

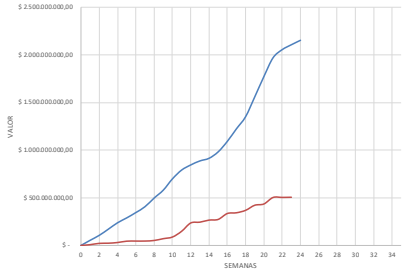
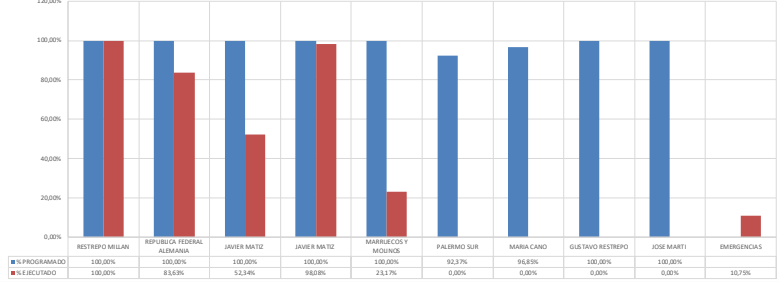



<div></div>				INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				<div> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN </div>					
DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO													
FECHA INICIO INTERVENTORIA:		2 de octubre de 2025		FECHA FINAL INTERVENTORIA:		1 de mayo de 2026		INFORME GENERAL DEL PROYECTO		SEMANA		23	
FECHA INICIO OBRA:		2 de octubre de 2025		FECHA FINAL OBRA:		1 de mayo de 2026				DEL		20/04/2026	
CONTRATISTA OBRA		CONSORCIO VIRREY SED				Director de Obra				JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14*				VALOR INICIAL		VALOR TOTAL		CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8155166	
						\$ 2.267.991.539,00							
CONTRATISTA INTERVENTORIA		INGENIERIA MASTER S.A.S				Director de Interventoría				ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5*				VALOR INICIAL		VALOR TOTAL		CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8168833	
						\$ 796.278.926,00							
ACTIVIDADES REALIZADAS													
COMPONENTE TÉCNICO:													
A la fecha se termino el tiempo contractual de colegios sin iniciar como son Jose Marti, Gustavo Restrepo, y los demas ya superaron el 70%													
El contratista presento un plan de contingencia para los 5 frentes en ejecución el cual a la fecha no lo esta cumpliendo, muestra de ellos es los incumplimientos en las entregas de Republica Federal Alemania, Javier Matiz A, Javier Matiz B.													
Se continua en tramite el incumplimiento ante la SED por el atraso presentado a la fecha													
COMPONENTE SST: Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra, se hace seguimientos a los sitios de obra, se revisan EPPs													
COMPONENTE AMBIENTAL: Se genera pin ambiental , se revisa documentos de volquetas para retiro de material.													
REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA													
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE				DÍAS DEL CONTRATO					
% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO	COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	4	Actas de vecindad	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES			
97,83%	95,45%	0,08%	23,49%	COLEGIOS POR INTERVENIR	4	9							
5				COLEGIOS TERMINADOS	1								
				TOTAL	9								
								211	206	6			
									97,6%	2,8%			
													
OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:													
* Se ajusto el porcentaje ejecutado del colegio Javier Matiz Sede A													
Elaborado Por:  Nombre : Luis Carlos Rojas Representante de Interventoría													
Verificado Por:  Nombre : Cindy Lorena Rodriguez Bohórquez Directora de Interventoría													

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				  					
DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO											
FECHA INICIO INTERVENTORIA:		02 de octubre de 2025		FECHA FINAL INTERVENTORIA:		01 de mayo de 2026		SEMANA		23	
FECHA INICIO OBRA:		12 de noviembre de 2025		FECHA FINAL OBRA:		29 de enero de 2026		DEL		20/04/2026 AL 26/04/26	
CONTRATISTA OBRA		CONSORCIO VIRREY SED				Director de Obra		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"						CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA		INGENIERIA MASTER S.A.S				Director de Interventoria		CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"						CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8168833	
COMPONENTE TÉCNICO:											
20/04/2026 Sin actividades de obra											
21/04/2026 Sin actividades de obra											
22/04/2026 Sin actividades de obra											
23/04/2026 Se realizo adecuación de cerramiento de obra											
24/04/2026 Se realizo adecuación de cerramiento de obra.											
25/04/2026 Sin actividades de obra											
COMPONENTE SST:											
COMPONENTE AMBIENTAL:											
REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA											
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA						DÍAS DEL CONTRATO					
% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO		TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES			
44,16%	100,00%	0,00%	52,34%			78	165	-86			
							211,5%	-110,3%			
ESTADO DE AVANCE FINANCIERO				% DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO							
											



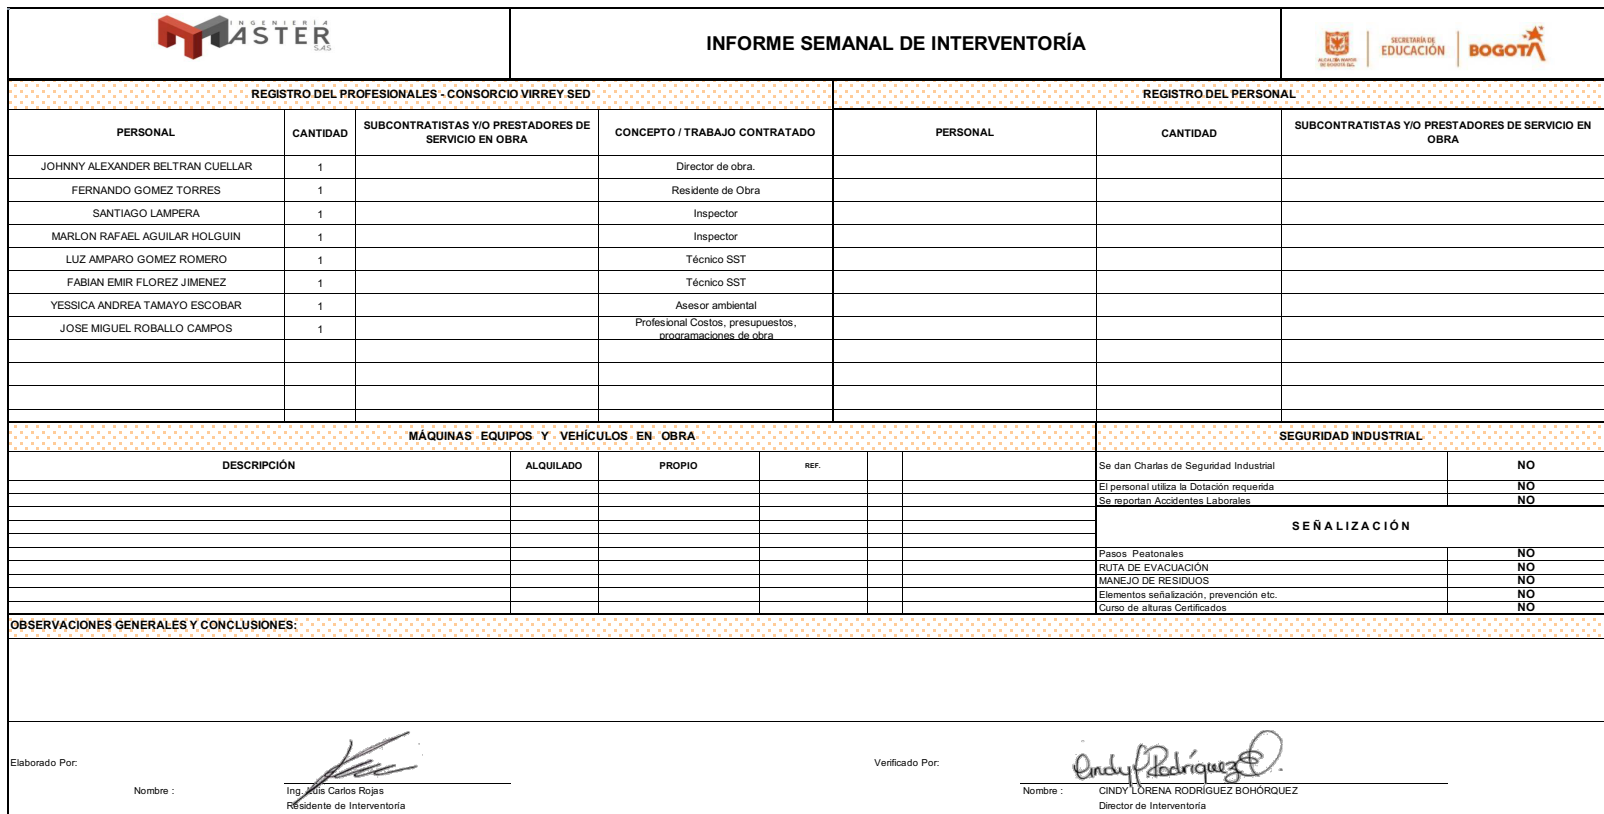

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



FECHA INICIO INTERVENTORIA:

02 de octubre de 2025

FECHA FINAL INTERVENTORIA:

01 de mayo de 2026

FECHA INICIO OBRA:

10 de noviembre de 2025

FECHA FINAL OBRA:

3 de febrero de 2026

COLEGIO REPUBLICA FEDERAL ALEMANIA

SEMANA

23

CONTRATISTA OBRA

CONSORCIO VIRREY SED

Director de Obra

JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR

OBJETO DEL CONTRATO

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14*

CONTRATO N°

CO1.PCCNTR.8155166

CONTRATISTA INTERVENTORIA

INGENIERÍA MASTER S.A.S

Director de Interventoria

CINDY LORENA RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5*

CONTRATO N°

CO1.PCCNTR.8168833

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

20/04/2026 Sin actividades de obra.

21/04/2026 Sin actividades de obra.

22/04/2026 Sin actividades de obra.

23/04/2026 Se inicia pañete de muros de baño de primer piso.

24/04/2026 Se continua actividad de pañete y se realizan regatas para tubería de agua potable.

25/04/2026 Sin actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO

100,00%

% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR

100,00%

% EJECUTADO ESTA SEMANA

2,78%

TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO

83,63%

TIEMPO EJECUCIÓN

85

DIAS DEL CONTRATO

CONTRACTUAL

167

TRANSCURRIDOS

196,5%


FALTANTES

-81


FALTANTES

-95,3%

ESTADO DE AVANCE FINANCIERO



% DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO



Cindy L. Rodríguez
CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Directora de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 2

SEMANA	DEL	AL
23	20/04/2026	26/04/2026

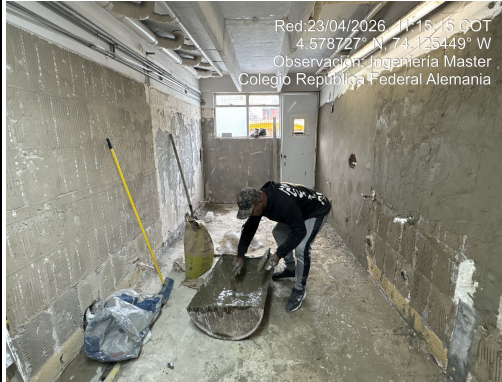


FOTO 1: Pañete de muros - Colegio Republica Federal Alemania



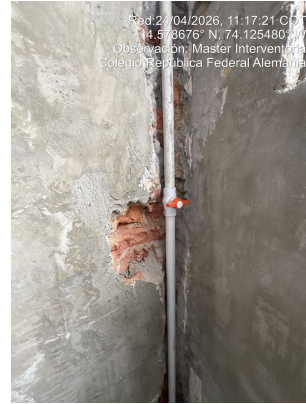


FOTO 2: Instalación de tubería de agua potable - Colegio Republica Federal Alemania

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							
DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO									
FECHA INICIO INTERVENTORIA:		02 de octubre de 2025		FECHA FINAL INTERVENTORIA:		01 de mayo de 2026		COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	
FECHA INICIO OBRA:		18 de noviembre de 2025		FECHA FINAL OBRA:		27 de enero de 2026		SEMANA 23	
CONTRATISTA OBRA		CONSORCIO VIRREY SED				Director de Obra		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	
OBJETO DEL CONTRATO		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRÁVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA		INGENIERIA MASTER S.A.S				Director de Interventoria		CINDY LORENA RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRÁVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8168833	
ACTIVIDADES REALIZADAS									
COMPONENTE TÉCNICO:									
20/04/2026 Sin actividades de obra									
21/04/2026 Sin actividades de obra									
22/04/2026 Sin actividades de obra									
23/04/2026 Sin actividades de obra									
24/04/2026 Sin actividades de obra									
25/04/2026 Sin actividades de obra									
COMPONENTE SST:									
Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimiento de personal en obra: epp, ats.									
COMPONENTE AMBIENTAL:									
Se realiza apertura de pin ambiental									
REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA									
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA						DÍAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO			CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES	
100,00%	100,00%	1,25%	23,17%			70	159	-88	
							227,1%	-125,7%	
ESTADO DE AVANCE FINANCIERO									
									
% DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO									
									

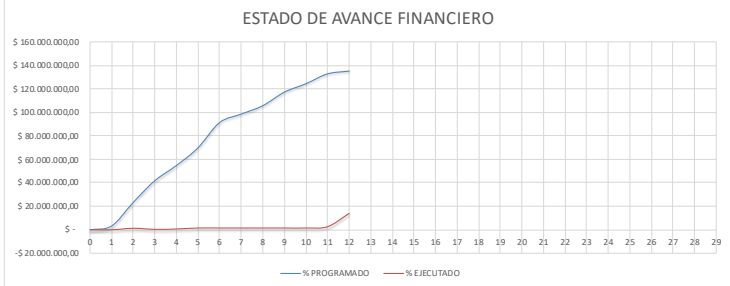

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

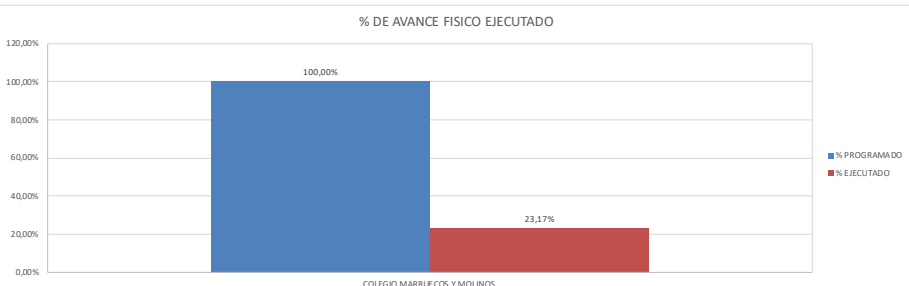

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra.

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.			

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	N/A
ruta de EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realizar ajuste de presupuesto con las cantidades de piso de aulas de preescolar, por tanto el porcentaje ejecutado disminuye al subir el valor del presupuesto del colegio.

Elaborado Por:


Nombre :

Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							
DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO									
FECHA INICIO INTERVENTORIA:		02 de octubre de 2025		FECHA FINAL INTERVENTORIA:		01 de mayo de 2026		COLEGIO JAVIER MATIZ B	
FECHA INICIO OBRA:		18 de noviembre de 2025		FECHA FINAL OBRA:		15 de enero de 2026		SEMANA	
CONTRATISTA OBRA		CONSORCIO VIRREY SED				Director de Obra		DEL	
						JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		23	
OBJETO DEL CONTRATO		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14'				CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA		INGENIERIA MASTER S.A.S				Director de Interventoria		CINDY LORENA RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5'				CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8168833	
ACTIVIDADES REALIZADAS									
COMPONENTE TÉCNICO:									
20/04/2026 Instalación de tubería de bajante de zona dura, vaciado de concreto de placa frente a cancha.									
21/04/2026 Se realiza relleno de excavación de tubería de descole de cárcamo, reinstalación de adoquín									
22/04/2026 Se realiza pañete de graderías, y nivelación de adoquín									
23/04/2026 Corte de adoquín para remates y mantenimiento de cerramiento									
24/04/2026 Sin actividades de obra									
25/04/2026 Sin actividades de obra.									
COMPONENTE SST:									
Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimiento de personal en obra: epp, ats.									
COMPONENTE AMBIENTAL:									
Se realiza apertura de pin ambiental									
REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA									
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				DÍAS DEL CONTRATO					
% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO		TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES	
100,00%	100,00%	0,77%	98,08%			58	159	-100	
							274,1%	-172,4%	
ESTADO DE AVANCE FINANCIERO									
									



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.			
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra			
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector			
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector			
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST			
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST			
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental			
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.			
						Se dan Charlas de Seguridad Industrial
						NO
						El personal utiliza la Dotación requerida
						NO
						Se reportan Accidentes Laborales
						NO
						SEÑALIZACIÓN
						Pasos Peatonales
						NO
						ruta de EVACUACIÓN
						NO
						MANEJO DE RESIDUOS
						NO
						Elementos señalización, prevención etc.
						NO
						Curso de alturas Certificados
						NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realiza ajuste al presupuesto de obra v2, por tanto se ajusta el porcentaje ejecutado.

Elaborado Por:

Nombre :

Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LÓRENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Directora de Interventoría



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 2

SEMANA	23
DEL	20/04/2026
AL	26/04/2026



FOTO 1: Instalación de adoquín - Javier Matiz B


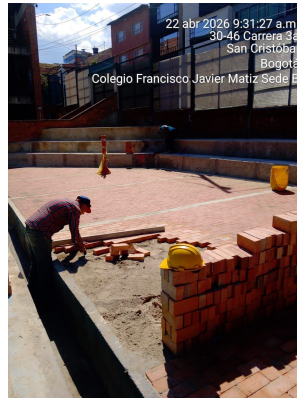


FOTO 2: Renovación de adoquín - Colegio Javier Matiz B



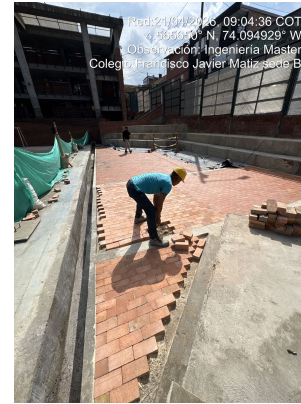
