

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. TRES (03) PARCIAL	Código: FO-GD-02-018
		Versión: 28
		Fecha de Modificación: 05/02/2026

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	jueves, 7 de mayo de 2026
------------	-----------------	------------	---------------------------

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-002-2025 (D.CO1.PCCNTR.7910456)	Número Radicado interno del Contrato:	21062025-1151
---	---	---------------------------------------	---------------

Número de identificación del contratista - NIT	901450894-6	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	2024003170094
--	-------------	--	---------------

CONTRATISTA	ICCSA SAS (REP.LEGAL: RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO)
-------------	---

CONTRATO CEDIDO A:	N/A
--------------------	-----

CODIGO VIA	50CL01	NOMBRE DE LA VIA	LAS MARGARITAS - CAUYA, MUNICIPIO DE RISARALDA
------------	--------	------------------	--

Actividad Económica	4210	Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
---------------------	------	------------------	------------------

Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS
----------------------	--

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 1.385.369.883	\$ 92.341.765,00	\$ 277.073.976

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:		
Aporte Departamento:	100%	\$ 1.477.711.648	PUBLICA		Fecha de Iniciación	SEPTIEMBRE 01 DE 2025
Aporte Convenio No					Fecha de Terminación de ejecución	ABRIL 30 DE 2026
Aporte Convenio No						

Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FEI 111	4500028298	1	\$ 223.537.709,00	\$ 45.594.108,00	\$ 177.943.601,00	7-RFR-0378	16INF	23201010010302	S240231455302AAA	INF-240170.01.01
	SPGR 11225									
VALOR ACTA			\$ 223.537.709,00	\$ 45.594.108,00	\$ 177.943.601,00					

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:			\$ 1.385.369.883,00	Valor del Anticipo:			\$ 277.073.976,00
Adición del Contrato			\$ 92.341.765,00				
Valor Acta Nro. 1		\$ 627.186.928,00		Amortización Acta 1		\$ 125.437.386,00	
Valor Acta Nro. 2		\$ 530.212.409,00		Amortización Acta 2		\$ 106.042.482,00	
Valor Acta Nro. 3		\$ 223.537.709,00		Amortización Acta 3		\$ 45.594.108,00	
Valor Acta Nro. 4		\$ 0,00		Amortización Acta 4		\$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5		\$ 0,00		Amortización Acta 5		\$ 0,00	
Valor Acta Nro. 6		\$ 0,00		Amortización Acta 6		\$ 0,00	
Valor Acta Nro. 7		\$ 0,00		Amortización Acta 7		\$ 0,00	
Valor Acta Nro. 8		\$ 0,00		Amortización Acta 8		\$ 0,00	
Valor Acta Nro. 9		\$ 0,00		Amortización Acta 9		\$ 0,00	
Saldo del Contrato:		\$ 96.774.602,00		Saldo por Amortizar:		\$ 0,00	
SUMAS IGUALES		\$ 1.477.711.648,00	\$ 1.477.711.648,00	SUMAS IGUALES		\$ 277.073.976,00	\$ 277.073.976,00

OBSERVACION: El contrato 21062025-1151, fue prorrogado en su plazo de ejecución en tres (3) meses, desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026 (prorroga uno) y en un (1) mes, desde le 01/04/2026 hasta el 30/03/2026 (prorroga 02), con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2026.

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Colizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma		Firma	
Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	Nombre:	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
	Secretario de Infraestructura		Supervisor
	Ordenador del gasto		
Firma			
Nombre	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ		
	Interventor Externo		

ICSSA S.A.S.
 NIT 901.450.894-6
 CL 36 27 79
 Tel: (607) 6826902
 Bucaramanga - Colombia
 paan83@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA NO. FEI 111**

RES.DIAN No. Número Autorización
 Electrónica 18764091666454 aprobado en
 20250407 prefijo FEI desde el número 51 al
 200 Vigencia: 12 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica
 4290 - Construcción de otras obras de
 ingeniería civil

Fecha y hora Factura
 Generación: 07/05/2026,
 07:02
 Expedición: 07/05/2026, 07:16

Nombre del Cliente
 DEPARTAMENTO DE CALDAS

Nit ó C.C.
 890.801.052-1

Fecha de Vencimiento
 2026-06-06

Razón Social
 DEPARTAMENTO DE CALDAS

Dirección
 CR 21 CL 22 23


Teléfono
 (607) 8982444

Correo
 aocampo@caldas.gov.co

Vendedor
 ICSSA S.A.S.

Centro de Costo
 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Acta parcial No. 3 al contrato 21062025-1151 suscrito entre La Gobernación de Caldas e Icssa SAS, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS.	1.00	166,819,185.82	0.00	166,819,185.82
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	48,377,563.89	0.00	48,377,563.89
3	UTILIDAD 5%	1.00	8,340,959.29	0.00	8,340,959.29

Total items: 3**OBSERVACIONES:****Valor en Letras:**

Doscientos veintitres millones quinientos treinta y siete mil setecientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 \$ 223,537,709.00
vence el 2026-06-06 por

Total Bruto	223,537,709.00
Total a Pagar	223,537,709.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

e6d265e07368a2c61dd0d4607bcacca1e7e6331e799ffbfed9bb9adac489b1d9c292456729875badb9be8c5aa0dec0



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ICSSA SAS

Identificado con NI 9014508946

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina BUCARAMANGA PRINCIPAL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24140356258
Fecha de apertura:	29 de Octubre de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0421 BUCARAMANGA PRINCIPAL de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Viernes, 11 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500028298	Fecha de Contabilización:	31.12.2025
Beneficiario:	9014508946 ICSSA SAS	Fecha Impresión:	23.02.2026
Contrato:		Estado Liberación:	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDACALDAS

Item 1

Apropiación: 7-RFR0378-16INF-23201010010302-S240231455302AAA-INF-R-240170.01.01 INV REG 60%-DEPARTA INVERSION REGIONAL-CONS DE LA INFRA DEL TRAN-

Valor: 1.108.295.907 COP

Proyecto: INF-R-240170.01.01 1.1.1 Actividad 1: Ejecución conforme a

CDP Asociados:

3500045558

Programación PAC

ENE: 1.108.295.907

Importe total: La suma de UN MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS

Nombre y
Firma Solicitante

Elaboró:

Nombre y
Firma Aprobador



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante,

Usuario Solicitante: LAURA LUCIA DUCUE CASTAREDA
Unidad 6 Simulación: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Módulo: 02-17000

Fecha y Hora Solicitud: 2025-06-19 04:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10325 de fecha 2024-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11225	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	Tipo de Moneda:	LUP-Peso	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1,395,393,853.00	Saldo a Obligar:	1,395,393,853.00
Valor Inicial:	1,395,393,853.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Saldo a Obligar:			
Localización:	501450304	Recurso Social:	12354.1945	TECUNIBO		Medio de Pago:			Abono en cuenta
Numero:	29140302206	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	CUENTA BANCARIA		Monto:		Estado:	Activo
Identificación:	10231209	Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
Identificación:	CAJA MENOR	Numero:	001.00000000000000	DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO	Fecha:	2025-06-19		
Proxima Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Comprobante:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITIO:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	3048 2401 0000 2024 00317 0054 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS	Nalsh	A01/000	CSF	2025-06-19	1,395,393,853.00	0.00	1,395,393,853.00	1,395,393,853.00
					Total:	1,395,393,853.00	0.00	1,395,393,853.00	1,395,393,853.00

Cuenta: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DEPARTAMENTO DE CALDAS	500-JULIO	2025-06-30	1,395,393,853.00	1,395,393,853.00	NINGUNO



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO**, identificado con CC 88.266.568 de Cúcuta, en mi condición de representante legal de **ICSSA SAS** identificada con NIT 901.450.894-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes a las Empresas Promotoras de Salud – EPS –, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP –, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF –, y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, pagados durante los últimos meses, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO**, identificada con CC 63.539.126 de Bucaramanga, portadora de la Tarjeta Profesional 235252-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **ICSSA SAS**, identificada con NIT 901.450-894-6, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes a las Empresas Promotoras de Salud – EPS –, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP –, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF –, y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, pagados durante los últimos meses, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firmado en Bucaramanga el 7 de mayo de 2026,

RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO
REPRESENTANTE LEGAL

PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO
REVISORA FISCAL
TP 235252-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F 3 C 8 B 2 3 0 9 7 A 2 2 A 0 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63539126 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 235252-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

235252-T

PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO
C.C. 63539126
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL


240949 258628

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C


FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63539126

MALAGON NIÑO
APELLIDOS

RAOLA ANDREA
NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

28-MAY-1983

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

O+

F

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

31-MAY-2001 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2700100-50090572-F-0063539126-0001208

0379001341A 01 116933091

2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

141227128313



(425)7707212489984(8020) 0000141227128313

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

E. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 5 0 8 9 4 6

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ICSSA S.A.S.

36. Nombre comercio

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 36 27 71 OF 810 ED MILLENIUM

42. Correo electrónico

icssasas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 6 7 8 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

4 2 1 0

2 0 2 1 0 1 2 9

4 2 2 0

2 0 2 1 0 1 2 9

4 9 2 3

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

45- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Perígrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2018. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1591 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ PAEZ SANDRA MILENA

985. Cargo Gestor

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227128313



(415)7707212489984(8020) 0000141227128313

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 5 0 8 9 4

6

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades e instituciones de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficia

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Edad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 0 2	
77. No. Matricula mercantil	0 5 4 8 0 9 8 3 1 6	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 1 0 1 2 6
81. Hasta	2 0 2 1 1 2 3 1

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 1 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la CIAN

Página 3 de 4 Hoja 3

4. Número de formulario

141227128313



(415)7707212489984(8020) 0000141227128313

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 5 0 8 9 4 6

Impuestos y Aduanas de Guayaquil

4

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 5 1 2 1 2

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

8 8 2 6 6 5 6 8

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

PEÑARANDA

FORERO

RAFAEL

ANDRES

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227128313



(41317707212489984(8020) 0000141227128313

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 5 0 8 9 4 | 6

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga


4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 6 3 5 3 9 1 2 6	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 3 5 2 5 2 T
	128. Primer apellido MALAGON	129. Segundo apellido NIÑO	130. Primer nombre PAOLA	131. Otros nombres ANDREA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 4 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Planilla Resumen

[illegible]



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado IENA e ICBF	
HIT 801446168	2	COVILLAG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RESALADA	CALLE 9 22 55	BOGOTÁ D.C. ALDIAS	3157386885	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	59319924	9504316766	E	2024/05/16	2024/05/08	BANCO CUCUMBIA	0	\$10,521,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					24	\$5,436,000	\$0	\$0	\$5,436,000
COLFENSIONES		71-14	90013361004	7	7	\$1,774,600	\$0	\$0	\$1,774,600
PORVENIR		230301	80012241808	8	9	\$2,054,800	\$0	\$0	\$2,054,800
PROTECCION		230201	80017791719	0	8	\$1,606,600	\$0	\$0	\$1,606,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					24	\$2,365,300	\$0	\$0	\$2,365,300
ARL SURA		14-11	89019031790	5	24	\$2,365,300	\$0	\$0	\$2,365,300
CLCF (ADMINISTRADORAS: 1)					24	\$1,340,200	\$0	\$0	\$1,340,200
CONFAMILIARES		CCT11	89018061490	5	24	\$1,340,200	\$0	\$0	\$1,340,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					24	\$1,340,200	\$0	\$0	\$1,340,200
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	90012761715	3	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	80010881702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAWESANAR		EPS017	83010031564	7	1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400
NUEVA F.P.S.		EPS037	90011561264	2	5	\$306,100	\$0	\$0	\$306,100
NUEVA EPS MOVILIDAD		FP0041	90011561264	2	12	\$631,100	\$0	\$0	\$631,100
SALUD TOTAL		EP0002	80011301907	4	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SANTITAS		EP5005	80012511440	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL					24	\$10,521,700	\$0	\$0	\$10,521,700

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA		
Fecha acta	ABRIL 27 DE 2026		
Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	21062025-1151	Acto Administrativo	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028208 4500030631		
NIT o RUT:	901.450.894 - 6		
Contratista:	ICCSA SAS		
Representante Legal:	RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO		
Valor del Contrato (\$):	\$ 1.385.369.883,00	Aporte Departamento	\$ 1.477.711.646,00
Valor Adición	\$ 92.341.765,00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRITICO K12+800 EN EL MUNICIPIO DE RISARALJA, CALDAS		
Disponibilidad presupuestal	3500045558 - 3500045558	FONDO	2 - 0378
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 01 DE 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2025
Modificador 01 (prorroga plazo):	TRES (MESES) DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	Nueva fecha terminación	MARZO 31 DE 2026
Modificador 02 (prorroga plazo):	JUN (1) MES (DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026	Nueva fecha terminación	ABRIL 30 DE 2026
Interventor Externo	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ		
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	VTOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
14	311.1		AFIRMADO	m3	3,00	216.174,00	648.522,00
35	681.1P		SABIONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE. RELACIÓN S/C 6:1	m3	149,40	399.471,00	59.680.967,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (ADMINISTRACION: 29,00% - U: 5%)							60.329.489,00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	VTOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
26	311.1		AFIRMADO	m3	20,56	216.174,00	4.444.537,00
48		NP-8	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARUCHA	m3	468,50	335.158,00	156.351.207,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (ADMINISTRACION: 29,00% - U: 5%)							160.795.744,00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	VTOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
45		NP-3	SOBREACARREO DE MATERIAL	m3	55,90	43.157,00	2.412.476,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (ADMINISTRACION: 29,00% - U: 5%)							2.412.476,00

Valor Acta PARCIAL	☒	TOTAL	☐	\$223.537.709,00
Amortización Anticipo				\$45.594.108,00
Valor Ordenación del Gasto:				\$177.943.601,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		1.385.369.883,00
Valor adicional		92.341.765,00
Valor Acta No. 1:	627.186.928,00	
Valor Acta No. 2:	530.212.409,00	
Valor Acta No. 3:	223.537.709,00	
Saldo del contrato	96.774.602,00	
Sumas iguales	1.477.711.648,00	1.477.711.648,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		277.073.976,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	125.437.598,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	106.042.482,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	45.594.108,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas iguales:	277.073.976,00	277.073.976,00


SE HACE CONSTAR

Que ICCSA SAS, representado legalmente por RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Cando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 826 de 2.003 y el Artículo 27 del Decreto 2°75 de 2.002, la suscrita interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista:

Firma: 
Jhon E. Riquelme Gutierrez Cardona
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma: 
ICCSA SAS
(Rep-Lega. Rafael Andres Peñaranda Forero
Contratista

Firma: 
JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
Interventor Externo

Firma: 
MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
Supervisor Depto

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y NO PREVISTA AL ACTA NRO TRES (03) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21062025-1151 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 21062025-1151
---	--

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta	ABRIL 27 DE 2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	21062025-1151	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028298		
NIT o RUT:	901.450.894 - 6		
Contralista:	ICCSA SAS		
Representante Legal:	RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO		
Valor del Contrato (\$):	\$ 1.385.369.883,00	Aporte Departamento:	\$ 1.477.711.648,00
Valor Adición	\$ 92.341.765,00	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS		
Disponibilidad presupuestal	3500045558	FONDO	2 - 0378
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 01 DE 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2025
Modificadorio 01 (prorroga plazo)	TRES (MESES) DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	Nueva fecha terminación	MARZO 31 DE 2026
Modificadorio 02 (prorroga plazo)	UN (1) MES (DESEE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026	Nueva fecha terminación	ABRIL 30 DE 2026
Interventor Externo	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ		
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
26	311.1		AFIRMADO	m3	20,86	216.174,00	4.444.537,00
48		NP-6	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARUCHA	m3	466,50	335.156,00	156.351.207,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (ADMINISTRACION: 29,00% - U: 5%)							160.795.744,00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
45		NP-3	SOBREACARREO DE MATERIAL	m3	55,90	43.157,00	2.412.476,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (ADMINISTRACION: 29,00% - U: 5%)							2.412.476,00

Fue necesario realizar las mayores cantidades de obra y la obra adicional no prevista aquí relacionada debido a: 26: AFIRMADO De acuerdo a las indicaciones de la entidad contratante y a las necesidades del proyecto se requiere mayor cantidad en este ítem ya que los diseños suministrados contemplaban que el relleno para el muro en tierra armada sea afirmado. 48. CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARRUCHA: Durante los meses de febrero y marzo de 2026, se realizaron los transportes internos de material seleccionado, para los tenos de los sacos de suelo cemento, los cuales fueron almacenados en los gaviones para la conformación de los diques uno, dos, y tres.

En cuanto a obra no prevista: 45. SOBREACARREO DE MATERIAL. Este ítem se está empleando para transportar el material desde sus sitio de acopio o disposición hasta el sitio de su utilización, como en este caso para el muro estabilizado.

Por lo tanto, se autoriza la inclusión del acta de mayores cantidades de obra y obra adicional no prevista aquí relacionadas.


JORGE RICARDO GUTIERREZ CARPONA
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma 
ICCSA SAS
(Rep-Legal: Rafael Andres Peñaranda Forero
Contratista

Firma 
JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
Interventor Externo

Firma 
MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
Supervisor Depto

[illegible]

WALCRA

71

111

1

del Andes Peruanos FOMIO
VIOY.

11516

Secretaria :
INFRAESTRUCTURA
Fecha acta
ABRIL 27 DE 2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	21062025-1151	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028298 4500030531		
NIT o RUT:	501.450.894 - 6		
Contratista:	ICCSA SAS		
Representante Legal:	RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO		
Valor del Contrato (\$):	\$ 1.385.369.883,00	Aporte Departamento	\$ 1.477.711.648,00
Valor Adición	\$ 92.341.765,00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS		
Disponibilidad presupuestal	3500045558 - 3500045558	FONDO	2 - 0378
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 01 DE 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2025
Modificadorio 01 (prorroga plazo)	TRES (MESES) DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	Nueva fecha terminación	MARZO 31 DE 2026
Modificadorio 02 (prorroga plazo)	UN (1) MES (DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026	Nueva fecha terminación	ABRIL 30 DE 2026
Interventor Externo	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ		
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
	GENERAL	PARTIC.				
1	201.7		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	-	0.00
2	201.8		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	-	0.00
3	201.15		REMOD.ÓN DE ALCANTARILLAS	m	-	0.00
4	465.1P		CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO	m	-	0.00
5	450.2P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	-	0.00
6	420.2		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57	m2	-	0.00
7	330.3.1		BASE GRANULAR CLASE C	m3	-	0.00
8	320.3.1		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	-	0.00
9	600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	-	0.00
10	600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	-	0.00
11	610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	-	0.00
12	630.1.4.1		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-	0.00
13	640.1		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	kg	-	0.00
14	311.1		AFIRMADO	m3	23,56	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
15	663.1		TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	m	-	0.00
16	673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR	m2	-	0.00
17	673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	0.00
18	663.1P		TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	-	0.00
19	600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	-	0.00
20	600.1.1P		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m3	-	0.00
21	600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	-	0.00
22	630.1.4.1		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-	0.00
23	640.1		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	kg	-	0.00
24	640.2		MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa	kg	-	0.00
25	673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	0.00
26	311.1		AFIRMADO	m3	-	0.00
27	673.1.1P		GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR	m2	-	0.00
28	683.1.1		GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO T2400 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m2	-	0.00
29	683.1.2		GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR6000HF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m2	-	0.00
30	683.1.3		GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO HR160 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m2	-	0.00
31	663.5		RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	-	0.00

32	673.2P		FILTRO TRANSVERSAL PARA CUERPO DE MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO. INCLUYE MATERIAL DRENANTE Y RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT-1600 O SIMILAR	m	-	0.00
33	674.1P		LAGRIMALES Y/O LLORADEROS DE DIAMETRO 3" EN PVC	m	-	0.00
34	610.2		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	-	0.00
35	681.1P		GAVIONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE. RELACIÓN S/C 6:1	m3	149.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
36	674.1		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	-	0.00
37	670.5P		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO DE 21MPa	m3	-	0.00
38	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	-	0.00
39	701.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	und	-	0.00
40	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV	und	-	0.00
41			VALOR PGIO (INMODIFICABLE)	und	-	0.00
42			VALOR PMT (INMODIFICABLE)	und	-	0.00
48		NP-4	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARUCHA	m3		VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
	GENERAL	PARTIC.				
49		NP-3	SOBREACARREO DE MATERIAL	m3	55.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

ICSSA SAS (Rep. Legal: Rafael Andes Peñaranda Forero)
Contralista

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
Interventor Externo

COD. FO-GEOP-438		Formulario FO-GEOP Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública										GOBIERNO DE CALDAS	
Versión 1													
CONTRATO No	21022022-1151	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	10/04/2025	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025	VALOR		DE			
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITO CRITICO K17+000 EN EL MUNICIPIO DE RUJALDA, CALDAS												
FECHA DE ELABORACION (dd/mm/aaaa)	11/12/2025	CORRESPONDENCIA AL PERIODO DE REG		10/12/2025	HASTA	30/12/2025	ACTA N°	1					
CONTRATISTA	KESA S.A.S		INTERVENIOR	JUAN DIEGO BENAVIDEZ		SUPERVISOR		JORGE RICARDO GUTIERREZ TAPIA					
ITEM	25	DESCRIPCION	APROBADO		FORMULA		UNIDAD	MEJ	PREMIO DE OBRA		SITO CRITICO K17+000		
Registro fotográfico o diagrama de la actividad					LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	CANTIDAD		
   					Vigilancia y mantenimiento de la obra		1	6	2	0,2	11,56		
Mejoramiento subrasante canal de drenaje del muro mecatricamente estabilizado							1	25	2	0,2	10,00		
Mejoramiento subrasante canal de drenaje del muro mecatricamente estabilizado							1	25	2	0,2	10,00		
OBSERVACIONES:													
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA													
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES													
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO													
TOTAL POR EJECUTAR													
FIRMAS:													
 JUAN SEBASTIAN CERDANO RODRIGUEZ Presidente de la UDA			 CARLOS ANDRES VILLANAR Director de UDA			 JUAN DIEGO BENAIDEZ Director de Interventoría			 JORGE RICARDO GUTIERREZ Supervisor				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	21062025-1151		RADICADO JURID. NRO:		21062025-1151		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ICCSA SAS (REP LEGAL: RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO)						
NOMBRE DEL INTERVENTOR	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ						
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA						
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025				PRORROGA 01 PLAZO	TRES MESES. HASTA 31/03/2016	
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO A.U. (34%)	\$ 1.477.711.649	PORCENTAJE AU %	25% (A: 20%, U: 5%)				
VALOR TOTAL	\$ 1.477.711.649				PRORROGA 02 PLAZO	UN (1) MES. HASTA 01/04/2026	
OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	3,10	1.606.807,00	0,11%	0,24%	10,00	5.183.251	0,35%
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	8,00	825.488,00	0,06%	-0,06%	0,00	0	0,00%
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	10,00	3.686.030,00	0,25%	-0,25%	0,00	0	0,00%
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO	12,00	151.536,00	0,01%	-0,01%	0,00	0	0,00%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 -	1,00	1.369.386,00	0,09%	-0,09%	0,00	0	0,00%
RIEGO DE IMPRVACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	8,00	47.984,00	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00%
BASE GRANULAR CLASE C	1,00	242.059,00	0,02%	-0,02%	0,00	0	0,00%
SUBBASE GRANULAR CLASE C	2,00	419.362,00	0,03%	-0,03%	0,00	0	0,00%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	38,00	9.261.180,00	0,63%	0,21%	47,50	12.296.789	0,83%
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	9,00	2.912.112,00	0,20%	-0,20%	0,00	0	0,00%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	19,00	3.313.752,00	0,22%	-0,22%	0,00	0	0,00%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	10,00	9.568.650,00	0,65%	-0,65%	0,00	0	0,00%
ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	518,00	3.791.760,00	0,26%	-0,26%	0,00	0	0,00%
AFIRMADO	3,00	648.522,00	0,04%	0,30%	23,56	5.093.059	0,34%
TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC, NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	20,50	27.026.032,00	1,83%	-1,25%	6,50	8.569.230	0,58%
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR	70,00	1.315.650,00	0,09%	-0,09%	0,00	0	0,00%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	12,00	2.127.240,00	0,14%	-0,14%	0,00	0	0,00%
TUBERIA DE PVC 4" PARA FILTROS	20,00	611.060,00	0,04%	0,00%	20,00	611.060	0,04%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	180,00	45.305.000,00	3,13%	-3,13%	0,00	0	0,00%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	838,00	21.809.788,00	1,46%	0,22%	963,40	25.073.448	1,70%
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	254,00	70.680.072,00	4,78%	-4,78%	0,00	0	0,00%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	173,40	142.691.554,00	9,66%	-8,96%	12,47	10.261.613	0,69%
ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	255,00	1.866.600,00	0,13%	-0,13%	0,00	0	0,00%
MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa	1.180,70	11.294.576,00	0,76%	-0,63%	203,63	1.947.944	0,13%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	210,80	37.368.516,00	2,53%	1,51%	336,80	59.704.535	4,04%
AFIRMADO	94,00	20.320.356,00	1,38%	18,53%	1.360,60	294.126.345	19,90%
GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR	759,00	8.582.772,00	0,58%	-0,01%	746,70	8.443.684	0,57%
GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO T2400 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	683,00	14.444.767,00	0,98%	0,40%	962,80	20.362.257	1,38%
GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR5000HF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	2.237,00	89.097.473,00	6,03%	-0,75%	1.957,20	77.953.319	5,26%
GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO HR1600 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	1.281,00	71.513.106,00	4,94%	2,83%	2.030,20	113.337.945	7,67%
RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	1.298,00	200.640.946,00	13,58%	-13,58%	0,00	0	0,00%
FILTRO TRANSVERSAL PARA CUERPO DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO. INCLUYE MATERIAL DRENANTE Y RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT-1600 O SIMILAR	474,00	6.260.592,00	0,42%	0,00%	474,00	6.260.592	0,42%
LAGRIMALES Y/O LLORADEROS DE DIAMETRO 3" EN PVC	2.922,00	51.289.866,00	3,47%	-3,47%	0,00	0	0,00%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	629,00	86.951.073,00	5,88%	-5,88%	0,00	0	0,00%
GAVIONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE. RELACIÓN S/C 6:1	1.095,20	437.500.639,00	29,61%	-7,98%	800,00	319.576.799	21,53%
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	160,00	23.688.640,00	1,60%	-1,60%	0,00	0	0,00%
DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO DE 21MPa	43,00	24.456.250,00	1,66%	-1,66%	0,00	0	0,00%
LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	300,00	1.125.900,00	0,08%	-0,08%	0,00	0	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	38,00	493.354,00	0,03%	-0,03%	0,00	0	0,00%

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR. SP Y/O SL DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA	4,00	4.607.540,00	0,31%	-0,31%	0,00	0	0,00%
VALOR PGIO (INMODIFICABLE)	1,00	29.570.505,00	2,00%	-2,00%	0,00	0	0,00%
VALOR PMT (INMODIFICABLE)	1,00	13.083.400,00	0,89%	-0,36%	0,60	7.816.490	0,53%
TALA DE ARBOLES DE 0-10 MTS	(2,00)	-847.516,00	-0,06%	0,17%	4,00	1.695.032	0,11%
PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II	(4,00)	-1.231.408,00	-0,08%	0,08%	0,00	0	0,00%
PERFILADO MANUAL PARA TALUD CON ALTURA HASTA 12 MTS	(99,10)	-12.736.035,00	-0,86%	5,92%	581,70	74.758.339	5,00%
HORA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJADA, STAND BY 5 HORAS DIA	(18,00)	-3.750.048,00	-0,25%	0,25%	0,00	0	0,00%
TRANSPLANTE DE ARBOLES TIPO IV TRASLADO LARGO	(20,00)	-9.945.960,00	-0,67%	0,67%	0,00	0	0,00%
CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARUCHA	99,35	33.297.947,00	2,25%	15,89%	800,00	268.126.400	18,14%
SOBREACARREO DE MATERIAL	(269,60)	-11.635.127,00	-0,79%	4,83%	1.384,22	59.738.955	4,04%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (A: 29,00% - U: 5%)		1.477.711.648,00	100,00%			1.380.937.046,00	93,45%

INFORMACIÓN DE CONTRATO

CONTRATISTA	ICCS SAS (Rep. - Legal: Santiago Andres Sanchez Mantilla)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.385.369.883
VALOR ADICIONAL	\$ 92.341.765
VALOR TOTAL	\$ 1.477.711.648
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	SEPTIEMBRE 01 DE 2025
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2025
MODIFICATORIO 01 (PRORROGA DE PLAZO)	DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026
MODIFICATORIO 02 (PRORROGA DE PLAZO)	DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ES
REALIZADA POR EL INGENIERO JUAN
DIEGO SERNA MARQUEZ. LA
SUPERVISION ESTA A CARGO DE LA
INGENIERA MARIA DEL PILAR GOMEZ
VALENCIA, PROFESIONAL
UNIVERSITARIA ADSCRITA A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, MATERIAL GRANULAR DRENANTE, AFIRMADO, GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR, GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR6000HF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS, GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO HR160 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS, FILTRO TRANSVERSAL PARA CUERPO DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, INCLUYE MATERIAL DRENANTE Y RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT-1600 O SIMILAR, GAVIONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE, RELACION S/C 5-1, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO-PMT (INMODIFICABLE), ADEMAS DE OBR ADICIONAL NO PREVISTA COMO TALA DE ARBOLES DE 0-10 MTS, PERFILADO MANUAL PARA TALUD CON ALTURA HASTA 12 MTS Y SOBREACARREO DE MATERIAL CON UNA INVERSION DE \$ 1.380.937.046,00 EQUIVALENTE AL 33,46% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - UTILIDAD: 5,00%).

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
INTERVENTOR EXTERNO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA

MARZO 24 DE 2026

ACTA NRO. 02 PARCIAL

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO

21062025-1151

CONSULTORIA
OBRA:

X

Nro. CONTRATO RADICADO:

21062025-1151

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

CONTRATISTA:

ICCSA SAS (REP.LEGAL: RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO)

INTERVENTOR:

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

SUPERVISOR

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

PREGUNTAS
SI
NO
N/A
OBSERVACIONES

El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal

X

Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora

X

La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros

X

Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.

X

Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas

X

Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable

X

Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra

X

Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios

X

Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva

X

La obra cuenta con valla publicitaria

X

Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra

X

La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas

X

En la obra se realizan quemas a cielo abierto

X

Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil

X

Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado

X

El cambio de aceites se realiza en la obra

X

Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra

X

El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas

X

Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados

X

Se usan baños portátiles

X

Se entrega volantes informativos para la comunidad

X

Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra

X

Se afectan corredores de fauna nativa

X

Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región

X

Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra

X

Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra

X

Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)

X

Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire

X

Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición

X

Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra

X

Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región

X

OBSERVACIONES:
JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
INTERVENTOR EXTERNO



INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATOS 03 PARCIAL

Código: FO-FT-02-005

Versión: 07

Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: ABRIL 27 DE 2026

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, MATERIAL GRANULAR DRENANTE, AFIRMADO, GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR, GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR6000HF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS, GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO HR16C O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS, FILTRO TRANSVERSAL PARA CUERPO DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, INCLUYE MATERIAL DRENANTE Y RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT-1600 O SIMILAR, GAVIONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE, RELACIÓN S/C 6:1, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO-PMT (INMODIFICABLE), ADEMÁS DE OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS COMO TALA DE ARBOLES DE 0-10 MTS, PERFILADO MANUAL PARA TALUD CON ALTURA HASTA 12 MTS Y SOBRECARGO DE MATERIAL CON UNA INVERSIÓN DE \$ 1.380.937.046,00 EQUIVALENTE AL 33,45% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AL 34% (ADMINISTRACIÓN: 26% - UTILIDAD: 5,00%.

CONTRATO 21062025-1151

CONSULTORIA

OBRA 21062025-1151

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

CONTRATISTA

ICCSA SAS (REP.LEGAL: SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA)

INTERVENITOR EXTERNO

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

SUPERVISOR (A)

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 21007978300002 Y 12007316600001	\$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$ 120.000.000,00	01/09/2025 AL 31/12/2025	CHUBB ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	277.073.976.60	01/09/2025 AL 03/05/2026	CHUBB ASEGURADORA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	415.810.964.90	31/12/2025 AL 31/12/2030	CHUBB ASEGURADORA
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO	277.073.976.60	01/09/2025 AL 03/05/2026	CHUBB ASEGURADORA
SALARIOS Y PRESTACIONES	277.073.976.60	01/09/2025 AL 31/12/2028	CHUBB ASEGURADORA

NOTA: SE AMPLIARON LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS Y/O POLIZAS PARA LAS PRORROGAS DE PLAZO Y PARA LA ADICIÓN EN VALOR.

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	NRO.	DESCONTADO DE CADA ACTA	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF			PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)			INF. SUPERVISION	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
01/09/2025 AL 31/09/2025	SEPTIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CONSTANTES
01/10/2025 AL 31/10/2025	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS CONSTANTES
01/11/2025 AL 30/11/2025	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CONSTANTES
01/12/2025 AL 31/12/2025	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CONSTANTES
01/01/2026 AL 31/01/2026	ENERO	HUMEDO	LLUVIAS CON ALTA PRECIPITACIONES
01/02/2026 AL 28/02/2026	FEBRERO	HUMEDO	LLUVIAS CON ALTA PRECIPITACIONES
01/03/2026 AL 31/03/2026	MARZO	HUMEDO	LLUVIAS CON ALTA PRECIPITACIONES
01/03/2026 AL 27/04/2026	ABRIL	HUMEDO	LLUVIAS CON ALTA PRECIPITACIONES

INTERVENITOR/SUPERVISOR

DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO; SE LLEVO LA RELACION Y REGISTRO DE LAS ALTAS PRECIPITACIONES PRESENTADAS, EVIDENCIÁNDOSE ESTE FACTOR, LO QUE OCASIONO EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

FE/DA	-0.54 (0.00)
-------	--------------

UNION SUBSTITUTION: [SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE EXTRACTION](#)

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346094> on Tue, 20 Jun 2017 12:02:05 UTC

PERIOD: MIN 144.19

CONTRACT NO. DAH4-60-1-104

PLATE NUMBER 1

054793:6 MSCS

VALUATION OF THE FIRM (in million dollars)	8	1,200,500,000,000
--	---	-------------------

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, MITIGACIÓN Y DEMARCACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE TOSIGASTÓN, C.A.S.

REDACTED SUPPLEMENT
REDACTED SUPPLEMENT

1000

VALUON NORDIC MÅNEN (i-kilometer N/A)	5	57,244,705.00
VALUON NORDIC MÅNEN (i-kilometer N/A)	5	57,244,705.00

CONTRATISTA: EDGAR R. R.

PLAZO ACUMULADO:

10

ANTICIPA CONSUMO	5	27.433.471,00
ANTICIPA AMORALIZAC	5	12.437.300,00

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 248775-1992

INTRODUCTION **CONCLUSIONS**

SUPERABORDO DEL CONTRATO DE MIPROPIETARIEDAD:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Plan de desarrollo	Control de avance		
	Medición de avance		
	Planificación		
Cálculo de costos	Costos		
	Presupuesto		
Medición de avance	Presupuesto		
	Presupuesto		
Otros (Ejemplo: costos)	Evaluación de costos	Gr	1
	Costos		

AVANCE RISCO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MIB	CANTIDAD EQUIVALENTE
Desempeño			
Compromiso			
No-Aud-Itapari			
Tarjetas			
Paseos			
Mantenimiento			
Otros			
Total	Evaluación Pro Difusa	08	6

AVANCE FINANCIERE

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS AJUSTES

[illegible]

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

[illegible]

Estos conceptos deben ser revisados a las referencias de la próxima edición de la obra.

SUBTECÓN EN OBRA.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA A 10% VALUADA (A)	1	1.208.858.364,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA A 10% VALUADA (B)	1	1.212.407.392,00
AVANCE DE OBRA (EN %) (B/A)		100,36%

EMPLIDOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRERA CALIFICADA:	5
MANO DE OBRERA NO CALIFICADA:	15
EMPLEOS INOCUOS GENERADOS:	60
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	80



GOBIERNO DE CALDAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENCIÓN PARA PÚBLICA
PERIODO MENSUAL, ESTADO GUERRA, DEL PROYECTO

CONDICIÓN	NO SE APLICA
POSICIÓN	1
ALGUNA	

FECHA: 10/04/2022
2022/04/04

REGISTRO FOTOGRAFICO



Estado de la estructura y acciones

Estado de la estructura y acciones

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (generalización en que se establece a través de los procedimientos de multa o sanción vigentes)

N/A

Por: 
Nombre: JUAN CARLOS SERRANO
Cargo: Director de Infraestructura
Módulo de Infraestructura: 17200000-0000
Código de Identificación: 17200000-0000
Código de Verificación: 17200000-0000

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente a lo largo de la red vial departamental se presenta una gran cantidad de sitios críticos que afectan la estabilidad de los taludes laterales, esto sumado a las características de uso del suelo, los regímenes de lluvias intensos, las propiedades poco cohesivas y los inadecuados manejos de las aguas superficiales, se traduce en la existencia de sitios puntuales en la red vial con las condiciones para que el evento erosivo que afecta la vía sea un proceso continuo y latente si no se realizan obras que permitan mejorar las condiciones previamente mencionadas. Estas situaciones también se presentan en la vía Las Margaritas-Cauyá, donde se han identificado 10 puntos críticos.

Lo descrito anteriormente ha sido causado por condiciones de inestabilidad geológica o geotécnica, inestabilidad de taludes y drenaje deficiente de escorrentía. Lo que consecuentemente ha provocado congestión en las vías por restricciones en la movilidad y aumento en los tiempos de viaje, traducido en un evidente nivel de riesgo en determinados sitios de la red vial departamental.

De acuerdo con las necesidades del Departamento, la Gobernación de Caldas viabilizó el proyecto BPIN 2024003170094 que tiene por objeto el Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el Municipio de Risaralda, Caldas.

Con el fin de ejecutar la obra, el Departamento publicó el proceso de Licitación Pública LP-SI-002-2025, el cual fue adjudicado a la persona jurídica ICSSA S.A.S. por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$1,385,369,883 COP).

De la misma manera se llevó a cabo el proceso de Concurso de méritos CM-SI-004-2025, el cual fue adjudicado a la persona natural, el ingeniero JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ, para ejercer la interventoría sobre el contrato de obra por un valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$ 165,091,311 COP).

Ambos contratos tuvieron orden de inicio del 1 de septiembre de 2025 y sobre los mismos se realizaron dos (2) modificatorios tanto de prórroga como de adición, resultando como fecha de terminación para ambos, el 30 de abril de 2026. Por otra parte, con las adiciones el valor final para el contrato de obra ascendió a la suma de \$ 1,477,711,648 y de \$263,964,627 para la Interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN


El departamento de Caldas geográficamente limita al este con el departamento de Cundinamarca, al norte con el departamento de Antioquia, al oeste con el departamento de

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

Risaralda y al sur con los departamentos del Tolima y Risaralda. Se encuentra localizado entre las coordenadas 05°46'51" y los 04°48'20" de latitud norte y los 74°38'01" y 75°55'45" de longitud oeste, estando situado en la zona centro – occidente de la región andina.

El punto crítico se encuentra ubicado en el municipio de Risaralda, el cual se encuentra ubicado en el sur-occidente del departamento de Caldas. Junto con los municipios de Viterbo, Belalcázar, San José y Anserma, conforman el denominado Occidente Próspero o Bajo Occidente caldense, con una altitud de 1713 m.s.n.m. con una temperatura aproximada de 18 °C. Esta región se destaca por la producción de café y la mayoría de sus habitantes subsisten del cultivo, la venta y exportación de este producto, así como el plátano verde y el maíz de esta zona montañosa. Limita al norte con el municipio de Anserma, al oriente con los municipios de Palestina y Chinchiná, al sur con los municipios de Chinchiná, San José y Belalcázar y al occidente con los municipios de Viterbo y Anserma. Conocido también como la "colina del Viento" por su constante paso del viento entre sus calles empinadas, cuna de personalidades a nivel literario y artístico.

La vía donde se encuentra el punto crítico a mitigar es el corredor vial 50CL01 denominado según el inventario vial del Departamento Las Margaritas - Risaralda – Cauya, según la Resolución 5134 del 30 de noviembre de 2016 del Ministerio de Transporte.

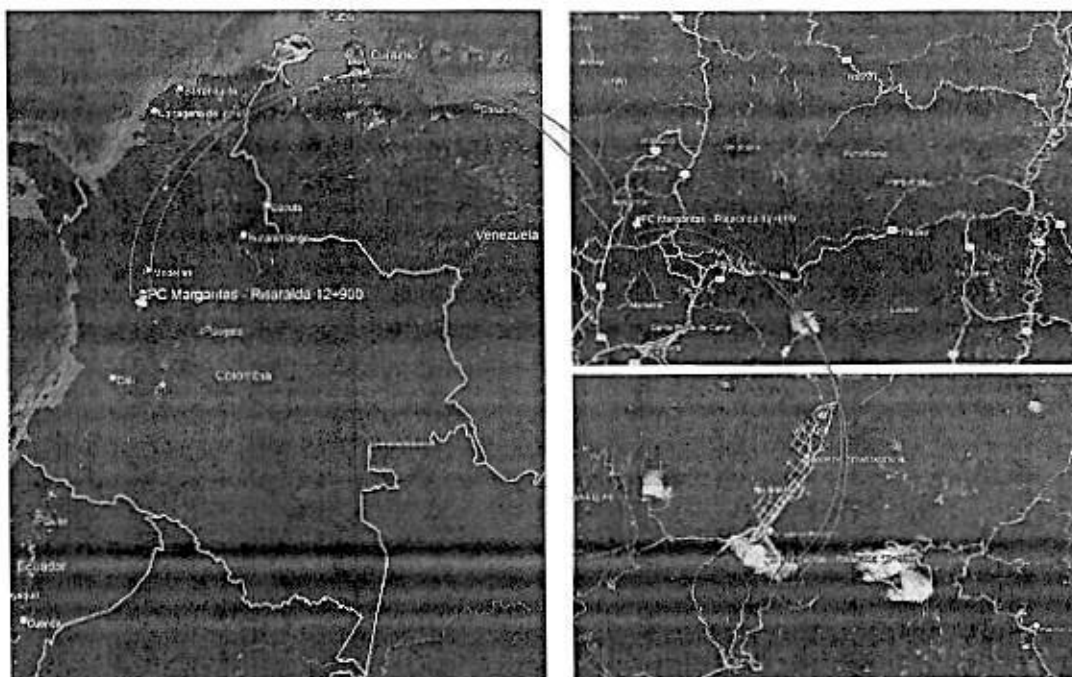

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto beneficia de manera directa los municipios de Risaralda, Anserma, San José y Viterbo, los cuales se encuentran en la zona del occidente prospero del Departamento, los

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

cuales se conectan a través de la red secundaria con el municipio de Risaralda y este a su vez con la capital del Departamento.

Según las estimaciones del Departamento el proyecto beneficia de manera directa según la siguiente relación:

Población Afectada: 11.333 personas, habitantes del Municipio de Risaralda.

Población Objetivo: 11.333 personas, habitantes del Municipio de Risaralda.

Caracterización de la Población:

Clasificación	Detalle	N° de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	2.211	Proyección 2024 derivada del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018
	15 a 19 años	758	
	20 a 59 años	6.139	
	Mayor de 60 años	2.225	
Género	Masculino	5.908	
	Femenino	5.425	

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El punto crítico en estudio corresponde a una cárcava que se ha venido desarrollando con el paso de los años, en un sector donde se realiza la entrega de aguas del descole de una obra hidráulica localizada en la vía departamental, entrega que se realiza de manera no controlada favoreciendo la profundización progresiva del fallo.

Las condiciones actuales de carencia de protección superficial para las capas de suelo y saprolito expuestas al intemperismo, contribuyen a que el sector se vea altamente afectado por la presencia de aguas tanto de escorrentía superficial (descole de la alcantarilla) como por el régimen de lluvias en la zona. Estas aguas no solo generan socavación de fondo, sino que también aumentan los niveles de saturación de los materiales, lo cual afecta las condiciones de estabilidad de la ladera en general.



MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

Desde el año 2023 se viene haciendo un monitoreo de las condiciones del sitio en donde se desarrolla la cárcava, evidenciando que, si bien a la fecha la vía no presenta afectaciones que se reflejen en el estado de la carpeta asfáltica, se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad; pues se encuentra desconfiada lateralmente y con algunos sectores aledaños a las cunetas con pérdida total de su material de apoyo.

La complejidad en este punto crítico es alta pues se tiene registro de un fuerte proceso de inestabilidad que se desarrolla unos metros más adelante en sentido Risaralda – Margaritas, el cual se manifiesta en un fuerte hundimiento y deformación de la banca vial. Este proceso de inestabilidad con características de reptamiento tiene un control estructural asociado a la Falla Sevilla, la cual fue identificada y descrita en los estudios y diseños con que cuenta la Secretaría de Infraestructura para este sector, especialmente los volúmenes II. Geología y III. Estudio geotécnico y análisis de estabilidad de taludes para los “Estudios y diseños para la estabilización de la banca carretable en la vía Las Margaritas – Risaralda – Cauyá (K13+000), Departamento de Caldas” (Secretaría de Infraestructura, diciembre de 2019).



Tal como se mencionó en el apartado de Alcance de este proyecto (numeral 1.3), el objeto de los presentes estudios y diseños será atender la problemática que se presenta en el descole de la alcantarilla, la zona donde se desarrolla la cárcava y la línea de drenaje que cruza el sector aproximadamente 250 m aguas abajo del descole, finalizando en una estructura de captación ubicada en el siguiente tramo vial. Se pretende entonces analizar las características de este cauce o canal natural, con el fin de proponer intervenciones que permitan mejorar la estabilidad del talud inferior.



Se tiene evidencia que en el sector se generan deslizamientos influenciados por la diferencia en la permeabilidad de las unidades litológicas, ayudados por factores externos como son cultivos limpios, deficiente canalización de aguas lluvias, permeabilidad secundaria muy alta de los suelos (grietas) que favorecen la infiltración de aguas lluvias hasta los sustratos más impermeables produciendo saturación, aumento de la masa, disminución de la cohesión y posterior movimiento lento o brusco de toda la masa a favor de la pendiente.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto pretende atender un punto crítico que se encuentra allí mediante la estabilización del talud inferior de la banca mediante la ejecución de dos frentes de trabajo. El primero consiste en la construcción de un muro mecánicamente estabilizado que permita confinar la banca y la segunda consiste en la construcción de una serie de diques de gaviones en sacos de suelo – cemento. Finalmente, la construcción de obras hidráulicas para el manejo de aguas de escorrentía superficiales y subsuperficiales.

En cuanto a la obra de estabilidad se contempla un muro en suelo mecánicamente estabilizado con una altura de 13.4 metros, 13 metros de longitud y 13 metros de ancho.

En cuando a las obras para la restauración del cauce se propone la construcción de 5 diques en gaviones con saco de suelo – cemento de 7 metros de altura y una base de 4 metros, con un vertedero de 2 metros de ancho y un ancho total de las estructuras acopladas a la topografía del cauce.

Para todos los diques, en la parte inferior del vertedero, se propone la construcción de un enrocado de fondo con la finalidad de evitar procesos de socavación y lograr una mejor adherencia al fondo del cauce, así como la necesidad de un recubrimiento en concreto para el cuerpo del dique que permita protegerlo frente a la acción del agua y el intemperismo.

El cuerpo de los diques deberá contener tuberías de PVC a manera de lloraderos o mechinales para aliviar las presiones intersticiales.

Se propone la construcción de aproximadamente 6 a 8 drenes subhorizontales en zonas aledañas al muro mecánicamente estabilizado (aguas abajo del canal escalonado), para garantizar la disminución de presiones intersticiales al interior de las masas de suelo, especialmente los depósitos coluviales, de cenizas volcánicas y suelos residuales de basaltos.

En cuanto a las obras hidráulicas se plantea la construcción de una alcantarilla de 36" en la abscisa K12+900.

Para el drenaje superficial se construirán 400 metros de cuneta y para el manejo del subdrenaje se contemplan 400 metros de filtro francés con geotextil (norma INVIAS 673).

Obras Hidráulicas


La estructura hidráulica definida para la captación, transporte y disposición de las aguas de escorrentía superficial provenientes del tramo vial, involucrados en los estudios y diseños plantea la construcción de una alcantarilla de 36" en la abscisa K12+900.

Los filtros de subdrenaje y cuneta serán implantados en el costado de la vía contiguo a la ladera o talud de corte. Su descole se efectuará en la poceta de la alcantarilla propuesta. A continuación, el resumen de las obras con su localización, tipo de obra, dimensiones y longitud.

CUNETA										
Abscisas	Sentido Agua	Obra	Distancia entre cunetas	Ti	Td	Área vía m ²	Escorrentía Vía [m ³ /s]	Pendiente del tramo	Caudal m ³ /s	Chequeo
0+000										
0+400	Mayores		400	400	0	1200	0.0238	9.87%	0.4695	0.446 5.08%

Obras transversales proyectadas

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS Volumen: Hidráulica

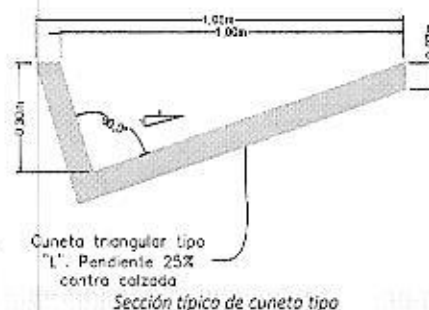


Por su parte también se establece la necesidad de la instalación de filtros tipo francés para garantizar el drenaje de la escorrentía sub superficial. Se proponen 400 m de filtro en el costado izquierdo de la vía (lado opuesto a muro de contención).

Localización del filtro

CHEQUEO DE FILTROS									
ID Obra	Tramo	Long.	Q Infiltración	Alto Filtro	Q Exfiltración	D tubería	Q Exfiltración	Q Total	Che q.
	Km	m	m ³ /s	m	m ³ /s	m	m ³ /s	m ³ /s	
1	0+000- 0+400	400	0.0051	1	0.0182	0.1	0.016	0.034 4	OK

Filtros

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS Volumen: Hidráulica

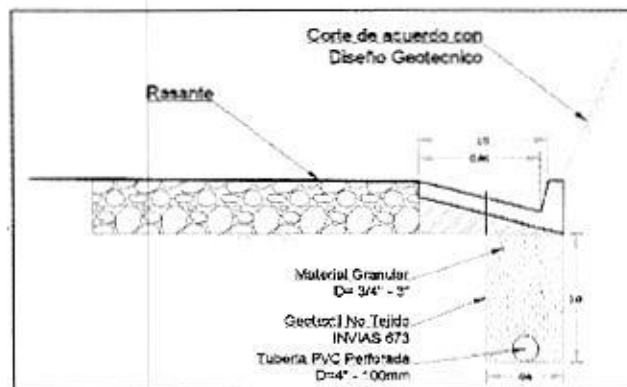


Corte de detalle filtro

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS, Volumen: Hidráulica

Diseño De Obras De Estabilidad

El planteamiento general para la recuperación de la cárcava producto de la inadecuada entrega de la alcantarilla, así como las obras para procurar una estabilidad de la línea de drenaje presente en la zona, consiste en la ejecución de dos frentes: el primero, la construcción de un muro mecánicamente estabilizado con vertedero integrado que permita confinar la banca de la vía y captar las aguas provenientes de la alcantarilla entregándolas de manera disipada al drenaje. La segunda fase consiste en la construcción de una serie de diques de gaviones en sacos de suelo – cemento, con la finalidad de controlar la corriente, dirigiéndola por el centro del lecho del cauce y retirándola de las márgenes.

A continuación, se presenta el detalle del muro requerido para la ejecución del proyecto

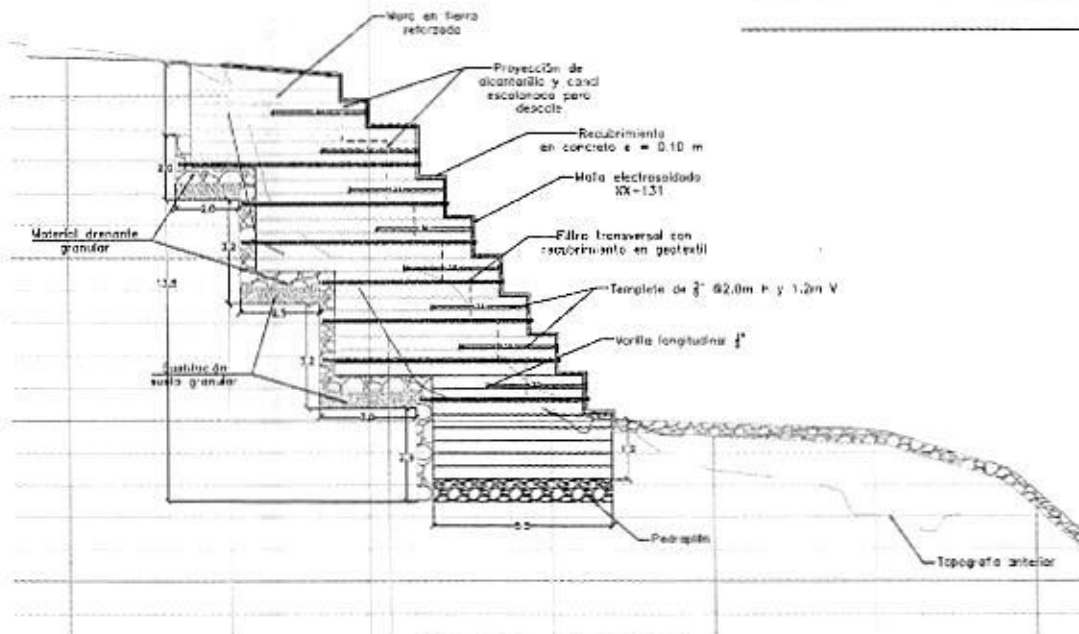


Muro mecánicamente estabilizado
Fuente: MEMORANDO TÉCNICO No. 2 – 14 de octubre de 2025

Como parte integral de la solución para la problemática a atender en este sitio crítico, se propone la construcción de una serie de diques en gaviones, los cuales corresponden a estructuras transversales a la dirección del flujo del agua en el drenaje, cumpliendo con los siguientes objetivos (Obras de corrección de cauces torrenciales, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España):


- ✓ Establecimiento de un punto fijo en el lecho del cauce, controlando su descenso progresivo.
- ✓ Mientras el vaso de embalse que originan los diques se encuentra sin aterrar, el efecto de presa hace que las aguas embalsadas frenen la velocidad de llegada de los sedimentos, se depositen los más gruesos y disminuya en su caudal de vertido la proporción sólida.
- ✓ Los depósitos que se producen van formando un aterramiento que eleva el cauce hasta alcanzar la pendiente de compensación (pendiente de equilibrio entre la tensión tractiva del agua y la tensión límite de arrastre de los materiales), menor que la del cauce natural.
- ✓ La elevación del cauce, en el entorno que comprende el aterramiento, da lugar a que el nuevo lecho, elevado y asentado sobre los acarrees retenidos, tenga secciones de mayor anchura, que posibilitan la circulación de caudales por perfiles de amplia base, con disminución del radio hidráulico, igual sensiblemente al calado de las aguas.
- ✓ La cuña de aterramiento adosada a la obra ejerce sobre los taludes o laderas que conforman los márgenes del torrente una función consolidadora, ya sea porque tal cuña sirve de apoyo fijo, no erosionable por debajo del plano del aterramiento estabilizado, ya porque el derribo propio de aquellas laderas irá paralizándose al pie de las mismas, remontándose sobre ellas hasta alcanzar el nuevo plano del terraplén natural de

equilibrio, con lo que se habrá sensiblemente anulado, en el intervalo de influencia, la aportación lateral más directa de sólidos al cauce. Se propone entonces la construcción de 5 diques en gaviones con 7 m de altura, base de 4 m, con un vertedero de 2 m de ancho y un ancho total de las estructuras acopladas a la topografía del cauce. Las figuras a continuación muestran de manera esquemática las dimensiones y características de los diques propuestos.

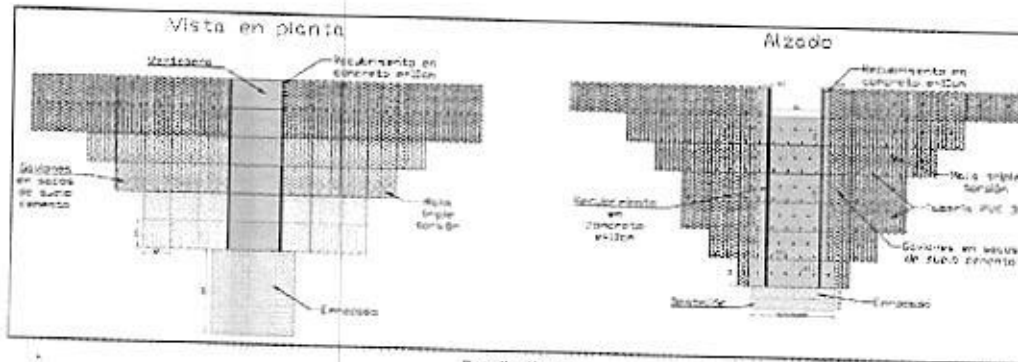

Detalle diques

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS volumen "Geotecnia"

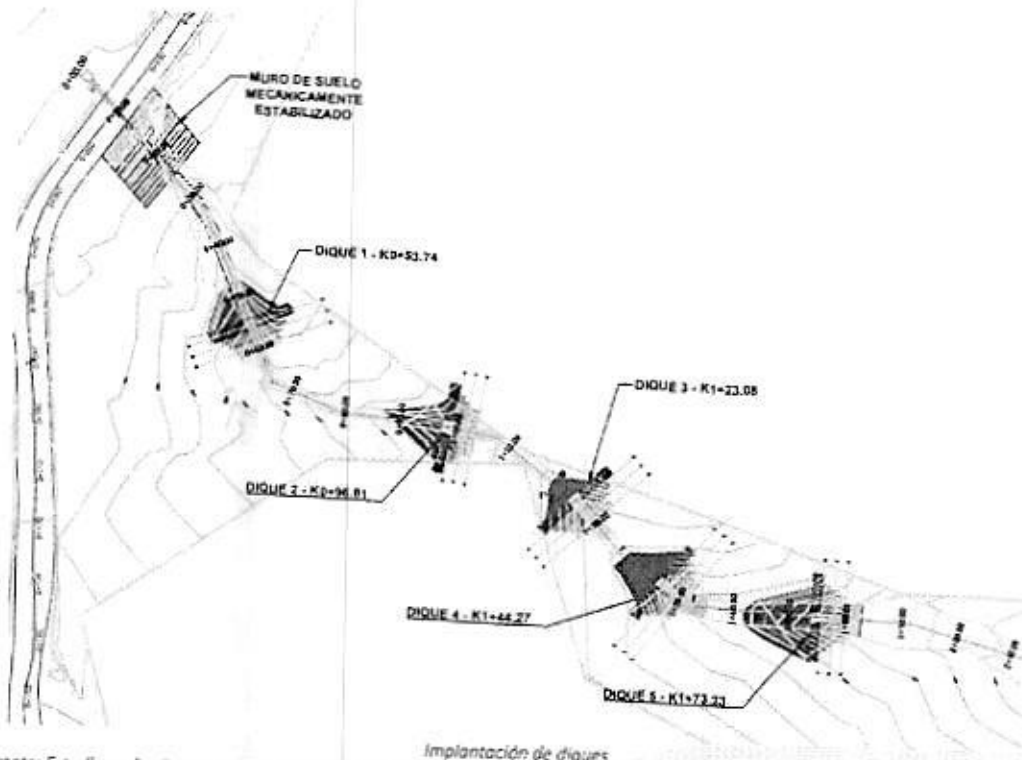

Implantación de diques

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS volumen "Geotecnia"

Se propone la construcción de aproximadamente 6 a 8 drenes subhorizontales en zonas aledañas al muro mecánicamente estabilizado (aguas abajo del canal escalonado), para garantizar la disminución de presiones intersticiales al interior de las masas de suelo, especialmente los depósitos coluviales, de cenizas volcánicas y suelos residuales de basaltos.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

La ubicación de los drenes debe hacerse en una cota de tal forma que la cabeza de agua sea suficiente y que esté preferiblemente por debajo del nivel freático para abatirlo como mínimo en las capas más superficiales. La pendiente de los drenes horizontales debe estar entre los 5 y 10°. Se considera apropiado realizar una inspección posterior a la construcción del muro mecánicamente estabilizado para detectar aquellos puntos de afloramiento de aguas cerca de los cuales estos drenes podrán ir localizados.

Se recomienda igualmente, durante las primeras semanas de funcionamiento de los drenes, realizar aforos de caudal que permitan definir si es necesario construir algunos drenes más en ciertas zonas donde los caudales sean persistentemente altos.

MANEJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS:


Drenes subhorizontales dispuestos en abanico:

- Número de líneas: 2 en talud superior y 3 en talud inferior
- Longitud mínima: 40 metros.
- Diámetro mínimo: 100 milímetros.
- Con tela, perforados.
- Inclinação de -10° con respecto a la horizontal.

DETALLE DREN HORIZONTAL



LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS EN LA TUBERÍA PVC



Detalle Dren Horizontal

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS volumen "Geotecnia"

Diseño De Estructuras

El diseño ejecutado tiene como objeto plantear obras hidráulicas para la vía que se pretende construir estableciendo la geometría y el acero de refuerzo necesario para la construcción de este.

Se ha realizado un análisis, teniendo en cuenta las diferentes solicitaciones definidas en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes del año 2014 a través de las diferentes etapas constructivas que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto. Con las características del terreno se han definido los empujes horizontales y verticales, el empuje originado por las fuerzas sísmicas y por la sobrecarga vehicular y del suelo; adicionalmente se ha tenido en cuenta el peso propio de los elementos y una consideración sísmica adicional originada por los efectos inerciales en la modelación de la estructura.

En los diseños se ha considerado que el material de lleno se encuentra drenado y que no se transmiten empujes hidrostáticos en el muro, por lo que se deberá garantizar en todo momento el drenaje de este utilizando las recomendaciones de drenaje y evacuación de aguas consignadas en los planos para construcción. Con el fin de minimizar la presión del suelo ejercida en el muro por el relleno compactado, deberán usarse pequeños rodillos o compactadores de mano para la compactación del lleno en una franja con ancho mínimo igual a la mitad de la altura del muro, medida desde la cara posterior.

En la siguiente tabla se presentan los parámetros de diseño:

PARÁMETROS DE DISEÑO				
Estrato	Descripción	γ_n (KN/m ³)	ϕ' (°)	C' (KPa)
1	Suelo de terreno	18	25	10

Flujos de lodo	
Empuje activo (Coulomb)	
$K_a = \frac{\sin^2(\beta + \delta)}{\sin^2 \beta \sin(\beta - \delta) \left[1 + \frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \alpha)}{\sin(\beta - \delta) \sin(\alpha + \beta)} \right]}$	= 0.4
Empuje sísmico (Mononobe-Okabe)	
$K_{ae} = \frac{\sin^2(\phi + \beta - \theta)}{\cos \theta \sin^2 \beta \sin(\beta - \theta - \delta) \left[1 + \frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \theta - \alpha)}{\sin(\beta - \delta) \sin(\alpha + \beta)} \right]}$	= 0.6
Empuje pasivo	
$K_p = 1 - \sin(\phi) = 3.8$	

Parámetros de diseño

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS volumen "Estructuras"

Material del lleno

- ✓ De acuerdo con el diseño geotécnico suministrado, el material utilizado para la conformación del lleno deberá tener un ángulo de fricción no menor a 25°, un peso unitario no mayor de 18 KN/m³
- ✓ La totalidad de los terrenos donde se apoyará el muro propuesto deberá estar desmontada y limpia antes de la ejecución de este sin ningún rastro de material orgánico o vegetal.
- ✓ El material de lleno debe disponerse en capas paralelas de un espesor máximo igual a 30cm.
- ✓ El material por utilizar en la conformación del lleno propuesto deberá cumplir con lo expuesto por el Instituto Nacional de Vías en el artículo 220-13 para núcleo de terraplén resumido en el cuadro a continuación:


CARACTERÍSTICA	NORMA DE ENSAYO INV	SUELOS SELECCIONADOS	SUELOS ADECUADOS	SUELOS TOLERABLES
Partes del terraplén a las que se aplican		Todas	Todas	Cimiento y Núcleo
Tamaño máximo, mm	E-123	75	100	150
Porcentaje que pasa el tamiz de 2 mm (No. 10) en masa, máximo	E-123	90	80	-
Porcentaje que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) en masa, máximo	E-123	25	35	35
Contenido de materia orgánica, máximo (%)	E-121	0	1.0	1.0
Límite líquido, máximo (%)	E-125	30	40	40
Índice de plasticidad, máximo (%)	E-126	10	15	-
CBR de laboratorio, mínimo (%) (Nota 1)	E-148	10	5	3
Expansión en prueba CBR, máximo (%)	E-148	0.0	2.0	2.0
Índice de colapso, máximo (%) (Nota 2)	E-157	2.0	2.0	2.0
Contenido de sales Solubles, máximo (%)	E-158	0.2	0.2	-

Artículos de cumplimiento

Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS volumen "Estructuras"

- ✓ La zona de lleno que servirá como subrasante para la estructura vial deberá ser caracterizado como material apto para corona acorde a la especificación INV-220-13, con propiedades mínimas como las descritas en el cuadro anterior.
- ✓ En caso de cimentar el muro sobre suelos inadecuados, éstos deberán ser removidos y sustituidos por un material que cumpla las características para la base. Si este proceso es impráctico, deberá considerarse el mejoramiento de suelo de subrasante por medio de tratamiento con agentes externos o la consolidación del terreno de ser posible.
- ✓ Las capas de construcción deberán ser paralelas y su espesor no deberá ser superior a 0.30m, además cada capa deberá ser debidamente apisonada hasta alcanzar el grado de compactación deseada según la humedad óptima.
- ✓ Para la compactación del lleno en una franja con ancho mínimo igual a la mitad de la altura del muro, medida desde la cara posterior, deberán usarse pequeños rodillos o compactadores de mano con el fin de minimizar la presión del suelo ejercida en el muro por el relleno compactado.
- ✓ Durante la construcción del lleno se deberá garantizar lo propuesto por el Instituto Nacional de Vías en el Artículo 220-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras.

En el siguiente esquema se presenta el detalle de la poceta:

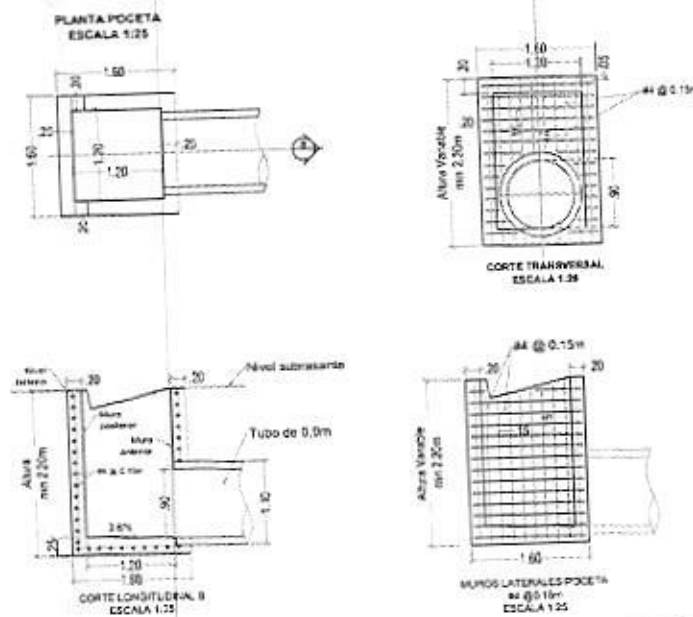

Detalle Poceta Fuente: Estudios y diseños para MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS volumen "Estructuras"

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA


3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ID	CO1.PCCNTR.7910456 /
Contratista:	ICSSA SAS
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS
Alcance:	<p>El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No.LP-SI-002- 2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.</p> <p>El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.</p> <p>El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsible identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.</p>
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7910456
Valor Inicial:	\$ 1,385,369,883

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS



total 5,442 estopas que representan aproximadamente 272,1 m³ de material, para la construcción de 109 cuerpos de gavión aproximadamente. Para el dique 3 a la fecha se han utilizado 2,311 estopas, que representan un volumen de 115.6 m³ de material. Se espera que se inicien las actividades de recubrimiento en concreto conforme al diseño.

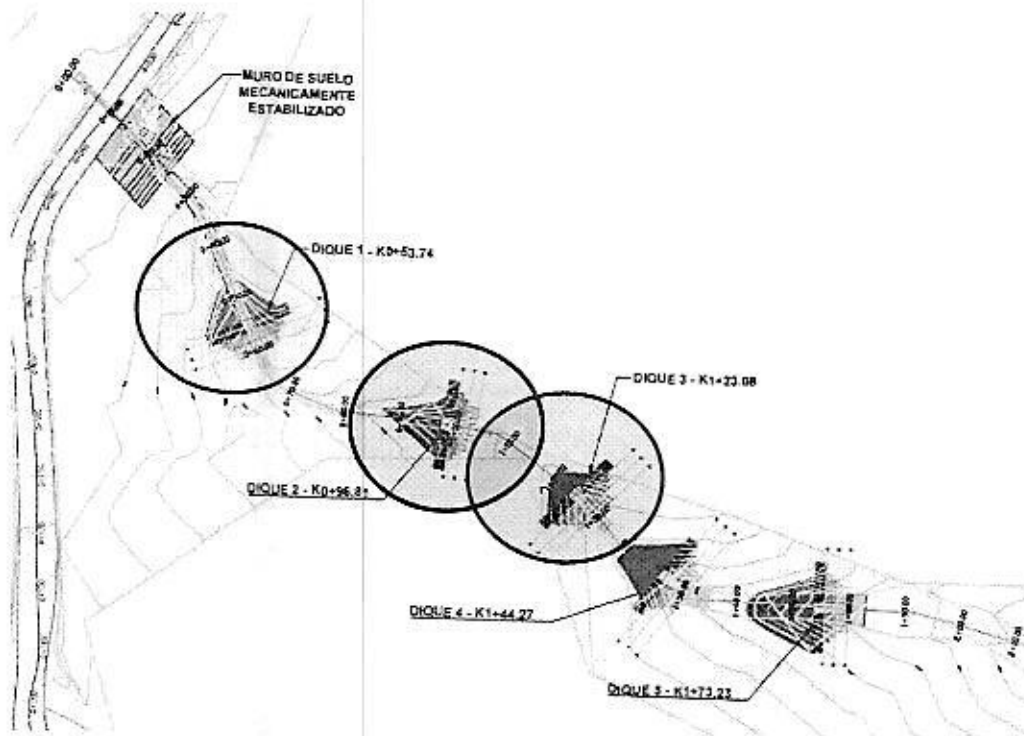



Por otra parte se concluyó la actividad de recubrimiento en concreto del canal del muro mecánicamente estabilizado y se inician las actividades del canal de descole en piedra pegada que concluye hasta el dique No. 1.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el mes de noviembre se fijaron los siguientes APU no previstos y hasta la fecha no ha existido necesidad de crear nuevos ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
NP-01	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO II (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo II (altura entre 10,1 a 20m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, cargue y transporte)	Und	\$ 423,758
NP-02	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO III (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo III (altura entre 5 a 10m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, cargue y transporte)	Und	\$ 307,852
NP-03	PERFILADO MANUAL PARA TALUD CON ALTURA HASTA 12m	M3	\$ 128,517
NP-04	HORA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJADA, STAND BY 5 HORAS DIA	HORA	\$ 208,836

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
NP-05	TRASPLANTE DE ARBOLES TIPO IV TRASLADO LARGO (Análisis aplicado para el trasplante en sitio o reubicación inmediata dentro del mismo predio o área de obra entre 15,1m a 100,0m para un Árbol (Altura <5m, Diam. < 2m), Extracción del cepellón, preservando raíces estructurales. Izaje, excavación manual (ahoyado) en el nuevo sitio de plantación, Preparación del nuevo hueco con tierra abonada y Tutoraje, transporte y disposición final de material sobrante)	Und	\$ 497,298
NP-06	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARRUCHA	M3	\$ 335,158
NP-07	SOBRE ACARREO DE MATERIAL	M3	\$ 43,157

Durante el mes de marzo se dejó estructurada para trámite el acta No.2 del contrato de obra por valor de \$530,212,409 en la cual se ejecutaron los ítems no previstos de acuerdo con la siguiente relación:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-01	TALA DE ARBOLES 0-10 m	Und	-	\$ 423,758.00	\$ -
NP-02	TALA DE ARBOLES 10-20 m	Und	-	307,852.00	\$ -
NP-03	PERFILADO MANUAL PARA TALUD CON ALTURA HASTA 12m	M3	152.20	128,517.00	\$19,560,287
NP-04	HORA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJADA STAND BY 5 HORAS DIA	HORA	-	208,836.00	\$ -
NP-05	TRASPLANTE DE ARBOLES TIPO IV TRASLADO LARGO	M3	-	497,298.00	\$ -
NP-06	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARRUCHA	M3	333.50	335,158.00	\$111,775,193
NP-07	SOBRE ACARREO DE MATERIAL	M3	558.42	43,157.00	\$24,099,905
VALOR TOTAL					\$ 155,435,385.00

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Con corte al 19 de marzo de 2026 (informe semanal 30) el contrato tenía una programación de obra según la siguiente relación:

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	4.31%	81.79%
Valor	\$ 63,707,621.00	\$ 1,208,658,384.00

Contra una ejecución de acuerdo con la siguiente tabla:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	4.32%	82.11%
Valor	\$ 63,824,501.00	\$ 1,213,407,392.00

Porcentaje de Avance / Atraso	0.32%	\$ 4,749,008.00
-------------------------------	-------	-----------------

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ID	CO1.PCCNTR.7962383 /	
Interventor	JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-002-2025, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS	
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=C.O1.PCCNTR.7962383	
Valor Inicial:	\$ 165,091,311	
Anticipo o valor anticipado:	\$ 0	
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses	
Acta de Iniciación:	1 de septiembre de 2025	
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025	
Modificaciones	Modificadorio No. 1:	Prorroga tres (3) meses, contados a partir de 1 de enero de 2026 a 31 de marzo de 2026
	Modificadorio No. 2:	Prorroga No. 2 por un (1) mes, contados desde el 1 de abril al 30 de abril de 2026 Adición No. 1 por NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$98.873.316)
Valor final:	\$ 263,964,627	
Nueva Fecha de Terminación:	30 de abril de 2026	

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Control y seguimiento de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

Se remitieron periódicamente todos los informes que hacen parte de las obligaciones contractuales de la Interventoría, en cuanto informes mensuales, informes semanales y actas de Comité de Obra que se celebraron en el transcurso del mes

Control permanente a la ejecución de las obras mediante la programación elaborada por el constructor.

Verificación del cumplimiento por parte del contratista de obra de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

Seguimiento y acompañamiento al cumplimiento de las obligaciones de carácter Social y SST por parte del constructor del proyecto.

Relación diaria de los empleados y maquinaria del contratista de obra, indicando, para el caso de los trabajadores, el cargo, el frente de trabajo, la actividad. Para el caso de la maquinaria, el tipo de maquinaria, el frente de trabajo en donde estuvo y las horas de actividad o de inactividad, de cada uno de los equipos.

4.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

No aplica hasta la fecha

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El contrato tuvo orden de inicio del 1 de septiembre y su plazo de ejecución se extiende hasta el 30 de abril de 2026, después de la suscripción del Modificadorio No. 2 de ambos contratos.
2. Se suscribe el modificadorio No. 2 para ambos contratos, que tiene por finalidad prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026 y adiciona el contrato de obra en NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$92.341.765) y el contrato de Interventoría en NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$98.873.316)
3. Con corte a marzo el contrato tiene una programación, posterior a la reprogramación de las obras, del 81.79% que representan \$ 1,208,658,384.00 contra una ejecución del 82.1% que representa \$ 1,213,407,392.00 lo que significa que se encuentra adelantado un 0.32% que representa un valor de \$ 4,749,008.00.
4. Realizado el balance financiero del contrato, y con base en las condiciones encontradas en campo y los eventos identificados en las actividades, se toman las siguientes determinaciones:
 - a. Construir únicamente 3 de los 5 diques presupuestados, con el fin de no intervenir el área del nacimiento de agua que es fuente de captación por parte de un acueducto veredal, teniendo además en cuenta que en dicha zona la topografía ya es menos pendiente y no se evidencian rastros del movimiento en maza
 - b. No reemplazar la tubería existente, ya que es una tubería en concreto de 36" que después de una inspección minuciosa se determinó que se encuentra en buen estado.
 - c. De lo anterior se desprende que no habría necesidad de intervenir el pavimento sobre la vía ni las capas subyacentes.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12-900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS


5. Haciendo un análisis de lo que va transcurrido del año se tiene la siguiente estadística:

Seco		16
Llovizna	< 1 mm/h.	7
Lluvia débil	Entre 1 y 2 mm/h.	7
Lluvia moderada	Entre 2 y 15 mm/h.	19
Lluvia fuerte	Entre 15 y 30 mm/h.	6
Lluvia muy fuerte	Entre 30 y 60 mm/h.	4
Lluvia torrencial	Más de 60 mm/h.	3

Se concluye que, de 62 días transcurridos, en 42 se han presentado lluvias (67,74% de lo corrido del 2026), de los cuales 32 días han sido lluvias de magnitud importante (51,61% de los días transcurridos en el presente año). En concordancia con lo anterior, el contratista de obra solicita una prórroga en la ejecución del contrato equivalente a un (1) mes, avalado por la interventoría y justificado en causas no imputables al constructor, comprendido entre el 1 y el 30 de abril, tiempo que representa 48,38% de los días transcurridos en el 2026.

ANEXOS 1

INFORMES SEMANALES

 JUAN DIEGO SERNA		ACTA INFORME SEMANAL		  	
CÓDIGO: 1410-F-07	VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	28/03/2014	PÁGINA: 1	
Semana Número: <u>27</u> De: <u>2-mar-2025</u> Al: <u>8-mar-2025</u> días <u>130</u> Tiempo para finalización del contrato: <u>21</u> días					
CONTRATO N° 21002025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SIMOCRÍTICO K12+000, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS					
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 8 de marzo de 2025			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 8 de marzo de 2025		
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	13.77%	71.18%	(%)	15.68%	77.31%
Valor	\$ 190,762,512.00	\$ 580,119,478.00	Valor	\$ 217,232,749.00	\$ 1,071,006,421.00
			Porcentaje de Avance / Atasco: 6.13% \$ 84,386,943.00		
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
Contratista: ICSSA S.A.S. Representante Legal: SANTIAGO ANDRÉS SANCHEZ MANTILLA Contrato No: 21062025-1151 Valor inicial Estudios y Diseños: \$ - Valor de Obras: \$ 1,342,832,981 Adición N°1: \$ - Valor PGIO: \$ 29,453,362 Valor PVT: \$ 13,063,400 Valor Total Actualizado: \$ 1,385,349,803 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 7 MESES Fecha de Iniciación: 01/09/2025 Fecha de suspensión No. 1: 14 Avance Contractual Fecha de reinicio: 89.10 Fecha de suspensión No. 2: Fecha de reinicio: Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025 Fecha de Terminación (final): 31/03/2026 10.00			Interventor: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ Representante Legal: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ Contrato No: 21002025-1152 Valor Total Inicial: (Con IVA) \$ 165,001,311.00 Valor Anticipo: \$ - Adición N°1: \$ - Adición N°3: \$ - Adición N°4: \$ - Valor Total Actualizado: \$ 165,001,311.00 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 7 MESES Fecha de Iniciación: 01/09/2025 Fecha de suspensión No. 1: Fecha de reinicio: Fecha de suspensión No. 2: Fecha de reinicio: Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025 Fecha de Terminación (actualizada): 31/03/2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
En la semana del 2 al 8 de marzo de 2025 se realizaron las siguientes actividades: Se concluye la construcción del séptimo escalón e inician actividades para la construcción del octavo y último escalón. En este aspecto, teniendo en cuenta que se tienen aproximadamente 1.2 m para llegar al nivel de A.C. se plantea la construcción de tres capas de este último escalón del tipo mecánicamente estabilizado. Se construye el filtro perimetral a lo largo del muro mecánicamente estabilizado. Se continúa con la construcción del dique dos, alcanzando 95 cuerpos de pavón con un promedio de 50 sacos por pavón. De igual manera se inician actividades sobre el Dique 3, con la excavación para el empalme y el transporte del material al sitio de construcción. En el Dique No. 3 ya se tienen aproximadamente 23 cuerpos construidos. Se empieza la construcción del recubrimiento en concreto del canal sobre el muro estabilizado mecánicamente.					
ACTIVIDADES PARA LA PRÓXIMA SEMANA					
Se debe concluir con la construcción del octavo escalón del muro y continuar con las actividades del recubrimiento del canal del muro. Se debe iniciar las actividades de recubrimiento del primer dique concreto. Se deben continuar actividades de construcción del dique 3.					
OBSERVACIONES			INTERVENTORÍA		
			 Javier Mauricio Vanegas Vanegas RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		

OBJETO CONTRATO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-31402-2012, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITO CRÍTICO K12+600 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 27 Del: 2-mar-2014 Al: 8-mar-2014
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 188 Días
Contratista de Interventoría: JUAN DIEGO SERNA WARGLEZ
Representante legal: JUAN DIEGO SERNA WARGLEZ
Contrato No: 21022009-1152
Valor inicial del contrato: \$ 155,001,311
Duración del contrato: 4 MESES De: 1-ago-2013 Hasta: 31-dic-2013 Fecha terminación: 31/03/2014
Prorroga No. 1: 3 MESES Prorroga No. 2: Adición 03: \$ Adición 04: \$
Adición 01: \$ Adición 02: \$
Valor actualizado del contrato: \$ 167,201,311
Coordinador de Zona: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENZUELA

RESUMEN ACUMULADO DEL CONTRATO

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Inversión programada (%)	4.03%	128.43%
Inversión del contrato:	\$ 8,746,873	\$ 211,373,678
Financiero	\$ 4,703,932	\$ 140,557,560
Pólizas de aseguración	\$ 153,064	\$ 23,500,217
Gastos Fijos	\$ 543,288	\$ 12,770,304
Gastos Swatchkates	\$ 735,579	\$ 22,046,133
Valor del contrato	\$ 168,091,311.00	

PERSONAL DE INTERVENTORIA

	RELACION SEMANAL DE PERSONAL							DEDICACIÓN
	L	M	M	J	V	S	D	
Ing. Director de Interventoría	X	X	X	X	X	X		30%
Ing. Presidente de Interventoría	X	X	X	X	X	X		30%
Ing. Especialista en Geotecnia								5%
Ing. Especialista en Estructuras								5%
Ing. Auditor de Interventoría								5%
Profesora Ambiental								5%
Profesora Social - SST	X	X	X	X	X	X		100%
Secretaría								5%
Topógrafo - receptor	X	X	X	X	X	X		100%
Cadeneta 1								5%
Cadeneta 2								5%

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-31402-2012, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITO CRÍTICO K12+600, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Recorrido de obra

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inspección general de obra

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

JDS		ACTA INFORME SEMANAL		CAGAS		SEMANA 27	
CÓDIGO: 14184-01		VERSIÓN: 01		PÁGINA:			
SEMANA 27							
CANTIDADES DE OBRA - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA							
Item	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD TOTAL DE OBRA PROYECTADA	CANTIDAD DE OBRA ACUMULADA HASTA LA SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA EN LA PRESENTE SEMANA	CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA	
I.- Realizar actividades preliminares							
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12.00	13.00	-	10.00	
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2	8.00	-	-	-	
1.03	DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS	m	10.00	-	-	-	
1.04	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO	m	12.00	-	-	-	
II.- Tratar el pavimento							
2.05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	1.00	-	-	-	
2.06	RIEGO DE MINIMIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-17	m2	8.00	-	-	-	
2.07	BASE GRANULAR CLASE C	m3	1.00	-	-	-	
2.08	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	2.00	-	-	-	
III.- Construir infraestructura de drenaje							
3.09	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	38.00	47.50	-	47.50	
3.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	9.00	-	-	-	
3.11	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	19.00	-	-	-	
3.12	CONCRETO RESISTENTE A 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	10.00	-	-	-	
3.13	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4200 \text{ Mpa}$	kg	518.00	-	-	-	
3.14	AFRIMADO	m3	3.00	-	-	-	
3.15	TUBERÍA DE PLÁSTICO TPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	m	14.00	6.50	-	6.50	
3.16	GEOTEXTIL TPO N° 2390 O SIMILAR	m2	70.00	-	-	-	
3.17	MATERIAL GRANULAR DREANTE	m3	12.00	-	-	-	
3.18	TUBERÍA DE PVC 4" PARA F.LTRCO	m	20.00	20.00	-	20.00	
IV.- Construir obras de estabilización							
4.19	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	180.00	-	-	-	
4.20	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m3	838.00	663.40	-	663.40	
4.21	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	214.00	-	-	-	
4.22	CONCRETO RESISTENTE A 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	124.00	12.47	-	12.47	
4.23	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4200 \text{ Mpa}$	kg	255.00	-	-	-	
4.24	MALLA DE REFUERZO $f_y = 420 \text{ Kpa}$	kg	977.00	203.83	-	203.83	
4.25	MATERIAL GRANULAR DREANTE	m3	185.00	235.80	-	338.80	
4.26	AFRIMADO	m3	94.00	1.360.00	-	1.360.00	
4.27	GEOTEXTIL TPO N° 1600 O SIMILAR	m2	759.00	745.70	-	745.70	
4.28	GEOTEXTIL DE REFUERZO TPO 7240 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS	m2	683.00	652.90	-	652.90	
4.29	GEOTEXTIL DE REFUERZO TPO 78502HF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS	m2	2,237.00	1,957.20	-	1,957.20	
4.30	GEOTEXTIL DE REFUERZO TPO H-1600 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS	m2	1,281.00	2,030.20	-	2,030.20	
4.31	RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS	m3	1,301.00	-	-	-	
4.32	FILTRO TRANSVERSAL PARA CUERPO DE MORTUICIA CON GEOTEXTIL ESTABILIZADO, INCLUYE MATERIAL DREANTE Y RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL N° 1600 O SIMILAR	m	474.00	474.00	-	474.00	
4.33	LACRMALES Y/O LLOCRADEROS DE DIÁMETRO 3" EN PVC	m	2,822.00	-	-	-	
4.34	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	629.00	-	-	-	
4.35	CAVIONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMACIÓN DE INQUE RELACIÓN SCS 1	m3	874.00	558.60	-	558.60	
4.36	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	180.00	-	-	-	
4.37	DISPARADORES DE BOMBEO Y COMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO DE 21MPa	m3	43.00	-	-	-	
V.- Construir señalización y seguridad vial							
5.34	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA EN FRÍO	m	300.00	-	-	-	
5.35	TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	und	39.00	-	-	-	
5.40	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TPO BR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TPO IV	und	4.00	-	-	-	
VI.- NPS CONSIDERADOS							
NP-01	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO I (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo I (altura entre 10.1 a 20m), incluyendo corte de ramas secas, enfermeras, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, carga y transporte)	und	-	4.00	-	4.00	
NP-02	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO II (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo II (altura entre 5 a 10m), incluyendo corte de ramas secas, enfermeras, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, carga y transporte)	und	-	-	-	-	
NP-03	PERFILADO MANUAL PARA TALUD CON ALTURA HASTA 12m	m3	-	561.70	-	561.70	
NP-04	HORA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJADA, STAND BY 6 HORAS DIA	hr	-	-	-	-	
NP-06	TRASPLANTE DE ARBOLES TIPO Y TRASLADO LARGO (Análisis aplicado para el trasplante en sitio o trasplante en el mismo predio o área de obra entre 10.1m a 100.0m para un árbol (altura 40m, D.am. < 2m), extracción del cepellón, preparación raíces estructurales, carga, extracción manual (aboyado) en el nuevo sitio de plantación, preparación del nuevo hueco con tierra abonada y fertilizante, transporte y descarga en final de material sobrante)	m3	-	-	-	-	
NP-08	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN CARROCHA	m3	-	333.30	-	333.30	
NP-07	SOBRECARREO DE MATERIAL	m3	-	1,328.30	-	1,328.30	
EXCERPTO ACTA DE OBRA							

 JDS JUAN PABLO JORDAN CODIGO: 1410-F-01	ACTA INFORME SEMANAL			 CALDAS
VERSION: 01	FECHA DE VERSION:	28.03.2014	PAGINA:	
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORA				
Semana Número: <u>27</u> Del: <u>2-mar-2014</u> Al: <u>8-mar-2014</u> Tiempo Intervenido desde la iniciación de: <u>155</u> días				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO N° 21162025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO R TIOO K12+800, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS				
				
FRENTE DE OBRA No. 1	FRENTE DE OBRA No. 1			
				
FRENTE DE OBRA No. 1	FRENTE DE OBRA No. 1			



JUAN DIEGO SERNA

ACTA INFORME SEMANAL



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

28/08/2014

PAGINA:

INFORME SEMANAL No 27

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de interventoría No. 03052022-0938 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE

INTERVENTOR:

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

CONTRATISTA:

ICSSA S.A.S

SUPERVISOR:

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME DE INTERVENTORIA

DATOS ESPECÍFICOS:

FECHA	CUBA	CONDICIÓN CLIMÁTICA	INICIO	FIN	PRECIPITACIÓN (mm)	OBSERVACIONES
2/03/2026	TEMPERADO	Llovizna			0.6	
3/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
4/03/2026	TEMPERADO	Lluvia moderada			3.3	
5/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
6/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
7/03/2026	TEMPERADO	Lluvia moderada			7	
8/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	

Condiciones Climáticas presentes en la zona:

Frio: Región que por su ubicación geográfica o tiempo presenta bajas temperaturas.

Templado: Región que por su ubicación geográfica se ve afectada por la instancia intermedia entre cálida y frío, efecto de las precipitaciones intermitentes e intensas propias de la zona.

ESTADO DEL TIEMPO

Tiempo soleado: Temperaturas media - baja.

Tiempo húmedo: Temperaturas bajas con presencia de lluvias leves.

Tiempo lluvioso: Periodos moderados o intensos de precipitación.

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

 <p>JUAN DIEGO SERNA</p>		<p>ACTA INFORME SEMANAL</p>		 																			
CÓDIGO: 1410-F-07	VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	28/09/2014	PAGINA: 1																			
<p>Semana Número: <u>28</u> Del <u>9 mar 2025</u> Al <u>15 mar 2025</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>195</u> días Tiempo para finalización de contrato: <u>65</u> días</p>																							
<p>CONTRATO N° 21062025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITOCRÍTICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS</p>																							
<p>INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 15 de marzo de 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMADO</th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(%)</td> <td>5.82%</td> <td>72.73%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$ 83,029,929.00</td> <td>\$ 1,074,772,597.00</td> </tr> </tbody> </table>			PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	(%)	5.82%	72.73%	Valor	\$ 83,029,929.00	\$ 1,074,772,597.00	<p>INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 15 de marzo de 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTADO</th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(%)</td> <td>0.83%</td> <td>73.30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$ 12,209,557.00</td> <td>\$ 1,043,215,978.00</td> </tr> </tbody> </table>			EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO	(%)	0.83%	73.30%	Valor	\$ 12,209,557.00	\$ 1,043,215,978.00
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO																					
(%)	5.82%	72.73%																					
Valor	\$ 83,029,929.00	\$ 1,074,772,597.00																					
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO																					
(%)	0.83%	73.30%																					
Valor	\$ 12,209,557.00	\$ 1,043,215,978.00																					
<p>Porcentaje de Avance / Atrazo</p>			<p>0.57% \$ 3,443,571.00</p>																				
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																				
<p>Contratista: ICCSA S.A.S. Representante Legal: SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA Contrato No: 21062025-1151 Valor Inicial Estudios y Diseños: \$ - Valor de Obras: \$ 1,342,700,925 Adición N°1: \$ 92,341,785 Valor PGIO: \$ 20,585,558 Valor PMT: \$ 13,083,400 Valor Total Actualizado: \$ 1,477,711,648</p>			<p>Interventor: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ Representante Legal: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ Contrato No: 21062025-1152 Valor Total Inicial: (Con IVA) \$ 185,061,311.00 Valor Antídoto: \$ - Adición N°1: \$ 98,879,316.00 Adición N°3: \$ - Adición N°4: \$ - Valor Total Actualizado: \$ 283,940,627.00</p>																				
<p>Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 8 MESES Fecha de iniciación: 01/09/2025 Fecha de suspensión No. 1: % Avance Contractual Fecha de reinicio: 80.91 Fecha de suspensión No. 2: Fecha de reinicio: Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025 % Para Finalizar Fecha de Terminación (final): 30/04/2026 13.09</p>			<p>Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 8 MESES Fecha de iniciación: 01/09/2025 Fecha de suspensión No. 1: Fecha de reinicio: Fecha de suspensión No. 2: Fecha de reinicio: Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025 Fecha de Terminación (actualizada): 30/04/2026</p>																				
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p>																							
<p>En la semana del 9 al 15 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se continuó con la construcción del octavo escalón del muro mecánicamente estabilizado que comprende de tres (3) cabos Se construye el filo perimetral a lo largo del muro mecánicamente estabilizado Se continúa con la construcción del dique dos y dique tres al mismo tiempo Se continúa la construcción del recubrimiento en concreto del canal sobre el muro estabilizado mecánicamente 																							
<p>ACTIVIDADES PARA LA PRÓXIMA SEMANA</p>																							
<p>Se debe concluir con la construcción del octavo escalón del muro y continuar con las actividades del recubrimiento de canal del muro</p> <p>Se debe iniciar las actividades de recubrimiento al primer dique construido</p> <p>Se deben continuar actividades de construcción del dique 3</p>																							
OBSERVACIONES			INTERVENTORIA																				
			<p><i>Humberto Viregas V.</i> Javier Mauricio Viregas Viregas RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p>																				

		ACTA INFORME SEMANAL																																																																																																																																														
Juan Diego Bernal CODIGO: 1419237		VERSION: 01	FECHA DE VERSION:	2019/07/04	PAGINA:																																																																																																																																											
OBJETO CONTRATO:		INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-0102-2019, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRTIC0 K12+993, EN EL MUNICIPIO DE RIOSALIDA, CALDAS																																																																																																																																														
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA																																																																																																																																																
Semana N.º: 26 Del 19-mar-2019 A 15-mar-2019																																																																																																																																																
Tiempo transcurrido desde la inscripción del contrato: 186 Días																																																																																																																																																
Contratista de Interventoría: JUAN DIEGO BERNAL MARQUEZ Representante legal: JUAN DIEGO BERNAL MARQUEZ																																																																																																																																																
Contrato No.: 21902019-1152 Valor inicial de contrato: \$ 165,031,311																																																																																																																																																
Duración del contrato: 4 MESES Del 14-mar-2019 Fecha: 31-mar-2019 Fecha terminación: 30-mar-2019																																																																																																																																																
Prórroga No. 1: 3 MESES Prórroga No. 2: 1 MES																																																																																																																																																
Adición 01: \$ 10,077,316 Adición 02: \$ Adición 03: \$ Adición 04: \$																																																																																																																																																
Valor actualizado de contrato: \$ 165,031,311																																																																																																																																																
Coordinador de Zona: MARIA DEL PILAR SÓMEZ VALENZUELA																																																																																																																																																
EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			PERSONAL DE INTERVENTORIA																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMADO</th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>versión programada (%)</td> <td>1.64%</td> <td>83.06%</td> </tr> <tr> <td>Inversión del contrato:</td> <td>\$ 6,745,873</td> <td>\$ 318,040,884</td> </tr> <tr> <td>Honorarios:</td> <td>\$ 4,753,000</td> <td>\$ 154,042,750</td> </tr> <tr> <td>Prestes de localización:</td> <td>\$ 753,064</td> <td>\$ 24,474,692</td> </tr> <tr> <td>Gastos fijos:</td> <td>\$ 902,296</td> <td>\$ 16,157,196</td> </tr> <tr> <td>Gastos Recorridos:</td> <td>\$ 738,579</td> <td>\$ 23,228,297</td> </tr> <tr> <td>Valor del contrato:</td> <td>\$ 293,964,827.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	versión programada (%)	1.64%	83.06%	Inversión del contrato:	\$ 6,745,873	\$ 318,040,884	Honorarios:	\$ 4,753,000	\$ 154,042,750	Prestes de localización:	\$ 753,064	\$ 24,474,692	Gastos fijos:	\$ 902,296	\$ 16,157,196	Gastos Recorridos:	\$ 738,579	\$ 23,228,297	Valor del contrato:	\$ 293,964,827.00		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RELACION SEMANAL DE PERSONAL</th> <th colspan="7">D</th> <th rowspan="2">DEDICACIÓN</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>M</th> <th>M</th> <th>J</th> <th>V</th> <th>S</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rg. Director de Interventoría</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>rg. Presidente de Interventoría</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>rg. Especialista en Gestión</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>rg. Especialista en Estructuras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>rg. Auditor de Interventoría</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Interventoría Ambiental</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Interventoría Social - SOT</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Secretaría</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Topógrafo - mensurador</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Calamero 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Calamero 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>			RELACION SEMANAL DE PERSONAL	D							DEDICACIÓN	L	M	M	J	V	S	D	rg. Director de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%	rg. Presidente de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%	rg. Especialista en Gestión								0%	rg. Especialista en Estructuras								0%	rg. Auditor de Interventoría								0%	Interventoría Ambiental								0%	Interventoría Social - SOT	X	X	X	X	X	X	X	100%	Secretaría								0%	Topógrafo - mensurador	X	X	X	X	X	X	X	100%	Calamero 1								0%	Calamero 2								0%
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO																																																																																																																																														
versión programada (%)	1.64%	83.06%																																																																																																																																														
Inversión del contrato:	\$ 6,745,873	\$ 318,040,884																																																																																																																																														
Honorarios:	\$ 4,753,000	\$ 154,042,750																																																																																																																																														
Prestes de localización:	\$ 753,064	\$ 24,474,692																																																																																																																																														
Gastos fijos:	\$ 902,296	\$ 16,157,196																																																																																																																																														
Gastos Recorridos:	\$ 738,579	\$ 23,228,297																																																																																																																																														
Valor del contrato:	\$ 293,964,827.00																																																																																																																																															
RELACION SEMANAL DE PERSONAL	D							DEDICACIÓN																																																																																																																																								
	L	M	M	J	V	S	D																																																																																																																																									
rg. Director de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																																																								
rg. Presidente de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																																																								
rg. Especialista en Gestión								0%																																																																																																																																								
rg. Especialista en Estructuras								0%																																																																																																																																								
rg. Auditor de Interventoría								0%																																																																																																																																								
Interventoría Ambiental								0%																																																																																																																																								
Interventoría Social - SOT	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																																																								
Secretaría								0%																																																																																																																																								
Topógrafo - mensurador	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																																																								
Calamero 1								0%																																																																																																																																								
Calamero 2								0%																																																																																																																																								
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-0102-2019, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRTIC0 K12+993, EN EL MUNICIPIO DE RIOSALIDA, CALDAS																																																																																																																																																
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:																																																																																																																																																
Resumen de obra:																																																																																																																																																
Actividades a desarrollar en la siguiente semana:																																																																																																																																																
Resumen general del estado del contrato:																																																																																																																																																

[illegible]

[illegible]

JPS JUAN PABLO SORIA		ACTA INFORME SEMANAL		CASA 3		SEMANA 10	
CÓDIGO: 1410-F-07		VERSIÓN: 01		PÁGINA:			
SEMANA 10							
CANTIDADES DE OBRA - INFORME SEMANAL DE INTERVENCIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD TOTAL DE OBRA PROYECTADA	CANTIDAD DE OBRA ACUMULADA HASTA LA SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA EN LA PRESENTE SEMANA	CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA	
I.- Realizar actividades preliminares							
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	10.00	10.00	-	10.00	
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2	-	-	-	-	
1.03	DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS	m	-	-	-	-	
1.04	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO	m	-	-	-	-	
II.- Instalar pavimento							
2.05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TPO MDC-19 - COMPA DE MEZCLA	m3	-	-	-	-	
2.06	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	-	-	-	-	
2.07	BASE GRANULAR CLASE C	m3	-	-	-	-	
2.08	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	-	-	-	-	
III.- Construir estructuras de drenaje							
3.09	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	47.80	47.80	-	47.80	
3.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	-	-	-	-	
3.11	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	-	-	-	-	
3.12	CONCRETO RESISTENTE A 21MPa (C) - MEZCLA IN SITU	m3	-	-	-	-	
3.13	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4200$ Mpa	kg	-	-	-	-	
3.14	AFIRMADO	m2	-	-	-	-	
3.15	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, NORMA NTC-5056, DE DIÁMETRO INTERNO 500 mm	m	8.50	8.50	-	8.50	
3.16	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR	m2	-	-	-	-	
3.17	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	-	-	-	
3.18	TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	20.00	20.00	-	20.00	
IV.- Construir obras de estabilización							
4.10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	-	-	-	-	
4.20	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m3	963.40	963.40	-	963.40	
4.21	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	-	-	-	-	
4.22	CONCRETO RESISTENTE A 21MPa (C) - MEZCLA IN SITU	m3	51.90	-	12.47	12.47	
4.23	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4200$ Mpa	kg	-	-	-	-	
4.24	MAILLA DE REFUERZO $f_y = 420$ Mpa	kg	203.63	-	203.63	203.63	
4.25	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	338.80	338.80	-	338.80	
4.26	AFIRMADO	m2	1,477.60	1,360.60	-	1,360.60	
4.27	GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR	m2	746.70	746.70	-	746.70	
4.28	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR6000H-F O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEORRETES	m2	962.80	962.80	-	962.80	
4.29	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR6000H-F O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEORRETES	m2	1,957.20	1,957.20	-	1,957.20	
4.30	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR6000H-F O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEORRETES	m2	2,030.20	2,030.20	-	2,030.20	
4.31	RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA TIPO TRANSVERSAL PARA CUBRIR DE FRENTE Y LATERALMENTE ESTABILIZADO, INCLUYENDO MATERIAL DRENANTE Y GEORRETES EN GEOTEXTIL AS 1600 O	m3	100.00	-	-	-	
4.32	LAGRIMALES Y/O LLOADEROS DE DIÁMETRO 3" EN PVC	m	474.00	474.00	-	474.00	
4.33	LAGRIMALES Y/O LLOADEROS DE DIÁMETRO 3" EN PVC	m	-	-	-	-	
4.34	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEO	m3	-	-	-	-	
4.35	GAVIONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFOR	m3	731.70	650.00	-	650.00	
4.36	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	-	-	-	-	
4.37	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEGMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO DE 21x	m3	29.80	-	-	-	
V.- Ejecutar señalización y seguridad vial							
5.38	LÍNEA DE DEMARCAÇÃO CON PINTURA EN FRÍO	m	-	-	-	-	
5.39	TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TUVOPLASTICO	Und	-	-	-	-	
5.40	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV	Und	-	-	-	-	
VI.- OTRAS CONDICIONES							
NP-01	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO II (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo II (altura entre 10.1 a 20m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales. Incluye recolección de residuos, carga y transporte)	Und	4.00	4.00	-	4.00	
NP-02	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO III (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo III (altura entre 5 a 10m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales. Incluye recolección de residuos, carga y transporte)	Und	-	-	-	-	
NP-03	PERFILADO MANUA, PARA TALUD CON ALTURA HASTA 13m	m3	581.70	581.70	-	581.70	
NP-04	HDRA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJADA, STAND BY 5 HORAS DIA	Hr	342.00	-	-	-	
NP-05	TRANSPLANTE DE ARBOLES TPO IV TRASLADO LARGO (Análisis aplicado para el trasplante en sitio o reubicación in-clase dentro del mismo predio o área de obra entre 15.1m a 100.9m para un árbol (altura <8m, Diam. < 2m). Excavación del capelón, preservando raíces estructurales, taje, excavación manual (atoyado) en el nuevo sitio de plantación, Preparación del nuevo hueco con tierra abonada y T.terral, transporte y disposición final de material sobrante)	m3	-	-	-	-	
NP-06	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN GARUCHA	m3	540.30	333.50	-	333.50	
NP-07	SOBRECARREGO DE MATERIAL	m3	1,326.32	1,326.32	-	1,326.32	
AJUSTES ACTAS DE OBRA							

 JDS JUAN DAVID SANCHEZ C.C. 1410-4-07	ACTA INFORME SEMANAL			 UCA UNIVERSIDAD CALDAS
VERSION: 01	FECHA DE VERSION:	28/08/2014	PAGINA:	
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORA				
Semana N.º: 28 De: 8-mar-2014 A: 15-mar-2014 Tiempo transcurrido desde la iniciación de obra: 185 días				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO N.º 21082005-1161 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS				
 FRENTA DE OBRA No. 1	 FRENTA DE OBRA No. 1			
 FRENTA DE OBRA No. 1	 FRENTA DE OBRA No. 1			



JUAN DIEGO SERNA

ACTA INFORME SEMANAL

SECRETARÍA DE CALDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: 1419-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

28/08/2014

PÁGINA:

INFORME SEMANAL No 28

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de interventoría No. 03052022-0938 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE

INTERVENTOR:

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

CONTRATISTA:

ICSSA S.A.S

SUPERVISOR:

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME DE INTERVENTORIA

DATOS ESPECÍFICOS:

FECHA	CLIMA	CONDICIÓN CLIMÁTICA	INICIO	FIN	PRECIPITACIÓN (mm)	OBSERVACIONES
9/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
10/03/2026	TEMPERADO	Lluvia fuerte			21	
11/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
12/03/2026	TEMPERADO	Lluvia debil			2	
13/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
14/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
15/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	

Condiciones Climáticas presentes en la zona:

Frio: Región que por su ubicación geográfica o tiempo presenta bajas temperaturas.

Templado: Región que por su ubicación geográfica se ve afectada por la instancia intermedia entre cálido y frío, efecto de las precipitaciones intermitentes e intensas propias de la zona.

ESTADO DEL TIEMPO

Tiempo soleado: Temperatura media - baja.

Tiempo húmedo: Temperaturas bajas con presencia de lluvias leves.

Tiempo lluvioso: Periodos moderados o intensos de precipitación.

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

 JUAN DIEGO SERNA		ACTA INFORME SEMANAL		  	
CÓDIGO: 1410-F-07	VERSION: 01	FECHA DE VERSIÓN:	26/08/2014	PAGINA: 1	
Semana Número: <u>29</u> Del: <u>15-mar-2026</u> Al: <u>22-mar-2026</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>202</u> días Tiempo para finalización del contrato: <u>39</u> días					
CONTRATO N° 21052025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SÍTIOS CRÍTICO K12+500, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS					
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 22 de marzo de 2026			INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 22 de marzo de 2026		
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	4.75%	77.45%	(%)	4.49%	77.79%
Valor	\$ 70,178,456.00	\$ 1,144,350,763.00	Valor	\$ 66,366,913.00	\$ 1,149,582,891.00
			Porcentaje de Avance / Acceso 0.31% \$ 4,632,128.00		
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
Contratista: ICSSA S.A.S. Representante Legal: SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA Contrato No: 21052025-1151 Valor Inicial Estudios y Diseños: \$ - Valor de Obras: \$ 1,342,700,925 Adición N°1: \$ 92,341,765 Valor PGIO: \$ 29,585,558 Valor PMT: \$ 13,083,400 Valor Total Actualizado: \$ 1,477,711,648 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 6 MESES Fecha de Iniciación: 01/09/2025 Fecha de suspensión No. 1: % Avance Contractual Fecha de reinicio: 83.82 Fecha de suspensión No. 2: Fecha de reinicio: Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025 % Para Finalizar Fecha de Terminación (final): 30/04/2026 15.18			Interventor: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ Representante Legal: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ Contrato No: 21052025-1152 Valor Total Inicial: (Con IVA) \$ 155,091,311.00 Valor Anticipo: \$ - Adición N°1: \$ 98,873,316.00 Adición N°3: \$ - Adición N°4: \$ - Valor Total Actualizado: \$ 253,964,627.00 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 6 MESES Fecha de Iniciación: 01/09/2025 Fecha de suspensión No. 1: Fecha de reinicio: Fecha de suspensión No. 2: Fecha de reinicio: Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025 Fecha de Terminación (actualizada): 30/04/2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
En la semana del 16 al 22 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades: Se continúa con la construcción del octavo escalón del muro mecánicamente estabilizado que comprende de tres (3) pasos Se construye el filo de metal a lo largo del muro mecánicamente estabilizado Se continúa con la construcción del dique dos y cique tres al mismo tiempo Se continúa la construcción del recubrimiento en concreto del canal sobre el muro estabilizado mecánicamente					
ACTIVIDADES PARA LA PRÓXIMA SEMANA					
Se debe concluir con la construcción del octavo escalón del muro y continuar con las actividades del recubrimiento del canal del muro Se debe iniciar las actividades de recubrimiento del primer dique construido Se deben continuar actividades de construcción del dique 3					
OBSERVACIONES			INTERVENTORÍA		
			 Javier Mauricio Vanegas Vanegas RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		

OBJETO CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-002-2015 QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+000, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 29 Del: 16-mar-2016 Al: 22-mar-2016

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 232 Días

Contratista de Interventoría: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
Representante legal: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

Contrato No: 21062015-1152

Valor inicial del contrato: \$ 165,091,311

Duración del contrato: 4 MESES Del: 1-ago-2015 Hasta: 31-dic-2015

Prórroga No. 1: 3 MESES Prórroga No. 2: 1 MES

Adición 01: \$ 30,873,315 Adición 03: \$

Adición 02: \$ Adición 04: \$

Valor actualizado del contrato: \$ 253,954,627

Coordinador de Zona: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

Fecha terminación: 30-mar-25

Prórroga No. 3: -

Adición 03: -

Adición 04: -

EVOLUCIÓN ACUMULADA DE CONTRATO

PERSONAL DE INTERVENTORIA

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Inversión programada (%)	2.96%	\$6.04%
Inversión del contrato:	\$ 6,745,873	\$ 227,111,648
Honorarios	\$ 4,753,932	\$ 160,040,044
Primas de estabilización	\$ 763,064	\$ 25,253,167
Gastos Fijos	\$ 503,210	\$ 16,542,305
Gastos Reembolsables	\$ 735,570	\$ 24,772,472
Valor del contrato	\$ 283,954,627.00	

RELACIÓN SEMANAL DE PERSONAL								DEDICACIÓN
	L	M	M	J	V	S	D	
Ing. Director de Interventoría	X	X	X	X	X	X		30%
Ing. Representante de Interventoría	X	X	X	X	X	X		50%
Ing. Especialista en Geotecnia								0%
Ing. Especialista en Estructuras								0%
Ing. Auxiliar de Interventoría								0%
Profesional Ambiental								0%
Profesional Social - SST	X	X	X	X	X	X		100%
Secretaría								0%
Yegorito - Intelectual	X	X	X	X	X	X		100%
Cacemero 1								0%
Cacemero 2								0%

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-002-2015 QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO CRITICO K12+000, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Resumen de días:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Asignación general al contrato:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO



JUAN DIEGO SIERRA

0000014384-02

ACTA INFORME SEMANAL

VERIFICAR

FECHA DE VERIFICACIÓN

27 DE MARZO DE 2025

PÁGINA

MAQUINARIA - EQUIPOS - PERSONAL INFORME SEMANAL DE INTERVENCIÓN

CONTRATO N° 21082025-1151

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CORAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SUDORITIO K+2+500 EN EL MUNICIPIO DE RIGUALDA, CALDAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO N° 21082025-1151

CONTRATO N° 21082025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CORAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SUDORITIO K+2+500 EN EL MUNICIPIO DE RIGUALDA, CALDAS

FECHA DE INTERVENCIÓN

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

HASTA

DEL

AL

PERIODO EVALUADO

DE


JDS		ACTA INFORME SEMANAL		VERSIÓN: 01		PÁGINA:	
CODIGO: 1410F-01		SEMANA 20		VERSION: 01		PAGINA:	
CANTIDADES DE OBRA - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD TOTAL DE OBRA PROYECTADA	CANTIDAD DE OBRA ACUMULADA HASTA LA SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA EN LA PRESENTE SEMANA	CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA	
I - Realizar actividades preliminares							
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m ³	10.00	10.00	-	10.00	
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m ²	-	-	-	-	
1.03	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	-	-	-	-	
1.04	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO	m	-	-	-	-	
II - Instalar pavimento							
2.05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m ³	-	-	-	-	
2.06	REGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m ²	-	-	-	-	
2.07	BASE GRANULAR CLASE C	m ³	-	-	-	-	
2.08	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m ³	-	-	-	-	
III - Construir estructuras de drenaje							
3.09	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m ³	47.50	47.50	-	47.50	
3.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m ³	-	-	-	-	
3.11	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m ³	-	-	-	-	
3.12	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - MEZCLA IN SITU	m ³	-	-	-	-	
3.13	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	kg	-	-	-	-	
3.14	AFIRMADO	m ³	-	-	-	-	
3.15	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	m	6.50	6.50	-	6.50	
3.16	GEOTEXTIL TIPO NT-2008 O SIMILAR	m ²	-	-	-	-	
3.17	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m ³	-	-	-	-	
3.18	TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	20.00	20.00	-	20.00	
IV - Construir obras de estabilización							
4.10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m ³	-	-	-	-	
4.20	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m ³	903.40	903.40	-	903.40	
4.21	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m ³	-	-	-	-	
4.22	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - MEZCLA IN SITU	m ³	61.90	12.47	-	12.47	
4.23	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	kg	-	-	-	-	
4.24	MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa	kg	203.60	203.63	-	203.63	
4.25	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m ³	336.80	314.66	22.14	335.50	
4.26	AFIRMADO	m ³	1,477.50	1,168.24	192.30	1,353.60	
4.27	GEOTEXTIL TIPO NT-1506 O SIMILAR	m ²	746.70	702.42	44.28	746.70	
4.28	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TK6000HF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON PERFORACIONES	m ²	962.80	406.80	553.00	952.80	
4.29	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TK6000HF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON PERFORACIONES	m ²	1,957.20	1,957.20	-	1,957.20	
4.30	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TK1600 O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON PERFORACIONES	m ²	2,030.20	2,030.20	-	2,030.20	
4.31	RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MEDIO TRANSVERSAL, PROYECTADO DE MANERA MECANICAMENTE ESTABILIZADO	m ³	180.00	-	-	-	
4.32	MALLA DE MATERIAL BIDIMENSIONAL, 6.35mm, 1500mm x 1500mm, GEOTEXTIL NT-1506	m	474.00	341.20	132.80	474.00	
4.33	LAGRIMALES Y OLLORADIZOS DE DIÁMETRO 3" EN PVC	m	-	-	-	-	
4.34	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECESO	m ³	-	-	-	-	
4.35	SABONES EN SACOS DE SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMAR	m ³	731.70	650.60	-	650.60	
4.36	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	-	-	-	-	
4.37	DIPADORES DE ENERGÍA Y SEMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO DE 21MPa	m ³	29.80	-	-	-	
V - Ejecutar señalización y seguridad vial							
5.38	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	-	-	-	-	
5.39	TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	Und	-	-	-	-	
5.40	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO BR, BP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV	Und	-	-	-	-	
VI - NP/9 CONCLUSIONES							
NP-01	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo I (altura entre 10.1 a 20m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, carga y transporte)	Und	4.00	4.00	-	4.00	
NP-02	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO III (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo II (altura entre 5 a 10m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, carga y transporte)	Und	-	-	-	-	
NP-03	PERFILADO MANUAL PARA TALLO CON ALTURA HASTA 12m	m ³	581.70	581.70	-	581.70	
NP-04	HORA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJADA, STAND BY 5 HORAS DIA	Hr	342.00	-	-	-	
NP-05	TRANSPLANTE DE ARBOLES TIPO IV TRASLADO LARGO (Análisis aplicado para el transplante en sitio o reubicación inmediata dentro del mismo predio o área de copa entre 1.5" m a 103.0m para un Arbol (Altura <5m, Diam. <2m). Extracción del cepellón, preservando raíces estructurales, logo, excavación manual (shovel) en el nuevo sitio de plantación, Preparación de nuevo hueco con tema abonada y tutoraje, transporte y disposición final de material sobrante)	m ³	-	-	-	-	
NP-06	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN CARUCHA	m ³	540.30	335.50	-	335.50	
NP-07	SCOREACARREO DE MATERIAL	m ³	1,328.32	1,168.24	159.08	1,328.32	
AJUSTES ACTAS DE OBRA							

	ACTA INFORME SEMANAL			
CÓDIGO: 1415-F-07	VERSION: 01	FECHA DE VERSION:	28/08/2014	PAGINA:
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA				
Semana Número: <u>26</u> Del: <u>15-mar-2026</u> Al: <u>22-mar-2026</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>262</u> días				
OS. 110 DEL CCA "A" 6 DE 2014 CONTRATO N° 21362025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL ST+0CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS				
 <p data-bbox="414 1123 574 1144">FRENTE DE OBRA No. 1</p>	 <p data-bbox="1037 1123 1197 1144">FRENTE DE OBRA No. 1</p>			
 <p data-bbox="414 1522 574 1543">FRENTE DE OBRA No. 1</p>	 <p data-bbox="1037 1522 1197 1543">FRENTE DE OBRA No. 1</p>			



JEAN DIEGO SERNA

ACTA INFORME SEMANAL



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

28/08/2014

PAGINA:

INFORME SEMANAL No 29

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de interventoría No. 03052022-0938 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE

INTERVENTOR:

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

CONTRATISTA:

ICSSA S.A.S.

SUPERVISOR:

MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME DE INTERVENTORIA

DATOS ESPECÍFICOS:

FECHA	CLIMA	CONDICIÓN CLIMÁTICA	INICIO	FIN	PRECIPITACIÓN (m.m)	OBSERVACIONES
16/03/2026	TEMPLADO	Seco			0	
17/03/2026	TEMPLADO	Lluvia moderada			2.8	
18/03/2026	TEMPLADO	Seco			0	
19/03/2026	TEMPLADO	Seco			0	
20/03/2026	TEMPLADO	Seco			0	
21/03/2026	TEMPLADO	Seco			0	
22/03/2026	TEMPLADO	Lluvia moderada			6.3	

Condiciones Climáticas presentes en la zona:

Frio: Región que por su ubicación geográfica o tiempo presenta bajas temperaturas.

Templado: Región que por su ubicación geográfica se ve afectada por la instancia intermedia entre cálido y frío, efecto de las precipitaciones intermitentes e intensas propias de la zona.


ESTADO DEL TIEMPO

Tiempo soleado: Temperatura media - baja.

Tiempo húmedo: Temperaturas bajas con presencia de lluvias leves.

Tiempo lluvioso: Periodos moderados o intensos de precipitación.

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

 <p>JUAN DIEGO SERNA</p>		<p align="center">ACTA INFORME SEMANAL</p>		  																			
CÓDIGO: 1410-F-07	VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	28/04/2024	PÁGINA: 1																			
<p>Semana Número: <u>32</u> Del <u>22-mar-2026</u> Al: <u>29-mar-2026</u> días Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>200</u> días Tiempo para finalización del contrato: <u>32</u> días</p>																							
<p>CONTRATO N° 21062025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+906, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS</p>																							
<p>INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 29 de marzo de 2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMADO</th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(%)</td> <td>4.31%</td> <td>81.79%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$ 63,707,621.00</td> <td>\$ 1,208,658,354.00</td> </tr> </tbody> </table>			PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	(%)	4.31%	81.79%	Valor	\$ 63,707,621.00	\$ 1,208,658,354.00	<p>INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 29 de marzo de 2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTADO</th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(%)</td> <td>4.32%</td> <td>82.11%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$ 63,624,501.00</td> <td>\$ 1,213,407,392.00</td> </tr> </tbody> </table>			EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO	(%)	4.32%	82.11%	Valor	\$ 63,624,501.00	\$ 1,213,407,392.00
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO																					
(%)	4.31%	81.79%																					
Valor	\$ 63,707,621.00	\$ 1,208,658,354.00																					
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO																					
(%)	4.32%	82.11%																					
Valor	\$ 63,624,501.00	\$ 1,213,407,392.00																					
<p>Porcentaje de Avance / Atresco</p> <table border="1"> <tr> <td>0.32%</td> <td>\$ 4,743,000.00</td> </tr> </table>			0.32%	\$ 4,743,000.00																			
0.32%	\$ 4,743,000.00																						
<p>CONTRATO DE OBRA:</p> <p>Contratista: ICSSA S.A.S.</p> <p>Representante Legal: SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA</p> <p>Contrato No: 21062025-1151</p> <p>Valor Inicial Estudios y Diseños: \$ -</p> <p>Valor de Obras: \$ 1,342,700,025</p> <p>Adición N°1: \$ 82,341,765</p> <p>Valor PGIO: \$ 29,555,556</p> <p>Valor PMT: \$ 13,053,400</p> <p>Valor Total Actualizado: \$ 1,477,711,546</p> <p>Plazo Inicial: 4 MESES</p> <p>Plazo Actualizado: 8 MESES</p> <p>Fecha de Iniciación: 01/09/2025</p> <p>Fecha de suspensión No. 1: % Avance Contractual</p> <p>Fecha de reinicio: 88.72</p> <p>Fecha de suspensión No. 2:</p> <p>Fecha de reinicio:</p> <p>Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025 % Para Finalizar</p> <p>Fecha de Terminación (final): 30/04/2026 13.28</p>			<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</p> <p>Interventor: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ</p> <p>Representante Legal: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ</p> <p>Contrato No: 21062025-1152</p> <p>Valor Total Inicial (Con IVA): \$ 165,051,311.00</p> <p>Valor Anticipo: \$ -</p> <p>Adición N°1: \$ 99,873,316.00</p> <p>Adición N°3: \$ -</p> <p>Adición N°4: \$ -</p> <p>Valor Total Actualizado: \$ 264,924,627.00</p> <p>Plazo Inicial: 4 MESES</p> <p>Plazo Actualizado: 8 MESES</p> <p>Fecha de Iniciación: 01/09/2025</p> <p>Fecha de suspensión No. 1:</p> <p>Fecha de reinicio:</p> <p>Fecha de suspensión No. 2:</p> <p>Fecha de reinicio:</p> <p>Fecha de terminación (inicial): 31/12/2025</p> <p>Fecha de Terminación (actualizada): 30/04/2026</p>																				
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>En la semana del 22 al 29 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se concluye la construcción del muro, se están ultimando detalles de la última capa de llano para nivelar con la vía Se concluye con la construcción de diques dos y tres 																							
<p>ACTIVIDADES PARA LA PRÓXIMA SEMANA</p> <p>Se debe iniciar las actividades de recubrimiento del primer dique construido</p>																							
<p>OBSERVACIONES</p>			<p>INTERVENTORÍA</p> <p align="right">  Javier Mauricio Vanegas Vanegas RES DE VIE DE INTERVENTORIA </p>																				

OBJETO CONTRATO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-S-003-2023, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 30 Del: 23-mar-2024 Al: 29-mar-2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 203 Días
Contratista de interventoría: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
Representante legal: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
Contrato No: 21052025-1152
Valor inicial del contrato: \$ 155,091,311
Duración del contrato: 4 MESES Del: 14-mar-2023 Hasta: 31-dic-2023
Prórroga No. 1: 3 MESES Prórroga No. 2: 1 MES
Adición 01: \$ 95,873,316 Adición 03: \$
Adición 02: \$ Adición 04: \$
Valor actualizado del contrato: \$ 262,964,627
Coordinador de Zona: MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

Ejecución Adquirida del Contrato

PERSONAL DE INTERVENTORIA

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Inversión programada (%)	2.5%	88.02%
Inversión del contrato:	\$ 6,745,873	\$ 234,161,234
Prestaciones:	\$ 4,793,932	\$ 165,106,256
Primas de localización:	\$ 753,064	\$ 26,291,742
Gastos fijos:	\$ 503,298	\$ 17,581,567
Gastos fijos variables:	\$ 735,578	\$ 25,622,647
Valor del contrato:	\$ 262,964,627.00	

RELACIÓN SEMANAL DE PERSONAL								DEDICACIÓN
	L	M	M	J	V	S	D	
Ing. Director de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%
Ing. Subdirector de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%
Ing. Especialista en Costos								0%
Ing. Especialista en Estructuras								0%
Ing. Auxiliar de Interventoría								0%
Profesional Ambiental								0%
Profesional Social - SST	X	X	X	X	X	X	X	100%
Secretaría								0%
Topógrafo - Inspector	X	X	X	X	X	X	X	100%
Cadeneta 1								0%
Cadeneta 2								0%

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-S-003-2023, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Resumen de obra

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inspección general al contrato

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO



JDS JUAN DÍAZ SORIA		ACTA INFORME SEMANAL		VERSION: 01		PÁGINA:	
CODIGO: 14109-417		SEMANA 50					
CANTIDADES DE OBRA - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD TOTAL DE OBRA PROYECTADA	CANTIDAD DE OBRA ACUMULADA HASTA LA SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA EN LA PRESENTE SEMANA	CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA	
I - Realizar actividades preliminares							
1.01	DEMOICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	10.00	10.00	-	10.00	
1.02	DEVOLUCIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	-	-	-	-	
1.03	REVOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	-	-	-	-	
1.04	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO	m	-	-	-	-	
II - Instalar pavimento							
2.05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TPO MOC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	-	-	-	-	
2.06	REGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA ORLE7	m2	-	-	-	-	
2.07	BASE GRANULAR CLASE C	m3	-	-	-	-	
2.08	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	-	-	-	-	
III - Construir estructuras de drenaje							
3.05	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	47.80	47.80	-	47.80	
3.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	-	-	-	-	
3.11	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	-	-	-	-	
3.12	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - MEZCLA IN SITU	m3	-	-	-	-	
3.13	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	kg	-	-	-	-	
3.14	AFIRMADO	m3	-	-	-	-	
3.15	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC-5055, DE DIAMETRO INTERNO 900 mm	m	6.50	6.50	-	6.50	
3.18	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR	m2	-	-	-	-	
3.17	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	-	-	-	
3.16	TUBERIA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	20.00	20.00	-	20.00	
IV - Construir obras de estabilización							
4.19	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	-	-	-	-	
4.20	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m3	903.40	903.40	-	903.40	
4.21	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	-	-	-	-	
4.22	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - MEZCLA IN SITU	m3	81.96	81.96	12.47	94.43	
4.23	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	kg	-	-	-	-	
4.24	VALIA DE REFUERZO fy = 420 Mpa	kg	203.83	203.83	-	203.83	
4.25	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	336.89	336.89	-	336.89	
4.26	AFIRMADO	m3	1,477.83	1,477.83	-	1,477.83	
4.27	GEOTEXTIL TIPO NT-1500 O SIMILAR	m2	746.70	746.70	-	746.70	
4.28	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TRACOMF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOTEXTILES	m2	962.80	962.80	-	962.80	
4.29	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TRACOMF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOTEXTILES	m2	1,957.20	1,957.20	-	1,957.20	
4.30	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TRACOMF O SIMILAR PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOTEXTILES	m2	2,030.20	2,030.20	-	2,030.20	
4.31	RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOTEXTILES	m3	190.00	190.00	-	190.00	
4.32	RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOTEXTILES	m3	474.00	474.00	-	474.00	
4.33	LAGRIVALES Y DRENADORES DE DIAMETRO 3" EN PVC	m	-	-	-	-	
4.34	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECESO	m3	-	-	-	-	
4.35	GAVIONES EN SACOS DE SUELO CEVENTO CON MATERIAL DE SITIO PARA CONFORMAR DREN HORIZONTAL DE CONJUNTO MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m3	731.70	731.70	46.55	778.25	
4.36	DREN HORIZONTAL DE CONJUNTO MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	-	-	-	-	
4.37	DIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO DE 21MP	m3	29.80	29.80	-	29.80	
V - Construir señalización y seguridad vial							
5.38	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	m	-	-	-	-	
5.39	TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLASTICO	Und	-	-	-	-	
5.43	SEAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SL, DIVENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV	Und	-	-	-	-	
VI - NP'S CONCLUIDOS							
NP-01	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo II (altura entre 10.1 a 20m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, carga y transporte)	Und	4.00	4.00	-	4.00	
NP-02	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO III (Análisis aplicado para la poda manual de la parte aérea de árbol tipo III (altura entre 5 a 10m), incluyendo corte de ramas secas, interferentes, ramas bajas y control de copa. Se realiza con herramientas manuales, incluye recolección de residuos, carga y transporte)	Und	-	-	-	-	
NP-03	PERFILADO MANUAL PARA TALUD CON ALTURA HASTA 12m	m3	581.70	581.70	-	581.70	
NP-04	HORA MAQUINA RETROEXCAVADORA TRABAJADA STAND BY 5 HORAS DIA	Hr	342.00	-	-	-	
NP-05	TRANSPLANTE DE ARBOLES TIPO IV TRASLADO LARGO (Análisis aplicado para el trasplante en sitio o reubicación inmediata dentro del mismo predio o área de obra entre 15.1 m a 100.0 m para un árbol (Altura <5m, Diámetro <2m). Extracción del capelón, preservando raíces estructurales, taje, excavación manual (tahaya) en el nuevo sitio de plantación. Preparación del nuevo basco con tierra abonada y fertilizante, transporte y disposición final de material sobrante)	m3	-	-	-	-	
NP-06	CARGUE Y TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL EN CARROCHA	m3	540.30	540.30	142.10	682.40	
NP-07	SOBRECARREO DE MATERIAL	m3	1,328.32	1,328.32	-	1,328.32	
AJUSTE A ACTAS DE OBRA							

	ACTA INFORME SEMANAL			
CODIGO: 1410-F-07	VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	28/03/2018	PAGINA:
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA				
Semana Número: <u>30</u> Del: <u>23-mar-2018</u> Al: <u>29-mar-2018</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>209</u> días				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO N° 21162034-151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITUORIT CO K12+900. EN E. VÍA CIPIO DE RISARALDA, CALDAS.				
 <p data-bbox="418 1134 578 1150">FRENTE DE OBRA No. 1</p>	 <p data-bbox="1045 1134 1205 1150">FRENTE DE OBRA No. 1</p>			
 <p data-bbox="418 1533 578 1549">FRENTE DE OBRA No. 1</p>	 <p data-bbox="1045 1533 1205 1549">FRENTE DE OBRA No. 1</p>			



JUAN DIEGO SERNA

CÓDIGO: 1410-F-07

ACTA INFORME SEMANAL



VERSION: 01

FECHA DE VERSIÓN:

28/08/2014

PAGINA:

INFORME SEMANAL No 30

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de intervención No. 03052022-0938 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE

INTERVENTOR:

JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

CONTRATISTA:

CSSA S.A.S.

SUPERVISOR:

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME DE INTERVENTORIA

DATOS ESPECÍFICOS:

FECHA	CLIMA	CONDICION CLIMATICA	INICIO	FIN	PRECIPITACION (mm)	OBSERVACIONES
23/03/2026	TEMPERADO	Lluvia moderada			2.5	
24/03/2026	TEMPERADO	Lluvia moderada			19.4	
25/03/2026	TEMPERADO	Lluvia			0.4	
26/03/2026	TEMPERADO	Lluvia muy fuerte			38.5	
27/03/2026	TEMPERADO	Lluvia moderada			3.5	
28/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	
29/03/2026	TEMPERADO	Seco			0	

Condiciones Climáticas presentes en la zona:

Frio: Región que por su ubicación geográfica o tiempo presenta bajas temperaturas.

Templado: Región que por su ubicación geográfica se ve afectada por la instancia intermedia entre cálida y frío, efecto de las precipitaciones intermitentes e intensas propias de la zona.

ESTADO DEL TIEMPO

Tiempo soleado: Temperatura media - baja.

Tiempo húmedo: Temperaturas bajas con presencia de lluvias leves.

Tiempo lluvioso: Períodos moderados o intensos de precipitación.

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

ANEXO 4

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12/03/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

1 de 2

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE CALDAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 21062025-1151
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ICSSA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900. EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 21062025-1152
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el Acta anterior sin observaciones.

Por otra parte los compromisos pactados en el acta anterior son:

- + Reunión del balance de obra (Se cumplió)
- + Garrucha operativa (se cumplió)
- + Presentación Acta de Costos No. 1 (se cumplió)
- + Informe del anticipo (NO se cumplió)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra
2. Aspectos técnicos de la ejecución del contrato
3. Aspectos ambientales
4. Aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo SST
5. Aspecto social
6. Programación, seguimiento y control del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

El último informe semanal es el No. 26 que comprende la semana entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2026.

PROGRAMADO: 75,15% (\$ 1,054,952,689.00) EJECUTADO: 61,16% (\$ 847,340,322.00)

ATRASO DEL 14,99% que representa \$ 207,612,367.00

TÉCNICO:

Se recibirán actas hasta este mes. En hacienda los últimos 4 días hábiles del mes. Se debe presentar acta la próxima semana. Idealmente se deben radicar antes del próximo jueves.

La Supervisión menciona que pronto solicitará la aceptación de las prórrogas y adiciones para ambos contratos.

La interventoría insiste en la presentación del informe de inversión del anticipo solicitado desde diciembre de 2025.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Mesa técnica para conciliación de cantidades acta No. 2
Informe de inversión del anticipo

17 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026

CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

19/03/2026
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO MEPI-MN1-N-14-FR-1

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

12/03/2026

(Día / Mes / Año)

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURTH	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE CALDAS	
JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA	Javier Mauricio Vanegas V.
ANDRÉS GUTIÉRREZ	COORDINADOR	ICSSA S.A.S.	
SEBASTIAN CEDEÑO	RESIDENTE OBRA	ICSSA S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Contraloría, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-N-14-PR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 19/03/2026
(Día / Mes / Año)

1 de 2

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 21062025-1151
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ICSSA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 21062025-1152
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el Acta anterior sin observaciones.

Por otra parte los compromisos pactados en el acta anterior son:

- + Mesa técnica para conciliación Acta No. 2 (Se cumplió el 16 de marzo)
- + Informe del anticipo (NO se cumplió)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra
2. Aspectos técnicos de la ejecución del contrato
3. Aspectos ambientales
4. Aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo SST
5. Aspecto social
6. Programación, seguimiento y control del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

El último informe semanal es el No. 28 que comprende la semana entre el 9 y el 15 de marzo de 2026.
PROGRAMADO: 72,73% (\$ 1,074,772,307.00) EJECUTADO: 73,30% (\$ 1,083,215,978.00)
ADELANTO DEL 0,57% que representa \$ 5,443,671.00

TÉCNICO:

Se reprograma el contrato de obra con base en la adición y prórroga hasta el 30 de abril que se refleja en el informe No. 28.
Se pone a consideración de la Supervisión que el último escalon (8) del muro mecánicamente estabilizado sea de 3 cuerpos de 40 cm para llegar con los niveles de la vía.
Está pendiente el vaciado del recubrimiento sobre el canal de los escalones 1, 5, 6, 7 y 8.
Se solicita se inicien actividades para el recubrimiento de los Diques para el próximo 6 de abril de 2026.
Se está trabajando en dos frentes de obra paralelos en diques 2 y 3. En el Dique 2 se alcanzó el sexto nivel, mientras que en el Dique 3 se alcanza el segundo nivel.
Se encuentra en trámite el Acta No. 2 de obra

COMPROMISOS PACTADOS

Informe de inversión del anticipo
Inicio actividades recubrimiento de los diques

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

24 de marzo de 2026
5 de abril de 2026

RESPONSABLES

CONTRATISTA
CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

26/03/2026
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modificar por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-14-FR-1
VERSIÓN	-
PÁG. 4A	

FECHA 19/03/2026
(Día / Mes / Año)

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURTH	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE CALDAS	
JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA	Hugo Vanegas V.
ANDRÉS GUTIÉRREZ	COORDINADOR	ICSSA S.A.S.	Andrés Gutiérrez
SEBASTIAN CEDEÑO	RESIDENTE OBRA	ICSSA S.A.S.	Sebastián Cedeño

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contralista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN ¹ -IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 26/03/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

1 de 2

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE CALDAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 21062025-1151
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ICSSA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 21062025-1152
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el Acta anterior sin observaciones.

Por otra parte los compromisos pactados en el acta anterior son:

- + Informe de inversión del anticipo (NO se cumplió)
- + Trámite Acta No. 2 (NO se cumplió)
- + Inicio actividad de recubrimiento de diques

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra
2. Aspectos técnicos de la ejecución del contrato
3. Aspectos ambientales
4. Aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo SST
5. Aspecto social
6. Programación, seguimiento y control del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

El último informe semanal es el No. 29 que comprende la semana entre el 16 y el 22 de marzo de 2026:

PROGRAMADO: 77.48% (\$ 1,144,950,763.00) EJECUTADO: 77.75% (\$ 1,149,582,591.00)

ADELANTO DEL 0.31% que representa \$ 4,632,128.00

TÉCNICO:

Se toma la decisión en conjunto, de ejecutar el canal de descole del muro mecánicamente estabilizado en sus primeros 30 m en concreto ciclópeo (tal como se encuentra diseñado) y el resto de la longitud hasta el Dique 1, en un canal escalonado de sacos de suelo cemento.

La cuneta existente sobre la vía se entregará a un canal que se construirá sobre el escalon No. 8 teniendo en cuenta la misma sección de diseño (1.4 m de ancho con altura de 0.4 m), implementando estructuras de disipación.

Se hace una revisión documental de los diseños y se eleva la consulta a la Supervisión y a la Geotecnista respecto a la altura de las aletas del canal del muro mecánicamente estabilizado.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Informe de inversión del anticipo

27 de marzo de 2026

CONTRATISTA

Inicio actividades recubrimiento de los diques

6 de abril de 2026

CONTRATISTA

Trámite Acta No. 2

27 de marzo de 2026

SUPERVISIÓN

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

10/04/2026
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 26/03/2026
(Día / Mes / Año)

2 de 2

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURTH	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE CALDAS	
JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	
JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORÍA	Humberto Vanegas V.
ANDRÉS GUTIÉRREZ	COORDINADOR	ICSSA S.A.S.	
SEBASTIAN CEDEÑO	RESIDENTE OBRA	ICSSA S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Centralista, Interventor y Dirección Territorial


ANEXO 5

**RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
GENERADA ENTRE CONTRATISTA E
INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO,
REFERENCIA, FECHA DE RECIBO**


FECHA	CONSECUTIVO	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADA / RECIBIDA	RESPUESTA	REMITENTE
2-mar-26	OFIRIS - 2026 - 029	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ	SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 y ADICIÓN NO. 1 DEL CONTRATO EN REFERENCIA.	RECIBIDA	N/A	ICSSA S.A.S.
4-mar-26	OFIRIS - 2026 - 030	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ	RADICACIÓN REPROGRAMACIÓN CONTRACTUAL, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO.	RECIBIDA	N/A	ICSSA S.A.S.
15-mar-26	D-GC-017-2025	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA	Aval Memorando Técnico No. 3.	ENVIADA	N/A	GOBERNACIÓN DE CALDAS
18-mar-26	OFIRIS-2025-030	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ	ENVIO INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 6 V1.0. PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.	RECIBIDA	N/A	ICSSA S.A.S.
25-mar-26	D-GC-017-2025	JUAN SEBASTIÁN MEZA BETANCURTH	Remisión de los Anexos Nos. 4 y 5 a la Fianza de Cumplimiento del contrato de Interventoría.	ENVIADA	N/A	JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ
27-mar-26	D-GC-019-2025	JUAN SEBASTIÁN MEZA BETANCURTH	Solicitud de detalles del canal de descole sobre el muro mecánicamente estabilizado.	ENVIADA		JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ

ANEXO 6


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

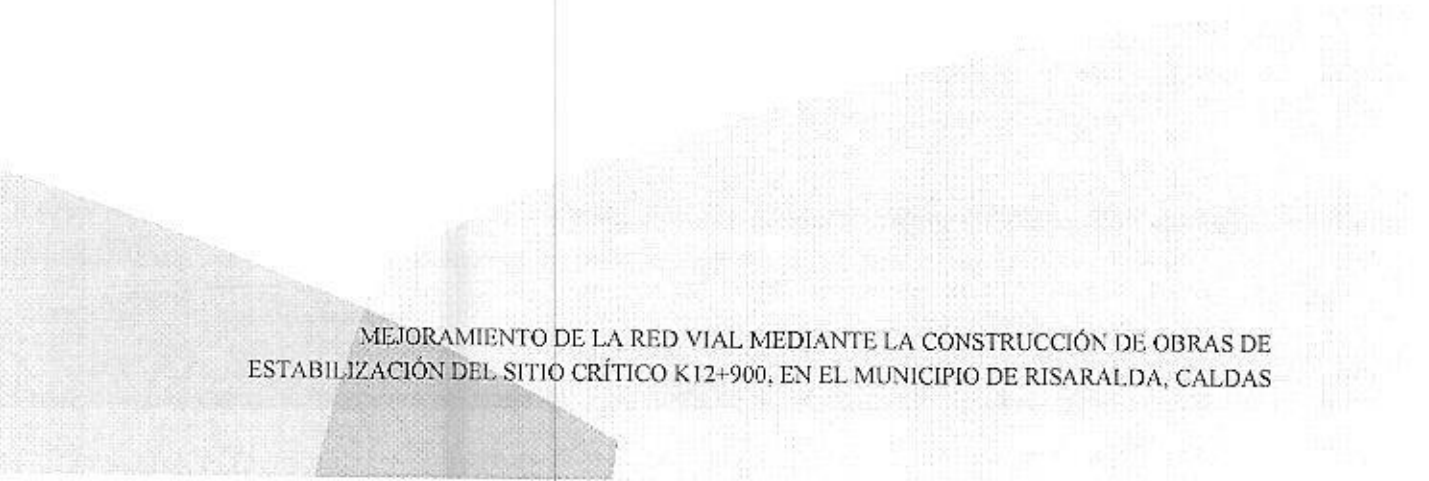

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

 JDS JALISCO S.A.S. CÓDIGO: 1410-4-07	ACTA INFORME SEMANAL		 Vías Caldas
VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	24/06/2014	PAGINA:
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
Semana Número: 27 Del 2-mar-2014 Al 8-mar-2014 Tiempo transcurrido desde la ejecución de: 185 días			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO N° 21002025-1151 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL BITÚMENCOSITICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS			
 FRETE DE OBRA No. 1	 FRETE DE OBRA No. 1		
 FRETE DE OBRA No. 1	 FRETE DE OBRA No. 1		

AS Registro Fotográfico

 JDS CÓDIGO: 1413-F-07	ACTA INFORME SEMANAL			 CALDAS
VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	28/03/2014	PAGINA:	
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENCIÓN				
Semana Número 28 Del 0-mar-2026 Al 15-mar-2026 Tiempo Intervenido desde la iniciación del contrato 156 días				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO N° 21082025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SÍMBOLO TICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS				
 FRETE DE OBRA No. 1	 FRETE DE OBRA No. 1			
 FRETE DE OBRA No. 1	 FRETE DE OBRA No. 1			

 CODIGO: 1410-F-07	ACTA INFORME SEMANAL		
VERSION: 01	FECHA DE VERSIÓN:	26/08/2014	PAGINA:
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
Semana Número: 29 Del: 10-mar-2025 Al: 22-mar-2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 202 días			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO N° 21092025-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRITICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDO, CALDAS			
 FRENTA DE OBRA No. 1	 FRENTA DE OBRA No. 1		
 FRENTA DE OBRA No. 1	 FRENTA DE OBRA No. 1		

	ACTA INFORME SEMANAL		
CODIGO: 1410-F-07	VERSION: 01	FECHA DE VERSION:	28/08/2014
PAGINA:			
REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
Semana Número: <u>30</u> Del: <u>23-mar-2008</u> Al: <u>28-mar-2008</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>203</u> días			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO N° 21162028-1151 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL S. TIPO RITICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS			
 <p data-bbox="418 1108 574 1123">FRENTA DE OBRA No. 1</p>	 <p data-bbox="1045 1114 1201 1129">FRENTA DE OBRA No. 1</p>		
 <p data-bbox="418 1502 574 1516">FRENTA DE OBRA No. 1</p>	 <p data-bbox="1045 1508 1201 1522">FRENTA DE OBRA No. 1</p>		
