

CARLOS EDGARDO HURTADO JIMENEZ

NIT: 15985491 - 4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Natural

Dirección: BRR MILENIO III 3 B34, MANZANARES, Caldas, Colombia

Tel. 3165325959

Email. dykaroscolombia@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764109030437 válida desde 2026-04-28 hasta 2026-10-28 rango desde FECA14 hasta FECA50

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE MANZANARES

NIT: 890802505

Dirección: CRA 4 N° 5 - 76, MANZANARES, Caldas, Colombia

Teléfono: 8850022

Email: hacienda@manzanares-caldas.gov.co

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Pago: 30/04/2026

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FECA14

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 11:48:25

FECHA FIRMADO: 28/04/2026 11:48:26

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
28	04	2026

DIA	MES	AÑO
30	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	PAGO TOTAL IPMC-035-2026OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS	CE	1,00	\$49.025.340,00				\$0,00	\$49.025.340,00

Notas:

SON: (cuarenta y nueve millones veinticinco mil trescientos cuarenta pesos cero centavos)


CUFE: a6701c0fb2a5bb095b06ae384eb0e4e58be10fd965ad84b15c2b0746e1b7ee1df9d73e52e01198cd7293b658628c02f8

Subtotal:	\$49.025.340,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$49.025.340,00

Firma Digital: Rigu4OD5cwS+St8baftA5smyYhNL1zhwYkC8q7Xim2zujhXyqQqtjKvkFTn1XM
rNKzWAhj3gnv3Q+HqKdyHoxg3qInO/iIFLrWKTJxcOOdQ/z1K+3cHJIAKVHmOL5b
/6TlqJ0b3v5oh8RliPRyR7SeLqwYldHa9e4AzSMMHvUxx9diLMrQCSqyZ968Ppba
QMXH4YyRWBY/HI7IKZGDrC7rO33y6/b80m1GUBhqlsJvxpXpW02BACsOFh3GuD3
kleFtP0SXGtdKF0vHZIN8vvOGSxMiYWU/m9wo2jzHZdlcCpJEicafXe7RHZZsE
EG7gZjxybOUKF9vTYdRaCg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



Manzanares- Caldas

27/04/2026

Señores:
Alcaldía Municipal
TESORERIA

AUTORIZACION

Reciban un cordial saludo, yo CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía 15.985.491 de Manzanares -Caldas, AUTORIZO al Municipio de Manzanares Caldas en representación del Señor Alcalde Carlos Enrique Botero Alvares para que me hagan el favor de consignar a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No 488.472391041, perteneciente a la señora KATERIN CECILIA CIRO MARTINES identificada con cedula de ciudadanía No 1.004620161 de Manzanares Caldas. para el PAGO No 1 Y FINAL – IPMC- 035 -2026 OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$49.026.340.00)


ATT: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ
CC: 15.985.491 de Manzanares -Caldas
CELULAR: 310-6279021

Notaria Unica
Manzanares Caldas

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Al Despacho de la NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MANZANARES compareció:

HURTADO JIMENEZ CARLOS EGDARDO
con C.C. 15985491

Y dijo que reconoce el contenido y firma del documento que antecede. El compareciente solicita y autoriza el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

En Manzanares, el día 2026-04-28 09:00:16

X 

 Cod. 12b2sr

 12565-d77431d3

Alex Fermin Restrepo Martinez
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MANZANARES





DAVIVIENDA

CERTIFICADO

MANZANARES,
24/04/2026
CALDAS,
COLOMBIA.

A quién interese.

Por medio de la presente hacemos constar que la señora **KATERIN CECILIA CIRO MARTINEZ** identificada con cedula de ciudadanía Número: **1004620161**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número: **488472391041**

Fecha de apertura **24/04/2026**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

141247551357



(415)7707212489984(8020) 000014124755135 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 0 4 6 2 0 1 6 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

1 0

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 0 4 6 2 0 1 6 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Caldas

1 7

30. Ciudad/Municipio

Manizales

4 3 3

31. Primer apellido

CIRO

32. Segundo apellido

MARTINEZ

33. Primer nombre

KATERIN

34. Otros nombres

CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

Manizales

4 3 3

Dirección principal

CL 5 # 2 - 29 BLV

42. Correo electrónico

kateciro114@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 5 1 1 1 6 6 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 0 8 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 6 0 4 0 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-04-24 / 02:33:33PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CIRO MARTINEZ KATERIN CECILIA

985. Cargo Contribuyente

INFORME N°1 Y FINAL

IPMC-035-2026

OBJETO

**CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA
ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS**

CONTRATISTA

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMÉNEZ

2026

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	IPMC-035-2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.
CONTRATISTA	CARLOS EGDARDO HURTADO JIMÉNEZ
C.C	15.985.491 DE MANZANARES, CALDAS
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$49.025.340,00 M/CTE).
SUPERVISOR	ING. DIEGO TORO RAMIREZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	SE ESTABLECE QUE, UNA VEZ CULMINADO EL PROCESO DE SELECCIÓN Y REALIZADA LA RESPECTIVA ADJUDICACIÓN, EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA SERÁ HASTA EL AGOTAMIENTO DEL TOPE PRESUPUESTAL ASIGNADO, SIN QUE EN NINGÚN CASO SUPERE LOS CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	11 DE MAYO DE 2026
ADICION DE RECURSOS	N/A
PRÓRROGA	N/A
CDP	242, 243, 244 DEL 11 DE MARZO DE 2026
RP	353 DEL 27 DE MARZO DE 2025

INTRODUCCIÓN

En el marco de las competencias asignadas al Municipio de Manzanares, Caldas, conforme a lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, la administración municipal orienta su gestión al cumplimiento de funciones esenciales como la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras que impulsen el desarrollo territorial y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad.

En este contexto, la Secretaría de Planeación e Infraestructura lidera la estructuración, coordinación y ejecución de proyectos enfocados al mantenimiento y mejoramiento de la red vial del municipio, especialmente en el sector rural, donde la conectividad representa un factor determinante para el desarrollo social y económico de las comunidades.

En atención a lo anterior, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el suscrito contratista **CARLOS EGDARDO HURTADO JIMÉNEZ**, el presente informe de cobro da cuenta de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto orientado al mejoramiento de la vía rural de la vereda Romeral, mediante la implementación de soluciones en placa huella en concreto reforzado,

como respuesta a las condiciones de deterioro que presenta la vía, derivadas de factores topográficos, climáticos y de uso.

Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de transitabilidad, garantizar la seguridad vial, optimizar los tiempos de desplazamiento y facilitar el transporte de productos agrícolas, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la economía rural y al acceso oportuno a servicios básicos por parte de la comunidad.

De esta manera, el presente documento consolida el avance de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, evidenciando el cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del contratista, así como el aporte al desarrollo de la infraestructura vial del municipio, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y las necesidades prioritarias del territorio.

LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución de la obra se llevará a cabo en la vereda ROMERAL.

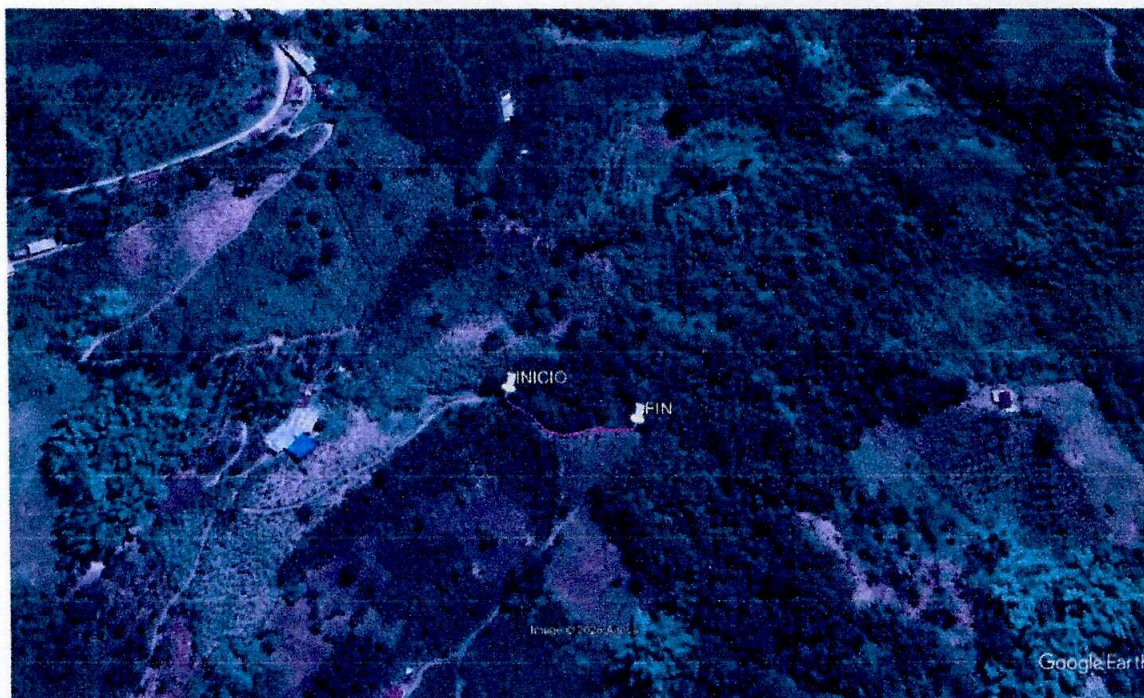


Ilustración 1. COORDENADAS. 75° 9'28.02"O-5°14'4.66"N



Estado de vía ANTES de la intervención, vereda ROMERAL

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO AU=(36%)	VALOR PARCIAL
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN.	M3	24,7500	\$ 80.350,00	\$ 1.988.663,00
1.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO.	M3	21,2777	\$ 225.586,00	\$ 4.799.960,00
1.03	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN PLACAS, VIGAS Y CUNETAS.	M3	12,5200	\$ 1.633.325,00	\$ 20.449.229,00
1.04	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ENROCADOS.	M3	3,0000	\$ 924.000,00	\$ 2.772.000,00
1.05	SARDINEL EN CONCRETO CLASE D. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO. INCLUYE FORMALETA.	ML	62,0000	\$ 114.004,00	\$ 7.068.248,00
1.06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI.	KG	143,4720	\$ 13.900,00	\$ 1.994.261,00
1.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM X 5MM.	M2	100,9100	\$ 47.860,00	\$ 4.829.553,00
1.08	SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	TON	82,5600	\$ 62.057,00	\$ 5.123.426,00

COSTO TOTAL	\$ 49.025.340,00
-------------	------------------

ACTA DE MODIFICATORIA N°1

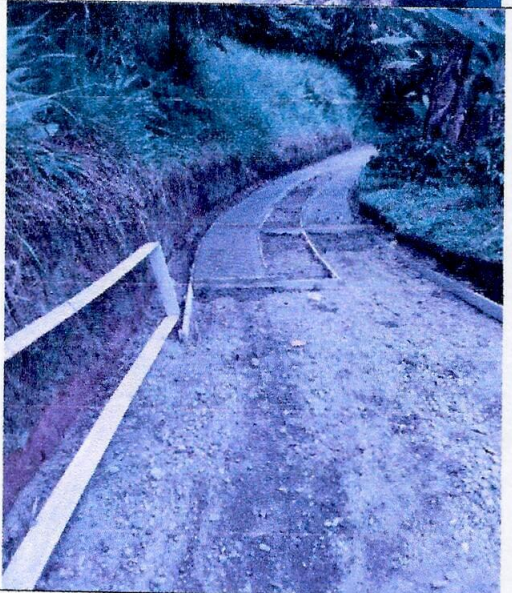
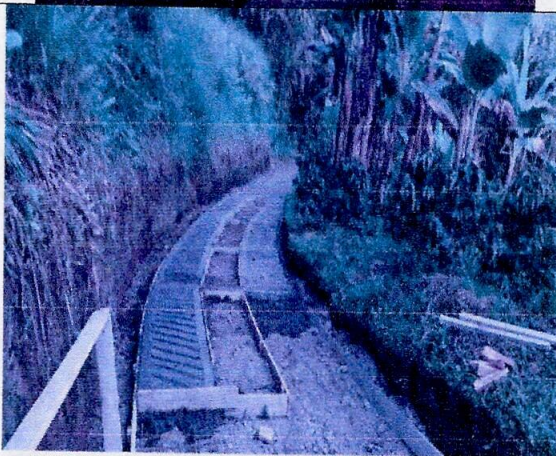
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN D	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	(+/-)	CANT.	VR TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1.01	EXCAVACIONES EN MATERIALES VARIOS	M3	24.75	\$ 80,350.00	\$ 1,988,663.00	+	35.85	\$ 2,880,641.60	60.60	\$ 4,869,304.10
1.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO.	M3	21.28	\$ 225,586.00	\$ 4,799,960.00	-	4.18	\$ - 944,044.02	17.09	\$ 3,855,915.98
1.03	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN PLACAS, VIGAS Y CUNETAS.	M3	12.52	\$ 1,633,325.00	\$ 20,449,229.00	-	0.23	\$ - 380,156.39	12.29	\$ 20,069,072.61
1.04	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ENROCADOS.	M3	3.00	\$ 924,000.00	\$ 2,772,000.00	+	0.15	\$ 138,600.00	3.15	\$ 2,910,600.00
1.05	SARDINEL EN CONCRETO CLASE D. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO. INCLUYE FORMALETA.	ML	62.00	\$ 114,004.00	\$ 7,068,248.00	+	5.64	\$ 642,982.56	67.64	\$ 7,711,230.56
1.06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI.	KG	143.47	\$ 13,900.00	\$ 1,994,261.00	+	45.10	\$ 626,873.82	188.57	\$ 2,621,134.62
1.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM X 5MM.	M2	100.91	\$ 47,860.00	\$ 4,829,553.00	-	52.60	\$ - 2,517,196.70	48.32	\$ 2,312,355.90
1.08	SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	TON	82.56	\$ 62,057.00	\$ 5,123,426.00	-	7.21	\$ - 447,699.69	75.35	\$ 4,675,726.23
COSTO TOTAL					\$ 49,025,340.00			\$ 49,025,340.00		

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49.025.340,00
VALOR ACTA N°1 Y FINAL	\$ 49.025.340,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100,00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,0

REGISTRO FOTOGRÁFICO







A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos E. Hurtado Jimenez', written over a horizontal line.

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ
Contratista


ACTA MODIFICATORIA

Nº1

ALCALDIA DE MANZANARES, CALDAS			
CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS			
SUPERVISOR		ING. DIEGO TORO RAMIREZ	
CONTRATISTA		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ	
LUGAR DE EJECUCIÓN		MANZANARES, CALDAS	
FECHA		16/04/2026	

PRESUPUESTO OFICIAL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			ACTA MODIFICATORIA N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL	(+/-)	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.01	EXCAVACIONES EN MATERIALES VARIOS	M3	24.75	\$ 80,350.00	\$ 1,988,663.00	+	35.85	\$ 2,880,641.60	60.60	\$ 4,869,304.10
1.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO.	M3	21.28	\$ 225,586.00	\$ 4,799,960.00	-	4.18	\$ -944,044.02	17.09	\$ 3,855,915.98
1.03	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN PLACAS, VIGAS Y CUNETAS.	M3	12.52	\$ 1,633,325.00	\$ 20,449,229.00	-	0.23	\$ -380,156.39	12.29	\$ 20,069,072.61
1.04	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA. INCLUYE PREPARACION E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ENROCADOS.	M3	3.00	\$ 924,000.00	\$ 2,772,000.00	+	0.15	\$ 138,600.00	3.15	\$ 2,910,600.00
1.05	SARDINEL EN CONCRETO CLASE D. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO. INCLUYE FORMALETA.	ML	62.00	\$ 114,004.00	\$ 7,068,248.00	+	5.64	\$ 642,982.56	67.64	\$ 7,711,230.56
1.06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI.	KG	143.47	\$ 13,900.00	\$ 1,994,261.00	+	45.10	\$ 626,873.82	188.57	\$ 2,621,134.62
1.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM X 5MM.	M2	100.91	\$ 47,860.00	\$ 4,829,553.00	-	52.60	\$ -2,517,196.70	48.32	\$ 2,312,355.90
1.08	SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHICULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	TON	82.56	\$ 62,057.00	\$ 5,123,426.00	-	7.21	\$ -447,699.69	75.35	\$ 4,675,726.23
COSTO TOTAL					\$ 49,025,340.00				\$	49,025,340.00

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 49,025,340.00
VALOR ACTA MODIFICATORIA	\$ 49,025,340.00
VALOR ACTA N°1 Y FINAL	\$ 49,025,340.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ -
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100.00%



 ING. DIEGO TORO RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ
 CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS



PREACTAS

Contratista:	CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ					
Objeto:	CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS					
Item	Unidad	Descripción	Acta			Fecha
1.01	M3	EXCAVACIONES EN MATERIALES VARIOS	ACTA MODIFICATORIA N°1			16/04/2026
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Ancho/Altura(m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Nivelación área placa huella	2.80	0.30	28.00	1.00	23.52
2	Excavación Riostra	0.20	0.30	2.80	10.00	1.68
3	Excavación dentellón 1	2.80	0.30	2.17	1.00	1.82
4	Excavación dentellón 2	2.80	0.30	1.65	1.00	1.39
5	Remoción de derrumbe en K 0+015	2.10	1.95	5.80	1.00	23.75
6	Remoción de derrumbe en K 0+0 22	1.50	1.88	3.00	1.00	8.44
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ				
Total Item Acumulado					60.60	

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS



PREACTAS

Contratista: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.02	M3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO.	ACTA MODIFICATORIA N°1	16/04/2026

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1	Nivelación área placa huella	2.80	0.15	28.00	1.00	11.76
2	Excavacion Riostra	0.20	0.15	2.80	10.00	0.84
3	Excavación dentellón 1	2.80	0.15	2.17	1.00	0.91
4	Excavación dentellón 2	2.80	0.15	1.65	1.00	0.69
5	Afirmado en curva para ingreso de material a obra por mal tiempo (reeplanteo)	2.80	0.15	6.88	1.00	2.888
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

CONTRATISTA


SUPERVISOR

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

ING. DIEGO TORO RAMIREZ

Total Item Acumulado

17.09

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PREACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta		Fecha	
1.03	M3	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN PLACAS, VIGAS Y CUNETAS.	ACTA MODIFICATORIA N°1		16/04/2026	
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Cinta huella derecha subiendo	0.75	0.15	28.00	1.00	3.150
2	Cinta huella izquierda subiendo	0.85	0.15	28.00	1.00	3.570
3	Viga Riostra	0.20	0.30	2.80	10.00	1.680
4	Cuneta	0.45	0.15	33.82	1.00	2.283
5	Dentellón 1	2.80	0.15	2.17	1.00	0.911
6	Dentellón 2	2.80	0.15	1.65	1.00	0.693
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ		Total Item Acumulado		12.29


ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS






PREACTAS

Contratista: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta			Fecha	
1.04	M3	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ENROCADOS.	ACTA MODIFICATORIA N°1			16/04/2026	
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total	
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)			
1	Enrocado central placa huella	0.75	0.15	28.00	1.00	3.15	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
CONTRATISTA		SUPERVISOR					
							
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ			Total Item Acumulado	3.15	

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PREACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta		Fecha	
1.05	ML	SARDINEL EN CONCRETO CLASE D. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO. INCLUYE FORMALETA.	ACTA MODIFICATORIA N°1		16/04/2026	
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Sardinel placa huella			33.82	2.00	67.640
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ			Total Item Acumulado 67.64	

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PRACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta		Fecha	
1.06	KG	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI.	ACTA MODIFICATORIA N°1		16/04/2026	
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Diametro mm ó pulg	Peso Kg/m2 ó kg/ml	Área (m2) ó Longitud (ml)		
1	Acero Rlostras					
2	Acero Longitudinal	3/8	0.56	3.60	11.20	22.58
3	Flejes	3/8	0.56	0.6	180.00	60.48
4	Acero bastones bordillo	3/8	0.56	0.30	225	37.88
5	Acero longitudinal bordillo	1/2	0.9999	33.82	2.00	67.63
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ		Total Item Acumulado		188.57

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS



PREACTAS

Contratista: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.07	M2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM X 5MM.	ACTA MODIFICATORIA N°1	16/04/2026

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Malla electrosoldada para cuneta	0.45		33.82	1.00	15.22
2	Malla electro soldada para cintas	0.80		28.00	1.00	22.40
3	Malla electrosoldad para dentellón 1	2.8		2.17	1.00	6.08
4	Malla electrosoldad para dentellón 2	2.80		1.65	1.00	4.62
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

ING. DIEGO TORO RAMIREZ

48.32


ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS



PREACTAS

Contratista: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta				Fecha	
1.08	TON	SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	ACTA MODIFICATORIA N°1				16/04/2026	
No.	Localización / Descripción		Dimensiones promedio				N° Elementos	Medida Total
			Área (m2)	Volumen (m3)	Peso (Ton)	Longitud (m)		
1	ITEM 1.02 AFIRMADO			17.09	2.10		1.00	35.90
2	ITEM 1.03 CONCRETO CLASE D			12.29	2.70		1.00	33.18
3	ITEM 1.04 CONCRETO CLASE G			3.15	1.90		1.00	5.99
4	ITEM 1.05 ACERO DE REFUERZO				0.19		1.00	0.19
5	ITEM 1.06 MALLA ELECTROSOLDADA		48.32		0.0021		1.00	0.10
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
CONTRATISTA			SUPERVISOR					
								
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ			INQ. DIEGO TORO RAMIREZ				Total Item Acumulado	75.35

ACTA N°1

Y

FINAL

ALCALDIA DE MANZANARES, CALDAS

CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

SUPERVISOR

CONTRATISTA

LUGAR DE EJECUCIÓN

FECHA

ING. DIEGO TORO RAMIREZ

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

MANZANARES, CALDAS

23/04/2026

PRESUPUESTO OFICIAL					MAYORES Y MENORES CANTIDADES			ACTA MODIFICATORIA N°1		ACTA N°1 Y FINAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL	(+/-)	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.01	EXCAVACIONES EN MATERIALES VARIOS	M3	24.75	\$ 80.350.00	\$ 1.988.663.00	+	35.85	\$ 2.880.641.60	60.60	\$ 4.869.304.10	60.60	\$ 4.869.304.10
1.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO.	M3	21.28	\$ 225.586.00	\$ 4.798.960.00	-	4.18	\$ -944.044.02	17.09	\$ 3.855.915.98	17.09	\$ 3.855.915.98
1.03	PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN PLACAS, VIGAS Y CUNETAS.	M3	12.52	\$ 1.633.325.00	\$ 20.449.229.00	-	0.23	\$ -380.156.39	12.29	\$ 20.069.072.61	12.29	\$ 20.069.072.61
1.04	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ENROCADOS.	M3	3.00	\$ 924.000.00	\$ 2.772.000.00	+	0.15	\$ 138.600.00	3.15	\$ 2.910.600.00	3.15	\$ 2.910.600.00
1.05	SARDINEL EN CONCRETO CLASE D. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO. INCLUYE FORMALETA.	ML	62.00	\$ 114.004.00	\$ 7.068.248.00	+	5.64	\$ 642.982.56	67.64	\$ 7.711.230.56	67.64	\$ 7.711.230.56
1.06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI.	KG	143.47	\$ 13.900.00	\$ 1.994.261.00	+	45.10	\$ 626.873.82	188.57	\$ 2.621.134.62	188.57	\$ 2.621.134.62
1.07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM X 5MM.	M2	100.91	\$ 47.860.00	\$ 4.829.553.00	-	52.60	\$ -2.517.196.70	48.32	\$ 2.312.355.90	48.32	\$ 2.312.355.90
1.08	SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHICULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	TON	82.56	\$ 62.057.00	\$ 5.123.426.00	-	7.21	\$ -447.698.69	75.35	\$ 4.675.726.23	75.35	\$ 4.675.726.23
COSTO TOTAL					\$ 49,025,340.00				\$	49,025,340.00	\$	49,025,340.00


RESUMEN FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 49,025,340.00
VALOR ACTA MODIFICATORIA	\$ 49,025,340.00
VALOR ACTA N°1 Y FINAL	\$ 49,025,340.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ -
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100.00%


ING. DIEGO TORO RAMIREZ


SUPERVISOR

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PREACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta			Fecha
1.01	M3	EXCAVACIONES EN MATERIALES VARIOS	ACTA N°1 Y FINAL			23/04/2026
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Ancho/Altura(m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Nivelación área placa huella	2.80	0.30	28.00	1.00	23.52
2	Excavacion Rlostra	0.20	0.30	2.80	10.00	1.68
3	Excavación dentellón 1	2.80	0.30	2.17	1.00	1.82
4	Excavación dentellón 2	2.80	0.30	1.65	1.00	1.39
5	Remoción de derrumbe en K 0+015	2.10	1.95	5.80	1.00	23.75
6	Remoción de derrumbe en K 0+0 22	1.50	1.88	3.00	1.00	8.44
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ			Total Item Acumulado	60.60

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PREACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta			Fecha
1.02	M3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO.	ACTA N°1 Y FINAL			23/04/2026
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1	Nivelación área placa huella	2.80	0.15	28.00	1.00	11.76
2	Excavacion Riostra	0.20	0.15	2.80	10.00	0.84
3	Excavación dentellón 1	2.80	0.15	2.17	1.00	0.91
4	Excavación dentellón 2	2.80	0.15	1.65	1.00	0.69
5	Afirmado en curva para ingreso de material a obra por mal tiempo (reeplanteo)	2.80	0.15	6.88	1.00	2.888
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ			Total Item Acumulado 17.09	

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PREACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta			Fecha
1.03	M3	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN PLACAS, VIGAS Y CUNETAS.	ACTA N°1 Y FINAL			23/04/2026
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Cinta huella derecha subiendo	0.75	0.15	28.00	1.00	3.150
	Cinta huella izquierda subiendo	0.85	0.15	28.00	1.00	3.570
2	Viga Riostra	0.20	0.30	2.80	10.00	1.680
3	Cuneta	0.45	0.15	33.82	1.00	2.283
4	Dentellón 1	2.80	0.15	2.17	1.00	0.911
5	Dentellón 2	2.80	0.15	1.65	1.00	0.693
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ			Total Item Acumulado	12.29

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS



PREACTAS

Contratista: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.04	M3	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ENROCADOS.	ACTA N°1 Y FINAL	23/04/2026

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Enrocado central placa huella					
2		0.75	0.15	28.00	1.00	3.15
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

CONTRATISTA


SUPERVISOR



CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ



ING. DIEGO TORO RAMIREZ

Total Item Acumulado

3.15

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PREACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta			Fecha
1.05	ML	SARDINEL EN CONCRETO CLASE D. INCLUYE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONCRETO. INCLUYE FORMALETA.	ACTA N°1 Y FINAL			23/04/2026
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Sardinel placa huella			33.82	2.00	67.640
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ			Total Item Acumulado	67.64

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PRACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta		Fecha	
1.06	KG	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI.	ACTA N°1 Y FINAL		23/04/2026	
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Diametro mm ó pulg	Peso Kg/m2 ó kg/ml	Área (m2) ó Longitud (ml)		
1	Acero Riostras					
2	Acero Longitudinal	3/8	0.56	3.60	11.20	22.58
3	Flejes	3/8	0.56	0.6	180.00	60.48
4	Acero bastones bordillo	3/8	0.56	0.30	225	37.88
5	Acero longitudinal bordillo	1/2	0.9999	33.82	2.00	67.63
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ			Total Item Acumulado	188.57

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS						
PREACTAS						
Contratista:		CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ				
Objeto:		CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS				
Item	Unidad	Descripción	Acta			Fecha
1.07	M2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM X 5MM.	ACTA N°1 Y FINAL			23/04/2026
No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Altura/Ancho (m)	Espesor (m)	Longitud (m)		
1	Malla electrosoldada para cuneta	0.45		33.82	1.00	15.22
2	Malla electro soldada para cintas	0.80		28.00	1.00	22.40
3	Malla electrosoldad para dentellón 1	2.8		2.17	1.00	6.08
4	Malla electrosoldad para dentellón 2	2.80		1.65	1.00	4.62
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
						
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ		ING. DIEGO TORO RAMIREZ				48.32


ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS



PREACTAS

Contratista: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta				Fecha	
1.08	TON	SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	ACTA N°1 Y FINAL				23/04/2026	
No.	Localización / Descripción		Dimensiones promedio				N° Elementos	Medida Total
			Área (m2)	Volumen (m3)	Peso (Ton)	Longitud (m)		
1	ITEM 1.02 AFIRMADO			17.09	2.10		1.00	35.90
2	ITEM 1.03 CONCRETO CLASE D			12.29	2.70		1.00	33.18
3	ITEM 1.04 CONCRETO CLASE G			3.15	1.90		1.00	5.99
4	ITEM 1.05 ACERO DE REFUERZO				0.19		1.00	0.19
5	ITEM 1.06 MALLA ELECTROSOLDADA		48.32		0.0021		1.00	0.10
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
CONTRATISTA			SUPERVISOR					
								
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ			ING. DIEGO TORO RAMIREZ				Total Item Acumulado	75.35

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: **15.985.491**
 NOMBRE: **HURTADO JIMENEZ**

APELLIDOS: **CARLOS EDOARDO**

SEXO: **M**

FECHA DE EMISIÓN: **10-SEP-1959**

LUGAR DE EMISIÓN: **MANZANARES (CALDAS)**

ESTADURA: **1.65**

G.S. RH: **O+**

SEXO: **M**

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: **05-ENE-1979 MANZANARES**

REGISTRADOR NACIONAL: **ALEXANDER VERA RUCHA**

A-0905500-01135754-M-0015985491-20200302

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1959**
MANZANARES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **M**

ESTADURA **G.S. RH** **SEXO**

05-ENE-1979 MANZANARES

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VERA RUCHA

INDICE DERECHO

A-0905500-01135754-M-0015985491-20200302

0070387357A 2 **51313150**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141105242987



(415)7707212489984(8020) 0000141105242987

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

1 5 9 8 5 4 9 1

4

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

24. Tipo de contribuyente

IDENTIFICACIÓN

Persona natural o sucesión líquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

1 5 9 8 5 4 9 1

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

29. Departamento

Caldas

30. Ciudad/Municipio

Manzanares

4 3 3

31. Primer apellido

HURTADO

32. Segundo apellido

JIMENEZ

33. Primer nombre

CARLOS

34. Otros nombres

EGDARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

38. País

COLOMBIA

UBICACIÓN

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

Manzanares

4 3 3

Dirección principal

CALLE MILENIO III 3 B 34

42. Correo electrónico dykaroscolombia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 3 6 8 4 7 5 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos SI ☐ NO ☒

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2024 - 08 - 08 / 18 : 34 : 25

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

ING. DIEGO TORO RAMIREZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

Manzanares, Caldas

ASUNTO: Referencia de los profesionales solicitados en invitación pública – Proceso IPMC-035-2026

Cordial saludo,


Por medio de esta comunicación, y conforme a los requisitos especificados en el pliego de condiciones del proceso de invitación pública de mínima cuantía **IPMC-035-2026**, cuyo objeto es **“CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.”** procedo a presentar los profesionales que integran el equipo propuesto para llevar a cabo esta obra, cumpliendo con todos los perfiles y requisitos establecidos en la invitación pública.

a. Requisitos del personal					
Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia					
Profesional Ofrecido para el Cargo	Cantidad de profesionales requeridos	% Dedicación	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica	Formación académica
Ingeniero Civil	1	50	Tres (3) años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	Experiencia en mejoramiento de vías y/o construcciones de placa huellas	Pregrado
Maestro de Obra	1	100	Diez (10) años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	Experiencia en construcción placa huella	Técnico Profesional

NOMBRE	CÉDULA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
JHONATHAN ADNÉRÉS CARMONA MIRANDA	1.006.165.522	051037-0751545 CLD	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ	15.985.491	17420-06302	MAESTRO DE OBRA > 08 AÑOS EXP.

Los documentos soporte correspondientes a las hojas de vida, certificaciones laborales y matrículas profesionales han sido adjuntados a la presente comunicación para su respectiva revisión y validación.

Cordialmente,

**CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ**

Contratista

SOBRE MÍ

Poseo un amplio conocimiento en la ejecución de obras civiles, lo cual me permite abordar proyectos con una perspectiva integral y eficiente, garantizando resultados de alta calidad y cumplimiento de los estándares más exigentes del sector. Mi experiencia se traduce en una gestión efectiva y una ejecución técnica precisa, asegurando la satisfacción de los objetivos planteados.

EDUCACIÓN

**TÍTULO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**
INSTITUTO MANZANARES /
MANZANARES, CALDAS /

Hasta grado 9°

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

CONTRATISTA-MAESTRO DE OBRAS CIVILES



MANZANARES, 173020



3106279021



DYKAROSCOLOMBIA@GMAIL.COM

EXPERIENCIA LABORAL

ALCADA DE
MANZANANRES
Manzanares, Caldas
1998 - 2025

CONTRATISTA-MAESTRO DE OBRAS CIVILES

- Gestión de proyectos de obras civiles en colaboración con la Alcaldía Municipal, asegurando la correcta ejecución y entrega de infraestructuras públicas.
- Supervisión del mantenimiento de puentes, garantizando su seguridad y funcionalidad para la comunidad.
- Liderazgo en mejoramientos viales, contribuyendo a la optimización de la movilidad urbana y rural.
- Coordinación de actividades de reparcho, mejorando la calidad de las carreteras y caminos para un tránsito seguro.
- Dirección de proyectos de mejoramiento de vivienda, elevando el estándar de habitabilidad y confort para los residentes.
- Implementación de medidas para la estabilidad de taludes, previniendo deslizamientos y protegiendo zonas de riesgo.
- Ejecución de obras de mitigación de riesgo, fortaleciendo la resiliencia de la infraestructura frente a eventos naturales adversos.

COINTPRO
INGENIERIA S.A.S
MANZANARES,
CALDAS
2023 - 2024

MAESTRO DE OBRA

- Dirigí proyectos de estabilización de terrenos, contribuyendo a la prevención de deslizamientos y mejorando la seguridad de la comunidad.
- Coordiné iniciativas de mejoramiento de viviendas, elevando la calidad de vida de los habitantes y fortaleciendo la infraestructura local.
- Supervisé obras de mejoramiento vial, optimizando la conectividad y accesibilidad en el municipio de Manzanares.
- Administré recursos y materiales de construcción, asegurando la eficiencia y la calidad en la ejecución de las obras.
- Colaboré con equipos multidisciplinarios, fomentando un ambiente de trabajo cooperativo y eficiente en la gestión de proyectos.
- Implementé normativas de seguridad en obra, garantizando el cumplimiento de estándares y la integridad del personal a cargo.

ANTONIO GOMEZ
MANZANARES,
CALDAS
2021 - 2021

MAESTRO OBRA

- Supervisión de la construcción del edificio para tienda D1 en Manzanares, Caldas, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
- Coordinación de equipos de trabajo para la ejecución eficiente de las tareas asignadas, optimizando recursos y tiempo.

VICTOR HUGO
HERNANDEZ
2022 - 2023

JR CONTUCCONES
S.A.S
BOGOTÁ D.C

Control y seguimiento de la programación de obra, garantizando el avance según el cronograma establecido.

- Gestión de materiales y herramientas necesarias para la construcción, manteniendo un inventario adecuado y evitando retrasos en la obra.
- Implementación de medidas de seguridad en el sitio de construcción para proteger la integridad del personal y la infraestructura.
- Colaboración con Ingenieros y arquitectos para resolver problemas técnicos y asegurar la calidad en la ejecución de la obra.
- Mantenimiento de comunicación efectiva con todos los niveles del equipo de construcción y con los proveedores de servicios y materiales.

● MAESTRO DE OBRA

- Supervisión y coordinación de las actividades de construcción en el proyecto de edificio residencial en Manzanares, Caldas.
- Aseguramiento del cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las distintas etapas de la obra.
- Gestión de equipos de trabajo, fomentando un ambiente laboral seguro y productivo.
- Control de calidad de los materiales y procesos constructivos para garantizar la integridad estructural y el cumplimiento de las normativas vigentes.
- Resolución de problemas técnicos en obra, aplicando conocimientos de ingeniería y construcción.
- Colaboración con arquitectos, ingenieros y otros profesionales para la correcta interpretación de planos y especificaciones técnicas.
- Supervisión del mantenimiento de maquinaria y herramientas utilizadas en la construcción, asegurando su óptimo funcionamiento.
- Implementación de medidas de seguridad en el sitio de construcción para proteger al personal y prevenir accidentes.
- Comunicación efectiva con proveedores para la adquisición de materiales y gestión de entregas en tiempo y forma.

● MAESTRO OBRA

- Participación activa en la construcción de edificación residencial en Bogotá, con un total de 60 apartamentos.
- Colaboración en todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución y finalización de la obra.
- Coordinación de equipos de trabajo para garantizar el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad.
- Supervisión de la correcta implementación de planos y especificaciones técnicas en la construcción.
- Manejo de recursos y materiales para asegurar la eficiencia y la economía en la ejecución del proyecto.
- Cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, manteniendo un entorno seguro para el personal.
- Resolución de problemas y desafíos técnicos surgidos durante la construcción para evitar retrasos en la entrega.



Jhonatan Andres Carmona Miranda

Ingeniero civil
Esp, vias y transporte

CONTACTO

3214252253
Cc. 1.006.165.522
carmonamirandaj@gmail.com
www.linkedin.com/in/jacarmonaing

REFERENCIAS

Sandra Rodriguez
IDirectora de obras, ecosoluciones
3214679059

Juan Camilo Barrera
Ingeniero, Genesis estructuras
3188573971

HABILIDADES

- Liderazgo
- Comunicación
- Toma de decisiones
- Gestión del tiempo
- Trabajo en equipo
- Pensamiento estratégico

IDIOMAS

Español
Inglés

SOBRE MÍ

Ingeniero Civil con experiencia en la ejecución, supervisión y control de obras de infraestructura y edificaciones. Especializado en la coordinación de actividades en campo, manejo de contratistas, control de calidad de materiales y cumplimiento de cronogramas de obra.

EXPERIENCIA

Enero 2024 -
Abril 2024

Residente de obra - Ecosoluciones S.A.S

- Supervision y coordinacion de actividades diarias en obra
- Control de cronogramas, gestion de recursos resolucion de problemas en obra

Mayo 2024 -
Septiembre 2024

Director de obra - EcoSoluciones S.A.S

- Supervision y coordinacion de obras
- Gestion de recursos humanos, materiales y financieros
- Gestion de contratistas, proveedores y clientes

Octubre 2024 -
Noviembre 2024

Inspector de obra - Consorcio Gamavivienda

- Inspeccion tecnica, administrativa y financiera de la construccion de 44 casas cafeteras en todo el departamento de Caldas

Noviembre 2024 -
Abril 2025

Ingeniero de proyectos - Genesis estructuras S.A.S

- Ejecucion de 320m de pavimento en Manzanares, Caldas
- Ejecucion de 600m de placa huella en Pensilvania, Caldas
- Remodelacion y adecuacion de la plaza de mercado de Norcasia, Caldas
- Formulacion y estructuracion de proyectos

CURSOS Y CERTIFICACIONES

2016

Bachiller academico
Escuela Normal Superior de villahermosa Tolima

2021

Pregrado - Ingeniero civil
Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales

2022

Posgrado - Especialista en vias y transporte
Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2026-04-17, 03:53:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 15985491
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	85107079
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	232387258
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 621.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.215.61

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 218.900	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 121.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 621.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 621.000





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2026-03-17, 05:34:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 15985491
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84395266
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	137141543
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 621.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.215.61

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 218.900	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 121.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 621.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 621.000





Manizales, Caldas, 14 de enero de 2025

Carta de Certificación Laboral

A quien corresponda:

Por medio de la presente, el suscrito **Diego Alonso Rojas Páez**, identificado con cédula de ciudadanía No. **88256702** de Cúcuta, en mi calidad de representante legal del **Consortio Mejoramiento Vial Filadelfia**, certifico que el **Ingeniero Jhonatan Andrés Carmona Miranda**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1006165522** de Villahermosa, Tolima, prestó sus servicios profesionales en las diferentes etapas constructivas de la obra localizada en la vereda Samaria del municipio de Filadelfia, Caldas.

El ingeniero laboró de manera activa desde el mes de mayo hasta el mes de octubre del año 2024, cumpliendo un periodo de **seis (6) meses**. Durante este tiempo, desempeñó labores relacionadas con la supervisión, inspección técnica y gestión de las actividades constructivas, demostrando responsabilidad, compromiso y profesionalismo en sus funciones.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Cordialmente,

DIEGO ALONSO ROJAS PAEZ

Consortio Mejoramiento Vial Filadelfia

NIT. 901682079-5 CR 24A # 69A -11 AP 201 BARRIO PALERMO Tel: 3125570759

Email: gerencia@ecosolucionessas.page

Manizales, Caldas (Colombia)

Manzanares caldas, 15 de Julio de 2024

CERTIFICADO LABORAL


Certifico que el señor **JHONATAN ANDRES CARMONA MIRANDA**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.006.165.522 de Villahermosa, presto sus servicios como **INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA**, en la construcción del proyecto inmobiliario denominado "EDIFICIO AVELLANA", desde el 15 de Enero de 2024 hasta el 15 de Julio de 2024, desempeñando las siguientes funciones:

- Dirigir la ejecución de la obra, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.
- Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra.
- Coordinar al personal que tenga relación directa con la obra
- Hacer oportunamente los requerimientos de material y elaborar reportes de avances de ejecución

El señor JHONATAN ANDRES CARMONA MIRANDA desempeñó sus funciones en el proyecto de construcción del edificio, cumpliendo con las responsabilidades propias de su cargo con profesionalismo y compromiso.

Este certificado se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Atentamente,


CRISTIAN CAMILO GARZON MARIN
Propietario
Tel: 3232242625
EDIFICIO AVELLANA



Digitally signed by: e-TITULO - U

Date: 26 abr. 2024 04:49:42 UT

<https://etitulo.com/validate/v/032>

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional



La Universidad Nacional de Colombia


Confiere el Título de
Ingeniero Civil

a
Jhonatan Andres Carmona Miranda

C.C. 1.006.165.522 de Villahermosa

quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos
En testimonio de ello, y previa toma del juramento de rigor,

DIPLOMA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES
FACULTAD DE

Ingeniería y Arquitectura

ACTA DE GRADO NÚMERO 7536

El Consejo de Facultad en su sesión del día 27 de febrero de 2024 - Acta No. 07

CONSIDERANDO QUE

Jhonatan Andres Carmona Miranda

C.C. 1.006.165.522 de Villahermosa

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 198004 consignado en el Registro No. 7632, Folio 10 del Libro 8
En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Manizales, a los 27 días del mes de febrero de 2024

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad




Digitally signed by: e-TITULO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -

Date: 26 abr. 2024 04:49:18 UTC

<https://etitulo.com/validate/v/75BBEAC4-AC59-49C3-80ED-7EFC8F55D18B>

SECRETARÍA
Consejo de Facultad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES
FACULTAD DE

Ingeniería y Arquitectura

ACTA DE GRADO NÚMERO 3431

El Consejo de Facultad en su sesión del día 12 de noviembre de 2024 - Acta No. 51

CONSIDERANDO QUE

Jhonatan Andres Carmona Miranda

C.C. 1.006.165.522 de Villahermosa

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Especialista en Vías y Transporte

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 76747 consignado en el Registro No. 3436, Folio 30 del Libro 4

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Manizales, a los 12 días del mes de noviembre de 2024

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad



Digitally signed by: e-TÍTULO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -

Date: 22 nov. 2024 19:03:07 UTC

<https://etitulo.com/validate/v/FAA5C256-47C1-4B15-9602-1255438A2556>

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

CÉDULA DE
CIUDADANÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.006.165.522

Apellidos

CARMONA MIRANDA

Nombres

JHONATAN ANDRES

Nacionalidad

COL

Estatura

1.72

Sexo

M

Fecha de nacimiento

04 MAYO 2000 O+

Lugar de nacimiento

VILLAHERMOSA (TOLIMA)


Fecha y lugar de expedición

10 MAYO 2018, VILLAHERMOSA


Firma

Fecha de expiración


26 SEPT 2033



069706820



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL028904690029124<<<<<<<<
0005049M3309265COL1006165522<6
CARMONA<MIRANDA<<JHONATAN<ANDR

Resolución R2024054863
del 11/12/2024


 COPNIA
Consejo Profesional de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL

JHONATAN ANDRES CARMONA MIRANDA

ID 1006165522

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA





MATRICULA PROFESIONAL

051037-0751545 CLD

https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/WaterMarkmethod?CertificateNumber=051037-0751545%20CLD


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4419073

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JHONATAN ANDRES CARMONA MIRANDA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1006165522, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 051037-0751545 CLD desde el 11 de Diciembre de 2024, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2024054863.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Abril del año dos mil veintiseis (2026).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Se certifica que JHONATAN ANDRES CARMONA MIRANDA identificado(a) con CC 1006165522 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA NI 75106064																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																
										Ing	ret	tde	tde	top	asp	vsp	cor	ast	sin	ige	lm	vac	ava	vct	ir	rip
9501440793	139756137	E	2026-03-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	15	X	X															
9501440793	139756137	E	2026-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	15	X	X															
9501440793	139756137	E	2026-03-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	15	X	X															
9501440793	139756137	E	2026-03-16	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	15	X	X															
9501440793	139756137	E	2026-03-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	15	X	X															
9501440793	139756137	E	2026-03-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	15	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 12:04.

Manzanares, Caldas

30 de marzo de 2026

ING. DIEGO TORO RAMIREZ

Secretario de Planeación e Infraestructura
Manzanares, Caldas

ASUNTO: Relación de maquinaria y equipos a utilizar durante la ejecución de obras dentro del proceso IPMC-035-2026

Cordial saludo,


Mediante este documento, en nuestra calidad de contratistas responsables del proceso IPMC-035-2026, deseamos informarle sobre los equipos y maquinaria que emplearemos durante la ejecución del contrato, conforme a las especificaciones detalladas en la convocatoria pública:

- (1) Concretadora
- (1) Volqueta con capacidad de 7 metros cúbicos
- (1) Rana compactadora

Nos comprometemos a garantizar que todo el equipo mencionado cumpla con las especificaciones técnicas necesarias para la correcta realización de las obras correspondientes al contrato mencionado.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir en relación con este asunto.

Cordialmente,



CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ

Contratista

ING.
DIEGO TORO RAMIREZ
Secretario de planeación e Infraestructura
Manzanares, caldas

Manzanares, Caldas 30 de marzo de 2026

Referencia: Contrato de Obra IPMC-035-2026

Asunto: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)-IPMC-035-2026

Cordial saludo;

Por medio del presente y en atención a lo requerido en el pliego de condiciones del proceso de invitación pública de mínima cuantía **IPMC-035-2026** cuyo objeto es **"CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS."**, me permito remitir PMT correspondiente a la obra en asunto;

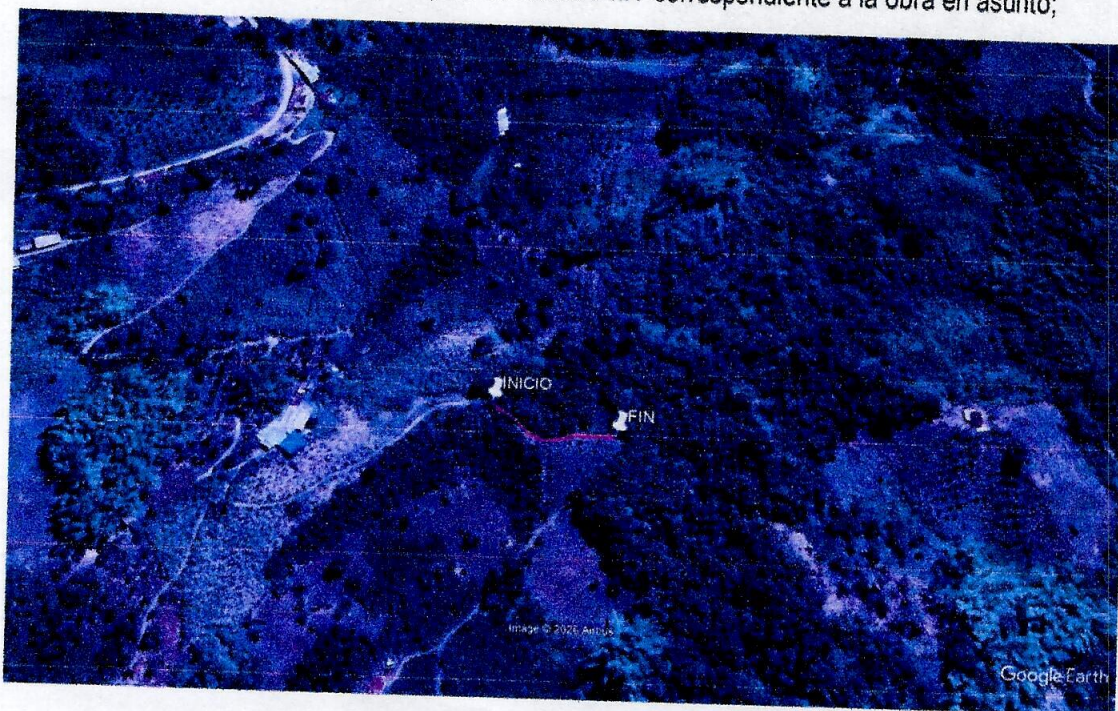


Ilustración 1. 75° 9'28.02"O-5°14'4.66"N

Con la presente solicitud anexamos planos y formulario resumen de plan de manejo de tránsito aplicable a la obra.

Cordialmente,

CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ
Contratista

ALCALDIA DE MANZANARES SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		
HOJA 1/2		
"CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ROMERAL, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS."	CONTRATISTA: CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ	No. CELULAR: 3106279021 No. OFICINA:
CONTRANTE ALCALDIA MUNICIPAL	SUPERVISIÓN SECRETARIA PLANEACIÓN E INF	No. CELULAR:
LOCALIZACION DE LA OBRA: ROMERAL		
DESCRIPCION DE LA OBRA: PLACA HUELLA		
REQUIERE LICENCIA EXPEDIDA POR PLANEACIÓN MUNICIPAL: NO ☒ SI ☐ RESOLUCION N°		
TIPO DE LICENCIA:		
JERARQUIA DE LA VIA: PRINCIPAL ☐ COLECTORA ☐ SECUNDARIA ☒ LOCAL ☐	NUMERO DE CARRILES: 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ MAS ☐	SENTIDO DE CIRCULACION: UN SENTIDO ☐ DOBLE SENTIDO ☒
LOCALIZACION DE LA OBRA: CALZADA ☐ EN UN COSTADO ☐ ANDEN ☐ EN EL CENTRO ☐ ZONA VERDE ☐ EN TODA LA SECCION ☒	ANCHO APROXIMADO (MTS): CALZADA 3.6 ANDENES 0 ZONA VERDE	ANCHO A UTILIZAR (MTRS): CALZADA 3.6 ANDENES 0 ZONA VERDE
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS ALTO ☐ MEDIO ☐ BAJO ☒	LONGITUD DE LA VIA A OCUPAR Y/O A INTERVENIR 30 METROS	HORARIO DE TRABAJO 7:00 AM A 5:00 PM
FLUJO VEHICULAR: ALTO ☐ MEDIO ☐ BAJO ☒	TRANSPORTE PUBLICO: SI ☐ NO ☒	REQUIERE CIERRE: PARCIAL ☐ TOTAL ☒
SE AFECTA LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE: HORIZONTAL SI ☐ NO ☒ VERTICAL SI ☐ NO ☒		
FECHA DE INICIACIÓN PMT 30-mar	TIEMPO DE EJECUCION 45 DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN 11 DE MAYO 2026
YO, CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ IDENTIFICADO CON C.C. No.: 15,985,491 Manifiesto que conozco la LEY 1383 de 2.010 , "Por la cual se Reforma la Ley 769 DE 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones", la cual entre otras normas, establece: "ARTÍCULO 19. El artículo 102 de la Ley 769 de 2.002, quedará así: Artículo 102. Manejo de escombros. Cada municipio determinará el lugar o lugares para la disposición final de los escombros que se produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos materiales se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será responsable del control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin perjuicio que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso público.		
Para constancia, se firma en Manzanares a 30 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026		
CARLOS EGDARDO HURTADO JIMENEZ CONTRATISTA		

ALCALDIA DE MANZANARES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

REPOSICION DE SEÑALES

DEBE REPONER SEÑALIZACIÓN VERTICAL AFECTADA
DEBE REPONER SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL AFECTADA
ESPECIFICACIONES SEÑALIZACIÓN A REPONER

SI

☐

NO

☒

MANEJO DEL TRANSPORTE EN GENERAL

REQUIEREN AUXILIARES DE TRANSITO

SI

☐

NO

☒

MANEJO DEL TRANSPORTE PUBLICO EN ZONAS URBANAS

REQUIEREN DESVIOS DE RUTAS
REQUIERE LA UBICACION DE PARADEROS TEMPORALES
REQUIERE SOLICITUD A LAS EMPRESAS DE REPROGRAMACIÓN DE LOS DESPACHOS

SI

☐

NO

☒

MANEJO DE PEATONES

REQUIERE CANALIZACIÓN DE PEATONES CON SEÑALIZACION HORIZ. Y VERTICAL
REQUIEREN AJUSTE LOS SEMAF. PEATON. O HABILITACIÓN DE FASES ESPECIALES

SI

☐

NO

☒

MANEJO DE VEHICULOS PESADOS

DEBE SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA OBRA Y TRANSPORTAR ESCOMBROS EN HORAS NO PICO DEL DIA
DEBE SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA OBRA EN HORAS DE LA NOCHE O DE LA MADRUGADA
DEBE TRANSPORTAR ESCOMBROS EN HORAS DE LA MADRUGADA
SITIO HABILITADO POR LA ALCALDIA PARA DEPOSITAR LOS ESCOMBROS:

SI

☐

NO

☒

NOTA: LA MOVILIZACION DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION SERA ACORDE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

INFORMACION Y DIVULGACION DEL PLAN

REQUIERE VALLAS INFORMATIVAS
REQUIERE PASAVIAS
REQUIERE AVISOS DE PRENSA
REQUIERE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO Y TELEVISION)
REQUIERE VOLANTES DE INFORMACION DE LA OBRA
REQUIERE VOLANTES DE DESVIOS Y CORTES DE SERVICIOS
REQUIERE SENSIBILIZACION CON LA COMUNIDAD

SI

☐

NO

☒☐☒☐☒☐☒☐☒

OBSERVACIONES:

REQUIERE REGULACION:

SI

☐

NO

☒

SEÑALES REQUERIDAS:

Ver planos adjuntos

ELABORÓ:

JHONATHAN CARMONA M.

FECHA:

30/03/2026




Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-17, 05:19:23 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	LUIS ALVARO OLAYA ARANGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 75071972
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84395249
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	137141528
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 621.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.215.61

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 218.900	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 121.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 621.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 621.000





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-17, 05:13:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	JHON JAIRO OBANDO JIMENEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 15991445
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84395243
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	137141522
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 621.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.215.61

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 218.900	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 121.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 621.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 621.000





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-17, 05:23:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	GILBERTO GALLEG0
CEDULA CIUDADANIA	CC 15987165
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84395251
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	137141534
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 621.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.215.61

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 218.900	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 121.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 621.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 621.000

