

Continuación Informe de Intervención
B=N

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 08"

Fecha: Octubre de 2022

Versión: 01

Página: 45



Adecuación y Nivelación de Media Banca



Excavación del Box #2 y Mejoramiento

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 08"

Fecha: Octubre de 2022

Versión: 01

Página: 46

12.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Foto GSST1. Evidencia de barrera en zona restringida por el SGSST



Foto GSST2. Evidencia de uso de EPP



Foto GSST3. Evidencia de instalación de delimitación de material para obra



Foto GSST6. Evidencia de señalizaciones en obra

9609

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 08"

Fecha: Octubre de 2022

Versión: 01


Página: 47

13. APROBACIONES Y CAMBIOS

VERISIÓN: 01 – Elaboración de documento

Fecha de aprobación: Agosto 22 de 2023

Elaboró:


INGENIERO AMBIENTAL

Aprobó:

Directora de obra


Contrato de obra N° LP/SPM-012-2022

CONSTRUCCIONES AP

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 08"

Fecha: Octubre de 2022

Versión: 01

Página: 48

14. ANEXOS

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PRELIMINARES

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No. LP.SPM-0.12-2022 Nombre del Contrato: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS MR Interventor: CONSULTORES DONOVAN

SASValor del contrato de construcción: \$9.691.701.283,00

Valor del Plan de Manejo Ambiental y de Gestión Social: \$ 133.790.267,00

Fecha de inicio: 22-09-23 Fecha de terminación:

Licencia Ambiental: Licencias ambientales de las Canteras donde provienen los materiales pétreos.

Otros permisos: Ocupación de cause para la construcción del puente y box coulverts

Aprobación del diseño paisajístico. Fecha: ____ N/A ____ Acta No. ____ N/A ____

Aprobación del plan de contingencias. Fecha: ____ N/A ____ Acta No. ____ N/A ____

Manejo de Escombros:

Escombrera	Localización	Licencia ambiental	Anexo Rutas transporte
Se levanto acta con los gestores ambientales de la vereda Maracayo, con lo cual se acordó entregar a la comunidad los escombros.	Plaza principal vereda maracayo	N/A	N/A

Proveedores de Materiales de Construcción:

Proveedor	Localización	Licencia ambiental	Anexo rutas transporte
Cantera la Fontana	Montería, Córdoba	RESOLUCION N°1-6511	N/A

Anexar Cronograma detallado de obra.

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PRELIMINARES

(Continuación)

CAMPAMENTOS

Tipo y número de campamentos: Campamento temporal de 600m2 de área ubicado sobre la margen izquierda de la abscisa K1+650

Direcciones: K1+650

Obtención de agua potable: Acueducto vereda maracayo

Permisos de vertimientos de aguas residuales: N/A

Nº. De baños: No se evidencia Nº. De baños portátiles en obra; No hay baños portátiles.

Predios a adquirir

Anexar listado, características y costos de los predios.

Anexos:

1. Hojas de vida del residente y especialista ambiental y social de obra y de interventoría.
2. Cuadro de costos del Plan de Manejo Ambiental.
3. Plano en planta de la obra.
4. Plano de localización del proyecto.
5. Permiso de escombrera y proveedores ó en su defecto certificación de Inscripción al directorio.
6. Plano con las rutas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción.
7. Plano de campamento.
8. Anexo fotográfico.
9. Cronograma de actividades.
10. Plan de Manejo de Tráfico, aprobación del PMT.
11. Plan de desvíos, rutas y accesos temporales.
12. Planos de señalización de frentes de trabajo.
13. Diseño paisajístico.

Cargo	Profesión	Nombre	Identificación
DIRECTOR DE OBRA	Ingeniero Civil	Santiago sanchez P.	1067912244
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil	Hugo Antonio Argumedo Miranda	1003050039
ESPECIALISTA VIAS	Ingeniero civil	Margarita mejia B.	42764982
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ingeniero Ambiental	Ana Maria Paternina	1067945898
ESPECIALISTASG-SST	INGENIERO INDUSTRIAL	Jovana Gonzalez Mendoza	1102813446

9607

TRABAJADORA SOCIAL	Trabajadora social	Eliana Patricia Flores Hernández	50934894
INSPECTOR DE OBRA	Ingeniero civil	Elían Andrés Padilla Carrascal	1007675925

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PRELIMINARES

(Continuación)

RESUMEN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Dirección punto de atención al ciudadano: Ubicado sobre el margen izquierdo de la vía en abscisa K1+650Tel:
N/A

No. de reuniones programadas N.A Tipo N.A

No. de volantes de inicio de obra: Se realizó entrega de volantes sobre las viviendas levantadas a lo largo del proyecto (Ver anexo social)

No. de volantes de restricción de tráfico: Se realizó entrega de volantes sobre las viviendas levantadas a lo largo del proyecto (Ver anexo social)

No. de volantes de invitación a reuniones: N.a

No. de actas de vecindad a levantar: 0

Especialista Ambiental Interventoria.

Ana María B. Refinán
Especialista Ambiental de la Obra.

FORMATO 2. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN

N° Contrato: LP-SPM-012-2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS

Mes: JULIO 2023 Dirección Sitio de Disposición: Maracayo

Fecha	Placa volqueta	Volumen transportado m ³	Firma responsable de la obra	Firma de recibo	Dirección y/o teléfono

De acuerdo a las actividades realizadas en el presente periodo no se generaron residuos de escombros y tampoco se realizo corte de material a lo largo del proyecto, la empresa contratista realizo actividades de conformación de terreno para fundida de placas sobre el carril izquierdo entre abcisa K2+300 hasta k2+700

Firma Residente Interventoria

[Firma]
Firma Residente Contratista

FORMATO 3. CONTROL DE ESCOMBROS PRODUCIDOS

Nº Contrato: LP-SPM-012-2022

Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: JULIO 2023

Control de Escombros por ítems contractuales:

Código	Ítem	Volumen generado m³		Escombrera utilizada
		Período evaluado	Acumulado obra	
	NO SE GENERARON RCD, DURANTE EL PERIODO EN MENCIÓN			

Control de escombros por categorías ambientales (m³):

Órgano	Excavaciones		Demolición concretos		Demolición asfaltos		Demolición edificaciones	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado

Total periodo: 0 m³ Total certificado: 0 Diferencia m³ 0

De acuerdo a las actividades realizadas en el presente periodo no se generaron residuos de escombros y tampoco se realizó corte de material a lo largo del proyecto, la empresa contratista realizó actividades de conformación de terreno para fundida de placas sobre el carril izquierdo entre abscisa K2+300 hasta K2+700

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 5. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Contrato N° LP-SPM-012-202 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: JULIO

2023 Tipo de campamento: Fijo: X Móvil: _____ Dirección: K1+650

¿Cuenta con cafetería? NO No. de Servicios Sanitarios: NO

No. Extinguidores: 1

¿Cuenta con almacenamiento de materiales de construcción? SI

¿Cuenta con cuneta perimetral? SI Estado BIEN Desarenador? NO Estado NO
CUENTA

¿Trampa de grasas? NO Estado NO CUENTA Separación de basuras? NO

No. de canecas de basura: Orgánica: 1 Metales 1 Papel 1 Vidrio 0

Residuos Aceitosos: Las máquinas que se encuentran en sitio de obra no presentan fugas.

Disposición de Basuras: las basuras se dispondrán en el sitio de campamento
Frecuencia de recolección: semanal

Destino del material reciclable: El material reciclable será transportado por el camion de la basura y en su lugar de disposición final es colectado por recicladores.

Servicio de Acueducto: No Energía: No Teléfonos: No Gas: No

Las aguas residuales son vertidas en: No se generan aguas residuales

¿Requiere permiso de vertimiento? No Resolución: N/A Fecha vencimiento: N/A

Notas: El campamento se encuentra sobre el margen izquierdo en la abscisa K1+650 de la vía, no se cuentan con baños y el cerramiento con lona verde

Firma Interventor Ambiental.

FORMATO 6. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Contrato N° LP-SPM-013-2022 Contratista CONSTRUCCIONES AP SAS Mes JULIO 2023

Relación de Vehículos en la obra

Tipo de vehículo	Placa	Modelo	Vencimiento Certificado Emisiones	Estado de llantas	Estado de luces	Estado de frenos	Alarma de reversa	Equipo de carretera
VOLQUETA	W12175	2020	08/06/2025	OK	OK	OK	OK	OK
VOLQUETA	W12174	2020	08/06/2025	OK	OK	OK	OK	OK

Mantenimiento de Equipo y Maquinaria

Equipo o maquinaria	Fecha último mantenimiento	Horas trabajadas desde último mantenimiento	Horas de trabajo en el mes	Problemas del equipo en el mes
MINICARGADOR HS850-Z	18/07/2023	60.5	60.5	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
RETROEXCAVADORA 940 C	18/07/2023	35	35	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
VIBROCOMPACTADOR AMMAN A5.400	18/07/2023	62	62	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
EXCAVADORA LINKBELT 80	18/07/2023	52.4	52.4	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
MOTONIVELADORA 120 6#1	18/07/2023	57	57	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 7. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes:

JULIO 2023 Registro de derrames de sustancias químicas y residuos líquidos

Semana	Fecha	Hora	Tipo de residuo o sustancia derramada	Causa	Acción realizada
1			NO SE HA REPORTADO NI PRESENCIADO DERRAME DE ALGUNA SUSTANCIA O RESIDUOS		
2					
3					
4					
5					

Incluye cualquier sustancia líquida o sólida, acelerantes o cualquier otro aditivo químico, ligas asfálticas y residuos de concretos de las mezcladoras o aguas residuales de cabinas sanitarias.

¿Generó activación del Plan de contingencias? Hasta la fecha no se han presentado derrames

¿Se presentaron reclamaciones por parte de la comunidad? No se han presentado reclamo por parte de la comunidad.

Notas: Hasta la fecha del presente informe, no se han presentado algún tipo de fugas, por las actividades que se han desarrollado.

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 8. ASEO DE LA OBRA

Contrato N° LP-SContratista:CONSTRUCCIONES AP SAS MR Mes:

Mes: JULIO 2023

¿Se cuenta con una brigada de aseo por cada 1.000 m? SI

¿Se cuenta con una caneca de basura cada 200 m? SI

¿Se han presentado quejas de la comunidad? NO

Semana	LO 1 (70% 100%)	LO 2 (40% a < 70%)	LO 3 (0 < 40%)
1		X	
2		X	
3		X	
4		X	
5		X	

El valor de LO (limpieza de obra) se calcula como sigue:

LO1: La obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

LO-2: En la obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas, colombinas y cintas desechables.

LO-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

En caso de quejas de la comunidad por basuras, se debe anexar el registro.

Firma Interventor Ambiental

9615



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)
CONSTRUCCION DE PLACA HUELTA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO
EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FORMATO 9. SEÑALIZACIÓN

Contrato N° LP-SPM-012-2022__Contratista CONSTRUCCIONES AP SAS Mes JUNIO 2023

Control de señalización


Semana	No. señales PMT	Preventivas	Reglamentarias	Informativas	Perímetro frente de obra	Long. cinta o malla de demarcación	Pasos peatonales (m)	No. vallas institucionales
1	8	8	8	No	No	No	1	1
2	8	8	8	No	No	30m	1	1
3	8	8	8	No	No	no	1	1
4	8	8	8	No	No	40m	1	1
5	8	8	8	No	No	no	1	1

¿Se presentaron quejas de la comunidad? ____ no ____ En caso positivo, anexar los formatos.

Dificultades presentadas y diferencias con lo programado:

No se llevaron a cabo inconvenientes con relacionados con el tráfico:

Firma Interventor Ambiental



Plan 27 No. 1 - 96.7.2023/19.4. Secretaría General
www.gobernacion.gov.co

FORMATO 10. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Contrato N° LP-SPM-012-2022_Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS MR Mes: JULIO 2023

Control de manejo de sumideros del sistema de alcantarillado

Semana	Frente de obra	No. de sumideros presentes	Estado	Protección y limpieza dados
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas: Por ser una vía rural no hay presencia de alcantarillado ya que en las casas colindantes manejan sistemas de letrinas.

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 11. MANEJO DE LA VEGETACIÓN

Contrato N° LP-SPM-012-2022, Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: JULIO 2023

INVENTARIO FORESTAL

N°	Especie		No. Plano ubicación	Altura total (m)	DAP (m)	Volumen (m³)	Estado fitosanitario			Tratamiento recomendado
	Nombre Común	Nombre Científico					B	R	M	
1	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Ingeniero Forestal o Ambiental de obra

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 12. MANEJO DE LA VEGETACIÓN (2)

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: JULIO 2023

Control de tala

No.	Especie	Fecha de tala/poda	Productos forestales	Usos de material aprovechable
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se extrajeron las raíces

Control de bloqueos y traslados

No.	Especie	Fecha de bloqueo	Fecha de traslado	Nueva ubicación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: N° de inventario, tratamiento dado, calidad del suelo donde se trasladó

Control de tratamiento fitosanitario árboles a permanecer

No.	Especie	Fecha	Descripción tratamiento
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: No hay previstos tratamiento fitosanitario para árboles en el proyecto, por ser vía existente no hay árboles, sin embargo, al momento de iniciar la construcción de las obras hidráulicas se debe hacer una compensación contemplada en el permiso de ocupación de cauce dado por la CVS

Firma Ingeniero Forestal o Ambiental de obra

Janeth P. Páez
Firma Interventor Ambiental

FORMATO 13. SIEMBRAS COMPENSATORIAS

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: JULIO 2023

Control de Siembras Compensatorias

Semana	Número de individuos sembrados		Número de riegos	Fertilizaciones
	Primera vez	Por reposición		
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A

Problemas fitosanitarios presentados y medidas tomadas: N/A

Ubicación de las Siembras: N/A

Origen del Germoplasma: N/A

Nota: Hasta el momento no ha sido necesaria una compensación forestal ya que es una vía antigua en donde se va a construir la placa huella y no será necesario realizar tala de árboles.

Firma Ingeniero Forestal o Ambiental de obra

Ana María Patefinam
Firma Interventor Ambiental

FORMATO 5. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Contrato N° LP-SPM-012-2022
2023

Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: JULIO

¿Cuenta con cafetería?: No

No. de Servicios Sanitarios: 0

No. Extintidores: 0

¿Cuenta con almacenamiento de materiales de construcción?: No

¿Cuenta con cuneta perimetral?: No

Estado: N/A

Desarenador?: No Estado: N/A

¿Trampa de grasas?: No Estado N/A Separación de basuras?: No

No. de canecas de basura: Orgánica: 0 Metales: 0 Papel: 0 Vidrio: 0

Residuos Aceitosos: las maquinarias que se encuentran en el campamento no ha presentado fuga

Disposición de Basuras: Las basuras se dispondrán en el sitio del campamento Frecuencia de recolección:
Semanal

Destino del material reciclable: El material reciclable será transportado por el camión de la basura y en su lugar de disposición final es recolectado por recicladores.

Servicio de Acueducto: No Energía: No Teléfonos: No Gas: No

Las aguas residuales son vertidas en: No se generan aguas residuales.

¿Requiere permiso de vertimiento? : No Resolución: N/A Fecha vencimiento: N/A

Notas:

El campamento se encuentra ubicado en el K1+650, aún falta que instalen el baño, los puntos ecológicos, cerramientos y señalización el estado actual se detalla en las imágenes adjuntas al informe.

Firma Interventor Ambiental.

4621

INSPECCIÓN A VEHÍCULOS					Noviembre de 2022
FECHA: 24/10/2022					Versión: 01
INSPECTOR: <u>CRISTO FERNANDEZ</u>					CARGO: <u>SS</u>
TIPO DE VEHÍCULO: <u>GRUPO A</u>					MODELO: <u>N° PLACA</u>
ÁREA ASIGNADA: <u>CA/90</u>					N° MOVIL: <u></u>
CONDUCTOR: <u>VIRGILIO CORTES</u>					
ITEM A INSPECCIONAR	SI	R	N	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	✓				
Seguro Colpaseo (COAT)	✓				
Licencia de conducción	✓				
Revisión técnica mecánica				X	
CARROCERÍA					
Llantas	✓				
Puertas	✓				
Asientos y apoyacabezas	✓				
Botas laterales				X	
Cuerpo	✓				
Seguros y bloqueos de puertas	✓				
Impugnaciones	✓				
Tarjetas y duplicados de agua para impugnaciones				X	
Reguladores laterales	✓				
Revisión central	✓				
Vidrios	✓				
Piso	✓				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	✓				
Temperatura	✓				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, nivel de agua, gasolina	✓				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	✓				
Sistema de suspensión	✓				
Nivel aceite de motor	✓				
Estado del filtro de aceite	✓				
Nivel líquido refrigerante del radiador	✓				
Estado del filtro de gasolina	✓				
Pedal de embrague				X	
Llantas				X	
Puertas				X	
SISTEMA DE FRENSO					
Pedal	✓				
Pastillas				X	
Ruedas				X	
Líquido de freno				X	
SISTEMA DE ALUMINADO					
Faro delantero	✓				
Faro trasero	✓				
Luces de estacionamiento	✓				
Señales laterales				X	
Señales traseras				X	
Luces de neblina	✓				
Luces de freno	✓				
Luces de laser					
BATERÍA					
Bornes de conexión	✓				
Cables de la caja	✓				
Aseguramiento de la caja	✓				
Nivel de agua	✓				
ITEM A INSPECCIONAR	SI	R	N	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	✓				
Cofre o tacho	✓				
Caja o elevador mecánico o hidráulico	✓				
Llantas o banda de repuesto	✓				
Algo de herramientas	✓				
Señales de prevención	✓				
Extintor de 5 a 20 lbs. (Estado general, Recarga, Presión)	✓				
Luz roja	✓				
RY AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	✓				
Botella para recolección de residuos	✓				
Cinta de demarcación: Peligro	✓				
Materiales absorbentes para contención de derrames (Arena o Aserrín)	✓				
Cinta de seguridad	✓				
Luces de seguridad	✓				
Fluores	✓				
Pala	✓				
Tipera	✓				
BOGOTON DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	✓				
Vendaje 2" X 3" (1 Unidad)	✓				
Alcornoque 4 1/2 pulgadas (1 Unidad)	✓				
Caja Están 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	✓				
Agudón 18g (1 Unidad)	✓				
Cintas (4 Unidades)	✓				
Termómetros (1 unidad x 2 Unidades)	✓				
Antipirético 500mg (1 Unidad)	✓				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	✓				
Antipirético Espuma (1 Unidad)	✓				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	✓				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Resistencia elevadas y bajas				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Fichas de Emergencia legibles				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	✓				
Adecuada clasificación de residuos	✓				
Si el vehículo es autorizado luego de la inspección escribir en este espacio la(s) razón(es) de inhabilitación:					

The image is a very dark, low-contrast scan of a document page. The page appears to be a ledger or table with multiple columns and rows. The text is illegible due to the poor quality of the scan, but the structure suggests a formal record-keeping document. The page is filled with horizontal lines, likely representing rows in a table, and there are some faint vertical lines that might represent columns. The overall appearance is that of a heavily underexposed or poorly scanned document.

4623

INSPECCIÓN A VEHÍCULOS

FECHA: 26/01/2019 INSPECTOR: Francisco Medina CARGO: JEFE SST

Tipo de Vehículo: Camión MODELO: N° PLACA: N° MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: Camión y Accesorios CONDUCTOR: W. Pineda

ITEM A INSPECCIONAR	O	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)					
Licencia de conducción					
Revisión Técnica mecánica				X	
CATERGORIZACIÓN					
Lejía					
Puertas	X				
Asientos y reposacabezas	X				
Cables eléctricos				X	
Coperta					
Seguros y bloqueo de puertas	X				
Unipolares	X				
Tanque y dispositivos de agua para higiene personal				X	
Relojómetro lateral					
Relojómetro central	X				
Vidrios	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X				
Tachómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, presión	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Control de dirección	X				
Control de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina					
Pedal de embrague				X	
Uñas				X	
Rines				X	
SISTEMA DE FRENO					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Resaca				X	
Líquido de freno				X	
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Fanallas altas	X				
Fanallas bajas	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras				X	
Direccionales traseras				X	
Luces de neblina				X	
Luces al frenar				X	
Luces de taxi	X				
BATERÍA					
Bornas de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseopamiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				
ITEM A INSPECCIONAR	O	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cables e laceros				X	
Botón elevador mecánico o hidráulico	X				
Llaves o llave de seguridad	X				
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Extintor de 5 a 20 Lit. (Estado general, Recarga, Presión, Límite)	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brecha para recolección de residuos	X			X	
Cinta de demarcación Peligro	X				
Material absorbente para contención de derrames (Arena o Aserrín)	X				
Caras de seguridad	X				
Químicos de seguridad	X				
Escudo	X				
Pala	X				
Tijeras	X				
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Muñequera (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Cura (1 Unidad)	X				
Termómetro (1 Unidad)	X				
Esposadora (1 Unidad)	X				
Esposadora Espuma (1 Unidad)	X				
Gantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias volátiles y líquidas				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Fichas de Emergencia legibles				X	
Buen estado del envase o empaque					
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es autorizado luego de la inspección escrita en este espacio (s) adicional de autorización:

INSPECCIÓN A VEHÍCULOS

FECHA: 21/10/2015 INSPECTOR: Flamante CARGO: SS NÚMERO DE VEHÍCULO: 9629

TIPO DE VEHÍCULO: 2006 MODELO: 2006 N° PLACA: SS N° MOVIL: SS

ÁREA ASIGNADA: Extracción CONDUCTOR: Vicente

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Técnica	X				
CARROCERÍA					
Lubrificado	X				
Puertas	X				
Asientos y accesorios	X				
Alas laterales	X				
Cajuela	X				
Seguro y bloqueo de puertas	X				
Anticorrosión	X				
Tanque y dispositivos de agua para lavaparabrisas	X				
Refrigeración lateral	X				
Refrigerador central	X				
Vidrios	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X				
Tachómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, nivel de agua, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague	X				
Llaves	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FREMOS					
Pedal	X				
Palancas	X				
Bandas	X				
Líquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faros delanteros	X				
Faros traseros	X				
Luces de estacionamiento	X				
Directrices delanteras	X				
Directrices traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de freno	X				
BATERÍA					
Terminales de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				
ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cifras o letreros	X				
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				
Llaves o llave de repuesto	X				
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Extintor de 5 a 20 lbs. (Estado general, Recarga, Presión)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Botas para residuos	X				
Botas para recolección de residuos	X				
Cinta de empaque	X				
Materiales absorbentes para contención de derrames (Arena o Aserrín)	X				
Trapos de limpieza	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala	X				
Tijeras	X				
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendajes 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Microscopio 13 Yentes (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Fajas x 2 Unidades)	X				
Isopropileno 500ml (1 Unidad)	X				
Alcohol 125ml (1 Unidad)	X				
Isopropileno 500ml (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles	X				
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Fichas de Emergencia legibles	X				
Buen estado del envase o empaque	X				
MANEJO DE RESIDUOS					
Residuos o bolsa en buen estado	X				
Adeuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio (a) razón(es) de inmovilización:

Powered by  CamScanner

INSPECCIÓN A VEHÍCULOS

FECHA: 14/07/2017 INSPECTOR: ALBERTO VILLALBA CARGO: Sub 55 VEHICULO: 9626

TIPO DE VEHICULO: DESGA MODELO: N° PLACA: N° MOVIL:

AREA ASIGNADA: Examinación CONDUCTOR: Villalba

ITEM A INSPECCIONAR	S	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Forma de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Carta de homologación					
Forma Técnica mecánica					
CARROCERÍA					
Lacomeria	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Símbolos	X				
Cabineta	X				
Seguro y/o bloqueo de puertas	X				
Limpieza	X				
Tanque y niveladores de agua para lavaparrillas	X				
Retradores laterales	X				
Retractor central	X				
Vidrios	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X				
Tanque	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, nivel de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del tipo de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del tipo de gasolina	X				
Pedal de embrague	X				
Llaves				X	
Rines				X	
SISTEMA DE FRENSO					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Líquido de frenos				X	
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faros delanteros	X				
Faros traseros	X				
Luces de estacionamiento	X				
Diagonales delanteras				X	
Diagonales traseras				X	
Luces de reversa	X				
Luces de freno	X				
Luces de batería	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				
ITEM A INSPECCIONAR	S	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cables o jacks				X	
Gas o elevador mecánico o hidráulico	X				
Luces o luces de repuesto	X				
Junco de frenos	X				
Defensas de protección	X				
Extintor de 5 a 20 Lbs. (Estado general, Recarga, Presión)	X				
Llaves	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Bolsa para recolección de residuos	X				
Cinta de desinfección (Pelgr)	X				
Materiales absorbentes para contención de derrames (Arena o Aserrín)	X				
Cables de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala	X				
Trépal	X				
BOYOLIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" x 5" (1 Unidad)	X				
Micrope 25 Yards (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15g (1 Unidad)	X				
Cortas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias esquistos y líquidos				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de Emergencia legibles				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Residuos o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

INSPECCIÓN A VEHÍCULOS

FECHA: 14/10/2023 INSPECTOR: Fernando Herrera CARGO: SSI Versión: 01
 TIPO DE VEHÍCULO: carro MODELO: N° PLACA: N° MOVIL: 4627
 AREA ASIGNADA: carro CONDUCTOR: Wilder Cortez

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Colombiano (SOAT)	X				
Licencia de conducción				X	
Revisión Técnica reciente					
CARROCERÍA					
Llantas	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyabrazos				X	
Columnas	X				
Espejos y/o bloques de puertas	X				
Impugnadores	X				
Tanque y distribuidores de agua para impugnadores	X				
Rebordes laterales	X				
Rebordes centrales	X				
Alfombras	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEMORIAS					
Revoluciones	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, presión	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del líquido de frenos	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del líquido de potencia	X				
Pedal de embrague				X	
Clavijas				X	
Pines				X	
SISTEMA DE FRENO					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Líquido de frenos				X	
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faro alto	X				
Faro bajo	X				
Luces de estacionamiento	X				
Seccionales delanteros					
Seccionales traseros					
Luces de reversa					
Luces al freno					
Luces de freno					
BATERÍA					
Forma de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua					
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Dispositivos de seguridad	X				
Cinturones de seguridad	X			X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico				X	
Llaves o llave de repuesto	X				
Kit de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Extintor de 5 a 20 lbs. (estado general, Recarga, Presión)	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Borracha para recolección de residuos	X				
Cinta de demarcación: Peligro	X				
Material absorbente para contención de derrames (Arena o Aserrín)	X				
Calas de seguridad	X				
Cuadros de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala	X				
BOYSCOUTS DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras	X				
Torniquete	X				
Vendaje 2" x 5" (1 Unidad)	X				
Microscopio 10x (1 Unidad)	X				
Gaseo Estéril 7.6x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Agua 15gr (1 Unidad)	X				
Curete (1 Unidad)	X				
Antiséptico (1 Unidad)	X				
Antipirético (1 Unidad)	X				
Alcohol 70% (1 Unidad)	X				
Antipirético (1 Unidad)	X				
Antipirético (1 Unidad)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias químicas y aceites					
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Fichas de Emergencia locales				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Respeto y bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				
Si el vehículo es inspeccionado luego de la inspección se debe en este espacio hacer registro de inspección:					

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 24/07/2023

Título de capacitación: Riesgos Mecánicos

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo basen
identificar factores de riesgos, efectos cantin

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. identificación	Firma
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78673101	<i>[Firma]</i>
Andres Suarez	Operador de vibro	1038138868	<i>Andres Suarez</i>
Angelo Ibañez	Conductor de Volqueta	1067892257	<i>Angelo Ibañez</i>
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	<i>Angie Paola Guzman</i>
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	<i>Arturo Mendoza</i>
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	<i>Carlos Torres</i>
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	<i>Carlos Torres</i>
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	
Carmelo Ochoa	Ayudante	78705024	<i>Carmelo Ochoa</i>
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	<i>Cristian J...</i>
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	
Domingo Aguilar	Operador de minicargador	1003588951	<i>Elian Padilla</i>
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	<i>Elian Padilla</i>
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	<i>Francisco H</i>
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	<i>Hugo Antonio M</i>
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	
Jarlinson Jalet Fumieles Padilla	Oficial	1007367728	
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	<i>Jarlein Vargas</i>
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	<i>Jorge Meza</i>
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	<i>Jorge Morales</i>
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	<i>Jose Alfredo Jimenez</i>
Jose Alfredo Hernandez	Obrero	1067895491	<i>Jose Alfredo Jimenez</i>
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	<i>Jose Alfredo Jimenez</i>
Juan Olier	Ayudante	1148436663	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	
Libardo Antonio Martinez Guerra	Ayudante	1071433184	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	<i>Luis Alfredo De Hoyos</i>
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Margie Guifo Martinez	Controladora Vial	1067837388	
Maria Isabel Guifo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	
Miguel Viloria	Obrero	106785949	<i>Miguel Viloria</i>

4629



Soluciones de la GE TE

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO
EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Nombre empleado	Cargo	No. identificación	Firma
Nilson Enrique Ramos Murillo	Oficial	78742380	
Oberto José Furnieles Rivera	Ayudante	71976485	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Oscar Blandon	Oficial	71000889	
Oswaldo Manuel García Sotelo	Ayudante	1073970075	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	Wilfrido Cortes
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	
Yohelis Torres	Controladora Vial	1073978901	
Yoni José Martínez Miranda	Oficial	78713203	
Humberto Pérez Reyes	Conductor de volqueta de riego	9100866	
Yesica Paola Pastrana	Controladora Vial	1073982472	
Yohelis Torres Guerr	Controladora vial	1073978901	
Moris Wango	Operador	1213978842	

Carmona & Gonzalez R.

Firma Contratista

Firma Interventoría

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 27/07/2023

Título de capacitación: Planes de Auxilio.

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo para identificar factores de riesgo y hacer control sobre ellos

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. identificación	Firma
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78675101	<i>Alejandro Alvarez</i>
Andres Suarez	Operador de vibro	1038138868	<i>Andres Suarez</i>
Angelo Ibañez	Conductor de Volqueta	1067892257	<i>Angelo</i>
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	<i>Angie Paola</i>
Arturo Mendoza Rodríguez	Conductor Mixer	1067915824	<i>Arturo Mendoza</i>
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	<i>Carlos Torres</i>
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	<i>Carlos Arturo</i>
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	<i>Carlos Montoya</i>
Carmelo Ochoa	Ayudante	78705024	<i>Carmelo Ochoa</i>
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	<i>Cesar Augusto</i>
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	<i>Cristian J...</i>
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	<i>Daniel Gaspar</i>
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	<i>Dany Daniel</i>
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	
Domingo Aguilar	Operador de minicargador	1003588951	
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	<i>Eliecer Agamez</i>
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	<i>Francisco H.</i>
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	<i>Hugo Antonio</i>
Jarlinson Jalet Furnieles Padilla	Oficial	1007367728	
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	<i>Jarlein</i>
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	<i>Jorge Morales</i>
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	<i>Jose Alfredo</i>
Jose Alfredo Hernandez	Obrero	1067895491	<i>Jose Alfredo</i>
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	<i>Juan David</i>
Juan Olier	Ayudante	1148436663	
Leonidas Gomez	Calador	6888770	<i>Leonidas G.</i>
Libardo Antonio Martinez Guerra	Ayudante	1071433184	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	
Miguel Viloria	Obrero	106785949	<i>Miguel Viloria S.</i>

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-5PM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 29/07/2023

Título de capacitación: La capacitación

Descripción: capacitación sobre el control de calidad de los trabajos de labrado para identificar los puntos de trabajo y hacer el control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación:

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78673101	Alejandro Alvarez
Andres Suarez	Operador de vibro AMMAN	1038138868	Andres Suarez
Angie Paola Guzman Peña	Controladora vial	1003000869	Angie Guzman
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor de mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Obrero	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Obrero	1133796702	Carlos Pastrana
Carlos Mario Montoya	Obrero	1067953923	Carlos Montoya
Carlos Medina Padilla	Conductor de camioneta	78690873	Carlos Medina
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado
Cristian Jose Herrera Blanquett	Obrero	1073968895	Cristian Herrera
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Obrero	1133796735	Daniel Gaspar
Dany Daniel Romero Peralta	Bodeguero	10774682	Dany Romero
Denis Manuel Hernandez Mendoza	Oficial	78749297	Denis Hernandez
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	Elian Padilla
Eliecar Remberto Agamez	Conductor volco blanco	2755180	Eliecar Agamez
Fabio Luis Acuña	Especialista	72291221	Fabio Acuña
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco H
Hugo Antonio Miranda Argumedeo	Obrero	1003050039	Hugo Antonio
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein Vargas
Javier Montes	Residente de obra	1067898208	Javier Montes
Jorge Andrés Meza	Operador de minicargador	1100248122	Jorge Meza
Jorge Andres Morales	Obrero	1007822286	Jorge Morales
Jose Alfredo Hernandez Peñafiel	Ayudante	1067895491	Jose A. Hernandez
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose Jimenez
Juan David Negrette González	Obrero	78717301	Juan David Negrette
Leonidas Gomez Vellojin	Celador	6888770	Leonidas Gomez
Luis Alfredo De Hoyos	Controlador Vial	11042069	Luis Alfredo
Margarita María Mejía Bedoya	Especialistas en vías	42764982	Margarita Mejía
Margie Gulfo Martinez	Controladora vial	1067837388	Margie Gulfo
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora vial	1062955710	Maria Isabel Gulfo
Miguel Rosendo Viloria Soto	Ayudante	1067859490	Miguel Viloria

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Over Enrique Arrieta	Ayudante de mixer	10904585	over arrieta
Paula Herrera	Controladora vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	W. I. Cortes
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	
Yohelis Torres Guerr	Controladora vial	1073978901	
Yoni José Martínez Miranda	Oficial	78713203	
Angelo Ibañez	Conductor de volqueta	1067892257	Angelo Ibañez

Angelo Ibañez

Firma Contratista

Firma Interventoría

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 30/07/2023

Título de capacitación: Salidas a un mismo nivel

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo para identificar factores de riesgo, ejercer control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación:

Nombre empleado	Cargo	No. identificación	Firma
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78673101	
Andres Suarez	Operador de vibro AMMAN	1038138868	Andres Suarez
Angie Paola Guzman Peña	Controladora vial	1003000869	
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor de mixer	1067915824	
Carlos Andres Torres Suarez	Obrero	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Obrero	1133796702	Carlos Pastrana
Carlos Mario Montoya	Obrero	1067953923	
Carlos Medina Padilla	Conductor de camioneta	78690873	
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	
Cristian Jose Herrera Blanquett	Obrero	1073969895	Cristian Herrera
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Obrero	1133796735	
Dany Daniel Romero Peralta	Bodeguero	10774682	
Denis Manuel Hernandez Mendoza	Oficial	78749297	
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	Elian Padilla
Eliecer Remberto Agamez	Conductor volco blanco	2755180	
Fabio Luis Acuña	Especialista	72291221	
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco H.
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo Miranda
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	
Javier Montes	Residente de obra	1067898208	
Jorge Andrés Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Obrero	1007822286	Jorge Morales
Jose Alfredo Hernandez Peñafiel	Ayudante	1067895491	Jose Alfredo Hernandez
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose A. Jimenez G
Juan David Negrette González	Obrero	78717301	Juan Negrette
Leonidas Gomez Vellojin	Celador	6888770	
Luis Alfredo De Hoyos	Controlador Vial	11042069	
Margarita Maria Mejia Bedoya	Especialistas en vías	42764982	
Margie Gulfo Martinez	Controladora vial	1067837388	
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora vial	1062955710	
Miguel Rosendo Viloria Soto	Ayudante	1067859490	Miguel Viloria

PROYECTO MARACAYO			
RELACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO			
JULIO DE 2023			
Orden de	Nombre	Edad	Grado
Operativo			
1	Alfonso Acosta	48/06/1975	Medio
2	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
3	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
4	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
5	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
6	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
7	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
8	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
9	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
10	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
11	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
12	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
13	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
14	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
15	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
16	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
17	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
18	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
19	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
20	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
21	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
22	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
23	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
24	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
25	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
26	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
27	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
28	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
29	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
30	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
31	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
32	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
33	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
34	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
35	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
36	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
37	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
38	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
39	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
40	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
41	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
42	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
43	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
44	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada
45	Alfonso Acosta	48/06/1975	Comodoro de Armada

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES AP SAS	Nombre Sucursal	MONTERIA MARACAYO	Código Sucursal	312
Documento	N1900940810	Dirección	CL 80 SUR #47 D - 163 BODEGA 107		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3222388		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ACERO ALVAREZ SERGIO ANDRES	Identificación	CC 71695453		
Total Afiliados	10	APP	ARL SURIA		


II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novidades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Número	Apellido y Nombre	Tipo	Sexo	Fecha de Nacimiento	Edad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
02	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
03	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
04	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
05	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
06	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
07	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
08	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
09	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	
10	ALVAREZ SERGIO ANDRES	M	M	1970-07-10	53																	

III. TOTALES

IBC Prevalen	BC Salud	BC Prevalen	BC Casos	Aportes Prevalen	Aportes Salud	Aportes Materna	Aportes CEB	Aportes EAP	Aportes Ma Embarazo	Prepagadas, Lactantes, Salud y Farm EPB	Escapadas de EIP	DIFERENCIAL con INTC y CC NORA	TOTAL INTC y CC 20.00.00	TOTAL FINAL
\$ 20.290.000	\$ 20.290.000	\$ 20.290.000	\$ 20.290.000	\$ 4.802.800	\$ 5.000.000	\$ 1.201.000	\$ 1.201.000	\$ 1.201.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0.000.000

MAXIMUS S&B S.A.S



Código del Prestador: 230010185701 NH: 900944634
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3184659413-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSS&B.COM
 Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia: S.O.042

Fecha de Impresión: 2022/12/05 14:44:38
 Impreso por: YLOPEZ
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación: CC - 6088770 Paciente: GOMEZ VELLOJIN LEONIDAS JOSE
 Fecha Ingreso: 2022/12/05 Hora Ing: 09:43 Ingreso: 118862
 Fecha Naci: 1961-04-22 Edad: 61 años Sexo: M
 Teléfono: 3238811658 Municipio: MONTERIA
 Dirección: CORREGIMIENTO TRES PIEDRAS
 Empresa: INGENIAR DE LA COSTA LTDA
 Contrato: CONTRATO No 581 - INGENIAR DE LA COSTA LTDA - CONSOLIDADO
 Ocupación: VIGILANTE



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN

INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP

HIGIENE POSTURAL

CONTROL OPTOMETRICO ANUAL

ACTIVIDAD FISICA EJERCICIO

CONTROL NUTRICIONAL Y PESO

PAUSAS ACTIVAS

MANEJO ADECUADO DE CARGAS

PARACLINICOS REVISADOS

AUDIOMETRIA

VISIOMETRIA

INGRESO A SVE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS

AUTOCUIDADOS Y HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE.
 DISTANCIAMIENTO SOCIAL, TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejora de su estado de salud. MAXIMUS S & B S.A.S Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de la historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009


David Gari Bustos
 C.C./1904578216
 MD. Especialista en Seguridad y
 Salud en el Trabajo
 Resolución: 33223096/0117

Leonidas Gomez

ATENDIDO POR

DAVID DE JESUS GARI BUSTOS - Esp: SALUD
 OCUPACIONAL - Reg Médico:

FIRMA DEL TRABAJADOR

MAXIMUS S&B S.A.S

Código del Prestador: 230010185701 NR: 900944634
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3164059413-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSS&B.COM
 Email: maximus_syb@gmail.com - Licencia: S.O 042

Fecha de Impresión: 2022/11/18 15:11:37
 Impreso por: YLOPEZ
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación: CC - 1192714770
 Fecha Ingreso: 20/2/11/18
 Fecha Naci: 2000-06-12
 Teléfono: 3148701471
 Dirección: VEREDA CAMPO ALEGRE
 Empresa: INGENIAR DE LA COSTA LTDA
 Contrato: CONTRATO No 581 : INGENIAR DE LA COSTA LTDA - CONSOLIDADO
 Ocupación: CONDUCTOR DE MIXER

Paciente:
 Hora Ing:
 Edad:
 Municipio:

CORCERO CRTEGA BRONAL ANDRES
 07:45
 22 años
 TIERRALTA

Ingreso: 118259
 Sexo: M

**CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL****ENFASIS**

OSTEOMUSCULAR

CONCEPTO MEDICO LABORAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP

HIGIENE POSTURAL

PAUSAS ACTIVAS

PARACLINICOS REVISADOS

COCAINA Y MARIJUANA

VISIONOMETRIA

EVALUACION PSICOMOTRIZ

OTROS - COMENTARIOS

APROBO EVALUACION PSICOMOTRIZ / DROGAS DE ABUSO NEGATIVAS

INGRESO A SVE**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS**

AUTOCUIDADO / HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejora de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009

TIPO DE EXAMEN

INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD PARA LABOR ESPECIFICA

CONDUCCION DE VEHICULOS

MANEJO ADECUADO DE CARGAS

AUDIOMETRIA


Carlos Padron Perez
 Carlos Padron Perez MD
 Exp. en Salud Ocupacional
 R.M. 1133 Lic. ESO 565

BRONAL CRTEGA
 BRONAL CRTEGA

ATENDIDO POR

CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ - Esp:
 MEDICINA DEL TRABAJO - Reg Médico: Lic ESO 565

FIRMA DEL TRABAJADOR

MAXIMUS S&B S.A.S

Código del Prestador: 230010185701 Nit: 900944924
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3154659413-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSS&B.COM
 Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia: S.O.042

Fecha de Impresión: 2022/11/03 14:07:26
 Impreso por: YLOPEZ
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 1065002297	Paciente:	GONZALEZ ESPINOSA SAMIR ELIAS
Fecha Ingreso:	2022/11/03	Hora Ing:	08:09
Fecha Naci:	1993-11-17	Edad:	28 años
Teléfono:	3044672375	Municipio:	CERETE
Dirección:	EL PRADO		
Empresa:	INGENIAR DE LA COSTA LTDA		
Contrato:	CONTRATO No 581 - INGENIAR DE LA COSTA LTDA - CONSOLIDADO		
Ocupación:	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		

**CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL****ENFASIS**

OSTEOMUSCULAR

CONCEPTO MEDICO LABORAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP

HIGIENE POSTURAL

PAUSAS ACTIVAS

PARACLINICOS REVISADOS

COCAINA Y MARIHUANA

VISIONOMETRIA

EVALUACION PSICOMOTRIZ

OTROS - COMENTARIOS

EVALUACION PSICOMOTRIZ: APROBADAS - LABORATORIOS: NEGATIVOS

INGRESO A SVE

SVE CARDIOVASCULAR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS

HABITOS SALUDABLES - AUTOCUIDADO

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009

TIPO DE EXAMEN

INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD PARA LABOR ESPECIFICA

CONDUCCION DE VEHICULOS

ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO

CONTROL NUTRICIONAL Y PESO

AUDIOMETRIA


Maximo Segundo Tordecilla Diaz
 Esp. En Salud Ocupacional
 R.M. 34054404
 Lic (S.S.T.) 202130002379

Samir Gonzalez

ATENDIDO POR

MAXIMO SEGUNDO TORDECILLA DIAZ - Esp: SALUD
 OCUPACIONAL - Reg Médico: 202130002379

FIRMA DEL TRABAJADOR

MAXIMUS S&B S.A.S

Código del Prestador: 230010185701 NIT: 900944614
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3154608413-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSSYB.COM
 Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia: S.O.042

Fecha de Impresión: 2022/11/03 14:09:58
 Impreso por: YLOPEZ
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación: CC-1192811399 Paciente: JIMENEZ YANEZ LUIS ALFREDO
 Fecha Ingreso: 2022/11/03 Hora Ing: 08:30 Ingreso: 117397
 Fecha Naci: 1991-05-05 Edad: 31 años Sexo: M
 Teléfono: 3142005379 Municipio: TIERRALTA
 Dirección: SAN ANTERITO
 Empresa: INGENIAR DE LA COSTA LTDA
 Contrato: CONTRATO No 581 - INGENIAR DE LA COSTA LTDA - CONSOLIDADO
 Ocupación: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

**CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL**

ENFASIS
 OSTEO MUSCULAR

CONCEPTO MEDICO LABORAL
 SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP
 HIGIENE POSTURAL
 PAUSAS ACTIVAS

PARACLINICOS REVISADOS

COCAINA Y MARIHUANA
 VISIOMETRIA
 EVALUACION PSICOMOTRIZ

OTROS - COMENTARIOS

EVALUACION PSICOMOTRIZ: APROBO, cada una de las pruebas de la evaluación psicomotriz - LABORATORIOS: NEGATIVOS

INGRESO A SVE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS
 HABITOS SALUDABLES - AUTOCUIDADO

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009

TIPO DE EXAMEN
 INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD PARA LABOR ESPECIFICA
 CONDUCCION DE VEHICULOS

ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO

AUDIOMETRIA

Maximo Segundo Tordecilla Diaz
 M. Segundo Tordecilla Diaz
 Exp. En Salud Ocupacional
 RM. 14804MS
 Lic (SST) 202130002379

Luis Alfredo Jimenez

ATENDIDO POR


MAXIMO SEGUNDO TORDECILLA DIAZ - Esp: SALUD OCUPACIONAL - Reg Médico: 202130002379

FIRMA DEL TRABAJADOR

9691

MAXIMUS S&B S.A.S

Código del Prestador: 230010185701 NIT: 900944534
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3154658413-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSS&B.COM
 Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia: S.O.042



Fecha de Impresión: 2022/11/18 15:07:02
 Impreso por: YLOPEZ
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación: CC - 1087915824
 Fecha Ingreso: 2022/11/18
 Fecha Naci: 1992-10-15
 Teléfono: 3114113284
 Dirección: MZ 24 LOTE 16
 Empresa: INGENIAR DE LA COSTA LTDA
 Contrato: CONTRATO No 581 - INGENIAR DE LA COSTA LTDA - CONSOLIDADO
 Ocupación: AYUDANTE

Paciente:
 Hora Ing:
 Edad:
 Municipio:

MENDOZA RODRIGUEZ ARTURO JESUS
 07:25
 30 años
 MONTERIA

Ingreso: 118355
 Sexo: M

**CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL****ENFASIS**

OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN

INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP

HIGIENE POSTURAL

PAUSAS ACTIVAS

MANEJO ADECUADO DE CARGAS

PARACLINICOS REVISADOS

AUDIOMETRIA

VISIOMETRIA

INGRESO A SVE**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS**
AUTOCUIDADO / HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clinica ocupacional según resolución 1518 de 2009


Carlos Padron Perez MD
 Esp. en Salud Ocupacional
 R.M. 1133 Lic. ESO565

ATENDIDO POR

CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ - Esp:
MEDICINA DEL TRABAJO - Reg Médico: Lic ESO 565

FIRMA DEL TRABAJADOR

MAXIMUS S&B S.A.S



Código del Prestador: 230010185701 NIT: 900944634
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3164658413-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSS&B.COM
 Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia: S.O.042

Fecha de Impresión: 2022/12/05 14:36:27
 Impreso por: YLOPEZ
 CERTIFICADO DE APTITUD
 LABORAL

Datos del Paciente

Identificación: CC - 2755180 Paciente: AGAMEZ BEDOLLA ELIECER REMBERTO
 Fecha Ingreso: 2022/12/05 Hora Ing: 06:54 Ingreso: 118259
 Fecha Naci: 1952-09-05 Edad: 70 años Sexo: M
 Teléfono: 3116610536 Municipio: MONTERIA
 Dirección: MZ 90 LOT 11
 Empresa: INGENIAR DE LA COSTA LTDA
 Contrato: CONTRATO No 581 - INGENIAR DE LA COSTA LTDA - CONSOLIDADO
 Ocupación: CONDUCTOR DE VOLQUETA



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN

INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

CONCEPTO DE APTITUD PARA LABOR ESPECIFICA

CONDUCCION DE VEHICULOS

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP

HIGIENE POSTURAL

CONTROL OPTOMETRICO ANUAL

PAUSAS ACTIVAS

MANEJO ADECUADO DE CARGAS

PARACLINICOS REVISADOS

COCAINA Y MARIJUANA

AUDIOMETRIA

VISIOMETRIA

EVALUACION PSICOMOTRIZ

OTROS - COMENTARIOS

LABORATORIOS NEGATIVOS / APROBÓ, la evaluación psicomotriz.

INGRESO A SVE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS

AUTOCUIDADO / HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE.
 DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no recibió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009

Carlos Alfonso Padron Perez
 Carlos Alfonso Padron Perez MD
 Esp. en Salud Ocupacional
 R.M. 1133 Lic. ESO666

Elmer Aguirre


ATENDIDO POR

FIRMA DEL TRABAJADOR

CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ - Esp:
 MEDICINA DEL TRABAJO - Reg Médico: Lic ESO 565

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

MAXIMUS S&B S.A.S



Código del Prestador: 230010185701 MR: 900344634
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3184659419-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSSB.COM
 Email: maximus.srb@gmail.com - Licencia: S.O.042

Fecha de Impresión: 2022/11/21 16:19:41
 Impreso por: YLOPEZ
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación: CC - 1007595160

Fecha Ingreso: 2022/11/03

Fecha Naci: 2001-10-14

Teléfono: 3186593507

Dirección: LOS GARZONES

Empresa: INGENIAR DE LA COSTA LTDA

Contrato: CONTRATO No 581 INGENIAR DE LA COSTA LTDA: CONSOLIDADO

Ocupación: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

Paciente:

Hora Ing:

Edad:

Municipio:

VIDAL DE LA ROSA JAIR MANUEL

08:19

25 años

MONTERIA

Ingreso: 117886

Sexo: M



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CONCEPTO MEDICO LABORAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP

HIGIENE POSTURAL

PAUSAS ACTIVAS

PARACLINICOS REVISAGOS

COCAINA Y MARIJUANA

VISIONOMETRIA

EVALUACION PSICOMOTRIZ

OTROS - COMENTARIOS

PRUEBAS DE LABORATORIO NEGATIVAS / APROBO EVALUACION PSICOMOTRIZ

INGRESO A SVE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS

AUTOCUIDADO / HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no contó ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de la historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009

TIPO DE EXAMEN

INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD PARA LABOR ESPECIFICA

CONDUCCION DE VEHICULOS

MANEJO ADECUADO DE CARGAS

AUDIOMETRIA

Carlos Padron Perez, M.D.
 Esp. en Salud Ocupacional
 R.M. 1133 Lic. ESO565


ATENDIDO POR

CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ - Esp:
 MEDICINA DEL TRABAJO - Reg Médico: Lic ESO 565

Jaiver Vidal

FIRMA DEL TRABAJADOR

46919

MAXIMUS S&B S.A.S

Código del Prestador: 230010185701 NR: 902948634
 Dirección: CL 27 10 24 P1
 Teléfono: 3164899413-7917842
 Web: WWW.MAXIMUSS&B.COM
 Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia: S.O.042

Fecha de Impresión: 2022/11/08 15:02:15
 Impreso por: ECAUSADO
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación: CC - 1120378938
 Fecha Ingreso: 2022/11/08
 Fecha Naci: 1995-04-18
 Teléfono: 3137693732
 Dirección: PUEBLO NUEVO
 Empresa: INGENIAR DE LA COSTA LTDA
 Contrato: CONTRATO No 581 - INGENIAR DE LA COSTA LTDA - CONSOLIDADO
 Ocupación: ALIARAR SET

Paciente: HERNANDEZ PEÑAFIEL FRANCISCO ANTONIO
 Hora Ing: 07:27
 Edad: 27 años
 Municipio: TIERRALTA

Ingreso: 113013
 Sexo: M

**CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL****ENFASIS**

OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN

INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP

HIGIENE POSTURAL

CONTROL OPTOMETRICO ANUAL

ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO

CONTROL NUTRICIONAL Y PESO

PAUSAS ACTIVAS

PARACLINICOS REVISADOS

ESPIROMETRIA

AUDIOMETRIA

VISIONOMETRIA

INGRESO A SVE

SVE SALUD VISUAL

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS

AUTOCUIDADOS - HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE.
 DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19. El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009.

Maximo Tordecilla Diaz
 Esp. En Salud Ocupacional
 R.M. 1468496
 Lic (SST) 202130002379

FRANCISCO H

ATENDIDO POR

MAXIMO SEGUNDO TORDECILLA DIAZ - Esp: SALUD
 OCUPACIONAL - Reg Médico: 202130002379

FIRMA DEL TRABAJADOR

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados

	FORMULARIO DE HISTORIA MEDICO OCUPACIONAL
---	--

Fecha: 3-Abril-2022

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA

EL SEÑOR(A):	<u>BOABE, ANTONIO MORALES NEONETE</u>	
ES APTO PARA EL CARGO:	SI ☒	NO ☐ APTO CON RESTRICCIONES: SI ☐ NO ☐
APTOS CON LIMITACIONES QUE NO INTERFIEREN EN SU TRABAJO:		
PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE: <u>ASISTENTE ALEGANDILERIA</u>		
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO PARA EL CARGO:		
APTOS FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA: SI ☒ NO ☐		
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:		
APTOS FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (zanja o excavaciones): SI ☒ NO ☐		
APTOS FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (tanques o valijas, separadores, tratadores, ductos, sótanos, túneles, alcantarillas): SI ☒ NO ☐		
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:		
APTOS FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS: SI ☒ NO ☐		
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:		
APTOS FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR: SI ☒ NO ☐		
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR:		
RESTRICCIONES:	<u>NINGUNA</u>	
RECOMENDACIONES:	<u>USO EPP</u>	

El examinado certifica que toda la información suministrada por el es cierta y no omitió ningún otro dato sobre su salud.


Dr. Augusto Miguel Mendoza Abdala
 MEDICO ESPECIALISTA EN
 SALUD OCUPACIONAL
 Licencia SO No. 1133-13 RM 231836-95
 Celular: 310 361 72 49


Jorge Morales
 FIRMA DEL TRABAJADOR
 C.C No. 4004522156

Certifico que he recibido en el día de hoy copia de la historia médica ocupacional de examen médico de pre-ingreso, según lo establecido en la Resolución número 2346 del 11 de Julio de 2007, en el Artículo 9.

Firma: Jorge Morales

No. Cédula: 1004522156

Fecha: 03/11/2022

INSTITUTO VITAL
IPS
FORMATO DE HISTORIA MEDICA OCUPACIONAL

Fecha: 3 - NOV - 2012

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA

EL SEÑOR(A): MARCELO ARACELY GILLES NARANJO

ES APTO PARA EL CARGO: SI NO APTO CON RESTRICCIONES: SI NO

APT CON LIMITACIONES QUE NO INTERFIEREN EN SU TRABAJO

PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE: ATENDIENTE DE TRAFICO

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO PARA EL CARGO:

APT FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA: SI NO

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:

APT FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (zanja o excavaciones): SI NO

APT FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (tanques o vasijas, separadores, tratadores, ductos, solarios, tinales, alcantarillas): SI NO

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:

APT FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS: SI NO

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:

APT FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR: SI NO

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR:

RESTRICCIONES: NO

RECOMENDACIONES: USO EPP


El examinado certifica que toda la informacion suministrada por el es cierta y no omitió ningún otro dato sobre sus antecedentes.

Dr. Augusto Miguel Mendoza Abdala
MEXICO ESPECIALISTAS
MEDICO ESPECIALISTA
DR. AUGUSTO MIGUEL MENDOZA ABDALA
Licencia SO No. 1133-13 RM 231830-95
Celular: 310 361 72 49
FECHA: 3 - NOV - 2012

Marcelo Gilles N
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C No 4067833-388

Certifico que he recibido en el día de hoy copia de la historia medica ocupacional de examen medico de pre ingreso, según lo establecido en la Resolución número 2346 del 11 de Julio de 2007, en el Artículo 9.

Firma: Marcelo Gilles N No. Cédula 1067833-388
Fecha: 3 - NOV - 2012



FORMATO DE HISTORIA MEDICO OCUPACIONAL

Fecha: 3 - NOV - 2022

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA

EL SEÑOR(A): MARIA ISABEL OLITO PASTRANA
 ES APTO PARA EL CARGO: SI X NO: NO APTO CON RESTRICCIONES: SI NO
 APTO CON LIMITACIONES QUE NO INTERFIEREN EN SU TRABAJO
 PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DEL: ANEXIANA DE TRATICO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO PARA EL CARGO:

APT. FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA: SI X NO: NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:

APT. FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (zanjas o excavaciones): SI X NO: NO
 APT. FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (tanques o vasijas, separadores, tratadores, ductos, sótanos, túneles, alcantarillas): SI X NO: NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:

APT. FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS: SI X NO: NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:

APT. FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCIÓN VEHICULAR: SI X NO: NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCIÓN VEHICULAR:

RESTRICCIONES:

RECOMENDACIONES:

U 80 E P P

El examinado Dr. Augusto Mendoza Abdala informa en samitistrada por el es cierta y no omitió ningún otro dato sobre su salud.

DR. AUGUSTO MIGUEL MENDOZA ABDALA
 Licencia SO No. 1133-13 RM 251830-05


Celular: 310 3607249

FECHA: 3 - NOV - 2022

Maria Isbel Pastana
 FIRMA DEL TRABAJADOR
 C.C. No. 1062955370

Certifico que he leído en el día de hoy copia de la historia médica ocupacional y el examen médico de pre ingreso, según lo establecido en la Resolución número 3366 del 31 de julio de 2007, en el Artículo 9

Firma: Maria Isbel PastanaNo. Cédula: 1062955370Fecha: 03 - NOV - 2022

	FORMATO DE HISTORIA MEDICO OCUPACIONAL
---	---

Fecha: 3 - NOV - 2022

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA

EL SEÑOR(A): Carlos Arturo Castorina Cuervo

ES APTO PARA EL CARGO: SI ☒ NO ☐ APTO CON RESTRICCIONES SI ☐ NO ☒

APT CON LIMITACIONES QUE NO INTERFIEREN EN SU TRABAJO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ACUDANTE KIBANILEALA

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO PARA EL CARGO:

APT FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA: SI ☒ NO ☐

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:

APT FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (zanja o excavaciones): SI ☒ NO ☐

APT FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (tanques o vasijas, separadores, tratadores, ductos, sótanos, túneles, alcantarillas): SI ☐ NO ☒

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:

APT FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS: SI ☒ NO ☐

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS:

APT FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCIÓN VEHICULAR: SI ☒ NO ☐

RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCIÓN VEHICULAR:

RESTRICCIONES: NO

RECOMENDACIONES: USO EPP


El examinado, Carlos Arturo Castorina Cuervo, declara que la información suministrada por él es cierta y no omitió ningún otro dato sobre su salud.

DR. AUGUSTO MIGUEL MENDOZA ABDALA
 Licencia SO No. 1133-13 RM 231830-93
 Celular: 310 361 72 49
 FECHA: 3 - NOV - 2022

Carlos Castorina
 FIRMA DEL TRABAJADOR
 C.C No. 1133796702

Certifico que he recibido en el día de hoy copia de la historia medica ocupacional de examen medico de pre-ingreso, según lo establecido en la Resolución número 2346 del 11 de Julio de 2007, en el Artículo 9.

Firma: Carlos Castorina
 No. Cédula 1123796702
 Fecha: 3 NOV 2022



FORMATO DE HISTORIA MEDICO OCUPACIONAL

Fecha: 3-NOV-2022

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA

EL SEÑOR(A):	CARLOS ANTONIO TORRES SUAREZ	
ES APTO PARA EL CARGO:	SI ☒	NO ☐
APT CON RESTRICCIONES:	SI ☐	NO ☒
APT CON LIMITACIONES QUE NO INTERFIEREN EN SU TRABAJO:		
PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE:	AUXILIANTE ASESORIA	
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO PARA EL CARGO:		
APT FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:	SI ☐	NO ☒
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:		
APT FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (zanjas o excavaciones):	SI ☐	NO ☒
APT FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (tanques o vasijas, separadores, tratadores, ductos, solarios, torres, alcantarillas):	SI ☐	NO ☒
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:		
APT FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:	SI ☐	NO ☒
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:		
APT FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR:	SI ☐	NO ☒
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR:		
RESTRICCIONES:	NO	
RECOMENDACIONES:	USO EPP	

El examinado certifica que la información suministrada por el es cierta y no omitió ningún dato sobre su salud.


DR. AUGUSTO MIGUEL MENDOZA ABDALA
Licencia SO No. 1133-13 RM 231833-05
Celular: 310 381 72 49
FECHA: 3-NOV-2022

Carlos Torres
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C No. 1003401081

Certifico que he certado en el C.A de My capitulo de la historia medica ocupacional de examen medico de ingreso, segun lo establecido en la Resolución número 2340 del 11 de Julio de 2007, en el Artículo 5°

Firma: Carlos Torres No. Cedula: 1003401081

Fecha: 03/11/2022



FORMATO DE HISTORIA MEDICO OCUPACIONAL

Fecha: 3 - NOV - 2022

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA

EL SEÑOR(A):	CRISTIAN JOSE HERRERA BANQUETT	
ES APTO PARA EL CARGO:	SI	NO
APTO CON LIMITACIONES QUE NO INTERFIEREN EN SU TRABAJO:	APTO CON RESTRICCIONES	
PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE:	AYUDANTE ALBANILERIA	
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO PARA EL CARGO:		
APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:	SI	NO
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:		
APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (zanja o excavaciones):	SI	NO
APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (tanques o vasijas, separadores, tratadores, ductos, sótanos, túneles, alcantarillas):	SI	NO
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:		
APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:	SI	NO
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:		
APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR:	SI	NO
RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR:		
RESTRICCIONES:	NINGUNA	
RECOMENDACIONES:	USO EPP	

El examinado certifica que la información suministrada por él es cierta y no ocultó ningún otro dato sobre su salud.

DR. AUGUSTO MIGUEL MENDOZA ABDALA
Licencia SO No. 1133-13 RM 231830-05

Celular: 310 361 72 49

FECHA: 3 Noviembre

Cristian
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C No. 1073969895

Certifico que he recibido en el día de hoy copia de la historia medica ocupacional de examen medico de pre- ingreso, según lo establecido en la Resolución número 2340 del 11 de Julio de 2007, en el artículo 9.

Firma: Cristian

No. Cédula 1073969895

Fecha: 3 Noviembre

FORMATO DE HISTORIA MEDICO OCUPACIONAL

Fecha: 3 - NOV - 2022

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA

EL SEÑOR(A): LUIS FERNANDO URZOLA BERRIO
 ES APTO PARA EL CARGO: SI NO APTO CON RESTRICCIONES: SI NO
 APTO CON LIMITACIONES QUE NO INTERFIEREN EN SU TRABAJO
 PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE: AUXILIANTE ALBAÑILERIA
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO PARA EL CARGO:

APT. FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA: SI NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJAR EN ALTURA:

APT. FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (zarcas o excavaciones): SI NO
 APT. FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (tanques o vasijas, separadores, tratadores, ductos, sifones, binetes, alcantarillas): SI NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:

APT. FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS: SI NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS:

APT. FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR: SI NO
 RAZONES POR LAS CUALES NO ES APTO FISICAMENTE PARA REALIZAR CONDUCCION VEHICULAR:

RESTRICCIONES: NINGUNA

RECOMENDACIONES:

Uso EPP

El examinado certifica que los datos suministrados en esta historia médica ocupacional son ciertos y no omitió ningún otro dato sobre su antecedente.

DR. AUGUSTO MIGUEL PANDOZA ABDALA
 Licencia SO No. 1133-13 RM 231830-95

Celular: 3103617249

FECHA:

3 - NOV - 2022

Luis Fernando

FIRMA DEL TRABAJADOR

C.C No.

1.063.357.586

Certifica que ha recibido en el día de hoy copia de la historia médica ocupacional de examen médico de pre-ingreso, según lo establecido en la Resolución número 2346 del 11 de Julio de 2007, en el Artículo 9.

Firma:

Luis Fernando

No. Cédula

1.063.357.582

Fecha:

03 - Noviembre - 22



9652

Obra		Fecha de Revisión				Responsable de Inspección	
Contrato de obra N° 1P-SPM 012-2022		A	B	C	D	Jovana González Mendez	
Objeto de Obra		Encargado del Frente				Representante SST	
Santiago Sanchez		Javier Morales				Cristian P. Gonzalez	
CALIFICACIÓN: T = Cumplimiento Total P = Cumplimiento Parcial I = Insuficiente NA = No Aplica							
ITEM	DESCRIPCION DE FACTORES CRITICOS ENTORNO Y DE SUS RESPECTIVOS ITEMS	T	P	I	NA	Observaciones	
1. SEÑALIZACIÓN ZONA DE CIRCULACIÓN							
1.1	Se encuentran señalizadas las rutas de evacuación y salida de emergencia.	x					
1.2	Se tiene ubicado y demarcado el sendero peatonal.	x					
1.3	Los tableros eléctricos se encuentran señalizados de acuerdo al voltaje.				x		
1.4	Están señalizados la ubicación de extintores.	x					
1.5	Está delimita con conos reflectivos al área de trabajo.	x					
1.6	Se cuenta con señalización de advertencia de peligros potencial: en la vía o en la zona tales como trabajos en la vía, maquinaria en la vía, senderero.	x					
1.7	Se cuenta con señalización informativa para indicar el trabajo que se realiza como inicio y fin de obra, terrizo, etc.	x					
1.8	Se cuenta con señalización que indique atención especial como desvíos, cerramientos, etc. otros.	x					
2. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL							
2.1	El personal que permanece en la obra utiliza en todo momento el casco de seguridad.	x					
2.2	El personal expuesto utiliza protección de gafas de seguridad en todo momento en la obra.	x					
2.3	El personal que permanece en la obra o cerca de una fuente de ruido utiliza protección auditiva.	x					
2.4	El operador del compresor utiliza protección ocular, tipo resaca y tipo copa.	x					
2.5	El operador de la planta vibradora, elaplanador, la tierra de corte de pavimento utiliza en todo momento la protección auditiva y protección visual.	x					
2.6	El personal de la obra utiliza en todo momento el uniforme de trabajo de la empresa puesto correctamente.	x					
2.7	El personal de la obra utiliza en todo momento guantes en la manipulación de materiales y herramientas.	x					
2.8	El personal de la obra utiliza en todo momento botas de seguridad.	x					
2.9	El personal que manipula, fonde, transporta la liga para pavimento e imprimación, utiliza el delantal de goma, guantes de goma largos hasta el codo, careta de protección facial, y polainas para la protección de las piernas.				x		
3. HERRAMIENTAS MANUALES							
3.1	Las herramientas son transportadas en portaherramientas.				x		
3.2	Los malletes o portaherramientas se encuentran en buen estado.				x		
3.3	Los malletes o portaherramientas permiten el aseguramiento de la herramienta a la anilla desde la zona de la cabeza.				x		
3.4	La herramienta está ubicada de manera que no ofrece puntas o bordes expuestos.				x		
3.5	La herramienta está ubicada dentro de gavetas, estantes o fijada a la pared discriminadas por tipo y por tamaño y no representa riesgo de accidente por contacto con partes cortantes, o punzantes.				x		

CS 53

4. EL ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS GARANTIZA LA MANIPULACIÓN SEGURA SI ESTA ES UTILIZADA PARA EL TIPO DE TRABAJO QUE FUE DISEÑADA					
PICAS					
4.1	Con inserción adecuada de la cabeza de la herramienta al mango.				X
4.2	Pala con punta dentada y pala con filo.				X
4.3	Presencia de astillas de madera en el mango, mango fisurado.				X
PAJAS					
4.4	Con inserción adecuada de la cabeza de la herramienta al mango.	X			
4.5	Borde de pala en buen estado y completa (sin de tres cuartos de vida).	X			
4.6	Presencia de astillas de madera en el mango, mango fisurado.	X			
MANGOS O BARRETONES					
4.7	Mango torcido o con rebabas.	X			
4.8	Pala con borde en buen estado y punta con filo.	X			
5. SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
5.1	Se conservan las distancias de seguridad con respecto a la operación del equipo pesado (por fuera de la trayectoria del equipo y por lo menos la distancia máxima del alcance del brazo o de la herramienta del equipo más un metro).	X			
5.2	El equipo no se utiliza como portaherramientas o para guardar elementos del trabajo o personales de los operarios.	X			
5.3	El transporte del personal se realiza en vehículos destinados para tal fin, jamás se utilizan balde de retroexcavadores, palas de bulldozer para transportar personal.	X			
5.4	La operación del equipo pesado es realizado por personal capacitado debidamente entrenado y autorizado.	X			
5.5	Se verifica diariamente el estado del equipo antes, durante y después de su operación.	X			
6. ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y EPP					
6.1	Se encuentra en adecuado estado de orden y aseo.		X		
6.2	Se tienen correctamente almacenados los EPP.		X		
6.3	Se tiene registro de la entrega de EPP con la firma de la persona que recibe y fecha.		X		
6.4	Se tiene tríptico de primeros auxilios en buen estado, y con los elementos necesarios.		X		
6.5	Se cuenta con extintor, con recarga vigente.		X		
7. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ESPECIALES					
	Se almacenan los combustibles y aceites en tanques o recipientes cerrados según la cantidad y se protege el contenedor de daños para reducir al riesgo de derrame.	X			
EXCAVACIONES					
	Cuando se realizan excavaciones, éstas se señalan acorde con la normatividad, para evitar accidentes.	X			
	La persona que realiza la excavación está acompañada.	X			
	El material excavado se utiliza como relleno a 60 cm de la excavación para evitar que este se desmorone.	X			
	Se almacenan las herramientas en lugares adecuados en la obra.	X			
	Se enciende y se deja el área de trabajo en orden y aseo.	X			
	Se cuenta con adecuada señalización.	X			
	Se verifica el correcto estado de los equipos y herramientas a utilizar en la ejecución de esta actividad.	X			
	Se tiene la existencia de redes de servicio que interfieren con la ejecución de la actividad.	X			
	Se chequean los niveles de excavación requieridos de acuerdo a la norma establecida.	X			
ACTIVIDADES GENERALES					
	El transporte interno de materiales como hierro, tubería, y demás, se hace entre dos o más personas (en estafas similar y si no es posible, la persona más alta va atrás, utilizan adecuada postura que impide el roce del material con el hombro).			X	
	La concretadora está ubicada en un lugar seguro que impide el volcamiento y riesgo eléctrico.			X	
	Las tarimas de circulación tienen como mínimo dos superficies de apoyo que generen estabilidad en el momento del transporte del coche.			X	
	Al ocupar a bordo de obra, se cuenta con la línea para indicar la carga máxima permitida del peso.			X	



CONSULTORES DONOVAN SAS

4659

INFORME PGIO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA,	Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022
COMPONENTE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.	

Datos Generales

Datos Generales					
PERIODO DEL	18 / julio / 2023	AL	31 / julio / 2023	INFORME No.	8
Nombre:	Mario Monterroza Otero				
Cargo:	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo				

Actividades realizadas en el periodo

1. LABOR REALIZADA	
1.1.	Se cumplió el Plan de Trabajo de SG-SST CONSTRUCCIONES AP establecida para el desarrollo del contrato de Obra. Seguimiento Indicadores de conformidad a requisitos mínimos.
1.2.	Se realizo el Plan de Trabajo de SG-SST del CONSULTORES DONOVAN SAS establecida para el desarrollo del contrato de Interventoría. Seguimiento Indicadores de conformidad a requisitos mínimos.
1.3.	Se realizaron las Inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo a todos los frentes de Obra CONSTRUCCIONES AP, asimismo, se hace con el Cronograma de actividades del SST
1.4.	Se ejecuto seguimiento Implementación cronograma de actividades SST para el desarrollo de las actividades del contrato de Obra.
2. CONCEPTOS Y GENERALIDADES ACORDE A LA LABOR REALIZADA	
2.1.	De conformidad con el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022, se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none">✓ Afiliación al sistema general de seguridad social integral✓ Se realizó entrega de elementos de protección personal al personal operativo.✓ Se realizaron Inspección a camilla y botiquín.✓ instalación de señalización de ruta de evacuación✓ Identificación de los peligros y valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo✓ Se realizó la reunión del COPASST.✓ Inspecciones de equipos y maquinarias a: MINICARGADOR - MOTONIVELADORA - VIBRO CAT 7 TON -RETROEXCAVADORA - EXCAVADORA ORUGA✓ Durante este periodo se realizaron capacitaciones al personal de los siguientes temas:<ul style="list-style-type: none">● Riesgos biológicos● Cuidado de la piel● Riesgos ergonómicos● Lugares confinados● Higiene laboral.● Pausas activas● Condiciones inseguras● Primeros auxilios● Riesgos psicosociales



De acuerdo con lo definido a la Resolución 0312 de 2019 en su Art. 30. "Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo", a partir del año 2019, a continuación, se encuentra el seguimiento a los siguientes indicadores: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica, los cuales son los siguientes:

PERIODO	Trabajadores	MEDICIÓN DE LOS INDICADORES					
		FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA
18 julio hasta el 31 julio 2023	50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00

2.2.

De conformidad con el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CMA-SPM-009-2022 periodo comprendido del 18 julio hasta el 31 julio 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del personal contratado
- ✓ Cálculo y análisis de los indicadores de accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo de acuerdo al art. 30 de la Res. 0312 de 2019.
- ✓ Control y organización de la documentación física y digital del SG -SST.
- ✓ Realización de las inspecciones de seguridad.
- ✓ Charlas de higiene, seguridad industrial y protocolo de bioseguridad
- ✓ Se entregan de dotación y elementos de protección personal EPP

En este periodo el CONSULTORES DONOVAN SAS no se presentaron Accidentes de trabajo, ni fueron reportadas por los colaboradores enfermedades laborales, no se presentaron ausencias por origen común o laboral, a continuación, se presentan los indicadores de accidentalidad:

INDICADORES	INDICE (KPI)	META	ACUMULADO	Resultado periodo (comprendido del 18 julio hasta el 31 julio 2023)	Cumple SI / NO
Frecuencia de los accidentes laborales	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes * 100	0	0,00	0,00	SI
Severidad de los accidentes laborales	Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días perdidos en el mes / Número de trabajadores en el mes * 100	0	0,00	0,00	SI
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Población de trabajadores en el periodo * 100/1000	0	0,00	0,00	SI
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año * 100	0	0,00	0,00	SI
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Población de trabajadores en el periodo * 100/1000	0	0,00	0,00	SI
Ausentismo	Número de días de ausente por incapacidad laboral y común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes * 100	<2,5	0,00	0,00	SI

2.3

En el Periodo comprendido del 18 julio hasta el 31 julio 2023, se implementó en el frente de obra LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en donde se evidenciaron las siguientes desviaciones:

- ✓ 19-07-2023 se evidencia trabajadores trabajando sin EPP correspondiente a la actividad que realizaban
- ✓ 28-07-2023 se evidencia en el frente de obra con falta de orden y aseo y poca



	<p>señalización</p> <p>✓ Las desviaciones detectadas fueron reportadas IN SITU al contratista de obra, y se establecieron las respectivas acciones de cierre con fecha de cierre estimada.</p>
3. RECOMENDACIONES	
3.1.	Continuar con la implementación de las actividades programadas en el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022 CONSTRUCCIONES AP. Se debe se organizar una jornada de orden y aseo en el frente de obra, asimismo, señalar más la obra y entregar los EPP a los trabajadores
3.2	Asegurar el cumplimiento de las acciones de cierre producto de los hallazgos evidenciados en el desarrollo de las Inspecciones de seguridad y Salud en el Trabajo realizadas por la Interventoría, así como las desviaciones producto de sus propias inspecciones.
3.3.	Continuar con la implementación del Control de trabajo para el desarrollo del contrato.
4. CONCLUSIONES	
4.1.	CONSTRUCCIONES AP <ul style="list-style-type: none">✓ En el periodo comprendido del 18 julio hasta el 31 julio 2023, se cumplió el 85% de las actividades programadas en el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022✓ Se realizaron inspecciones planeadas de seguridad✓ Los Indicadores de accidentalidad establecidos con base en la resolución 0312 fueron medidos, en el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, enfermedades laborales o incapacidades de origen común o laboral que afectaran dichos indicadores
4.2.	CONSULTORES DONOVAN SAS <ul style="list-style-type: none">✓ En el periodo comprendido del 18 julio hasta el 31 julio 2023, se cumplió el 97% de las actividades programadas en el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CMA-SPM-009-2022✓ Al realizar seguimiento de Objetivos, metas e Indicadores establecidas para el SG-SST, no se presentaron desviaciones. Los indicadores se encuentran dentro de las metas establecidas.✓ Se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de SST.✓ se realizó la implementación de los indicadores del SG-SST, basado en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019



COMSA - INGENIERIA S.A.S.

9637

INFORME PGIO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"	Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022
COMPONENTE DE CALIDAD	

Actividades realizadas en el periodo

5. LABOR REALIZADA	
5.1.	Comprobación cumplimiento Pólizas y actualizaciones, actas de vecindad y bitácora de obra.
5.2.	Cumplimiento Cronograma de obra vigente (Programado VS. Ejecutado), seguimiento y cálculo del avance de obra
5.3	Se realizó la verificación de los certificados de calidad de materiales prefabricados utilizados en obra
5.4	<p>En el transcurso del mes de JULIO, se han logrado avances significativos en el proyecto de construcción de la placa huella. El equipo de construcción ha llevado a cabo una serie de actividades cruciales para el desarrollo del proyecto, demostrando un alto nivel de profesionalismo y eficiencia en cada fase del proceso</p> <p>Avances Destaca Durante este periodo, se han completado con éxito las reparaciones y desvíos provisionales de las tuberías de agua potable de 4" y 6", asegurando la continuidad del sistema de agua potable durante la construcción. Además, se ha realizado el descapote y cargue de material con acarreo libre a habitantes de la zona, proporcionando la base esencial para las fases posteriores de la obra. La conformación del terraplén con material de relleno general ha preparado el terreno para la colocación, extendido y compactación de la subbase granular clase c han garantizado una base sólida y estable. En el ámbito estructural, se ha progresado en la colocación del acero de refuerzo para la placa huella y se han completado los vaciados de concreto, incluyendo la placa rígida, concreto ciclópeo, viga riostra y berma cuneta, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad. Además, se ha llevado a cabo la excavación y fundición de los pilotes restantes (16 unidades), proporcionando el soporte necesario para la elaboración del puente. La excavación del box #2 y su posterior mejora con piedra, material seleccionado y solado han preparado el área para la construcción, junto con el formateo y vaciado de la losa inferior del mismo.</p> <p>Para facilitar la construcción de los box culverts #1 y #2, se han establecido pasos provisionales, asegurando tanto la seguridad como la accesibilidad en el sitio de trabajo. Además, se ha avanzado en la figuración y colocación del acero de refuerzo en los elementos estructurales del box culvert #2, preparándolo para las siguientes fases de construcción</p> <p>Ensayos y Garantía de Calidad: Es importante destacar que, durante todas estas actividades, se han llevado a cabo ensayos detallados, incluyendo ensayos de resistencia del concreto, ensayos de suelo y otros análisis de calidad. Estos ensayos han confirmado que los materiales y las estructuras cumplen con los estándares requeridos, asegurando la durabilidad y seguridad del proyecto.</p> <p>Conclusiones y Próximos Pasos: El equipo ha demostrado un compromiso excepcional con la calidad y la eficiencia en cada etapa del proyecto. Los avances realizados durante este mes sientan una base sólida para las fases subsiguientes. Para el próximo mes, se planea continuar con la construcción de los box culverts y avanzar en las actividades que conducirán a la finalización exitosa del proyecto de la placa</p>



CONSULTORES PUNTA RENAS S.A.S.

	huella. Se continuará trabajando de cerca con todos los equipos involucrados para garantizar un progreso continuo y un resultado final que cumpla con los estándares más altos de calidad y seguridad.
6. CONCEPTOS Y GENERALIDADES ACORDE A LA LABOR REALIZADA	
6.1.	Los equipos de medición utilizados durante el periodo evaluado se encontraban debidamente calibrados, para garantizar la veracidad de las mediciones.
6.2.	Se Cuenta con el PMT aprobado por la autoridad de tránsito competente.
6.3.	Se evidencia en campo: Se continúa evidenciando poca señalización preventiva e informativa vial en los frentes de obra de acuerdo al PMT
7. RECOMENDACIONES	
7.1.	Continuar con la implementación de las actividades programadas en el Plan de calidad establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022 CONSTRUCCIONES AP
7.2.	El director del CONSTRUCCIONES AP, deben asegurar el cumplimiento del plan de calidad en obra.
7.3.	Mejorar la implementación del PMT de manera inmediata en cada frente de obra
8. CONCLUSIONES	
8.1.	CONSTRUCCIONES AP
	<ul style="list-style-type: none">✓ En el Periodo comprendido del 18 julio hasta el 31 julio 2023, se cumplió el 80% de las actividades programadas en el Plan de calidad establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022✓ se cumplió con las actividades establecidas para en el Periodo comprendido del 18 julio hasta el 31 julio 2023, en las instalaciones de señalizaciones establecidas por el PMT



CONSULTORES SOCIOAMBIENTALES

9639

**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO**



Foto GSST1. Evidencia de cercamiento de materiales en obra



Foto GSST2. Evidencia de instalación de cerramiento en la vía

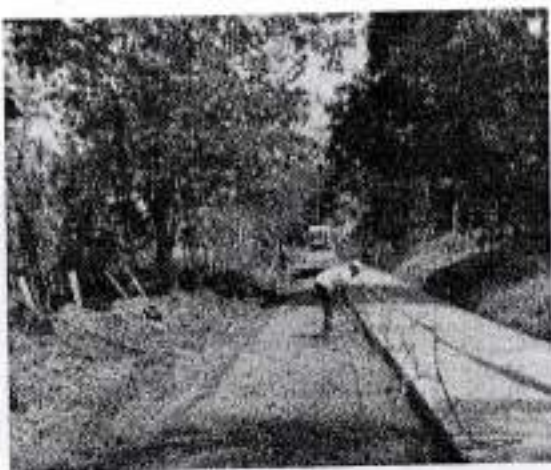


Foto GSST3. Señalización de condiciones inseguras

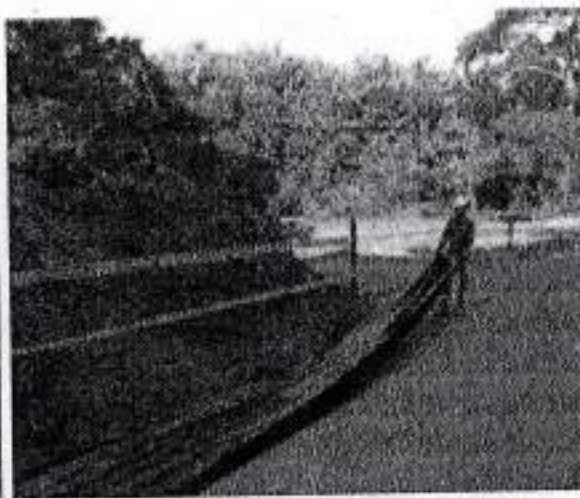


Foto GSST4. Señalización de condiciones inseguras



ESTELI TORRES CONSULTORES S.A.S.

4660

ELABORO: Mario Monterroza Otero Ingeniero. ESP SST
FIRMA: 

FECHA INFORME: 31 julio de 2023

Informe de Supervisión
Nº 08



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



9661

PERIODO INFORME: 18 DE JULIO DE 2023 AL 17 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información general obra

CONTRATO No:	LP-SPM-012-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$9.691.701.283,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL INICIAL:	22 DE MARZO DE 2023
VALOR PAGADO 30% ANTICIPO:	\$ 2.907.510.384.90
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	29 DE DICIEMBRE 2022
ACTA DE REINICIO N°1:	10 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°1:	2 DE JUNIO DE 2023 (1 MES)
SUSPENSION N°2:	30 DE JUNIO DE 2023
REINICIO N°2:	18 DE JULIO DE 2023

1.2 Información general interventoría

CONTRATO N°:	CMA-SPM-009-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA.
CONTRATISTA:	CONSULTORIA DONOVAN S.A.S, Representado Legalmente Por: JUAN DIEGO ARENA DE LA HOZ, CC. N°1.020.720.226 de BOGOTA.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



VALOR INICIAL:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
PESOS (\$696.192.460) M/CTE.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería

Corregimiento: Tres piedras



3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 3.58 km de pavimento tipo placa huella, de forma general estos se construirán desde la apartada (carretera en asfalto – hasta la placa huella existente en la vereda Maracayó) dentro de las obras de arte o drenaje se encuentra la construcción de 1 puente y 6 box culvert, distribuidos de la siguiente según lo indica la siguiente tabla:

ID OBRA	ESTRUCTURA	ABSCISA	OBSERVACION
01	Box culvert	k0+379.51	Nueva
02	Box culvert	k0+860.21	Nueva
03	Box culvert	k1+241.12	Nueva
04	Box culvert	k1+506.28	Nueva
05	Puente	k1+781.80	Nueva
06	Box culvert	k1+975.73	Nueva
07	Box culvert	k2+048.39	Nueva

De ajustes contenidos en el documento que suscito o soportes de la adición N°1 y prórroga N°2, se incluyó la construcción de una nueva estructura hidráulica tipo box culvert en la abscisa K3+030.



Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA


INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023




9663

4. DISEÑO PLACA HUELLA

4.1 Sección típica placa huella

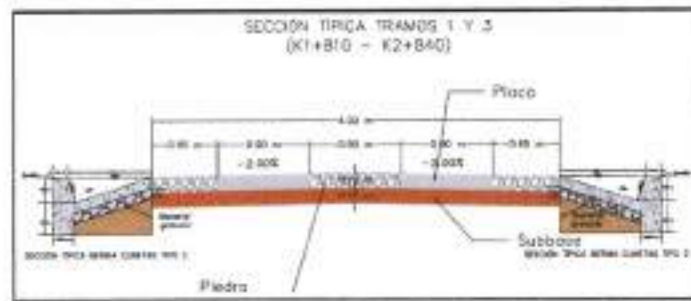

4.2 Sección típica Vox Culvert

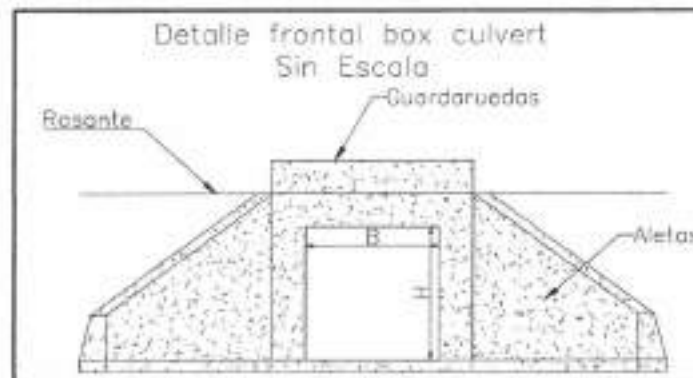

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1. PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIAL: 6 MESES	DESDE	HASTA
		22 de septiembre de 2022	22 de marzo de 2022
2. SUPERVISOR:	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Secretaria de Infraestructura	22 de septiembre de 2022	22 de marzo de 2022
3. INTERVENTORÍA:	CONOSRCIO CDI INTERVENTORES	DESDE	HASTA
		22 de septiembre de 2022	22 de marzo de 2022
4. C.D.P	NUMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
Vigencia 2022	22000927	11/03/2022	\$ 10.206.292.719,00

Gobierno de La **GENTE**

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



4659

5. C.R.P	NUMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
Vigencia 2022	22001857	5/08/2022	\$ 9.691.701.283,00
POLIZA N° 100171905	ASEGURADORA: SEGUROS MUNIDAL		
6. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	0151-2022	7 JULIO DE 2022	SEGÚN CONTRATO
7. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	0270-2022	20 OCTUBRE 2022	ACTA DE INICIO
8. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	CO1.WRT.11313535 SECOPII	24 MARZO DE 2023	ACTA DE REINICIO N°1
9. RES. APROBACIÓN DE POLIZA PENDIENTE	NUMERO	FECHA	PROCESO
	EN TRAMITE		PRORROGA N°1 REINICIO N°2 ADICION N°1 Y PRORROGA N°2

6. CONTRATO INTERVENTORIA

10. PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIAL: 6 MESES	DESDE	HASTA
		22 de septiembre de 2022	22 de marzo de 2022
11. SUPERVISOR:	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Secretaría de Infraestructura	22 de septiembre de 2022	22 de marzo de 2022
12. C.D.P	NUMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
Vigencia 2022	22000926	11/03/2022	\$714.068.800,00
13. C.R.P	NUMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
Vigencia 2022	22002010	25/08/2022	\$ 696.192.460,00
POLIZA N° 3413175-4	ASEGURADORA: SURAMERICANA		
14. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	0198-2022	22/08/2022	SEGÚN CONTRATO
15. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	0286-2022	01 NOVIEMBRE 2022	ACTA DE INICIO
16. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	CO1.WRT.12141148	31 JULIO DE 2023	PRORROGA N°1 REINICIO N°2



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



7. ACTAS DEL CONTRATO

Acta	Fecha de Suscripción
Socialización	26 de Agosto 2022
Inicio	22 de Septiembre 2022
Acta de suspensión N°1	29 de Diciembre de 2022
Acta de reinicio N°1	10 de Marzo de 2023
Prorroga N°1	2 de Junio de 2023
Suspensión N°2	30 de Junio de 2023
Reinicio N°2	18 de Julio de 2023
Adición N°1 y prórroga N°2	19 de Julio de 2023

8. Avance físico según informe semanal N°37 (26/06/2023 al 30/06/2023)

INDICADORES			
Fecha de inicio	22-sep-2022	Días Programados	60
Suspensión N°01	29-dic-2022	Días Transcurridos	241
Reinicio N°01	10-mar-2023	Días Faltantes	59
Suspensión N°02	30-jun-2023		
Reinicio N°02	18-jul-2023		
Fecha de entrega	20-oct-2023		
Valor Planeado	\$ 5.432.206.991	% Acumulado Programado	49.47%
Valor Ejecutado	\$ 2.414.445.704	% Acumulado Ejecutado	22.17%
		% ATRASO	-27.30%
% Semana Programado	8.51%	Horas arqueología del Día	48/70
% Semana Ejecutado	0.34%	Horas arqueología Acumulada	0
% Atraso	-8.58%		
Horas bloqueos del Día	0		
Horas bloqueos Acumulados	0		

Según reprogramación entregada con la Adición N°1 y prórroga N°2 el avance físico es el siguiente:

% de avance físico acumulado ejecutado: 22.17%

% de avance programado acumulado según reprogramación: 49.47%

% retraso: -27.30%

9. Balance financiero Obra

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGADO/TRAMITE
Valor del Contrato	\$9.691.701.283,00	
Anticipo 30%		\$ 2.907.510.384.90
Saldo		\$ 6.784.190.898.10
TOTAL	\$9.691.701.283,00	\$9.691.701.283,00



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



El avance financiero es el siguiente:

Avance financiero ejecutado: \$ 2.434.445.704

Avance financiero programado: \$ 5.432.206.991

10. Balance financiero interventoría

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGADO/TRAMITE
Valor del contrato	\$ 696.192.460,00	
Actas		\$ 0,0
TOTAL	\$ 696.192.460,00	\$ 696.192.460,00

11. Seguimientos informes de interventoría

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO	ESTADO
Informe 1	22 septiembre 2022	22 septiembre de 2022 al 21 de octubre 2022	PRESENTADO
Informe 2	22 noviembre de 2022	22 octubre de 2022 al 21 de noviembre 2022	PRESENTADO
Informe 3	22 diciembre de 2023	22 noviembre de 2022 al 21 de diciembre 2023	PRESENTADO
Informe 4	01 abril de 2023	22 al 29 de diciembre de 2022 – 10 al 30 de marzo 2023	PRESENTADO
Informe 5	01 Mayo de 2023	1 abril al 30 abril 2023	PRESENTADO
Informe 6	01 Junio de 2023	1 mayo al 30 de mayo 2023	PRESENTADO
Informe 7	03 Julio de 2023	1 junio al 30 de junio de 2023	TRAMITE

12. Actividades realizadas durante el periodo

Instalación de Sub base, Terraplén.

Construcción de placa huella.

Excavación con máquina para construcción de box culvert.

Gobierno de La **GENTE**

Calle 27 No. 9 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



Figuración de hierro para box culvert.
Armada y fundida de Box Culvert K0+860.
Fundida de Pilotes.

13. Desarrollo del contrato

El Contrato de Obra No. LP-SPM-012-2022, inició su ejecución en fecha 22 de septiembre de 2022, de acuerdo al Acta de Inicio suscrita por el representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES AP S.A.S, la firma contratista de interventoría CONSULTORES DONOVAN S.A.S. y, el secretario de Infraestructura del Municipio.

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 se suspendió el contrato de obra LP-SPM-022-2022 y por ende el contrato de interventoría CMA-SPM-009-2022.

Que, en fecha 10 de marzo de 2023 se reactivó el contrato de obra e interventoría.

Que, en fecha 2 de junio de 2023 se materializó la prórroga N°1 del contrato de obra y por ende el contrato de interventoría.

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se realizó la suspensión N°2 del contrato de obra e interventoría.

Que, en fecha 18 de julio de 2023 se realiza el reinicio N°2 del contrato de obra e interventoría.

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se aprueba por las partes en la plataforma Secop II la adición N°1 y prórroga N°2 del contrato de obra e interventoría.

En el seguimiento realizado al desarrollo del contrato se resalta el periodo del siguiente informe:

En fecha 27 de junio de 2023 se realiza comité de obra N°13, donde se expresa que a la fecha se encuentra en revisión y/o concepto técnico por parte de la firma consultora PABLO CASTILLA NEGRETE, estudios geotécnicos y ambientales. Por su parte Construcciones AP solicita suspender el contrato de obras dado que el Consultor requiere tiempo para revisar y emitir concepto.

Por otra parte, el Consultor PABLO CASTILLA NEGRETE mediante oficio de fecha 30 de junio de 2023, al respecto de la construcción de un cárcamo con rejilla propuesta por el contratista de obra y avalada interventoría, recomienda el diseño de una estructura hidráulica de mayor capacidad que permita el flujo de agua de acuerdo al área aferente.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



Así las cosas, el día 4 de julio de 2023 el contratista entrego los diseños de dicha estructura hidráulica, la cual fue remitida en la misma fecha al consultor.

Se obtuvo respuesta afirmativa con respecto a la construcción del boxculvert y modificación del diseño geométrico, mediante oficio de fecha 7 de julio de 2023 emitido por el consultor del proyecto, donde además realiza otras recomendaciones.

En fecha 7 de julio de 2023 se desarrolla comités de obras N°14 donde trata y concluye los siguiente:

Sobre la tubería existente, la administración Municipal adelanta los estudios necesarios con el fin de adelantar los tramites administrativos para contratar el remplazo de la tubería.

Teniendo en cuenta que se tiene el pronunciamiento total del Consultor sobre las situaciones planteadas, instar al contratista a presentar presupuesto de las obras adicionales, balance de obras con mayores y menores cantidades y la inclusión dentro de dicho balance de los INP. Con todos los soportes requeridos para su estudio y aprobación por parte de la interventoría y finalmente la aprobación de la Municipalidad.

Lo anterior debe también soportar el tiempo necesario para la ejecución de las obras, por tal motivo se debe presentar una programación.

En fecha 10 de julio de 2023 mediante oficio MAR-012-2022-044, construcciones AP presento al firma interventora presupuesto de obras adicionales por valor de \$1.289.109.292,00 y la estimación de un tiempo de prórroga de 3 meses, la firma interventora de pronunció a través de los oficios DON-009-MONT-2022 adiado 10 de julio de 2023 aprobando el balance presentado por el contratista de obras y DON-009-MONT-125-2022 de fecha 11 de julio de 2023 la interventoría en ejercicio de sus funciones emite concepto favorable para realizar la adición y prórroga.

En fecha 11 de julio de 2023, desde la secretaria de infraestructura se recomienda al alcalde la necesidad de adicionar recursos y prorrogar el contrato de obra e interventoría.

En fecha 18 de julio de 2023, se realiza el reinicio N°2 del contrato de obra e interventoría.

Lo anterior conlleva a que en fecha 19 de julio de 2023 se firmara por las partes en la plataforma Secop II, Adición N°1 y prórroga N°2 al contrato de obra e interventoría.

Dado lo anterior se tiene que:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA: \$10.980.810.575,00

Gobierno de La GENTE



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



9669

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: \$ 899.778.696,00

TIEMPO DE EJECUCION FINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2023.

14. Conclusiones

- Según la reprogramación de obra entregada con respecto a la prórroga N°1, el contratista proyecto para el presente periodo alcanzar un avance acumulado del 49.47% al a fecha alcanza un acumulado ejecutado de 22.17%, reflejando un retraso del 27.30%.

Ing. Iris Spath Camano.
Secretaria de Infraestructura – Supervisor del contrato.

Proyectó: Ing. Victor Hernández – Apoyo a la supervisión



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

INFORME SUPERVISIÓN N°8
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 20 AGOSTO de 2023



ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

RELLENOS /EXTENDIDO /COMPACTACION /PLACA HUELLA



Gobierno de La **GENTE**

Acta de Reunión



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE REUNIÓN
FECHA: 31 de agosto de 2023



9671

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No:	CMA-SPM-009-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR:	\$ 696.192.460,00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 (SEIS) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	22 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA REINICIO 1:	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 2:	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA REINICIO 2:	18 E JULIO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE AGOSTO DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los 31 días del mes de agosto del año 2023 y estando vigente el Contrato de interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron los firmantes de la asistencia, tal como se presenta a continuación:

VICTOR HERNANDEZ NOVOA: Ingeniero de apoyo a la supervisión
IVAN ALVIZ GONZALEZ: Director de Interventoría

TEMAS A TRATAR

1. Autorización vinculación de personal de Interventoría según las necesidades de ejecución del contrato.

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE REUNIÓN
FECHA: 31 de agosto de 2023



El ingeniero Víctor Hernández, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, manifiesta que, de acuerdo a lo contemplado en el numeral 14.11 del anexo técnico del proceso contractual de interventoría, el cual expresa lo siguiente: "...El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría del municipio. Así mismo el municipio se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) de los integrantes del equipo de interventoría conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del servicio..." por tal motivo se hace necesario autorizar el personal y recursos de interventoría de acuerdo a las necesidades actuales de la ejecución del contrato para el mes de septiembre de 2023, tal como se describe en el siguiente cuadro:

PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2023				
	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	DEDICACION
1	IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ	92.033.432	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	0,50
2	MARTIN MARTINEZ	3.880.125	ESPECIALISTA AMBIENTAL	0,60
3	JESUS TAFUR	1.102.856.789	RESIDENTE 1	1,00
4	KIARA MAZA	1.102.581.304	PROFESIONAL SOCIAL	0,50
5	MARIO MONTERROZA	92.534.968	Coordinador SG-SST	0,50
6	ANDERSON VILLAMIZAR TEHERAN	92.549.890	TOPOGRAFO	1,00
7	PEDRO ARRIETA	1.074.013.639	INSPECTOR 1	1,00
8	GERMAN NOVOA	1.103.094.694	INSPECTOR 2	1,00
9	ELVIS HURTADO	1.002.439.502	CADENERO 1	1,00
OTROS COSTOS DIRECTOS				
10	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015			1,00
11	Equipo completo de topografia			1,00
12	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo			0,50
13	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)			1,00
OTROS COSTOS				
14	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.			0,20
15	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.			1,00

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE REUNIÓN
FECHA: 31 de agosto de 2023



COMPROMISOS

1. Disponer del personal y recursos de interventoría en el mes de septiembre de 2023, de acuerdo a las indicaciones manifestadas en el cuadro anterior (INTERVENTORÍA).

LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRE	CELULAR	CORREO	FIRMA
VICTOR HERNANDEZ NOVOA	301 555 51 60	Infra.hernandez24@gmail.com	
IVAN ALVIZ GONZALEZ	301 284 55 57	Donovanmtr009@gmail.com	

Informe de interventoria
Nº 9

9679

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV: 0 Página 1 de 51
---	---	------------------------------

ALCALDIA DE MONTERIA

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CMA-SPM-009-2022

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9

PERIODO

1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

AGOSTO DE 2023


9675

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPN-005-2022	REV. 0
	INFORME MENSUAL No. II PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022	Página 2 de 51


**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9
DEL PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.**

**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN
EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**

ELABORÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
IVÁN ENRIQUE ALVIZ GONZÁLEZ
M.P.Nº: 22202151364 COR

REVISÓ Y APROBÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
IVÁN ENRIQUE ALVIZ GONZÁLEZ
M.P.Nº: 22202151364 COR

VERSIÓN:

1.0

Todos los derechos reservados. Este documento es de propiedad única de la ALCALDIA DE MONTERIA. Ninguna parte de este Documento de autoría de CONSULTORES DONOVAN S.A.S, grabaciones magnéticas o cualquier medio de almacenamiento de información y sistema de recuperación sin la previa autorización escrita de la ALCALDIA DE MONTERIA, entidad contratante.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE SICUTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-DIA-2022	REV: 0
	INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022	Página 3 de 51

TABLA DE CONTENIDO

	PÁG.
1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1 LOCALIZACIÓN	7
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA	9
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	9
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	12
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	12
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO	13
3.3 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	14
3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS (INP)	15
3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	16
3.6 VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA	21
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	26
4.1 INFORME SEMANAL	26
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATO DE OBRA	26
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	26
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA	26
4.5 PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA	26
4.6 ESTADO GENERAL DE TIEMPO	26
4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	26
4.8 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	26
4.9 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	27
4.10 ACTAS DE COMITÉ DE TÉCNICOS	27
4.11 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	28
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	28
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	29
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS/PROFESIONALES	30
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC	31
5.5 VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	32
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	45

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-BOS-2023	REV: 0
	INFORME MENSUAL No. 0 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	Página 4 de 51

6.1	EQUIPO Y VEHICULO CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	45
6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	45
6.3	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	46
6.4	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	46
6.5	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.....	46
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	47
8	ANEXOS.....	49
8.1	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR.....	49
8.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.....	49
8.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES	
	51	
8.4	COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.....	51

9678

 ALCALDIA DE MONTERIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA/SPM-GOB-3023	REV: 0
CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS	INFORME MENSUAL No. 0 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	Página 3 de 31

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la situación actual de la red vial del Municipio de Montería y considerando además que dentro de los programas que viene desarrollando la Administración Municipal para dar cumplimiento al Plan de desarrollo, se encuentran aquellos que buscan dar soluciones a las necesidades de las diferentes comunidades, tanto de la zona urbana como de la zona rural, se inscribió en el banco de proyectos de esta entidad territorial, el proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo de esta entidad territorial 2020-2023 **"GOBIERNO DE LA GENTE"** en el lineamiento estratégico **MONTERÍA CON CONVIVENCIA Y MOVILIDAD SEGURA**, PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE.

Por consiguiente, la Alcaldía de Montería a través de la Secretaría de Planeación Municipal, adelantó el proceso de licitación pública tendientes a contratar las obras consistentes en la **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, dando como adjudicado al contratista de obra **CONSTRUCCIONES AP S.A.S.**

Así mismo, con el fin de adelantar las actividades de vigilancia y control al contrato de obra, la Alcaldía de Montería considero oportuno adelantar el proceso de selección para la **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**, proceso que fue adjudicado a **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** con orden de inicio a partir del 22 de septiembre de 2022.

Para el control y vigilancia de la Alcaldía de Montería se designó como **Supervisor** del contrato de obra e interventoria al ingeniero **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, Secretario de Infraestructura Municipal, quien estuvo ejerciendo dicha labor hasta el mes de octubre de 2022 y a partir del mes de noviembre de 2022, se designó a la Ingeniera **MÓNICA SEVERICHE NÚÑEZ** como Supervisora del contrato de obra e interventoria hasta el mes de julio de 2023, por consiguiente se designó a la ingeniera **IRIS SPATH CAMAÑO** como supervisora del contrato de obra e interventoria.

En el presente informe mensual de Interventoria se hace una descripción general de las actividades en el marco del desarrollo del proyecto y las gestiones inherentes al cumplimiento de las obligaciones de la Interventoria en relación con la supervisión, vigilancia y control a la correcta ejecución del contrato de obra durante el periodo del **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**, en cumplimiento en lo establecido en el Contrato de Interventoria.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDÍA DE MONTERÍA CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. CMA-SPM-069-2022 INFORME MENSUAL No. 9 PERÍODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV-3 Página 6 de 50
---	--	-----------------------------

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Al Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 311 de la Constitución Política, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Dentro de las competencias constitucionales le corresponde al Municipio mantener y mejorar la infraestructura vial municipal.

La red vial terciaria tiene una importancia relevante en el mejoramiento de la economía de los corregimientos y por ende de los municipios en el logro de mejores niveles de bienestar para sus habitantes. Entre las funciones básicas y primordiales de la red vial están facilitar el acceso de la educación, la salud, el comercio, los centros de trabajo y otros servicios indispensables para la población; además de lo anterior, una red vial adecuada contribuye al desarrollo como estrategia de integración de las regiones.

La vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico.


Actualmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de las vías, lo que hace que se deteriore más en época de invierno generando aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 126A-SPM-001-2023</p> <p>INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 7 de 51</p>
---	--	-------------------------------------

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en la Vereda Maracayo del Corregimiento Tres Piedras del Municipio de Montería.

Ilustración 1. Localización general del proyecto.

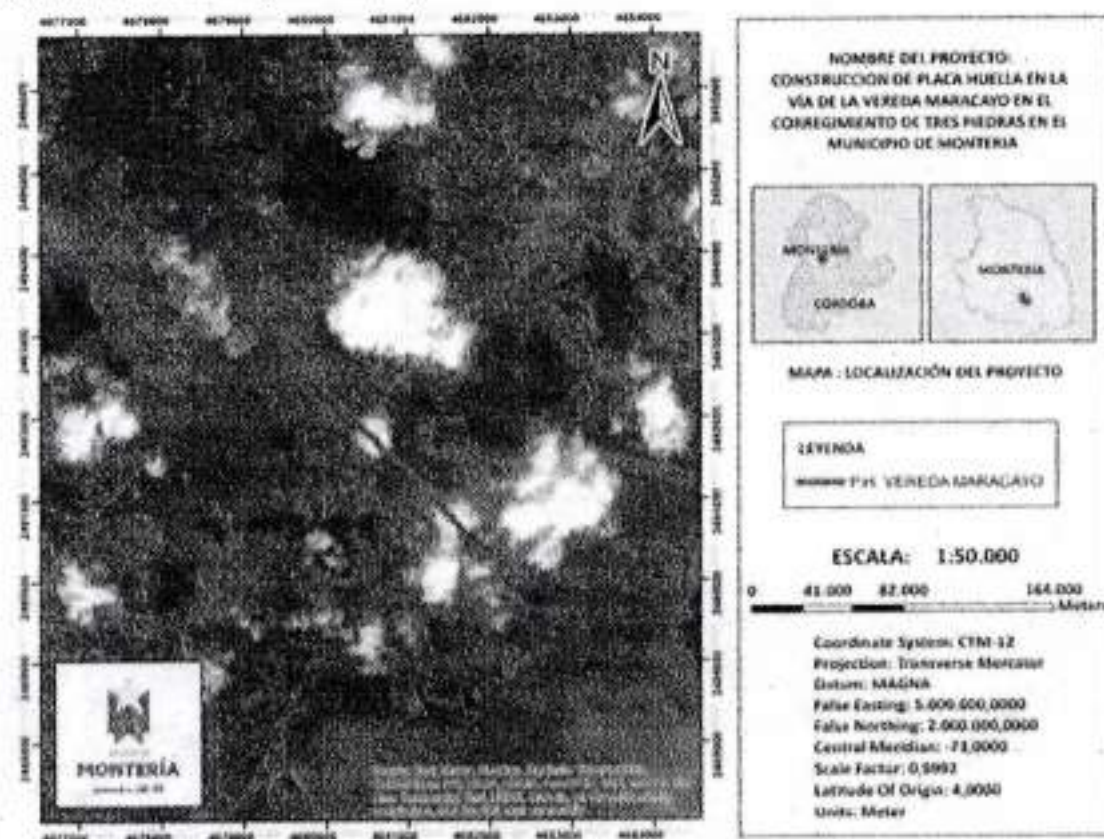

Fuente: Estudios Previos "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

 <p>ALCALDIA DE MONTERIA</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMF-MTM-008-2022</p> <p>INFORME MENSUAL No. II</p> <p>PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV. 2</p> <p>Página 5 de 51</p>
---	--	-------------------------------------

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Montería está situado en la zona centro del Departamento de Córdoba correspondiente a las tierras planas y ligeramente onduladas de los valles de los ríos San Jorge y Sinú, entre las coordenadas 08° 45'27" de latitud Norte y 75° 53'24" de longitud Oeste, cubre un área total de 3141 Km².

Limita al Norte con el Municipio de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los Municipios de Canalete y San Carlos.

El municipio de Montería hace parte de la unidad estratigráfica del Cinturón de San Jacinto y las unidades lito estratigráficas del anticlinorio de San Jerónimo conformado por rocas ígneas y rocas sedimentarias.

El sitio de construcción del proyecto corresponde a un paisaje tipo planicie, con un relieve de plano de inundación y terrazas, con una litología de sedimentos medios y finos.

Dentro de las competencias constitucionales le corresponde al Municipio mantener y mejorar la infraestructura vial municipal.

La red vial terciaria tiene una importancia relevante en el mejoramiento de la economía de los corregimientos y por ende de los municipios en el logro de mejores niveles de bienestar para sus habitantes. Entre las funciones básicas y primordiales de la red vial están facilitar el acceso de la educación, la salud, el comercio, los centros de trabajo y otros servicios indispensables para la población; además de lo anterior, una red vial adecuada contribuye al desarrollo como estrategia de integración de las regiones.

La vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico.

Actualmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de las vías, lo que hace que se deteriore más en época de invierno generado aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

Es por ello que, la Alcaldía de Montería delega técnica y administrativamente en la Secretaría de Planeación la ejecución de proyectos de pavimentación de vías terciarias, incluida la vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta. Este Proyecto busca mejorar potencialmente la comunicación terrestres de este tramo de vía, la cual se encuentra deteriorada a causa de distintos factores, tales como: falta de mantenimiento,

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022</p> <p>Informe Mensual No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 9 de 51</p>
---	---	-------------------------------------

escorrentías producto de precipitaciones, y otros efectos como los del tránsito pesado que ha provocado desniveles severos, hundimientos, lo que en efecto, se traduce en una reducción de la calidad de vida útil del parque automotor que transita por esta vía, generando poco o nulo tránsito de los usuarios de la vía y claro esta afecta el normal uso del ambiente público y el desarrollo social de la comunidad.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En forma general, la vía se encuentra a nivel de capa de rodamiento de material seleccionado en mal estado en toda su longitud, encontrándose un desarrollo de daños desde el mismo desgaste superficial de la vía, penetración de la vegetación (malezas, arborización menor, pastos, etc.), pasando por puntos críticos en los que es muy complicado circular en vehículos y zonas en las que existen obstrucciones parciales o totales ubicados en los pasos críticos con presencia de baches, charcos, hundimientos, abultamientos, erosión y desmoronamiento de taludes, hasta el daño total de la vía en algunos casos.

En cuanto a las obras de drenaje y de arte existentes, estas se encuentran en regular estado por efecto de falta de mantenimiento, en algunas de estas pocas obras de arte como las alcantarillas, presentan deficiencia en cuanto a desprendimiento de aletas, falta de solado de entrada y de salida e incluso no cuentan con estas, además se puede evidenciar que el diámetro de algunas de las obras existentes no es el ideal para el caudal de las aguas de escorrentía y algunas presentan socavación superficial por el rebose de las aguas cuando trabajan en su máxima capacidad hidráulica.

El drenaje superficial es deficiente y construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros, incremento del riesgo de deserción escolar.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades¹ a las que se les realizará interventoría y/o serán objeto de seguimiento son las siguientes:

En este proyecto se ejecutará la construcción 3.586 m de pavimento tipo placa huella y estructuras hidráulicas, las cuales tendrán las siguientes características:

- Ancho de la placa huella: 4 m más berma cuneta.
- Superficie de apoyo de las losas: Subbase granular de quince (15) centímetros de espesor.

¹ Anexo Técnico "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORRECTORIO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA" pág 1-4

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-GRM-DUB-2022</p> <p>INFRAURE MENSUAL No. 8 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 19 de 51</p>
---	---	--------------------------------------

- Material de las losas: Concreto Resistencia a la compresión a los 28 días $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$
- La piedra pegada: es una capa de concreto ciclópeo con espesor de quince centímetros (0,15 m).
- Dimensión de las losas: Longitud: 2.8 m. X Ancho: noventa (90) centímetros X Espesor de la losa: quince (15) centímetros.
- Se construirán vigas riostras de confinamiento cada 3 m en todo el ancho de la calzada incluyendo las bermas cunetas. Estas se realizarán en concreto de 21 Mpa con dimensiones 0.2m x 0.3m.

Las losas del pavimento tipo placa huella estarán sobre una capa de subbase granular de 15 cm de espesor en toda la longitud de la vía, en el tramo 2, comprendido entre la abscisa: K1+810 y K2+840 el CBR de subrasante es inferior al 5% por lo que se requiere adicionalmente un mejoramiento en material de terraplén tipo INVIAS de 30 centímetros de espesor.

Ilustración 2: Estructura placa huella, Tramo N°02




Ilustración 3: Estructura placa huella, Tramo N°01 y 03



EL proyecto contempla la construcción de 7 estructuras hidráulicas transversales a la vía, de las cuales 6 son tipo box culverts con diferentes dimensiones geométricas según lo indicado en los estudios correspondientes y 1 puente vehicular de 20.85 metros de luz. En la fundación de estas estructuras hidráulicas se debe hacer un mejoramiento en piedra tipo rajón de 50 cm de espesor para estabilizar el suelo. Se construirán disipadores de energía laterales y protección en piedra pegada en los taludes para evitar la erosión. Además, se construirán 7,172 metros de berna cuneta en concreto reforzado de 3000 PSI.

9689

 CONSULTORES DONOVAN E.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º CMA-SPN-039-2022	FOLIO : 0
	INFORME MENSUAL N.º 8 PERÍODO, DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022	Página 11 de 11

ID OBRA	ESTRUCTURA	ABSCISA	OBSERVACION	TIPO	Ct (msm)	Ct (msm)	SENTIDO	LONGITUD (m)	B (m)	H (m)
01	Box culvert	k0+379.51	Nueva	Cajón	39.80	39.77	Izq - Der	7.70	1.50	1.50
02	Box culvert	k0+800.21	Nueva	Cajón	43.17	43.14	Izq - Der	7.30	1.00	1.00
03	Box culvert	k1+241.12	Nueva	Cajón	35.67	35.39	Izq - Der	10.00	1.00	1.00
04	Box culvert	k2+506.28	Nueva	Cajón	36.11	35.95	Izq - Der	11.50	1.00	1.00
05	Puente	k1+791.00	Nueva	Cajón	28.18	28.11	Izq - Der	6.00	15.00	5.50
06	Box culvert	k1+975.73	Nueva	Cajón	29.70	28.67	Izq - Der	8.50	4.00	2.00
07	Box culvert	k2+048.39	Nueva	Cajón	28.77	28.69	Izq - Der	8.50	3.00	2.00

Tabla N° 1- Ubicación obras hidráulicas

4685

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENCIÓN N° CMA-SPM-012-2022</p> <p>INFORME MENSUAL N° 8 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 12 de 81</p>
---	--	--------------------------------------

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
Número de proceso de selección	Proceso de licitación pública LP-SPM-012-2022
Número del contrato	LP-SPM-012-2022
Objeto	Construcción de Placa Huella en la Vía de la Vereda Maracayo en el Corregimiento de Tres Piedras en el Municipio de Montería
Contratista	CONSTRUCCIONES AP S.A.S
NIT	890.940.910-1
Valor Total Inicial	Nueve Mil Seiscientos Noventa y Un Millones seiscientos Un Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos (\$9.691.701.283,00) MCTE
Adición No. 1	Un Mil Doscientos Ochenta y Nueva Millones Ciento Nueva Mil Doscientos Noventa y Dos pesos (\$ 1.289.109.292,00) MCTE
Valor acumulado del contrato	diez mil novecientos ochenta millones ochocientos diez mil quinientos setenta y cinco pesos (\$10.980.810.575,00) m/cte
Modificaciones	N/A
Aclaraciones	N/A
Suspensión No. 01.	29 de diciembre de 2022
Reinicio No. 01.	10 de marzo de 2023
Suspensión No. 02	30 junio de 2023
Reinicio No. 02.	18 julio de 2023
Cesiones de participación contractual	N/A
Plazo Inicial	Seis (06) meses.
Prórroga Número Uno (1)	02 de junio de 2023 (1 meses adicionales)
Prórroga Número Dos (2)	19 de julio de 2023 (3 meses adicionales)
Plazo Final	Diez (10) meses
Fecha de Inicio	Veintidós (22) de septiembre de 2022
Fecha de Terminación Inicial del contrato	Veintidós (22) de marzo de 2023
Fecha de terminación Actualizada del contrato	Veinte (20) de octubre de 2023
Dirección	Calle 80 Sur N°-47D-163. Bodega 107. Sabaneta- Antioquia
Número de Teléfono	7910720

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SFM-008-2022 INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV: 0 Página 13 de 51
---	---	---------------------------

3.2 DESCRIPCION DEL PLAZO DEL CONTRATO

De acuerdo al plazo de ejecución, se contemplan 300 días programados, de los cuales hasta la fecha van transcurridos 250 días, tal y como se muestra en la siguiente tabla

Fecha de Inicio	22-sep-22	Días Programados	300
Fecha de entrega Inicial	22-mar-23	Días Transcurridos Hasta suspensión N°01	98
Fecha de Reinicio N°01	10-mar-23	Días transcurridos desde Reinicio N°01	152
Fecha de corte Informe Actual	31-ago-23	Días transcurridos	250
Fecha de Entrega Final	20-oct-23	Días Faltantes	50

Tabla N° 2- Descripción de plazo de ejecución

A continuación, se evidencia grafico de los días programados vs los días transcurridos, de acuerdo al plazo de ejecución del contrato de obras.



 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SPM-008-2022	REV: 0
	INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO, DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	Página 14 de 51

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA No LP-SPM-012-2022			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento General	30/06/2023	18/01/2024	\$969.170.128,30
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	30/06/2023	18/01/2024	\$2.907.510.384,90
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	30/06/2023	18/07/2026	\$1.938.340.256,60
Estabilidad y Calidad de las Obras	18/07/2023	18/07/2028	\$2.907.510.384,90

3.3 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

3.3.1 Actividades desarrolladas en Campo.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades de campo:

- Se realizó fundida de placa huella, viga riostra, berma cuneta y piedra pegada entre abscisas K2+080 y K2+220, y entre las abscisas K2+540 sobre el carril derecho en sentido de las abscisas de menores a mayores, de acuerdo a lo contemplado en el diseño de la placa huella.
- Se realizó armado de acero de refuerzo para vigas riostra, placa huella y berma cuneta, de acuerdo a lo descrito a lo descrito en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se realizó fundida de piedra pegada, de acuerdo a los diseños del proyecto y especificaciones técnicas.
- Se realizó actividades de excavaciones con máquina en material común entre las abscisas K3+090 y K3+350 que corresponden al tramo N°03, el cual, de acuerdo al diseño y especificaciones técnicas contempla una capa de 15cm de espesor de subbase granular tipo C.
- Se realizó actividades de relleno con máquina de una capa de 15cm de espesor entre las abscisas K3+090 y K3+160 que corresponden al tramo N°03, de al diseño y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se realizó armado de acero de refuerzo para los Box culvert N°01, N°03 y N°04, de acuerdo a lo descrito a lo descrito en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se realizó fundida de losa inferior de los Box culvert N°01, N°03 y N°04 respectivamente, de acuerdo a los diseños del proyecto y especificaciones técnicas.

 CONSULTORES DCMOVAR S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-SPM-003-2022 INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV: 0 Página 15 de 81
---	---	---------------------------

- El contratista de obras realizó el reemplazar las conexiones domiciliarias convencionales de acueducto de ½" de Policloruro de vinilo (PVC) por tubería de Polietileno (PEAD) de ½", para mejorar la transitabilidad de las maquinarias y evitar fugas al momento de ejecutar las actividades, se deja constancia que estas actividades no son contractuales, por tanto, no serán tenidas en cuenta para efecto de pagos.
- Se realizaron actividades de cargue y retiro de material granular proveniente de las excavaciones.
- Se llevaron a cabo comités en sitio de obra entre interventoría y contratista de obra, con el fin de revisar los avances y dificultades técnicas que ha teniendo el contratista con respecto a la ejecución de las actividades con respecto a la programación inicial entregada, de igual manera, se priorizaron puntos de PMT y PGIO que no se estaban cumpliendo adecuadamente.

3.3.2 Actividades Administrativas desarrolladas.

- El contratista hizo entrega del PGIO No 05, en cual la interventoría realizó las observaciones correspondientes, las cuales están pendientes por entregar.
- El contratista de obras mediante oficio MAR-012-2022-037, Realiza entrega informe de seguimiento al PGIO No 005.
- El contratista de obras realizó entrega de documentación Correspondiente al balance de obras N°01, consistiendo en la inclusión de ítems no previstos y mayores y menores cantidades.
- El contratista de obras realizó entrega órdenes de operaciones No. 23, 24, 25 y 26 para la respectiva revisión y/o VoBo de la Interventoría.
- El contratista de obras asiste a comités técnicos y reuniones técnicas convocadas por la Alcaldía de Montería y la Interventoría, donde se logran concertar temas administrativos, técnicos y socio ambientales del proyecto.

3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS (INP)

Durante el presente periodo se evidencian los siguientes avances individuales, de acuerdo a los ítems NP.

NP	NO PREVISTOS	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE INDIVIDUAL
NP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	M3	2285	0	0%
NP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	ML	2820	0	0%
NP - 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	M2	10716	0	0%
NP - 4	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f _c = 28 MPa VACIADO	ML	200	200	100%

 CONSULTORES DONOVAN S.A.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CNA-SPM-009-2022		REV. 08
	INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023		Página 16 de 11
IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 0.80 M Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO.			

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de mayo del 2023, una vez firmada el acta de inicio del contrato de obra LP-SPM-012-2022, el 22 de septiembre de 2022, se vienen realizando avances en las actividades tales como: participación a comités y reuniones programadas, contestación por parte del contratista de obra a las comunicaciones de la Interventoria, recorridos de obra entre el personal profesional del contratista e interventoria. A la fecha el contratista de obras adelanta actividades de afiliación del personal operativo, excavación con maquina en material común entre las abscisas K3+090 y K3+350, retiro de material proveniente de las excavaciones entre el tramo mencionado, mejoramiento de la subrasante con adición de material seleccionado, relleno con material de subbase sobre el tramo N°03, se deja constancia que, de acuerdo a la reprogramación entregada por el contratista de obras, se presenta un atraso del 35.41% de ejecución de las actividades.

A la fecha del presente informe y según programa de obra presentado por el Contratista, la obra posee un porcentaje programado acumulado del 58.34% correspondiente a \$ 8.406.204.889 VS un ejecutado del \$ 2.517.899.865 correspondiente a 22.93%, reflejando un atraso del 35.41%. Esta interventoria semana – semana continuara realizando los controles a la programación de obra.


La Interventoria ha venido realizando seguimiento, acompañamiento y revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra en el marco del desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", según lo estipulado en los documentos técnicos contractuales, así como la elaboración y remisión de respuestas a las comunicaciones del contratista, según los requerimientos contractuales del proyecto y necesidades reales del proyecto.

3.5.1 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO FINANCIERO.

Para el periodo comprendido del presente informe mensual de interventoria No 9, el avance general del contrato en el área financiera es del 29.99% respecto al valor total del contrato de obra; equivalente a \$2,907,510,384.90



AVANCE FINANCIERO VS AVANCE FISICO

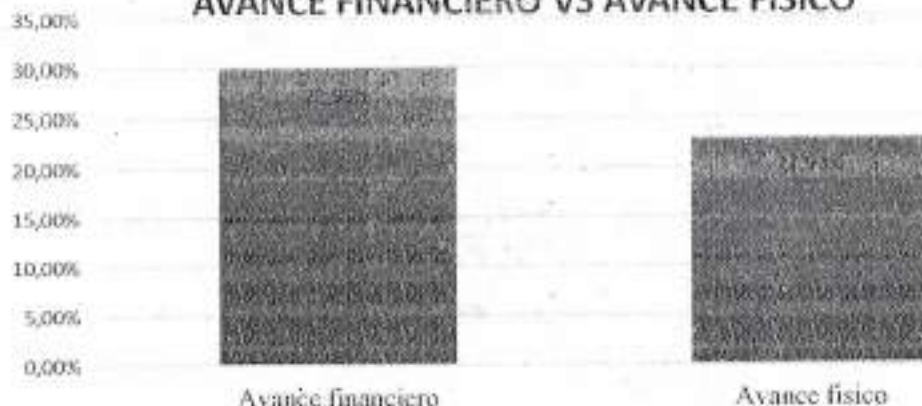

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES			SALDO		
	BÁSICO	I V A	TOTAL	BÁSICO	I V A	TOTAL	BÁSICO	I V A	TOTAL
PRELIMINARES									
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	\$ 140.817.215	\$ 0	\$ 140.817.215	\$ 140.817.215	\$ 0	\$ 140.817.215	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EXCAVACION MANUAL	\$ 8.163.124	\$ 0	\$ 8.163.124	\$ 5.035.650	\$ 0	\$ 5.035.650	\$ 3.127.474,36	\$ 0	\$ 3.127.474,36
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	\$ 14.680.729	\$ 0	\$ 14.680.729	\$ 14.680.729	\$ 0	\$ 14.680.729	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE SUBRASANTE Y SUBBASE	\$ 344.715.644	\$ 0	\$ 344.715.644	\$ 262.554.735,78	\$ 0	\$ 262.554.735,78	\$ 82.160.908,16	\$ 0	\$ 82.160.908,16
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	\$ 140.457.804	\$ 0	\$ 140.457.804	\$ 140.457.804	\$ 0	\$ 140.457.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBBASE GRANULAR CLASE C	\$ 544.697.191	\$ 0	\$ 544.697.191	\$ 134.565.838,24	\$ 0	\$ 134.565.838,24	\$ 410.131.352,73	\$ 0	\$ 410.131.352,73
TERRAPLEN	\$ 395.442.241	\$ 0	\$ 395.442.241	\$ 338.768.613,38	\$ 0	\$ 338.768.613,38	\$ 56.673.627,18	\$ 0	\$ 56.673.627,18



ALCALDÍA DE MONTERÍA
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º CMS-SPW-000-3022

REV: 0

Informe Mensual N.º 9
PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 AGOSTO DE 2021

Página 15 de 51

PAVIMENTO Y BORDILLOS									
CONCRETO HIDRAULICO f _c = 21MPa (D) elaborado en sitio	\$ 782.431.370	\$ 0	\$ 782.431.370	\$ 54.333.498,28	\$ 0	\$ 54.333.498,28	\$ 728.097.872	\$ 0	\$ 728.097.872
CONCRETO HIDRAULICO f _c = 21MPa (D) para viga riostra	\$ 314.716.288	\$ 0	\$ 314.716.288	\$ 23.359.088,90	\$ 0	\$ 23.359.088,90	\$ 291.357.220,70	\$ 0	\$ 291.357.220,70
CONCRETO HIDRAULICO f _c = 14 MPa CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	\$ 735.285.288	\$ 0	\$ 735.285.288	\$ 72.122.591,58	\$ 0	\$ 72.122.591,58	\$ 663.162.989,30	\$ 0	\$ 663.162.989,30
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	\$ 58.058.162	\$ 0	\$ 58.058.162	\$ 2.527.991,25	\$ 0	\$ 2.527.991,25	\$ 55.528.170,47	\$ 0	\$ 55.528.170,47
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	\$ 969.894.928	\$ 0	\$ 969.894.928	\$ 97.027.278,24	\$ 0	\$ 97.027.278,24	\$ 872.867.649,72	\$ 0	\$ 872.867.649,72
SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	\$ 313.274.304	\$ 0	\$ 313.274.304	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.274.304	\$ 0	\$ 313.274.304
OBRAS DE DRENAJE									
EXCAVACION MANUAL	\$ 7.223.808	\$ 0	\$ 7.223.808	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.223.808	\$ 0	\$ 7.223.808
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	\$ 99.682.169	\$ 0	\$ 99.682.169	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.682.169	\$ 0	\$ 99.682.169
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	\$ 140.283.892	\$ 0	\$ 140.283.892	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.283.892	\$ 0	\$ 140.283.892
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	\$ 844.781.760	\$ 0	\$ 844.781.760	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 844.781.760	\$ 0	\$ 844.781.760
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	\$ 1.523.651.045	\$ 0	\$ 1.523.651.045	\$ 38.139.118,32	\$ 0	\$ 38.139.118,32	\$ 1.485.511.927,00	\$ 0	\$ 1.485.511.927,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE BOX COULVERT	\$ 5.588.086	\$ 0	\$ 5.588.086	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.588.086	\$ 0	\$ 5.588.086
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	\$ 2.935.327	\$ 0	\$ 2.935.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.935.327	\$ 0	\$ 2.935.327
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	\$ 9.930.838	\$ 0	\$ 9.930.838	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.930.838	\$ 0	\$ 9.930.838

9692

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	\$ 24.453.377	\$ 0	\$ 24.453.377	\$ 16.413.112,00	\$ 0	\$ 16.413.112,00	\$ 8.040.265,28	\$ 0	\$ 8.040.285,28
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	\$ 40.171.110	\$ 0	\$ 40.171.110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.171.110	\$ 0	\$ 40.171.110
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	\$ 164.090.722	\$ 0	\$ 164.090.722	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.090.722	\$ 0	\$ 164.090.722
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14MPa (F) (SOLADO	\$ 8.689.549	\$ 0	\$ 8.689.549	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.689.549	\$ 0	\$ 8.689.549
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	\$ 174.972.115	\$ 0	\$ 174.972.115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.972.115	\$ 0	\$ 174.972.115
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	\$ 263.056.776	\$ 0	\$ 263.056.776	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.056.776	\$ 0	\$ 263.056.776
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	\$ 346.982.469	\$ 0	\$ 346.982.469	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 346.982.469	\$ 0	\$ 346.982.469
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	\$ 377.417.277	\$ 0	\$ 377.417.277	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.417.277	\$ 0	\$ 377.417.277
PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO Fc= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO	\$ 566.413.000	\$ 0	\$ 566.413.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.413.000	\$ 0	\$ 566.413.000
APOYO ELASTOMERICO	\$ 3.434.100	\$ 0	\$ 3.434.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.434.100	\$ 0	\$ 3.434.100
JUNTA ELASTOMERICA PARA PUENTES	\$ 22.342.043	\$ 0	\$ 22.342.043	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.342.043	\$ 0	\$ 22.342.043
PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$ 86.111.076	\$ 0	\$ 86.111.076	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86.111.076	\$ 0	\$ 86.111.076
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	\$ 3.167.794	\$ 0	\$ 3.167.794	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.167.794	\$ 0	\$ 3.167.794


 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-DEPM-008-2022 INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV: 0 Página 20 de 81
---	---	---------------------------

BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	\$ 27.021.475	\$ 0	\$ 27.021.475	\$ 0	\$ 0	\$ 27.021.475	\$ 0	\$ 27.021.475
SEÑALIZACIÓN								
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	\$ 1.825.096	\$ 0	\$ 1.825.096	\$ 0	\$ 0	\$ 1.825.096	\$ 0	\$ 1.825.096
IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA	\$ 133.790.267	\$ 0	\$ 133.790.267	\$ 60.205.620,15	\$ 60.205.620,15	\$ 73.584.646,85	\$ 0	\$ 73.584.646,85
PAPSO	\$ 51.053.824	\$ 0	\$ 51.053.824	\$ 22.974.220,80	\$ 22.974.220,80	\$ 28.079.603	\$ 0	\$ 28.079.603

Tabla. Control de valores del proyecto

3.5.2 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO FÍSICO.

En el presente informe, se registra un avance físico del 22.93%, según programación de obra las actividades de construcción de obras de drenaje y puente debían haber iniciado, la construcción de la placa huella, realizando actividades de excavación en material común de la explanación y canales, cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre, subbase granular clase c, concreto hidráulico $f'c = 21 \text{ MPa}$ (D) elaborado en sitio, concreto hidráulico $f'c = 14 \text{ MPa}$ clase G (para piedra pegada), acero de refuerzo $FY = 420 \text{ MPa}$, asimismo se debieron iniciar la Implementación de Gestión de Obra y PAPSO, lo cual a la fecha no ha sido cumplido.

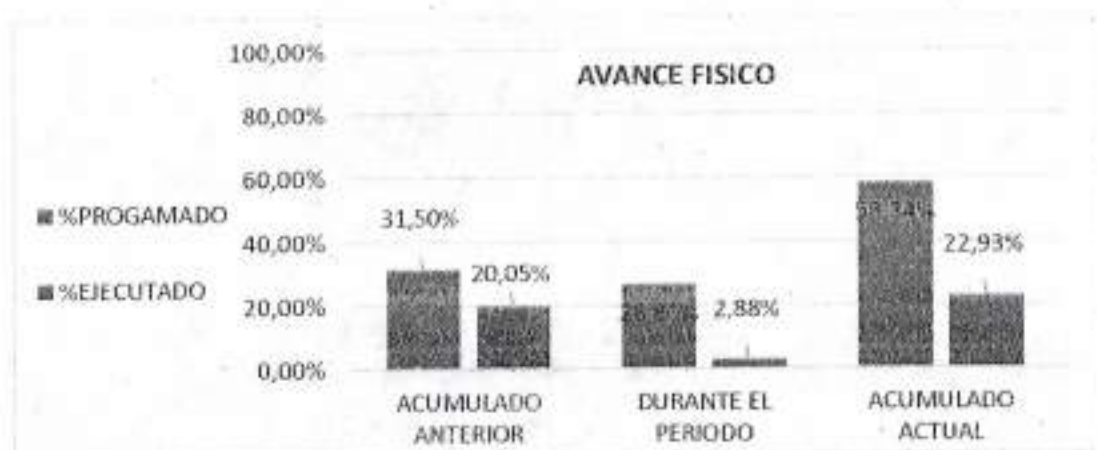

Gráfica: Avance Físico

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-008-2022</p> <p>ANEXO AL MENSAJAL No. 8 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022</p>	<p>REV. 0</p> <p>Página 22 de 51</p>
---	--	--------------------------------------

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.		prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso	calidad de los bienes y servicios prestados.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	La interventoría mantendrá informada a la entidad contratante, de cualquier suceso que tenga efecto en la ejecución del contrato		
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	La interventoría velará por el cumplimiento del contratista, de acuerdo a las normativas vigentes.		
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.		La interventoría, realizará verificación a los cumplimientos de calidad pactados por el contratista de obras.	
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.		El contratista promueve la vinculación laboral al personal que se encuentra en las zonas de intervención de la obra, las cuales están siendo verificadas por la interventoría	
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.		El contratista promueve la vinculación laboral al personal que se encuentra en las zonas de intervención de la obra, las cuales están siendo verificadas por la interventoría	
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.		Se realiza seguimiento continuo para garantizar al	

		cumplimiento de las obligaciones del contratista de obras.	
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Se mantendrá informada a la entidad de cualquier situación que implique una modificación del estado de los riesgos.		
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.		Se mantendrá informada a la entidad contratante de cualquier circunstancia que impida la ejecución del contrato.	
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Por parte de la interventoría se realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones en el componente de la seguridad y salud de los trabajadores en obra.		
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	El contratista se compromete a informar a la interventoría/entidad cualquier composición jurídica, social, comercial o financiera, tal y como lo describen las obligaciones del contrato.		
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las		La interventoría verifica constantemente el cumplimiento de las	

4697

 <p>CONSULTORES DINCOM S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-SPM-000-2022</p> <p>VERBOSAL No. 9 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 24 de 51</p>
--	--	--------------------------------------

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.		obligaciones laborales del contratista de obras	
Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	Se mantendrá informada a la entidad de cualquier suceso de inicio de investigaciones penales.		
El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	Se realizará la verificación al plan de calidad y se encuentra en constante seguimiento por parte de la interventoría		
El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	Se dio inicio a la construcción de la placa huella, de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante, sin embargo, el contratista entrego un comunicado donde manifiesta realizar obras adicionales. (Sin aprobar)		
Garantizar el cumplimiento de la Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y las normas que la reemplace, adicione y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.		Se realiza la verificación por parte de la interventoría de la implementación del PGO, de acuerdo al componente ambiental y a las normativas vigentes.	
Cumplir las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales		Se realiza la verificación de los ensayos realizados por el contratista,	

4698

 <p>CONSEJO MUNICIPAL</p>	<p>ALCALDÍA DE MONTERÍA CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SPMA-036-2022</p> <p>PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022</p>	<p>REV.: 0</p> <p>Página 25 de 51</p>
--	---	---------------------------------------

<p>cumpliendo las especificaciones de INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.</p>		<p>constatados por la interventoría, durante el presente periodo, de acuerdo a las esp. Técnicas del proyecto</p>	
<p>Colocar vallas informativas en cada uno de los sitios donde se adelanten obras, con base en las especificaciones señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio de Transporte.</p>		<p>El contratista colocará las vallas informativas en sitio de obra con la información necesaria del proyecto, de acuerdo a lo solicitado por la entidad.</p>	
<p>Incluir al personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: familias en acción, jóvenes en acción y/o estrategias unidas y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto, EL MUNICIPIO solicitará a PROSPERIDAD SOCIAL el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. EL MUNICIPIO remitirá al interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condición, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.</p>	<p>El contratista de obras durante de la ejecución del proyecto realizará la vinculación del personal descrito, donde la interventoría realizará el seguimiento respectivo del mismo.</p>		
<p>Cumplir de los protocolos de bioseguridad de conformidad con la norma vigente.</p>	<p>Se mantendrá una revisión constante a lo largo de la ejecución del proyecto por parte de la interventoría en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.</p>		

	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORA No. CMA-SPM-408-2022</p> <p>INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 AGOSTO DE 2021</p>	<p>REV : 0</p> <p>Página 20 de 21</p>
---	--	---------------------------------------

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

VER ANEXO NUMERAL 4.9)

4.1 INFORME SEMANAL

Se anexa formato

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

4.5 PROGRAMACION DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA

Se anexa programación de obras del contratista.

4.6 ESTADO GENERAL DE TIEMPO

Se anexa formato

4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se anexa formato

4.8 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

4400

 <p>ALCALDIA DE MONTERIA</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-00-3022</p> <p>Informe Mensual No. 8</p> <p>PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 9</p> <p>Página 27 de 31</p>
---	--	--------------------------------------

4.9 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

4.10 ACTAS DE COMITÉ DE TÉCNICOS.

Se anexa formato

4.11 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Se anexa formato

 <p>GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERÍA</p>	<p>SECRETARÍA DE MONTERÍA</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022</p> <p>INFORME MENSUAL No. 9</p> <p>PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 AGOSTO DE 2022</p>	<p>REV: 9</p> <p>Página 26 de 51</p>
---	---	--------------------------------------

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Número de proceso de selección	Concurso de Méritos Abierto CMA-SPM-009-2022
Número del contrato	CMA-SPM-009-2022
Objeto	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Contable al Contrato cuyo Objeto es " Construcción de Placa Huella en la Vía de la Vereda Maracayo en el Corregimiento de Tres Piedras en el Municipio de Montería".
Contratista	CONSULTORIA DONOVAN S.A.S
NIT	900.644.351-9
Valor Total Inicial	Seiscientos noventa y seis millones cien noventa y dos mil cuatrocientos sesenta pesos (\$696.192.460) Mcte
Adición No. 01	Doscientos tres Millones Quinientos Ochenta y seis Mil Ochocientos treinta y seis pesos (\$203.586.836) Mcte
Valor acumulado del contrato	Ochocientos Noventa y nueve Mil Setecientos Setenta y nueve Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos (\$899.779.296) Mcte
Modificaciones	N/A
Suspensión No. 01.	29 de diciembre de 2022
Reinicio No. 01.	10 de marzo de 2023
Suspensión No. 02	30 junio de 2023
Reinicio No. 02.	19 julio de 2023
Cesiones de participación contractual	N/A
Plazo Inicial	Seis (06) meses.
Prórroga Número Uno (1)	02 de junio de 2023 (1 meses adicionales)
Prórroga Número Dos (2)	19 de julio de 2023 (3 meses adicionales)
Plazo Final	Diez (10) meses
Fecha de Inicio	Veintidós (22) de septiembre de 2022
Fecha de Terminación Inicial del contrato	Veintidós (22) de marzo de 2023
Fecha de terminación Actualizada del contrato	Veinte (20) de octubre de 2023
Dirección	Calle 4 N° Kra 10-41- Barrio El Prado – Tierra Alta - Córdoba
Número de Teléfono	601 265 02 21

	<p>ALCANTARA DE INGENIERIA</p> <p>CONTRATO DE INTERVENCIÓN EN LA CALIDAD DE LA OBRA</p> <p>INFORME MENSUAL No. 4</p> <p>PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 25 de 31</p>
---	--	--------------------------------------

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, el interventor realizó las siguientes actividades:

- Se realizó revisión y observaciones a la documentación entregada por parte del contratista de obra, verificando el cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Obra, Pliegos de Condiciones Definitivos, anexo Técnico y demás documentos inherentes al Contrato.
- Se realizó constante seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obras con respecto al cronogramas de obras entregado.
- Se realizó revisión de los resultados de laboratorio del material de terraplén y sub base, entregados por el contratista de obras, de acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas.
- Se realizó revisión y/o chequeo en las excavaciones con maquina en material común y los rellenos en material de terraplén y subbase granular, realizadas por el contratista de obras.
- Se exigió al contratista el cumplimiento de la Programación de Obra presentada, se realizaron seguimientos semana a semana.
- Se diligencio en compañía del contratista la Bitácora de Obra
- Se realizaron Comités de Seguimiento al Contrato, donde estuvieron presentes el Supervisor del contrato de la Secretaria de Infraestructura, Contratista de Obra e Interventoría, con el objeto de hacer seguimiento al estado y avance del contrato, se pactaron compromisos por las partes.

COMITÉS TÉCNICOS.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de abril al 21 de mayo de 2023 se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos en el marco del desarrollo del contrato número LP-SPM-012-2022.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDÍA DE MONTERÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA No CMA-SPM-009-2022 Informe Mensual No. 9 PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV: 0 Página 30 de 51
---	--	-------------------------------

FECHA	PARTICIPANTES	OBJETO
11/08/2023	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - CONTRATISTA - INTERVENTORIA	<p>Comité de obra No 16 convocado con el objeto de hacer seguimiento a la ejecución del contrato LP-SPM-012-2022 en los aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Técnico: manifiesta su preocupación, debido al atraso que se presenta en la ejecución de las actividades en obra con respecto a la reprogramación enviada por el contratista de obras, reiterando al contratista tomar los correctivos necesarios para contrarrestar el atraso y cumplir con el tiempo contractual de obra. Se solicita al contratista de obras tomar de manera inmediata los correctivos pertinentes con las fisuraciones presentadas en las placas de concreto, berna-cuneta, piedra pegada y viga riostra, además de realizar debidamente el proceso constructivo de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto con el curado de los elementos y realizar correctamente las juntas de construcción, dichas técnicas se presumen que son las causas de las fisuras.• Documental: Se solicita al contratista de obras presentar los informes de Implementación al PGIO N° 4,6,7 y 8; los cuales se encuentran atrasados por entregar a la interventoria para su respectiva revisión y/o VoBo de la interventoria al igual que la entrega del Informe PGIO N°5 Corregido.• SST: Señalización de la obra, importante evitar accidentes a particulares. El personal debe portar la dotación, elementos de protección personal, afiliaciones al día, informar sobre accidentes presentados. Se le solicita al contratista de obras dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico para cada uno de los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que se ha evidenciado ausencia de señalización y demarcaciones de las labores en obra.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS/PROFESIONALES.

A continuación, se presenta los informes del personal profesional y técnico que prestaron sus servicios profesionales durante el periodo correspondiente entre el 1 de agosto al 31 de agosto del 2023 para la ejecución del contrato de interventoria No CMA-SPM-009-2022. VER ANEXO 5.3

4709

 CONSULTORES DONCEVAL S.A.S.	ALCALDÍA DE MONTERÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022	REV: 0
	INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	Página 31 de 51

CARGO PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS A CARGO	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	<ul style="list-style-type: none">• INGENIERO IVÁN ENRIQUE ALVIZ GONZÁLEZ
	<ul style="list-style-type: none">• Dirección y coordinación en las actividades propias de la interventoría para la ejecución del proyecto• Elaboración de informes semanales del proyecto de acuerdo con los lineamientos de la Entidad Contratante• Elaboración y presentación de informe mensual y acta de costos mensual de la interventoría de según los requisitos establecidos en la Entidad en los documentos contractuales.• Asistencia y participación en reuniones y comités de seguimiento convocado.• Acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del contrato de obra No LP-SPM-012-2022• Elaboración y remisión respuesta a las comunicaciones del contratista de obra

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

Se presenta la programación mensual de los recursos programados comparados con la ejecución mensual realizada para el contrato de obra e interventoría:

Contrato de obra

MES DE EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS
Agosto de 2023	\$ 6.406.204.889	\$ 2.517.899.865

Nota: La información registrada en la tabla anterior fue tomada del programa de inversión del contrato, flujo de caja y programa de obra.

Contrato de interventoría

MES DE EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS
Agosto de 2023	\$ 114.520.980,00	\$ 773.394.992,00

Nota: La información del contrato de interventoría fue tomada del plan de cargas.

4905

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SM-009-2023 INFORME ANUAL No. 3 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	RSV.19 Página 32 de 83
---	--	---------------------------

5.5 VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante el presente periodo se realizó la verificación y/o cumplimiento a las obligaciones del contrato de la interventoría, de acuerdo a la ejecución de las actividades del contratista de obras e informando de manera oportuna de los avances del contratista de obras:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Obligación	Verificación	Cumplimiento	Observaciones
Presentar a la secretaria de planeación el plan de trabajo de la interventoría en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de la interventoría.		Se entregó a la entidad contratante plan de trabajo de la interventoría en el tiempo indicado por medio magnético.	
Presentar un Plan de Calidad para la interventoría.		Se presenta plan de calidad de acuerdo a lo solicitado por la entidad contratante.	
Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoría.		Fue entregado a la entidad contratante en su momento.	
Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el municipio de Materia para el personal de la interventoría.	Se encuentra en proceso de entrega por proveedor de despacho		
Mantenerse al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus Trabajadores.		Los aportes de seguridad social y parafiscales de los trabajadores se encuentran en cumplimiento constantemente.	
Presentar informes de interventoría en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad.		Se entregaron en la fecha de corte indicada por medio magnético y físico a la entidad contratante.	
Revisar y aprobar los estudios y diseños definitivos para la ejecución de la obra.		Se revisó y aprobó los estudios y diseños definitivos a la entidad contratante.	

9706

 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE MONTEVIDEO</p>	<p>ALCALDÍA DE MONTERÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SPM-009-2023</p> <p>INFORME MENSUAL N° 2 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 33 de 51</p>
--	--	--------------------------------------

Elaborar la lista y programación de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto de interventoria.		Se cuenta con una programación para la realización de los test de laboratorio o pruebas requeridas en obra.	
Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer Recomendaciones.	Hasta la fecha de corte del presente informe al contratista no ha realizado pruebas de laboratorio.	No cumple	Hasta la fecha de corte del presente informe el contratista de obra no ha presentado pruebas de laboratorio.
Registro fotográfico y de video.		Se tomaron registros fotográficos y videos del estado inicial de la vía y de las actividades realizadas.	
Obligaciones de carácter técnico			
Verificación de la situación actual antes del inicio de la obra.		Se realizó un recorrido, levantamiento topográfico y se tomaron registros fotográficos y de video.	
Revisar y aprobar los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de la obra.	Se encuentra en revisión de acuerdo a las especificaciones encontradas en la vía.	No cumple	Hasta la fecha de corte del presente informe encuentra en revisión de acuerdo a las especificaciones encontradas en la vía.
Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta crítica en método CPM usando el software PROJECT.		Se aprobó cronograma de actividades en software PROJECT	
Exigir al contratista la reprogramación del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener plazos contractuales.	Hasta la fecha no se ha solicitado reprogramación de obras.		
Verificar la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar.		Se verifico correctamente la existencia de licencias, permisos y demás.	
Hacer controles y seguimientos.		Se realizan controles y seguimientos al contrato de obras de forma constante.	

9707

 CONSULTORES DONOVAN E.A.S. NIT. 800.544.351-9	SECRETARÍA DE INGENIERÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º CMA-SPM-406-2022	REV: 0
	INFORME MENSUAL No. 9 PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 AGOSTO DE 2021	

Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de laboratorio se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia.	Se encuentra en revisión.		Hasta la fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión.
Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos contractuales e informar a la secretaría de Planeación posibles irregularidades.		Se realizan revisiones y balances de obra constantes con el fin de que el trabajo ejecutado corresponda a los diseños y documentos contractuales.	
Bitácora.		Se realiza el debido registro diario.	
Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaría para la presentación de informes parciales, finales de interventoría y de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011.		Los documentos descritos se realizan utilizando los formatos dispuestos por la secretaría.	
Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras.		Se realiza el seguimiento y control de las actividades con el propósito que el contratista logre ejecutar las actividades de acuerdo al cronogramas entregado.	
Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito.		Se realiza seguimiento y control diario a los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito.	

9708

Revisar el PMA presentado por el contratista.		Se revisó y se realizaron recomendaciones.	
Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.		Se realiza seguimiento constante al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.	
Revisar y aprobar el permiso de ocupación de cauce necesario para el desarrollo de la obra.	Hasta la fecha de corte del presente informe, aun no se ha desarrollado un permiso de ocupación de cauce para el desarrollo de la obra.		No se ha tramitado un permiso de ocupación de cauce.
Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental.		Se realiza seguimiento constante a los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental para hacer cumplir todo lo pertinente.	
Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos.		Se tiene completo conocimiento y se acatan las disposiciones normativas locales, departamentales y nacionales que afectan técnicamente la ejecución de las obras.	
Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoría, los planos record de la construcción durante toda la ejecución de la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos finales.	Hasta la fecha no se han ejecutado actividades que representen presentación de planos record		
Elaborar un listado de actividades críticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoría.	Se encuentra en ejecución hasta la fecha de corte del presente informe.		La realización del listado de actividades críticas del cronograma de actividades del contrato de interventoría se encuentra en revisión.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022	REV: 0
	INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO, DEL 1 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	Página 26 de 81

Revisar al PMA presentado por el contratista.		Se revisó y se realizaron recomendaciones.	
Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.		Se realiza seguimiento constante al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.	
Revisar y aprobar los permisos de tala de árboles y disposición de escombros necesarios para el desarrollo de la obra.	Hasta la fecha el contratista de obras no ha realizado retiro de material de escombro producto de las demoliciones de cunetas en tramo 1, no se han presentado talas.		
Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.		Se realiza la verificación de la implementación del PGIO, del contratista de obras y se hacen las respectivas observaciones.	
Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante.		Se participa y se atienden las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante.	
Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, así como la		Se realiza el desarrollo del informe mensual en donde se relacione la gestión pertinente	

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-008-2022 INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 AGOSTO DE 2021	REV: 0 Página 37 de 51
---	--	---------------------------

gestión adelantada para responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto.		para cada observación planteada.	
Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste.		Se tienen claras las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental y se atenderán debidamente.	
Recibir y verificar dentro de los 15 días siguientes al inicio del contrato de consultoría que el contratista de obra presente, la relación del equipo mínimo obligatorio, los Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, al Programa de obra, el plan de manejo de tránsito PMT, y los demás documentos exigidos en el pliego de condiciones de acuerdo con la normatividad legal vigente. Estos documentos deberán ser revisados dentro de los cinco días calendario siguientes al recibo de los mismos; y deberá informar cualquier novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco días hábiles.		Se revisó y verifico dentro del tiempo establecido la relación de equipos mínimos obligatorios, los análisis de precios unitarios, el programa de obra, el plan de manejo de tránsito PMT y demás documentos exigidos en el pliego de condiciones.	
Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, así como la gestión adelantada para responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto.		Se realiza entrega del respectivo informe, en el presente informe.	

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENIORIA No. CIMA-SPM-038-2022	REV. 0
	INFORME PERIÓDICO No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	Página 36 de 51

Recibir dentro de los cinco hábiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad ofrecido por el contratista de obra.		Se recibió dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad ofrecido por el contratista de obra.	
Cumplir con los ensayos establecidos en la propuesta.	Hasta la fecha de corte del presente informe no se ha realizado ensayos contractuales.		
Obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente al contratista de obra			
Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra.		Se verifico que el contratista de obra cumple con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales.	
Recibir y verificar dentro de los 15 días siguientes al inicio del contrato de consultoría que el contratista de obra presente el personal previsto en el anexo técnico 1. Del pliego de condiciones. Estos documentos deberán ser revisados dentro de los cinco días calendario siguientes al recibo de los mismos; y deberá informar cualquier novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco días hábiles.		Se recibió y se verifico dentro de los 15 días siguientes al inicio del contrato de consultoría que el contratista de obra presente el personal previsto en el anexo técnico 1. Del pliego de condiciones.	
Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que interviendra en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente.		Se revisó y se aprobó, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que interviendra en la ejecución de dicho contrato.	
Llevar una relación detallada de todo el personal que el		Se realiza una relación detallada	

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001A-SPM-400-2022</p> <p>INTERVENIENDO PERSONAL No. 0 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 30 de 39</p>
---	---	--------------------------------------

<p>contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.</p>		<p>de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de trabajos y se exige que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, así mismo, se determina el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable.</p>	
<p>Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoria.</p>		<p>Se realiza un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoria.</p>	
<p>Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.</p>		<p>Se verifica y se mantiene un seguimiento constante al contratista para que mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.</p>	
<p>Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y</p>		<p>Se establecieron y se mantienen controlados las medidas necesarias para que el contratista se</p>	

4713

el orden en ellos y en todos sus trabajos; podrá emplear vigilantes o inspectores, según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el Municipio de Montería - Secretaría de Planeación, en ningún caso reconocerá suma alguna adicional.		responsables del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos.	
Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoria.		Se hace seguimiento constante para mantener las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoria.	
Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por El Municipio de Montería - Secretaría de planeación.		Se verifico la instalación de la valla por parte del contratista aprobada por El Municipio de Montería - Secretaria de planeación.	
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoria del Municipio de Montería - Secretaría de Planeación y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.	Hasta la fecha no han ocurrido situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que requieran participación del supervisor del contrato de interventoria del Municipio de Montería - Secretaria de Planeación.		
Consultar con el Municipio de Montería - Secretaría de Planeación las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de corte del presenta informe, no se ha presentado alguna inquietud de orden legal.		
Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el			

9719

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-008-2023 INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV: 3 Pagina 41 de 51
---	--	---------------------------

contratista de las obligaciones contractuales.			
Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.		Se realizan reuniones de manera correcta al menos una (1) vez por semana con el contratista de obra, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.	
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.		Se elaboró y se suscribió el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	
Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio de Montería - Secretaría de Planeación. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras.		Se elaboró de manera correspondiente el acta de inicio de ejecución del contrato utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio de Montería - Secretaría de Planeación.	
Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del Municipio de Montería - Secretaría de Planeación relacionada con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas		Se ha asistido de manera correcta a todas las reuniones que se han celebrado en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del Municipio de Montería - Secretaría de Planeación	

9775

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-GPM-006-2022 INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV.: 0 Página 42 de 51
---	--	----------------------------

por todas las personas que hayan intervenido.		relacionada con los trabajos objeto de la interventoria y se han elaborado y suscrito las actas correspondientes.	
Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la confrontación de las pre-actas suscritas con el contratista.		Se revisan las actas mensuales de manera oportuna.	
Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra.	A la fecha, aun no se ha aprobado actas de modificación de cantidades de obra.		
Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente.	A la fecha, aun no se ha recibido a satisfacción obras realizadas.		
Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	Hasta la fecha de corte del presente informe se ha venido trabajando en el análisis del avance contractual para prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.		

	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º CMA-SPM-008-3622 INFORME MENSUAL N.º 9 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022	REV: 9 Página 43 de 51
---	--	-------------------------------

Presentar al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberán adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del Municipio de Montería – Secretaría de Planeación.		Se presentó al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación el primer informe parcial, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, se incluyó lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	
Obligaciones de Control Contable y financiero.			
Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.	Hasta la fecha de corte del presente informe, se realiza un análisis financiero con los debidos procesos para anticipar eventuales necesidades.		
Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.	Hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista aún no ha presentado facturas con sus debidos soportes.		

9117

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2023</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>PERIODO, DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>Página 44 de 51</p>

<p>Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato.</p>	<p>Los balances financieros se encuentran en desarrollo a la fecha de corte del presente informe.</p>		
<p>Obligaciones Juridicas</p>			
<p>Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista.</p>	<p>Hasta la fecha de corte del presente informe, no se ha tramitado alguna solicitud de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista de obra.</p>		
<p>Antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.</p>	<p>Hasta la fecha de corte del presente informe, no se ha tramitado alguna solicitud de sanciones contractuales al contratista de obra.</p>		
<p>Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al Municipio de Montería - Secretaría de Planeación, y de resultar pertinente, dar aviso a la compañía aseguradora.</p>	<p>Hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista no ha incumplido obligaciones contractuales.</p>		

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV: 0 Página 45 de 51
---	--	---------------------------

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (VER ANEXO NUMERAL 6).

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, en la Interventoria se utilizaron los siguientes recursos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (mes)
Camioneta o campero de más de 2000c.c. (incluye peajes y combustible) el modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelo 2005 a 2015	1
Equipo completo de topografía	1
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, la Interventoria laboró con el siguiente personal:

PERSONAL DE INTERVENTORIA CTO No CMA-SPM-009-2022		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANTIDAD
Director de Interventoria	Iván Enrique Alviz González	1
Residente de Interventoria 1	Jesús David Tafur Acosta	1
Residente de Interventoria 2	Maria Camila Arenas de la Hoz	1
Especialista en Estructuras	Javier José Carrillo Ortega	1
Especialista Ambiental	Marlin Rafael Martínez Mercado	1
Especialista en Vías	Diego Ignacio Arenas	1
Trabajadora Social	Klara Beatriz Maza Yapez	1
Coordinador SG-SST	Mario Alberto Monterroza Otero	1
Contador	Yenny Castillo	1
Abogado	Diana Patricia Gomez	1
Topógrafo	Anderson Lebigoth Villamizar Teherán	1
Cadenero 1	Elvis Hurtado	1
Inspector 1	German Francisco Novoa Cordero	1
Inspector 2	Pedro Julio Arrieta Doria	1
Secretaria	Kelly Johanna Grast	1
Conductor	Gustavo Hoyos	1

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 8 PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	REV. 0 Pagina 46 de 58
---	---	---------------------------

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA No CMA-SPM-009-2022			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Calidad del Servicio	20/07/2023	20/07/2028	\$69.619.246
Cumplimiento del Contrato	22/09/2022	20/01/2024	\$69.619.246
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	22/09/2022	20/07/2026	\$69.619.246

Póliza de Seguro No 3413175-4
 Suramericana

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

El Sistema de Gestión Integral de la interventoría CONSULTORES DONOVAN S.A.S. establece unos parámetros de calidad para el proyecto, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. Se implementan aquí controles rigurosos al desarrollo de las actividades de obra civil así como también a los procesos administrativos y financieros que son el apoyo base para la ejecución del mismo, se hará control directo sobre los resultados de laboratorio, de la toma de muestra para su análisis, del control de equipos y del manejo responsable de medio ambiente.

6.5 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado.

920

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-004-2022</p> <p>INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023</p>	<p>REV: 0</p> <p>Página 47 de 51</p>
---	---	--------------------------------------

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre del presente informe el contratista de obras llevo a cabo actividades de relleno con material de terraplén y sub base en el segundo tramo comprendido entre las abscisas K3+090 y K3+160 y que de acuerdo a lo descrito en los informes semanales presentados por la interventoria, las actividades para la semana N38 son las siguientes: la construcción de la placa huella, realizando actividades de excavación en material común de la explanación y canales, cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre, subbase granular clase c, concreto hidráulico $f'c = 21\text{MPa}$ (D) elaborado en sitio, concreto hidráulico $f'c = 14\text{MPa}$ clase G (para piedra pegada), acero de refuerzo $FY = 420\text{MPa}$, concreto hidráulico $f'c = 21\text{MPa}$ (D) elaborado en sitio (para construcción de Box culvert), así mismo, dar cumplimiento a lo descrito en la Implementación de Gestión de Obra y PAPS. Esta interventoria, por medio de comunicado requerirá al contratista con el fin de dar inicio a las actividades contractuales en la obra y así evitar más atrasos e incumplimientos a lo estipulado en el contrato de obra.

A la fecha del presente informe y según programa de obra presentado por el Contratista, la obra posee un porcentaje programado acumulado del 58.34% correspondiente a \$ 6.406.204.889 VS un ejecutado del 22.93% correspondiente a \$ 2.517.899.865, reflejando un atraso del 35,41%, Se ha solicitado al contratista de obras aumentar el rendimiento en la ejecución de actividades. Esta interventoria semana – semana continuara realizando los controles a la programación de obra.

En el presente mes el contratista realizo el mejoramiento de los puntos críticos y la conformación de la calzada, dando el ancho de la via, esto con el fin de brindar acceso a su maquinaria e ingreso de materiales y equipos para la normal ejecución del proyecto, vale resaltar que dichas actividades no son contractuales, por lo que no estarán sujetas a reconocimiento de pago.

Se realizó el relleno con material de subbase sobre el tramo No.03, comprendido en entre las abscisas K3+090 hasta K3+160, de acuerdo a lo descrito en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.

Se realizó fundida de placa huella sobre un carril entre las abscisas K2+080 hasta K2+220 y desde K2+360 hasta K2+540 sobre el carril derecho en sentido del abscisado (menores a mayores), de acuerdo a las medidas en los diseños y especificaciones del proyecto.

Se realizó la revisión y/o observaciones a la implementación del PGIO, presentado por el contratista de obras, ajustado a las normativas vigentes y recomendaciones de los especialistas de la interventoria.

Se realizaron comités de seguimientos al contrato a los cuales asistieron, el Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del Contrato, Contratista de Obra e Interventoria, en los cuales se hablaron temas referentes al contrato y se pactaron compromisos por las partes.

921

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	 ALCALDÍA DE MONTEBELLO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA/SPM-008-2022 INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 AGOSTO DE 2021	REV: 0 Página 48 de 51
---	---	-------------------------------

La interventoría en el presente mes en diferentes ocasiones requirió al contratista la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Calidad y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y PAPSO contratados, teniendo en cuenta que no se viene ejecutando en su totalidad. Se seguirá verificando y realizando seguimiento constante y en los casos que se requieran se solicitará al contratista su cumplimiento.

La interventoría ha recomendado al contratista hacer entrega de la documentación necesaria para el control y seguimiento de las actividades en ejecución.

Se ha recomendado al contratista de obras instalar la señalización en los lugares intervenidos, hacer entrega de las afiliaciones a seguridad social y parafiscal del personal en obra, hacer entrega de la dotación y EPP y subsanar las no conformidades encontradas en el seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Calidad y Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y PAPSO contratados.

972



8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR

Se anexan al presente informe Relación de correspondencia enviada.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS



Estado de la vía durante la intervención



Estado de la vía durante la intervención



Fundida de concreto reforzado de 21MPa



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE BONTERRA
CONTRATO DE INTERVENTORA N.º CMA-13MA-006-2022

REV.: II

INFORME MENSUAL N.º 9
PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022

Página 50 de 51



Fundida de concreto de 14MPa



Fundida de concreto reforzado de 21MPa



Fundida de Box culvert



Realización de ensayos de densidad en campo

CONSULTORES DONOVAN S.A.S NIT. 900.644.351-8
Calle 17 10-16 OFIC 803 Bogotá D.C
Calle 4 No Kra. 10-41 – Barrio El Prado- Tienratta – Córdoba
Teléfono: 601 265 02 21 – 3012845557
e-mail: donovanm009@gmail.com

9729

 CONSULTORES DONOVAR S.A.S. MT	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-006-2022	REV. 0
	INFORME MENSUAL No. 9 PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 AGOSTO DE 2023	Página 51 de 51

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES

Durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 no se realizaron actividades de campo desde el área socio, ambiental y predial en la zona del proyecto.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta copia de la bitácora del mes correspondiente al presente informe mensual de interventoría.

INFORME SEMANAL

9A7

 Municipio de Montería	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN: CAMILOS CONVIVIALES ALCALDIA DE MONTERÍA				FECHA		Nº		Nº		
	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME				FECHA DE RECIBO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE RECIBO		
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME				FECHA DE RECIBO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE RECIBO	



Se evidencia el estado de la vía en el punto de partida.



Se evidencia el estado de la vía en el punto de llegada.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME

FECHA DE RECIBO

FECHA DE RECIBO

FECHA DE RECIBO

[illegible]

The following legend must be included in the report:



Se estatus Frecuente de plaza vacía

 <p>Municipio de Montevideo Dirección de Obras Públicas Calle 12 de Mayo 1234 Montevideo, Uruguay</p>	<p>INFORME SEMANAL INTERVENCIÓN - OBRAS TORRE CONCRETO 1A.2 ALCALDÍA DE MONTEVIDEO</p>					<p>ÁREA</p>	<p>4</p>								
<p>100-2-01-00000000-00</p>	<p>Revisión: 14 de agosto de 2022</p>	<p>100-2-01</p>	<p>100-2-01</p>	<p>100-2-01</p>	<p>100-2-01</p>	<p>100-2-01</p>	<p>100-2-01</p>								
															
<p>Se están realizando con normalidad las obras.</p>								<p>Se están llevando a cabo las obras de refuerzo de la zona.</p>							
<p><i>[Signature]</i> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Municipio de Montevideo 100-2-01-00000000-00</p>															

 Municipio de Montería Cesar	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Código: 20 de agosto de 1993	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Código: 20 de agosto de 1993	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
 Municipio de Montería Cesar	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Código: 20 de agosto de 1993	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio



Se evidencia el estado de conservación de la vía

Handwritten signature
Firma: _____
Cargo: _____
Municipio de Montería
Cesar



1/08/2023 5:05:28 p. m.
MVA a vereda Manrique, Municipio de Montería

Se evidencia el estado de conservación de la vía

 Ministerio de Salud Honduras	NOMBRE DE PRESENTACION	Fecha: 28 de agosto de 2022	Página: 1 de 1	Municipio: 2180003	Dpto: 21	País: 100	Municipio: 2180003	Municipio: 2180003	Municipio: 2180003
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE PASILLO - CONCEJO DE PERSONAS S.R.L. ALCALDIA DE PASILLO									
NOMBRE DEL PROYECTO									
COMUNIDAD DEL PROYECTO									
1									



Se entregó a las 10:00 horas del día 28 de agosto de 2022

Firma: *[Signature]*
DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD
HONDURAS



Se entregó a las 10:00 horas del día 28 de agosto de 2022

-
-
-
-

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATO DE OBRA

●
●
**PERSONAL, CONTROL APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA**
●
●

[illegible]

**INFORME FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE
OBRA**

PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	30 días	lun 17/04/23	sáb 20/05/23	13CC-1 día
16		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	30 días	mar 18/04/23	lun 22/05/23	12CC
17		SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	9 días	sáb 13/05/23	mar 23/05/23	14FC-9 días
18		OBRAS DE DRENAJE	32 días	mié 19/04/23	jue 25/05/23	
19		EXCAVACION MANUAL	29 días	mié 19/04/23	lun 22/05/23	12CC+1 día
20		GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	31 días	mié 19/04/23	mié 24/05/23	19CC
21		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	31 días	mié 19/04/23	mié 24/05/23	20CC
22		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	30 días	jue 20/04/23	mié 24/05/23	23CC-1 día
23		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	vie 21/04/23	jue 25/05/23	21CC+2 días
24		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, CON ACARREO LIBRE	29 días	mié 19/04/23	lun 22/05/23	19CC
25		BOX-COULVERT	37 días	mié 19/04/23	mié 31/05/23	
26		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	18 días	mié 19/04/23	mar 9/05/23	24CC
27		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	18 días	mar 2/05/23	lun 22/05/23	28CC+1 día
28		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	18 días	lun 1/05/23	sáb 20/05/23	26CC+10 días

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23



Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Fecha límite
Resumen	Tareas críticas
Resumen del proyecto	División crítica
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
29		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	18 días	mar 2/05/23	lun 22/05/23	28CC+1 día
30		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	6 días	sáb 6/05/23	vie 12/05/23	32FC-21 días
31		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14MPa (F) (SOLADO)	18 días	mié 3/05/23	mar 23/05/23	29CC+1 día
32		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	18 días	mié 10/05/23	mar 30/05/23	33CC+1 día
33		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	18 días	mar 9/05/23	lun 29/05/23	35CC
34		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	18 días	mié 10/05/23	mar 30/05/23	32CC
35		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	18 días	mar 9/05/23	lun 29/05/23	31CC+5 días
36		PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO	15 días	vie 21/04/23	lun 8/05/23	26CC+2 días
37		APOYO ELASTOMERICO	3 días	mar 9/05/23	jue 11/05/23	36CC+15 días
38		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES.	3 días	mar 9/05/23	jue 11/05/23	36CC+15 días
39		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1 día	mar 30/05/23	mié 31/05/23	30FC+15 días

Proyecto: Proyecto1 Fecha: jue 13/04/23	Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
	División	Tarea manual	Hito externo
	Hito	solo duración	Fecha límite
	Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
	Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

9792

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
40		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	25 días	mié 19/04/23	mié 17/05/23	26CC
41		BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	1 día	mar 30/05/23	mié 31/05/23	39CC
42		SEÑALIZACIÓN	1 día	lun 29/05/23	lun 29/05/23	
43		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	1 día	lun 29/05/23	lun 29/05/23	
44		IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA	141 días	jue 13/10/22	mié 31/05/23	
45		PAPSO	141 días	jue 13/10/22	mié 31/05/23	44CC

Proyecto: Proyecto1 Fecha: jue 13/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Costo	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
\$ 9.691.701.283,00										
\$ 508.376.712,00										
\$ 140.817.215,00										
\$ 8.163.124,00										
\$ 14.680.729,00										
\$ 344.715.644,00										
\$ 1.080.597.236,00										
\$ 140.457.804,00										
\$ 544.697.191,00										
\$ 395.442.241,00										
\$ 3.173.658.340,00										
\$ 782.431.370,00										
\$ 314.716.288,00										
\$ 735.285.288,00										
<div> <div>Tarea</div> <div>División</div> <div>Hito</div> <div>Resumen</div> <div>Resumen del proyecto</div> <div>Tarea inactiva</div> <div>Hito inactivo</div> </div> <div> <div>Tareas externas</div> <div>Hito externo</div> <div>Fecha límite</div> <div>Tareas críticas</div> <div>División crítica</div> <div>Progreso</div> <div>Progreso manual</div> </div> <div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> </div> <div> <div>Proyecto: Proyecto1</div> <div>Fecha: jue 13/04/23</div> </div>										
<div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> </div> <div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> </div> <div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> </div> <div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> </div>										

5799

ESTADO GENERAL DE TIEMPO

9798

 ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO		VERSIÓN		FECHA																												
					1 DE 1																												
UNIDAD EJECUTORA:		ALCALDIA DE MONTERIA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CORDOBA																											
CONTRATO DE OBRA No:		LP-SPM-012-2022		CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES AP SAS																											
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		AGOSTO		VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN CARRETERA Y10 PROYECTO: EL MUNICIPIO DE MONTERIA		SECTOR: K0+300 - K3+586																											
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
DIAS DEL MES AGOSTO																																	
Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	24	23	24	24	22	24	24	23	23	24	24	24	22	24	21	24	23	24	23	24	24	21	23	20	24	24	24	23	24	24	24	23	722
Lluvias moderadas	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	19
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA																																	
OBSERVACIONES: SE RELACIONA EL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME																																	
<div> Nombre: Javier Morales Residente de Obra Construcciones AP S.A.S Matricula No.: 22202-3999470COR</div> <div> Nombre: Jesus David Tafur Acosta Residente de Interventoria Consultoria Bogotiana S.A.S. Matricula No.: 22202-195511 COR</div>																																	

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

 ALCALDÍA DE MONTERÍA CONSULTORES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO VERSIÓN PAGINA 1	FECHA 31/08/2022 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DE MONTERÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORCOBÁ									
CONTRATO DE OBRA N.º: LP-SPM-070-2022 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AP SAS CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARCAJO EN EL CORRECIAMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO INTERVENIOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º: OMA-SPM-005-2022									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENCIÓN									
OBSERVACIONES:									

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. En responsabilidad del interviniente verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el interviniente debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (Internacional Organization for Standardization) vigentes que aplican y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interviniente debe presentar esta formato diligenciado los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el controlado como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soporten.

Firma: 
 Nombre: LUIS ENRIQUE ALVE GONZÁLEZ
 Director de Interventoría
 Matricul. Profesional No. 2220015138400R

Firma: 
 Nombre: ÁLVARO AGUILAR
 Representante legal contratista de Obra

9750

Nº. Certificado: 1156
Fecha: 4/09/2023



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Servicio Técnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	ANDERSON VILLAMIZAR TEHERAN	Nit/ C.C	92549890
Dirección	CLL 2L # 24K-85	Ciudad	SINCELEJO
Teléfono	3506467614	Fecha de Expiración	3/03/2024

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	ESTACION TOTAL	Marca	TOPCON
Modelo	GTS-602	Nº Serial	WA1905
Aumentos	30X	Precisión	2"

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico					X

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Horios Hz y Vt					X
Puntero láser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(A) Ajuste (R) Reparación (M) Mantenimiento (CP) Cambio de piezas (N/A) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5946	0,0014	(+ / -) 0,0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5952	0,0008	(+ / -) 0,0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0,0000	(+ / -) 0,001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.



HOLGER IVAN NOVA GÓMEZ
Técnico Laboratorio

9751



CERTIFICADO DEL COLIMADOR				Servicio Técnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5		
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S						
FECHA DE INSPECCION:			21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:			20/02/2024			
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S		NIT:	901163978-5		
DIRECCION :	CRA 77 # 45B - 21 FLORIDA NUEVA		CIUDAD:	MEDELLIN- ANTIOQUIA		
TELEFONO :	5804175		PROXIMO CONTROL	23/02/2023		
INSTRUMENTO :	COLIMADOR		MARCA	SOUTH		
MODELO :	W42D-3		SERIE	S/N		
ANGULO DE GRADUACION	10"2mm		GRADUACION MINIMA	20"		
Inspección sistemas mecánicos y ópticos niveles tubulares y esféricos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable:
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S						
Inspección de cierres angulares de cada eje	lectura inicial		errores encontrados		lecturas después de ajuste	
Angulo vertical tubo superior	60°00'12"		00°00'12"		00°00'00"	
Angulo vertical tubo intermedio	90°00'15"		00°00'15"		00°00'00"	
Angulo vertical tubo inferior	119°59'50"		00°00'10"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo superior	00°00'07"		00°00'07"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00'00"		00°00'00"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo inferior	00°00'12"		00°00'12"		00°00'00"	



CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES				Servicio Técnico NOVA S.A.S NIT: 901163978-5			
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S							
FECHA DE INSPECCION:				21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:				20/02/2024			
EMPRESA:		SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S		NIT:		901163978-5	
DIRECCION:		CRA 77 # 45B - 21 FLORIDA		CIUDAD:		MEDELLIN-	
TELEFONO:		5804175		PROXIMO CONTROL		23/02/2023	
INSTRUMENTO:		ESTACION TOTAL		MARCA		TOPCON	
MODELO:		GPT7501L		SERIE		S/N	
ANGULO DE GRADUACION		1°		GRADUACION MINIMA		(2mm+2ppm*O)m.s.e	
Inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
Óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x
Inspección sistema de medida angular y verificación según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00'	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00'	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	10"

INSTRUMENTO		NIVEL AUTOMATICO		MARCA		SOKKISHA	
MODELO		B1C		SERIE		6906	
AUMENTOS		32X		PRECISIÓN EN DISTANCIA		±0.8mm*2km de nivelación	
Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
sistema pendular automatico							x
A1	1.254		MM	B2	1.425		
A2	1.246		MM	B1	1.375		
A1-A2			MM	B1-B2			

Error detectado	0.000
-----------------	-------

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

N°. Certificado: 1128

Fecha: 3/09/2023



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Técnico NOVA S.A.S
NIT: 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	ANDERSON VILLAMIZAR TEHERAN	Nit/ C.C	92549890
Dirección	CLL 2L # 24K-85	Ciudad	SINCELEJO
Teléfono	3506467614	Fecha de Expiración	2/03/2024

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	NIVEL AUTOMATICO	Marca	GANCE
Modelo	DSZ3-32X	N° Serial	2254717
Aumentos	32X	Precisión	(+/-)2mm*Km en Nivelación

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante					X
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Óptica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico	X				
Error Detectado	0.0010				
Error despues de Ajustado	0.0000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

9755



CERTIFICADO DEL COLIMADOR				Servicio Técnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5			
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S							
FECHA DE INSPECCION:				21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:				20/02/2024			
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			NIT :	901163978-5		
DIRECCION :	CRA 73 # 47-13 APTO 103 FLORIDA			CIUDAD:	MEDELLIN-ANTIOQUIA		
TELEFONO :	5804175			PROXIMO CONTROL	23/02/2023		
INSTRUMENTO :	COLIMADOR			MARCA	SOUTH		
MODELO :	W420-3			SERIE	S/N		
ANGULO DE GRADUACION	10°2mm			GRADUACION MINIMA	20"		
inspección sistemas	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable	
niveles tubulares y	x						
tubo superior	x						
tubo intermedio	x						
tubo inferior	x						
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S							
inspeccion de cierres angulares de	lectura inicial		errores encontrados		lecturas después		
Angulo vertical tubo superior	60°00'12"		00°00'12"		00°00'00"		
Angulo vertical tubo intermedio	90°00'15"		00°00'15"		00°00'00"		
Angulo vertical tubo inferior	119°59'50"		00°00'10"		00°00'00"		
Angulo horizontal tubo superior	00°00'07"		00°00'07"		00°00'00"		
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00'00"		00°00'00"		00°00'00"		
Angulo horizontal tubo inferior	00°00'12"		00°00'12"		00°00'00"		

9756



CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES **Servicio Técnico NOVA S.A.S**
NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S

FECHA DE INSPECCION:	21/08/2023
PROXIMA INSPECCION:	20/02/2024

EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	NIT :	901163978-5
DIRECCION :	CRA 73 # 47-13 APTO 103 FLORIDA	CIUDAD:	MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO :	5804175	PROXIMO CONTROL	23/02/2023
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL	MARCA	TOPCON
MODELO :	GPT7501L	SERIE	S/N

ANGULO DE GRADUACION	1°	GRADUACION MINIMA	(2mm+2ppm*D)res.s.e
----------------------	----	-------------------	---------------------

Inspección	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles		x					x
Verticalidad							x
óptica general							x
Eje vertical y							x
Frenos y							x

Inspección	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador							
compensador		x					
colimación		x					
colimación		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00'	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00'	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	10"

9757

INSTRUMENTO		NIVEL AUTOMATICO		MARCA		SOKKISHA	
MODELO		B1C		SERIE		6906	
AUMENTOS		32X		PRECISION EN DISTANCIA		+/-0.8mm*2kmde	
Inspección de	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
sistema							x

A1	1.254	MM	B2	1.425
A2	1.246	MM	B1	1.375
A1-A2		MM	B1-B2	

Error detectado	0.000
-----------------	-------



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

9758

 Alcaldía de Montería <small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small>	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA:	31	8	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-012-2022 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AP SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

FECHA DE INICIO: 22/08/2022

PLAZO INICIAL: 6 (SEIS) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/10/2023
(incluye prórroga y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 9.651.701.283,00

VALOR ACUMULADO: \$ 9.651.701.283,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: _____

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-009-2022 INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 968.170.128,30	22	9	2022	20	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	\$ 2.907.510.384,90	18	7	2023	3	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 1.938.340.256,60	18	7	2023	20	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 2.907.510.384,90	20	10	2023	20	10	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100171905

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	\$ 484.585.084,15	22	9	2022	20	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100034726 OTRAS PÓLIZAS No. N.A.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

-
-
-
-

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

4759

ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA																																																												
			1																																																													
		FECHA	31	8																																																												
			(Día)	(Mes)																																																												
				2023																																																												
				(Año)																																																												
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																																
A continuación indicar los emperos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																
ADICIONAL No.: N.A. PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 1 SUSPENSIÓN No.: 1																																																																
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10</td><td>\$ 969.170.128,30</td><td>22</td><td>9</td><td>2022</td><td>3</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>30</td><td>\$ 2.907.510.384,90</td><td>10</td><td>3</td><td>2023</td><td>3</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20</td><td>\$ 1.938.340.258,60</td><td>18</td><td>7</td><td>2023</td><td>20</td><td>10</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30</td><td>\$ 2.907.510.384,90</td><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>20</td><td>10</td><td>2028</td></tr></tbody></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10	\$ 969.170.128,30	22	9	2022	3	12	2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	\$ 2.907.510.384,90	10	3	2023	3	12	2023	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 1.938.340.258,60	18	7	2023	20	10	2026	Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.							Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 2.907.510.384,90	20	10	2023	20	10	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																													
			Desde			Hasta																																																										
Cumplimiento	10	\$ 969.170.128,30	22	9	2022	3	12	2023																																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	\$ 2.907.510.384,90	10	3	2023	3	12	2023																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 1.938.340.258,60	18	7	2023	20	10	2026																																																								
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.																																																														
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 2.907.510.384,90	20	10	2023	20	10	2028																																																								
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____																																																																
Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																
Razón Social Compañía Aseguradora: _____																																																																
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																																																																
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																																
A continuación indicar los emperos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																
ADICIONAL No.: N.A. PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>					Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																													
			Desde			Hasta																																																										
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N.A. OTRAS PÓLIZAS No. _____																																																																
Certificado de modificación o anexo No. _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																
Razón Social Compañía Aseguradora: _____																																																																
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																																																																
OBSERVACIONES:																																																																
AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME, EL CONTRATISTA DE OBRA HIZO ENTREGADO LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS A FECHA DEL ACTA DE INICIO, QUEDANDO PENDIENTE LAS APROBACIONES DE LAS MISMAS POR PARTE DEL ENTE CONTRATANTE.																																																																
NOTAS:																																																																
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																																
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar los casillas que se requieran).																																																																
																																																																
Firma																																																																
Nombre: WAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ																																																																
Director de Interventoría																																																																
Matrícula Profesional No.: 22202151394COR																																																																



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



CAMARA COLOMBIANA
DE LA ENUNSTRACION

PASAPASAP
Asociación de Profesionales de Aseguración
Perteneciente al Sector Privado

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100271905 y endoso, 3 cuyo afianzado es:
CONSTRUCCIONES AP SAS Asegurado o Beneficiario: MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,
expedida por la Compañía en 28/09/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del
Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 28 días del mes SEPTIEMBRE del año 2022.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



No. Póliza: M-180171985		No. ANEXO: 3		No. CERTIFICADO: 14751529		No. RESGOL:	
TÍTULO DE DOCUMENTO:		FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/08/2022		SUC. EXPEDIDORA: IDELLER			
VIGENCIA DESDE:		VIGENCIA HASTA:		DÍAS:		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE:	
00:00 Horas Del 22/08/2022		24:00 Horas Del 22/08/2022		0/A		N/A	
TOMADOR:		CONSTRUCCIONES AP S.A.		No. DOC. IDENTIDAD:		896.949.938-1	
DIRECCIÓN:		CL 80 SUR 800, 47 B - L43 DE 100		TELÉFONO:		3222386	
ASEGURADO:		MUNICIPIO DE MONTERÍA		No. DOC. IDENTIDAD:		896.096.734-1	
DIRECCIÓN:		CALLE 146C B15 90-43		TELÉFONO:		7916720	
BENEFICIARIO:		MUNICIPIO DE MONTERÍA		No. DOC. IDENTIDAD:		896.096.734-1	
DIRECCIÓN:		CALLE 146C B15 90-57		TELÉFONO:		7916720	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DE ACUERDO A ACTA DE INICIO CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O AJUSTES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. LP-SAN-012-2022, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA PIEDRA EN LA VÍA DE LA VEREDA PARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CONSTRUCCIÓN	00:00 Horas Del 22/08/2022	24:00 Horas Del 22/08/2022	980.179.128,38	2.432.925,98
RENOVACIÓN DE ASESORIA TÉCNICA	00:00 Horas Del 22/08/2022	24:00 Horas Del 22/08/2022	2.907.539.304,00	7.266.776,98
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/08/2022	24:00 Horas Del 22/08/2022	3.918.740.250,00	16.500.350,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 22/08/2022	24:00 Horas Del 22/08/2022	2.987.508.204,00	16.363.740,00

INTERMEDIARIOS		TIPO		% PARTICIPACIÓN		PRIMA BRUTA	
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA		AGENCIAS		100,00		\$ 43.835.887,98	
DISTRIBUCIÓN COSEGURO		TIPO COSEGURO		PÓLIZA LÍDER		% PARTICIPACIÓN	
COMPANIA							
						PRIMA NETA	
						\$ 43.835.887,98	
						GASTOS EXA	
						\$ 5.000,00	
						IVA	
						\$ 33.977.758,53	
						TOTAL A PAGAR	
						\$ 75.818.655,51	

CONVENIO DE PRIMO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EL FORMULARIO DE CONDICIONES DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES ANUALMENTE (CONGLAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERINTENDENCIA).

EXIGE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA PRESENCIANDO A PRUEBA DE VERIFICACIÓN EN LA OFICINA DE SEGUROS QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIGILA LA EXISTENCIA DE ESTAS ASESORAS CON EL RESGOL DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PUEDE LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO TERCERO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 45 DE 1993, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPIRACIÓN DE LA PÓLIZA. EN EL CASO COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTE CERTIFICADO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TOMADO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADIANTAR QUE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANZOS Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma Tomador]

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Contenido los términos de seguro presentados en el presente documento y he leído el presente documento y he leído el presente documento y he leído el presente documento.

HOLAS No

Nº PÓLIZA: M-100024720	Nº ANEXO: 2	Nº CERTIFICADO: 14751480	Nº RESGO:
TIPO DE DOCUMENTO:		FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2022	SOC. EXPEDIDORA: MUNDIAL
VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE:	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA:
09/09/2022	31/08/2027	N/A	N/A
TOMADOR: CONSTRUCCIONES AP SAS		Nº DOC. IDENTIDAD: 800.948.938-1	
DIRECCIÓN: CL 80 SUR NO. 47 D - 141 DE 107		TELÉFONO: 3221586	
ASEGURADO: CONSTRUCCIONES AP SAS		Nº DOC. IDENTIDAD: 800.948.938-1	
DIRECCIÓN: CL 80 SUR NO. 47 D - 141 DE 107		TELÉFONO: 3221586	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		Nº DOC. IDENTIDAD:	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	

OBJETO DE CONTRATO

POR RATIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INTERO CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS APAROS DE LA PÓLIZA. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O AJUSTES NO MODIFICADOS CONTENDrán VIGENTES.
SE RENOVAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. LP-SM-032-2022, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARICAYO EN EL CANTONAMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A BENEFICIO DE ADJERTEA RET 000.000.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LINEE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA COLGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS (ROCA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES AP SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA Y DEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERÍA RET 000.000.734-1.

HOMBRE DEL APARADO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
APARADO BÁSICO - PRESENCIA, LABORES Y OPERACIONES	484.585.064,00	484.585.064,00	484.585.064,00	728.899,04
INTERVENI	484.585.064,00	484.585.064,00	484.585.064,00	0,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	484.585.064,00	484.585.064,00	484.585.064,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	484.585.064,00	484.585.064,00	484.585.064,00	0,00
R.C. PROPIA	484.585.064,00	484.585.064,00	484.585.064,00	0,00
CONSTRUCCIÓN ACCIDENTAL	484.585.064,00	484.585.064,00	484.585.064,00	0,00
PREFICIONES ADICION	484.585.064,00	484.585.064,00	484.585.064,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 484.585.064,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	728.899,04
VISION AGENTE DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$	
DISTRIBUCIÓN COASEGURADO			EXTRA PRIMA	\$	
COMPAÑIA	TIPO COASEGURADO	PÓLIZA LÍMITE	PRIMA NETA	\$	728.899,04
		CERT. LÍMITE	GASTOS EXP.	\$	5.000,00
			IVA	\$	339.435,12
CONVENIO DE PAGO: EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/09/2022			TOTAL A PAGAR	\$	873.394,16

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

EL SE OBLIGADOR CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONCIENCIAMIENTO DEL CLIENTE, PROPORCIONAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE Y INCLUIR LA TERMINAL DE 2000 SUPERFINANCIAR.

LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA PÓLIZA INTERVENIENDO A PROYECTO DE PAGO DE PRIMAS COMO DOTA EL CORPO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y EN LA OPERACIÓN DE ESTE ASEGURADO CON EL PERSONAL DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PRESENTE LA PARTE DE LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4712/13.

EL TOMADOR O ASEGURADO DEBEN CONFERIRSE, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 304 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY 45 DE 1993, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ OROCHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA.

EN RENCIA COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO CONFORMEMENTE QUE HE TENIDO A DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADICIONAL, QUE DURANTE EL PROCESO DE RESERVA, ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ MENCIONADO, SOBRE LAS EXCEPCIONES Y ALCANES Y CONTENDIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935

- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



tu compañía siempre

NIT 800.037.013-0

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AL RÉGIMEN COMÚN AUTÓNOMOS DE CANTÓN

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCION GENERAL, CALLE 37 N. RD - 2405051, 2 y 3 - BOLIVIA
TELÉFONO: 2131000 FAX: 2511700 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1817-P-06-PP5US8400800027-0001

Nº. POLIZA	N-300014720	Nº. ANEXO	2	Nº. CERTIFICADO	14751406	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICION			18/05/2022	SUC. EXPEDIDORA		
VIGENCIA DESDE	22/05/2022	VIGENCIA HASTA	24/05/2023	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del		24:00 Horas Del		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRA A MANEJO DE MONEDA, NIT 800.037.013-0 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SEGURO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

SE AMPARA EL DAÑO GUARDANTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS HECHOS DE LAS COMISIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE \$484.585.064.

SE OCEA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PERJUICIOS EXTRACONTRACTUALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRACONTRACTUALES HASTA POR LA SUMA DE \$484.585.064.

PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EXCLUYE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: SÓLO TENDRA ALCANCE A LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN VEHICULO DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS Y POR HECHOS CAUSADOS ÚNICAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES QUE SE DETERMINAN EN EL CONTRATO AMPARADO CON ESTA POLIZA. OPERARIA EN EXCESO DE SU COBERTURA DE AUTOMOVILES, CONTRATADA POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. SE EXCLUYE DE ESTA COBERTURA, LA INQUILINARIA Y EQUIPOS JUNTO CON LAS DEMAS EXCLUSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CLAUSULADO GENERAL.

CONTAMINACION ACCIDENTAL: SE AMPARA LA CONTAMINACION SUBITA, IMPREVISTA REPENTINA Y ACCIDENTAL CON LAS SIGUIENTES EXCLUSIONES: - INOBERVANCIA DE INSTRUCCIONES - OMISION EN REPARACIONES - INOBERVANCIA DE LEYES, DECRETOS, ETC. PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y PREVENCIÓN - EXPLOTACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - DAÑOS GEMEJOS - AGUAS RESINAS, BASURAS, SUSTANCIAS RESIDUALES - DIOXINAS O CLOROFENOLAS - DAÑOS ECOLOGICOS - CONTAMINACION PARLATA O POLUCION - GASTOS PARA PREVENIR, NEUTRALIZAR O ANIHILAR LOS DAÑOS.

BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL: SE CUBREN LOS DAÑOS CAUSADOS CON LOS BIENES A TERCEROS.

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: OPERA EN EXCESO DE LAS POLIZAS DE R.C. DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS MISMOS QUE SE GENERE FUERA DE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA POLIZA, ASÍ COMO LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA.

R.C. CRUZADA: SE CONSIDERAN LOS ASEGURADOS, QUE FIGUREN EN LA CARATULA DE LA POLIZA, COMO TERCEROS ENTRE SI.

GASTOS MEDICOS: SE AMPARAN GASTOS MEDICOS INMEDIATOS (ATENCIÓN DE URGENCIAS).

PROPIEDADES ADYACENTES: EL PRESENTE SEGURO SE EXTIENDE A AMPARAR LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVA DE DAÑOS A CAUSA DE VIBRACION, ELIMINACION O DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANTES, HUNDIMIENTO DE TERRENO, DERRUMBES Y/O DESLIZAMIENTO DE TIERRA, AGENTAMIENTO, INUNDACIONES, DESBORDAMIENTO Y AMEGACIONES POR AGUAS REPRESENTADAS, SIEMPRE QUE HAYAN SIDO CAUSADAS POR EL ASEGURADO PARA ELLO DEBEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES PREVIAS:

- EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PERDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARA AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PERDIDAS SÓLO CUANDO TENGAN POR CONSECUENCIA EL DERRUMBE TOTAL O PARCIAL. LOS DAÑOS AGRIETAS QUE NO AFECTEN LA ESTABILIDAD DE LAS PROPIEDADES DE TERCEROS NO SERAN OBJETO DE COBERTURA. SE SE AFECTAN ELEMENTOS IMPORTANTES O EL SUMARIO DE PROPIEDADES DE TERCEROS, LA INDEMNIZACION QUEDA RESTRINGIDA AL COLAPSO TOTAL O PARCIAL DE TAL PROPIEDAD. - EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PERDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARA AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PERDIDAS SÓLO SIJETO A QUE LA REFERIDA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O EDIFICIOS SE ENCONTRARAN EN ESTADO SEGURO ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES Y CUANDO SE HAYAN ENCARIMADO LAS NECESARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. - A SOLICITUD, ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES EL ASEGURADO ELABORARA POR SU PROPIA CUENTA UN IMPORTE SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O LOS EDIFICIOS QUE POSTERAMENTE SE HALLAN AMENAZADOS.

ES NECESARIO CONTAR CON ACTAS DE VECINDADES, ELABORADOS ANTES DE INICIARSE LAS OBRAS, EN LAS QUE CONSTE EL BUEN ESTADO DE LAS PROPIEDADES VECINAS. EL ASEGURADOR NO INDEMNIZARA AL ASEGURADO EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR: - DAÑOS PREVISIBLES TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION O SU EJECUCION. - DAÑOS DE MENOR IMPORTANCIA QUE NO PERJUDICAN LA ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD ASEGURADA, DE LOS TERRENOS O EDIFICIOS NI CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS. - COSTES POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN O A MONITOREO DE DAÑOS QUE HAY QUE INVERTIR EN EL TRANSURSO DEL PERIODO DEL SEGURO.

CONDUCCIONES SUBTERRANEAS Y AEREAS: SOLAMENTE SE INDEMNIZARA AL ASEGURADO RESPECTO DE PERDIDAS O DAÑOS A LOS CABLES EXISTENTES Y/O TUBERIAS O OTROS SERVICIOS SIEMPRE Y CUANDO HAYA TOMADO CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES RESPECTO DE LA LOCALIZACION EXACTA DE LOS MENCIONADOS CABLES, TUBERIAS O OTROS SERVICIOS ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS. LA INDEMNIZACION ESTARA EN CUALQUIER CASO, RESTRINGIDA AL COSTO EFECTIVO DE REPARACION O REEMPLAZO DE DICHS CABLES, TUBERIAS O OTROS SERVICIOS SEGUN SEA VALUADO POR UN INSPECTOR INDEPENDIENTE, Y NO SE DEDERA EXTENDER A CUBRIR CUALQUIER COSTO ADICIONAL POR LA PERDIDA DEL USO O PENALIZACIONES Y/O POR LAS CUALES PUEDA SER IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES COMO RESULTADO DE UNA PENALIDAD Y/O DAÑO CONSECUCIONAL. SE EXCLUYEN DAÑOS PREVISIBLES, CAUSADOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O A CONSECUENCIA DE UNA R.C. PROFESIONAL, ERRORES Y OMISIONES. ESTA COBERTURA ESTA SUJETADA A COP \$484.585.064 EVENTO/VIGENCIA.

NOTA DE RC PRODUCTOS: NOTA 1: SE EXCLUYE:

- DAÑOS AL PRODUCTO MISMO O SU EMPAQUE.
- DEFECTOS PROPIOS DEL PRODUCTO.
- RECIBIDA DEL PRODUCTO (AMPARO EXCLUSIVO DE POLIZAS R/CALL)
- RETRASOS EN LA ENTREGA.
- FALTA DE IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA DESARROLLAR LA FUNCION PARA LA CUAL SE DESTINA.





tu compañía siempre

SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS
AL CLIENTE Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B-24 PISO 1-2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONOS 2855600 FAX 2851270 - WWW.SEGURSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-3317-P-06-PPSUSR00000027-0001

Nº. POLIZA	N-20034720	Nº. ANEXO	2	Nº. CERTIFICADO	14751486	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPIRACION	26/09/2022	SIC. EXPEDIDORA	REELLEN		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del 22/09/2022	24:00 Horas Del 24/03/2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- DEFICIENCIAS CONOCIDAS POR EL ASEGURADO.
- PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL.
- FALTA DE PERMISOS O LICENCIAS.
- INDUSTRIA DE AVIACION.
- UNION Y MECILA.
- TRANSFORMACION.
- EXPORTACION A ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA Y/O ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ADENAS SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE QUEDA EXCLUIDA LA RC PRODUCTOS PARA LAS SIGUIENTES CLASES DE PRODUCTOS:


- PRODUCTOS QUÍMICOS; FARMACÉUTICOS Y/O COSMÉTICOS.
- PRODUCTOS PETROQUÍMICOS; FERTILIZANTES; HERBICIDAS; INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS.
- PINTURAS CON PLOMO.
- PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN VETERINARIA.
- PRODUCTOS PARA EL USO EN LA MEDICINA.
- IMPLANTES PARA EL CUERPO HUMANO.
- TABACO Y TODOS LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL TABACO.

NO SE APLICARÁN LAS LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES PROVENIENTES DE:

- A) A RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE DERIVEN DEL HECHO DE QUE EL ASEGURADO NO HAYA CONVENIDO CON EL PROVEEDOR DE SUS PRODUCTOS; CONDICIONES QUE LIMITEN SU RESPONSABILIDAD EN FORMA TAL QUE TENGAN APLICACIÓN JURÍDICA.
- B) DAÑOS DERIVADOS DE LA INOBSERVANCIA DE CUALQUIER DISPOSICIÓN LEGAL O GUBERNAMENTAL; O POR TOLERANCIA DE TALES INOBSERVANCIAS.
- C) DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS PRODUCTOS COMO CONSECUENCIA DE UN ERROR O DEFECTO DE FABRICACIÓN.
- D) OPERACIONES QUE HAYAN SIDO TERMINADAS POR EL ASEGURADO PERO QUE PUEDAN JUZGARSE COMO INCOMPLETAS POR SER INAPROPIADAS O DEFECTUOSAS.
- E) OPERACIONES QUE PUEDAN SER INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS COMO COMPLETAMENTE TERMINADAS; PERO QUE A SU VEZ FORMEN PARTE DE UN CONJUNTO A CARGO DE ASEGURADO NO PLANEAMENTE CONCLUIDAS.
- F) EL LUCRO QUE HUBIERE DEJADO DE RECIBIR EL ASEGURADO O TERCEROS A CONSECUENCIA DE UN DEFECTO DEL PRODUCTO SUMINISTRADO, DAÑOS CAUSADOS POR EL NO SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USOS DEL PRODUCTO.
- G) GASTOS POR RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO DE LAS INSPECCIONES; REPARACION; SUSTITUCIÓN PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO; DEL TRABAJO O SERVICIO.
- H) DAÑOS POR ASBESTOS EN ESTADO NATURAL O POR PRODUCTOS DERIVADOS DE EL; ASÍ COMO DAÑOS EN RELACIÓN CON OPERACIONES Y ACTIVIDADES EXPUESTAS A POLVO QUE CONTIENGA FIBRAS DE ANIANO.
- I) DAÑOS POR PRODUCTOS; OBRAS; TRABAJOS O SERVICIOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN.
- J) RECLAMACIONES BASADAS EN QUE LOS PRODUCTOS NO CUMPLEN LA FINALIDAD PARA LA CUAL HABÍAN SIDO DESTINADOS O NO RESPONDEN A LAS CALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLOS.
- K) DAÑOS RESULTANTES DE UN DEFECTO EVIDENTE EN LOS PRODUCTOS; TRABAJOS O SERVICIOS QUE PODÍAN SER DESCUBIERTO POR EL ASEGURADO O POR EL CLIENTE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.
- L) DAÑOS O DEFECTOS QUE SUPERA EL PRODUCTO; TRABAJO O SERVICIO MISMO O EL BIEN QUE HA SIDO OBJETO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA.
- M) GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA; FINALIZACIÓN; PÉRDIDA DE BENEFICIO; FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE INSTALACIONES; SALVO QUE SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DAÑO MATERIAL O PERSONAL CAUSADO EN EL PRODUCTO FABRICADO; ENTREGADO O SUMINISTRADO O POR EL TRABAJO O SERVICIO EJECUTADO POR EL ASEGURADO.
- N) HERRAMIENTAS DEL ASEGURADO; Y EQUIPOS O MATERIALES NO INSTALADOS QUE HUBIEREN SIDO ABANDONADOS POR ESTE.
- O) SI SE DESCUBRE UN ERROR O DEFECTO DE UN PRODUCTO QUE HUBIERE O NO SIDO SUMINISTRADO Y CUAL PRODUCTO O PUDO PRODUCIR UNA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL O SI EXISTE LA SOSPECHA DE QUE TAL ERROR O OTRO SIMILAR PODRÍA PRESENTARSE EN OTROS PRODUCTOS ELABORADOS Y POR TAL RAZÓN SUGIEREN GASTOS ADICIONALES; ESTOS NO SERÁN REEMBOLSADOS.
- P) DAÑOS POR PRODUCTOS; TRABAJOS O SERVICIOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS; SEGÚN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TÉCNICA QUE FUEREN DE APLICACIÓN DE TALES SUPUESTOS O POR REALIZAR LA PRODUCCIÓN; ENTREGA O LA EJECUCIÓN DESVIÁNDOSE A SABIDURAS DE LAS REGLAS DE LA TÉCNICA O DE LAS INSTRUCCIONES DEL CONTENIDO.



4769



tu compañía siempre

Tel: 660.937.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETINEDORES

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 78 N. 48 - 24 PISO, 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 665.5600 FAX: 2051220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 38-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR00000827-0001

Nº. POLIZA	N-100094720	Nº. ANEXO	2	Nº. CERTIFICADO	14751905	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICION	28/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	PEDELIN		
VIGENCIA DESDE	22/08/2022	VIGENCIA HASTA	24/03/2023	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
08:00 Horas Del		24:00 Horas Del		N/A		N/A	

CONDICIONES PARTICULARES

EL CONOCIMIENTO, ANTICIPADO DE DEFECTO O DE LA NOCIVIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS SE CONSIDERARÁ COMO CULPA GRAVE Y QUEBRA. POR LO TANTO EXCLUIDA DE ESTE SEGURO.

SALVO ESTIPULACIÓN EN CONTRATO QUEDAN IGUALMENTE EXCLUIDAS LAS RECLAMACIONES POR:

1) DAÑOS, PERJUICIOS O GASTOS DE TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNIÓN O MEZCLA DE PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS POR UN TERCERO.

2) DAÑOS, PERJUICIOS O GASTOS DE TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS ASEGURADOS POR UN TERCERO.

3) DAÑOS RELACIONADOS CON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

CALIDAD MEDICAMENTOS Y TODOS LOS QUE SUMINISTREN MEDICAMENTOS SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADA POR LOS DAÑOS PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL AFIANZADO.

DEDUCIBLES:

AMPAO

DEDUCIBLES

AMPAO BASICO + PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
CONTAMINACION ACCIDENTAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
PROPIEDADES ADYACENT	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
PRODUCTOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	0.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 0.00 SMMLV

CONTINUACION AMPAROS...

AMPAO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PREMIA
PRODUCTOS	484,585,064.00	484,585,064.15	484,585,064.15	0.00
GASTOS MEDICOS	50,000,000.00	484,585,064.15	484,585,064.15	0.00



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)



suramericana

1766

Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Póliza 3413175-4	Documento 14383584
Intermediario LUAL SEGUROS LTDA	Código 34493	Oficina 2615
		Referencia de Pago 01214383584

TOMADOR			
NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9006443519	CONSULTORES DONOVAN S.A.S		
Dirección	Ciudad	Teléfono	
TV 27 # 57 19	BOGOTÁ D.C.	3516772	

GARANTIZADO	
NIT	Nombres y Apellidos
9006443519	CONSULTORES DONOVAN S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO	
NIT	Nombres y Apellidos
8020947341	MUNICIPIO DE MONTERÍA

COBERTURAS DE LA PÓLIZA					
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA	
CALIDAD DEL SERVICIO	22-MAR-2023	22-MAR-2028	69.619.246,00		0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-SEP-2022	22-SEP-2023	69.619.246,00		0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22-SEP-2022	22-MAR-2026	69.619.246,00		0,80
VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR	
Desde Hasta	Días Desde Hasta	\$0	\$0	\$0	
22-SEP-2022 22-MAR-2028	2028 22-SEP-2022 22-MAR-2028				
VALOR A PAGAR EN LETRAS CERO PESOS M/L					

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	\$0	\$480.372	\$209.657.738,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP							
PAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO POLIZA LIDER
012	NOX	2615	975243	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANIA	CATEGORIA
34493	LUAL SEGUROS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ratno al cual accede	Identificación externa de la póliza
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-086
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	E	M-01-612-031

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO CMA-SPM-009-2022.
SEGÚN CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CMA-SPM-009-2022. REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS, A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE PROCEDE A ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE LAS COBERTURAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES*

●

●

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

CONTRATO DE OBRA

●

●

9767

 Alcaldía de Montería CORPUS TURISMO Y OTRAS S.A.S.	ALCALDÍA DE MONTERÍA CORPUS TURISMO Y OTRAS S.A.S. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LIBRO:</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FOLIO:</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA:</td> <td></td> </tr> </table>	LIBRO:		FOLIO:	1	FECHA:	
LIBRO:								
FOLIO:	1							
FECHA:								
		FECHA: 21/06/2022 <small>VER: 0001 / 0001</small>						
UNIDAD SUBSTANTIVA: <u>ALCALDÍA DE MONTERÍA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORPORAL</u>								
CONTRATO DE OBRA No. <u>LP-SEM-013-2022</u> <small>(Código de contrato y obra)</small>								
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELTA EN LA VÍA DE LA VEREDA BARRACAYO EN EL CORRECAMBIO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA								
CONTRATISTA: <u>CONSTRUCIONES AP 305</u>								
FECHA DE BANDO: <u>21/06/2022</u> <small>(Fecha de publicación)</small>	PLAZO INICIAL: <u>6 (SEIS) MESES</u>	FECHA DE VENCIMIENTO: <u>21/06/2023</u> <small>(Fecha estimada de cumplimiento)</small>						
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. <u>CMA-SEM-004-2022</u> <small>(Código de contrato y obra)</small>								
INTERVENIENTE: <u>CORPUS TURISMO Y OTRAS S.A.S.</u>								
1. PLAN DE CALIDAD								
PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSIÓN No. <u>1</u> FECHA DE VERSIÓN <u>16/06/2022</u>								
OBSERVACIONES: A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HECHO ENTREGA A LA INTERVENIENTE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO.								
2. AUDITORIAS DE CALIDAD								
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: <u> </u> FECHA ÚLTIMA AUDITORIA: <u> </u> PRESENTE INFORME DE AUDITORIA: SI ☒ NO ☐ No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: <u> </u> FECHA PRÓXIMA AUDITORIA: <u> </u>								
OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS POR TAL MOTIVO NO SE ENVIARON PROGRAMAS DE AUDITORIAS POR REALIZAR.								
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PMIE)								
PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN: <u> </u>								
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MCO: <u> </u> No. TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS EN EL MCO: <u> </u> CUMPLIDO EL PLAN DE PMIE EN EL MES: SI ☒ NO ☐								
OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.								
<small>El Plan de Inspección, Medición y Ensayo debe cumplir en un todo con los requisitos establecidos en las normas de ensayo y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La totalidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define conforme a las exigencias del PMIE y en la obra que se ejecuta. La totalidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PMIE y de la obra ejecutada.</small>								
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES								
No. de No Conformidades reportadas en el mes: <u>0</u> No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: <u>0</u> No. Acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: <u>0</u> No. Acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: <u>0</u> No. Acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: <u>0</u>								
OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO PRESENTA NO CONFORMIDADES.								
5. QUEJAS Y RECLAMOS								
No. De quejas y reclamos recibidos en el mes: <u>0</u> No. De quejas y reclamos atendidos en el mes: <u>0</u> No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: <u>0</u> No. Acumulado de quejas y reclamos recibidos por el contrato: <u>0</u> No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: <u>0</u> No. Acumulado de quejas y reclamos atendidos en el contrato: <u>0</u>								
OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA RECIBIDO QUEJAS O RECLAMOS POR PARTE DE LA COMUNICACIÓN SEÑALADA EN EL SUBJUNTO DEL PRESENTE.								
<small>Las quejas y reclamos sirven como origen fundamental a los cambios del proyecto y a la necesidad de la obra.</small>								

ACTAS DE COMITÉ DE TÉCNICOS

4769



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



MONTERÍA

ACTA DE COMITÉ No.16

CONTRATO No:	LP-SPM-012-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$9.691.701.283,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	30 JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N°2	18 JULIO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	11 DE JULIO 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los once (11) días del mes de agosto del año 2023, y estando en ejecución el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron: el apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal Ingeniero **VÍCTOR HERNÁNDEZ**, el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** en representación asiste el Director de Interventoría el ingeniero Iván Alviz y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** y en representación de este, el Ing. Santiago Sánchez quien funge como Director de obra, con el propósito de adelantar el Comité No.16 del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

4770



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



Alcaldía de
MONTERÍA

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Revisión de Compromisos Anteriores
3. Avance de Obra.
4. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
5. Compromisos.

DESARROLLO

1. PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES.

Lista de participantes en el Comité N°16 el día de hoy 11 de agosto de 2023.

- Director de interventoría, Iván Alviz González.
- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Trabajadora Social Interventoría: Kiara Maza.
- Especialista SST: Mario Monterroza.
- Especialista Ambiental: Martín Martínez.
- Director de obras, Santiago Sánchez.
- Especialista SST contratista: Jovana González.
- Especialista de Vías: Margarita Mejía
- Apoyo a la supervisión, Víctor Hernández.

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha compromiso
Entrega de planillas de afiliación del personal	CONTRATISTA	No cumple
Incremento de personal en Obra e Implementación de Jornada nocturna	CONTRATISTA	No cumple
Construcción de filtros	CONTRATISTA	No cumple
Correctivos de Obra (Losas Fisuradas)	CONTRATISTA	No cumple



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



Alcaldía de
MONTERÍA

3. AVANCE DE OBRA

3.1 avance físico

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 40.64% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 21.93%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 18.71% con respecto al cronograma de obras.

4. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Interventoría:

El Ingeniero Iván Alviz González, en su calidad de director de Interventoría manifiesta:

- El Ing. Iván Alviz, manifiesta su preocupación, debido al atraso que se presenta en la ejecución de las actividades en obra con respecto a la reprogramación enviada por el contratista de obras, reiterando al contratista tomar los correctivos necesarios para contrarrestar el atraso y cumplir con el tiempo contractual de obra.
- La interventoría solicita nuevamente en el presente comité de obras al contratista aumentar las cuadrillas de trabajo para la construcción de la placa huella, iniciar la construcción de los filtros, construcción del puente e intervenir de manera simultánea los box culvert.
- Se solicita al contratista de obras tomar de manera inmediata los correctivos pertinentes con las fisuraciones presentadas en las placas de concreto, berma-cuneta, piedra pegada y viga riostra, además de realizar debidamente el proceso constructivo de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto con el curado de los elementos y realizar correctamente las juntas de construcción, dichas técnicas se presumen que son las causas de las fisuras.
- De acuerdo a la solicitud del contratista de obras realizada en el presente comité de realizar un recorrido en campo para analizar e identificar las fisuras que presenta la placa huella, se le informa que la interventoría esta presta en realizar acompañamiento técnico a cada una de las actividades en obra.
- La interventoría, en atención a la solicitud presentada por el contratista de obras en cuento a la aprobación del cambio de flujo de inversión y ordenes de operaciones N°28, 29, 30 y 31, se le manifiesta al contratista de obras que en vista de que se ha desembolsado aproximadamente el 80% del anticipo y transcurrido 8 meses del plazo total del contrato, no se evidencia avance físico del proyecto que genere un balance con respecto al avance financiero, por ende no es posible generar aprobaciones sobre las ordenes de operaciones, siempre y cuando el avance de la obra sea significativo en la



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



Alcaldía de
MONTERÍA

semana siguiente, la interventoría revisará y dará los trámites pertinentes de las ordenes de operaciones, se deja constancia en el presente comité de obras que el atraso de la obra no está sujeto al desembolso del anticipo.

El Ingeniero Mario Monterroza, en su calidad de Especialista SST de Interventoría manifiesta:

- Se solicita al contratista de obras presentar las planillas de pago de afiliación del personal operativo y administrativo de la obra.
- El Ing. Mario Monterroza solicita al contratista de obras dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico para cada uno de los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que se ha evidenciado ausencia de señalización y demarcaciones de las labores en obra.
- El Ing. Mario Monterroza solicita al contratista de obras dar respuesta a los requerimientos enviados por la interventoría, los cuales hasta la fecha no se han atendido.
- Se solicita al contratista de obras dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico para cada uno de los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que se ha evidenciado ausencia de señalización y demarcaciones de las labores en obra.

El Ingeniero Martin Martínez, en su calidad de Especialista Ambiental de Interventoría manifiesta:

- Se solicita al contratista de obras presentar los informes de Implementación al PGIO N° 4,6,7 y 8, al igual que la entrega del Informe PGIO N°5 Corregido.
- El ing. Martin Martínez, manifiesta que desde el inicio de las actividades se logro dar trazabilidad a las gestiones administrativas atreves del Ingeniero Ambiental del contratista, Jesús tirado, donde se revisaron los informes N°01 y N°02 los cuales fueron aprobados parcialmente, sujetos a una subsanaciones que se tenían que tomar en el informe N°03, a partir del reinicio de obra N°01 no se logró tener comunicación alguna con el encargado Esp. Ambiental del contratista de obras para atender las solicitudes de la interventoría.
- El ing. Ambiental de Interventoría manifiesta que dentro del Informe PGIO se debe presentar cada una de las actividades que realizadas en dicho periodo con el registro fotográfico y los avances obtenidos en la ejecución de las actividades.
- El Ing. Martin Martínez, Manifiesta que se tomen las medidas correctivas de manera inmediata para que se logre llevar a cabo la ejecución de las actividades ejerciendo las buenas practicas Ambientales.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



MONTERÍA

- Se solicita al contratista de obras presentar los informes de Implementación al PGIO N° 4,6,7 y 8; los cuales se encuentran atrasados por entregar a la interventoría para su respectiva revisión y/o VoBo de la interventoría al igual que la entrega del Informe PGIO N°5 Corregido.
- El Ing. Martin Martínez, solicita al contratista de obras entregar informe de implementación de la resolución de permiso de ocupación de cause N° 2-9038 de fecha 23 de marzo de 2022, a partir de la fecha de intervención de las obras de drenaje.

Secretaría de Infraestructura:

El Ingeniero Víctor Hernández, en su calidad de Ingeniero de Apoyo a la supervisión, manifiesta:

- La Entidad Contratante, manifiesta su preocupación con respecto a los avances de las actividades del contratista de obras, desde el punto de visto técnico, ambiental y SST; por lo cual, se debe implementar un plan de contingencia, no solo con el incremento de jornadas de trabajo, si no de cuadrillas en los frentes de trabajo, esto teniendo en cuenta que la longitud del proyecto posibilita aumentar los frentes de trabajo y mejoraría la ejecución física del proyecto.
- El Ing. Víctor Hernández, solicita al contratista de obras que se puedan adoptar compromisos que se cumplan en campo y que impacten positivamente en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden ir realizando y que no generan ninguna complicación para su ejecución.
- El Ing. Víctor Hernández, solicita al contratista de obras dar cumplimiento a cada una de las competencias del proyecto desde el punto de vista técnico, ambiental, social y de SST.

Contratista de Obras:

El Ingeniero Santiago Sánchez, en su calidad de Director de Obra, Manifiesta:

- El Ing. Santiago Sánchez, manifiesta que, se aumentaran las cuadrillas de trabajo, han tenido algunos inconvenientes internos, los cuales fueron sub sanados y que se aumentara el número de trabajadores en las cuadrillas de trabajos, aumentando a tres (3) cuadrillas, las cuales se distribuirán en dos jornadas, dos (2) en la jornada diurna y una (1) en la jornada nocturna en la construcción de la placa huella, todo esto para nivelar la ejecución de las actividades con la reprogramación de obras.
- El contratista de obras, solicita a la interventoría dar aprobación al cambio de plan de inversión del anticipo presentado el día 01 de agosto de 2023 y a las ordenes de

9779



Aldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



MONTERÍA

operaciones N°28,29,30 y 31, esto con el fin de poder cubrir gastos administrativos asociados a la ejecución del proyecto.

- Se le informa a la interventoría que, se incrementara el rendimiento de las actividades del box culvert, interviniendo simultáneamente para lograr cumplir y culminar estas obras de drenaje.
- El Ing. Santiago Sánchez, Solicita acompañamiento de la interventoría para realizar un recorrido en campo para analizar e identificar las dificultades que presenta el contratista de obras en la ejecución de las actividades al igual de chequear las placa huella, viga riostra y bermas cuentas que se encuentran fisuradas para tomar los correctivos.
- El contratista de obras, manifiesta que realizara los respectivos correctivos con las instalaciones de las señalizaciones transitorias para garantizar la transpirabilidad de los vehículos que se movilizan sobre el proyecto.

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha compromiso
Entrega de planillas de afiliación	CONTRATISTA	14 de agosto de 2023
Entrega de informes PGIO No 4 y 5	CONTRATISTA	16 de agosto de 2023
Entrega de informes PGIO No 6 y 7	CONTRATISTA	18 de agosto de 2023
Entrega de informes PGIO No 8	CONTRATISTA	23 de agosto de 2023
Entrega de Dotación del personal	CONTRATISTA	16 de agosto de 2023
Construcción de 1000 ml de placa huella Completa	CONTRATISTA	28 de agosto de 2023
Construcción de filtros	CONTRATISTA	17 de agosto de 2023
Construcción de puente	CONTRATISTA	21 de agosto de 2023
Finalización de los Box Culvert	CONTRATISTA	15 de septiembre de 2023
Correctivos de Obra (Losas fisuradas)	CONTRATISTA	21 de agosto de 2023

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 11 días del mes de agosto de 2023.

ASISTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
ING. VÍCTOR HERNÁNDEZ NOVOA	ENTIDAD	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
ING. JESÚS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	

Gobierno de la GENTE

Carta 23 No. 8 - de 7 de agosto de 2023, Córdoba
www.monteria.gov.co



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
 Contrato No: LP-SPM-012-2022
 Fecha: 11 de agosto de 2023



MONTERÍA

ING. IVÁN ALVIZ GONZÁLEZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	<i>Ivan Alviz</i>
ING. MARIO MONTERROZA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	ESPECIALISTA SST	<i>Mario Monterroza</i>
ING. MARTIN MARTÍNEZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	ESPECIALISTA AMBIENTAL	<i>Martin Martinez</i>
KIARA MAZA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	TRABAJADORA SOCIAL	<i>Kiara Maza</i>
ING. SANTIAGO SÁNCHEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	DIRECTOR DE OBRA	<i>Sgt. Sanchez</i>
ING. JOVANA GONZÁLEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA SST	<i>Jovana Gonzalez</i>
ING. MARGARITA MEJÍA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA DE VÍAS	<i>Margarita Mejia</i>



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



ALCALDÍA DE
MONTERÍA

ACTA DE COMITÉ No.16

CONTRATO No:	LP-SPM-012-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$9.691.701.283,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	30 JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N°2	18 JULIO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	11 DE JULIO 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los once (11) días del mes de agosto del año 2023, y estando en ejecución el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron: el apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal Ingeniero **VÍCTOR HERNÁNDEZ**, el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** en representación asiste el Director de Interventoría el ingeniero Iván Alviz y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** y en representación de este, el Ing. Santiago Sánchez quien funge como Director de obra, con el propósito de adelantar el Comité No.16 del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

Gobierno de la **GENTE**

Carta 27 No. 9 - de 7. 2020/2021. C. Montería, Córdoba

9777



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Revisión de Compromisos Anteriores
3. Avance de Obra.
4. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
5. Compromisos.

DESARROLLO

1. PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES.

Lista de participantes en el Comité N°16 el día de hoy 11 de agosto de 2023.

- Director de interventoría, Iván Alviz González.
- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Trabajadora Social Interventoría: Kiara Maza.
- Especialista SST: Mario Monterroza.
- Especialista Ambiental: Martín Martínez.
- Director de obras, Santiago Sánchez.
- Especialista SST contratista: Jovana González.
- Especialista de Vías: Margarita Mejía
- Apoyo a la supervisión, Víctor Hernández.

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha compromiso
Entrega de planillas de afiliación del personal	CONTRATISTA	No cumple
Incremento de personal en Obra e implementación de Jornada nocturna	CONTRATISTA	No cumple
Construcción de filtros	CONTRATISTA	No cumple
Correctivos de Obra (Losas Fisuradas)	CONTRATISTA	No cumple



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



Alcaldía de
MONTERÍA

3. AVANCE DE OBRA

3.1 avance físico

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 40.64% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 21.93%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 18.71% con respecto al cronograma de obras.

4. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Interventoría:

El Ingeniero Iván Alviz González, en su calidad de director de Interventoría manifiesta:

- El Ing. Iván Alviz, manifiesta su preocupación, debido al atraso que se presenta en la ejecución de las actividades en obra con respecto a la reprogramación enviada por el contratista de obras, reiterando al contratista tomar los correctivos necesarios para contrarrestar el atraso y cumplir con el tiempo contractual de obra.
- La interventoría solicita nuevamente en el presente comité de obras al contratista aumentar las cuadrillas de trabajo para la construcción de la placa huella, iniciar la construcción de los filtros, construcción del puente e intervenir de manera simultánea los box culvert.
- Se solicita al contratista de obras tomar de manera inmediata los correctivos pertinentes con las fisuraciones presentadas en las placas de concreto, berma-cuneta, piedra pegada y viga riostra, además de realizar debidamente el proceso constructivo de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto con el curado de los elementos y realizar correctamente las juntas de construcción, dichas técnicas se presumen que son las causas de las fisuras.
- De acuerdo a la solicitud del contratista de obras realizada en el presente comité de realizar un recorrido en campo para analizar e identificar las fisuras que presenta la placa huella, se le informa que la interventoría esta presta en realizar acompañamiento técnico a cada una de las actividades en obra.
- La interventoría, en atención a la solicitud presentada por el contratista de obras en cuento a la aprobación del cambio de flujo de inversión y ordenes de operaciones N°28, 29, 30 y 31, se le manifiesta al contratista de obras que en vista de que se ha desembolsado aproximadamente el 80% del anticipo y transcurrido 8 meses del plazo total del contrato, no se evidencia avance físico del proyecto que genere un balance con respecto al avance financiero, por ende no es posible generar aprobaciones sobre las ordenes de operaciones, siempre y cuando el avance de la obra sea significativo en la



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



MONTERÍA

semana siguiente, la interventoría revisará y dará los trámites pertinentes de las ordenes de operaciones, se deja constancia en el presente comité de obras que el atraso de la obra no está sujeto al desembolso del anticipo.

El Ingeniero Mario Monterroza, en su calidad de Especialista SST de Interventoría manifiesta:

- Se solicita al contratista de obras presentar las planillas de pago de afiliación del personal operativo y administrativo de la obra.
- El Ing. Mario Monterroza solicita al contratista de obras dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico para cada uno de los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que se ha evidenciado ausencia de señalización y demarcaciones de las labores en obra.
- El Ing. Mario Monterroza solicita al contratista de obras dar respuesta a los requerimientos enviados por la interventoría, los cuales hasta la fecha no se han atendido.
- Se solicita al contratista de obras dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico para cada uno de los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que se ha evidenciado ausencia de señalización y demarcaciones de las labores en obra.

El Ingeniero Martín Martínez, en su calidad de Especialista Ambiental de Interventoría manifiesta:

- Se solicita al contratista de obras presentar los informes de Implementación al PGIO N° 4,6,7 y 8, al igual que la entrega del Informe PGIO N°5 Corregido.
- El Ing. Martín Martínez, manifiesta que desde el inicio de las actividades se logró dar trazabilidad a las gestiones administrativas a través del Ingeniero Ambiental del contratista, Jesús Tirado, donde se revisaron los informes N°01 y N°02 los cuales fueron aprobados parcialmente, sujetos a una subsanación que se tenía que tomar en el informe N°03, a partir del reinicio de obra N°01 no se logró tener comunicación alguna con el encargado Esp. Ambiental del contratista de obras para atender las solicitudes de la interventoría.
- El Ing. Ambiental de Interventoría manifiesta que dentro del Informe PGIO se debe presentar cada una de las actividades que realizadas en dicho periodo con el registro fotográfico y los avances obtenidos en la ejecución de las actividades.
- El Ing. Martín Martínez, Manifiesta que se tomen las medidas correctivas de manera inmediata para que se logre llevar a cabo la ejecución de las actividades ejerciendo las buenas prácticas Ambientales.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



MONTERÍA

- Se solicita al contratista de obras presentar los informes de Implementación al PGIO N° 4,6,7 y 8; los cuales se encuentran atrasados por entregar a la interventoría para su respectiva revisión y/o VoBo de la interventoría al igual que la entrega del Informe PGIO N°5 Corregido.
- El Ing. Martín Martínez, solicita al contratista de obras entregar informe de implementación de la resolución de permiso de ocupación de cause N° 2-9038 de fecha 23 de marzo de 2022, a partir de la fecha de intervención de las obras de drenaje.

Secretaria de Infraestructura:

El Ingeniero Víctor Hernández, en su calidad de Ingeniero de Apoyo a la supervisión, manifiesta:

- La Entidad Contratante, manifiesta su preocupación con respecto a los avances de las actividades del contratista de obras, desde el punto de visto técnico, ambiental y SST; por lo cual, se debe implementar un plan de contingencia, no solo con el incremento de jornadas de trabajo, si no de cuadrillas en los frentes de trabajo, esto teniendo en cuenta que la longitud del proyecto posibilita aumentar los frentes de trabajo y mejoraría la ejecución física del proyecto.
- El Ing. Víctor Hernández, solicita al contratista de obras que se puedan adoptar compromisos que se cumplan en campo y que impacten positivamente en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden ir realizando y que no generan ninguna complicación para su ejecución.
- El Ing. Víctor Hernández, solicita al contratista de obras dar cumplimiento a cada una de las competencias del proyecto desde el punto de vista técnico, ambiental, social y de SST.

Contratista de Obras:

El Ingeniero Santiago Sánchez, en su calidad de Director de Obra, Manifiesta:

- El Ing. Santiago Sánchez, manifiesta que, se aumentaran las cuadrillas de trabajo, han tenido algunos inconvenientes internos, los cuales fueron sub sanados y que se aumentara el número de trabajadores en las cuadrillas de trabajos, aumentando a tres (3) cuadrillas, las cuales se distribuirán en dos jornadas, dos (2) en la jornada diurna y una (1) en la jornada nocturna en la construcción de la placa huella, todo esto para nivelar la ejecución de las actividades con la reprogramación de obras.
- El contratista de obras, solicita a la interventoría dar aprobación al cambio de plan de inversión del anticipo presentado el día 01 de agosto de 2023 y a las ordenes de

9781



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



Alcaldía de
MONTERÍA

operaciones N°28,29,30 y 31, esto con el fin de poder cubrir gastos administrativos asociados a la ejecución del proyecto.

- Se le informa a la interventoría que, se incrementara el rendimiento de las actividades del box culvert, interviniendo simultáneamente para lograr cumplir y culminar estas obras de drenaje.
- El Ing. Santiago Sánchez, Solicita acompañamiento de la interventoría para realizar un recorrido en campo para analizar e identificar las dificultades que presenta el contratista de obras en la ejecución de las actividades al igual de chequear las placa huella, viga riostra y bermas cuentas que se encuentran fisuradas para tomar los correctivos.
- El contratista de obras, manifiesta que realizara los respectivos correctivos con las instalaciones de las señalizaciones transitorias para garantizar la transpirabilidad de los vehículos que se movilizan sobre el proyecto.

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha compromiso
Entrega de planillas de afiliación	CONTRATISTA	14 de agosto de 2023
Entrega de Informes PGIO No 4 y 5	CONTRATISTA	16 de agosto de 2023
Entrega de Informes PGIO No 6 y 7	CONTRATISTA	18 de agosto de 2023
Entrega de Informes PGIO No 8	CONTRATISTA	23 de agosto de 2023
Entrega de Dotación del personal	CONTRATISTA	16 de agosto de 2023
Construcción de 1000 ml de placa huella Completa	CONTRATISTA	28 de agosto de 2023
Construcción de filtros	CONTRATISTA	17 de agosto de 2023
Construcción de puente	CONTRATISTA	21 de agosto de 2023
Finalización de los Box Culvert	CONTRATISTA	15 de septiembre de 2023
Correctivos de Obra (Losas fisuradas)	CONTRATISTA	21 de agosto de 2023

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 11 días del mes de agosto de 2023.

ASISTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
ING. VÍCTOR HERNÁNDEZ NOVOA	ENTIDAD	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
ING. JESÚS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	

9782



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°16
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 11 de agosto de 2023



MONTERÍA

ING. IVÁN ALVIZ GONZÁLEZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	<i>[Signature]</i>
ING. MARIO MONTERROZA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	ESPECIALISTA SST	<i>[Signature]</i>
ING. MARTÍN MARTÍNEZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	ESPECIALISTA AMBIENTAL	<i>[Signature]</i>
KIARA MAZA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	TRABAJADORA SOCIAL	<i>[Signature]</i> Kiara Maza P.
ING. SANTIAGO SÁNCHEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	DIRECTOR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
ING. JOVANA GONZÁLEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA SST	<i>[Signature]</i>
ING. MARGARITA MEJÍA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA DE VÍAS	<i>[Signature]</i>

Gobierno de La GENTE

Calle 47 No. 5 - 1a. y 2da. Paredes / Montería, Córdoba
tel: 312 400 1111 / www.monteria.gov.co

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

●

● **RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
GENERADA ENTRE CONTRATISTA DE
OBRA E INTERVENTOR**

●

●

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Formulario 004 / Versión 02 / Página 1 de 3

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:		CONSTRUCCION DE PLACA MUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAJO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL			
Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de envío		Observaciones
							Trámite	Fin	
DON-009-MONT-118-2022	2-ago-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud Implementación SST.			X
DON-009-MONT-120-2022	3-ago-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	CORRECTIVOS DE OBRA			X
DON-009-MONT-124-2022	9-ago-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.			X
DON-009-MONT-125-2022	16-ago-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	NOTIFICACION DE QUEJA DE MIEMBRO DE LA COMUNIDAD.			X
DON-009-MONT-127-2022	9-ago-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud de planillas de Afiliación del personal Administrativo y operativo			X
DON-009-MONT-128-2022	15-ago-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.			X
DON-009-MONT-131-2022	16-ago-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	CORRECTIVOS DE OBRA			X

9789

9785

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA		
Código consecutivo de documento	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	
DON-009-MONT-002-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales	
DON-009-MONT-003-2022	31-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio	
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoría	
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoría	
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Reiteración Entrega de Documentación Para Acta de Inicio	
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida	
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2	
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento	
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito	
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra	
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición. Solicitud Información Perfiles Disponibles	
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre Del 2022	
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoría	
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio	
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA	
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoría	
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio	
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001	
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio	
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoría	
DON-009-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio	

9286

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA		
Código consecutivo de	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado	
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	(Breve descripción del tema tratado en el oficio)	
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoria	
DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO	
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social	
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-004 HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA	
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022.	
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS.	
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA	
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA	
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO	
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSQ CONTRATADOS.	
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACION Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.	
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de Actividades	
DON-009-MONT-040-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio	
DON-009-MONT-041-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN VIAS	
DON-009-MONT-042-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO MAR-012-2022-011: SEGUIMIENTO MENSUAL PGIO 01	
					Ivan Alviz	AUSENCIA DE PERSONAL EN OBRA	

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
Código consecutivo de	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
DON-009-MONT-043-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRAS CONTRATISTA
DON-009-MONT-045-2022	1-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REQUERIMIENTO AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PGIO
DON-009-MONT-046-2022	1-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRAS CONTRATISTA
DON-009-MONT-047-2022	1-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE IMPLEMETACION SST
DON-009-MONT-048-2022	8-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRAS DEL CONTRATISTA
DON-009-MONT-049-2022	8-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A OFICIO MAR-012-2022-015: Seguimiento PGIO (Componente Ambiental)
DON-009-MONT-050-2022	10-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.
DON-009-MONT-050-2022	10-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES V2.
DON-009-MONT-051-2022	10-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE TRABAJOS LOS DIAS 12,13 Y 14 DE
DON-009-MONT-052-2022	11-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A OFICIO MAR-012-2022-013: Entrega documentos cartàtera y
DON-009-MONT-053-2022	17-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.
DON-009-MONT-054-2022	17-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A OFICIO: MAR-012-2022-020 – REVISIÓN Y APROBACION INFORME MENSUAL DE LA IMPLEMENTACION PGIO COMPONENTE AMBIENTAL
DON-009-MONT-055-2022	18-nov-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión de concepto estructural de interventoría.
DON-009-MONT-055-2022	18-nov-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión de concepto estructural de interventoría.
DON-009-MONT-056-2022	23-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud de Plan de Contingencia
DON-009-MONT-057-2022	24-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta a oficios MAR-012-2022-016 "Justificación y solicitud aprobación de obras no previstas" y MAR-012-2022-021 "Justificación y solicitud de aprobación de obras no contempladas-envío archivo digital con la información de la tubería de la red de acueducto a trasladar".

9700

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
Código consecutivo de	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado	
DON-009-MONT-058-2022	28-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Resposta a entrega de respuesta del oficio DON-009-MONT-057-2022 "Respuesta a oficios MAR-012-2022-016 "Justificación y solicitud aprobación de obras no previstas" y MAR-012-2022-021 "Justificación y solicitud de aprobación de obras no contempladas-envío archivo digital con la información de la tubería de la red de acueducto a trasladar"	
DON-009-MONT-059-2022	1-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Resposta a comunicado cuyo asunto es "P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 2022 - ORDEN REEMBOLSO N°1"	
DON-009-MONT-060-2022	2-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Resposta a oficio MAR-012-2022-013: Documentos cantera La Fortana y caracterización del material	
DON-009-MONT-061-2022	3-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Resposta a comunicado cuyo asunto es "15629 P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 2022 - ORDENES SDE OPERACIÓN"	
DON-009-MONT-062-2022	6-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones enviados por correo electrónico cuyo asunto es "15629 P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 2022 - ORDENES DE OPERACIONES"	
DON-009-MONT-063-2022	6-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de orden de operación N°1 por concepto de alquiler de maquinarias enviado por correo electrónico cuyo asunto es "15629 P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 202 - ORDENES DE OPERACIÓN"	
DON-009-MONT-064-2022	7-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Resposta oficio OFI: MAR-012-2022-022 - Revisión informe mensual de la implementación PGIO componente ambiental mes dos	
DON-009-MONT-065-2022	8-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Resposta oficio OFI: MAR-012-2022-024 cuyo asunto es : Respuesta al oficio DON-009-MONT-058-2022	
DON-009-MONT-066-2022	9-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Observaciones al proceso constructivo de relleno de material de terraplen y subbase	
DON-009-MONT-067-2022	9-dic-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remision de informe presunto incumplimiento al contrato de obra N° LP-SPM-012-2022	
DON-009-MONT-068-2022	9-dic-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Entrega de informe mensual de interventoria N°02	
DON-009-MONT-069-2022	9-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones enviados por correo electrónico cuyo asunto es "ORDEN DE OPERACIÓN"	
DON-009-MONT-070-2022	10-dic-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remision plan de calidad de interventoria	

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
Código consecutivo de	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado		
DON-009-MONT-071-2022	13-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones enviados por correo electrónico cuyo asunto es "ordenes de operaciones fiducia"		
DON-009-MONT-072-2022	13-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de orden de operación N°13 enviado por correo electrónico cuyo asunto es "ORDENES DE OPERACION FIDUCIA"		
DON-009-MONT-073-2022	16-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones N°15, 16 y 17 enviado por correo electrónico cuyo asunto es "RV: 15629 P.A. ANT CONSTRUCCIONES A.P. S.A.S 2022 - RECHAZO DE ORDEN"		
DON-009-MONT-074-2022	21-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación a los análisis de precios unitarios contractuales		
DON-009-MONT-085-202	23-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO CON EL ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE OBRA		
DON-009-MONT-086-2022	24-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPS CONTRATADOS.		
DON-009-MONT-087-2022	23-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL PROYECTO.		
DON-009-MONT-088-2022	24-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.		
DON-009-MONT-090-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.		
DON-009-MONT-091-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL PROYECTO.		
DON-009-MONT-092-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA		
DON-009-MONT-093-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO CON EL ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE OBRAS		
DON-009-MONT-094-2022	13-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION DE HOJA DE VIDA INGENIERA AMBIENTAL		
DON-009-MONT-095-2022	14-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.		
DON-009-MONT-096-2022	13-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPS CONTRATADOS.		
DON-009-MONT-098-2022	22-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE RELLENO DE MATERIAL DE TERRAPLEN Y SUB BASE		
DON-009-MONT-099-2022	4-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de actividades.		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
Código consecutivo de	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Persona que firma el documento	Cargo de persona destinataria	Asunto tratado	
DON-009-MONT-100-2022	5-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	Solicitud de plan de contingencia.	
DON-009-MONT-101-2022	8-may-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Ivan Alviz	Secretaría de Infraestructura Municipal	REMISION DE INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N° LP. SPM-012-2022.	
DON-009-MONT-102-2022	18-may-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Ivan Alviz	Secretaría de Infraestructura Municipal	Respuesta a Oficio C.E.SIM No.534-2023 cuyo asunto es Solicitud de Información.	
DON-009-MONT-103-2022	18-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	Correctivos de obra.	
DON-009-MONT-104-2022	18-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	
DON-009-MONT-105-2022	18-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	SOLICITUD DE FECHA DE REUNIÓN MENSUAL CON EL COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA.	
DON-009-MONT-106-2022	19-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
DON-009-MONT-107-2022	29-may-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Ivan Alviz	Secretaría de Infraestructura Municipal	REMISION DE ENTREGA DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRAS	
DON-009-MONT-108-2022	29-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	RESPUESTA A OFICIO MAR-012-2022-038 CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PRORROGA REQUERIMIENTO AMBIENTAL A LA	
DON-009-MONT-109-2022	30-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO PGIO – RESOLUCION PERMISO OCUPACION DE CAUCE N° 2-9038 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022	
DON-009-MONT-112-2022	7-jun-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO CON LA PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRAS.	
DON-009-MONT-113-2022	8-jun-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	SOLICITUD DE POLIZAS SEGUN PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRAS	
DON-009-MONT-114-2022	13-jun-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Ivan Alviz	Representante Legal	RESPUESTA A COMUNICADO MAR-012-2022-041 CUYO ASUNTO ES RESPUESTA A OFICIO DON-009-MONT-112-2022 DEL DIA 07/06/2023	
DON-009-MONT-116-2022	23-jun-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Ivan Alviz	Secretaría de Infraestructura Municipal	Entrega de informe mensual de interventoría N°06	

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.						
Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de			Observaciones	
							Inicio	Fin	Mes		
DON-009-MONT-001-2022	18-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Entrega Poliza de Cumplimiento				X	
DON-009-MONT-002-2022	19-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales				X	
DON-009-MONT-003-2022	31-ago-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio				X	
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoría				X	
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoría				X	
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Reiteración Entrega de Documentación Para Acta de Inicio				X	
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida				X	
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2				X	
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento				X	
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito				X	
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra				X	
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición, Solicitud Información Perfiles Disponibles				X	
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre De 2022				X	
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoría				X	
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio				X	
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoría				X	

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.				
Codigo consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de		Observaciones
							Impreso	Mail	
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001			x
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio			x
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoría			x
DON-008-MONT-022-2022									
DON-008-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio			x
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoría			x
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x
DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social			x
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-004 HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA			x
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022			x
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO			x
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS			x
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA			x
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA			x
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPS CONTRATADOS.			x

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.					
Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de			Observaciones	
							Telefono	Fax	Mail		
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO				x	
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION SOCIAL				x	
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrascos en la ejecución de Actividades				x	
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio				x	

9793

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
Código consecutivo de envío	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de envío		Observaciones
							Presencial	Fax	
DON-009-MONT-001-2022	18-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Aviz	Entrega Poliza de Cumplimiento			X
DON-009-MONT-002-2022	19-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales			X
DON-009-MONT-003-2022	31-ago-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio			X
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoría			X
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoría			X
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Referencia Entrega de Documentación Para Acta de Inicio			X
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida			X
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2			X
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento			X
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito			X
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra			X
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición. Solicitud Información Perfiles Disponibles			X
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre De 2022			X
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoría			X
DON-009-MONT-015-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			X
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoría			X
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			X
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001			X
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio			X
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoría			X
DON-009-MONT-022-2022									
DON-009-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Aviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio			X
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Aviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoría			X
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Aviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INICIO DE CONTRATO			X

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				Proyecto:		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.			
Codigo consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de		Observaciones
							correo	Fax	
DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social			x
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-COH HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO			x
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022.			x
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO			x
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS.			x
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATESTA DE OBRA			x
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENIENTOS			x
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAFSO CONTRATADOS.			x
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACION Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION SOCIAL			x
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de Actividades			x
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio			x

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA				Proyecto:		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado	Medio de			Observaciones
							correo	Fax	Mail	
OFE MAR-012-2022-001	16-sep-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	Experiencia de profesionales.			x	
OFE MAR-012-2022-002	22-ago-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	Experiencia de profesionales.			x	
OFE MAR-012-2022-004	6-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	HOJAS DE VIDA PROPUESTO			x	
OFE MAR-012-2022-005	10-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	RESPUESTA AL OFICIO DON-009-MONT-027-2022			x	
OFE MAR-012-2022-006	10-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	RESPUESTA COMUNICADO RECHAZO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN VIAS			x	
OFE MAR-012-2022-008	21-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	DOCUMENTOS ACTA DE INICIO			x	

BITÁCORA

Maricunga, 1 de agosto de 2023, martes.
 Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Presidente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) Carretero; (1) Almacenero; (1) Operadores de maquinaria; (1) Contratistas de fuerza de trabajo; (1) Operarios varios; (1) Maestro de obra; (1) Oficial civil; (1) Ayudantes civiles.


Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Presidente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topógrafo; (1) Carretero; (1) Carretero;

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activa); (1) Vibro compactador (Activa); (1) Minicargador (Activa); (1) Retroexcavadora plegable (Activa); (1) Excavadora (Activa); (1) Camión (Inactiva); (1) Camión Puma (Activa); (1) Volquetes (Activa).

Actividades Realizadas:

- El contratista de obra realizó excavación de viga maestra e instalación de rieles y excavación de trazo entre las abisnas K21-00 y K21-01, y entre K21-01 y K21-02, en canal derecho.
- El contratista de obra realizó adecuación de la vía de acceso para el tránsito constante de maquinaria y de la comunidad.
- El contratista de obra realizó mezcla de subbase granular en sitio de acceso de maquinaria.
- Se le entregó al contratista de obra, según los rendimientos y dar cumplimiento al PPS, PNT y PGO correspondientes.




 Director de obra

Marranga, 2 de agosto de 2023, Miércoles.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratado de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspectores de obra; (1) profesional SST; (1) Trabajador Social; (1) Auxiliar SST; (1) Almacenera; (1) Topógrafo; (1) cadenera; (1) operadores de maquinaria; (3) oficiales vareros; (1) Maestro de obra; (1) oficial civil; (12) ayudantes civiles.


Personal interventores: (1) Residente de subcontratación; (1) inspectores de subcontratación; (1) Topógrafo; (1) cadenera; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (A); (1) Vibracompactor (A); (1) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora - pagadora (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) Camión (Inactivo); (1) Camión tanque (Activo); (2) Volquetes (Activo).

Actividades Realizadas:

- El contratista de obra realizó puentes y armado de acero de refuerzo, entre las abscisas K2+540 y K2+570, en canal derecho.
- El contratista de obra realizó adiciones de elos de los baseculvert N°3, ubicada en la abscisa K2+240.
- El contratista de obra realizó selección de piedra rega para concreto de resistencia de compresión a los 28 días de 2000 psi.
- El contratista de obra realizó suelta de subbase granular en área de acopio de materiales.




Residente de obra

Mamaya, 3 de agosto de 2023, jueves
Estado del clima: Solado.

Personal constructiva de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) Cadenera; (6) operarios de maquinaria; (9) oficiales varos; (1) maestro de obra; (1) oficial civil; (15) ayudantes civiles.


Personal Interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenera; (1) conductor

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activa); (1) Retrocompactador (Activa); (1) minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora pajaeta (Activa); (1) Excavadora (Activa); (1) camión (Inactiva); (1) camión tanque (Activo); (1) volquetes (Activo).

Actividades Realizadas:

- El contratista de obra realizó figura y armado de acero de refuerzo para baseculvert N°1, ubicada en la abscisa K+220.
- El contratista de obra realizó aducción de diseño para baseculvert N°3, ubicada en la abscisa K+220.
- El contratista de obra realizó figura y armado de acero de refuerzo para pilas de concreto reforzado, viga riostra y balsa unida, entre las abscisas K+220 y K+240, en canal derecho.




Residente de obra

Marcayo, 4 de agosto de 2023, viernes.
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) especialista en vías; (1) profesor SST; (1) Trabajadora Social; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) Cadenero; (1) Almacenero; (1) Operadores de maquinaria; (1) Controladores de tránsito; (1) Oficiales varios; (1) Maestros de obra; (1) Oficial civil; (15) Ayudantes civiles.


Personal intercontratista: (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Topógrafo; (1) Cadenero; (1) Conductor.

maquinaria y equipo: (1) Motoniveladora (inactiva); (1) vibracompactor (inactivo); (1) Betonera (inactiva); (1) Pajero (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) Camión cargador (Activo); (1) Camión (inactivo); (1) Carro tanque (Activo); (2) volquetes (Activo).

Actividades Realizadas:

- el contratista de obra realizó un recorrido de obra en acompañamiento de la intercontratista para determinar puntos críticos y actividades sin ejecutar.
- el contratista de obra realizó firma de y acumulación de obra de repuesto para boxculeros N°3, ubicada en la obra kit 240.
- el contratista de obra realizó recolección y selección de pedras ripio para su utilización en concreto ciclopico para placa base.




Residente de obra

Marcenay, 5 de agosto de 2023, sábado.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (4) Presidente de obra; (1) Inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) albañilería; (4) operarios de maquinaria; (3) operarios; (4) controladores viales; (1) maestro de obra; (1) oficial civil; (15) ayudantes civiles.


Personal contratista e interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Presidente de interventoria; (1) Inspector de subcontratos; (1) profesional SST; (1) Trabajador social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipo: (1) Motoniveladora (Inactiva); (1) volvo compactador (Inactiva); (1) minicargador (Activa); (1) Retroexcavadora preparata (Activa); (1) excavadora (Activa); (1) camión (Activa); (1) camión tanque (Activa); (1) volquete (Activa).

Actividades Realizadas:

- El contratista de obra realizó instalación de rieles, excavación de viga maestra y fijación y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzada, viga maestra y bodega cuneta, entre las abscisas K2+110 y K2+140, y entre K2+500 y K2+540, en canal derecho.
- El contratista de obra fundió losa superior de bocatombos N°1, ubicada en la abscisa K2+30.
- El contratista de obra realizó fundición del placas de cuneta reforzada viga maestra y bodega cuneta, entre las abscisas K2+110 y K2+140; y entre K2+500 y K2+540, en canal derecho.




Presidente de obra
