

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 1 de 25

INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 3 DE INTERVENTORÍA

DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

VERSIÓN 0.0



CONTRATO FDLUSA-CIN-477-2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.

Bogotá D.C., abril de 2026

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 2 de 25

CONTRATO No.		FDLUSA-CIN-477-2025	FECHA	Abril de 2026
TÍTULO DEL DOCUMENTO		Informe mensual técnico de interventoría No. 3		
EDICIÓN No	FECHA	DESCRIPCIÓN		
0	17/04/2026	Emitido para revisión		
CONTROL INTERNO				
ELABORÓ Y REVISÓ		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MÓNICA GUERRA	16/04/2026
				

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C</p>	
<p>FDLUSA-CIN-477-2025</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.0 Página 3 de 25</p>

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. GENERALIDADES	6
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	6
2.1.1 LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
2.2. FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES FASES, PRÓRROGAS, SUSENSIONES Y ADICIONES.	8
2.2.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	8
2.2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9
2.3 DIRECTORIO TELEFONICO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y DE LOS DELEGADOS DE LAS ESP A SOCIADOS AL PROYECTO	10
2.3.1 DIRECTORIO TELEFONICO CONTRATISTA.....	10
2.3.2 DIRECTORIO TELEFONICO PERSONAL DE INTERVENTORIA.....	11
3 INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA.....	11
3.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA	11
3.1.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA	11
3.2 CUADRO DE CONTROL LEGAL	12
3.2.1 CUADRO DE CONTROL LEGAL CONTRATO DE OBRA	12
3.2.2 CUADRO DE CONTROL LEGAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	12
3.3 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONVENIOS ASOCIADOS.....	13
3.3.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO DE OBRA...13	
3.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE CONVENIOS ASOCIADOS.....	14
3.4.1 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.....	14
3.4.2 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	15
4 INFORMACION TECNICA	16
4.1 CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL CON ANALISIS A LA FECHA DE CORTE	16
4.2 AVANCE DEL CONTRATO	16
4.2.1 SEMANAL No. 2 DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2025	16
4.2.2 SEMANAL No. 3 DEL 03 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2025	16
4.2.3 SEMANAL No. 4 DEL 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2025	17
4.2.4 SEMANAL No. 5 DEL 17 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2025	17

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 4 de 25

4.2.5	SEMANAL No. 6 DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2025.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3	PLAN DE CONTINGENCIA.....	17
4.4	MEDIDAS CORRECTIVAS	17
4.5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR LA INTERVENTORIA.....	18
4.6	AVANCE FISICO	22
4.7	AVANCE FISICO Y FINANCIERO POR ELEMENTO	22
4.8	CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD	22
4.9	CRONOGRAMA	¡Error! Marcador no definido.
4.10	BITACORA DE OBRA.....	22
4.11	ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO (COMITES Y REUNIONES)	22
4.11.1	INFORMES SEMANALES	22
4.11.2	ACTAS DE COMITES DE OBRA	23
4.11.3	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	23
4.12	CUADRO DE CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS	23
5	INFORMACION SOCIAL.....	24
6	INFORMACION AMBIENTAL Y SST	24
7	CONCLUSIONES	24
8	RECOMENDACIONES.....	25

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Parques priorizados	7
Tabla 2. Información Contrato de obra.....	8
Tabla 3. Información Contrato de Interventoría	9
Tabla 4. Directorio del contratista de obra	10
Tabla 5. Directorio Telefónico contrato de interventoría 1759 de 2024.....	11
Tabla 6. Garantía cumplimiento a favor de entidades estatales interventoría.....	12
Tabla 7. Cuadro de control legal contrato de obra	12
Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de interventoría.....	13

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 5 de 25

Tabla 9. Apremios y llamados de atención realizadas al contratista.....	13
Tabla 10. Valores del contrato de obra	14
Tabla 11. Actas parciales de consultoría	14
Tabla 12. CDPs vigentes para el contrato de obra.....	15
Tabla 13. Valores del contrato de interventoría.....	15
Tabla 14. Valores del contrato de interventoría.....	15
Tabla 15. CDPs vigentes para el contrato de interventoría	15
Tabla 16. Apremios y llamados de atención realizadas al contratista	17
Tabla 17. Actividades semana del 01 al 28 de febrero de 2026	18
Tabla 18. Relación informes semanales	23
Tabla 19. Relación comités de obra.....	23

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto	7
Ilustración 2. Ciclo de vida del proyecto	9

LISTADO DE ANEXOS

- ANEXO 1.** Informes semanales.
- ANEXO 2.** Actas de comité.
- ANEXO 3.** Correspondencia enviada.
- ANEXO 4.** Correspondencia recibida.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C</p>	
<p>FDLUSA-CIN-477-2025</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA</p>	<p>V.0 Página 6 de 25</p>

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relacionan las actividades realizadas en el desarrollo del Contrato FDLUSA-CIN-477-2025 durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026, tercer mes de ejecución del contrato de interventoría suscrito entre SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN - FDLUSA cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.**

Así mismo, en el presente informe se detalla el seguimiento realizado por la interventoría al contrato de obra **FDLUSA-CTO-459-2025** cuyo objeto es **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.**

A continuación, se describen los procedimientos y acciones a realizarse para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en los componentes técnico, administrativo, financiero, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar la calidad de las obras, el servicio y seguridad de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las normas técnicas, ambientales y de seguridad industrial de la Empresa y la Legislación vigente.

Para el desarrollo de este informe se incluyen todas las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el presente periodo siguiendo todas las especificaciones exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.

El presente contrato se encuentra supervisado por el ingeniero Daniel Hernando Ortiz Quintero.

2. GENERALIDADES

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El siguiente proyecto comprende la ejecución de los trabajos necesarios conforme al Anexo Técnico y los apéndices, Estudios y Documentos Previos, la Minuta del contrato y demás documentos contractuales.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 7 de 25

El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo la intervención de los parques de proximidad (antes catalogados como vecinales y de bolsillo) por la firma CONTRECOL S.A.S. ubicados en la localidad de Usaquén, se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Subdirección Técnica de Construcción del IDRD, especificaciones con las cuales fueron construidos los parques.

Así mismo se realizará el mantenimiento para la sostenibilidad de la estructura física de los parques presentes en la localidad, estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo con el manual de especificaciones técnicas del área técnica de la subdirección de construcciones y el "MANUAL DE SEÑALES PARA PARQUES" del IDRD.

2.1.1 LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA

Los parques a intervenir se encuentran ubicados en la localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá:

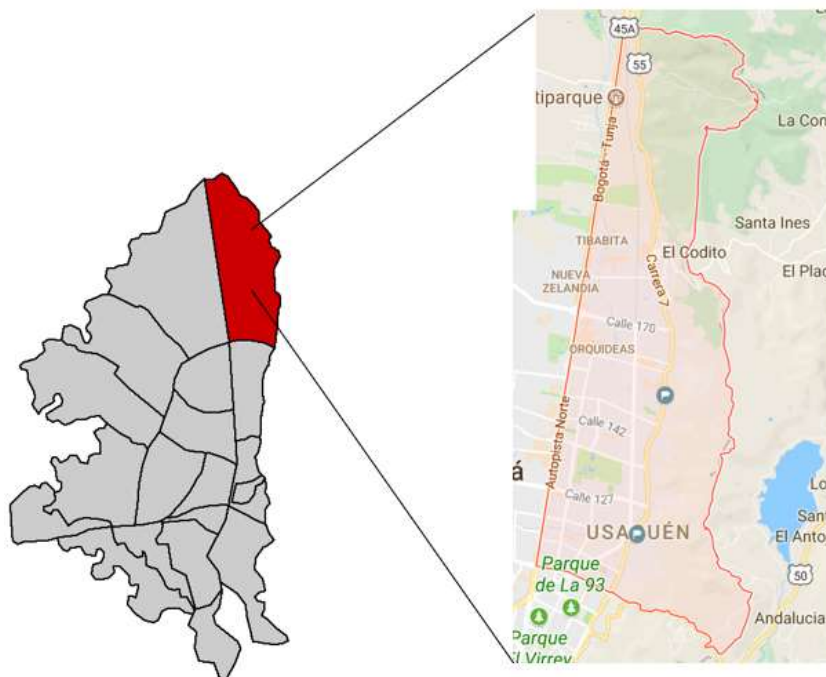


Ilustración 1. Localización del proyecto

El listado de parques a intervenir, producto del prediagnóstico realizado por el Fondo De Desarrollo Local de Usaquén es el siguiente:

Tabla 1. Parques priorizados

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 8 de 25

No.	CÓDIGO	PARQUE	BARRIO	DIRECCIÓN
1	01-006	UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR	LAS MARGARITAS	Calle 148 con carrera 17
2	01-061	URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR	SAN PATRICIO	Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18
3	01-063	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL CONSUELO	EL CONSUELO	Entre Calles 155B Bis y 155A y Carreras 8 Bis y 8
4	01-094	DESARROLLO BELLAVISTA	BELLAVISTA	Entre Carreras 4A y 4A Bis y Calles 192A y 192B
5	01-186	URBANIZACIÓN MAGDALA MZ 77	MAGDALA	Calle 153 con Carrera 21B
6	01-372	URBANIZACIÓN CODABAS	SAN ANTONIO	Entre Calles 180 y 181A y Transversal 7D
7	01-200	VILLA MAGDALA	VILLAS DEL MEDITERRANEO	Calle 159 con Avenida carrera 19
8	01-137	URBANIZACIÓN NUEVO COUNTRY I SECTOR	NUEVO COUNTRY	Entre calles 135b y 135 y Carreras 12 b y 12 c
9	01-220	PARQUE ALTA BLANCA	BARRANCAS	Calle 157 b carrera 7 d bis

2.2. FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES FASES, PRÓRROGAS, SUSPENSIIONES Y ADICIONES.

2.2.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla, se relaciona la información contractual del Contrato de obra FDLUSA-CTO-459-2025.

Tabla 2. Información Contrato de obra

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
No. PROCESO LICITATORIO	FDLUSA-LP-003-2025
No. CONTRATO DE OBRA	1736 DE 2024
MODALIDAD	CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
CONTRATISTA	CONTRECOL S.A.S.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 9 de 25

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA GERALDINE CONTRERAS CABALLERO
NIT	901649389-4
VALOR INICIAL	\$ 330.180.197
ADICION No 1	\$ 161.788.296,53
VALOR TOTAL	\$ 491.968.493,53
PLAZO INICIAL	5 meses
FECHA DE INICIO	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 de agosto de 2026
PRÓRROGA No. 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO FINAL	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	14 DE AGOSTO DE 2026

FUENTE: Elaboración propia

A continuación, un esquema que contiene el ciclo de vida del proyecto de obra, con sus etapas:



Ilustración 2. Ciclo de vida del proyecto

2.2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la siguiente tabla, se relaciona la información contractual del Contrato de Interventoría FDLUSA-CIN-477-2025.

Tabla 3. Información Contrato de Interventoría

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
No. PROCESO LICITATORIO	FDLUSA-CMA-001-2025
No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FDLUSA-CIN-477-2025
MODALIDAD	CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 10 de 25

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
CONTRATISTA	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO BARRETO ESQUIVEL
NIT	900389180-2
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 222.160.041
ADICIÓN No. 1	\$ 108.020.156
VALOR ACTUALIZADO	\$ 330.180.197
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO ETAPA 2 - OBRA	CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE MAYO DE 2026
PRÓRROGA No. 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	14 DE AGOSTO DE 2026

FUENTE: Elaboración propia

2.3 DIRECTORIO TELEFONICO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y DE LOS DELEGADOS DE LAS ESP A SOCIADOS AL PROYECTO

2.3.1 DIRECTORIO TELEFONICO CONTRATISTA

A continuación, se presenta el directorio telefónico del CONSORCIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 003 de los profesionales principales del contrato:

Tabla 4. Directorio del contratista de obra

CARGO	NOMBRE	CONTACTO
Director de obra	Luis Ernesto Otálora Urriago	3209996433 contrecols@gmail.com
Residente de obra	Carlos Andrés Salamanca Sarmiento	
Especialista en urbanismo o diseño urbano	Sara Daniela Loterstein Botero	
Profesional SST	Maryluz Morales Acevedo	

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 11 de 25

CARGO	NOMBRE	CONTACTO
Profesional ambiental	Diana Marcela Niño Santamaria	
Profesional social	María Angelica Pérez Coba	
Inspector de obra	Mateo Alexander Velandia Gama	
Profesional forestal	Daniel García Forero	
Profesional de tránsito y transporte	Natalia Paola Duque Gómez	
Profesional Gerente de Proyectos	Enrique Luis Monroy	

FUENTE: Elaboración propia

2.3.2 DIRECTORIO TELEFONICO PERSONAL DE INTERVENTORIA

A continuación, se presenta el directorio telefónico del CONSORCIO TESLA de los profesionales principales del contrato:

Tabla 5. Directorio Telefónico contrato de interventoría 1759 de 2024

PERSONAL	NOMBRE	No. CONTACTO
Director de interventoría	Mónica Jimena Guerra Vergara	601 811 7212 <i>interventoriausaquen477@gmail.com</i>
Especialista en Urbanismo	Edgar Alirio Gómez	
Residente ambiental	Ana Milena Rodríguez	
Inspector de obra	Esteban Valencia Echeverri	
Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ivonne Milena Guerra Vergara	
Profesional en Gestión Social	María del Carmen Vergara Guevara	
Residente de obra	Jose Edison Forigua Orjuela	

FUENTE: Elaboración propia

3 INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Los contratos de obra e interventoría se encuentran amparados con las pólizas que se describen a continuación.

3.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA

3.1.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA

A día de la realización de este documento las pólizas se encuentran en revisión y no han sido aprobadas por la interventoría y la alcaldía.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 12 de 25

Tabla 6. Garantía cumplimiento a favor de entidades estatales interventoría

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA No.	AMPARO	CAUSA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-44-101111229 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ANEXO CAUSA PRIMA	17/12/2025	21/09/2026	\$ 66.036.040,60
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES		17/12/2025	21/05/2029	\$ 16.509.010,15
		CALIDAD DEL SERVICIO		17/12/2025	03/05/2031	\$ 99.054.060,90
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-44-101111229 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ANEXO DE PORROGA	17/12/2025	06/12/2026	\$ 66.036.040,60
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES		17/12/2025	06/08/2029	\$ 16.509.010,15
		CALIDAD DEL SERVICIO		17/12/2025	18/07/2031	\$ 99.054.060,90

FUENTE: Elaboración propia

3.2 CUADRO DE CONTROL LEGAL

3.2.1 CUADRO DE CONTROL LEGAL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se presenta la relación de las actas legales suscritas por el contratista a la fecha de corte del periodo del presente contrato:

Tabla 7. Cuadro de control legal contrato de obra

ACTA No.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PERIODO
1	Acta de inicio	30/12/2025	Acta de inicio

FUENTE: Elaboración propia

A la fecha de corte del presente informe, se han suscrito un acta correspondiente al acta de inicio

Las actas suscritas a la fecha de corte se adjuntan en el **ANEXO No. 2**.

3.2.2 CUADRO DE CONTROL LEGAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En la siguiente tabla se presenta la relación de las actas legales suscritas por la interventoría a la fecha de corte del periodo del presente contrato:

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 13 de 25

Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de interventoría

ACTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PERIODO
1	Acta de inicio	30/12/2025	Acta de inicio

FUENTE: Elaboración propia

A la fecha de corte del presente informe, se ha suscrito un acta correspondiente al acta de inicio.

Las actas suscritas a la fecha de corte se adjuntan en el **ANEXO No. 4**.

3.3 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONVENIOS ASOCIADOS

3.3.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO DE OBRA

La siguiente tabla detalla todas las comunicaciones enviadas al contratista durante el periodo del presente informe, relacionando los llamados de atención y apremios.

Tabla 9. Apremios y llamados de atención realizadas al contratista

ID	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA CONTRATISTA	ESTADO
1	SPLI-USA-477-0117	09/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES SEMANALES No. 5, No.6 y No.7 DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-082	CERRADO. SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
2	SPLI-USA-477-0118	09/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DEL INFORME MENSUAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-090	ABIERTO. A LA FECHA DE CORTE ESTA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO APROBADA EN SU TOTALIDAD.
3	SPLI-USA-477-0125	10/03/2026	APREMIO No. 2 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DEL INFORME MENSUAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.		
4	SPLI-USA-477-0123	10/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DETALLADO DE LOS NUEVES (9) PARQUES DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-083	CERRADO. SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 14 de 25

5	SPLI-USA-477-0124	10/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN APROBADA PLANTILLA MÍNIMA DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-091	CERRADO. SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
---	-------------------	------------	---	---------------	---

FUENTE: Elaboración propia

3.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE CONVENIOS ASOCIADOS

3.4.1 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

El contrato se acabará cuando se agote el valor presupuestado y/o cuando finalice el plazo estimado, siendo este ultimo de CINCO (5) meses, contado a partir de la firma del acta de inicio.

El presupuesto oficial se estima en MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREcientos TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.676.337.178)

En donde se realizará el pago al contratista de la siguiente manera:

- Con pagos mensuales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible
- El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte de la FDLUSA y el contratista

Tabla 10. Valores del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA				
CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	AVANCE FINANCIERO
FASE DE CONSTRUCCION	\$ 1.508.703.460,22	\$ 0	\$ 0	0%
TERMINADO EL CONTRATO	\$ 167.633.717,8	\$0	\$ 0	0 %
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 1.676.337.178	\$ 0	\$ 0	

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 11. Actas parciales de consultoría

ACTA				RECIBO PARCIAL	GARANTÍA ADICIONAL	VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Retenido	
TOTAL						

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 15 de 25

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 12. CDPs vigentes para el contrato de obra

CDP/VIGENCIAS FUTURAS	FECHA REGISTRO	VALOR (COP)
1631	No se ha iniciado	\$ 0
1877	No se ha iniciado	\$ 0
PRESUPUESTAL CDP	FECHA REGISTRO	VALOR
1755	No ha iniciado	\$ 222.160.041

FUENTE: Elaboración propia

3.4.2 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La forma de pago para el contrato de interventoría comprende dos tipos de remuneraciones las cuales se pagará el noventa (90%) por ciento en actas mensuales de actividades ejecutadas, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y presentación de la factura de cobro correctamente elaborada y el diez (10%) por ciento restantes, previa a la suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte de la FDLUSA.

Tabla 13. Valores del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	AVANCE FINANCIERO
VALOR ETAPA 1	\$ 199.944.036	\$ 40.548.445		12.28%
VALOR ETAPA 2	\$ 22.216.004	\$ 0		0.00 %
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 222.160.041	\$ 40.548.445		12.28%

FUENTE: Elaboración propia

Durante el mes del presente informe, no se suscribió acta de pago de interventoría.

Tabla 14. Valores del contrato de interventoría

CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	ACTA No	PERIODO	VALOR TOTAL	VALOR FACTURADO ACUMULADO
VALOR TOTAL	\$ 222.160.041	-		-	-
VALOR TOTAL	\$ 222.160.041				

FUENTE: Elaboración propia

A continuación, se presentan los datos principales de los CDPs vigentes del contrato de interventoría:

Tabla 15. CDPs vigentes para el contrato de interventoría

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 16 de 25

CDP/VIGENCIAS FUTURAS	FECHA REGISTRO	VALOR (COP)
1631	No se ha iniciado	\$ 0
1877	No se ha iniciado	\$ 0
PRESUPUESTAL CDP	FECHA REGISTRO	VALOR
1755	No ha iniciado	\$ 222.160.041

FUENTE: Elaboración propia

4 INFORMACION TECNICA

4.1 CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL CON ANALISIS A LA FECHA DE CORTE

Se iniciaron actividades de obra el día 17 de marzo de 2026.

4.2 AVANCE DEL CONTRATO

Dado que el día de 19 de enero se terminó en plazo la etapa de diagnóstico, a la fecha el contratista ya debería encontrarse ejecutando trabajos de la etapa 2. En cuanto al plazo del contrato, se tiene que ya se ha consumido el 40,35% del tiempo contractual, sin dar por cerrada la etapa de diagnóstico hasta el 17 de marzo que inicia la etapa de ejecución de obra.

4.2.1 SEMANAL No. 7 DEL 03 DE MARZO AL 09 DE MARZO DEL 2026

No se ha iniciado con esta etapa debido a que el contratista a la fecha no ha radicado el documento de diagnóstico completo, a su vez se manifiesta que el contratista debió radicar el pasado 20 de enero dicho documento en cumplimiento con la parte contractual que da como plazo 20 días después de la firma del acta de inicio que fue el pasado 30 de diciembre del 2025.

el contratista no ha remitido de forma oportuna y completa la documentación de documentos de ingreso personal profesional aprobado subsanado, topografía, informe mensual no. 2, informe semanal no. 5, 6 y 7, diagnóstico de los nueve (9) parques. asimismo, a la fecha no existe una programación aprobada para realizar el correcto seguimiento al contrato y sus actividades, razón por la cual no se presentan porcentajes programado y ejecutado del contrato de obra.

4.2.2 SEMANAL No. 8 DEL 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO DEL 2026

No se ha iniciado con esta etapa debido a que el contratista a la fecha no ha radicado el documento de diagnóstico completo, a su vez se manifiesta que el contratista debió radicar el pasado 20 de enero dicho documento en cumplimiento con la parte contractual que da como plazo 20 días después de la firma del acta de inicio que fue el pasado 30 de diciembre del 2025.

El contratista a la fecha no existe una programación aprobada para realizar el correcto seguimiento al contrato y sus actividades, razón por la cual no se presentan porcentajes programado y ejecutado del contrato de obra, se encuentra pendiente la radicación y aprobación del pin ambiental.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 17 de 25

4.2.3 SEMANAL No. 9 DEL 17 DE MARZO AL 23 DE MARZO DEL 2026

No se ha iniciado con esta etapa debido a que el contratista a la fecha no ha radicado el documento de diagnóstico completo, a su vez se manifiesta que el contratista debió radicar el pasado 20 de enero dicho documento en cumplimiento con la parte contractual que da como plazo 20 días después de la firma del acta de inicio que fue el pasado 30 de diciembre del 2025.

El contratista a la fecha presenta un atraso del 1,935% en el seguimiento al contrato y sus actividades, se encuentra pendiente la radicación y aprobación del pin ambiental en apoyo de la supervisión

4.2.4 SEMANAL No. 10 DEL 24 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026

No se ha iniciado con esta etapa debido a que el contratista a la fecha no ha radicado el documento de diagnóstico completo, a su vez se manifiesta que el contratista debió radicar el pasado 20 de enero dicho documento en cumplimiento con la parte contractual que da como plazo 20 días después de la firma del acta de inicio que fue el pasado 30 de diciembre del 2025.

El contratista a la fecha presenta un atraso del % en el seguimiento al contrato y sus actividades, se encuentra pendiente la radicación y aprobación del pin ambiental en apoyo de la profesional piga de la supervisión.

4.3 PLAN DE CONTINGENCIA

A la fecha de corte del presente informe, no ha sido necesario requerir al contratista un plan de contingencia con respecto a su programación de actividades.

4.4 MEDIDAS CORRECTIVAS

La siguiente tabla detalla todas las comunicaciones enviadas al contratista durante el periodo del presente informe, relacionando los llamados de atención y apremios.

Tabla 16. Apremios y llamados de atención realizadas al contratista

ID	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	RESPUESTA CONTRATISTA	ESTADO
1	SPLI-USA-477-0117	09/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES SEMANALES No. 5, No.6 y No.7 DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-082 OF-CS-USQ-090	CERRADO. SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS ABIERTO. A LA FECHA DE CORTE ESTA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO
2	SPLI-USA-477-0118	09/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DEL INFORME		

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 18 de 25

			MENSUAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.		APROBADA EN SU TOTALIDAD.
3	SPLI-USA-477-0125	10/03/2026	APREMIO No. 2 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DEL INFORME MENSUAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-061	ABIERTO. A LA FECHA DE CORTE CON OBSERVACIONES
4	SPLI-USA-477-0123	10/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DETALLADO DE LOS NUEVES (9) PARQUES DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-083	CERRADO. SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
5	SPLI-USA-477-0124	10/03/2026	APREMIO No. 1 POR LA NO REMISIÓN COMPLETA Y OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN APROBADA PLANTILLA MÍNIMA DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA-CTO-459-2025.	OF-CS-USQ-091	CERRADO. SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

FUENTE: Elaboración propia

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR LA INTERVENTORIA

En las siguientes tablas se describe semana a semana las actividades realizadas por la interventoría.

Tabla 17. Actividades semana del 01 al 31 de marzo de 2026

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO
OF-CS-USQ-074	1/03/2026	CONTRATIST A	REMISIÓN DE HOJA DE VIDA - PROFESIONAL SST	RESP. SPLI-USA-477-0108
OF-CS-USQ-075	2/03/2026	CONTRATIST A	REMISIÓN DOCUMENTOS TRÁMITE PIN - SDA	REMISIÓN PROFESIONAL PIGA DE ENTIDAD MEDIANTE CORREO
OF-CS-USQ-076	3/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA OFICIO SPLI-USA-477-0094 – OBSERVACIONES PLAN DE GERENCIA V2	RESP. SPLI-USA-477-0109
OF-CS-USQ-077	3/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OBSERVACIONES – RADICADO SPLI-USA-477-0102– PRESUPUESTOS FINALES VERSIÓN 4	RESP. SPLI-USA-477-0112
OF-CS-USQ-078	3/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OBSERVACIONES – RADICADO SPLI-USA-477-	RESP. SPLI-USA-477-0111

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 19 de 25

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO
			0102- DIAGNOSTICO FINAL VERSIÓN 7	
OF-CS-USQ-079	3/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OBSERVACIONES – RADICADO SPLI-USA-477-0102– TOPOGRAFIA FINAL VERSIÓN 5	
OF-CS-USQ-080	3/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0096 - documentos personal contractual - concepto a los documentos de ingreso de personal plantilla minima.	RESP. SPLI-USA-477-0116
OF-CS-USQ-081	6/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OBSERVACIONES – RADICADO SPLI-USA-477-0112– PRESUPUESTOS FINALES VERSIÓN 5	RESP. SPLI-USA-477-0119
OF-CS-USQ-082	10/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OFICIO SPLI-USA-477-0117 – Remisión Informes Semanales	RESP. SPLI-USA-477-0120
OF-CS-USQ-083	10/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OFICIO SPLI-USA-477-0119– PRESUPUESTOS FINALES VERSIÓN 13	RESP. SPLI-USA-477-0129
OF-CS-USQ-084	10/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OFICIO SPLI-USA-477-0115 – TOPOGRAFÍA FINAL V7	RESP. SPLI-USA-477-0143
OF-CS-USQ-085	10/03/2026	CONTRATIST A	REMISIÓN INFORME FORESTAL – PARQUES NO. 1 Y NO. 2	RESP. SPLI-USA-477-0131
OF-CS-USQ-086	11/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0101 – Informe Mensual No. 1	RESP. SPLI-USA-477-0166
OF-CS-USQ-087	11/03/2026	CONTRATIST A	Remisión de documentación – Profesional Forestal	RESP. SPLI-USA-477-0137
OF-CS-USQ-088	11/03/2026	CONTRATIST A	Remisión de hoja de vida – Inspector de obra	RESP. SPLI-USA-477-0130
OF-CS-USQ-089	12/03/2026	CONTRATIST A	REMISIÓN INFORME INVENTARIO SUMIDEROS – PARQUES NO. 1 Y NO. 2	RESP. SPLI-USA-477-0131
OF-CS-USQ-090	12/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta a oficios SPLI-USA-477-0118 y SPLI-USA-477-0125 – Informe Mensual No. 2	RESP. SPLI-USA-477-0133 RESP. SPLI-USA-477-0171
OF-CS-USQ-091	12/03/2026	CONTRATIST A	Presentación de personal de mano de obra no calificada	RESP. SPLI-USA-477-0134

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 20 de 25

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO
OF-CS-USQ-092	13/03/2026	CONTRATIST A	RESPUESTA A OFICIO SPLI-USA-477-0129– PRESUPUESTOS FINALES VERSIÓN 14	RESP. SPLI-USA-477-0143
OF-CS-USQ-093	13/03/2026	CONTRATIST A	REMISIÓN TOPOGRAFÍA AJUSTADA – OBSERVACIONES COMITÉ 11 DE MARZO	
OF-CS-USQ-094	14/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0116 - documentos personal contractual - concepto a los documentos de ingreso de personal plantilla minima.	RESP. SPLI-USA-477-0138
OF-CS-USQ-095	14/03/2026	CONTRATIST A	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 8 – CONTRATO DE OBRA NO. FDLUSA-CTO-459-2025	
OF-CS-USQ-096	16/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0134 – Documentos personal mano de obra no calificada	RESP. SPLI-USA-477-0135
OF-CS-USQ-097	16/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta a comunicado SPLI-USA-477-0130 – Observaciones hoja de vida Inspector de Obra	RESP. SPLI-USA-477-0142
OF-CS-USQ-098	17/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0135 - presentación de mano de obra no calificada y documentos de ingreso de personal.	RESP. SPLI-USA-477-0145
OF-CS-USQ-100	19/03/2026	CONTRATIST A	Respuesta al oficio SPLI-USA-477-0137 – Observaciones documentos personal especialista forestal	RESP. SPLI-USA-477-0144
OF-CS-USQ-101	19/03/2026	CONTRATIST A	Remisión de documentación SST – Personal Mariluz Morales Acevedo	RESP. SPLI-USA-477-0144
OF-CS-USQ-102	20/03/2026	CONTRATIST A	Presentación personal mano de Obra no calificada	RESP. SPLI-USA-477-0146
OF-CS-USQ-103	20/03/2026	CONTRATIST A	Presentación de trabajador Jose Miguel granados, mano de obra no calificada para aprobación	RESP. SPLI-USA-477-0147
OF-CS-USQ-104	21/03/2026	CONTRATIST A	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 9 – CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA- CTO-459-2025	

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 21 de 25

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO POR	ASUNTO	RESPUESTA AL OFICIO
OF-CS-USQ-105	24/03/2026	CONTRATISTA A	Solicitud de definición y/o suministro de formatos para presentación de cuentas de cobro	RESP. SPLI-USA-477-0153
OF-CS-USQ-106	25/03/2026	CONTRATISTA A	Respuesta a la comunicación SPLI-USA-477-0147, Mano de obra no calificada, documentos de ingreso de personal de obra – Contrato de Obra No. FDLUSA-CTO-459-2025.	RESP. SPLI-USA-477-0156
OF-CS-USQ-107	25/03/2026	CONTRATISTA A	Respuesta a la comunicación SPLI-USA-477-0146, Mano de obra, documentos de ingreso Soldador	RESP. SPLI-USA-477-0157
OF-CS-USQ-108	26/03/2026	CONTRATISTA A	Presentación personal mano de Obra no calificada.	RESP. SPLI-USA-477-0158
OF-CS-USQ-109	26/03/2026	CONTRATISTA A	PRESENTACIÓN PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	RESP. SPLI-USA-477-0160
OF-CS-USQ-110	26/03/2026	CONTRATISTA A	Presentación de equipos – Volquetas	RESP. SPLI-USA-477-0161
OF-CS-USQ-111	27/03/2026	CONTRATISTA A	Solicitud de aprobación de maquinaria contratista FDLUSA-CTO-459-2025	RESP. SPLI-USA-477-0162
OF-CS-USQ-112	28/03/2026	CONTRATISTA A	PRESENTACIÓN PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	
OF-CS-USQ-113	28/03/2026	CONTRATISTA A	Presentación de personal operador de maquinaria amarilla	RESP. SPLI-USA-477-0165
OF-CS-USQ-114	28/03/2026	CONTRATISTA A	Respuesta a solicitud de programación actualizada y flujo de inversión	
OF-CS-USQ-115	30/03/2026	CONTRATISTA A	Subsanación SPLI-USA-477-0162 Hoja de vida maquinaria minicargador	RESP. SPLI-USA-477-0164
OF-CS-USQ-116	30/03/2026	CONTRATISTA A	Solicitud aprobación de bordillo cancha baloncesto parque Margaritas.	
OF-CS-USQ-117	30/03/2026	CONTRATISTA A	Solicitud incluir NP para malla contra impacto parque 2 (san patricio).	RESP. SPLI-USA-477-0182

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 22 de 25

FUENTE: Elaboración propia

4.6 AVANCE FISICO

A la fecha de corte del presente informe se presenta un avance físico de la siguiente manera:

- PARQUE 1 “Las Margaritas”: presenta un avance físico del 5.62% del total del proyecto.
- PARQUE 2 “Urbanización autopista norte primer sector”: presenta un avance físico del 22,47% del total del proyecto.

4.7 AVANCE FINANCIERO POR ELEMENTO

A la fecha de corte del presente informe se presenta un avance financiero de la siguiente manera:

- PARQUE 1 “Las Margaritas”: presenta un avance financiero de \$23.6743887 del total del proyecto.
- PARQUE 2 “Urbanización autopista norte primer sector”: presenta un avance financiero d de \$72.774.438 del total del proyecto.

4.8 CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD

El 29 de enero el contratista envía la versión V0 a la documentación del plan de calidad en respuesta a la interventoría sobre la solicitud de envío documentos requeridos a lo cual la interventoría manda las observaciones y las correcciones necesarias con el comunicado SPLI-USA-477-033 el día 02 de febrero.

El día 16 de febrero se envió por parte del contratista la versión 1 del plan de calidad con el comunicado OF-CS-USQ-039 en respuesta al comunicado anterior enviado por la interventoría, en donde por medio del comunicado SPLI-USA-477-066 vuelve a mandar las observaciones pertinentes al plan de calidad para su subsanación y después su aprobación.

El día 02 de marzo se le dio respuesta al comunicado OF-CS-USQ-0062 con el oficio SPLI-USA-477-0105 Por medio del cual se le dio visto bueno y correspondiente aprobación al plan de calidad remitido por le contratista.

4.9 BITACORA DE OBRA

El contrato al no haber iniciado la etapa 2 no se tiene registro de bitácora de obra.

4.10 ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO (COMITES Y REUNIONES)

4.10.1 INFORMES SEMANALES

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 23 de 25

A continuación, se relacionan los informes semanales del periodo y su estado. Se adjuntan en el **ANEXO No.1.**

Tabla 18. Relación informes semanales

INFORME	ESTADO
Informe Semanal No. 7 del 03 de marzo al 09 de marzo de 2026	Radicado a la entidad con oficio SPLI-USA-477-0127
Informe Semanal No. 8 del 10 de marzo al 16 de marzo de 2026	Radicado a la entidad con oficio SPLI-USA-477-0141
Informe Semanal No. 9 del 17 de marzo al 23 de marzo de 2026	Radicado a la entidad con oficio SPLI-USA-477-0150
Informe Semanal No. 10 del 24 de marzo al 30 de marzo de 2026	Radicado a la entidad con oficio SPLI-USA-477-0167

FUENTE: Elaboración propia

4.10.2 ACTAS DE COMITES DE OBRA

En el **ANEXO No.2** se remite copia de las actas de los comités del contrato de obra realizados durante el mes de mayo de 2022.

Tabla 19. Relación comités de obra

ACTA	ESTADO
Acta de comité No. 8 fecha del 02 de marzo de 2026	Firmado en obra por los participantes
Acta de comité No. 9 fecha del 11 de marzo de 2026	Firmado en obra por los participantes
Acta de comité No. 10 fecha del 18 de marzo de 2026	Firmado en obra por los participantes
Acta de comité No. 11 fecha del 25 de marzo de 2026	Firmado en obra por los participantes

FUENTE: Elaboración propia

4.10.3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

La correspondencia enviada y recibida se encuentra relacionada en el **ANEXO No.3 y 4.**

4.11 CUADRO DE CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 24 de 25

	Valor acumulado
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	\$ 29.724.456,28
Inicio del frente	\$ -
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	\$ 8.271.217,07
Desmante Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	\$ 1.374.016,00
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	\$ 12.127.919,29
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	\$ 7.514.080,00
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	\$ 437.223,92
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	\$ 15.740.263,60
Inicio de obra	\$ -
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	\$ 4.960.177,08
Desmante cerramiento contra impacto h=5.0M **	\$ 1.794.428,00
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	\$ 3.105.419,94
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	\$ 4.602.132,20
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	\$ 1.278.106,38
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	\$ 9.364.155,39
COMPONENTE SOCIAL	\$ 4.324.941,09
COMPONENTE TRANSITO	\$ 3.859.059,18

5 INFORMACION SOCIAL

La información de las actividades ejecutadas por el componente social y de dialogo ciudadano se presentan en el Informe Mensual No. 3 plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2026. Remitido junto a este informe.

6 INFORMACION AMBIENTAL Y SST

La información de las actividades ejecutadas por el componente SST se presenta en el Informe Mensual No. 3 de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2026. Remitido junto este informe.

7 CONCLUSIONES

- 1 Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026, correspondiente al tercer mes de ejecución del Contrato de Interventoría FDLUSA-CIN-477-2025, se realizó el seguimiento integral al contrato de obra FDLUSA-CTO-459-2025, verificando los componentes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales del mismo.
- 2 A la fecha de corte del presente informe, se evidencia que la etapa de diagnóstico del contrato de obra ya culmino y fue aprobada por la interventoría.
- 3 Se ha dado inicio a la etapa 2 – ejecución de obra, el día 17 de marzo de 2026.
- 4 Desde el punto de vista financiero, el contrato de obra presenta una ejecución con atraso a la fecha del 31 de marzo.
- 5 En relación con el Plan de Calidad, la interventoría ya le dio visto bueno y aprobación al documento presentado por el contratista.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	
FDLUSA-CIN-477-2025	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA	V.0 Página 25 de 25

- 6 La interventoría ha cumplido con sus obligaciones contractuales, efectuando el seguimiento continuo al contrato de obra, emitiendo comunicaciones formales, realizando comités de seguimiento, elaborando informes semanales y adelantando la revisión técnica de los documentos radicados.
- 7 Finalmente, se recomienda al contratista dar cumplimiento al cronograma de obra y atender las observaciones pendientes, con el fin de evitar mayores afectaciones al cronograma contractual.

8 RECOMENDACIONES

- 1 Se recomienda al contratista fortalecer sus mecanismos de control documental y de seguimiento a obligaciones contractuales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos y evitar la reiteración de llamados de atención y apremios.
- 2 Se recomienda realizar un monitoreo permanente al porcentaje de tiempo ejecutado frente al avance físico y económico, con el fin de identificar tempranamente posibles desviaciones y aplicar medidas correctivas oportunas.
- 3 Se recomienda continuar con la realización periódica de comités técnicos y administrativos, dejando trazabilidad formal de compromisos, responsables y fechas de cumplimiento.
