



ORDEN DE VENTA

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá, D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

09/04/2026

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	\$3,831,119,315.00	\$0.00	\$3,831,119,315.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	\$842,846,249.00	\$0.00	\$842,846,249.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	\$191,555,966.00	\$0.00	\$191,555,966.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$114,933,579.00	\$21,837,380.00	\$114,933,579.00
VS0023	HONORARIOS	1.0000	\$149,449,611.00	\$28,395,426.00	\$149,449,611.00
TOTALES			\$5,129,904,720.00	\$50,232,806.00	\$5,180,137,526.00

Notas
















#\$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 58 PERIODO MARZO 2026 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%


AMORTIZACION DE ANTICIPO \$268.249.692

ssalazar
Elaborado

cagarcia
Aprobado

Recibido

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 DE 1																																																																											
FECHA 6 4 2026 (Día / Mes / Año)																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: mar/2026 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 58 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,129,904,720																																																																															
<table><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>11-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID</td><td></td><td rowspan="10"> CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 1. A la preacta de obra le faltan los anexos y soportes correspondientes 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero falta la actualización de la información en "Indicar pago según reporte SIF" 3. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES no corresponde con la versión aprobada actualmente la cual es la versión 13 4. MASPS-MN1-IN-5-FR-10 RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL y MASPS-MN1-IN-5-FR-8 RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL no presentan la información histórica de la adquisición y gestión predial. Deberá diligenciarse según Manual de Interventoría 5. MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS no tiene la totalidad de anexos y soportes necesarios 6. No presenta el reporte del pago de las planillas de seguridad social correspondiente al periodo del acta y el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRA ENERO 2026 7. No presenta el soporte de pago de las estampillas 1.- Se adjuntan los anexos de la Preacta. 2.- Se actualizan los pagos en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 3.- En conversación con Ing. Lauren, se había acordado pasar el MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES, R14 Interventoría solicita R13 Se adjunta. 4.- No Aplica. Los formatos prediales solicitados reflejan solamente el Mes que se cobra, no son formatos que acumulan el desarrollo de todo el proyecto a nivel predial. 5.- Se adjunta los anexos de Estudios y Diseño. 7.- En el acta pasada (Feb 2026) se anexaron los MEPI del pago de SS de Feb 2026. En esta acta se anexa declaración juramentada. (Todavía no es fecha de pago). 8.- Se anexa el recibo. Dejando claro que siempre hemos pasado solamente la Estampilla. </td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>11-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOHN JAIRO TORRES ORTEGA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>14-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>14-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOHN JAIRO TORRES ORTEGA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>15-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>15-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>MAURICIO GÓMEZ CAICEDO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>15-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>22-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>22-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LAUREN IGUARAN</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>29-abr-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LAUREN IGUARAN</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>06-may-26</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LAUREN IGUARAN</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>12/05/26</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Luis Diaz</td><td></td></tr></table> Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 1. A la preacta de obra le faltan los anexos y soportes correspondientes 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero falta la actualización de la información en "Indicar pago según reporte SIF" 3. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES no corresponde con la versión aprobada actualmente la cual es la versión 13 4. MASPS-MN1-IN-5-FR-10 RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL y MASPS-MN1-IN-5-FR-8 RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL no presentan la información histórica de la adquisición y gestión predial. Deberá diligenciarse según Manual de Interventoría 5. MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS no tiene la totalidad de anexos y soportes necesarios 6. No presenta el reporte del pago de las planillas de seguridad social correspondiente al periodo del acta y el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRA ENERO 2026 7. No presenta el soporte de pago de las estampillas 1.- Se adjuntan los anexos de la Preacta. 2.- Se actualizan los pagos en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 3.- En conversación con Ing. Lauren, se había acordado pasar el MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES, R14 Interventoría solicita R13 Se adjunta. 4.- No Aplica. Los formatos prediales solicitados reflejan solamente el Mes que se cobra, no son formatos que acumulan el desarrollo de todo el proyecto a nivel predial. 5.- Se adjunta los anexos de Estudios y Diseño. 7.- En el acta pasada (Feb 2026) se anexaron los MEPI del pago de SS de Feb 2026. En esta acta se anexa declaración juramentada. (Todavía no es fecha de pago). 8.- Se anexa el recibo. Dejando claro que siempre hemos pasado solamente la Estampilla.	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	11-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	29-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06-may-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12/05/26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 1. A la preacta de obra le faltan los anexos y soportes correspondientes 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero falta la actualización de la información en "Indicar pago según reporte SIF" 3. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES no corresponde con la versión aprobada actualmente la cual es la versión 13 4. MASPS-MN1-IN-5-FR-10 RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL y MASPS-MN1-IN-5-FR-8 RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL no presentan la información histórica de la adquisición y gestión predial. Deberá diligenciarse según Manual de Interventoría 5. MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS no tiene la totalidad de anexos y soportes necesarios 6. No presenta el reporte del pago de las planillas de seguridad social correspondiente al periodo del acta y el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRA ENERO 2026 7. No presenta el soporte de pago de las estampillas 1.- Se adjuntan los anexos de la Preacta. 2.- Se actualizan los pagos en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 3.- En conversación con Ing. Lauren, se había acordado pasar el MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES, R14 Interventoría solicita R13 Se adjunta. 4.- No Aplica. Los formatos prediales solicitados reflejan solamente el Mes que se cobra, no son formatos que acumulan el desarrollo de todo el proyecto a nivel predial. 5.- Se adjunta los anexos de Estudios y Diseño. 7.- En el acta pasada (Feb 2026) se anexaron los MEPI del pago de SS de Feb 2026. En esta acta se anexa declaración juramentada. (Todavía no es fecha de pago). 8.- Se anexa el recibo. Dejando claro que siempre hemos pasado solamente la Estampilla.																																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	11-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA																																																																												
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA																																																																												
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID																																																																												
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO																																																																												
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																													
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN																																																																												
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																													
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	29-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN																																																																												
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06-may-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN																																																																												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12/05/26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz																																																																												
ORDEN DE PAGO																																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3. CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. NIT. 902.003.281-9 DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: T. BOYACÁ LCP S.A.S. (Indicar el ordenador del pago) VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 4,911,887,834 VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Novecientos Once Millones Ochocientos Ochoenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos M/cte (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 58 DEL PERIODO mar/2026 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.  Firmado digitalmente por ESPITIA MALAGON MARTIN ALONSO Firma Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN Matrícula No. 01198-0489 CPITVC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)  Firmado digitalmente por ESPITIA MALAGON MARTIN ALONSO Firma Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN Matrícula No. 01198-0489 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)  Firmado digitalmente por LAUREN IGUARAN Firma Nombre: LAUREN IGUARAN SALINAS Matrícula profesional No.: 25202104893 CND APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: (Suscribe según su competencia)  Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Matrícula: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																															

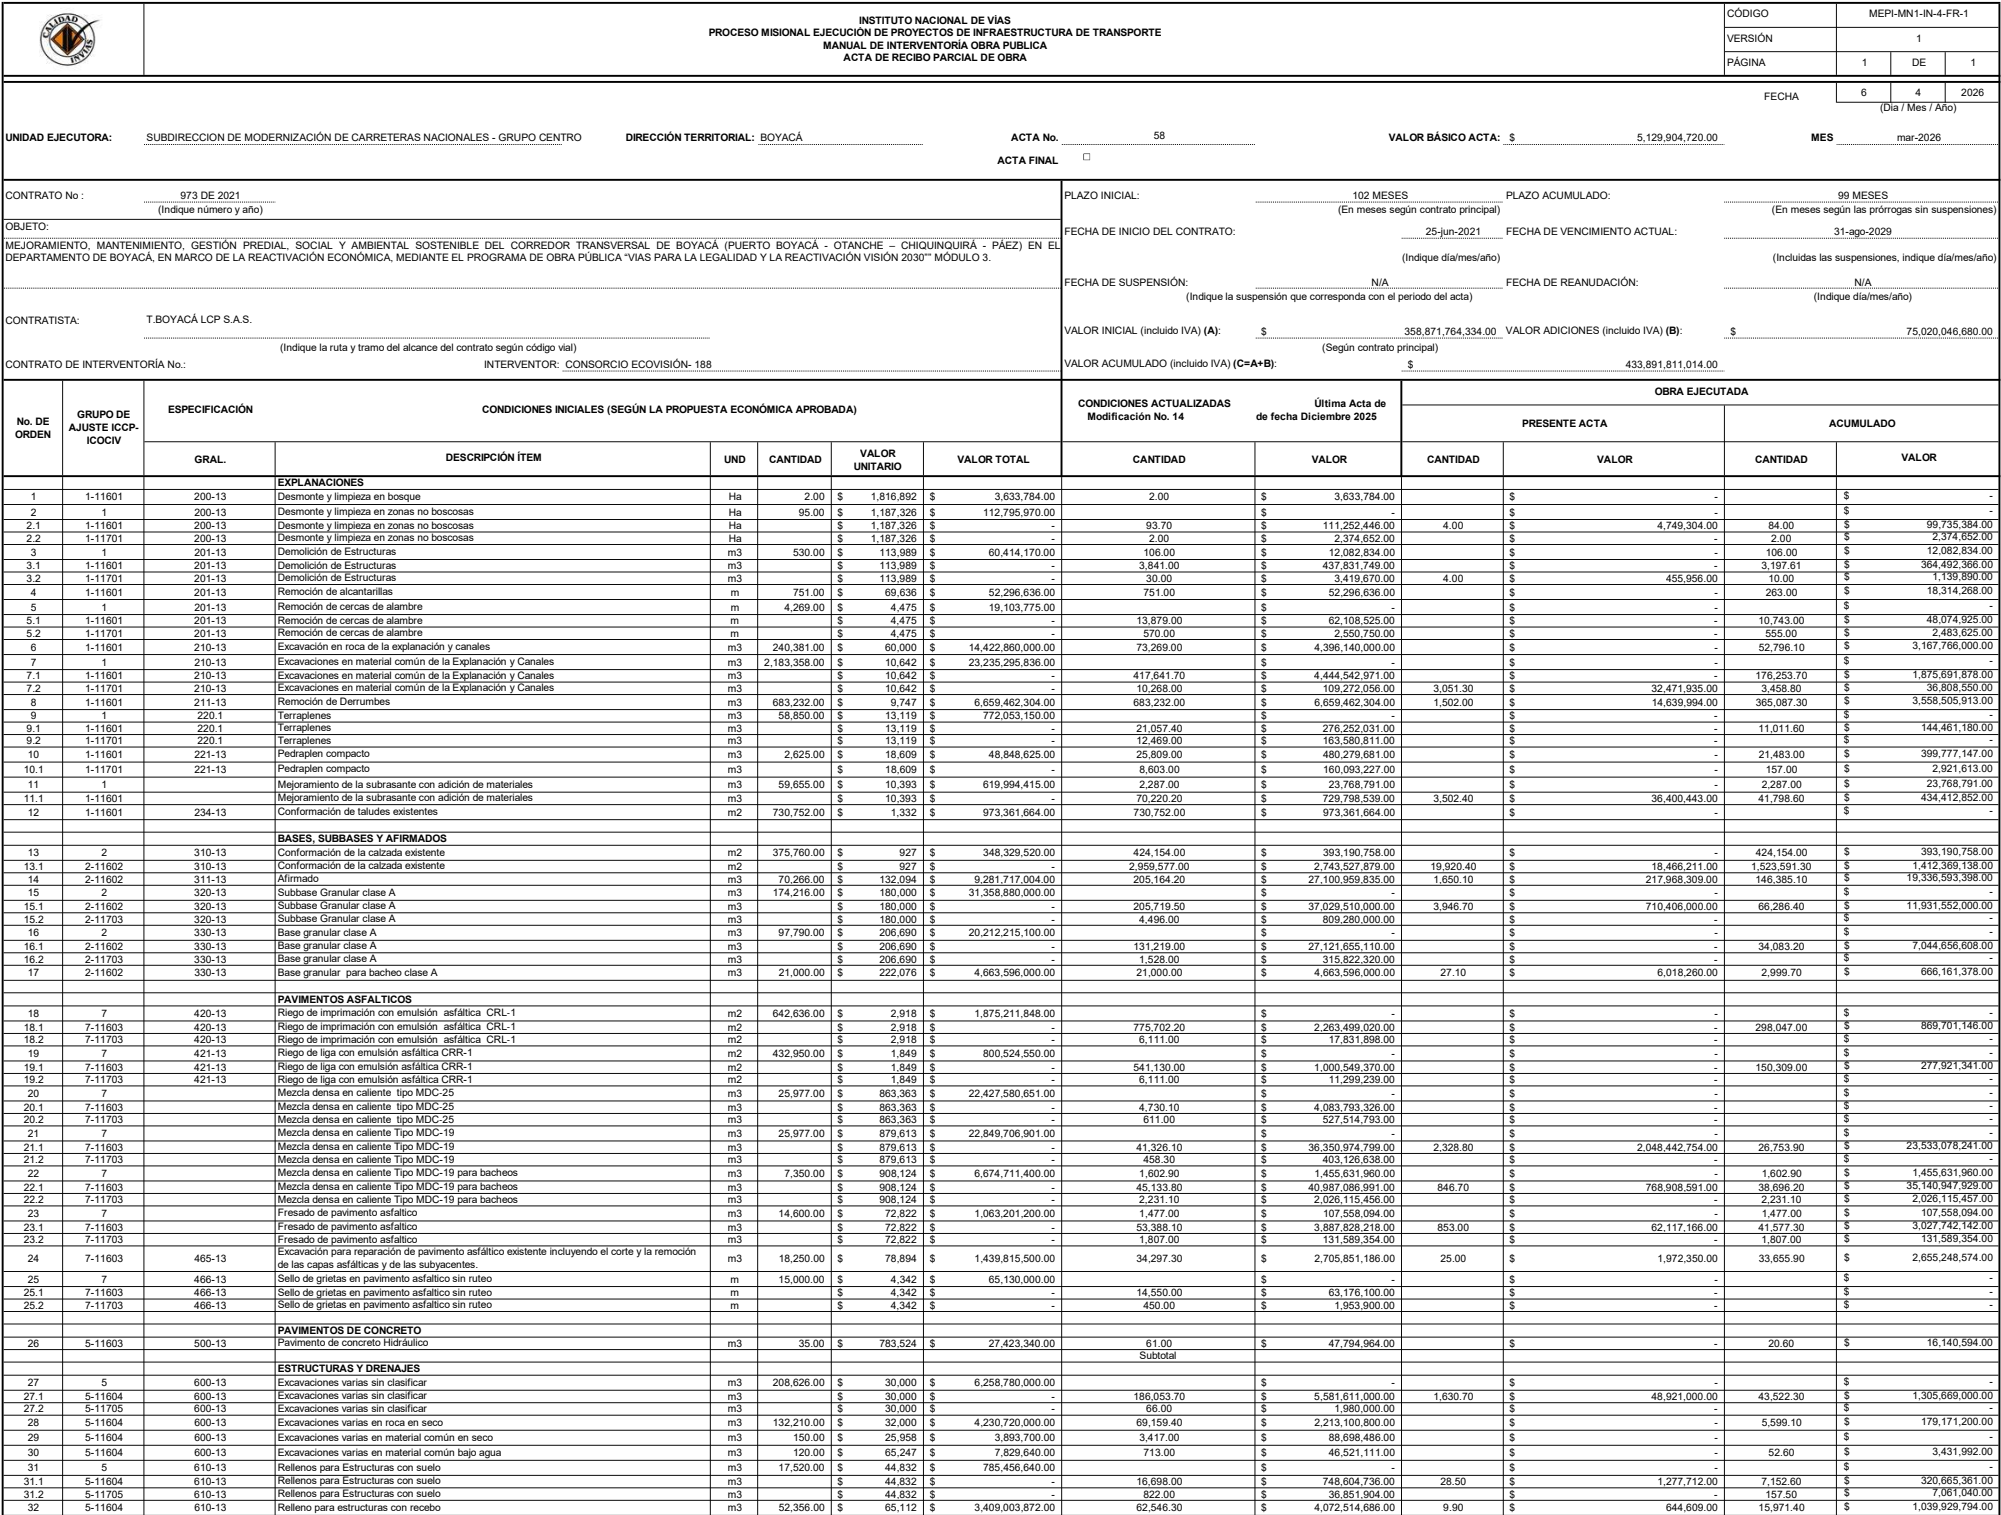

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN		1		
												PÁGINA		1		
												FECHA		6 4 2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ				ACTA No. 58		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,129.904.720.00		MES mar-2026		
						ACTA FINAL										
CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 75.020.046.680.00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 433.891.811.014.00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de fecha Diciembre 2025		OBRA EJECUTADA				
			GRAL.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	5-14101			Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	\$ 2,233,592	\$ 89,343,680.00	1,891.68	\$ 4,225,241,315.00	11.50	\$ 25,686,308.00	1,355.90	\$ 3,028,527,393.00		
33.1	5-11604			Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$ 2,233,592	\$ -	810.72	\$ 1,810,817,706.00	27.00	\$ 60,306,984.00	82.60	\$ 184,494,699.00		
34	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3,764.00	\$ 368,509	\$ 1,387,067,876.00	3,914.00	\$ 1,442,344,226.00		\$ -	517.00	\$ 190,519,153.00		
35	6-14103			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,709.00	\$ 1,254,085	\$ 5,905,486,265.00	4,964.00	\$ 6,225,277,940.00		\$ -		\$ -		
36	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4,792.00	\$ 871,252	\$ 4,175,039,584.00		\$ -		\$ -		\$ -		
36.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871,252	-	2,700.10	\$ 2,352,467,525.00	5.80	\$ 5,053,262.00	592.30	\$ 516,042,557.00		
36.2	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871,252	-	3,591.70	\$ 3,129,275,808.00		\$ -	2,060.10	\$ 1,794,866,245.00		
36.3	5-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871,252	-	14.00	\$ 12,197,528.00		\$ -		\$ -		
37	6-14102			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2,354.00	\$ 1,033,388	\$ 2,432,595,352.00	5,928.90	\$ 6,126,854,113.00	10.60	\$ 10,953,913.00	2,347.20	\$ 2,425,568,313.00		
38	6-14101			Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411.00	\$ 1,127,087	\$ 463,232,757.00	1,120.10	\$ 1,262,450,149.00		\$ -		\$ -		
39	6-14103			Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	1,412.00	\$ 1,184,864	\$ 1,673,027,968.00	1,412.00	\$ 1,673,027,968.00		\$ -		\$ -		
40	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5,444.00	\$ 721,775	\$ 3,929,343,100.00	5,599.30	\$ 4,041,434,758.00		\$ -	236.60	\$ 170,771,970.00		
41	5-11606			Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5,382.00	\$ 972,051	\$ 5,231,578,482.00	4,101.20	\$ 3,986,575,561.00		\$ -	117.40	\$ 114,118,787.00		
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,539.00	\$ 539,260	\$ 829,921,140.00		\$ -		\$ -		\$ -		
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 539,260	-	1,549.80	\$ 835,745,148.00	1.50	\$ 808,890.00	899.50	\$ 485,064,370.00		
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 539,260	-	16.00	\$ 8,628,160.00		\$ -		\$ -		
42.3	6-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 539,260	-	64.50	\$ 34,782,270.00		\$ -	3.00	\$ 1,617,780.00		
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1,137.00	\$ 485,168	\$ 551,636,016.00	3,011.90	\$ 1,461,277,499.00		\$ -	1,545.40	\$ 749,778,625.00		
44	4-14104			Baranda Metálica	m	2,915.00	\$ 545,130	\$ 1,589,053,950.00	2,915.00	\$ 1,589,053,950.00		\$ -		\$ -		
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,611,800.00	\$ 5,378	\$ 14,046,260,400.00		\$ -		\$ -		\$ -		
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	-	2,027,562.00	\$ 10,904,228,436.00	9,006.00	\$ 48,434,268.00	844,577.70	\$ 4,542,138,870.00		
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	-	1,569.00	\$ 8,438,082.00		\$ -	1,127.00	\$ 6,061,006.00		
45.3	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	-	1,084,065.00	\$ 5,830,101,570.00	3,523.00	\$ 18,946,694.00	16,121.58	\$ 86,701,844.00		
46	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg	256,153.00	\$ 5,483	\$ 1,404,486,899.00		\$ -		\$ -		\$ -		
46.1	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg		\$ 5,483	-	253,742.00	\$ 1,391,267,386.00		\$ -	9,994.00	\$ 54,797,102.00		
46.2	4-11705	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg		\$ 5,483	-	2,429.00	\$ 13,318,207.00		\$ -		\$ -		
47	4-11606	641-13		Acero de Prestrefuerzo	Tl-m	2,143,171.00	\$ 2,237	\$ 4,794,273,527.00	2,180,329.00	\$ 4,877,395,973.00		\$ -		\$ -		
48	5-14103	642-13		Apoyo elastómero	u	243.00	\$ 2,720,318	\$ 661,037,274.00	263.00	\$ 715,443,634.00		\$ -		\$ -		
49	5-14103			Junta FREYSINET M80 o similar	m	871.00	\$ 2,799,200	\$ 2,438,103,200.00	871.00	\$ 2,438,103,200.00		\$ -		\$ -		
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,035.00	\$ 628,687	\$ 650,691,045.00	14.00	\$ 8,801,618.00		\$ -	14.00	\$ 8,801,618.00		
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628,687	-	1,377.70	\$ 866,142,080.00		\$ -	571.30	\$ 359,168,883.00		
50.2	5-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628,687	-	16.00	\$ 10,058,992.00		\$ -		\$ -		
51	5-11604			Tubería para filtro PVC e 6"	m	58,240.00	\$ 66,621	\$ 3,880,007,040.00	60,840.00	\$ 4,053,221,640.00		\$ -		\$ -		
52	5			Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83,952.00	\$ 38,113	\$ 3,199,662,576.00		\$ -		\$ -		\$ -		
52.1	5-11604			Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38,113	-	90,293.90	\$ 3,441,371,411.00	41.00	\$ 1,562,633.00	18,399.20	\$ 707,248,711.00		
52.2	5-11705			Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38,113	-	1,665.10	\$ 63,461,956.00		\$ -		\$ -		
53	5			Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f' c 21 Mpa)	m3	5,784.00	\$ 666,880	\$ 3,857,233,920.00		\$ -		\$ -		\$ -		
53.1	5-11604			Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f' c 21 Mpa)	m3		\$ 666,880	-	10,515.60	\$ 7,012,643,328.00	12.70	\$ 8,469,376.00	4,853.10	\$ 3,236,435,328.00		
53.2	5-11705			Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f' c 21 Mpa)	m3		\$ 666,880	-	160.00	\$ 106,700,800.00		\$ -	62.00	\$ 41,346,560.00		
54	5-11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1,400.00	\$ 90,059	\$ 126,082,600.00	10,525.00	\$ 947,870,975.00		\$ -	112.40	\$ 10,122,632.00		
55	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482,587.00	\$ 5,200	\$ 2,509,452,400.00		\$ -		\$ -		\$ -		
55.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 5,200	-	545,097.00	\$ 2,834,504,400.00		\$ -	198,714.00	\$ 1,033,312,800.00		
55.2	7-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 5,200	-	18,852.00	\$ 98,030,400.00	6,344.00	\$ 32,988,800.00	7,013.00	\$ 36,467,600.00		
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51,808.00	\$ 152,050	\$ 7,877,406,400.00		\$ -		\$ -		\$ -		
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152,050	-	39,740.30	\$ 6,042,512,615.00	6.00	\$ 912,300.00	11,773.00	\$ 1,790,084,850.00		
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152,050	-	1,837.00	\$ 279,315,850.00		\$ -		\$ -		
57	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	21,350.00	\$ 150,000	\$ 3,202,500,000.00	22,966.70	\$ 3,445,005,000.00		\$ -	7,066.00	\$ 1,059,900,000.00		
58	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5,157.00	\$ 173,904	\$ 896,822,928.00	9,445.60	\$ 1,642,627,622.00		\$ -	6,236.10	\$ 1,084,482,735.00		
59	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,250.00	\$ 265,893	\$ 332,366,250.00	3,414.80	\$ 907,971,416.00	34.00	\$ 9,040,362.00	2,415.00	\$ 642,131,595.00		
											\$ -					
											\$ -					
60	7	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111,199.00	\$ 1,794	\$ 199,491,006.00	305,221.90	\$ 547,568,089.00		\$ -	305,221.90	\$ 547,568,088.00		
60.1	7-11607	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794	-	1,897,808.10	\$ 3,404,667,731.00		\$ -	1,007,369.80	\$ 1,807,221,422.00		
60.2	7-11710	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794	-	3,275.00	\$ 5,875,350.00		\$ -		\$ -		
61	7	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487.00	\$ 22,076	\$ 10,751,012.00		\$ -		\$ -		\$ -		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
														VERSIÓN		1	
														PÁGINA		1 DE 1	
														FECHA		6 4 2026 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ				ACTA No. 58		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.129.904.720.00		MES mar-2026			
ACTA FINAL																	
CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ, OTANCHE, CHIQUINQUIRÁ, PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Indique día/mes/año)					
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358,871,764.334.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 75,020,046.680.00					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 433.891.811,014.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV	ESPECIFICACIÓN						CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14	Última Acta de de fecha Diciembre 2025	OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
61.1	7-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076	\$ -	8,173.20	\$ 180,431,626.00		\$ -	4,848.20	\$ 107,028,863.00				
61.2	7-11710	anual de Señalización Vial 20	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076	\$ -	41.00	\$ 905,053.00		\$ -		\$ -				
62	5-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11,798.00	\$ 8,346	\$ 98,466,108.00	18,077.00	\$ 150,870,642.00		\$ -	1,646.00	\$ 13,737,516.00				
63	4	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513.00	\$ 399,581	\$ 204,985,053.00		\$ -		\$ -		\$ -				
63.1	4-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399,581	\$ -	1,550.00	\$ 619,350,550.00	53.00	\$ 21,177,793.00	169.00	\$ 67,529,189.00				
63.2	4-11710	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399,581	\$ -	12.00	\$ 4,794,972.00		\$ -		\$ -				
64	4-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471.00	\$ 327,606	\$ 154,302,426.00	593.00	\$ 194,270,358.00	128.00	\$ 41,933,568.00	128.00	\$ 41,933,568.00				
65	4	anual de Señalización Vial 20	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5.00	\$ 559,793	\$ 2,798,965.00		\$ -		\$ -		\$ -				
65.1	4-11607	anual de Señalización Vial 20	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		\$ 559,793	\$ -	36.00	\$ 20,152,548.00		\$ -		\$ -				
65.2	4-11710	anual de Señalización Vial 20	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		\$ 559,793	\$ -	2.00	\$ 1,119,586.00		\$ -		\$ -				
66	4-11607	730-13	Defensa metálica	m	4,245.00	\$ 230,532	\$ 978,608,340.00	7,296.00	\$ 1,681,961,472.00	428.00	\$ 98,667,696.00	955.10	\$ 220,181,114.00				
67	4-11607	730-13	Sección final	u	319.00	\$ 103,189	\$ 32,917,291.00	331.00	\$ 34,155,559.00		\$ -		\$ -				
68	4-11607	740-13	Captafaros	u	328.00	\$ 22,031	\$ 7,226,168.00	2,418.00	\$ 53,270,958.00	104.00	\$ 2,291,224.00	242.00	\$ 5,331,502.00				
OBRAS VARIAS																	
69	5-11606	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700.00	\$ 17,838	\$ 12,486,600.00	8,200.00	\$ 146,271,600.00		\$ -	2,325.00	\$ 41,473,350.00				
70	5	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4,332.00	\$ 34,235	\$ 148,306,020.00		\$ -		\$ -		\$ -				
70.1	5-11606	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34,235	\$ -	53,724.00	\$ 1,839,241,140.00		\$ -	21,193.00	\$ 725,542,355.00				
70.2	5-11704	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34,235	\$ -	580.00	\$ 19,856,300.00		\$ -	580.00	\$ 19,856,300.00				
Subtotal																	
TRANSPORTES																	
71	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	#####	\$ 1,100	\$ 32,926,494,700.00		\$ -		\$ -		\$ -				
71.1	3-11608		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1,100	\$ -	8,320,264.80	\$ 9,152,291,280.00	7,140.00	\$ 7,854,000.00	1,358,753.50	\$ 1,494,628,850.00				
71.2	3-11701		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1,100	\$ -	10,278.00	\$ 11,305,800.00		\$ -		\$ -				
72	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6,832,314.00	\$ 1,100	\$ 7,515,545,400.00	280,416.00	\$ 308,457,600.00		\$ -	280,416.00	\$ 308,457,600.00				
72.1	3-11608		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$ 1,100	\$ -	6,568,169.10	\$ 7,224,986,010.00	6,685.40	\$ 7,353,940.00	2,848,998.00	\$ 3,133,897,800.00				
Subtotal																	
OBRAS NO PREVISTAS																	
73	650.3P		Transporte de estructura metálica	Kg	-	\$ 361	\$ -	210,403.00	\$ 75,955,483.00		\$ -	65,635.90	\$ 23,694,560.00				
74	650.4P		Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg	-	\$ 3,717	\$ -	257,400.00	\$ 956,755,800.00		\$ -	112,632.50	\$ 418,655,003.00				
75	730.1.3P		Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m	m	-	\$ 665,869	\$ -	122.40	\$ 81,502,366.00		\$ -	122.40	\$ 81,502,366.00				
76	730.2.1P		Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m	-	\$ 752,076	\$ -	250.00	\$ 188,019,000.00	240.00	\$ 180,498,240.00	248.10	\$ 186,590,056.00				
77	8.5P		Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 624,680	\$ -	513.00	\$ 320,460,840.00		\$ -	3.00	\$ 1,874,040.00				
78	8.6P		Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u	-	\$ 80,293	\$ -	216.00	\$ 17,343,288.00		\$ -	216.00	\$ 17,343,288.00				
79	8.7P		Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u	-	\$ 107,058	\$ -	24.00	\$ 2,569,392.00		\$ -	24.00	\$ 2,569,392.00				
80	8.8P		Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0.75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u	-	\$ 80,293	\$ -	50.00	\$ 4,014,650.00		\$ -	50.00	\$ 4,014,650.00				
81	900.2.1P		Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km	-	\$ 1,410	\$ -	2,166,160.40	\$ 3,054,286,164.00		\$ -	1,783,105.70	\$ 2,514,179,037.00				
82	233.1	233-13	Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		\$ 12,601	\$ -	331,700.00	\$ 4,179,751,700.00		\$ -	182,073.00	\$ 2,294,301,873.00				
83	464.1.1	464-13	Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		\$ 13,288	\$ -	147,825.00	\$ 1,964,298,600.00	31,296.00	\$ 415,861,248.00	89,279.00	\$ 1,186,339,352.00				
84	672.4	672-13	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m		\$ 77,169	\$ -	2,996.00	\$ 231,198,324.00		\$ -	1,481.50	\$ 114,325,874.00				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

6

4

2026

(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

ACTA No.

58

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

5.129.904.720.00

MES

mar-2026

ACTA FINAL

CONTRATO No :

973 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

CONTRATISTA:

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL:

102 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

99 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

25-jun-2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31-ago-2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$

358,871.764.334.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$

75.020.046.680.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$

433.891.811.014.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de de fecha Diciembre 2025	OBRA EJECUTADA							
			GRAL.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
85	900.1	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		\$	1,057	\$	-	399,331.70	\$	422.093.607.00	\$	-	286,763.10	\$	303,108,597.00	
86	662.2P		Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).	m		\$	1,098,470	\$	-	168.00	\$	184.542,960.00	\$	-	136.90	\$	150,380,543.00	
87	8P	anual de Señalización Vial 20	Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1,20m X 0,75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).	u		\$	1,298,836	\$	-	152.00	\$	197,423,072.00	6.00	\$	7,793,016.00	63.00	\$	81,826,668.00
			Ajustes al peso								\$	(1.00)						

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	\$	305,189,938,913.00	\$	363,782,710,736.00	\$	4,980,455,109.00	\$	163,344,803,009.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$	41,440,096,041.00	\$	51,541,253,475.00	\$	-	\$	45,195,421,879.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	\$	1,080,000,000.00	\$	1,080,000,000.00	\$	-	\$	-
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$	347,710,034,954.00	\$	416,403,964,211.00	\$	4,980,455,109.00	\$	208,540,024,887.00
VALOR IVA (OBRAS) (E)	\$	1,524,574,769.00	\$	1,825,771,229.00	\$	21,837,380.00	\$	914,367,802.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	\$	349,234,609,723.00	\$	418,229,735,440.00	\$	5,002,292,489.00	\$	209,454,392,689.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$	1,281,000,000.00	\$	1,281,000,000.00	\$	-	\$	1,288,877,959.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$	243,390,000.00	\$	243,390,000.00	\$	-	\$	241,048,812.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	\$	1,524,390,000.00	\$	1,524,390,000.00	\$	-	\$	1,509,726,771.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)	\$	-	\$	4,279,765,515.00	\$	149,449,611.00	\$	3,550,628,141.00
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)	\$	-	\$	813,155,448.00	\$	28,395,426.00	\$	674,619,347.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)	\$	-	\$	5,092,920,963.00	\$	177,845,037.00	\$	4,225,247,488.00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)	\$	7,772,764,611.00	\$	8,704,674,611.00	\$	-	\$	3,675,322,500.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	\$	340,000,000.00	\$	340,000,000.00	\$	1,985,425.00	\$	1,985,425.00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+M)	\$	358,871,764,334.00	\$	433,891,811,014.00	\$	5,180,137,526.00	\$	218,866,674,873.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AJU

30

%

Utilidad

3

%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 31,009,208,054.00	7.10%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 268,249,692.00	5.39%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 19,793,915,634.00	63.83%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 11,215,292,420.00	36.17%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 4,980,455,109.00	\$ 21,837,380.00	\$ 5,002,292,489.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O ATÍPICOS	\$ 149,449,611.00	\$ 28,395,426.00	\$ 177,845,037.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 5,129,904,720.00	\$ 50,232,806.00	\$ 5,180,137,526.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G. P. P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 88,717,632.00	\$ 12,487,113,741.00
SB	\$ 710,406,000.00	\$ 11,931,552,000.00
B	\$ 242,452,780.00	\$ 28,852,971,280.00
P	\$ 3,297,302,109.00	\$ 70,428,014,184.00
OA	\$ 274,007,111.00	\$ 27,917,556,193.00
SCT	\$ 352,361,537.00	\$ 3,186,251,722.00
OV	\$ -	\$ 786,872,005.00
T	\$ 15,207,940.00	\$ 7,754,271,884.00
TOTAL	\$ 4,980,455,109.00	\$ 163,344,803,009.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE, ICOCIV Vías Interurbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y explanación	\$ 116,096,725.00	\$ 10,331,578,237.00
2. Afirmados, subbases y bases	\$ 952,858,780.00	\$ 43,078,825,153.00
3. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 3,297,302,109.00	\$ 68,270,309,373.00
4. Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 116,084,050.00	\$ 17,716,916,006.00
5. Obras de urbanismo	\$ -	\$ -
6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 9,040,362.00	\$ 4,593,134,220.00
7. Señalización y control de tránsito	\$ 352,361,537.00	\$ 3,186,251,722.00
8. Transporte y sobre acarrees	\$ 15,207,940.00	\$ 7,754,271,884.00
TOTAL	\$ 4,858,951,503.00	\$ 154,931,286,595.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

6

4

2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

ACTA No.

58

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

5,129,904,720.00

MES

mar-2026

ACTA FINAL

CONTRATO No :

973 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

T. BOYACÁ LCP S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

No. DE ORDEN

GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV

ESPECIFICACIÓN

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRAL.

DESCRIPCIÓN ÍTEM

UND

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Modificación No. 14

Última Acta de fecha Diciembre 2025

CANTIDAD

VALOR

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanación	\$ 32,927,891.00	\$ 45,728,330.00
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	\$ -	\$ -
3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases	\$ -	\$ 2,157,704,811.00
4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	\$ -	\$ 19,856,300.00
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito	\$ 32,988,800.00	\$ 205,262,080.00
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$ -	\$ -
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -
8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -
9. Estabilización de terreno	\$ -	\$ -
10. Señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 65,916,691.00	\$ 2,428,551,521.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y cimentación	\$ 25,686,308.00	\$ 3,030,145,173.00
2. Subestructura y cimentación	\$ 10,953,913.00	\$ 2,425,568,313.00
3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ 18,946,694.00	\$ 529,051,407.00
4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -
5. Drenajes	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 55,586,915.00	\$ 5,984,764,893.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 88,717,632.00	\$ 10,192,811,868.00
2 Sub-bases y bases	\$ 952,858,780.00	\$ 40,784,523,280.00
3 Transporte de materiales	\$ 15,207,940.00	\$ 7,777,966,444.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 239,244,259.00	\$ 5,525,155,866.00
5 Concretos, morteros y obras varias	\$ 162,683,436.00	\$ 20,105,291,430.00
6 Concreto para estructura de puentes	\$ 10,953,913.00	\$ 2,427,186,093.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 3,510,789,149.00	\$ 76,531,668,028.00
TOTAL	\$ 4,980,455,109.00	\$ 163,344,603,009.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$

5,129,904,720.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$

4,861,655,028.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$

4,911,887,834.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Novecientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre SEÑOR HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: T. BOYACÁ LCP S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
VERSIÓN									1								
PÁGINA									1	DE	1						
FECHA									6	4	2026						
(Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCION TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 58		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,129,904,720.00		MES mar-2026					
						ACTA FINAL											
CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029							
								(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)								FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358,871,764,334.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 75,020,046,680.00							
		(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						(Según contrato principal)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 433,891,811,014.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de fecha Diciembre 2025		OBRA EJECUTADA				
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
GRAL.		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
1	1-11601	200-13		EXPLANACIONES													
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2.00	\$ 1,816,892	\$ 3,633,784.00	2.00	\$ 3,633,784.00	-	\$ -	-	\$ -			
2.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95.00	\$ 1,187,326	\$ 112,795,970.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
2.2	1-11701	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	\$ 1,187,326	-	93.70	\$ 111,252,446.00	4.00	\$ 4,749,304.00	84.00	\$ 99,735,384.00			
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530.00	\$ 113,989	\$ 60,414,170.00	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 2,374,652.00			
3.1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113,989	-	106.00	\$ 12,082,834.00	-	\$ -	106.00	\$ 12,082,834.00			
3.2	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113,989	-	3,841.00	\$ 437,831,749.00	-	\$ -	3,197.61	\$ 364,492,366.00			
4	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	751.00	\$ 69,636	\$ 52,296,636.00	30.00	\$ 3,419,670.00	4.00	\$ 455,956.00	10.00	\$ 1,139,890.00			
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4,269.00	\$ 4,475	\$ 19,103,775.00	751.00	\$ 52,296,636.00	-	\$ -	263.00	\$ 18,314,268.00			
5.1	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4,475	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.2	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4,475	-	13,879.00	\$ 62,108,525.00	-	\$ -	10,743.00	\$ 48,074,925.00			
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240,381.00	\$ 60,000	\$ 14,422,860,000.00	570.00	\$ 2,550,750.00	-	\$ -	555.00	\$ 2,483,625.00			
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,183,358.00	\$ 10,642	\$ 23,235,295,836.00	-	\$ -	-	\$ -	52,796.10	\$ 3,167,766,000.00			
7.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	\$ 10,642	-	417,641.70	\$ 4,444,542,971.00	-	\$ -	176,253.70	\$ 1,875,691,878.00			
7.2	1-11701	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	\$ 10,642	-	10,268.00	\$ 109,272,056.00	3,051.30	\$ 32,471,935.00	3,458.80	\$ 36,808,550.00			
8	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683,232.00	\$ 9,747	\$ 6,659,462,304.00	683,232.00	\$ 6,659,462,304.00	1,502.00	\$ 14,639,994.00	365,087.30	\$ 3,558,505,913.00			
9	1	220.1		Terraplenes	m3	58,850.00	\$ 13,119	\$ 772,053,150.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
9.1	1-11601	220.1		Terraplenes	m3	-	\$ 13,119	-	21,057.40	\$ 278,252,031.00	-	\$ -	11,011.60	\$ 144,461,180.00			
9.2	1-11701	220.1		Terraplenes	m3	-	\$ 13,119	-	12,469.00	\$ 163,580,811.00	-	\$ -	-	\$ -			
10	1-11601	221-13		Pedraplen compacto	m3	2,625.00	\$ 18,609	\$ 48,848,625.00	25,809.00	\$ 480,279,681.00	-	\$ -	21,483.00	\$ 399,777,147.00			
10.1	1-11701	221-13		Pedraplen compacto	m3	-	\$ 18,609	-	8,603.00	\$ 160,093,227.00	-	\$ -	157.00	\$ 2,921,613.00			
11	1			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59,655.00	\$ 10,393	\$ 619,994,415.00	2,287.00	\$ 23,768,791.00	-	\$ -	2,287.00	\$ 23,768,791.00			
11.1	1-11601			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10,393	-	70,220.20	\$ 729,798,539.00	3,502.40	\$ 36,400,443.00	41,798.60	\$ 434,412,852.00			
12	1-11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730,752.00	\$ 1,332	\$ 973,361,664.00	730,752.00	\$ 973,361,664.00	-	\$ -	-	\$ -			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375,760.00	\$ 927	\$ 348,329,520.00	424,154.00	\$ 393,190,758.00	-	\$ -	424,154.00	\$ 393,190,758.00			
13.1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927	-	2,959,577.00	\$ 2,743,527,879.00	19,920.40	\$ 18,466,211.00	1,523,591.30	\$ 1,412,369,138.00			
14	2-11602	311-13		Afirmado	m3	70,266.00	\$ 132,094	\$ 9,281,717,004.00	205,164.20	\$ 27,100,959,835.00	1,650.10	\$ 217,968,309.00	146,385.10	\$ 19,336,593,398.00			
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174,216.00	\$ 180,000	\$ 31,358,880,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
15.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 180,000	-	205,719.50	\$ 37,029,510,000.00	3,946.70	\$ 710,406,000.00	66,286.40	\$ 11,931,552,000.00			
15.2	2-11703	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 180,000	-	4,498.00	\$ 809,280,000.00	-	\$ -	-	\$ -			
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	97,790.00	\$ 206,690	\$ 20,212,215,100.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
16.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 206,690	-	131,219.00	\$ 27,121,655,110.00	-	\$ -	34,083.20	\$ 7,044,656,600.00			
16.2	2-11703	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 206,690	-	1,528.00	\$ 315,822,320.00	-	\$ -	-	\$ -			
17	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21,000.00	\$ 222,076	\$ 4,663,596,000.00	21,000.00	\$ 4,663,596,000.00	27.10	\$ 6,018,260.00	2,999.70	\$ 666,161,378.00			
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
18	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642,636.00	\$ 2,918	\$ 1,875,211,848.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
18.1	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	\$ 2,918	-	775,702.20	\$ 2,263,499,020.00	-	\$ -	298,047.00	\$ 869,701,146.00			
18.2	7-11703	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	\$ 2,918	-	6,111.00	\$ 17,831,898.00	-	\$ -	-	\$ -			
19	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432,950.00	\$ 1,849	\$ 800,524,550.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
19.1	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1,849	-	541,130.00	\$ 1,000,549,370.00	-	\$ -	150,309.00	\$ 277,921,341.00			
19.2	7-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1,849	-	6,111.00	\$ 11,299,239.00	-	\$ -	-	\$ -			
20	7			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25,977.00	\$ 863,363	\$ 22,427,580,651.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
20.1	7-11603			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 863,363	-	4,730.10	\$ 4,083,793,326.00	-	\$ -	-	\$ -			
20.2	7-11703			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 863,363	-	611.00	\$ 527,514,793.00	-	\$ -	-	\$ -			
21	7			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	25,977.00	\$ 879,613	\$ 22,849,706,901.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
21.1	7-11603			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 879,613	-	41,326.10	\$ 36,350,974,799.00	2,328.80	\$ 2,048,442,754.00	26,753.90	\$ 23,533,078,241.00			
21.2	7-11703			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 879,613	-	458.30	\$ 403,126,638.00	-	\$ -	-	\$ -			
22	7			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,350.00	\$ 908,124	\$ 6,674,711,400.00	1,602.90	\$ 1,455,631,960.00	-	\$ -	1,602.90	\$ 1,455,631,960.00			
22.1	7-11603			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 908,124	-	45,133.80	\$ 40,987,086,901.00	846.70	\$ 768,908,591.00	38,696.20	\$ 35,140,947,929.00			
22.2	7-11703			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 908,124	-	2,231.10	\$ 2,026,115,456.00	-	\$ -	2,231.10	\$ 2,026,115,457.00			
23	7			Fresado de pavimento asfáltico	m3	14,600.00	\$ 72,822	\$ 1,063,201,200.00	1,477.00	\$ 107,558,094.00	-	\$ -	-	\$ -			
23.1	7-11603			Fresado de pavimento asfáltico	m3	-	\$ 72,822	-	53,388.10	\$ 3,887,828,218.00	853.00	\$ 62,117,166.00	41,577.30	\$ 3,027,742,142.00			
23.2	7-11703			Fresado de pavimento asfáltico	m3	-	\$ 72,822	-	-	\$ -	-	\$ -	1,807.00	\$ 131,589,354.00			
24	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	18,250.00	\$ 78,894	\$ 1,439,815,500.00	34,297.30	\$ 2,705,851,186.00	25.00	\$ 1,972,350.00	33,655.90	\$ 2,655,248,574.00			
25	7	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	15,000.00	\$ 4,342	\$ 65,130,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
25.1	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	-	\$ 4,342	-	14,550.00	\$ 63,176,100.00	-	\$ -	-	\$ -			
25.2	7-11703	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	-	\$ 4,342	-	450.00	\$ 1,953,900.00	-	\$ -	-	\$ -			
PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
26	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	35.00	\$ 783,524	\$ 27,423,340.00	61.00	\$ 47,794,964.00	-	\$ -	20.60	\$ 16,140,594.00			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
27	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208,628.00	\$ 30,000	\$ 6,258,780,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
27.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 30,000	-	186,053.70	\$ 5,581,611,000.00	1,630.70	\$ 48,921,000.00	43,522.30	\$ 1,305,669,000.00			
27.2	5-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 30,000	-	66.00	\$ 1,980,000.00	-	\$ -	-	\$ -			
28	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132,210.00											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		1			
												FECHA		6 4 2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ				ACTA No. 58		VALOR BÁSICO ACTA: \$		5,129.904.720.00		MES mar-2026	
										ACTA FINAL							
CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 75.020.046.680.00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 433.891.811.014.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de fecha Diciembre 2025		OBRA EJECUTADA				
			GRAL.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
33	5-14101			Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	\$ 2,233,592	\$ 89,343,680.00	1,891.68	\$ 4,225,241,315.00	11.50	\$ 25,686,308.00	1,355.90	\$ 3,028,527,393.00			
33.1	5-11604			Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$ 2,233,592	\$ -	810.72	\$ 1,810,817,706.00	27.00	\$ 60,306,984.00	82.60	\$ 184,494,699.00			
34	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3,764.00	\$ 368,509	\$ 1,387,067,876.00	3,914.00	\$ 1,442,344,226.00		\$ -	517.00	\$ 190,519,153.00			
35	6-14103			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,709.00	\$ 1,254,085	\$ 5,905,486,265.00	4,964.00	\$ 6,225,277,940.00		\$ -		\$ -			
36	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4,792.00	\$ 871,252	\$ 4,175,039,584.00		\$ -		\$ -		\$ -			
36.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871,252	-	2,700.10	\$ 2,352,467,525.00	5.80	\$ 5,053,262.00	592.30	\$ 516,042,557.00			
36.2	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871,252	-	3,591.70	\$ 3,129,275,808.00		\$ -	2,060.10	\$ 1,794,866,245.00			
36.3	5-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 871,252	-	14.00	\$ 12,197,528.00		\$ -		\$ -			
37	6-14102			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2,354.00	\$ 1,033,388	\$ 2,432,595,352.00	5,928.90	\$ 6,126,854,113.00	10.60	\$ 10,953,913.00	2,347.20	\$ 2,425,568,313.00			
38	6-14101			Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411.00	\$ 1,127,087	\$ 463,232,757.00	1,120.10	\$ 1,262,450,149.00		\$ -		\$ -			
39	6-14103			Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	1,412.00	\$ 1,184,864	\$ 1,673,027,968.00	1,412.00	\$ 1,673,027,968.00		\$ -		\$ -			
40	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5,444.00	\$ 721,775	\$ 3,929,343,100.00	5,599.30	\$ 4,041,434,758.00		\$ -	236.60	\$ 170,771,970.00			
41	5-11606			Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5,382.00	\$ 972,051	\$ 5,231,578,482.00	4,101.20	\$ 3,986,575,561.00		\$ -	117.40	\$ 114,118,787.00			
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,539.00	\$ 539,260	\$ 829,921,140.00		\$ -		\$ -		\$ -			
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 539,260	-	1,549.80	\$ 835,745,148.00	1.50	\$ 808,890.00	899.50	\$ 485,064,370.00			
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 539,260	-	16.00	\$ 8,628,160.00		\$ -		\$ -			
42.3	6-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 539,260	-	64.50	\$ 34,782,270.00		\$ -	3.00	\$ 1,617,780.00			
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1,137.00	\$ 485,168	\$ 551,636,016.00	3,011.90	\$ 1,461,277,499.00		\$ -	1,545.40	\$ 749,778,625.00			
44	4-14104			Baranda Metálica	m	2,915.00	\$ 545,130	\$ 1,589,053,950.00	2,915.00	\$ 1,589,053,950.00		\$ -		\$ -			
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,611,800.00	\$ 5,378	\$ 14,046,260,400.00		\$ -		\$ -		\$ -			
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	-	2,027,562.00	\$ 10,904,228,436.00	9,006.00	\$ 48,434,268.00	844,577.70	\$ 4,542,138,870.00			
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	-	1,569.00	\$ 8,438,082.00		\$ -	1,127.00	\$ 6,061,006.00			
45.3	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	-	1,084,065.00	\$ 5,830,101,570.00	3,523.00	\$ 18,946,694.00	16,121.58	\$ 86,701,844.00			
46	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg	256,153.00	\$ 5,483	\$ 1,404,486,899.00		\$ -		\$ -		\$ -			
46.1	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg		\$ 5,483	-	253,742.00	\$ 1,391,267,386.00		\$ -	9,994.00	\$ 54,797,102.00			
46.2	4-11705	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg		\$ 5,483	-	2,429.00	\$ 13,318,207.00		\$ -		\$ -			
47	4-11606	641-13		Acero de Prestrefuerzo	Tl-m	2,143,171.00	\$ 2,237	\$ 4,794,273,527.00	2,180,329.00	\$ 4,877,395,973.00		\$ -		\$ -			
48	5-14103	642-13		Apoyo elastómero	u	243.00	\$ 2,720,318	\$ 661,037,274.00	263.00	\$ 715,443,634.00		\$ -		\$ -			
49	5-14103			Junta FREYSINET M80 o similar	m	871.00	\$ 2,799,200	\$ 2,438,103,200.00	871.00	\$ 2,438,103,200.00		\$ -		\$ -			
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,035.00	\$ 628,687	\$ 650,691,045.00	14.00	\$ 8,801,618.00		\$ -	14.00	\$ 8,801,618.00			
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628,687	-	1,377.70	\$ 866,142,080.00		\$ -	571.30	\$ 359,168,883.00			
50.2	5-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628,687	-	16.00	\$ 10,058,992.00		\$ -		\$ -			
51	5-11604			Tubería para filtro PVC e 6"	m	58,240.00	\$ 66,621	\$ 3,880,007,040.00	60,840.00	\$ 4,053,221,640.00		\$ -		\$ -			
52	5			Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83,952.00	\$ 38,113	\$ 3,199,662,576.00		\$ -		\$ -		\$ -			
52.1	5-11604			Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38,113	-	90,293.90	\$ 3,441,371,411.00	41.00	\$ 1,562,633.00	18,399.20	\$ 707,248,711.00			
52.2	5-11705			Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38,113	-	1,665.10	\$ 63,461,956.00		\$ -		\$ -			
53	5			Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f' c 21 Mpa)	m3	5,784.00	\$ 666,880	\$ 3,857,233,920.00		\$ -		\$ -		\$ -			
53.1	5-11604			Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f' c 21 Mpa)	m3		\$ 666,880	-	10,515.60	\$ 7,012,643,328.00	12.70	\$ 8,469,376.00	4,853.10	\$ 3,236,435,328.00			
53.2	5-11705			Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f' c 21 Mpa)	m3		\$ 666,880	-	160.00	\$ 106,700,800.00		\$ -	62.00	\$ 41,346,560.00			
54	5-11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1,400.00	\$ 90,059	\$ 126,082,600.00	10,525.00	\$ 947,870,975.00		\$ -	112.40	\$ 10,122,632.00			
55	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482,587.00	\$ 5,200	\$ 2,509,452,400.00		\$ -		\$ -		\$ -			
55.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 5,200	-	545,097.00	\$ 2,834,504,400.00		\$ -	198,714.00	\$ 1,033,312,800.00			
55.2	7-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 5,200	-	18,852.00	\$ 98,030,400.00	6,344.00	\$ 32,988,800.00	7,013.00	\$ 36,467,600.00			
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51,808.00	\$ 152,050	\$ 7,877,406,400.00		\$ -		\$ -		\$ -			
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152,050	-	39,740.30	\$ 6,042,512,615.00	6.00	\$ 912,300.00	11,773.00	\$ 1,790,084,850.00			
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152,050	-	1,837.00	\$ 279,315,850.00		\$ -		\$ -			
57	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	21,350.00	\$ 150,000	\$ 3,202,500,000.00	22,966.70	\$ 3,445,005,000.00		\$ -	7,066.00	\$ 1,059,900,000.00			
58	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5,157.00	\$ 173,904	\$ 896,822,928.00	9,445.60	\$ 1,642,627,622.00		\$ -	6,236.10	\$ 1,084,482,735.00			
59	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,250.00	\$ 265,893	\$ 332,366,250.00	3,414.80	\$ 907,971,416.00	34.00	\$ 9,040,362.00	2,415.00	\$ 642,131,595.00			
											\$ -						
											\$ -						
60	7	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111,199.00	\$ 1,794	\$ 199,491,006.00	305,221.90	\$ 547,568,089.00		\$ -	305,221.90	\$ 547,568,088.00			
60.1	7-11607	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794	-	1,897,808.10	\$ 3,404,667,731.00		\$ -	1,007,369.80	\$ 1,807,221,422.00			
60.2	7-11710	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794	-	3,275.00	\$ 5,875,350.00		\$ -		\$ -			
61	7	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487.00	\$ 22,076	\$ 10,751,012.00		\$ -		\$ -		\$ -			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
														VERSIÓN		1			
														PÁGINA		1 DE 1			
														FECHA		6 4 2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				BOYACÁ				ACTA No. 58		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.129.904.720.00		MES mar-2026	
														ACTA FINAL					
CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ, OTANCHE, CHIQUINQUIRÁ, PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Indique día/mes/año)			
														FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358,871,764.334.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 75,020,046.680.00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 433.891.811,014.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV	ESPECIFICACIÓN						CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14	Última Acta de fecha Diciembre 2025	OBRA EJECUTADA							
		GRAL.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
61.1	7-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076	\$ -	8,173.20	\$ 180,431,626.00		\$ -	4,848.20	\$ 107,028,863.00						
61.2	7-11710	anual de Señalización Vial 20	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076	\$ -	41.00	\$ 905,053.00		\$ -		\$ -						
62	5-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11,798.00	\$ 8,346	\$ 98,466,108.00	18,077.00	\$ 150,870,642.00		\$ -	1,646.00	\$ 13,737,516.00						
63	4	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513.00	\$ 399,581	\$ 204,985,053.00		\$ -		\$ -		\$ -						
63.1	4-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399,581	\$ -	1,550.00	\$ 619,350,550.00	53.00	\$ 21,177,793.00	169.00	\$ 67,529,189.00						
63.2	4-11710	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399,581	\$ -	12.00	\$ 4,794,972.00		\$ -		\$ -						
64	4-11607	anual de Señalización Vial 20	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471.00	\$ 327,606	\$ 154,302,426.00	593.00	\$ 194,270,358.00	128.00	\$ 41,933,568.00	128.00	\$ 41,933,568.00						
65	4	anual de Señalización Vial 20	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5.00	\$ 559,793	\$ 2,798,965.00		\$ -		\$ -		\$ -						
65.1	4-11607	anual de Señalización Vial 20	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		\$ 559,793	\$ -	36.00	\$ 20,152,548.00		\$ -		\$ -						
65.2	4-11710	anual de Señalización Vial 20	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		\$ 559,793	\$ -	2.00	\$ 1,119,586.00		\$ -		\$ -						
66	4-11607	730-13	Defensa metálica	m	4,245.00	\$ 230,532	\$ 978,608,340.00	7,296.00	\$ 1,681,961,472.00	428.00	\$ 98,667,696.00	955.10	\$ 220,181,114.00						
67	4-11607	730-13	Sección final	u	319.00	\$ 103,189	\$ 32,917,291.00	331.00	\$ 34,155,559.00		\$ -		\$ -						
68	4-11607	740-13	Captafaros	u	328.00	\$ 22,031	\$ 7,226,168.00	2,418.00	\$ 53,270,958.00	104.00	\$ 2,291,224.00	242.00	\$ 5,331,502.00						
OBRAS VARIAS																			
69	5-11606	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700.00	\$ 17,838	\$ 12,486,600.00	8,200.00	\$ 146,271,600.00		\$ -	2,325.00	\$ 41,473,350.00						
70	5	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4,332.00	\$ 34,235	\$ 148,306,020.00		\$ -		\$ -		\$ -						
70.1	5-11606	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34,235	\$ -	53,724.00	\$ 1,839,241,140.00		\$ -	21,193.00	\$ 725,542,355.00						
70.2	5-11704	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34,235	\$ -	580.00	\$ 19,856,300.00		\$ -	580.00	\$ 19,856,300.00						
Subtotal																			
TRANSPORTES																			
71	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	#####	\$ 1,100	\$ 32,926,494,700.00		\$ -		\$ -		\$ -						
71.1	3-11608		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1,100	\$ -	8,320,264.80	\$ 9,152,291,280.00	7,140.00	\$ 7,854,000.00	1,358,753.50	\$ 1,494,628,850.00						
71.2	3-11701		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1,100	\$ -	10,278.00	\$ 11,305,800.00		\$ -		\$ -						
72	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6,832,314.00	\$ 1,100	\$ 7,515,545,400.00	280,416.00	\$ 308,457,600.00		\$ -	280,416.00	\$ 308,457,600.00						
72.1	3-11608		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$ 1,100	\$ -	6,568,169.10	\$ 7,224,986,010.00	6,685.40	\$ 7,353,940.00	2,848,998.00	\$ 3,133,897,800.00						
Subtotal																			
OBRAS NO PREVISTAS																			
73	650.3P		Transporte de estructura metálica	Kg	-	\$ 361	\$ -	210,403.00	\$ 75,955,483.00		\$ -	65,635.90	\$ 23,694,560.00						
74	650.4P		Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg	-	\$ 3,717	\$ -	257,400.00	\$ 956,755,800.00		\$ -	112,632.50	\$ 418,655,003.00						
75	730.1.3P		Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m	m	-	\$ 665,869	\$ -	122.40	\$ 81,502,366.00		\$ -	122.40	\$ 81,502,366.00						
76	730.2.1P		Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m	-	\$ 752,076	\$ -	250.00	\$ 188,019,000.00	240.00	\$ 180,498,240.00	248.10	\$ 186,590,056.00						
77	8.5P		Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 624,680	\$ -	513.00	\$ 320,460,840.00		\$ -	3.00	\$ 1,874,040.00						
78	8.6P		Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u	-	\$ 80,293	\$ -	216.00	\$ 17,343,288.00		\$ -	216.00	\$ 17,343,288.00						
79	8.7P		Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u	-	\$ 107,058	\$ -	24.00	\$ 2,569,392.00		\$ -	24.00	\$ 2,569,392.00						
80	8.8P		Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0.75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u	-	\$ 80,293	\$ -	50.00	\$ 4,014,650.00		\$ -	50.00	\$ 4,014,650.00						
81	900.2.1P		Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km	-	\$ 1,410	\$ -	2,166,160.40	\$ 3,054,286,164.00		\$ -	1,783,105.70	\$ 2,514,179,037.00						
82	233.1	233-13	Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		\$ 12,601	\$ -	331,700.00	\$ 4,179,751,700.00		\$ -	182,073.00	\$ 2,294,301,873.00						
83	464.1.1	464-13	Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		\$ 13,288	\$ -	147,825.00	\$ 1,964,298,600.00	31,296.00	\$ 415,861,248.00	89,279.00	\$ 1,186,339,352.00						
84	672.4	672-13	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m		\$ 77,169	\$ -	2,996.00	\$ 231,198,324.00		\$ -	1,481.50	\$ 114,325,874.00						

FECHA

6

4

2026

(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

ACTA No.

58

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

5,129,904,720.00

MES

mar-2026

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

973 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

CONTRATISTA:

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL:

102 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

99 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

25-jun-2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31-ago-2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$

358,871,764,334.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$

75,020,046,680.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$

433,891,811,014.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de de fecha Diciembre 2025	OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
85	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		\$ 1,057	\$ -	399,331.70	\$ 422,093,607.00		\$ -	286,763.10	\$ 303,108,597.00
86	662.2P			Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).	m		\$ 1,098,470	\$ -	168.00	\$ 184,542,960.00		\$ -	136.90	\$ 150,380,543.00
87	8P	anual de Señalización Vial 20		Suministro e instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1,20m X 0,75m con lámina retrorreflexiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y retrorreflexiva Tipo XI).	u		\$ 1,298,836	\$ -	152.00	\$ 197,423,072.00	6.00	\$ 7,793,016.00	63.00	\$ 81,826,668.00
				Ajustes al peso						\$ (1.00)				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	\$ 305,189,938,913.00	\$ 363,782,710,736.00	\$ 4,980,455,109.00	\$ 163,344,803,009.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 41,440,096,041.00	\$ 51,541,253,475.00	\$ -	\$ 45,195,421,879.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	\$ 1,080,000,000.00	\$ 1,080,000,000.00	\$ -	\$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 347,710,034,954.00	\$ 416,403,964,211.00	\$ 4,980,455,109.00	\$ 208,540,024,887.00
VALOR IVA (OBRAS) (E)	\$ 1,524,574,769.00	\$ 1,825,771,229.00	\$ 21,837,380.00	\$ 914,367,802.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	\$ 349,234,609,723.00	\$ 418,229,735,440.00	\$ 5,002,292,489.00	\$ 209,454,392,689.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$ 1,281,000,000.00	\$ 1,281,000,000.00	\$ -	\$ 1,288,877,959.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$ 243,390,000.00	\$ 243,390,000.00	\$ -	\$ 241,048,812.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	\$ 1,524,390,000.00	\$ 1,524,390,000.00	\$ -	\$ 1,509,726,771.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)	\$ -	\$ 4,279,765,515.00	\$ 149,449,611.00	\$ 3,550,628,141.00
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)	\$ -	\$ 813,155,448.00	\$ 28,395,426.00	\$ 674,619,347.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)	\$ -	\$ 5,092,920,963.00	\$ 177,845,037.00	\$ 4,225,247,488.00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)	\$ 7,772,764,611.00	\$ 8,704,674,611.00	\$ -	\$ 3,675,322,500.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	\$ 340,000,000.00	\$ 340,000,000.00	\$ -	\$ 1,985,425.00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+M)	\$ 358,871,764,334.00	\$ 433,891,811,014.00	\$ 5,180,137,526.00	\$ 218,866,674,873.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AJU	30 %		
Utilidad	3 %		
		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		\$ 31,009,208,054.00	7.10%
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 268,249,692.00	5.39%
Valor Amortizado Acumulado		\$ 19,793,915,634.00	63.83%
Valor Saldo por Amortizar		\$ 11,215,292,420.00	36.17%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 4,980,455,109.00	\$ 21,837,380.00	\$ 5,002,292,489.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O ATÍPICOS	\$ 149,449,611.00	\$ 28,395,426.00	\$ 177,845,037.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 5,129,904,720.00	\$ 50,232,806.00	\$ 5,180,137,526.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)		
G. P. P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 88,717,632.00	\$ 12,487,113,741.00
SB	\$ 710,406,000.00	\$ 11,931,552,000.00
B	\$ 242,452,780.00	\$ 28,852,971,280.00
P	\$ 3,297,302,109.00	\$ 70,428,014,184.00
OA	\$ 274,007,111.00	\$ 27,917,556,193.00
SCT	\$ 352,361,537.00	\$ 3,186,251,722.00
OV	\$ -	\$ 786,872,005.00
T	\$ 15,207,940.00	\$ 7,754,271,884.00
TOTAL	\$ 4,980,455,109.00	\$ 163,344,803,009.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)		
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE, ICOCIV Vías Interurbanas		
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y explanación	\$ 116,096,725.00	\$ 10,331,578,237.00
2. Afirmados, subbases y bases	\$ 952,858,780.00	\$ 43,078,825,153.00
3. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 3,297,302,109.00	\$ 68,270,309,373.00
4. Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 116,084,050.00	\$ 17,716,916,006.00
5. Obras de urbanismo	\$ -	\$ -
6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 9,040,362.00	\$ 4,593,134,220.00
7. Señalización y control de tránsito	\$ 352,361,537.00	\$ 3,186,251,722.00
8. Transporte y sobre acarreo	\$ 15,207,940.00	\$ 7,754,271,884.00
TOTAL	\$ 4,858,951,503.00	\$ 154,931,286,595.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

6

4

2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

ACTA No.

58

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

5,129,904,720.00

MES

mar-2026

ACTA FINAL

CONTRATO No :

973 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

102 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

99 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

25-jun-2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31-ago-2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

T. BOYACÁ LCP S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$

358,871,764,334.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$

75,020,046,680.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$

433,891,811,014.00

No. DE ORDEN

GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV

ESPECIFICACIÓN

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de

Modificación No. 14

de fecha Diciembre 2025

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

GRAL.

DESCRIPCIÓN ÍTEM

UND

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanación	\$ 32,927,891.00	\$ 45,728,330.00
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	\$ -	\$ -
3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases	\$ -	\$ 2,157,704,811.00
4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	\$ -	\$ 19,856,300.00
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito	\$ 32,988,800.00	\$ 205,262,080.00
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$ -	\$ -
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -
8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -
9. Estabilización de terreno	\$ -	\$ -
10. Señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 65,916,691.00	\$ 2,428,551,521.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y cimentación	\$ 25,686,308.00	\$ 3,030,145,173.00
2. Subestructura y cimentación	\$ 10,953,913.00	\$ 2,425,568,313.00
3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ 18,946,694.00	\$ 529,051,407.00
4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -
5. Drenajes	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 55,586,915.00	\$ 5,984,764,893.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 88,717,632.00	\$ 10,192,811,868.00
2 Sub-bases y bases	\$ 952,858,780.00	\$ 40,784,523,280.00
3 Transporte de materiales	\$ 15,207,940.00	\$ 7,777,966,444.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 239,244,259.00	\$ 5,525,155,866.00
5 Concretos, morteros y obras varias	\$ 162,683,436.00	\$ 20,105,291,430.00
6 Concreto para estructura de puentes	\$ 10,953,913.00	\$ 2,427,186,093.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 3,510,789,149.00	\$ 76,531,668,028.00
TOTAL	\$ 4,980,455,109.00	\$ 163,344,603,009.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$

5,129,904,720.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$

4,861,655,028.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$

4,911,887,834.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Novecientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre SEÑOR HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista: T. BOYACÁ LCP S.A.S.

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO AFINCO-FR-12

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: **973 DE 2021**

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 58	Marzo 2026
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO \$ -
No. COMPROMISO 926425	RUBRO No. 2401-0600-74-51102D-2401029-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO \$ 4,911,887,834
TOTAL ACTA			\$ 4,911,887,834

NOTA:

1. El valor total del acta es de \$ 5180.137.526 se descuenta \$268.249.692 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de \$ 4911.887.834

MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No: 01198-0489 CPITVC

	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFIN-FR-5	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: T.BOYACÁ LCP S.A.S.
 Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
 Acta de Obra N°: 58 Valor básico \$ 5,129,904,720 Período: Marzo 2026
 Valor Incluido IVA \$ 5,180,137,526

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	Puerto Boyacá	\$ 226,763,606	\$ -	\$ -	\$ 226,763,606
2	6006	Dos y Medio - Otanche	\$ 1,953,709,099	\$ 115,298,637	\$ 18,801,018	\$ 2,087,808,754
3	6007	Otanche - Chiquinquirá	\$ 360,791,563	\$ -	\$ 1,465,254,611	\$ 1,826,046,174
4	6008	Chiquinquirá - Tunja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6009	Tunja - Páez	\$ 208,344,512	\$ 62,546,400	\$ 768,628,080	\$ 1,039,518,992
						\$ -
						\$ -
TOTALES			\$ 2,749,608,780	\$ 177,845,037	\$ 2,252,683,709	\$ 5,180,137,526

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ 2,234,337,233	\$ 2,209,112,867
891801362-1	Otanche	Boyacá	\$ 80,235,127	\$ 77,449,594
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	\$ 3,289,352	\$ 3,274,992
891801368-5	Pauna	Boyacá	\$ 1,822,756,822	\$ 1,814,799,624
800024789-8	Maripí	Boyacá	\$ -	\$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	\$ -	\$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	\$ -	\$ -
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	\$ -	\$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	\$ -	\$ -
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	\$ -	\$ -
800019846-1	Sáchica	Boyacá	\$ -	\$ -
800016757-9	Samacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891802089-1	Cucaita	Boyacá	\$ -	\$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	\$ -	\$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	\$ -	\$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	\$ -	\$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	\$ -	\$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	\$ -	\$ -
891801770-3	Rondón	Boyacá	\$ 184,776,178	\$ 174,256,187
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	\$ 75,544,590	\$ 75,214,802
800029660-1	Miraflores	Boyacá	\$ 10,570,144	\$ 10,524,000
800099390-5	Berbeo	Boyacá	\$ 92,994,766	\$ 92,588,800
800049508-3	Páez	Boyacá	\$ 675,633,314	\$ 672,683,854
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA			\$ 5,180,137,526	\$ 5,129,904,720

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



Nombre SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.
 Matrícula: 05202-66520 ANT



Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
 Matrícula: N/A

PAGADO 13/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	T BOYACA LCP SAS				
Documento	NI902003281			Dirección	CR 70F #127 A - 90
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	6041111
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO			Identificación	CC 71714292
Total Afiliados	152			ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días APP	Días EPS	Días APP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002580818	SEBASTIAN ALEXANDER LLANOS PATIÑO	01	00	X															0	18	18	18	18			(230201) PROTECCION	\$ 1.050.543	\$ 168.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.050.543	\$ 42.100	6,960	\$ 1.050.543	\$ 73.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.050.543	\$ 42.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.500	
CC 1002604414	JUAN DIEGO MARIÑO ANZOLA	01	00	X															0	3	3	3	3			(230301) PORVENIR	\$ 175.091	\$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 175.091	\$ 7.100	6,960	\$ 175.091	\$ 12.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 175.091	\$ 7.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.500	
CC 1002623248	DILFER ARLEY GALINDO CASTRO	01	00	X								X							0	20	20	20	20			(230201) PROTECCION	\$ 1.306.545	\$ 209.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.306.545	\$ 52.300	6,960	\$ 1.306.545	\$ 91.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.306.545	\$ 52.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 404.700	
CC 1002624418	EDDY ELIAN ROJAS CASTELLANOS	01	00									X							0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 2.344.364	\$ 375.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.344.364	\$ 93.800	6,960	\$ 2.344.364	\$ 163.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.344.364	\$ 93.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 725.900	
CC 1002674499	ANGER ZAMIR MORENO ROMERO	01	00									X							0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 2.158.785	\$ 345.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 2.158.785	\$ 86.400	6,960	\$ 2.158.785	\$ 150.300	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.158.785	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 668.600	
CC 1002674500	LINA PAOLA MORENO ROMERO	01	00	X								X							0	29	29	29	29			(230301) PORVENIR	\$ 1.861.663	\$ 297.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.861.663	\$ 74.500	6,960	\$ 1.861.663	\$ 129.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.861.663	\$ 74.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.500	
CC 1002702934	JUAN DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00																0	29	29	29	29			(230301) PORVENIR	\$ 1.692.542	\$ 270.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.692.542	\$ 67.800	6,960	\$ 1.692.542	\$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.692.542	\$ 67.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.400	
CC 1002702934	JUAN DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00													L			0	1	1	1	1			(230301) PORVENIR	\$ 58.364	\$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 58.364	\$ 2.400	0,000	\$ 58.364	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 58.364	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.200	
CC 1003123220	MAHER ZULETA QUINTERO	01	00									X							0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 4.024.775	\$ 644.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 4.024.775	\$ 161.000	6,960	\$ 4.024.775	\$ 280.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.024.775	\$ 161.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.246.200	
CC 1003698223	CAMILO ANDRES DONATO VARGAS	01	00	X															0	3	3	3	3			(230301) PORVENIR	\$ 175.091	\$ 28.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 175.091	\$ 7.100	6,960	\$ 175.091	\$ 12.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 175.091	\$ 7.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.500	
CC 1005564857	JOSE MAURICIO GONZALEZ ALVARADO	01	00	X								X							0	22	22	22	22			(230301) PORVENIR	\$ 2.999.579	\$ 480.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.999.579	\$ 120.000	6,960	\$ 2.999.579	\$ 208.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.999.579	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	
CC 1007134193	ENRIQUE DE JESUS CABRERA FUENTES	01	00																0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	
CC 1007202192	ERIKA MARCELA GUERRERO VARON	01	00									X							0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.923.125	\$ 307.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.923.125	\$ 77.000	6,960	\$ 1.923.125	\$ 133.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.923.125	\$ 77.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.600	
CC 1007391401	JHON SEBASTIAN IRREÑO BARAHONA	01	00	X								X							0	28	28	28	28			(230301) PORVENIR	\$ 1.644.125	\$ 263.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.644.125	\$ 65.800	6,960	\$ 1.644.125	\$ 114.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.644.125	\$ 65.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.200	
CC 1010124055	JEISON ANDRES CASTRO ROMERO	01	00								X	X							0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 2.558.455	\$ 409.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 2.558.455	\$ 102.400	6,960	\$ 2.558.455	\$ 178.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.558.455	\$ 102.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 792.300	
CC 1015428422	ANDRES FELIPE SANCHEZ CHAVERRA	01	00																0	30	30	30	30			(230201) PROTECCION	\$ 3.130.000	\$ 500.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.130.000	\$ 125.200	6,960	\$ 3.130.000	\$ 217.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.130.000	\$ 125.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 969.100	
CC 1017249673	BRAYAN ESTEBAN DELGADO HINCAPIE	01	00									X							0	30	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.929.974	\$ 308.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.929.974	\$ 77.200	6,960	\$ 1.929.974	\$ 134.400	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.929.974	\$ 77.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 597.600	
CC 10175482	ARIEL DURAN GONZALEZ	01	00	X								X							0	27	27	27	27			(230301) PORVENIR	\$ 1.839.440	\$ 294.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.839.440	\$ 73.600	6,960	\$ 1.839.440	\$ 128.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.839.440	\$ 73.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.700	
CC 10184062	PEDRO DANILO TRIANA HERNANDEZ	01	00	X															0	5	5	5	5			(25-14) COLPENSIONES	\$ 376.000	\$ 60.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 376.000	\$ 15.100	6,960	\$ 376.000	\$ 26.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 376.000	\$ 15.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.600	

Pagado: 13/03/2026

Empresa NI902003281 T BOYACA
LCP SAS

Planilla Nro: 84234877

Periodo Cotización: febrero de 2026

Periodo Servicio: marzo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAP	TAP	VSP	COR	U	U	U	U	U	U	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018457875	JEFFREY SEBASTIAN MELO CORDOBA	01	00																			0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 5.153.000	\$ 824.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 5.153.000	\$ 206.200	6,960	\$ 5.153.000	\$ 358.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 5.153.000	\$ 206.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.595.600	
CC 10188491	JUAN CARLOS GRISALES MAHECHA	01	00							X	X											0	30	30	30	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 3.545.475	\$ 567.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.545.475	\$ 141.900	6,960	\$ 3.545.475	\$ 246.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.545.475	\$ 141.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.900	
CC 1019032327	WALTER LUILLY RUIZ RAMIREZ	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.077.159	\$ 332.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.077.159	\$ 83.100	6,960	\$ 2.077.159	\$ 144.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.077.159	\$ 83.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 643.200	
CC 1022434092	YESID ROJAS CAÑIZARES	01	00	X																		0	18	18	18	(230301)	PORVENIR	\$ 1.050.543	\$ 168.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.050.543	\$ 42.100	6,960	\$ 1.050.543	\$ 73.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.050.543	\$ 42.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.500	
CC 1024502941	MIGUEL ANGEL JARAMILLO SAMPEDRO	01	00	X							X											0	28	28	28	(230301)	PORVENIR	\$ 1.907.140	\$ 305.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.907.140	\$ 76.300	6,960	\$ 1.907.140	\$ 132.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.907.140	\$ 76.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 590.600	
CC 1030521591	JUAN CARLOS VANEGAS MORENO	01	00								X											0	30	30	30	(231001)	COLFONDOS	\$ 2.283.541	\$ 365.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.283.541	\$ 91.400	6,960	\$ 2.283.541	\$ 159.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.283.541	\$ 91.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 707.200	
CC 1036134023	ANNY YISNEY CIRO MACARENO	01	00																			0	30	30	30	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 2.124.000	\$ 339.900	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 2.124.000	\$ 85.000	6,960	\$ 2.124.000	\$ 147.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.124.000	\$ 85.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 657.800	
CC 1036222427	JHON EDUER CIFUENTES VALENCIA	01	00								X											0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 3.051.350	\$ 488.300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.051.350	\$ 122.100	6,960	\$ 3.051.350	\$ 212.400	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.051.350	\$ 122.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 944.900	
CC 1039684321	FABIAN ANDRES GOMEZ SEPULVEDA	01	00	X							X											0	29	29	29	(230301)	PORVENIR	\$ 1.801.973	\$ 288.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.801.973	\$ 72.100	6,960	\$ 1.801.973	\$ 125.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.801.973	\$ 72.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 558.100	
CC 1039706184	ANDRES FELIPE FRANCO PASOS	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.797.569	\$ 447.700	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 2.797.569	\$ 112.000	6,960	\$ 2.797.569	\$ 194.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.797.569	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.500	
CC 1049656277	JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO	01	00																			0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600	
CC 1051210644	RITA SAMACA FRESNO	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.830.490	\$ 292.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.830.490	\$ 73.300	6,960	\$ 1.830.490	\$ 127.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.830.490	\$ 73.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.000	
CC 1052217039	EDWIN FLORIAN JIMENEZ	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.618.498	\$ 419.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.618.498	\$ 104.800	6,960	\$ 2.618.498	\$ 182.300	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.618.498	\$ 104.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 810.900	
CC 1052391984	NACIM YANINE ACERO ACERO	01	00																			0	30	30	30	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 4.350.000	\$ 696.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 4.350.000	\$ 174.000	6,960	\$ 4.350.000	\$ 302.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.350.000	\$ 174.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.346.800	
CC 1053329677	LIZETH DAYANA CORTES GUALTEROS	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.790.697	\$ 286.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.790.697	\$ 71.700	6,960	\$ 1.790.697	\$ 124.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.790.697	\$ 71.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 554.700	
CC 1053339460	JOHN ALEXANDER CAÑON NEIZA	01	00							X	X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.109.995	\$ 337.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 2.109.995	\$ 84.400	6,960	\$ 2.109.995	\$ 146.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.109.995	\$ 84.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 653.300	
CC 1053684180	EDWARD SANTIAGO PARRA JIMENEZ	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.830.490	\$ 292.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.830.490	\$ 73.300	6,960	\$ 1.830.490	\$ 127.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.830.490	\$ 73.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.000	
CC 1053684367	LEIDY PAOLA IBAÑEZ MARTINEZ	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.830.490	\$ 292.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.830.490	\$ 73.300	6,960	\$ 1.830.490	\$ 127.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.830.490	\$ 73.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.000	
CC 1053684504	JOSE ALEXANDER WILCHES FARIAS	01	00	X																		0	7	7	7	(230301)	PORVENIR	\$ 408.545	\$ 65.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 408.545	\$ 16.400	6,960	\$ 408.545	\$ 28.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 408.545	\$ 16.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.700	
CC 1053836400	MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA	01	00																			0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 3.708.000	\$ 593.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.708.000	\$ 148.400	6,960	\$ 3.708.000	\$ 258.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.708.000	\$ 148.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.200	
CC 1054538383	ALEJANDRA AZUCENA VERA OSORIO	01	00																			0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.861.000	\$ 297.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.861.000	\$ 74.500	6,960	\$ 1.861.000	\$ 129.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.861.000	\$ 74.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.400	
CC 1054539703	GUSTAVO ADOLFO DIAZ GAVIRIA	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.824.522	\$ 292.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.824.522	\$ 73.000	6,960	\$ 1.824.522	\$ 127.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.824.522	\$ 73.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 565.000	
CC 1054542450	OSWALDO RAMIREZ VARGAS	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.352.578	\$ 376.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 2.352.578	\$ 94.200	6,960	\$ 2.352.578	\$ 163.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.352.578	\$ 94.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 728.700	
CC 1054552172	DARWIN ALVARO GONZALEZ AGUDELO	01	00								X											0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.780.749	\$ 285.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.780.749	\$ 71.300	6,960	\$ 1.780.749	\$ 124.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.780.749	\$ 71.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.600	
CC 1054566433	IVAN ALEJANDRO VERA OSORIO	01	00	X							X											0	26	26	26	(230301)	PORVENIR	\$ 2.279.492	\$ 364.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.279.492	\$ 91.200	6,960	\$ 2.279.492	\$ 158.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.279.492	\$ 91.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 705.900	
CC 1055246594	JOHN JAIRO MURCIA	01	00																			0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	
CC 105551836	OSCAR ALBERTO PADILLA ROJAS	01	00							X	X																																	

Periodo Servicio: marzo de 2026

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	PRE	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	UST	SIN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1056769743	JESUS ANTONIO USUGA USUGA	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 3.169.318	\$ 507.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.169.318	\$ 126.800	6,960	\$ 3.169.318	\$ 220.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.169.318	\$ 126.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 981.300	
CC 1056770155	LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.171.591	\$ 347.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.171.591	\$ 86.900	6,960	\$ 2.171.591	\$ 151.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.171.591	\$ 86.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.500	
CC 1056770370	DANIEL ARTURO OSPINA HENAO	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.830.491	\$ 292.900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.830.491	\$ 73.300	6,960	\$ 1.830.491	\$ 127.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.830.491	\$ 73.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.000	
CC 1056774548	VICTOR BARRAGAN ARIAS	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.760.852	\$ 281.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.760.852	\$ 70.500	6,960	\$ 1.760.852	\$ 122.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.760.852	\$ 70.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 545.400	
CC 1056775483	JULIETH PAOLA CONTRERAS TOVAR	01	00	X								X							0	13	13	13	13	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 880.891	\$ 141.000	(EP-S041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 880.891	\$ 35.300	6,960	\$ 880.891	\$ 61.400	(CCF10) COMFABOY	\$ 880.891	\$ 35.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.000	
CC 1056776710	VICTOR JULIO GUZMAN CANOLA	01	00																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600	
CC 1056778308	CESAR TIBERIO BERNAL RODRIGUEZ	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.902.556	\$ 304.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.902.556	\$ 76.200	6,960	\$ 1.902.556	\$ 132.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.902.556	\$ 76.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 589.400	
CC 1056780335	JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 2.354.114	\$ 376.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.354.114	\$ 94.200	6,960	\$ 2.354.114	\$ 163.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.354.114	\$ 94.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 729.000	
CC 1056785151	MIGUEL ANGEL CARTAGENA TREJOS	01	00	X								X							0	24	24	24	24	(230301)	PORVENIR	\$ 1.506.625	\$ 241.100	(EP-S041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.506.625	\$ 60.300	6,960	\$ 1.506.625	\$ 104.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.506.625	\$ 60.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 466.600	
CC 1056786778	JUAN DANIEL SUAREZ CAÑAS	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.860.336	\$ 297.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.860.336	\$ 74.500	6,960	\$ 1.860.336	\$ 129.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.860.336	\$ 74.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.200	
CC 1057410022	YIMI FERNANDO GALINDO GRANADOS	01	00	X								X							0	13	13	13	13	(25-14)																		

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Periodo Servicio: marzo de 2026

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	USP	COR	UST	ICE	LMA	VAC	AVP	UPT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARS	Días CCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112476078	JANER MESIAS GUAZA GONZALEZ		01	00	X								X						0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	\$ 1.432.242	\$ 229.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.432.242	\$ 57.300	6,960	\$ 1.432.242	\$ 99.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.432.242	\$ 57.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 443.500
CC 1116724048	JOSE ANTONIO PESCADOR ALZATE		01	00	X								X						0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 729.924	\$ 116.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 729.924	\$ 29.200	6,960	\$ 729.924	\$ 50.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 729.924	\$ 29.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226.100
CC 1117547523	ANGELICA MARIA RICAURTE MUÑOZ		01	00									X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.863.636	\$ 458.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.863.636	\$ 114.600	6,960	\$ 2.863.636	\$ 199.400	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.863.636	\$ 114.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.800
CC 11185056	WALTER LAVESI LOPEZ MORALES		01	00															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 4.880.000	\$ 780.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 4.880.000	\$ 195.200	6,960	\$ 4.880.000	\$ 339.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.880.000	\$ 195.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.510.900
CC 1118801937	HAROLD EMIR ZUÑIGA ORTIZ		01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.869.319	\$ 459.100	(CCFC55) PROTEGER EPS	\$ 2.869.319	\$ 114.800	6,960	\$ 2.869.319	\$ 199.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.869.319	\$ 114.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 888.500
CC 1118810087	YEIN ENRIQUE TAPIA PALMEZANO		01	00									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.588.330	\$ 414.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.588.330	\$ 103.600	6,960	\$ 2.588.330	\$ 180.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.588.330	\$ 103.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 801.600
CC 1121873710	BRAYAN ARLEY CAMACHO ANZOLA		01	00									X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.259.462	\$ 361.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.259.462	\$ 90.400	6,960	\$ 2.259.462	\$ 157.300	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.259.462	\$ 90.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 699.700
CC 11343794	JORGE GUSTAVO ESCANDON GONZALEZ		01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.838.000	\$ 774.100	(EPS005) EPS SANTAS	\$ 4.838.000	\$ 193.600	6,960	\$ 4.838.000	\$ 336.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.838.000	\$ 193.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.498.100
CC 11812134	SILVIO MOSQUERA BERRIO		01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.248.000	\$ 679.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 4.248.000	\$ 170.000	6,960	\$ 4.248.000	\$ 295.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.248.000	\$ 170.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.315.400
CC 1193255109	ELKIN ESNEIDER HERNANDEZ MOLANO		01	00	X														0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 291.818	\$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 291.818	\$ 11.700	6,960	\$ 291.818	\$ 20.400	(CCF10) COMFABOY	\$ 291.818	\$ 11.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.500
CC 1233690646	PAULA VALENTINA ORTIZ CORTES		01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 5.153.000	\$ 824.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 5.153.000	\$ 206.200											

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 13/03/2026

Empresa NI902003281 T BOYACA
LCP SAS

Planilla Nro: 84234877

Periodo Cotización: febrero de 2026

Periodo Servicio: marzo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SEN	IGE	LMA	VLC	VAP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7254014	CESAR AUGUSTO RESTREPO CADAVID	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.897.727	\$ 463.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.897.727	\$ 116.000	6,960	\$ 2.897.727	\$ 201.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.897.727	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 897.400	
CC 7254258	SERGIO JARAMILLO	01	00	X																	0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	\$ 1.050.543	\$ 168.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.050.543	\$ 42.100	6,960	\$ 1.050.543	\$ 73.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.050.543	\$ 42.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.500	
CC 7254512	CRISTIAN HERNAN GUTIERREZ OSPINA	01	00	X									X								0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	\$ 1.579.859	\$ 252.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.579.859	\$ 63.200	6,960	\$ 1.579.859	\$ 110.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.579.859	\$ 63.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 489.200	
CC 7255190	EDGAR ROJAS MEJIA	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.860.335	\$ 297.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.860.335	\$ 74.500	6,960	\$ 1.860.335	\$ 129.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.860.335	\$ 74.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.200	
CC 7315233	JOSE JOAQUIN LANCHEROS SUAREZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.089.147	\$ 334.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.089.147	\$ 83.600	6,960	\$ 2.089.147	\$ 145.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.089.147	\$ 83.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 647.000	
CC 7316867	MAURICIO ADOLFO ARGUELLO NEIZA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.007.955	\$ 321.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 2.007.955	\$ 80.400	6,960	\$ 2.007.955	\$ 139.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.007.955	\$ 80.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621.900	
CC 74185487	OSCAR BARBOSA TORRES	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 79389429	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 15.960.000	\$ 2.713.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 15.960.000	\$ 638.400	6,960	\$ 15.960.000	\$ 1.110.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 15.960.000	\$ 638.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.100.900	
CC 79452603	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ PORRAS	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 5.473.000	\$ 875.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 5.473.000	\$ 219.000	6,960	\$ 5.473.000	\$ 381.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 5.473.000	\$ 219.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.694.700	
CC 79488329	JOSE FERNANDO PESCADOR NUÑEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.296.000	\$ 687.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 4.296.000	\$ 171.900	6,960	\$ 4.296.000	\$ 299.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.296.000	\$ 171.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.330.300	
CC 79967731	LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.497.500	\$ 399.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.497.500	\$ 99.900	6,960	\$ 2.497.500	\$ 173.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.497.500	\$ 99.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.300	
CC 80065332	PEDRO DANIEL GUZMAN RUBIANO	01	00	X																	0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.800.000	\$ 608.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.800.000	\$ 152.000	6,960	\$ 3.800.000	\$ 264.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.800.000	\$ 152.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.176.500	
CC 80103879	BREITNER JOHAN PULGARIN ZULUAGA	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 4.317.000	\$ 690.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.317.000	\$ 172.700	6,960	\$ 4.317.000	\$ 300.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.317.000	\$ 172.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.336.700	
CC 84070631	RODOMIRO ARCANGEL MATIAS CARMONA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.200.000	\$ 672.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 4.200.000	\$ 168.000	6,960	\$ 4.200.000	\$ 292.400	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.200.000	\$ 168.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300.400	
CC 8439159	JESUS ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	01	00	X																	0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 509.000	\$ 81.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 509.000	\$ 20.400	6,960	\$ 509.000	\$ 35.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 509.000	\$ 20.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.800	
CC 8527406	EFRAIN MERCADO ALCAZAR	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.001.000	\$ 640.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 4.001.000	\$ 160.100	6,960	\$ 4.001.000	\$ 278.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.001.000	\$ 160.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.238.900	
CC 91044471	WILLSON MEJIA RUIZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.024.750	\$ 324.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.024.750	\$ 81.000	6,960	\$ 2.024.750	\$ 141.000	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.024.750	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 627.000	
CC 91110589	JULIO ENRIQUE GONZALEZ PINTO	01	00	X																	0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 1.145.600	\$ 183.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.145.600	\$ 45.900	6,960	\$ 1.145.600	\$ 79.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.145.600	\$ 45.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.900	
CC 93131145	ARNULFO CORONADO SANCHEZ	01	00	X																	0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	\$ 1.326.833	\$ 212.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.326.833	\$ 53.100	6,960	\$ 1.326.833	\$ 92.400	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.326.833	\$ 53.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.900	
CC 93337655	HECTOR HERRERA SANCHEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.355.113	\$ 696.900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 4.355.113	\$ 174.300	6,960	\$ 4.355.113	\$ 303.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.355.113	\$ 174.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.348.700	
CC 9499211	HUGO NORVAIRO BERNAL LOPEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.290.909	\$ 526.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.290.909	\$ 131.700	6,960	\$ 3.290.909	\$ 229.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 3.290.909	\$ 131.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.019.100	
CC 98138532	NAIRO ANCIZAR MORA ERASO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.473.909	\$ 395.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 2.473.909	\$ 99.000	6,960	\$ 2.473.909	\$ 172.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.473.909	\$ 99.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 766.100	
CC 98652444	ELIAS FRANCISCO MACIAS HERNANDEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.995.364	\$ 479.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.995.364	\$ 119.900	6,960	\$ 2.995.364	\$ 208.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.995.364	\$ 119.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 927.600	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 366.821.212	\$ 366.821.212	\$ 366.821.212	\$ 366.659.835	\$ 58.940.500	\$ 14.680.500	\$ 25.450.700	\$ 14.631.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.703.000	\$ 0	\$ 113.703.000





Bogotá, 6 de abril de 2026

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD T BOYACÁ LCP S.A.S CERTIFICA:


Que la sociedad T. BOYACÁ LCP S.A.S., identificada con NIT 902.003.281-9, respecto del personal propio y del personal que de manera directa o indirecta ha ejecutado actividades relacionadas con el desarrollo de las obras derivadas del Contrato de Obra No. 973 de 2021, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales y de seguridad social que legalmente le corresponden y que resultan exigibles a la fecha de expedición de la presente certificación.

Lo anterior comprende, según corresponda, el cumplimiento de obligaciones relacionadas con salarios, prestaciones sociales, afiliaciones, cotizaciones, aportes y demás obligaciones laborales y las derivadas del Sistema de Seguridad Social Integral, de los aportes parafiscales, incluyendo aquellas relativas a salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y demás conceptos que legalmente resulten aplicables.

Es de aclarar que la fecha límite de la liquidación de los aportes, está establecida para el 13° día hábil de cada mes.

La presente certificación se expide bajo juramento, en los términos de la información laboral y documental bajo responsabilidad de la sociedad y con observancia de los plazos legales de exigibilidad aplicables a cada obligación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,


Sergio Humberto Ramirez Arroyave
Representante Legal
T. BOYACÁ LCP S.A.S.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
GRUPO LATAM 2010 DE 2015 A 2017 / 5 Años

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 51,299,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 902003281
Correo Usuario Pagador : infopagos@latincosa.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 186.97.130.140
Fecha y Hora: 10/04/2026 05:20:03-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
159982743	213510592 APROBADA	BANCO DE BOGOTA	\$ 51,299,000.00



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Desde la Ley 30 de 1992 y la Ley 1712 de 2014

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

159982743

Fecha y Hora

10/04/2026
05:20:03-p.m.


Resumen Servicio


Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 51,299,000.00	COP \$ 51,299,000.00


Referencias


Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
NIT	902003281
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
TRANSVERSAL DE BOYACA	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
INVIAS - 800215807	973
Vigencia	Base Gravable
2021	5129904720

  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla			7859172	
Contratista:	TRANSVERSAL DE BOYACA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	902003281			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - BAEZ) DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN MARCO DE LA			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
  N° 7859172	Numero de Contrato:	973	Vigencia:	2021
	Base Gravable	\$5129904720	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 51,299,000.00
	Fecha de Pago:	10/04/2026 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141224700357			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122470035 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 2 0 0 3 2 8 1		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
T. BOYACA LCP S.A.S.							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 70 F NO. 127 A 90							
42. Correo electrónico NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM							
43. Código postal		44. Teléfono 1		6 0 4 6 0 4 0 1 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 1 0		2 0 2 5, 1 0, 2 2		50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 8 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta							
08- Retención timbre nacional							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
52- Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141224700357			
 (415)7707212489984(8020) 000014122470035 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 2 0 0 3 2 8 1		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número		0				1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 5 1 0 2 7				83. Nacional público	
74. Número de notaría						1 0 0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 2 5 1 0 2 9				0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 4 0 2 9 2 5 7				85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde						87. Extranjero privado	
81. Hasta						0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	7 9	2 0 2 5 1 2 0 9		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141224700357			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122470035 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 2 0 0 3 2 8 1		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 1 0 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141224700357			
 (415)7707212489984(8020) 000014122470035 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 2 0 0 3 2 8 1				Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 0 7 6 5 8 8 2 1		1		3 2 2 8 4 9 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	GOMEZ		TORRES		DAVINSON		
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 5 1 2 1 0							

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-N-3-FR-6						
										VERSIÓN		1						
										PÁGINA		1	DE	2				
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		58				FECHA				30 MARZO 2026 (Día / Mes / Año)				
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		973 DE 2021				
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Boyacá										No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		962 DE 2021				
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		2 AGOSTO 2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES		
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M B	I T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJE. MES	VALOR BÁSICO EJE. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJE. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **		VALOR POR EJECUTAR (\$)	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerios e Hidratación	Und	1000	\$6,000	\$ 6,000,000	X		\$ 6,178,500		\$	2.5%	\$		451.13	\$ 2,787,125	\$ 3,391,375		
	Alquiler de sillas	Und	1000	\$1,500	\$ 1,500,000	X		\$ 1,544,625		\$	- 2.5%	\$	-	0.00	\$	- \$ 1,544,625		
	Alquiler de mesas	Und	250	\$7,000	\$ 1,750,000	X		\$ 1,802,063		\$	- 2.5%	\$	-	0.00	\$	- \$ 1,802,063		
	Transporte para sillas y mesas ida y vuelta	Und	301	\$4,000	\$ 1,204,000	X		\$ 1,239,819		\$	- 2.5%	\$	-	0.00	\$	- \$ 1,239,819		
	Alquiler de sonido incluye transporte	Und	90	\$1,050,000	\$ 94,500,000	X		\$ 97,311,375	0.00	\$	- 2.5%	\$	-	1.00	\$ 1,081,138	\$ 96,230,237		
	Alquiler de video Beam	Und	100	\$154,000	\$ 15,400,000	X		\$ 15,858,150		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 15,858,150		
	Volantes tamaño 21.5"13.5 cm	Und	1000	\$170	\$ 170,000	X		\$ 170,000		\$	- 0.0%	\$	-	0	\$	- \$ 170,000		
	Pasacalles	Und	57	\$176,000	\$ 10,032,000	X		\$ 10,330,452		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 10,330,452		
	Folleto informativo tamaño 28"42 cm	Und	2000	\$1,372	\$ 2,744,000	X		\$ 2,825,634		\$	- 2.5%	\$	-	0.00	\$	- \$ 2,825,634		
	Cuñas Radiales 30 seg	Und	8000	\$8,000	\$ 64,000,000	X		\$ 65,904,000		\$	- 2.5%	\$	-	1303.	\$ 10,734,114	\$ 55,169,886		
Canillas	Und	1000	\$10,274	\$ 10,274,000	X		\$ 10,579,652		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 10,579,652			
Perifoneo	Hora	1400	\$35,000	\$ 49,000,000	X		\$ 50,457,750		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 50,457,750			
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	Und	1000	\$ 10,000	\$ 10,000,000	X		\$ 10,297,500		\$	2.5%			368.00	\$ 3,789,480	\$ 6,508,020		
	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria Servicio transporte buseta 22 pasajeros	Und	99	\$ 2,500,000	\$ 247,500,000	X		\$ 254,863,125		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 254,863,125		
	Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)	Und	40	\$ 35,700	\$ 1,428,000	X		\$ 1,470,483		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 1,470,483		
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)	Und	300	\$ 25,100	\$ 7,530,000	X		\$ 7,754,018		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 7,754,018		
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)	Und	40	\$ 249,900	\$ 9,996,000	X		\$ 10,293,381		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 10,293,381		
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Obras con participación Comunitaria	Global	1	\$ 592,797,471	\$ 592,797,471	X		\$ 610,433,196		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 610,433,196		
	Ejecución Proyectos Productivos	Global	1	\$ 76,168,475	\$ 76,168,475	X		\$ 78,434,487		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 78,434,487		
GERENCIA DE REGIONES	Línea Turística - Caminatas Ecológicas Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y Pañoletas)□	Und	101	\$ 30,600	\$ 3,090,600	X		\$ 3,182,545		\$	- 2.5%	\$	-	43.79	\$ 11,379,823	-\$ 8,197,278		
	Línea Turística - Gastrotour INVIAS (Vala publicitaria) □	Und	6	\$ 20,000	\$ 120,000	X		\$ 123,570		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 123,570		
	Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias y pelotas) □	Und	100	\$ 75,000	\$ 7,500,000	X		\$ 7,723,125	0.00	\$	- 2.5%	\$	-	70.90	\$ 7,300,928	\$ 422,197		
	Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, pitos, tarjetas) □	Und	20	\$ 401,500	\$ 8,030,000	X		\$ 8,268,893		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 8,268,893		
	Línea Deportiva (medallas) □	Und	40	\$ 4,400	\$ 176,000	X		\$ 181,236	0.00	\$	- 2.5%	\$	-	35.00	\$ 158,585	\$ 22,651		
	Línea Deportiva (Trofeos) □	Und	4	\$ 150,000	\$ 600,000	X		\$ 617,850	0.00	\$	- 2.5%	\$	-	1.89	\$ 291,934	\$ 325,916		
	Línea Deportiva - Premio (Bono de \$ 4,000,000) Categoría Fútbol y Ping Pong □	Und	2	\$ 8,000,000	\$ 16,000,000	X		\$ 16,476,000	0.00	\$	- 2.5%	\$	-	1.00	\$ 8,238,000	\$ 8,238,000		
	Línea Deportiva - (1 mesas de Ping Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de Ping Pong) □	Und	3	\$ 1,660,500	\$ 4,981,500	X		\$ 5,129,700		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 5,129,700		
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (1bicicletas y kit de protección) □	Und	40	\$ 730,000	\$ 29,200,000	X		\$ 30,068,700		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 30,068,700		
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (Camisetas Jersey con reflectivos y casco)	Und	100	\$ 145,000	\$ 14,500,000	X		\$ 14,931,375		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 14,931,375		
Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 chalecos reflectivo)	Und	50	\$ 19,000	\$ 950,000	X		\$ 978,263		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 978,263			
GERENCIA DE REGIONES	Línea Social - Manos a la obra (1 cascos, 1 bota dieléctrica, 1 guante baqueta, y 1 gafa)□	und	70	\$ 69,646	\$ 4,875,220	X		\$ 5,020,258		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 5,020,258		
	Placas conmemorativas para Línea Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)□	Und	12	\$ 77,000	\$ 924,000	X		\$ 951,489		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 951,489		
	Línea Social - Talleres de Embellecimiento y Muralismo- Kit de Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 galones y 1 brocha 4")□	Und	10	\$ 249,500	\$ 2,495,000	X		\$ 2,569,226		\$	- 2.5%	\$	-	0	\$	- \$ 2,569,226		

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPRELAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	2 AGOSTO 2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPRELAL(\$)	8 E X E M	9 T X E M	10 VALOR GESTIÓN SOCIOPRELAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD E.EJEC. MES	11 VALOR BÁSICO E.EJEC. MES (\$)	12 OTROS* (%)	13 VALOR OTROS MES (\$)	14 VALOR MES GESTIÓN SOCIOPRELAL (incluye OTROS*) (\$)	15 CANTIDAD E.EJEC. ACUMUL. **	16 VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	17 VALOR POR EJECUTAR (\$)	
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - UMV-	Global	1	\$ 27,479,811	\$ 27,479,811	x		\$ 28,297,335.38	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 28,297,335		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - TDO	Global	1	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	x		\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV	Global	1	\$ 45,990,778	\$ 45,990,778	x		\$ 47,359,004	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 47,359,004		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO	Global	1	\$ 2,320,000	\$ 2,320,000	x		\$ 2,389,020	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME	Global	1	\$ 10,440,000	\$ 10,440,000	x		\$ 10,750,590	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez - UMV-	Global	1	\$ 83,416,968	\$ 83,416,968	x		\$ 85,898,623	0		2.5%			1	\$ 85,898,623		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez- TDO	Global	1	\$ 2,600,000	\$ 2,600,000	x		\$ 2,677,350	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - UMV-	Global	1	\$ 101,160,560	\$ 101,160,560	x		\$ 104,170,087	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 104,170,087		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - TDO	Global	1	\$ 2,600,000	\$ 2,600,000	x		\$ 2,677,350	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - UMV	Global	1	\$ 97,876,224	\$ 97,876,224			\$ 100,788,042	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 100,788,042		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - TDO	Global	1	\$ 2,600,000	\$ 2,600,000			\$ 2,677,350	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - ARRTO	Global	1	\$ 2,600,000	\$ 2,600,000			\$ 2,677,350	0		2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188M2-D-TU-MCTB Angela Aceneth Morales Henao - UMV	Global	1	\$ 85,127,970	\$ 85,127,970	x		\$ 87,660,527	1	\$ 85,127,970	2.5%	\$	\$	1			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188M2-D-TU-MCTB Angela Aceneth Morales Henao - TDO	Global	1	\$ 2,847,000	\$ 2,847,000	x		\$ 2,931,698	1	\$ 2,847,000	2.5%	\$	\$	1			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Provision Soco-predial UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo	Global	1	\$ 521,343,151	\$ 469,379,311	x		\$ 536,853,110			2.5%						

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	\$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	\$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	\$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	\$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	\$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPRELAL	\$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	1,825,072,414	K	VALOR TOTAL EJEUTADO ACUMULADO	\$	520,104,473
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	2,354,176,887	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	\$	22.48%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
S Representante Legal Contratista Apoderado II

Firma

Nombre: WALTER LOPEZ MORALES
Profesional Social Contratista Matricula Profesional No.: 176435

Firma

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Interventoria Matricula Profesional No.: NA

Firma

Nombre: CECILIA CORTÉS RODRIGUEZ
Profesional Social Interventoria Matricula Profesional No.: 129612

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2.3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	6

				FECHA	6	4	2026
				(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACÁ
-------------------	---	------------------------	--------

CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021	CONTRATISTA:	T. BOYACÁ LCP S.A.S.
MES INFORME MENSUAL:	Marzo 2026	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	962 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
4,628,712,871	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,204,974,344	\$ 659,136,054
	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 3,423,738,527	\$ 68,375,062
28,823,323,054	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	\$ 4,508,775,371	\$ -
		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	\$ 24,314,547,683	\$ -
8,015,328,690	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 7,176,168,955	\$ -
	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 839,159,735	\$ -
15,128,000,000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 15,128,000,000	\$ -
19,272,000,000	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 2	\$ 19,272,000,000	\$ -
727,511,116	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	VIGENCIA EXPIRADA 2021 RP 425821	\$ 659,136,054	\$ -
	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS		\$ 68,375,062	\$ -
37,029,702,970	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 35,498,884,651	\$ -
	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,530,818,319	\$ -
46,287,128,713	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 21,373,605,815	\$ -
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 23,000,000,000	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8				
							VERSION	1				
							PÁGINA	1	DE	6		
							FECHA			6	4	2026
							(Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO							DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ					
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021							CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.					
MES INFORME MENSUAL: Marzo 2026							PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021							INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188					
	(No. 165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,913,522,898	\$ -					
13,500,000,000	(No. 1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 4,352,941,176	\$ -					
	(No. 1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 9,147,058,824	\$ -					
40,416,554,455	(No. 86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 2,234,130,474	\$ -					
	(No. 86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 38,182,423,981	\$ -					
13,124,723,626	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	ADICIÓN No 3	\$ 3,438,009,930	\$ -					
	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 3	\$ 4,596,713,696	\$ -					
	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 3	\$ 2,200,000,000	\$ 2,200,000,000					
	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401020-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	ADICIÓN No 3	\$ 2,890,000,000	\$ -					
13,800,000,000	(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	ADICIÓN No 4	\$ 5,580,000,000	\$ 4,435,394,923					
	(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	ADICIÓN No 4	\$ 8,220,000,000	\$ 8,220,000,000					
48,623,048,139	(No. 283726) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 48,623,048,139	\$ 48,623,048,139					
2,678,932,059	(No. 283726) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 2,678,932,059	\$ 2,678,932,059					
TOTAL						\$ 291,327,454,577	\$ 66,157,375,121					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:						\$ 433,891,811,014.00						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8												
												VERSIÓN		1												
												PÁGINA		1	DE	6										
												FECHA		6	4	2026										
												(Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ														
CONTRATO DE OBRA No:		973 DE 2021										CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.														
MES INFORME MENSUAL:		Marzo 2026										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		962 DE 2021										INTERVENOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																										
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones											
													SI	NO												
1	Parcial	Jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4,628,712,871	\$ 358,871,764,334	110840 25/11/2021	X													
1	Ajustes	Jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4,628,712,871	\$ 358,871,764,334	127279 29/12/2021	X													
2	Parcial	Jul-21	\$ 37,925,826	\$ 166,290	\$ 38,092,116	\$ -	\$ 38,092,116	\$ -		\$ 4,590,620,755	\$ 358,833,672,218	110840 25/11/2021	X													
3	Parcial	ago-21	\$ 333,579,546	\$ 20,673,810	\$ 354,253,356	\$ -	\$ 354,253,356	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4,236,367,399	\$ 358,479,418,862	118914 18/12/2021	X													
2	Ajustes	Jul-21	\$ 520,861	\$ 2,284	\$ 523,145	\$ -	\$ 523,145	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4,235,844,254	\$ 358,478,895,717	127279 01/03/2022	X													
4	Parcial	sep-21	\$ 713,711,394	\$ 13,799,722	\$ 727,511,116	\$ -	\$ 727,511,116	\$ -	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(12/12/2022)	\$ -	\$ 357,751,384,601	15560 24/02/2023	X													
3	Ajustes	ago-21	\$ 2,763,334	\$ 12,116	\$ 2,775,450	\$ -	\$ 2,775,450	\$ -		\$ 4,233,068,804	\$ 357,748,609,151	127277 07/03/2022	X													
5	Parcial	oct-21	\$ 246,010,585	\$ 1,078,662	\$ 247,089,247	\$ -	\$ 247,089,247	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 3,985,979,557	\$ 357,501,519,904	18976 01/03/2022	X													
4	Ajustes	sep-21	\$ 16,117,547	\$ 70,669	\$ 16,188,216	\$ -	\$ 16,188,216	\$ -		\$ 3,969,791,341	\$ 357,485,331,688	127281 24/02/2022	X													
1	Anticipo	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,185,885,000	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 1,783,906,341	\$ 357,485,331,688	109706 24/11/2021	X													
6	Parcial	nov-21	\$ 968,880,492	\$ 4,248,168	\$ 973,128,660	\$ 486,378,007	\$ 486,750,653	\$ 1,699,506,993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 1,297,155,688	\$ 356,512,203,028	125885 28/12/2021	X													
5	Ajustes	oct-21	\$ 4,420,226	\$ 19,381	\$ 4,439,607	\$ -	\$ 4,439,607	\$ 1,699,506,993		\$ 1,292,716,081	\$ 356,507,763,421	19054 01/03/2022	X													
6	Ajustes Provisional	nov-21	\$ 22,581,721	\$ 99,012	\$ 22,680,733	\$ -	\$ 22,680,733	\$ 1,699,506,993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 1,270,035,348	\$ 356,485,082,688	20957 07/03/2022	X													
7	Parcial	dic-21	\$ 2,061,141,235	\$ 166,324,583	\$ 2,227,465,818	\$ 1,699,476,993	\$ 527,988,825	\$ 30,000		\$ 742,046,523	\$ 354,257,616,870	125896 28/12/2023	X													
7	Ajustes Provisional	dic-21	\$ 13,303,929	\$ 58,333	\$ 13,362,262	\$ -	\$ 13,362,262	\$ 30,000		\$ 728,684,261	\$ 354,244,254,608	21007 07/03/2022	X													
7	Ajustes	dic-21	\$ 1,602,624	\$ 7,027	\$ 1,609,651	\$ -	\$ 1,609,651	\$ 30,000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$ 15,126,390,349	\$ 363,065,968,011	141611 12/02/2023	X													
8	Parcial	ene-22	\$ 901,929,125	\$ 3,954,612	\$ 905,883,737	\$ 30,000	\$ 905,853,737	\$ -		\$ 7,109,474,953	\$ 362,160,084,274	41446 02/05/2022	X													
9	Parcial	feb-22	\$ 1,144,639,720	\$ 5,018,805	\$ 1,149,658,525	\$ -	\$ 1,149,658,525	\$ -	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$ 5,959,816,428	\$ 381,010,425,749	51700 24/05/2022	X													
10	Parcial	mar-22	\$ 496,373,075	\$ 2,176,405	\$ 498,549,480	\$ -	\$ 498,549,480	\$ -		\$ 5,461,266,948	\$ 380,511,876,269	52535 25/5/2022	X													
2	Anticipo	abr-22						\$ 4,508,775,371	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$ 24,314,547,683	\$ 380,511,876,269	12834810/02/2022	X													
11	Parcial	abr-22	\$ 1,419,520,822	\$ 6,224,053	\$ 1,425,744,875	\$ 298,099,373	\$ 1,127,645,502	\$ 4,210,675,998	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$ 4,333,621,446	\$ 379,086,131,394	66910 29/06/2022	X													
8	Ajustes Provisional	ene-22	\$ 58,964,704	\$ 258,538	\$ 59,223,242	\$ -	\$ 59,223,242	\$ 4,210,675,998	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$ 28,588,945,887	\$ 379,026,908,152	131000 03/12/2022	X													
9	Ajustes Provisional	feb-22	\$ 88,985,072	\$ 390,165	\$ 89,375,237	\$ -	\$ 89,375,237	\$ 4,210,675,998		\$ 28,499,570,650	\$ 378,937,532,915	131001 05/12/2022	X													
12	Parcial	may-22	\$ 1,860,787,403	\$ 19,797,107	\$ 1,880,584,510	\$ 390,765,355	\$ 1,489,819,155	\$ 3,819,910,643	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$ 2,843,802,291	\$ 377,056,948,405	89194 24/08/2022	X													
13	Parcial	Jun-22	\$ 437,853,878	\$ 2,224,230	\$ 440,078,108	\$ 92,014,750	\$ 348,063,358	\$ 3,727,895,893		\$ 23,966,484,325	\$ 376,616,870,297	94992 08/09/2022	X													
10	Ajustes Provisional	mar-22	\$ 42,702,732	\$ 187,235	\$ 42,889,967	\$ -	\$ 42,889,967	\$ 3,727,895,893		\$ 23,923,594,358	\$ 376,573,980,330	131004 03/12/2022	X													
11	Ajustes Provisional	abr-22	\$ 113,376,511	\$ 497,112	\$ 113,873,623	\$ -	\$ 113,873,623	\$ 3,727,895,893		\$ 23,809,720,735	\$ 376,460,106,707	1063421 14/12/2022	X													
14	Parcial	Jul-22	\$ 1,296,021,421	\$ 5,682,555	\$ 1,301,703,976	\$ 272,164,498	\$ 1,029,539,478	\$ 3,455,731,395	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$ 22,780,181,257	\$ 394,430,402,731	103063 29/09/2022	X													
15	Parcial	ago-22	\$ 2,212,804,286	\$ 18,926,677	\$ 2,231,730,963	\$ 110,640,214	\$ 2,121,090,749	\$ 3,345,091,181		\$ 20,659,090,508	\$ 392,198,671,768	109838 11/10/2022	X													
16	Parcial	sep-22	\$ 2,273,657,335	\$ 9,969,113	\$ 2,283,626,448	\$ 26,147,059	\$ 2,257,479,389	\$ 3,318,944,122		\$ 18,401,611,119	\$ 389,915,045,320	115403 29/10/2022	X													
17	Parcial	oct-22	\$ 2,320,920,585	\$ 21,063,962	\$ 2,341,984,547	\$ 26,690,587	\$ 2,315,293,960	\$ 3,292,253,535	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 727,511,116	\$ 387,573,060,773	130996 05/12/2022	X													
									(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$ 16,087,490,304																

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8									
												VERSIÓN 1									
												PÁGINA 1 DE 6									
												FECHA 6 4 2026 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO														DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ							
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021														CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.							
MES INFORME MENSUAL: Marzo 2026														PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188							
8	Ajustes Definitiva	ene-22	\$	61,550,880	\$	269,877	\$	61,820,757					\$	16,025,669,547	\$	387,511,240,016	142114 27/12/2022	X			
9	Ajustes Definitiva	feb-22	\$	93,085,743	\$	408,145	\$	93,493,888					\$	15,932,175,659	\$	387,417,746,128	142120 27/12/2022	X			
10	Ajustes Definitiva	mar-22	\$	50,152,833	\$	219,901	\$	50,372,734					\$	15,881,802,925	\$	387,367,373,394	142125 27/12/2022	X			
11	Ajustes Definitiva	abr-22	\$	210,628,155	\$	923,523	\$	211,551,678					\$	15,670,251,247	\$	387,155,821,716	142129 27/12/2022	X			
12	Ajustes Definitiva	may-22	\$	418,036,113	\$	1,832,928	\$	419,869,041					\$	15,250,382,206	\$	386,735,952,675	137218 29/12/2022	X			
13	Ajustes Definitiva	jun-22	\$	99,327,588	\$	435,513	\$	99,763,101				(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	15,150,619,105	\$	386,636,189,574			X		
14	Ajustes Definitiva	jul-22	\$	411,799,277	\$	1,805,581	\$	413,604,858					\$	14,737,014,247	\$	386,222,584,716	137464 29/12/2022	X			
15	Ajustes Definitiva	ago-22	\$	689,270,316	\$	3,022,185	\$	692,292,501					\$	14,044,721,746	\$	385,530,292,215	137452 29/12/2022	X			
3	Anticipo							\$	18,558,374,709			(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	8,044,721,746							
												(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$	2,568,015,640	\$	385,530,292,215	112144 08/11/2022	X			
18	Parcial	nov-22	\$	3,078,412,249	\$	13,497,654	\$	3,091,909,903	\$	35,401,741	\$	3,056,508,162		\$	4,988,213,584	\$	382,438,382,312	137395 29/12/2022	X		
16	Ajustes Definitiva	sep-22	\$	519,313,870	\$	2,276,992	\$	521,590,862				(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	4,466,622,722	\$	381,916,791,450	137429 29/12/2022	X			
17	Ajustes Definitiva	oct-22	\$	412,986,755	\$	1,810,788	\$	414,797,543					\$	4,051,825,179	\$	381,501,993,907	137425 27/12/2022	X			
18	Ajustes Provisional	nov-22	\$	943,049,453	\$	4,134,909	\$	947,184,362					\$	3,104,640,817	\$	380,554,809,545	137420 29/12/2022	X			
19	Parcial	dic-22	\$	7,276,375,355	\$	41,402,139	\$	7,317,777,494	\$	416,936,308	\$	6,900,841,186	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	148,598,479						
												(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$	-	\$	373,237,032,051	142142 27/12/2022	X			
												(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(01/02/2022)	\$								
												(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$	1,467,019,083							
19	Ajustes Provisional	dic-22	\$	2,507,310,935	\$	10,993,594	\$	2,518,304,529				(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$	1,191,589	\$	370,718,727,522	145010 19/02/2023	X			
												(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	18,219,522,965							
20	Parcial	ene-23	\$	2,177,679,024	\$	9,548,285	\$	2,187,227,309	\$	124,781,008	\$	2,062,446,301	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	16,157,076,664	\$	368,531,500,213	21590 09/03/2023	X		
	Anticipo 4										\$	5,756,172,974	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	10,400,903,690	\$	368,531,500,213	143093 01/02/2023	X		
21	Parcial	feb-23	\$	4,055,527,522	\$	17,781,928	\$	4,073,309,450	\$	297,270,167	\$	3,776,039,283	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	6,624,864,407	\$	364,458,190,763	28010 23/03/2023	X		
22	Parcial	mar-23	\$	3,804,577,283	\$	21,984,897	\$	3,826,562,180	\$	302,080,472	\$	3,524,481,708	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	3,100,382,699	\$	360,631,628,583	44790 29/05/2023	X		
20	Ajustes Definitiva N°18, 19 y 20	ene-23	\$	380,013,289	\$	1,666,212	\$	381,679,501					(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	2,718,703,198	\$	360,249,949,082	49886 04/06/2023	X		
21	Ajustes Definitiva	feb-23	\$	755,951,273	\$	3,314,556	\$	759,265,829					(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	1,959,437,369	\$	359,490,683,253	56695 23/06/2023	X		
23	Parcial	abr-23	\$	2,626,394,957	\$	11,515,732	\$	2,637,910,689	\$	210,111,597	\$	2,427,799,092	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	-	\$	356,852,772,564	61051 24/06/2023	X		
												(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	\$	36,561,341,247							
22	Ajustes Definitiva	mar-23	\$	867,870,830	\$	3,805,280	\$	871,676,110					(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	\$	35,689,665,137	\$	355,981,096,454	56720 23/06/2023	X		
24	Parcial	may-23	\$	2,716,129,555	\$	34,458,914	\$	2,750,588,469	\$	207,571,459	\$	2,543,017,010	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$	33,146,648,127	\$	353,230,507,985	62510 17/07/2023	X		
23	Ajustes Definitiva	abr-23	\$	680,973,214	\$	2,985,806	\$	683,959,020					(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$	32,462,689,107	\$	352,546,548,965	66748 17/07/2023	X		
24	Ajustes Definitiva	may-23	\$	685,719,156	\$	3,006,615	\$	688,725,771					(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$	31,773,963,336	\$	351,857,823,194	83210 19/10/2023	X		
25	Parcial	jun-23	\$	2,232,113,986	\$	10,925,155	\$	2,243,039,141	\$	178,078,559	\$	2,064,960,582	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$	29,709,002,754	\$	349,614,784,053	71891 27/07/2023	X		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 6			
												FECHA 6 4 2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
CONTRATO DE OBRA No:		973 DE 2021										CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.			
MES INFORME MENSUAL:		Marzo 2026										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		962 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188			
26	Parcial	jul-23	\$ 4,656,416,288	\$ 25,281,151	\$ 4,681,697,439	\$ 363,390,848	\$ 4,318,306,591	\$ 25,471,179,059	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 25,390,696,163	\$ 344,933,086,614	80679 27/08/2023	X		
27	Parcial	ago-23	\$ 5,018,473,853	\$ 23,051,728	\$ 5,041,525,581	\$ 379,828,499	\$ 4,661,697,082	\$ 25,091,350,560	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$ -	\$ 339,891,561,033	81860 21/09/2023	X		
25	Ajustes Definitiva	jun-23	\$ 558,917,400	\$ 2,450,638	\$ 561,368,038		\$ 561,368,038		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 20,730,190,670					
26	Ajustes Definitiva	jul-23	\$ 1,334,067,751	\$ 5,849,374	\$ 1,339,917,125		\$ 1,339,917,125		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 20,168,822,632	\$ 339,330,192,995	83212 19/10/2023	X		
28	Parcial	sep-23	\$ 3,101,029,091	\$ 13,596,820	\$ 3,114,625,911	\$ 248,082,327	\$ 2,866,543,584	\$ 24,843,268,233	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 18,828,905,507	\$ 337,990,275,870	83215 20/10/2023	X		
27	Ajustes Definitiva	ago-23	\$ 1,134,849,399	\$ 4,975,878	\$ 1,139,825,277		\$ 1,139,825,277		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 15,962,361,923	\$ 334,875,649,959	83217 23/10/2023	X		
28	Ajustes Definitiva	sep-23	\$ 738,499,072	\$ 3,238,034	\$ 741,737,106		\$ 741,737,106		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 14,822,536,646	\$ 333,735,824,682	84872 17/11/2023	X		
29	Parcial	oct-23	\$ 6,601,304,839	\$ 27,442,626	\$ 6,628,747,465	\$ 500,707,570	\$ 6,128,039,895	\$ 24,342,560,663	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 14,080,799,540	\$ 332,994,087,576	84876 17/11/2023	X		
29	Ajustes Definitiva	oct-23	\$ 1,908,849,388	\$ 8,369,570	\$ 1,917,218,958		\$ 1,917,218,958		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 7,952,759,645	\$ 326,365,340,111	84868 17/11/2023	X		
30	Parcial	nov-23	\$ 2,718,804,964	\$ 10,929,715	\$ 2,729,734,679	\$ 249,274,196	\$ 2,480,460,483	\$ 24,093,286,467	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 6,035,540,687	\$ 324,448,121,153	86935 06/12/2023	X		
30	Ajustes Provisional	nov-23	\$ 740,800,643	\$ 3,248,126	\$ 744,048,769		\$ 744,048,769		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 3,555,080,204	\$ 321,718,386,474	87005 07/12/2023	X		
31	Parcial	dic-23	\$ 2,208,892,420	\$ 9,685,144	\$ 2,218,577,564	\$ 220,889,242	\$ 1,997,688,322	\$ 23,872,397,225	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 2,811,031,435	\$ 320,974,337,705	87924 16/12/2023	X		
31	Ajustes Provisional	dic-23	\$ 809,792,484	\$ 3,550,629	\$ 813,343,113		\$ 813,343,113		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 813,343,113	\$ 318,755,760,141	87866 17/12/2023	X		
30	Ajustes Definitiva	nov-23	\$ 13,878,201	\$ 60,851	\$ 13,939,052		\$ 13,939,052		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ -	\$ 317,942,417,028	87869 17/12/2023	X		
31	Ajustes Definitiva	dic-23	\$ 10,489,475	\$ 45,992	\$ 10,535,467		\$ 10,535,467		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 46,273,189,661	\$ 317,928,477,976	1609 26/03/2024	X		
32	Parcial	ene-24	\$ 7,762,154,189	\$ 33,567,223	\$ 7,795,721,412	\$ 765,568,238	\$ 7,030,153,174	\$ 23,106,828,987	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 46,262,654,194	\$ 317,917,942,509	1850 03/04/2024	X		
33	Parcial	feb-24	\$ 7,707,685,770	\$ 252,779,276	\$ 7,960,465,046	\$ 624,795,446	\$ 7,335,669,600	\$ 22,482,033,541	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 39,232,501,020	\$ 310,122,221,097	1602 03/04/2024	X		
32	Ajustes Definitiva	ene-24	\$ 2,329,760,110	\$ 10,215,102	\$ 2,339,975,212		\$ 2,339,975,212		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$ 31,896,831,420	\$ 302,161,756,051	1838 06/04/2024	X		
34	Parcial	mar-24	\$ 4,951,782,058	\$ 47,258,760	\$ 4,999,040,818	\$ 476,493,588	\$ 4,522,547,230	\$ 22,005,539,953	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$ 29,556,856,208	\$ 299,821,780,839	2053 07/04/2024	X		
33	Ajustes Definitiva	feb-24	\$ 1,794,963,200	\$ 7,870,223	\$ 1,802,833,423		\$ 1,802,833,423		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$ 25,034,308,978	\$ 294,822,740,021	3038 24/04/2024	X		
34	Ajustes Definitiva	mar-24	\$ 1,306,182,169	\$ 5,727,106	\$ 1,311,909,275		\$ 1,311,909,275		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 23,231,475,555	\$ 293,019,906,598	3890 16/05/2024	X		
35	Parcial	abr-24	\$ 5,795,416,060	\$ 47,824,081	\$ 5,843,240,141	\$ 567,466,416	\$ 5,275,773,725	\$ 21,438,073,537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$ 21,919,566,280	\$ 291,707,997,323	4248 22/05/2024	X		
36	Parcial	may-24	\$ 5,888,441,545	\$ 64,089,957	\$ 5,952,531,502	\$ 469,448,507	\$ 5,483,082,995	\$ 20,968,625,030	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 16,643,792,555	\$ 285,864,757,182	5222 05/06/2024	X		
37	Parcial	jun-24	\$ 6,824,588,311	\$ 106,591,268	\$ 6,931,179,579	\$ 641,154,026	\$ 6,290,025,553	\$ 20,327,471,004	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 11,160,709,560	\$ 279,912,225,680	5937 19/06/2024	X		
35	Ajustes Definitiva	abr-24	\$ 1,659,772,168	\$ 7,277,463	\$ 1,667,049,631		\$ 1,667,049,631		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 4,870,684,007	\$ 272,981,046,101	6467 27/06/2024	X		
38	Parcial	jul-24	\$ 684,172,341	\$ 2,999,833	\$ 687,172,174	\$ 68,417,234	\$ 618,754,940	\$ 20,259,053,770	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 3,203,634,376	\$ 271,313,996,470	12011 14/01/2025	X		
										\$ 2,584,879,436	\$ 270,626,824,296	9544 10/09/2024	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8											
													VERSIÓN		1											
													PÁGINA		1	DE	6									
													FECHA		6	4	2026									
													(Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA:			SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ													
CONTRATO DE OBRA No:			973 DE 2021										CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.													
MES INFORME MENSUAL:			Marzo 2026										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			962 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188													
39	Parcial	ago-24	\$	890,707,845	\$	74,745,661	\$	965,453,506	\$	334,855,884	\$	630,597,622	\$	19,924,197,886	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	1,954,281,814	\$	269,661,370,790	11641 30/10/2024	X					
40	Parcial	sep-24	\$	687,811,177	\$	3,015,787	\$	690,826,964	\$	68,781,118	\$	622,045,846	\$	19,855,416,768	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	1,332,235,968	\$	268,970,543,826	13943 23/01/2025	X					
41	Parcial	oct-24	\$	410,059,762	\$	35,954,216	\$	446,013,978	\$	22,604,343	\$	423,409,635	\$	19,832,812,425	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	908,826,333	\$	268,524,529,848	16437 22/11/2024	X					
42	Parcial	nov-24	\$	600,262,326	\$	3,282,887	\$	603,545,213	\$	57,805,888	\$	545,739,325	\$	19,775,006,537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	801,043,898	\$	267,920,984,635	2254 11/04/2025	X					
														(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$	13,062,043,110										
36	Ajustes Definitiva	may-24	\$	1,444,784,292	\$	6,334,823	\$	1,451,119,115			\$	1,451,119,115			(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	437,956,890	\$	266,469,865,520	19588 17/12/2024	X					
														(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$	11,974,011,003										
37	Ajustes Definitiva	jun-24	\$	2,497,246,489	\$	10,949,465	\$	2,508,195,954			\$	2,508,195,954			(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(10/12/2024)	\$	9,465,815,049	\$	263,961,669,566	19594 17/12/2024	X					
38	Ajustes Definitiva	jul-24	\$	141,376,036	\$	619,880	\$	141,995,916			\$	141,995,916			(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	295,960,974	\$	263,819,673,650	19595 17/12/2024	X					
39	Ajustes Definitiva	ago-24	\$	46,604,099	\$	204,341	\$	46,808,440			\$	46,808,440			(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	249,152,534	\$	263,772,865,210	19598 17/12/2024	X					
40	Ajustes Definitiva	sep-24	\$	138,829,823	\$	608,715	\$	139,438,538			\$	139,438,538			(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	109,713,996	\$	263,633,426,672	19649 17/12/2024	X					
41	Ajustes Definitiva	oct-24	\$	41,667,954	\$	182,698	\$	41,850,652			\$	41,850,652			(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	67,863,344	\$	263,591,576,020	19474 17/12/2024	X					
42	Ajustes Provisional	nov-24	\$	67,567,088	\$	296,256	\$	67,863,344			\$	67,863,344			(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	-	\$	263,523,712,676	19484 17/12/2024	X					
43	Parcial	dic-24	\$	7,978,644,186	\$	69,139,547	\$	8,047,783,733	\$	830,907,330	\$	7,216,876,403	\$	18,944,099,207	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$	2,248,938,646	\$	255,475,928,943	19539 17/12/2024	X					
43	Ajustes Provisional	dic-24	\$	2,239,120,962	\$	9,817,684	\$	2,248,938,646			\$	2,248,938,646			(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$	-	\$	253,226,990,297	3007 02/05/2025	X					
42	Ajustes Definitiva	nov-24	\$	404,089	\$	1,772	\$	405,861			\$	405,861			(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	\$	40,416,148,594	\$	253,226,584,436	939 07/03/2025	X					
44	Parcial	ene-25	\$	5,200,415,635	\$	23,002,449	\$	5,223,418,084	\$	3,003,936,634	\$	2,219,481,450	\$	15,940,162,573	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	\$	38,196,667,144	\$	248,003,166,352	923 06/03/2025	X					
45	Parcial	feb-25	\$	4,922,000,754	\$	21,581,080	\$	4,943,581,834	\$	2,525,478,587	\$	2,418,103,247	\$	13,414,683,986	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025) (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	35,778,563,897	\$	243,059,584,518	1872 03/04/2025	X					
43	Ajustes Definitiva	dic-24	-\$	1,259,790	-\$	5,523	-\$	1,265,313			-\$	1,265,313			(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	35,779,829,210	\$	243,060,849,831	4496 29/05/2025	X					
44	Ajustes Definitiva	ene-25	\$	829,196,445	\$	3,635,707	\$	832,832,152			\$	832,832,152			(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	34,946,997,058	\$	242,228,017,679	4496 29/05/2025	X					
45	Ajustes Definitiva	feb-25	\$	1,523,192,610	\$	6,678,614	\$	1,529,871,224			\$	1,529,871,224			(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	33,417,125,834	\$	240,698,146,455	3295 07/05/2025	X					
46	Parcial	mar-25	\$	4,931,829,029	\$	45,771,865	\$	4,977,600,894	\$	265,055,701	\$	4,712,545,193	\$	13,149,628,285	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	28,704,580,641	\$	235,720,545,561	3256 07/05/2025	X					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8													
												VERSIÓN		1													
												PÁGINA		1	DE	6											
												FECHA			6	4	2026										
												(Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ															
CONTRATO DE OBRA No:		973 DE 2021										CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.															
MES INFORME MENSUAL:		Marzo 2026										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		962 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188															
46	Ajustes Definitiva	mar-25	\$	1,880,155,548	\$	8,243,759	\$	1,888,399,307		\$	1,888,399,307		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	26,816,181,334	\$	233,832,146,254	6906 14/07/2025	X								
47	Parcial	abr-25	\$	4,018,402,074	\$	72,004,128	\$	4,090,406,202	\$	200,769,618	\$	3,889,636,584	\$	12,948,858,067	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	22,926,544,750	\$	229,741,740,052	4422 28/05/2025	X						
47	Ajustes Definitiva	abr-25	\$	1,393,858,328	\$	6,111,533	\$	1,399,969,861		\$	1,399,969,861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	21,526,574,889	\$	228,341,770,191	7117 16/07/2025	X								
48	Parcial	may-25	\$	3,660,802,913	\$	16,051,213	\$	3,676,854,126	\$	206,469,284	\$	3,470,384,842	\$	12,742,389,383	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	18,056,190,047	\$	224,664,916,065	6376 04/07/2025	X						
49	Parcial	jun-25	\$	3,460,473,993	\$	63,794,761	\$	3,524,268,754	\$	178,887,536	\$	3,345,381,218	\$	12,563,501,847	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	14,710,808,829	\$	221,140,647,311	7251 18/07/2025	X						
48	Ajustes Definitiva	may-25	\$	1,135,341,663	\$	4,978,037	\$	1,140,319,700		\$	1,140,319,700		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	13,570,489,129	\$	220,000,327,611	7257 18/07/2025	X								
49	Ajustes Definitiva	jun-25	\$	1,068,470,883	\$	4,684,834	\$	1,073,155,717		\$	1,073,155,717		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	12,497,333,412	\$	218,927,171,894	9173 28/08/2025	X								
50	Parcial	jul-25	\$	3,452,100,623	\$	28,685,510	\$	3,480,786,133	\$	193,960,545	\$	3,286,825,588	\$	12,369,541,302	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	9,210,507,824	\$	215,446,385,761	8986 26/08/2025	X						
50	Ajustes Definitiva	jul-25	\$	1,082,842,785	\$	4,747,849	\$	1,087,590,634		\$	1,087,590,634		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	8,122,917,190	\$	214,358,795,127	10632 22/09/2025	X								
51	Parcial	ago-25	\$	3,940,108,063	\$	17,275,858	\$	3,957,383,921	\$	227,344,235	\$	3,730,039,686	\$	12,142,197,067	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	4,392,877,504	\$	210,401,411,206	10908 26/09/2025	X						
51	Ajustes Definitiva	ago-25	\$	1,672,529,008	\$	7,333,396	\$	1,679,862,404		\$	1,679,862,404		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	2,713,015,100	\$	208,721,548,802	12199 24/10/2025	X								
52	Parcial	sep-25	\$	1,810,862,499	\$	37,446,185	\$	1,848,308,684	\$	96,140,466	\$	1,752,168,218	\$	12,046,056,601	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	960,846,882	\$	206,873,240,118	12568 04/11/2025	X						
52	Ajustes Definitiva	sep-25	\$	486,209,799	\$	2,131,843	\$	488,341,642		\$	488,341,642		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	472,505,240	\$	206,384,898,476		X								
53	Parcial	oct-25	\$	256,632,611	\$	1,125,235	\$	257,757,846	\$	14,987,344	\$	242,770,502	\$	12,031,069,257	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	229,734,738	\$	206,127,140,630		X						
53	Ajustes Definitiva	oct-25	\$	72,363,224	\$	317,285	\$	72,680,509		\$	72,680,509		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	157,054,229	\$	206,054,460,121	R26 1918 19/03/2026	X								
54	Parcial	nov-25	\$	126,698,314	\$	555,523	\$	127,253,837	\$	7,762,216	\$	119,491,621	\$	12,023,307,041	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	37,562,608	\$	205,927,206,284		X						
54	Ajustes Provisional	nov-25	\$	37,398,629	\$	163,979	\$	37,562,608		\$	37,562,608		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$	-	\$	205,889,643,676		X								
55	Parcial	dic-25	\$	5,439,987,877	\$	23,874,756	\$	5,463,862,633	\$	312,429,110			(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$	2,200,000,000												
													(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$	4,596,713,696												
											\$	2,890,000,000		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401020-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	\$	-											
											\$	2,261,433,523		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	\$	1,176,576,407											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 6			
												FECHA 6 4 2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ															
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.															
MES INFORME MENSUAL: Marzo 2026 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188															
55	Ajustes Provisional	dic-25	\$ 2,405,846,471	\$ 10,548,711	\$ 2,416,395,182	\$ -	\$ 1,176,576,407	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 224,934,109,487	57829	01/30/2026	X		
								(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	\$ -						
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000						
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000						
								(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 3,356,894,921						
54	Ajustes Definitivo	nov-25	\$ 1,141,517	\$ 5,005	\$ 1,146,522	\$ 1,146,522	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 224,932,962,962	R26-897	02/03/2026	X			
							(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000							
							(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000							
							(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 3,355,748,399							
55	Ajustes Definitivo	dic-25	\$ 11,953,044	\$ 52,410	\$ 12,005,454	\$ 12,005,454	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 224,920,957,508	R26-2527	06/04/2026	X			
							(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000							
							(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000							
							(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 3,343,742,945							
56	Parcial	ene-26	\$ 1,469,731,586	\$ 6,444,208	\$ 1,476,175,794	\$ 86,930,013	\$ 1,389,245,781	\$ 11,623,947,918	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 223,444,781,714	R26-1825	18/03/2026	X	
									(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000					
									(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000					
									(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 1,954,497,164					
57	Parcial	feb-26	\$ 2,739,985,575	\$ 12,013,783	\$ 2,751,999,358	\$ 140,405,806	\$ 657,096,388	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 220,692,782,356	R26-2570	07/04/2026	X		
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000						
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 4,922,903,612						
								(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ -						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
											VERSION	1		
											PÁGINA	1	DE	6
											FECHA	8	4	2026
											(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO											DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021											CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.			
MES INFORME MENSUAL: Marzo 2026											PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021											INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188			
									(No283726) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	\$ 2,678,932,059				
									(No283726) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	\$ 48,623,048,139				
56	Ajustes Definitiva	ene-26	\$ 485,380,482	\$ 2,128,207	\$ 487,508,689		\$ 487,508,689		(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 4,435,394,923	\$ 220,205,273,667		X	
58	Parcial	mar-26	\$ 5,129,004,720	\$ 50,232,806	\$ 5,180,137,526	\$ 268,249,692		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 215,025,136,141			X	
							\$ 4,911,887,834	(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 3,308,112,166					
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 4,435,394,923					
								(No283726) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	\$ 2,678,932,059					
								(No283726) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	\$ 48,623,048,139					
TOTALES			\$ 216,934,971,832	\$ 1,931,703,041	\$ 218,866,674,873	\$ 19,793,915,634	\$ 199,072,759,236	\$ 11,215,292,420		\$ 61,245,487,287	\$ 215,025,136,141			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
									VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL			
OBRA			\$	163,344,603,009	\$	716,203,259	\$	164,060,806,268						
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$	-	\$	-	\$	-						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$	-	\$	-	\$	-						
AJUSTES			\$	45,195,421,879	\$	198,164,543	\$	45,393,586,422						
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$	1,268,677,959	\$	241,048,812	\$	1,509,726,771						
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS			\$	3,550,628,141	\$	674,619,347	\$	4,225,247,488						
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			\$	3,067,921,769	\$	95,062,497	\$	3,162,984,266						
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			\$	506,050,652	\$	6,287,582	\$	512,338,234						
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			\$	-	\$	-	\$	-						
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			\$	1,668,424	\$	317,001	\$	1,985,425						
VALOR TOTAL			\$	216,934,971,833	\$	1,931,703,041	\$	218,866,674,873						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24														
Firma Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega Director de Obra T. BOYACÁ LCP S.A.S. Matrícula No.: 25202-27242 CND Firma Nombre: Ing. Julio César Sánchez Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188 MatriculaNo.: 0520246153 ANT														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor y Dirección Territorial.														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	1 DE 2

	FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------

ACTA Parcial No. 13

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN	X	ACTUALIZACIÓN		MODIFICACIÓN		COMPLEMENTACIÓN		AJUSTE		REVISIÓN	
-------------	---	---------------	--	--------------	--	-----------------	--	--------	--	----------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

El concepto de revisión y/o ajustes y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/o optimización y/o complementación de estudios y diseños de sectores y sitios críticos y/o atípicos se establece en aras de atender las necesidades que se presentan a lo largo del corredor de la Transversal de Boyacá, objeto del Contrato de Obra Pública No. 973 de 2021, así mismo llevar a cabo la ejecución de estudios y diseños de sectores y sitios críticos y/o atípicos a nivel de Fase III según la Modificación No. 2.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Según la propuesta de pagos sobre el rubro de estudios y diseños entregado por el contratista, se obtiene el siguiente resumen de aprobación:

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	PORCENTAJE DE FACTURACIÓN	COMUNICACIÓN ENVIADA	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN	RADICADO INV.
TRAMO DE MEJORAMIENTO RUTA 6006 PR20+630 al PR32+890						
X	Estudio y Diseño de Estructuras	Ruta 6006 PR20+630 al PR32+890	100%	DO-TB-2039-2024	055-2-2181-2024	
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006						
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR37+900	100%	DO-TB-2928-2025	055-2-3097-2026	
VI	Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones	PC PR46+600	100%	DO-TB-3013-2025	055-2-2892-2025	
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR46+600	100%	R48104	055-2-3174-2026	
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6007						
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR1+230	100%	DO-TB-2992-2025	055-2-2888-2025	

CONTRATO DE OBRA No: 973 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

25 (Día)	DE	JUNIO (Mes)	DE	2021 (Año)
-------------	----	----------------	----	---------------

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

31 (Día)	DE	AGOSTO (Mes)	DE	2029 (Año)
-------------	----	-----------------	----	---------------

CONTRATISTA: T BOYACÁ LCP S.A.S

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CONTRATO No. 962 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
	25/06/2021	99 MESES	\$ 358.871.764.334	\$ 358.871.764.334
1	22/12/2021		\$ 28.823.323.054	\$ 387.695.087.388
2	29/08/2022		\$ 19.272.000.000	\$ 406.967.087.388
3	15/12/2025		\$ 13.124.723.626	\$ 420.091.811.014
4	31/12/2025		\$ 13.800.000.000	\$ 433.891.811.014

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MODIFICACIÓN No. 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	FECHA DE APROBACIÓN	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN
TRAMO DE MEJORAMIENTO RUTA 6006 PR20+630 al PR32+890				
X	Estudio y Diseño de Estructuras	Ruta 6006 PR20+630 al PR32+890	16-ago-24	055-2-2181-2024
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006				
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR37+900	01-feb-26	055-2-3097-2026
VI	Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones	PC PR46+600	24-sep-26	055-2-2892-2025
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR46+600	11-mar-26	055-2-3174-2026
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6007				
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR1+230	23-sep-26	055-2-2888-2025

2. Planos.

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	FECHA DE APROBACIÓN	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN
TRAMO DE MEJORAMIENTO RUTA 6006 PR20+630 al PR32+890				
X	Estudio y Diseño de Estructuras	Ruta 6006 PR20+630 al PR32+890	16-ago-24	055-2-2181-2024
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006				
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR37+900	01-feb-26	055-2-3097-2026
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR46+600	11-mar-26	055-2-3174-2026
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6007				
X	Estudio y Diseño de Estructuras	PC PR1+230	23-sep-26	055-2-2888-2025

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ 177.845.037

NOTAS:

- Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.
- Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante legal o apoderado.
Contratista: T. BOYACÁ LCP S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado.
Interventoría. CONSORCIO ECOVISIÓN - 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

055-2-3253-2026

Puerto Boyacá, 15 de abril de 2026

Ingeniero
MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
Director Territorial Boyacá (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Tunja

Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°58- Marzo de 2026

Cordial saludo,

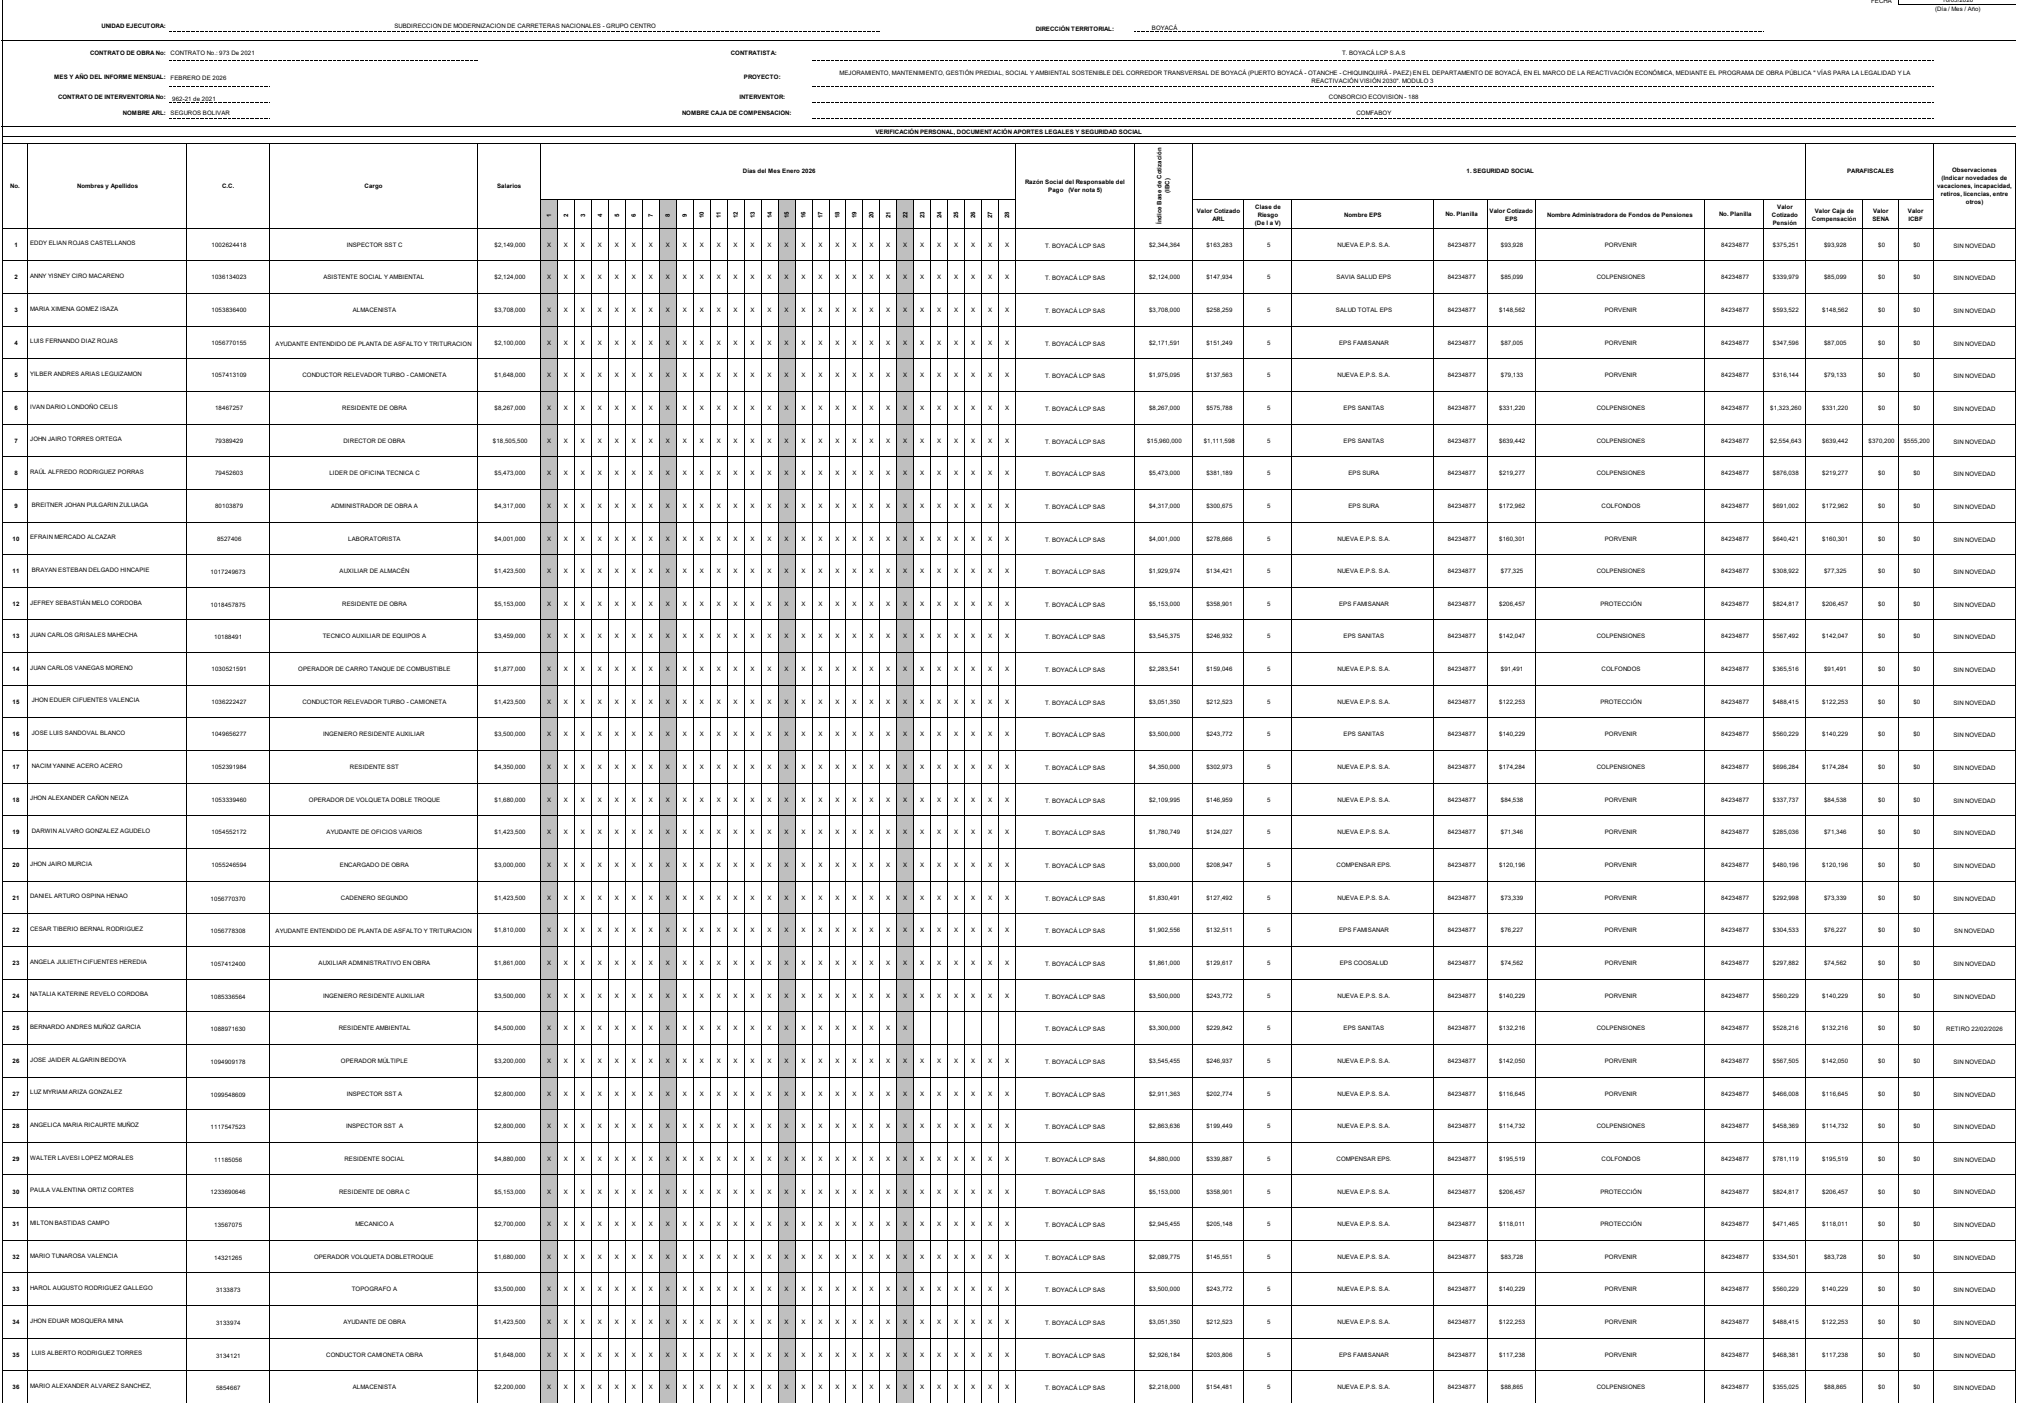
Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°58 correspondiente al mes de marzo de 2026 del desarrollo del contrato de obra N°973 de 2021 con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual.

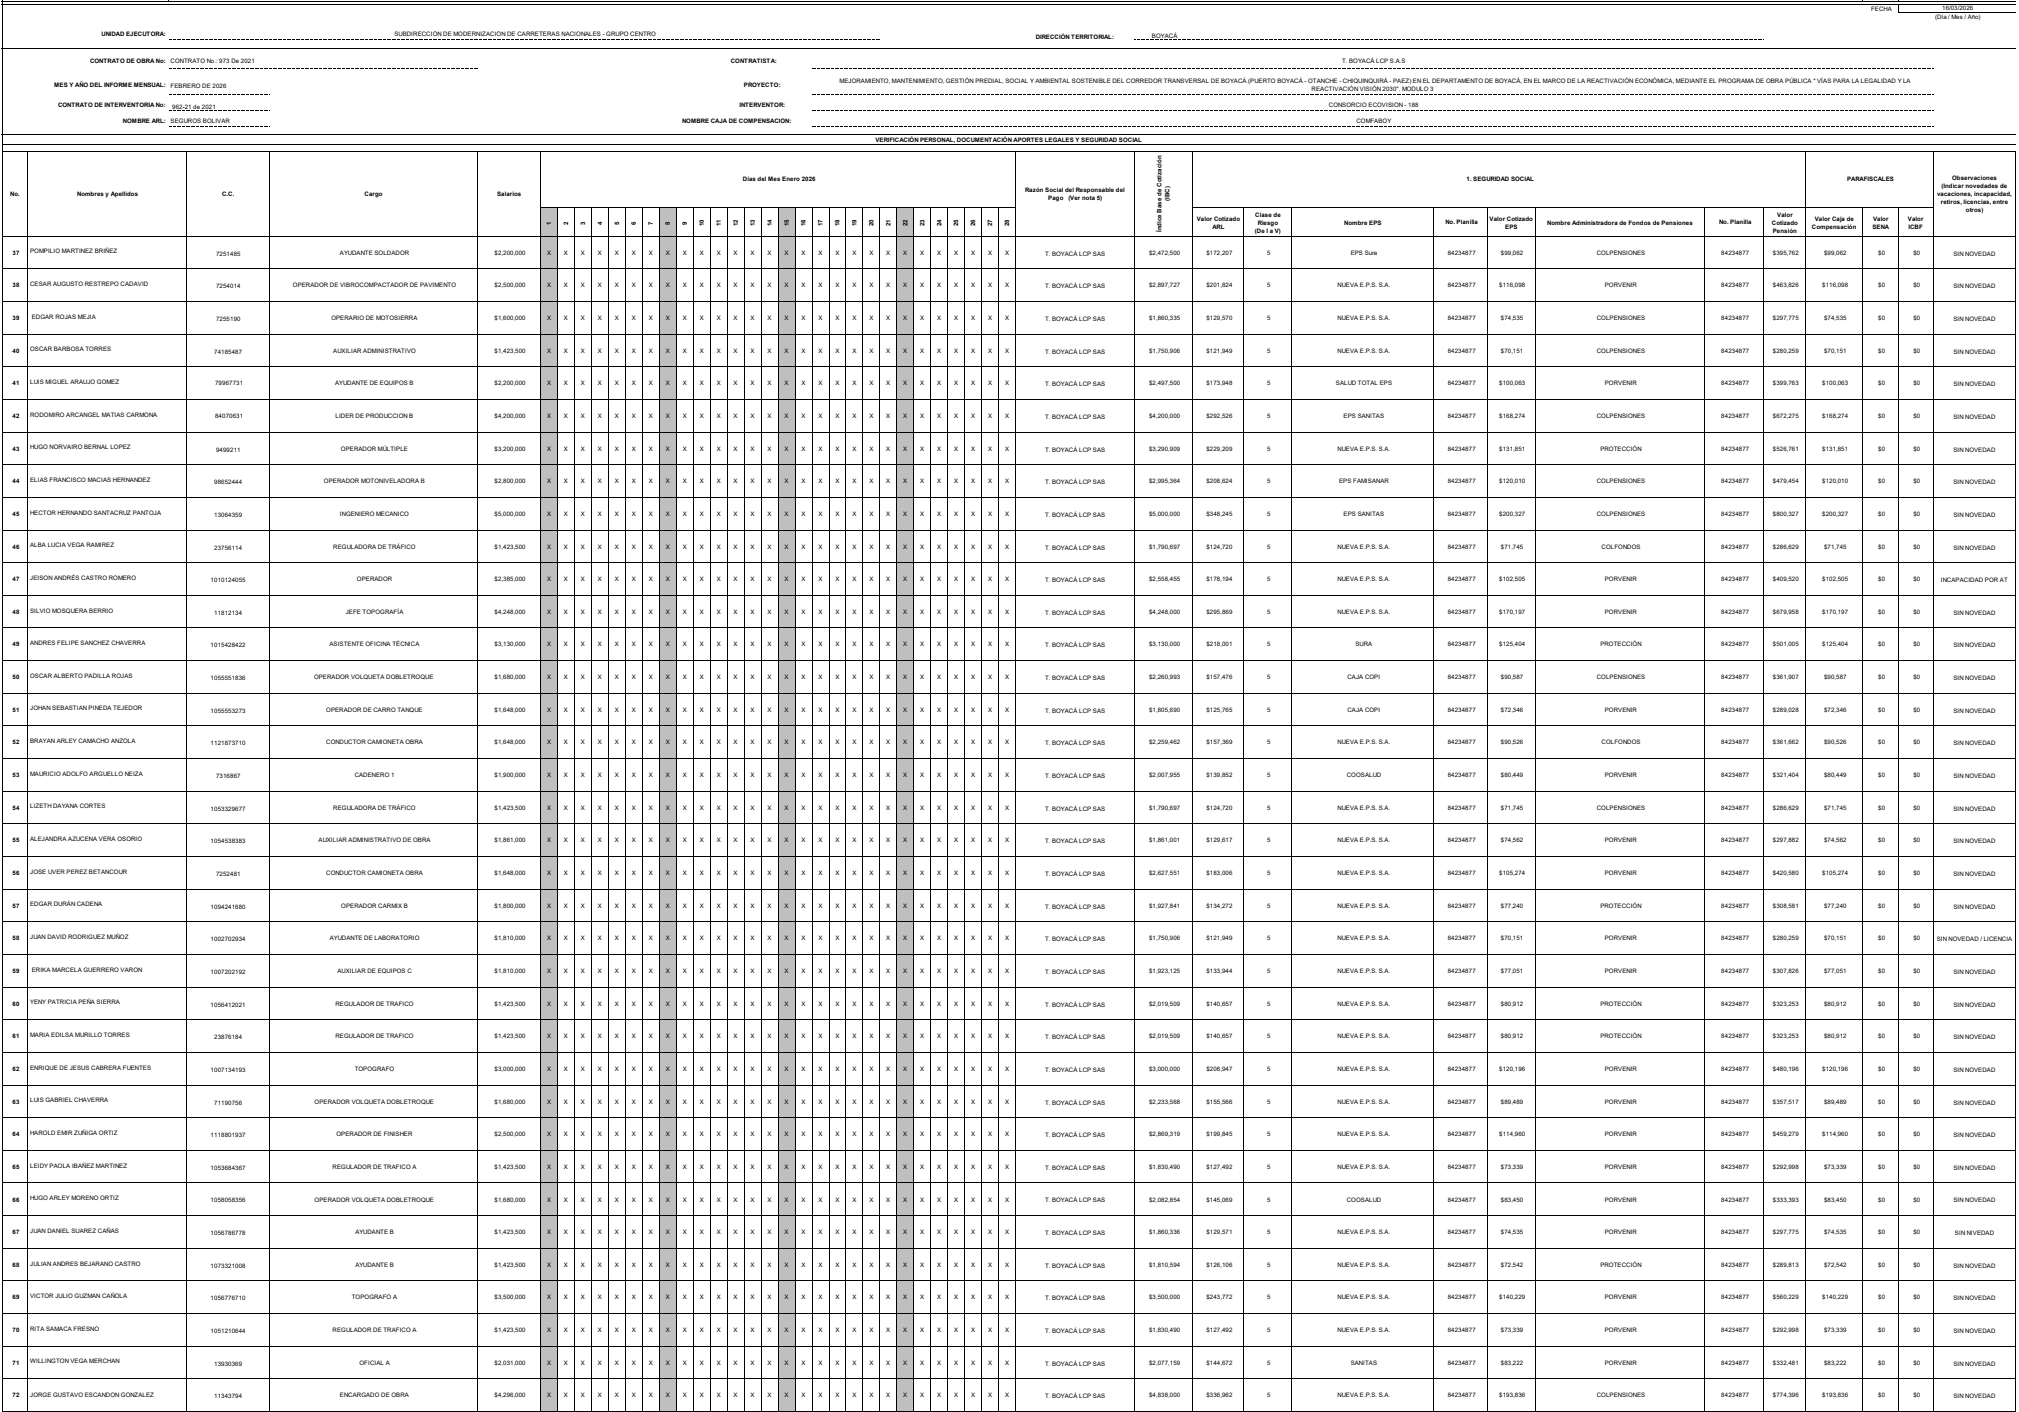
A la presente se anexan en total de veinticinco (25) documentos, solicitamos de manera comedida la aprobación para continuar con los trámites correspondientes.

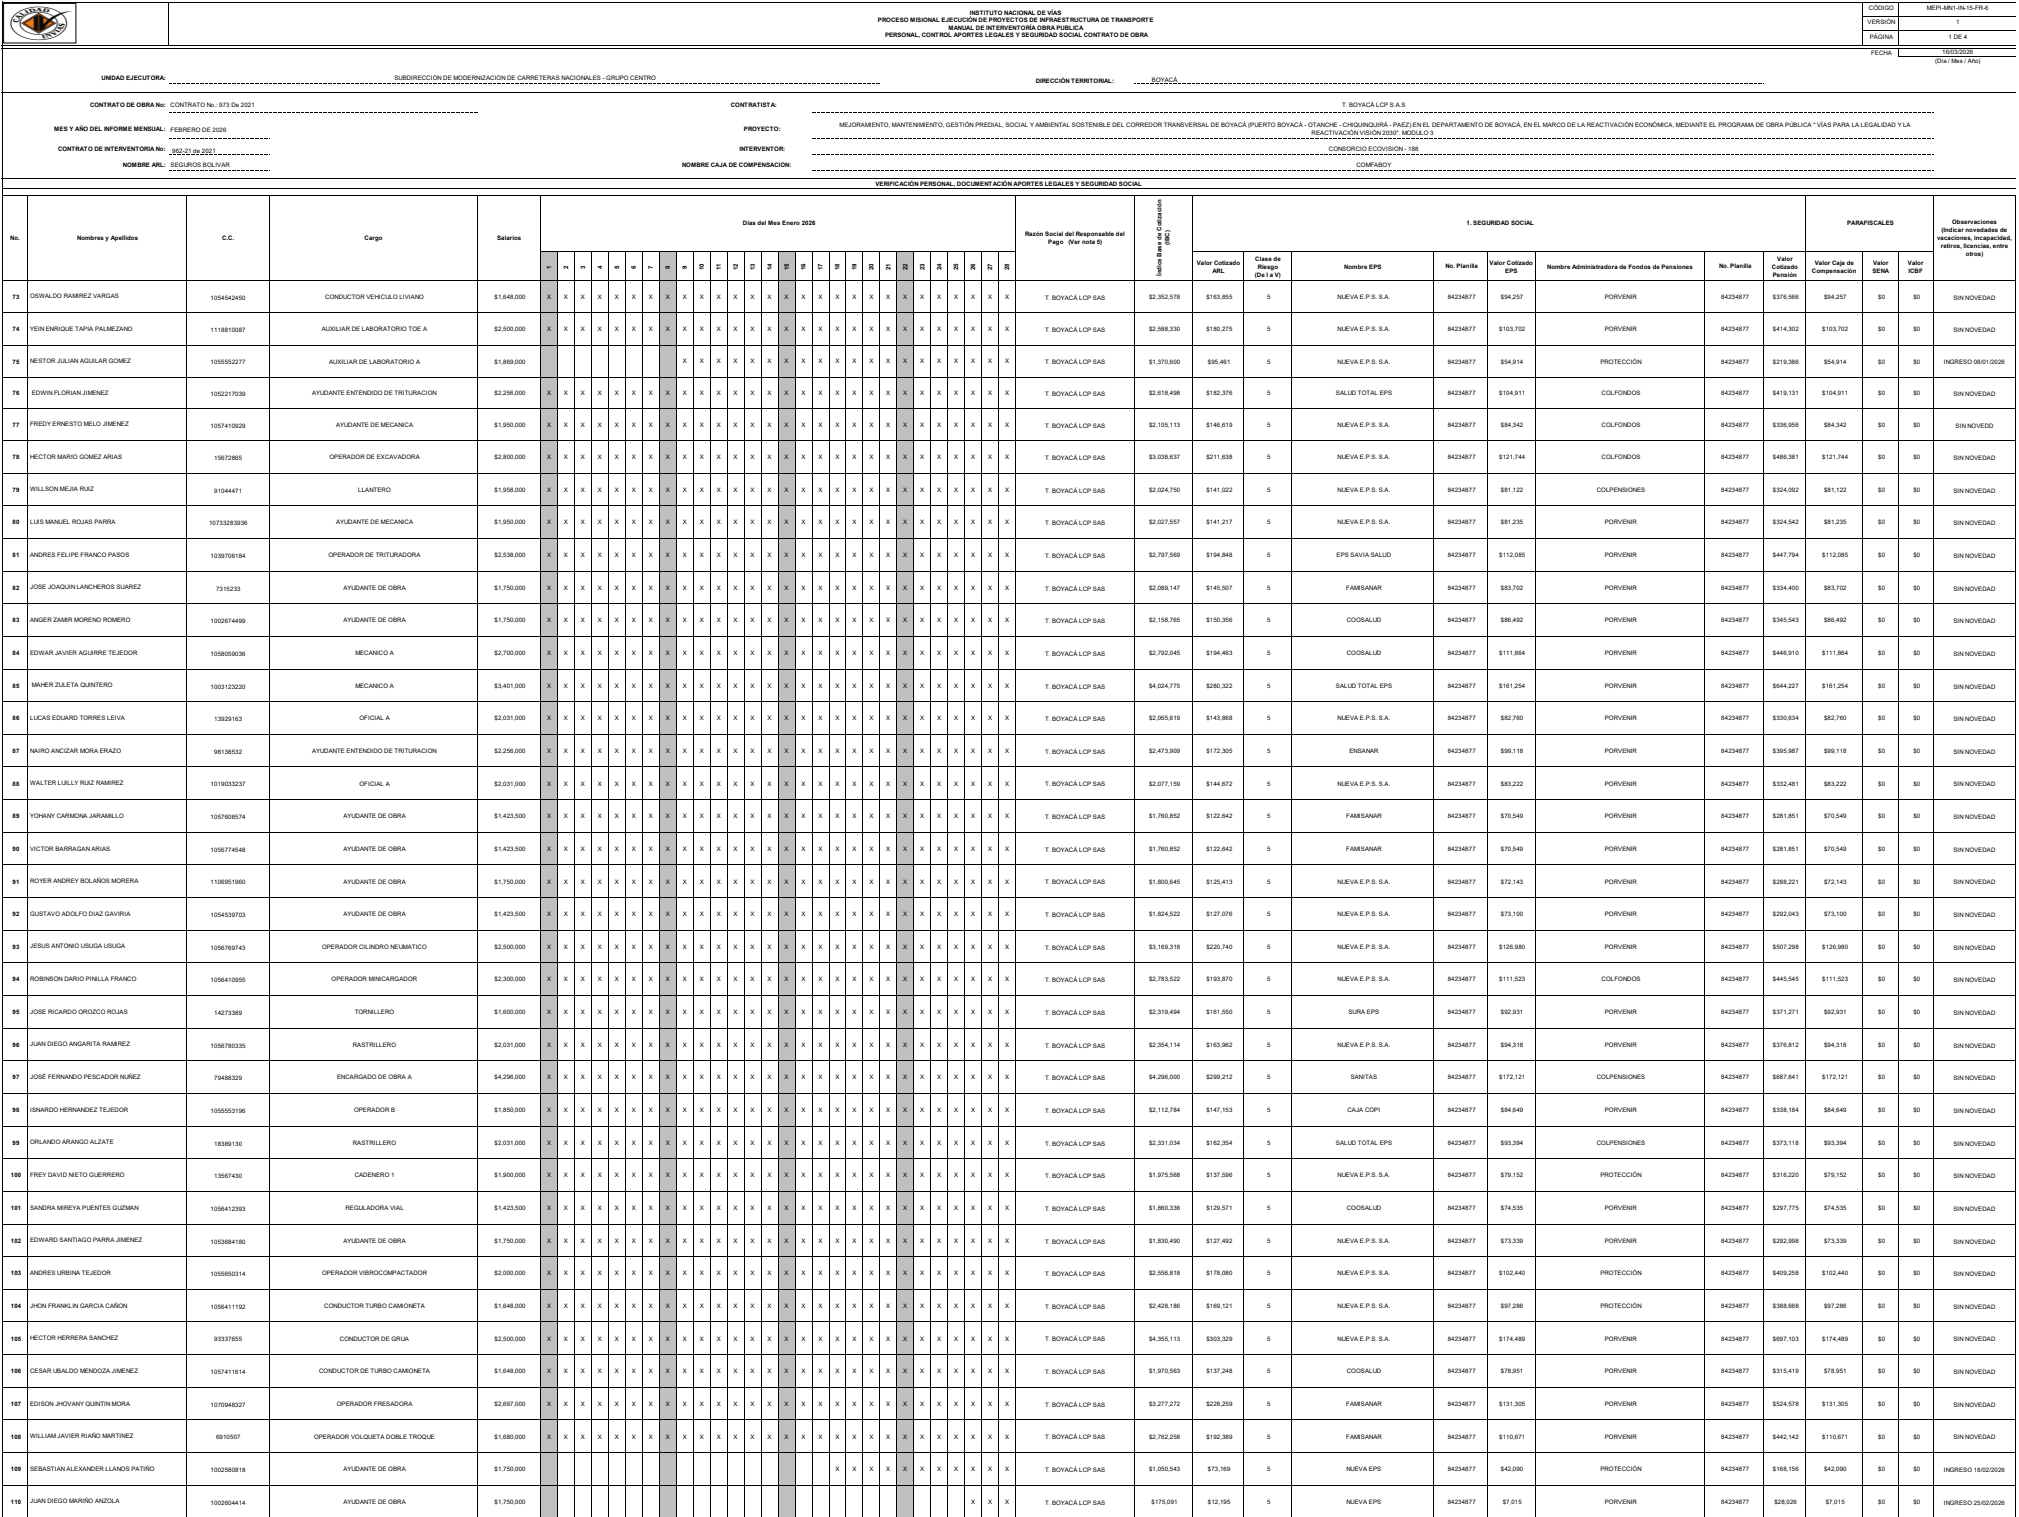
Atentamente,


JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C.
Director de interventoría
Consorcio Ecovisión 188

Anexo: 25 archivos
Copia: Apoyo a la supervisión
Elaboró: LMMM










UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	DIRECCION TERRITORIAL:	BOYACA
-------------------	---	------------------------	--------

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO N°: 973 De 2021		CONTRATISTA: T. BOYACA LOP S.A.S	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026		PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHOJUNJURA - FAZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 86231 de 2021		INTERVENIOR: CONGREGO ECUADOR - 188	
NOMBRE APL: SEGUROS BOLIVAR		NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: COMFABOY	

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]



UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	DIRECCION TERRITORIAL:	BOYACA
-------------------	---	------------------------	--------

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATO No.: 973 De 2021		CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026		PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHOQUINOURA - PAZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN (DOF, MODULO 3)	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 002/21 de 2021		INTERVENIOR: CONSORCIO ECDIVISION - 188	
NOMBRE APL: SEGUROS BOLIVAR		NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: COMASBO	

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]



UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	DIRECCION TERRITORIAL	BOYACA
CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATO No. 873 De 2021	CONTRATISTA:	T. BOYACA L.P.S.A.S
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	FEBRERO DE 2025	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGORQUIRA - INCE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 3
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	362-21-JN-2021	INTERVENIOR:	CONSORCIO ECOMISION - 188
NOMBRE ARL:	SEGUROS BOLIVAR	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes Enero 2025																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Número de Cédula Profesional (C.P.)	1. SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidades, retiros, licencias, entre otras)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																						Valor Cotizado ARL	Clase de Rango (De 1 a V)	Número EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pension	Valor Caja de Compensación	Valor BENA	Valor XCBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
188	MICHELLE ESTIVEN ESCOBAR GONZALEZ	1107355389	AYUDANTE DE OBRA	\$1.580.557																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

NOTAS:

El presente está debidamente aprobado y se cumple con la dedicación contractual.

Verificación del control: incluir copia de los certificados y/o calificados y diligenciar la casilla "Observaciones".

Se debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de este obligo.

Indicar incidencias o faltas que impidan los pagos. Los pagos pueden ser reducidos por el Contralero por uno de los siguientes del Contralero en el caso de Convenio o Unión Temporal, las cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplica.

Convenio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

Pago de Ocho, así como el cumplimiento por parte del controlador de la normalidad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplica.


presentarse Legajo o Resguardo Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los controladores de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad prestadora del servicio.

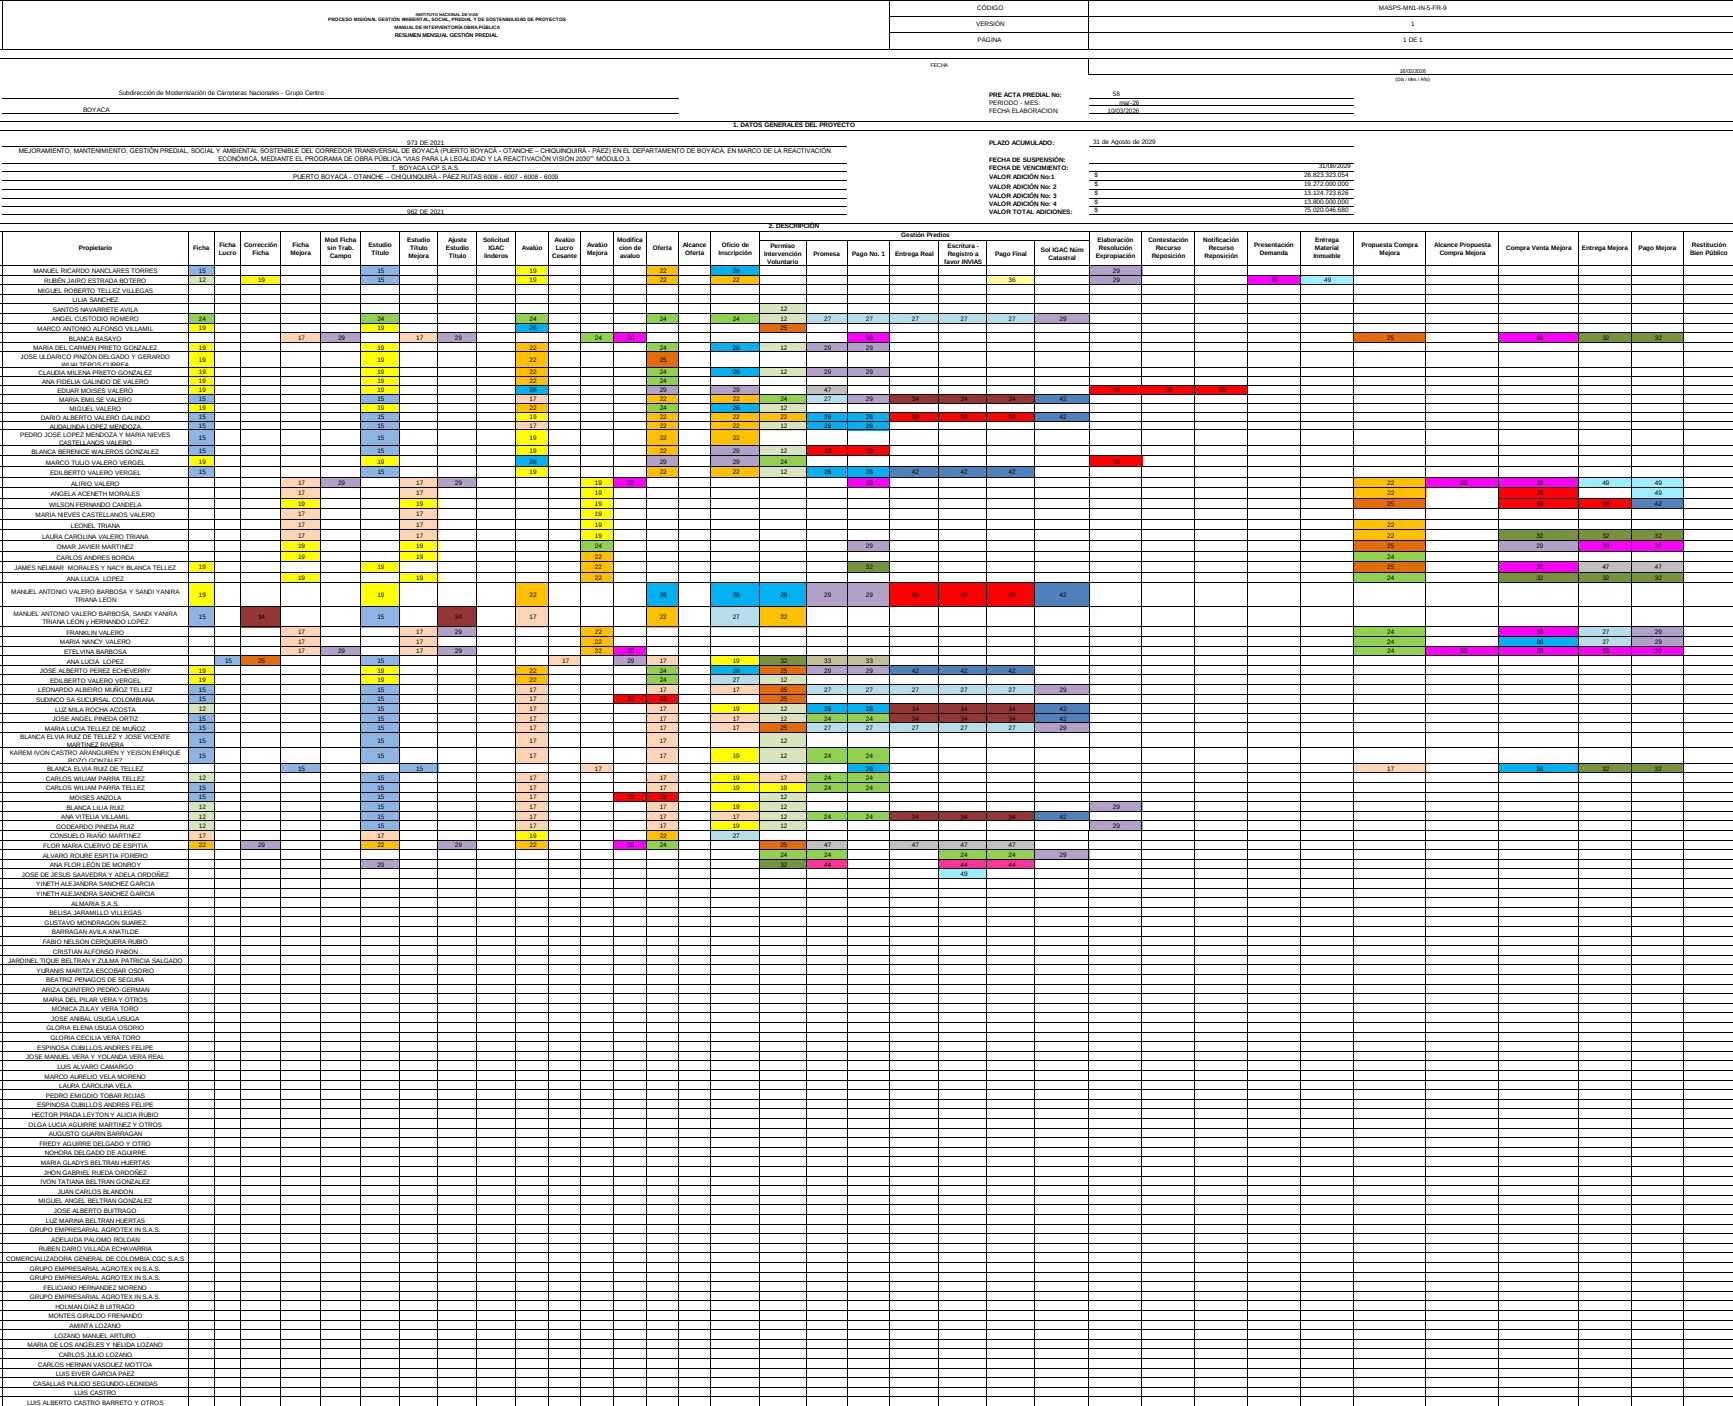
Se debe presentar de servicios. Así mismo debe diligenciar la aplicación según el caso que prevalece al servicio.


Firma
Nombre: Ing. John Jairo Torres Gaitanero
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25302-2742 CND
Asesoría Técnica de Gestión del TPAVE
Bogotá, D.C. - Colombia

Firma
Nombre: Julio César Sánchez Sotelo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 032048153 ANT

[illegible]







	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL											CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	1	DE	1

											FECHA		
											10	3	26
(Día / Mes / Año)													

I. INFORMACION GENERAL															
1. UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro											2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ				
3. AÑO: 2026 MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12															
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009											TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)				
6. CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021															
7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.															
8. CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.											NIT	902.003.281-9			
9. INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188											NIT	901.481.141-1			
10. CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 962 DE 2021															
11. PLAZO INICIAL: 99 MESES											12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25				
14. PLAZO ACUMULADO: 99 MESES											15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A				
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL											18. VR. DE LA GESTIÓN: 4.097.433.082				
											19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 4.097.433.082				
II. INFORMACION FINANCIERA															
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): \$ 358.871.764.334.00															
21. VR. ANTICIPO: \$ 2.185.885.000.00															
22. VR. ADICIÓN No: \$ 28.823.323.054.00															
23. VR. ADICIÓN No: \$ 19.272.000.000.00															
24. VR. ADICIÓN No: \$ 13.124.723.626.00															
25. VR. ADICIÓN No: \$ 13.800.000.000.00															
24. VR. TOTAL ADICIONES: \$ 75.020.046.880.00															
25. VR. TOTAL ACUMULADO: \$ 433.891.811.814.00															
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN															
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)															
											CANTIDAD	VR/ UNIDAD.	TOTAL		
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL											26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE	\$	1.394.000	\$	-
											27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN	\$	2.788.000	\$	-
											28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIAS	\$	1.045.000	\$	-
											29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	\$	348.500	\$	-
ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES											30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	\$	1.074.000	\$	-
											31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	\$	805.500	\$	-
ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS											32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	\$	268.500	\$	-
											33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES	\$	754.000	\$	-
AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN											34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	\$	377.000	\$	-
											35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	\$	377.000	\$	-
SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS											36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	\$	320.000	\$	-
											37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	\$	217.000	\$	-
INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10 KM											38. INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10 KM	\$	1.600.000	\$	-
											39. INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR KM ADICIONAL	\$	960.000	\$	-
											40. INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO - VALOR CADA 500 MTS	\$	2.460.000	\$	-
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL											41. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)	\$	1.340.000	\$	-
											42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO	\$	2.680.000	\$	-
											43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	\$	670.000	\$	-
											44. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	\$	860.000	\$	-
MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV											45. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	\$	430.000	\$	-
											46. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV	\$	640.000	\$	-
											47. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV	\$	320.000	\$	-
											48. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	\$	348.500	\$	-
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)											49. OFERTA DE COMPRA	\$	231.000	\$	-
											50. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	\$	231.000	\$	-
											51. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA	\$	346.500	\$	-
											52. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	\$	231.000	\$	-
TRÁMITE DE PRIMER PAGO - VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEADOR											53. TRÁMITE DE PRIMER PAGO - VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEADOR	\$	115.500	\$	-
											54. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	\$	115.500	\$	-
											55. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	\$	462.000	\$	-
											56. TRÁMITE DE PAGO - VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEADOR	\$	231.000	\$	-
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL											57. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	\$	231.000	\$	-
											58. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	\$	321.000	\$	-
											59. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	\$	321.000	\$	-
											60. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	\$	107.000	\$	-
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)											61. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	\$	749.000	\$	-
											62. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	\$	642.000	\$	-
											63. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	\$	150.000	\$	-
											64. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	\$	300.000	\$	-
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SS (Valor / Cantidad)											65. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	\$	150.000	\$	-
											66. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEADOR	\$	150.000	\$	-
											67. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$	640.000	\$	-
											68. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	\$	4.650.000	\$	-
SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70															
IVA															
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-JN-5-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	10	3	26
(Día / Mes / Año)			

1. INFORMACIÓN GENERAL	
1. UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro
2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACÁ
3. AÑO:	2026
4. MES:	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009
6. CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.
8. CONTRATISTA:	T. BOYACA LCP S.A.S.
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISION- 188
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	962 DE 2021
11. PLAZO INICIAL:	99 MESES
12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25
13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	99 MESES
15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL
18. VR. DE LA GESTIÓN:	4.097.433.082
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	4.097.433.082

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha- Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta		\$ 0.00
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)		
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)		\$ -
64. (2.5% ADMINISTRACIÓN)		\$ -
65. IVA		\$ -
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS		\$ -
IV. VALORES LIQUIDADOS		
76. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA		\$ -
77. IVA PRESENTE PREACTA		\$ -
78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)		\$ -
79. VALOR GESTIÓN PREDIAL		\$ -
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS		
80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES		\$ 3.162.984.266
81. GESTIÓN PREDIAL		\$ -
82. DESEMBOLSOS PREDIALES		\$ -
83. OTROS		\$ -
84. IVA		\$ -
85. VALOR TOTAL ACUMULADO		\$ 3.162.984.266
86. SALDO POR EJECUTAR		\$ 934.448.816

VI. FIRMAS			
FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE	NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
C.C. X C.E.	NUMERO 71.714.292	C.C. X C.E.	NUMERO 79.150.916
MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO 05202-66520 ANT	MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO N/A
Representante Legal	☒ Apoderado	Representante Legal	☒ Apoderado

NOTAS

- Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
- Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
- El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

AAC

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

NIT: 901.481.141-1

EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021


Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

HACE CONSTAR:

Que la sociedad T. BOYACÁ LCP S.A.S., identificada con NIT 902.003.281-9, remitió a esta interventoría certificación suscrita por su representante legal, bajo la gravedad del juramento, en la que manifestó que la sociedad ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales que legalmente le corresponden y resultan exigibles a la fecha de expedición de dicha certificación, respecto del personal propio y del personal que de manera directa o indirecta ejecutó actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto durante el periodo correspondiente.

La presente constancia se expide con fundamento exclusivo en la certificación allegada por el contratista, para efectos del trámite correspondiente ante la entidad.

Bogotá, 15 de abril de 2026



MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal
Consortio ECOVISIÓN-188
Interventor.



902003281-9

Autorización Numeración De Facturación No. 18764101342021,
Numeración Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde:
2025/11/10 hasta 2027/11/10 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

TV 13

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha	11.05.2026 12:16:45
C.C o NIT:	800215807 2	Vencimiento	11.06.2026
Dirección:	TV 45 26 60 BOGOTÁ		
Ciudad:	Bogotá, D.C.		
Teléfono:	4280400		
e-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Contrato	Condición de Pago:	30D CREDITO A 30 DIAS	Medio de Pago:	C. Operación:	001-GENERAL T BOYACA L
----------	--------------------	-----------------------	----------------	---------------	------------------------

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	\$3,831,119,315	0 %	\$0.00	\$3,831,119,315
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administración)	\$842,846,249	0 %	\$0.00	\$842,846,249
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	\$191,555,966	0 %	\$0.00	\$191,555,966
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19 % (Utilidad)	\$114,933,579	19 %	\$21,837,380.00	\$136,770,959
5	HONORARIOS	\$149,449,611	19 %	\$28,395,426.00	\$177,845,037
#\$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$ ACTA DE OBRA 58 PERIODO MARZO 2026 CONTRATO 973 DE 2021 IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO \$268.249.692					
No. Líneas Totales: 5					
Valor letras:	CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * *	SUB-TOTAL		\$5,129,904,720	
Firma y Sello del Cliente		IVA		\$50,232,806	
		RETE FUENTE		\$0	
		DEDUCCIÓN ANTICIPO		\$268,249,692	
		TOTAL		\$4,911,887,834	
Dirección: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: Web: E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia		ssalazar Elaborado		dgiraldo Aprobado	

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 05/11/26 12:16:49 PM



CUFE: 2c00ff4595ce6cfe693399a72ae04907f71e7e3bdcb029c6ce8c0eb4ad765e455fe31db6bd76706e8020b5df09105a6a



902003281-9

Autorización Numeración De Facturación No. 18764101342021,
Numeración Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde:
2025/11/10 hasta 2027/11/10 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

TV 13

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha	11.05.2026 12:16:45
C.C o NIT:	800215807 2	Vencimiento	11.06.2026
Dirección:	TV 45 26 60 BOGOTÁ		
Ciudad:	Bogotá, D.C.		
Teléfono:	4280400		
e-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Contrato	Condición de Pago:	30D CREDITO A 30 DIAS	Medio de Pago:	C. Operación:	001-GENERAL T BOYACA L
----------	--------------------	-----------------------	----------------	---------------	------------------------

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	\$3.831.119,315	0 %	\$0.00	\$3,831,119,315
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administración)	\$842.846,249	0 %	\$0.00	\$842,846,249
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	\$191.555,966	0 %	\$0.00	\$191,555,966
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19 % (Utilidad)	\$114.933,579	19 %	\$21,837,380.00	\$136,770,959
5	HONORARIOS	\$149,449,611	19 %	\$28,395,426.00	\$177,845,037
	#\$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$ ACTA DE OBRA 58 PERIODO MARZO 2026 CONTRATO 973 DE 2021 IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO \$268.249.692				
No. Líneas Totales: 5					
Valor letras:	CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * *	SUB-TOTAL		\$5,129,904,720	
Firma y Sello del Cliente		IVA		\$50,232,806	
		RETE FUENTE		\$0	
		DEDUCCIÓN ANTICIPO		\$268,249,692	
		TOTAL		\$4,911,887,834	
Dirección: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: Web: E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia		ssalazar Elaborado		dgiraldo Aprobado	

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 05/11/26 12:16:49 PM



CUFE: 2c00ff4595ce6cfe693399a72ae04907f71e7e3bdcb029c6ce8c0eb4ad765e455fe31db6bd76706e8020b5df09105a6a
