

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 1 de 30

**INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20251800043177**

De conformidad con la vigilancia y control que realiza el municipio a través de esta supervisión, por medio del cual se hace seguimiento al cumplimiento del convenio solidario, supervisión que se desarrolla conforme a las disposiciones de la ley 1474 de 2011, la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y en calidad de supervisor designado del convenio solidario No. 20251800043177 de 2025, se presenta a continuación el **"INFORME DE SUPERVISION"**, correspondiente al periodo del 02 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

Orden del Informe:

- 1.) Información general y específica sobre el desarrollo del convenio
- 2.) Seguimiento de la ejecución del convenio
- 3.) Concepto sobre la ejecución del convenio
- 4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra
- 5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas
- 6.) Informe financiero

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONVENIO

1.1 Información General del convenio

CONVENIENTE 1:	MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN- ASOCOMUNAL
NIT Y/O CEDULA:	817.002.876-8
VALOR APOORTE MUNICIPIO:	SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 669.480.355,00)
VALOR APOORTE DE OAC	VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$ 26.779.213,00).
VALOR TOTAL CONVENIO	SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$6.499.782.176),
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS BARRIOS

CP

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 2 de 30

	ROSALES, ISABELA, PRIMERO DE MAYO, LA GRAN VICTORIA, ANDES, ESMERALDA, LOMA DE LA VIRGEN, SANTA FE, SANTA RITA Y 31 DE MARZO, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"
PLAZO INICIAL	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.

Para la ejecución de las obras el municipio de Popayán, suscribió el convenio solidario No. 20251800043177 para realizar las obras priorizadas por presupuesto participativo en el sector urbano del municipio de Popayán, que tiene como propósito, responder a la necesidad de mejorar las condiciones viales en las diferentes comunas de la ciudad de Popayán.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA

1.2 Información Específica del convenio interadministrativo

FECHA	EVENTO
24 de Noviembre de 2025	Firma del contrato
02 de diciembre de 2025	Acta de inicio
31 de diciembre de 2025	Acta de recibo final
31 de diciembre de 295	Fecha de terminación

2. EJECUCION DEL CONVENIO

2.1 ALCANCE DE LA OBRA:

Las obras seleccionadas en el presupuesto participativo, por las comunidades de: 1). Urbanización Los Rosales – Comuna 1; 2). La Isabela – Comuna 7; 3. Primero de Mayo – Comuna 6; 4. La Gran Victoria – Comuna 6; 5. Los Andes – Comuna 5; 6. La Esmeralda – Comuna 8; 7. Loma de la Virgen –Comuna 6; 8. Santa Fe – Comuna 6; 9. Santa Rita – Comuna 6; y 10. Treinta y Uno de Marzo – Comuna 7, fueron priorizadas por dichas comunidades, mediante Asamblea de priorización, llevada a cabo por la respectiva Junta de Acción de Comunal. Las obras de mejoramiento tienen como finalidad la siguiente ejecución:

BARRIO	CANTIDAD
Urbanización Los Rosales – Comuna 1	323,73 m2 de pavimento rígido
La Isabela – Comuna 7	127, 5 m2 de pavimento rígido
Primero de Mayo – Comuna 6	143 m2 de pavimento rígido
La Gran Victoria – Comuna 6	87,50 M2 de pavimento rígido
Los Andes – Comuna 5	325,20 m2 de pavimento rígido
La Esmeralda – Comuna 8	225 m2 de pavimento rígido

Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075
Commutador 321 496 5013, www.popayan.gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.gov.co.


Handwritten signature

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 3 de 30

Loma de la Virgen – Comuna 6	14,70 ml de muro de contención
Santa Fe – Comuna 6	112 m2 de andenes
Santa Rita – Comuna 6	9,6 ml de muro de contención
Treinta y uno de Marzo – Comuna 7	82,80 m2 de pavimento rígido

URBANIZACION LOS ROSALES


El sector intervenido corresponde a la Calle 1 AN entre carrera 11AN hasta el final, de la urbanización Los Rosales, cuya vía se encontraba con el carril occidente en pavimento rígido y carril oriente sin intervención, por lo cual fue necesaria su ejecución para mejorar las condiciones de la vía, dentro de su ejecución se realizaron las siguientes actividades

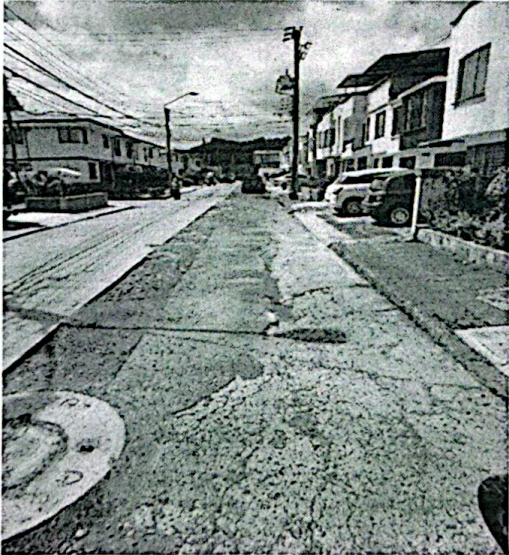URBANIZACION LOS ROSALES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

Estado inicial de la vía




ALCALDÍA DE POPAYÁN
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

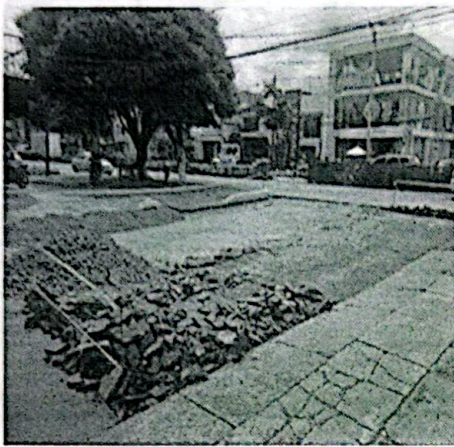F-GC-CT-14
Versión: 01
Página 4 de 30




Demolición de pavimento

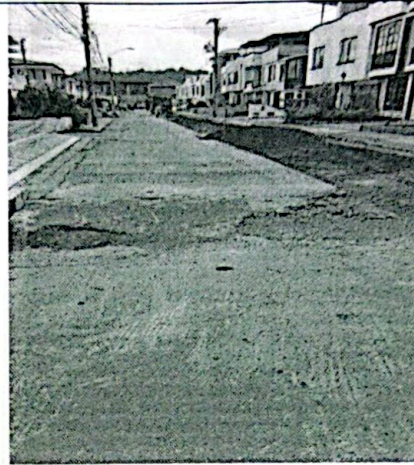

Excavación sin clasificar de la explanación y canales




Conformación y compactación de subrasante

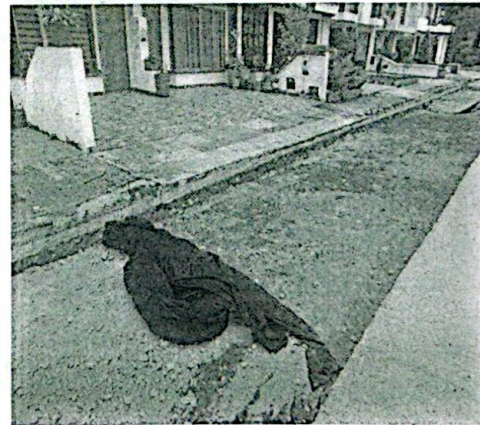


Instalación de geotextil

CM


	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 5 de 30

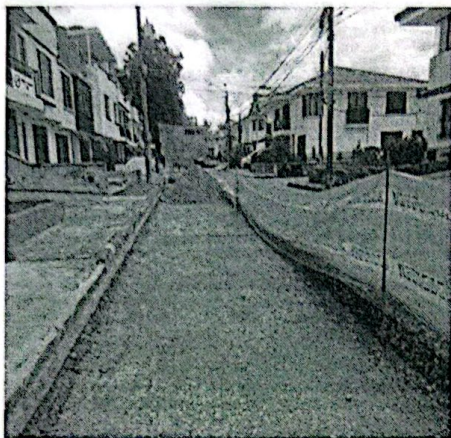


Instalación de subbase

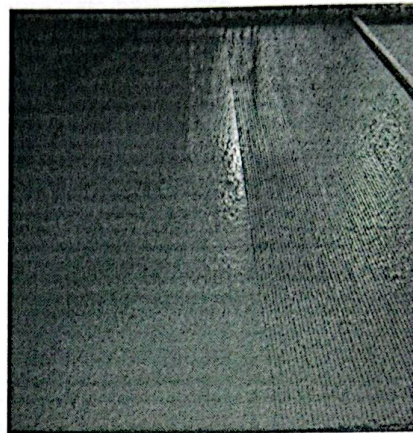

Pavimento en concreto hidraulico

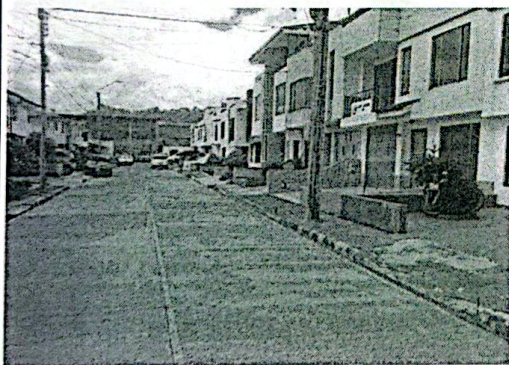

Pavimento en concreto rígido

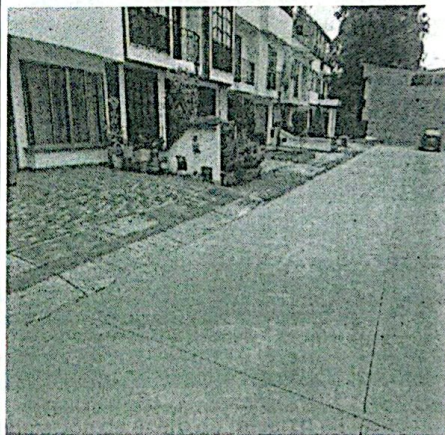

Pavimento en concreto rígido

BARRIO LA ISABELA

El sector a intervenir ubicado en la calle 10 entre carrera 36B y 36A presentaba una vía pavimentada hasta cierto sector con un tramo faltante sin pavimento, estructura con material de afirmado, cuya comunidad priorizó la intervención de esta calle con el fin de dar continuidad al pavimento existente; para ello se construyó una vía en pavimento rígido, con sus estructuras de drenaje.

BARRIO LA ISABELA
PAVIMENTO RIGIDO



ALCALDÍA DE POPAYÁN
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

F-GC-CT-14

Versión: 01


Página 6 de 30



Condiciones iniciales de la vía




Instalación de subbase

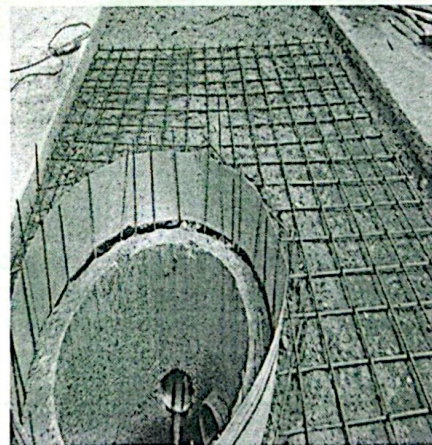


Instalación de acero de refuerzo en losas




Construcción de losas de concreto

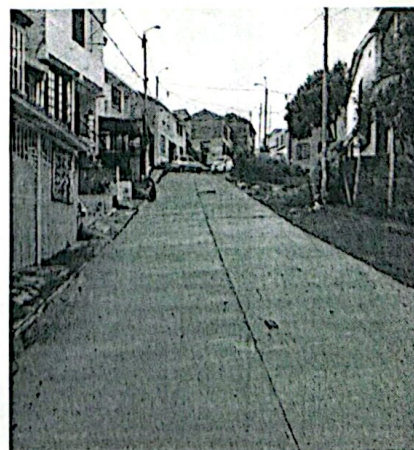

Fundición en concreto de las losas de pavimento

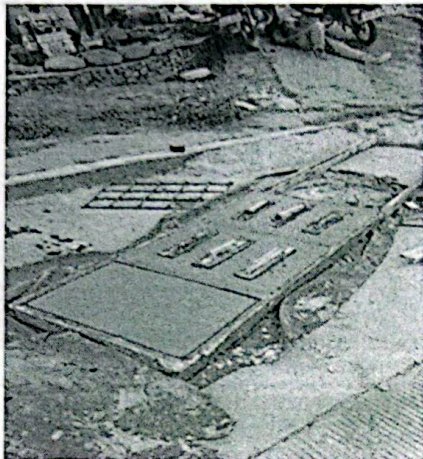

Construcción de tapas de sumideros

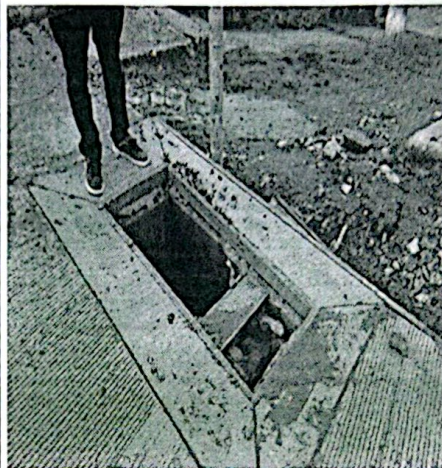


Adecuación y recalce de sumideros

BARRIO PRIMERO DE MAYO

La vía intervenida corresponde a un tramo de la calle 16 entre carreras 7 y 8A , cuya vía se encontraba en material de afirmado sin capa de rodadura , por lo cual la comunidad priorizo la construcción de pavimento en concreto rígido , en cuya ejecución se realizaron actividades como : excavación a máquina y/o cajeo , conformación y compactación de subrasante , instalación y compactación de la capa de subbase y fundición de losas en concreto hidráulico Mr 40.

BARRIO PRIMERO DE MAYO

PAVIMENTO RIGIDO

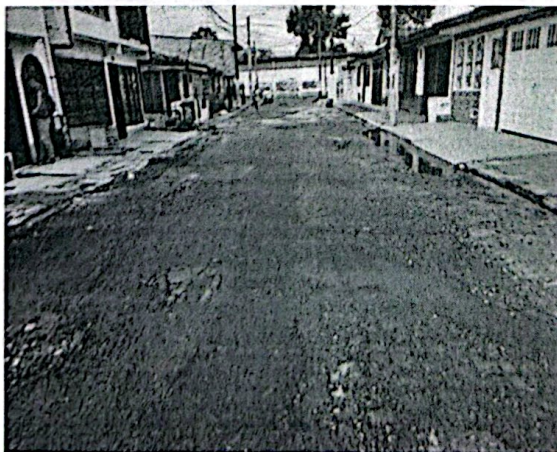

Condiciones Iniciales de la vía

CA



ALCALDÍA DE POPAYÁN
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION


F-GC-CT-14

Versión: 01


Página 8 de 30




Excavación y preparación de la subrasante

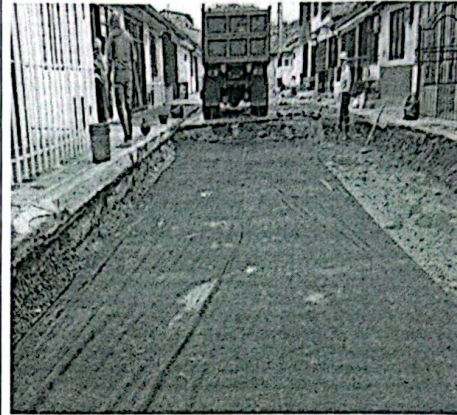


Instalación de geotextil

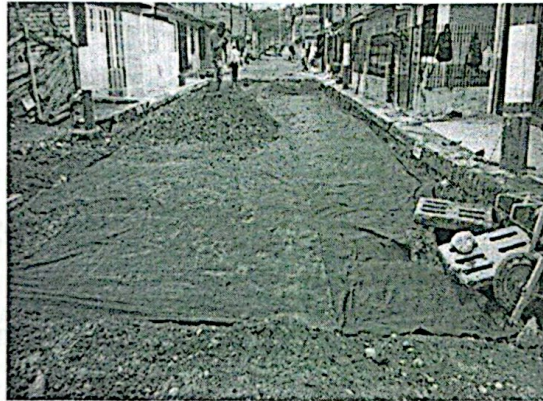

Instalación de geotextil y subbase

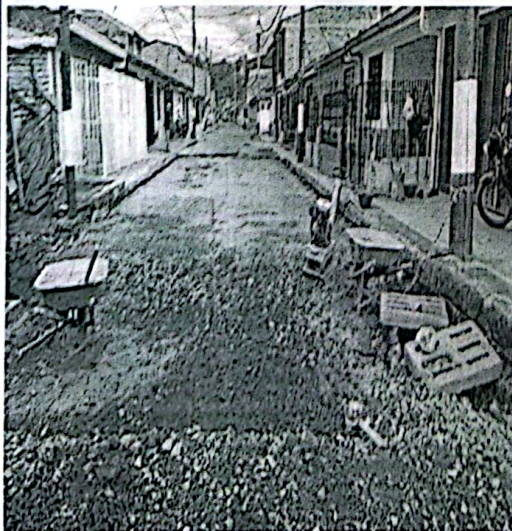


Instalación de subbase

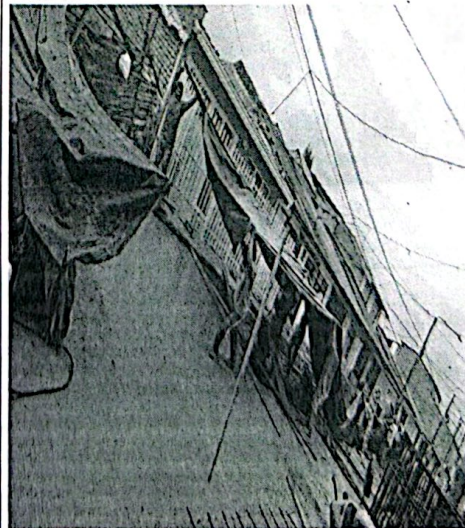


Fundición de losas de concreto

Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075
Conmutador 321 496 5013, www.popayan.gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.gov.co.


115

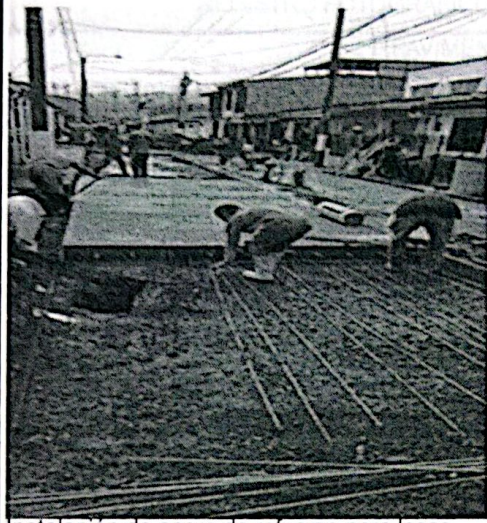


Instalación de acero de refuerzo para losas reforzadas

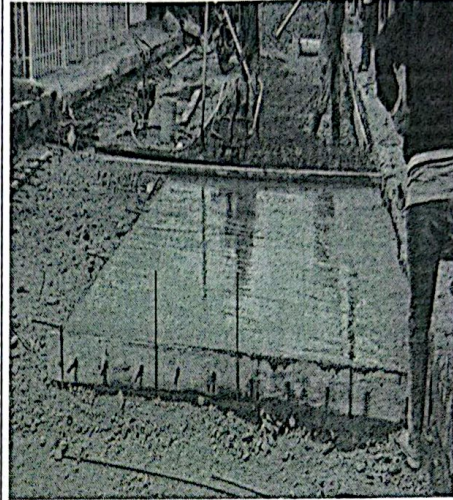

Instalación de pasaderos

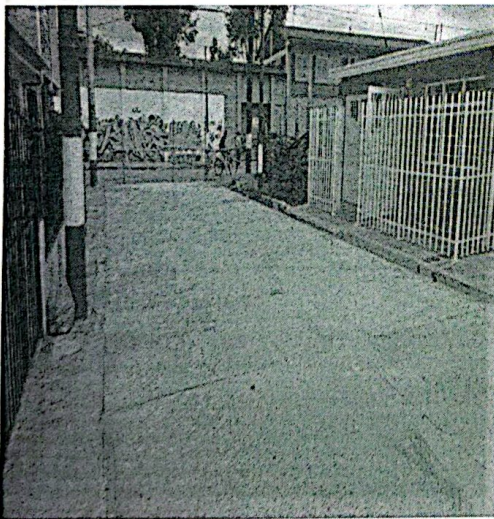

Pavimento en concreto MR 40

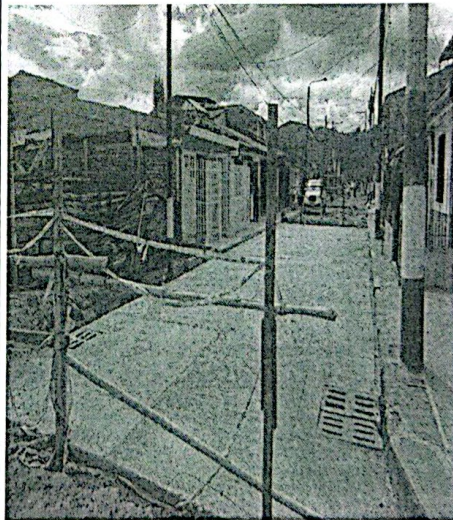

Pavimento en concreto MR 40

BARRIO LA GRAN VICTORIA

Las obras priorizadas por la comunidad del barrio La Gran Victoria , corresponden a la construcción de vías y andenes desde la calle 14A desde la carrera 5 hasta final, en dicho sector no existía una estructura vial , ni andenes ;cuya intervención mejora la movilidad peatonal y contribuye a mejorar las condiciones del inventario vial del sector.

74



REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO LA GRAN VICTORIA


PAVIMENTO RIGIDO



Condiciones iniciales del sector a intervenir




Construcción de bordillos

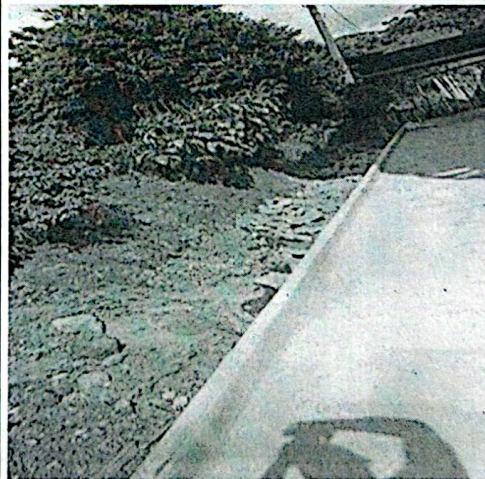


Construcción de bordillos




Excavación para andén

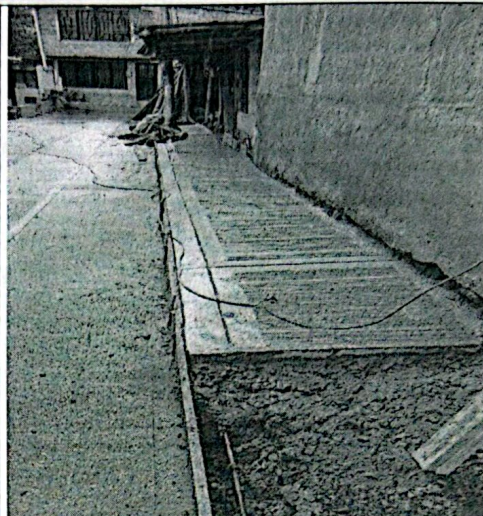

Construcción de andenes

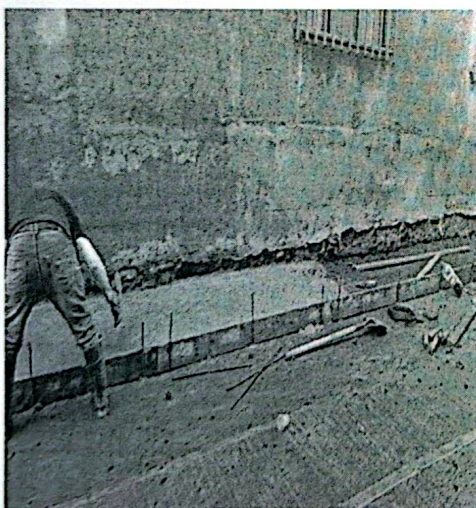

Fundición de andenes

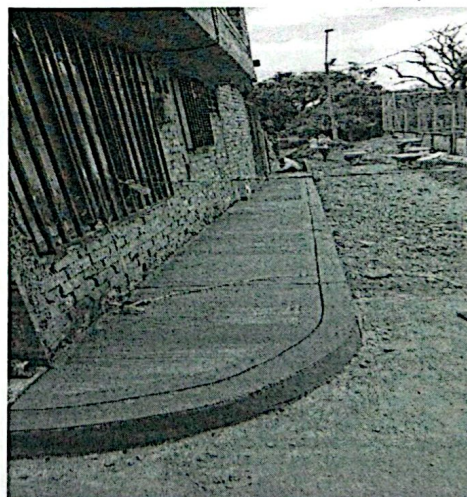


Construcción de andenes

74

BARRIO LOS ANDES


El trabajo se realizó en el barrio Los Andes, donde se está construyendo un andén de concreto en la vía principal. La obra consiste en la excavación, colocación de hierro y fundición de concreto. La vía presenta una condición de deterioro en la superficie de rodadura y una superficie en material grullo.

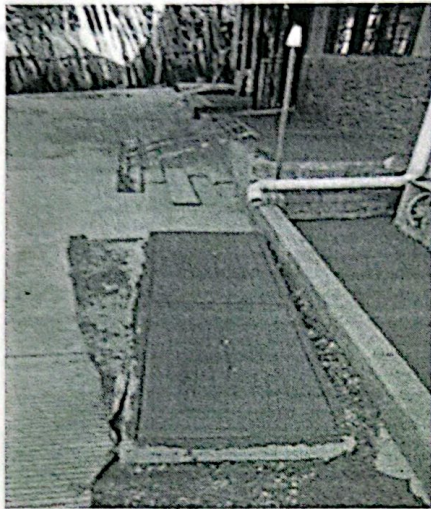


Fundición de tapas



Nivelación de recamara

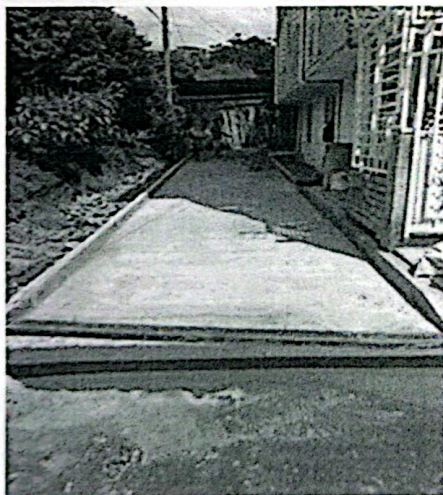

Pavimento en concreto Mr 40

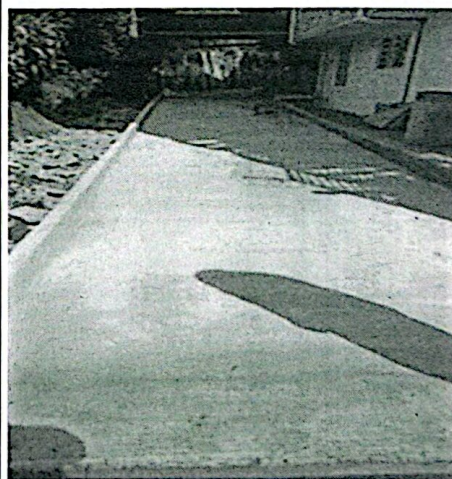

Pavimento en concreto Mr 40

BARRIO LOS ANDES


El barrio Los Andes , perteneciente a la comuna 5 , los presidentes y ediles priorizaron la pavimentación de la carrera 7AE y carrera 7BE , en el tramo comprendido entre la calle 17A y su finalización. La via presente unas condiciones considerables de deterioro con perdida de superficie de rodadura y una superficie en material granular.

[Handwritten signature]




REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO LOS ANDES


PAVIMENTO RIGIDO

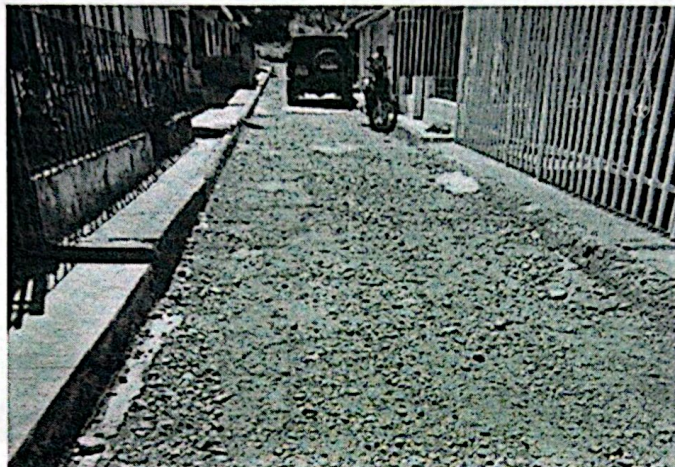


Estado inicial de la vía

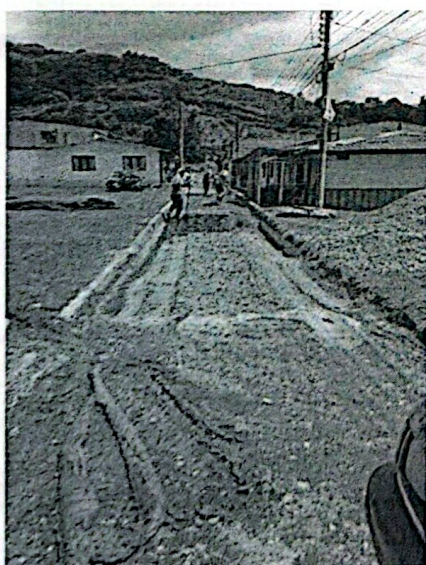


Actividades de excavación y cajeo

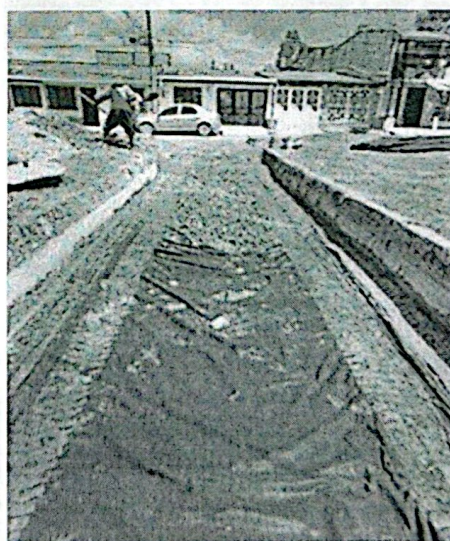


Instalación de Geotextil sobre subrasante

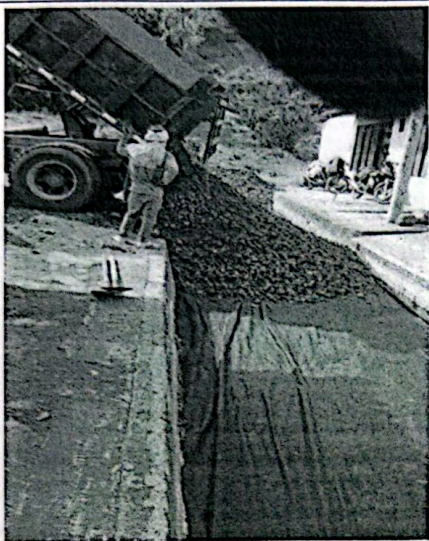

Suministro de subbase

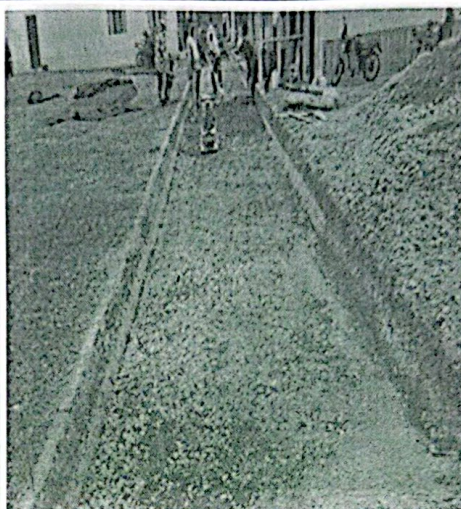

Instalación y nivelación de subbase

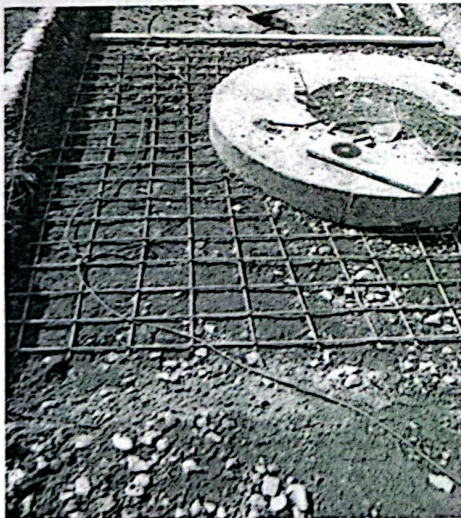


Instalación de acero de refuerzo en losas




Instalación de acero de refuerzo en losas de pavimento rígido

CP

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 15 de 30

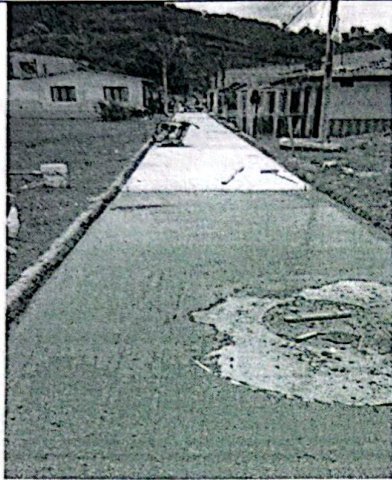

Pavimento en concreto rígido

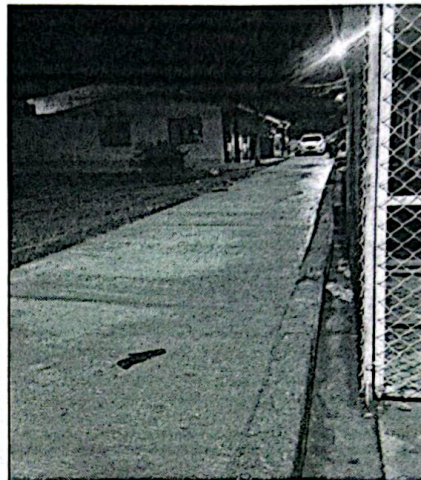

Pavimento en concreto rígido

BARRIO LA ESMERALDA


Las obras del barrio de esmerlada , priorizadas por la comunidad corresponden a la construcción de pavimento rígido y bordillos en la calle 8B entre carreras 19 y 20 , la via se encuentra en un sector residencial y comercial , con un gran deterioro del pavimento asfáltico por el desgaste de la carpeta asfáltica por vejez , como un proceso natural de deterioro, acelerado por cargas de tráfico repetitivas, oxidación del material, humedad y ciclos de temperatura, provocando agrietamiento, fatiga ("piel de cocodrilo"), baches y desprendimiento de material ,asi como la intervención por reposición de redes de alcantarillado, esta situación ha generado que la comunidad priorice esta via para su pavimentación con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y mejora de calidad de vida de sus habitantes.

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO LA ESMERALDA


PAVIMENTO RIGIDO




Condiciones iniciales de la vía

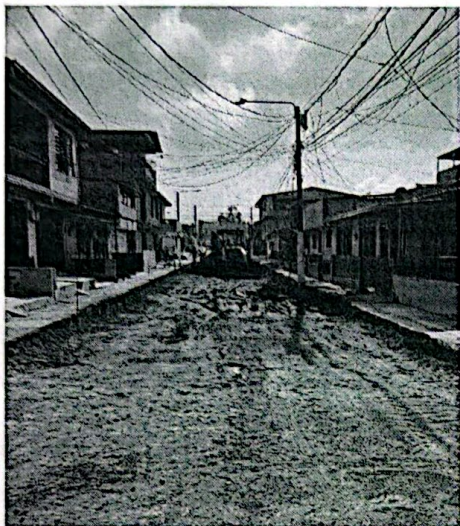

Excavacion a máquina (Cajeo)

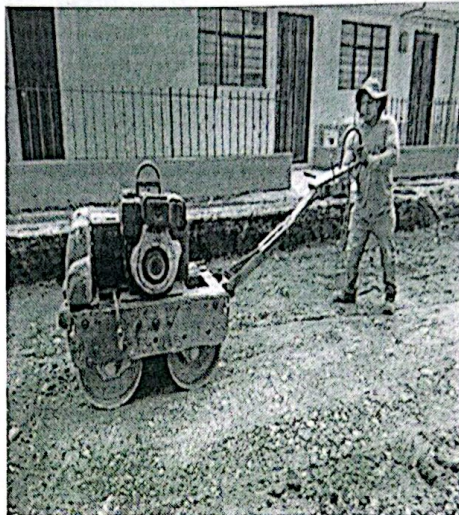

Compactación de subrasante mejorada

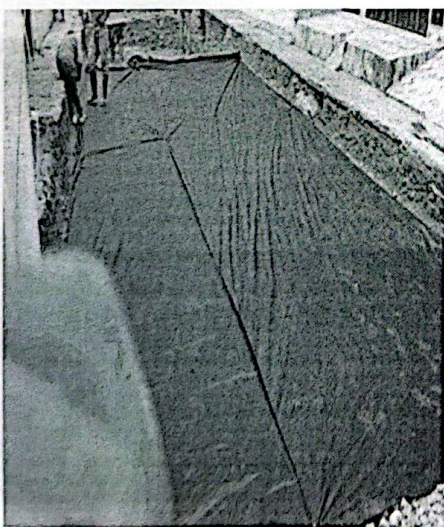

Instalacion de geotextil en subrasante




Instalación y compactación de subbase

CP




ALCALDÍA DE POPAYÁN
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION


F-GC-CT-14
Versión: 01
Página 17 de 30

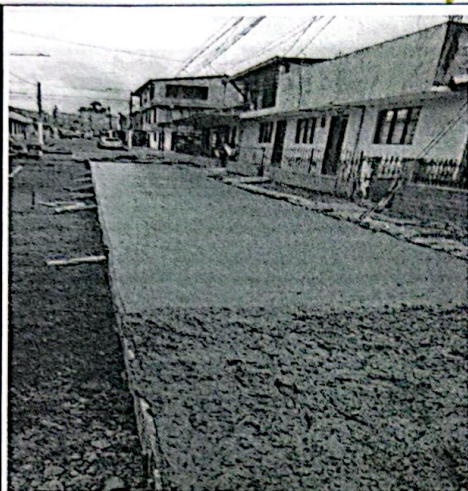


Fundición de losas en concreto Mr40

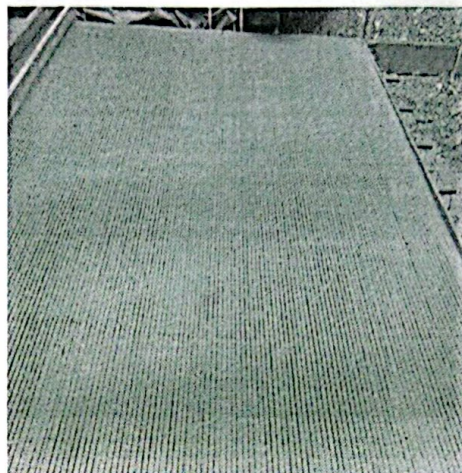

Proceso de texturizado de losas de concreto

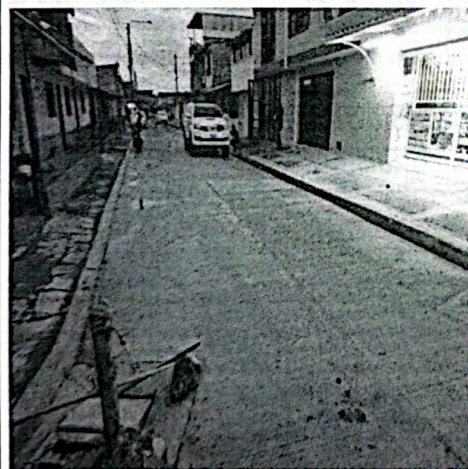


Construcción de pavimento rígido

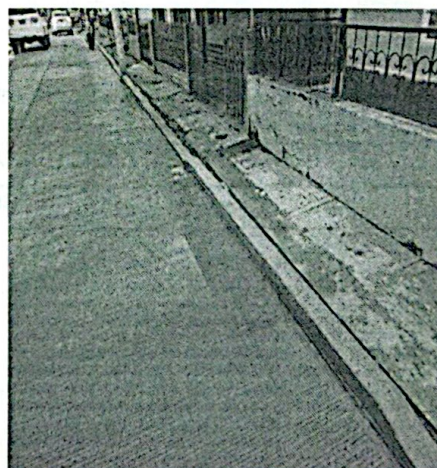

Construcción de bordillos en concreto

NA

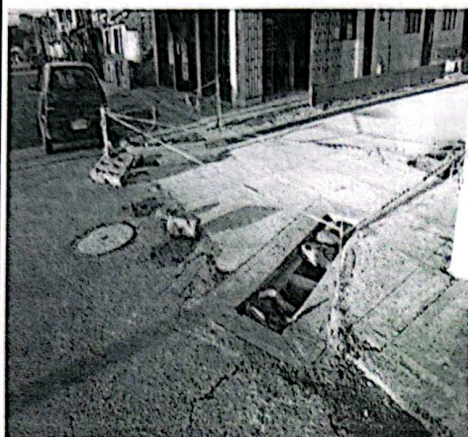

Construcción de sumideros



Construcción de sumideros

BARRIO LOMA DE LA VIRGEN

La intervención en la loma de la virgen ,corresponde a un muro de contención en concreto reforzado que tiene como propósito estabilizar la banca y mejorar las condiciones estructurales de contención de la via ubicada en la calle 26 entre carreras 10B y 11.

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO LOMA DE LA VIRGEN

MURO DE CONTENCIÓN




Estado inicial del sector

CVK



ALCALDÍA DE POPAYÁN
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

F-GC-CT-14
Versión: 01
Página 19 de 30

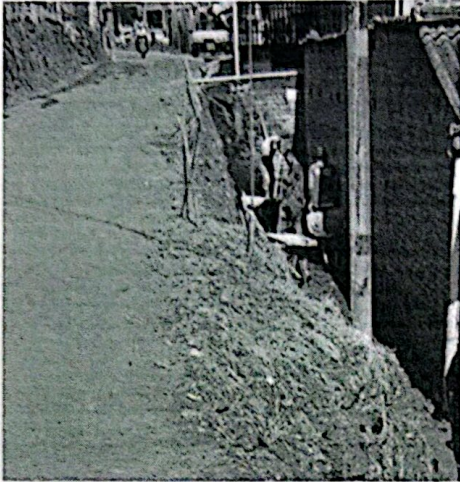


Excavaciones en material común



Nivelación de la excavación



Instalación de acero de refuerzo

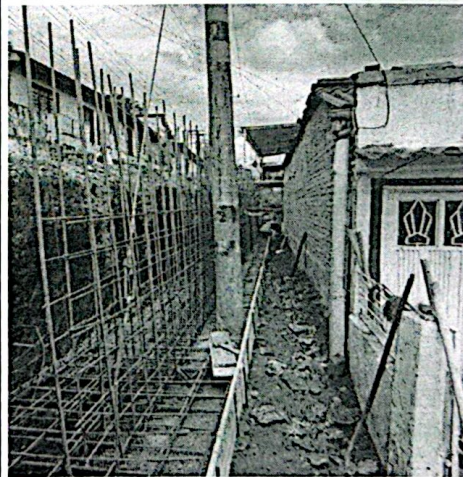


Instalación de acero de refuerzo

Handwritten signature




ALCALDÍA DE POPAYÁN
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION


F-GC-CT-14
Versión: 01
Página 20 de 30

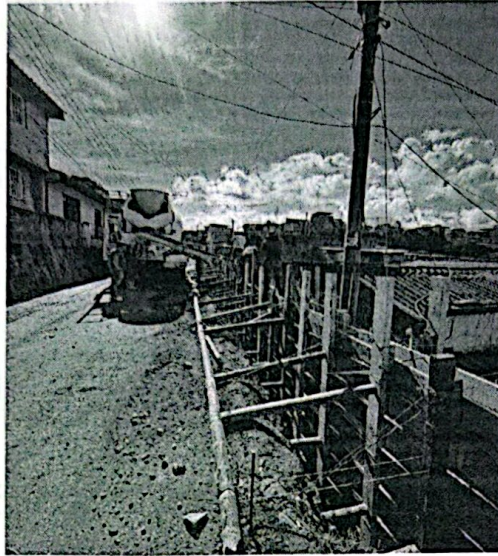

Fundición de muro en concreto

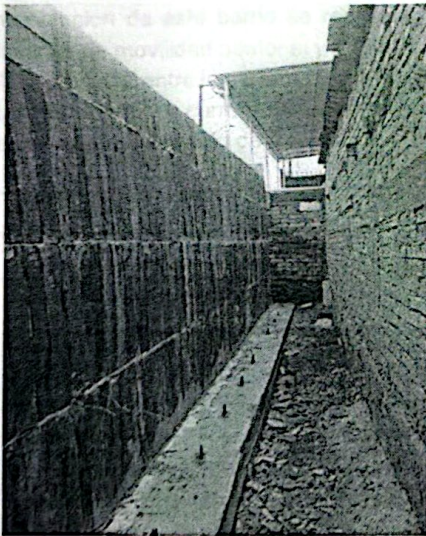


Muro de contención

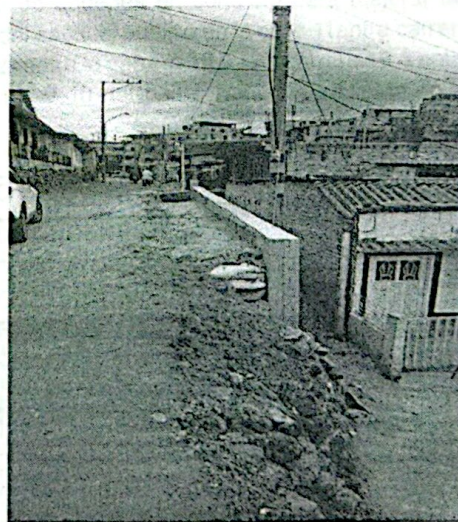


Muro de contención

64

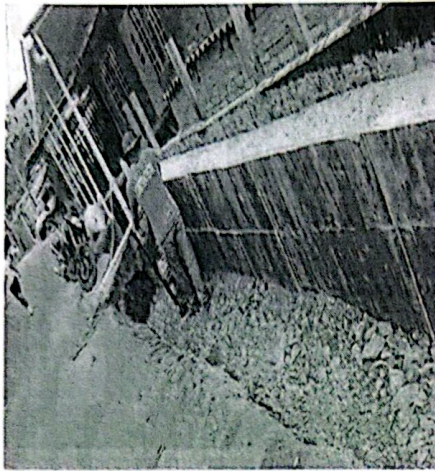

Instalación de relleno compactado en muro

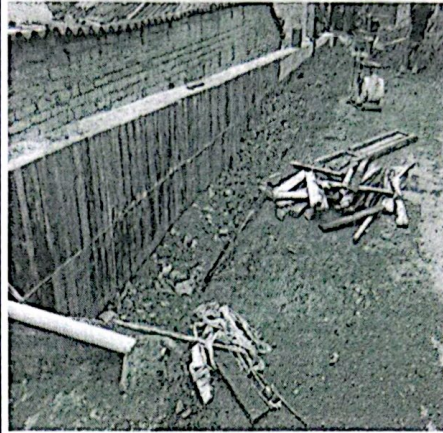


Instalación de relleno en muro

BARRIO SANTA FE

La intervención de este barrio se realiza a través de andenes en concreto para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y mejoramiento del espacio público en la calle 11 entre carrera 19 y 19A, calle 12 entre la carrera 19 y 19ª, calle 12A entre la carrera 19 y 19ª, carrera 19 A entre las calles 13ª y 11 y carrera 19 entre las calles 13ª y 10 del barrio Santa Fe ubicado en el suroccidente del municipio de Popayán.

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO SANTA FE


CONSTRUCCION DE ANDENES

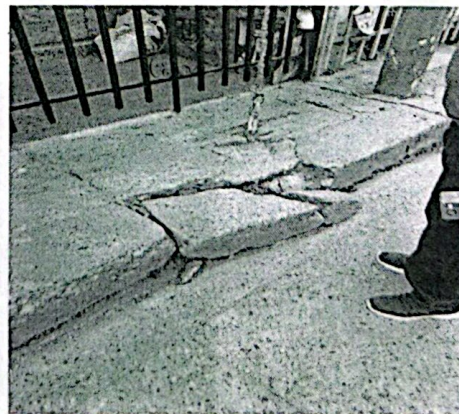


Estado inicial de los sectores




Excavaciones mano de material común

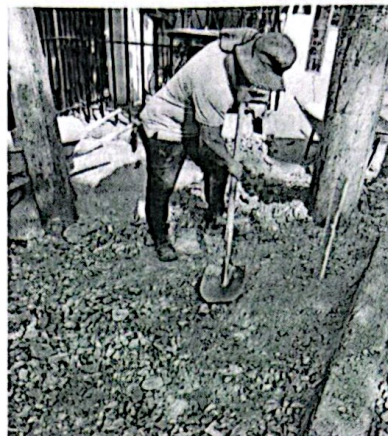


Relleno para andenes

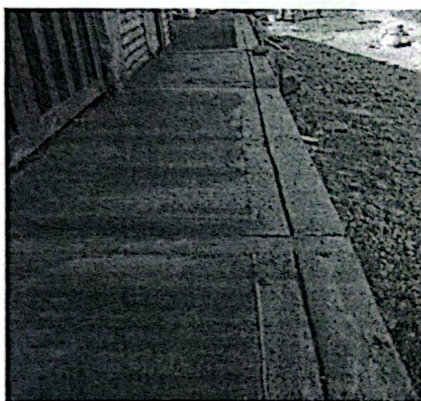

Construccion de andene

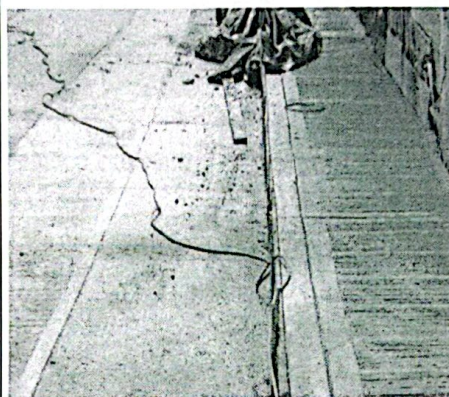

Construcción de andenes

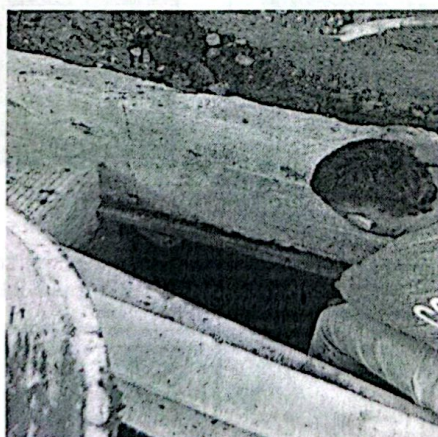

Construccion de sumideros


64




BARRIO SANTA RITA

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO SANTA RITA


CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN

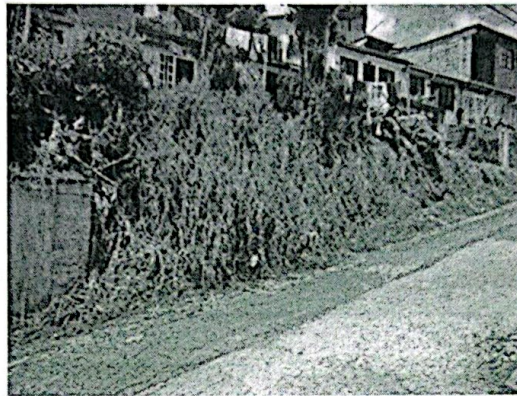

Estado inicial de sector a intervenir

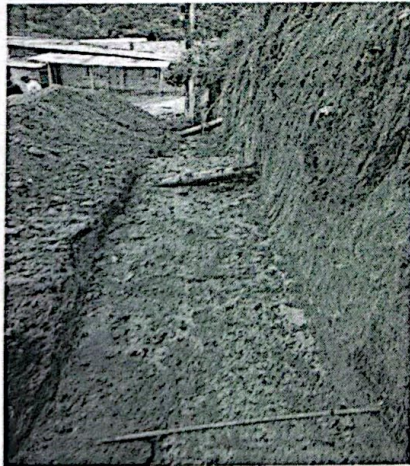

Excavación manual en material común para construcción del muro

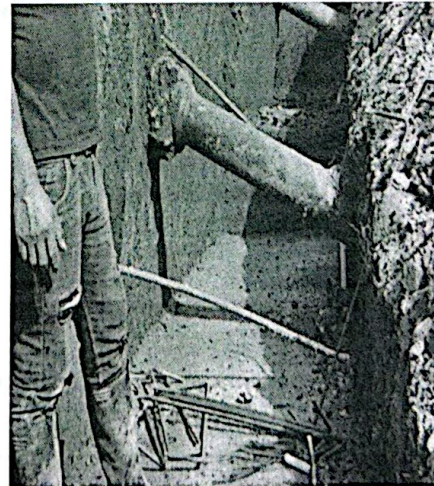


Construcción de solado para muros




ALCALDÍA DE POPAYÁN
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

F-GC-CT-14
Versión: 01
Página 24 de 30

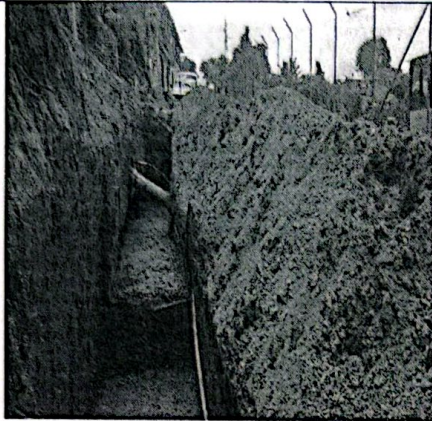


Construcción de solados en concreto Clase F

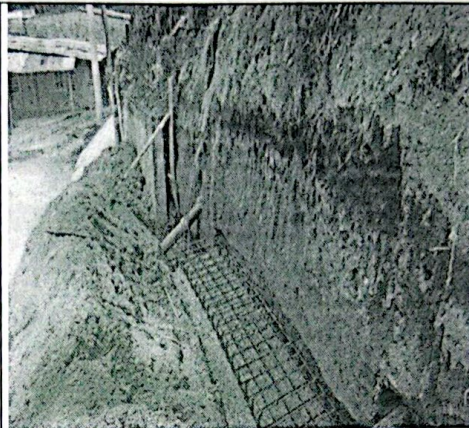

Instalación de acero de refuerzo de zarpa



Instalación de acero de refuerzo

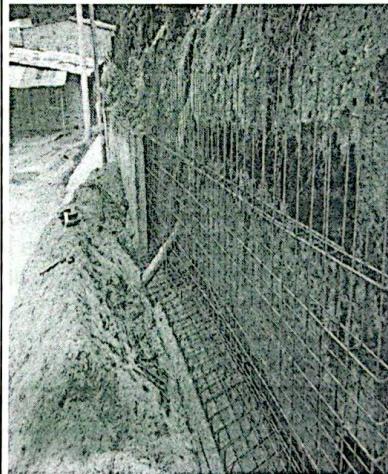

Acero de refuerzo del cuerpo del muro

OK



Muro en concreto reforzado

BARRIO TREINTA Y UNO DE MARZO

La intervención del sector corresponde a construcción de pavimento rígido en la calle 15 entre carreras 33 y 33C, cuya vía se encontraba en mal estado sin pavimentar con una superficie sin rodadura, lo cual fue necesario realizar un muro de contención, pavimento en concreto rígido y bordillos.


REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO TREINTA Y UNO DE MARZO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO




Estado Inicial de la vía a intervenir

Handwritten signature

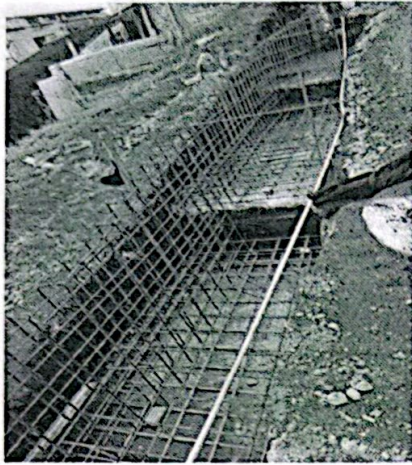


Instalación de acero de refuerzo para muros

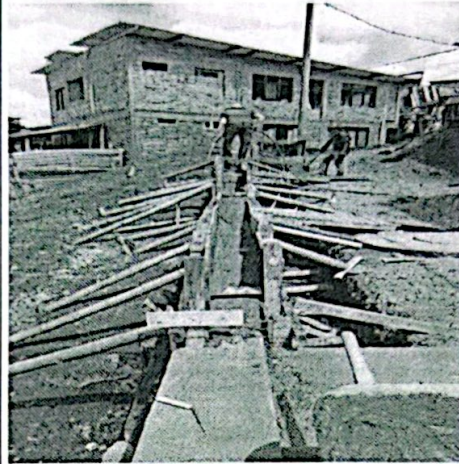

Formateado y Fundición en concreto de muro de contención







Fundición de muro en concreto

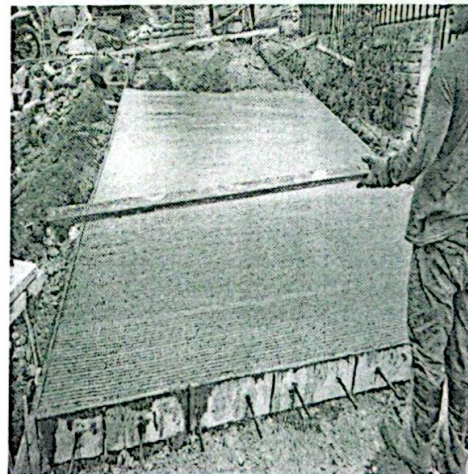

Fundición de losas en concreto

GH


41
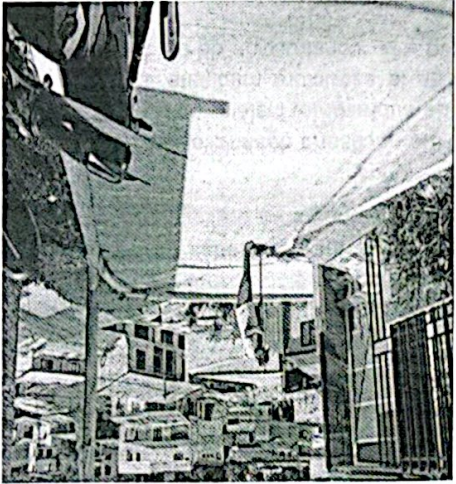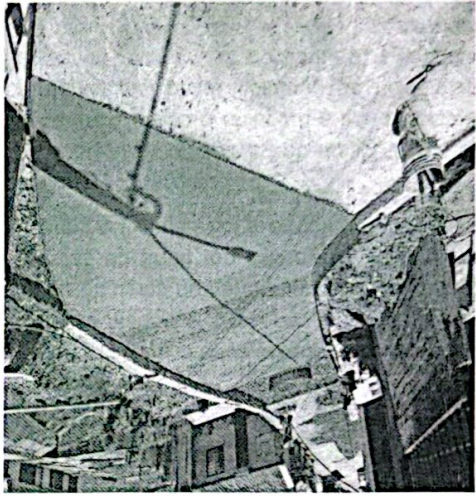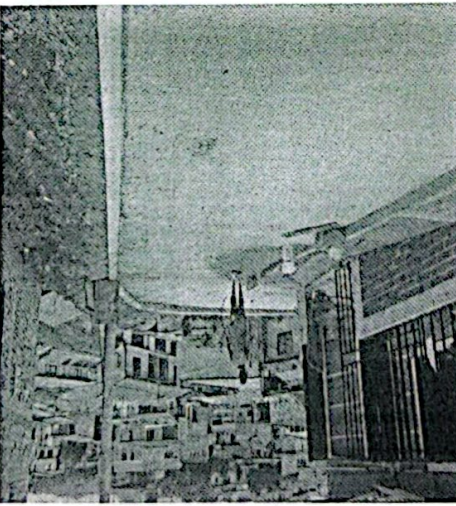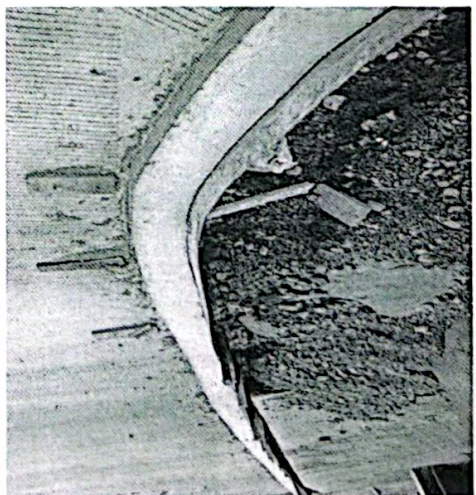
<p>Pavimento en concreto rígido</p> 	<p>Pavimento en concreto rígido</p> 
<p>Construcción de bordillos</p> 	<p>Fundición de bordillo en concreto</p> 

<p>F-GC-CT-14</p>	<p>ALCALDIA DE POPAYÁN</p>	
	<p>INFORME MENSUAL DE SUPERVISION</p>	

<p>Página 27 de 30</p>
<p>Versión: 01</p>

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 28 de 30

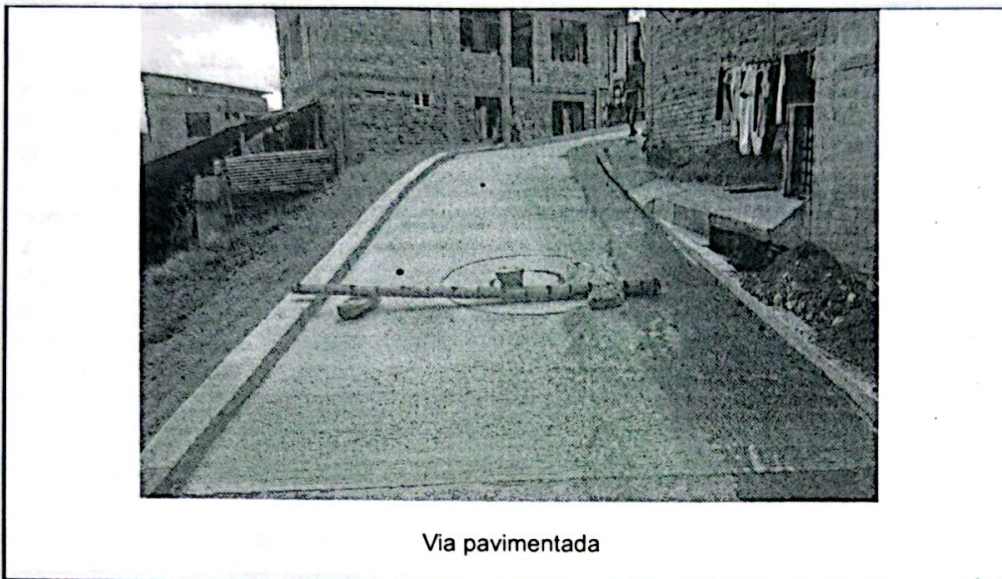

3. CONCEPTO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Las obras contratadas entre el municipio de Popayán y la asociación de juntas de acción comunal que tiene como propósito la construcción de vías en pavimento rígido, andenes y muros de contención que componen un conjunto de intervenciones de mejoramiento vial en los sectores priorizados, se verifico por parte de esta supervisión que las actividades de construcción se ejecutaran conforme a las especificaciones técnicas y cronograma previamente establecidos, entre ellas se destaca:

La construcción de pavimento rígido, por lo cual fue necesario desarrollar las actividades de: Excavaciones a máquina o cajeo, compactación de subrasante, instalación de mejoramiento , instalación de geotextil Tejido , la construcción de la estructura mediante la instalación de subbase y la fundición de losas en concreto MR40 y la construcción de bordillos en algunos sectores.

Para la construcción de andenes en el barrio de Santa Fe y Los Andes se destacan actividades realizadas como la demolición de andén deteriorado existente, excavaciones sin clasificar a mano, relleno y fundición de andén concreto de 21Mpa y bordillos.

En sectores como La esmeralda, Los Andes, La isabela y Santa fe se realizó la construcción de sumideros, para ellos fue necesario la demolición de sumideros existentes y construcción de sumideros sobre la vía intervenida , y en otras ocasiones el recalce y nivelación de brocales y sumideros ,

La construcción de muros en los barrios Lomas de la virgen y santa Rita y el barrio 31 de marzo , se realizaron actividades correspondientes a : excavaciones a mano , fundición de solados, instalación de acero , formateado y fundición del muro (zarpa + cuerpo) en concreto clase D(21Mpa), con sus respectivos drenes , así como la construcción de un filtro (geotextil NT y

Handwritten signature

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 29 de 30

material filtrante) en la parte posterior del muro y construcción de relleno compactado

Por medio del presente convenio se intervinieron 10 barrios del area urbana del municipio de Popayán, lo que se traduce en un porcentaje del 100% del objeto del convenio, beneficiando tanto a los habitantes de los sectores intervenidos como a la comunidad colindante. Los recursos del convenio se manejaron de acuerdo con la CLAUSULA 8: MANEJO DE LOS RECURSOS, numeral IV: De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021 el OAC deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos y la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, numeral XXI: Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte el Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal.

1. Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra

Durante la ejecución de obra se abrieron los frentes de obra para ejecución de las diferentes sectores , lo que hace que los avances de obra en cada frente sean los esperados , no se registraron suspensiones o modificatorios, dado que tanto las condiciones climáticas como las operativas en obra no alteraron la estructura del cronograma, favoreciendo el cumplimiento total del objeto del convenio.

Si bien se presentaron tiempos de de lluvias en algunos días fue necesario trabajar con plásticos para poder dar continuidad a las fundiciones.

En algunos sectores se encontraron redes de servicios públicos (redes de internet , conexiones hidráulicas y conexiones sanitarias) superficiales por lo cual fue necesario su profundización y protección para poder garantizar que no se registren daño mecánicos , rupturas por presión etc.

2. Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas

EL SUPERVISOR se acoge a las consideraciones técnicas realizadas por el ingeniero de Apoyo del conveniente ,cuya verificación de calidad se encuentra consignadas en los informes de obra presentado asi como en el informe final de obra y validadas en la preacta presentada por el conveniente

3. Informe financiero

En la siguiente tabla se muestra como fue el balance de los recursos invertidos y como se fue amortizando los recursos entregados.

BALANCE DEL CONVENIO		
Valor APOORTE MUNICIPIO:	\$ 669.480.355,00	
Valor APOORTE OAC	\$ 26.779.213,00	\$ 26.779.213,00
Valor adición :		
Valor desembolso 1		\$ 334.740.177,50
Valor pagado acta 1 y final		\$ 334.740.177,50


GA

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-14
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 01
		Página 30 de 30

Valor por multas impuestas al Contratista		
Saldo a favor del Municipio:		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$696.259.568,00	\$696.259.568,00

En consecuencia a lo anterior y teniendo como soporte el acta No. 1 y final suscrita el 31 de diciembre de 2025 , el conveniente ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN- ASOCOMUNAL ejecuto la obra al 100% , atendiendo en su totalidad los sectores intervenidos priorizados por las juntas de acción comunal , dando cumplimiento al objeto del convenio solidario .

Se firma el presente informe, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025


CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
 Supervisor del Convenio

Proyectó: Javier montilla – contratista apoyo a supervisión
 Proyectó: Carlos Fernando Castro Franco- Supervisor del convenio
 Anexos: N/A.
 Copia: N/A
 Archivado en: Carpeta del Convenio Oficina Asesora Jurídica y SECOP II
