

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 25-0107

OBJETO DEL CONTRATO:

“INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO, INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR LOTE
1,2 Y 3”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 04

PERIODO DEL: 1 al 31 de marzo 2026



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Descripción del proyecto.....	5
2.1. Antecedentes	5
2.2 Localización	7
3. Actividades previstas para ejecutar en el sitio del proyecto	8
4. Características técnicas del proyecto.	9
5. Representantes de las entidades involucradas al proyecto	9
5.1 Información general del contrato.....	10
5.1.1 Representantes de la Entidad Contratante	10
5.1.2 Representantes del Contratista	10
5.1.3 Representantes de la Interventoría.....	10
5.1.4 Información de domicilio del Contratista de Obra	10
5.1.5 Información de domicilio del Contratista de Interventoría.....	10
6. Información contrato de obra	11
6.1 Pólizas o garantías contrato de obra	11
7. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes enero 2025.	13
7.1 Preliminares.....	13
7.2 Excavaciones y rellenos	13
7.3 Comités de obra	13
7.5 Análisis del avance de obra	16
7.5.1 Avance físico y financiero de la obra	18
7.5.2 CURVA S.....	19
7.6 Seguimiento Programa de Obra.	19
8. Aportes ejecución mensual contrato de obra	20
8.1. Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra.	20
8.2. Información financiera del contrato de obra.	20
8.4. Ensayos de Laboratorio.	21
8.7. Revisión y verificación de pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social.	21

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

9.	Información Contrato de Interventoría	22
9.1	Información general del contrato de interventoría.....	22
9.2.	Pólizas o garantías contractuales de interventoría.....	22
9.3.	Seguimiento a la inversión del Anticipo.	24
9.4.	Acta parcial de interventoría	24
10.	Gestión de interventoría	25
10.1.	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.	25
10.2	Informes especialistas.	26
10.2.	Gestión sst y ambiental.....	26
10.4.	Gestión social	26
10.	Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría	26
10.1.	Control diario del equipo de la Interventoría.....	26
10.2.	Control diario del personal de Interventoría.....	26
10.3.	Información financiera Contrato de Interventoría.	27
10.4.	Revisión y verificación de pago de aportes legales (Parafiscales) y seguridad social.....	27
11.	Conclusiones y recomendaciones	28
12.	ANEXOS	29
13.	REGISTRO FOTOGRAFICO	29

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

1. Introducción.

El presente documento elaborado por CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE DESARROLLO SAS- COINDESAS contiene el INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 04 DE INTERVENTORÍA, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 al 31 de MARZO de 2026, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del Contrato de Interventoría No. 25-0107, Cuyo objeto es “INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR LOTE 1,2 Y 3”

El Contratista responsable de las obras del CONTRATO 2567 DE 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. (LOTE 1), es el CONSORCIO BIENESTAR RECREATIVO 25, con NIT 901.976.418-1

En este Informe, la Interventoría hace una descripción a EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR- EDURBE de las actividades realizadas, de tal manera que le permita tener a la entidad una visión general del desarrollo del CONTRATO No. 25-0107, desde la firma del acta de inicio, en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y demás.

En este informe se presentará también una descripción general del proyecto, información del contrato de Obra y de Interventoría, el estado general del contrato, junto con el avance de las actividades contratadas, el detalle de los recursos humanos y de equipos que involucran al Contratista en el período en cuestión. Finalmente se presenta un registro fotográfico que permite observar el avance de las obras más específicas y un análisis de la programación y el estado actual del contrato dejando las recomendaciones y conclusiones pertinentes.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

2. Descripción del proyecto.

El proyecto objeto del contrato corresponde al “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, cuyo propósito principal es fortalecer la infraestructura deportiva municipal, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de actividades físicas, recreativas, culturales y comunitarias.

La iniciativa surge ante la clara insuficiencia de escenarios deportivos en el municipio y el deterioro de los espacios existentes, situación que limita los accesos de la población, especialmente niños y jóvenes, a actividades deportivas formales, recreación saludable y programas de integración social.

El proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Clemencia, promoviendo hábitos saludables, disminuyendo problemáticas sociales derivadas del sedentarismo y fortaleciendo el tejido social comunitario.

2.1. Antecedentes

Colombia, el Departamento de Bolívar y el Municipio de Clemencia, desde hace décadas se mantienen en la búsqueda de la disminución de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las disparidades territoriales es por ello por lo que se enfocan en las necesidades de los territorios y se enfoca en estrategias y programas que generen desarrollo.

Es por esto por lo que las diferentes administraciones Departamento de Bolívar y del Municipio de Clemencia se han preocupado por realizar inversiones en infraestructura que le permitan incrementar su desarrollo social, económico y sostenible en su territorio.

Es importante reconocer que, en los últimos años, el Departamento de Bolívar ha ejecutado obras que demuestran el avance en materia deportiva. Sin embargo, a pesar de estos grandes esfuerzos, aún existe una brecha en cuanto a la no disponibilidad de unidades deportivas en la zona rural y urbana del departamento.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	

Es por ello por lo que se busca promover las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones de manera sostenible y articulada, para la transformación social y la paz de la población Bolivarenses.

El Departamento de Bolívar y el Municipio de Clemencia, están en constante búsqueda de desarrollo sostenible y progresivo, donde la comunidad viva mejor, con espacios para la integración, el sano esparcimiento y la actividad deportiva.

Lo anterior con miras a que el Departamento de Bolívar y el Municipio de Clemencia sean un territorio llamativo para invertir, un Departamento con una visión turística, que los visitantes y la comunidad cuenten con óptimos espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

La poca práctica deportiva y recreativa en un territorio generalmente se debe a que hay pocos escenarios disponibles o porque no hay suficientes incentivos.

Algunos espacios destinados a la práctica deportiva no están disponibles porque se encuentran en alto estado de deterioro, implicando riesgo de lesiones o porque han sido ocupados para desarrollar otras actividades. Generalmente cuando esto ocurre y hay buena demanda de usuarios, la oferta de los espacios en buenas condiciones empieza a ser de orden privado, lo cual limita la accesibilidad a ciertos niveles de ingreso.

Por otro lado, pueden existir espacios disponibles y accesibles pero subutilizados por la ausencia de programas de fomento al deporte y la recreación en la entidad territorial.

A pesar de existir interés en la comunidad, factores como los descritos, reducen la disposición hacia la práctica deportiva. Se presenta práctica informal del deporte y los interesados se van a otras poblaciones y finalmente, la comunidad empieza a hacerse sedentaria.

Dentro de los principales impactos que podemos analizar asociados a la poca oferta de espacios para la práctica deportiva estarían: los problemas de salud pública asociados al sedentarismo, como la obesidad y el exceso de peso, la migración de deportistas jóvenes con talento a otros lugares con mejor infraestructura, lo cual hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte, y algunas patologías sociales asociadas al ocio y al mal uso del tiempo libre. Lo cual podría incidir negativamente en la calidad de vida de las personas en la comunidad a falta de espacios para el deporte.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

2.2 Localización

El proyecto se desarrolla en el municipio de Clemencia, ubicado al norte del Departamento de Bolívar, con cercanía al distrito de Cartagena de Indias. Se encuentra localizado en una zona de relieve poco montañoso, con alturas inferiores a los 300 metros sobre el nivel del mar. Las coordenadas geográficas aproximadas son 10° 34' 03" de Latitud Norte y 75° 19' 33" de Longitud Oeste.

Clemencia se encuentra al norte del departamento de Bolívar, Se ha consolidado como un territorio con vocación agrícola y comercial, apoyado en su ubicación estratégica sobre el corredor vial de La Cordialidad, lo que le ha permitido articularse con los municipios vecinos y gestionar proyectos de impacto social y comunitario, constituyéndose en un municipio con potencial de desarrollo dentro del norte del Departamento de Bolívar.

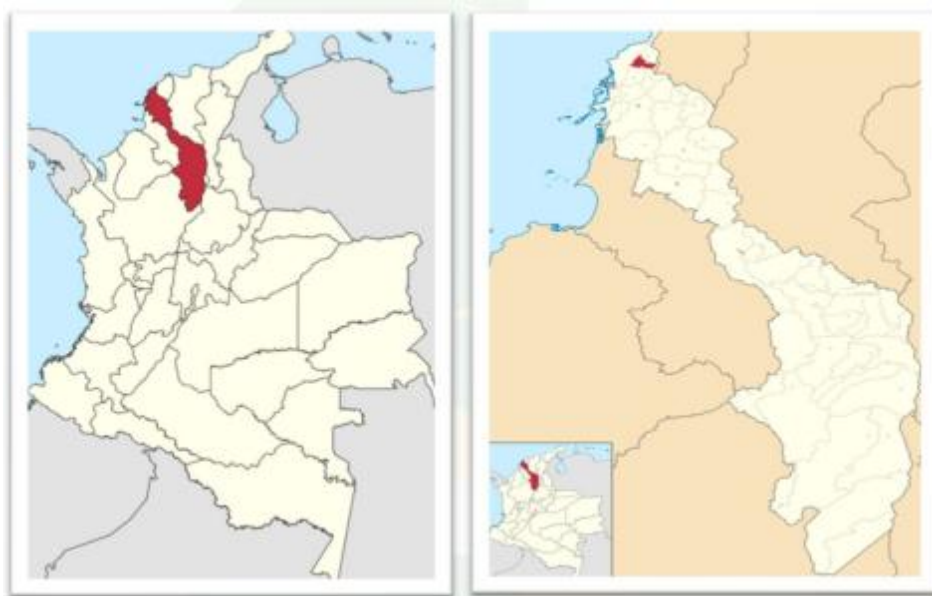


Ilustración 1. Localización Municipio de Santa Rosa de Lima - Departamento de Bolívar.

Fuente: Anexo técnico

Aspectos geográficos relevantes:

Fisiografía: El municipio se emplaza en un área de relieve suave, con terrenos aptos para urbanización e infraestructura recreo deportiva.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

Hidrografía: Clemencia está influenciada por cuerpos de agua menores propios de la región, sin presencia de grandes ríos inmediatos; sin embargo, su dinámica hídrica incide en aspectos de drenaje pluvial y manejo de aguas superficiales en el predio del proyecto.

Accesibilidad: El municipio cuenta con vías de conexión hacia Cartagena, Calamar, María La Baja y otros centros poblados, lo que facilita la movilidad de usuarios, equipos y materiales para la ejecución del proyecto.

3. Actividades previstas para ejecutar en el sitio del proyecto

De acuerdo con el Anexo Técnico del proceso licitatorio, la construcción del Estadio Municipal de Fútbol contempla los siguientes componentes principales:

1. Movimiento de Tierras y Preparación del Terreno

- Limpieza, descapote y adecuación de la superficie.
- Nivelación y conformación del terreno para el campo de juego y zonas complementarias.

2. Construcción del Campo de Juego

- Conformación de la subrasante y capas estructurales.
- Instalación del sistema de drenaje y manejo de aguas superficiales.
- Implementación del acabado de la superficie de juego según especificaciones del proyecto.

3. Construcción de Graderías y Estructuras Complementarias

- Construcción de graderías nuevas o mejoradas en concreto.
- Instalación de techos y cubiertas metálicas donde aplique.
- Adecuación de zonas para espectadores.

4. Cerramiento Perimetral y Control de Accesos

- Instalación de cerramiento metálico o en malla eslabonada.
- Construcción de accesos peatonales y vehiculares.

5. Construcción y Adecuación de Instalaciones Sanitarias y de Apoyo

- Baños y camerinos para deportistas y público.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	

- Cuartos técnicos y áreas de servicio.

6. Urbanismo y Circulaciones Exteriores

- Andenes, senderos, zonas duras y blandas.
- Espacios para circulación perimetral y accesibilidad.

7. Obras Eléctricas y de Iluminación

- Sistema de iluminación general del estadio.
- Instalación eléctrica interna para áreas sanitarias, oficinas y zonas complementarias.

4. Características técnicas del proyecto.

El alcance del proyecto se enmarca en la ejecución integral de la obra definida en el pliego y sus anexos. Este incluye la construcción completa del Estadio Municipal de Fútbol, conformado por:

- Campo de juego reglamentario.
- Graderías nuevas con estructura metálica y concreto.
- Baños, camerinos y cuartos técnicos.
- Sistema de drenaje interno y externo.
- Cerramiento perimetral del estadio.
- Urbanismo y accesos.
- Iluminación y sistema eléctrico asociado.

5. Representantes de las entidades involucradas al proyecto

En las Tablas 1, 2 y 3 se presentan los representantes legales, directores y/o supervisores de las entidades involucradas en la ejecución del proyecto correspondiente al **Lote 1 – Construcción del Estadio Municipal de Fútbol en el Municipio de Clemencia, Bolívar.**

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

5.1 Información general del contrato.

5.1.1 Representantes de la Entidad Contratante

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAVIER ENRIQUE AYOLA AYOLA

Tabla 1 Representantes de la entidad contratante. Elaboración propia

5.1.2 Representantes del Contratista

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
CONSORCIO BIENESTAR RECREATIVO 25	REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN JOSÉ MORALES SALAS
	DIRECTOR DE OBRA	JAIME ARNALDO RUBIANO CAMARGO

Tabla 2 Representantes del Contratista-Consortio emprendimiento deportivo. Elaboración propia

5.1.3 Representantes de la Interventoría

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR Y CARTAGENA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	JORGE MORRIS
CONSULTORÍA E INGENIERIA DE DESARROLLO S.A.S. - COINDESAS	REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO ENRIQUE SANDOVAL RUIZ

Tabla 3 Representantes de la interventoría-Consultoría e ingeniería de desarrollo SAS. Elaboración propia

5.1.4 Información de domicilio del Contratista de Obra

- Dirección del Contratista: Barrio Almirante Colón, Manzana I, Lote 23, T E. – Cartagena.
- Teléfono: **3157201323**
- Correo electrónico: consorciobienestarrecreativo@gmail.com

5.1.5 Información de domicilio del Contratista de Interventoría

- Dirección del Contratista: CR 49 D CL 101 87 - Ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico.
- Teléfono: **3107037634**
- Correo electrónico: coindesas2025@gmail.com

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

6. Información contrato de obra

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
OBJETO	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. (LOTE 1)
CONTRATO DE OBRA	2567 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO BIENESTAR RECREATIVO 25
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN JOSE MORALES SALAS
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.654.632.837
PLAZO TOTAL	8 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE AGOSTO DE 2026

Tabla 4 Información contrato de obra. Elaboración propia

6.1 Pólizas o garantías contrato de obra

El contratista se obliga a constituir a su cargo y a favor del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, garantías que amparen la ejecución del contrato de obra 2567 DE 2025 con las cuantías y vigencias establecidas, la póliza N° 196998 ampara el cumplimiento del contrato de obra y la póliza N° 196999, correspondiente a la responsabilidad extracontractual expedidas por la compañía NACIONAL DE SEGUROS. En los siguientes cuadros se muestra las vigencias y valores respectivos.

 GOBERNACIÓN de BOLIVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA		 DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLIVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR		 CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 196998							
FIRMA DEL CONTRATO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO / BENEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	30%	8/09/2025	8/09/2026	\$ 2.596.389.851.10
2		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		5%	8/09/2025	8/05/2029	\$ 432.731.641.85
3		ESTABILIDAD DE LA OBRA		5%	8/06/2026	8/05/2031	\$ 432.731.641.85

Tabla 5 Poliza de cumplimiento. Firma del contrato. Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 196999							
FIRMA DEL CONTRATO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO / BENEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	10%	8/09/2025	8/05/2026	\$711.750.000,00

Tabla 6 Poliza RCE. Firma del contrato. Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.204003							
FIRMA DEL ACTA DE INICIO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO / BENEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	30%	23/12/2025	23/12/2026	\$ 2.596.389.851.10
2		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		5%	23/12/2025	23/08/2029	\$ 432.731.641.85
3		ESTABILIDAD DE LA OBRA		5%	23/08/2026	23/08/2031	\$ 432.731.641.85

Tabla 7 Poliza de cumplimiento. Firma del acta de inicio. Elaboración propia

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 204004 FIRMA DEL ACTA DE INICIO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO/BE NEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	10%	23/12/202 5	23/12/2026	\$711.750.000,00

Tabla 8 Poliza RCE. Firma acta de inicio. Elaboración propia

VER ANEXO 1.1 POLIZAS DEL CONTRATISTA

7. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes MARZO 2026.

Durante este período se ejecutaron las siguientes actividades correspondientes al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

7.1 PRELIMINARES

/NA

7.2 GRADERÍAS- CIMIENTOS DE GRADERÍA

Excavación en material común de zapatas, vigas.

Se ejecutó en el área de intervención. La cantidad ejecutada corresponde a **113,4 m³**

Relleno compactado con material del sitio.

Se ejecutó en el área de intervención. La cantidad ejecutada corresponde a **20,4 m³**

Concreto de cimentaciones (zapatas y vigas)

Durante el periodo evaluado el contratista ejecutó un total de **7,50 m³**.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	

7.3 CUBIERTA

➤ **Acero estructura metálica.**

Se ejecutó en el área de intervención. La cantidad ejecutada corresponde a **5703,14 m3**.

7.4 CERRAMIENTO DE CANCHA

➤ **Suministro e instalación de malla panel prefabricada en alambre de acero galvanizada, recubrimiento en pintura de poliéster de 4.75mm de diámetro con puntos de cruce electrosoldados, en cuadros de 100mm x 50mm**

Se ejecutó en el área de intervención. La cantidad ejecutada corresponde a **221,21 m2**

7.5 ZONA DE CIRCULACIÓN

➤ **Losa contra piso zona de circulación**

Se ejecutó en el área de intervención. La cantidad ejecutada corresponde a **366,43 m3**

➤ **Malla electrosoldas**

Se ejecutó en el área de intervención. La cantidad ejecutada corresponde a **37,23 m2**.

7.6 COMITÉS DE OBRA

Durante el periodo evaluado se realizó un (1) comité de obra, en el cual el contratista presentó, reviso avances del proyecto, metodología a seguir de acuerdo a programación, las mayores y menores cantidades identificadas. En la reunión se analizaron cantidades de obras, posibilidad de apertura de más frentes de trabajo, los impactos del rebalanceo sobre la programación y ejecución de la obra, y la interventoría realizó las observaciones correspondientes, dejando constancia de los compromisos adquiridos para la continuidad del proyecto.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

No.	TEMA	ASISTENTES	FECHA
3	avances del proyecto, metodología a seguir de acuerdo a programación, las mayores y menores cantidades identificadas	Interventoría Contratista	12-03-2026

En el **ANEXO 5**. Se presenta las actas de comité realizadas en el periodo que comprende el informe.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

7.7 Análisis del avance de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS CORTE 31 MARZO -2026								
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNIT	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	VR. TOTAL	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
ES	GRADERIA					\$ 207.224.785		
ES.01	CIMENTOS GRADERIA					\$ 15.456.702		
ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	\$ 55.082	158,89	113,40	\$ 6.246.299	45,49	71,37%
ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	\$ 1.114.268	54,56	7,50	\$ 8.357.010	0,00	100%
ES.01.009	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	\$ 41.833	99,20	20,40	\$ 853.393	78,80	20,57%
ES.03	CUBIERTA					\$ 191.768.083		
ES.03.003	ACERO ESTRUCTURA METALICA	KG	\$ 33.625	5703,14	5703,14	\$ 191.768.083	0,00	100,00%
TJF	TERRENO DE JUEGO FUTBOL					\$ 82.318.877		
TJ.06	CERRAMIENTO DE CANCHA					\$ 82.318.877		



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	

TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM	M2	\$ 372.130	1204,54	221,21	\$ 82.318.877	983,33	18,36%
PR	ZONA DE CIRCULACION					\$ 82.208.403		
PR .01.011	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	M2	\$ 223.332	2398,35	366,43	\$ 81.835.545	2.031,92	15,28%
PR .01.012	MALLA ELECTROSOLDAS	M3	\$ 10.015	4003,5	37,23	\$ 372.858	3.966,28	0,93%
TOTAL EJECUTADO						\$ 371.752.065,01		
SUBTOTAL DEL CONTRATO			\$ 8.459.089.135,00					
% AVANCE PROGRAMADO DE MARZO 2026						\$ 365.086.831	4,32%	
% AVANCE EJECUTADO DE MARZO 2026						\$ 371.752.065	4,39%	
% DESVIACIÓN (+) (-)						\$ 6.665.234	0,08%	



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

7.7.1 Avance físico y financiero de la obra


Se presenta el resumen del avance financiero, porcentual y en cantidades de las actividades ejecutadas por el contratista y comparadas con el avance programado que se calcula con la herramienta Microsoft Project conforme a la programación de obra vigente.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO					
TIPO DE CONTRATO	OBRA				
CONTRATO NUMERO	2567 de 2025				
FECHA DE CORTE	31 DE MARZO 2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO BIENESTAR RECREATIVO				
INTERVENTOR	CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS				
Mes	Acumulado Programado (Miles de Pesos)	Indicador (%)	Acumulado Ejecutado (Miles de Pesos)	Ejecutado Mensual	Indicador (%)
Acta de inicio	\$ -	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
Diciembre	\$ 48.718.821,00	0,58%	\$ 112.504.195,00	\$ 112.504.195,00	1,33%
Enero	\$ 570.964.422,37	6,75%	\$ 575.560.876,00	\$ 463.056.681,00	5,47%
Febrero	\$ 952.438.121,48	11,26%	\$ 952.326.865,00	\$ 376.765.989,00	4,45%
Marzo	\$ 1.317.524.952,69	15,58%	\$ 1.324.078.929,80	\$ 371.752.064,80	4,39%
Abril	\$ 2.442.749.318,66	28,88%			
Mayo	\$ 4.632.917.638,05	54,77%			
Junio	\$ 5.547.238.017,82	65,58%			
Julio	\$ 7.809.879.421,70	92,33%			
Agosto	\$ 8.459.089.135,00	100,00%			
TOTAL	\$ 8.459.089.135,0				15,65%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN EL MES		\$ 1.324.078.929,80	15,65%		
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO EN EL MES		\$ 1.317.524.952,69	15,58%		
DESVIACIÓN		\$ 6.553.977,11	0,08%		



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

7.7.2 CURVA S

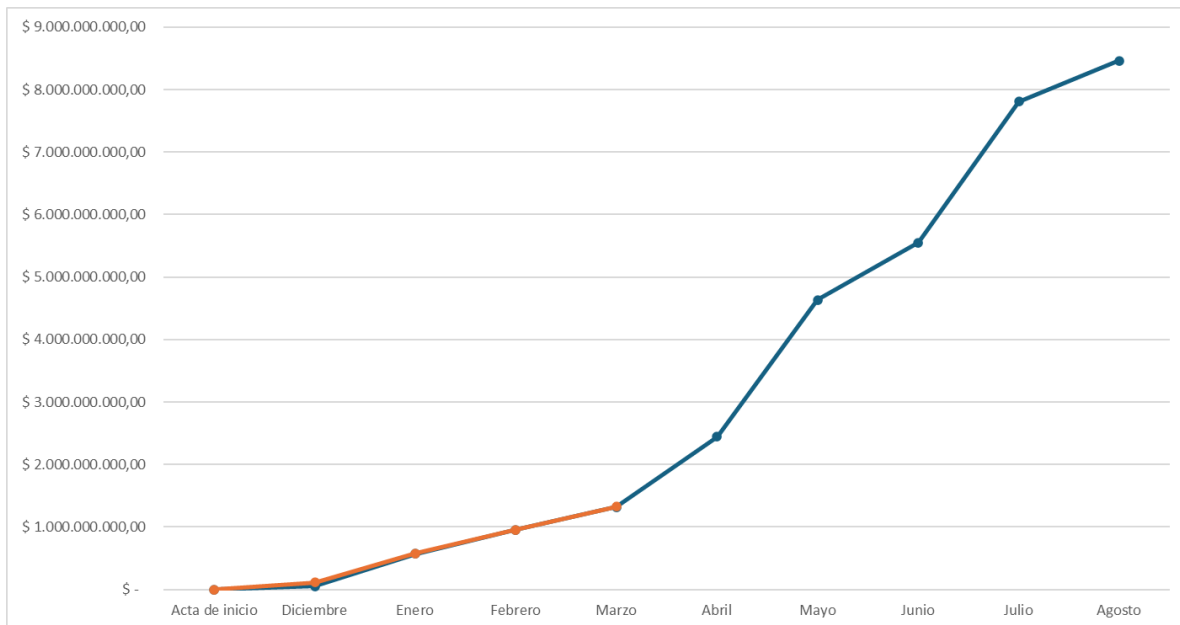

Durante el período cubierto por el presente informe, se registró un avance presupuestal de \$ 371.752.065,00, equivalente a un avance porcentual del **4,39%** contra un 4,32% que corresponde al avance programado para el mes de MARZO, A su vez, el avance físico acumulado hasta el mes de MARZO registra \$ 1.324.078.930,00 correspondiente a 15,65% Se aprecia que durante este periodo el contratista presenta un avance físico sobre lo programado, permitiendo tener una desviación positiva acumulada en obra del 0,08% en su programación.

7.9 Seguimiento Programa de Obra.

En el **ANEXO 3**. Se presenta el programa de obra presentado por el contratista de obra.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	

8. Aportes ejecución mensual contrato de obra

8.1. Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra.

En cumplimiento de la verificación se lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y se verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones
(A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

MAQUINARIA Y EQUIPO	01-31 de marzo del 2026																															
	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	30	31							
MOTONIVELADORA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
RETROEXCAVADORA																																
MINICARGADOR	A	A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
VIBROCOMPACTADOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
VOLTEO 1					A	A	A	A	A					A	A	A	A	A			A	A	A	A								
VOLTEO 2					A	A	A	A	A					A	A	A	A	A			A	A	A	A								
VOLTEO 3																																
MEZCLADORA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								

Tabla 5. Equipo en obra.
Fuente: Propia

Resultado a este seguimiento, el contratista, no Aplica alguna observación al respecto.

8.2. Información financiera del contrato de obra.

No aplica para este periodo

8.3. Estado general del tiempo.

En la siguiente tabla, se puede observar el histograma del estado del clima relacionando tiempos de días soleados, lluviosos moderados y lluviosos con intensidad, en el lapso del presente informe.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																		
Clase de tiempo	de	DÍAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026																														Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
Seco		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X		X	X		X	X	X	27
Lluvias moderadas																																	0	
Lluvias intensas																																		
Total																																	27	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																		

8.4. Ensayos de Laboratorio.

No aplica para este periodo

VER ANEXO 10.

8.7. Revisión y verificación de pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social.

El Interventor verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

VER ANEXO 7.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

9. Información Contrato de Interventoría

9.1 Información general del contrato de interventoría.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2 Y 3
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	25- 0107
GERENTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR Y CARTAGENA
SUPERVISOR DE GERENCIA	JORGE MORRIS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO S.A.S. - COINDESAS
REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO ENRIQUE SANDOVAL RUIZ
FECHA ACTA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.408.174.938
PLAZO TOTAL	9 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE AGOSTO DE 2026

9.2. Pólizas o garantías contractuales de interventoría

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.CG-1068709 FIRMA DEL CONTRATO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO/BENEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		3/10/2025	3/11/2026	\$ 549.998,00
2		PRESTACIONES SOCIALES			3/10/2025	3/07/2029	\$ 950.692,00
3		CALIDAD DEL SERVICIO			3/07/2026	3/07/2031	\$ 3.804.156,00

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA		
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR		

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.CG-1016891 FIRMA DEL CONTRATO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO/BENEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		3/10/2025	3/07/2026	\$ 284.700.000,00
2		PATRONAL			3/10/2025	3/07/2026	\$ 284.700.000,00
3		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			3/10/2025	3/07/2026	\$ 284.700.000,00
4		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			3/10/2025	3/07/2026	\$ 284.700.000,00

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.2000134570601 FIRMA DEL ACTA DE INICIO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO/BENEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	20%	12/11/2025	13/12/2026	\$ 549.998,00
2		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		10%	12/11/2025	12/08/2029	\$ 950.692,00
3		CALIDAD DEL SERVICIO		30%	12/08/2026	12/08/2031	\$ 3.804.156,00



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA		
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR		

INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.CG-1016891 FIRMA DEL ACTA DE INICIO							
ITEMS	POLIZA	GARANTÍA	ASEGURADO/BENEFICIARIO	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	RCE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		12/11/2025	12/08/2026	\$ 284.700.000,00
2		PATRONAL			12/11/2025	12/08/2026	\$ 284.700.000,00
3		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			12/11/2025	12/08/2026	\$ 284.700.000,00
4		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			12/11/2025	12/08/2026	\$ 284.700.000,00

9.3. Seguimiento a la inversión del Anticipo.

Este ítem no Aplica, puestos que, no se contempla contractualmente anticipos para entregar a interventoría.

9.4. Acta parcial de interventoría

De acuerdo con la cláusula séptima del contrato No. 25-0107, EDURBE S.A., pagará al contratista del contrato conforme a lo establecido en el contrato interadministrativo No. 2544 de 2025, suscrito entre la gobernación de Bolívar y EDURBE S.A. a través de actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance de la obra e interventoría. Las actas deberán ser debidamente aprobadas por el Coordinador técnico y administrativo del contrato y el supervisor del contrato interadministrativo y su sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90%) del valor del costo de la interventoría y su pago está supeditado a la disponibilidad de los recursos en el patrimonio autónomo según la forma de desembolso establecida en el contrato interadministrativo No. 2544 de 2025. El último pago, corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del costo de la interventoría y se hará efectivo con la presentación del acta de recibo y de liquidación.

La interventoría presentó la siguiente acta de cobro en el mes de febrero correspondiente al periodo comprendido entre 12 de noviembre de 2025 al 30 de

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	

enero de 2026. Dicho valor equivale al 17,09% de cobro. Hasta la fecha no ha sido desembolsada.

AVANCE DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1					
FRENTE	VALOR TOTAL	EQUIVALENCIAS CONTRATOS DE OBRA	INTERVENTORÍA POR FRENTE DE OBRA	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE OBRA	AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA
LOTE 1 - CLEMENCIA	\$ 8.654.632.837,00	30,23%	\$ 425.646.959,25	6,80%	\$ 28.943.993,23
LOTE 2 - SANTA ROSA DEL SUR	\$ 9.988.248.882,00	34,88%	\$ 491.236.063,39	24,45%	\$ 120.107.217,50
LOTE 3 - SANTA ROSA DE LIMA	\$ 9.989.384.514,00	34,89%	\$ 491.291.915,36	18,64%	\$ 91.576.813,02
TOTAL CONTRATOS DE OBRA	\$ 28.632.266.233,00	TOTAL CONTRATO INTERVENTORIA	\$ 1.408.174.938,00	TOTAL ACTA DE COBRO N°1 INTERVENTORIA	\$ 240.628.023,75

10. Gestión de interventoría

10.1. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

Se realizó seguimiento y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones suscritas en el pliego de condiciones, para las diferentes actividades ejecutadas, informando y requiriendo al contratista sobre observaciones, detalles y sugerencias durante el proceso constructivo. De igual forma se ha coordinado el desarrollo de comités de obra, en los cuales se han expuesto las distintas observaciones y dificultades surgidas de los procesos constructivos, con la toma de decisiones sobre mejoramientos de suelos, a fin de garantizar la estabilidad y buena calidad de la obra.

En específico se implementaron las siguientes actividades:

- Control permanente sobre la realización de actividades de obra. En consecuencia, se realizan diversas observaciones y recomendaciones sobre los procesos utilizados en obra.
- Se revisan las competencias del personal que se prevea ingresar a obras y la organización de cargos y funciones para el desarrollo de actividades.
- Se realiza un control y seguimiento permanente de los ajustes con relación al cronograma de obra aprobado; como resultado de ello se realizaron recomendaciones al contratista de obra sobre incrementar ritmo de trabajo en actividades.
- Se realiza control de cantidades de obra y presupuesto del proyecto para llevar un control financiero continuo; en este sentido se formalizó la respectiva certificación

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

de obra y se ha requerido al contratista para la verificación permanente de esta obligación contractual.

- Se realizó supervisión al proceso de ingreso de personal a la obra que cumplan con todos los requisitos de afiliaciones de seguridad social, para este control se solicita entrega de la documentación que evidencia las afiliaciones del personal al Plan Obligatorio de Salud, Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales.
- Diligenciamiento diría de las actividades ejecutadas, equipos y personal del proyecto en el libro diario (Bitácora) de obras.
- Acompañamiento permanente en la obra para generar soluciones, en los distintos procesos de avance de obras.

10.2 Informes especialistas.

En el presente periodo no se presentaron informes por especialistas

10.2. Gestión sst y ambiental

En el **ANEXO 7**. Se presenta el seguimiento realizado por parte de interventoría al componente sst y ambiental realizada por el contratista CONSORCIO BIENESTAR RECREATIVO 25

10.4. Gestión social

En el **ANEXO 6**. Se presenta el seguimiento realizado por parte de interventoría al componente social realizado por el contratista CONSORCIO BIENESTAR RECREATIVO 25

10. Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría

10.1. Control diario del equipo de la Interventoría.

En el presente periodo no APLICA reporte de Equipos de Interventoría.

10.2. Control diario del personal de Interventoría.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS

En el siguiente cuadro se presenta el control diario del personal mínimo requerido vinculado a la interventoría de acuerdo al anexo técnico.

NOMBRE	CARGO	01 AL 31 MARZO DEL 2026																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
VICTOR LOPEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		A				A					A							A								A				A		
JUAN VELEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A		A	A
LISSETH ESCOBAR	TRABAJADORA SOCIAL		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A		A	A
HERLINDA OCHOA	PROFESIONAL HSEQ		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A		A	A
CRISTIAN GARCIA	TOPÓGRAFO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A		A	A
EDER SANDOVAL	CADENERO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A		A	A

10.3. Información financiera Contrato de Interventoría.

En el presente periodo no APLICA

10.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales (Parafiscales) y seguridad social.



En el **ANEXO 4**. se presenta la acreditación de pagos parafiscales del interventor a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

11. Conclusiones y recomendaciones

Como aspecto final del presente informe se tiene:

- ❖ En relación con la verificación de documentación a personal en obra el contratista cumplió con los procesos de afiliación a Sistemas de Seguridad Social.
- ❖ El contratista ha venido cumpliendo con los requerimientos de interventoría en cuantos aspectos técnicos en obra, tales como, toma de muestras y resultados de ensayos de conformidad con lo indicado en planos y demás documentos técnicos del proyecto.
- ❖ El contratista ha dado cumplimiento a los compromisos sobre disponer en plena operatividad los equipos en obra, derivado del seguimiento y requerimientos de interventoría.
- ❖ Durante el período cubierto por el presente informe, se registró un avance presupuestal de \$ 371.752.065,00, equivalente a un avance porcentual del **4,39%** contra un 4,32% que corresponde al avance programado para el mes de MARZO, A su vez, el avance físico acumulado hasta el mes de MARZO registra \$ 1.324.078.930,00 correspondiente a 15,65% Se aprecia que durante este periodo el contratista presenta un avance físico sobre lo programado, permitiendo tener una desviación positiva acumulada en obra del 0,08% en su programación

 	
ELABORADO POR:	REVISÓ Y APROBÓ
ING JUAN VELEZ	ING VICTOR JOSE LÓPEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>

12. ANEXOS

- ANEXO 1. AVANCE DE OBRA**
- ANEXO 2. PPTO Y CRONOGRAMA**
- ANEXO 3. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
- ANEXO 4. COMITES DE OBRA**
- ANEXO 5. GESTIÓN SOCIAL**
- ANEXO 6. GESTIÓN SST Y AMBIENTAL**
- ANEXO 7. BITACORA DE OBRA**
- ANEXO 8. CERTIFICACIÓN DE OBRA**

13. REGISTRO FOTOGRAFICO

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA		 EDURBE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR		 COINDESAS CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS



GRADERÍAS- CIMIENTOS DE GRADERÍA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS

GRADERÍAS- CIMIENTOS DE GRADERÍA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS



GRADERÍAS -CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS Y VIGAS

GRADERÍAS -CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	



ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO



ACERO DE REFUERZO

RELLENOS

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	 EDURBE <small>DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C. - BOLÍVAR</small>
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	 COINDESAS <small>CONSULTORIA E INGENIERIA DE DESARROLLO SAS</small>



MALLA ELECTROSOLDAS



LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA
