		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1			
						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	7 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
Yelson Galeano						Jose cortes		1098727137	
Carlos González						Jonathan Rendon		1036962270	
Moises Reyes		1002500713				Queny Patricia		43068550	
						Cindy morales		4077150777	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 70	Separador	U-E	Suministro e instalacion de 1.5mts coraza flexible				8 am		215-
Circular 1			Suministro e instalacion de 7mts de cable 4x18						94-
			construccion de 5 empalmes						212-
			Instalacion de 3 semaforos de piso						-
			Instalacion de fuente electrica					4 pm	
EQUIPO EN OBRA:									
Pulidora, Planta electrica, martillo demolidor, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA		FIRMA				FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría			

112		PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 7-09-2026		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA: Martes				LLUVIOSO		SI X		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE	
JHOHAN RAMIREZ		1018186405						JOSE CORTES	
JAVIER MARCELA PADILLA		1017221580						1018727131	
DIRECCIÓN		COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL
Carretera BCL 53		NE	S-N	Lavado poste recto					
				Lavado de semáforo peatonal					
Carretera BCL 53		S	E-W	Lavado poste recto					
				Lavado de semáforo peatonal					
Carretera BCL 53		S	E-W	Lavado de poste recto					
				Lavado de semáforo peatonal					
				Lavado de semáforo ciclista					
Carretera BCL 53		S	S-N	Lavado de poste recto					
				Lavado de semáforo peatonal					
				Lavado de semáforo vehicular					
				Lavado de disco					
EQUIPO EN OBRA:									
Arnes, eslinga, escalera									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA: [Firma]		FIRMA: [Firma]			FIRMA: [Firma]				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

212		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
Alcaldía de Medellín CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 7-09-2026		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA: Martes				LLUVIOSO		SI X		SI X	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN				NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE	
Hogan Ramirez		1615186405						Jose Cortes	
Laura Marcela		10772585						1098727137	
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJO REALIZADOS		HORA INICIO	
Cr 53 CL 53		S-E		S-N		Lavado De poste Recto			
						Lavado de semaforo vehicular			
						Lavado de semaforo peatonal			
						Lavado de disco			
						Retiro de contraste			
Cr 53 CL 53		S-W		S-W		Lavado de poste Recto		230	
						Lavado de semaforo vehicular		234	
						Lavado de semaforo peatonal		231	
						Lavado de disco		236	
						Retiro de contraste		199	
Cr 54 CL 54		S-W		N-S		Lavado de poste Recto		230	
						Lavado de semaforo peatonal		231	
Cr 64 CL 54		SW		N-S		Lavado de poste Recto, semaforo peatonal y sigrista		230-231	
EQUIPO EN OBRA:									
Arbol, estilogra, escalera									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

172		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
Alcaldía de Medellín CONSORCIO INT. PAROJ. MED. 2021		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				VERSIÓN 1					
UNION TEMPORAL UT MEDÉLLIN						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	7 Abril 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Hoy		LLUVIOSO			SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:	ESB 669		DURACIÓN			NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Eberto Cadizco		13.461.111						Jose Cortes		1098724131	
Leon Oquendo		15.435.477									
Jorge Rodriguez		PPT 1.137.342									
Yair Carlos Usuga		1.214.729.941									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carretera 92x	N-W	N-S	Retiro de semáforo vehicular a poste					8:30		172	
Calle 48			Retiro de disco direccional							179	
			Retiro de poste de enterramiento							168	
			" de cable de control 4x16 16 metros.							173	
			instalacion de poste de enterramiento nuevo							206	
			Reinstalacion de semáforo vehicular a poste							208	
			" de cable de control 4x16 16mts.							215	
			construccion de empalme electrico							94	
	S-E	S-N	Retiro de semáforo vehicular a poste							172	
			Retiro de disco direccional							176	
			Retiro de poste de enterramiento							168	
			" de cable de control 4x16 7 metros							173	
			instalacion de poste de enterramiento nuevo							206	
			Reinstalacion de semáforo vehicular a poste							208	
			" de cable de control 4x16 7 metros.							215	
			construccion de empalme electrico						13:40	94	
EQUIPO EN OBRA:											
Planta electrica, Martillo demolidor, Pulidora, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA								
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria							

[illegible]




   		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		CONTRATO DE OBRA No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1	
				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	08 - 04 2026	TIEMPO	SECO	SI	CUMPLE
DIA:	MIÉRCOLES		LLUVIOSO		SI
VEHÍCULOS:	TAVO		DURACIÓN		NO
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098727131
Simón Vivas				Jonathan Rendon	1036962270
DIRECCIÓN					
COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS		HORA INICIO	HORA FINAL
S-E	N-E	Revisión de cable y pulsadores a poste retiro de 2 pulsadores digitales a poste retiro de 4 cordones de isem en tapa de 50x50 instalación de 2 pulsadores de boton de segunda a poste construcción de 2 empalmes en los pulsadores construcción de 7 empalmes en la caja de 50x50 soldadura de 4 cordones de isem en tapa de 50x50 acompañamiento al personal de tigo para apertura de las tapas de los semaforos		9:15AM	
EQUIPO EN OBRA:					
Herramienta Mejor					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA	FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría			

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	8/4/2026		TIEMPO	SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA:	Miércoles			LLUVIOSO		SI		SI	
VEHÍCULOS:	MINSO?			DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
Franklin Burbosa		16791906					Alvaro Londoño		71 775 731
Christhian Burbosa		1151966785							
Jairo Aldade		11 727 857							
Jairo Rara		1.000 537 976							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ C-45x C-52 y 54	W	SN	Daño en el grupo 2 y 5				8:00		
			Se procede a desoldar 14 cgas de paso 60x80						183
			Se retira 120 metros de cable 4x18 en mal estado						173
			Se instala 128 metros de cable 4x18 (nuevo)						215
			Se soldan 14 camisas de paso de 60x80						262
			Se realizan 3 empalmes					5:00 pm	94
EQUIPO EN OBRA:									
Equipo Soldador, Perca									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				


 Alcaldía de Medellín Corporación Municipal		 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
 CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025		 RNV		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	8 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO
DÍA:	Miércoles								
VEHÍCULOS:									
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
Yelson Galeano						Jose cortes		1098727131	
Carlos Bonzalez		1649894058				Jonathan Rendon		1036962270	
Moises Reyes		1002500713				Queny Banul		4306755	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 70	separador	E-W	suministro e instalacion de 7mts coraza flexible				08:00		
circular 1			Suministro e instalacion de 23 mts cable 4x18						215
			construccion de 5 empalmes						94
			Retiro de 16 adoquines de 20 x 20 para canalizacion						53
			Reinstalacion de 16 adoquines de 20x20						
			Instalacion de 3 semaforos de piso						212
			Instalacion de puente electrica					14:00	-
EQUIPO EN OBRA:									
Pulidora, Placa electrica, martillo demolador, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA	FIRMA		FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría						


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: DIA: VEHÍCULOS:	8-04-2026 Miércoles	TIEMPO SECO ☒ LLUVIOSO ☐ DURACIÓN ☐	CUMPLE SI ☒ NO ☐
		UNIFORMES SI ☒ NO ☐	SEÑALIZACIÓN SI ☒ NO ☐
		ESCOMBROS SI ☐ NO ☒	CUMPLE SI ☐ NO ☒
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura Marcela Padilla	1017221580	Jonathan Paulín	1036962270
J. Hogan Ramirez	1015186405		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Carrera 80 cl 30			Lavado de poste Recto
			Lavado de Disco
			Lavado de Semáforo Vehicular
			Lavado de AVISO
cr 80 cl 25	E-W	N-S	Lavado de poste Recto
			Lavado de Semáforo Vehicular
			Lavado de Disco
Cra 80 cl 25			Lavado de poste Recto
			Lavado de Semáforo Vehicular
			Lavado de disco
cra 80 cl 25			Lavado de Disco
			Lavado de poste Recto
			Lavado de Semáforo Vehicular
EQUIPO EN OBRA:			
Arnes, estaca, Escalera			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	03-04-2025	SECO	2
DÍA:	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	
UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
	SI	SI	SI
	NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
W. J. C. Chaves	95 187 797	Jonathan Benito	103 696 2270
W. J. C. Chaves	95 187 797		
W. J. C. Chaves	95 187 797		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
CIR 54 calle 52	N-W	E-W	lavado de parrilla vertical
			lavado de semáforo peatonal
CIR 50 calle 53	S-W	S-AB	lavado de parrilla vertical
			lavado de semáforo vehicular
			lavado de semáforo peatonal
			lavado de disco direccional
	S-E	S-N	lavado de parrilla vertical
			lavado de semáforo vehicular
			lavado de semáforo peatonal
			lavado de disco direccional
			retiro de placa de contratista
	S-W	S-AB	lavado de parrilla vertical
			lavado de semáforo vehicular
			lavado de semáforo peatonal
			lavado de disco direccional
			lavado de parrilla vertical
EQUIPO EN OBRA:			
Arbol, estinga, escalera			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 Alcalde de Medellín Gustavo Petro		 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
 CONSORCIO INT. EABOL MED 2025		 CONTRATO		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	08-09-2025	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
William Chaves		98157777				Jonathan Restán		103 696 2270		
Jesús Lozano		912 52 207								
Exelito Mena		1078817116								
TRABAJOS REALIZADOS										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CALLE 50	N-W	W-E	nivelado de portafort				6:00		230	
			nivelado de semáforo vertical						234	
			nivelado de semáforo peatonal						231	
			nivelado de disco direccional						236	
			nivelado de placa de cuadrante						199	
CALLE 49	S	W-E	nivelado de portafort						230	
			nivelado de semáforo vertical						234	
			nivelado de semáforo peatonal						231	
			nivelado de disco direccional						236	
			nivelado de placa de cuadrante						199	
CALLE 53	N	W-E	nivelado de portafort						230	
			nivelado de semáforo vertical						234	
			nivelado de semáforo peatonal						231	
			nivelado de disco direccional						236	
			nivelado de placa de cuadrante						199	
EQUIPO EN OBRA:										
Arnes, eslinga, Escalera										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA: 		FIRMA: 			FIRMA: 					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

[illegible]

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	8 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
Yan Carlos Ugo		1.214.729.941				Jonathan Gelon		1036762770	
Yelson Carlos		1.035.961.703							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 45x	S-W	E-W	Retiro de lámpara peatonal Roja mala 02 unids				8:50		195
calle 67			instalacion de lámpara peatonal Roja de						218
Cost. Norte			segunda. 02 unidades						
			construccion de 2 empalmes electricos.					9:07	94
Carrera 45x	S-W	N-S	Retiro de lámpara peatonal verde mala				9:08		195
calle 67			instalacion de lámpara peatonal verde de						218
Cost. Sur.			segunda						
			construccion de empalme electrico.					9:13	94
Carrera 47x	S-W	N-S	Retiro de lámpara peatonal Roja mala				9:17		195
calle 67			instalacion de lámpara peatonal Roja de						218
			segunda.						
			construccion de empalme electrico					9:26	94
Carrera 45x	S-W	N-S	Retiro de lámpara peatonal verde mala.				10:02		195
calle 73			instalacion de lámpara peatonal verde de segunda						218
			construccion de empalme electrico					10:08	94
EQUIPO EN OBRA:									
Escala, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORIA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria				

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
CONSORCIO INT. E.A.R.O.L. MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
R.M.V.		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA: 8 Abril 2026		TIEMPO		SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA: Miércoles				LLUVIOSO		SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Yan Carlos Uluja		1.214.729.941						Jonathan Rendón		103 696 2270	
Velson Cuyas		1.035.861.703									
DIRECCIÓN		COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carrera 46x		N-E	W-S	Retiro de lampara peatonal verde mala				10:28		195	
Calle 73				Instalacion de lampara peatonal verde de segunda						218	
				Construccion de empalme						94	
		N-E	E-W	Retiro de lampara peatonal verde mala						195	
				Instalacion de lampara peatonal verde de segunda						218	
				Construccion de empalme						94	
		S-W	N-S	Retiro de lampara peatonal verde mala						195	
				Instalacion de lampara peatonal verde de segunda						218	
				Construccion de empalme.					10:53	94	
Carrera 46x		N-W	N-S	Retiro de lampara peatonal verde mala				10:55		195	
Calle 71A				Instalacion de lampara peatonal verde de segunda						218	
				Construccion de empalme					11:03	94	
EQUIPO EN OBRA:											
Escala, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria							

3/4

ACADEMIA DE PLANEACIÓN		UNION TEMPORAL Y MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSORCIO JNT PAROL MED 2025		RNV		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025								ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	8 Abril 2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Miércoles					SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Van Carlos Usuga		1.214.729.941				Jonathan Pulín		1036962270			
Velson Cañas		1.035.861.703									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
✓ Carrera 45x	S-W	E-W	Retiro de lámpara peatonal verde mala				11:10		195		
calle 71			instalación de lámpara peatonal verde de segunda						218		
			construcción de empalme					11:16	94		
✓ Carrera 44x	E-N	E-N	Retiro de lámpara peatonal roja mala				11:20		195		
calle 71			instalación de lámpara peatonal roja de segunda						218		
			construcción de empalme					11:30	94		
✓ Carrera 45x	E-N	E-W	Retiro de lámpara peatonal verde mala				13:25		195		
calle 78			instalación de lámpara peatonal verde de segunda						218		
			construcción de empalme					13:30	94		
✓ Carrera 46x	S-E	E-W	Retiro de lámpara peatonal verde mala				14:26		195		
calle 86			instalación de lámpara peatonal verde de segunda						218		
			construcción de empalme					14:33	94		
EQUIPO EN OBRA:											
Escala, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA			FIRMA				FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría				

  	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	8 Abril 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHICULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Usuga	1.214.729.941			Jonathan Pardo	1036762970
Yelson Canas	1.035.861.703				

[illegible]

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, herramienta mejor




OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

[illegible]

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria



PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	09-04-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	51	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES					SI /		SI /		SI /
VEHÍCULOS:	ESP 528					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA						
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA					
Edwin Santos Simón Liviás	1038310427			Alvaro Lantini	71225231					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
EXR64CXC1167	N-E	S-N	Revisión de pulsadores y cambio de lamparas pentagonales de fuente a poste. Retiro de 7 pulsador digital a poste Retiro de 7 lampara roja pentagonal de fuente a poste Retiro de 7 lampara verde pentagonal de fuente a poste Perforación en poste con taladro broca cerro y machucos Instalación de 7 lampara roja pentagonal de segunda a poste Instalación de 7 lampara verde pentagonal de segunda a poste Instalación de 7 pulsador de boton de segunda a poste construcción de 7 empalmes electricos a poste construcción de 7 empalmes en el pulsador			8:52 Am		177 195 195 218 218 214 94 94		
EQUIPO EN OBRA: Escalera, herramienta menor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ								
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche								
FIRMA	FIRMA	FIRMA								
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría								

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	9 Abril 2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Jueves.					SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Carlos Mario G.						Jonathan Pelin		103 6962770			
Yerson Galeano											
Moses Reyes.		1002500113									
TRABAJOS REALIZADOS											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
✓ Carrera 70	E-5	W-E	Suministro e instalacion de 6 mts				8 am				
Circular 1			coraza flexible								
			Suministro e instalacion de 20 mts cable 4x13						215		
			se suministra 4 mts de cable adicional a						215		
			semaforos peatonal por cable tensionado								
			se realiza canalizacion de 5 mts. en adogum.								
			Construccion de 6 empalmes.						94		
			Instalacion de 2 semaforos de piso.						212		
			S/N 20250034 Serial 0749 S/N 20250095 Serial 0757								
			Instalacion fuente electrica S/N 20250064, Serial 0305					4 pm			
EQUIPO EN OBRA:											
Pesca, herramienta mejor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA 		FIRMA 				FIRMA 					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001																																																																													
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1																																																																													
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025																																																																													
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																																																																															
FECHA: 04/04/2026 DIA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	CUMPLE SI ☒ NO ☐	CUMPLE SI ☒ NO ☐																																																																												
PERSONAL EN OBRA																																																																															
CONTRATISTA		INTERVENTORIA																																																																													
NOMBRE Juan José Pao Silva Willda Chavama	CÉDULA 1000537926	NOMBRE Jose Cortes	CÉDULA 109877131																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DIRECCIÓN</th> <th>COSTADO</th> <th>SENTIDO</th> <th>TRABAJO REALIZADOS</th> <th>HORA INICIO</th> <th>HORA FINAL</th> <th>ITEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">CALLE 43A - CALLE 9 SUR</td> <td rowspan="6">N - W</td> <td rowspan="6">N - S</td> <td>Lavado de semáforo vehicular</td> <td>8:00</td> <td></td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>Lavado de semáforo peatonal</td> <td></td> <td></td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>Lavado de disco direccional</td> <td></td> <td></td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Lavado de disco paso peatones</td> <td></td> <td></td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Lavado de sonotodo</td> <td></td> <td></td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>Lavado de poste recto</td> <td></td> <td>8:30</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">CALLE 43A - CALLE 9 SUR</td> <td rowspan="6">N - E</td> <td rowspan="6">N - S</td> <td>Lavado de semáforo vehicular</td> <td>8:32</td> <td></td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>Lavado de semáforo peatonal</td> <td></td> <td></td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>Lavado de disco direccional</td> <td></td> <td></td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Lavado de disco paso peatones</td> <td></td> <td></td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Lavado de sonotodo</td> <td></td> <td></td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>Lavado de poste recto</td> <td></td> <td>8:50</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CALLE 43A - CALLE 9 SUR</td> <td rowspan="3">E - S</td> <td rowspan="3">E - W</td> <td>Lavado de poste de sonotodo</td> <td>8:55</td> <td></td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>Lavado de disco paso peatones</td> <td></td> <td></td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Lavado de sonotodo</td> <td></td> <td>9:20</td> <td>232</td> </tr> </tbody> </table>				DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	CALLE 43A - CALLE 9 SUR	N - W	N - S	Lavado de semáforo vehicular	8:00		234	Lavado de semáforo peatonal			231	Lavado de disco direccional			236	Lavado de disco paso peatones			236	Lavado de sonotodo			232	Lavado de poste recto		8:30	230	CALLE 43A - CALLE 9 SUR	N - E	N - S	Lavado de semáforo vehicular	8:32		234	Lavado de semáforo peatonal			231	Lavado de disco direccional			236	Lavado de disco paso peatones			236	Lavado de sonotodo			232	Lavado de poste recto		8:50	230	CALLE 43A - CALLE 9 SUR	E - S	E - W	Lavado de poste de sonotodo	8:55		230	Lavado de disco paso peatones			236	Lavado de sonotodo		9:20	232
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM																																																																									
CALLE 43A - CALLE 9 SUR	N - W	N - S	Lavado de semáforo vehicular	8:00		234																																																																									
			Lavado de semáforo peatonal			231																																																																									
			Lavado de disco direccional			236																																																																									
			Lavado de disco paso peatones			236																																																																									
			Lavado de sonotodo			232																																																																									
			Lavado de poste recto		8:30	230																																																																									
CALLE 43A - CALLE 9 SUR	N - E	N - S	Lavado de semáforo vehicular	8:32		234																																																																									
			Lavado de semáforo peatonal			231																																																																									
			Lavado de disco direccional			236																																																																									
			Lavado de disco paso peatones			236																																																																									
			Lavado de sonotodo			232																																																																									
			Lavado de poste recto		8:50	230																																																																									
CALLE 43A - CALLE 9 SUR	E - S	E - W	Lavado de poste de sonotodo	8:55		230																																																																									
			Lavado de disco paso peatones			236																																																																									
			Lavado de sonotodo		9:20	232																																																																									
EQUIPO EN OBRA: Arnes, eslinga, escalera																																																																															
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																																																																															
VERIFICACIÓN																																																																															
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA																																																																													
ELABORÓ NOMBRE: Maria Victoria Durango FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Auxiliar de Residencia	REVISÓ/ACTUALIZÓ NOMBRE: Carlos Alberto Diaz FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Residente de Obra	APROBÓ NOMBRE: Pueny Patricia Barreneche FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Residente de Interventoría																																																																													

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA: 04/04/26		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE		
DÍA: Jueves				LLUVIOSO		SI /		SI /		
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO		
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		
Juan Yosi Rog Silva		1000537976						dora Cols		
Wilson Chavarria								1098227131		
DIRECCIÓN		COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ CARRETERA 43A - CARRE 9 SUR		W - N	W - E	• Lavado de semáforo vehicular				9:30		234
		SEPTENTRIONAL		• Lavado de 3 semáforos peatonales						231
				• Lavado de disco direccional						236
				• Lavado de disco paso peatonales						236
				• Lavado poste de entubamiento						230
				• Lavado semáforo					9:50	232
✓ CARRETERA 43A - CARRE 9 SUR		E - U	E - W	• Lavado de poste de semáforo				10:00		230
				• Lavado de disco paso peatonales						236
				• Lavado semáforo					10:30	232
✓ CARRETERA 43A - CARRE 9 SUR		N - W	N - S	• Lavado semáforo vehicular				10:45		234
				• Lavado 2 semáforos peatonales						231
				• Lavado disco direccional						236
				• Lavado disco paso peatonales						236
				• Lavado semáforo						232
				• Lavado poste recto a mensula					11:10	230
EQUIPO EN OBRA:										
Arnes, estinga, herramienta menor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA			FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

314		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
Alcaldía de Medellín CONSORCIO INT. PAROL. MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	09/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	9 de abril		LLUVIOSO			SI		SI			
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Juan José Rodríguez		1000537926						Jose Cortes		1098727131	
William Chavarria											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 43A - CARRE QUEL	N - E	N - S	• Lavado semáforo vehicular					11:15		234	
			• Lavado semáforo peatonal							231	
			• Lavado poste recto							230	
			• Lavado disco direccional							236	
			• Lavado disco paso peatonal							236	
			• Lavado sonotador						11:45	232	
CARRERA 43A - CARRE QUEL	E - N	E - W	• Lavado semáforo vehicular					11:50		234	
			• Lavado semáforo peatonal							231	
			• Lavado poste q. mensura							230	
			• Lavado de disco direccional						12:20	236	
CARRERA 43A - CARRE QUEL	E - S	E - W	• Lavado de semáforo vehicular					12:25		234	
	SEPTENTRIONAL		• Lavado de 2 semáforos peatonales							231	
	CENTRAL		• Lavado de poste recto							230	
			• Lavado de disco direccional							236	
			• Lavado de disco paso peatonal							236	
			• Lavado de sonotador						12:45	232	
EQUIPO EN OBRA:											
Araes, eslinga, escalera											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ						
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA			FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría						

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	09/04/2025		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Juan José Rodríguez		1000557976					Julián Ceballos		1098727 131	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 43A - CALLE 9 SUR	W - N	W - E	• Lavado poste sonorizador				1:45		230	
	SEPTENTRIONAL		• Lavado disco paso peatones						236	
			• Lavado sonorizador					2:10	232	
CARRERA 43A - CALLE 9 SUR	W - S	W - E	• Lavado poste sonorizador				12:15		230	
			• Lavado disco paso peatones						236	
			• Lavado sonorizador					2:40	232	
CARRERA 43A - CALLE 4 SUR	S - E	S - W	• Lavado semáforo vehicular				2:45		234	
			• Lavado 2 semáforos peatonales						231	
			• Lavado poste a mensula					3:10	230	
CARRERA 43A - CALLE 9 SUR	S - W	S - N	• Lavado semáforo vehicular				3:15		234	
			• Lavado semáforo peatonal						231	
			• Lavado disco direcciona						236	
			• Lavado poste recto					3:45	230	
EQUIPO EN OBRA:										
Arnes, eslinga, escalera										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría						

112		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
Alcalde de Medellín CONSORCIO INT. EABOL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	9 ABRIL	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	JUEVES		LLUVIOSO		SI		SI		SI		
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO		
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Junior Rivas				Bryan Palacio				Jose Carlos		109 822 131	
Vicente Rioscos								Jonathan Belon		102 676 2290	
Andres Berocha											
Steven Palacio											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
✓ CRA 52 CII 20	OR	S-N	Retiro 2 Herrajes 50 x 50				8 AM		187		
			limpieza de Caja						54		
			instalacion de 2 Herrajes 50 x 50						13		
			Retiro tapa Concretada						1		
			limpieza de Caja						54		
			instalacion de Herraje 50 x 50						13		
✓ CRA 52 CII 25	OR	S-N	Retiro 1 Herraje 50 x 50						187		
			limpieza de Caja						54		
			instalacion de Herraje Reforzado (RF)						13		
	OC	N-S	Retiro y Herraje 50 x 50						187		
			limpieza de Caja						54		
			instalacion de Herraje Reforzado (RF)					5: PM	13		
EQUIPO EN OBRA:											
Planta electrica, Pulidora, martillo demolider, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA				FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSORCIO INT. EABOL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	9/4/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	DXT928				NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
Christian Burbosa						Alvaro Loraño		71775731	
Cristian Mena									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C53x C173	Separados	NS	Se retira semáforo vehicular				8:00		172
			Se instala 8 metros de cable						173
			Se instala disco direcciona						179
			Se instala parte de antorillamiento						168
			Se instala parte de antorillamiento						206
			Se reinstala 8 metros de cable						215
			Se reinstala disco direcciona						220
			Se reinstala semáforo vehicular						208
			Se realiza 1 empalme					12:00	94
EQUIPO EN OBRA:									
Pesca, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN


FECHA:	9-09-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO


PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHojan Ramirez	1015986405			José D. Cols	1098727131
Laura Marcela Giallo	109221586				



DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cr 80 cl 21		E-N	Lavado de poste recto			230
			Lavado de disco			236
			Lavado de semáforo vehicular			234
cr 80 cl 21		N-S	Lavado de poste recto			230
			Lavado semáforo vehicular			234
			Lavado de disco			236
cr 80 cl 21		S-N	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semáforo vehicular			234
			Lavado de disco			236
cr 80 cl 21		SN	Lavado de semáforo vehicular			234
			Lavado de poste			230
			Lavado de disco			236
cr 80 cl 21		N-S	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semáforo vehicular			234


EQUIPO EN OBRA: Arnes, estrega, escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1		ED: SEP 2025						
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	09-04-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Cesar Santander		1038806300				Alvaro Galarza		21725231		
Jaime Cifuentes		7148675				Jonathan Rendon		1036762210		
Santiago Melan		1000533292								
Alex Caceres		1036651089								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
AV. EL CLAY		E-W.	Sector Oeste de la glorieta controlador local dividido con botón y consola retiro de 1 controlador local, consola y se reintegran consola con 4 teclas y potencia 1 tarjeta de control y una tarjeta de pulsadores Retiro de (2Lx3m)=6m de cable fibra óptica Retiro de 3m de cable encauchado 2x12. Retiro de 3m de cable USB. Retiro de 3m de cable #8 verde de poste a tierra Retiro de (20Lx3m)=60m de cable 4x16. Nota: Todas las retiros de cableado quedaran en la casa de Goxeo. retiro de 4 cordones de soldadura a la casa de Goxeo. Nota: Por favor programar el bacheo y construcción de base controladora.				9:20		165	
									173	
									173	
									173	
									173	
									173	
									183	
								10-40		
EQUIPO EN OBRA:										
Equipo soldador, herramienta menor, Pesca										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ								
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche								
FIRMA	FIRMA	FIRMA								
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría								

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	10/9/2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Viernes					SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:	MTN 102					NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Franklin Barbosa		16.791.906				Alvaro Lombardi		71775231			
Christina Barbosa		1.151.966.785				Jonathan Pedraza		103 696 2210			
Jose Andrade		11.222.857									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
✓ Cr 46 Cl 50	E	SN	Daño en cableado de Semáforos de Piso PY Demolicion de Tapa concretada 50x50 Construccion de Dos Empalmes en caja. Construccion de Tapa de concreto 50x50				07 am		1 94 263		
✓ Cr 46 Cl 52	E	SN	Daño en Cableado de Semáforos de Piso PY Construccion de #6 Empalmes Desinstalacion de Semáforos de Piso PY limpieza de Semáforos de piso Instalacion de Semáforos de Piso PY con Silicona.						94 212		
	EN	NS	Daño en cableado de Semáforos de Piso PY Construccion de #6 Empalmes Desinstalacion de Semáforos de Piso PY limpieza de Semáforos de piso Instalacion de Semáforos de piso PY con Silicona.						94 212		
									4pm		
EQUIPO EN OBRA:											
Planta electrica, Pulidora, Martillo demolidor, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA 			FIRMA 			FIRMA 					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

1/2		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001								
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1								
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025								
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN												
FECHA:		10 Abril 2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:		viernes.					SI	/		SI	/			
VEHÍCULOS:							NO			NO				
PERSONAL EN OBRA														
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA								
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA				
Carlos M. González.								Alvaro Bolívar		71775731				
Jerson Galeano.								Jonhys Beltrán		103676227				
Moises Reyes.		1004500113												
TRABAJOS REALIZADOS														
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS						HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM			
Carretera 70	Septentrional	W-E	Instalacion de 2 semáforos de piso								212			
Circular 7.			S/N 20250190 stiker 0778 S/N 20250147 stiker 0777											
			Instalacion de fuente S/N 20250076 stiker 0298								-			
			Suministro e instalacion de 7 mts. coraza flexible											
			Suministro e instalacion de 8 mts cable 4x18								215			
			Construccion de 4 empalmes.								94			
			Se realiza canalizacion de 2 mts. en aboguin.							4 pm.				
EQUIPO EN OBRA:														
Planta electrica, Pulidora, martillo demoledor, herramienta menor														
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA														
VERIFICACIÓN														
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA										
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ										
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche										
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 										
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría										

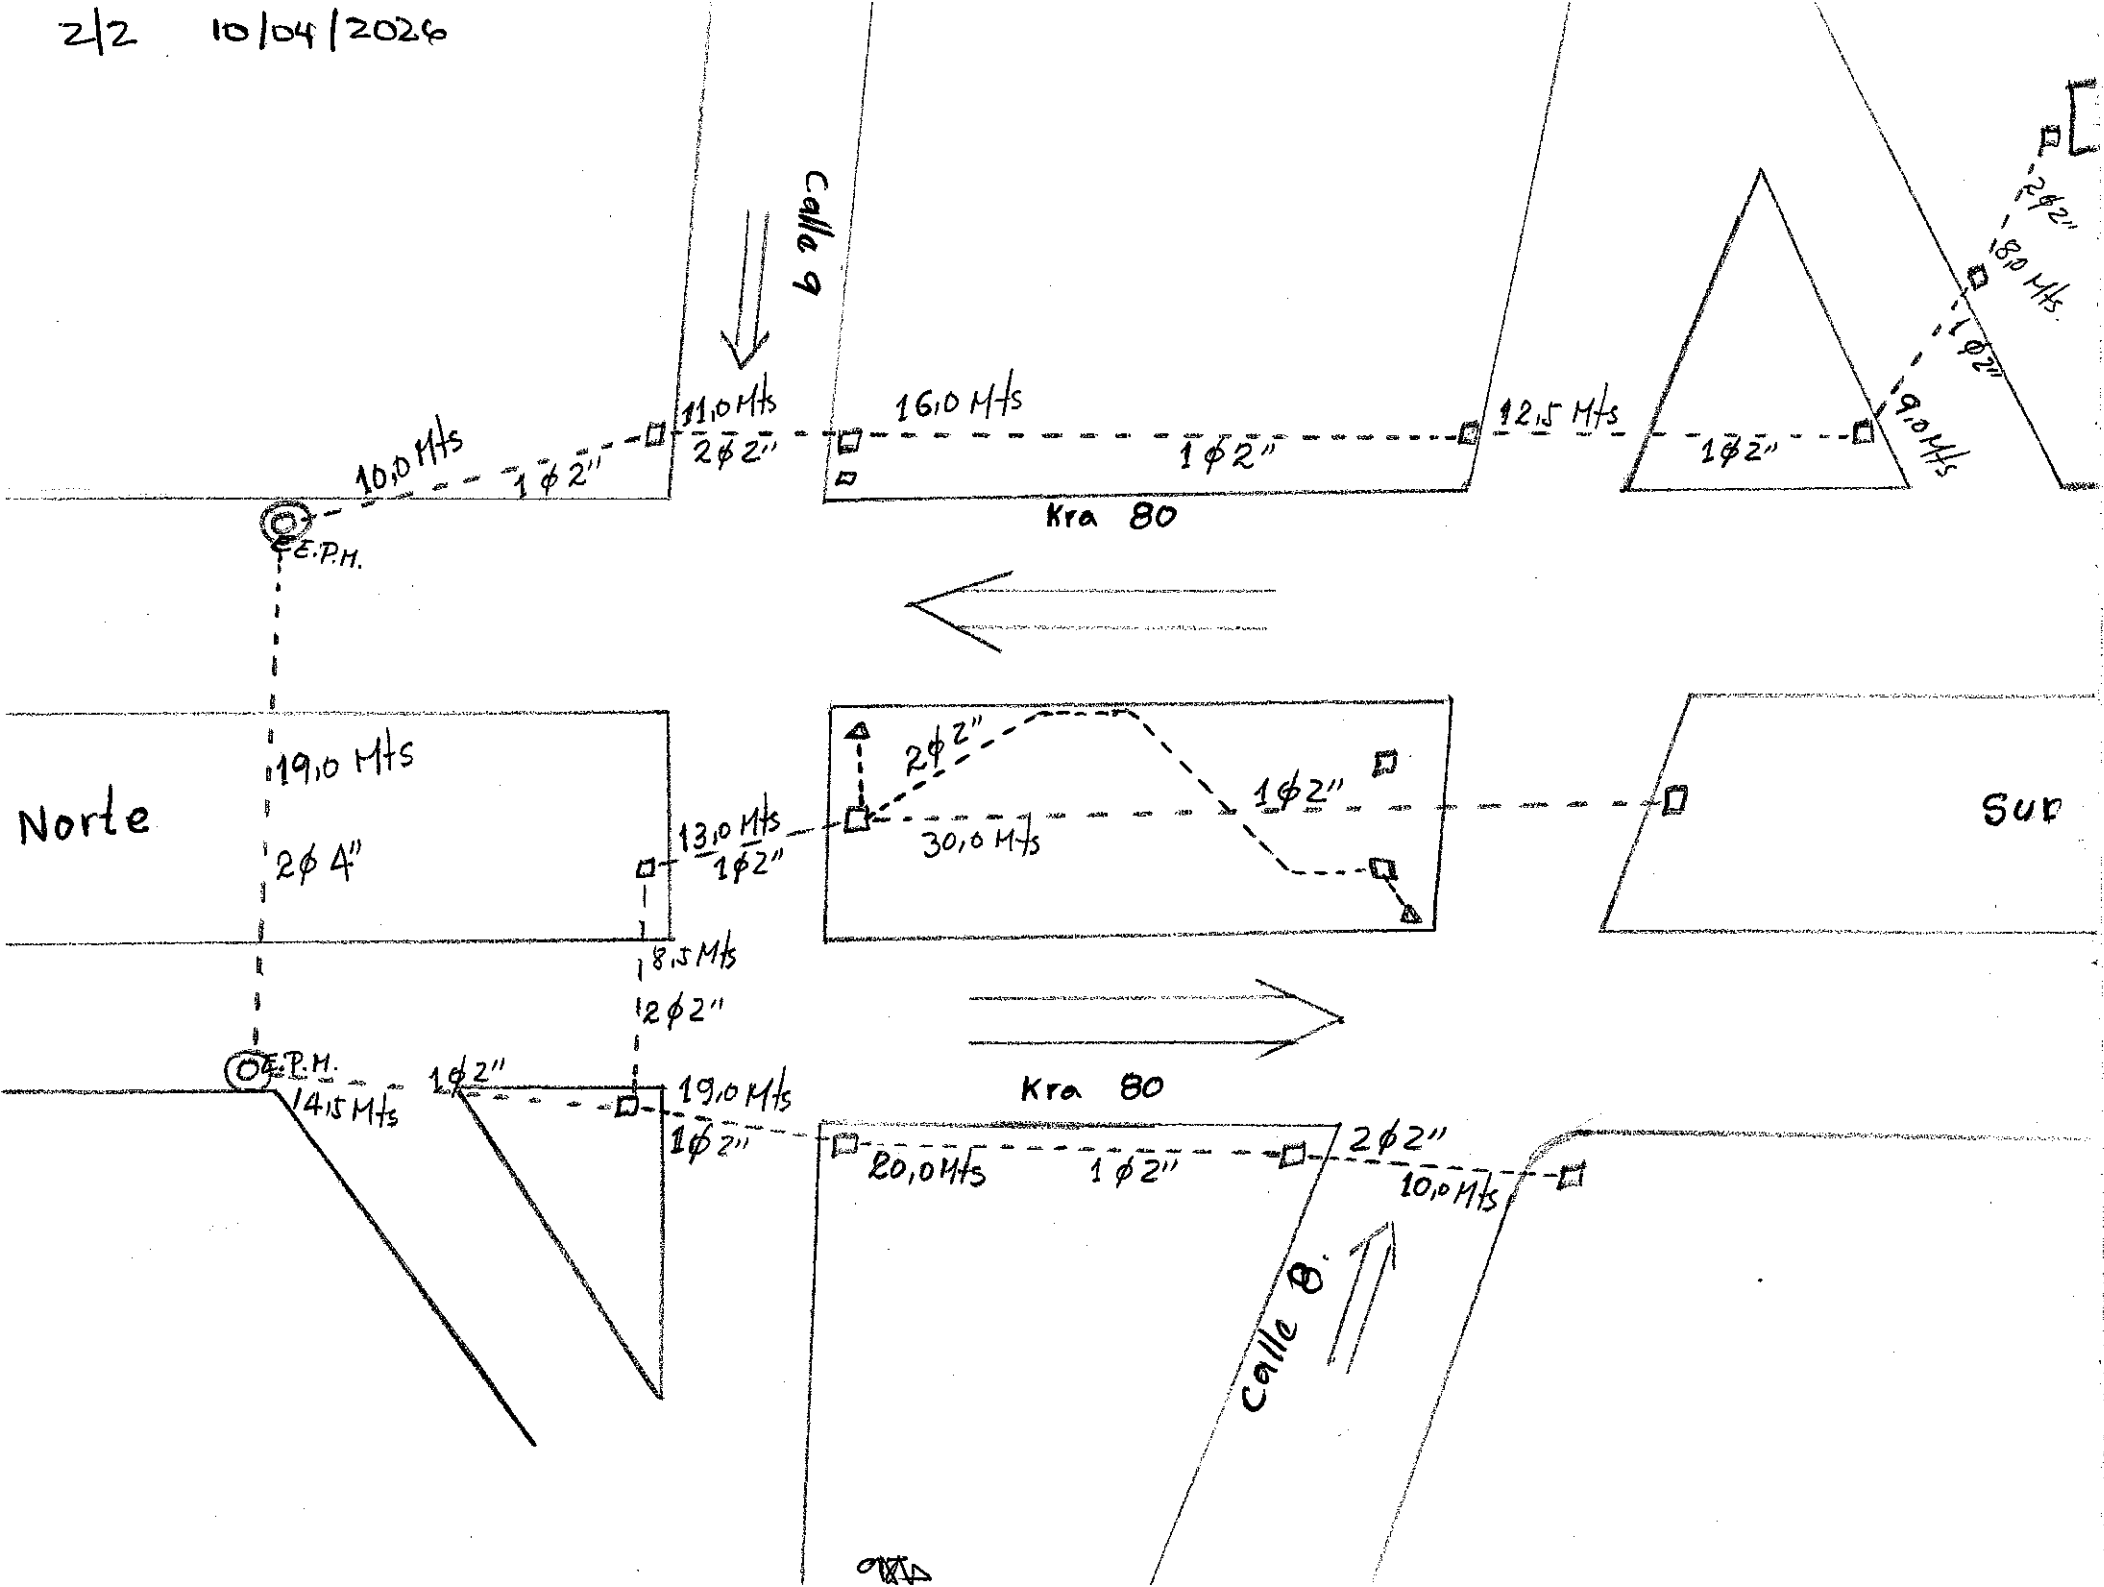
✓

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1				
						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	10-07-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:			LLUVIOSO			SI /		SI /		SI /
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA					
William Chaves	95681777			Jorge Luis	1098727131					
Thoon Luján										
Luis Zozana	91452201									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Ay 43a	S	N-B	lavado de poste de mantenimiento				8:00		230	
Calle 9 Sur			lavado de semáforo vertical						234	
			lavado de semáforo peatonal						231	
			lavado de disco direccional						236	
			lavado de disco peatonal						236	
			lavado de zonificación						232	
	N-	N-B	lavado de torre de intersección						230	
			lavado de 1 semáforo vertical						234	
			lavado de 1 semáforo peatonal						231	
			lavado de 1 disco direccional						236	
			lavado de 1 disco peatonal						236	
			lavado de 1 zonificación					11:00	232	
EQUIPO EN OBRA:										
Arnes, eslinga, escalera										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBO				
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA			FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				


		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001						
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1						
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025						
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	10-04-2026	TIEMPO	SECO	7	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	Viernes		LLUVIOSO			SI		7		SI	x	SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO				NO		NO
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA				
Laura Marcela Padilla		1017221580				Jose Carlos		1098727137				
Christian Nino		1076917476				Alvaro Londoño		77775737				
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM			
Cra 80 CL 20A		N-S	Lavado de Poste Recto						230-			
			Lavado de Semáforo Peatonal				8:00		231-			
Cra 80 CL 20A		repara	Lavado de poste recto						230-			
			Lavado de Semáforo Vehicular						234-			
			Lavado de Disco						236-			
Cra 80 CL 20A		E-W	Lavado de poste Recto						230-			
			Lavado de Semáforo Vehicular						234-			
			Lavado de Semáforo Peatonal					2:00	231-			
			Lavado de Disco						236-			
Cra 80-CL 19,		N-S	Lavado de Poste Recto						230-			
			Lavado de Semáforo Peatonal						231-			
			Lavado de Pulsador						232-			
			Lavado de De Disco de Pulsador						236-			
EQUIPO EN OBRA:												
Arnes, estroga, Escalera												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ							
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA			FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría							

422		PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
Alcaldía de Medellín Secretaría de Planeación y Desarrollo		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
CONSORCIO INT. EABOL MED. 2025		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 10-04-2025		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA: VIERNES				X		SI		SI	
VEHÍCULOS:				LLUVIOSO		SEÑALIZACIÓN		ESCOMBROS	
				DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE	
Laura Marcela Padilla		1017221580						Jose Gótz	
Cristian Merce Cardozo		814 476						109 696 131	
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJO REALIZADOS		HORA INICIO	
Cra 80 cl 19				N-S		Lavado de disco de pulsador		8:00	
						Lavado de semáforo peatonal			
						Lavado de pulsador			
						Lavado de poste			
Cra 80 cl 19						Lavado de poste recto			
						Lavado de pulsador y disco de pulsador			
Cra 80 cl 19				S-N		Lavado de poste recto		230-236	
						Lavado de disco		230-	
						Lavado de semáforo vial		236-	
								234-	
Cra 80 cl 19				N-S		Lavado de poste recto			
						Lavado de semáforo vial		9:00	
						Lavado de semáforo peatonal		230-	
						Lavado de semáforo pulsador		231-	
						Lavado de disco de pulsador		232-	
						Lavado de semáforo peatonal		236-	
						Lavado de disco		231-	
								236-	
EQUIPO EN OBRA:									
Arnel, estrega, escalera									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA: DÍA: VEHÍCULOS:	70 ABRIL viernes	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN				
		UNIFORMES CUMPLE SI / NO				
		SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI / NO				
		ESCOMBROS SI / NO				
		CUMPLE SI / NO				
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Bramon Palacios		Alvaro Bolzon	71225 731			
Andres Lopez		Jordan Pineda	103696 2270			
Javier Nieves						
Steven Patino						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 76 cl 30	OR	S-N	Retiro de 4 Herrajes 50x50			187
			Limpieza de cables			54
			Instalacion de 4 Herrajes 50x50			13
	OC	S-N	Retiro de 4 Herrajes 50x50			187
			Limpieza de cables			54
			Instalacion de 4 Herrajes 50x50			13
EQUIPO EN OBRA:						
Planta electrica, Pulidora, Martillo demoledor, herramienta menor						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA		FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria			



1/2		PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	11/09/2025	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Sábado		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI /	
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Juan José Ruiz Silva		1000337476						Jorge Coffer		1098727137	
W. Alan Chovamua								Alvaro Londoño		71775731	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CALLE 5A - CALLE 4A	W - N	W - E	• Revisar de cable de alumbrado						261		
	SEPARADOR		• Verificación de conexiones								
	CENTRAL		• Se enciende el voltaje en 100v								
			"								
CALLE 52 - CALLE 58	N - E	N - S	• Retiro de lámpara peatonal roja en mal estado						195		
			• Instalación de lámpara peatonal roja de segunda						218		
			• Construcción de empalme						94		
CALLE 52 - CALLE 58	N - E	N - S	• Retiro de lámpara peatonal verde en mal estado						195		
			• Instalación de lámpara peatonal verde de segunda						218		
			• Construcción de empalme						94		
CALLE 52 - CALLE 58	W - N	W - E	• Retiro de lámpara peatonal verde en mal estado						195		
			• Instalación de lámpara peatonal verde de segunda						218		
			• Construcción de empalme						94		
EQUIPO EN OBRA:											
Escala, arnes, estrioga, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA			FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría						

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	11-04-2026	TIEMPO	SECO ☒	UNIFORMES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
DÍA:	Sábado		LLUVIOSO		SI ☒	SEÑALIZACIÓN	SI ☒	ESCOMBROS	SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO	NO	NO	NO ☒	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
Laura Marcela Padilla	107221580			Jole Cobi	1098727131				
Christian Mena									
Jennifer									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Cr 52 CL 58		N-S	Lavado de semáforo peatonal			8:00		231-	
			Lavado de semáforo peatonal					231-	
			Lavado de poste recto					230-	
							1:00		
Cr 52 CL 58		N-S	Lavado de poste recto					230-	
			Lavado de semáforo peatonal					231-	
Cr 52 - CL 57B		E-W	Lavado de poste recto					230-	
			Lavado de semáforo vehicular					234-	
			Lavado de semáforo peatonal					231-	
			Lavado de disco					236-	
Cr 52 CL 57B			Lavado poste recto					230-	
			Lavado de semáforo vehicular					234-	
			Lavado de semáforo peatonal y disco			1:00		231-236-	
EQUIPO EN OBRA:									
Arnes, estinga, escalera									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 11-04-2026 DÍA: Sábado VEHÍCULOS:	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X UNIFORMES CUMPLE SI X NO	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI X NO ESCOMBROS SI NO X
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura Marcela pa Cristian Meng Jennifer	1017221580	José Luis	1098227131
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
ca 52 CL 58		N-S	Lavado de Semáforo Vascular
			Lavado de Semáforo Peatonal
			Lavado de Poste Recto
			Lavado de Semáforo Peatonal
			Lavado de Disco
ca 52 CL 58		N-S	Lavado de Semáforo Vascular
			Lavado de Semáforo Peatonal
			Lavado de Poste Recto
			Lavado de Disco
ca 52 -CL 58		N-S	Lavado de Poste Recto
			Lavado de Semáforo Peatonal
			Lavado de Semáforo Peatonal
EQUIPO EN OBRA:			
Artes, estilogra, escalera			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD

SIT-SGC-F-001

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

VERSIÓN 1

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025

ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14-09-2026	TIEMPO	SECO X		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
DÍA:	Sábado		LLUVIOSO		SI X	SEÑALIZACIÓN	SI X	ESCOMBROS	SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Lidia Marcela Padilla	10722580			Alvaro Lora	9122334
Cristian Mena				José Luis	1090222131
Jennifer					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 CL 58		E-W	Lavado de poste recto	8:00		230
			Lavado de semáforo vehicular			234
			Lavado de semáforo peatonal			231
			Lavado de disco			236
CR 52 CL 58		E-W	Lavado de semáforo vehicular			234
			Lavado de semáforo peatonal			231
			Lavado de semáforo peatonal			231
			Lavado de poste recto			230
			Lavado de disco			236
CR 52 CL 58		N-S	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semáforo peatonal			231
			Lavado de semáforo vehicular			234
			Lavado de disco			236
CR 52 CL 58		N-S	Lavado de poste recto		1:00	230
			Lavado disco, semáforo vehicular y peatonal			236-234
						231




EQUIPO EN OBRA:

Artes, eslinga, escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA



VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001																	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1																	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025																	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																							
FECHA: 13/09/26		DIA: Lunes		VEHÍCULOS:		TIEMPO		SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE		ESCOMBROS		CUMPLE			
												SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
PERSONAL EN OBRA																							
CONTRATISTA												INTERVENTORÍA											
NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA			
Juan José Roca Silva				1000537916												Jose Carlos				109872719			
Vilmar Fernando Uribe				1065918019																			
Luis Lopez				41482201																			
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS										HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM			
CARRETERA 45-CALLE 4B		S - E		S - N		Retiro de base de controlador										8:40		9:00		-			
CARRETERA 80-CALLE 4A		E - S		E - W		Instalación base de controlador										10:00				-			
		SEÑALIZADOR				Instalación de controlador														216-			
						Instalación de 14 líneas de 4 metros de cable 4x16														215-			
						Instalación de 4 metros de cable de acometida														215-			
						Instalación de 4 metros de cable de tierra														215-			
						Instalación de 2 líneas de 4 metros de fibra Optica														215-			
						Soldadura de caja de 60x80												4:15		262			
EQUIPO EN OBRA:																							
Herramienta menor, Pesca																							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																							
VERIFICACIÓN																							
RESPONSABLE CONTRATISTA												RESPONSABLE INTERVENTORIA											
ELABORÓ						REVISÓ/ACTUALIZÓ						APROBÓ											
NOMBRE: Maria Victoria Durango						NOMBRE: Carlos Alberto Diaz						NOMBRE: Queny Patricia Barreneche											
FIRMA 						FIRMA 						FIRMA 											
CARGO: Auxiliar de Residencia						CARGO: Residente de Obra						CARGO: Residente de Interventoría											


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	13 04 2026	TIEMPO	SECO
DIA:	lunes		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN
		2 horas	
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	/
		NO	
		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
		SI	/
		NO	
		ESCOMBROS	CUMPLE
		SI	/
		NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa P.	16791406	Jose Cortes	1098727131
Christian Barbosa	1151966785		
José andrade	11222857		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
✓ Crv 36ª Cl/45			261
		Falla en acometida	
		Se realiza cambio de Punto de acometida en	
		Poste	
		Construcción de Empalme.	94
✓ Crs 3 Cl/44			
		Falla de acometida	
		Se realiza cambio de Punto de acometida en	
		cable de 50x50	
		Construcción de Empalme.	94
✓ Crs 2 Cl/57B	W	N	263
		Concreto en poste de retiro de Enterramiento	
Cr 48x Cl/502	E	S-N	179
CAFIT		Retiro de disco para peatones de poste	
		Instalación del mismo dis	220
EQUIPO EN OBRA:			
Escalera, herramienta menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	13 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOBROS	CUMPLE
DÍA:	Lunes.				SI /		SI /		SI /
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jerson Galeano				José Cortes	1098727131				
Moses Reyes	1002500113			Alvaro Londoño	71775737				
Johan Ramirez	1015186405			Eduardo Pauli	43068550				
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carrera 70 circular 1.	N-E	N-S	Suministro e instalación de 6 mts coraza flexible			8 am			
			Suministro e instalación de 21mts cable 4x18					215-	
			Se realiza canalización de 3 mts en adoquin						
			Instalación de 3 semáforos de piso					212-	
			S/N: 20250018 sticker 0775 S/N 20250211 sticker 0773 S/N 20250468						
			Instalación de fuente eléctrica						
			S/N: 20250077 sticker 0300				4 pm		
			Construcción de 5 empalmes.					94	
EQUIPO EN OBRA: Planta eléctrica, pulidora, martillo dental, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBO							
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA	FIRMA	FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria							

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA: 13-04-2026		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA: Lunes		LLUVIOSO		SI X		SI X	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Laura Marcela Padilla		1017221585		Jennifer Altamirano		1098727137	
Cristian Mena		1076817116				71775737	
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS	
Cra 80 Cl 18				Sep		Lavado de poste recto	
						Lavado de semáforo vehicular	
						Lavado de bisco	
Cra 80 Cl 18				N-S		Lavado de poste recto	
						Lavado de bisco	
						Lavado de semáforo vehicular	
Cra 80 Cl 76				Sept		Lavado de poste recto	
						Lavado de semáforo vehicular	
						Lavado de bisco	
						Barrido Perim de Constraste	
EQUIPO EN OBRA:							
Arnes, estinga, escalera							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		14 Abril 2022		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	
DIA:		Martes					SI	/		SI	/
VEHÍCULOS:							NO			NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Yelson Galeano								Jose cortes		1048727131	
Carlos Gonzalez		1049894058						Jonathan Rendon		1036962770	
Moises Reyes		1002500113									
TRABAJOS REALIZADOS											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carretera 70	N-W	N-S	Suministro e instalacion 10 mts coraza flexible					8am			
Circular 1			Suministro e instalacion 27 mts cable 4x18							215	
			Se realiza canalizacion de 9 mts en adogun								
			Adoguina de 25 adoguinas 20x20							53	
			(se retiran y se reinstalan)								
			Instalacion de 3 semaforos de piso							212	
			S/N: 20250056 sticker: 0770 S/N: 20250093 sticker: 0769								
			S/N: 20250007 sticker: 0771								
			Instalacion de fuente electronica								
			S/N: 20250065 sticker: 0297						4:00 pm		
			Construccion de 5 empalmes.							94	
EQUIPO EN OBRA:											
Planta electrica, Palidora, martillo de molidor, Herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORIA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria					

PLAN DE CALIDAD							SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1.				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: DÍA: VEHÍCULOS:	19/4/26 <i>Martes</i> <i>A.T.N.S.O?</i>	TIEMPO	SECO Lluvioso Duración		UNIFORMES	CUMPLE SÍ / NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SÍ / NO	ESCOMBROS	CUMPLE SÍ / NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
<i>Franklin Barbosa</i>						<i>Huanos lo Roto</i>		<i>21725220</i>		
<i>Christico Barbosa</i>										
<i>Jesé Andrade</i>										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
<i>G. 70 x C I 16 y 19</i>		<i>N S</i>	<i>Retiro de 14 líneas de 4 metros de 4x18 de cable de señal controlado antiguo</i>					<i>9:00</i>		<i>173-</i>
			<i>Retiró de 4 metros de cables de Arcofida controlados antiguos</i>							<i>173</i>
			<i>Reinstalacion de 14 líneas de 4 metros de 4x18 de cable de sonido " controlados nuevos</i>							<i>215-</i>
			<i>Reinstalacion de 4 metros de arcofida si controlados nuevos</i>						<i>1:30</i>	<i>215-</i>
			<i>Verificación de cada grupo vehicular</i>							
EQUIPO EN OBRA:										
<i>Pescar herramienta mejor</i>										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA								
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALizó	APROBÓ								
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche								
FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>								
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria								



PLAN DE CALIDAD

SIT-SGC-F-001

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

VERSIÓN 1

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025

ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14-04-2026	TIEMPO	SECO		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
DÍA:	Martes		LLUVIOSO X		SI Y	SEÑALIZACIÓN	SI X	ESCOMBROS	SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura Marcela Padilla	1017221580			José Carlos	1098227139
Alfonso Ramirez	1015186405				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV 80 CIR 76	cep	S-N	Lavado de poste Recto	8:00		230
			Lavado de semáforo Vehicular			234
			Lavado de disco		8:30	236
AV 80 CIR 9		S-N	Lavado de poste Recto	9:00		230
			Lavado de semáforo Vehicular			234
			Lavado de disco			236
AV 80 CIR 9		E-W	Lavado de poste Recto			230
			Lavado semáforo Vehicular			234
			Lavado disco			236
			Retiro de contraste			199
AV 80 CIR 9		EW	Lavado de poste Recto			230
			Lavado de semáforo Vehicular			234
			Lavado de disco y Retiro de contraste			236-199

EQUIPO EN OBRA:

Arnes, eslinga, escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA <i>MV Durango</i>	FIRMA <i>CD Díaz</i>	FIRMA <i>Q Barreneche</i>
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD

SIT-SGC-F-001

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025

VERSIÓN 1

ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	Laura Marcela Padilla	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jhuan Ramirez		LLUVIOSO	P		SI		SI		SI
VEHICULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA
Fecha	14-04-2025	1017221586				José Carlos	1098222131	
Día	Mañes	1015186406						

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV 80 CL 9		N-S	Lavado De Poste Recto			230
			Lavado De Semaforo Vehicular			234
			Lavado De Disco			236
AV 80 CL 9		E-W	Lavado De Poste Recto			230
			Lavado De Semaforo Vehicular			234
			Lavado De Disco			
AV 80 CRR 75 B		S-N	Lavado De Poste Recto			230
			Lavado De Semaforo Vehicular			234
			Lavado De Semaforo Peatonal			231
			Lavado De Disco			236
			Lavado De Disco			236
			Lavado De Boton De Pulsador			232

EQUIPO EN OBRA:

Arbol, escalera, colina

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

RESPONSABLE INTERVENTORÍA

ELABORÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	

NOMBRE: Carlos Alberto Diaz

NOMBRE: Queny Patricia Barreneche

FIRMA 

FIRMA CA

FIRMA 10

CARGO: Auxiliar de Residencia

CARGO: Residente de Obra

CARGO: Residente de Interventoría

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	14 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Haites					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	esb 669					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Elberto Cuchiarco		13.461.111				Blanca Baliga		71225131		
Leon Agüendo		15.495.477								
Jorge Rodríguez		PPT 1.137.342								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
* Carretera 48x	W	S-N	Se realiza la búsqueda de una caha de inspección ubicada en zona verde				9:00			
entre calles			demolicion de tapa de caha de inspeccion						1	
30 y 31			limpieza de caha de inspeccion 02 undr.						54	
Tiendagro			excavacion en zona verde para reparacion de tuberia 060x0,50x0,50						38	
			concreteada de 0,50x0,50 de tapa, se concretea porque se debe construir una caha de inspeccion						263	
			concreteada de 2 cahas de tapa de inspeccion						263	
			excavacion en zona verde para reparacion de tuberia (4x0,30x0,50)						38	
			encamisada de 1 tubo pvc de 2" 3,80 metros.				16:00		55	
EQUIPO EN OBRA:										
Herramienta menor, Planta electrica, martillo demoledor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA		FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria						

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001									
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1									
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025									
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN															
FECHA:		14-Abril-2026		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE					
DÍA:		Martes				LLUVIOSO		SI		SI					
VEHÍCULOS:		Bodega				DURACIÓN		NO		NO					
PERSONAL EN OBRA															
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA									
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA					
William Clavomía								Jose Cota		1098727131					
Cristian Córdoba								Jonathan Beltrán		1036762270					
Abuelo Gomez M.		1157187124						Blanca Balsa		71775731					
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM	
Bodega						→ Aseo y orden de la Bodega.				9:00					
de						→ Separación y revisión de elementos									
Secretaría de						→ Alistamiento de limpiaparabrisas nuevos para reutilizar									
Semáforización						→ Selección de letreros sólidos desechables.						14:00			
EQUIPO EN OBRA:															
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA															
VERIFICACIÓN															
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche									
FIRMA		FIRMA				FIRMA									
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría									

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
 		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	13 ABRIL	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Lunes					SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Javier Arceles			Bryan Palacio			Jorge Cortes		1098427131			
Alcides Riasco											
Andrés Bedoya											
Steven Palacio											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
AV 80 CII 25	OR	S-N	Canalización de 3 mts - con concreto se tapo el tubo Concretado de tapa 1 tubo 3" 2 Verde				8:00 am		263		
AV 80 CII 21	OR	S-N	Canalización de 1.30 mts canalización 1 tubo de 3" Zona Verde								
AV 80 CII 25	OC	N-S	Canalización 2 mts 1 tubo 3" Concretado tapa Ant Zona Verde						263		
AV 80 CII 21	OC	N-S	Canalización 2.30 mts 1 tubo 3" Concretado tapa Ant con concreto					5: PM	263		
EQUIPO EN OBRA:											
Herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA				FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO
 Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 ABRIL	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHICULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Andres Begoza		Braulio Palacio		Jose Cortes	1098727131
Alicios Riasco					
Valdez Nieves					
Steven Palacio					

[illegible]

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta mejor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

RESPONSABLE INTERVENTORÍA

ELABORÓ

REVISÓ/ACTUALIZÓ

APROBÓ

NOMBRE: Maria Victoria Durango

NOMBRE: Carlos Alberto Diaz

NOMBRE	Queny Patricia Barreneche
--------	---------------------------

FIRMA amts

FIRMA	CAO
-------	-----

FIRMA

CARGO: Auxiliar de Residencia

CARGO: Residente de Obra


CARGO: Residente de Interventoría

 Alcalde de Medellín		 UNION TEMPORAL DIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
 CONSORCIO INT. ECOL MED 2025		 CONV		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	14-04-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO	X		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	LKN 741		DURACIÓN	2 horas		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Cesar Santos		1038806300				Jorge Cortes		1098727131		
Luis Rivas		PPT435 0715								
Yeferson Gaitan		1035861.703								
Alex. Casas		1036651089								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CR45CL28			Revisión de cruce con problema						261	
CR48CL30			Revisión de cruce con problema						261	
EQUIPO EN OBRA:										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA				FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría				

[illegible]

eth

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1				
						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	15 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	*	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA						
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA					
Juan José Roca Silva	1000537976			José Cortés	1098724131					
Luis Fernando Vivas	1065913019									
TRABAJOS REALIZADOS								HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO								
CARRERA 37	N-W	N-S	Retiro de 8 líneas de 7 metros de cable 4x18 de controlador anterior			8:25		173-		
CAJIE 58			Retiro de 7 metros de cable de acometida 2x12					173-		
			Retiro de 7 metros de cable de tierra					173-		
			Re-instalación de 8 líneas de 7 metros de cable 4x18 en controlador nuevo					215-		
			Re-instalación de 7 metros de cable de acometida 2x12					215-		
			Re-instalación de 7 metros de cable de tierra					215-		
			Suministro e instalación de toma corriente							
			Suministro e instalación de 10 metros de cable de acometida 2x12					79-		
			(Se conecta en paralelo la acometida del controlador anterior con el controlador nuevo ya que se encuentra comunicación de fase en el controlador anterior y se debe dejar alimentado)					94-		
							1:00			
EQUIPO EN OBRA:										
Pesca, herramienta mano										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ								
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche								
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]								
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría								


   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA: 15/4/26		TIEMPO		SECO		CUMPLE	
DÍA: Vacaciones				LLUVIOSO		SI	
VEHÍCULOS: 17N502				DURACIÓN		NO	
				UNIFORMES		SEÑALIZACIÓN	
				SI		SI	
				NO		NO	
				ESCOMBROS		CUMPLE	
				SI		SI	
				NO		NO	
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Franklin Barbosa		16741906		Jonathan London		1036982270	
Christine Barbosa				Jose Cortes		109072713	
Jose Andrade							
DIRECCIÓN							
COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS		HORA INICIO	
C/30 x Cg 1				Semáforo peatonal y semáforo de piso en falla		8:00	
				Se rotura 14 metros de cable 4X18			
				Se instalan 14 metros de cable 4X18 (nuevo)			
				Se realizan 4 empalmes			
				Se rotura punto en falla			
				Se instala punto			
				Se realiza concretado de tapa 40X40		11:00	
C/52 C/2 sur		E SN		Enderezado de Semáforo PedaTonal		258	
		E SN		Enderezado de Semáforo Vehicular.		258	
C/45 C/52				concretado de base de mensula de 80X80		263	
EQUIPO EN OBRA:							
Mantenimiento menor							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA							
Se verifica señalización y GPA, programar cambio de cable y posibilidad de canalización nueva, mantener este obstructo.							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA		FIRMA		FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			



PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001													
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1													
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025													
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																							
FECHA: 15 Abril 2026		DÍA: Miércoles		VEHÍCULOS:		TIEMPO		SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE		ESCOMBROS		CUMPLE			
								2h.				SI NO		SI NO		SI NO		SI NO					
PERSONAL EN OBRA																							
CONTRATISTA												INTERVENTORÍA											
NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA			
Carlos Gonzalez				1049894058												Jose Cortes				1098727131			
Moses Reyes				1002500113												Jonathan Rendon				1036962740			
																Wendy Baul				11306854			
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS										HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM			
Carrera 70 Circular 1		E-5		W-E		Suministro e instalacion de 7 mts cable 4x18										8 am				215			
						Suministro e instalacion de 1 mts correa flexible																	
						Construccion de 2 empalmes.														94			
						Instalacion de 1 semaforo de piso.														212			
						S/N: 20250024 sticker: 0768												3:40pm					
EQUIPO EN OBRA:																							
Planta electrica, Pulidora, martillo demoledor, herramienta menor																							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																							
VERIFICACIÓN																							
RESPONSABLE CONTRATISTA												RESPONSABLE INTERVENTORIA											
ELABORÓ						REVISÓ/ACTUALIZÓ						APROBÓ											
NOMBRE: Maria Victoria Durango						NOMBRE: Carlos Alberto Diaz						NOMBRE: Queny Patricia Barreneche											
FIRMA						FIRMA						FIRMA											
CARGO: Auxiliar de Residencia						CARGO: Residente de Obra						CARGO: Residente de Interventoria											

[illegible]

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1				
						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	15 Abril 2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Miércoles.					SI	SI		NO	NO
VEHÍCULOS:						NO	NO		NO	NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA					
Eberto Cadizano	13.461.111			José Cortés	20.987.27131					
Ricardo Rodríguez	PPT 1.139.342									
Leon Guerrero	15.485.477									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Calle 29 entre Carreteras 444 y 45.	S	E-W	Construcción de Canalización en Zona Verde con 2 tubos pvc 2" 10,40 metros.			8:30	16:00	Z5		
EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBO								
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche								
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]								
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría								

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	16/09/2026	TIEMPO	SECO
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
			SEÑALIZACIÓN
			CUMPLE
			ESCOMBROS
			CUMPLE
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan José Roca Silva	1000537976	Jose Cortes	1098727131
Edwin Santiz	1038010427	Jonathan Rendon	1036962270
Simón Leonardo Uribe	1065913019		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
CARRERA 48	E - N	E - W	• Apertura de 3 cajas de 50x50 controladoras
CALLE 59			• Retiro de 8 líneas de 6 metros de cable 4x18
			• Retiro de 6 metros de cable de acometida 2x12
			• Instalación de zanja para pavimento de 2 metros
			• Retiro de 1" de tubería total de 2"
			• Suministro e instalación de 1" de tubo pvc 2"
			• Suministro e instalación de 4 líneas de 40 metros de cable 4x18
			• Suministro e instalación de 30 metros de cable de acometida 2x12
			• Construcción de 5 empalmes en caja
			• Instalación de 6 líneas de cable 4x18 en controlador nuevo
			• Instalación de cable de acometida en controlador nuevo
			• Concreto de 3 cajas de 50x50
			• Concreto de zanja de 2 metros
			HORA INICIO: 7:45
			HORA FINAL: 3:00 pm
			ITEM: 1, 173, 173, 28, 215, 79, 94, 213, 263
EQUIPO EN OBRA:			
Hexamétrica Mayor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		 UNION TEMPORAL SIT-MED 2025		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1			
						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	16 04 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO
DÍA:	Jueves								
VEHÍCULOS:	MTN 502								
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
Franklin Bobosa P.		16794408				Jose Cortes		1098727131	
Cristian Mena		1676817116							
Cristian Bobosa		1151966785							
Jose andrade		11222857							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C76 x C130			Se realiza verificación de cámaras de paso donde paso cableado semaforico 21 cámaras de paso Se realiza soldadura de 9 cámaras de paso Se realiza limpieza de 7 cámaras de paso				8:00		183 54-
C144 x C144	E-W	NS	Se realiza enderizada de 2 semaforos peatonales						258
C145 x C145	Sopriador	NS	Se realiza enderizada de semaforo vehicular						258
C145 x C147	E	SN	Se realiza montaje de vases de modulo vehicular amarillo					4:30	260
EQUIPO EN OBRA:									
Equipo Soldador, Planta electrica, Pulidora									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA	FIRMA	FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría							

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSORCIO INT. PAR. MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				VERSIÓN 1			
						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	16 Abril 2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Viernes		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juime Cifuentes	71.420.675			Jode Cortes	1098727131				
Yelson Cañas	1.035.861.703								
Santiago Mena	1.000.533.792								
TRABAJOS REALIZADOS									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Carrera 80 x Calle 9	E	N-S	Revisión de cable de comunicación vandalizado y suministro e instalación de 77 metros de cable UTP				9:30		110
Cost. Norte.			construcción de empalme (eléctrico) con cubierta telefónica.						95
Pincon (36) y Cost. Sur.			Se dejó en funcionamiento el cable de comunicación.					16:20	
Carrera 80 x D675 D Cost.									
Norte y Sur									
La Mota.									
EQUIPO EN OBRA:									
Herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD

SIT-SGC-F-001

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

VERSIÓN 1

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025

ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16 Abril 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO		SI	/		SI		/
VEHÍCULOS:			DURACIÓN	24	NO			NO		

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez		Brayan Palaeo		Jose Cortes	1098727131
Moses Reyes	1002500113	Javier Nieves			
		Andres Bedoya			
		Alcides Riasco			


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Correa 74	W-E	W-E	Suministro e instalacion 1 mts correa flexible	9 am		
Diagonal 74			Suministro e instalacion 3 mts cable 4x18			215-
			Instalacion semaforo de 1 piso			212-
			Instalacion fuente electrica			262-
			Soldada de tapa de concreto de 40x40 10cm (4 cordones)			94-
			Construccion de 3 empalmes.			
	S-E	N-S	Suministro e instalacion 2 mts correa flexible			
			Suministro e instalacion 3 mts cable 4x18			215-
			Instalacion de 1 semaforo de piso.			212-
			Instalacion fuente electrica			
			Construccion canalizacion 2 mts			
			Construccion de 3 empalmes.			94-

EQUIPO EN OBRA:

Pulidora, Planta electrica, Martillo demolador, Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16-07-2026	TIEMPO	SECO	☒	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	JUIN		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
N. J. - Contrata	96147777	José A. Amiranda	105482270	José Cortes	1098727131		
Ysidro Galeano	1030547032						
Luis Lozano							


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carretera			Visión de planta	10:00		
S2	N-E	E-W	visión de planta de control			199-
	S-E	E-W	visión de planta de control			199-
Carretera	S-E	E-W	visión de planta de control			199-
S3	S-E	N-S	visión de planta de control			199-
Carretera	S-E	N-S	visión de planta de control			199-
Calle 500	S-E	N-S	visión de planta de control			199-
	S-E	E-W	visión de planta de control			199-
	N-W	W-E	visión de planta de control		2:20pm	199-

EQUIPO EN OBRA:

Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	16 ABRIL 2026	TIEMPO	SECO
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	SEÑALIZACIÓN
		NO	CUMPLE
			ESCOMBROS
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cadizaco	13.461.111	Jose Cortes	10.987.111
Jose Perez	PPT 5.240.599		
Jaime Rodriguez	PPT 1.137.342		
Leon Ojeda	15.495.477		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
* Calle 170 x	N-E	S-N	Cerrada de aspecto en lente amarilla en
* Calle 24			semáforo vehicular a mensula.
			HORA INICIO 8:30 HORA FINAL 8:48 ITEM 259
* Calle 29 entre	S	E-W	construcción de canalización en zona verde
Calle 44			con 2 tubos pvc de 2" 25.6 metros.
445			Demolicion de tapa de cana de inspeccion
			concretada de tapa de cana de inspeccion
			limpieza de cana de inspeccion 03 uncs.
			HORA INICIO 9:20 HORA FINAL 16:50 ITEM 25 263 54
EQUIPO EN OBRA:			
Herramienta menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria	

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: DIA: VEHÍCULOS:	16-04-2026 Jueves	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X UNIFORMES CUMPLE SI X NO
		SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI X NO	ESCOMBROS CUMPLE SI NO X
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura Marcela Padilla	1017221580	Jose cortes	1098777131
JHojan Ramirez	1015186405	Jonathan Rendon	1035962770
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* Ave 80 CLL 1	W-E	N-S	Lavado de poste Recto
			Lavado de Semaforo Vehicular
			Lavado de DISCO Direccional
* AV 80 CLL 1	E-W	S-N	Lavado de Poste Recto
			Lavado de Semaforo Vehicular
			Lavado de DISCO Direccional
* AV 80 CLL 1	E-W	S-N	Lavado de poste Recto
			Lavado de Semaforo Vehicular
			Lavado de DISCO Direccional
* AV 80 CL 1		S-N	Lavado de Semaforo Vehicular
			Lavado de Semaforo peatonal
			Lavado de DISCO Direccional
			Lavado Poste Recto y Boron de polsados
EQUIPO EN OBRA:			
Arnes, estinga, Escalera			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA <i>MV Durango</i>	FIRMA <i>CD Diaz</i>	FIRMA <i>Q Barreneche</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

  		  		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1			
CONTRATO DE OBRA No. 4600105555 de 2025		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	16-04-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
DÍA:	JUEVES		LLUVIOSO	X		SI	SI	SI	
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO	NO	NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA			
Laura Marcela P		1013221580							
JHojan Ramirez		1015186405							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV 80 CLL 1	W-E	N-S	Lavado de semáforo vehicular				10:00		234
			Lavado de semáforo peatonal						231
			Lavado de poste Recto						230
			Lavado de bisco direccional						236
			Lavado de disco peatonal						231
			Lavado de Boton De Pasador						232
EQUIPO EN OBRA:									
Armer, erlinga, Escalera									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA			FIRMA			FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría			

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	17/04/2026	TIEMPO	SECO	X	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO		SI ✓	SI ✓	SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan José Rodríguez Silva	1000537476			Alvaro Londoño	91777771		
Eduin Santos	1038810427						
Simón Fernando Uribe	1065913019						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
CALLE 69B			Se llega al punto para cambio de cableado			7:45	
CALLE 30	W-5	W-E	Retiro de 30 metros de cable 4x16 en mal estado del grupo #6 peatonal				173-
			Suministro e instalación de 42 metros de cable 4x18 nuevo				215-
			Retiro de 12 metros de cable 4x16 en mal estado del grupo #1 vehicular				173-
			Suministro e instalación de 20 metros de cable 4x18 nuevo				215-
			Construcción de 2 empalmes				94
			Busqueda de caja perdida			4:00	
EQUIPO EN OBRA:							
Planta, Cables, Dms, Pulidos							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBO			
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]			FIRMA [Firma]			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria			

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA: 17 04 2026		DÍA: Viernes		VEHÍCULOS: MTN 502		TIEMPO		SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	
								CUMPLE SI NO		SEÑALIZACIÓN	
								CUMPLE SI NO		ESCOMBROS	
								CUMPLE SI NO		CUMPLE SI NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Franklin Babasa P.		16791906						Jose cortes		4098727137	
Cristian Mena		1076817116									
Cristian Babasa P.		1151966785									
Jose andrade		11222857									
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	
C. 76 x C130						Se realiza retiro de cableado del flujo (12-212-23-4-48-24)				8:00	
						Se retira 298 metros de cable 4x18					
						Se realiza instalación de cableado nuevo para los flujos, (12-212-33-4-48-24)					
						Se instala cableado nuevo 4x18 318 metros					
						Se realiza construcción de 15 empalmes en conductores				4:00	
						61-66+25					
						66-67+25					
						611-30+25					
						64-13+27					
						67-12+27					
						Total 318					
EQUIPO EN OBRA:											
Escala, herramienta menor, aros, estinga											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN						
FECHA:	13 Abril 2026	SECO	CUMPLE			
DÍA:	Viernes	LLUVIOSO	SI			
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO			
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Eberto Cochaco	13.461.111	Jose Cortes	10.187.2131			
Leon Ovando	15.485.477					
Jorge Rodriguez	PPT 1.137.342					
Jose Perez	PPT 5.240.599					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Calle 29 entre	Señalización	E-W	Demolicion de tapa de cana de inspeccion	10:00		1
Callejas 44 y			de 50x50			
45			limpieza de cana de inspeccion			54
			instalacion de heringe de seguridad			
			nuevo de 50x50		11:00	13
Camara 47 x	N-E	E-W	Demolicion de base de controlador.	13:15	14:10	2
Calle 59						
Carreia 45 x	N-E	E-W	Demolicion de base de controlador.	14:20		2
Calle 59			Retiro de galvanete de controlador.		15:20	165
EQUIPO EN OBRA:						
Martillo demoledor, Planka electrica						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA				
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA	FIRMA	FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria				

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN															
FECHA:		17-04-2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:		Viernes						SI X			SI X			SI X	
VEHÍCULOS:								NO			NO			NO	
PERSONAL EN OBRA															
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA									
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA					
Laura Marcela Padilla		64221580						Jode Carter		1098727131					
Jhayan Ramirez		1015186405													
TRABAJOS REALIZADOS															
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS						HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM				
* AV 80 CL 65	E-W	N-S	Lavado de poste Recto						9:00		230				
			Lavado de Semafaro Vehicular								234				
			Lavado de Disco Direccional								236				
* AV 80 CL 65	W-E	S-N	Lavado de poste Recto								230				
			Lavado de Semafaro Vehicular								234				
			Lavado de Disco Direccional								236				
* AV 80 CL 65	W-E	N-S	Lavado de poste Recto								230				
			Lavado de Semafaro Vehicular								234				
			Lavado de Disco Direccional								236				
* AV 80 CL 65	W-E	N-S	Lavado de Semafaro Vehicular								234				
			Lavado de poste								230				
			Lavado de Disco Direccional								236				
EQUIPO EN OBRA:															
Arco de estinga, escalera															
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA															
VERIFICACIÓN															
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA											
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ											
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche											
FIRMA <i>[Firma]</i>		FIRMA <i>[Firma]</i>		FIRMA <i>[Firma]</i>											
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría											

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001								
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1								
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025								
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN														
FECHA:	17-04-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE				
DIA:	Víernes					SI		X		SI	X	NO	NO	X
VEHÍCULOS:						NO				NO		NO		
PERSONAL EN OBRA														
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA										
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA									
Laura Marcela Padilla	1017221580	José Cortes	1098727134											
Jhojan Ramirez	1015186405													
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM						
Carrera 80 CR 53		N-S	Lavado De Poste Recto			9-00		230-						
			Lavado De Vehicular Semaforo					234-						
			Lavado De Semaforo Peatonal					231-						
			Lavado De Disco Direccional					236-						
			Lavado De Disco Peatonal					236-						
AU 80 CR 53	sepa	N-S	Lavado De Disco Direccional					236-						
			Lavado De Disco Peatonal					231-						
			Lavado De Semaforo Vehicular					234-						
			Lavado De Semaforo Peatonal					231-						
			Lavado De Boton De Pulsador					232-						
			Lavado De poste Recto					230-						
AU 80 CR 53	Separa	S-N	Lavado de poste recto					230-						
			Lavado De semaforo vehicular y peatonal					234-231						
			Lavado De Disco Direccional y peatonal					236-						
			Lavado De Boton de pulsador					232-						
EQUIPO EN OBRA:														
Ar Des, estrioga, Escalera														
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA														
VERIFICACIÓN														
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA											
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ											
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche											
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]											
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria											

1/5

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	18. ABRIL 2026	SECO	CUMPLE
DIA:	SABADO	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI	SI
		NO	NO
ESCOMBROS		CUMPLE	SI
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JUAN CARLOS	71480675	JOSÉ CARLOS	709827131
SERGIO RODRIGUES	PPT 1.137.342		
ALBERTO OQUENDO	15.495.477		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
* ca 80 X 44	Sor	oc. oc	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo
			variculas de manzula, lavado de 1 semáforo
			variculas de poste, lavado de 1 semáforo
			peatonal, lavado de 1 disco direccional
			lavado de 1 sonorizador, lavado de 1 disco PEC
* ca 80 X 44	Sor	oc. oc	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo
			variculas de manzula, lavado de 1 semáforo
			variculas de poste, lavado de 1 semáforo
			peatonal, lavado de 1 disco direccional
			lavado de 1 sonorizador
* ca 80 X 44	Sor	N.S	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo
			variculas de manzula, lavado de 1 semáforo
			variculas de poste
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma lavado de 1 disco PEC			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

215

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	18 Abril 2026	SECO	CUMPLE
DIA:	Sabado	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI	SI
		NO	NO
ESCOMBROS		SI	CUMPLE
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Carlos Fuentes	71480675	Jose Cortes	1098721131
Jorge Rodriguez	PPT 1137.342		
Alvaro Oquendo	15.485.477		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
X ca 80x45	OC	N-S	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular de poste, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229
			230
			235
			234
			231-236
X ca 80x45	OC	S-N	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular de manzula, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco direccional, lavado de 1 semaforo vehicular de poste
			229
			230
			235
			231-236
			234
X ca 80x48	OC	S-N	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular de poste, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229
			230
			235
			234
			231-236
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

315

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	18 Abril 2026	SECO	CUMPLE
DÍA:	Sabado	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	CUMPLE
		SEÑALIZACIÓN	SI
		ESCOMBROS	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Saime Cortes	71480675	Jose Cortes	169872431
Sergio Rodriguez	DPT 1137.342		
Albeto Oquendo	15.435.477		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* ca 80x47d	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de menzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semaforo
			peatonal, lavado, lavado de 1 disco direccional
			lavado de 1 sonarizador
			229-230-235-234-231-236-232
* ca 80x46	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de de menzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste, lavado de 2 semaforos
			peatonales lavado de 1 disco direccional
			229-230-235-234-231-236
* ca 80x46	OS	S-N	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de menzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semaforo
			peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229-230-235-234-231-236
EQUIPO EN OBRA:			
plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

415

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	18 Abril 2026	TIEMPO	SECO
DIA:	Sábado		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	SEÑALIZACIÓN
		NO	CUMPLE
			ESCOMBROS
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Carlos	71480678	José Carlos	1098727131
José Carlos	PPT 1.137.342		
Alberto Oquendo	15.495.477		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
ca 784x50	oc	N-S	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo de manzula, lavado de 1 disco direccional
			229
			230
			235-236
ca 784x50	or	S-N	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo vehicular, lavado de 1 semáforo peatonal, lavado de 1 disco direccional, lavado de 1 pulsador, lavado de 1 disco PEC
			229
			230
			235-236
			236
			232-236
ca 784x50	sur	ocor	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo de manzula, lavado de 1 semáforo vehicular de poste, lavado de 1 semáforo peatonal, lavado de 1 disco direccional, lavado de 1 pulsador, lavado de 1 disco PEC
			229
			230
			235
			234
			231-236
			232
			236
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14-09-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Domingo					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502					NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16.791.906			Jose Cortes	1098727131
Jose Andrade	11.222.857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 74 x Cl 53	Seponal	WE	Atencion de accidente de tránsito.			
			- Retiro de Semáforo peatonal			172
			- Retiro de Semáforo Vehicular			172
			- Retiro de Cable 4X18 Grupo peatonal y Vehicular 16 m			173
			- Retiro de poste de Enterramiento golpeado			168
			- Retiro de Disco direccional			179
			- Instalación de Poste de Enterramiento Nuevo			206
			- Reinstalación de Cable 4X18 de Grupos 16 m			215
			- Instalación de Semáforo peatonal			208
			- Instalación de Carcasa de 3 Aspectos Nueva			208
			- Instalación de 3 Lámparas Vehiculares (R.A.V) Reinstalación			220
			- Reinstalación de disco direccional			94
			- Construcción de (2) Empalmes en Semáforos			
CIOS			Suministro de (4) Carcasa de (1) Aspectos			137

EQUIPO EN OBRA: Martillo demoledor, planta eléctrica, Pulidora, herramienta menor

VERIFICACIÓN		
ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	RESPONSABLE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Maria Victoria Durango	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
FIRMA	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
CARGO: Auxiliar de Residencia	FIRMA	FIRMA
	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

216

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	19. Abril 2026	TIEMPO	SECO
DIA:	Domingo		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	✓
		NO	
		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
		SI	✓
		NO	
		ESCOMBROS	CUMPLE
		SI	✓
		NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Saime Cifuentes	71480675	Alvaro Londoño	71775731
José Luis Rodríguez	PPT 1.137.342		
Alvaro Oquendo	15.495.477		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Car 80x35	OC	N-S	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo
			vehicular de manzula, lavado de 1 semáforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semáforo
			peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229-230-235-234-231-236
Car 80x35	SUR	OC-OR	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo
			vehicular de manzula, lavado de 1 semáforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semáforo
			peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229-230-235-234-231-236
Car 80x35	OR	S-N	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semáforo
			vehicular de manzula, lavado de 1 semáforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semáforo
			peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229-230-235-234-231-236
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma, Dinam, Slinga			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Quely Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

3/6


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	19 Abril 2026	SECO	CUMPLE
DIA:	domingo	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI	SI
		NO	NO
ESCOMBROS		SI	SI
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Saúl Cifuentes	71480675	Alma Linares	7177577
Socorro Soledad Gue	PPT 1.137.342		
Albano Oquendo	15495477		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
cra 80x35	os	os.oc	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semaforo
			vehicular de manzula, lavado de 1 semaforo
			peatonal lavado de 1 disco direccional
			229
			230
			234
			235
			231-236
cra 80x35	norte	os.oc	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de manzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semaforo
			peatonal lavado de 1 disco direccional
			229
			230
			235
			234
			231-236
cra 80x33	noc	n.s	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de manzula, lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste, lavado de 1 semaforo
			peatonal
			229
			230
			235
			234
			231
EQUIPO EN OBRA:			
Platano, Silla, Saca			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

416



PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	19 Abril 2026	SECO	CUMPLE
DÍA:	domingo	LLUVIOSO	SI ☒
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI ☒	SI ☒
		NO	NO
ESCOMBROS		CUMPLE	CUMPLE
SI ☒		SI ☒	SI ☒
NO		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JAIRO CIFUENTES	71480675	Alvaro Londo	21775431
Saúl Rodríguez	PPT 1.137.342		
Alvaro Londo	15.485.477		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
* Csa 80x33	S.OC	S-N	lavado de 1 brazo de manzula lavado de 1 poste de manzula lavado de 1 semaforo
			vehicular de manzula lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste lavado de 1 semaforo
			peatonal lavado de 1 disco direccional
* Csa 80x33	SUR	OGOS	lavado de 1 brazo de manzula lavado de 1 poste de manzula lavado de 1 semaforo
			vehicular de manzula lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste lavado de 1 semaforo
			peatonal lavado de 1 disco direccional
* Csa 80x33	OS	S-N	lavado de 1 brazo de manzula lavado de 1 poste de manzula lavado de 1 semaforo
			vehicular de manzula lavado de 1 semaforo
			vehicular de poste lavado de 1 semaforo
			peatonal lavado de 1 disco direccional
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma, Dens, Slinga			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Odeny Patricia Barreneche	
FIRMA <i>MV Durango</i>	FIRMA <i>CD</i>	FIRMA <i>OP Barreneche</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

5/6

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 19 Abril 2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DIA: domingo		LLUVIOSO	SI ☒
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI ☒	SI ☒
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jair Cifuentes	71480675	Alvaro Leizaola	71775771
Josue Rodriguez	PPT 1137.342		
Alberto Oquendo	MS. 485.477		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* Ca80x33	OC	OSI OC	lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 semáforo vehicular de manzola, lavado de 1 semáforo vehicular de poste, lavado de 1 semáforo peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229-
			230-
			235-234
			231-
			236-
* Ca80x33	OS	OSI OC	lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 semáforo vehicular de manzola, lavado de 1 semáforo vehicular de poste, lavado de 1 semáforo peatonal, lavado de 1 disco direccional
			229-
			230-
			235-
			234-231
			236-
* Ca80x33	OC	OSI OC	lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 semáforo vehicular de manzola, lavado de 1 semáforo vehicular de poste, lavado de 1 semáforo peatonal
			229-
			230-
			235-
			234-
			231-
EQUIPO EN OBRA:			
Plataformas, Dmy, Slinga			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
CONSORCIO INT. PARQ. MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	20 Abril 2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		V		SI	V
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO				NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Juan José Ruiz Silva		1000537426				Alvaro Londo		21775731			
Edwin Santos		1038810422									
Dimitri Fernando Uivas		1065913019									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CARRERA 39	S-E	S-N	Retiro de 10 líneas de 4 metros de cable 4x18 de controlador anterior				7:45		173		
CARR 38			Retiro de 4 metros de cable de acometido						173		
			Retiro de 4 metros de cable de tierra						173		
			Retiro de 4 metros de cable de comunicación						173		
			Suministro e instalación de 3 metros de cable 4x18 para el grupo # 1						215		
			Suministro e instalación de 3 metros de cable 4x18 para el grupo # 3						215		
			Instalación de 2 empalmes						94		
			Re-instalación de 10 líneas de 4 metros de cable 4x18 a controlador nuevo						215		
			Re-instalación de 4 metros de cable de acometido						215		
			Re-instalación de 4 metros de cable de tierra						215		
			Re-instalación de 4 metros de cable de comunicación						215		
			Retiro de controlador anterior					12:30			
EQUIPO EN OBRA:											
Plataformas, barras, Estiletes											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz				NOMBRE: Geny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA				FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

CARGO: Residente de Interventoría


   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	20 4 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502				NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
Franklin Barbosa		16741906					Jose Cortes		1098127131
Cristian Durazo							Jonathan Rendón		1036962270
Cristian Mena							Queen y Patricia		43068550
Jose Andrade									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 76 Cl 30			Se realiza cambio de cableado por falla				8:00		
			Se retira 267 metros de cable 4x18 de fuya (312-20-3-23)						173
			Se instala 288 metros de cable 4x18 de fuya (312-20-3-23)						215
			69-25+35						
			63-70+43						
			68-72+43						
			Total = 288						
			Se realiza 8 empalmes en semáforos peatonales y vehiculares					4:20	94
EQUIPO EN OBRA:									
Herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queen y Patricia Barreneche							
FIRMA	FIRMA	FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría							

[illegible]


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:	20 Abril 2026					
DIA:	Lunes.					
VEHÍCULOS:						
SECO	LLUVIOSO	DURACIÓN				
UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN				
SI	NO	SI				
NO	NO	NO				
ESCOMBROS	CUMPLE	ESCOMBROS				
SI	NO	SI				
NO	NO	NO				
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Van Carlos Usuga	A.214.729.941	Alvaro Londo	7777777			
José Pérez	PPT 5240.899					
Nelson Carvajal	A.035.861.703					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carretera 76x	N-W	E-W	Retiro de lámpara peatonal roja estática			195
calle 16			instalación de lámpara peatonal roja de			218
			segunda.			
			construcción de empalme eléctrico			94
Carretera 76x	N	E-W	Retiro de lámpara peatonal verde estática			195
calle 28			instalación de lámpara peatonal verde			218
			dinámica de segunda			
			construcción de empalme eléctrico.			94
Carretera 76 x	E	S-N	Retiro de lámpara peatonal verde estática			195
calle 32B			instalación de lámpara peatonal verde			218
Placucha SUR			dinámica de segunda			
			construcción de empalme.			94
EQUIPO EN OBRA:						
Cables, Arm., A.Mens.						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALizó		APROBO			
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA		FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1		
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	21 abril 2025	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN.	*	UNIFORMES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DÍA:	Martes					SI	SI	SI
VEHÍCULOS:						NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORIA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Juan José Rojas Siles	1000537976			Stiven Londoño	71225731			
Eduin Mantecón	1038810427							
Imeón Fernando Uivar	1065918019							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 4B	S-W	S-N	• Instalación de controlador (gabinete) nuevo			10:15	10:35	216-
CALLE 1B	SEPARADOR CENTRAL							
CARRERA 64 B	W-S	W-E	• Bragueda de caja					
CALLE 30			• Metro de 319 metros de cable 4x14 en rollo estado de los grupos vehiculares #2 y #3 y grupo peatonal #7			10:52am		173-
			• Suministro e instalación de 429 metros de cable 4x14 para los grupos vehiculares #2 y #3, y grupo peatonal #7					215-
			• Confección de 5 empalmes					94-
			(cable queda operativo)				6:30 pm	
EQUIPO EN OBRA:								
H. Mano								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA						
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ						
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA	FIRMA	FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría						

[illegible]

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	21 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Martes				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Carlos Mario González			Brayan		Jose cortes		1098727131		
Gerson Galeano			Aleider		Jonathan Rendón		1036962270		
Moises Reyes.		1002300713	Javier.		Alvaro Londoño		71775731		
					Queny Patricia		43068550		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carrera 47	N-E	N-S	Instalacion de 3 semaforos de piso			8 am		212	
Calle 52			Instalacion de fuente electrica					-	
			Suministro e instalacion de 3.5 mts coraza flexible						
			Se realiza canalizacion de 3 mts en zona dura "orden"						
			Suministro e instalacion de 20 mts cable 4x18					215	
			Construccion de 5 empalmes					94	
Carrera 47	N-W	N-S	Instalacion de 3 semaforos de piso					212	
Calle 52			Instalacion de fuente electrica					-	
			Suministro e instalacion de 3.5 mts coraza flexible						
			Se realiza canalizacion de 3 mts en zona dura "orden"						
			Suministro e instalacion de 20 mts cable 4x18					215	
			Construccion de 5 empalmes.				4:15 pm	94	
EQUIPO EN OBRA:									
Planta electrica, Pulidora, Martillo demoledor, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA						
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA	FIRMA		FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria						

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 20-11-04-2024	SECO	CUMPLE	CUMPLE
DIA: Lunes - 11/11/24	LLUVIOSO	SI	SI
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	NO	NO
TIEMPO	UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN	ESCOMBROS
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
WILLIAM CHAVEZ	98651777	JOSE CORTES	1098727137
LUIS JOTA MO	91452201	ALVARO LONDOÑO	71775737
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
K147- Calle 52	C.C	E-W	PINTURA EN POSTE DE INTERVENIENTOS SIN
			RESQUITO
	N-E	E-W	PINTURA EN POSTE DE MANUTENCIÓN SIN
			RESQUITO
	S-E	E-W	PINTURA EN POSTE DE MANUTENCIÓN SIN
			RESQUITO
	N-E	N-S	PINTURA EN POSTE DE INTERVENIENTOS SIN
			RESQUITO
	N-W	N-S	PINTURA EN POSTE DE INTERVENIENTOS SIN
			RESQUITO
	N-W	E-W	PINTURA EN POSTE DE INTERVENIENTOS SIN
			RESQUITO
EQUIPO EN OBRA:			
Escala, arcos, estinga, Kit Antiderrame			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

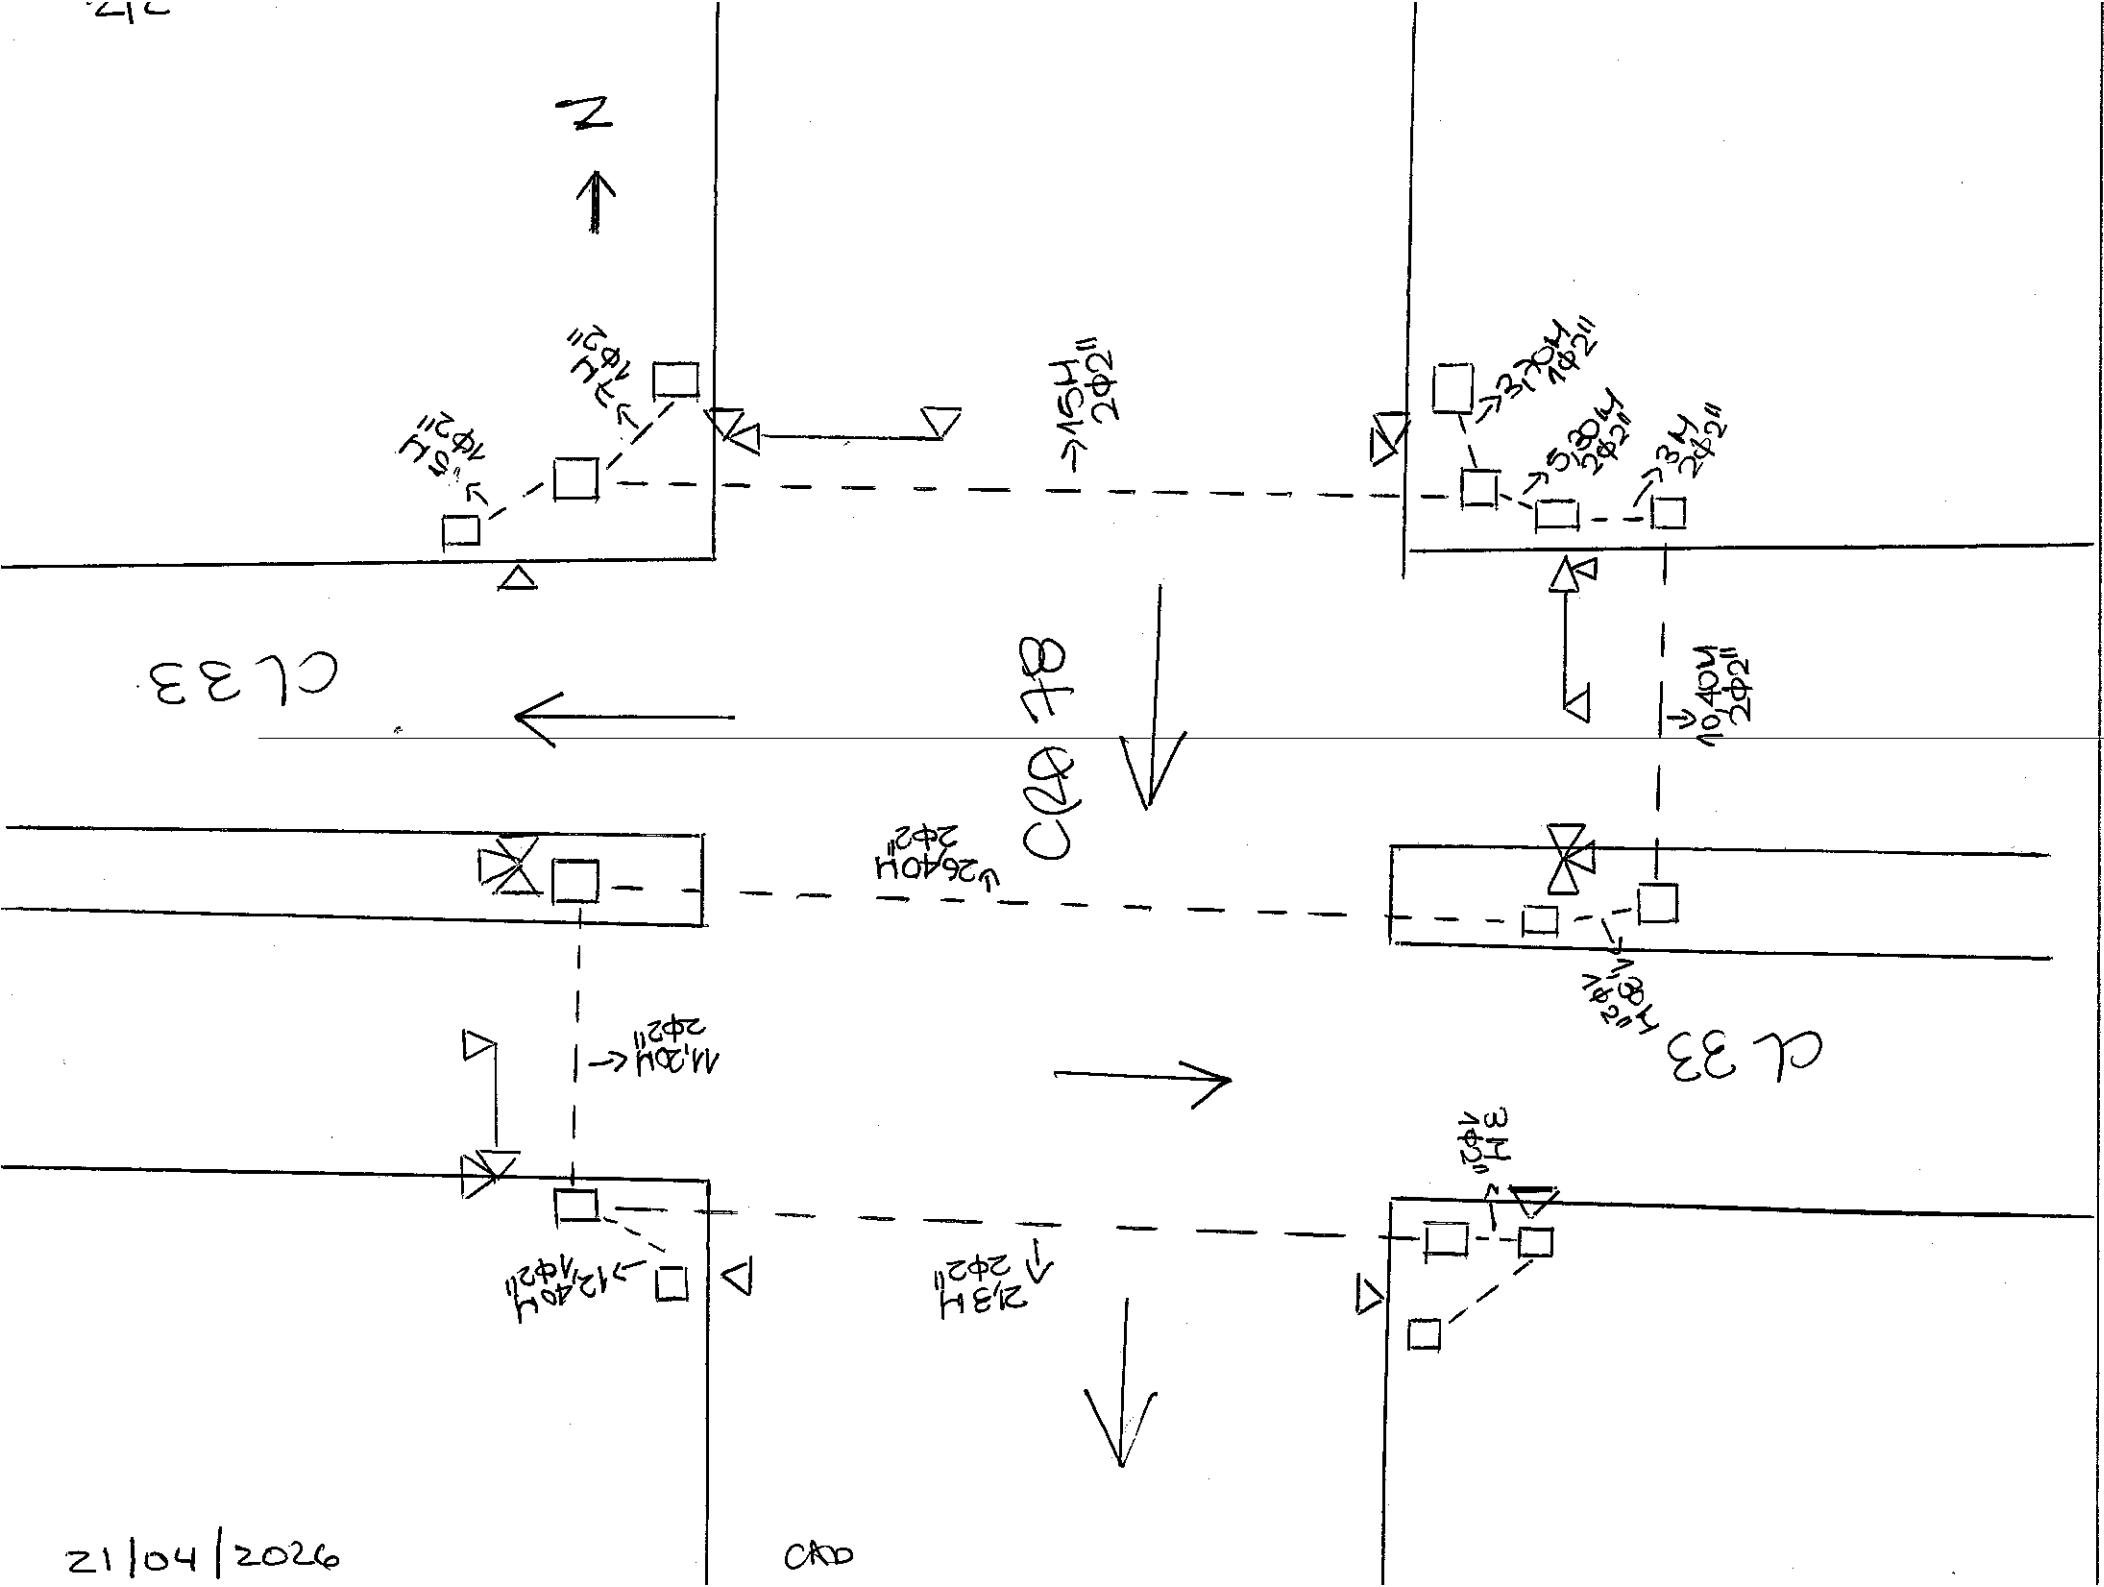
PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN												
FECHA:	21-04-2026		TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE			
DÍA:	Martes			LLUVIOSO	X		SI		NO		SI	NO	SI	NO
VEHÍCULOS:				DURACIÓN			NO				NO		NO	
PERSONAL EN OBRA														
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA								
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA				
Lewamarcia Padilla		1017221580						Jose Carlos		1098724131				
JHgar Ramirez		1015186405						Jonathan Rendon		1036962240				
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM				
* AV 80 CR 50ff		N-S	Lavado De poste Recto							230				
			Lavado De Semaforo Vehicular							234				
			Lavado De Disco DireccionaL							236				
* AV 80 CR 50ff	separ	N-S	Lavado de poste Recto							230				
			Lavado De Semaforo Vehicular							234				
			Lavado de Disco DireccionaL							236				
* AV 80 CR 125		S-N	Lavado De poste Recto							230				
			Lavado De Semaforo Vehicular							234				
			Lavado De Semaforo peatonal							231				
			Lavado De Disco DireccionaL							236				
			Reiro De Constraste							199				
* AV 80 CR 125		S-N	Lavado de poste Recto							230				
			Lavado de Semaforo (Vehicular) peatonal							231				
			Lavado											
EQUIPO EN OBRA:														
Arnes, estriaga, Escalera														
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA														
VERIFICACIÓN														
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ								
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche								
FIRMA: 			FIRMA: 			FIRMA: 								
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria								

[illegible]

[illegible]



21/04/2026

CRD



RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	14/02/2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	SABADO		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
JHONFREDDY LONDOÑO	71785749			Alonso Londoño A	71775731				
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 41 X CL 58			Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, 312 MTS. CR 41 x CL 58 a CR 43 X CL 58					122	
			Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica. 20 UNIDADES					125	
			Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica. 20 UNIDADES					123	
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 20 UNIDADES					126	
			Construcción Canalización en zona verde, con 1 tubo de 1 y 1/2 pulgadas. 1 metros					27	
			Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2". 4,5 metros					47	
			Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. 4 UNIDAD					262	
EQUIPO EN OBRA:									
Perros, H.Memo									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA: [Firma]	FIRMA: [Firma]	FIRMA: [Firma]							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría							



 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	16/02/2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	
DÍA:	LUNES		LLUVIOSO		SI		SI	
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
JHONFREY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731			
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927							
TRABAJOS REALIZADOS								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	
CARRERA 37 X CL 58	Pagado Abril		Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND				116	
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 37 X CL 58 A CR 39 X CL 58				117	
CARRERA 39 X CL 58			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND				116	
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 39 X CL 58 A CR 37 X CL 58				117	
CARRERA 41 X CL 58			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND				116	
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 41 X CL 58 A CR 43 X CL 58				117	
CARRERA 45 X CL 58	pagado mayo		Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND				116	
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 45 X CL 58 A CR 45 X CL 57				117	
CARRERA 45 X CL 58			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND				116	
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 45 X CL 58 A CR 41 X CL 58				117	
CARRERA 39 X CL 58			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND				116	
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 39 X CL 58 A CR 41 X CL 58				117	
CARRERA 41 X CL 58			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND				116	
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 41 X CL 58 A CR 39 X CL 58				117	
CARRERA 39 X CL 58			Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, 460 MTS. CR 39 x CL 58 a CR 41 X CL 58				122	
			Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica. 28 UNIDADES				125	
			Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica. 26 UNIDADES				123	
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 17 UNIDADES				124	
			Construcción Canalización en zona verde, con 1 tubo de 1 y 1/2 pulgadas. 2,5 metros				217	
			Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2". 4,5 metros				217	
EQUIPO EN OBRA:								
Fusiónadora, H. Mano								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría				

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSEJO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
CONSEJO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	27/03/2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Viernes		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
Luis Fernando G. A.		7.070.807.034				Alfonso Londo		7.777.777.777	
Santiago Zuma		7.000.533.792							
Leonar Riera		7.777.777.777							
Aks Cañ		7.036.651.089							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CRISTIANIZ	1000	N/S	Instalación de 450 mt de cable de fibra para la comunicación de los semáforos.			10:30		113	
CH 41			Instalación de 20 Placas de información de la señalización de fibra.				11:20	126	
EQUIPO EN OBRA:									
Rico H. Mesa									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ						
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA	FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría						

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
 CONSORCIO INT. EANH. MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	01/04/2026.	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X.	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles.					SI		SI		
VEHÍCULOS:	WLY 897.					NO		NO		
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Juan Camilo Restrepo		71293497				Alvaro Holguín		71775731		
Luis Elío Usuga.		71.703.197								
Jorge Rodríguez.		PPT 1.137.342								
TRABAJOS REALIZADOS										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CR 46 x CI 148.	E.	S-M.	retiro de soldadura x 02 und.						183	
			soldadura de Tapes x 02 und.						262	
			suministro e instalación 50m cable UTP.						110	
			retiro de Antena de comunicaciones.							
			suministro e instalación 02 Terminales RJ.							
			suministro e instalación POEF.							
			Instalación de Antena de comunicaciones.							
			Configuración de Antena de comunicaciones.							
CR 54 x CI 154.	W.	N-S.	retiro de 03 semáforos de mensula.							
			retiro de 02 mensulas completas.						OK	
			retiro de 02 discos direccionales.							
EQUIPO EN OBRA:										
Plataforma, Arroyo, H. Moreno										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ								
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Cely Patricia Barreneche								
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 								
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría								


 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1	
						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:		TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
DÍA:			LLUVIOSO		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
				Olivero Anderson	71215 270		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS		HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
K53 cl58			Programación e instalación MIKROTIK. SN: HG20ACAOWB3				133
			* Instalación 1 SFP.				132
K52 cl10			Programación e instalación MIKROTIK. SN: HK 40AZGWCH2				133
			Instalación 2 SFP. - DG25D4260365				132
			- DG25D42606367				
K51 cl10			Programación e instalación MIKROTIK. SN: HK 40AP8E3KC.				133
			Instalación 1 SFP - DG25D42606368				132
K5592			Programación e instalación MIKROTIK.				133
K51 cl92			* Instalación 2 SFP.				132
EQUIPO EN OBRA:							
Pc, tablet							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			


[illegible]


 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No: 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1								
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:			LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
TV SUP X 02S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK						133	
			SN: HKCOA GWZ226							
			INSTALACION SFP → DG25052440						132	
			DG2507212502							
4158			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK						133	
			SN: HK40A XP3A12P							
			INSTALACION SFP → DG25052400422						132	
			— DG25052400423							
3958			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK						133	
			SN: HK00A XBYVM3							
			INSTALACION SFP → DG25052400424						132	
			DG25052400425							
3758			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK						133	
			SN: HKCOA ZJ44NW							
			INSTALACION SFP → DG2507212503						132	
EQUIPO EN OBRA										
Portatí										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA 			FIRMA 			FIRMA 				
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:		TIEMPO	SECO
DÍA:			LLUVIOSO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
			SEÑALIZACIÓN
			ESCOMBROS
			CUMPLE
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
		Alvaro London	21225736
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
TU SUP X125			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN: HKCOA X73 H59
			INSTALACION SFP → DG 25D 426 06391
			DG 25D 426 06392
			DG 25D 426 06393
TU INF X015			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN: HGSOA CXSH XDI
			INSTALACION SFP → DG 25D7 212 25D1
			DG 25D5 2400 421
TU INF X065			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN: HGSOA DT5WH
			INSTALACION SFP → DG 25D5 2400 431
			DG 25D5 2400 432
TU INF X095			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN: HGSOA FE43AZB
			INSTALACION SFP → DG 25D5 2400 433
			DG 25D5 2400 434
Portatiz			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	


PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No: 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:							
DÍA:							
VEHÍCULOS:							
		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN SI NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
				Diego Lopez	21225738		
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
ISA			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKCOA YSFXDO INSTALACION SFP → DG25042606394				ITEM 133 132
TUSUPX01SUT			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA VTIWQ F INSTALACION SFP → DG25042606395- DG25042606396- DG25042606397-				133 132
290IS			PROGAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA HMAXAH INSTALACION SFP → DG25042606398 DG25042606399				133 132
TUSUPX03			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKCOA H22CZ INSTALACION SFP → DG25042606399				133 132
EQUIPO EN OBRA: Portatil							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Pueny Patricia Barreneche			
FIRMA: [Signature]		FIRMA: [Signature]		FIRMA: [Signature]			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria			



PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:		SECO	
DIA:		LLUVIOSO	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	
		UNIFORMES	
		CUMPLE	
		SEÑALIZACIÓN	
		CUMPLE	
		ESCOMBROS	
		CUMPLE	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
		Alonso Londoño	71775737
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
TV INF X 16AS			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN: HGSOA 85FQ7Q
			INSTALACION SFP → DG 2505 2400 435
			DG 2505 2400 436
SAN LUCAS			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN: HGSOA EABVCH
			INSTALACION SFP → DG 2505 2400 437
			DG 2505 2400 438
TV SUP X 20S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN: HGSOA BRAZHS
			INSTALACION SFP → DG 2505 2400 439
			DG 2505 2400 440
			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK
			SN:
			INSTALACION SFP →
EQUIPO EN OBRA:			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	


 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:		TIEMPO	SECO		CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
DÍA:			LLUVIOSO		SI	SI	ESCOMBROS
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO	NO	SI
							NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
				Alvaro Landa	71773771		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
K43 C133 ✓			Programación e instalación MIKROTİK/HG20AZB2D8T				133
			*instalación 1 SFP				132
K43A C134 ✓			Programación e instalación MIKROTİK/HG20A3T2J5X				133
			*instalación 2 SFP				132
K53 C193			Programación e instalación MIKROTİK/HG20AB75D6D				133
			*instalación 2 SFP				132
K55 C193			Programación e instalación MIKROTİK/HG20ABDHE3Y				133
			*instalación 3 SFP				132
K51B C192			Programación e instalación MIKROTİK/HG20A2HK3V9				133
			*instalación 2 SFP				132
K65 C194			Programación e instalación MIKROTİK/HG20A0HNTYH				133
			*instalación 1 SFP				132
EQUIPO EN OBRA:							
Portátil							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			


 Municipalidad de Medellín		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:			TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:				LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:				DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORIA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
								Alonso L. L. L.		31775237	
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
8180-44			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK							133	
			SN: HKCOARYHMB2								
			INSTALACION SFP -> DG25052400429							13.2	
			DG25052400430								
			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.								
			SN:								
			INSTALACION SFP ->								
			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.								
			SN:								
			INSTALACION SFP ->								
			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK								
			SN:								
			INSTALACION SFP ->								
EQUIPO EN OBRA											
P. ATIL											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							


 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
CONSORCIO INE EARG-MED 2025		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:						SI		SI		
VEHÍCULOS:						NO		NO		
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
						Hector Lombardi		71225771		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
8081 44			Adecuación de Controlador Local						250	
BORNEZAS			80	-	20	=	60	(80+3)-20		161
TOMAS CORRIENTE			2	-	2					
TERMOSTATO			1	-	1					
EXTRACTOR			1	-	1					
BREAKER MONOPOLAR 3A			1	-	2	=	2			
BREAKER			2	-	0	=	2			96
FLECHOS BORNEZAS			8	-	8					
CANA LETA			1.5	-	1.5					
TERMINALES CABLE			40	-	1	=	39			
CABLES			1.5	-	0	=	1.5			
TORNILLERÍA			1	-	0					
OTROS			1	-	0					
TRANSPORTE			1	-	0					
HERRAMIENTA			1	-	0					
INSTALACIONES CL			1	-	0					
BORNERA AUTOMATICA			3	-						161
EQUIPO EN OBRA:										
H. Mano 1										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					


PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:						SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
								Huan Lobato		21725321	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
4859			Adecuación de Controlador local							250	
BORNEZAS		32	(32-20)							161	
TOMAS CORRIENTE		2									
TERMOSTATO		1									
EXTRACTOR		1									
BREAKER MONOFASICO 3A		1									
BREAKER		2								96	
FRENOS BORNEZAS		5									
CANAleta		1.5									
TERMINALES CABLE		10									
CABLES		1.5									
TORNILLERIA		1									
OTROS		1									
TRANSPORTE		1									
HERRAMIENTA		1									
INSTALACIONES CL		1									
BORNERIA ACOMETIDA		3								161	
EQUIPO EN OBRA:											
H. Manu											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA: 			FIRMA: 			FIRMA: 					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					


 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
  		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:		TIEMPO		SECO		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE	
DÍA:		LLUVIOSO		UNIFORMES		SI		SI		ESCOMBROS	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN		NO		NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
								Alvaro Lugo		77777777	
DIRECCIÓN		COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
4759				Adecuación de controlador local						250	
BORNERAS				32 (32-20) + 3						161	
TOMAS CORRIENTE				2							
TERMOSTATO				1							
EXTRACTOR				1							
BREAKER MONODUO 3A				1						96	
BREAKER				2							
FLECHOS BORNERAS				5							
CANALETA				1.5							
TERMINALES CABLE				10							
CABLES				1.5							
TORNILLERIA				1							
OTROS				1							
TRANSPORTE				1							
HERRAMIENTA				1							
INSTALACIONES CL				1							
BORNERA ACOMETIDA				3						161	
EQUIPO EN OBRA:											
H. Menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							



 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
  		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
						Alvaro Lugo		71775227	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
4158 ST			Adecuación de Controlador Local					250	
BORNEZAS			(64-20)+3					161	
TOMAS CORRIENTE			2						
TERMOSTATO			1						
EXTRACTOR			1						
BREAKER MONOPOLAR 3A			1						
BREAKER			2					96	
FLENCOS BORNEZAS			7						
CANA LETA			1.5						
TERMINALES CABLE			10						
CABLES			1.5						
TORNILLERÍA			1						
OTROS			1						
TRANSPORTE			1						
MANEJO			1						
INSTALACIONES CL			1						
BORNERIA ACOMETIDA			3					161	
EQUIPO EN OBRA:									
H. Menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

<div> Alcaldía de Medellín Oficina del Registro de Obras</div> <div> UNION TEMPORAL SIT-MED-2025</div> <div> CONSORCIO INF. FAROL MED. 2025</div> <div> DAY</div>		PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001											
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025										VERSIÓN 1											
												ED: SEP 2025											
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																							
FECHA:				TIEMPO		SECO				UNIFORMES		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE		ESCOMBROS		CUMPLE			
DÍA:						LLUVIOSO						SI /				SI /				SI /			
VEHÍCULOS:						DURACIÓN						NO				NO				NO /			
PERSONAL EN OBRA																							
CONTRATISTA												INTERVENTORÍA											
NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA			
																Alvaro Londoño				31225731			
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS										HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM			
3958						Adecuación de Controlador Local														250			
BORNERAS						32 (32-20) + 3														161			
TOMAS CORRIENTE						2																	
TERMOSTATO						1																	
EXTRACTOR						1																	
BREAKER MONODIGAR 3A						1.																	
BREAKER						2.														96			
FIZENOS BORNERAS						5.																	
CANALITA						1.5																	
TERMINALES CABLE						10																	
CABLES						1.5																	
TORNILLERÍA						1																	
OTROS						1																	
TRANSPORTE						1																	
HIDRANTERÍA						1																	
INDICACIONES CL						1																	
BORNERA ACOHETIDA						3.														161			
EQUIPO EN OBRA:																							
A. Mens																							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA																							
VERIFICACIÓN																							
RESPONSABLE CONTRATISTA												RESPONSABLE INTERVENTORÍA											
ELABORÓ						REVISÓ/ACTUALIZÓ						APROBÓ											
NOMBRE: Maria Victoria Durango						NOMBRE: Carlos Alberto Diaz						NOMBRE: Queny Patricia Barreneche											
FIRMA 						FIRMA 						FIRMA 											
CARGO: Auxiliar de Residencia						CARGO: Residente de Obra						CARGO: Residente de Interventoría											

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:						SI			SI			SI	
VEHÍCULOS:						NO			NO			NO	
PERSONAL EN OBRA													
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA			
								Alvaro Vando		71775738			
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS						HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
3758			(DUHAREJO) Adequación de controlador								250 ✓		
BORNERAS			16										
TOMAS CORRIENTE			3										
TERMOSTATO			1										
EXTRACTOR			1										
BREAKER MONOPOLAR 3A			1										
BREAKER			2								96 ✓		
FRENOS BORNERAS			9										
CANA LETA			1.5										
TERMINALES CABLE			10										
CABLES			1.8										
TORNILLERÍA			1										
OTROS			1										
TRANSPORTE			1										
HERRAMIENTA			1										
INSTALACIONES CL			1										
BORNERA ACOMETIDA			3										
EQUIPO EN OBRA:													
H. Mano													
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA													
VERIFICACIÓN													
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA: 			FIRMA: 			FIRMA: 							
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría							

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
  		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI / NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI / NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI / NO
DÍA:									
VEHÍCULOS:									
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
					Alvaro Londo		71777731		
DIRECCIÓN		CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS		HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
701619				Adecuación de controlador local				250	
BORNERAS				64 (64-20) + 3				161	
TOMAS CORRIENTE				2					
TERMOSTATO				1					
EXTRACTOR				1					
BREAKER MONODIGAR 3A				1.					
BREAKER				2.				96	
FRENOS BORNERAS				7.					
CANALITA				1.5					
TERMINALES CABLE				10					
CABLES				1.5					
TORNILLERÍA				1.					
CABLES				1.					
TRANSPORTE				1.					
HERRAMIENTA				1.					
INSTALACIONES CL				1.					
BORNERA ADICIONADA				3.				161	
EQUIPO EN OBRA:									
H. Mano									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
FIRMA: 		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA: 		FIRMA: 			FIRMA: 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001								
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1								
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025								
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																
FECHA:			TIEMPO	SECO			UNIFORMES	CUMPLE			SEÑALIZACIÓN	CUMPLE			ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:				LLUVIOSO				SI				SI				SI		
VEHÍCULOS:				DURACIÓN				NO				NO				NO		
PERSONAL EN OBRA																		
CONTRATISTA										INTERVENTORÍA								
NOMBRE			CÉDULA		NOMBRE			CÉDULA		NOMBRE			CÉDULA					
										Alonso Londo			7777737					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS							HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM						
K70 d30A			Adecuación de Controlador Local									250						
BORNERAS			48 (48-20)+3									161						
TOMAS CORRIENTE			2															
TERMOSTATO			1															
EXTRACTOR			1															
BREAKER MONOPOLAR 3A			10															
BREAKER			20									96						
FIZENOS BORNERAS			7															
CANA LETA			15															
TERMINALES CABLE			10															
CABLES			15															
TORNILLERIA			1															
OTROS			1															
TRANSPORTE			1															
HERRAMIENTA			1															
INSTALACIONES CL			1															
BORNERA ACOMETIDA			3									161						
EQUIPO EN OBRA:																		
H. Muro																		
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																		
VERIFICACIÓN																		
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORIA												
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ			APROBÓ									
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche									
FIRMA: 			FIRMA: 			FIRMA: 			FIRMA: 									
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría			CARGO: Residente de Interventoría									


 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
DÍA:					SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
				Alvaro L. L.	71775737		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
CRD 24			Adecuación de Controlador Local				
BORNEZAS		16					250
TOMAS CORRIENTE		2					
TERMOSTATO		1					
EXTRACTOR		1					
BREAKER MONOPOLAR 3A		1					
BREAKER		2					96
FRENOS BORNEZAS		4					
CANA LETA		1.5					
TERMINALES CABLE		10					
CABLES		1.5					
TORNILLERÍA		1					
OTROS		1					
TRANSPORTE		1					
HERRAMIENTA		1					
INSTALACIONES CL		1					
BORNERIA ACOMETIDA		3					
EQUIPO EN OBRA:							
H. M. M.							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
 		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
						Alonso Londoño		71777731	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
K70 CHIV			Adecuación de Controlador Local					250	
BORNERAS			48 (48-202)+3					161	
TOMAS CORRIENTE			2						
TERMOSTATO			1						
EXTRACTOR			1						
BREAKER MONOPOLAR 3A			1						
BREAKER			2					96	
FUSIBLES BORNERAS			4						
CANA LETA			15						
TERMINALES CABLE			10						
CABLES			1.5						
TURNILLERIA			1						
OTROS			1						
TRANSPORTE			1						
HEIDRAHIENTA			1						
INSTALACIONES CL			1						
BORNERA ACOMETIDA			3					161	
EQUIPO EN OBRA:									
A. M...									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:				TIEMPO		SECO				CUMPLE	
DÍA:						LLUVIOSO				SI	
VEHÍCULOS:						DURACIÓN				NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
								Alonso Londono		21275731	
DIRECCIÓN		CÓSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	
K 700 dog						- Adecuación de Controlador Local				HORA FINAL	
BORNERAS				32		(32-20)+3				ITEM	
TOMAS CORRIENTE				2						250	
TERMOSTATOS				1						161	
EXTRACTOR				1							
BREAKER MONODOLAR 3A				1							
BREAKER				2							
FRENOS BORNERAS				5						96	
CANALETA				1.5							
TERMINALES CABLE				1.0							
CABLES				1.5							
TORNILLERÍA				1							
OTROS				1							
TRANSPORTE				1							
HERRAMIENTA				1							
INSTALACIONES CL				1							
BORNERA ACOMETIDA				3						161	
EQUIPO EN OBRA:											
H. Mano											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORIA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA: [Firma]			FIRMA: [Firma]			FIRMA: [Firma]					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1		
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No: 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:					SI	NO		SI	NO		SI	NO
VEHÍCULOS:					SI	NO		SI	NO		SI	NO
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		
								Alvaro Walsky		72775231		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
TU INF CLIBAS			(CLUB CAMPESTRE) Adecuación Controlador							250		
BORNERAS			32 (32-20)							161		
TOMAS CORRIENTE			2									
TERMOSTATO			1									
EXTRACTOR			1									
BREAKER MONOPOLAR 3A			1									
BREAKER			2							96		
FRENOS BORNERAS			5									
CANA LETA			1.5									
TERMINALES CABLE			10									
CABLES			1.5									
TORNILLERIA			1									
OTROS			1									
TRANSPORTE			1									
HEURAHIENTA			1									
INSTALACIONES CL			1									
BORNERA ADECUADA			3							161		
EQUIPO EN OBRA:												
H. M...												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORIA						
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA			FIRMA			FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría						

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1		
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No: 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:			TIEMPO	SECO			UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:				LLUVIOSO			SI	✓		SI	✓	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN			NO			NO		NO
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		
								Blasobando ro		71725731		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
AU80C146			Adecuación de controlador local							250		
BORNERAS			32 (32-20)+3							161		
TOMAS CORRIENTE			2									
TERMOSTATO			1									
EXTRACTOR			1									
BREAKER MONOPOLAR 3A			1									
BREAKER			2									
FLENCOS BORNERAS			5							96		
CANA LETA			1.5									
TERMINALES CABLE			10									
CABLES			1.5									
TORNILLERIA			1									
OTROS			1									
TRANSPORTE			1									
HERRAMIENTA			1									
INSTALACIONES CL			1									
BORNERA ACOMETA			3							161		
EQUIPO EN OBRA:												
H. M. 1												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Cely Patricia Barreneche						
FIRMA: 			FIRMA: 			FIRMA: 						
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría						

 		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001					
CONSORCIO INTEARGI MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOBROS	CUMPLE SI NO
DIA:									
VEHÍCULOS:									
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA						
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
				Alvaro Londoño	71278731				
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
AV 80 CLASG			Adecuación de Controlador Local					250-	
BORNERAS			32 (32-20) + 3					161-	
TOMAS CORRIENTE			2						
TERMOSTATO			1.						
EXTRACTOR			1.						
BREAKER MONODIGAR			1.						
BREAKER			2. 1					96-	
FLENCOS BORNERAS			5						
CANA LETA			1.5						
TERMINALES CABLE			1.0						
CABLES			1.5						
TORNILLERÍA			1.						
OTROS			1						
TRANSPORTE			1						
HERRAMIENTA			1						
INSTRUMENTOS CL			1.						
BORNERA ACOMETIDA			3					161-	
EQUIPO EN OBRA:									
H. Mano,									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA	FIRMA	FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría							



PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO								
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No: 4600105599 de 2025								
ED: SEP 2025								
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTÉNIMIENTYO OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:				SECO				
DÍA:				LLUVIOSO				
VEHÍCULOS:				DURACIÓN				
		TIEMPO		UNIFORMES		CUMPLE		
						SI / NO		
						SEÑALIZACIÓN		
						SI / NO		
						ESCOMBROS		
						SI / NO		
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		
				Alonso Londono		7775731		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
K 53 CIV			(DIAGNOSTICO ROSAS DINICA) Adecuación Controlador					250
BORNEZAS			32. (32-20)+3					161
TOMAS CORRIENTE			2.					
TERMOSTATO			1.					
EXTRACTOR			1.					
BREAKER MONOFASE 3A			1.					
BREAKER			2. 1					96.
FRENOS BORNEZAS			5					
CANAleta			1.5					
TERMINALES CABLE			10					
CABLES			1.5					
TURNILLERIA			1.					
OTROS			1.					
TRANSPORTE			1					
HERRAMIENTA			1.					
INSTALACIONES CL			1					
BORNERA ACOMETIDA			3.					161
EQUIPO EN OBRA:								
A.Menos								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA: [Firma]		FIRMA: [Firma]		FIRMA: [Firma]				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria				

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001															
CONSORCIO INEEROL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1															
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025															
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																			
FECHA:		DÍA:		VEHÍCULOS:		TIEMPO		SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE		ESCOMBROS		CUMPLE	
												SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
PERSONAL EN OBRA																					
CONTRATISTA											INTERVENTORÍA										
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE	
																Alcides Gordojo		7122522			
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRÁBAJOS REALIZADOS										HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM	
K43-45 c/58						MARIA AUXILIADORA) Adecuación de Controlador														250-	
BORNERAS				48		(48-20) + 3														161-	
TOMAS CORRIENTE				2																	
TERMOSTATO				1																	
EXTRACTOR				1																	
BREAKER MONODIAR 3A				1																	
BREAKER				2		1														96-	
PIZOS BORNERAS				7																	
CANALETA				1.5																	
TERMINALES CABLE				10																	
CABLES				1.5																	
TORNILLERIA				1																	
OTROS				1																	
TRANSPORTE				1																	
HERRAMIENTA				1																	
INSTALACIONES CL				1																	
BOMBERA ACOHETIDA				3																161-	
EQUIPO EN OBRA:																					
H Mms																					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																					
VERIFICACIÓN																					
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA										RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz										NOMBRE: Queny Patricia Barreneche									
FIRMA		FIRMA										FIRMA									
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra										CARGO: Residente de Interventoría									

  		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEDELLÍN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:		TIEMPO	SECO		CUMPLE		CUMPLE
DÍA:			LLUVIOSO		SI /	SEÑALIZACIÓN	SI /
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL
K 54 cl 53			Adecuación de controlador local				
BORNERAS			48 (48-20)				
TOMAS CORRIENTE			2				
TERMOSTATO			1				
EXTRACTOR			1				
BREAKER MONODIGAR 3A			1				
BREAKER			2				
FRENOS BORNERAS			7				
CANAleta			1.5				
TERMINALES CABLE			10				
CABLES			1.5				
TORNILLERIA			1				
OTROS			1				
TRANSPORTE			1				
HERRAMIENTA			1				
INSTALACIONES CL			1				
BORNERA ACOPLADA			3				
EQUIPO EN OBRA:							
H. Mano							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA		FIRMA		FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

  		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:		SECO		CUMPLE	
DÍA:		LLUVIOSO		CUMPLE	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN		CUMPLE	
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA
			Alvaro Londo		71775737
DIRECCIÓN					
COSTADO					
SENTIDO					
TRABAJOS REALIZADOS					
HORA INICIO					
HORA FINAL					
ITEM					
K53053					
BORNERAS					
32 (32+3)-20					
TOMAS CORRIENTE					
2					
TERMOSTATO					
1					
EXTRACTOR					
1					
BREAKER MONOFASICO 3A					
1					
BREAKER					
2					
PIZUENOS BORNERAS					
5					
CANALETA					
1.5					
TERMINALES CABLE					
10					
CABLES					
1.5					
TORNILLERIA					
1					
OTROS					
1					
TRANSPORTE					
1					
HERRAMIENTA					
1					
INSTALACIONES CL					
1					
BORNERA ALUMINADA					
3					
EQUIPO EN OBRA:					
H. Mano					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA		
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ		
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche		
FIRMA		FIRMA	FIRMA		
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría		

  		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:		TIEMPO	SECO		CUMPLE
DÍA:			LLUVIOSO		SI /
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Alfonso	91735737
TRABAJOS REALIZADOS					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL
K7005153			(U. SALAZAR HENRIETA) Adecuacion Controlador		
BORNERAS			• 64 (64-20)+3		
TOHAS CORRIENTE			• 2		
TERMOSTATO			• 1		
EXTRACTOR			• 1		
BREAKER MONOPOLAR 3A			• 1		
BREAKER			• 2		
FLEZOS BORNERAS			• 7		
CANA LETA			• 1.5		
TERMINALES CABLE			• 10		
CABLES			• 1.5		
TORNILLERIA			• 1		
OTROS			1		
TRANSPORTE			1		
HEURAHIENTA			1		
INSTALACIONES CL			1		
BOQUERA ACOHEIDA			3		
EQUIPO EN OBRA:					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Quely Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA	FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría			

 Alcalde de Medellín Municipalidad de Medellín		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
 CONSORCIO INT. EABOL MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:						SI		SI		
VEHÍCULOS:						NO		NO		
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA										
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		INTERVENTORÍA		
								Blanca London 71728771		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
K48 clot			DOLITECNOZ Adecuación de Controlador						250	
BORNERAS			→ 32 (32 - 20) + 3						161	
TOMAS CORRIENTE			→ 2							
TERMOSTATO			→ 1							
EXTRACTOR			→ 1							
BREAKER MONODIGAR 3A			→ 1							
BREAKER			→ 2							
FRENOS BORNERAS			→ 5						96	
CANAleta			→ 1.5							
TERMINALES CABLE			→ 10							
CABLES			→ 1.5							
TURNILLERIA			→ 1 KIT							
OTROS			1							
TRANSPORTE			1							
HERRAMIENTA			1							
INSTALACIONES CL			1							
BORNERA ACOMIDA			3						161	
EQUIPO EN OBRA:										
H. Mow										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA 		FIRMA 				FIRMA 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría				

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001																	
CONSORCIO INTECAROL MER 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1																	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025																	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																					
FECHA:		TIEMPO		SECO		UNIFORMES		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE		ESCOMBROS		CUMPLE							
DÍA:				LLUVIOSO		SI		NO		SI		NO		SI		NO							
VEHÍCULOS:				DURACIÓN																			
PERSONAL EN OBRA																							
CONTRATISTA																							
INTERVENTORÍA																							
NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA				NOMBRE				CÉDULA			
																Alonso Londoño				21775738			
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS						HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM							
481617						Adecuacion de controlador local										250							
BORNERAS						32 (32+3)-20										161							
TOMAS CORRIENTE						2																	
TERMOSTATO						1																	
EXTRACTOR						1																	
BREAKER 3A						1																	
BREAKER 6A						2										96							
FRENDA BORNERA						5																	
CAJALITA						1.5																	
TERMINALES CABLE						10																	
TORNILLERIA						1																	
CABLES						1																	
TRANSPORTE						1																	
HERRAMIENTAS						1																	
INSTALACIONES						1																	
BORNERA ACORRIADA						3																	
EQUIPO EN OBRA:																							
H.V. co																							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																							
VERIFICACIÓN																							
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORIA																	
ELABORÓ						REVISÓ/ACTUALIZÓ						APROBÓ											
NOMBRE: Maria Victoria Durango						NOMBRE: Carlos Alberto Díaz						NOMBRE: Queny Patricia Barreneche											
FIRMA 						FIRMA 						FIRMA 											
CARGO: Auxiliar de Residencia						CARGO: Residente de Obra						CARGO: Residente de Interventoría											

PERSONAL EN OBRA	
CONTRATISTA	

1. Memoria

NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	APROBO
FIRMA 	FIRMA 	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	FIRMA 
		CARGO: Residente de Interventoría

1/7

7

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	21-04-2026	TIEMPO	SECO
DÍA:	martes		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:	1 K1170		DURACIÓN
UNIFORMES		CUMPLE	SEÑALIZACIÓN
		SI	SI
		NO	NO
ESCOMBROS		CUMPLE	
		SI	
		NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Sandoz	1038806300	Jose Cortes	1098727137
Santiago Mena	1000533772		
Leonar Rivera	PPT 4320715		
Alex Carro	1036651087		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* CRSI CL38-39			Sondeo y levantamiento
			Nota: Se realizó el sondeo con pieza de
			fibra pero no fue posible la apertura de
			cámara telefónica la cual está vendida
			por haber programar con personal de tiro
			que para la reposición de fibra de cámara
			en la vía para mayor ubicación ver detalle en
			planos y fotos CRSI CL38 costado N-W.
			en la vía para Verificación
* CRSI CL39-40			Sondeo y levantamiento
			Instalación de 150mts de cable de segunda
* CRSI CL40-41			Sondeo y levantamiento
			Instalación de 192mts de cable de segunda
EQUIPO EN OBRA:			
Pisca, Herramienta Menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

217

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN CONCEJO LOCAL DE MEDICINA UNIÓN TEMPORAL SIT MEDICINA	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025


NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA:	21-04-2025	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Mar 15				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	IRU 241				NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
Cesar Santos	1038906300			Jose Cortes	1098727131		
Santiago Mena	100053792						
Leonar Pulgar	PPT 437075						
Alex Cortes	1036651089						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
* CR52C138			Sondeo y levantamiento			237	
CR51C138			instalación de 75mts de cablea de segunda				
* CR52C138	NW		Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tope de 50x50. motivo para poder realizar el sondeo			183	
			se le aplican puntos de soldadura a 1 tope de 50x50				
	NE		Retiro de 8 cordones de soldadura a 2 tope de 50x50. motivo para poder realizar el sondeo			183	
			se le aplican puntos de soldadura a 2 tope de 50x50				
* CR51C138	NW		Retiro de 4 cordones a 1 tope de 50x50			183	
			se le aplican puntos de soldadura a 1 tope de 50x50				

EQUIPO EN OBRA:	Pesca, equipo soldador, planta eléctrica, pulidora, herramienta menor
-----------------	---

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA	
--------------------------------	--

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	21-04-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Mar Jue				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	1 K N 741				NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
CESAR DURANGO		1038806300				JOSE CORTES		1098727131	
Santiago Mena		1000533792							
Leonar Rivero		PTA370715							
Alex Cortes		1036651089							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CR52CL39	N-E	E-W	Semáforo Peatonal grupo 13 apagador motor cortado.						
			Construcción de 1 empalme eléctrico en semáforo Peatonal.					94	
			Se realizó medición con multímetro en controlador local y continúa el corte en el mismo grupo.						
	S-E	E-W	Revisión de semáforo Peatonal se localiza el corte en cara de semáforo Peatonal.						
			Se encanta el corte al cara de semáforo Peatonal. el empalme eléctrico no continúa con concreto de resorte.						
			Construcción de 1 empalme eléctrico en semáforo Peatonal.					94	
			Se pone en funcionamiento el grupo peatonal del grupo 13.						
EQUIPO EN OBRA:									
Herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ							
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA	FIRMA	FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría							



CL 41

CL 40

2 ϕ 3"
12m

NO

1 ϕ 3"
9m

control
3 ϕ 2" 1m

6 ϕ 3"
27m

CR 51

6 ϕ 3"
4m




6 ϕ 3"
11m



6 ϕ 3" 117m





6φ3"
38m

CR51

CL40



CL40

6φ3"
99m



CL39

CR51

CRSL


6 ϕ 3"

6 ϕ 3" 92m

→ camera telefonica
con problemas de
apertura esta vendida

102"
8m


CL39



CL38

CL37

ORTA

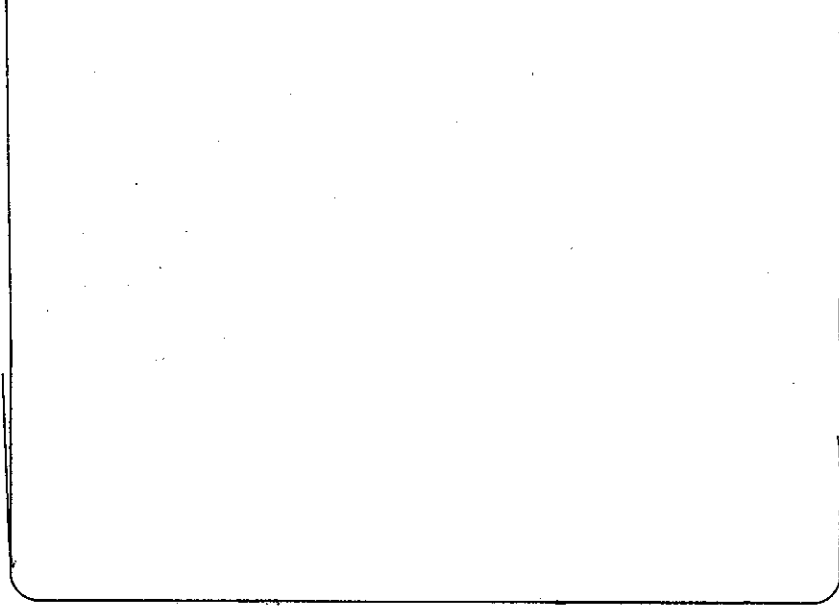


understand
no other

→ to go

102"
8m

CR51




CL38

102"
4.1m

102"
8m


202"
16m

CR52




302"
1m

CR

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
CONSORCIO INT. EARCIL MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA: 22 ABRIL 2026		TIEMPO		SECO		CUMPLE	
DÍA:				LLUVIOSO		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO	
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Yvan Jairo Ruiz Alvarado		1000837976		LINDY MORALES		1017180733	
Edwin Santos		1038810427					
Simón Fernando Vivar		1065913019					
TRABAJOS REALIZADOS							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
CALLE 52	N - E	N - S	Se llega al punto por cable en corto en grupo vehicular # 3			8:00 am	
CALLE 2 SUR	SEPARADOR		Retiro de 20 metros de cable 4x18 en mal estado de semáforo vehicular de cuatro aspectos				193
			Suministro e instalación de 101 metros de cable 4x18				215
			Construcción de empalme en recámara				94
			Construcción de empalme en semáforo vehicular de cuatro aspectos				94
						4:30 pm	
EQUIPO EN OBRA:							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
SUSPENDER ACTIVIDAD HASTA QUE SE TOMEN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ESPACIOS CONFINADOS Y ALTURAS, SE ENCONTRO PERSONAL EN ESPACIO CONFINADO SIN NINGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD. 10:30 am							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 22-04-2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO
DÍA: miércoles									
VEHÍCULOS: MTN 507									
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Franklin Barbosa		16791900	Tenifer Altamiranda	1052982270	Jose Cortes		1098721131		
Cristian Barbosa		1.131.966.783	Lina Prado	32226126					
Cristian Menga		1076.817.116							
Jose andrade		11.222.857							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
8 1.76 x 1.29			Se realiza cambio de cableado por falla del grupo (S-15-14)			8:00			
			Se instala 490 metros de cable 4X18 del grupo (S-15-14)					173	
			Se instala 586 metros de cable 4X18 del grupo (S-15-14)					215	
			Se reparan 7 empalmes a sonajeros vehiculares y peatonales					94	
			Se soldan 10 canchales de peso					262	
			65-180						
			615-200						
			614-200						
			Total = 5800				5:00		
EQUIPO EN OBRA:									
Pesca, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA		FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría					



PLAN DE CALIDAD

SIT-SGC-F-001

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

VERSIÓN 1

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025

ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22 ABRIL	TIEMPO	SECO		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
DÍA:	MIÉRCOLES		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Javier Nieves				Jorge Cortes	1098727131
Alcides Riasco					
Steven Palacio					
Bryan Palacio					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CIRA 47 CII 52	ORN	OR-OC	Instalación 1 Semáforo PISO			212-
			Suministro e instalación 5.10 de Coraza flexible			
			Canalización en zona dura 5.70			
			Suministro e instalación de 6.70 cable 4x18			215-
			Construcción 3 Empalmes			94-
		OR-OC	Instalación 1 Semáforo PISO			212-
			Suministro e instalación 2.30 Coraza flexible			
			Canalización en zona dura 2.30			
			Suministro e instalación de 3.80 cable 4x18			215-
			Construcción 3 Empalmes			94-
			Instalación 1 Semáforo PISO			212-
			Suministro e instalación 4.Mts Coraza flexible			
			Canalización en zona dura 4 Mts			
			Suministro e instalación de cable 5.50 cable 4x18			215-
			Construcción 3 Empalmes			94-

EQUIPO EN OBRA:


Cortadora, Planta eléctrica, Pulidora, herramienta menor, martillo demolidor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA


VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

[illegible]

 Alcaldía de Medellín		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
 CONSORCIO METROPOLITANO DE MEDELLÍN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
 CONSORCIO METROPOLITANO DE MEDELLÍN		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	22/04/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO			SI		✓		SI	✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO				NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Carlos Gonzalez						Alvaro Lombria		7777737			
Yeison Galeano											
Moses Reyes		1002500113									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Carrera 47 Calle 52	W-N	E-W	Instalacion de 2 semaforos de piso				8 am		212		
			Instalacion de fuente electrica						-		
			Suministro e instalacion de 1 mts coraza flexible								
			Suministro e instalacion de 6 mts cable 4x18						215		
			Construccion de 4 empalmes						94		
			Demolicion de tapa concreteada 50x50						1		
			Limpieza de caja 50x50						54		
			Concreteada de caja 50x50.						263		
	W-S	E-W	Instalacion de 1 semaforo de piso						212		
			Instalacion de 1 fuente electrica						-		
			Suministro e instalacion 40 cm de coraza flexible								
			Suministro e instalacion de 1 mts cable 4x18						215		
			Construccion de 3 empalmes						94		
			Demolicion de tapa 50x50						1		
			Concreteada de tapa 50x50						263		
EQUIPO EN OBRA:											
Densolab, Pulidora, Planto, Herramienta Mano											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
Favor limpiar Puente											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							

CR 51



6ø 3"
60m

6ø 3"
5m

3ø 3" 46m


3ø 3" 65m

CR 52

CL 40

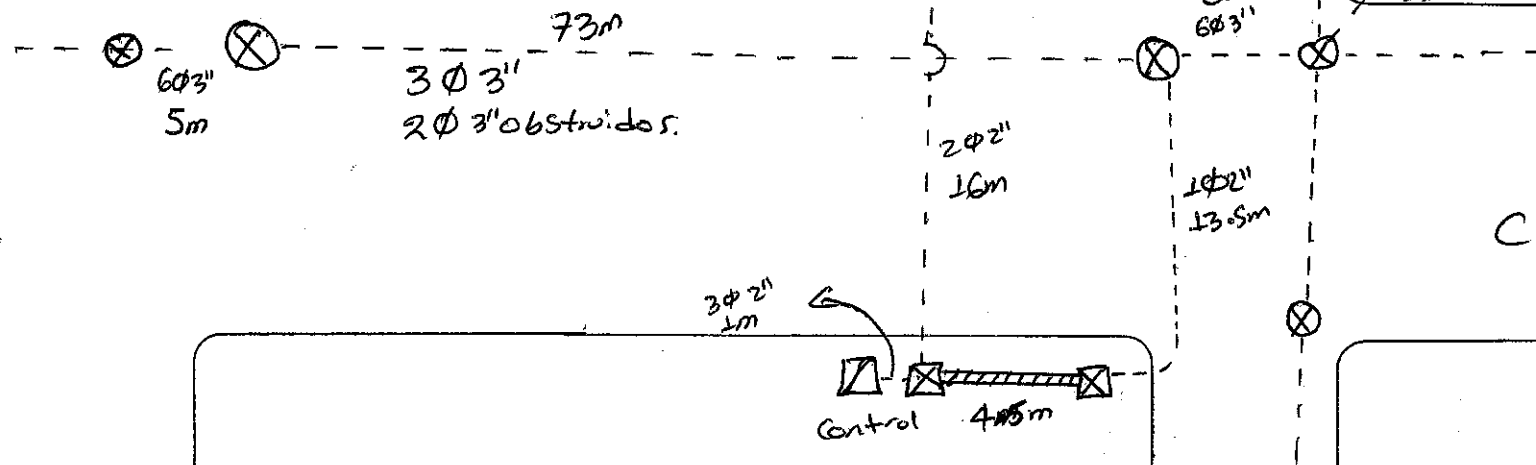
CL 39

ab




CL39

CL38



PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 23 Abril 2026 DÍA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN:	UNIFORMES CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE Juan José Alonso Silva Edwin Santos	CÉDULA 1000537926 1038810427	NOMBRE Jose Carlos Jonathan Rueda	CÉDULA 1090727131 1036962770
DIRECCIÓN * CARRETA 48-CAJUE 16	COSTADO W - N	SENTIDO W - E	TRABAJOS REALIZADOS • Re-encatamiento de semáforo vehicular
			HORA INICIO 9:40 HORA FINAL 9:50 ITEM 258-
CARRETA 66 B CAJUE 34 B	S - E	S - N	• Retiro de pulsador mal instalado (Desajustado) • Perforación en poste • Puesta con machuelo • Re-instalación de pulsador
			HORA INICIO 11:03 am HORA FINAL ITEM 177-
CARRETA 66 B CAJUE 34 B	S - W SEPARA POR	S - N	• Retiro de pulsador desajustado • Perforación en poste • Puesta con machuelo • Re-instalación de pulsador
			HORA INICIO HORA FINAL ITEM 214-
	S - E	S - N	• Retiro de pulsador desajustado • Perforación en poste • Puesta con machuelo • Re-instalación de pulsador
			HORA INICIO HORA FINAL ITEM 177-
			HORA INICIO HORA FINAL ITEM 214-
EQUIPO EN OBRA: Mantiendo menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA Se verificó señalización y GPP, se pte. por favor revisar la placa perforada ubicada en el lado N-S los todos occidentales			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ NOMBRE: Maria Victoria Durango FIRMA: <i>MV Durango</i> CARGO: Auxiliar de Residencia	REVISÓ/ACTUALIZÓ NOMBRE: Carlos Alberto Díaz FIRMA: <i>CD</i> CARGO: Residente de Obra	APROBÓ NOMBRE: Queny Patricia Barreneche FIRMA: <i>QPB</i> CARGO: Residente de Interventoría	



 Alcalde de Medellín Gobernador de Medellín		 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
 CONSORCIO INT. FABOL MED. 2025		 RAY		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	23 Abo 2026	TIEMPO	SECO	*	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Juan José Rop Silvo		1000537976				Jose Cortes		1098727131		
Edwin Santos		1038810421								
TRABAJOS REALIZADOS										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 66 B	S - E	S - W	• Perforación en poste							
CALLE 34 B	SEMPERADOR		• Punteo con machete							
			• Re-instalación de 2 líneas de tres metros de cable 4x18						215-	
			(se encontraban en caja)							
			• Suministro e instalación de pulsador (nuevo)						218-	
CARRERA 66 B	S - W	S - N	• Retiro de pulsador desajustado						177-	
CALLE 34 B	SEMPERADOR		• Perforación en poste							
			• Punteo con machete							
			• Re-instalación de pulsador						214-	
CARRERA 66 B	N - E	N - S	• Retiro de pulsador desajustado						177-	
CALLE 34 B	SEMPERADOR		• Perforación en poste							
			• Punteo con machete							
			• Re-instalación de pulsador						214-	
EQUIPO EN OBRA:										
Taladro, herramienta menor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA			FIRMA				FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría			


 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	23 04 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	CW 3 189		DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Franklin Barbosa		16791906				Jose Cortes		1098727131		
Jose Andrade		11222587								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Cr 70 Cl 30	E	NS	Enderezada de Semáforo Peatonal y Cierre de compuertas de modulo.			11am		258-260		
Cr 66B CC 30			Suministro e Instalacion de Sonorizador					72-94-215		
			CONSTRUCCION de Empalme 1 metro de cable 4x18					72-94-215		
			Serial: 20250017					72-94-215		
			Suministro e Instalacion de Sonorizador					72-94-215		
			CONSTRUCCION de Empalme 1 metro de cable 4x18					72-94-215		
			Serial: 20250035					72-94-215		
			Suministro e Instalacion de Sonorizador					72-94-215		
			CONSTRUCCION de Empalme 1 metro de cable 4x18					72-94-215		
			Serial: 20250022					72-94-215		
			Suministro e Instalacion de Sonorizador 4x18					72-94-215		
			CONSTRUCCION de Empalme 1 metro de cable 4x18					72-94-215		
			Serial: 20250024				05pm	72-94-215		
EQUIPO EN OBRA:										
Herramienta menor, escalera										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ								
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche								
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 								
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría								

[illegible]

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 23 Abril 2026 DÍA: Jueves. VEHÍCULOS:	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE Carlos Gonzalez Yerson Galeano Moises Reyes	CÉDULA 1002500113	NOMBRE Jose Cortes Jonathan Rendon Alvaro Londoño	CÉDULA 109872131 103696270 11775731
DIRECCIÓN Carrera 47 Calle 52	COSTADO S-W	SENTIDO N-S	TRABAJO REALIZADO Instalacion de 1 semaforo de piso Instalacion de fuente electrica Suministro e instalacion de 7 mts coraza flexible Suministro e instalacion de 8 mts cable 4x18 Construcción de 3 empalmes Se realiza canalizacion de 3 mts en zona dura Devoldada de tapa 50x50 y cordones de 10 cm Soldada de tapa 50x50 y cordones 15 cm Instalacion de 1 semaforo de piso Instalacion de fuente electrica Suministro e instalacion de 4 mts coraza flexible Suministro e instalacion de 5 mts cable 4x18 Se realiza canalizacion de 3 mts en zona dura Construcción de 3 empalmes Soldada de camara (tapa de camara)
			HORA INICIO 8 am
			HORA FINAL
			ITEM 212 - 215 94 183 262 212 215 94 262
EQUIPO EN OBRA: Planta electrica, pulidora, Martillo demoledor, herramienta menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ NOMBRE: María Victoria Durango FIRMA CARGO: Auxiliar de Residencia	REVISÓ/ACTUALIZÓ NOMBRE: Carlos Alberto Diaz FIRMA CARGO: Residente de Obra	APROBÓ NOMBRE: Queny Patricia Barreneche FIRMA CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1			
						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	23 ABRIL	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
Ricardo Risco				Jose cortes	2098727131				
Javier nieves									
Stiven Palacio									
Bryan Palacio									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Km 46 CHS3	S-E	S-N	Instalación de 4 semáforos de piso			8 am		212-	
			Construcción de 8 empalmes					94-	
			Canalización en zona dura 3.70					-	
			Suministro e instalación de 2 corazas de 3.90					-	
			Suministro e instalación de cable					-	
			2 de 7.20 cable 4x18					215-	
			2 de 5.70 cable 4x18					215-	
			Instalación de 2 puentes				5 pm	-	
EQUIPO EN OBRA:									
Pulidora, planta eléctrica, martillo demolidor, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA	FIRMA		FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría						


		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001							
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1							
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025							
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN													
FECHA:	23-04-26		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	Jueves						SI		X		SI		SI
VEHÍCULOS:							NO				NO		NO
PERSONAL EN OBRA													
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA									
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA					
Laura Marcela Padilla		Grado 101720586				Jose coffer		1098727131					
Jhojan Ramirez		1015186405				Jonathan Rendon		1036962270					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM				
X AV 80 CLI 1		N-S	Lavado de poste Recto				8:30		230				
			Lavado de Semafaro Vehicular						234				
			Lavado de Semafaro Peatonal						231				
			Lavado de Disco Direccional						236				
X AV 80 CLI 1		N-S	Lavado de poste Recto						230				
			Lavado de Semafaro Vehicular						234				
			Lavado de Semafaro Peatonal						231				
			Lavado de Semafaro Peatonal						231				
			Lavado de Disco Direccional						236				
X AV 80 CLI 1		N-S	Lavado de poste Recto						230				
			Lavado de Semafaro Vehicular						234				
			Lavado de Disco Direccional						236				
			Retiro de Contraste						199				
			Lavado de Semafaro Vehicular				11:20		234				
			Lavado de Semafaro Peatonal						231				
			Lavado de poste Recto						230				
EQUIPO EN OBRA:													
Arnes, eslinga, escalera													
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA													
VERIFICACIÓN													
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ									
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche									
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 									
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría									

   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001						
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1.						
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025						
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN												
FECHA:	23-04-2026		TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Jueves			LLUVIOSO			SI		X		SI	X
VEHÍCULOS:				DURACIÓN			NO		NO		NO	NO
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA								
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA				
Luisa María Padilla G		1013221380				Jode Cortes		1090727131				
Jhojan Ramirez		105186405										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
			Lavado De Disco Direccional							236		
			Retiro De Constraste							199		
		N-5	Lavado De Poste Recto							230		
			Lavado De Semáforo Vehicular							234		
			Lavado De Semáforo Peatonal							231		
			Retiro De Constraste							199		
			Lavado De Disco Direccional							236		
EQUIPO EN OBRA:												
Artes, estinga, escalera												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA										
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ						
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA				FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría						

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	23 Abril 2026	SECO	CUMPLE
DIA:	Jueves	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
UNIFORMES			
SEÑALIZACIÓN			
ESCOMBROS			
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Van Carlos Usuga	1.214.729.941	José Alfaro	1098721131
Leonar Rivera	PPT 4.350.715		
Jorge Rodríguez	PPT 1.137.342		
Alex Casas	1036.651.034		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
* Carretera 52x	N-W	S-N	Construcción de Canalización en adoquín
calle 38			Con 2 tubos pvc 2" 4,5 metros.
Carretera 45			Revisión de acometida en cruce semafórico
Entre calles			Construcción de empalme eléctrico en la
55 y 56			acometida.
* Carretera 55x			* Revisión de semáforos peatonales apagados
calle 30A			Retiro de 10 metros de cable de control 4x18
			instalación de 10 metros de cable de
			control (translación)
			Construcción de empalme eléctrico
* Carretera 43x	S	E-W	instalación de disco direccional nuevo
calle 33			
*NOTA: En la 55x30A la Canalización donde se encuentra el cable semafórico sufrió daños a causa de una obra externa, se debe reparar dicha Canalización			
EQUIPO EN OBRA:			
Herramienta menor, Pesca, escalera			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

1/2

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 23.04.2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DÍA: JUEVES		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
			CUMPLE
			SI
			NO
			ESCOMBROS
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Antonio	71480675	José Cortes	1098727131
Alberto Oquendo	15.485.477		
Santiago Mora	1000.533.792		
José Pérez	PPT 5240.594		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Carrera 48x or		Sur	Retiro de 1 semáforo de manzula, retiro de 1
Calle 7 sur			semáforo vehicular, retiro de 1 semáforo peatonal
EAFIT			retiro de 1 disco direccional, retiro de 19 mts
			de cable de control 4x16, retiro de 1 brazo de
			manzula, retiro de 1 poste de manzula
			lavado de 1 semáforo de manzula, lavado de 1
			semáforo vehicular de poste, lavado de 1 semáforo
			peatonal, lavado de 1 disco direccional
			Retiro de señal informativa a mensula
			instalación de 1 poste de manzula nuevo
			instalación de 1 brazo de manzula nuevos estructura
			de 5.50 mts, instalación de 1 semáforo vehicular de
			manzula de 2da lavado, instalación de 1 semáforo
			vehicular de poste de 2da lavado, instalación de 1
			semáforo peatonal de 2da lavado, instalación de 1
			disco direccional lavado, instalación de 19 x
			metros de cable 4x16, se hicieron 3 empalmes
			eléctricos
			HORA INICIO 9:20
			HORA FINAL 14:26
			ITEM 170
			172
			179-173
			166
			234
			231-236
			180
			203
			207
			208
			208
			220
			215-94
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	



 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
 		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	23.04.2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	VIERNES		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
JUAN C. FORTES		71480675					JOSE CORTES		109872713
ALBERTO LEON		15.485.477							
SANTIAGO MENA		1.000.533.792							
JOSE		PPT 5.240.599							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CCA 4877D	OC	SUR.	SEÑALIZACION DE 1 SEMAFORO VEHICULAR MALO (REVENTADO)			14:20		170	
Paseo Segio			lavado de 1 semaforo vehicular a maza					234	
Politecnico			instalacion de 1 semaforo vehicular a maza de					207	
			2da lavado, se hizo 1 empalme electrico				15:15	94	
EQUIPO EN OBRA:									
Plataforma									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA	FIRMA	FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria							

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	24-04-2026	TIEMPO	SECO
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN
			SI
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	SEÑALIZACIÓN
		NO	CUMPLE
			ESCOMBROS
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427	Jose Cortes	1098727137
cristian mosquera			
john			
DIRECCIÓN	CÓSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
CRV 79 X C1150	S-W	S-N	cambio de pulsadores touchless a poste
			retiro de 7 pulsador touchless a poste
			perforación en poste con taladro y machuelos
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste
	S-E	S-N	retiro de 7 pulsador touchless a poste
			perforación en poste con taladro y machuelos
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste
	SSP 79 X E-W	E-W	retiro de 7 pulsador touchless a poste
			perforación en poste con taladro y machuelos
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste
	N-E	E-W	retiro de 7 pulsador touchless a poste
			perforación en poste con taladro y machuelos
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste
EQUIPO EN OBRA:			
Taladro, herramienta menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	24 04 2025		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO	
DIA:	VIERNES										
VEHÍCULOS:	CWB 189										
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Frentelin Bellos		16791906				Jose Cortes		1098727131			
Jose Andrade		11222587									
Laura Padilla											
TRABAJOS REALIZADOS											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Cr 45 Cl 73			Suministro Instalacion de Sonorizador Construccion de Empedre 1 metro de cableado 4x18 Serial: 20250018				07 00		72 94-215		
			Suministro Instalacion de Sonorizador Construccion de Empedre 1 metro de cableado 4x18 Serial: 20251024						72 94-215		
EQUIPO EN OBRA:											
Herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ									
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche									
FIRMA	FIRMA	FIRMA									
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría									

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		24 Abril 2026									
DIA:		Viernes.									
VEHÍCULOS:											
TIEMPO				SECO		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE	
				LLUVIOSO		SI		SI		ESCOMBROS	
				DURACIÓN		NO		NO		SI	
						UNIFORMES				NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Moses Reyes		1002500713						Quen y Patricia		43068550	
Carlos González								Jose David C.		1098727137	
Yerson Galeano											
DIRECCIÓN		COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carrera 46		S-E	S-N	Instalacion de 2 semáforos de piso				9 am		212-	
calle 53				Instalacion de frente electrica						-	
				Suministro e instalacion de 1.50 mts coraza flexible						-	
				Suministro e instalacion de 7 mts cable 4x18						215-	
				Se realiza canalizacion de 1.50 mts en adoguin xoxo						94-	
				construccion de 4 empalmes						262-	
				se realizan 3 cordones soldadura de 8 cm						212-	
		E-S	E-W	Instalacion de 1 semáforo de piso						-	
				Instalacion de 1 frente electrica						-	
				Suministro e instalacion de 1mts coraza flexible						215-	
				Suministro e instalacion de 3mts cable 4x18						94-	
				Se realiza canalizacion de 80 cm en adoguin xoxo						4:30pm	
				Construccion de 3 empalmes							
				(queda pendiente instalacion de frente)							
EQUIPO EN OBRA:											
Planta electrica, Pulidora, Martillo de molidor, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Quen y Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria							

<div><div>Alcaldía de Medellín</div><div>CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025</div><div><div>UNION TEMPORAL</div><div>SIT MEDELLÍN</div></div></div>		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001																							
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1																							
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025																							
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																													
FECHA: 24 Abril		DIA: viernes		VEHÍCULOS:		TIEMPO		SECO		LLUVIOSO		DURACIÓN		UNIFORMES		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE		ESCOMBROS		CUMPLE					
PERSONAL EN OBRA																													
CONTRATISTA													INTERVENTORÍA																
NOMBRE			CÉDULA			NOMBRE			CÉDULA			NOMBRE			CÉDULA			NOMBRE			CÉDULA			NOMBRE			CÉDULA		
Bryan Palacio																		Jose Cortes			1098727191								
Steven Palacio																													
Javier Nieves																													
Ricardo Riosco																													
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS										HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM									
Cia 46 C1153		S-E		N-S		Instalación de 4 semáforos de Piso										8 AM				212									
						Construcción de 8 empalmes														94									
						Canalización en zanja dura 1m														-									
						Suministro e instalación de Coraza 1m 20cm														-									
						Suministro e instalación de cable														-									
						1 de 6m cable 4x18														215									
						1 de 4m cable 4x18														215									
						1 de 2.80 cable 4x18														215									
						1 de 3.50 cable 4x18										5 PM				215									
						Instalación de 1 fuente														-									
EQUIPO EN OBRA:																													
Pulidora, Planta eléctrica, cortadora, martillo demolidor, herramienta menor																													
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																													
VERIFICACIÓN																													
RESPONSABLE CONTRATISTA													RESPONSABLE INTERVENTORÍA																
ELABORÓ						REVISÓ/ACTUALIZÓ							APROBÓ																
NOMBRE: Maria Victoria Durango						NOMBRE: Carlos Alberto Diaz							NOMBRE: Queny Patricia Barreneche																
FIRMA: [Firma]						FIRMA: [Firma]							FIRMA: [Firma]																
CARGO: Auxiliar de Residencia						CARGO: Residente de Obra							CARGO: Residente de Interventoría																

   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001																	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1													
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025													
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																							
FECHA: 24/4/26		DÍA: Viernes		VEHÍCULOS: DX7928		TIEMPO		SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES		CUMPLE SI NO		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE SI NO		ESCOMBROS		CUMPLE SI NO			
PERSONAL EN OBRA																							
CONTRATISTA										INTERVENTORÍA													
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Christian Barbosa		1.151.966.785														Jose Cortes		1098727131					
Simón Vivas		1.065.912.019																					
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJO REALIZADOS								HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM					
Lv sup xcl-10		W		SN		Se destapa 1 cámara de paso para instalar 14 metros de cable 4x18 para la instalación de radar de detección								8:00									
						Se instala 14 metros de cable 4x18												215.					
						Se instala radar de detección (05-06-00-26-16-009)												91.					
Lv inf x Tv 7a		N		EW		Se destapa 3 cámaras de paso para instalación 51 metros de cable 4x18 para la instalación de radar de detección																	
						Se instala 51 metros de cable 4x18												215.					
						Se instala radar de detección (05-06-00-26-16-008)										3:30		91.					
EQUIPO EN OBRA:																							
Pescas, herramienta menor																							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																							
VERIFICACIÓN																							
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA																	
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ																	
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche																	
FIRMA 			FIRMA 			FIRMA 																	
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría																	

112

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 24.04.2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DIA: VIERNES		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Cortés	71480675	José Cortés	109872131
Alvaro Oquendo	15.493.497		
Santiago Mora	1.000.533.792		
José Peier	PPT 5.240.599		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
Car 53753	ON	S-N	Retiro de 1 semáforo de manzula, retiro de 1 semáforo vehicular de poste, retiro de 1 semáforo peatonal, retiro de 1 disco direccional, retiro de 1 brazo de manzula, retiro de 1 poste de manzula, retiro de 19 mts de cable de control Uxlb, demolición de pedestal en concreto en Anclaje, Retiro de señal informativa de motos=10n, instalación de 1 poste de manzula, instalación de 1 brazo de manzula nuevo de 5.50 mts, instalación de 1 semáforo a manzula, instalación de 1 semáforo vehicular a poste, instalación de 1 semáforo peatonal, instalación de 1 disco direccional, instalación de 19 mts de cable de control Uxlb, se hizo semiendo en Anclaje, se hicieron 3 empalmes eléctricos, suministro instalación 4 tornillos con arandela para Anclaje y tornillos con arandela para enflunche
			HORA INICIO 7:40 AM HORA FINAL 12 PM ITEM 170
			172
			179
			166
			173
			1
			180
			203
			207
			208
			208-210
			215
			94
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma, herramienta menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Any Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

[illegible]

10
24
2

ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	25/04/2026					SI		SI		SI
VEHICULOS:						NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Angelo Somet	1052187124			Jose Cortez	1098427131
William Chuquillo	98681725				
Carloz Diaz	101744410				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
076xcl33A	S	SN	Retiro de Contraste y Giro de Semaforo a Plensola			171
			Retiro de lampara de Conteo			196
			Reinstalacion de lampara de Conteo y Construcion de Empalme			219-94
076xcl33A	W	WE	Retiro de Contraste y Giro de Semaforo a Plensola			171
076xcl34	S	SN	Retiro de contraste y Giro de Semaforo a Plensola,			171
			Retiro de lampara de conteo			196
			reinstalacion de lampara y construccion de empalme			219-94
076xcl34	E	EW	Retiro de contraste y Giro de Semaforo a Plensola.			171
			Retiro de lampara de Conteo			196
			reinstalacion de lampara y construccion de empalme			219-94
076xcl35	S	SN	Retiro de contraste y Giro de Semaforo a Plensola			171
			Retiro de lampara de Conteo			196
			reinstalacion de lampara y construccion de empalme			219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	25/09/2025	SECO	
DÍA:	Sábado	LLUVIOSO	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	
		UNIFORMES	CUMPLE SI ☒ NO ☐
		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ☒ NO ☐
		ESCOMBROS	CUMPLE SI ☐ NO ☐
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Angelo Gomet	1052187124	Jose Cortes	1098727131
William Chavalla	98681775		
Carlos Diaz	101144470		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Calles 76 x cd 31	W	WE	Grdo de semaforo a Mensola y Retiro de Contraste.
Calles 76 x cd 33	E	EW	Grdo de semaforo a Mensola y Retiro de Contraste.
			Retiro de lampara de Contro.
			Instalacion de lampara de Contro.
			Construccion de Empalme Electrico
Calles 76 x cd 33	W	WE	Grdo de semaforo a Mensola y Retiro de Contraste.
			Retiro de lampara de Contro.
			Instalacion de lampara de Contro.
			Construccion de Empalme.
Calles 70 x cd 42	W	WE	Grdo de Semaforo a Mensola y Retiro de Contraste.
Calles 63 x cd 42	N	NS	Grdo de semaforo a Mensola y Retiro de Contraste.
Calles 63 x cd 42	W	EW	Grdo de semaforo a Mensola y Retiro de Contraste.
Calles 63 x cd 36	N	NS	Grdo de semaforo a Mensola y Retiro de Contraste.
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

[illegible]

114

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 25.01.2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DÍA: Sábado		LLUVIOSO	SEÑALIZACIÓN
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	UNIFORMES	ESCOMBROS
		SI	SI
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
SEMA C RUENTES	71480675	Jose Cortes	1048727131
Alberto Aguado	15.485.477		
Leo Mor Riera	PPT 4.350.715		
Liviana Rito	1.017.162.399		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* AV 80x19	OC	N-S	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vialculo de manzula, lavado de 1 semaforo vialculo de poste, lavado de 1 disco direccional, lavado de 2 placas de contraste
			229-230
			235
			234
			236
			199
* AV 80x19	OC	OC-OC	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vialculo de manzula, lavado de 1 semaforo vialculo de poste, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco direccional, lavado de 1 pulsador, lavado de 1 sonarizador, lavado de 2 placas de contraste, lavado de 1 disco direccional (pep)
			229-230
			235
			234
			231
			236-232
			232-199
			236
* AV 80x12	OC	N-S	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vialculo de manzula, lavado de 1 semaforo vialculo de poste, lavado de 1 semaforo peatonal
			229-230
			235
			236
			231
			236-232
EQUIPO EN OBRA			
lavado de 1 disco direccional, lavado de 1 disco por lavado			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA de 1 pulsador			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria	

214

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 25.04.2026	SECO	CUMPLE	CUMPLE
DIA: Sabado	LLUVIOSO	SEÑALIZACIÓN	ESCOMBROS
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Josma Cepentes	71.480.675	Jode Cortes	7098727137
Albino Oquendo	15.485.477		
Leo Mar Riera	PPT 4.350.715		
Uriana Pinto	1.017.162.399		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
AV 80x30	OC	S.N	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vicular de manzula, lavado de 2 semaforos viculares de poste, lavado de 1 disco direccional
			229-230-235-234-236-
AV 80x31A	OC	S.N	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vicular de manzula, lavado de 1 disco direccional, lavado de 1 placa de contraste
			229-230-235-236-199-
* AV 80x28	OC	N.S	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vicular de manzula, lavado de 1 disco direccional
			229-230-235-236-
* AV 80x28	OC	OCOR	lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 semaforo vicular de poste, lavado de 1 disco direccional
			229-230-234-236-
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria	

4/4

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 25-04-2026	SECO	CUMPLE	CUMPLE
DÍA: Sábado	LLUVIOSO	SI	SI
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	NO	NO
UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN	ESCOMBROS	CUMPLE
SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Cifuentes	71480675	José Cortes	1098727131
Albato Oquendo	15.485.477		
Leo Mar Diera	PPT 4350.715		
Viviana Antio	107.162.399		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Av 80x25	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semáforo vial, lavado de 1 menzula, lavado de 1 semáforo vial, lavado de 1 poste, lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			234
			236
Av 80x21	OC	O-C-O	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semáforo vial, lavado de 1 menzula, lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			236
Av 80x20A	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semáforo vial, lavado de 1 menzula, lavado de 1 semáforo vial, lavado de 1 poste, lavado de 1 disco direccional
			229
			230
			235-234
			236
Av 80x20A	OC	O-C-O	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semáforo vial, lavado de 1 menzula, lavado de 1 semáforo vial, lavado de 1 poste, lavado de 1 semáforo peatonal
			229-230
			235
			234
			231
EQUIPO EN OBRA:			236
Plataforma			lavado de 1 disco direccional
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 Alcaldía de Medellín Municipio de Medellín		 UNION TEMPORAL EN MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025				
 CONSORCIO INT. CAROL MED 2025		 RAY		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025								
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	26/09/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Domingo				SI	NO		SI	NO		SI	NO
VEHÍCULOS:					SI	NO		SI	NO		SI	NO
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		
Anyelo Gomez		1052187124						Jose Cortes		1098727131		
William Chavarria		98681795										
Carlos Viat		101144470										
TRABAJOS REALIZADOS												
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
C43 x calle 57	W	WE	Retiro de Contraste y B110 de Semáforo a Menúola							171		
C43 x calle 56	E	EW	Retiro de Contraste y B110 de Semáforo a Menúola							171		
C43 x cl 53	N	NS	Retiro de Contraste y B110 de Semáforo a Menúola							171		
			Retiro de Lámpara de Centro							196		
			Reinstalación de Lámpara de Centro							219		
			Construcción de Empalme							94		
C43 x cl 53	W	WE	Retiro de Contraste y B110 de Semáforo a Menúola							171		
C41 x cl 55	S	SN	Retiro de Contraste y B110 de Semáforo a Menúola							171		
			Retiro de Lámpara de Centro							196		
			Reinstalación de Lámpara de Centro							219		
Calle 1040 x cl 55	N	NS	Retiro de Contraste y B110 de Semáforo a Menúola							171		
Calle 1042 x cl 52	E	EW	Retiro de Contraste y B110 de Semáforo a Menúola							171		
			Retiro de Semáforo a Menúola							170		
EQUIPO EN OBRA:												
Plataforma												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA				FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría						

215

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	26/04/2026.	TIEMPO	SECO
DIA:	Domingo		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	SEÑALIZACIÓN
		NO	CUMPLE
			SI
			NO
		ESCOMBROS	CUMPLE
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Angelo Gomez	1032187124	Jose Cortes	1098727131
William Chavarría	98681775		
Carlos Diaz	10444470		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Calle 45 x cl 32	E	ew	Retiro de contraste y giro de semáforo a Ténsola.
Calle 48 x cl 34	N	NS	Retiro de contraste y giro de semáforo a Ténsola
			Retiro de lámpara de control
			Instalación de lámpara de control.
Calle 50 x cl 38	SE	SN	Retiro de contraste y giro de semáforo a Ténsola
			Retiro de lámpara de control
			Instalación de lámpara de control.
	SW	SN	Retiro de contraste y giro de semáforo a Ténsola
	EW	EW	Retiro de contraste y giro de semáforo a Ténsola
Calle 50 x cl 41	S	SN	Retiro de contraste y giro de semáforo a Ténsola
			Retiro de lámpara de control.
			Instalación de lámpara de control
Calle 50 x cl 43	E	EW	Retiro de contraste y giro de semáforo a Ténsola
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
Poste Rodado en Calle 50 x cl 38 (SE).			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

3/5

4
5

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 26/04/2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DIA: Domingo		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI	SI
		NO	NO
		ESCOMBROS	CUMPLE
		SI	
		NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Angelo Gomez	1052187124	Jose Cortes	1098727131
William Chavarrin	98681775		
Carlos Diaz	1017144470		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Carretera 50 x Calle 44	E	EW	Retiro de Contraste y Giro de Semáforo
			Retiro de 3 Lámparas de Flecha
			Reinstalación de 3 Lámparas de Flecha
			Construcción de 1 Empalmes
			171
			196
			219
			94
Carretera 50 x Calle 44	E	EW	Retiro de Contraste y Giro de Semáforo
			Retiro de lámpara de Contraste
			Reinstalación de lámpara de Contraste
			171
			196
			219
			94
Carretera 50 x Calle 44	E	EW	Retiro de Contraste y Giro de Semáforo
			Retiro de Semáforo a mensula
			Construcción de Empalmes
			171
			196
			219
			94
	E	EW	Retiro de Contraste y Giro de Semáforo
			Retiro de lámpara de Contraste
			Reinstalación de lámpara de Contraste
			Construcción de Empalmes
			171
			196
			219
			94
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

4/5

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 26/04/2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DÍA: Domingo		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI	SI
		NO	NO
		ESCOMBROS	CUMPLE
		SI	SI
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Anyelo Bonnet	1052189124	José Cortes	1098727131
William Chovarría	98681775		
Carlos Díaz	1017144470		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Carretera SL x cl 44	W	WE	Grillo de Semáforo a Mensola.
			Retiro de lámpara a Mensola
			Reinstalación de Lámpara de Contraste
Carretera SO x cl 38	E	EW	Grillo de Semáforo a Mensola
			Retiro de lámpara a Mensola
			Reinstalación de lámpara a Mensola
Carretera K x cl 37	N	NS	Grillo de Semáforo a Mensola y Retiro de Contraste
			Retiro de lámpara a Mensola
			Reinstalación de lámpara a Mensola
Cl 52 x cl 41	S	SN	Grillo de Semáforo a Mensola y Retiro de Contraste
Cl 66 x cl 33	E	EW	Grillo de Semáforo a Mensola y Retiro de Contraste.
			Retiro de lámpara de Contraste
			Reinstalación de lámpara de Contraste.
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

5/5

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 26/09/2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DIA: Domingo		LLUVIOSO	SI /
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI /	SI /
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Anacle Gomez	1052184124	Jose Cortes	1098727131
William Chavillo	98681735		
Carlos Diaz	101144470		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
CR50 xcll3+	W	WE	Retiro de contraste y giro de semáforo a Mensole
			Retiro de lámpara de control
			Reinstalación de lámpara de control
CR45 xcll45	S	SN	Retiro de Contraste y giro de Semáforo a Mensole.
			Retiro de lámpara de control
			Reinstalación de lámpara de control
			Construcción de Empalmes
	E	EW	Retiro de Contraste y giro de Semáforo a Mensole
CR45 xcll5T	S	SN	Retiro de Contraste y giro de Semáforo a Mensole
			Retiro de lámpara de control
			Reinstalación de lámpara de control
CR45 xcll5B	S	SN	Retiro de Contraste y giro de Semáforo a Mensole
			Retiro de lámpara de control
			Reinstalación de lámpara de control
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	26 de 04 2026		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	domingo			LLUVIOSO		SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Sandra Cifuentes		71480675				Jose Cortes		1098727131			
Albino Aguado		15.485.477									
Leo Mar Riera		PPT 4.330.715									
Viviana Pinto		1.017.162.399									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Av 80x 11	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional							229-230-235-234-236-	
Av 80x esa 76	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional							229-230-235-234-236-	
Av 80x esa 76	OC	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste							229-230-235-234-	
Av 80x 2	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste lavado de 1 semáforo peatonal lavado de 1 disco direccional							229-230-235-234-231-236-	
EQUIPO EN OBRA:											
Plataforma			lavado de 1 disco per lavado de 1 pulsador serico de 2 placas							232-199-	
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria							

2/3

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105589 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 06.04.2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DÍA: domingo		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
SAIME CIFUENTES	71480675	JOSE CORTES	6098727134
ALBERTO OQUENDO	15.405.437		
LEONAR RIERA	PPT 4.350.715		
WILIANA RINCO	1.017.162.399		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
AV 80X ca 76	OR	N-S	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de poste, lavado de 1 disco direccional, seteo de 1 placa de contraste
			229-230
			235
			234
			236-199
AV 80X 11	OR	S-N	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de poste, lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			234
			236
AV 80X 11	OR	OR-OC	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de poste, lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			234
			236
AV 80X 12	OR	S-N	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de menzula, lavado de 1 semaforo vehicular de poste, lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			234
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma		disco direccional lavado de 1 pulsador	236-232
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria	

313

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 26-04-2026	SECO	CUMPLE	CUMPLE
DÍA: domingo	LLUVIOSO	SE	SE
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	NO	NO
TIEMPO	UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN	ESCOMBROS
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
SAIME CIFUENTES	71480675	JOSE CORTES	1098727131
ALBERTO OQUENDO	15.485.477		
LEONAR DIAZ	PPT 4.350.715		
VIVIANA RINCO	1.072.162.399		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
AV 80 X 19	OR	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional lavado de 1 sonarizador
			229-230
			235
			234
			236-232
AV 80 X 20A	OR	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			234
			236
AV 80 X 21	OR	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			234
			236
AV 80 X 28	OR	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula, lavado de 1 semáforo vehicular de menzula lavado de 1 semáforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional
			229-230
			235
			234-236
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma disco direccional			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria	

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	27 04 2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Lunes					SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:	MTN 502					NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Franklin Burbosa P.		16791406						Jose Cortes		1098727131	
Jose Andrade		11222857						Jonathan Rendon		1036962270	
								Alvaro Londoño		71775731	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Cr 77 Cl 30	Separador	W-E	Enderezado de Semáforo Vehicular				07:02		258		
			Compuerta de modulo abierto - se instala.						260		
	Separador	E-W	Enderezado de Semáforo Vehicular						258		
Cr 66B Cl 30A			Instalación - Suministro de Sonorizador (Módulo)						72		
			construcción de Empalme Serial = 20250030						94		
			Instalación - Suministro de Sonorizador (Módulo)						72		
			construcción de Empalme Serial = 20250003						94		
			Programación de Sonido de Semáforos Sonorizadores								
Av 80 Cl 48	Separador	S-N	Enderezado de Semáforo Peatonal						258		
Av 80 Cl 49D	Separador	S-N	Enderezado de Semáforo Peatonal.						258		
Av 80 Cl 33			Enderezado de Semáforo Peatonal.						258		
EQUIPO EN OBRA:											
Escala, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD								SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1				
						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: DIA: VEHÍCULOS:	27 / abril / 2026 Lunes	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	v	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Juan José Ríos Silva		1000531976				Jose Carlos		1098721131		
William Chaverri										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CALLE 50 - CARRETERA S2	E - S	E - W	• Aplicación de wash primer en poste						—	
CARRETERA S2 - CALLE 50	S - E	S - N	• Aplicación de wash primer en poste					4:00	—	
EQUIPO EN OBRA:										
Kit antiderrame 5 brocha										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ		REVISO/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA [Signature]		FIRMA [Signature]		FIRMA [Signature]						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria						

 Alcaldía de Medellín Corporación de Planeación Urbana y Territorial		 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		 DMV		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 27/4/26		DIA: Lunes		TIEMPO: SECO		LLUVIOSO		DURACIÓN	
VEHÍCULOS:						UNIFORMES		CUMPLE	
						SI		SEÑALIZACIÓN	
						NO		CUMPLE	
								SI	
								NO	
								ESCOMBROS	
								SI	
								NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE	
Cristian Barbosa		1.161.966.785						Jose Cortes	
Cristian Alenc		1.076.817.116						109842431	
Sneon Vivas		1.065.973.019							
DIRECCIÓN									
COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	
N		WE		Se destapa 4 cajas de paso para instalar 87 metros de cable 4x18 para la instalación de radar de detección				8:06	
				Se instala 87 metros de cable 4x18					
				Se instala radar de detección (05-06-00-26-16-010)				215-91-	
E		NS		Se destapa 5 cámaras de paso para instalar 60 metros de cable 4x18 para la instalación de radar de detección					
				Se instala 60 metros de cable 4x18					
				Se instala radar de detección (05-06-00-26-16-007)				4:30	
								215-91-	
EQUIPO EN OBRA:									
Pesca, barramita menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				


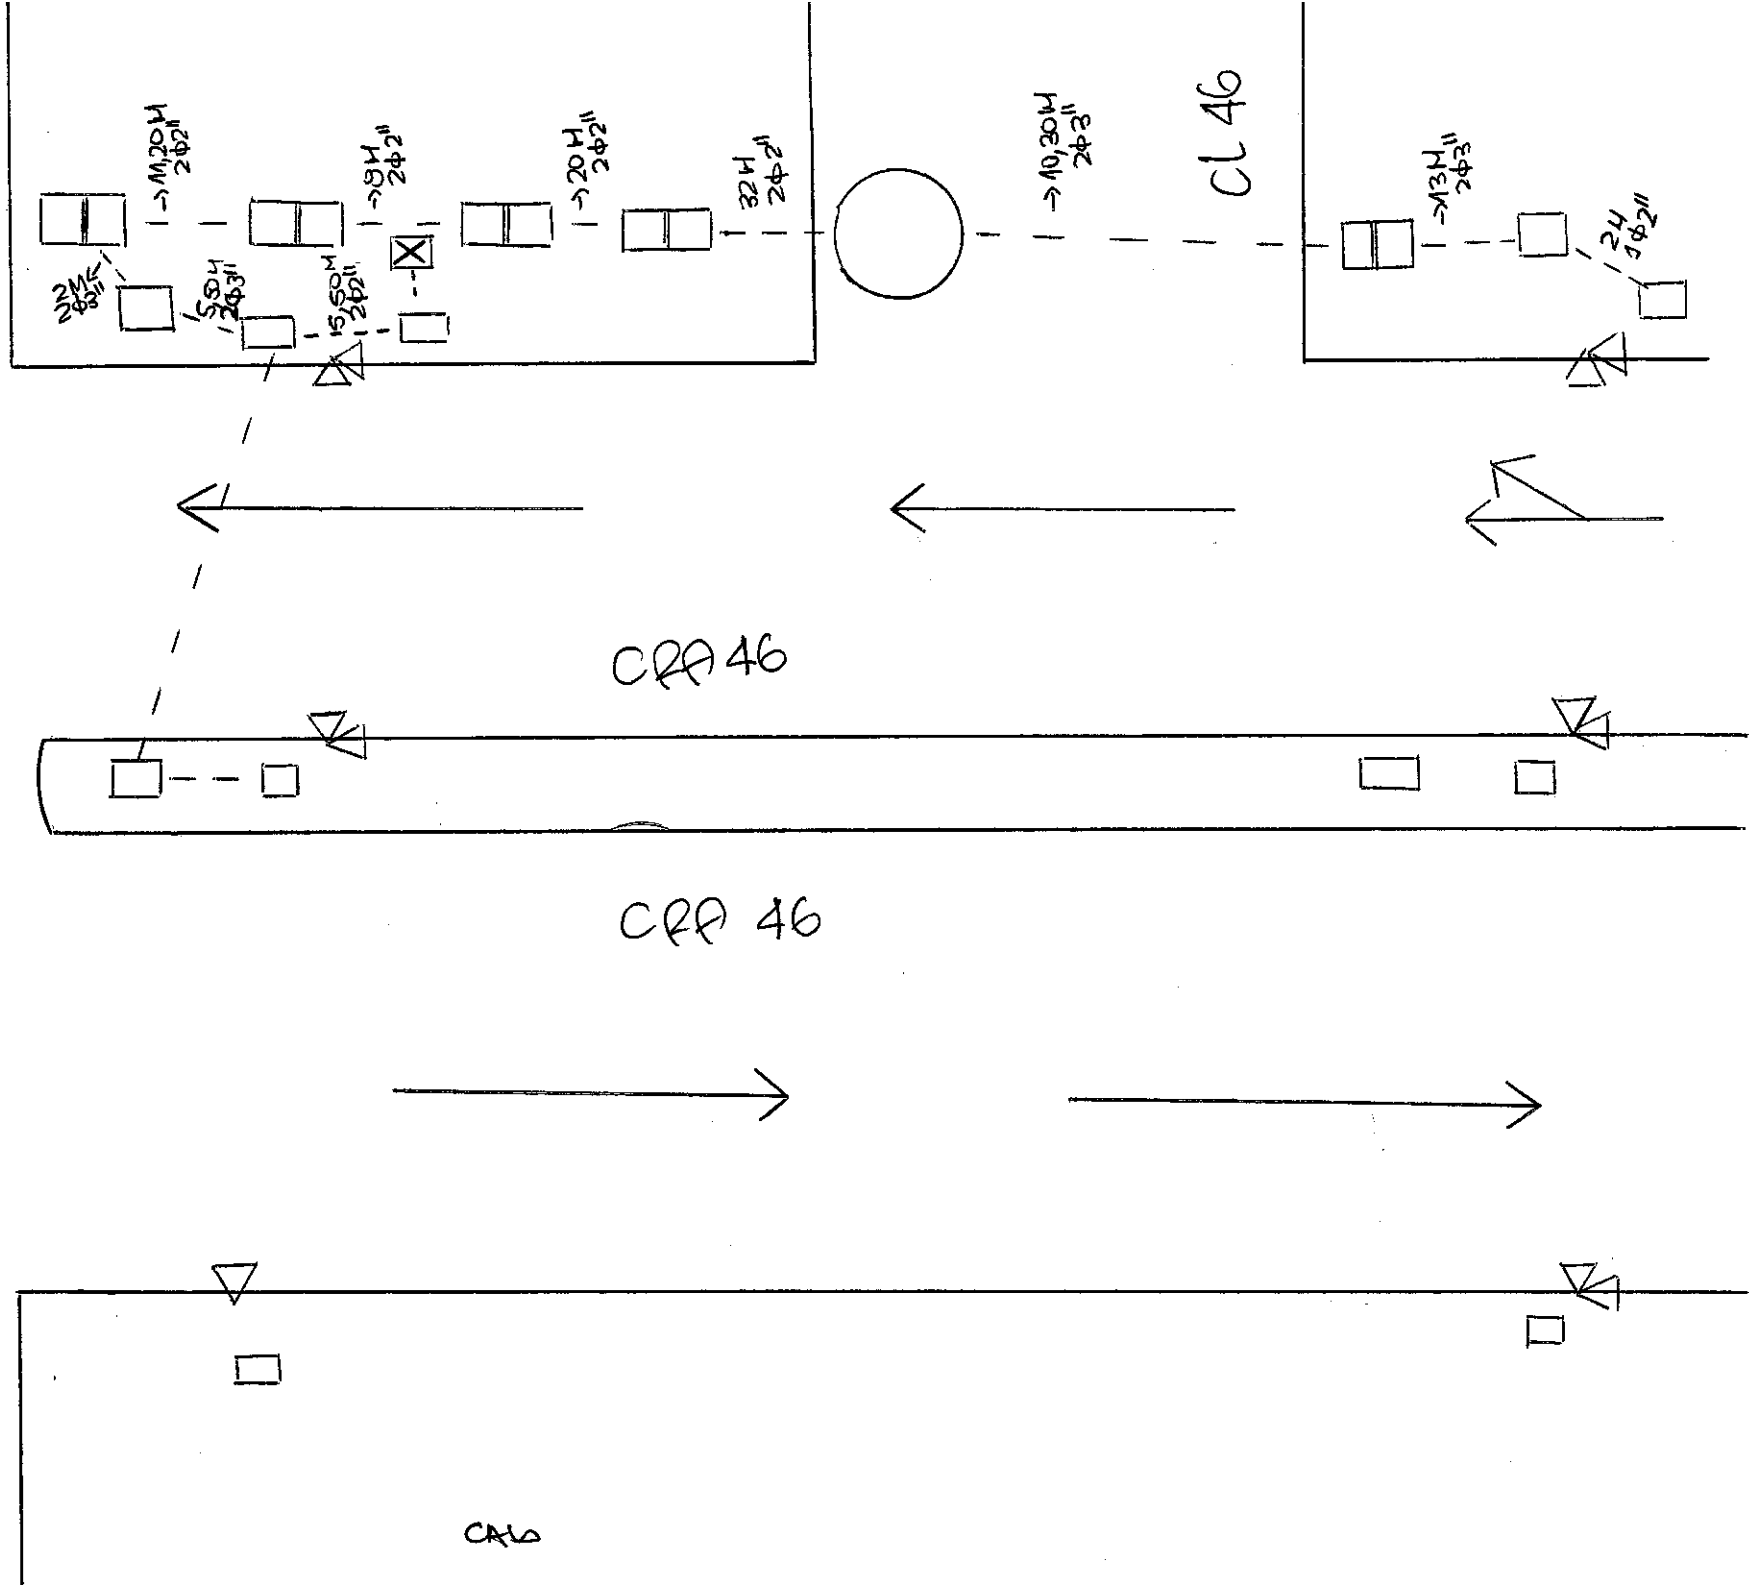
		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001							
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1							
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025							
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	27-09-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Lunes					SI	X		SI	X		SI	
VEHÍCULOS:						NO			NO			NO	X
PERSONAL EN OBRA													
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA			
Hogan Ramirez		1015186405						Jose Cortes		1098727131			
Laura marcela padilla		1017221585											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS						HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CR 63CCL 42C		W-E	Lavado de poste Recto						8:40		230-		
			Lavado de Semaforo Biclista								231-		
			Lavado de Semaforo Peatonal								231-		
			Lavado de Boton pulsador								232-		
			Lavado de Disco pulsador								236-		
			Lavado de Disco pulsador								236-		
CR 63CCL 42C		W-E	Lavado de poste Recto								230-		
			Lavado de Semaforo Biclista								231-		
			Lavado de Semaforo Peatonal								231-		
			Lavado de Boton pulsador								232-		
			Lavado de Disco pulsador								236-		
											12=40		
EQUIPO EN OBRA:													
Escalera, arnes, eslinga													
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA													
VERIFICACIÓN													
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA				FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría							

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		27 Abril 2026									
DIA:		Lunes									
VEHÍCULOS:											
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Moyes Reyes		1002500113						Jose Cortes		1098727131	
Carlos Gonzalez								Jonathan Bendon		1036962270	
Yerson Galeano								Alvaro Londoño		71775731	
TRABAJOS REALIZADOS											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carrera 46	N-E	S-N	Instalacion de 3 semaforos de piso					8 am		212-	
calle 53			Instalacion de 1 fuente electrica							-	
			Suministro e instalacion de 6mts coraza flexible							-	
			Suministro e instalacion de 10 mts cable 4x18							215-	
			Construccion de 7 empalmes							94-	
			Suministro e instalacion de 2mts de cable 4x18 por cable peatonal tensionado.						4.30pm	215-	
EQUIPO EN OBRA:											
Planta electrica, Paladora, Martillo demolidor, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
FIRMA		FIRMA				FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoria					

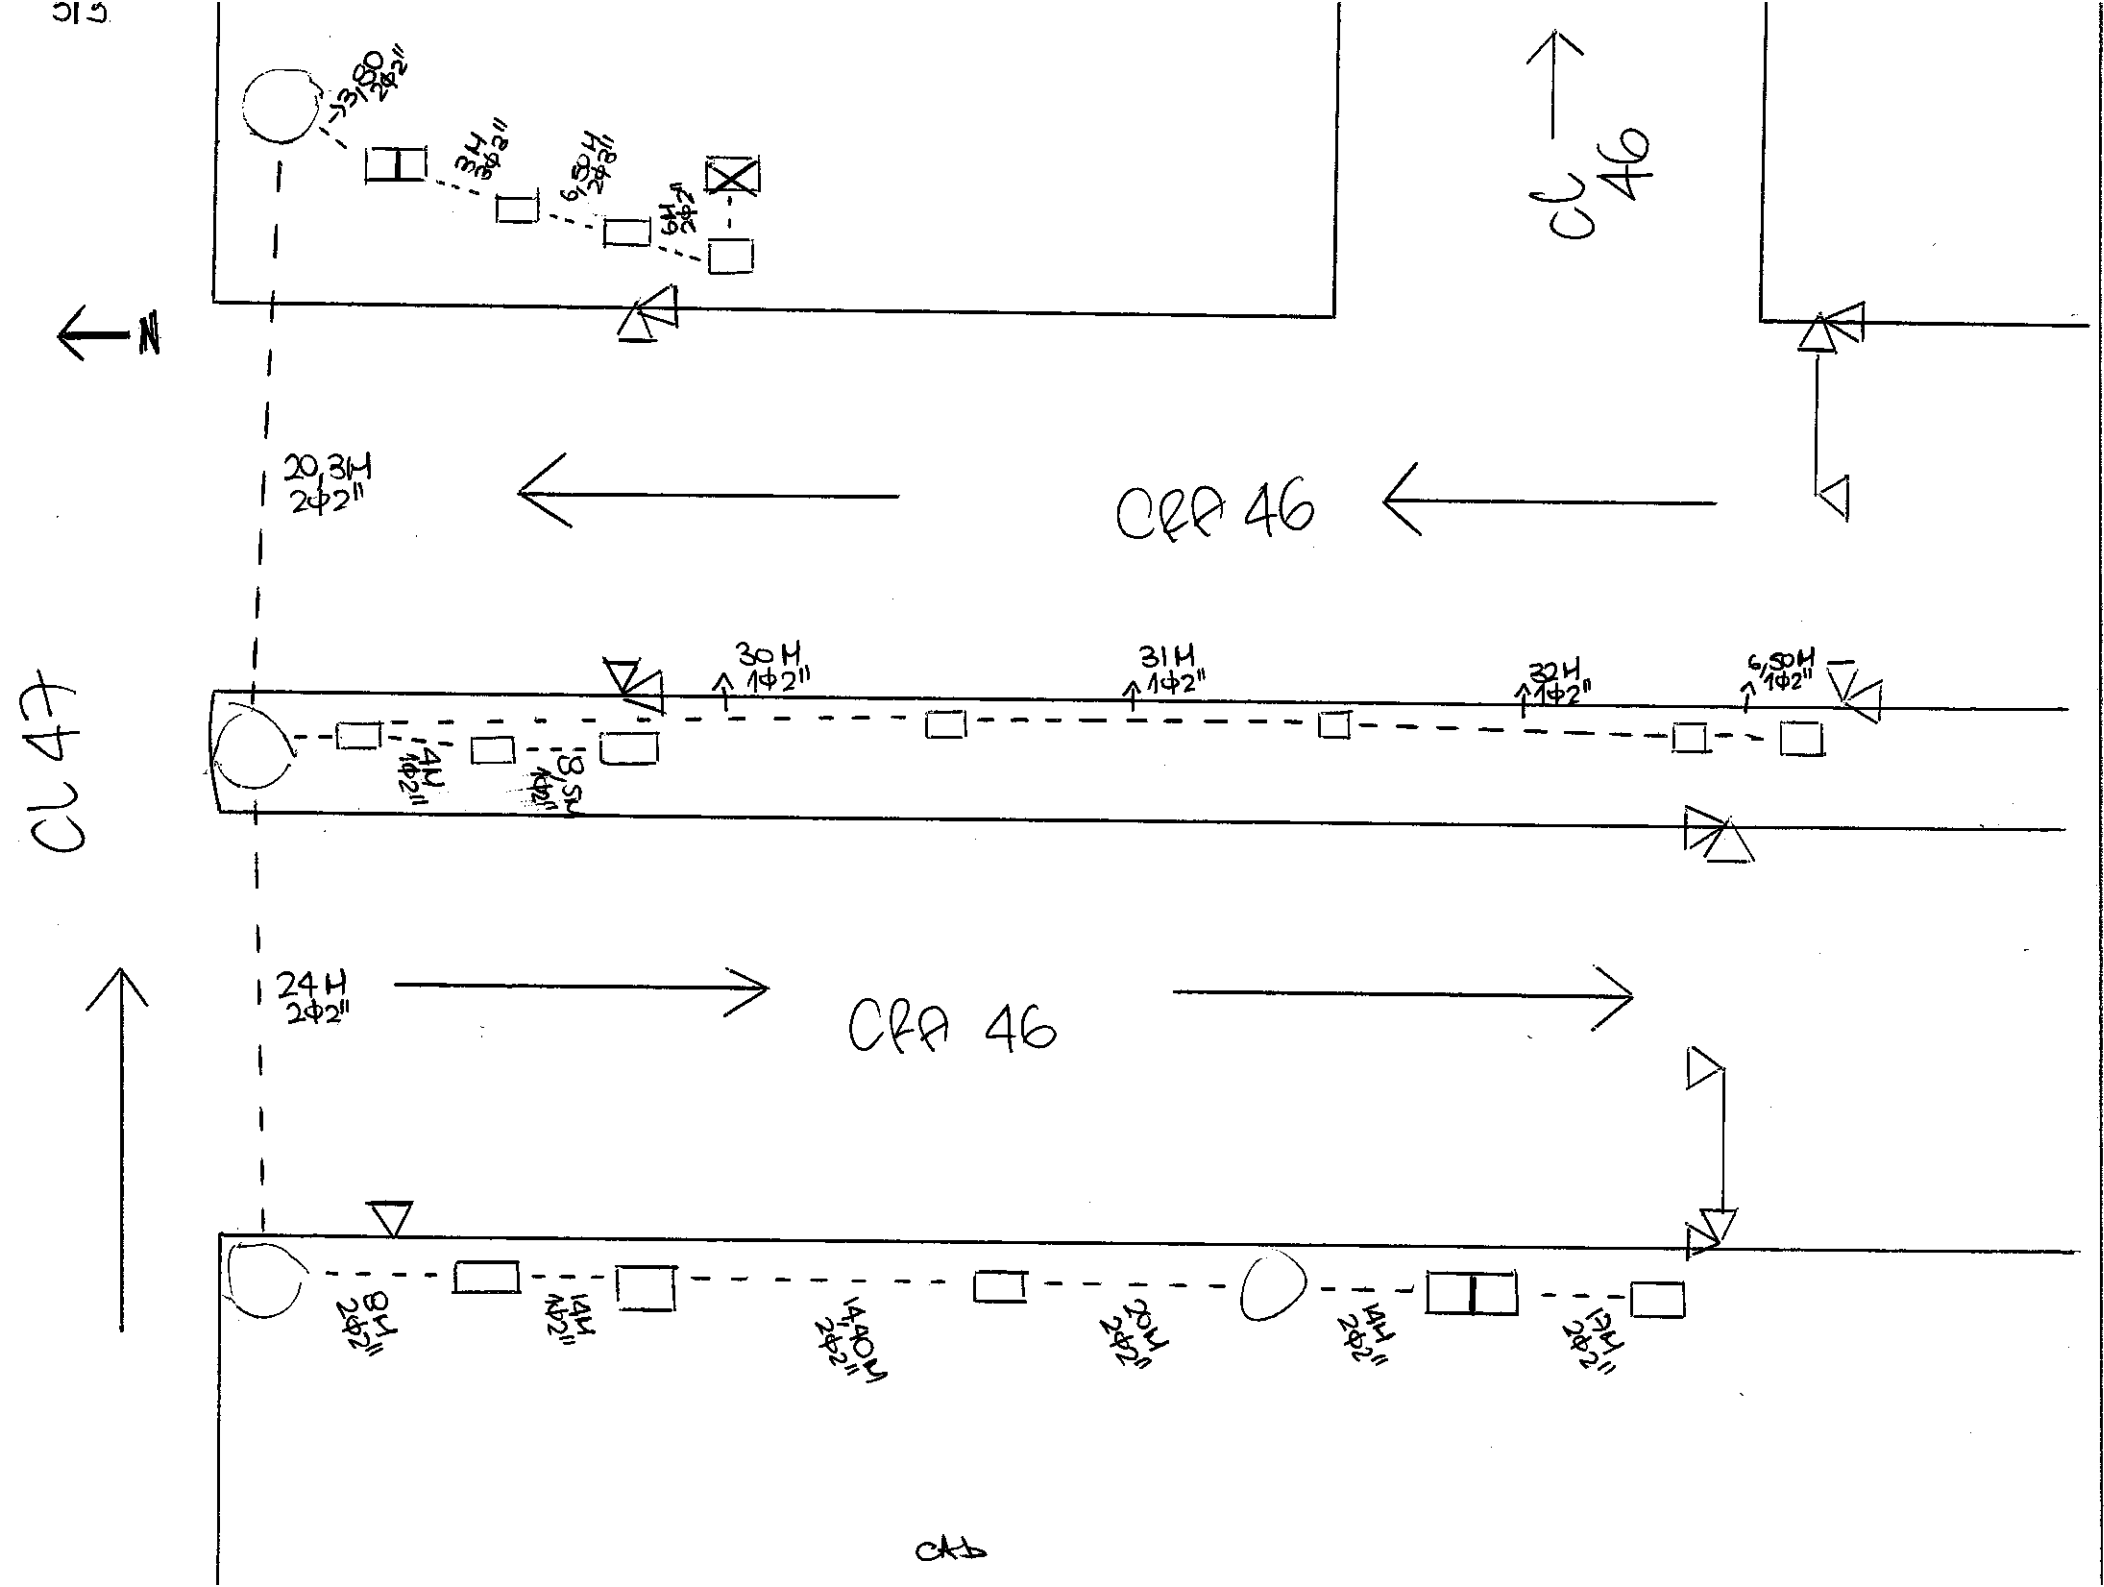
PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1	
						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	27 ABRIL	TIEMPO	SECO	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS
DÍA:	Lunes		LLUVIOSO	SI		SI	
VEHÍCULOS:			DURACIÓN	NO		NO	
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Bryan Palacio		Steven Palacio		Jonathan Rendón	1036962290		
Javier Nieves				José Carlos	1090929131		
Alejandro Rivas							
Andrés Benoya							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
Cra 46 Cl/S3	N-W	S-W	Instalación 8 Semáforos de piso			8:00 am	2:15 pm
			Suministro e instalación carcasa 5mts				-
	SP	N-S	Canalización en zona dura 1 mts 70cm				
			Suministro e instalación de cables				
			2=7.30 Cable 4x18				2:15 pm
			2=5.90 Cable 4x18				2:15 pm
			2=4.40 Cable 4x18			4:00 pm	2:15 pm
			2=2.60 Cable 4x18				2:15 pm
			Construcción 12 Empalmes				94
EQUIPO EN OBRA: Planta eléctrica pública, cortador, fusible, interruptor							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA Limpieza bases en semáforos "esquineros" y un cableado							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBO			
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA			FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría			


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 27/04/2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DÍA: Lunes		LLUVIOSO	SI /
VEHÍCULOS:	DURACIÓN		NO
	2 horas		
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G. A.	7.070807034	José Carlos	7098727131
Enrique Torres	7028030487		
Miguel Ángel Villalga	70782929462		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
CRUZ 1153	DECC	N S	
Se en cuenta la caja para en dos horas			261 -
Se en cuenta la caja para no haberla			
Caja para que el taca de molida.			
Contrucción de una caja de 50x50			34 -
instalación de un bache de 50x50			
nuevo metálico de seguridad.			3 09 13 -
EQUIPO EN OBRA:			
Herramienta menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	



CL 47




CRA 46



PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001																																																												
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1																																																												
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025																																																												
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																																																																						
FECHA:		28-04-2026		TIEMPO		SECO		51		CUMPLE																																																												
DIA:		MARTES				LLUVIOSO				SI																																																												
VEHÍCULOS:		756405				DURACIÓN				NO																																																												
PERSONAL EN OBRA																																																																						
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA																																																																
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA																																																												
Edwin Santos		1038810427						Jose Cortes		1098727131																																																												
Juan Rom																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DIRECCIÓN</th> <th>COSTADO</th> <th>SENTIDO</th> <th>TRABAJO REALIZADO</th> <th>HORA INICIO</th> <th>HORA FINAL</th> <th>ITEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">CARRIL 50</td> <td rowspan="4">N-W</td> <td rowspan="4">N-S</td> <td>Cambio de pulsadores touchless a poste</td> <td rowspan="4">9:00 AM</td> <td rowspan="4"></td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>Retiro de 7 pulsador touchless a poste</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>perforación en poste con taladro y machuelos</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">N-E</td> <td rowspan="4">N-S</td> <td>Retiro de 7 pulsador touchless a poste</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>perforación en poste con taladro y machuelos</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td></td> <td>88</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">N-E</td> <td rowspan="4">E-W</td> <td>Retiro de 7 pulsador touchless a poste</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>perforación en poste con taladro y machuelos</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td></td> <td>88</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">separador</td> <td rowspan="4">E-W</td> <td>Retiro de 7 pulsador touchless a poste</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">12:30 PM</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>perforación en poste con taladro y machuelos</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td></td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>												DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	CARRIL 50	N-W	N-S	Cambio de pulsadores touchless a poste	9:00 AM		177	Retiro de 7 pulsador touchless a poste	88	perforación en poste con taladro y machuelos	177	suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste	88		N-E	N-S	Retiro de 7 pulsador touchless a poste			177	perforación en poste con taladro y machuelos	88	suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste	177		88		N-E	E-W	Retiro de 7 pulsador touchless a poste			177	perforación en poste con taladro y machuelos	88	suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste	177		88		separador	E-W	Retiro de 7 pulsador touchless a poste		12:30 PM	177	perforación en poste con taladro y machuelos	88	suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste	177		88
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM																																																																
CARRIL 50	N-W	N-S	Cambio de pulsadores touchless a poste	9:00 AM		177																																																																
			Retiro de 7 pulsador touchless a poste			88																																																																
			perforación en poste con taladro y machuelos			177																																																																
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste			88																																																																
	N-E	N-S	Retiro de 7 pulsador touchless a poste			177																																																																
			perforación en poste con taladro y machuelos			88																																																																
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste			177																																																																
						88																																																																
	N-E	E-W	Retiro de 7 pulsador touchless a poste			177																																																																
			perforación en poste con taladro y machuelos			88																																																																
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste			177																																																																
						88																																																																
	separador	E-W	Retiro de 7 pulsador touchless a poste		12:30 PM	177																																																																
			perforación en poste con taladro y machuelos			88																																																																
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste			177																																																																
						88																																																																
EQUIPO EN OBRA: Taladro, herramienta menor																																																																						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA																																																																						
VERIFICACIÓN																																																																						
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA																																																																
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ																																																																
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche																																																																
FIRMA 			FIRMA 			FIRMA 																																																																
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría																																																																

  		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	28-04-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	51	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	MARTES					SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:	756405					NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Edwin Santos		1038810427				Jose Cortes		1098727131			
Juan Rob											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CRV 81 X C1150	S-E	S-N	retiro de 7 pulsador touchless a poste perforación en poste con taladro y machuelos suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste				9:06 am		177-		
									88-		
	S-W	S-N	retiro de 7 pulsador de boton a poste suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste						177-		
									88-		
AV 80 X C1150	S-W	E-W	retiro de 7 pulsador touchless a poste perforación en poste con taladro y machuelos suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste						177-		
									88-		
	N-E	E-W	retiro de 7 pulsador touchless a poste perforación en poste con taladro y machuelos suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste						177-		
								12:30 pm	88-		
EQUIPO EN OBRA:											
Taladro, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Pueny Patricia Barreneche							
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							



 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	28 Abril 2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO	
DÍA:	Martes.										
VEHÍCULOS:											
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Moises Reyes		1002500113				Jose Cortes		1098727131			
Carlos Gonzalez											
Yewon Galeano											
DIRECCIÓN		COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carrera 46		N-W	N-S	Instalacion de 3 semáforos de piso				8 am		212	
calle 53				Instalacion de fuente electrica						-	
				suministro e instalacion de 2.20mts coraza flexible						-	
				suministro e instalacion de 13 mts cable 4x18						215	
				Construccion de 5 empalmes.					4pm	94	
EQUIPO EN OBRA:											
Pulidora, Planta electrica, Martillo demolidor, herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
FIRMA		FIRMA				FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN													
FECHA:	28-04-2026		TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	MARTES			LLUVIOSO			SI		X		SI	X	SI
VEHÍCULOS:				DURACIÓN			NO				NO		NO
PERSONAL EN OBRA													
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA					
Laura Marcela Padilla G		101721580				Jonathan Zúñiga		1036962270					
JHoyan Ramirez		1015186405											
TRABAJOS REALIZADOS													
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM			
* Crr 63C CLL42C		N-S	Lavado de Semáforo Peatonal					9:00		231 -			
			Lavado de Semáforo Vehicular							234 -			
			Lavado de poste Recto							230 -			
			Lavado de Disco Direccional							236 -			
* Crr 63C CLL42C	cep.	N-S	Lavado de poste Recto							230 -			
			Lavado de Semáforo Vehicular							234 -			
			Lavado de Disco direccional							236 -			
* Crr 63C CLL42C		E-W	Lavado de poste Recto							230 -			
			Lavado de Semáforo Peatonal							231 -			
			Lavado de Disco Peatonal							236 -			
			Lavado de Boton pulsador							232 -			
* Crr 63C CLL42C		W-E	Lavado de poste Recto							230 -			
			Lavado de Semáforo Vehicular							234 -			
			Lavado de Semáforo Peatonal							231 -			
EQUIPO EN OBRA:													
<i>Manejo de mano, Escuela tipo figura</i>													
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA													
<i>Se verificó señalización y EIP</i>													
VERIFICACIÓN													
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>							
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría							

CARGO: Residente de Interventoría

[illegible]


PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										
						VERSIÓN 1 ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: DIA: VEHÍCULOS:	28/9/26 <i>Motos</i>	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
<i>Christian Barbosa</i>										
<i>Simeon Vivas</i>										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
<i>C 70 x C1104</i>	<i>E</i>	<i>SN</i>	<i>Se abren 17 candados de paso para i</i>				<i>8:00</i>			
			<i>Instalar 71 metros de cable 4x18</i>						<i>215</i>	
			<i>Instalar radar de detección (05-06-00-26-16-004)</i>						<i>91</i>	
<i>Cr 65 x C181</i>	<i>Superaodo</i>	<i>NS</i>	<i>Se instala Radar de deteccion (05-06-00-26-16-001)</i>					<i>4:30</i>	<i>91</i>	
EQUIPO EN OBRA:										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALizó			APROBó				
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA <i>[Signature]</i>			FIRMA <i>[Signature]</i>			FIRMA <i>[Signature]</i>				
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria				

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	29-04-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	MIÉRCOLES					SI		SI			
VEHÍCULOS:	TSG 405					NO		NO			
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Edwin Santos		1039810427				Jose Cortes		1098727131			
JUAN PARRA											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CRV 70X C/150	S-E	N-S	cambio de 4 pulsadores touchless a poste				8:00 AM		177-		
			retiro de 7 pulsador touchless a poste						88-		
			perforación en poste con taladro y machuelos								
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste								
	S-W	N-S	retiro de 7 pulsador touchless a poste						177-		
			perforación en poste con taladro y machuelos						88-		
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste								
	separador	N-S	retiro de 7 pulsador touchless a poste						177-		
			perforación en poste con taladro y machuelos						88-		
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste								
	S-W	N-S	retiro de 7 pulsador touchless a poste						177-		
			perforación en poste con taladro y machuelos						88-		
			suministro instalación de 7 pulsador digital nuevo a poste					10:20 AM			
EQUIPO EN OBRA:											
Herramienta menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ									
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche									
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 									
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría									

CARGO: Residente de Interventoría

[illegible]

 Alcaldía de Medellín Oficina de Planeación y Desarrollo		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	29/4/26	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN:		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
Christian Dabasa									
S. Leon Vivas									
Wilber Echavarría									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C 65 x (181	Servicio	N 5	Se abren 10 cámaras de paso para:				9:00		
			Se instalan 252 metros de cable 4x18						215
			Se soldan 5 cámaras de paso						262
			Se demuele tapa de concreto x 3						1
			Se concretan 3 cámaras de paso					4:40	263
EQUIPO EN OBRA:									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA			FIRMA			FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría			

   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	29 Abril 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Miercoles.					SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Moises Reyes		1002500113									
Carlos M. Bonzalez											
Yeison Galeano											
TRABAJOS REALIZADOS											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Carrera 46	N-W	N-S	Instalacion de 1 semaforo de piso				8 am		212		
Calle 53			Suministro de instalacion 5 mts cable 4x18						215		
			Suministro e instalacion 4 mts coraza flexible						-		
			Construccion de 1 empalme						94		
			(Queda pendiente fuente electrica)								
Carrera 46	S-W	N-S	Instalacion de 1 semaforo de piso						212		
Calle 53			Suministro e instalacion 5 mts cable 4x18						215		
			Suministro e instalacion 4 mts coraza flexible						-		
			Construccion de 1 empalme						94		
			Se realiza canalizacion de 1 mts en adoquin 20x20								
			Se realiza 4 puntos de soldadura en caja concreto								
			Bar 60								
			(Queda pendiente fuente electrica)					4:00 pm	262		
EQUIPO EN OBRA:											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
FIRMA		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
CARGO: Auxiliar de Residencia		FIRMA				FIRMA					
		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

□ cajas
 ○ postes

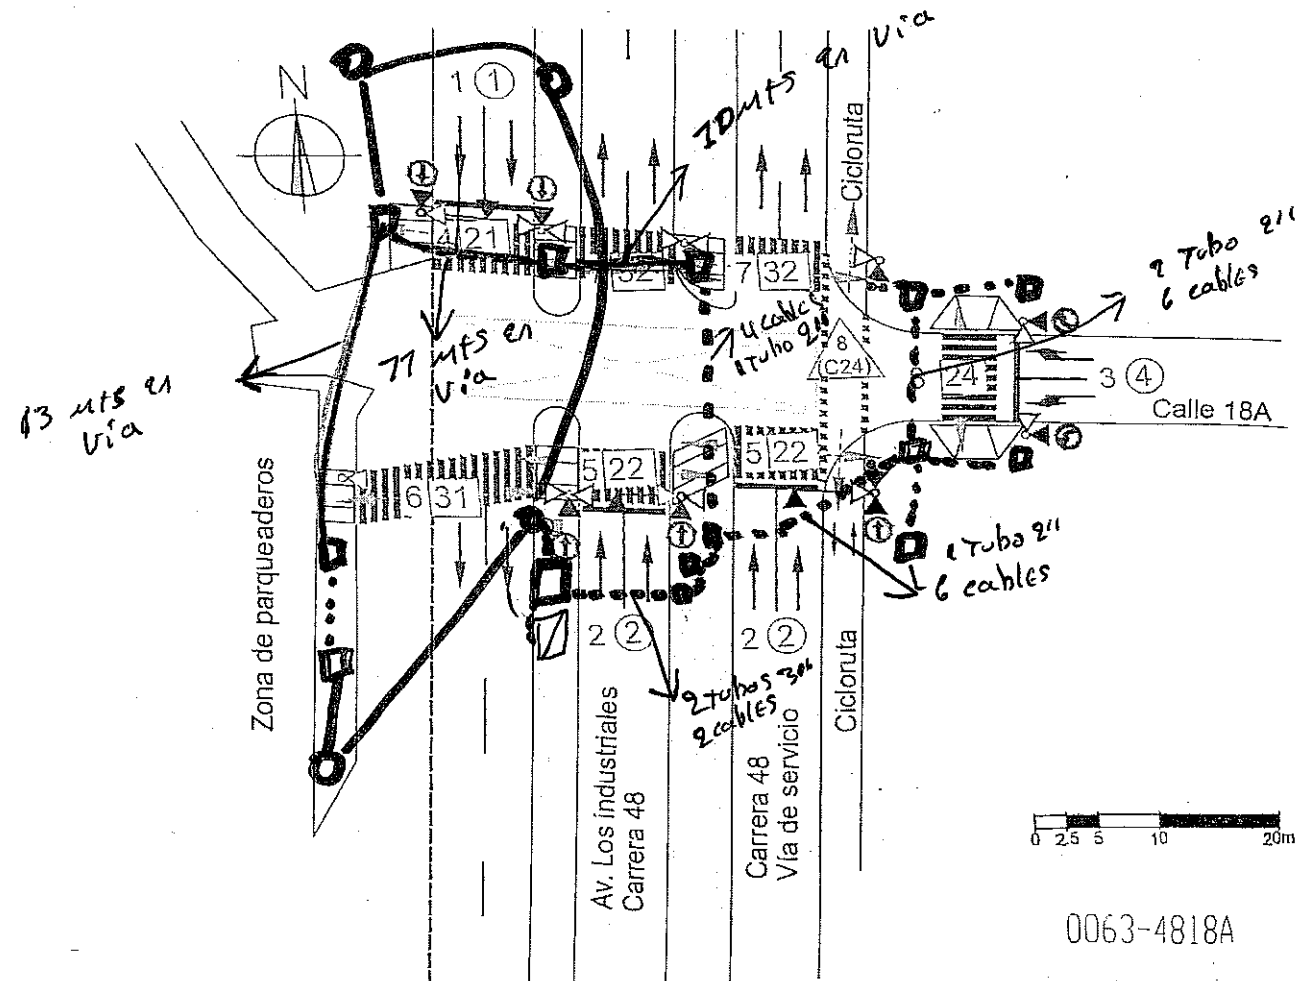
— cable aéreo


..... tubería canalizada

— canalización pendiente por hacer en vía para canalizar cableado aéreo



SONDEO CONSULTIVO 29. ABRIL 2020

CARRERA 48 X CALLE 18A



PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		30-04-2026		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DIA:		Nubes				LLUVIOSO		SI		SEÑALIZACIÓN	
VEHÍCULOS:						DURACIÓN		NO		ESCOMBROS	
								NO		SI	
								NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
								Alvaro J. J. J.		71725721	
EQUIPO EN OBRA:											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							

PLAN DE CALIDAD							SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025							VERSIÓN 1				
							ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA: DÍA: VEHÍCULOS:	22-04-2025 JUNIO		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SÍ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SÍ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SÍ NO
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA						
William Chumbin	98167775										
Luis Jorcano											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
E-W	E-W	S-E	revisión y limpieza de semáforos					3:10	4:20	258-	
Movilidad			apoyo logístico en entrega de movilidad					4:10	4:20		
EQUIPO EN OBRA:											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		 ALCALDÍA DE MEDELLÍN CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1		ED: SEP 2025	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025									
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 29 Abril 2026		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA: Hare				LLUVIOSO		SI		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		CÉDULA	
Van Carlos Usuga		1.214.729.941							
Yelson Carras		1.035.861.703							
Jose Perez		PPT 5240.594							
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS		HORA INICIO	
Carrera 55x		W		E-W		Revisión de semáforos peatonales apagados.		10:00	
Calle 30A						Construcción de empalme eléctrico 62 unids.			
						Retiro de 12 metros de cable de control		94	
						Reinstalación de 12 metros de cable de control.		173	
						La actividad se realizó porque el cableado debía cambiarse de tubería).		215	
								11:20	
Carrera 43A						Revisión de semáforos peatonales apagados			
x calle 10						en grupo M, se debe cambiar el cable de control.		261	
Carrera 43A						Revisión de semáforos peatonales apagados.			
x calle 150x						Se debe cambiar el cable por que el hilo rojo está malo.		261	
EQUIPO EN OBRA:									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA: 		FIRMA: 			FIRMA: 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

1/2

0

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 29 Abril 2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DIA: Miércoles.		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:	DURACIÓN		NO
UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS
		SI	SI
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Van Carlos Usuga	1.214.929.941		
Yelson Carraz	1.035.861.903		
Jose Perez	PPT 5.240.599		
DIRECCIÓN			
COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	ITEM
Carretera 43A		Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección	183
X calle 10		05 unidades.	
		Retiro de 73 metros de cable de control	173
		instalación de 87 metros de cable de control nuevo.	215
		Soldadura de tapa de caja de inspección metálica 05 unidades.	262
		Busqueda de caja de inspección.	261
S-E	N-S	Retiro de lámpara peatonal roja estática	195
		Retiro de lámpara peatonal verde estática	195
		instalación de lámpara peatonal roja estática de segunda.	218
		instalación de lámpara peatonal verde dinámica de segunda.	218
		Construcción de empalme eléctrico 02 unidades	94
		(1 empalme en semáforo peatonal y 1 en dorado)	
EQUIPO EN OBRA:			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001						
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1						
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105559 de 2025		ED: SEP 2025						
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	29 Abo. L 2025	TIEMPO	SECO	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO	SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN	NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Van Carlos Usuga	1.214.729.941							
Velson Caras	1.035.861.763							
José Pérez	PPT 5240.599							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Calle 43A	SECA	N-S	Retiro de lámpara peatonal roja estática			195		
X calle 10			Retiro de lámpara peatonal verde estática			195		
			Instalación de lámpara peatonal roja estática de segunda			218		
			Instalación de lámpara peatonal verde dinámica de segunda.			218		
			Construcción de empalme eléctrico 02 unds		16:00	94		
			(1 empalme en semáforo peatonal y 1 en finalizador)					
EQUIPO EN OBRA:								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALizó			APROBO		
NOMBRE: María Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche		
FIRMA			FIRMA			FIRMA		
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría		

                                		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001							
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1									
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025									
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	30-04-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:	ESP 528		DURACIÓN			NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Edwin Santos		1039410427									
Juan Ram											
DIRECCIÓN											
COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO		HORA FINAL	
CARR 48 X CIL PASO		SEPARADOR		cambio de poste recto en mal estado y cambio de pulsador				9:20AM			
psutonal EAFIT		central		retiro de 7 semafaro vehicular a poste						172-	
				retiro de 7 semafaro psutonal de 3 aspectos a poste						172-	
				retiro de 7 disco direccional 4 a poste						179-	
				retiro de 7 disco de señal de psutones a poste						179-	
				retiro de 7 pulsador touchless a poste para reintegro						177-	
				retiro de 10mts de cable 4x16 del poste						173-	
				retiro de 7 poste recto para reintegro						168-	
				suministro instalacion de 7 poste recto nuevo						206-	
				suministro instalacion de 7 pulsador digital nuevo a poste						88-	
				perforacion en poste con broca nueva y machuelos de 7/4						-	
				reinstalacion de 7 semafaro vehicular a poste						208-	
				reinstalacion de 7 semafaro psutonal de 3 aspectos a poste						208-	
				reinstalacion de 7 disco direccional 4 a poste						220-	
				reinstalacion de 7 disco direccional de señal de psutones a poste						220-	
				reinstalacion de 10mts de cable 4x16 al poste						215-	
				construccion de 2 empalmes electricos a poste				3:00PM		94-	
EQUIPO EN OBRA:											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA				FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

[illegible]

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001																																																													
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1																																																													
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025																																																													
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																																																															
FECHA: 30 Abril 2026 DÍA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO SECO ☒ LLUVIOSO ☐ DURACIÓN:	UNIFORMES CUMPLE ☒ SI ☐ NO ☐	SEÑALIZACIÓN CUMPLE ☒ SI ☐ NO ☐																																																												
PERSONAL EN OBRA																																																															
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA																																																													
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA																																																												
Moses Reyes	1002500113																																																														
Carlos Gonzalez																																																															
Yelson Galeano																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DIRECCIÓN</th> <th style="width: 10%;">COSTADO</th> <th style="width: 10%;">SENTIDO</th> <th style="width: 50%;">TRABAJOS REALIZADOS</th> <th style="width: 10%;">HORA INICIO</th> <th style="width: 10%;">HORA FINAL</th> <th style="width: 10%;">ITEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Carrera 46 Calle 53</td> <td rowspan="5">S-W</td> <td rowspan="5">N-S</td> <td>Instalacion de 1 semaforo de piso</td> <td>8 am</td> <td></td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>Instalacion de fuente electronica</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suministro e instalacion de 1 mts coraza flexible</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suministro e instalacion de 4 mts cable 4x18</td> <td></td> <td></td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>Construccion de 3 empalmes</td> <td></td> <td></td> <td>94</td> </tr> <tr> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5">N-E</td> <td rowspan="5">S-N</td> <td>Instalacion de 1 semaforo de piso</td> <td></td> <td></td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>Instalacion de fuente electronica</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suministro e instalacion de 2 mts coraza flexible</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suministro e instalacion de 5 mts cable 4x18</td> <td></td> <td></td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>Construccion de 3 empalmes</td> <td></td> <td></td> <td>94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Se realiza canalizacion de 1 mts en adogan xaxzo</td> <td></td> <td>4pm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	Carrera 46 Calle 53	S-W	N-S	Instalacion de 1 semaforo de piso	8 am		212	Instalacion de fuente electronica			-	Suministro e instalacion de 1 mts coraza flexible				Suministro e instalacion de 4 mts cable 4x18			215	Construccion de 3 empalmes			94		N-E	S-N	Instalacion de 1 semaforo de piso			212	Instalacion de fuente electronica			-	Suministro e instalacion de 2 mts coraza flexible			-	Suministro e instalacion de 5 mts cable 4x18			215	Construccion de 3 empalmes			94				Se realiza canalizacion de 1 mts en adogan xaxzo		4pm	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM																																																									
Carrera 46 Calle 53	S-W	N-S	Instalacion de 1 semaforo de piso	8 am		212																																																									
			Instalacion de fuente electronica			-																																																									
			Suministro e instalacion de 1 mts coraza flexible																																																												
			Suministro e instalacion de 4 mts cable 4x18			215																																																									
			Construccion de 3 empalmes			94																																																									
	N-E	S-N	Instalacion de 1 semaforo de piso			212																																																									
			Instalacion de fuente electronica			-																																																									
			Suministro e instalacion de 2 mts coraza flexible			-																																																									
			Suministro e instalacion de 5 mts cable 4x18			215																																																									
			Construccion de 3 empalmes			94																																																									
			Se realiza canalizacion de 1 mts en adogan xaxzo		4pm																																																										
EQUIPO EN OBRA:																																																															
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA																																																															
VERIFICACIÓN																																																															
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA																																																													
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ																																																													
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche																																																													
FIRMA <i>MV</i>	FIRMA <i>CAD</i>	FIRMA																																																													
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría																																																													

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
RIV		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	30/04/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	W12 049		DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Luis Fernando G. A.		7.070.801.024								
Eduardo Torres		7028030484								
Forza Luis Rodriguez		PPT 1177342								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CR 52 CH 300	SUR	OROC	Demolicion de un piso de concreto de 60x60x40.				10:30		1	
			Construccion de una caja de 60x60.					4:10	35	
EQUIPO EN OBRA:										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA			FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4690105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4690105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 30 04 2026	SECO	CUMPLE	CUMPLE
DIA: JUEVES	LLUVIOSO	SI	SI
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Carlos Montes	71480675		
Alvaro Oquendo	15485477		
Miguel Angel	1018229962		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
Cra 52 x 14	Separador	N. S	Retiro de 1 semáforo vehicular de menzula, retiro de 1 semáforo vehicular de poste, retiro de 1 semáforo peatonal, retiro de 1 semáforo para ciclistas, retiro de 1 disco direccional, retiro de 21 mts de cable de control 4x16, retiro de 1 brazo de menzula, retiro de 1 poste de menzula
			7:00 AM 4 PM 170
			172
			172
			179-173
			166
			203
			207
			208
			208
			208
			220
			215
			215
			94
			-
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	24-30-09-2025	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DÍA:	VIEVES JUEVES				UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN	ESCOMBROS
VEHÍCULOS:					SI NO	SI NO	SI NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
William Chaves							
Luis Lozano							
Laura Pelilla							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
Movilidad			se apoyó logístico en botiga de movilidad y personal cada día			8:00	4:30
	24-09-2025		viernes dos personas - Luis Lozano - William Chaves				
	30-09-2025		viernes 2 personal Laura pelilla - William Chaves				
EQUIPO EN OBRA:							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA	FIRMA	FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CAUDAD						SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	30 Abril 2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO
DÍA:	Jueves.										
VEHÍCULOS:											
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Yan Carlos usuga		1.214.729.941									
Jose Perez		PPT 5.240.599									
Velson Canas		1.035.861.703									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS						HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Calle 43Ax	S-E	W-E	Revisión de semáforos peatonales apagados se encuentra el cable cortado en la caja de inspección.								
Calle 1Sur			Construcción de empalme eléctrico 03 unidades (2 en una inspección, 1 en semáforo peatonal)								94
			Soldadura de tapa de caja de inspección 03 unids								262
			Retiro de lámpara peatonal roja estática mala.								195
			Instalación de lámpara peatonal roja estática de segunda.								218
Calle 48Ax	S-E	S-E	Retiro de lámpara vehicular china 3 (VAR) a poste								195
calle 4Sur			2 Rojas - 2 Amarillas - 2 verdes.								
Peatonal puente			Instalación de lámpara vehicular china 3 (VAR) de segunda a poste								218
Cst. Jocc			2 Rojas - 2 Amarillas - 2 Verdes.								
			Construcción de empalme eléctrico 02 unidades.								94
EQUIPO EN OBRA:											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
ELABORÓ			RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
NOMBRE: María Victoria Durango			REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ				
FIRMA [Firma]			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
CARGO: Auxiliar de Residencia			FIRMA [Firma]				FIRMA				
			CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoria				

 Alcaldía de Medellín Municipio de Medellín		 UNION TEMPORAL EN MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
 CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025		 RAY		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	01-ABRIL-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	CIOS					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CIOS			Suministro de 134 Herrajes de 50x50. Metálicos con tapa.							9 -
CIOS			Suministro de 20 Herrajes de 60x60 Metálicos con tapa.							11 -
CIOS.			Suministro de 188 tornillos 5/8" para fabricación de Herrajes Metálicos.							15 -
			Suministro de 120 tornillos 5/8".							15 -
EQUIPO EN OBRA:										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA		FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría						

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 13.

PERSONAL

LIQUIDADO

PAZ Y SALVO LABORAL

Codigo A029

Yo, Francisco Javier Nieves Valencia identificado (a) con cedula de ciudadanía No 91446091 declaro que la firma UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No UT SIT MEDELLIN cuyo objeto es Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de Semaforos en el Distrito Especial de Medellin


Por consiguiente declaro a la Empresa a Paz y Salvo por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja el 30 de Abril de 2026.

Atentamente

 91446091

Francisco Javier Nieves Valencia
CARGO : Auxiliar de Mantenimiento
C.C. 1096232225



HUELLA INDICE DERECHO

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



**UNION TEMPORAL SIT
MEDELLIN**
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@g
mail.com



Periodo de Pago: **20260401 - 20260430**

Comprobante Número: **210**

Fecha y hora de generación: **04/05/2026 - 07:49 AM**

Fecha y hora de expedición: **04/05/2026 - 07:50 AM**

Empleado: **Francisco Javier Nieves Valencia**

Ciudad: **Medellín**

Identificación: **91446091**

Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**

Salario básico: **\$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 249.096
Provisión de Cesantías*				0	\$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	\$ 19.992
Provisión de Prima*				0	\$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	\$ 73.013
Total Ingresos					\$ 2.426.205

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	\$ 70.036
Total Deducciones		\$ 140.072

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 2.286.133

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 2.286.133

Soporte de pago: DNE210

CUNE:

2ab250f8c890e8670eb16ce0d9fdab138ced5ca2f2a54f9978306b68aa916df6de64bb794b332908b8fe4494fe58afb0

[Handwritten signature] 2.286.133

PAZ Y SALVO LABORAL

Codigo A020

Yo, Johan Ramirez Lopera identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1015186405 declaro que la firma UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No UT SIT MEDELLIN cuyo objeto es Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de Semaforos en el Distrito Especial de Medellin

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja el 30 de Abril de 2026.


Atentamente

Johan Ramirez

Johan Ramirez Lopera


CARGO : Auxiliar de Mantenimiento

C.C. 1096232225




HUELLA INDICE DERECHO

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT
MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com



Periodo de Pago: **20260401 - 20260430**

Comprobante Número: **185**

Fecha y hora de generación: **04/05/2026 - 07:49 AM**

Fecha y hora de expedición: **04/05/2026 - 07:50 AM**

Empleado: **Johan Ramirez Lopera**

Ciudad: **Medellín**

Identificación: **1015186405**

Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**

Salario básico: **\$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				28	\$ 1.634.178
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	\$ 232.489
Licencia remunerada	20/04/2026	20/04/2026		1	\$ 58.364
Provisión de Cesantías*				0	\$ 160.355
Provisión de Intereses de cesantías*				0	\$ 19.243
Provisión de Prima*				0	\$ 160.355
Provisión de Vacaciones*				0	\$ 70.579
Total Ingresos					\$ 2.335.563

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 67.702
Fondo de pensión	4.00	\$ 67.702
Total Deducciones		\$ 135.404

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
Licencia no remunerada	22/04/2026	22/04/2026	1

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	\$ 2.200.159
--	---------------------

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 2.200.159

Soporte de pago: DNE185


CUNE:

9fc30f3ed3b7e048e24a0f9b977d726312455d84e320c86c2a3c1900a04082fea3e5f8b4bac7a494ff05ac58357f085

Johan Ramirez


Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT
MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com



Periodo de Pago: 20260401 - 20260430

Comprobante Número: 184

Fecha y hora de generación: 04/05/2026 - 07:49 AM

Fecha y hora de expedición: 04/05/2026 - 07:50 AM

Empleado: Moises David Reyes Amaya

Ciudad: Medellín

Identificación: 1002500113

Cargo: Auxiliar de Mantenimiento

Salario básico: \$1.750.905

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	3	\$ 29.845
Provisión de Cesantías*				0	\$ 169.086
Provisión de Intereses de cesantías*				0	\$ 20.290
Provisión de Prima*				0	\$ 169.086
Provisión de Vacaciones*				0	\$ 73.013
Total Ingresos					\$ 2.461.320

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 71.230
Fondo de pensión	4.00	\$ 71.230
Total Deducciones		\$ 142.460

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	\$ 2.318.860
---	--------------

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 2.318.860

Moises A.

Soporte de pago: DNE184

CUNE:

0c4937d814e97e61ee4060dc4e58fe526dc0a1b6203afd38a7f5b567cb316b9dfe97efe870fb72c91bdeade17af14a53

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO LABORAL

Codigo A006

Yo, Moises David Reyes Amaya identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1002500113 declaro que la firma UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No UT SIT MEDELLIN cuyo objeto es Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de Semaforos en el Distrito Especial de Medellin

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja el 30 de Abril de 2026.

Atentamente



Moises David Reyes Amaya
CARGO : Auxiliar de Mantenimiento
C.C. 1096232225



HUELLA INDICE DERECHO

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 14.

CERTIFICADO DE

EMPRESA DE

MUJERES



Sergio Andrés Díaz Montañez

**Contador Público Especialista en Tributaria
& Revisoría Fiscal.**

☎ 310 205 1725

✉ sergio.andresdiaz@hotmail.com

📍 Trans. 49 # 10A - 01 Edificio Terzetto - oficina 406

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

REVISADO EL LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD SERVICIVIL SAS IDENTIFICADO CON NIT 800147909-3 DESDE EL DÍA 15 JUNIO DEL AÑO 2021 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, SE ENCONTRÓ LA SIGUIENTE COMPOSICION ACCIONARIA, ADEMAS SE CERTIFICA QUE LOS ACCIONISTAS SON COLOMBIANOS.

CAPITAL AUTORIZADO	\$ 580.000.000.
No DE ACCIONES	1000
VALOR NOMINAL	\$ 580.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 580.000.000
No DE ACCIONES	1000
VALOR NOMINAL	\$580.000

ACCIONISTA	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C.	13893413
No DE ACCIONES	490
PARTICIPACIÓN	49%
VALOR TOTAL ACCIONES	\$ 284.200.000

ACCIONISTA	NELSY VANEGAS CALDERON
C.C.	63459480
PARTICIPACIÓN	51%
No DE ACCIONES	510
VALOR TOTAL ACCIONES	\$ 295.800.000

DADO EN BARRANCABÉRMEJA, A LOS 09 DIAS DE FEBRERO DE 2026

SERGIO ANDRÉS DÍAZ MONTAÑEZ

T.P 187097-T
CONTADOR PÚBLICO

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 15.

CAMARA DE

COMERCIO



CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 800147909-3
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 21568
Fecha de matrícula: 22 de noviembre de 1991
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 30 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : servicivil_ltlda@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6102194
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3125486349

Dirección para notificación judicial : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico de notificación : servicivil_ltlda@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 2370 del 28 de octubre de 1991 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 1991, con el No. 912486 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIVIL LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se inscribió Transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se decretó Cambio de nombre de SERVICIVIL LIMITADA por SERVICIVIL S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03

Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

HABILITACIÓN (ES) ESPECIAL (ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Por Acta No. 019 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea General de Accionistas, inscrita el 06 de noviembre de 2024 se reformo así: Artículo 2. La sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de actividades tendientes a la realización de obras arquitectónicas, de urbanismo e ingeniería, bien sea civiles, eléctricas, electrónicas, mecánicas, ambientales, petroleras, energéticas, hidráulicas, de servicios públicos, saneamiento básico, mineras, de telecomunicaciones, agrícolas, rurales, de sistemas de información, vías y transportes, en todo lo relacionado con asesorías, ejecución, planeación, preparación, diseño, montaje y construcción de todo tipo de obras, estructuras, instalación de plantas de toda clase, mantenimiento y operación de las mismas, excavación de pozos profundos, suministros de materiales de construcción y de cantera, industria minera, economía minera, comercialización, exploración, explotación, trituración, beneficio y distribución de minerales comunes, exploración minera, geología minera, exploración y evaluación de reservas mineras,, minería a cielo abierto, minería subterránea, procesamiento de minerales, manejo y transporte de minerales, metalurgia metales ferrosos y no ferrosos, exploración y explotación de minerales usuales (comodietis), cobre, zinc, plomo, níquel, mineral de hierro, bauxita, alúmina, aluminio, oro, plata, platino, fosfatos, magnesio, cromo, lignito, antracita, metales raros. La prestación de toda clase de servicios de consultoría, inventories técnicas y administrativas en las diferentes áreas anteriormente mencionadas, el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social según la legislación vigente, la promoción, compra, venta, arriendo y administración de inmuebles tanto urbanos como rurales, urbanización de terrenos y la construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercializa con, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación, transformación de todo tipo de maquinaria pesada y equipos destinados a la construcción, a la explotación agrícola, a la explotación minera, a la explotación acuífera, en el área de servicios públicos, petrolífera y sus derivados, industria petroquímica, de biocombustibles, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercialización, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación transformación de vehículos de carga, vehículos de transporte de pasajeros, bien sea terrestres o fluviales, fabricación y comercialización de equipos y o dispositivos de control de tránsito con y sin registro gráficos de infracciones, (semáforos, equipos de control, botoneras peatonales, dispositivos sonoros, cámaras de seguridad, cámara de foto – detección, materiales eléctricos y electrónicos), suministros, instalación y programación de software para controladores de semáforos ,equipos de foto detección y en general para entidades de tránsito y transporte , en el desarrollo de todo lo anterior que comprende el objeto social de la empresa, se podrán constituir en territorio nacional o extranjero, sucursales o agencias, podrá promover y fundar establecimientos, almacenes de depósitos, fabricas; podrá además adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones, adquirir toda clase de derecho mineros, permisos o licencias, ejecutar o conformar asociaciones, aportes y/o concesiones, uniones temporales, para explorar y explotar minas o yacimientos, , explotar o registrar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal u objeto contractual que pueda desarrollarse, dentro de los parámetros del objeto social, girar, aceptar, endosar, cobrar, pagar, negociar, toda clase de títulos valores, bursátiles, de inversión, celebrar contratos de mutuo, seguro y transporte, agencia comercial, cuentas en participación y demas contratos comerciales, concurrir a licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas, celebrar cualquier tipo de contratos con entidades bancarias o financieras y concurrir a la formación de aportes a entidades de crédito como bancos, corporaciones financieras, dedicadas a la financiación de actividades comprendida dentro de los objetivos sociales, efectuar cualquier tipo de tramites tendiente a importar o exportar mercancías de productos en cumplimiento del objeto social. Parágrafos: en desarrollo o cumplimiento de tal objeto, la sociedad podrá: hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, todas las actividades o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03

Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

finances sociales. participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre' estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los fines sociales.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 580.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 580.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	\$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 580.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

representante legal: Artículo 27. Se hace transformación según acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente para sus faltas temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Artículo 28. Se hace transformación según acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieran reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018 con el No. 25347 del libro IX, se designó a:

CARGO**NOMBRE****IDENTIFICACION**

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO	C.C. No. 13.893.413
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VANEGAS CALDERON	C.C. No. 63.459.480

REVISORIA FISCAL TEXTUAL

** Revisor fiscal: ** Que por acta no. 0000003 De asamblea de accionistas del 2 de diciembre de 2016 , inscrita el 5 de diciembre de 2016 bajo el numero 00022750 del libro ix , fue(ron) nombrado(s): Nombre identificacion revisor fiscal murillo villarreal pablo emilio c.C.13891253 Tarjeta profesional: 14953 T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

*) E.P. No. 1122 del 10 de mayo de 1993 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3365 del 06 de abril de 1994 del libro IX
*) E.P. No. 2009 del 25 de julio de 1995 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3968 del 01 de agosto de 1995 del libro IX
*) E.P. No. 2076 del 12 de julio de 1996 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	4587 del 02 de septiembre de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 2499 del 21 de noviembre de 2007 de la Notaria Primera Barrancabermeja	11284 del 30 de noviembre de 2007 del libro IX
*) E.P. No. 1827 del 26 de julio de 2011 de la Notaria Primera Barrancabermeja	14715 del 28 de julio de 2011 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16185 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16188 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16189 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 746 del 21 de abril de 2014 de la Notaria Primera Barrancabermeja	18588 del 05 de mayo de 2014 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21205 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21206 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta De Socios	25347 del 17 de octubre de 2018 del libro IX
*) Acta No. 18 del 15 de julio de 2024 de la Asamblea General De Accionistas	35939 del 23 de julio de 2024 del libro IX
*) Acta No. 19 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	36444 del 06 de noviembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4390
Actividad secundaria Código CIIU: E3900
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SERVICIVIL BCA
Matrícula No.: 62658
Fecha de Matrícula: 27 de noviembre de 2006
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : 62 NO 43 151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio: Barrancabermeja, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3.214.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio



CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 16.

CEDULAS

PERSONAL 100%

COLOMBIANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.151.966.785**

BARBOSA YEPES

APELLIDOS

CHRISTIAN

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1998**

CALI
(VALLE)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-JUN-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100150-00838444-M-1151966785-20160702

0050330467A 1

45220169

CÉDULA DE CIUDADANÍA  REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.037.368.900

Apellidos
BEDOYA VALENCIA

Nombres
ANDRES FERLEY

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
10 JUN 1990

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MACEO (ANTIOQUIA)


Fecha y lugar de expedición
11 DIC 2008, MACEO

Fecha de expiración
22 SEPT 2033

Firma
andres Bedoya



032536593



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL032536593601175<<<<<<<<<<
9006108M3309221COL1037368900<3
BEDOYA<VALENCIA<<ANDRES<FERLEY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.049.894.058

GONZALEZ MORA

APELLIDOS

CARLOS MARIO

NOMBRES

Carlos Mario

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-2001**
HATILLO DE LOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

11-ABR-2019 HATILLO DE LOBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-0300150-01300080-M-1049894058-20220602

0079538656A 1

8504797463

ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.076.817.116

MENA CORDOBA

APELLIDOS

CRISTIAN

NOMBRES

Cristian Mena Cordoba

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1991

CONDOTO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-AGO-2009 CONDOTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALIMDO VACHA



A-1701300-00844744-M-1076817116-20160824 0050726215A 1 45839510

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

04-AGO-1992

**MONTERIA
(CORDOBA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M


SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118

0024863480A 1

34994022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118 0024863480A 1 34994022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.096.218.904**
PALACIO ACEVEDO

APELLIDOS
JAIME ESTIVEN

NOMBRES

Stiven

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1992**

MACEO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

AB+

G.S. RH

M

SEXO

15-DIC-2010 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00570561-M-1096218904-20140508

0038389502A 1

2862858412

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.982.270**

ALTAMIRANDA DIAZ

APELLIDOS

JENIFER DEL CARMEN

NOMBRES

Jenifer Altamiranda Diaz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1992**
MAGANGUE
(BOLIVAR)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-OCT-2010 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0502800-00279702-F-1052982270-20110201

0025674797A 1

35708396

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS

APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

24-DIC-2001

**DIBULLA
(LA GUAJIRA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109

0069589379A 1

53711091

IA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS

APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-2001**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 0069589379A 1 53711091

CÉDULA DE
CIUDADANÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Apellidos

CHAVARRIA BUILES

NUIP 98.681.775

Nombres

WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad

COL

Estatura

1.83

Sexo

M

Fecha de nacimiento

03 SEPT 1977

G.S.

O+

Lugar de nacimiento

SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición

15 JUN 1996, SABANALARGA

Fecha de expiración

22 JUL 2034

Firma

W.A. - Ch. B.



08

050913923




REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



ICCOL050913923601217<<<<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE

NUIP 4.852.397

Sexo
M

G.S.
O+

Fecha y lugar de expedición
19 NOV 1983, BAHIA SOLANO

Alcides Moscoso

Fecha de expiración
18 MAR 2033

CO

020198477



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL020198477417008<<<<<<<<<
6402053M3303182COL4852397<<<<0
RIASCO<REYES<<AGUEDO<ALCIDES<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.002.500.113**

REYES AMAYA

APELLIDOS

MOISES DAVID

NOMBRES

Moises Reyes A

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1999**
MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

B+

G.S. RH

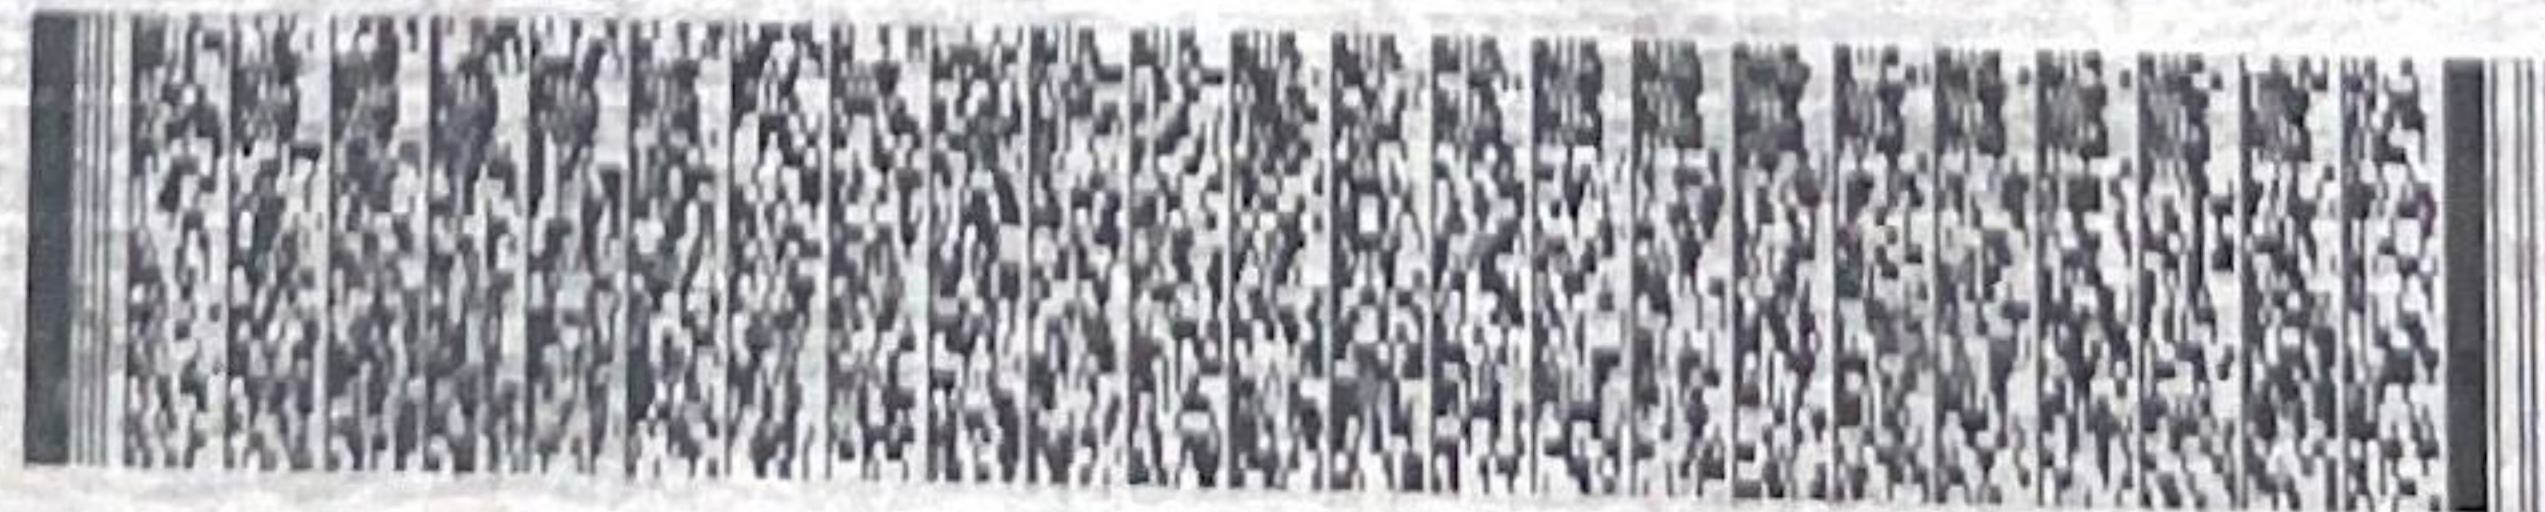
M

SEXO

05-ENE-2018 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0502800-00972751-M-1002500113-20180125

0059290273A 1

49259471

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.152.187.124

GOMEZ MEJIA

APELLIDOS

ANYELO DANIEL

NOMBRES

Anyelo Daniel Gómez M.



22-MAY-1990

REGIÓN DE NARCOTRÁFICO

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

UNIDAD DE NARCOTRÁFICO

1.81

A-

M

ESTADURA

G.S. RH

SECO

21-MAY-2001 MEDELLIN

REGIÓN MINOR DE EXPEDICIÓN

Antonio José Martínez

INDUSTRIAL

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ TORRES



SP-0100159-0015507444-0152167124-20000425

000000/200004 1

2002-10-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.096.247.535

PALACIO ACEVEDO

APELLIDOS

BRAYAN ESMID

NOMBRES

Brayan Palacio

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1998

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

05-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2701900-01294488-M-1096247535-20220505

0079078024A 1

9918929745



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.017.144.470

DIAZ PEÑA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

Carlos Alberto Diaz P

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

10-ENE-1987

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

10-FEB-2005 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso
REGISTRADORA NACIONAL
ALFONSO LOPEZ



P-0100100-14136885-M-1017144470-20060103

0019906003H 01 197206634

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.537.976**

ROA SILVA

APELLIDOS

JUAN JOSE

NOMBRES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. R. Silva', written over a horizontal line.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

21-ABR-2000

**MEDELLIN
(ANTIOQUIA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

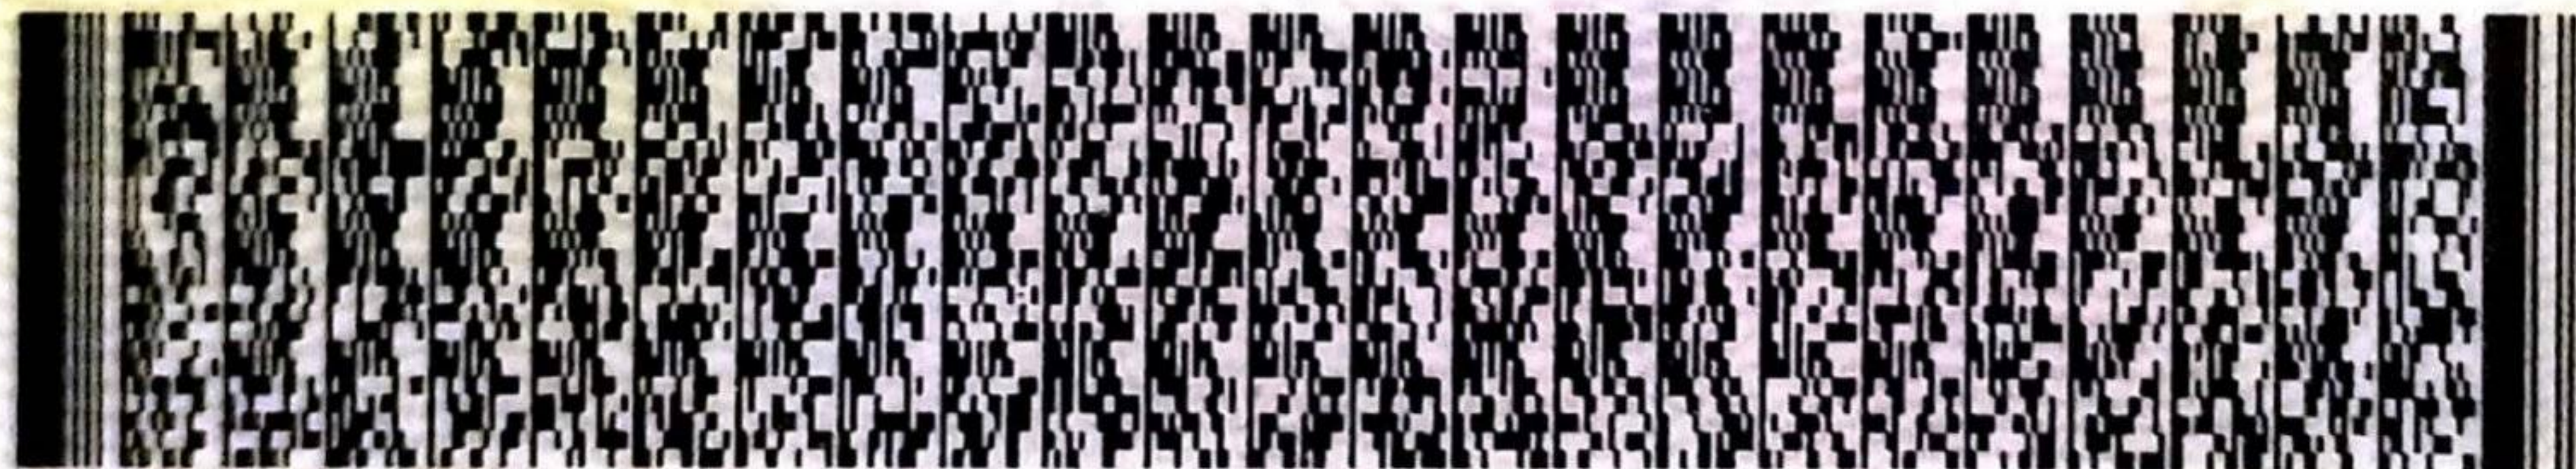
M.

SEXO

17-MAY-2018 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0100150-01015231-M-1000537976-20180618

0061569756A 1

50040024

Powered by

CS CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.446.091**

NIEVES VALENCIA

APELLIDOS

RANCISCO JAVIER

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M


SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610

00444457306A 1

7013424191



FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1975

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO


31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0100150-P0713668-M-0091446191-20150610

0044457306A 1

7013424191

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.605.230**
MORENO VALENCIA

APELLIDOS
JAIR ALONSO

NOMBRES
Jair Moreno

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1990**
MACEO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **O+** **M**
ESTATURA C.S. RH SEXO

07-JUL-2008 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0104900-00488737-M-1037605230-20131007 0035334768A 1 2172573142

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.571.457**

BELEÑO GALVIS

APELLIDOS

JHON DEIVIS

NOMBRES

Jhon Deivis Bo

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-2002**

AGUACHICA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

29-ENE-2020 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Alexander Vega Rocha
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1207500-01131954-M-1007571457-20200213

0070082283A 1

52959355



NUIP 11.222.857



ANDRADE GARCIA

JOSE ALCIBIADES

Sexo

1.65

M

GS.

24 JUN 1977

B+

Lugar de nacimiento

BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición

19 MAR 1997, GIRARDOT

Firma

Fecha de expiración

17 MAR 2033

.CO

020217615



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020217615015109<<<<<<<<<

• 7706242M3303171C0L11222857<<<8

ANDRADE<GARCIA<<JOSE<ALCIBIADE

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **32220126**

GIRALDO BOTERO
APELLIDOS

LINA MARIA
NOMBRES

Lina Giraldo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1982**

SANTUARIO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-ENE-2001 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0125600-14092643-F-0032220126-20010814 0090501194P 01 100861994

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **42.683.289**

DURANGO ARENAS

APELLIDOS

MARIA VICTORIA

NOMBRES

Maria Victoria Durango

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

01-FEB-1967

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

14-DIC-1987 COPACABANA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-0110300-00903448-F-0042683289-20170509

0055312616A 2

9999877919

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.913.019

VIVAS MANDON

APELLIDOS

SIMEON FERNANDO

NOMBRES

Simeon F. VIVAS

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1998**
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

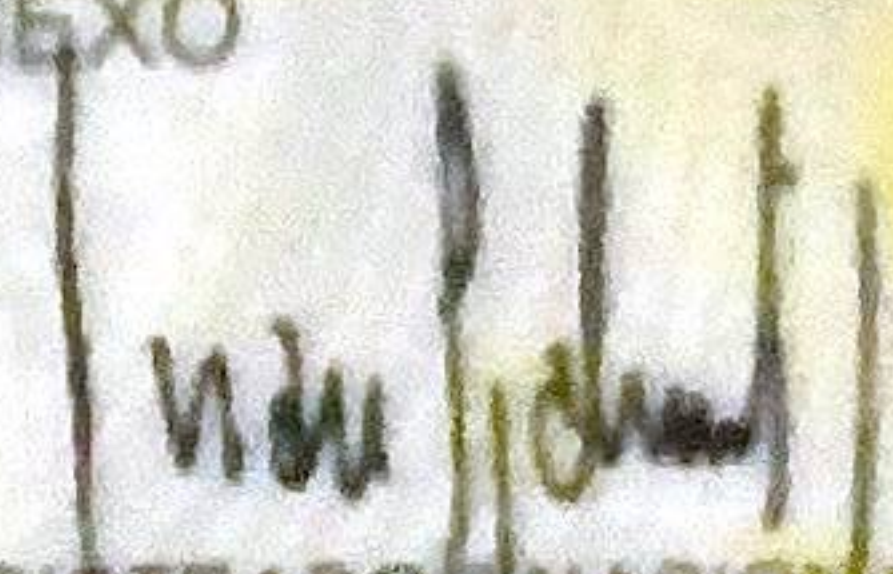
G.S. RH

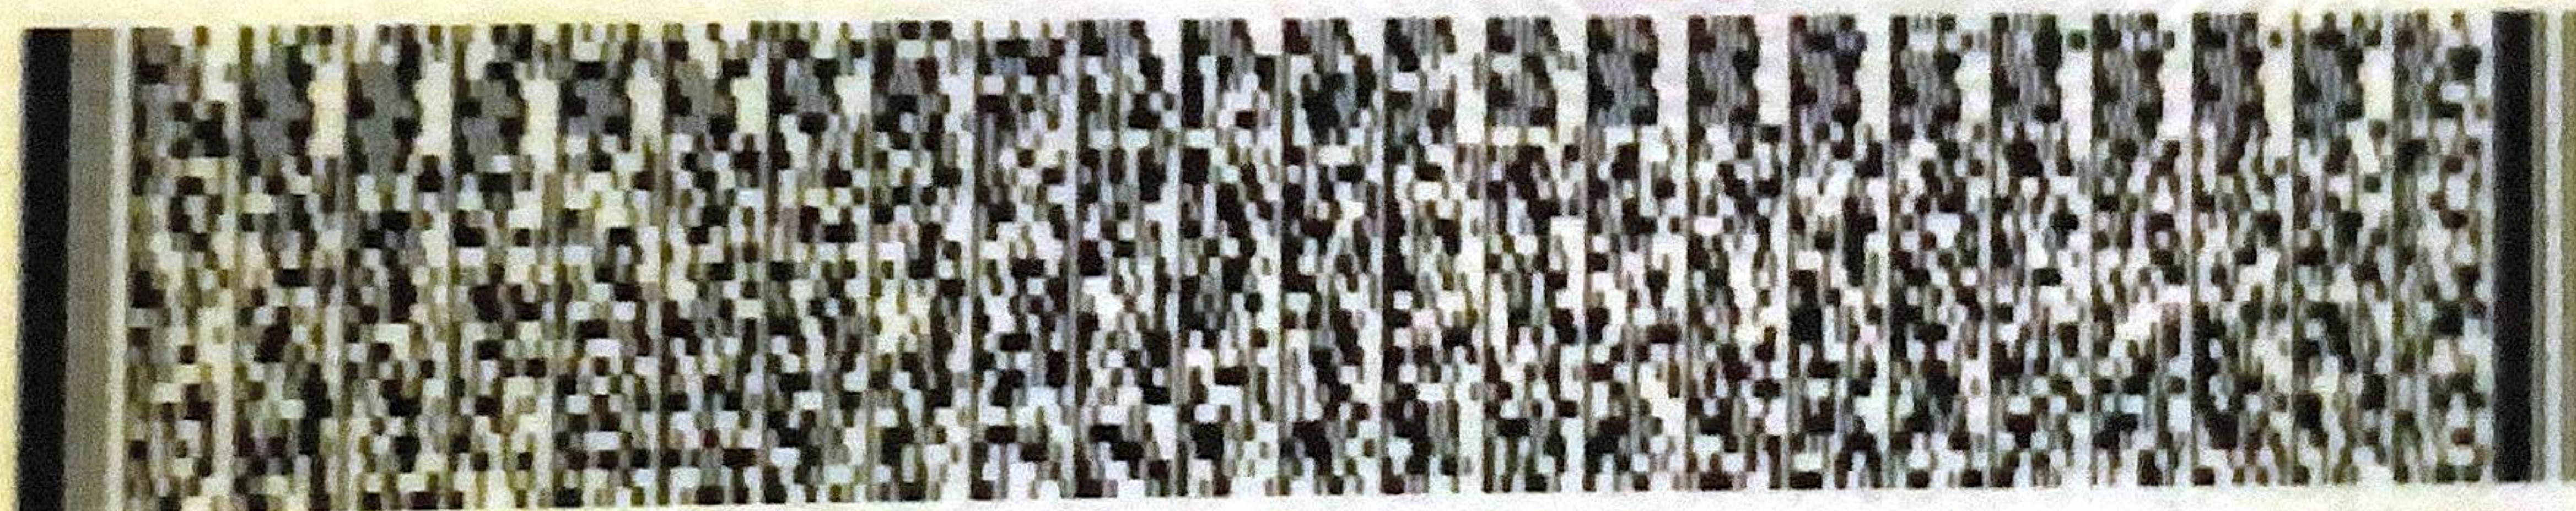
M

SEXO

16-FEB-2016 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1207500-00801034-M-1065913019-20160314

0048941810A 1

45800978



FECHA DE NACIMIENTO

31-DIC-1996

CONCORDIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O-

G.S. RH

M
SEXO

29-ENE-2016 HISPANIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACIA

INDICE DERECHO



P-0115000-00812631-M-1039597832-20160411

0049254415G 1

45539531

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.039.597.832

GALEANO PARRA

APELLIDOS

YEISON ALEJANDRO

NOMBRES

Yeison Alejandro Galeano P

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
APARTADO
(ANTIOQUIA)

31-MAR-2000

LUGAR DE NACIMIENTO
1.85

O+

M


ESTATURA


G.S. RH

SEXO

11-ABR-2018 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0103500-01001737-M-1001025750-20180430

0060997701A 1

50027940

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.001.025.750**

ACOSTA SIMANCA

APELLIDOS

HERNAN DARIO

NOMBRES

H. Acosta

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.791.906**
BARBOSA PALOMINO

APELLIDOS
FRANKLIN

NOMBRES

Franklin Barbosa P.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1971**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

31-OCT-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00032442-M-0016791906-20080728

0001536733A 1

2020021788

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.015.186.405**

RAMIREZ LOPERA

APELLIDOS
JOHAN

NOMBRES

JOHAN Ramirez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-ABR-2002**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-2020 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-0100160-01318059-M-1015186405-20220908 0084735526A 3 8505122346

CÉDULA DE
CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.017.221.580



Apellidos
PADILLA GIRALDO

Nombres
LAURA MARCELA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.66	F
Fecha de nacimiento	G.S.	
29 JUL 1994	O+	
Lugar de nacimiento		
PALMIRA (VALLE)		

Fecha y lugar de expedición
10 AGO 2012, MEDELLIN

Firma

Laura MPP

Fecha de expiración
18 ENE 2034




.CO

037809496



Hernan Penagos Giraldo
REGISTRADOR NACIONAL
Hernan Penagos Giraldo



ICCOL037809496201001<<<<<<<<<<
9407299F3401181COL1017221580<1
PADILLA<GIRALDO<<LAURA<MARCELA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91452201**

LOZANO ROJAS
APELLIDOS

LUIS DANOVER
NOMBRES

Luis Danover Lozano

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1977**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

19-JUN-1996 ARATOCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0500100-30104581-M-0091452201-20030127

02482 03024A 01 129453752

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	MARZO 2026		Versión: 01

ANEXO 17.

CERTIFICADO

PERSONAL 100%

COLOMBIANO

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL**

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Calle 44 # 52 165

Medellín, Antioquia

127 - 2026

El suscrito JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, bajo la gravedad de juramento, certifico que durante el **período comprendido entre el 01 de Abril de 2026 y el 30 de Abril de 2026**, para la ejecución del Contrato de Obra No. 4600105555 de 2025, cuyo objeto es realizar el mantenimiento y las obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín, **se destinó el cien por ciento (100 %) de empleados y/o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad colombiana para la ejecución del objeto contractual.**

Lo anterior se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional y Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, correspondientes al Proceso de Contratación No. 0070007743.

En constancia, se firma en Medellín, Antioquia, a los **Cuatro (04)** días del mes de **Mayo** de **2026**.

Cordialmente,



JORGE TRUJILLO NIÑO

C.C 13.893.413 de Barrancabermeja

R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 18.

ACTA MES DE

MARZO

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>						CONTRATO 4600105555 DE 2025	FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
						OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
							DURACIÓN	865 DÍAS	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
						CONTRATISTA: UT SIT MEDELLÍN	ADICIONES	\$ -	% EJECUTADO ACUMULADO	40,65%
						INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240		
							% EJECUTADO EN EL PERIODO	4,41%		
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total	
OBRA CIVIL										
1	Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m2	1,0	\$ 48.280,00	\$ 48.280,00	6,94	\$ 335.063,00	212,02	10.236.325,60	
2	Demolición base controlador local. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	\$ 159.885,00	\$ 159.885,00	9,00	\$ 1.438.965,00	29,00	4.636.665,00	
3	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15)	m	1,0	\$ 148.053,00	\$ 148.053,00	0,00	\$ 0,00	67,71	10.024.668,63	
4	Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	m	1,0	\$ 14.768,00	\$ 14.768,00	0,00	\$ 0,00	21,70	320.465,60	
5	Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	\$ 147.881,00	\$ 147.881,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
6	Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de vía. Incluye cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	\$ 260.770,00	\$ 260.770,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
7	Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base granular, cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	\$ 656.913,00	\$ 656.913,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
8	Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 14.384,00	\$ 14.384,00	0,00	\$ 0,00	1,00	14.384,00	
9	Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior y anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	\$ 534.013,00	\$ 534.013,00	134,00	\$ 71.557.742,00	614,00	327.883.982,00	
10	Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento.	Un	1,0	\$ 626.290,00	\$ 626.290,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
11	Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	\$ 723.504,00	\$ 723.504,00	20,00	\$ 14.470.080,00	70,00	50.645.280,00	
12	Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, recolección de escombros	Un	1,0	\$ 56.495,00	\$ 56.495,00	0,00	\$ 0,00	1,00	56.495,00	
13	Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPa para empotramiento de elemento	Un	1,0	\$ 153.601,00	\$ 153.601,00	37,00	\$ 5.683.237,00	833,00	127.949.633,00	
14	Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm	Un	1,0	\$ 103.386,00	\$ 103.386,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
15	Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Un	1,0	\$ 29.167,00	\$ 29.167,00	308,00	\$ 8.983.436,00	1.368,00	39.900.456,00	
16	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 50x50 cm medida exterior, incluye tornillos de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	\$ 625.739,00	\$ 625.739,00	0,00	\$ 0,00	50,00	31.286.950,00	

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026			
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026	
						DURACIÓN		865 DÍAS		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026	
						VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250	
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%	
		INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED				% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%					
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total				
17	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 60x60 cm medida exterior, incluye tornillos de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	\$ 776.380,00	\$ 776.380,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
18	Suministro e instalaci3n de Concreto de 21 Mpa hecho en obra.	m3	1,0	\$ 743.427,00	\$ 743.427,00	0,00	\$ 0,00	2,89	2.148.504,03				
19	Construcci3n de canalizaci3n en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora de concreto, demolici3n de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavaci3n, botada de escombros al botadero oficial, instalaci3n de 2 tubos electricos DB de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mec3nicamente.	m	1,0	\$ 256.892,00	\$ 256.892,00	0,00	\$ 0,00	38,50	9.890.342,00				
20	Construcci3n de canalizaci3n en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora de concreto, demolici3n de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavaci3n, botada de escombros al botadero oficial, instalaci3n de 2 tubos el3ctricos IMC de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mec3nicamente	m	1,0	\$ 308.637,00	\$ 308.637,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
21	Suministro e instalaci3n provisional de pavimento flexible en fri3 de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, seg3n requerimientos de la Secretar3a de Infraestructura F3sica de Medell3n.	m	1	\$ 125.098,00	\$ 125.098,00	0,00	\$ 0,00	36,20	4.528.547,60				
22	Construcci3n Canalizaci3n en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolici3n de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavaci3n, botada de escombros, instalaci3n de dos tubos el3ctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento r3gido y la cimentaci3n de la tuber3a, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.	m	1	\$ 292.727,00	\$ 292.727,00	13,80	\$ 4.039.633,00	34,15	9.996.627,05				
23	Construcci3n Canalizaci3n en adoqu3n de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavaci3n, botada de escombros, instalaci3n de dos tubos el3ctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentaci3n, reinstalaci3n adoquines y reposici3n de adoquines deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	\$ 156.993,00	\$ 156.993,00	9,20	\$ 1.444.336,00	119,54	18.766.943,22				
24	Construcci3n de canalizaci3n en adoqu3n de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavaci3n, botada de escombros, instalaci3n de un tubo el3ctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentaci3n, reinstalaci3n de adoquines y reposici3n de adoquines deteriorados , arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	\$ 47.379,00	\$ 47.379,00	0,00	\$ 0,00	2,50	118.447,50				
25	Construcci3n Canalizaci3n en zona verde, incluye descapote, excavaci3n, botada de escombros, instalaci3n de 2 tubos el3ctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalaci3n de la vegetaci3n existente.	m	1,0	\$ 113.988,00	\$ 113.988,00	59,00	\$ 6.725.292,00	144,30	16.448.468,40				

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
						DURACIÓN	865 DÍAS	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
						VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO ACUMULADO	40,65%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED				% EJECUTADO EN EL PERIODO	4,41%				
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
26	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	\$ 20.398,00	\$ 20.398,00	0,00	\$ 0,00	5,10	104.029,80
27	Construcción Canalización en zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 1 1/2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	\$ 27.759,00	\$ 27.759,00	32,50	\$ 902.168,00	35,20	977.116,80
28	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	\$ 31.737,00	\$ 31.737,00	4,40	\$ 139.643,00	70,40	2.234.284,80
29	Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	Un	1,0	\$ 321.237,00	\$ 321.237,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
30	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 2", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	\$ 107.747,00	\$ 107.747,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
31	Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"	Un	1,0	\$ 189.634,00	\$ 189.634,00	0,00	\$ 0,00	4,00	758.536,00
32	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 3", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	\$ 161.859,00	\$ 161.859,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
33	Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estribos de 3/8", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye formaleta metálica y curado. Botada de material sobrante.	Un	1,0	\$ 827.666,00	\$ 827.666,00	1,00	\$ 827.666,00	73,00	60.419.618,00
34	Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 0.8 m, no incluye herraje (marco y tapa) metálico y/o sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	\$ 322.250,00	\$ 322.250,00	2,00	\$ 644.500,00	6,00	1.933.500,00
35	Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa) , fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	\$ 405.108,00	\$ 405.108,00	7,00	\$ 2.835.756,00	30,00	12.153.240,00
36	Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado	m2	1,0	\$ 119.037,00	\$ 119.037,00	0,00	\$ 0,00	107,01	12.738.149,37

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026			
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026	
						DURACIÓN		865 DÍAS		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026	
						VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250	
						ADICIONES		\$ -					
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%	
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED								% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%			
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total				
37	Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en en manual de espacio público	m2	1,0	\$ 155.931,00	\$ 155.931,00	0,00	\$ 0,00	18,96	2.956.451,76				
38	Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m, incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m3	1,0	\$ 52.461,00	\$ 52.461,00	4,78	\$ 250.764,00	13,72	719.764,92				
39	Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"	m	1,0	\$ 85.447,00	\$ 85.447,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
40	Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m. La excavación se pagará en su respectivo ítem.	m	1,0	\$ 91.307,00	\$ 91.307,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
41	Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica	m	1,0	\$ 73.690,00	\$ 73.690,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
42	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1,0	\$ 387.566,00	\$ 387.566,00	0,00	\$ 0,00	6,00	2.325.396,00				
43	Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	\$ 371.481,00	\$ 371.481,00	0,00	\$ 0,00	11,00	4.086.291,00				
44	Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico.	Un	1,0	\$ 32.607,00	\$ 32.607,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
45	Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	\$ 443.993,00	\$ 443.993,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
46	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).	m	1,0	\$ 76.588,00	\$ 76.588,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
47	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	\$ 72.987,00	\$ 72.987,00	13,50	\$ 985.325,00	13,50	985.324,50				
48	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).	m	1,0	\$ 54.610,00	\$ 54.610,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026					
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026			
						DURACIÓN		865 DÍAS		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026			
						VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250			
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				ADICIONES		\$ -							
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%		% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%	
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO					
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total						
49	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"" , incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	\$ 47.767,00	\$ 47.767,00	0,00	\$ 0,00	4,50	214.951,50						
50	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 1 1/2"	m	1,0	\$ 10.610,00	\$ 10.610,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00						
51	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 2"	m	1,0	\$ 12.132,00	\$ 12.132,00	0,00	\$ 0,00	1,05	12.738,60						
52	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 3"	m	1,0	\$ 23.642,00	\$ 23.642,00	0,00	\$ 0,00	22,95	542.583,90						
53	Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o guía). Incluye subbase y arena	m2	1,0	\$ 56.161,00	\$ 56.161,00	1,84	\$ 103.336,00	15,50	870.495,50						
54	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir mínimo el 50% del volumen de la caja.	Un	1,0	\$ 20.032,00	\$ 20.032,00	56,00	\$ 1.121.792,00	600,00	12.019.200,00						
55	Encamisado de tubería pvc en canalizacion existente hasta 50 cm.	Un	1,0	\$ 19.377,00	\$ 19.377,00	9,00	\$ 174.393,00	21,00	406.917,00						
56	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico. Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido	m	1,0	\$ 106.272,00	\$ 106.272,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00						
57	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico. Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido.	m	1,0	\$ 136.627,00	\$ 136.627,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00						
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS														
58	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 3.931.291,00	\$ 3.931.291,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00						
59	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 3.862.147,00	\$ 3.862.147,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00						
60	Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste	Un	1,0	\$ 1.557.489,00	\$ 1.557.489,00	0,00	\$ 0,00	3,00	4.672.467,00						
61	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina , con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 2.144.221,00	\$ 2.144.221,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00						
62	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 2.221.574,00	\$ 2.221.574,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00						

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026			
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026	
						DURACIÓN		865 DÍAS		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026	
						VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250	
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%	
		INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED				% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%					
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total				
63	Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.	Un	1,0	\$ 787.506,00	\$ 787.506,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
64	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	\$ 1.481.576,00	\$ 1.481.576,00	2,00	\$ 2.963.152,00	7,00	10.371.032,00				
65	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	\$ 1.382.865,00	\$ 1.382.865,00	3,00	\$ 4.148.595,00	40,00	55.314.600,00				
66	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de pasta.	Un	1,0	\$ 1.788.944,00	\$ 1.788.944,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
67	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	\$ 2.165.692,00	\$ 2.165.692,00	1,00	\$ 2.165.692,00	6,00	12.994.152,00				
68	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	\$ 1.658.257,00	\$ 1.658.257,00	0,00	\$ 0,00	8,00	13.266.056,00				
69	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo para paso peatonal actuado (pulsado). Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye módulo de conteo, cableado interno y dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	\$ 1.781.158,00	\$ 1.781.158,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
70	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	\$ 1.220.337,00	\$ 1.220.337,00	0,00	\$ 0,00	27,00	32.949.099,00				
71	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal proyector en piso. Incluye ajuste y elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 4.004.506,00	\$ 4.004.506,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
72	Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal.	Un	1,0	\$ 2.243.667,00	\$ 2.243.667,00	8,00	\$ 17.949.336,00	50,00	112.183.350,00				
73	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería de 19.5x97.5 cm.	Un	1,0	\$ 9.476.115,00	\$ 9.476.115,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
74	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	\$ 3.511.437,00	\$ 3.511.437,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026			
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026	
						DURACIÓN		865 DÍAS		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026	
						VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250	
						ADICIONES		\$ -		% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%	
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%	
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED													
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total				
75	Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para ciclistas, de tres aspectos de 100 mm. IP65. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	un	1,0	\$ 1.229.318,00	\$ 1.229.318,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
76	Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, incluye pintura anticorrosivo y acabado en poliuretano.	Un	1,0	\$ 463.039,00	\$ 463.039,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
77	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	\$ 7.556,00	\$ 7.556,00	0,00	\$ 0,00	3.660,00	27.654.960,00				
78	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para semaforización.	m	1,0	\$ 4.101,00	\$ 4.101,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
79	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	\$ 8.546,00	\$ 8.546,00	80,00	\$ 683.680,00	306,00	2.615.076,00				
80	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	\$ 12.789,00	\$ 12.789,00	10,00	\$ 127.890,00	193,00	2.468.277,00				
81	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	\$ 20.225,00	\$ 20.225,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
82	Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8"	m	1,0	\$ 2.583,00	\$ 2.583,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
83	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 3/4" y hebillas) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalización vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	\$ 201.244,00	\$ 201.244,00	5,00	\$ 1.006.220,00	239,00	48.097.316,00				
84	Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.	Un	1,0	\$ 266.799,00	\$ 266.799,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
85	Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalización vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	\$ 104.200,00	\$ 104.200,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
86	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de señalización vial vigente.	Un	1,0	\$ 287.345,00	\$ 287.345,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
87	Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 940.860,00	\$ 940.860,00	0,00	\$ 0,00	7,00	6.586.020,00				
88	Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones.Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm.	Un	1,0	\$ 1.026.702,00	\$ 1.026.702,00	30,00	\$ 30.801.060,00	36,00	36.961.272,00				

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>						CONTRATO 4600105555 DE 2025	FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
						OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
							DURACIÓN	865 DÍAS	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
						CONTRATISTA: UT SIT MEDELLÍN	ADICIONES	\$ -	% EJECUTADO EN EL PERIODO	40,65%
						INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO ACUMULADO	
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total	
89	Suministro, transporte e instalación de percha con aislador	Un	1,0	\$ 75.588,00	\$ 75.588,00	0,00	\$ 0,00	12,00	907.056,00	
90	Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.	Un	1,0	\$ 3.668.548,00	\$ 3.668.548,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
91	Suministro, transporte e instalación de radar para detección de vehículos en intersección semafórica	Un	1,0	\$ 5.276.791,00	\$ 5.276.791,00	7,00	\$ 36.937.537,00	7,00	36.937.537,00	
92	Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local	Un	1,0	\$ 63.406,00	\$ 63.406,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
93	Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de fijación	Un	1,0	\$ 361.923,00	\$ 361.923,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
94	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	Un	1,0	\$ 53.619,00	\$ 53.619,00	427,00	\$ 22.895.313,00	2.190,00	117.425.610,00	
95	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos necesarios para el buen desempeño	Un	1,0	\$ 356.628,00	\$ 356.628,00	1,00	\$ 356.628,00	28,00	9.985.584,00	
96	Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios.	Un	1,0	\$ 17.522,00	\$ 17.522,00	21,00	\$ 367.962,00	21,00	367.962,00	
97	Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación, acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	Un	1,0	\$ 614.727,00	\$ 614.727,00	2,00	\$ 1.229.454,00	7,00	4.303.089,00	
98	Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos	Un	1,0	\$ 8.781,00	\$ 8.781,00	0,00	\$ 0,00	126,00	1.106.406,00	
99	Suministro, transporte e instalación de empalme UY	Un	1,0	\$ 2.077,00	\$ 2.077,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
100	Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10	Un	1,0	\$ 15.558,00	\$ 15.558,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
101	Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	\$ 9.408,00	\$ 9.408,00	0,00	\$ 0,00	1,00	9.408,00	
102	Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra	m	1,0	\$ 9.107,00	\$ 9.107,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
103	Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera	m	1,0	\$ 7.498,00	\$ 7.498,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
104	Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	\$ 10.062,00	\$ 10.062,00	19,00	\$ 191.178,00	167,00	1.680.354,00	
105	Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura poliuretano.	Un	1,0	\$ 92.570,00	\$ 92.570,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
106	Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm	Un	1,0	\$ 122.434,00	\$ 122.434,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
107	Suministro e Instalación de tornillos para flanche.	Un	1,0	\$ 7.763,00	\$ 7.763,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
108	Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10	m	1,0	\$ 12.967,00	\$ 12.967,00	0,00	\$ 0,00	282,00	3.656.694,00	
109	Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14	m	1,0	\$ 9.214,00	\$ 9.214,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
110	Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie	m	1,0	\$ 5.901,00	\$ 5.901,00	157,00	\$ 926.457,00	7.006,00	41.342.406,00	
111	Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie	m	1,0	\$ 6.374,00	\$ 6.374,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
112	Suministro e instalación de tapa bornera	Un	1,0	\$ 113.050,00	\$ 113.050,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
RED DE COMUNICACIONES										
113	Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.	m	1,0	\$ 10.793,00	\$ 10.793,00	450,00	\$ 4.856.850,00	15.333,00	165.489.069,00	
114	Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación.	Un	1,0	\$ 431.593,00	\$ 431.593,00	0,00	\$ 0,00	9,00	3.884.337,00	

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>						CONTRATO 4600105555 DE 2025	FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
						OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
						CONTRATISTA: UT SIT MEDELLÍN	ADICIONES	\$ -	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
						INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO ACUMULADO	40,65%
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total	
115	Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja y adosamiento en cámara o poste	Un	1,0	\$ 379.842,00	\$ 379.842,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
116	Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos.	Un	1,0	\$ 289.775,00	\$ 289.775,00	7,00	\$ 2.028.425,00	68,00	19.704.700,00	
117	Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + Potencias) punto a punto	Un	1,0	\$ 14.471,00	\$ 14.471,00	24,00	\$ 347.304,00	540,00	7.814.340,00	
118	Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica	Un	1,0	\$ 13.093,00	\$ 13.093,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
119	Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica	Un	1,0	\$ 256.359,00	\$ 256.359,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
120	Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC	Un	1,0	\$ 44.404,00	\$ 44.404,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
121	Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ	m	1,0	\$ 1.114,00	\$ 1.114,00	0,00	\$ 0,00	56.376,00	62.802.864,00	
122	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye plano record.	m	1,0	\$ 11.099,00	\$ 11.099,00	1.140,00	\$ 12.652.860,00	2.917,00	32.375.783,00	
123	Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica	Un	1,0	\$ 24.288,00	\$ 24.288,00	66,00	\$ 1.603.008,00	140,00	3.400.320,00	
124	Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica	Un	1,0	\$ 25.261,00	\$ 25.261,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
125	Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica	Un	1,0	\$ 18.086,00	\$ 18.086,00	72,00	\$ 1.302.192,00	147,00	2.658.642,00	
126	Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica	Un	1,0	\$ 9.200,00	\$ 9.200,00	72,00	\$ 662.400,00	665,00	6.118.000,00	
127	Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula.	Un	1,0	\$ 1.229.450,00	\$ 1.229.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
128	Instalación de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula. Incluye cinta bandit	Un	1,0	\$ 182.536,00	\$ 182.536,00	0,00	\$ 0,00	2,00	365.072,00	
129	Retiro de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula	Un	1,0	\$ 158.942,00	\$ 158.942,00	0,00	\$ 0,00	2,00	317.884,00	
130	Suministro de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	\$ 1.039.940,00	\$ 1.039.940,00	20,00	\$ 20.798.800,00	71,00	73.835.740,00	
131	Suministro e instalación de switch capa 2 de cinco puertos ethernet de 1 gbps	Un	1,0	\$ 106.517,00	\$ 106.517,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
132	Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps Dúplex LC/APC 1310 nm	Un	1,0	\$ 183.379,00	\$ 183.379,00	49,00	\$ 8.985.571,00	70,00	12.836.530,00	
133	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	\$ 243.495,00	\$ 243.495,00	29,00	\$ 7.061.355,00	48,00	11.687.760,00	
134	Suministro, configuración e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.	Un	1,0	\$ 2.497.278,00	\$ 2.497.278,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
135	Suministro e instalación dentro de gabinete de controlador de multitoma AC de 6 puestos con polo a tierra.	Un	1,0	\$ 30.679,00	\$ 30.679,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
136	Suministro e instalación de tubería embebida al interior de cárama de inspección en tubería metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación.	m	1,0	\$ 35.197,00	\$ 35.197,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS										

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>			CONTRATO 4600105555 DE 2025			FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
			OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.			AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
						DURACIÓN	865 DÍAS	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
						VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
			CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN			ADICIONES	\$ -		
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED			VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	4,41%	% EJECUTADO ACUMULADO	40,65%	
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
137	Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	\$ 294.625,00	\$ 294.625,00	4,00	\$ 1.178.500,00	8,00	2.357.000,00
138	Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	\$ 533.590,00	\$ 533.590,00	0,00	\$ 0,00	6,00	3.201.540,00
139	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	\$ 3.486.539,00	\$ 3.486.539,00	0,00	\$ 0,00	15,00	52.298.085,00
140	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	\$ 3.417.396,00	\$ 3.417.396,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
141	Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	\$ 1.442.326,00	\$ 1.442.326,00	0,00	\$ 0,00	159,00	229.329.834,00
142	Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	\$ 2.077.371,00	\$ 2.077.371,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
143	Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	\$ 1.354.428,00	\$ 1.354.428,00	0,00	\$ 0,00	10,00	13.544.280,00
144	Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	\$ 1.622.178,00	\$ 1.622.178,00	0,00	\$ 0,00	92,00	149.240.376,00
145	Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	\$ 1.184.259,00	\$ 1.184.259,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
146	Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	\$ 3.317.524,00	\$ 3.317.524,00	0,00	\$ 0,00	200,00	663.504.800,00
147	Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	Un	1,0	\$ 4.610.908,00	\$ 4.610.908,00	0,00	\$ 0,00	35,00	161.381.780,00
148	Suministro de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	\$ 6.353,00	\$ 6.353,00	0,00	\$ 0,00	36.275,00	230.455.075,00
149	Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye acople de 4" y elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 967.895,00	\$ 967.895,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
150	Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto	Un	1,0	\$ 106.507,00	\$ 106.507,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
151	Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par)	Un	1,0	\$ 107.728,00	\$ 107.728,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
152	Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula	Un	1,0	\$ 62.692,00	\$ 62.692,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
153	Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción	Un	1,0	\$ 181.246,00	\$ 181.246,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
154	Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla.	Un	1,0	\$ 335.933,00	\$ 335.933,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
155	Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja.	Un	1,0	\$ 336.446,00	\$ 336.446,00	0,00	\$ 0,00	40,00	13.457.840,00

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>			CONTRATO 4600105555 DE 2025			FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
			OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.			AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
						DURACIÓN	865 DÍAS		
						VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
			CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN			ADICIONES	\$ -	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED			% EJECUTADO EN EL PERIODO	4,41%	% EJECUTADO ACUMULADO	40,65%			
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
156	Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja.	Un	1,0	\$ 363.199,00	\$ 363.199,00	0,00	\$ 0,00	65,00	23.607.935,00
157	Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo y en verde	Un	1,0	\$ 373.428,00	\$ 373.428,00	0,00	\$ 0,00	200,00	74.685.600,00
158	Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led	Un	1,0	\$ 44.362,00	\$ 44.362,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
159	Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V	Un	1,0	\$ 1.223,00	\$ 1.223,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
160	Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	\$ 7.653,00	\$ 7.653,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
161	Suministro de borneras para gabinete de controlador local.	Un	1,0	\$ 8.430,00	\$ 8.430,00	493,00	\$ 4.155.990,00	493,00	4.155.990,00
162	Suministro de Transformador (220-110)	Un	1,0	\$ 176.626,00	\$ 176.626,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
163	Suministro de Canastilla para sonorizador	Un	1,0	\$ 411.114,00	\$ 411.114,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
164	Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml	Un	1,0	\$ 23.376,00	\$ 23.376,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
	RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO								
165	Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 115.227,00	\$ 115.227,00	6,00	\$ 691.362,00	24,00	2.765.448,00
166	Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 224.375,00	\$ 224.375,00	6,00	\$ 1.346.250,00	18,00	4.038.750,00
167	Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 96.137,00	\$ 96.137,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
168	Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.	Un	1,0	\$ 189.513,00	\$ 189.513,00	9,00	\$ 1.705.617,00	195,00	36.955.035,00
169	Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de material sobrante	Un	1,0	\$ 83.338,00	\$ 83.338,00	0,00	\$ 0,00	1,00	83.338,00
170	Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 76.942,00	\$ 76.942,00	10,00	\$ 769.420,00	34,00	2.616.028,00
171	Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de contraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.	Un	1,0	\$ 258.474,00	\$ 258.474,00	49,00	\$ 12.665.226,00	200,00	51.694.800,00
172	Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición final.	Un	1,0	\$ 28.668,00	\$ 28.668,00	27,00	\$ 774.036,00	434,00	12.441.912,00
173	Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final	m	1,0	\$ 527,00	\$ 527,00	3.560,00	\$ 1.876.120,00	17.585,90	9.267.769,30
174	Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 871,00	\$ 871,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
175	Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 106.330,00	\$ 106.330,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
176	Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 39.167,00	\$ 39.167,00	0,00	\$ 0,00	26,00	1.018.342,00
177	Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 39.167,00	\$ 39.167,00	42,00	\$ 1.645.014,00	88,00	3.446.696,00

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
						DURACIÓN	865 DÍAS	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
						VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				ADICIONES	\$ -	VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED								% EJECUTADO ACUMULADO	40,65%
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
178	Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 36.389,00	\$ 36.389,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
179	Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 8.169,00	\$ 8.169,00	15,00	\$ 122.535,00	313,00	2.556.897,00
180	Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra.	Un	1,0	\$ 36.389,00	\$ 36.389,00	2,00	\$ 72.778,00	5,00	181.945,00
181	Retiro de señalización vertical de tránsito de cualquier tipo. Incluye cargue y transporte al sitio donde lo indique la interventoria.	Un	1,0	\$ 19.311,00	\$ 19.311,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
182	Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 6.955,00	\$ 6.955,00	4,00	\$ 27.820,00	4,00	27.820,00
183	Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección	Un	1,0	\$ 8.304,00	\$ 8.304,00	99,00	\$ 822.096,00	359,00	2.981.136,00
184	Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 42.558,00	\$ 42.558,00	0,00	\$ 0,00	3,00	127.674,00
185	Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	\$ 207.248,00	\$ 207.248,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
186	Retiro de Cámaras de video analítica para aforos , elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 305.670,00	\$ 305.670,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
187	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	\$ 80.804,00	\$ 80.804,00	24,00	\$ 1.939.296,00	725,00	58.582.900,00
188	Retiro de marco metálico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	\$ 80.804,00	\$ 80.804,00	1,00	\$ 80.804,00	17,00	1.373.668,00
189	Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 21.502,00	\$ 21.502,00	0,00	\$ 0,00	2,00	43.004,00
190	Retiro de dispositivo de análisis en campo.	Un	1,0	\$ 69.655,00	\$ 69.655,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
191	Retiro de percha de electroporcelana	Un	1,0	\$ 41.445,00	\$ 41.445,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
192	Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 22.320,00	\$ 22.320,00	0,00	\$ 0,00	5,00	111.600,00
193	Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas	Un	1,0	\$ 35.852,00	\$ 35.852,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
194	Retiro de soporte tipo L para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 27.623,00	\$ 27.623,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
195	Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 15.116,00	\$ 15.116,00	46,00	\$ 695.336,00	477,00	7.210.332,00
196	Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 27.184,00	\$ 27.184,00	28,00	\$ 761.152,00	147,00	3.996.048,00
197	Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa	Un	1,0	\$ 102.470,00	\$ 102.470,00	4,00	\$ 409.880,00	14,00	1.434.580,00
198	Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 10.426,00	\$ 10.426,00	0,00	\$ 0,00	4,00	41.704,00
199	Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	\$ 17.938,00	\$ 17.938,00	44,00	\$ 789.272,00	702,00	12.592.476,00




<div><div>Alcaldía de Medellín</div><div>Distrito de</div><div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div></div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026			
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026	
						DURACIÓN		865 DÍAS					
						VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026	
						ADICIONES		\$ -					
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250	
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED				% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%		% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%			
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total				
200	Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final	m	1,0	\$ 723,00	\$ 723,00	0,00	\$ 0,00	503,00	363.669,00				
201	Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo.	Un	1,0	\$ 68.017,00	\$ 68.017,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
202	Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa	Un	1,0	\$ 107.195,00	\$ 107.195,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO												
203	Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m	Un	1,0	\$ 435.317,00	\$ 435.317,00	8,00	\$ 3.482.536,00	22,00	9.576.974,00				
204	Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto de instalación.	Un	1,0	\$ 159.063,00	\$ 159.063,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
205	Instalación de poste recto con platina	Un	1,0	\$ 76.855,00	\$ 76.855,00	0,00	\$ 0,00	1,00	76.855,00				
206	Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante	Un	1,0	\$ 129.735,00	\$ 129.735,00	8,00	\$ 1.037.880,00	193,00	25.038.855,00				
207	Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)	Un	1,0	\$ 112.610,00	\$ 112.610,00	6,00	\$ 675.660,00	22,00	2.477.420,00				
208	Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	\$ 33.170,00	\$ 33.170,00	21,00	\$ 696.570,00	378,00	12.538.260,00				
209	Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	\$ 63.098,00	\$ 63.098,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
210	Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma.	Un	1,0	\$ 15.826,00	\$ 15.826,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
211	Instalación de viseras de semáforo en poste recto	Un	1,0	\$ 4.084,00	\$ 4.084,00	0,00	\$ 0,00	5,00	20.420,00				
212	Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	\$ 208.865,00	\$ 208.865,00	91,00	\$ 19.006.715,00	173,00	36.133.645,00				
213	Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación	Un	1,0	\$ 74.317,00	\$ 74.317,00	0,00	\$ 0,00	12,00	891.804,00				
214	Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	\$ 84.079,00	\$ 84.079,00	15,00	\$ 1.261.185,00	57,00	4.792.503,00				
215	Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	Un	1,0	\$ 1.410,00	\$ 1.410,00	6.342,80	\$ 8.943.348,00	22.195,80	31.296.078,00				
216	Instalación de Controlador local. Incluye prueba de acometida, cableado de grupos, detectores y pulsadores.	Un	1	\$ 357.787,00	\$ 357.787,00	15,00	\$ 5.366.805,00	57,00	20.393.859,00				
217	Instalación de placa identificadora de cables de semáforo	Un	1,0	\$ 4.291,00	\$ 4.291,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
218	Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	\$ 17.984,00	\$ 17.984,00	46,00	\$ 827.264,00	481,00	8.650.304,00				
219	Instalación de lámpara vehicular a ménsula	Un	1,0	\$ 32.074,00	\$ 32.074,00	28,00	\$ 898.072,00	147,00	4.714.878,00				
220	Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla).	Un	1,0	\$ 18.598,00	\$ 18.598,00	10,00	\$ 185.980,00	105,00	1.952.790,00				
221	Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante.	Un	1,0	\$ 41.159,00	\$ 41.159,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
222	Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semaforica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín	Hr	1,0	\$ 50.539,00	\$ 50.539,00	236,00	\$ 11.927.204,00	2.436,00	123.113.004,00				
	PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS												

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>						CONTRATO 4600105555 DE 2025	FECHA DE INICIO	5/09/2025	ACTA NO. 8 ABRIL 2026	
						OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	AMPLIACIONES	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN	30/04/2026
							DURACIÓN	865 DÍAS	PERIODO	1/04/2026 a 30/04/2026
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	VALOR ACUMULADO	\$ 5.757.317.250
						CONTRATISTA: UT SIT MEDELLÍN	ADICIONES	\$ -	% EJECUTADO EN EL PERIODO	40,65%
						INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO ACUMULADO	
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total	
223	Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de la tubería (rasqueteada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura.	Un	1,0	\$ 178.847,00	\$ 178.847,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
224	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	\$ 143.944,00	\$ 143.944,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
225	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	\$ 85.515,00	\$ 85.515,00	13,00	\$ 1.111.695,00	55,00	4.703.325,00	
226	Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM.	Un	1,0	\$ 144.020,00	\$ 144.020,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
227	Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer, pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo.	Un	1,0	\$ 60.705,00	\$ 60.705,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS						0,00				
228	Lavada de gabinete de controlador local	Un	1,0	\$ 32.665,00	\$ 32.665,00	0,00	\$ 0,00	3,00	97.995,00	
229	Lavada de brazo de ménsula	Un	1,0	\$ 60.829,00	\$ 60.829,00	58,00	\$ 3.528.082,00	116,00	7.056.164,00	
230	Lavada de Poste recto	Un	1,0	\$ 23.214,00	\$ 23.214,00	206,00	\$ 4.782.084,00	533,00	12.373.062,00	
231	Lavada de semáforo peatonal o ciclista	Un	1,0	\$ 23.214,00	\$ 23.214,00	186,00	\$ 4.317.804,00	586,00	13.603.404,00	
232	Lavada de Sonorizadores o pulsador	Un	1,0	\$ 13.891,00	\$ 13.891,00	58,00	\$ 805.678,00	124,00	1.722.484,00	
233	Lavada de avisos de motos	Un	1,0	\$ 23.090,00	\$ 23.090,00	3,00	\$ 69.270,00	5,00	115.450,00	
234	Lavado de semáforo vehicular a poste	Un	1,0	\$ 25.936,00	\$ 25.936,00	179,00	\$ 4.642.544,00	419,00	10.867.184,00	
235	Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos	Un	1,0	\$ 60.829,00	\$ 60.829,00	60,00	\$ 3.649.740,00	119,00	7.238.651,00	
236	Lavada de disco direccional	Un	1,0	\$ 12.886,00	\$ 12.886,00	213,00	\$ 2.744.718,00	487,00	6.275.482,00	
VARIOS										
237	Sondeo de canalizaciones, búsqueda de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la información necesaria para su correcto entendimiento.	Un	1,0	\$ 243.212,00	\$ 243.212,00	12,00	\$ 2.918.544,00	121,00	29.428.652,00	
238	Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente, incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado negra.	Un	1,0	\$ 85.481,00	\$ 85.481,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	
239	Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en anclaje de ménsula existente.	Un	1,0	\$ 507.820,00	\$ 507.820,00	0,00	\$ 0,00	3,00	1.523.460,00	
240	Suministro, transporte e instalación de conector tipo piercing para acometida de controlador. Incluye dos conductores (F-F o F-N)	Un	1,0	\$ 134.829,00	\$ 134.829,00	0,00	\$ 0,00	9,00	1.213.461,00	
241	Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.	Un	1,0	\$ 39.537,00	\$ 39.537,00	0,00	\$ 0,00	6,00	237.222,00	

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026			
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026	
						DURACIÓN		865 DÍAS		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026	
						VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250	
						ADICIONES		\$ -					
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240					
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED				% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%		% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%			
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total				
242	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina.	Un	1,0	\$ 491.690,00	\$ 491.690,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
243	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento.	Un	1,0	\$ 347.436,00	\$ 347.436,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
244	Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintuta existente y pintura electrostática	Un	1,0	\$ 188.195,00	\$ 188.195,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
245	Suministro y aplicación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula x 150 ml.	Un	1,0	\$ 53.095,00	\$ 53.095,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
246	Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular	Un	1,0	\$ 28.207,00	\$ 28.207,00	0,00	\$ 0,00	11,00	310.277,00				
247	Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.	Un	1,0	\$ 69.849,00	\$ 69.849,00	0,00	\$ 0,00	1,00	69.849,00				
248	Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.	Un	1,0	\$ 94.727,00	\$ 94.727,00	0,00	\$ 0,00	286,00	27.091.922,00				
249	Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.	Un	1,0	\$ 100.202,00	\$ 100.202,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
250	Adecuación de controlador local existente. Incluye instalación de ventilador, termostato, breakers, borneras, tomas de alimentación, cableado de los grupos, acometida, puesta a tierra, prueba en laboratorio y limpieza de racks (son hasta tres) y de cables. No incluye programación de tarjetas	Un	1,0	\$ 917.023,00	\$ 917.023,00	21,00	\$ 19.257.483,00	24,00	22.008.552,00				
251	Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2" y llave.	Un	1,0	\$ 140.003,00	\$ 140.003,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
252	Suministro de llave para apertura de cámara de inspección según diseño.	Un	1,0	\$ 29.403,00	\$ 29.403,00	0,00	\$ 0,00	58,00	1.705.374,00				
253	Suministro e instalación de final de carrera para detección de apertura de gabinete. Incluye cableado hasta tarjeta de entrada del controlador.	Un	1,0	\$ 88.518,00	\$ 88.518,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
254	Adecuación de flanches (Brida), en taller, para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.	Un	1,0	\$ 352.728,00	\$ 352.728,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00				
255	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales.	Un	1,0	\$ 50.285,00	\$ 50.285,00	0,00	\$ 0,00	3,00	150.855,00				
256	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales	Un	1,0	\$ 17.436,00	\$ 17.436,00	1,00	\$ 17.436,00	9,00	156.924,00				
257	Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula	Un	1,0	\$ 66.533,00	\$ 66.533,00	2,00	\$ 133.066,00	5,00	332.665,00				
258	Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste	Un	1,0	\$ 22.423,00	\$ 22.423,00	23,00	\$ 515.729,00	221,00	4.955.483,00				
259	Enderezada o ajustada de visera a ménsula	Un	1,0	\$ 42.581,00	\$ 42.581,00	1,00	\$ 42.581,00	11,00	468.391,00				
260	Enderezada o ajustada de visera a poste	Un	1,0	\$ 12.253,00	\$ 12.253,00	6,00	\$ 73.518,00	47,00	575.891,00				
261	Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio. Incluye transporte de peronal y equipos.	Un	1,0	\$ 93.381,00	\$ 93.381,00	15,00	\$ 1.400.715,00	108,00	10.085.148,00				
262	Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja	Un	1,0	\$ 66.601,00	\$ 66.601,00	124,00	\$ 8.258.524,00	560,50	37.329.860,50				
263	Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección	Un	1,0	\$ 51.086,00	\$ 51.086,00	35,00	\$ 1.788.010,00	79,00	4.035.794,00				

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>						CONTRATO 4600105555 DE 2025				FECHA DE INICIO		5/09/2025		ACTA NO. 8 ABRIL 2026			
						OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.				AMPLIACIONES		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		30/04/2026	
										DURACIÓN		865 DÍAS					
										VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		PERIODO		1/04/2026 a 30/04/2026	
										ADICIONES		\$ -					
						CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN				VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		VALOR ACUMULADO		\$ 5.757.317.250	
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED				% EJECUTADO EN EL PERIODO		4,41%		% EJECUTADO ACUMULADO		40,65%							
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA				ACUMULADO							
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total								
264	Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad.	Un	1,0	\$ 47.238,00	\$ 47.238,00	0,00	\$ 0,00	14,00	661.332,00								
COSTOS DIRECTOS					\$ 116.649.142	COSTO DIRECTO ACTA	\$ 452.606.990,000	COSTO DIRECTO ACUM.	\$ 4.093.694.266,8800								
Administración				32,9%	\$ 38.377.568	32,90%	\$ 148.907.700,000	32,90%	\$ 1.346.825.413,8035								
Imprevistos				0,50%	\$ 583.246	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -								
Utilidad				5,00%	\$ 5.832.457	5,00%	\$ 22.630.350,000	5,00%	\$ 204.684.713,3440								
Valor Total AIU				38,40%	\$ 44.793.271	37,90%	\$ 171.538.050,000	37,90%	\$ 1.551.510.127,1475								
Pago Reajuste					\$ 100.000.000		\$ -		\$ 20.489.861,1753								
Guía Socioambiental					\$ 125.529.472				\$ 41.400.118,0000								
Pólizas					\$ 71.143.135				\$ 50.147.456,0000								
Ajuste por menor valor pagado en actas Nros.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por calculo de cada una con precios Unitarios de APU, ya que originalmente se calcularon con todos los decimales.							\$ 75.420,723		\$ 75.420,7233								
PRESUPUESTO TOTAL					\$ 458.115.020	VALOR TOTAL ACTA	\$ 624.220.461,000	VALOR TOTAL ACUM.	\$ 5.757.317.250								



Miguel Ángel Osorio Gómez
Director de Obra - UT SIT MEDELLIN



Marta Lucía Suárez Gómez
Director de Interventoría - CONSORCIO INT FAROL MED

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 19.

INDICES DE

CAMACOL

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

Una eficaz gestión de obras

Que impulsa tu innovación

Mejora la calidad , entrega tus
proyectos a tiempo y agiliza
tus tareas de construcción.



322 6534335



www.saotechnology.com



ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA EN MEDELLÍN

BASE 100 = DICIEMBRE DE 1989

ENERO DE 2026

INDICE COSTO TOTAL									VARIACION %					
									DICIEMBRE			ENERO		
									MENS.	ACUM/26	ANUAL			
EDIFICACIÓN									3.598,10	3.757,33	4,43	4,43	6,54	
CONCEPTO	COD	UNIFAMILIAR			MULTIFAMILIAR		PROMEDIO		INDICE TOTAL POR ITEM	VARIACION POR ITEM %				
		MÍNIMO	MEDIO	COMPLETO	HASTA 5 PISOS	MAS DE 5 PISOS	UNI- FAMILIAR	MULTI- FAMILIAR		dic-25	dic-25	ene-25		
										ene-26	ene-26	ene-26		
TOTAL MANO DE OBRA	TMO	4.294,75	4.262,65	4.255,88	4.210,56	4.213,30	4.264,92	4.209,87	4.226,58	5,45	5,45	9,97		
CEMENTO	CE	3.864,27	3.853,77	3.846,60	3.844,78	3.840,40	3.849,74	3.841,44	3.843,02	4,62	4,62	9,04		
CONCRETO PREMEZCLADO	CO	3.670,11	3.695,47	3.697,08	3.707,79	3.713,49	3.694,36	3.707,92	3.700,69	3,53	3,53	6,64		
PREFABRICADOS	PR	2.974,50	3.899,06	3.270,70	3.325,09	3.106,65	3.568,49	3.192,70	3.289,47	8,49	8,49	8,49		
AGREGADOS MINERALES	AM	3.234,67	2.948,93	3.010,75	2.801,21	2.861,58	3.026,25	2.770,70	2.828,67	4,33	4,33	11,56		
HIERRO	HI	3.751,88	3.825,88	3.495,14	2.866,76	3.260,59	3.685,38	3.052,86	3.238,87	1,51	1,51	-1,25		
MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN	MA	6.586,87	6.853,32	7.250,31	6.192,83	6.361,59	6.962,78	6.277,54	6.491,23	0,23	0,23	3,66		
MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA	MM	4.603,06	4.805,01	4.500,41	4.150,46	4.694,20	4.680,28	4.383,83	4.468,98	5,94	5,94	12,73		
MAT.INST. HIDRÁULICA SANITARIA	IHS	5.336,33	5.709,15	6.294,06	5.849,66	4.833,40	5.866,11	5.423,03	5.543,91	1,84	1,84	6,65		
INST. ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	IET	9.641,94	11.380,32	10.823,14	11.950,73	9.870,58	10.885,72	10.989,99	10.936,25	8,60	8,60	2,35		
MATERIALES PARA CUBIERTA	MC	3.742,98	3.599,47	2.779,71	3.614,77	3.478,88	3.250,88	3.521,09	3.433,82	11,42	11,42	10,30		
TOTAL MATERIALES OBRA NEGRA	TMON	4.590,19	4.733,39	4.445,75	4.693,37	4.409,78	4.594,63	4.558,55	4.542,25	4,56	4,56	5,20		
PISOS	PIS	2.943,12	2.373,44	2.275,40	2.352,03	2.389,11	2.415,09	2.381,49	2.396,06	4,83	4,83	8,73		
CARPINTERÍA DE MADERA	CMA	3.192,36	3.245,63	3.141,09	3.151,98	3.140,70	3.126,98	3.142,59	3.150,25	2,21	2,21	0,44		
CARPINTERÍA METÁLICA	CM	2.808,81	3.069,43	3.172,78	3.437,97	3.467,58	3.096,78	3.448,79	3.345,16	4,52	4,52	7,26		
APARATOS SANITARIOS	AS	1.795,59	1.869,55	2.079,03	1.963,84	2.130,56	1.940,26	2.026,78	2.004,97	2,47	2,47	2,11		
PINTURAS	PI	2.100,11	1.970,90	1.939,44	2.816,40	2.547,10	1.957,28	2.711,46	2.488,34	6,39	6,39	10,93		
INSTALACIONES ESPECIALES	IE	3.688,76	3.038,98	3.000,72	2.725,24	2.481,40	3.032,65	2.565,29	2.666,27	-0,91	-0,91	4,91		
ENCHAPES	EN	1.515,34	1.448,15	1.561,03	1.676,07	1.608,97	1.512,99	1.640,50	1.607,16	1,50	1,50	-1,08		
TOTAL MATERIALES ACABADOS	TMA	2.550,35	2.620,97	2.566,96	2.692,13	2.633,06	2.593,74	2.654,17	2.635,82	2,89	2,89	5,30		
HERRAMIENTAS	HE	3.168,95	2.954,57	3.217,23	2.221,92	1.997,38	3.092,53	2.220,38	2.522,12	3,34	3,34	13,16		
EQUIPOS	EQ	1.414,32	1.376,66	1.528,89	1.432,81	1.525,32	1.443,25	1.462,29	1.456,08	1,30	1,30	2,21		
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO	THE	1.890,02	1.754,03	1.903,76	1.477,45	1.558,26	1.842,31	1.504,87	1.619,61	1,77	1,77	4,56		
TOTAL MATERIALES	TM	4.001,18	3.837,32	3.528,68	3.720,97	3.441,58	3.730,56	3.581,78	3.613,21	4,04	4,04	5,28		
COSTO TOTAL DE EDIFICACIÓN	CTE	4.080,58	3.951,99	3.730,40	3.845,68	3.611,76	3.878,37	3.723,06	3.757,33	4,43	4,43	6,54		

Alfonso J. Gato

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN

NOTA: PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

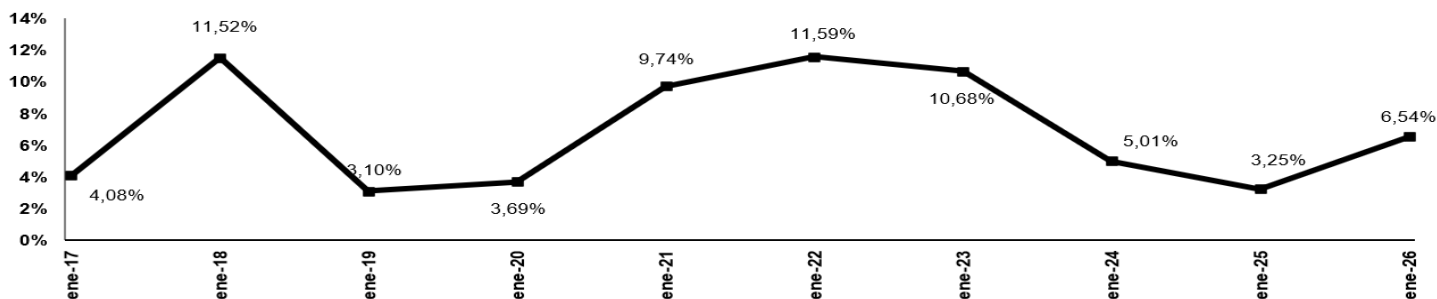
CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION %		
					dic-25	dic-25	ene-25
					ene-26	ene-26	ene-26
ACCESORIOS DE BRONCE	dic-89	ACC.BR.	5.392,46	5.577,75	3,44	3,44	26,66
ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO	dic-89	ACC.HF.	2.006,42	2.006,42	0,00	0,00	5,57
AFIRMADOS - BASE GRANULAR (*)	dic-89	AF	4.454,58	4.640,36	4,17	4,17	13,80
AISLADORES	dic-89	AIS.	1.534,32	1.484,22	-3,27	-3,27	-0,25
ALAMBRE (COBRE Y ALUMINIO)	dic-89	ALM	10.774,91	11.000,36	2,09	2,09	-0,90
ALAMBRE DE COBRE	dic-89	ACU	30.027,71	30.150,19	0,41	0,41	1,29
ALAMBRES DE ALUMINIO	dic-89	AL.AL.	11.622,78	11.957,48	2,88	2,88	-7,33
ALCANTARILLADOS (*)	dic-89	AL	2.612,20	2.660,22	1,84	1,84	8,67
ALUMBRADO PUBLICO	dic-97	ALP	315,87	321,33	1,73	1,73	1,73
ANDENES, CUNETAS Y CORDONES (*)	dic-89	ACC	1.739,19	1.811,52	4,16	4,16	7,11
BLOQUE DE CONCRETO PARA MAMPOSTERIA	dic-89	BLC	2.474,31	2.538,49	2,59	2,59	8,11
CABLE DE ALUMINIO FORRADO	dic-97	CAF	2.313,51	2.328,78	0,66	0,66	-4,34
CONCRETO DE 2.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C20	3.343,70	3.507,64	4,90	4,90	4,90
CONCRETO DE 2.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C25	3.638,73	3.822,60	5,05	5,05	7,83
CONCRETO DE 3.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C30	3.516,57	3.694,01	5,05	5,05	7,28
CONCRETO DE 3.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C35	3.553,11	3.734,31	5,10	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C40	3.938,20	4.139,04	5,10	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C45	4.162,52	4.353,58	4,59	4,59	4,59
CONCRETO DE 5.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C50	4.247,16	4.442,11	4,59	4,59	4,59
CONDUCTORES DE COBRE	dic-97	CC	5.547,65	5.562,10	0,26	0,26	-4,71
DRYWALL	dic-23	DWL	104,21	104,01	-0,19	-0,19	-0,07
ELEMENTOS METALICOS	dic-89	E.M.	2.345,11	2.345,11	0,00	0,00	11,97
EQUIPO BASICO	dic-98	EB	540,31	540,31	0,00	0,00	-7,86
EQUIPO DE ELEVACION	dic-23	ELE	109,49	109,49	0,00	0,00	-4,00
EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	dic-89	EQO	2.591,08	2.591,08	0,00	0,00	-4,70
EQUIPO PARA EDIFICACION	dic-89	EQE	1.555,57	1.569,89	0,92	0,92	17,63
EQUIPO PARA EXCAVACION EN ROCA	dic-98	EER	441,32	441,32	0,00	0,00	-6,31
EQUIPO PARA IMPRIMACION Y PAVIMENTO ASFA	dic-98	EIPA	299,60	299,60	0,00	0,00	5,14
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA	dic-98	EMT	551,47	551,47	0,00	0,00	-7,88
EQUIPO PARA PAVIMENTOS NO CONVENCIONAL	dic-98	EPNC	355,93	355,93	0,00	0,00	0,66
EQUIPO PARA SUBBASE Y BASE	dic-98	ESB	623,91	623,91	0,00	0,00	1,05
GABINETE ELECTRICO - SUBESTACION	dic-97	GES	408,78	402,25	-1,60	-1,60	-6,31
GAS - CENTROS DE MEDICION	dic-95	GCM	306,57	300,01	-2,14	-2,14	-3,33
GAS - RED EXTERNA POLIETILENO	dic-97	REX	644,68	644,68	0,00	0,00	-1,98
LLANTAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA	dic-89	LL	5.950,40	5.950,40	0,00	0,00	-2,39
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	dic-89	LC	6.203,46	6.101,64	-1,64	-1,64	2,21
MANO DE OBRA ELECTRICA	dic-97	MOBE	509,13	522,80	2,68	2,68	16,50
MANO DE OBRA PARA OBRAS PUBLICAS	dic-89	MOOP	3.602,49	3.703,80	2,81	2,81	9,39
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA EDIF.	dic-89	MOSE	5.886,36	6.217,61	5,63	5,63	8,85
MATERIALES GALVANIZADOS	dic-89	M.G.	1.548,46	1.547,18	-0,08	-0,08	11,08
MEZCLA ASFALTICA	dic-89	MAS	10.194,80	10.404,98	2,06	2,06	8,93
MOVIMIENTO DE ROCA (*)	dic-89	MR	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00	-1,91
MOVIMIENTO DE TIERRA (*)	dic-89	MT	3.339,52	3.348,20	0,26	0,26	-3,41
PAVIMENTO ASFALTICO (CORRIDO) (*)	dic-89	PA	7.614,23	7.763,20	1,96	1,96	8,72
PAVIMENTO ASFALTICO (PARCHEO)(*)	dic-98	PAP	1.046,69	1.068,72	2,10	2,10	8,79
PAVIMENTOS DE CONCRETO (*)	dic-89	PC	2.636,92	2.758,78	4,62	4,62	5,18
POSTERIA DE CONCRETO	dic-89	PT.C.	2.580,25	2.580,25	0,00	0,00	0,31
SALIDA ELECTRICA	dic-97	SA	1.729,83	1.733,81	0,23	0,23	0,56
SUB-BASE (*)	dic-89	SB	4.019,16	4.273,14	6,32	6,32	13,40
TRANSFORMADOR	dic-89	TR	3.456,35	3.456,35	0,00	0,00	-4,48
TRANSPORTE (*)	dic-89	TRA	2.005,18	2.004,76	-0,02	-0,02	0,92
TUBERIA DE ACERO	dic-89	T.ACE.	1.649,53	1.657,16	0,46	0,46	1,90
TUBERIA DE COBRE	dic-89	T.CU.	1.182,66	1.182,66	0,00	0,00	3,10
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA	dic-89	TCR	2.101,31	2.101,31	0,00	0,00	9,17

(*) INCLUYE MANO DE OBRA

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	DICIEMBRE	ENERO	VARIACIÓN %		
					dic-25	dic-25	ene-25
					ene-26	ene-26	ene-26
TUBERIA DE PRESION Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCP	7.193,60	7.266,31	1,01	1,01	7,10
TUBERIA PVC (DUCTO TELEFONICO)	dic-89	PVCT	7.694,31	7.694,31	0,00	0,00	5,00
TUBERIA PVC CORRUGADA	dic-89	PVCC	12.206,90	12.206,90	0,00	0,00	10,12
TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCS	5.091,24	5.212,82	2,39	2,39	9,40
TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	dic-89	T.G.	2.920,93	2.967,33	1,59	1,59	1,53
VIDRIO	dic-89	VI	1.275,26	1.275,26	0,00	0,00	-3,54
INDICES DE ADITIVOS							
CEMENTICIOS	dic-99	CEM	354,96	361,79	1,92	1,92	7,52
CEMENTOS MODIFICADOS	dic-99	CEMO	937,76	956,51	2,00	2,00	25,11
EPÓXICOS (ADHERENTES)	dic-99	EPX	577,71	583,49	1,00	1,00	13,64

**VARIACIÓN ANUAL ENERO
DEL ICCV EN EL VALLE DE ABURRA
(Índices de Costos de Construcción de Viviendas)
2017 A 2026**



Fuente: Camacol Antioquia

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN

EL ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN es un elemento estadístico que permite estimar el cambio promedio de los precios de los principales recursos requeridos para la edificación de viviendas, insumos básicos o actividades de construcción

El número índice es una cifra abstracta, expresada como porcentaje y se calcula con base en una participación en el costo y por la mano de obra según categorías, es decir, por aquellos elementos que conforman los costos directos. No incluye el valor del terreno. Los costos indirectos, constituidos por los gastos generales, impuestos y las utilidades, no se tomaron en cuenta por la dificultad para captar la información necesaria para elaborar el índice.

El índice en un periodo de tiempo determinado permite conocer el cambio porcentual en el costo medio de los materiales, equipo y la mano de obra en dicho periodo con relación al costo promedio de los materiales, equipo y la mano de obra en el periodo base. La base tiene valor de 100.

USOS:

- Los índices se utilizan principalmente como instrumento para el reajuste de los contratos de obra, ya sea que estos se pacten entre particulares o entre firmas contratistas y el estado.

En los factores determinantes de los costos. Para tal efecto, la revisión debe hacerse mediante fórmulas polinómicas incorporadas en el respectivo contrato.

- Con los índices de costos se pueden hacer estimativos sobre la posible evolución de los precios de los insumos.

- Los índices permiten detectar variaciones estacionales en los precios y en consecuencia prever periodos de escasez o alzas relativas al grupo de insumos estudiados.

- En la elaboración de cuentas nacionales, los índices de costos se emplean para deflactar o ajustar el valor bruto de la producción del sector a precios constantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Los precios incluyen el impuesto a las ventas, excepto los que expresamente estipule la ley con excepción. Los precios son de lista y no se considera ningún descuento.

La Vivienda Unifamiliar se divide en tres tipos según su costo: mínimo, medio y completo. La Vivienda Multifamiliar según su estructura hasta cinco pisos y más de cinco pisos.

- Los precios de los materiales como el cemento, los agregados minerales, bloques de concreto, los ladrillos, etc. No incluyen valor del transporte.

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 20.

CERTIFICADO DE

NO SUB-

CONTRATACION

Medellín, Antioquia, 04 de Mayo de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES

Profesional Especializado - Unidad de Circulación
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

128 - 2026

Asunto. Certificación de inexistencia de subcontratos en la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, para el periodo comprendido entre el **período comprendido entre el 01 de Abril de 2026 y el 30 de Abril de 2026.**


En mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificado como JORGE TRUJILLO NIÑO, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN **NO** ha suscrito, celebrado ni ejecutado ningún tipo de subcontrato con terceros para el desarrollo del **Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025**, cuyo objeto es: "Realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín para el periodo comprendido entre el **01 de Abril de 2026 y el 30 de Abril de 2026**"

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 19 – Independencia del Contratista y la Cláusula 20 – Inexistencia de relación laboral entre la Entidad y el Contratista del mencionado contrato, dejando constancia de que todas las actividades, obligaciones y compromisos contractuales han sido ejecutados directamente por la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, sin que haya existido delegación, cesión o subcontratación alguna.

La presente se expide a solicitud de los interesados, para los fines pertinentes.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Cuatro (04) días del mes de Mayo de 2026.**

Cordialmente,



JORGE TRUJILLO NIÑO

C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 21.

CERTIFICADO DE

REUTILIZACION

DE AGUAS

LLUVIAS

Medellín, Antioquia, 04 de Mayo de 2026

Ingenieros

MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ

Directora de interventoría

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025

Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025

Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES

Profesional Especializado - Unidad de Circulación

Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025

Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín

Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

129 - 2026

Asunto. Certificación de implementación de sistema de recolección de aguas lluvias – Plan de Sostenibilidad Ambiental para la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025.

Por medio de la presente, la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, se permite certificar que, para la vigencia comprendida entre el **01 de Abril de 2026 y el 30 de Abril de 2026**, se evidenció avance en la implementación y optimización del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias, en cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Plan de Sostenibilidad Ambiental del proyecto.

Durante el periodo correspondiente al mes de **Abril de 2026**, y en continuidad con las acciones implementadas durante el mes de Marzo del mismo año, se evidencian avances significativos en el mejoramiento de la calidad del agua recolectada en el proyecto.

En efecto, partiendo del diagnóstico previo en el cual se identificaron condiciones lodosas asociadas principalmente a la presencia de sedimentos provenientes del contacto con canaletas, bajantes y superficies de captación, durante el mes de marzo se consolidaron y fortalecieron las medidas correctivas y de optimización previamente adoptadas, destacándose:

- La continuidad y fortalecimiento de las rutinas periódicas de limpieza en los puntos de captación y conducción.
- La mejora en la eficiencia de los procesos de filtrado primario y en el manejo de sedimentos dentro de los sistemas de almacenamiento.
- La implementación de ajustes operativos adicionales orientados a disminuir la carga de sólidos suspendidos previo al almacenamiento final.


Como resultado de lo anterior, durante el mes de **Abril de 2026** se ha evidenciado una mejora progresiva y sostenida en la calidad del agua recuperada, reduciendo de manera significativa la presencia de material particulado y optimizando sus condiciones para el aprovechamiento en actividades propias de obra y usos domésticos asociados al proyecto.

Este avance contribuye de manera efectiva a la reducción del consumo de agua potable, al uso eficiente del recurso hídrico y al cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables al contrato.

En consecuencia, se deja constancia del avance positivo en la gestión y tratamiento del agua recolectada, ratificando el compromiso del contratista con la sostenibilidad ambiental y la mejora continua dentro del desarrollo contractual.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Cuatro (04) día del mes de Mayo de 2026**.

Cordialmente,



JORGE TRUJILLO NINO

C.C 13.893.413 de Barrancabermeja

R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

Proyectaron. Ing. Miguel Angel Osorio Gomez – Director de Obra UT SIT MEDELLIN

Ing. Carlos Alberto Diaz Peña – Residente de Obra UT SIT MEDELLIN

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ABRIL 2026		Versión: 01

ANEXO 22.

CERTIFICADO DE

MADRE CABEZA

DE FAMILIA

PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA POR PARTE DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Calle 44 # 52 165

Medellín, Antioquia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 4600105555 DE 2025

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

Estimados señores:

Nosotros, JORGE TRUJILLO NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, y SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ, identificado con C.C. No. 1.098.609.537 de Bucaramanga en nuestra condición de REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, certificamos bajo la gravedad de juramento que se **VINCULÓ PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 4600105555 DE 2025** en el periodo comprendido entre **01 de Marzo de 2026 al 31 de Marzo de 2026** empleadas y/o contratistas por prestación de servicios por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del contrato referenciado:

Nombre de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obra	Identificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obra	Cargo en la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
JENIFER DEL CARMEN ALTAMIRANDA DÍAZ	C.C. 1.052.982.270 FECHA INGRESO: 1/09/2025	Auxiliar SST y Ambiental
LAURA PADILLA GIRALDO	C.C. 1.017.221.580 FECHA INGRESO: 21/01/2026	Auxiliar de mantenimiento

En constancia, se firma en **Medellín, Antioquia**, a los **Treinta y Un (31)** días del mes de **Marzo** de **2026**.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ

C.C. 1.098.609.537 de Bucaramanga

Contador Público - T.P 187097-T

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

JORGE TRUJILLO NIÑO

C.C 13.893.413 de Barrancabermeja

R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
