




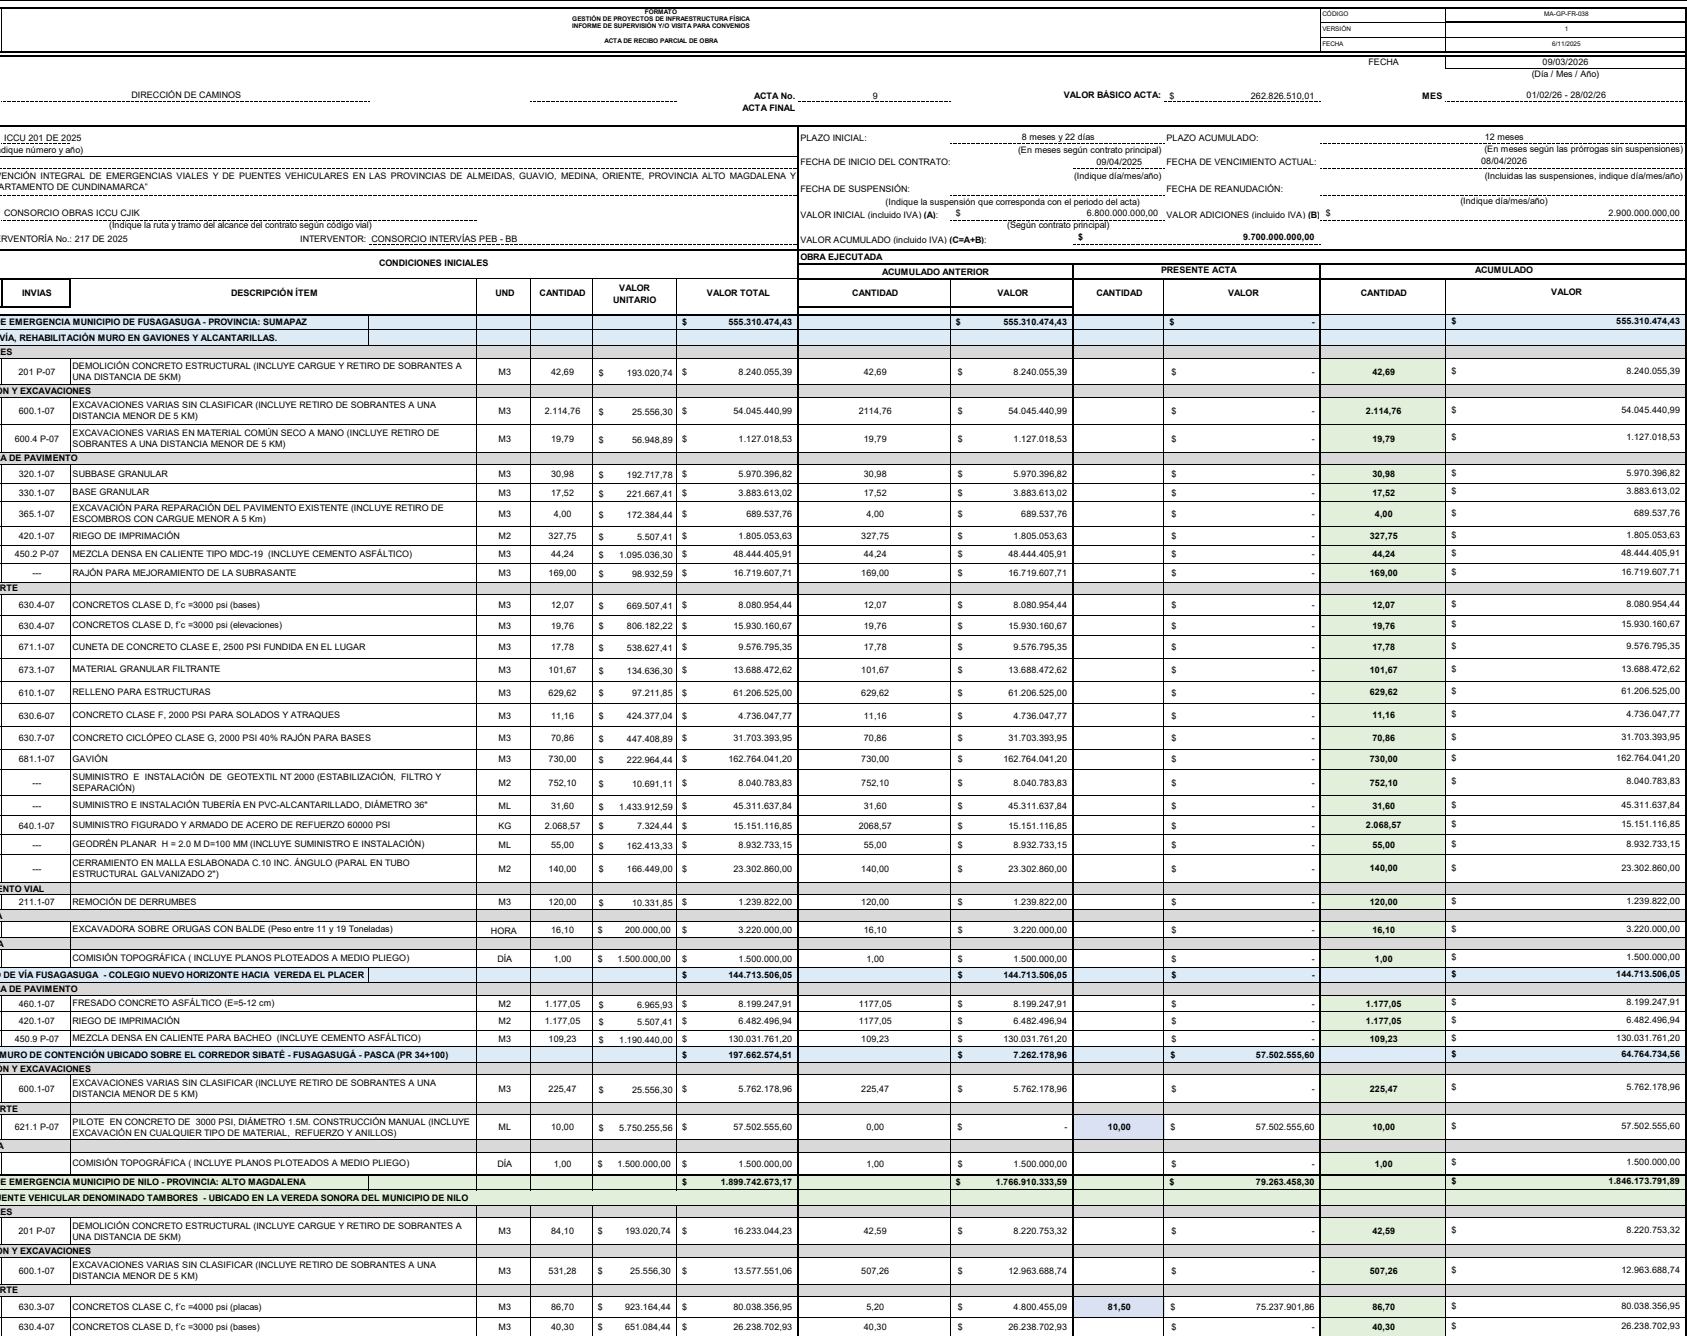

FORNOS
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MAL-GR-FR-008
VERSIÓN	1
FECHA	8/11/2025

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE CAMINOS	ACTA No. 9	VALOR BASICO ACTA: \$ 262.826.510,01	FECHA 09/03/2026 (Día / Mes / Año)	MES 01/02/26 - 28/02/26
ACTA FINAL					

CONTRATO No: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 12 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAJIVO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CUIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 217 DE 2025	INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 6.800.000.000,00
		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.900.000.000,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 9.700.000.000,00

CONDICIONES INICIALES							OBRA EJECUTADA						
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
E	4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (bases)	M3	26,25	\$ 681.687,41	\$ 17.894.294,51	26,25	\$ 17.894.294,51	\$	-	26,25	\$ 17.894.294,51
E	4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (elevaciones)	M3	28,95	\$ 818.843,70	\$ 23.705.525,12	28,95	\$ 23.705.525,12	\$	-	28,95	\$ 23.705.525,12
E	4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	20,00	\$ 5.772.860,00	\$ 115.457.200,00	20,00	\$ 115.457.200,00	\$	-	20,00	\$ 115.457.200,00
E	4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	23,00	\$ 22.034,07	\$ 506.783,61	23,00	\$ 506.783,61	\$	-	23,00	\$ 506.783,61
E	4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	25,82	\$ 141.571,11	\$ 3.655.366,06	25,82	\$ 3.655.366,06	\$	-	25,82	\$ 3.655.366,06
E	4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	211,23	\$ 78.300,00	\$ 16.539.309,00	211,23	\$ 16.539.309,00	\$	-	211,23	\$ 16.539.309,00
E	4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,52	\$ 437.200,00	\$ 664.544,00	1,52	\$ 664.544,00	\$	-	1,52	\$ 664.544,00
E	4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	65,96	\$ 10.691,11	\$ 705.185,62	65,96	\$ 705.185,62	\$	-	65,96	\$ 705.185,62
E	4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	9,00	\$ 1.433.912,59	\$ 12.905.213,31	9,00	\$ 12.905.213,31	\$	-	9,00	\$ 12.905.213,31
E	4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.619,33	\$ 7.324,44	\$ 26.509.565,43	3619,33	\$ 26.509.565,43	\$	-	3.619,33	\$ 26.509.565,43
TOPOGRAFÍA													
E	E-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$	-	1,00	\$ 1.500.000,00
F ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE MANTA - PROVINCIA: ALMEIDAS							\$ 216.915.408,06		\$ 167.870.808,29		\$ 49.044.599,77		\$ 216.915.408,06
ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LA QUINERÍA, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE MANTA Y GACHETÁ													
2 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES													
F	2.9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30,00	\$ 25.556,30	\$ 766.689,00	0,00	\$ -	30,00	\$ 766.689,00	30,00	\$ 766.689,00
4 OBRAS DE ARTE													
F	4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (bases)	M3	30,00	\$ 699.877,78	\$ 20.996.333,40	0,00	\$ -	30,00	\$ 20.996.333,40	30,00	\$ 20.996.333,40
F	4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	9,00	\$ 5.757.827,41	\$ 51.820.446,69	9,00	\$ 51.820.446,69	0,00	\$ -	9,00	\$ 51.820.446,69
F	4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,32	\$ 456.762,96	\$ 602.927,11	0,00	\$ -	1,32	\$ 602.927,11	1,32	\$ 602.927,11
F	4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.691,50	\$ 7.164,44	\$ 12.118.650,26	0,00	\$ -	1.691,50	\$ 12.118.650,26	1.691,50	\$ 12.118.650,26
6 MANTENIMIENTO VIAL													
F	6.8	810.3-07	EMPLAZADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	1.000,00	\$ 31.122,96	\$ 31.122.960,00	1000,00	\$ 31.122.960,00	\$	-	1.000,00	\$ 31.122.960,00
F	6.9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	480,00	\$ 13.546,67	\$ 6.502.401,60	480,00	\$ 6.502.401,60	\$	-	480,00	\$ 6.502.401,60
MAQUINARIA													
F	F-M1		RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	40,00	\$ 140.000,00	\$ 5.600.000,00	40,00	\$ 5.600.000,00	\$	-	40,00	\$ 5.600.000,00
F	F-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	399,20	\$ 200.000,00	\$ 79.840.000,00	326,40	\$ 65.280.000,00	72,80	\$ 14.560.000,00	399,20	\$ 79.840.000,00
MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA													
F	F-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo vacío)	TRASLADO	2,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.400.000,00	2,00	\$ 2.400.000,00	\$	-	2,00	\$ 2.400.000,00
F	F1-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo cargado)	TRASLADO	202,50	\$ 18.000,00	\$ 3.645.000,00	202,50	\$ 3.645.000,00	\$	-	202,50	\$ 3.645.000,00
TOPOGRAFÍA													
F	F-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$	-	1,00	\$ 1.500.000,00
G ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE VENEZIA - PROVINCIA DE SUMAPAZ							\$ 139.983.923,21		\$ 139.983.923,21		\$ -		\$ 139.983.923,21
ATENCIÓN EMERGENCIA BOX CULVERT VÍA VENEZIA - CABRERA VEREDA SABANETA BAJA, SECTOR LOS AZA													
1 PRELIMINARES													
G	1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	38,11	\$ 193.020,74	\$ 7.356.020,40	38,11	\$ 7.356.020,40	\$	-	38,11	\$ 7.356.020,40
G	1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	55,42	\$ 67.582,22	\$ 3.745.406,63	55,42	\$ 3.745.406,63	\$	-	55,42	\$ 3.745.406,63
2 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES													
G	2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	72,43	\$ 18.180,74	\$ 1.316.831,00	72,43	\$ 1.316.831,00	\$	-	72,43	\$ 1.316.831,00
G	2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	528,94	\$ 25.556,30	\$ 13.517.749,32	528,94	\$ 13.517.749,32	\$	-	528,94	\$ 13.517.749,32
3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
G	3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	16,10	\$ 149.207,41	\$ 2.402.239,30	16,10	\$ 2.402.239,30	\$	-	16,10	\$ 2.402.239,30
4 OBRAS DE ARTE													
G	4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (box-culvert)	M3	53,20	\$ 749.807,41	\$ 39.889.754,21	53,20	\$ 39.889.754,21	\$	-	53,20	\$ 39.889.754,21
G	4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	17,93	\$ 184.911,85	\$ 3.315.469,47	17,93	\$ 3.315.469,47	\$	-	17,93	\$ 3.315.469,47
G	4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	155,00	\$ 135.036,30	\$ 20.930.626,50	155,00	\$ 20.930.626,50	\$	-	155,00	\$ 20.930.626,50
G	4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,86	\$ 483.151,11	\$ 1.381.812,17	2,86	\$ 1.381.812,17	\$	-	2,86	\$ 1.381.812,17
G	4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	6,50	\$ 1.433.912,59	\$ 9.320.431,84	6,50	\$ 9.320.431,84	\$	-	6,50	\$ 9.320.431,84
G	4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.761,92	\$ 7.324,44	\$ 34.878.397,32	4761,92	\$ 34.878.397,32	\$	-	4.761,92	\$ 34.878.397,32
6 MANTENIMIENTO VIAL													
G	6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	41,54	\$ 10.331,65	\$ 429.185,05	41,54	\$ 429.185,05	\$	-	41,54	\$ 429.185,05
TOPOGRAFÍA													
G	G-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$	-	1,00	\$ 1.500.000,00
H ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE MEDINA - PROVINCIA DE MEDINA							\$ 141.747.100,00		\$ 141.747.100,00		\$ -		\$ 141.747.100,00
I. ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DERRUMBES Y AFECTACIÓN VIAL DEBIDO A SISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDINA													
MAQUINARIA													

	FORNATO SECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISTA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO	MA-GR-FR-008					
							VERSION	1					
							FECHA	6/11/2025					
						FECHA	09/03/2026 (Día / Mes / Año)						
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS						ACTA No. 9	VALOR BASICO ACTA: \$ 262.826.510,01	MES 01/02/26 - 28/02/26					
CONTRATO No.: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 12 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/04/2026 (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CAJIC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 217 DE 2025						INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.900.000.000,00 (Indique día/mes/año)	
CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA							
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4	OBRAS DE ARTE												
N	4.5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	19,02	\$ 1.399.951,11	\$ 26.627.070,11	19,02	\$ 26.627.070,11	\$ -		19,02	\$ 26.627.070,11
O	ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GACHALÁ - PROVINCIA DE GUAVIO						\$ 146.016.555,36		\$ 146.016.555,36	\$ -		\$ -	\$ 146.016.555,36
ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LAS MINAS, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE GACHALÁ - UBALÁ													
2	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES												
O	2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	264,30	\$ 25.556,30	\$ 6.754.530,09	264,30	\$ 6.754.530,09	\$ -		264,30	\$ 6.754.530,09
4	OBRAS DE ARTE												
O	4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (box-culvert)	M3	44,92	\$ 713.700,74	\$ 32.059.437,24	44,92	\$ 32.059.437,24	\$ -		44,92	\$ 32.059.437,24
O	4.25	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	48,33	\$ 465.982,22	\$ 22.520.920,69	48,33	\$ 22.520.920,69	\$ -		48,33	\$ 22.520.920,69
O	4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	26,00	\$ 1.494.250,37	\$ 38.850.509,62	26,00	\$ 38.850.509,62	\$ -		26,00	\$ 38.850.509,62
O	4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.507,59	\$ 7.616,30	\$ 34.331.157,72	4507,59	\$ 34.331.157,72	\$ -		4.507,59	\$ 34.331.157,72
MAQUINARIA													
O	O-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	50,00	\$ 200.000,00	\$ 10.000.000,00	50,00	\$ 10.000.000,00	\$ -		50,00	\$ 10.000.000,00
TOPOGRAFIA													
O	O-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ -		1,00	\$ 1.500.000,0000
P	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - PROVINCIA: ALMEIDAS						\$ 228.391.147,87		\$ 228.391.147,87	\$ -		\$ -	\$ 228.391.147,87
ATENCIÓN EMERGENCIA MURO DE CONTENCIÓN VEREDA EL QUINCHE EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN													
1	PRELIMINARES												
G	1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	2,58	\$ 193.020,74	\$ 497.993,51	2,58	\$ 497.993,51	0,00	\$ -	2,58	\$ 497.993,51
2	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES												
O	2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	268,00	\$ 25.556,30	\$ 6.849.088,40	268,00	\$ 6.849.088,40	0,00	\$ -	268,00	\$ 6.849.088,40
O	2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27,00	\$ 56.948,89	\$ 1.537.620,03	27,00	\$ 1.537.620,03	0,00	\$ -	27,00	\$ 1.537.620,03
4	OBRAS DE ARTE												
O	4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (bases)	M3	24,09	\$ 677.345,19	\$ 16.317.245,63	24,09	\$ 16.317.245,63	0,00	\$ -	24,09	\$ 16.317.245,63
O	4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (elevaciones)	M3	41,12	\$ 814.337,04	\$ 33.485.539,08	41,12	\$ 33.485.539,08	0,00	\$ -	41,12	\$ 33.485.539,08
O	4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M, CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	12,30	\$ 5.717.764,44	\$ 70.328.502,61	12,30	\$ 70.328.502,61	\$ -		12,30	\$ 70.328.502,61
O	4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	18,00	\$ 21.634,07	\$ 389.413,26	18,00	\$ 389.413,26	\$ -		18,00	\$ 389.413,26
O	4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	29,46	\$ 137.715,56	\$ 4.057.100,40	29,46	\$ 4.057.100,40	0,00	\$ -	29,46	\$ 4.057.100,40
O	4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	226,50	\$ 98.905,19	\$ 22.402.025,54	226,50	\$ 22.402.025,54	0,00	\$ -	226,50	\$ 22.402.025,54
O	4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,63	\$ 433.325,93	\$ 1.139.647,20	2,63	\$ 1.139.647,20	0,00	\$ -	2,63	\$ 1.139.647,20
O	4.31	681.1	GAVIÓN	M3	67,65	\$ 288.891,85	\$ 19.543.533,65	67,65	\$ 19.543.533,65	0,00	\$ -	67,65	\$ 19.543.533,65
O	4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	141,71	\$ 10.491,11	\$ 1.486.695,20	141,71	\$ 1.486.695,20	0,00	\$ -	141,71	\$ 1.486.695,20
O	4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	7,90	\$ 1.400.794,07	\$ 11.066.273,15	7,90	\$ 11.066.273,15	0,00	\$ -	7,90	\$ 11.066.273,15
O	4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.136,66	\$ 7.164,44	\$ 36.801.292,37	5136,66	\$ 36.801.292,37	0,00	\$ -	5.136,66	\$ 36.801.292,37
6	MANTENIMIENTO VIAL												
R	6.9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	73,02	\$ 13.546,67	\$ 989.177,84	73,02	\$ 989.177,84	\$ -		73,02	\$ 989.177,84
TOPOGRAFIA													
P	P-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ -		1,00	\$ 1.500.000,0000
Q	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA - PROVINCIA: SOACHA						\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	\$ -		\$ -	\$ 1.500.000,00
ATENCIÓN EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT- SECTOR ALTOS DE CAZUCA MUNICIPIO DE SOACHA													
TOPOGRAFIA													
Q	Q-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ -		1,00	\$ 1.500.000,0000
R	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PASCA - PROVINCIA: SUMAPAZ						\$ 20.538.314,01		\$ 20.538.314,01	\$ -		\$ -	\$ 20.538.314,01
ATENCIÓN EMERGENCIA REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR - MUNICIPIO DE PASCA													
1	PRELIMINARES												
R	1.1	201 P-07	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	8,63	\$ 193.020,74	\$ 1.665.768,99	8,63	\$ 1.665.768,99	\$ -		8,63	\$ 1.665.768,99
2	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES												
R	2.13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12,95	\$ 56.948,89	\$ 737.488,13	12,95	\$ 737.488,13	\$ -		12,95	\$ 737.488,13
4	OBRAS DE ARTE												
R	4.2	630.3-07	CONCRETOS CLASE C, Fc >4000 psi (placas)	M3	11,08	\$ 952.480,00	\$ 10.553.478,40	11,08	\$ 10.553.478,40	\$ -		11,08	\$ 10.553.478,40
R	4.7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, Fc >3000 psi (elevaciones)	M3	0,07	\$ 812.512,59	\$ 56.875,88	0,07	\$ 56.875,88	\$ -		0,07	\$ 56.875,88
R	4.52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	523,11	\$ 7.324,44	\$ 3.831.487,81	523,11	\$ 3.831.487,81	\$ -		523,11	\$ 3.831.487,81
MARCA VIAL													
R	5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	40,00	\$ 54.830,37	\$ 2.193.214,80	40,00	\$ 2.193.214,80	\$ -		40,00	\$ 2.193.214,80
TOPOGRAFIA													
R	R-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,0000
S	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA: SUMAPAZ						\$ 119.904.000,00		\$ 119.904.000,00	\$ -		\$ -	\$ 119.904.000,00



FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Informe de Supervisión y/o Visita para Convenios
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

LÍBRRO
MA-GP-FR-008
SESION
6/11/2025
FECHA

FECHA
09/03/2026
(Día / Mes / Año)

DIRECCION: DIRECCIÓN DE CAMINOS ACTA No. 9 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 262.826.510,01 MES 01/02/26 - 28/02/26
CONTRATO No.: ICCU 201 DE 2025 PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días PLAZO ACUMULADO: 12 meses
OBJETO: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAYVO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/04/2026
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CUIK FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 6.800.000.000,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.900.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 9.700.000.000,00

CONDICIONES INICIALES							OBRA EJECUTADA						
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA DE SUMAPAZ - SUMINISTRO DE MATERIALES													
NO PREVISTOS													
S	NP-001	---	SUMINISTRO DE TUBERÍA PETROLERA AP 5L PSL 1 SCH 40	ML	720,00	\$ 145.000,00	\$ 104.400.000,00	720,00	\$ 104.400.000,00	\$	-	720,00	\$ 104.400.000,000
S	NP-002	---	SUMINISTRO DE LÁMINA MARCHAVANTE CALIBRE 3 MM	M2	91,20	\$ 170.000,00	\$ 15.504.000,00	91,20	\$ 15.504.000,00	\$	-	91,20	\$ 15.504.000,000
T	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA: RIONEGRO						\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00	\$	-	\$	\$ 1.500.000,00
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA DE RIONEGRO - PÉRDIDA DE BANCA EN EL COSTADO IZQUIERDO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO - LA PALMA (PR 80+900)													
TOPOGRAFÍA													
T	R-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.000,000
COSTO DIRECTO													
AIU 35%							\$ 4.762.332.848,92		\$ 4.381.179.823,97	\$	194.686.303,71	\$	4.575.866.127,67
SUBTOTAL							\$ 1.666.816.497,12		\$ 1.533.412.938,39	\$	68.140.206,30	\$	1.601.553.144,68
DISPONIBILIDAD ATENCION DE EMERGENCIAS							\$ 6.429.149.346,04		\$ 5.914.592.762,36	\$	262.826.510,01	\$	6.177.419.272,35
VALOR TOTAL DEL CONTRATO							\$ 9.700.000.000,00						
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA									\$ 5.914.592.762,36	\$	262.826.510,01	\$	6.177.419.272,35
VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (20%)									\$ 1.182.918.552,47	\$	176.511.876,08	\$	1.235.483.854,47
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA									\$ 4.731.674.209,89	\$	86.314.633,93	\$	4.941.935.417,88

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU	35	%
Utilidad	5	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 1.360.000.000,00	100,00%
Valor Amortizado Acta No 1	\$ 71.774.700,16	5,28%
Valor Amortizado Acta No 2	\$ 128.440.468,71	9,44%
Valor Amortizado Acta No 3	\$ 100.123.848,79	7,36%
Valor Amortizado Acta No 4	\$ 230.908.106,58	16,98%
Valor Amortizado Acta No 5	\$ 274.521.293,85	20,19%
Valor Amortizado Acta No 6	\$ 99.921.672,85	7,35%
Valor Amortizado Acta No 7	\$ 178.205.999,89	13,10%
Valor Amortizado Acta No 8	\$ 99.592.333,09	7,32%
Valor Amortizado Acta No 9	\$ 176.511.876,08	12,98%
Valor Amortizado Acta No 10		
Valor Amortizado Acumulado	\$ 1.360.000.000,00	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	\$ -	0,00%

		FORNATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Informe de Supervisión y/o Visita para Convenio ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MA-GR-FB-026		VERSION 1		FECHA 6/11/2025	
						FECHA 09/03/2026 (Día / Mes / Año)					
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS		ACTA No. 8				VALOR BASICO ACTA: \$ 292.926.510,01		MES 01/02/26 - 28/02/26			
CONTRATO No: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 12 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/04/2026 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 217 DE 2025		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.900.000.000,00 (Indique día/mes/año)			
CONDICIONES INICIALES		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO											
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.											
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)											
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO											
NO APLICA											
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AII VR. ACUMULADO											
E: EXCAVACIONES											
P: PILOTE											
CB: CONCRETO BASE											
CE: CONCRETO DE ELEVACION											
CV: CONCRETO VIGA											
CL: CONCRETO LOSA											
R: ACERO DE REFUERZO											
R: RELLENO PARA ESTRUCTURA											
A: ALQUILER Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA											
TOTAL \$ - \$ -											
VALOR INICIAL CONTRATADO \$ 6.800.000.000,00											
VALOR ADICIÓN No. 1 \$ 2.900.000.000,00											
ANTICIPO \$ 1.360.000.000,00 14,02% 14,02%											
ACTA 1 \$ 358.873.500,82 3,70% 2,96%											
AMORTIZACION ACTA 1 \$ 71.774.700,16 -0,74%											
ACTA 2 \$ 642.202.343,57 6,62% 5,30%											
AMORTIZACION ACTA 2 \$ 128.440.468,71 -1,32%											
ACTA 3 \$ 500.619.243,95 5,16% 4,13%											
AMORTIZACION ACTA 3 \$ 100.123.848,79 -1,03%											
ACTA 4 \$ 1.154.540.532,91 11,96% 9,52%											
AMORTIZACION ACTA 4 \$ 230.908.106,58 -2,36%											
ACTA 5 \$ 1.372.606.469,24 14,15% 11,32%											
AMORTIZACION ACTA 5 \$ 274.521.293,85 -2,83%											
ACTA 6 \$ 499.608.364,26 5,15% 4,12%											
AMORTIZACION ACTA 6 \$ 99.921.672,85 -1,03%											
ACTA 7 \$ 891.028.499,45 9,19% 7,35%											
AMORTIZACION ACTA 7 \$ 178.205.699,89 -1,84%											
ACTA 8 \$ 497.961.665,47 5,13% 4,11%											
AMORTIZACION ACTA 8 \$ 99.592.333,09 -1,03%											
ACTA 9 \$ 262.626.510,01 2,71% 0,89%											
AMORTIZACION ACTA 9 \$ 176.511.876,08 -1,82%											
SALDO A FAVOR DEL ICCU \$ 3.519.732.870,32 36,29%											
SUMAS IGUALES \$ 9.700.000.000,00 \$ 9.700.000.000,00 100,00% 100,00%											

		<div>FORNITO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISTA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</div>				<div>CÓDIGO MA-GR-FR-038</div> <div>VERSIÓN 1</div> <div>FECHA 9/11/2025</div>									
DIRECCIÓN: DIRECCION DE CAMINOS		ACTA No. 9		VALOR BASICO ACTA: \$ 262.826.510,01		FECHA: 09/03/2026 (Día / Mes / Año)									
CONTRATO No.: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 12 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		MES: 01/02/26 - 28/02/26									
OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/04/2026 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CUIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 6.900.000.000,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.900.000.000,00									
CONDICIONES INICIALES		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA									
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FOMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FOMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CAQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CAQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GACHALÁ - PROVINCIA DE GUAVIO - ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LAS MINAS, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE GACHALÁ - UBALÁ	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - PROVINCIA ALMEIDAS - ATENCIÓN EMERGENCIA MURO DE CONTENCIÓN VENEZA EL GUINCHO EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA - PROVINCIA SOACHA - ATENCIÓN EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT - SECTOR ALTOS DE CAZUCA MUNICIPIO DE SOACHA	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PASCA - PROVINCIA SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR - MUNICIPIO DE PASCA	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA DE SUMAPAZ - SUMINISTRO DE MATERIALES	\$	-	\$	-	\$	-								
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA RIONEGRO - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA DE RIONEGRO - PERDIDA DE BANCA EN EL COSTADO IZQUIERDO VÍA ZAPAQUÍRA - PACHO - LA PALMA (PR 80-900)	\$	-	\$	-	\$	-								
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$	194.686.303,71	\$	68.140.206,30	\$	262.826.510,01								
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$	262.826.510,01												
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$	176.511.876,08												
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$	86.314.633,93	VALOR EN LETRAS:		OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.									
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)															
El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.															
OBSERVACIONES															
NOTAS:															
1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.															
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.															
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).															
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.															
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.															
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.															
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.															
Para constancia de lo anterior firman															
Firma:  Nombre: Jaime Ernesto Salas Bahamón REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: CONSORCIO OBRAS ICCU CUIK				Firma:  Nombre: Juan Manuel Bravo Páez REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB				Firma:  Nombre: Cristian Fabián Torres Garzón GESTOR ICCU				Firma:  Nombre: Ing. Daniela Nieto Gutiérrez DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS ICCU			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera). Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.															
