




Bogotá, 31 de Marzo de 2026
INTER-WPG-LG-196

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remision Informe Mensual De Interventoria No.10

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia, esta interventoria se permite remitir el informe mensual de interventoria No.10, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de Enero de 2026 y el 31 de Enero de 2026. Para su informacion y fines pertinentes, acompañados de todos sus anexos.

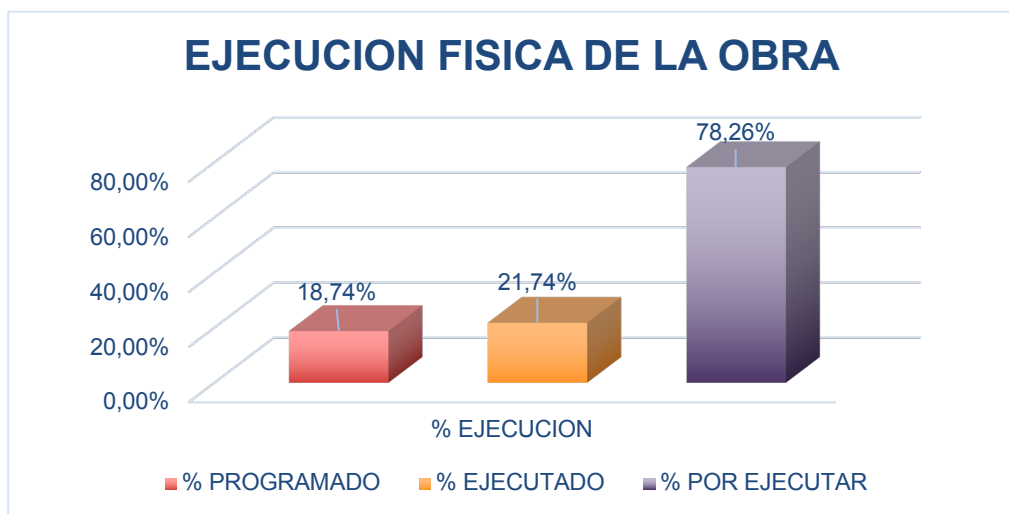

Cordialmente,


Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores



**Gobernación
del Huila**

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

**FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE
OBRA**

INFORME MENSUAL

PERIODO 10

(12 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026)

 <div> Gobernación del Huila </div>	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

Informe No.	10	Período al que corresponde	Desde	12/Ene/2026	Hasta	31/Ene/2026
-------------	----	----------------------------	-------	-------------	-------	-------------

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBRA								
Contratista		CONSORCIO COLPITALITO 23						
Contrato de obra No.		1506 De 2023	Objeto	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.				
V a l o r	\$12.653.913.161,52		P l a z o	18 Meses 20 Días	Fecha de inicio	Dic/04/23	Fecha de Terminación	Nov/08/26

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA								
Contratista		CONSORCIO INTERCONSULTORES						
Contrato de Interventoría No.		1585 De 2023	Objeto		“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”			
Valor	\$ 973.140.781,00		Plazo	18 Meses 20 Días	Fecha de inicio	Dic/04/23	Fecha de Terminación	Nov/08/26



**Gobernación
del Huila**


“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

**FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE
OBRA**

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Item	Descripción	Evidencia
2.1	Solicitud de Prórroga	No Aplica
2.2	Solicitud de Suspensión	No Aplica
2.3	Solicitud de Adición	No Aplica
2.4.	Orientación sobre trámites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.	No Aplica

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

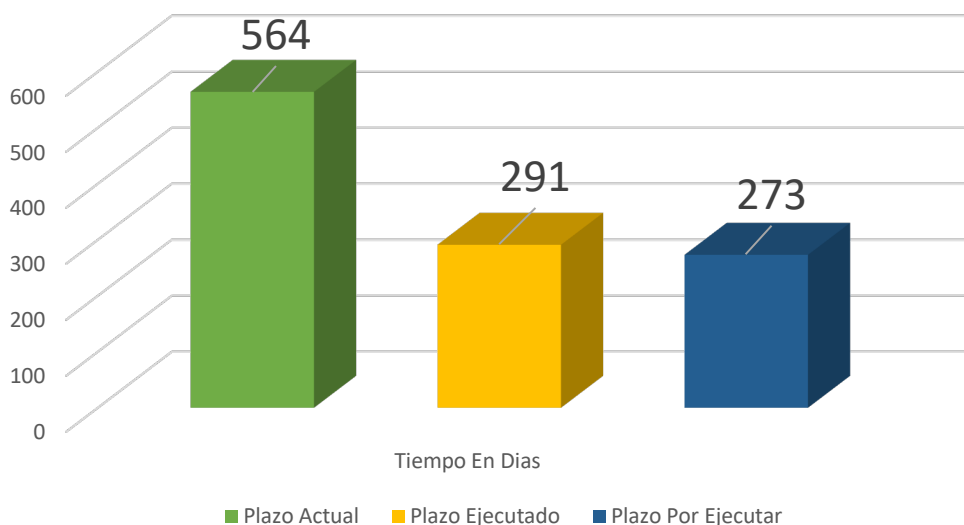

Tiempo En Dias

■ Plazo Actual ■ Plazo Ejecutado ■ Plazo Por Ejecutar

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Item	Descripción			Evidencia
3.1	Programación de obra (%)	Programado	Ejecutado	Se adjunta registro Semanal fotográfico de avance del periodo.
		18,74%	21,74%	
3.2	Actas de recibo parcial de obra			Si Aplica
3.3	Actas de recibo final de obra			No Aplica
3.4	Resultados ensayos de laboratorio cuando se requiera			Si Aplica




**Gobernación
del Huila**

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

EJECUCION FISICA DE LA OBRA

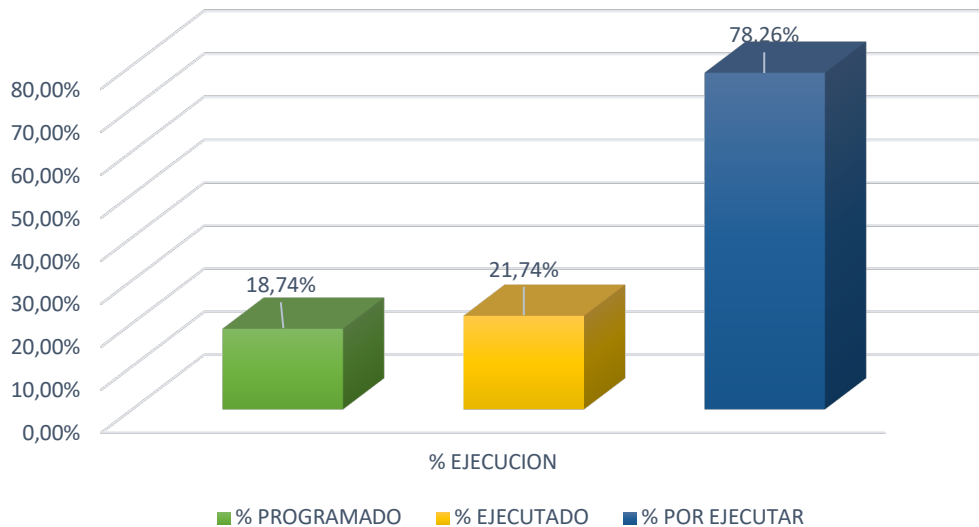

COMPONENTE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

4. ASPECTOS FINANCIEROS						
Item	Descripción				Evidencia	
4.1	Programación financiera de obra (\$)		Programado	Ejecutado		Se adjunta registro fotográfico de avance del periodo.
			\$ 2.371.342.526,48	\$ 2.750.868.120,01		
4.2	Entrega de recurso		Valor		Estado	-
		Acta Parcial 1	\$554.458.857,38		DESEMBOLSADA	
		Acta Parcial 2	\$368.711.925,91		DESEMBOLSADA	
		Acta Parcial 3	\$247.093.830.03		DESEMBOLSADA	
		Acta Parcial 4	\$354.770.738,00		DESEMBOLSADA	
		Acta Parcial 5	\$1.213.153.654,82		DESEMBOLSADA	
		Acta Parcial 6	\$648.120.653,54		PRESENTE	
		Total entrega de recursos		\$3.386.309.659,68		
4.3	Plan de inversión del anticipo de obra (si aplica)				Si Aplica	
4.4	Informe de inversión del anticipo de obra (si aplica)				Si Aplica	




**Gobernación
del Huila**

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

**FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE
OBRA**

El acta parcial No.06 de obra e interventoría se radica con el presente informe.

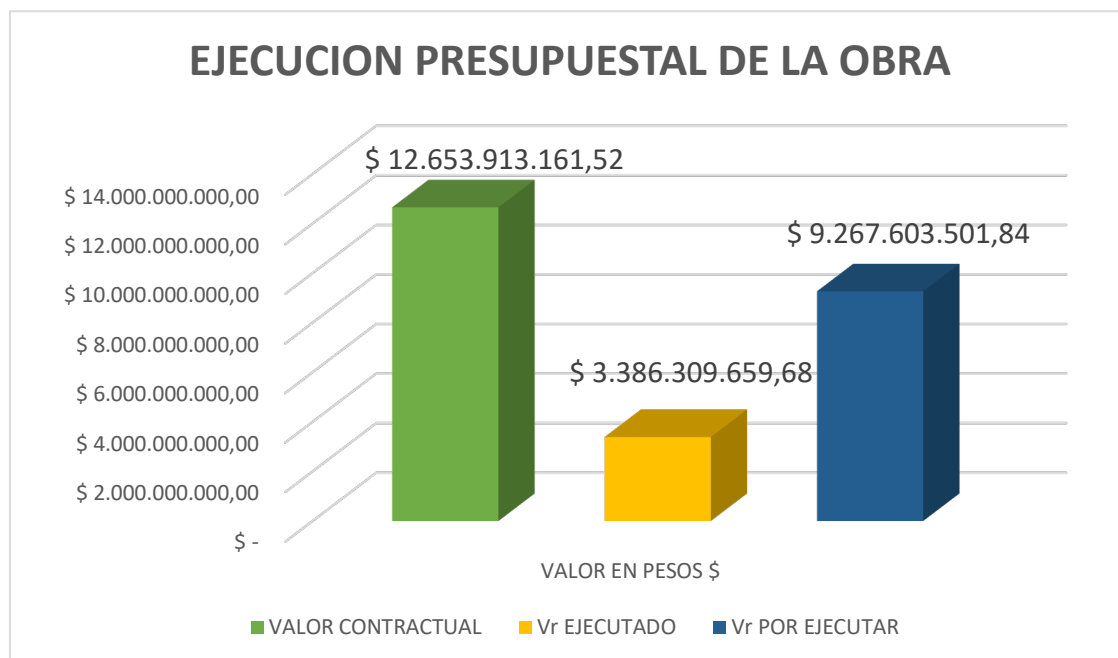

CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR DEL CONTRATO	\$ 973.140.781,00
VALOR FACTURADO PERIODO 04-12-2023 A 28-12-2023	\$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 06-05-2024 A 31-05-2024	\$40.448.251,76
VALOR FACTURADO PERIODO 01-06-2024 A 30-06-2024	\$26.897.852,94
VALOR FACTURADO PERIODO 01-07-2024 A 31-07-2024	\$18.025.707,97
VALOR FACTURADO PERIODO 01-08-2024 A 31-08-2024	\$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 01-09-2024 A 30-09-2024	\$ 0,00




**Gobernación
del Huila**

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

**FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE
OBRA**

VALOR FACTURADO PERIODO 01-10-2024 A 31-10-2024	\$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 01-11-2024 A 15-11-2024	\$25.867.317,47
VALOR FACTURADO PERIODO 24-11-2025 A 11-01-2026	\$23.623.405,60
VALOR FACTURADO PERIODO 12-01-2026 A 28-02-2026	\$49.824.848,77
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	\$788.453.396,49

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA
INTERVENTORIA**

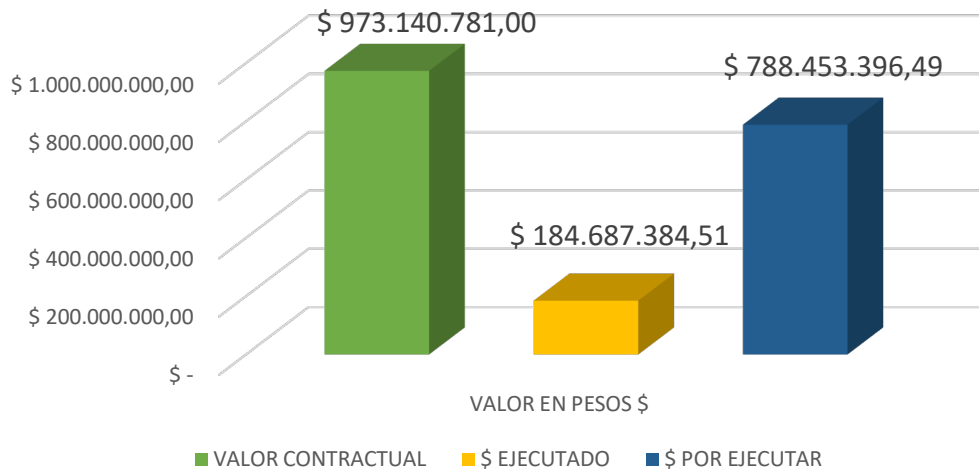

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

RESPECTO AL BALANCE DE MAYORS Y MENORES CANTIDADES NO.02

Actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica, análisis y aval de las cantidades de obra mayores y menores correspondientes a los capítulos que aún se encuentran pendientes de ajuste, con el fin de garantizar la coherencia entre el alcance real del proyecto y las condiciones contractuales vigentes. Este proceso, por su nivel de detalle técnico y presupuestal, resulta dispendioso, toda vez que implica la verificación exhaustiva de cantidades, actividades, rendimientos y su correspondencia con las soluciones constructivas adoptadas en obra; no obstante, se encuentra en desarrollo permanente por parte del contratista y la interventoría. De manera paralela, se adelanta la redistribución del recurso necesario.

Una vez se logre la conciliación técnica y presupuestal entre obra e interventoría, se dará inicio al trámite administrativo correspondiente ante la entidad contratante, el cual se tiene previsto gestionar durante el mes de febrero del año en curso, conforme a los procedimientos y plazos establecidos.

COMPONENTE LEGAL Y JURIDICO

1. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE OBRA					
Item	Descripción				Evidencia
6.1	Estado de las garantías VIGENTES				
	Aseguradora	SEGUROS DEL ESRADO	No. póliza	21-40-101220737 21-44-101427775	Pólizas Remitidas A La Entidad
	ANEXO 9				
	Amparo		Desde	Hasta	Valor Asegurado
	De Cumplimiento		04/12/2023	17/05/2027	\$2.530.782.632,30
	Buen Manejo Y Correcta Inversion Del Anticipo		04/12/2023	17/05/2027	\$2.563.268.624.69
	Salarios Y Prestaciones Sociales		04/12/2023	17/11/2029	\$1.265.391.316.15
	Estabilidad Calidad De La Obra		5 años		\$2.530.782.632,30
	ANEXO 9				
	Predios Labores Y Operaciones		04/12/2023	17/11/2026	\$711.750.000,00


	<p>Gobernación del Huila</p> <p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p align="center">FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

	Daño Emergente Y Lucro Cesante	04/12/2023	17/11/2026	\$711.750.000,00
	Perjuicios Extrapatrimoniales	04/12/2023	17/11/2026	\$711.750.000,00

2. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE INTERVENTORIA					
Item	Descripción				Evidencia
6.1	Estado de las garantías VIGENTES				
	Aseguradora	SEGUROS DEL ESRADO	No. póliza	33-44-101244090 33-40-101077107	Pólizas Remitidas A La Entidad
	ANEXO 10				
	Amparo		Desde	Hasta	Valor Asegurado
	De Cumplimiento		04/12/2023	27/07/2026	\$124.661.771,00
	Salarios Y Prestaciones Sociales		04/12/2023	27/01/2029	\$124.661.771,00
	Calidad Del Servicio		06/09/2024	10/01/2030	\$124.661.771,00
	ANEXO 10				
	Predios Labores Y Operaciones		04/12/2023	27/01/2026	\$284.000.000,00

COMPONENTE TECNICO

Información general del proyecto

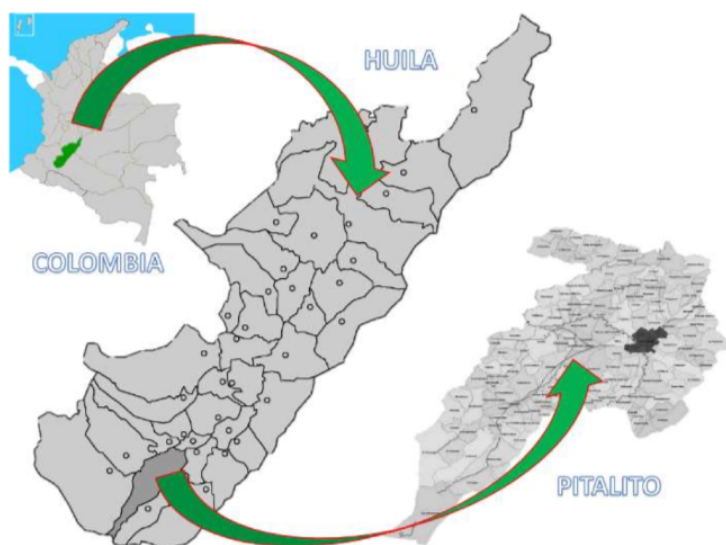

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

El proyecto se localiza en la Calle 1ª No. 12E – 67/68 en al barrio paraíso de la comuna 2 de la ciudad de Pitalito, departamento del Huila.

El proyecto corresponde a la construcción de la primera fase del colegio Winnipeg del Municipio de Pitalito – Huila, y se desarrolla en un área de 7.920 m2., el cual, de acuerdo con el alcance contractual, contempla la construcción de doce (12) aulas escolares en dos módulos de uno y dos niveles, con sus respectivas baterías sanitarias y demás espacios complementarios como biblioteca, sala de profesores, laboratorio de física y química, aulas TIC, restaurante comedor y aula múltiple, dos campos deportivos multifuncionales, tienda escolar, un taller, zona de parqueaderos y cerramiento perimetral con una portería peatonal y subestación eléctrica sobre la calle 1ª y una portería vehicular con depósito de basuras sobre la calle 12 Este.

El proyecto contempla internamente zonas duras de circulación peatonal y de concentración y permanencia a campo abierto tales como plazoletas. Así mismo, se cuenta con zonas verdes y franjas perimetrales con un diseño de contenedores de raíces para árboles. Dentro de la modificatoria No. 1 del contrato, del pasado 09 de diciembre de 2025 y conforme a la modificación de la licencia de construcción No. 11379-6 JUNIO 2022, según resolución No. 170 del 01 de abril de 2025 presentada por el Municipio de Pitalito, en el cual se realizaron los ajustes a los diseños estructurales en cumplimiento de la norma vigente Colombiana NSR-10, lo que conllevo al balance No. 1 de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previsto, con la modificación de la cimentación y los elementos estructurales de los módulos que componen el proyecto, tales como el sistema constructivo y la resistencia del concreto para aulas de dos pisos pasando de una cimentación de zapatas con concreto 3000PSI a una placa de cimentación aligerada de 50cm de espesor y concreto 4000psi, la incorporación de concretos ciclópeos bajo zapatas por parte del consultor de diseños, la adición de un muro de contención sobre el perímetro del predio para el cerramiento perimetral, el reforzamiento estructural del tanque de almacenamiento de agua potable y RCI, la mayor cantidad de obra en las actividades preliminares de replanteo, excavaciones, movimiento de tierra y rellenos, entre otros que se encuentran ampliamente soportados y graficados en el acta de justificación anexa al mencionado balance de obra.

A nivel de arquitectura, las modificaciones corresponden a la implantación del módulo de tienda escolar, bicicleteo, parqueadero y rampa de acceso para aulas de 2 pisos, la reubicación del tanque de almacenamiento de agua potable y RCI que se desplazó hacia el interior del lote de la fase 1, la ampliación de la subestación eléctrica para darle

 Gobernación del Huila	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

cabida a los equipos de respaldo del sistema de la red interna y sus respectivos tableros; se mantienen la materialidad y acabados que corresponde a muros en mampostería de arcilla a la vista en muros determinados y demás con las diferentes capas de acabado y obra blanca, estructura de cubierta con perfiles metálicos y teja en lámina, zona deportiva en placa de concreto con su respectiva demarcación multifuncional y circulaciones peatonales en adoquín; se incluyen en este la construcción de las redes internas de acueducto con tanque de almacenamiento y equipos, red sanitaria, red de aguas lluvias, red eléctrica con subestación eléctrica, red contra incendios con su respectivos tanque de almacenamiento.

En consecuencia, a dichas modificaciones, se contó con una adición en valor correspondientes a \$ 4.109.684.412,54 y una prórroga en tiempo de nueve (09) meses y veinte (20) días para un valor total de \$12.653.913.161,52 y un plazo total de dieciocho (18) meses y veinte (20) días contados a partir de la fecha del acta de inicio.

3. AVANCE DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	
PERIODO DE DESARROLLO	12-ENERO-2026 A 31-ENERO-2026
6.1 PRIMERA FASE IE WINNIPEG	

Informe	Fecha		Programado semanal	Programado acumulado	Ejecutado semanal	Ejecutado acumulado
	Del	al				
Semana 40	12-01-26	18-01-26	0,95%	17,17%	0,02%	21,66%
Semana 41	19-01-26	25-01-26	1,22%	18,39%	0,02%	21,68%
Semana 42	26-01-26	01-02-26	0,34%	18,74%	0,06%	21,74%

- EN CUANTO CANTIDADES SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESENTE ACTA	
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,1	Excavación manual a todo costo en material común, incluye: uso de herramientas, maquinaria equipos, entibados, emtarimados, manejo de aguas y demas actividades y elementos	M3	123,14	\$3.565.764,98



**Gobernación
del Huila**

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

	que se requieran para ejecutar correctamente la obra.			
3. CIMIENTOS				
3,1	Concreto de Fc = 21Mpa para (Zapatas y vigas de cimentación) (no incluye refuerzo)	M3	46,34	\$43.410.848,60
3,2	Concreto Pobre de limpieza Fc = 14Mpa de e = 5cm	M3	6,44	\$3.469.073,44
NP 3,9	Placa cimentacion aligerada h=50 cms 4000 psi, no incluye refuerzo.	M2	542,76	\$393.414.158,40
5. ESTRUCTURA				
5,2	Acero de refuerzo longitudinal de 60000 PSI (Fy=420Mpa), Incluye amarrado y figurado	Kg	10.341,40	\$ 101.428.451,20
5,3	Acero de trasversal de 60000 PSI (Fy=420Mpa), Incluye amarrado y figurado	Kg	6.759,94	\$ 66.301.467,00
NP 5,15	Columna en concreto de Fc= 27,6 Mpa, 4.000 psi no incluye acero de refuerzo	M3	19,68	\$ 29.592.028,80
8. INSTALACIONES HIDRAULICAS				
8,20	Tubería PVC presión de 1/2 RDE 21	ML	7,60	\$ 295.738,80
8,21	Tubería PVC presión de 3/4 RDE 21	ML	1,65	\$ 63.558,00
8,24	Tubería PVC presión de 1 1/2 RDE 21	ML	30,47	\$ 1.425.630,36
8,25	Tubería PVC presión de 2 RDE 21	ML	8,42	\$ 412.748,40
9 INSTALACIONES SANITARIAS				
9,4.1	Punto de desagüe PVC 4"	UND	12,00	\$ 1.682.496,00
9.4.3	Punto de desagüe PVC 3"	UND	9,00	\$ 1.015.218,00
9.7.4	Tuberia pvc-s 3 (red sanitaria)	ML	3,44	\$ 148.012,88
9.7.5	Tuberia pvc-s 4 (red sanitaria)	ML	27,28	\$ 1.458.961,68
19. INSTALACIONES INTERNAS				
19.5.12	CANALIZACION ACOMETIDAS PARCIALES C-3 A TABLERO 7, EN	ML	16,60	\$ 436.497,00

 <div data-bbox="428 239 764 331"> Gobernación del Huila </div>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p align="center">FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

	DUCTOS CONDUIT PVC TIPO PESADO, UN DUCTO DE 1 1/2" PARA BAJA TENSION . INCLUYE COMPACTACION Y TAPADA DE BRECHA. Profundidad 1M.			
--	---	--	--	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
12-ENERO-2026 A 31-ENERO-2026				

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista CONSORCIO COLPITALITO 23, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado en seguridad y salud en el trabajo del contrato en ejecución cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.”.

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

1. OBJETIVOS
- 1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento exhaustivo a las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales están enfocadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva del personal vinculado al proyecto “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.”, a través de la aplicación de programas y normas de seguridad en las áreas de trabajo, realizando un

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

seguimiento continuo, que permitan alcanzar el más alto nivel físico, mental y social en nuestros profesionales.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar e involucrar de forma clara en las diferentes etapas del desarrollo del contrato, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de la obra, que se pueden generar como consecuencia de la ejecución de las actividades contractuales.

Realizar el seguimiento a las responsabilidades y obligaciones de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las cuales enmarcan el componente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Bioseguridad.

Verificar el cumplimiento en cuanto a los procesos, procedimientos, permisos, registros e inspecciones que debe realizar el contratista, para cotejar el desempeño frente a lo indicado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. CONTROL DE PERSONAL

Con el fin de optimizar las medidas de seguridad y prevención, asegurando un óptimo manejo y control del personal, esta interventoría contempla con la solicitud para revisión y verificación de afiliación a seguridad social correspondientes a ARL, EPS y EFP. De igual forma también se solicita el respectivo examen ocupacional de ingreso y para los trabajos considerados de alto riesgo tales como tareas en alturas, se requiere de su respectivo certificado para trabajo en alturas.

Se toman registros de ingreso de personal diario para control del personal operativo de obra y verificación de sus afiliaciones vigentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo. En dicho control de personal se verifica el personal ingrese con toda la dotación correspondiente a su actividad laboral, adicional a la dotación básica de ropa, calzado y casco.

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p align="center">FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS:

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
JAIRO VARGAS TRILLERAS	CONTRATISTA PARA DESCAPORTE, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO Y COMPACTACIÓN.
W SOLUCIONES TOPOGRAFICAS S.A.S.	TOPOGRAFO
CONCRETOS P&S	CONTRATISTA MANO DE OBRA
SEGURIDAD LA FÉ	CELADURÍA Y VIGILANCIA DE LA OBRA 24/7
FERRETERIA G y J S.A.	PROVEEDOR DE ACERO FIGURADO
HORMIGONES DEL SUR S.A.S.	PROVEEDOR CONCRETO PREMEZCLADO
CONCRETOS P&S	PROVEEDOR CONCRETO PREMEZCLADO
FERRETERIA CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.S.	FERRETERÍA
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR S.A.S.	FERRETERÍA
DEPOSITO DE MADERAS CHELITA	PROVEEDOR DE MADERA

LISTADO PERSONAL DE MANO DE OBRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO
Andres trujillo	1075224894	Oficial	24/12/2025
Bladimir Valencia	1125409765	ayudante	19/02/2026
José albert Solano	830424	Ayudante	19/02/2026
Osvaldo Daniel Orozco Ramírez	1119581149	ayudante	12/12/2025
jhonger stilver rivera	1083881335	ayudante	24/12/2025
Jonny Alexander Díaz Esquivel	1006507474	ayudante	24/12/2025
Libardo Borja	97450038	Ayudante	24/12/2025

3. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo actúan como una herramienta efectiva para garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y

	Gobernación del Huila	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA		

social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

De acuerdo a lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales; esta interventoría solicita dentro de los requisitos mínimos para ingreso de personal a las instalaciones del proyecto, realizar a los trabajadores que se pretenden integrar en la ejecución del presente contrato, su respectivo examen médico ocupacional de ingreso, los cuales se deben practicar en los lugares definidos por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023 y efectuados por personal idóneo en salud ocupacional.

TEMA	ACTIVIDAD	MES – FECHA	ESTADO/ OBSERVACIONES
Inspecciones de seguridad	Inspección de condiciones y áreas de trabajo y seguridad, equipos, EPP Y áreas de trabajo.	Enero	Cumplido-seguimiento periodico en obra
Inducción SST	Inducción y reinducción al personal nuevo que ingrese al proyecto	Según ingreso	Cumplido- registro de asistencia y soportes archivados
Capacitación SST	Charlas de seguridad y socialización de riesgos laborales	Enero	Participación de personal operativo
Promoción de la salud	Ejecución de pausas activas con trabajadores	Enero	Actividad preventiva realizada en jornada laboral

 <div data-bbox="428 239 764 331"> Gobernación del Huila </div>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p align="center">FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

Equipos de emergencia	Instalación y verificación de camilla para atención de emergencias	Enero	Cumplido- disponible y señalizada
Permisos de trabajo	Control y verificación de permisos para actividades de riesgo	Permanente	Cumplido- aplicado según la actividad ejecutada
Orden y aseo	Seguimiento a condiciones de orden y aseo en áreas de trabajo	Enero	Cumplido – se realizan jornadas de aseo

4. SEGUIMIENTO A DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

La firma contratista Consorcio Colpitalito debe realizar la entrega de los elementos de protección personal adecuados para los trabajadores que se vinculen en obra, los cuales corresponde a:

- 
Guantes de Carnaza o vaqueta (cuando aplique)


Camisa
- 
Guantes de Caucho


Pantalón
- 
Gafas de seguridad


Botas punta de acero
- 
Protector respiratorio

De igual forma se deben presentar los registros del seguimiento de dotación de EPP's y realizar los respectivos cambios cuando sea necesario.

5. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

A lo largo del desarrollo de actividades, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, debe realizar capacitaciones y charlas de seguridad, las cuales se enfocarán en los

 <div data-bbox="427 237 764 331"> Gobernación del Huila </div>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

riesgos y peligros a los que se podrán ver expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas, de igual forma también se deben formular controles para evitar la materialización de algún accidente e incidente de trabajo.

FECHA	TEMA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
26/01/2026	presentación del equipo de trabajo y normas de convivencia	Director de obra	
28/01/2026	socialización de permisos de trabajo	Residente SST	
31/01/2026	orden y aseo	Residente SST	

6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El contratista debe presentar por medio de formatos las siguientes inspecciones:

- ✚ Elementos de protección personal y dotación
- ✚ Trabajo en caliente (en este momento no aplica)
- ✚ Trabajo seguro en alturas (Si aplica)
- ✚ Elementos de protección contra caídas (Si aplica)
- ✚ Inspección de extintores en obra.
- ✚ Inspección de botiquín.

INSPECCIONES SST REALIZADAS POR EL CONSORCIO COLPITALITO 23		
FECHA	UBICACIÓN	TIPO DE INSPECCIÓN
28/11//2025	Campamento de obra/ oficina	Inspección de equipos (camilla, botiquín y extintor)
28/11//2025	Campamento de obra/ oficina	Inspección de áreas locativas

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

7. TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Con el fin de identificar, valorar y establecer las medidas de control necesarias sobre las condiciones potencialmente peligrosas, se implementó el uso de los permisos para trabajos considerados de alto riesgo, los cuales definen las precauciones que se deben tomar antes, durante y después de la realización del trabajo, en donde estos serán diligenciados y avalados por el residente de obra.

8. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Tanto los accidentes como los incidentes de trabajo deben ser reportados por el contratista ante esta interventoría durante el mes, el cual debe ir soportado mediante la investigación del accidente y la documentación correspondiente del reporte.

A la fecha el contratista no ha manifestado ni reportado ante esta interventoría ningún accidente o incidente de trabajo que se haya presentado durante el mes evaluado.

9. CONCLUSIONES

1. Durante el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, el contrato se ha ejecutado bajo condiciones controladas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciándose cumplimiento general de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de SST por parte del contratista Consorcio Colpitalito 2023.
2. Se verificó que el personal técnico y operativo que labora en la obra cuenta con afiliaciones vigentes al Sistema de Seguridad Social, así como con los exámenes médicos ocupacionales y certificaciones requeridas para la ejecución de labores de alto riesgo, cuando aplica.
3. El contratista ha garantizado la dotación y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), evidenciándose en las inspecciones realizadas que el personal hace uso permanente y correcto de los mismos conforme a su actividad.

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

4. Las capacitaciones, charlas de seguridad, inspecciones y permisos de trabajo implementados han contribuido de manera efectiva a la prevención de accidentes, manteniendo condiciones seguras en el desarrollo de las actividades de obra.
5. Durante el periodo evaluado no se reportaron accidentes ni incidentes de trabajo, lo cual evidencia la efectividad de los controles implementados, así como el compromiso del contratista y del personal en el cumplimiento de las normas de seguridad.
6. Se constató la disponibilidad y adecuado estado de los elementos de atención de emergencias, tales como botiquín, camilla y extintores, los cuales se encuentran acordes con las necesidades actuales del proyecto.

10. RECOMENDACIONES

1. Mantener y fortalecer el seguimiento permanente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando su aplicación durante todas las etapas restantes del proyecto.
2. Continuar con la ejecución periódica de capacitaciones, charlas de seguridad e inducciones, especialmente frente a riesgos críticos asociados a trabajos de alto riesgo, con el fin de reforzar la cultura de autocuidado.
3. Verificar de manera constante el estado, reposición y renovación de los Elementos de Protección Personal, asegurando que estos se encuentren en óptimas condiciones y sean acordes a cada actividad.
4. Garantizar que el punto de hidratación permanezca disponible en todo momento para el personal de obra, especialmente considerando las condiciones climáticas y la exigencia física de las labores ejecutadas.
5. Continuar con el diligenciamiento oportuno de registros, inspecciones y formatos de control, dejando evidencia documental de las actividades de seguimiento y prevención implementadas en obra.

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

COMPONENTE AMBIENTAL

<p>8. INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL</p>
<p>12-ENERO-2026 A 31-ENERO-2026</p>

1. INTRODUCCIÓN

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista Consorcio Colpitalito, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado ambiental del contrato en ejecución cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”.

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos ambientales, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a los impactos ambientales que se generarán durante la ejecución del presente contrato, con el fin de desarrollar e implementar por medio de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las medidas de manejo ambiental necesarias para evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos negativos que se presenten y así mismo, potencializar los impactos positivos.

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✚ Dar cumplimiento estricto a las medidas determinadas por el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023.
- ✚ Dar seguimiento y control al Programa de Manejo Ambiental de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, con el fin de mitigar, minimizar y corregir cualquier eventualidad que se presente en cuanto a la disposición de los residuos de construcción y demolición generados dentro de los frentes de obra.
- ✚ Implementar todas las medidas ambientales Colombianas definidas, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental, que será verificada por la interventoría mediante el seguimiento y monitoreo continuo.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO



 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

VALLA INFORMATIVA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y VISIBLE.

3 ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

En el intervalo objeto de análisis, se ejecutaron intervenciones orientadas al acondicionamiento integral del área de influencia del proyecto, comprendiendo actividades de despeje mecánico de cobertura vegetal y aplicación de agentes de control fitosanitario, con el propósito de regular la biomasa existente y evitar la aparición de organismos nocivos. Estas actuaciones permitieron preservar condiciones adecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y ambiental, incidiendo favorablemente en la protección del talento humano involucrado.

Paralelamente, se implementaron acciones para la conducción, manejo y disposición de aguas superficiales acumuladas en el interior del frente de obra, con el objetivo de impedir alteraciones en las propiedades geotécnicas del suelo, reducir la probabilidad de incidentes por pérdida de adherencia en superficies y evitar la formación de ambientes propicios para vectores biológicos. Lo anterior repercutió positivamente en la optimización de las condiciones operativas del proyecto.

Dentro de la ejecución constructiva, se desarrollaron actividades asociadas a la remoción y conformación de material terroso, incluyendo excavaciones masivas y localizadas, así como procesos de cajeo para cimentaciones correspondientes a edificaciones de uno y dos niveles. Dichas labores fueron realizadas bajo esquemas de control técnico, incorporando cerramientos, demarcación y señalización preventiva, con el fin de garantizar la estabilidad de los taludes, la integridad del personal y la mitigación de efectos adversos sobre el entorno.

Adicionalmente, se adelantaron procesos de colocación y consolidación de concreto estructural en elementos tales como vigas y losas de entrepiso y/o piso, verificando el cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos y aplicando protocolos de control durante las etapas de mezclado, transporte y vertido, con el fin de prevenir contingencias operativas y minimizar impactos ambientales derivados de dichas actividades.

Como parte de las labores previas a la conformación de elementos estructurales, se ejecutaron capas de concreto de regularización (solado), garantizando condiciones adecuadas de soporte y nivelación, así como el mantenimiento del orden y la limpieza en las zonas intervenidas, promoviendo prácticas adecuadas de manejo ambiental. De

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

igual forma, las actividades generales de movimiento de tierras se realizaron bajo estrictos controles operacionales, asegurando el uso seguro y eficiente de la maquinaria pesada y reduciendo la incidencia de afectaciones al medio circundante.

En el marco de las actividades de supervisión técnica, la interventoría verificó que la maquinaria y los equipos empleados en el proyecto cumplieran con condiciones óptimas de funcionamiento, evidenciando la ejecución de programas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la conformidad con las especificaciones técnicas exigidas, lo cual permitió la continuidad de las operaciones sin la generación de riesgos adicionales.

Así mismo, se constató la implementación de estrategias para el control de emisiones atmosféricas, particularmente material particulado, mediante el manejo adecuado, acopio y disposición controlada de los materiales producto de excavación, limitando su dispersión tanto en el área intervenida como en zonas aledañas.

En relación con el componente de emisiones sonoras, se evidenció la adopción de medidas de control orientadas a la reducción de niveles de presión acústica, a través de la verificación del estado técnico y condiciones operativas de los equipos y vehículos utilizados, contribuyendo al cumplimiento de los límites establecidos en la normativa vigente y a la disminución de impactos sobre el entorno inmediato y la comunidad circundante.

3.1 AGUA POTABLE

La obra cuenta con el servicio domiciliario de agua potable suministrado por las empresas pública del municipio de Pitalito EMPITALITO, de uso doméstico para el servicio de las baterías sanitarias, cuenta con una red interna que permite el suministro directo hacia el servicio y una derivación hacia un tanque de almacenamiento de 2000 litros, como reserva ante cualquier contingencia.

Cabe aclarar que ese suministro tiene una presión mínima, la cual escasamente surte el servicio de los baños. A medida que va creciendo la demanda de la obra y a futuro del proyecto por ahora no se ha dado respuesta por parte del consultor.

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

Durante el mes, la ejecución del proyecto, se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron dispuestas directamente al sistema de alcantarillado.



4. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Como requisito para la ejecución del contrato, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.

5. SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

Mediante el presente programa se busca tener un control sobre los materiales de construcción, es decir cuantificar las cantidades ingresadas a obra que se utilizaran en el contrato, además de verificar que provengan de canteras con permisos ambientales y mineros si aplica.

Se realiza la verificación de los permisos de las canteras y todo la documentación de la Cantera Buenos Aires, que es la que abastece al proyecto se encuentra en regla.

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

Se lleva a cabo el acopio de residuos de construcción, los cuales fueron señalizados, cubiertos con plástico negro y delimitados con cinta de peligro. Al igual que se adecuaron sitios para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos.

10. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El contratista ejecutor, **Consortio Colpitalito 2023**, asume la obligación de efectuar el registro, cuantificación y trazabilidad de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el marco del proyecto denominado “*Construcción de la primera fase de la Institución Educativa Winnipeg – sede principal del municipio de Pitalito, Huila*”. Así mismo, es responsable de garantizar la disponibilidad de los soportes correspondientes a la gestión integral de dichos residuos, incluyendo certificados de disposición final emitidos por gestores autorizados y la verificación de las licencias ambientales vigentes de los sitios de disposición utilizados.

Como resultado de las actividades de control y seguimiento desarrolladas por la interventoría durante el periodo evaluado, se determinó que las operaciones ejecutadas no produjeron afectaciones adversas sobre los cuerpos de agua ni sobre el sistema de drenaje del área de influencia. No se evidenciaron vertimientos, obstrucciones ni acumulaciones que comprometieran la funcionalidad hidráulica existente, manteniéndose las condiciones ambientales dentro de rangos permisibles y sin indicios de contaminación.

En lo que respecta al comportamiento geotécnico del terreno, no se registraron eventos asociados a inestabilidad, fallas en taludes o movilización incontrolada de materiales, lo cual permite inferir que las actividades fueron ejecutadas conforme a lineamientos técnicos adecuados, incorporando medidas preventivas orientadas a la conservación de las condiciones físicas del suelo y a la protección de las áreas intervenidas.

En relación con los procesos constructivos, se constató la realización de excavaciones mediante procedimientos tanto manuales como mecanizados, ejecutadas bajo una secuencia técnica planificada, con aplicación de controles operacionales y ambientales. Estas acciones permitieron mantener condiciones de seguridad en obra, optimizar el manejo de materiales y asegurar un desarrollo controlado de las actividades programadas.

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

11. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES

En aras de velar por la integridad física y armonía del medio ambiente el contratista debe garantizar que los residuos peligrosos - RESPEL y Especiales generados por las actividades realizadas en el proyecto, tengan un manejo integral desde su generación hasta el final de su vida útil, con el fin de que este tipo de residuos sean almacenados, transportados y dispuestos tal y como lo estipula la normatividad legal vigente, conllevando así la correcta entrega a sitio de disposición autorizado por la entidad competente de la región para su respectivo tratamiento final.

Por consiguiente, en sitio se cuenta con acopios de disposición provisional tanto de residuos peligrosos como de residuos especiales, los cuales a la fecha se han generado sobrantes de envases de pintura, donde se encuentran debidamente delimitadas y señalizadas.

CONCLUSIONES AMBIENTALES

1. En el intervalo comprendido entre el 12 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, la ejecución del proyecto se desarrolló bajo condiciones de control ambiental verificables, evidenciándose la implementación de estrategias de gestión orientadas a la identificación, reducción y manejo de los impactos asociados a las actividades constructivas.
2. Las intervenciones relacionadas con el acondicionamiento del terreno, la remoción de cobertura vegetal, el direccionamiento de escorrentías superficiales y las actividades de excavación fueron ejecutadas conforme a una programación técnica definida, permitiendo preservar las condiciones de estabilidad del suelo y evitando interferencias negativas sobre los recursos naturales presentes en el área de influencia directa.
3. Se evidenció la adopción de mecanismos de control para la reducción de emisiones atmosféricas y niveles de presión sonora, así como la verificación del adecuado funcionamiento técnico de la maquinaria y equipos empleados,

 <p>Gobernación del Huila</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p>FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

contribuyendo a la protección de la calidad del aire y al control del impacto acústico en el entorno.

4. La gestión del recurso hídrico, incluyendo el manejo de aguas residuales de origen doméstico, se realizó mediante sistemas internos de conducción y disposición, garantizando su descarga controlada hacia la infraestructura de alcantarillado, sin que se presentaran eventos de contaminación o afectación a las redes existentes.
5. En lo concerniente a la gestión integral de residuos de construcción y demolición, así como de residuos peligrosos y de características especiales, se constató la habilitación de zonas de almacenamiento temporal debidamente acondicionadas, señalizadas y restringidas, asegurando su manejo bajo criterios técnicos y en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
6. De manera global, se establece que el contratista ha dado cumplimiento a los lineamientos ambientales definidos en el Plan de Manejo Ambiental, manteniendo condiciones adecuadas de organización, aseo y control en los frentes de trabajo objeto de seguimiento.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

1. Mantener el seguimiento permanente al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, reforzando las acciones preventivas durante las siguientes etapas del proyecto, especialmente en actividades que impliquen movimientos de tierra y uso intensivo de maquinaria.
2. Fortalecer el control y monitoreo de las aguas superficiales y de escorrentía, asegurando el mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje implementados y evitando acumulaciones que puedan generar riesgos ambientales o sanitarios.

	Gobernación del Huila	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA		

3. Continuar con la verificación periódica del estado técnico y documental de la maquinaria, vehículos y equipos, garantizando el cumplimiento de los requisitos ambientales asociados a emisiones atmosféricas y ruido.
4. Garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción, demolición, peligrosos y especiales, incluyendo el almacenamiento temporal, la trazabilidad y la entrega oportuna a gestores autorizados, conforme a la normatividad vigente.
5. Reforzar las actividades de inducción y sensibilización ambiental al personal de obra, promoviendo buenas prácticas relacionadas con el uso eficiente de recursos, el orden, la limpieza y la protección del entorno.

1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
<i>Ítem</i>	<i>Descripción</i>	<i>Observación</i>
9.1	Administrativa	Cumpliendo A Cabalidad
9.2	Técnica	Cumpliendo A Cabalidad
9.3	Financiera	Cumpliendo A Cabalidad
9.4	Legal	Cumpliendo A Cabalidad
9.5	Ambiental	Cumpliendo A Cabalidad
9.6	Seguridad Y Salud	Cumpliendo A Cabalidad

2. ENTREGA DE ANEXOS	
<i>Ítem</i>	<i>Descripción</i>
10.1	Registro fotográfico.
10.2	Bitácora.
10.3	Informes Semanales
10.4	Actas Comité.

 <div data-bbox="428 239 764 331"> Gobernación del Huila </div>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”</p>
<p align="center">FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA</p>	

10.5	Correspondencia Enviada
10.8	Anexos Varios

FIRMAS	
Firma	
Nombre	ING. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Dependencia	INTERVENTORIA



Gobernación
del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO.
HUILA



INFORME MENSUAL - ENERO DE 2026



Fotografia No 1: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 9 Y 10 - MÓDULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografia No 2: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN TORTA INFERIOR - MÓDULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografia No 3: CHEQUEO DE MEDIDAS EN LA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACIÓN - MÓDULO AULA 2 PISOS



Fotografia No 4: COMITÉ DE OBRA CON PRESENCIA DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA - SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA.



Fotografia No 5: INSTALACIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE D - MÓDULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografia No 6: INSTALACIÓN DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE 2 Y 3 - MODULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografía No 7: INSTALACIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 3 B Y 3D - MÓDULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografía No 8: REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL MÓDULO - AULA MULTIPLE.



Fotografía No 9: INSTALACIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 11F, 11E, 11D, 10F - MÓDULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografía No 10: INSTALACIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 9D Y 10D, - MÓDULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografía No 11: INSTALACIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 11B, 11D, 10B, 9B, 8B - MÓDULO AULA DE 2 PISOS.



Fotografía No 12: LIMPIEZA PARA REPARACIÓN DE COLUMNA EJE 8A - MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 13: REPARACIÓN DE COLUMNA EJE 3C - MODULO BIBLIOTECA




Fotografia No 14: REPARACIÓN DE COLUMNA EJE 3C - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 15: REPARACIÓN DE COLUMNA EJES 3C, 4C, 5C, - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 16: REPARACIÓN DE COLUMNA EJES 3C Y 4C - MODULO BIBLIOTECA

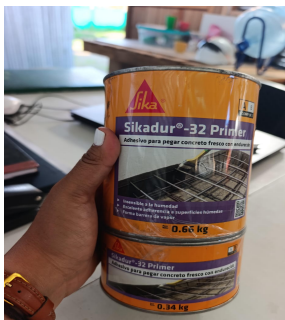

Fotografia No 17: ADHESIVO EPOXICO ESTRUCTURAL USADO PARA LA REPARACIÓN DE COLUMNAS - MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 18: MORTERO ACLIRICO IMPERMEABLE USADO PARA LA REPARACIÓN DE COLUMNAS - MÓDULO BIBLIOTECA




Fotografia No 19: LAS FUERTES LLUVIAS NO HAN PERMITIDO UN BUEN AVANCE EN LA SACTIVIDADES DE LA OBRA.



Fotografia No 20: EXCAVACIÓN MECANICA - MÓDULO AULA MULTIPLE



Fotografia No 21: SE INICIA INSTALACIÓN DE SOLADO EJE 1 - MÓDULO AULA MULTIPLE.

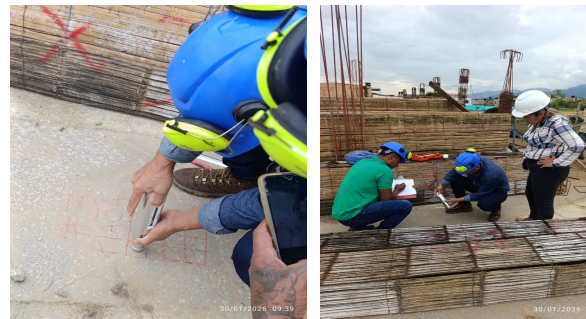

Fotografia No 22: TOMA DE ESCLEROMETRIA EN PLACA DE CIMNETACIÓN - MÓDULO AULA DE 1 PISO.



Fotografia No 23: INSTALACIÓN DE ACERO TRANSVERSAL EJE B - MÓDULO DE AULA DE 1 PISO.



Fotografia No 24: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO EN VIGA LONGITUDINAL DE CIMENTACIÓN Y ZAPATA 1, EJE 1- MÓDULO AULA MULTIPLE.



Fotografia No 25: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO EN VIGA LONGITUDINAL DE CIMENTACIÓN EJE 2- MÓDULO AULA MULTIPLE.



Fotografia No 26: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO EN VIGA LONGITUDINAL DE CIMENTACIÓN Y ZAPATA EJE 2 ZAPATA 2 - MÓDULO AULA MULTIPLE.



**Gobernación
del Huila**


“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

**FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE
OBRA**


INFORMES SEMANALES

PERIODO 10


(12 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026)

 Gobernación del Huila	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	 CONSORCIO INTER CONSULTORES																		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #40																				
Semana Número: 40 Del: 12 de enero de 2026 Al: 18 de enero de 2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 277 Días De 564 % Transcurrido 49,11% % Faltante 50,89%																				
ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACION DEL HUILA SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SUPERVISOR ING EDGAR MARTIN LARA																				
OBJETO:																				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA																				
<table border="1"> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>SEMANTAL</td> <td>ACUMULADO</td> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>SEMANTAL</td> <td>ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,95%</td> <td>17,17%</td> <td></td> <td>0,02%</td> <td>21,66%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra programada:</td> <td>\$ 120.000.000,00</td> <td>\$ 2.172.783.010,41</td> <td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td> <td>2.435.283,70</td> <td>2.740.624.289,81</td> </tr> </table>			Obra programada (%)	SEMANTAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANTAL	ACUMULADO		0,95%	17,17%		0,02%	21,66%	Valor básico de la Obra programada:	\$ 120.000.000,00	\$ 2.172.783.010,41	Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.435.283,70	2.740.624.289,81
Obra programada (%)	SEMANTAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANTAL	ACUMULADO															
	0,95%	17,17%		0,02%	21,66%															
Valor básico de la Obra programada:	\$ 120.000.000,00	\$ 2.172.783.010,41	Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.435.283,70	2.740.624.289,81															
CONTRATO DE OBRA																				
<table border="1"> <tr> <td> Contratista: Contrato No. CONSORCIO COLPITALITO 23 1506 De 2023 Valor Inicial: \$ 8.544.228.748,98 Valor Actualizado: \$ 12.653.913.161,52 Plazo Inicial: 274 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026 </td> <td> Interventor: Contrato No. CONSORCIO INTERCONSULTORES 1585 De 2023 Valor Inicial: \$ 623.308.855,00 Valor Actualizado: \$ 623.308.855,00 Plazo Inicial: 275 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026 </td> </tr> </table>			Contratista: Contrato No. CONSORCIO COLPITALITO 23 1506 De 2023 Valor Inicial: \$ 8.544.228.748,98 Valor Actualizado: \$ 12.653.913.161,52 Plazo Inicial: 274 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026	Interventor: Contrato No. CONSORCIO INTERCONSULTORES 1585 De 2023 Valor Inicial: \$ 623.308.855,00 Valor Actualizado: \$ 623.308.855,00 Plazo Inicial: 275 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026																
Contratista: Contrato No. CONSORCIO COLPITALITO 23 1506 De 2023 Valor Inicial: \$ 8.544.228.748,98 Valor Actualizado: \$ 12.653.913.161,52 Plazo Inicial: 274 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026	Interventor: Contrato No. CONSORCIO INTERCONSULTORES 1585 De 2023 Valor Inicial: \$ 623.308.855,00 Valor Actualizado: \$ 623.308.855,00 Plazo Inicial: 275 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026																			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:																				
GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO																				
 <p>1 FASE WINNIPEG</p>																				
En el transcurso de la semana se realizaron las siguientes actividades:																				
Se realizo replanteo topografico de la cimentación de zapatas y vigas del aula múltiple.																				
Se realizo excavación mecánica y perfilación manual para zapatas y vigas de cimentación en el módulo de aula múltiple																				
Se inicio la reparación de las columnas de la biblioteca con aditivo sikadur- 32 y mortero vertoac- 32																				
AVANCE FOTOGRAFICO																				
																				
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CIMENTACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DEL MÓDULO AULA MÚLTIPLE.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CIMENTACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DEL MÓDULO AULA MÚLTIPLE.																			
																				

EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS Y VIGAS DEL MÓDULO DE AULA MULTIPLE.	EXCAVACIÓN Y PERFILACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS DEL MÓDULO DE AULA MULTIPLE.	
		
REPARACIÓN DE COLUMNAS DEL MÓDULO DE BIBLIOTECA.	REPARACIÓN DE COLUMNAS DEL MÓDULO DE BIBLIOTECA.	
		
REPARACIÓN DE COLUMNAS DEL MÓDULO DE BIBLIOTECA.	ADHESIVO EPOXICO Y MORTERO USADO PARA REPARACION DE COLUMNA DEL MÓDULO DE BIBLIOTECA	
OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
		 Firma Nombre : Ing. Oscar S. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

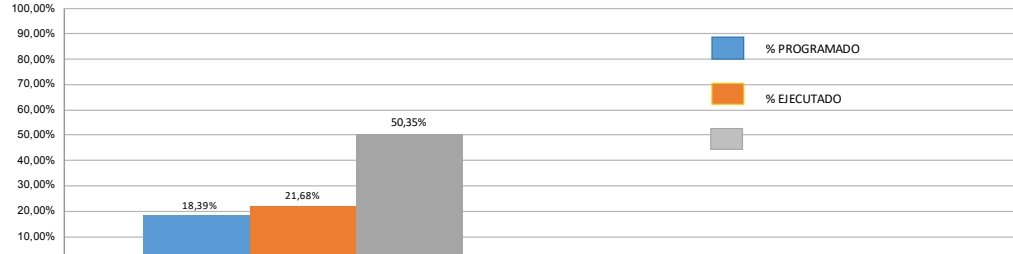 Gobernación del Huila	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	 CONSORCIO INTER CONSULTORES																																																						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #41																																																								
Semana Número: <u>41</u> Del: <u>19 de enero de 2026</u> Al: <u>25 de enero de 2026</u>																																																								
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>Días 284 De 564</u> % Transcurrido <u>50,35%</u> % Faltante <u>49,65%</u>																																																								
ENTIDAD CONTRATANTE <u>GOBERNACION DEL HUILA</u> SEDE: <u>PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG</u> SUPERVISOR <u>ING EDGAR MARTIN LARA</u>																																																								
OBJETO:																																																								
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA																																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>1,22%</td> <td>18,39%</td> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>0,02%</td> <td>21,68%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra programada:</td> <td>\$ 154.590.104,63</td> <td>\$ 2.327.373.115,04</td> <td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td> <td>2.756.358,45</td> <td>2.743.380.648,26</td> </tr> </table>				SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	1,22%	18,39%	Obra Física Ejecutada (%)	0,02%	21,68%	Valor básico de la Obra programada:	\$ 154.590.104,63	\$ 2.327.373.115,04	Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.756.358,45	2.743.380.648,26																																				
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO																																																			
Obra programada (%)	1,22%	18,39%	Obra Física Ejecutada (%)	0,02%	21,68%																																																			
Valor básico de la Obra programada:	\$ 154.590.104,63	\$ 2.327.373.115,04	Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.756.358,45	2.743.380.648,26																																																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th> <th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORIA:</th> </tr> <tr> <td>Contratista:</td> <td colspan="2">CONSORCIO COLPITALITO 23</td> <td>Interventor:</td> <td colspan="2">CONSORCIO INTERCONSULTORES</td> </tr> <tr> <td>Contrato No.</td> <td colspan="2">1506 De 2023</td> <td>Contrato No.</td> <td colspan="2">1585 De 2023</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$</td> <td>8.544.228.748,98</td> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$</td> <td>623.308.855,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Actualizado:</td> <td>\$</td> <td>12.653.913.161,52</td> <td>Valor Actualizado:</td> <td>\$</td> <td>623.308.855,00</td> </tr> <tr> <td>Plazo Inicial:</td> <td colspan="2">274</td> <td>Plazo Inicial:</td> <td colspan="2">275</td> </tr> <tr> <td>Plazo Actualizado:</td> <td colspan="2">564</td> <td>Plazo Actualizado:</td> <td colspan="2">564</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Iniciación:</td> <td colspan="2">lunes, 4 de diciembre de 2023</td> <td>Fecha de Iniciación:</td> <td colspan="2">lunes, 4 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Vencimiento:</td> <td colspan="2">lunes, 2 de noviembre de 2026</td> <td>Fecha de Vencimiento:</td> <td colspan="2">lunes, 2 de noviembre de 2026</td> </tr> </table>			CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23		Interventor:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		Contrato No.	1506 De 2023		Contrato No.	1585 De 2023		Valor Inicial:	\$	8.544.228.748,98	Valor Inicial:	\$	623.308.855,00	Valor Actualizado:	\$	12.653.913.161,52	Valor Actualizado:	\$	623.308.855,00	Plazo Inicial:	274		Plazo Inicial:	275		Plazo Actualizado:	564		Plazo Actualizado:	564		Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023		Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023		Fecha de Vencimiento:	lunes, 2 de noviembre de 2026		Fecha de Vencimiento:	lunes, 2 de noviembre de 2026	
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																					
Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23		Interventor:	CONSORCIO INTERCONSULTORES																																																				
Contrato No.	1506 De 2023		Contrato No.	1585 De 2023																																																				
Valor Inicial:	\$	8.544.228.748,98	Valor Inicial:	\$	623.308.855,00																																																			
Valor Actualizado:	\$	12.653.913.161,52	Valor Actualizado:	\$	623.308.855,00																																																			
Plazo Inicial:	274		Plazo Inicial:	275																																																				
Plazo Actualizado:	564		Plazo Actualizado:	564																																																				
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023		Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023																																																				
Fecha de Vencimiento:	lunes, 2 de noviembre de 2026		Fecha de Vencimiento:	lunes, 2 de noviembre de 2026																																																				
<div style="text-align: center;"> GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO </div>  <p>1 FASE WINNIPEG</p>																																																								
<p>En el transcurso de la semana se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se continuo con la excavación mecanica para zapatas y vigas de cimentación en el módulo de aula múltiple</p> <p>Se continua con la reparación de las columnas de la biblioteca con adhitivo sikadur- 32 primer y mortero verticoac No. 2AC</p> <p>Se trabaja en el armado de acero de zapatas y vigas del módulo de aula múltiple.</p> <p>Se inicio la instalación de solado para zapatas y vigas del aula multiple.</p>																																																								
AVANCE FOTOGRAFICO																																																								
																																																								
EXCAVACIÓN MECANICA PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN EN AULA MULTIPLE.	EXCAVACIÓN MECANICA PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN EN AULA MULTIPLE.																																																							
																																																								

<div>INSTALACIÓN DE SOLADO EN MÓDULO AULA MULTIPLE</div> <div></div> <div>REPARACIÓN DE COLUMNAS DEL MÓDULO DE BIBLIOTECA.</div>		<div>INSTALACIÓN DE SOLADO EN MÓDULO AULA MULTIPLE</div> <div></div> <div>LAS LLUVIAS NO PERMITEN UN BUEN RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.</div>
<div>OBSERVACIONES</div> <div>SE SUSPENDIO LA REPARACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL MÓDULO DE BIBLIOTECA DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL.</div>		<div>CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA</div> <div><div>Firma</div><div>Nombre : Ing. Oscar S. Gordillo Guerrero</div><div>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</div></div>

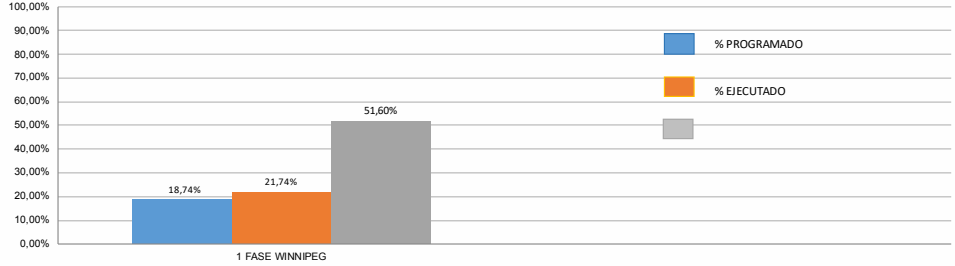 Gobernación del Huila		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA		 CONSORCIO INTER CONSULTORES	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #41					
Semana Número: 42		Del: 26 de enero de 2026		Al: 1 de febrero de 2026	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días 291 De 564		% Transcurrido 51,60% % Faltante 48,40%	
ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACION DEL HUILA		SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG		SUPERVISOR ING EDGAR MARTIN LARA	
OBJETO:					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA					
Obra programada (%) Obra básica de la Obra programada:		SEMANAL 0,34% \$ 43.375.000,00		ACUMULADO 18,74% \$ 2.370.748.115,04	
Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:		SEMANAL 0,06% 7.618.342,83		ACUMULADO 21,74% 2.750.998.991,09	
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista: CONSORCIO COLPITALITO 23 Contrato No. 1506 De 2023 Valor Inicial: \$ 8.544.228.748,98 Plazo Inicial: \$ 12.653.913.161,52 Plazo Actualizado: 274 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026			Interventor: CONSORCIO INTERCONSULTORES Contrato No. 1585 De 2023 Valor Inicial: \$ 623.308.855,00 Plazo Inicial: \$ 623.308.855,00 Plazo Actualizado: 275 Plazo Actualizado: 564 Fecha de Inicio: lunes, 4 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: lunes, 2 de noviembre de 2026		
GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO					
 <p>1 FASE WINNIPEG</p>					
<p>En el transcurso de la semana se realizarón las siguientes actividades:</p> <p>Se tomo ensayo de esclerometria por parte de la interventoria, en placa de cimentación del módulo de aula de 1 piso.</p> <p>Se continuo con la excavación mecanica para zapatas y vigas de cimentación en el módulo de aula múltiple</p> <p>Se continua con la instalación de solado para zapatas y vigas del módulo de aula multiple.</p> <p>Se trabaja en el armado de acero para vigas te invertidas y zapatas del módulo de aula múltiple.</p> <p>Se trabaja en la instalación de acero transversal en columnas del módulo de aulas de un piso.</p>					
AVANCE FOTOGRAFICO					
 <p style="text-align: center;">ENSAYO DE ESCLEROMETRIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN AULAS DE UN PISO.</p>			 <p style="text-align: center;">ENSAYO DE ESCLEROMETRIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN AULAS DE UN PISO.</p>		
 <p style="text-align: center;">ARMADO DE ACERO DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DEL MÓDULO DE AULA MÚLTIPLE.</p>			 <p style="text-align: center;">ARMADO DE ACERO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DEL MÓDULO DE AULA MÚLTIPLE.</p>		



INSTALACIÓN DE ACERO EN EL MÓDULO DE AULAS DE UN PISO.



REUNION CON LABORATORIOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<p>Firma </p> <p>Nombre : Ing. Oscar G. Castillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</p>



**Gobernación
del Huila**

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”

**FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE
OBRA**

BITACORA

PERIODO 10

(12 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026)


198 09/Ene/2026, viernes

- El Personal de obra da inicio a la actividad de instalación de acero de refuerzo longitudinal de Columnas para el módulo aulas de dos pisos.

- Personal de obra: 1 maestro
2 oficiales
7 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibrador compactador (sin uso)

- Clima: nublado con lluvias entre 11:00 am - 1:30 pm

Liliana A. Corón
D. Interventora.  Ing. Residente

199 10/Ene/2026, sábado


El personal de obra da continuidad con la instalación de acero de refuerzo longitudinal de Columnas para el módulo Aula de 2 pisos. Por otro lado, la topografía realiza el replanteo con la ubicación de todos los ejes de Aula múltiple.

- Personal de obra: 1 maestro
2 oficiales
7 ayudantes
1 Topógrafo
1 Cadenero.

- Equipos: 1 vibrador compactador (sin uso)

- Clima: Parcialmente nublado

Liliana A. Corón
D. Interventora.

 Ing. Residente

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

200 12/Ene/2026, Lunes

El personal de obra da continuidad a la actividad de instalación de acero de refuerzo longitudinal de Columnas para el módulo aulas de 2 pisos. Por otro lado, se inicia con el replanteo del módulo Aula múltiple y Cocina, demarcando vigas y refuerzos para

NKE

control de Excavación, dejando ubicados los ejes con 10 puentes en manera de referencia.

- Personal en obra: 1 maestro
2 oficiales
7 ayudantes.

- Equipos en obra: 1 vibracompuador (sin uso)

- Clima: nublado

Liliana A. Corín
E. Interventora

Liliana A. Corín
Residente

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

201. 13/Ene/2026 martes

El Personal de obra da continuidad a la actividad de instalación de acero de refuerzo longitudinal para Columnas del modulo aulas de 2 piso, así mismo, continúa con el replanteo del modulo Aula múltiple y Cocina con la demarcación de excavación en cul.

- Personal en obra: 1 maestro
2 oficiales
7 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibracompuador (sin uso)

- Clima: nublado con lluvias intermitentes.

Liliana A. Corín
E. Interventora

Liliana A. Corín
Residente

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

202. 14/Ene/2026 miércoles

El Personal de obra da Continuidad a la actividad de instalación de acero de refuerzo longitudinal de Columnas para el modulo aulas de dos pisos. Por otro lado se inicia con la reparación de Columnas del modulo biblioteca.

- Personal en obra: 2 oficiales
7 ayudante
1 maestro

- Equipos = 1 Vibracompuador (sin uso)

- Clima: Parcialmente nublado

Liliana A. Corín
Residente

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

203. 15/Ene/2026, Jueves

El personal de obra da Continuidad a la actividad de instalación de acero de refuerzo longitudinal de Columnas Para el modulo aulas de dos pisos así mismo, se da Continuidad con la reparación de Columnas del modulo Aula de biblioteca.

- Personal en obra: 2 oficiales

7 ayudantes

1 maestro

- Equipos en obra: 1 vibracompactor (en uso)

- Clima: nublado en horas de la mañana, lluvias entre las 2:30 pm. y 3:30 pm

Liliana Alarín
D. Interventora Residente

204. 16/Ene/2026, Viernes

El personal de obra da Continuidad a la actividad de instalación de acero longitudinal para Columnas del modulo aulas de 2. Pisos así mismo, se da Continuidad con la reparación de Columnas del modulo aula de biblioteca.

- Personal en obra: 2 oficiales

7 ayudantes

1 maestro

- Equipos en obra: 1 vibracompactor (en uso)

- Clima: nublado con lluvias intermitentes en horas de la tarde.

Liliana Alarín
D. Interventora Residente

ANDREA LAURA RODRIGUEZ M.
DIRECTORA DE
INTERVENCIÓN

205. 17/Ene/2026, Sábado

El personal de obra da Continuidad a la actividad de instalación de acero longitudinal de Columnas Para el modulo aulas de 2 pisos, por otro lado se da inicio a la excavación de zapatas y vigas de cimentación del modulo Aula múltiple.

- Personal en obra: 1 maestro
2 oficiales
7 ayudantes
1 operador de retroexcavadora
- Equipos en obra: 1 vibracompactador (sin uso)
1 Regurita (excavación zapatas y vigas)
- Clima: nublado. *Liliana AGRA C. Viquez*
P. Interventora. *Rolando S.*

206 19/Ene/2026, Lunes.

Se da continuidad a la actividad de instalación de acero longitudinal para columnas del módulo aulas de dos pisos, así mismo se da continuidad con la actividad de excavación mecánica para zapatas y vigas de cimentación del módulo aula múltiple y se realiza un primer de instalación de refuerzo para el acero de viga de cimentación del módulo aulas de dos pisos y se continúa con la reparación blanda.

- Personal en obra: 1 maestro
2 oficiales
7 ayudantes
1 operador de Regurita
- Equipos en obra: 1 vibracompactador (sin uso)
1 Regurita
- Clima: Soleado *Liliana AGRA C. Viquez*
P. Interventora. *Rolando S.*

207 20/Ene/2026, martes.

Se da continuidad a la actividad de instalación de acero longitudinal para columnas del módulo aulas de 2 pisos, así mismo se da continuidad con la excavación manual para vigas de cimentación y zapatas del módulo aula múltiple, realizando a su misma vez la perforación manual.

N/A

- Personal en obra: 1 maestro
1 oficial
7 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibracompactador (sin uso)

- Clima: Parcialmente nublado. *C. Juncos*
Liliana A. Corón *ing. Residente*
P. Interventora.

208 21/Ene/2026, miércoles

El Personal de obra: da Continuidad a la actividad de instalación de acero de refuerzo longitudinal para columnas del módulo aulas de 2 pisos así mismo se continúa con la perfilación manual de excavación de vigas de cimentación y zapatas del módulo aula múltiple.

- Personal en obra: 1 maestro
1 oficial
7 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibracompactador (sin uso)

- Clima: Parcialmente nublado *C. Juncos* Liliana A. Corón
ing. Residente P. Interventora

209 22/Ene/2026, Jueves.

El Personal de obra realiza uno de los últimos quiles de vibración de acero de viga de cimentación para el módulo aulas de 2 pisos y da continuidad a la actividad de perfilación manual para vigas de cimentación y zapatas del módulo aula múltiple.

- Personal en obra: 1 maestro
1 oficial
7 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibracompactador (sin uso)

- Clima: nublado *Liliana A. Corón* *C. Juncos*
P. Interventora. *ing. Residente*

20 23/Ene/2026, viernes

El personal de obra da continuidad con la actividad de perfilación manual para vigas y zapatas del módulo aula múltiple, así mismo se realizó el último quito de ubicación de vigas de cimentación del módulo aula de 2 pisos, por otro lado se inicia con el amare de acero de refuerzo de zapatas del módulo aula múltiple.

- Personal en obra: 1 maestro

1 oficial

7 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibracompactador (com. uso)

- Clima: nublado con lluvias entre las 11:30 am y 2:00 pm

Liliana A. Gerón
de Interventoría

Residente

21 24/Ene/2026, Sábado.

El personal en obra da continuidad a la actividad de perfilación manual para excavación de vigas y zapatas del módulo aula múltiple, así mismo, se dio continuidad con el amare de acero longitudinal para zapatas del módulo aula múltiple, por otro lado, se pasaron los niveles de fundación para la torta inferior del módulo aula de dos pisos.

- Personal en obra: 1 maestro

1 oficial

7 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibracompactador (sin uso)

- Clima: nublado

Liliana A. Gerón
de Interventoría

Residente

ING. LUIS FERRER, M.
DIRECTOR DE
INTERVENCIÓN

NK3

212 26/Ene/2026, Lunes

El personal de obra da continuidad a la actividad de fertilización manual para excavación de vigas y zapatas del módulo aula-múltiple.

- Personal en obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes
- Equipos en obra: 1 vibracompactor (sin uso)
- Clima: nublado con lluvias intermitentes

Liliana Acosta
P. Interventora

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENCIÓN

213 27/Ene/2026, Martes

- El personal de obra da continuidad a la actividad de fertilización manual para excavación de vigas y zapatas del módulo aula-múltiple, por otro lado, se inicia con la instalación de solado de limpieza con concreto 1500 psi para vigas y zapatas del módulo aula-múltiple. Se recomienda al contratista dar continuidad con la instalación de concreto del módulo aula 2 pisos.

- Personal en obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes

- Equipos en obra: 1 vibracompactor (sin uso)

- Clima: nublado con lluvias intermitentes

Liliana Acosta
P. Interventora

214 28/Ene/2026, Miércoles

El personal de obra da continuidad con la instalación de solado de limpieza para vigas y zapatas del módulo aula-múltiple.

- Personal en obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes
