	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 1 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MS-MC-017-2026

1. DATOS GENERALES

Tabla 1. Datos generales tipo de informe y supervisor.

TIPO DE INFORME	PERIÓDICO		FINAL	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE	11-05-2026	HASTA	21-05-2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración municipal de Sáchica inició el contrato No. **MS-MC-017-2026** y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de mínima cuantía al proponente **INGALCA S.A.S.** A continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:


Tabla 2. Información del contrato de obra.

CONTRATO	MS-MC-017-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SÁCHICA, BOYACÁ
CONTRATISTA:	INGALCA S.A.S NIT. No. 901.531.693-0 R/L: ALEJANDRO GUERRERO HUERTAS C.C. No. 1.049.645.972 DE TUNJA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 39.521.587,06) M/CTE

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 2 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

VALOR TOTAL EJECUTADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 39.521.587,06) M/CTE.
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 0,00
FECHA FIRMA DE CONTRATO	08 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MAYO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE MAYO DE 2026

3. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La localización de las actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimiento total del objeto contractual y hasta la fecha de la presente acta, se localizan en el Casco Urbano del Municipio de Sáchica sobre la **CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2**. Las coordenadas de la intervención se muestra a continuación.

Figura 1. Localización de las intervenciones realizadas **CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2** del municipio de Sáchica – Boyacá.



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 3 de 18
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **MS-MC-017-2026** los cuales hacen parte integral del presente contrato. Todas las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos.

Tabla 3. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual.

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.							
ÍTEM	SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNIT.	INCREMENTO POR DISTANCIA	V. TOTAL
1		DESMONTE Y EXCAVACIÓN					\$ 2.710.500,00
1.1	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3,15	\$ 70.000,00	0%	\$ 220.500,00
1.2	2.02.15	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	99,6	\$ 25.000,00	0%	\$ 2.490.000,00
2		INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO					\$ 6.440.640,00
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	24	\$ 64.000,00	4%	\$ 1.597.440,00
2.2	5.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	34	\$ 120.000,00	4%	\$ 4.243.200,00
2.3	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	6	\$ 100.000,00	0%	\$ 600.000,00
3		POZO DE INSPECCIÓN					\$ 2.236.000,00
3.1	5.01.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1	\$ 1.400.000,00	4%	\$ 1.456.000,00
3.2	5.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UND	1	\$ 750.000,00	4%	\$ 780.000,00
4		AFIRMADO, SUBBASES Y BASES					\$ 11.290.800,00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronald Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 4 de 18	
	Versión 2	03/08/2020	
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	34,52	\$ 120.000,00	0%	\$ 4.142.400,00
4.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	62,16	\$ 115.000,00	0%	\$ 7.148.400,00
5		TRANSPORTE					\$ 2.405.968,81
5.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	870,12	\$ 2.765,10	0%	\$ 2.405.968,81
6		PAVIMENTO					\$ 5.317.312,00
6.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	66,4	\$ 77.000,00	4%	\$ 5.317.312,00
TOTAL COSTO DIRECTO							\$ 30.401.220,81
ADMINISTRACIÓN				A	20%		\$ 6.080.244,16
IMPREVISTOS				I	5%		\$ 1.520.061,04
UTILIDAD				U	5%		\$ 1.520.061,04
VALOR TOTAL DE LA OBRA							\$ 39.521.587,06

El contratista ejecutó las actividades asignadas como obligaciones en el objeto contractual, las cuales se mencionan a continuación:

4.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.


Tabla 4. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
POZO INSPECCIÓN	1,45	1,45	1,50	3,15	1,00	3,15
TOTAL						3,15

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 5 de 18
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4.2 EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 5. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
TUBERÍA PRINCIPAL	34,00	1,60	1,50	81,60	1,00	81,60
DOMICILIARIAS	4,00	0,50	1,50	3,00	6,00	18,00
TOTAL						99,60

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 6. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (ML)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
DOMICILIARIAS	4,00	-	-	4,00	6,00	24,00
TOTAL						24,00


4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"** de acuerdo con las cantidades ejecutadas

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 6 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 7. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12".

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (ML)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
TUBERÍA PRINCIPAL	34,00	-	-	34,00	1,00	34,00
TOTAL						34,00

4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 8. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (UND)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
DOMICILIARIAS					6,00	6,00
TOTAL						6,00

4.6 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA)** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, número de elementos y la cantidad total ejecutada.


Tabla 9. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (UND)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27 Versión 2	Página 7 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

POZO INSPECCIÓN					1,00	1,00
					TOTAL	1,00

4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 10. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (UND)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
ARO Y TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN					1,00	1,00
					TOTAL	1,00

4.8 RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 11. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
RELLENO PRINCIPAL TUBERÍA	34,00	1,60	0,60	32,64	1,00	32,64
RELLENO DOMICILIARIAS	4,00	0,50	0,40	0,80	6,00	4,80
DESCUENTOS						

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
 Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
		FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 8 de 18	
		Versión 2	03/08/2020	
INFORME DE SUPERVISIÓN				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (m)	ÁREA(M2)	VOLUMEN (M3)	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
DESCUENTO TUBO PRINCIPAL D = 12"	34,00	0,3048	0,073	2,48	-1,00	- 2,48
DESCUENTO TUBO DOMICILIARIAS D = 6"	4,00	0,1524	0.018	0,072	-6,00	- 0.44
TOTAL						34,52

4.9 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 12. Cuadro de cantidades ejecutadas, RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
TUBERÍA PRINCIPAL	34,00	1,60	0,90	48,96	1,00	48,96
DOMICILIARIAS	4,00	0,50	1,10	2,20	6,00	13,20
TOTAL						62,16

4.10 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, distancia en KM, volumen, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27 Versión 2	Página 9 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

Tabla 13. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

LOCALIZACIÓN	DISTANCIA (KM)	VOLUMEN (M3)	CANT. PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3-KM)
TRANSPORTE ARENA	9,00	34,52	310,68	1,00	310,68
TRANSPORTE RELLENO DE AFIRMADO	9,00	62,16	559,44	1,00	559,44
TOTAL					870,12

4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282).

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 14. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M2)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
ADOQUÍN PARA TUBERÍA PRINCIPAL	34,00	1,60		54,40	1,00	54,40
ADOQUÍN PARA COMETIDAS	4,00	0,50		2,00	6,00	12,00
TOTAL						66,40

En la presente Acta Final se registra un valor ejecutado total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$ 112.234.865,57) M/CTE**, correspondiente a las cantidades e ítems ejecutados por el Contratista, alcanzando una ejecución total del 100 %.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades y el valor ejecutado del contrato en la presente Acta Final.

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 10 de 18
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

Tabla 15. Resumen de cantidades y valor total ejecutado con la presente acta.

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ										
ÍTEM	SUB ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA FINAL			
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNIT.	INCRE. POR DISTANCIA	V. TOTAL	CANT.	INCRE. POR DISTANCIA	V. TOTAL
1		DESMONTE Y EXCAVACIÓN					\$ 2,710,500.00			\$ 2,710,500.00
1.1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	3.15	\$ 70,000.00	0%	\$ 220,500.000	3.15	0%	\$ 220,500.00
1.2	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	99.60	\$ 25,000.00	0%	\$ 2,490,000.000	99.60	0%	\$ 2,490,000.00
2		INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO					\$ 6,440,640.00			\$ 6,440,640.00
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	24.00	\$ 64,000.00	4%	\$ 1,597,440.00	24.00	4%	\$ 1,597,440.00
2.2	5.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	M	34.00	\$ 120,000.00	4%	\$ 4,243,200.00	34.00	4%	\$ 4,243,200.00
2.3	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	6.00	\$ 100,000.00	0%	\$ 600,000.00	6.00	0%	\$ 600,000.00
3		POZO DE INSPECCIÓN					\$ 2,238,000.00			\$ 2,238,000.00
3.1	5.01.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1.00	\$ 1,400,000.00	4%	\$ 1,456,000.00	1.00	4%	\$ 1,456,000.00
3.2	5.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UND	1.00	\$ 750,000.00	4%	\$ 780,000.00	1.00	4%	\$ 780,000.00
4		AFIRMADO, SUBBASES Y BASES					\$ 11,290,800.00			\$ 11,290,800.00
4.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	34.52	\$ 120,000.00	0%	\$ 4,142,400.00	34.52	0%	\$ 4,142,400.00
4.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	62.16	\$ 115,000.00	0%	\$ 7,148,400.00	62.16	0%	\$ 7,148,400.00
5		TRANSPORTE					\$ 2,405,968.81			\$ 2,405,968.81
5.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	870.12	\$ 2,765.10	0%	\$ 2,405,968.81	870.12	0%	\$ 2,405,968.81
6		PAVIMENTO					\$ 5,317,312.00			\$ 5,317,312.00
6.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	66.40	\$ 77,000.00	4%	\$ 5,317,312.00	66.40	4%	\$ 5,317,312.00
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 30,401,220.81	SUB TOTAL		\$ 30,401,220.81	
			ADMINISTRACION	A	20%		\$ 6,080,244.16	A	20%	\$ 6,080,244.16
			IMPREVISTOS	I	5%		\$ 1,520,061.04	I	5%	\$ 1,520,061.04
			UTILIDAD	U	5%		\$ 1,520,061.04	U	5%	\$ 1,520,061.04
VALOR TOTAL DE LA OBRA						\$ 39,521,587.06	TOTAL EJECUTADO		\$ 39,521,587.06	

5. BALANCE FINANCIERO

Tabla 16. Balance financiero.


VALOR DEL CONTRATO	\$ 39.521.587,06
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 39.521.587,06
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 39.521.587,06

VALOR TOTAL A CANCELAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 39.521.587,06) M/CTE.

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 11 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

En el periodo de ejecución comprendido entre el 11 de mayo y el 21 de mayo de 2026, el municipio recibió a satisfacción las actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto contractual, correspondientes al Contrato de Mínima Cuantía No. **MS-MC-017-2026**.

7. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por **INGALCA S.A.S** procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Tabla 17. Aprobación pagos.

SI	NO
X	

8. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No. MS-MC-017-2026, suscrito el 08 de mayo de 2026, se presentan las características de las garantías que respaldan el mencionado contrato. En ese orden de ideas, el contratista **INGALCA S.A.S** identificado con Nit. No. 901.531.693-0 representado legalmente por **ALEJANDRO GUERRERO HUERTAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.645.972 de Tunja, a través del portal transaccional SECOP II actualizó la póliza de cumplimiento No. 51-44-101033241 de fecha de expedición 22 de mayo de 2026, proferido por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, cuyos amparos, vigencias y cuantías, se relacionan a continuación:


Tabla 18. Garantías actualizadas del Contrato - No. 51-44-101033241

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
PÓLIZA No.	51-44-101033241			
ANEXO No.	4			
FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026			
TIPO DE AMPARO	DESDE	HASTA	MONTO ASEGURADO	CUANTÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2026	27/09/2026	\$ 7.904.317,41	20%

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 12 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/05/2026	27/05/2029	\$ 7.904.317,41	20%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *	\$ 11.856.476,12	30%

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Tabla 19. Descripción registro fotográfico

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.	
1. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	
Descripción:	
La actividad consistió en la excavación manual en material común para la apertura y adecuación del espacio destinado a la posterior construcción del pozo de inspección que conecta con la tubería principal del alcantarillado. Esta excavación tuvo dimensiones de 1.45 m de ancho, largo y profundidad.	
	
2. EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	
Descripción:	
La actividad consistió en las excavaciones mecánicas y cortes en material común necesarios para la conformación de la zanja destinada a la instalación de la tubería principal del alcantarillado de 12" y de las acometidas domiciliarias de 6". Estas excavaciones se realizaron con una profundidad de 1.50 m y un ancho de 1.60 m para la tubería principal y de 0.50 m para las acometidas, con longitudes de 34.00 m y 4.00 m respectivamente.	

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27 Versión 2	Página 13 de 18 03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.



3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"

Descripción:

La actividad consistió en el suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC de diámetro 6", necesaria para el cambio de la tubería en las acometidas domiciliarias que redirigen el flujo hacia la tubería principal de 12". En total, se suministró e instaló una longitud de 4.00 m para seis tramos respectivamente, para un total de 24.00 m instalados.




4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronald Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 14 de 18
Versión 2		03/08/2020	
INFORME DE SUPERVISIÓN			


CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.

Descripción:
 La actividad consistió en el suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC de diámetro 12", necesaria para el cambio de la tubería principal, la cual recibe las acometidas domiciliarias y conduce el flujo hacia el pozo de inspección construido sobre el eje de la carrera 6. En esta actividad se suministró e instaló un total de 34.00 m de tubería.



5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"


Descripción:
 La actividad consistió en el suministro e instalación del accesorio denominado **SILLA YEE** de 12" a 6", el cual permite la conexión de la tubería PVC de las acometidas domiciliarias de 6" al colector principal, correspondiente a la tubería de 12". En total, se suministraron e instalaron seis elementos para los seis tramos de acometidas ejecutados.

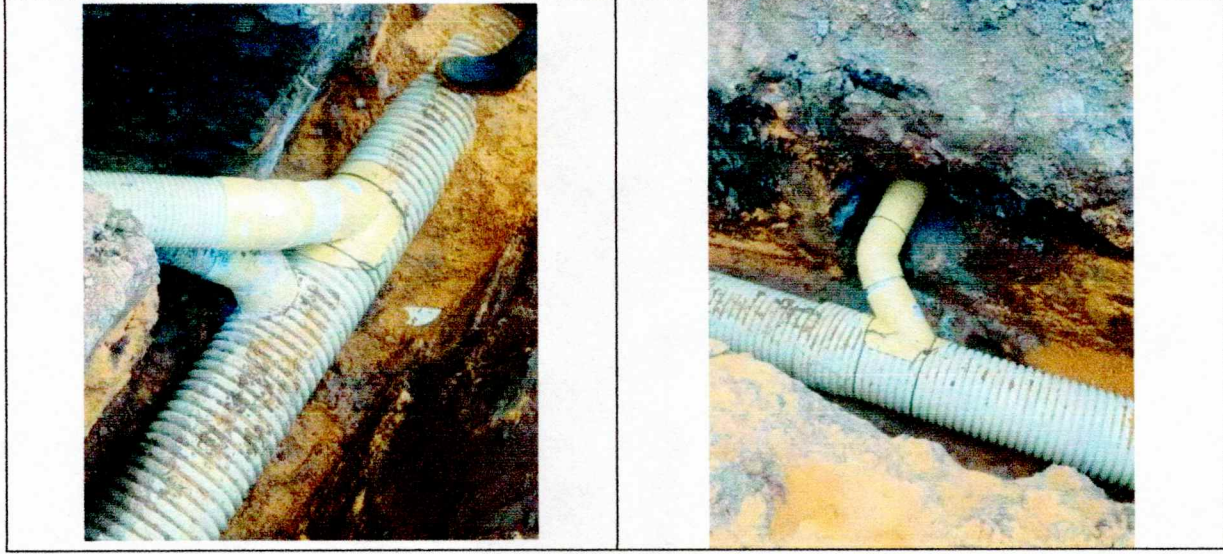

**Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
 Código Postal 153887**

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 15 de 18 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.

6. POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA)

Descripción:

La actividad tuvo como finalidad la construcción del pozo de inspección solicitado, al cual se conectó la tubería principal del alcantarillado. Este pozo fue construido en ladrillo tolete y contó con un diámetro interior de 1.20 m y una altura mayor a 1.00 m y menor a 1.50 m. Cabe aclarar que esta construcción no incluye el aro ni la tapa de concreto para el cierre superficial y superior del pozo.



7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)

Descripción:

La actividad consistió en el suministro e instalación del aro y tapa en concreto prefabricado para el pozo de inspección construido, compuesto por concreto prefabricado con un diámetro de 1.00 m.




8. RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
 Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27	Página 16 de 18
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.

Descripción:
 La actividad consistió en el relleno con arena de peña de las excavaciones realizadas para la instalación de la tubería principal de 12" y de las acometidas de 6". En esta actividad se ejecutó el atraque de la tubería mediante cama de arena para garantizar su debido sostenimiento, realizando posteriormente el relleno con arena hasta la cota superior de la tubería. Para ello, se suministró arena con alturas correspondientes de 0.60 m y 0.40 m para la tubería principal y las acometidas respectivamente, en este caso seis tramos. Este relleno fue compactado mediante plancha vibratoria. Dentro del análisis se descontó el volumen ocupado por la tubería.



9. RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)


Descripción:
 La actividad correspondió al relleno con material de afirmado compactado mediante rana y/o vibrocompactador, de la altura restante de la excavación posterior al suministro e instalación de la tubería principal, las acometidas y el relleno inicial con arena de peña. Este relleno tuvo una altura de 0.90 m para la tubería principal y de 1.10 m para las acometidas. El material fue compactado y nivelado hasta la cota rasante para la posterior colocación del pavimento articulado en adoquín de arcilla vehicular.



**Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
 Código Postal 153887**

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 17 de 18 03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ.

10. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM

Descripción:

La actividad tuvo como finalidad el cargue y transporte de materiales sueltos, específicamente arena de peña y material de afirmado, necesarios para el relleno de las excavaciones realizadas, de acuerdo con los volúmenes estipulados de 34.52 m³ para la arena y 62.16 m³ para el material de afirmado en los respectivos ítems. Este transporte se realizó a una distancia adicional de 9 km, posterior a los 5 km comprendidos dentro del ítem contratado.



11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)

Descripción:


La actividad tuvo como finalidad el suministro e instalación de adoquín de arcilla para vía vehicular pesada, con dimensiones de 10 x 8 x 20 cm, necesario para la adecuación de la capa de rodadura de la vía. Esta actividad estuvo condicionada a las áreas estipuladas en las respectivas excavaciones, de acuerdo con las longitudes y anchos correspondientes a las tuberías principales y acometidas domiciliarias.



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 18 de 18
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

10. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

- La ejecución de las actividades por parte del Contratista se desarrolló en las condiciones óptimas y estipuladas contractualmente, sin presentarse inconvenientes que generaran retrasos o demoras en los trabajos, de acuerdo con el plazo establecido. Adicionalmente, la ejecución de los trabajos fue satisfactoria, logrando el Contratista realizar la entrega anticipada de las actividades a la supervisión, con anterioridad a la fecha de terminación del contrato; por lo tanto, fue posible recibir las actividades ejecutadas el día 21 de mayo de 2026, en contraste con la fecha de terminación inicialmente estipulada para el 25 de mayo de 2026.
- De acuerdo con las cantidades y valores ejecutados, se registra un avance físico y presupuestal del 100% dentro del plazo contractual de quince (15) días, con terminación anticipada con corte al 21 de mayo de 2026. Conforme al Acta de Recibo Final, se alcanzó la ejecución total del contrato por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 39.521.587,06) M/CTE.**




ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-SP-38 Versión 2	Página 1 de 1 03/08/2020
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SECRETARIO ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ de Sáchica Boyacá, y actuando como Supervisor del contrato de obra N° **MS-MC-017-2026** cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ. No MS-MC-017-2026.**

CERTIFICA

Que el contratista **INGALCA S.A.S** identificado con NIT: 901.531.693-0, representado por **ALEJANDRO GUERRERO HUERTAS** identificado con numero de cedula CC: 1,049,645,972 DE TUNJA, en Calidad de Contratista, ejecutó el contrato de **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ. No MS-MC-017-2026** en modalidad de mínima cuantía, en el periodo comprendido el día 11 de MAYO al 21 de MAYO de 2026, desarrollando a satisfacción las actividades objeto del Acta Final, y certificando que la ejecución realizada hasta la fecha se anexa en la sabana presupuestal.

Esta certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de MAYO del 2026, en el municipio de Sáchica (Boyacá).

Cordialmente,



ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 Secretario de Planeación y Obras Publicas
