



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 2

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

Nº 0000000010

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00010	22/04/2026

Fecha de Expedición: 04/05/2026

Nit ò Cedula:	900615681 - 0
Beneficiario:	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S

Concepto de este Egreso

BB686BE7B65C06D666B669FFC9FA7D25

PAGO ACTA N° 03 DEL AVANCE 03 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAL 002 - 2025 CUYO OBJETO ES LA: INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	9.343.750,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53290	Otras obras de ingeniería civil	9.343.750,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.343.750,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	9.343.750,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE1	Por un San Roque agroindustrial competitivo y Ambientalmente sostenible	9.343.750,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 4503022	Obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres GOBIERNO TERRITORIAL Gestion del riesgo de desastres y emergencias	9.343.750,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	9.343.750,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	9.343.750,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 450302200	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	9.343.750,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056700061	Estrategias para la gestión del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de San Roque	9.343.750,00
CCPET10 - APORTES DEPARTAMENTALES 2.10.14	FDGRD-DAGRAN RESOL 2025060176043	9.343.750,00

Total de la Presente Orden

9.343.750,00

Total Retenciones

1.775.314,00

Total a Pagar

7.568.436,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_rpp_sanroque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: WILTON ALBERTO AGUDELO GALLEG0, el día: martes, 12 de mayo de 2026 siendo las: 16:22:44

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RESERPPTAL01026
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16385051381

Fecha: 05-05-2026
Fecha de Generación: 05-05-2026

Hora: 15:40:26
Fecha para Procesar el pago: 04-05-2026

Impreso por: ALEJANDRO2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,568,436.00	Valor Registros Procesados: \$7,568,436.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000422006379	Corriente	9006156810	ESTANDAR INGENIERO	7,568,436.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-05-2026



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 2

OBLIGACIÓN CONTRAÍDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

N° 0000000010

Fecha de Expedición: 22/04/2026

CA2FA57169BA853DED4F0792205F160B

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00887	01/01/2026

Nit ò Cedula:	900615681 - 0
Beneficiario:	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S

Por Concepto de: PAGO ACTA N° 03 DEL AVANCE 03 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAL 002 - 2025 CUYO OBJETO ES LA: INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCIARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	9.343.750,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53290	Otras obras de ingeniería civil	9.343.750,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.343.750,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	9.343.750,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE1	Por un San Roque agroindustrial competitivo y Ambientalmente sostenible	9.343.750,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 4503022	Obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres GOBIERNO TERRITORIAL Gestion del riesgo de desastres y emergencias	9.343.750,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	9.343.750,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	9.343.750,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 450302200	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	9.343.750,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056700061	Estrategias para la gestión del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de San Roque	9.343.750,00
CCPET10 - APORTES DEPARTAMENTALES 2.10.14	FDGRD-DAGRAN RESOL 2025060176043	9.343.750,00

Valor en letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA 4655	1,00	93.438,00
ESTAMPILLA PROANCIANO 4787	4,00	373.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 4647	1,50	140.156,00
FONDO DE SEGURIDAD 8697	5,00	467.188,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 0049	1,00	93.438,00
OBRA PUBLICA 4655	2,00	186.875,00
Estampilla Prodeportes 2.5% 2221	2,50	233.594,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 5695	2,00	186.875,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	9.343.750,00	1.775.314,00	7.568.436,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ocxrp_sanroque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: WILTON ALBERTO AGUDELO GALLEG0, el día: lunes, 27 de abril de 2026 siendo las: 8:42:17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Página: 2 de: 2

Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

CG 0010

9.343.750,00

1.775.314,00

7.568.436,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Buato Peralta
Rov Peralta 07/02/26
2-2

Rov Peralta 07/02/26
2-2





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 2

CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL

CRP N° 0000000887

Fecha de Expedición: 01/01/2026

3A9D19222962F564CED7468B8C11BCDE

CERTIFICA que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900615681 - 0
Beneficiario:	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	35.643.750,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53290	Otras obras de ingeniería civil	35.643.750,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	35.643.750,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	35.643.750,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE1	Por un San Roque agroindustrial competitivo y Ambientalmente sostenible	35.643.750,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 4503022	Obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres GOBIERNO TERRITORIAL Gestion del riesgo de desastres y emergencias	35.643.750,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	35.643.750,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	35.643.750,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 450302200	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	35.643.750,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056700061	Estrategias para la gestión del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de San Roque	35.643.750,00
CCPET10 - APORTES DEPARTAMENTALES 2.10.14	FDGRD-DAGRAN RESOL 2025060176043	35.643.750,00

Valor en letras:

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Objeto del Compromiso

INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)

ERP R. Pptal 0887/2
R2
✓



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_constrp_sanroque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: GINA MAGALY CARDONA OSSA, el día: miércoles, 22 de abril de 2026 siendo las: 8:53:58



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Página: 2 de: 2

Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Secretaría de Hacienda

Auxiliar Administrativa

CAP - Reserv
N° 887

01/01/2026

2 de 2

CCPPE 0887-2-2

CCPPE 0887-2026
2-2
✓



887



ESTÁNDAR INGENIEROS
S.A.S.
NIT 900.615.681-0
CR 81 3 A SUR 16
Tel: (57) 3196071441
MEDELLÍN - Colombia
estainge@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 125

Señores	MUNICIPIO DE SAN ROQUE		
NIT	890.980.850-7	Teléfono	(604) 8656755
Dirección	CL 20 # 20 59	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/02/2026, 16:19 ✓
Expedición	23/02/2026, 16:19 ✓
Vencimiento	23/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	0002	ACTA 3 OBJETIVO: INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LÍNEA ESTRATÉGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAIN 2025 (2024056700061)	1.00	9,343,750.00	0 %	0 %	9,343,750.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Nueve millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Otro - Crédito \$ 9,343,750.00

Observaciones:

- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
- SOMOS AGENTES RETENEDORES
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE ESTANDAR INGENIEROS S.A.S N° 422-006379

Total Bruto	9,343,750.00
Total a Pagar	9,343,750.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 630.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764109558440 aprobado en 20251023 prefijo FEV desde el número 108 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: e0e2ee7059e62d5027164be88f5d07acf22641695f6241a08584a11cec7142627a06932d40649759c57b79218b0ba1de

05-04-26
8:55

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA**


CERTIFICA:

Que de acuerdo a las evidencias presentadas por la **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297 y en cumplimiento a lo estipulado en el **CONTRATO CALAMIDAD PUBLICA No CAL 002-2025**, cuyo objeto es: **INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061); durante el periodo comprendido entre el 8/10/2025 al 22/10/2025, por un valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS. M.L (\$ 9.343.750 COP). Según factura Electrónica No FEV-125.**

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada en San Roque, veintiséis (26) días del de marzo de 2026 /



CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUIN
Secretaria Planeación, Obras Públicas e Infraestructura
Supervisor

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA	Nombre: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUIN	Nombre: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUIN
Cargo: Profesional de Apoyo -Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 11

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	No 3 y final	NUMERO DEL CONVENIO	CAL002-2025
--	---------------------	----------------------------	--------------------

NUMERO DEL CONTRATO	CAL 002-2025 /			
CONVENIENTE-MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIQUIA NIT 890980850-7			
CONVENIENTE-ASOCIACION	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0 representada legalmente Por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO , identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	REGIMEN ESPECIAL-URGENCIA MANIFIESTA			
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)".			
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML, (\$285.000.000).			
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO			
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000000651			
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA -CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN			
VALOR DEL CONVENIO	VALOR INICIAL	ADICION AL VALOR		
	\$ 285.000.000	No.	TIEMPO	VALOR
PLAZO:	INICIAL	No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO	1	22/07/2025	22/10/2025

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	2 de 11

		ADICION AL PLAZO	
		No.	TIEMPO ADICIONADO
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		NA	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		22/10/2025	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	
% DE EJECUCION FISICA		95%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS		90.77%	

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA						
Alcance (actividades realizadas)						Ejecución
						Observaciones
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO	CANT	VR.TOTAL	
1. MURO REFORZADO SECTOR PARQUE ECOLOGICO					\$41.883.315	
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	M3	\$ 85.000,00	32,22	\$ 2.738.700	CUMPLIO Se anexa
1,2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	M3	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0	
1,3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	M3	\$ 76.096,00	0,00	\$ 0	
1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS.	M3	\$ 146.638,00	17,50	\$ 2.566.165	



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Pagina	3 de 11


1,5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), PARA VIGA CABEZAL	M3	\$ 800.788,00	5,59	\$ 4.476.405
1,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), VASTAGO	M3	\$ 1.200.000,00	9,04	\$ 10.848.000
1,7	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE 30CM DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4m, EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), DISTANCIADOS A 1M A EJE ENTRE UNO Y OTRO, TIPO 3 BOLILLOS, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS LONGITUDINALES No4 Y ESTRIBOS EN ACERO No 3 CADA 30cm, y CONCRETO DE 21mpa	ML	\$ 345.000,00	27,00	\$ 9.315.000
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109, O FABRICADO EN OBRA	ML	\$ 55.095,00	0,00	\$ 0
1,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CABEZAL Y VASTAGO	KG	\$ 10.911,00	868,55	\$ 9.476.749
OE.1	Construcción de filtro tipo frances con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600. Incluye: imprimación e impermeabilización de la pantalla del muro con Igol Denso o similar.	m	\$ 157.392	8,10	\$ 1.274.878
OE.2	Suminitro e instalación de geotextil NT 1600	m2	\$ 15.137	22,07	\$ 334.078
OE.3	Colocación de concreto de 14 Mpa para solado con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno	m2	\$ 28.377	12,15	\$ 344.785



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	4 de 11

OE.7	Colocación de concreto de 21 Mpa para ajuste de placa con un espesor de 0.10 cm. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno	m2	\$ 69.761	7,29	\$ 508.556
2. MURO REFORZADO SECTOR LOS ALPES				0,00	\$ 51.838.339,72
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	M3	\$ 85.000,00	35,48	\$ 3.015.800
1,2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	M3	\$ 150.000,00	2,39	\$ 358.500
1,3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	M3	\$ 76.096,00	0,00	\$ 0
1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS.	M3	\$ 146.638,00	24,52	\$ 3.595.564
1,5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), PARA VIGA CABEZAL	M3	\$ 800.788,00	8,48	\$ 6.790.682
1,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), VASTAGO	M3	\$ 1.200.000,00	9,14	\$ 10.968.000
1,7	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE 30CM DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4m, EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), DISTANCIADOS A 1,5M A EJE ENTRE UNO Y OTRO, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS	ML	\$ 345.000,00	27,00	\$ 9.315.000



- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social del periodo de (febrero-marzo).
- Cuenta de cobro. (**FACTURA ELECTRONICA No FEV-125**),

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el artículo 50 de la ley 789 del 2002 que en su texto establece que “las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.”

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	6 de 11

OE.1	Construcción de filtro tipo frances con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600. Incluye: imprimación e impermeabilización de la pantalla del muro con Igol Denso o similar.	m	\$ 157.392,29	11,40	\$ 1.794.272
OE.2	Suministro e instalación de geotextil NT 1600	m2	\$ 15.137,19	20,86	\$ 315.762
OE.3	Colocación de concreto de 14 Mpa para solado con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno	m2	\$ 28.377,38	17,10	\$ 485.253
OE.5	Suministros, transporte e instalación de tubería de concreto reforzado de 24", incluye emboquillado con mezcla impermeabilizada con Sika 1 o similar.	m	\$ 310.446,04	4,00	\$ 1.241.784
OE.6	Reconstrucción de placa huella perdida por colapso del muro, 1.60Mts de ancho, incluye concreto de 21Mpa, entre huella de 1,00 m y sobrecanchos en piedra de 0.60 m y todo lo necesario para su correcta instalación	m	\$ 210.303,48	11,80	\$ 2.481.581
3.RECALZADO DE GAVIÓN EN CONCRETO					
					\$ 4.250.000,00
1,14	REPARACIÓN DE GAVIÓN, CON CONCRETO CICLOPEO (60%CONCRETO 21MPA, 40% PIEDRA DE CANTO), INCUYE RETIRO DE PIEDRA GAVIÓN ACTUAL, DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DE 5CM, FORMALETEADO Y VACIADO GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS ACTUALES	M3	\$ 850.000,00	5,00	\$ 4.250.000



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	7 de 11

4.RECLAZADO DE PILAR DE PUENTE					
					\$ 34.167.867,60
1,15	REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RECALZADO EN CONCRETO DE 28MPA Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE, PARA PROTECCIÓN DE CIMENTACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE, INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS, DEMOLICIÓN CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.500.000,00	15,09	\$ 22.635.000
OE.9	Control y manejo de aguas dentro del afluente para obras de recalzado de pilar de puente. Incluye: construcción de muro provisional en bolsas tipo Big bag, control de filtraciones con costales llenado con triturado y recubiertos con plástico calibre 6, incluye retiro de los materiales y reconstrucción por creciente del afluente.	M	\$ 288.321,69	40,00	\$ 11.532.868
5.CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS					
					\$ 59.672.977,06
1,16	CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS DE 1M DE ALTO, 0,7M DE ESPESOR, PARA CONTROL DE LOS DIFERENTES PROCESOS EROSIVOS ACTIVADOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ROQUE	M	\$ 460.000,00	87,24	\$ 40.130.400
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0-2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS	m3	\$ 85.000,00	95,66	\$ 8.131.100



Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	8 de 11

	HASTA 5km						
1.3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	m2	\$ 76.096,00	92,80	\$ 7.061.709		
OE.2	Suministro e instalación de geotextil NT 1600	m2	\$ 15.137,19	153,61	\$ 2.325.224		
OE.4	Demolición y retiro de bolsacreto en mal estado o desplomados. Incluye botada de escombros	m	\$ 44.825,00	8,50	\$ 381.013		
OE.8	Construcción de filtro tipo frances con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600 (Para control de afloramiento de agua en el terreno)	m	\$ 99.608,00	16,50	\$ 1.643.532		
6.CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SAN JOSE DEL NUS							
					\$ 7.187.500,00		
1,17	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE REJA EN ACERO CUADRADO O REDONDO EN 7/8", CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M	\$ 625.000,00		\$ 0		
OE.10	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN. PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJA EN PLATINA 2" X 3/8" X 6 m SEPARADAS A 2cm Y CONTRAMARCO, CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA	M	\$ 625.000,00	11,50	\$ 7.187.500		

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	5 de 11

	LONGITUDINALES No4 Y ESTRIBOS EN ACERO No 3 CADA 30cm, y CONCRETO DE 21mpa						
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	\$ 55.095,00	0,00	\$ 0		
1,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CABEZAL Y VASTAGO	KG	\$ 10.911,00	969,31	\$ 10.576.141		
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (TRITURADO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	M3	\$ 264.574,00	0,00	\$ 0		
1,11	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NOINCLUYE REJA O TAPA	ML	\$ 450.000,00	2,00	\$ 900.000		
1,12	RECONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PERDIDA POR COLAPSO DEL MURO, 3M DE ANCHO, INCLUYE CONCRETO 21MPA, ACERO, PARA RIEL DE 90CM, ENTRE HUELLA 90CM, Y SOBREALCHO EN PIEDRA PEGADA 1,2M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	\$ 350.000,00	0,00	\$ 0		
1,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36", POR PERDIDA DE BANCA EN COLAPSO DE MURO	ML	\$ 350.000,00	0,00	\$ 0		



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	10 de 11

El art. 10 de la ley 1122 de 2007 facultó al gobierno nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el art. 23 del decreto reglamentario 1703 de 2002 y al que había hecho referencia el ministerio de la protección social en su circular no. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del art. 18 de la ley 1122 de 2007, la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado señaló: "esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD DONDE REALIZA EL PAGO			SOI		
NO. PLANILLA	9037482615	PERIODO - SALUD	febrero	PERIODO - PENSION	marzo
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	\$221.100	\$441.200	\$190.000	\$221.100	\$ 0
FECHA DE PAGO	14/03/2026				
PAGADA	SI	SI	SI	VALOR TOTAL APOORTE	\$1.073.000

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE EJECUCION
VR. CONTRATO	\$ 285.000.000	100%
AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	\$ 85.500.000	30%
VR. TOTAL DE ACTA No1	\$ 179.822.198	
VR. A PAGAR ACTA No1	\$ 94.322.198	33%
VR. A PAGAR ACTA No2	\$ 69.534.052	24%
VR. A PAGAR ACTA No3 Y FINAL	\$ 9.343.750	3%




📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - Palacio Municipal, San Roque (Ant.)


📮 Código postal - 053030

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	11 de 11

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	\$ 249.356.250	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATO	\$ 26.300.000	9%
VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	\$ 9.343.750	

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	 FIRMA
------------	--


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA	Nombre: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUÍN	Nombre: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUÍN
Cargo: Ingeniera Civil -Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S.** identificada con el número de documento **9006156810** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 16 de enero del 2015 con la Cuenta Corriente 422-006379 la cual se encuentra Activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **15 de diciembre de 2025**.



Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141144182655			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9006156810		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		Lugar de expedición		28. País	
29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S.			
36. Nombre comercial ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S.		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín	
41. Dirección principal CR 81 3A SUR 16		42. Correo electrónico estaingecontable@gmail.com			
43. Código postal 005001		44. Teléfono 1 3196071441		45. Teléfono 2 3013493457	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20130508		48. Código 4330	
49. Fecha inicio actividad 20130508		50. Código 41124210		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 571442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exógena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios 0					
61. Fecha 2025-10-20 14:18:00					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre MONTOYA MORENO JUAN ESTEBAN					
985. Cargo Representante legal Certificado					



ACTA DE AVANCE NO 3 Y FINAL MEMORIA DE CALCULOS



MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA									
CONTRATO:		No. CAL-002-2025		SUPERVISIÓN:		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SAN ROQUE		FECHA DE INICIO		22 DE JULIO DE 2025			
CONTRATISTA		ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT: 900615883-8		FECHA DE TERMINACIÓN:		22 DE OCTUBRE DE 2025			
OBJETO:		OBJETO: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDañas A CORRIENTES HÍBRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (202405670063)"				LOCALIZACIÓN		MUNICIPIO DE SAN ROQUE	
PLAZO:		CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS		VALOR DEL CONVENIO		ACTA AVANCE DE OBRA No.		FECHA ACTA	
ITEM		DESCRIPCION		OBRA CONTRACTUAL			ACTA No 3 y FINAL		
		UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ORDINARIA	CANT. ADICIONAL	CANT. TOTAL	VR. TOTAL
OE.3		m2		\$ 28.377				12,15	\$ 344.785
OE.7		m2		\$ 69.761				7,29	\$ 508.556
2. MURO REFORZADO SECTOR LOS ALPES					\$ 83.268.591,44			0,00	\$ 51.838.339,72
1.1		M3	28,80	\$ 85.000,00	\$ 2.448.000,00			35,48	\$ 3.015.800
1.2		M3	2,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00			2,39	\$ 358.500
1.3		M3	86,40	\$ 76.096,00	\$ 6.574.694,40			0,00	\$ 0
1.4		M3	14,40	\$ 146.638,00	\$ 2.111.587,20			24,52	\$ 3.595.564
1.5		M3	2,88	\$ 800.788,00	\$ 2.306.269,44			8,48	\$ 6.790.682
1.6		M3	14,40	\$ 1.200.000,00	\$ 17.280.000,00			9,14	\$ 10.968.000

	CONTRATO:		No. CAL-002-2025	SUPERVISIÓN:		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
	CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SAN ROQUE	FECHA DE INICIO		22 DE JULIO DE 2025						
	CONTRATISTA		ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT: 900615681-8	FECHA DE TERMINACIÓN:		22 DE OCTUBRE DE 2025						
OBJETO:	OBJETO: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEJADAS A CORRIENTES HÍBRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCIARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATÉGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)"			LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SAN ROQUE							
PLAZO:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS			VALOR DEL CONVENIO		ACTA AVANCE DE OBRA No.			FECHA ACTA		30/10/2025	
ITEM	DESCRIPCION	OBRA CONTRACTUAL		ACTA No 3 Y FINAL			EJECUCION ACUMULADA					
		UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ORDINARIA	CANT. ADICIONAL	CANT. TOTAL	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
1.7	CONSTRUCCIÓN DE PIOTES DE 30CM DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4m. EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), DISTANCIADOS A 1,2M A DE ENTRE UNO Y OTRO, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS LONGITUDINALES No4 Y ESTRIBOS EN ACERO No 3 CADA 30cm, Y CONCRETO DE 21mpa	ML	32,00	\$ 345.000,00	\$ 11.040.000,00					27,00	\$ 9.315.000	
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTENO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	50,00	\$ 55.095,00	\$ 2.754.750,00					0,00	\$ 0	
1.9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CABEZAL Y VASTAGO	KG	2419,20	\$ 10.911,00	\$ 26.395.891,20					969,31	\$ 10.576.141	
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (TRITURADO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE EN TRESUELOS EN PIEDRA	M3	10,80	\$ 264.574,00	\$ 2.857.399,20					0,00	\$ 0	
1.11	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NOINCLUYE REJA O TAPA	ML	8,00	\$ 450.000,00	\$ 3.600.000,00					2,00	\$ 900.000	
1.12	RECONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PERDIDA POR COLAPSO DEL MURO. 3M DE ANCHO, INCLUYE CONCRETO 21MPa, ACERO, PARA RIEL DE 90CM, ENTRE HUELLA SOCMA, Y SOBREALCHO EN PIEDRA PEGADA 1,2M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	12,00	\$ 350.000,00	\$ 4.200.000,00					0,00	\$ 0	
1.13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36", POR PERDIDA DE BANCA EN COLAPSO DE MURO	ML	4,00	\$ 350.000,00	\$ 1.400.000,00					0,00	\$ 0	
OE.1	Construcción de filtro tipo frances con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600. Incluye: imprimación e impermeabilización de la pantalla del muro con Igol Densio o similar.	m		\$ 157.392,29						11,40	\$ 1.794.272	
OE.2	Suministro e instalación de geotextil NT 1600	m2		\$ 15.137,19						20,86	\$ 315.762	

<div></div> <div>MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA</div> <div>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA</div>										<div>ALCALDIA DE SAN ROQUE</div> <div>MUNICIPIO DE SAN ROQUE</div>									
CONTRATO:		No. CAL-002-2025		SUPERVISION:		FECHA DE INICIO		22 DE JULIO DE 2025											
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SAN ROQUE				FECHA DE TERMINACION:		22 DE OCTUBRE DE 2025											
CONTRATISTA		ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT: 900615681-8																	
OBJETO:		OBJETO: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDañas A CORRIENTES HÍBRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCERIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)"				LOCALIZACION		MUNICIPIO DE SAN ROQUE											
PLAZO:		CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS		VALOR DEL CONVENIO		ACTA AVANCE DE OBRA No.		FECHA ACTA											
								30/10/2025											
ITEM		DESCRIPCION		OBRA CONTRACTUAL		ACTA No 3 Y FINAL		EJECUCION ACUMULADA											
		UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ORDINARIA	CANT. ADICIONAL	CANT. TOTAL	VR. TOTAL										
OE.3		m2		\$ 28.377,38					\$ 485.253										
OE.5		m		\$ 310.446,04					\$ 1.241.784										
OE.6		m		\$ 210.303,48					\$ 2.481.581										
3.RECALZADO DE GAVIÓN EN CONCRETO					\$ 4.250.000,00				\$ 4.250.000,00										
1.14		M3	5,00	\$ 850.000,00	\$ 4.250.000,00				\$ 4.250.000										
4.RECALZADO DE PILAR DE PUENTE					\$ 14.625.000,00				\$ 34.167.867,00										
1.15		M3	9,75	\$ 1.500.000,00	\$ 14.625.000,00				\$ 22.635.000										
		REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RECALZADO EN CONCRETO DE 28MPA Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE - PARA PROTECCIÓN DE CIMENTACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE, INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS, DEMOLICIÓN CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBREPANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN																	

MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA									
CONTRATO:		No. CAL-002-2025		SUPERVISIÓN:		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SAN ROQUE		FECHA DE INICIO		22 DE JULIO DE 2025			
CONTRATISTA		ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S NIT: 900615681-8		FECHA DE TERMINACIÓN:		22 DE OCTUBRE DE 2025			
OBJETO:		OBJETO: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍBRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BARRICAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LÍNEA ESTRATÉGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POA 2025 (2024056700061)"			LOCALIZACIÓN		MUNICIPIO DE SAN ROQUE		
PLAZO:		CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIOS		VALOR DEL CONVENIO		ACTA AVANCE DE OBRA No.		FECHA ACTA	
								30/10/2025	
ITEM		DESCRIPCIÓN		OBRA CONTRACTUAL			ACTA No 3 y FINAL		
		UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ORDINARIA	CANT. ADICIONAL	CANT. TOTAL	VR. TOTAL
OE.9	Control y manejo de aguas dentro del afluente para obras de recalzado de pilar de puente. Incluye: construcción de muro provisional en bolsas tipo Big bag, control de filtraciones con costales llenados con triturado y recubiertos con plástico calibre 6, incluye retiro de los materiales y reconstrucción por creciente del afluente.	M		\$ 288.321,69					\$ 11.532.868
5.CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS					\$ 42.317.000,00				\$ 59.672.977,06
1.16	CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS DE 1M DE ALTO, 0.7M DE ESPESOR, PARA CONTROL DE LOS DIFERENTES PROCESOS EROSIVOS ACTIVADOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ROQUE	M	91,99	\$ 460.000,00	\$ 42.317.000,00				\$ 40.130.400
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	m3		\$ 85.000,00					\$ 8.131.100
1.3	LEÑOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMIO (LIMO O RECEIRO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	m2		\$ 76.096,00					\$ 7.061.709
OE.2	Suministro e instalación de geotextil NT 1600	m2		\$ 15.137,19					\$ 2.325.224
OE.4	Demolición y retiro de bolsacreto en mal estado o desplomados. Incluye botada de escombros	m		\$ 44.825,00					\$ 381.013
OE.8	Construcción de filtro tipo frances con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600 (para control de afloramiento de agua en el terreno)	m		\$ 99.608,00					\$ 1.643.532
6.CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SAN JOSE DEL NIUS					\$ 8.186.936,00				\$ 7.187.500,00



ALCALDIA DE
SAN ROQUE



**ALCALDIA DE
SAN ROQUE**

		CONTRATO: No. CAL-002-2025		SUPERVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN ROQUE		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA			
CONTRATANTE:						FECHA DE INICIO		22 DE JULIO DE 2025			
CONTRATISTA		ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S NIT: 900615681-8				FECHA DE TERMINACIÓN:		22 DE OCTUBRE DE 2025			
OBJETO:		OBJETO: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCIARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)"				LOCALIZACIÓN		MUNICIPIO DE SAN ROQUE			
PLAZO:		CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIOS		VALOR DEL CONVENIO		ACTA AVANCE DE OBRA No.		FECHA ACTA		30/10/2025	
ITEM		DESCRIPCIÓN		OBRA CONTRACTUAL			ACTA No 3 y FINAL			EJECUCIÓN ACUMULADA	
		UNO	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ORDINARIA	CANT. ADICIONAL	CANT. TOTAL	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1.17	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE. PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI). INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE REJA EN ACERO CUADRADO O REDONDO EN 7/8", CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRIANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M	13,10	\$ 625.000,00	\$ 8.186.936					0,00	\$ 0
OE.10	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN. PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI). INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJA EN PLATINA 2" X 3/8" X 6 m SEPARADAS A 2cm Y CONTRAMARCO, CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRIANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M		\$ 625.000,00			11,50	11,50	7.187.500	11,50	\$ 7.187.500
7. HORAS MAQUINARIA						\$ 19.230.769,23				0,00	\$ 0,00
1.18	RETROEXCAVADORA DE ORUGA TIPO 120, INCLUYE TRANSPORTE CAMA BALA	HORA	40,00	\$ 186.000,00	\$ 7.520.000,00					0,00	\$ 0
1.19	RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS	HORA	30,00	\$ 120.000,00	\$ 3.600.000,00					0,00	\$ 0
1.20	VOLQUETA	DÍA	9,00	\$ 901.196,58	\$ 8.110.769,23					0,00	\$ 0
	COSTO DIRECTO					\$ 219.230.769		COSTO DIRECTO		\$ 7.187.500	
	ADMINISTRACIÓN	A	25%			\$ 54.807.692		A		\$ 1.796.875	
	UTILIDAD	U	5%			\$ 10.961.538		U		\$ 359.375	
	TOTAL (COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO A)					\$ 285.000.000		VR ACTA No 3		\$ 9.343.750	
										\$ 199.000.000	
										\$ 49.750.000	
										\$ 9.950.000	
										\$ 258.700.000	

	CONTRATO:		No. CAL-002-2025	SUPERVISIÓN:		MUNICIPIO DE SAN ROQUE		No. CAL-002-2025		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIQUÍA					
	CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SAN ROQUE		FECHA DE INICIO		22 DE JULIO DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:		22 DE OCTUBRE DE 2025						
	CONTRATISTA		ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT: 900615681-8		FECHA DE INICIO		22 DE JULIO DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:		22 DE OCTUBRE DE 2025						
OBJETO: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCIARIAS, PÉRDIDA DE BANCA) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATÉGICA [1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE] PON 2025 [2024056700061]"												LOCALIZACIÓN		MUNICIPIO DE SAN ROQUE		ALCALDIA DE SAN ROQUE	
PLAZO:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIOS		VALOR DEL CONVENIO		ACTA AVANCE DE OBRA No.		FECHA ACTA		30/10/2025								
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA CONTRACTUAL		ACTA No 3 y FINAL		Ejecución Acumulada											
		UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ORDINARIA	CANT. ADICIONAL	CANT. TOTAL	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL						
		RESUMEN ACTA No 3 Y FINAL				RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO				% ACUMULADO							
		VR. OBRA TOTAL		\$ 9.343.750		VR. CONTRATO		\$ 285.000.000		100%							
						AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO		\$ 85.500.000									
						VR. TOTAL DE ACTA No 1		\$ 179.822.198		63,10%							
						VR. A PAGAR ACTA No 1		\$ 94.322.198									
						VR. A PAGAR ACTA No 2		\$ 69.534.052		24,40%							
						VR. A PAGAR ACTA No 3 Y FINAL		\$ 9.343.750		3,28%							
						SALDO A FAVOR DEL CONTRATO		\$ 26.300.000		9,23%							
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS																	
Para constancia firman los que en ella intervinieron.																	
<div><div> CARLOS ANDRÉS LOPEZ BOLGOIN Secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura Supervisor Cronograma</div><div> JUAN ESTEBAN MONTAÑA MORENO Representante Legal - ESTANDAR INGENIEROS S.A.S</div></div>																	



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

[illegible]

OBSERVACIONES:

CARLOS ANDRÉS VAREZ HOLGUÍN
Secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura
FIRMA SUPERVISOR

JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTRATISTA



ACTA DE CAMBIO DE OBRA NO 2



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Aprobación de precios no previstos	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	1 de 4

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS NO PREVISTOS No 02

CONTRATO No	CAL-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0 representada legalmente Por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297
OBJETO:	INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$285.000.000 COP)
PLAZO INICIAL	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	22 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 20205
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005
NÚMERO CDO	00000000651

En el municipio de San Roque, a los ocho(8) días del mes de octubre de 2025; se reunieron en la oficina de la Secretaria de Planeación las siguientes personas: el señor: **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297, **REPRESENTANTE LEGAL DE ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** y señor: **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**, Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de San Roque, en calidad de Supervisor del contrato de Calamidad Pública CAL No 002-2025, con el fin de acordar los precios para los ítems de obra extra de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que se suscribió el contrato de Calamidad Pública CAL No 002-2025, entre **MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA** y la **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0**, R.L. **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297, cuyo objeto es la: **"INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA**

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Aprobación de precios no previstos	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	2 de 4

AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061), por valor inicial DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML (\$285.000.000COP) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR y un plazo inicial de NOVENTA DIAS (90) CALENDARIO, a partir de la firma del acta de inicio.

- Que mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato de Calamidad Pública CAL No 002-2025, el día 22 de julio de 2025 y fecha de terminación el 22 de octubre de 2025.
- De acuerdo con las especificaciones contractuales, se contempló la instalación de una rejilla metálica fabricada en acero redondo de 7/8" de diámetro, con una separación libre de 5 cm entre barras, destinada a cubrir el cárcamo de captación de aguas superficiales en la vía.
- Durante la verificación en campo, se evidenció que la vía presenta un alto flujo peatonal, con presencia significativa de adultos mayores que hacen uso de bastones y otros elementos de apoyo para la movilidad. Bajo estas condiciones, el espaciamiento de 5 cm entre barras representa un riesgo para la seguridad de los usuarios, dado que permite la intrusión de dichos elementos, generando potenciales tropiezos y caídas. Adicionalmente, se identifican riesgos asociados al tránsito de mascotas y a la circulación ocasional de bicicletas con llantas de sección delgada, las cuales pueden quedar atrapadas entre los elementos de la rejilla, incrementando la probabilidad de accidentes.
- Desde el punto de vista estructural, y en concordancia con los diseños hidráulicos aprobados, se requiere conservar la sección del cárcamo para asegurar la adecuada captación y evacuación de aguas. No obstante, el uso de acero redondo de 7/8" en luces considerables, sometido a cargas derivadas del tránsito vehicular, presenta limitaciones en términos de rigidez y capacidad resistente. En particular, este tipo de configuración es susceptible a deformaciones por flexión, lo cual puede comprometer su desempeño estructural, reducir su vida útil y generar condiciones de servicio inadecuadas a mediano y largo plazo.
- En atención a lo anterior, se requiere la sustitución de la rejilla inicialmente especificada por una rejilla metálica fabricada en platina de acero de 2" x 3/8", con una separación libre de 2 cm entre elementos.
- La modificación propuesta obedece a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y desempeño estructural, sin afectar los criterios hidráulicos del diseño original. En consecuencia, se considera técnicamente viable y recomendable la implementación de la rejilla en platina de acero bajo las condiciones anteriormente descritas.
- Se relacionan las obras extras que corresponden a actividades no contempladas inicialmente en los diseños del contrato:

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Aprobación de precios no previstos	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	3 de 4

Item	Descripción	Unidad	Valor
OE.09	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN. PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJA EN PLATINA 2" X 3/8" X 6 m SEPARADAS A 2cm Y CONTRAMARCO, CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	m	\$ 625.000


Por lo anterior acuerdan:

1. Pactar el precio antes presentado e incluirlo en los ítems contractuales del CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA CAL 002-2025
2. Las demás consideraciones quedan como están estipuladas en el contrato inicial.
3. Adjunto se relacionan los ítems de obra extra

Para constancia firman los asistentes el día ocho (08) de octubre de 2025.


CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Supervisor


JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
Representante Legal
Estándar Ingenieros S.A.S

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA	Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN	Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Cargo: Ingeniera Civil -Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Aprobación de precios no previstos	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	4 de 4

APU PRECIOS NO PREVISTOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN. PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJA EN PLATINA 2" X 3/8" X 6 m SEPARADAS A 2cm Y CONTRAMARCO, CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.				No. Item	Unidad
				OE.10	ml
Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
1	concreto de 21 mpa	m3	0,29000	\$ 542.305	\$ 157.268
2	Acero de Refuerzo	Kg	20,30	\$ 10.600	\$ 215.180
4	impermeabilizante de mortero	kg	0,04	\$ 15.000	\$ 525
6	Super T de 19 mm de 1.83x2.44 m	m2	0,15	\$ 270.400	\$ 40.560
7	PLATINA 2" X 3/8 X 6 m	m	11,12	\$ 13.999	\$ 155.723
8	SOLDADURA WELD ALLOY 7018 1/8	kg	1,05	\$ 10.084	\$ 10.588
9	DISCO CORTE BNA26 356X2.6 X25.40 TRONZADORA 14"	und	0,10	\$ 11,796	\$ 1,180
Importe de Materiales				SUBTOTAL	\$ 579.846
Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
1	Soldador	jor	0,10000	\$ 98.829,00	\$ 9.883
2	oficial	jor	0,10000	\$ 78.829,00	\$ 7.883
Importe de Mano de Obra				SUBTOTAL	\$ 17.766
Clave	Equipo y Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
1	concretadora	dia	0,05	\$ 80.000	\$ 4.000
2	Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja	dia	0,05	\$ 50.000	\$ 2.500
3	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	\$ 17.766	\$ 888
Importe de Equipos y Herramientas				SUBTOTAL	\$ 7.388
Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
1	transporte de materiales	gl	1,00000	\$ 20.000	\$ 20.000
Importe de Auxiliares				SUBTOTAL	\$ 20.000
PRECIO UNITARIO					\$ 625.000

Para constancia firman los asistentes el día ocho (08) de octubre de 2025.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Supervisor


JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
 Representante Legal
 Estandar Ingenieros S.A.S

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Cambio de Obra	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	1 de 3

GRADO DE RESPONSABILIDAD ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 2	
CONTRATO No	CAL-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0 representada legalmente Por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297
OBJETO:	INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$285.000.000 COP)
PLAZO INICIAL	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	22 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005
NÚMERO CDO	00000000651

En el municipio de San Roque, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2025; se reunieron en la oficina de la Secretaria de Planeación las siguientes personas: **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297, **REPRESENTANTE LEGAL DE ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** y **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**, Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de San Roque, en calidad de Supervisor del contrato de Calamidad Pública CAL No 002-2025, con el fin de dar mutuo acuerdo al cambio de obra y aprobación de obra extra de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que se suscribió el contrato de Calamidad Pública CAL No 002-2025, entre **MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA** y la **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0**, R.L. **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297, cuyo objeto es la: **"INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA**

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Cambio de Obra	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	2 de 3

AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCIARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061), por valor inicial DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML (\$285.000.000COP) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR y un plazo inicial de NOVENTA DIAS (90) CALENDARIO, a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato de Calamidad Pública CAL No 002-2025, el día 22 de julio de 2025 y fecha de terminación el 22 de octubre de 2025.
3. De acuerdo con las especificaciones contractuales en el ítem 1.17 (CONSTRUCCION DE CARCAMO EN SAN JOSE DEL NUS), se contempló la instalación de una rejilla metálica fabricada en acero redondo de 7/8" de diámetro, con una separación libre de 5 cm entre barras, destinada a cubrir el cárcamo de captación de aguas superficiales en la vía.
4. Durante la verificación en campo, se evidenció que la vía presenta un alto flujo peatonal, con presencia significativa de adultos mayores que hacen uso de bastones y otros elementos de apoyo para la movilidad. Bajo estas condiciones, el espaciamiento de 5 cm entre barras representa un riesgo para la seguridad de los usuarios, dado que permite la intrusión de dichos elementos, generando potenciales tropiezos y caídas. Adicionalmente, se identifican riesgos asociados al tránsito de mascotas y a la circulación ocasional de bicicletas con llantas de sección delgada, las cuales pueden quedar atrapadas entre los elementos de la rejilla, incrementando la probabilidad de accidentes.
5. Desde el punto de vista estructural, y en concordancia con los diseños hidráulicos aprobados, se requiere conservar la sección del cárcamo para asegurar la adecuada captación y evacuación de aguas. No obstante, el uso de acero redondo de 7/8" en luces considerables, sometido a cargas derivadas del tránsito vehicular, presenta limitaciones en términos de rigidez y capacidad resistente. En particular, este tipo de configuración es susceptible a deformaciones por flexión, lo cual puede comprometer su desempeño estructural, reducir su vida útil y generar condiciones de servicio inadecuadas a mediano y largo plazo.
6. En atención a lo anterior, se requiere la sustitución de la rejilla inicialmente especificada por una rejilla metálica fabricada en platina de acero de 2" x 3/8", con una separación libre de 2 cm entre elementos
7. Que las actividades aquí descritas son fundamentales para que la obra continúe con su normal desarrollo, y se pueda cumplir así con el correcto proceso constructivo garantizando el buen funcionamiento y estabilidad de la obra.
8. Los cambios de obra planteados han sido encontrados durante la ejecución de la obra y fueron autorizados por supervisión del Contrato de Calamidad Pública CAL 002-2025.
9. Que se requiere realizar el ajuste de obra correspondiente al contrato de Calamidad Pública CAL-002-2025, como medida necesaria para garantizar el adecuado desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. Este ajuste obedece a condiciones identificadas en campo y a criterios técnicos que buscan asegurar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad de la obra, permitiendo así llevar a feliz término el contrato.
8. Se modifican las cantidades de obra como aparecen a continuación los cuales No modificaran el presupuesto general del contrato, y no se requiere adición presupuestal

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Cambio de Obra	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	3 de 3

OBRA QUE NO SE EJECUTA

1.17	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE REJA EN ACERO CUADRADO O REDONDO EN 7/8", CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M	13,10	\$625.000	\$ 10.643.750
------	---	---	-------	-----------	---------------


OBRA QUE SE EJECUTA

OE.10	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN. PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJA EN PLATINA 2" X 3/8" X 6 m SEPARADAS A 2cm Y CONTRAMARCO, CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M	13.10	\$625.000	\$ 10.643.750
-------	--	---	-------	-----------	---------------


Las partes dejan constancia en lo siguiente:

- Se ha mantenido el objeto del contrato calamidad Pública CAL 002-2025
- Se conservan las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato.
- Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los ocho (8) días el mes de octubre de 2025


CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Supervisor


JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
Representante Legal
Estandar Ingenieros S.A.S

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA	Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN	Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Cargo: Ingeniera Civil -Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

San Roque, 08 de octubre de 2025

Señores:

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Municipio de San Roque

Carlos Andrés López Holguín – Secretario de planeación

Asunto: Justificación de cambio de reja metálica de cárcamo en calle 11 del corregimiento de San José del Nus - Municipio de San Roque

El presente informe tiene como finalidad justificar el cambio del tipo de rejilla del cárcamo en concreto ubicado en la calle 11 del corregimiento de San José del Nus, en atención a condiciones de seguridad peatonal, funcionalidad estructural y durabilidad de la obra.

La rejilla inicialmente contemplada en las especificaciones contractuales corresponde a una fabricación en acero redondo de 7/8" de diámetro, con espaciamentos de 5 cm entre barras. Sin embargo, esta configuración no se ajusta a las condiciones reales de uso de la vía, la cual presenta un alto tránsito peatonal, especialmente de personas de la tercera edad que utilizan bastones u otros elementos de apoyo para la movilidad. Dicho espaciamiento representa un riesgo significativo, ya que los bastones pueden introducirse entre las barras, generando tropiezos y posibles caídas. De igual manera, se identifican riesgos para el paso de mascotas y para la circulación ocasional de bicicletas con ruedas delgadas, las cuales pueden quedar atrapadas entre los elementos de la rejilla.

Adicionalmente, desde el punto de vista estructural y respetando los diseños hidráulicos establecidos, se hace necesario conservar la sección del cárcamo para garantizar la adecuada recolección de las aguas en la vía. No obstante, el uso de acero redondo de 7/8" en una luz considerable, sumado al tránsito de vehículos sobre la rejilla, no resulta recomendable, ya que las barras pueden presentar deformaciones por flexión, reduciendo la capacidad resistente y afectando la durabilidad de la obra a mediano y largo plazo en atención a las condiciones anteriormente descritas, se determinó realizar el cambio a una rejilla metálica fabricada en platina de acero de 2" x 3/8", con una separación de 2 cm entre elementos. Esta solución permite mejorar significativamente la seguridad y accesibilidad peatonal, al tiempo que ofrece mayor rigidez estructural y resistencia frente a las cargas vehiculares, sin modificar la sección hidráulica del cárcamo ni afectar su correcto funcionamiento.

En conclusión, el cambio de la rejilla se encuentra plenamente justificado, ya que responde a criterios de seguridad, accesibilidad, comportamiento estructural y durabilidad, garantizando una solución más adecuada para las condiciones reales de la calle 11 del corregimiento de San José del Nus y contribuyendo a una infraestructura urbana más segura y eficiente

Atentamente



JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO

Representante Legal

Celular: 3196071441

Correo: estaingecontable@gmail.com



SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO PARAFISCALES



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - **Palacio Municipal, San Roque** (Ant.) 📠 Código postal - 053030
☎ **Conmutador:** 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co



SuAporte |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 14:05:51 PM

Tipo Planilla:

E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 9037482615

Periodo Cotización: febrero de 2026

Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 03/14/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTANDAR INGENIEROS SAS	Nombre Sucursal	006	Código Sucursal	006
Documento	N900615681	Dirección	calle 48 a 67-55		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4342028		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MONTOYA MORENO JUAN ESTEBAN	Identificación	CC 71792297		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Identificación	Apellido y Nombre	Sexo	Código	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
H123456	LOPEZ PEDRO J	M	00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTANDAR INGENIEROS SAS		Nombre Sucursal	005	Código Sucursal	006
Documento	N900615681		Dirección	calle 48 a 67-55		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	4342028		
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MONTOYA MORENO JUAN ESTEBAN		Identificación	CC 71792297		
Total Afiliados	1		ARP	ARL SURA		

III. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

	IBIC Pensión	IBIC Salud	IBIC Negocios	IBIC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Seguro	Aportes ICBP	Aportes EBAF	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Días en Pro) EPB	Incapacidades AEP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 4,411,409	\$ 2,211,100	\$ 160,400	\$ 221,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,071,600	\$ 2,400	\$ 1,074,000



**CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES
PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES**

Medellín, 26 de marzo de 2026

A QUIEN INTERESE

JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.792.297, actuando como representante Legal de ESTANDAR INGENIEROS SAS, Nit 900.615.681-0, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de la ley 789 de 2002

Dada en Medellín a los 26 días del mes de marzo del 2026

Atentamente,

JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DE ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S
Cédula de Ciudadanía: 71.792.297

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
CONTADOR PUBLICO
CC: 1.152.699.227
TP: 230982-T

**CARRERA 81 N 3ª SUR-16 MEDELLÍN – TELÉFONO 3196071441
CORREO:ESTAINGE@GMAIL.COM**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



230982-T

**CAROLINA
VÉLEZ CEBALLOS
C.C. 1152699227**

**RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO**



235992

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

251383

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.152.699.227**
VELEZ CEBALLOS

APELLIDOS
CAROLINA

NOMBRES

Carolina Vélez C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1995**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

A+

F

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

05-JUN-2013 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100150-00548889-F-1152699227-20140222

0037319235A 1

40593790

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

746F490044822F69

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152699227 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 230982-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - **Palacio Municipal, San Roque (Ant.)** 📠 Código postal - 053030
☎ **Conmutador:** 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: WAG Y VIVENDAS SAS DISTRICCIÓN: BOGOTÁ TPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR FORMA DE PRESENTACIÓN: CLASE APORTANTE APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, EDIA E CIFI (REFORMA TRIESTRATY)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7953185700 TIPO DE PLANILLA: 20 DÍAS DE MADURA: 2020/10/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2020/10/17 FECHA PAGO (autoliquidación)	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 90463360 VAG Y VIVENDAS SAS CARRERA 26 # 1A SUR-455 OF 402 BOGOTÁ CUMPLIMIENTO DE PRESE, PLAZAS (adjudicación) y acciones		DATOS GENERALES DEL APORTANTE MES: 2020 AÑO: 2020 MES: octubre AÑO: 2020	

TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN
2	2	2	2	2	2
TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	

TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN
2	2	2	2	2	2
TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	

TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN
2	2	2	2	2	2
TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	

TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN
2	2	2	2	2	2
TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	

TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN	COSEJO	PROTECCIÓN
2	2	2	2	2	2
TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
\$ 2.230.000		\$ 2.230.000		\$ 2.230.000	

TOTAL PAGADO: \$ 4.828.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900453980
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		VIAS Y VIVIENDAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 25 # 1A SUR -155 OF TELÉFONO:	5017251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - VIAS Y VIVIENDAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7975777701	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1570351381

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 358.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 1.599.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 914.200
SUBTOTAL:			22	\$ 2.872.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	\$ 57.200
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	\$ 61.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 171.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	\$ 171.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	\$ 257.400
SUBTOTAL:			22	\$ 718.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	22	\$ 718.700
SUBTOTAL:			22	\$ 718.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	22	\$ 1.249.600
SUBTOTAL:			22	\$ 1.249.600

TOTAL PAGADO:	\$ 5.559.200
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900453980
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		VIAS Y VIVIENDAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 25 # 1A SUR -155	OF TELÉFONO:	5017251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7953365760	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	20		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1134168465

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 2.568.400
SUBTOTAL:			2	\$ 2.568.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 604.300
SUBTOTAL:			2	\$ 604.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	\$ 604.300
SUBTOTAL:			2	\$ 604.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	\$ 1.051.500
SUBTOTAL:			2	\$ 1.051.500

VALOR SIN MORA:	\$ 4.634.200
VALOR MORA:	\$ 194.300
TOTAL PAGADO:	\$ 4.828.500

Medellín 11 de marzo de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES”.

Yo, **JESUS NOEL FIGUEROA MENA** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.107.831 de Medellín, Antioquia y con Tarjeta Profesional No. 54494-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público y la señora **NORA ELIANA MONTOYA** con cédula de ciudadanía No. 42.691.094 de Medellín, Antioquia y con Tarjeta Profesional No. 153607-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAS Y VIVIENDAS SAS**. Identificada con Nit. No. 900.453.980-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



NORA ELIANA MONTOYA TOBON
Revisora Fiscal - T.P 153607-T



JESUS NOEL FIGUEROA MENA
Contador Publico T.P 54494-T



Dirección: Carrera 51 # 1 - 05 - Medellín, Colombia

Teléfonos: 2859077 / 3136246172 - Email: viasyviviendas@gmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0050708AED187740

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS NOEL FIGUEROA MENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70107831 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 54494-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

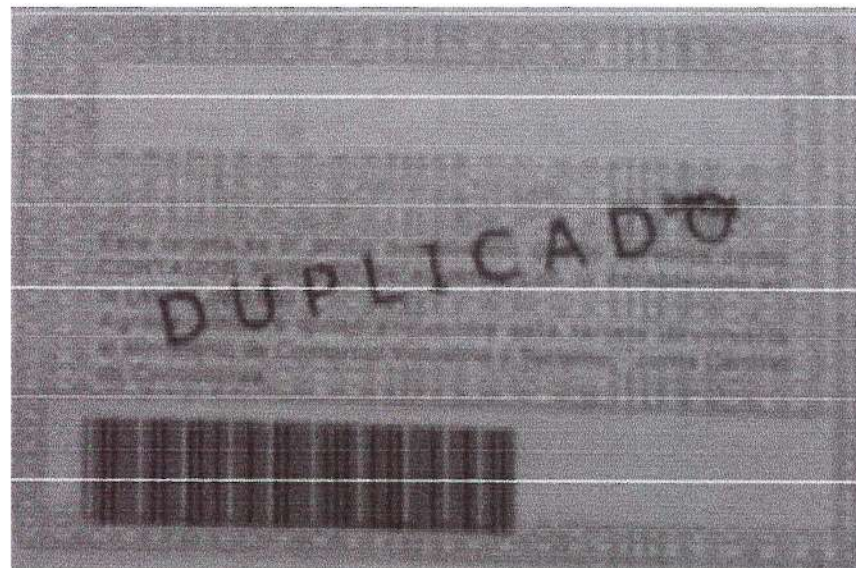
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0070898558A790EF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORA ELIANA MONTOYA TOBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42691094 de COPACABANA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 153607-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO

153607-T

NORA ELIANA
 MONTOYA TORRES
 C.C. 42691094

RESOLUCION INSCRIPCION 313 FECHA 21/10/2010
 UNIVERSIDAD P. C. JAIMÉ ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

263699



Nora Montoya

76982

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
 al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo, Junta Central
 de Contadores.





INFORME DE OBRA CONTRATISTA



	INFORME NO.3	 ALCALDIA DE SAN ROQUE
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA)
NO. CAL-002-2025**

OBJETO: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: ESTANDAR INGENIEROS S.A.S



**FECHA
22 DE OCTUBRE 2025**

**CARRERA 81 N 3ª SUR-16 MEDELLÍN – TELÉFONO 3196071441
CORREO:ESTAINGE@GMAIL.COM**

	INFORME NO.3	 ALCALDIA DE SAN ROQUE
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	UBICACIÓN	4
3	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	5
4	RELACIÓN DE PÓLIZAS	6
5	ACTIVIDADES EJECUTADAS	7
5.1	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SAN JOSE DEL NUS:	7
6	PROGRAMACIÓN	9
7	AVANCE DE FINANCIERO	11
8	PERSONAL	12
9	MAQUINARIA Y EQUIPO	12

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Pólizas del contrato iniciales	6
---	---

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación	4
Ilustración 2. Generalidades del contrato	5

	INFORME NO.3	 
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

1 INTRODUCCIÓN

En el municipio de San Roque Antioquia, el día 7 de mayo de 2025 el alcalde municipal declara mediante el **Decreto Municipal No. 231 situación de calamidad pública**, mediante la cual, por medio de la modalidad de Urgencia manifiesta – calamidad pública, contrató con la empresa Estándar Ingenieros S.A.S la intervención de diferentes puntos que se han visto afectados por las fuertes lluvias, causando aumento en el caudal del afluente principal del municipio, provocando deslizamientos, socavaciones e inundaciones, situación que vulnera la integridad de la comunidad y la infraestructura.

Los puntos críticos que se intervendrán, los cuales han sufrido afectaciones por los eventos climatológicos y geotécnicos ya mencionados son: sector los Alpes, Muro en sector parque ecológico, revestimiento de gavión y reforzamiento de pilar ambos cerca de la Alcaldía municipal, construcción de muro en bolsacreto para el control de erosión, construcción de cárcamo en San José del Nus y por último la intervención con maquinaria amarilla en la quebrada de la vereda La Mora, con el fin de retirar del volumen de tierra que está actualmente obstruyendo el cauce natural del afluente.

En el presente informe, comprende la ejecución física y financiera del proyecto a la fecha, así mismo, se muestran porcentajes de avance en cada una de las actividades, maquinaria y equipo, personal activo en obra, novedades y dificultades presentadas en el desarrollo de las actividades.

	INFORME NO.3	 
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

2 UBICACIÓN

El proyecto está ubicado en el Municipio de San Roque, ubicado en el departamento de Antioquia en la región Nordeste. Limita por el norte con el municipio de Yolombo, por el este municipios de Maceo y Caracolí, por el oeste con Santo Domingo y por el Sur con los municipios de San Carlos, San Rafael y Alejandría.

El municipio posee una extensión total de 441 km², tiene una población de 23.105 habitantes (2025). Su población urbana es de 8.493 habitantes, y la rural de 14.612. Su cabecera dista a 95 kilómetros de la ciudad de Medellín aproximadamente, capital del departamento de Antioquia, su altitud media sobre el nivel del mar es de 1.425 m y la temperatura media anual aproximadamente de 22 °C - 24°C.



Ilustración 1. Ubicación

**CARRERA 81 N 3ª SUR-16 MEDELLÍN – TELÉFONO 3196071441
CORREO:ESTAINGE@GMAIL.COM**

	INFORME NO.3	 
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	CAL-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA. NIT. 890980850-7
CONTRATISTA	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S. NIT 900.615.681-0 representada legalmente por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 71.792.297
MODALIDAD DE SELECCION	REGIMEN ESPECIAL – URGENCIA MANIFIESTA - CALAMIDAD PUBLICA
ETAPA - FASE	CONTRACTUAL – CELEBRACION DEL CONTRATO
SUSTENTO JURIDICO	LEY 1523 DE 2012
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	"INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDañas A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. Por un San Roque agroindustrial competitivo y Ambientalmente sostenible) POAI 2025 (2024056700061)"
PLAZO DEL CONTRATO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
VIGENCIA DEL CONTRATO	DESDE SU CELEBRACION HASTA SU LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$285.000.000)
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005
NUMERO CDP	0000000651

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA NIT: 890.980.850-7
CONTRATISTA	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT:900.615.681-0
SECRETARÍA OBRAS PUBLICAS	CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR CONVENIO

Ilustración 2. Generalidades del contrato

**CARRERA 81 N 3ª SUR-16 MEDELLÍN – TELÉFONO 3196071441
CORREO:ESTAINGE@GMAIL.COM**

	INFORME NO.3	
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

4 RELACIÓN DE PÓLIZAS

Información sobre las pólizas de seguro de Cumplimiento entidad estatal No. 65-44-101241086 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extra contractual No. 65-40-101082936, expedidas ambas por SEGUROS DEL ESTADO S.A. se encuentran vigentes y actualizadas a la fecha del contrato. A continuación, se presenta el resumen de pólizas:

Tabla 1. Pólizas del contrato iniciales

ANEXO.0							
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO							
PÓLIZA No: 65-44-101241086							
Cumplimiento	85.000.000	16	07	2025	16	02	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	57.000.000	16	07	2025	16	10	2028
Estabilidad y calidad de la obra	85.500.000	** 5 años a partir de fecha de suscripción del acta de recibo y entrega por parte de la entidad contratante					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL							
PÓLIZA No: 65-40-101082936							
Predios, labores y operaciones	284.700.000	16	07	2025	16	10	2025
Daños emergentes y lucro cesante	284.700.000	16	07	2025	16	10	2025
Perjuicios extrapatrimoniales	284.700.000	16	07	2025	16	10	2025

	INFORME NO.3		 
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025		

5 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de avance final comprende las actividades desarrolladas por Estándar Ingenieros S.A.S, este se elabora como complemento al Informe correspondiente al Acta N° 2, en atención a los requerimientos realizados por el DAGRAN y el Municipio de San Roque, específicamente en lo relacionado con el Capítulo 6, ítem 1.17.

Durante el proceso de revisión técnica se evidenció que las especificaciones inicialmente contratadas no garantizaban las condiciones óptimas de resistencia, calidad y durabilidad requeridas para soportar el tránsito pesado que actualmente presenta la vía intervenida. El diseño constructivo inicial no contemplaba cargas dinámicas ni solicitaciones estructurales acordes con las condiciones reales de operación de la vía, lo cual podría comprometer el desempeño y la vida útil de la estructura.

En razón de lo anterior, se procedió a modificar las especificaciones técnicas inicialmente establecidas, reforzando las condiciones estructurales mediante la incorporación de un nuevo ítem que cumple con los parámetros técnicos necesarios para garantizar mayor capacidad portante, estabilidad y durabilidad frente a las cargas vehiculares pesadas.

Con esta actualización se da cumplimiento a las observaciones efectuadas y se asegura que la obra cumpla con los estándares técnicos exigidos, garantizando así su adecuado funcionamiento y sostenibilidad en el tiempo.

Dentro de las actividades ejecutadas se han realizado las siguientes:

5.1 CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SAN JOSE DEL NUS:



**CARRERA 81 N 3ª SUR-16 MEDELLÍN – TELÉFONO 3196071441
CORREO:ESTAINGE@GMAIL.COM**



Ilustración 3. Construcción de cárcamo con reja metálica en platina 2" X 3/8"

	<p align="center">INFORME NO.3</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025</p>	
---	--	---

6 PROGRAMACIÓN

A continuación, se presenta la programación general de la obra actualizada:

Nota: se anexa programación en Project

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ago '25	sep '25	oct '25	nov
1	INICIO	0 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25																							
2	MURO REFORZADO SECTOR PARQUE ECOLOGICO	45 días	mar 22/07/25	jun 22/08/25																							
3	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO 1000 Ø+2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	7 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25																							
28	DEMOLICIÓN DE CONCRETO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	2 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25																							
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE GRANULAR TIPO A/VIAS	5 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25																							
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 22 MPa - (1000 PSI), PARA VIGA CAJETAL	7 días	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 22 MPa - (1000 PSI), VASTAGO	10 días	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
32	CONSTRUCCIÓN DE PLOTES DE BOTA DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4m, EN CONCRETO 22 MPa - (1000 PSI), DISTANCIADOS A UNA VEZ ENTRE UNO Y OTRO, TIPO 3 BOLLEROS, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 8 VARIAS	5 días	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ARMAZO DE ACERO DE REFUERZO 8000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CAJETAL Y	15 días	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
34	CONSTRUCCIÓN DE Muro tipo francés con material triturado 5/16" de 0.400 Acm, en gachala 17' 1000, incluye: 1) malla de estabilización de la pantalla del muro con 160 Barbas unidas	5 días	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
35	Suministro e instalación de gachala 17' 1000	2 días	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
36	Colocación de concreto de 14 Mpa para solado con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye aceros internos	1 día	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
37	Colocación de concreto de 21 Mpa para ajuste de placa con un espesor de 0.10 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye aceros	4 días	jun 02/08/25	jun 02/08/25																							
75	MURO REFORZADO SECTOR LOS ALPES	32 días	mar 22/07/25	may 30/08/25																							
76	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO 1000 Ø+2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	5 días	mar 22/07/25	jun 02/08/25																							
77	DEMOLICIÓN DE CONCRETO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	1 día	mar 22/07/25	mar 22/07/25																							

Página 1

	INFORME NO.3	
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

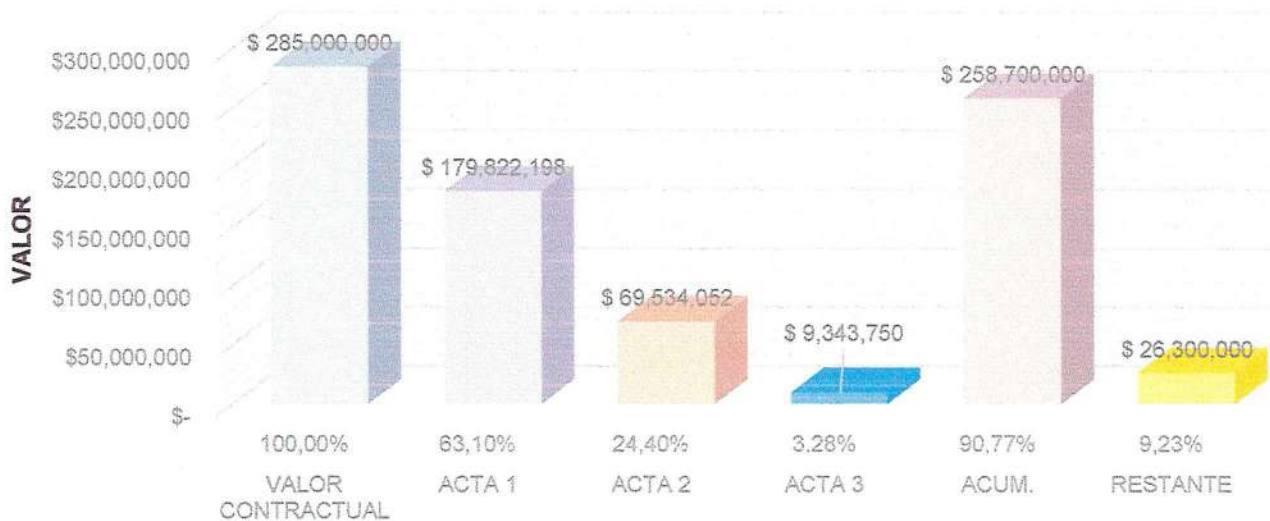
7 AVANCE DE FINANCIERO

A continuación, se presentan los valores parciales de las actas de obra:

Descripción	Valor	Ejecutado (%)	Acumulado (%)
Valor del contrato	\$285,000,000		
Valor de pago anticipado	\$85,500,000	30,00%	30,00%
Valor total acta no.1	\$ 179.822.198	63,10%	63,10%
Valor total acta no.2	\$ 69.534.052	24,40%	87,49%
Valor total acta no.3	\$ 9.343.750	3,28%	90,77%
Saldo por ejecutar	\$ 26.300.000	9,23%	

Resumen Acta No. 3	
Valor total	\$ 9.343.750
Costo directo	\$ 7.187.500
Administración	\$ 1.796.875
Utilidad	\$ 359.375
Valor a pagar acta No.3	\$ 9.343.750

RELACIÓN FINANCIERA



CARRERA 81 N 3ª SUR-16 MEDELLÍN – TELÉFONO 3196071441
CORREO:ESTAINGE@GMAIL.COM

	INFORME NO.3	 ALCALDIA DE SAN ROQUE
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) NO. CAL-002-2025	

8 PERSONAL

Personal administrativo:

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Jairo Alejandro Quiroz	98664500	Residente de obra
2	Mateo Aguas Berrio	1003308236	Aux. Residente

9 MAQUINARIA Y EQUIPO

Los equipos necesarios para la ejecución de las actividades en obra son los siguiente:

EQUIPO	CANTIDAD
Pulidora 9"	1
Radial	1
Vibrador concreto	1
Taladro eléctrico	1
Herramienta menor	Si



JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DE ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S
Cédula de Ciudadanía: 71.792.297

**CARRERA 81 N 3ª SUR-16 MEDELLÍN – TELÉFONO 3196071441
CORREO:ESTAINGE@GMAIL.COM**



CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - **Palacio Municipal, San Roque** (Ant.) 📮 Código postal - 053030
☎ **Conmutador:** 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co



retera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia. C.P

Tel/Fax: 7426350

ENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
RROS MADEBELLO	9007726473/10	PDOC18M2	11106697/000010	NTC 2289	14.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLAD	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%)												
				Ensayo según método ASTM E415												
				A												
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E..	
				0,27	1,04	0,011	0,026	0,16	0,22	0,13	0,12	0,04	0,003	0,002	0,47	
200459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727153401	GR 60	Rangos de referencia según norma												máx 0,5500
				máx 0,3000% máx 1,5000% máx 0,0350% máx 0,0160% máx 0,5000%												

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLAD	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
		A		Ensayo según método NTC3353										
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F.	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Allura	Separa	Ángulo	
				477	622	1,31	19,5	2,141	OK	12,90	1,26	3,35	63	
200459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727153401	6											
Rangos de referencia según norma				420.0 - 540.0 MPa	mín 550.0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm	mín 45,0 deg	

[illegible]



REPORTE DE ENSAYOS

CO S.A.

telera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia, C.P

0408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131645144

ENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
RROS MADEBELLO	9007726473/20	PDOC18M2	11106697/000020	NTC 2289	20.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLAD	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%)											
A				Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1727117301	GR 60	0,28	1,00	0,019	0,016	0,14	0,31	0,19	0,23	0,06	0,003	0,002	0,49
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLAD	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS					
A				Ensayo según método NTC3353											
000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1727117301	6	R. Fluencia	R. Tracción	R. T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Angulo		
Rangos de referencia según norma				477	635	1,34	17,1	2,146	OK	13,00	1,21	4,25	62		
				MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 12,00%	min 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm	min 45,0 deg		

ERVACIONES	RESPONSABLE DE CALIDAD
garantiza por mediciones que el producto está libre de floculidad.	TUTA. 27.10.2025 PAOLA KATHERIN MATEUS

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia, C.P
- 250058 Telf: 3118760266

Nº: 10016131691494

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
HIERROS MADEBELLO	9007764541/180	PDFEB4	11144396/000180	NTC 2289	33.073

MATERIAL	PRODUCTO	LOT/ECOLAD	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%)											
A				Ensayo según método ASTM E415											
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727308701	GR 60	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727311001	GR 60	0.27	1.01	0.009	0.019	0.19	0.17	0.09	0.08	0.03	0.002	0.038	0.45
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727335101	GR 60	0.27	0.98	0.013	0.030	0.13	0.25	0.13	0.13	0.03	0.002	0.040	0.45
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727335101	GR 60	0.29	0.96	0.011	0.019	0.19	0.27	0.12	0.18	0.03	0.002	0.035	0.48
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727358701	GR 60	0.29	1.01	0.012	0.037	0.18	0.21	0.13	0.12	0.03	0.002	0.038	0.47
Rangos de referencia según norma				max 0.3403%	max 1.3053	max 0.0350%	max 0.0453%	max 0.4003%							max 0.550

MATERIAL	PRODUCTO	LOT/ECOLAD	DESIG	PROPIEDADES MECANICAS						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
A				Ensayo según método NTC3363										
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727308701	4	R Fluencia	R Tracción	R T/R F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Especi	Alura	Sepera	Angulo	
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727311001	4	474	949	1.37	16.6	0.806	OK	8.50	0.78	3.48	52	
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727335101	4	458	937	1.39	16.2	0.959	OK	8.57	0.93	3.16	51	
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727335101	4	486	896	1.43	14.7	0.952	OK	8.50	0.66	3.17	54	
108000275	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727358701	4	462	874	1.45	15.0	0.954	OK	8.50	0.88	3.11	54	
Rangos de referencia según norma				420.0 - 540.0 MPa	710.500 MPa	min 1.200	min 14.00%	min 0.834 kg/m		max 8.93 mm	min 0.51 mm	max 4.20 mm	45.0 - 70.0 grs	

OBSERVACIONES
Se garantiza por medio de estos que el producto está libre de cualquier defecto.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATE 10.02.2026

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS



relera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia. C.F.

0408 Tel/Fax: 7426350

MATERIAL		PRODUCTO		LOTE/COLAD		GRADO		COMPOSICION QUIMICA (%)											
								A											
								Ensayo según método ASTM E415											
		C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.						
		0,29	1,08	0,013	0,025	0,16	0,25	0,11	0,13	0,02	0,003	0,002	0,49						
100153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1727154501	GR 60	Rangos de referencia según norma										máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%	máx 0,550

EXPLICACIONES: garantiza por mediciones que el producto está libre de contaminación.	RESPONSABLE DE CALIDAD TUTA. 27.10.2025
---	---

PAOLA KATHERIN MATEUS



PRODUCTO
SOLDADURA STICK 7018 * 1/8" CNC

REFERENCIA
E7018 CNC

DESCRIPCION

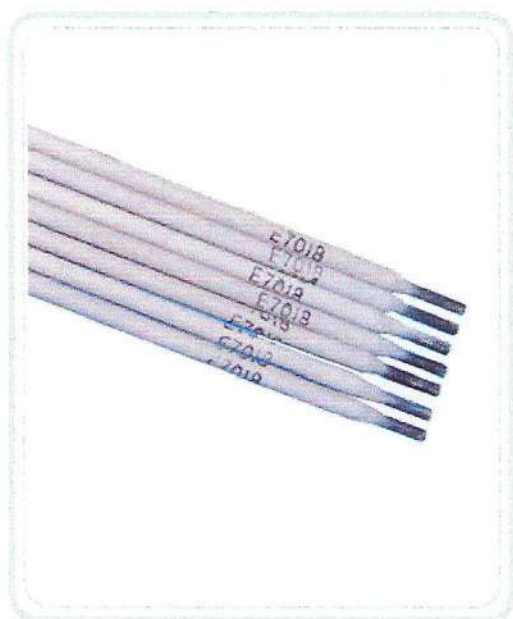
E7018 Es un electrodo de bajo hidrógeno aplicable en todas las posiciones de soldadura.

CARACTERISTICAS

- Su amplio rango de operación y su suave transferencia del metal de soldadura facilita la limpieza posterior a la aplicación.
- Su depósito de soldadura de alta calidad cumple los requisitos de múltiples códigos y especificaciones.
- El electrodo está desarrollado para la soldadura de aceros al carbono y de baja aleación de propiedades mecánicas compatibles.

APLICACIONES

Estructural, construcción y reparación naval, vagones de ferrocarril, tuberías, accesorios de recipientes a presión, calderas de acero galvanizado, fabricación general.





INFORMACION TECNICA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C	Mn	P	S	Si
0.08%	1.19%	0.017%	0.009%	0.46%

Propiedades Típicas de Tensión

Alargamiento	Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción
29%	Como Soldado	476 MPa (69 ksi)	538 MPa (78 ksi)

Prueba de Impacto (Como Soldado)

Valor de impacto	120 J	Grado	E7018
Temperatura de prueba	-30 °C	Nombre	AWSA5.1 / ASME SFA-5.

Depósito

Corriente	100-145 A
Diámetro	3.2 mm (1/8")

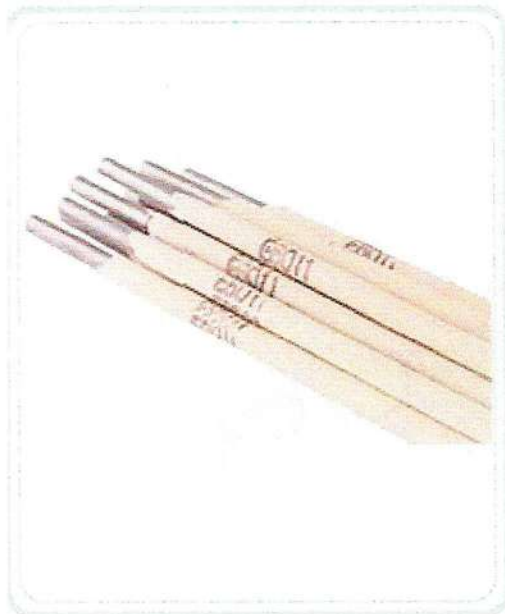


PRODUCTO
SOLDADURA STICK 6011 * 1/8 CNC

REFERENCIA
E6011 CNC

DESCRIPCION

Este electrodo se caracteriza por su operación suave, manteniendo muy buena penetración debido a su revestimiento celulósico. Presenta bajas pérdidas por chisporroteo.



CARACTERISTICAS

- Se usa con corriente directa cuando se requiere obtener la mayor suavidad y el mínimo de chisporroteo característicos del electrodo.
- Adecuado para soldar lámina galvanizada.

APLICACIONES

Se emplea para soldar todo tipo de aceros de bajo carbono en tuberías, estructuras, construcciones navales, recipientes a presión, etc., especialmente en pases de penetración cuando no se utiliza platina de respaldo y en filetes en donde no se dispone de equipos rectificadores.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

- Trabaja con corriente alterna y continua, electrodo positivo (+).
- Electrodo con diámetro hasta 4.8 mm (3/16") operan en todas las posiciones.
- Lleve un arco de mediana longitud.



INFORMACION TECNICA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C	Mn	P	S	Si
0.14%	0.42%	0.019%	0.010%	0.16%

Propiedades Típicas de Tensión

Alargamiento	Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción
28%	Como Soldado	393N/mm**2 (57ksi)	483 N/mm**2 (70ksi)

Prueba de Impacto (Como Soldado)

Clasificaciones

Valor de impacto	45 J	Grado	E6011
temperatura de prueba	-29 °C	Nombre	AWSA5.1 / ASME SFA-5.

Depósito

Corriente	80-115 A
Diámetro	3.2 mm (1/8")



PAZ Y SALVO TRABAJADORES Y PROVEEDORES



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - **Palacio Municipal, San Roque** (Ant.) 📠 Código postal - 053030
☎ **Conmutador:** 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co



PAZ Y SALVO

FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR

NIT: 901047310-1

Dirección: CL 21 18 14 - SAN ROQUE

Teléfono: 3117205252

Fecha: 22 de octubre de 2025

Por medio del presente documento, la empresa **FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR** certifica que el contratista **VIAS Y VIVIENDAS S.A.S.**, identificado con NIT 900453980-1, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de los servicios que corresponde al suministro de materiales necesarios para la ejecución de obras civiles, correspondientes a la ejecución del:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PÚBLICA)

No. CAL-002-2025

Se deja constancia de que, a la fecha de expedición del presente documento, no existe deuda pendiente ni obligación económica por parte del contratista con esta ferretería, derivada de los servicios anteriormente mencionados.

El presente paz y salvo se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Cordialmente,

Firma

Jhonatan Andrés Ossa Sosa

Identificación: 1037499912

Cargo: Representante Legal

FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR

PAZ Y SALVO

VÍAS & VIVIENDAS S.A.S con NIT: 900.453.980-1, certifica que la empresa **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S** con NIT 900.615.981-0, se encuentra a paz y salvo por todo concepto del CONTRATO DE MANO DE OBRA No. 2025 – 0001, cuyo objeto: "Contratación de mano de obra de las actividades: obras de contención en el municipio de San Roque – Antioquia, incluyendo muros en concreto armado, muros en bolsacretos, revestimientos de gaviones y repotenciación de pilar existente de puente peatonal, así como las obras complementarias como vaciado de pisos duros, construcción de filtros y/o cunetas, conformación y compactación de llenos."

Para constancia, se firma el presente documento en señal de aceptación a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2025



RAÚL ANDRÉS MIRA PEÑA

C.C. No. 71.380.228

VÍAS & VIVIENDAS S.A.S.

PAZ Y SALVO

Yo JORGE VALENCIA, identificado(a) con identificación número 11.809.211 expreso estar en paz y salvo con la empresa ESTANDAR INGENIEROS S.A.S con NIT 900615681-0 por todo concepto laboral y monetario en cuanto a nómina y prestaciones sociales.

En el contrato de obra publica URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) No. CAL-002-2025

El presente certificado se expide el jueves, 30 de octubre 2025

Atentamente,



C.C. 11.809.211



HUELLA

PAZ Y SALVO

Yo LUIS SABALA, identificado(a) con identificación número 98,458,590 expreso estar en paz y salvo con la empresa ESTANDAR INGENIEROS S.A.S con NIT 900615681-0 por todo concepto laboral y monetario en cuanto a nómina y prestaciones sociales.

En el contrato de obra publica URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) No. CAL-002-2025

El presente certificado se expide el jueves, 30 de octubre 2025

Atentamente,

LUIS ZALGIA
C.C. 98,458,590



HUELLA

PAZ Y SALVO

Yo GABRIEL RENGIFO, identificado(a) con identificación número 16,345,808,365 expreso estar en paz y salvo con la empresa ESTANDAR INGENIEROS S.A.S con NIT 900615681-0 por todo concepto laboral y monetario en cuanto a nómina y prestaciones sociales.

En el contrato de obra publica URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) No. CAL-002-2025

El presente certificado se expide el jueves, 30 de octubre 2025

Atentamente,



C.C 16,345,808,365



HUELLA

PAZ Y SALVO

Yo HERNAN JOSE OROZCO, identificado(a) con identificación número 7,598,252 expreso estar en paz y salvo con la empresa ESTANDAR INGENIEROS S.A.S con NIT 900615681-0 por todo concepto laboral y monetario en cuanto a nómina y prestaciones sociales.

En el contrato de obra publica URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) No. CAL-002-2025

El presente certificado se expide el jueves, 30 de octubre 2025

Atentamente,

Hernan orozco
C.C. 7,598,252



HUELLA

PAZ Y SALVO

Yo PEDRO LUIS DE HOYOS MORELO, identificado(a) con identificación número 1,067,161,039 expreso estar en paz y salvo con la empresa ESTANDAR INGENIEROS S.A.S con NIT 900615681-0 por todo concepto laboral y monetario en cuanto a nómina y prestaciones sociales.

En el contrato de obra publica URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) No. CAL-002-2025

El presente certificado se expide el jueves, 30 de octubre 2025

Atentamente,



C.C. 1,067,161,039



PAZ Y SALVO

Yo CARLOS JULIO HERNANDEZ ZABALA, identificado(a) con identificación número 1,002,497,406 expreso estar en paz y salvo con la empresa ESTANDAR INGENIEROS S.A.S con NIT 900615681-0 por todo concepto laboral y monetario en cuanto a nómina y prestaciones sociales.

En el contrato de obra publica URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) No. CAL-002-2025

El presente certificado se expide el jueves, 30 de octubre de 2025

Atentamente,

Carlos JH
C.C. 1,002,497,406



HUELLA


PAZ Y SALVO

Yo MATEO AGUAS BERRIO, identificado(a) con identificación número 1.003.308.236 expreso estar en paz y salvo con la empresa ESTANDAR INGENIEROS S.A.S con NIT 900615681-0 por todo concepto laboral y monetario en cuanto a nómina y prestaciones sociales.

En el contrato de obra publica URGENCIA MANIFIESTA (CALAMIDAD PUBLICA) No. CAL-002-2025

El presente certificado se expide el jueves, 30 de octubre de 2025

Atentamente,


C.C. 1.003.308.236



HUELLA



PÓLIZAS FINALES



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - **Palacio Municipal, San Roque (Ant.)** 📠 Código postal - 053030
☎ **Conmutador:** 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-44-101241198	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 03 2026	22 07 2025		00:00	22 02 2031		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTANDAR INGENIEROS S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.615.621-0
DIRECCIÓN: CL 32 A NRO. 72 A - 49	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA
	TELÉFONO: 2657315

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN ROQUE	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.850-7
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 20 - 59	CIUDAD: SAN ROQUE, ANTIOQUIA
	TELÉFONO 8656755
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.CAL-002-2025, RELACIONADO CON: INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HIDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VIAS TERCARIAS, PERDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTAMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/07/2025	22/02/2026	\$85,500,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/07/2025	22/10/2028	\$57,000,000.00	
PAGO ANTICIPADO	12/08/2025	22/02/2026	\$85,500,000.00	\$85,500,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$85,500,000.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL SE ESTABLECE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE EL 22/10/2025 HASTA EL 22/10/2030

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****313,500,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA MAGDALENA ARIAS HIGUITA	71575	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101241198

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF071575A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.POLIZA 65-44-101241198	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 03 2026	22 07 2025		00:00	22 02 2031		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTANDAR INGENIEROS S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.615.681-0
DIRECCIÓN: CL 32 A NRO. 72 A - 49	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA
	TELÉFONO: 2657315

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN ROQUE	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.850-7
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 20 - 59	CIUDAD: SAN ROQUE, ANTIOQUIA
	TELÉFONO: 8656755

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona
el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****313,500,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA MAGDALENA ARIAS HIGUITA	71575	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELÉFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101241198		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
10 03 2026			22 07 2025			00:00	22 02 2031			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTANDAR INGENIEROS S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.615.681-0			
DIRECCIÓN: CL 32 A NRO. 72 A - 49						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 2657315		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN ROQUE								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.850-7			
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 20 - 59						CIUDAD: SAN ROQUE, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 8656755		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELÉFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101241198

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF071575A

2



ACTA DE TERMINACION DE OBRA



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - **Palacio Municipal, San Roque (Ant.)** 📮 Código postal - 053030
☎ **Conmutador:** 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co

	Documento	Acta de Terminación Bilateral	Código	F-GC-ACT-11
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 4

ACTA RECIBO Y DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO

Entre los suscritos a saber **LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO**, con cédula de ciudadanía número **1.037.594.374**, quien actúa en nombre y representación del **Municipio de San Roque - Antioquia**, con NIT 890.910.913-3, en su calidad de **ALCALDE**, facultado para firmar Convenios y mediante Acuerdo Municipal 01 del 19 de enero de 2016 y en concordancia con el art. 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, quien para los efectos del presente se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte, y de la otra parte, **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, obrando en nombre propio; quien para los efectos de la presente **ACTA** se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA DE TERMINACION BILATERAL** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025 CAL No 002-2025**

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **Municipio de San Roque – Antioquia** y **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297; obrando en nombre propio, se celebró el siguiente **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025 CAL No 002-2025**:

NUMERO DEL CONTRATO	CAL 002-2025
CONVENIENTE-MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIQUIA NIT 890980850-7
CONVENIENTE-ASOCIACION	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0 representada legalmente Por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO , identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	REGIMEN ESPECIAL-URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)".
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML, (\$285.000.000).
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000000887 del 15 de Julio de 2025

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Terminación Bilateral	Código	F-GC-ACT-11
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	2 de 4

SUPERVISOR		SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA -CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN		
VALOR DEL CONVENIO	VALOR INICIAL	ADICION AL VALOR		
	\$ 285.000.000	No.	TIEMPO	VALOR
PLAZO:	INICIAL	No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO	1	22/07/2025	22/10/2025
		ADICION AL PLAZO		
		No.	TIEMPO ADICIONADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	HISTORICO DE SUSPENSIONES:		NA	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		22/10/2025		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			Si	
% DE EJECUCION FISICA			90.77%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS			90.77%	

- Que el plazo de la ejecución del contrato se encuentra vencido.
- Que las partes el día veintidós (22) de octubre de 2025, de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relación contractual.
- Que, una vez revisada las actividades ejecutadas, se deja constancia del cumplimiento de las especificaciones objeto del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025**. En consecuencia, se recibe a entera satisfacción por parte del supervisor de la obra.
- Que el recibo de los trabajos terminados no exime al **CONTRATISTA** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025** de su responsabilidad civil por los trabajos ejecutados, obligaciones descritas en el convenio o de aquellas aplicables según la norma vigente.
- El Contratista del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025** CAL No 002-2025, garantiza la responsabilidad ante los trabajadores y subcontratistas que tuvo en la ejecución del presente Convenio por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
- Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente **TERMINAR BILATERALMENTE** el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA- URGENCIA MANIFIESTA CAL**

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Terminación Bilateral	Código	F-GC-ACT-11
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	3 de 4

No 002-2025, cuyo objeto es: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)".

8. **EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025 CAL No 002-2025**, estuvo amparado por póliza de garantía.


En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:


PRIMERO: Dar por **TERMINADO BILATERALMENTE** el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025 CAL No 002-2025**, cuyo objeto es: "INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)"; **según las consideraciones de la presente acta.**

SEGUNDO: Líquidese el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - URGENCIA MANIFIESTA CAL No 002-2025 CAL No 002-2025** en el estado de ejecución en que se encuentre.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque el día veintidós (22) del mes de octubre de 2025.


LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
 ALCALDE MUNICIPAL


JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
 Representante Legal
 ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S


CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUÍN
 Supervisor
 V.Bno
 Coadyuvo



ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - **Palacio Municipal, San Roque (Ant.)** 📠 Código postal - 053030
☎ **Conmutador:** 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 17

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

Entre los suscritos a saber **LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO**, con cédula de ciudadanía número **1.037.594.374**, quien actúa en nombre y representación del **Municipio de San Roque - Antioquia**, con NIT 890.910.913-3, en su calidad de **ALCALDE**, facultado para firmar Convenios y mediante Acuerdo Municipal 01 del 19 de enero de 2016 y en concordancia con el art. 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, quien para los efectos del presente se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte, **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 9.861.586, quien funge como **SUPERVISOR** de **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025** y de la otra parte **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, obrando en nombre propio, quien para los efectos de la presente ACTA se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL** del **ACTA DE TERMINACION BILATERAL** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**:

NUMERO DEL CONTRATO	CAL 002-2025
CONVENIENTE-MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIQUIA NIT 890980850-7
CONVENIENTE-ASOCIACION	ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0 representada legalmente Por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO , identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	REGIMEN ESPECIAL-URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCIARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)".
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML, (\$285.000.000).
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000000651
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA -CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	2 de 17

VALOR DEL CONVENIO	VALOR INICIAL	ADICION AL VALOR		
	\$ 285.000.000	No.	TIEMPO	VALOR
PLAZO:	INICIAL	No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO	1	22/07/2025	22/10/2025
		ADICION AL PLAZO		
		No.	TIEMPO ADICIONADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		NA		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		22/10/2025		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			sí	
% DE EJECUCION FISICA			90.77%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS			90.77%	

ASPECTOS GENERALES:

- Que entre **LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO** identificado con cedula de ciudadanía 1.037.954.374 Representante Legal del **MUNICIPIO DE SAN ROQUE** identificado con NIT: 890.980.850-7 quien funge como **CONTRATANTE**, **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 9.861.586, quien funge como **SUPERVISOR** de **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025** y la **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, obrando en nombre propio, se celebró el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025, cuyo objeto es INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A CORRIENTES HÍDRICAS Y ÁREAS AFECTADAS POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA Y GESTIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (VÍAS TERCARIAS, PÉRDIDA DE BANCAS) EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA (1. POR UN SAN ROQUE AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE) POAI 2025 (2024056700061)".**
- Que el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, fue por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 285.000.000 COP)**. INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR.



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	3 de 17

- Que el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, tiene un plazo de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO**, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, y con fecha de terminación del 22 de octubre de 2025.
- Que el Registro Presupuestal No. 00000887 fue expedido el quince (15) julio de 2025; el contrato fue celebrado por las partes en la misma fecha y el contratista aportó la documentación requerida. En consecuencia, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento necesarios para la ejecución del contrato.
- Que, de acuerdo con el clausulado del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, la cual se suscribió el 22 de julio de 2025, quedando como fecha de terminación inicial el 22 de octubre de 2025.

II. ASPECTOS TÉCNICOS:

- Que la **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, según el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, se obligó a:

ITEM	DESCRIPCION	OBRA CONTRACTUAL			
		UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1. MURO REFORZADO SECTOR PARQUE ECOLOGICO					\$ 47.352.472,56
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	M3	9,00	\$ 85.000,00	\$ 765.000,00
1,2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	M3	1,60	\$ 150.000,00	\$ 240.000,00
1,3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	M3	24,00	\$ 76.096,00	\$ 1.826.304,00
1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS.	M3	1,20	\$ 146.638,00	\$ 175.965,60
1,5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), PARA VIGA CABEZAL	M3	1,92	\$ 800.788,00	\$ 1.537.512,96
1,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), VASTAGO	M3	9,60	\$ 1.200.000,00	\$ 11.520.000,00
1,7	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE 30CM DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE	ML	34,00	\$ 345.000,00	\$ 11.730.000,00

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	4 de 17

	4m, EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), DISTANCIADOS A 1M A EJE ENTRE UNO Y OTRO, TIPO 3 BOLILLOS , INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS LONGITUDINALES No4 Y ESTRIBOS EN ACERO No 3 CADA 30cm, y CONCRETO DE 21mpa				
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109, O FABRICADO EN OBRA	ML	50,00	\$ 55.095,00	\$ 2.754.750,00
1,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CABEZAL Y VASTAGO	KG	1540,00	\$ 10.911,00	\$ 16.802.940,00
2. MURO REFORZADO SECTOR LOS ALPES					\$ 83.268.591,44
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	M3	28,80	\$ 85.000,00	\$ 2.448.000,00
1,2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	M3	2,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
1,3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	M3	86,40	\$ 76.096,00	\$ 6.574.694,40
1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR TIPO INVIAS.	M3	14,40	\$ 146.638,00	\$ 2.111.587,20
1,5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), PARA VIGA CABEZAL	M3	2,88	\$ 800.788,00	\$ 2.306.269,44
1,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), VASTAGO	M3	14,40	\$ 1.200.000,00	\$ 17.280.000,00
1,7	CONSTRUCCIÓN DE PIOTES DE 30CM DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4m, EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), DISTANCIADOS A 1,5M A EJE ENTRE UNO Y OTRO, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS LONGITUDINALES No4 Y ESTRIBOS EN ACERO No 3 CADA 30cm, y CONCRETO DE 21mpa	ML	32,00	\$ 345.000,00	\$ 11.040.000,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	50,00	\$ 55.095,00	\$ 2.754.750,00

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	5 de 17

1,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CABEZAL Y VASTAGO	KG	2419,20	\$ 10.911,00	\$ 26.395.891,20
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (TRITURADO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	M3	10,80	\$ 264.574,00	\$ 2.857.399,20
1,11	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NOINCLUYE REJA O TAPA	ML	8,00	\$ 450.000,00	\$ 3.600.000,00
1,12	RECONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PERDIDA POR COLAPSO DEL MURO, 3M DE ANCHO, INCLUYE CONCRETO 21MPA, ACERO, PARA RIEL DE 90CM, ENTRE HUELLA 90CM, Y SOBREALCHO EN PIEDRA PEGADA 1,2M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	12,00	\$ 350.000,00	\$ 4.200.000,00
1,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36", POR PERDIDA DE BANCA EN COLAPSO DE MURO	ML	4,00	\$ 350.000,00	\$ 1.400.000,00
3.RECALZADO DE GAVIÓN EN CONCRETO					\$ 4.250.000,00
1,14	REPARACIÓN DE GAVIÓN, CON CONCRETO CICLOPEO (60%CONCRETO 21MPA, 40% PIEDRA DE CANTO), INCUYE RETIRO DE PIEDRA GAVIÓN ACTUAL, DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DE 5CM, FORMALETEADO Y VACIADO GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS ACTUALES	M3	5,00	\$ 850.000,00	\$ 4.250.000,00
4.RECLAZADO DE PILAR DE PUENTE					\$ 14.625.000,00
1,15	REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RECALZADO EN CONCRETO DE 28MPA Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE , PARA PROTECCIÓN DE CIMENTACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE, INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS, DEMOLICIÓN CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M3	9,75	\$ 1.500.000,00	\$ 14.625.000,00

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	6 de 17

5.CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS					\$ 42.317.000,00
1,16	CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS DE 1M DE ALTO, 0,7M DE ESPESOR, PARA CONTROL DE LOS DIFERENTES PROCESOS EROSIVOS ACTIVADOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ROQUE	M	91,99	\$ 460.000,00	\$ 42.317.000,00
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	m3		\$ 85.000,00	
1.3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	m2		\$ 76.096,00	
6.CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SAN JOSE DEL NUS					\$ 8.186.936,00
1,17	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE REJA EN ACERO CUADRADO O REDONDO EN 7/8", CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRLANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M	13,10	\$ 625.000,00	\$ 8.186.936,00
7.HORAS MAQUINARIA					\$ 19.230.769,23
1,18	RETROEXCAVADORA DE ORUGA TIPO 120, INCLUYE TRANSPORTE CAMA BAJA	HORA	40,00	\$ 188.000,00	\$ 7.520.000,00
1,19	RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS	HORA	30,00	\$ 120.000,00	\$ 3.600.000,00
1,20	VOLQUETA	DIA	9,00	\$ 901.196,58	\$ 8.110.769,23
	COSTO DIRECTO				\$ 219.230.769
	ADMINISTRACION		A	25%	\$ 54.807.692
	UTILIDAD		U	5%	\$ 10.961.538
	TOTAL (COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO A)				\$ 285.000.000

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	7 de 17

2. Que el estado final de las actividades del el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, celebrado por el Municipio de San Roque y **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadania No 71.792.297, obrando en nombre propio, fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	OBRA CONTRACTUAL		EJECUCION ACUMULADA	
		UND	VR. UNITARIO	CANT	VR.TOTAL
1. MURO REFORZADO SECTOR PARQUE ECOLOGICO					\$ 41.883.315
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	M3	\$ 85.000,00	32,22	\$ 2.738.700
1,2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	M3	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0
1,3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	M3	\$ 76.096,00	0,00	\$ 0
1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR TIPO INVIAS.	M3	\$ 146.638,00	17,50	\$ 2.566.165
1,5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), PARA VIGA CABEZAL	M3	\$ 800.788,00	5,59	\$ 4.476.405
1,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), VASTAGO	M3	\$ 1.200.000,00	9,04	\$ 10.848.000
1,7	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE 30CM DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4m, EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), DISTANCIADOS A 1M A EJE ENTRE UNO Y OTRO, TIPO 3 BOLILLOS , INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS LONGITUDINALES No4 Y ESTRIBOS EN ACERO No 3 CADA 30cm, y CONCRETO DE 21mpa	ML	\$ 345.000,00	27,00	\$ 9.315.000

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	8 de 17

1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109, O FABRICADO EN OBRA	ML	\$ 55.095,00	0,00	\$ 0
1,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CABEZAL Y VASTAGO	KG	\$ 10.911,00	868,55	\$ 9.476.749
OE.1	Construcción de filtro tipo francés con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600. Incluye: imprimación e impermeabilización de la pantalla del muro con Igol Denso o similar.	m	\$ 157.392	8,10	\$ 1.274.878
OE.2	Suministro e instalación de geotextil NT 1600	m2	\$ 15.137	22,07	\$ 334.078
OE.3	Colocación de concreto de 14 Mpa para solado con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno	m2	\$ 28.377	12,15	\$ 344.785
OE.7	Colocación de concreto de 21 Mpa para ajuste de placa con un espesor de 0.10 cm. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno	m2	\$ 69.761	7,29	\$ 508.556
2. MURO REFORZADO SECTOR LOS ALPES					\$ 51.838.339,72
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	M3	\$ 85.000,00	35,48	\$ 3.015.800
1,2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	M3	\$ 150.000,00	2,39	\$ 358.500
1,3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	M3	\$ 76.096,00	0,00	\$ 0

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	9 de 17

1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS.	M3	\$ 146.638,00	24,52	\$ 3.595.564
1,5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), PARA VIGA CABEZAL	M3	\$ 800.788,00	8,48	\$ 6.790.682
1,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 28 MPa - (4000 PSI), VASTAGO	M3	\$ 1.200.000,00	9,14	\$ 10.968.000
1,7	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE 30CM DE DIAMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4m, EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), DISTANCIADOS A 1,5M A EJE ENTRE UNO Y OTRO, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS LONGITUDINALES No4 Y ESTRIBOS EN ACERO No 3 CADA 30cm, y CONCRETO DE 21mpa	ML	\$ 345.000,00	27,00	\$ 9.315.000
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	\$ 55.095,00	0,00	\$ 0
1,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, PARA VIGA CABEZAL Y VASTAGO	KG	\$ 10.911,00	969,31	\$ 10.576.141
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (TRITURADO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	M3	\$ 264.574,00	0,00	\$ 0
1,11	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NOINCLUYE REJA O TAPA	ML	\$ 450.000,00	2,00	\$ 900.000
1,12	RECONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PERDIDA POR COLAPSO DEL MURO, 3M DE ANCHO, INCLUYE CONCRETO 21MPA, ACERO, PARA RIEL DE 90CM, ENTRE HUELLA 90CM, Y SOBRECARGO EN PIEDRA PEGADA 1,2M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	\$ 350.000,00	0,00	\$ 0
1,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E	ML	\$ 350.000,00	0,00	\$ 0

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	10 de 17

	INSTALACIÓN DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36", POR PERDIDA DE BANCA EN COLAPSO DE MURO				
OE.1	Construcción de filtro tipo francés con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600. Incluye: imprimación e impermeabilización de la pantalla del muro con Igol Denso o similar.	m	\$ 157.392,29	11,40	\$ 1.794.272
OE.2	Suministro e instalación de geotextil NT 1600	m2	\$ 15.137,19	20,86	\$ 315.762
OE.3	Colocación de concreto de 14 Mpa para solado con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno	m2	\$ 28.377,38	17,10	\$ 485.253
OE.5	Suministros, transporte e instalación de tubería de concreto reforzado de 24", incluye emboquillado con mezcla impermeabilizada con Sika 1 o similar.	m	\$ 310.446,04	4,00	\$ 1.241.784
OE.6	Reconstrucción de placa huella perdida por colapso del muro, 1.60Mts de ancho, incluye concreto de 21Mpa, entre huella de 1,00 m y sobreanchos en piedra de 0.60 m y todo lo necesario para su correcta instalación	m	\$ 210.303,48	11,80	\$ 2.481.581
3.RECALZADO DE GAVIÓN EN CONCRETO					\$ 4.250.000,00
1,14	REPARACIÓN DE GAVIÓN, CON CONCRETO CICLOPEO (60%CONCRETO 21MPA, 40% PIEDRA DE CANTO), INCUYE RETIRO DE PIEDRA GAVIÓN ACTUAL, DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DE 5CM, FORMALETEADO Y VACIADO GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS ACTUALES	M3	\$ 850.000,00	5,00	\$ 4.250.000
4.RECLAZADO DE PILAR DE PUENTE					\$ 34.167.867,60



Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	11 de 17

1,15	REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RECALZADO EN CONCRETO DE 28MPA Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE , PARA PROTECCIÓN DE CIMENTACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE, INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS, DEMOLICIÓN CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.500.000,00	15,09	\$ 22.635.000
OE.9	Control y manejo de aguas dentro del afluente para obras de recalzado de pilar de puente. Incluye: construcción de muro provisional en bolsas tipo Big bag, control de filtraciones con costales llenado con triturado y recubiertos con plástico calibre 6, incluye retiro de los materiales y reconstrucción por creciente del afluente.	M	\$ 288.321,69	40,00	\$ 11.532.868
5.CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS					\$ 59.672.977,06
1,16	CONSTRUCCIÓN DE BOLSACRETOS DE 1M DE ALTO, 0.7M DE ESPESOR, PARA CONTROL DE LOS DIFERENTES PROCESOS EROSIVOS ACTIVADOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ROQUE	M	\$ 460.000,00	87,24	\$ 40.130.400
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO SECO 0 - 2 M, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS HASTA 5km	m3	\$ 85.000,00	95,66	\$ 8.131.100
1.3	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O RECEBO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR)	m2	\$ 76.096,00	92,80	\$ 7.061.709
OE.2	Suministro e instalación de geotextil NT 1600	m2	\$ 15.137,19	153,61	\$ 2.325.224
OE.4	Demolición y retiro de bolsacreto en mal estado o desplomados. Incluye botada de escombros	m	\$ 44.825,00	8,50	\$ 381.013
OE.8	Construcción de filtro tipo frances con material triturado 3/4" de 0.40x0.40m, en geotextil NT 1600 (Para control de afloramiento de agua en el terreno)	m	\$ 99.608,00	16,50	\$ 1.643.532

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	12 de 17

6.CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SAN JOSE DEL NUS					\$ 8.187.500,00
1,17	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN LIBRE, PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE REJA EN ACERO CUADRADO O REDONDO EN 7/8", CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M	\$ 625.000,00	0,00	\$ 0
OE.10	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O DISIPADORES DE 0,7*0,7M DE SECCIÓN. PAREDES DE 10CM Y LOSA DE 15CM EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJA EN PLATINA 2" X 3/8" X 6 m SEPARADAS A 2cm Y CONTRAMARCO, CORTE Y DEMOLICIÓN NECESARIA EN PAVIMENTO EXISTENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS SOBRANTES, JUNTAS Y SELLOS NECESARIOS.	M	\$ 625.000,00	11.50	\$ 7.187.500
7.HORAS MAQUINARIA					\$ 0,00
1,18	RETROEXCAVADORA DE ORUGA TIPO 120, INCLUYE TRANSPORTE CAMA BAJA	HORA	\$ 188.000,00	0,00	\$ 0
1,19	RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS	HORA	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0
1,20	VOLQUETA	DIA	\$ 901.196,58	0,00	\$ 0
	COSTO DIRECTO				\$ 199.000.000
	ADMINISTRACION				A \$ 49.750.000
	UTILIDAD				U \$ 9.950.000
	TOTAL (COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO A)				\$ 258.700.000

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	13 de 17

3. Que el estado final de las actividades del el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, se describen en el **"INFORME DE SUPERVISION 03 Y FINAL"**, aprobado por el supervisor delegado por el Municipio.
4. Que el Supervisor del el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, y el **MUNICIPIO SAN ROQUE**, han recibido a entera satisfacción las actividades realizadas a través del el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**.
5. Que las actividades objeto del el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE SAN ROQUE** y el Contratista **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, fueron ejecutadas en un **NOVENTA Y UNO PORCIENTO (91%)**, según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción por el supervisor y el Municipio.
6. **Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados:**
Que la relación de las actividades totales ejecutadas en desarrollo del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, celebrado entre el Municipio de San Roque con el Contratista **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, se pueden verificar en el **"INFORME No 3 y FINAL"**, aprobado por el supervisor delegado por el Municipio.

VALORES PARA LIQUIDAR	
Valor Inicial del contrato	\$ 285.000.000
Valor Adicional	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 285.000.000
Valor recibido a entera satisfacción	\$ 258.700.000
Saldo no ejecutado	\$ 26.300.0000
MULTAS IMPUESTAS	
Valor Base para Cumplimiento	\$ 0
Porcentaje de Sanción	0%
Valor Sanción	\$ 0

Dada la característica de los elementos montados, la retoma de activos por parte del contratista, podrá ser en la cantidad y estado que se desmonten posteriormente, sin obligación o responsabilidad expresa por parte del municipio, el cual los desmontará en calidad de baja de inventario por caducidad y obsolescencia.

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	14 de 17

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. El Municipio de San Roque, no realizo anticipos.
2. El Municipio de San Roque, realizo pago de las siguientes actas al contratista.

RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO		
VR. INICIAL DEL CONTRATO	\$ 285.000.000	100%
AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	\$ 85.500.000	
VR. ACTA No1	\$ 179.822.198	63,10%
VR. ACTA A PAGAR No1	\$ 94.322.198	
VR. ACTA No 2	\$ 69.534.052	24,40%
VR. ACTA No3 Y FINAL	\$ 9.343.750	3,28%
VALOR EJECUTADO	\$ 258.700.000	90.77%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATO	\$ 26.300.000	9,23%

Saldos a favor del contratista	\$0
Activos a favor del contratante	\$ 26.300.000

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Revisada la carpeta del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, se logra evidenciar según certificado de parafiscales firmado por la contadora de la **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0**, esta al día en aportes parafiscales y de seguridad social a que haya lugar.
2. Que la Ley 789 de 2022, en su artículo 50., expone que la celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar. las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuara el giro directo de dichos recursos

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	15 de 8

a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.

3. Que el supervisor del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, dejo constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje) durante toda su vigencia, y estableció que no se realizó totalmente los aportes correspondientes.

4. Que el contratista **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, según la cláusula **SEGUNDA** en el literal 4 del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, anexa certificada de parafiscales .

ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que entre el alcalde en representación del Municipio de San Roque, Antioquia y el Señor **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0 representada legalmente Por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297**, se firmó el **ACTA DE TERMINACIÓN** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, en consecuencia se procederá a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

2. Que el estado final de las actividades del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, se describe en el Informe de supervisión No.3 y final a la fecha de liquidación, realizado por el supervisor del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, que reposa en el expediente del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

3. Que el contratista aportó las pólizas No. 6544-101241198 y sus anexos finales con la aseguradora Seguros del Estado S.A, para efectos de la liquidación del Contrato de Obra Pública del Régimen Especial – Calamidad Pública No. 002-2025

4. **Que el señor ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0 representada legalmente Por JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes, a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, además certificación de parafiscales firmado por el contador público con fecha del 26 de marzo de 2026.**

5. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

En virtud de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por Liquidado de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, en los acuerdos que a continuación se relacionan:

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	16 de 8

SEGUNDO: Reconocer a título de la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL REGIMEN ESPECIAL- CALAMIDAD PÚBLICA No 002-2025**, a los **sistemas** de seguridad social:

SALUD a la EPS, PENSIONES, ARL, según certificado de contadora de paz y salvo en pago de aportes a la seguridad social.

TERCERO: Reconocer como saldo a favor del contratista **ESTANDAR INGENIEROS S.A.S NIT 900.615.681-0** representada legalmente Por **JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO**, identificado con la cedula ciudadanía No 71.792.297, la suma de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. (\$ 9.343.750)**, conforme al balance financiero detallado en el Ordinal III ASPECTOS FINANCIEROS, numeral 4 y demás considerandos de la presente acta.

CUARTO: Declarar que una vez se pague la suma de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. (\$ 9.343.750)**, las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del objeto de la presente liquidación, una vez se cancele la suma descrita en el numeral segundo.

No obstante, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al municipio, por actividades ejecutadas en desarrollo, objeto de la presente liquidación.

El recibo de los trabajos terminados no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

QUINTO: Ordenar la anulación del valor del saldo sin ejecutar por la suma de **VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 26.300.000)**, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.

PARAGRAFO: El valor del saldo sin ejecutar corresponde a los recursos asignados para la gestión de maquinaria amarilla, los cuales no fueron comprometidos contractualmente, en razón a que el municipio atendió de manera oportuna y anticipada las emergencias presentadas, haciendo uso de maquinaria propia. Para el momento en que el DAGRAN efectuó la asignación de dichos recursos, las actividades correspondientes ya se encontraban ejecutadas.

Adicionalmente, no fue posible adelantar intervenciones en puntos distintos, dado que estos no estaban contemplados ni priorizados dentro del PAE. En consecuencia, los recursos no ejecutados deberán ser objeto de devolución.

SEXTO: El valor referido en el numeral quinto deberá ser reintegrado al DAGRAN, en cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales aplicables. Dicho reintegro deberá efectuarse dentro de los plazos establecidos para tal fin, mediante los mecanismos financieros que determine la entidad, dejando constancia del respectivo soporte de pago, el cual hará parte integral del acta de liquidación


SEPTIMO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	17 de 17

OCTAVO: La presente acta presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012

NOVENO: Copia de la presente Acta se hará llegar a la Oficinas de Presupuesto y/o de Tesorería, o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque; Antioquia, el día veinticinco (25) del mes de marzo de 2026.


LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal


JUAN ESTEBAN MONTOYA MORENO
Representante Legal
ESTANDAR INGENIEROS S.A.S


CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUÍN
Supervisor
V.Bno
Coadyuvo

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: BEATRIZ ELENA GÓMEZ CARDONA	Nombre: CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUÍN	Nombre: CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUÍN
Cargo: Ingeniera Civil Contratista -Secretaria de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

- 1 Información general
- 2 Contratos
- 3 Planes y servicios
- 4 Ejecución de facturas
- 5 Documentos de control
- 6 Historial de pagos
- 7 **Ejecución del contrato**
- 8 Balance de pagos
- 9 Documentos

Valor

Ejecución del contrato

Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor nro de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Detalle	Valor
Pago 001	CURRASE CORRO 001	15/06/2025 12:00 AM	15/06/2025 12:00 AM	85.500.000 COP	85.500.000 COP	85.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Valor
Pago 002	FEV 104	15/10/2025 1:06 PM	15/10/2025 12:00 AM	94.322.193 COP	94.322.193 COP	94.322.193 COP	Aprobado	Detalle	Valor
Pago 003	FEV 117	22/12/2025 4:25 PM	23/12/2025 12:00 AM	56.332.892 12 COP	69.534.052 COP	69.534.052 COP	Aprobado	Detalle	Valor
Pago 004	FEV 125	28/02/2025 11:44 AM	10/04/2025 12:00 AM	9.343.750 COP	9.343.750 COP	9.343.750 COP	Aprobado	Detalle	Valor

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	205.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	0%
Valor facturado:	258.700.000.00 COP	60.77%
Valor facturado pendiente de pago:	258.700.000.00 COP	90.77%
Valor pagado:	0.00 COP	0%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	205.000.000.00 COP	100%
Valor pendiente de entrega:	205.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Moneda del contrato

Cargado por
