



CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4
CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA
MEDELLÍN
TEL- 4440568
FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE7
Documento Ref.:
Código CIIU / Actividad Económica: 4210
Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	Fecha Documento :	20 - May - 2026
NIT:	901387801-2	Hora Documento:	18:14:56-05:00
Dirección:	CL 35 SUR 40 35 - Envigado - Antioquia	Fecha Vencimiento:	19 - Jun - 2026
Teléfono:	6044801300	Condición Pago:	Crédito
		Lugar de Pago:	MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANOGRADA	ACTA DE OBRA NO GRAVADA	1	18,605,909.00	18,605,909.00	

4) Contestar cito Radicado: 2026-1300-011385-R (d: 108938)
Fecha: 2026-05-25 16:42
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remite: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

ACTA NCONTRATO DESur-IA-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN NDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24"	Sub Total:	18,605,909.00
ifs17	Descuento:	
	IVA:	
	Retención:	0.00
	Retención AMB:	0.00
	Retención: ICA	0.00
	Valor Total:	18,605,909.00

Firma Digital : bb6d8d148ca06b0f7f2a2a72c875f3937b1882133be5af4e25495d55fe2f54dcb8758e7d5e3d88d3cd5552978e9122fa
CuFe : ba41bb0c25999de5dc09502e44ea5594fa11f6d241fff57bfd67d1667a8ccad45ec08eae6eac54ec914a2126939ba25

SON : DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS Y CERO CENTAVO M/L

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 041 de Enero 30 de 2014

Documento Ref.: -
Esta Factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio
Resolución No. 18764100452377 Fecha:22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000

ELABORADO POR	APROBADO	FECHA RECIBIDO:
---------------	----------	-----------------

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-20 HORA DE VALIDACIÓN 18:15:04-05:00 Elaborado por: lcuartas

Page 1 of 1

Este comprobante ha sido emitido por: TITANIO el Software de Facturación Electrónica de Delcor Colombia S.A.S. NIT 860.028.551

[illegible]

[illegible]

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										MODIFICACIONES				ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3				CONCURRENCIAS ACTUALIZADAS				ACTA 1			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJETO DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
CONTRATO DE OBRAS										OBJ															

[illegible]

1983

[illegible]

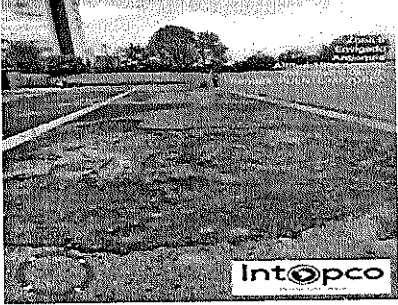
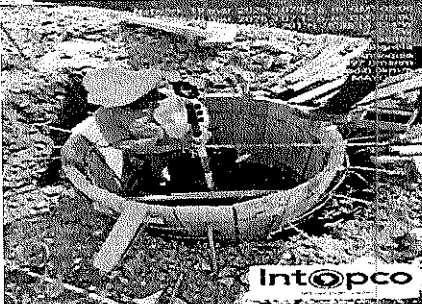

[illegible]


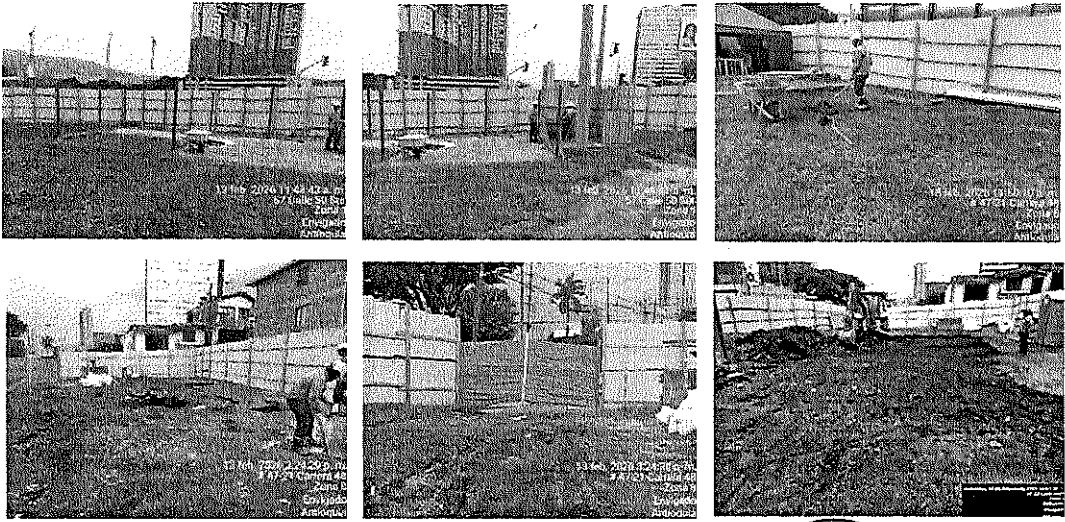
CONTRATO DE OBRAS										CONTRATO DE OBRAS									
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										CONDICIONES ACTUALIZADAS									
Item	Actividad	Unidad	Cant.	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant.	Valor (\$)	Cant.	Valor (\$)	Item	Actividad	Unidad	Cant.	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant.	Valor (\$)	Cant.	Valor (\$)
13.9	Construcción de alfileres de concreto diámetro 120mm, incluye materiales necesarios para su construcción y fundación, 10m.	un	4	\$ 5,610.271	\$ 22,441.084			4	\$ 22,441.084	13.9	Construcción de alfileres de concreto diámetro 120mm, incluye materiales necesarios para su construcción y fundación, 10m.	un	4	\$ 5,610.271	\$ 22,441.084			4	\$ 22,441.084
13.10	Construcción de canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	un	7	\$ 1,070.095	\$ 7,490.676			7	\$ 7,490.676	13.10	Construcción de canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	un	7	\$ 1,070.095	\$ 7,490.676			7	\$ 7,490.676
13.11	Construcción de canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	un	10	\$ 1,543.289	\$ 24,632.824			10	\$ 24,632.824	13.11	Construcción de canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	un	10	\$ 1,543.289	\$ 24,632.824			10	\$ 24,632.824
13.12	Construcción de BASE Y CIMENTACIÓN de 28 MPa, para canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	un	18	\$ 655.861	\$ 13,833.778			18	\$ 13,833.778	13.12	Construcción de BASE Y CIMENTACIÓN de 28 MPa, para canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	un	18	\$ 655.861	\$ 13,833.778			18	\$ 13,833.778
13.13	Construcción de BASE Y CIMENTACIÓN de 28 MPa, para canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	m	48	\$ 1,359.515	\$ 44,456.576			48	\$ 44,456.576	13.13	Construcción de BASE Y CIMENTACIÓN de 28 MPa, para canchales de concreto diámetro 300mm, 10m.	m	48	\$ 1,359.515	\$ 44,456.576			48	\$ 44,456.576
13.14	Suministro, transporte e instalación de CONO PREFABRICADO en concreto 28 MPa, para canchales de diámetro 120mm.	un	18	\$ 1,118.035	\$ 20,124.630			18	\$ 20,124.630	13.14	Suministro, transporte e instalación de CONO PREFABRICADO en concreto 28 MPa, para canchales de diámetro 120mm.	un	18	\$ 1,118.035	\$ 20,124.630			18	\$ 20,124.630
13.15	Prediseño y elaboración de plan de canchales de inspección.	un	51	\$ 172.204	\$ 8,832.404			51	\$ 8,832.404	13.15	Prediseño y elaboración de plan de canchales de inspección.	un	51	\$ 172.204	\$ 8,832.404			51	\$ 8,832.404
13.16	Construcción, transporte e instalación de guías galvanizadas para canchales de inspección.	un	192	\$ 102.160	\$ 19,810.560			192	\$ 19,810.560	13.16	Construcción, transporte e instalación de guías galvanizadas para canchales de inspección.	un	192	\$ 102.160	\$ 19,810.560			192	\$ 19,810.560
13.17	Operación de la cámara de inspección, accesorios y labores de mantenimiento para abastecer planos, recubrir impresos y en medio de la obra.	un	23	\$ 111.640	\$ 2,567.720			23	\$ 2,567.720	13.17	Operación de la cámara de inspección, accesorios y labores de mantenimiento para abastecer planos, recubrir impresos y en medio de la obra.	un	23	\$ 111.640	\$ 2,567.720			23	\$ 2,567.720
13.18	Operación de la cámara de inspección para abastecer planos, recubrir impresos y en medio de la obra.	m	601	\$ 39.854	\$ 23,958.864			601	\$ 23,958.864	13.18	Operación de la cámara de inspección para abastecer planos, recubrir impresos y en medio de la obra.	m	601	\$ 39.854	\$ 23,958.864			601	\$ 23,958.864
13.19	Llaves de concreto de 120mm.	un	24	\$ 335.265	\$ 8,046.360			24	\$ 8,046.360	13.19	Llaves de concreto de 120mm.	un	24	\$ 335.265	\$ 8,046.360			24	\$ 8,046.360
14	PERE SECCION	un	61	\$ 223.147	\$ 13,600.067			61	\$ 13,600.067	14	PERE SECCION	un	61	\$ 223.147	\$ 13,600.067			61	\$ 13,600.067
14.1	Relevo y remate de luminarias, propiedad de EPM.	un	35	\$ 348.076	\$ 12,182.700			35	\$ 12,182.700	14.1	Relevo y remate de luminarias, propiedad de EPM.	un	35	\$ 348.076	\$ 12,182.700			35	\$ 12,182.700
14.2	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	1720	\$ 53.541	\$ 91,910.720			1720	\$ 91,910.720	14.2	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	1720	\$ 53.541	\$ 91,910.720			1720	\$ 91,910.720
14.3	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	1448	\$ 107.467	\$ 155,397.282			1448	\$ 155,397.282	14.3	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	1448	\$ 107.467	\$ 155,397.282			1448	\$ 155,397.282
14.4	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	260	\$ 182.751	\$ 47,515.360			260	\$ 47,515.360	14.4	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	260	\$ 182.751	\$ 47,515.360			260	\$ 47,515.360
14.5	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	100	\$ 142.576	\$ 14,257.600			100	\$ 14,257.600	14.5	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	100	\$ 142.576	\$ 14,257.600			100	\$ 14,257.600
14.6	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	18	\$ 1,124.720	\$ 20,244.960			18	\$ 20,244.960	14.6	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	18	\$ 1,124.720	\$ 20,244.960			18	\$ 20,244.960
14.7	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	50	\$ 34.100	\$ 1,705.000			50	\$ 1,705.000	14.7	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	50	\$ 34.100	\$ 1,705.000			50	\$ 1,705.000
14.8	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	2550	\$ 41.646	\$ 106,197.300			2550	\$ 106,197.300	14.8	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	2550	\$ 41.646	\$ 106,197.300			2550	\$ 106,197.300
14.9	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	2070	\$ 63.853	\$ 131,844.510			2070	\$ 131,844.510	14.9	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	m	2070	\$ 63.853	\$ 131,844.510			2070	\$ 131,844.510
14.10	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 2,322.900	\$ 13,937.400			6	\$ 13,937.400	14.10	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 2,322.900	\$ 13,937.400			6	\$ 13,937.400
14.11	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 3,487.700	\$ 11,003.127			3	\$ 11,003.127	14.11	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 3,487.700	\$ 11,003.127			3	\$ 11,003.127
14.12	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	18	\$ 1,177.172	\$ 21,189.114			18	\$ 21,189.114	14.12	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	18	\$ 1,177.172	\$ 21,189.114			18	\$ 21,189.114
14.13	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 1,783.692	\$ 10,701.976			6	\$ 10,701.976	14.13	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 1,783.692	\$ 10,701.976			6	\$ 10,701.976
14.14	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	4	\$ 3,477.340	\$ 13,909.360			4	\$ 13,909.360	14.14	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	4	\$ 3,477.340	\$ 13,909.360			4	\$ 13,909.360
14.15	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 2,027.274	\$ 12,163.644			6	\$ 12,163.644	14.15	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 2,027.274	\$ 12,163.644			6	\$ 12,163.644
14.16	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 3,438.210	\$ 10,314.630			3	\$ 10,314.630	14.16	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 3,438.210	\$ 10,314.630			3	\$ 10,314.630
14.17	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 8,858.924	\$ 53,153.544			6	\$ 53,153.544	14.17	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 8,858.924	\$ 53,153.544			6	\$ 53,153.544
14.18	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 2,818.850	\$ 5,637.700			2	\$ 5,637.700	14.18	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 2,818.850	\$ 5,637.700			2	\$ 5,637.700
14.19	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 1,619.755	\$ 9,718.530			6	\$ 9,718.530	14.19	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 1,619.755	\$ 9,718.530			6	\$ 9,718.530
14.20	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 3,438.210	\$ 6,876.420			2	\$ 6,876.420	14.20	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 3,438.210	\$ 6,876.420			2	\$ 6,876.420
14.21	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 485.817	\$ 2,914.902			6	\$ 2,914.902	14.21	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 485.817	\$ 2,914.902			6	\$ 2,914.902
14.22	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 1,015.051	\$ 3,045.153			3	\$ 3,045.153	14.22	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 1,015.051	\$ 3,045.153			3	\$ 3,045.153
14.23	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 718.255	\$ 4,309.530			6	\$ 4,309.530	14.23	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 718.255	\$ 4,309.530			6	\$ 4,309.530
14.24	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 848.016	\$ 5,088.096			6	\$ 5,088.096	14.24	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	6	\$ 848.016	\$ 5,088.096			6	\$ 5,088.096
14.25	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 381.780	\$ 1,135.340			3	\$ 1,135.340	14.25	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	3	\$ 381.780	\$ 1,135.340			3	\$ 1,135.340
14.26	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	9	\$ 132.945	\$ 1,196.505			9	\$ 1,196.505	14.26	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	9	\$ 132.945	\$ 1,196.505			9	\$ 1,196.505
14.27	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 3,171.904	\$ 6,343.808			2	\$ 6,343.808	14.27	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 3,171.904	\$ 6,343.808			2	\$ 6,343.808
14.28	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 1,924.187	\$ 3,848.374			2	\$ 3,848.374	14.28	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	2	\$ 1,924.187	\$ 3,848.374			2	\$ 3,848.374
14.29	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	1	\$ 5,535.805	\$ 5,535.805			1	\$ 5,535.805	14.29	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	1	\$ 5,535.805	\$ 5,535.805			1	\$ 5,535.805
14.30	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	600	\$ 356.104	\$ 213,662.400			600	\$ 213,662.400	14.30	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	600	\$ 356.104	\$ 213,662.400			600	\$ 213,662.400
14.31	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	30	\$ 389.814	\$ 11,694.420			30	\$ 11,694.420	14.31	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	30	\$ 389.814	\$ 11,694.420			30	\$ 11,694.420
14.32	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	12	\$ 1,503.868	\$ 18,046.392			12	\$ 18,046.392	14.32	Relevo y remate de cables propiedad de EPM.	un	12	\$ 1,503.868	\$ 18,046.392			12	\$ 18,046.392


[illegible]



CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										CONDICIONES ACTUALIZADAS									
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor (\$)	Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor (\$)
14.77	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	670	\$ 113,236	\$ 75,806,920.00			670	\$ 75,806,920.00										
14.78	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	180	\$ 33,355	\$ 6,003,900.00			180	\$ 6,003,900.00										
14.79	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	60	\$ 8,403	\$ 504,180.00			60	\$ 504,180.00										
14.80	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	35	\$ 53,065	\$ 2,008,438.00			35	\$ 2,008,438.00										
14.81	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	2	\$ 480,273	\$ 960,546.00			2	\$ 960,546.00										
14.82	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	26	\$ 1,410,105	\$ 36,222,822.00			26	\$ 36,222,822.00										
14.83	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	59	\$ 1,931,125	\$ 112,915,375.00			59	\$ 112,915,375.00										
14.84	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	48	\$ 1,414,448	\$ 67,493,504.00			48	\$ 67,493,504.00										
14.85	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	28	\$ 1,747,485	\$ 50,046,892.00			28	\$ 50,046,892.00										
14.86	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	5	\$ 1,317,657	\$ 6,588,285.00			5	\$ 6,588,285.00										
14.87	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	195	\$ 183,039	\$ 36,059,860.00			195	\$ 36,059,860.00										
14.88	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	1930	\$ 14,655	\$ 28,180,590.00			1930	\$ 28,180,590.00										
14.89	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	106	\$ 599,646	\$ 63,562,784.00			106	\$ 63,562,784.00										
14.90	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	28	\$ 108,834	\$ 3,098,156.00			28	\$ 3,098,156.00										
14.91	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	400	\$ 10,804	\$ 4,321,600.00			400	\$ 4,321,600.00										
14.92	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	4	\$ 27,201	\$ 108,804.00			4	\$ 108,804.00										
14.93	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	18	\$ 141,325	\$ 2,543,850.00			18	\$ 2,543,850.00										
14.94	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	45	\$ 40,800	\$ 1,836,000.00			45	\$ 1,836,000.00										
14.95	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	1	\$ 9,391,844	\$ 9,391,844.00			1	\$ 9,391,844.00										
14.96	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	1	\$ 10,106,722	\$ 10,106,722.00			1	\$ 10,106,722.00										
14.97	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	2100	\$ 35,303	\$ 74,146,800.00			2100	\$ 74,146,800.00										
14.98	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	1510	\$ 28,778	\$ 43,380,790.00			1510	\$ 43,380,790.00										
14.99	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	40	\$ 16,677	\$ 667,080.00			40	\$ 667,080.00										
14.100	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	11	\$ 803,948	\$ 8,843,386.00			11	\$ 8,843,386.00										
14.101	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	10	\$ 855,946	\$ 8,559,466.00			10	\$ 8,559,466.00										
14.102	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	11	\$ 1,344,148	\$ 14,785,639.00			11	\$ 14,785,639.00										
14.103	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	1	\$ 4,501,552	\$ 4,501,552.00			1	\$ 4,501,552.00										
14.104	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	1	\$ 5,550,416	\$ 5,550,416.00			1	\$ 5,550,416.00										
14.105	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	1	\$ 6,616,405	\$ 6,616,405.00			1	\$ 6,616,405.00										
14.106	Suministro, transporte y montaje de cableado en tubería PVC de 2" para conexión entre caja de alumbrado y punto de salida de alumbrado.	m	0	\$ 3,340,000	\$ 0.00			0	\$ 0.00										


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONTRATO DE OBRAS				DISEÑOS DE OBRAS		CONTRATISTA		CONTRATO DE OBRAS		ACTA DE OBRAS	
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE LA ZONA DE LA													


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	540.00
1.1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	540.00
dia												Saldo por Ejecutar	476.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	64.00
10/02/2026	10/03/2026	10/04/2026											
23.00	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Localizacion, trazado y replanteo.	Levantamiento general del proyecto				21.00				21.00		
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												21.00	
OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,000.00	
2.3												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio.											Cant. Total	1,000.00	
m2												Saldo por Ejecutar	1.57	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	998.43
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026	10/04/2026												
0.00	759.72	238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total					
3	10/04/2026	Desmante	Glorieta		46.25	9.84	4.70		46.25					
3	10/04/2026	Desmante	Contenedores		157.50	25.00	6.30		157.50					
3	10/04/2026	Desmante	Contenedores		34.96	4.60	7.60		34.96					
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												238.71		
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,606.00	
2.5	Desmonte y retiro de cordones en concreto o bordillos existentes 0.15x0.10 m. Manual o mecánico. Incluye cargue, transporte, botada y disposición de los escombros a sitios definidos por la interventoría.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	1,606.00	
m												Saldo por Ejecutar	1,601.20	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	4.80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total			
3	10/04/2026	Retiro de cordónera	Glorieta sentido norte - sur				6.00	0.80				4.80		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3														4.80
   														
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8,160.00
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	8,160.00
m3												Saldo por Ejecutar	8,152.12
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	7.88
0.00	2.60	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Demolicion de concreto	Pilas eje 3 - 4 - campamento				5.28				5.28		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												5.28	
OBSERVACIONES:													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150.00	
3.3	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (0-2,5 m)											Cant. Adicional	0.00	
Unidad m3												Cant. Total	150.00	
												Saldo por Ejecutar	106.50	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	43.50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026	10/04/2026												
10.60	26.50	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diámetro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Excavacion de caisson	Eje 3 - eje 4					6.40				6.40		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												6.40		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

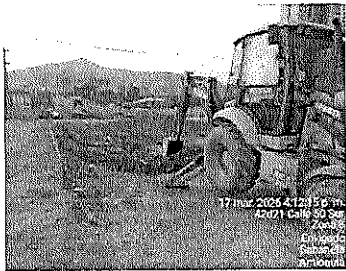
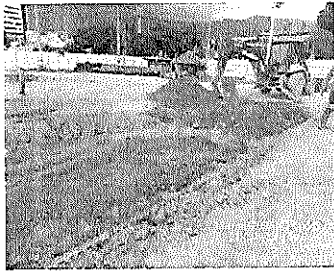
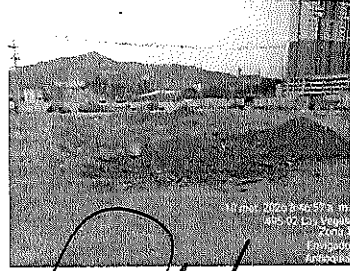
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150.00	
3.4	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2,5-5 m)											Cant. Adicional	0.00	
Unidad m3												Cant. Total	150.00	
												Saldo por Ejecutar	130.74	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	19.26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026	10/04/2026												
	16.72	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
3	10/03/2026	Excavacion de caisson				Eje 3 - eje 4				2.54				2.54
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3														2.54
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150.00	
3.6	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la inventoria, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (7,5-10 m)											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	150.00	
m3												Saldo por Ejecutar	136.78	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	13.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026	10/04/2026												
	4.42	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant.	Diámetro	Ancho	Alto	Total			
3	10/04/2026	Excavación de caisson	Eje 3				8.80				8.80			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												8.80		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	120.00	
3.7	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (10-12,5 m)											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	120.00	
m3												Saldo por Ejecutar	106.75	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	13.25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		10/04/2026												
		13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
3	10/04/2026	Excavacion de caisson				Eje 3				13.25				13.25
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3														13.25
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA														



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 			
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	79.00		
3.8	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (12,5-15 m)											Cant. Adicional	0.00		
Unidad												Cant. Total	79.00		
m3												Saldo por Ejecutar	65.75		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	13.25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		10/04/2026													
		13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant.	Diámetro	Ancho	Alto	Total	
3	10/04/2026	Excavacion de caisson				Eje 3				13.25				13.25	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3														13.25	
															
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA														CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA	

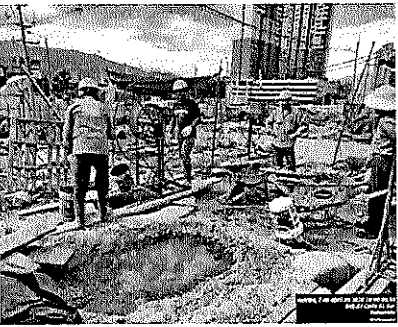
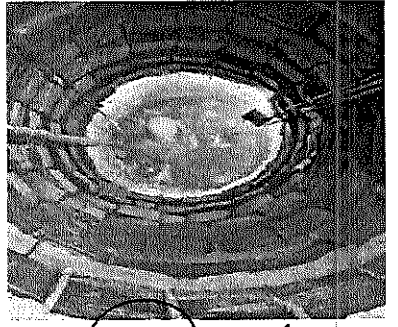


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	61.00	
3.9	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (15-17,5 m)											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	61.00	
m3												Saldo por Ejecutar	60.31	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.69
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		10/04/2026												
		0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant.	Diámetro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Excavacion de caisson	Eje 3					0.69				0.69		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												0.69		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

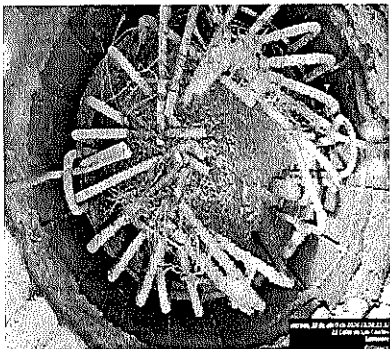
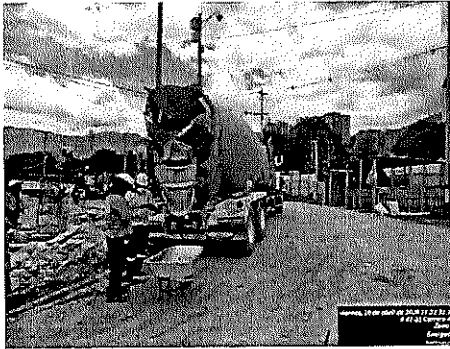

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
		OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.										DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN										Cant. Contractual	10,878.00		
3.12											Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Excavación mecánica hasta 4,00m de profundidad, incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones										Cant. Total	10,878.00		
m3											Saldo por Ejecutar	10,037.69		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	840.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026	10/04/2026												
0.00	195.03	645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total						
3	10/04/2026	Excavación eje 11	Glorieta	111.85				111.85						
3	10/04/2026	Excavación eje 12	Glorieta	77.85				77.85						
3	10/04/2026	Conformación de terreno	Eje 11 y 12 K0+000 a K0+068.87		68.87	18.90	0.35	455.58						
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												645.28		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Rastrope Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														


CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-03-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8.00		
14.11												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Suministro, transporte y montaje poste de concreto de 12m , 750 kg-f, según norma RA7-035, incluye hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento											Cant. Total	8.00		
un												Saldo por Ejecutar	6.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.00		
0.00	0.00	10/04/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total							
3	10/04/2026	Instalacion	Poste	1.00			12.00	1.00							
3	10/04/2026	Instalacion	Poste	1.00			12.00	1.00							
10/04/2026 11:05:29 a.m. 34 Calle 50 Sur Sabana Antioquia 10/04/2026 11:02:16 a.m. COT 6 1613417 N 75 804068 W Avenida Las Vegas 10/04/2026 11:01:30 a.m. COT 6 161272 N 75 804105 W Avenida Las Vegas															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												2.00			
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															



CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	3.00		
14.12												Cant. Adicional	2.00		
Unidad	Suministro, transporte y montaje poste de concreto de 14m 750 kg-f, según norma RA7-035, incluye hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento											Cant. Total	5.00		
												Saldo por Ejecutar	0.00		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	5.00		
0.00	0.00	10/04/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total							
3	10/04/2026	Instalacion	Poste	1.00			14.00	1.00							
3	10/04/2026	Instalacion	Poste	1.00			14.00	1.00							
3	10/04/2026	Instalacion	Poste	1.00			14.00	1.00							
3	10/04/2026	Instalacion	Poste	1.00			14.00	1.00							
3	10/04/2026	Instalacion	Poste	1.00			14.00	1.00							
8 abr 2026 14:58:17 h. m. 24100422 Carrera 48 Zona 8 Envigado Antioquia 9 abr 2026 5:00:57 h. m. 49301 58 Carrera 48 Zona 8 Envigado Antioquia 8 abr 2026 5:25:12 h. m. Zona 8 Envigado Antioquia															
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												5.00			
CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA															


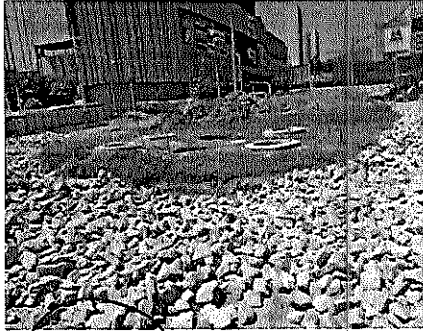
		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	18.00
14.13	Suministro, transporte y montaje poste de concreto de 8m, 510 kg-f, según norma RA7-035. Incluye hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	18.00
un												Saldo por Ejecutar	17.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico (Plano / Esquema)													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Instalacion	Poste				1.00			8.00	1.00		
 													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												1.00	
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA	


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1,691.00	
15.1	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, de e=0,05m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad m2												Cant. Total	1,691.00	
												Saldo por Ejecutar	1,688.74	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	2.26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Díametro	Ancho	Alto	Total					
3	10/04/2026	Solado	Pila 13		1.13	1.20		0.05	1.13					
3	10/04/2026	Solado	Pila 17		1.13	1.20		0.05	1.13					
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												3	2.26	
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	612.00
15.2	Colocación de concreto de 4000 PSI para pilas de fundación. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para pilas de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	612.00
m3												Saldo por Ejecutar	597.30
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	14.70
		10/04/2026											
0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
3	10/04/2026	Concreto	Pila 13		14.70	1.20		13.00	14.70				
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3													14.70
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	337.00	
15.3	CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pilas, incluye colocación de concreto 3000 psi (Incluye suministro, transporte, formaleta, colocación del concreto, molinete, motobomba, acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción.)											Cant. Adicional	0.00	
Unidad m3												Cant. Total	337.00	
												Saldo por Ejecutar	292.34	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	44.66
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.00	19.47	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
3	10/04/2026	Anillos de revestimiento	Eje 3 - eje 4				25.19				25.19			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3														
25.19														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	861,540.00	
16.1	Acero de refuerzo de fy=60.000 psi. Suministro, transporte e instalación. Acero según especificaciones particulares y de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero pdr-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos (herramienta menor), transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. Incluye separadores que garanticen el recubrimiento mínimo especificado.											Cant. Adicional	0.00	
Unidad												Cant. Total	861,540.00	
kg												Saldo por Ejecutar	837,449.09	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	24090.91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026	10/04/2026												
0.00	6680.72	17410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Acero de refuerzo			Anillos de caisson eje 3 - eje 4			1773.60	1/2"; 3/8"			1773.60		
3	10/04/2026	Acero de refuerzo			Fustes eje 3 - eje 4			15636.59	1"; 3/8"			15636.59		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												17410.19		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
OE1	Suministro, transporte e instalación de piedra Rajón											Cant. Adicional	155.00
Unidad												Cant. Total	155.00
m3												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	155.00
0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Carreteable	Glorieta				155.00				155.00		
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro												3	155.00
<i>[Signature]</i> CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA <i>[Signature]</i> CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
OE2												Cant. Adicional	8,643.00
Unidad	Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas.											Cant. Total	8,643.00
Pulg												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	8643.00
0.00	0.00	8643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Perforaciones en roca	Eje 3				8643.00				8643.00		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3 8643.00													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR1												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Ensayos de laboratorio (Ver anexo "Ens. Lab. + póliza")											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.99
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.01
0.00	0.00	0.010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Piano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant.	Díametro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2026	Laboratorio	Actividades de Enero - Marzo				0.0105				0.0105		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3													
0.01													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR2	Implementación Social (Ver anexo "Subanálisis AU")											Cant. Adicional	0.00
Unidad												Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.92
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.08
0.00	0.00	0.0774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
3	10/04/2026	Implementación actividades social	Actividades de Enero - Marzo					0.0774				0.0774	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.												3	0.0774
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00	
GR3												Cant. Adicional	0.00	
Unidad	Implementación Plan de Manejo Ambiental (Ver anexo PMA)											Cant. Total	1.00	
GL												Saldo por Ejecutar	0.91	
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.09	
0.00	0.00	0.0867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total						
3	10/04/2026	Implementación Plan manejo ambiental	Actividades de Enero - Marzo	0.0867				0.0867						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.				3				0.0867						
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR4												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación Plan de Manejo de Tránsito (Ver anexo PMT)											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.93
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.07
0.00	0.00	10/04/2025 0.0689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total		
3	10/04/2025	Implementación Plan manejo de tránsito	Actividades de Enero - Marzo				0.0689				0.0689		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3													
0.0689													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

CONTROL CANTIDADES DE OBRA												DESUR		CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO															
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00		
GR5												Cant. Adicional	0.00		
Unidad	Implementación SST (Ver anexo "Subanálisis AU")											Cant. Total	1.00		
GL												Saldo por Ejecutar	0.97		
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.03		
0.00	0.00	0.0316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Registro Fotográfico /Plano / Esquema															
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total				
3	10/04/2026	Implementación SST	Actividades de Enero - Marzo				0.0316				0.0316				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 3												0.0316			
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												 CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA			

	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR" PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	
CONTRATO N° DESur-IA-168-2025		
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.	
ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 3		
En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de MARZO de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GAVIRIA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO , representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el período correspondiente al mes de MARZO de 2026:		
JUSTIFICACION		
ITEM 2.8. DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura: La menor cantidad ejecutada obedece a ajustes en obra derivados de las condiciones reales encontradas, que permitieron conservar algunos elementos estructurales inicialmente contemplados para demolición, disminuyendo así el volumen total sin afectar el desarrollo del proyecto.		
ITEM 3.3. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (0-2,5 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 3.4. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2,5-5 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 3.5. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (5-7,5 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 3.6. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (7,5-10 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 3.7. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (10-12,5 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 3.8. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (12,5-15 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 3.9. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (15-17,5 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 3.10. Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (17,5-20 m) La menor cantidad se debe por cambios en el proceso constructivo, teniendo en cuenta que algunas pilas inicialmente previstas para excavación manual serán construidas mecánicamente mediante el uso de piloteadora. En consecuencia, la excavación manual se ejecutó únicamente en las pilas 12 a la 17 (eje 3) y en el primer metro de las pilas 18, 20 y 22 (eje 4). Las excavaciones restantes, serán reconocidas mediante la obra extra OE05.		
ITEM 15,3 CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pilas, incluye colocación de concreto 3000 psi (incluye suministro, transporte, formaleta, colocación del concreto, molinete, motobomba, acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción.) La menor cantidad se debe a que, por ajustes técnicos en obra, algunas pilas dejaron de ejecutarse mediante excavación manual y pasaron a construirse con el uso de camisa metálica con piloteadora. En consecuencia, no fue necesaria la instalación de anillos de concreto en dichas pilas, al emplearse un procedimiento constructivo diferente que garantiza la estabilidad de la excavación.		
OE1. Suministro, transporte e instalación de piedra Rajón Durante la ejecución de la obra, fue necesario incorporar el uso de piedra rajón como actividad no contemplada inicialmente, en respuesta a las condiciones del terreno. Esta intervención se requirió para garantizar la estabilidad y adecuado comportamiento de la plataforma de trabajo.		
OE2. Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas: Durante la excavación de los caissons se encontraron estratos rocosos que no podían ser removidos mediante los métodos convencionales previstos. Debido a las condiciones físicas y mecánicas del material, caracterizado por su alta resistencia y grado de compactación, fue necesario implementar excavación con cuña manual para su fragmentación y retiro controlado. Adicionalmente, se requirió el manejo de aguas durante el proceso constructivo para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y estabilidad en la excavación.		

CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 3

OE3. Traslado de cámara PTZ: desmonte, traslado y reinstalación de poste, gabinete y cámara; adecuación de puesta a tierra; canalización y vaciado de caja; traslado/adecuación de fibra óptica ADSS y realización de fusiones:

Se requiere el traslado de la cámara ubicada en el poste junto al eje 3, la cual no se encontraba registrada en el inventario inicial del proyecto. Esta situación implicó la ejecución de actividades no previstas como el desmonte, traslado y reinstalación del poste, gabinete y cámara PTZ.

OE4. Desmonte de valla informativa tipo tubo de 12 x 4 m, incluye señalización temporal, cierre parcial de vía, uso de grúa, trabajo nocturno para desmonte de estructura principal, desmonte diurno de torres, láminas y lonas, cargue, transporte y disposición final de material desmontado.

Durante la intervención en campo, se identificaron dos vallas informativas ubicadas en los ejes 2 y 5 del puente, las cuales no habían sido consideradas dentro del inventario inicial del proyecto. En consecuencia, fue necesario ejecutar el desmonte completo de dichas estructuras, incluyendo señalización temporal, cierre parcial de vía, uso de grúa, trabajos nocturnos para el retiro de la estructura principal y desmonte diurno de torres, láminas y lonas, así como el cargue, transporte y disposición final del material desmontado.

OE6. Excavación de pilote de cimentación profunda de 1.20 m de diámetro mediante perforación mecánica con piloteadora, uso de camisa metálica recuperable. Incluye personal especializado, equipos mayores y menores, herramientas, maniobras de izaje, transporte de equipos, plataforma y/o terraplenes para el posicionamiento de equipos y tanques para manejo polímeros o lodos bentoníticos.

La presente actividad se considera obra extra nueva debido a la adopción del proceso constructivo mediante pilotes de cimentación profunda ejecutados con piloteadora, el cual no se encontraba contemplado dentro del alcance inicial del proyecto.


Su implementación fue necesaria para garantizar la adecuada cimentación del puente, dadas las condiciones encontradas en campo y la necesidad de optimizar la solución estructural. Este proceso incluye la perforación mecánica con camisa metálica recuperable, así como todas las actividades asociadas como la conformación de plataformas de trabajo, manejo de lodos bentoníticos o polímeros, maniobras de izaje y transporte de equipos especializados.


14.12 Suministro, transporte y montaje poste de concreto de 14m 750 kg-f, según norma RA7-035, incluye hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento:

Se requiere una mayor cantidad de postes de concreto de 14 m – 750 kgf (Norma RA7-035) debido a que así está establecido en el diseño aprobado del proyecto, el cual define la cantidad necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluyendo su suministro, transporte, hincado y montaje. □

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	-6973.80	\$ 197,994.00	-\$ 1,380,769,604.00
3.3	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (0-2,5 m)	m3	-102.46	\$ 358,176.00	-\$ 36,698,713.00
3.4	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2.5-5 m)	m3	-118.49	\$ 447,704.00	-\$ 53,048,447.00
3.5	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (5-7,5 m)	m3	-118.49	\$ 485,376.00	-\$ 57,512,202.00

		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR" PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS						
CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025								
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.							
ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 3								
3.6	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (7,5-10 m)	m3	-118.49	\$	570,636.00	-\$	67,614,660.00	
3.7	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (10-12,5 m)	m3	-88.49	\$	643,998.00	-\$	56,987,383.00	
3.8	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (12,5-15 m)	m3	-47.49	\$	729,256.00	-\$	34,632,367.00	
3.9	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (15-17,5 m)	m3	-53.84	\$	814,515.00	-\$	43,853,488.00	
3.10	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (17,5-20 m)	m3	-12.84	\$	899,774.00	-\$	11,553,098.00	
15.3	CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pilas, incluye colocación de concreto 3000 psi (Incluye suministro, transporte, formaleta, colocación del concreto, molinete, motobomba, acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción.)	m3	-262.66	\$	905,841.00	-\$	237,928,197.00	
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA						-\$	1,980,598,159.00	
OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA:								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL			
14.12	Suministro, transporte y montaje poste de concreto de 14m 750 kg-f, según norma RA7-035, incluye hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	2.00	\$ 3,667,709.00	\$ 7,335,418.00			
TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA						\$	7,335,418.00	
OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL			
OE1	Suministro, transporte e instalación de piedra Rajón	m3	470.00	\$ 303,395.00	\$ 142,595,650.00			
OE2	Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas.	Pulg	10000.00	\$ 7,693.00	\$ 76,930,000.00			
OE3	Traslado de cámara PTZ: desmonte, traslado y reinstalación de poste, gabinete y cámara; adecuación de puesta a tierra; canalización y vaciado de caja; traslado/adecuación de fibra óptica ADSS y realización de fusiones	Global	1.00	\$ 11,023,176.00	\$ 11,023,176.00			
OE4	Desmonte de valla informativa tipo tubo de 12 x 4 m, incluye señalización temporal, cierre parcial de vía, uso de grúa, trabajo nocturno para desmonte de estructura principal, desmonte diurno de torres, láminas y lonas, cargue, transporte y disposición final de material desmontado.	Und	2.00	\$ 12,501,385.00	\$ 25,002,770.00			
OE6	Excavación de pilote de cimentación profunda de 1.20 m de diámetro mediante perforación mecánica con piloteadora, uso de camisa metálica recuperable. Incluye personal especializado, equipos mayores y menores, herramientas, maniobras de izaje, transporte de equipos, plataforma y/o terraplenes para el posicionamiento de equipos y tanques para manejo polímeros o lodos bentoníticos.	m	415.00	\$ 4,139,063.00	\$ 1,717,711,145.00			

		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR" PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS		 Alcaldía de Envigado	
CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025					
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.				
ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 3					
TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA				\$	1,973,262,741.00
TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA				\$	1,980,598,159.00
DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA				\$	-
Las partes dejan constancia de lo siguiente: 1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empresa DESur. 2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESUR-IA-168-2025 3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato. Para constancia firman: ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ Gerente EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR <i>[Firma]</i> JESUS ENRIQUE ACEVEDO Representante Legal Contratista CONSORCIO MAYORCA CONECTA <i>[Firma]</i> LAURA QUINTERO GAVIRIA Supervisora EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR <i>[Firma]</i> ALVARO HERNANDO VERA Representante Legal Interventoria CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025					



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



Alcaldía de Envigado

CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO:

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24

ACTA N°3 - APROBACIÓN OBRA EXTRA

En el Municipio de Envigado a los 15 días del mes de mayo de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GRAVIRIA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO, representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025; con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 2026:

OBRAS EXTRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO UNITARIO	FECHA
OE1	Suministro, transporte e instalación de piedra Rajón	m3	\$ 303,395.00	feb-26
OE2	Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas.	Pulg	\$ 7,693.00	feb-26
OE3	Traslado de cámara PTZ: desmonte, traslado y reinstalación de poste, gabinete y cámara; adecuación de puesta a tierra; canalización y vaciado de caja; traslado/adecuación de fibra óptica ADSS y realización de fusiones	Global	\$ 11,023,176.00	feb-26
OE4	Desmonte de valla informativa tipo tubo de 12 x 4 m, incluye señalización temporal, cierre parcial de vía, uso de grúa, trabajo nocturno para desmonte de estructura principal, desmonte diurno de torres, láminas y lonas, cargue, transporte y disposición final de material desmontado.	Und	\$ 12,501,385.00	feb-26
OE6	Excavación de pilote de cimentación profunda de 1.20 m de diámetro mediante perforación mecánica con piloteadora, uso de camisa metálica recuperable. Incluye personal especializado, equipos mayores y menores, herramientas, maniobras de izaje, transporte de equipos, plataforma y/o terraplenes para el posicionamiento de equipos y tanques para manejo polímeros o lodos bentónicos.	m	\$ 4,139,063.00	feb-26

OBSERVACIONES:

La construcción de estas obras extras se realizarán de acuerdo a las indicaciones del supervisor asignado por DESUR; y deben cumplir con las normas y especificaciones generales de construcción.

Se anexan los A.P.U de Obras Extras revisados y aprobados.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Los precios unitarios de Obra Extra fueron aprobados por la interventoría y representantes de la Empresa DESUR.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESUR-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

JESUS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

LAURA QUINTERO GRAVIRIA
Supervisora del Contrato
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN:

Suministro, transporte e instalacion de piedra Rajon

FECHA: 18/02/2026

UNIDAD: m3

CANTIDAD: 444.00

ITEM: OE1

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%mo	0.050	\$ 18,600.35	\$ 930.00
	Retrocargador 416 o similar	hr	0.160	\$ 141,196.00	\$ 22,591.00
				\$	-
	SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA				\$ 23,521.00

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Material granular -Piedra Rajon diametro 12"	m3	1.30	\$ 168,980.00	\$ 219,674.00
				\$	-
				\$	-
	SUBTOTAL MATERIALES				\$ 219,674.00

TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Transporte de material	m3	1.30	\$ 32,000.00	\$ 41,600.00
				\$	-
	SUBTOTAL TRANSPORTES				\$ 41,600.00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla 1 Of + 1 Ayu	jor	0.035	531,439	\$ 18,600.35
				\$	-
				\$	-
	OBSERVACIONES				\$ 18,600.35

SUBTOTAL MANO DE OBRA

\$ 18,600.35

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 303,395.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
DESCRIPCIÓN:	FECHA:	18/02/2026
	UNIDAD:	Pulg
Excavacion con cuña manual. Incluye manejo de aguas.	CANTIDAD:	10,000.00
	ITEM:	QE2

TOTAL COSTO DIRECTO	\$7,693.00
----------------------------	-------------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN:

Traslado de cámara PTZ: desmonte, traslado y reinstalación de poste, gabinete y cámara; adecuación de puesta a tierra; canalización y vaciado de caja; traslado/adecuación de fibra óptica ADSS y realización de fusiones

FECHA: 18/02/2026

UNIDAD: Glb

CANTIDAD: 1.00

ITEM: QE3

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%MO	0.070	\$ 6,830,180.00	\$ 478,113.00
	Canalización y vaciado de caja 50x50	und	1.000	\$ 1,130,500.00	\$ 1,130,500.00
					\$ -
	SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA				\$ 1,608,613.00

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Cable eléctrico 2x8+8	m	31.50	\$ 26,775.00	\$ 843,413.00
	Vestida de poste con gabinete, brazo y cámara PTZ	und	1.000	\$ 1,740,970.00	\$ 1,740,970.00
					\$ -
	SUBTOTAL MATERIALES				\$ 2,584,383.00

TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
					\$ -
	SUBTOTAL TRANSPORTES				\$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Desmonte de gabinete, cámara PTZ y fibra óptica	und	1.000	\$ 680,680.00	\$ 680,680.00
	Traslado de fibra óptica de 24 hilos ADSS	und	1.00	\$ 589,050.00	\$ 589,050.00
	Desmonte y reubicación de poste de concreto 14 m; instalación de anillo de cobre; puesta a tierra; ascenso por ductos hasta gabinete	und	1.000	\$ 5,324,829.93	\$ 5,324,830.00
	Fusiones de fibra óptica	und	4.000	\$ 58,905.00	\$ 235,620.00
					\$ -
	OBSERVACIONES				\$ 6,830,180.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 11,023,176.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN:			FECHA:		18/02/2026
Desmonte de valla informativa tipo tubo de 12 × 4 m, incluye señalización temporal, cierre parcial de vía, uso de grúa, trabajo nocturno para desmonte de estructura principal, desmonte diurno de torres, láminas y lonas, cargue, transporte y disposicion final de material desmontado.			UNIDAD:		und
			CANTIDAD:		2.00
			ITEM:		OE4
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor	%MO	0.050	\$ 9,758,000.00	\$ 487,900.00
	Camion grua 8 ton	día	1.000	\$ 2,142,000.00	\$ 2,142,000.00
SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA					\$ 2,629,900.00
MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL MATERIALES					\$ -
TRANSPORTES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Cargue, transporte de material y derecho de botadero.	m3	2.500	\$ 45,394.00	\$ 113,485.00
					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 113,485.00
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla para desmonte de torres, láminas y lonas	un	1.000	9,758,000	\$ 9,758,000.00
					\$ -
OBSERVACIONES					\$ 9,758,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 9,758,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12,501,385.00

CONSTRUCCION INTERCAMBIO VIAL PUENTE MAYORCA - ENVIGADO Y SABANETA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN:

excavacion de pilote de cimentacion profunda de 1.20 m de diametro mediante perforacion mecanica con piloteadora, uso de camisa metálica recuperable. Incluye personal especializado, equipos mayores y menores, herramientas, maniobras de izaje, transporte de equipos, plataforma y/o terraplenes para el posicionamiento de equipos y tanques para manejo polímeros o lodos bentoníticos

FECHA:

16/02/2026

UNIDAD:

m

CANTIDAD:

477.00

ITEM:

QEG

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Herramienta menor (5% M.O)	(%)mo	0.050	\$ 171,906.42	\$ 8,595.00
	Piloteadora Liebherr LB36 (Incluye operador)	hr	0.750	\$ 3,498,600.00	\$ 2,623,950.00
	Osciladora Leffer (Incluye operador)	hr	0.375	\$ 1,999,200.00	\$ 749,700.00
	Grúa telescópica 50 ton (Incluye operador)	hr	0.188	\$ 1,666,000.00	\$ 312,375.00

SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA

\$ -
\$ 3,694,620.00

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -

SUBTOTAL MATERIALES

\$ -
\$ -

TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. UNIT.	PREC. UNIT.	VR. PARCIAL
	Transporte de equipos	viaje	0.004	\$ 65,000,000.00	\$ 272,537.00

SUBTOTAL TRANSPORTES

\$ -
\$ 272,537.00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREC.UNIT.	VR. PARCIAL
	Cuadrilla - 1 Oficial - 4 Ayudantes	jor	0.167	\$ 1,031,438.54	\$ 171,906.42
					\$ -
					\$ -

OBSERVACIONES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

\$ -
\$ 171,906.42

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 4,139,063.00

Medellín, 02 de mayo de 2026.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.


Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6. certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,



Daniel Flórez Osorio
Revisor fiscal
T.P. 237007-T
Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A



+57 604 266 6474
+57 301 208 5777



www.ochgroup.co



Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia



Nro Planilla: 85845214

Fecha de creación del

Periodo de Cotización: 2026-04

Periodo de Servicio: 2026-05

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

jueves, 21 de mayo de 2026 07:45:03 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 15/05/2026

Se certifica que en la fecha 2026-05-15, la empresa CONSORCIO CONECTA MAYORCA con documento de identificación N1901999695, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1001233778	OCHOA MORALES EDUARDO SMITH	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015072510	OCHOA CARRILLO EMANUEL	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1010039747	HERRANDEZ QUINCHARA DIEGO ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	SI	NO	NO	NO
CC 1020113693	PIMENTA CASTRILLON RICARDO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036607393	SARAVIA LAINEZ SERGIO ANTONIO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037266817	LOPERA ORTIZ EDUAR ALEXIS	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037777449	MUNERA ZAPATA JUAN CAMILO	PORVENIR	SAVIA SALUD	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1039286649	RODRIGUEZ CASTRILLON JHONNY ALEXANDER	PORVENIR	SAVIA EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1040378567	VELASQUEZ SUAREZ FREYDY ADALBERTO	COLPENSIONES	SAVIA SALUD	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1045706581	JULIO ACOSTA HAROLD	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1045706581	JULIO ACOSTA HAROLD	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1046933263	RIOS CARDONA EDISON ANDRES	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1046933263	RIOS CARDONA EDISON ANDRES	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1046933263	RIOS CARDONA EDISON ANDRES	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1054541209	MOLINA RAMIREZ ANDERSON JHOVANY	PORVENIR	SAVIA EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1058920423	CASTAÑEDA GIRALDO HECTOR HERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1072751359	CANIZALES AVILA JHON SEBASTIAN	PROTECCION	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1096188182	OCHOA CARRILLO JUAN DAVID	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1127655755	MONTES PARRA CESAR ONAR	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128429470	ARANGO ESPINAL JORGE EMILIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193076337	ALTAMIRANDA LONDOÑO JULIAN STEVEN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO




Se certifica que en la fecha 2026-05-15, la empresa CONSORCIO CONECTA MAYORCA con documento de identificación NI901999695, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SEHA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 12486601	PEREZ NEGRETE JAMER ENRIQUE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
PT 5481664	MONTES FORTILLO ANGEL DIONICIO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70329174	ECHAVARRIA NEJIA ALEJANDRO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70421223	MONTAYA VASQUEZ WILMAR FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70421223	MONTAYA VASQUEZ WILMAR FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70421223	MONTAYA VASQUEZ WILMAR FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70421223	MONTAYA VASQUEZ WILMAR FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70932073	VELASQUEZ RIVERA OTONIEL DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71215420	YERPEZ CASTRO HUMBERTO HIRVAN	COLFONDOS	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 72153375	DEL CAMPO MARTELO WILLIAM	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74180099	CARDENAS CHAPARRO GEOVANNY YAIR	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 76006086	RUIZ MUÑOZ YOHAN ENRIQUE	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 78303055	DORIA HERNANDEZ JORGE LUIS	PROTECCION	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 81180240	VEGA ARDILA ANDELFO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 91523846	CORONEL PABON FREDY ARMANDO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98478799	OCHOA TORRES JESUS MARIA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 86510281	FIGUEROA BERMUDEZ FRANCISCO FIDEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98810281	FIGUEROA BERMUDEZ FRANCISCO FIDEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO



Certificación Bancaria



Señores


CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/04/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefania Niño Piza

 **Bancolombia**
