



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.780,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	\$ 172.969.667.780,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	24%
% DE AVANCE ACUMULADO:	40%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACOMULADO	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE		
1.1	CANCHA																	
1.1.1	PRELIMINARES																	
1.1.1.1	ALQUILER BAÑO PORTATIL	MES	18,00	\$	1.228.800,00	\$	1.597.440,00	\$	28.753.920,00	32,00	\$	51.118.080,00	8,00	\$	12.779.520,00	16,00	\$	25.559.040,00
1.1.1.2	TRAZADO, REPUNTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.894,57	\$	3.617,00	\$	4.702,00	\$	46.524.288,00	10.613,38	\$	49.904.107,12	10.613,38	\$	49.904.107,12	0,00	\$	-
1.1.1.3	DEMOLUCIÓN DE CANAL PERIMETRAL	ML	808,00	\$	48.153,00	\$	62.599,00	\$	50.579.992,00	510,00	\$	31.925.490,00	510,00	\$	31.925.490,00	0,00	\$	-
1.1.1.4	DEMOLUCIÓN DE ASFALTO	M2	4.484,00	\$	18.161,00	\$	23.609,00	\$	105.862.756,00	4.935,05	\$	116.511.591,11	4.935,05	\$	116.511.591,11	0,00	\$	-
1.1.1.5	DESMANTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR A 20 KM	M2	7.382,90	\$	11.140,00	\$	14.482,00	\$	106.919.158,00	0,00	\$	-	-	\$	-	0,00	\$	-
1.1.1.6	RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLUCIÓN DE REGISTROS	GLB	1,00	\$	24.000.000,00	\$	31.200.000,00	\$	31.200.000,00	1,00	\$	31.200.000,00	1,00	\$	31.200.000,00	0,00	\$	-
1.1.1.7	RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE	GLB	1,00	\$	14.400.000,00	\$	18.720.000,00	\$	18.720.000,00	1,00	\$	18.720.000,00	1,00	\$	18.720.000,00	0,00	\$	-
1.1.1.8	RETIRO RIEGOS ELÉCTRICAS EXISTENTES	GLB	1,00	\$	9.600.000,00	\$	12.480.000,00	\$	12.480.000,00	1,00	\$	12.480.000,00	1,00	\$	12.480.000,00	0,00	\$	-
1.1.1.9	DEMOLUCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	188,80	\$	284.385,00	\$	369.701,00	\$	69.799.549,00	2.147,21	\$	793.826.053,91	2.147,21	\$	793.826.053,91	0,00	\$	-
1.1.1.10	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO	M3	10,00	\$	41.624,00	\$	54.111,00	\$	541.110,00	171.887,66	\$	9.301.013.007,76	106.964,18	\$	5.787.938.547,24	64.923,48	\$	3.513.074.460,52
1.1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA																	
1.1.2.1	EXCAVACIÓN A MACOLINA	M3	39.250,40	\$	17.667,00	\$	22.967,00	\$	901.463.937,00	68.919,22	\$	1.582.867.816,96	41.392,18	\$	950.654.136,51	27.527,05	\$	632.213.680,45
1.1.2.2	RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RIO)	M3	2.473,64	\$	179.215,00	\$	232.980,00	\$	576.308.647,20	2.473,64	\$	576.308.647,20	-	\$	-	2.473,64	\$	576.308.647,20
1.1.2.3	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	1.990,42	\$	299.970,00	\$	389.961,00	\$	776.186.174,00	3.545,16	\$	1.382.473.943,78	3.545,16	\$	1.382.473.943,78	0,00	\$	-
1.1.2.4	ADICUACIÓN SUBASANTE	M2	9.894,57	\$	3.500,00	\$	45.020.294,00	\$	45.020.294,00	10.447,27	\$	47.535.055,75	10.447,27	\$	47.535.055,75	0,00	\$	-
1.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100	M2	9.894,57	\$	14.515,00	\$	18.870,00	\$	186.710.536,00	9.894,57	\$	186.710.535,90	-	\$	-	7.992,00	\$	150.809.040,00
1.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030	M2	7.992,00	\$	17.857,00	\$	23.214,00	\$	185.526.288,00	0,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
1.1.2.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD-SEMIJA	M2	7.992,00	\$	40.620,00	\$	52.806,00	\$	422.025.552,00	7.992,00	\$	422.025.552,00	-	\$	-	-	\$	-
1.1.2.8	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2	7.992,00	\$	335.808,00	\$	436.550,00	\$	3.488.907.600,00	7.992,00	\$	3.488.907.600,00	-	\$	-	-	\$	-
1.1.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIÉTERILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM	M2	1.902,57	\$	116.117,00	\$	150.952,00	\$	287.196.747,00	1.902,57	\$	287.196.746,64	-	\$	-	-	\$	-
1.1.2.10	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, DEMARCACIÓN Y ENTREGA FINAL	MES	4,00	\$	33.382.212,00	\$	43.396.876,00	\$	173.587.504,00	4,00	\$	173.587.504,00	-	\$	-	-	\$	-
1.1.2.11	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	739.588,89	\$	1.768,00	\$	2.298,00	\$	1.699.575.269,00	1.379.172,78	\$	3.169.339.037,78	860.668,49	\$	1.977.816.196,80	518.504,28	\$	1.191.522.840,97
1.1.3	RIEGOS HIDROSANTARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)																	
	SISTEMA DE DRENAJE																	
1.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12"	ML	2.462,39	\$	148.231,00	\$	192.700,00	\$	474.502.553,00	2.750,00	\$	529.925.000,00	-	\$	-	2.750,00	\$	529.925.000,00
1.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12"	ML	8,00	\$	270.496,00	\$	351.645,00	\$	2.813.160,00	0,00	\$	-	-	\$	-	0,00	\$	-
1.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10"	ML	288,00	\$	223.185,00	\$	290.141,00	\$	83.560.608,00	288,00	\$	83.560.608,00	-	\$	-	179,00	\$	51.935.239,00
1.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8"	ML	70,00	\$	140.225,00	\$	182.293,00	\$	12.760.510,00	1.399,00	\$	255.027.907,00	-	\$	-	1.399,00	\$	255.027.907,00
1.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6"	ML	350,00	\$	114.169,00	\$	148.420,00	\$	51.947.000,00	350,00	\$	51.947.000,00	-	\$	-	350,00	\$	51.947.000,00
1.1.3.6	CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	13,00	\$	1.291.699,00	\$	1.679.209,00	\$	21.829.717,00	13,00	\$	21.829.717,00	-	\$	-	4,00	\$	6.716.836,00
1.1.3.7	CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO DOBLE, PARETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS	UN	1,00	\$	2.219.064,00	\$	2.884.783,00	\$	2.884.783,00	1,00	\$	2.884.783,00	-	\$	-	1,00	\$	2.884.783,00
1.1.3.8	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	219,60	\$	299.970,00	\$	389.961,00	\$	85.635.436,00	1.776,25	\$	692.666.561,49	-	\$	-	1.776,25	\$	692.666.561,49
1.1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO	ML	396,00	\$	946.601,00	\$	1.230.581,00	\$	487.310.076,00	396,00	\$	487.310.076,00	-	\$	-	396,00	\$	487.310.076,00
	SISTEMA DE RIEGO																	
1.1.3.10	TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	313,00	\$	211.890,00	\$	274.807,00	\$	31.062.181,00	313,00	\$	31.062.181,00	-	\$	-	313,00	\$	31.062.181,00
1.1.3.11	TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	314,00	\$	131.253,00	\$	170.629,00	\$	33.577.596,00	314,00	\$	33.577.596,00	-	\$	-	314,00	\$	33.577.596,00
1.1.3.12	TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	313,00	\$	77.306,00	\$	100.498,00	\$	31.455.874,00	313,00	\$	31.455.874,00	-	\$	-	313,00	\$	31.455.874,00
1.1.3.13	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	122,00	\$	49.630,00	\$	64.519,00	\$	7.871.318,00	122,00	\$	7.871.318,00	-	\$	-	122,00	\$	7.871.318,00
1.1.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPIRADOR DE ROTOR POP UP R-17-21 METROS, INCLUYE SWING-JOINT (BRAZO ARTICULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	40,00	\$	1.195.776,00	\$	1.554.509,00	\$	62.180.360,00	40,00	\$	62.180.360,00	-	\$	-	40,00	\$	62.180.360,00
1.1.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE CAJA DE CONTROL RECTANGULAR	UN	8,00	\$	3.169.882,00	\$	4.120.847,00	\$	32.966.776,00	8,00	\$	32.966.776,00	-	\$	-	8,00	\$	32.966.776,00
1.1.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 ESTACIONES SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y TOTALIZADOR INDUSTRIAL SEGÚN DISEÑO	UN	1,00	\$	7.358.515,00	\$	9.566.070,00	\$	9.566.070,00	1,00	\$	9.566.070,00	-	\$	-	1,00	\$	9.566.070,00
1.1.3.17	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPIRCERO 10HP MOTOR THFAISKO 220 V CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA EN MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M)	UN	1,00	\$	99.097.344,00	\$	128.826.547,00	\$	128.826.547,00	1,00	\$	128.826.547,00	-	\$	-	1,00	\$	128.826.547,00



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	\$ 172.969.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	24%
% DE AVANCE ACUMULADO:	40%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACOMULADO	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.1.3.18	TANQUE HORIZONTAL (BWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8.000 GALONES, DE UN DIAMETRO DE 2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO (FRPV), EL CUA CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE DE INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN FRPV Y 12 TORNILLOS DE SUJECIÓN. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (INCLUYE OBRA CIVIL)	UN	1,00	\$ 152.256.000,00	\$ 197.932.800,00	\$ 197.932.800,00	1,00	\$ 197.932.800,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 197.932.800,00
1.1.4	OBRERALES EXTERIORES			\$ -	\$ -											
	CANALIZACIÓN			\$ -	\$ -											
1.1.4.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	9.456,53	\$ 17.667,00	\$ 22.967,00	\$ 217.188.125,00	9.456,53	\$ 217.188.124,51		\$ -		\$ -		\$ -	9.456,53	\$ 217.188.124,51
1.1.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	862,31	\$ 27.610,00	\$ 35.893,00	\$ 30.950.893,00	862,31	\$ 30.950.892,83		\$ -		\$ -		\$ -	862,31	\$ 30.950.892,83
1.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	543,46	\$ 229.934,00	\$ 298.914,00	\$ 162.447.802,00	543,46	\$ 162.447.802,44		\$ -		\$ -		\$ -	543,46	\$ 162.447.802,44
1.1.4.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA	M3	726,73	\$ 98.266,00	\$ 127.746,00	\$ 92.836.851,00	726,73	\$ 92.836.850,58		\$ -		\$ -		\$ -	726,73	\$ 92.836.850,58
1.1.4.5	RELLENO CON MATERIAL SITO	M3	7.238,92	\$ 29.641,00	\$ 38.533,00	\$ 278.937.304,00	7.238,92	\$ 278.937.304,36		\$ -		\$ -		\$ -	7.238,92	\$ 278.937.304,36
1.1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	150,00	\$ 67.210,00	\$ 87.373,00	\$ 13.105.950,00	150,00	\$ 13.105.950,00		\$ -		\$ -		\$ -	150,00	\$ 13.105.950,00
1.1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6")	ML	356,00	\$ 81.126,00	\$ 105.464,00	\$ 37.545.184,00	356,00	\$ 37.545.184,00		\$ -		\$ -		\$ -	356,00	\$ 37.545.184,00
1.1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8")	ML	940,00	\$ 118.812,00	\$ 154.456,00	\$ 145.188.640,00	940,00	\$ 145.188.640,00		\$ -		\$ -		\$ -	940,00	\$ 145.188.640,00
1.1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10")	ML	1.633,94	\$ 192.963,00	\$ 250.852,00	\$ 409.877.117,00	1.633,94	\$ 409.877.116,88		\$ -		\$ -		\$ -	1.633,94	\$ 409.877.116,88
1.1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14")	ML	611,70	\$ 305.774,00	\$ 397.506,00	\$ 243.154.420,00	611,70	\$ 243.154.420,20		\$ -		\$ -		\$ -	611,70	\$ 243.154.420,20
1.1.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.10 SEGÚN DISEÑO	ML	805,60	\$ 946.601,00	\$ 1.230.581,00	\$ 991.356.054,00	805,60	\$ 991.356.053,60		\$ -		\$ -		\$ -	805,60	\$ 991.356.053,60
1.1.4.12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	M3	61,99	\$ 1.488.269,00	\$ 1.934.750,00	\$ 119.935.153,00	61,99	\$ 119.935.152,50		\$ -		\$ -		\$ -	61,99	\$ 119.935.152,50
1.1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA	UN	85,00	\$ 694.211,00	\$ 902.474,00	\$ 76.710.290,00	85,00	\$ 76.710.290,00		\$ -		\$ -		\$ -	85,00	\$ 76.710.290,00
1.1.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA	UN	95,00	\$ 964.717,00	\$ 1.254.132,00	\$ 119.142.540,00	95,00	\$ 119.142.540,00		\$ -		\$ -		\$ -	95,00	\$ 119.142.540,00
1.1.4.15	CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	75,00	\$ 1.291.699,00	\$ 1.679.209,00	\$ 125.940.675,00	75,00	\$ 125.940.675,00		\$ -		\$ -		\$ -	75,00	\$ 125.940.675,00
1.1.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ML	200,00	\$ 365.015,00	\$ 474.520,00	\$ 94.904.000,00	200,00	\$ 94.904.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	200,00	\$ 94.904.000,00
1.1.4.17	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	12.400,00	\$ 7.579,00	\$ 9.851,00	\$ 122.152.400,00	391.591,51	\$ 3.857.567.939,07	391.591,51	\$ 3.857.567.939,07		\$ -	391.591,51	\$ 3.857.567.939,07	0,00	\$ -
1.1.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100	M2	1.764,68	\$ 14.515,00	\$ 18.870,00	\$ 33.299.512,00	1.764,68	\$ 33.299.511,60		\$ -		\$ -		\$ -	1.764,68	\$ 33.299.511,60
1.1.4.19	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1.45X1.45X1.80 MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1.50 MTS	UN	7,00	\$ 4.168.655,00	\$ 5.419.252,00	\$ 37.934.764,00	7,00	\$ 37.934.764,00		\$ -		\$ -		\$ -	7,00	\$ 37.934.764,00
1.1.4.20	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	39.814,04	\$ 1.768,00	\$ 2.298,00	\$ 91.492.664,00	39.814,04	\$ 91.492.663,92		\$ -		\$ -		\$ -	39.814,04	\$ 91.492.663,92
	OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO			\$ -	\$ -											
1.1.4.21	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	5.119,20	\$ 3.617,00	\$ 4.702,00	\$ 24.070.478,00	5.119,20	\$ 24.070.478,40		\$ -		\$ -		\$ -	5.119,20	\$ 24.070.478,40
1.1.4.22	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	3.354,00	\$ 23.113,00	\$ 30.047,00	\$ 100.777.638,00	3.354,00	\$ 100.777.638,00		\$ -		\$ -		\$ -	3.354,00	\$ 100.777.638,00
1.1.4.23	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	357,00	\$ 26.077,00	\$ 33.900,00	\$ 12.102.300,00	357,00	\$ 12.102.300,00		\$ -		\$ -		\$ -	357,00	\$ 12.102.300,00
1.1.4.24	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO	M2	100,00	\$ 37.975,00	\$ 49.368,00	\$ 4.936.800,00	259,60	\$ 12.815.932,80	37,22	\$ 1.837.674,43	222,38	\$ 10.978.258,37	259,60	\$ 12.815.932,80	0,00	\$ -
1.1.4.25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	3.564,42	\$ 114.768,00	\$ 149.198,00	\$ 531.804.335,00	3.564,42	\$ 531.804.335,16		\$ -		\$ -		\$ -	3.564,42	\$ 531.804.335,16
1.1.4.26	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	200,00	\$ 155.727,00	\$ 202.445,00	\$ 40.489.000,00	200,00	\$ 40.489.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	200,00	\$ 40.489.000,00
1.1.4.27	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA	M3	455,04	\$ 98.746,00	\$ 127.746,00	\$ 58.129.540,00	455,04	\$ 58.129.539,84		\$ -		\$ -		\$ -	455,04	\$ 58.129.539,84
1.1.4.28	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	3.354,00	\$ 84.562,00	\$ 109.931,00	\$ 368.708.574,00	3.354,00	\$ 368.708.574,00		\$ -		\$ -		\$ -	3.354,00	\$ 368.708.574,00
1.1.4.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO	M2	3.354,00	\$ 3.361,00	\$ 4.369,00	\$ 14.653.626,00	3.354,00	\$ 14.653.626,00		\$ -		\$ -		\$ -	3.354,00	\$ 14.653.626,00
1.1.4.30	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	300,00	\$ 239.467,00	\$ 311.307,00	\$ 93.392.100,00	300,00	\$ 93.392.100,00		\$ -		\$ -		\$ -	300,00	\$ 93.392.100,00
1.1.4.31	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	3.054,00	\$ 184.740,00	\$ 240.162,00	\$ 733.454.748,00	3.054,00	\$ 733.454.748,00		\$ -		\$ -		\$ -	3.054,00	\$ 733.454.748,00
1.1.4.32	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	848,00	\$ 79.492,00	\$ 103.340,00	\$ 87.632.320,00	848,00	\$ 87.632.320,00		\$ -		\$ -		\$ -	848,00	\$ 87.632.320,00
1.1.4.33	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1.272,00	\$ 101.436,00	\$ 131.867,00	\$ 167.734.824,00	1.272,00	\$ 167.734.824,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.272,00	\$ 167.734.824,00
1.1.4.34	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	357,00	\$ 270.725,00	\$ 351.943,00	\$ 125.643.651,00	357,00	\$ 125.643.651,00		\$ -		\$ -		\$ -	357,00	\$ 125.643.651,00
1.1.4.35	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	M3	30,00	\$ 1.488.269,00	\$ 1.934.750,00	\$ 58.042.500,00	30,00	\$ 58.042.500,00		\$ -		\$ -		\$ -	30,00	\$ 58.042.500,00
1.1.4.36	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	12.549,60	\$ 7.579,00	\$ 9.851,00	\$ 123.626.109,60	12.549,60	\$ 12.549.60		\$ -		\$ -		\$ -	12.549,60	\$ 123.626.109,60
1.1.4.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	130,00	\$ 46.075,00	\$ 59.898,00	\$ 7.786.740,00	130,00	\$ 7.786.740,00		\$ -		\$ -		\$ -	130,00	\$ 7.786.740,00



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.780,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	\$ 172.969.667.780,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	24%
% DE AVANCE ACUMULADO:	40%


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACOMULADO	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.1.4.38	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUDE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	130,00	\$ 375.935,00	\$ 488.716,00	\$ 63.533.080,00	130,00	\$ 63.533.080,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 63.533.080,00	
1.1.4.39	REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	130,00	\$ 76.568,00	\$ 99.538,00	\$ 12.939.940,00	130,00	\$ 12.939.940,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 12.939.940,00	
1.1.4.40	REALIZO DE VIVIENDAS + REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	\$ 76.800.000,00	\$ 99.840.000,00	\$ 99.840.000,00	1,00	\$ 99.840.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 99.840.000,00	
1.1.4.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10	ML	424,00	\$ 64.035,00	\$ 83.246,00	\$ 35.296.304,00	424,00	\$ 35.296.304,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424,00	\$ 35.296.304,00	
1.1.4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10	ML	520,00	\$ 18.273,00	\$ 23.755,00	\$ 12.352.600,00	520,00	\$ 12.352.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00	\$ 12.352.600,00	
1.1.4.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM	UN	130,00	\$ 213.486,00	\$ 277.532,00	\$ 36.079.160,00	130,00	\$ 36.079.160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 36.079.160,00	
1.1.4.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	130,00	\$ 236.868,00	\$ 307.928,00	\$ 40.030.640,00	130,00	\$ 40.030.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 40.030.640,00	
1.1.4.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8")	ML	424,00	\$ 118.812,00	\$ 154.456,00	\$ 65.489.344,00	424,00	\$ 65.489.344,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424,00	\$ 65.489.344,00	
1.1.4.46	ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	112,00	\$ 48.300,00	\$ 62.790,00	\$ 7.032.480,00	112,00	\$ 7.032.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,00	\$ 7.032.480,00	
1.1.4.47	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45xH=1,80 MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS	UN	14,00	\$ 4.168.655,00	\$ 5.419.252,00	\$ 75.869.528,00	14,00	\$ 75.869.528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ 75.869.528,00	
1.1.4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO	M3	455,04	\$ 229.934,00	\$ 298.914,00	\$ 136.017.827,00	455,04	\$ 136.017.826,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,04	\$ 136.017.826,56	
1.1.4.49	DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	474,00	\$ 9.819,00	\$ 12.765,00	\$ 6.050.610,00	474,00	\$ 6.050.610,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 474,00	\$ 6.050.610,00	
1.1.4.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24"	UN	14,00	\$ 909.845,00	\$ 1.182.799,00	\$ 16.559.186,00	14,00	\$ 16.559.186,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ 16.559.186,00	
1.1.4.51	RENVELACIÓN Y RECONSTRUCCÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H=1M (6-20CM	UN	15,00	\$ 569.161,00	\$ 739.909,00	\$ 11.098.635,00	15,00	\$ 11.098.635,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 11.098.635,00	
1.1.4.52	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO 0.70 X 0.70 H=1M (INCLUDE TAPA)	UN	130,00	\$ 751.254,00	\$ 976.630,00	\$ 126.961.900,00	130,00	\$ 126.961.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 126.961.900,00	
1.1.4.53	TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS	ML	474,00	\$ 2.004.852,00	\$ 2.606.308,00	\$ 1.235.389.992,00	474,00	\$ 1.235.389.992,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 474,00	\$ 1.235.389.992,00	
1.1.5	DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO			\$ -	\$ -	\$ -										
1.1.5.1	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA CANCHA DE FÚTBOL PROFESIONAL, INCLUDE MALLAS Y SOPORTES DE ANCLAJE EN LAS BASES	UN	2,00	\$ 4.768.751,00	\$ 6.199.376,00	\$ 12.398.752,00	2,00	\$ 12.398.752,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 12.398.752,00	
1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTE PARA JUGADORES Y ARBITROS	UN	1,00	\$ 103.882.836,00	\$ 135.047.687,00	\$ 135.047.687,00	1,00	\$ 135.047.687,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	\$ 135.047.687,00	
1.1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL	UN	4,00	\$ 412.957,00	\$ 536.844,00	\$ 2.147.376,00	4,00	\$ 2.147.376,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 2.147.376,00	
1.1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRACTIL - EN ALUMINIO - MANUAL, INCLUDE SILLETERÍA	M2	544,00	\$ 3.745.046,00	\$ 4.868.560,00	\$ 2.648.496.640,00	544,00	\$ 2.648.496.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544,00	\$ 2.648.496.640,00	
1.2	GRADERÍAS			\$ -	\$ -	\$ -										
1.2.1	PRELIMINARES			\$ -	\$ -	\$ -										
1.2.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.761,00	\$ 3.617,00	\$ 4.702,00	\$ 45.896.222,00	19.295,09	\$ 90.725.499,07	9.537,00	\$ 44.842.974,00	9.758,09	\$ 45.882.525,07	19.295,09	\$ 90.725.499,07	0,00	\$ -
1.2.1.2	DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA	M2	1.525,00	\$ 23.628,00	\$ 30.716,00	\$ 46.841.900,00	1.676,90	\$ 51.507.660,40	1.525,00	\$ 46.841.900,00	151,90	\$ 4.665.760,40	1.676,90	\$ 51.507.660,40	0,00	\$ -
1.2.1.3	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M., INCLUDE RETIRO DE MATERIAL	ML	500,00	\$ 44.855,00	\$ 58.312,00	\$ 29.156.000,00	540,28	\$ 31.504.807,36	540,28	\$ 31.504.807,36	\$ -	\$ 540,28	\$ 31.504.807,36	0,00	\$ -	
1.2.1.4	DEMOLUCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	5.330,00	\$ 284.385,00	\$ 369.701,00	\$ 1.970.506.330,00	12.507,83	\$ 4.624.156.486,15	12.507,83	\$ 4.624.156.486,15	\$ -	\$ 12.507,83	\$ 4.624.156.486,15	0,00	\$ -	
1.2.1.5	DEMOLUCIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.517,87	\$ 26.077,00	\$ 33.900,00	\$ 51.455.793,00	1.517,87	\$ 51.455.793,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.517,87	\$ 51.455.793,00	
1.2.1.6	CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA AISLAMIENTO DE DEMOLUCIÓN	ML	2.827,00	\$ 47.904,00	\$ 62.275,00	\$ 176.051.425,00	2.827,00	\$ 176.051.425,00	776,15	\$ 48.334.741,25	\$ -	\$ 776,15	\$ 48.334.741,25	2.050,85	\$ 127.716.683,75	
1.2.1.7	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	117.260,00	\$ 1.768,00	\$ 2.298,00	\$ 209.463.480,00	243.902,64	\$ 560.488.276,48	243.902,64	\$ 560.488.276,48	\$ -	\$ 243.902,64	\$ 560.488.276,48	0,00	\$ -	
1.2.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			\$ -	\$ -	\$ -										
1.2.2.1	EXCAVACIÓN A MANO/MAQUINA	M3	35.972,30	\$ 17.667,00	\$ 22.967,00	\$ 826.175.814,00	66.336,67	\$ 1.523.554.151,37	53.407,20	\$ 1.226.603.162,40	12.929,47	\$ 296.951.028,97	66.336,67	\$ 1.523.554.151,37	0,00	\$ -
1.2.2.2	ADECUACIÓN SUBRASANTE	M2	9.761,00	\$ 3.500,00	\$ 4.550,00	\$ 44.412.550,00	9.761,00	\$ 44.412.550,00	\$ -	\$ -	9.758,09	\$ 44.399.295,85	2,91	\$ 44.399.295,85	13.254,15	\$ -
1.2.2.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	2.928,30	\$ 114.768,00	\$ 149.198,00	\$ 436.896.503,00	2.928,30	\$ 436.896.503,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.928,30	\$ 436.896.503,40	
1.2.2.4	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	791.390,60	\$ 1.768,00	\$ 2.298,00	\$ 1.818.615.599,00	1.218.392,37	\$ 2.799.865.677,64	985.662,00	\$ 2.265.051.376,00	232.730,37	\$ 534.814.401,64	1.218.392,37	\$ 2.799.865.677,64	0,00	\$ -
1.2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS															
1.2.3.1	PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI E 10 cm	M2	5.890,00	\$ 147.171,00	\$ 191.322,00	\$ 1.126.886.580,00	5.890,00	\$ 1.126.886.580,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.890,00	\$ 1.126.886.580,00	
1.2.3.2	ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL	M2	12.425,00	\$ 25.438,00	\$ 33.069,00	\$ 410.882.325,00	12.425,00	\$ 410.882.325,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.425,00	\$ 410.882.325,00	
1.2.3.3	ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4"	UN	17.420,00	\$ 38.366,00	\$ 49.876,00	\$ 868.839.920,00	17.420,00	\$ 868.839.920,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.420,00	\$ 868.839.920,00	
1.2.3.4	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	189.000,00	\$ 7.578,00	\$ 9.851,00	\$ 1.861.839.000,00	189.000,00	\$ 1.861.839.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.000,00	\$ 1.861.839.000,00	
1.2.3.5	REMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS	KG	14.638,00	\$ 9.412,00	\$ 12.236,00	\$ 179.110.568,00	14.638,00	\$ 179.110.568,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.638,00	\$ 179.110.568,00	
1.2.3.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTEAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GRISO GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUDE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO	KG	56.890,00	\$ 25.589,00	\$ 33.266,00	\$ 1.892.502.740,00	56.890,00	\$ 1.892.502.740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.890,00	\$ 1.892.502.740,00	
1.2.3.7	RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUDE RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	ML	1.550,00	\$ 409.459,00	\$ 532.297,00	\$ 825.060.350,00	1.550,00	\$ 825.060.350,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.550,00	\$ 825.060.350,00	
1.2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	UN	692,00	\$ 28.299,00	\$ 36.789,00	\$ 25.457.988,00	692,00	\$ 25.457.988,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692,00	\$ 25.457.988,00	
1.2.3.9	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	1.759,00	\$ 331.556,00	\$ 431.023,00	\$ 758.169.457,00	1.759,00	\$ 758.169.457,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.759,00	\$ 758.169.457,00	
1.2.3.10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 PRIMER, SIKABOND 40, SIKAFLO, SIKAGET NC FORMALETIA PARA ASEGUARAMIENTO Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA	M3	150,00	\$ 3.400.095,00	\$ 4.420.124,00	\$ 663.018.600,00	150,00	\$ 663.018.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,00	\$ 663.018.600,00	
1.2.3.11	RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUDE DEMOLUCIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO	M2	1.320,00	\$ 359.595,00	\$ 467.474,00	\$ 617.065.680,00	1.320,00	\$ 617.065.680,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.320,00	\$ 617.065.680,00	
1.2.3.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIQUETA ESTRUCTURAL EN CONCRETO CON MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON ESPESOR HASTA 0,05m. INCLUDE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO EXPUESTO Y MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA	ML	1.256,00	\$ 483.598,00	\$ 628.677,00	\$ 789.618.312,00	1.256,00	\$ 789.618.312,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.256,00	\$ 789.618.312,00	
1.2.4	CEMENTACIÓN EN OBRA			\$ -	\$ -	\$ -										



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	\$ 172.969.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	24%
% DE AVANCE ACUMULADO:	40%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACOMULADO	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.2.4.1	PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN	M2	5.772,00	\$ 10.915,00	\$ 14.190,00	\$ 81.904.680,00	5.772,00	\$ 81.904.680,00	\$ -	\$ 3.448,43	\$ 48.933.203,68	\$ 3.448,43	\$ 48.933.203,68	2.323,57	\$ 32.971.476,32	
1.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO NEGRO CAL 6	M2	5.772,00	\$ 5.610,00	\$ 7.293,00	\$ 42.095.196,00	5.772,00	\$ 42.095.196,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.772,00	\$ 42.095.196,00	
1.2.4.3	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN	M2	1.332,00	\$ 41.428,00	\$ 53.856,00	\$ 71.736.192,00	1.332,00	\$ 71.736.192,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.332,00	\$ 71.736.192,00	
1.2.4.4	FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN	M2	1.243,20	\$ 91.187,00	\$ 118.543,00	\$ 147.372.658,00	1.243,20	\$ 147.372.657,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.243,20	\$ 147.372.657,60	
1.2.4.5	CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA	UN	250,00	\$ 54.465,00	\$ 70.805,00	\$ 17.701.250,00	250,00	\$ 17.701.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	250,00	\$ 17.701.250,00	
1.2.4.6	CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA	UN	55,00	\$ 80.196,00	\$ 104.255,00	\$ 5.734.025,00	55,00	\$ 5.734.025,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	55,00	\$ 5.734.025,00	
1.2.5	CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA			\$ -	\$ -											
1.2.5.1	CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40X0.40X0.60M) MUROS DE CONTENCIÓN, VIGAS DE CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO F' C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A LA VISTA, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 220 KG/M3 DE CONCRETO	UN	1.771,00	\$ 336.807,00	\$ 437.849,00	\$ 775.430.579,00	1,00	\$ 437.849,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 437.849,00	
1.2.6	ESCALERA CONSTRUIDA EN SITO			\$ -	\$ -											
1.2.6.1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	20.988,00	\$ 7.578,00	\$ 9.851,00	\$ 206.752.788,00	20.988,00	\$ 206.752.788,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20.988,00	\$ 206.752.788,00	
1.2.6.2	ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DETALLE SEGÚN DISEÑOS	M3	104,94	\$ 2.395.784,00	\$ 3.114.519,00	\$ 326.837.624,00	104,94	\$ 326.837.623,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	104,94	\$ 326.837.623,86	
1.2.7	PLASMINO PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS			\$ -	\$ -											
1.2.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON LÁMINA PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO	ML	520,00	\$ 198.539,00	\$ 258.101,00	\$ 134.212.520,00	1,00	\$ 258.101,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 258.101,00	
1.2.8	ZAPATAS PREFABRICADAS			\$ -	\$ -											
1.2.8.1	ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F' C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	1.168,40	\$ 6.730.087,00	\$ 8.749.113,00	\$ 10.222.463.629,00	817,88	\$ 7.155.724.540,44	195,83	\$ 1.713.295.053,23	71,63	\$ 626.655.218,63	267,45	\$ 2.339.950.271,85	550,43	\$ 4.815.774.268,59
1.2.9	VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS			\$ -	\$ -											
1.2.9.1	VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F' C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA VIGAS DE 1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	473,46	\$ 6.846.972,00	\$ 8.901.064,00	\$ 4.214.297.761,00	331,42	\$ 2.950.008.433,01	161,57	\$ 1.438.109.306,22	-	\$ 161,57	\$ 1.438.109.306,22	169,86	\$ 1.511.899.126,78	
1.2.10	COLUMNAS PREFABRICADAS			\$ -	\$ -											
1.2.10.1	COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F' C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA COLUMNAS DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	924,49	\$ 7.119.467,00	\$ 9.255.307,00	\$ 8.556.438.768,00	647,14	\$ 5.989.507.137,90	190,88	\$ 1.766.629.861,89	-	\$ 190,88	\$ 1.766.629.861,89	456,27	\$ 4.222.877.276,01	
1.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO			\$ -	\$ -											
1.2.11.1	MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F' C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE ALTURA Y 1.80 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	1.780,14	\$ 7.116.343,00	\$ 9.251.246,00	\$ 16.468.513.054,00	0,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
1.2.12	VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS			\$ -	\$ -											
1.2.12.1	VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F' C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	334,31	\$ 7.476.709,00	\$ 9.719.722,00	\$ 3.249.400.262,00	234,02	\$ 2.274.580.183,27	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	234,02	\$ 2.274.580.183,27	
1.2.12.2	VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F' C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE 1/4 FPU =19.000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	703,81	\$ 8.205.804,00	\$ 10.667.545,00	\$ 7.507.924.846,00	492,67	\$ 5.255.547.392,52	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	492,67	\$ 5.255.547.392,52	
1.2.13	LOSAS GRADAS			\$ -	\$ -											
1.2.13.1	LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F' C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE 1/4 FPU =19.000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	1.519,44	\$ 7.035.523,00	\$ 9.146.180,00	\$ 13.897.071.739,00	1.063,61	\$ 9.727.950.217,44	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	1.063,61	\$ 9.727.950.217,44	



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADO	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE		
12.13.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS CON UN ANCHO DE MAXIMO 0.5 CM, A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO	ML	3,100.00	\$	81.733.00	\$	106,253.00	\$	329,384,300.00	2,170.00	\$	230,569,010.00	\$	-	2,170.00	\$	230,569,010.00	
12.15	MAMPOSTERIA, PANELES Y ACABADOS				\$													
12.15.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPa, REFUEZO CENTRAL DE 5/8" A CADA 1.2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 4MM HORIZONTAL @ 3 HILADAS	M2	1,606.50	\$	184,668.00	\$	240,068.00	\$	385,669,242.00	1,606.50	\$	385,669,242.00	\$	-	1,606.50	\$	385,669,242.00	
12.15.2	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAJO O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	3,213.00	\$	22,672.00	\$	29,474.00	\$	94,699,962.00	3,213.00	\$	94,699,962.00	\$	-	3,213.00	\$	94,699,962.00	
12.15.3	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	M2	6,190.98	\$	21,730.00	\$	28,249.00	\$	174,888,994.02	6,190.98	\$	174,888,994.02	\$	-	6,190.98	\$	174,888,994.02	
12.15.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETERIA NUEVA	UN	17,000.00	\$	190,657.00	\$	247,854.00	\$	4,213,518,000.00	17,000.00	\$	4,213,518,000.00	\$	-	17,000.00	\$	4,213,518,000.00	
12.15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	346.00	\$	357,203.00	\$	464,364.00	\$	160,669,944.00	346.00	\$	160,669,944.00	\$	-	346.00	\$	160,669,944.00	
12.15.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICOS SEGUN DISEÑO	ML	781.00	\$	146,515.00	\$	190,470.00	\$	148,757,070.00	781.00	\$	148,757,070.00	\$	-	781.00	\$	148,757,070.00	
12.15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS SEGUN DISEÑO	ML	308.74	\$	758,916.00	\$	986,591.00	\$	304,600,105.00	308.74	\$	304,600,105.34	\$	-	308.74	\$	304,600,105.34	
1.3	TUNELES DE ACCESO - VIENTO				\$													
1.3.1	PRELIMINARES				\$	-												
1.3.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACION	M2	1,906.88	\$	3,617.00	\$	4,702.00	\$	8,966,150.00	3,976.38	\$	18,696,938.76	5,250.00	\$	2,468,550.00	1,544.50	\$	7,262,239.00
1.3.1.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	500.00	\$	284,385.00	\$	369,701.00	\$	184,850,500.00	500.00	\$	184,850,500.00	\$	-	373.90	\$	138,232,033.47	
1.3.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA																	
1.3.2.1	EXCAVACION A MAQUINA	M3	5,456.00	\$	17,667.00	\$	22,967.00	\$	125,307,952.00	13,125.72	\$	301,458,430.37	2,892.96	\$	66,442,612.32	10,232.76	\$	235,015,818.05
1.3.2.2	ENTIBADO CONTINUO METALICO	M2	4,160.00	\$	58,140.00	\$	75,582.00	\$	314,421,120.00	4,160.00	\$	314,421,120.00	-	\$	2,376.00	\$	179,582,832.00	
1.3.2.3	EXCAVACION MANUAL	M2	1,091.20	\$	27,610.00	\$	35,893.00	\$	39,166,442.00	1,091.20	\$	39,166,442.00	\$	-	1,091.20	\$	39,166,442.00	
1.3.2.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	173.26	\$	114,768.00	\$	149,158.00	\$	85,350,328.00	841.44	\$	125,540,807.04	-	\$	841.44	\$	125,540,807.04	
1.3.2.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	171.62	\$	155,727.00	\$	202,445.00	\$	34,743,631.00	171.62	\$	34,743,631.00	-	\$	171.62	\$	34,743,631.00	
1.3.2.6	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	144,038.40	\$	1,768.00	\$	2,298.00	\$	331,000,240.00	263,134.13	\$	604,682,236.79	263,134.13	\$	604,682,236.79	0.00	\$	0.00
1.3.2.7	MANEJO DE AGUAS	DIA	100.00	\$	190,945.00	\$	248,229.00	\$	24,822,900.00	0.00	\$	-	-	\$	-	0.00	\$	-
1.3.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METAULICAS																	
1.3.3.1	SOLAJA EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	390.69	\$	164,108.00	\$	798,340.00	\$	152,235,454.60	390.69	\$	152,235,454.60	-	\$	48.56	\$	38,771,350.17	
1.3.3.2	CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TUNELES (PLACAS Y MUROS)	M3	1,890.00	\$	1,591,392.00	\$	2,068,810.00	\$	3,910,050,900.00	0.00	\$	-	152.87	\$	316,248,640.65	-152.87	\$	316,248,640.65
1.3.3.3	ACERO DE REFUEZO FIGURADO	KG	93,600.00	\$	7,578.00	\$	9,851.00	\$	922,053,000.00	367,584.02	\$	3,621,070,204.66	35,311.22	\$	347,850,858.17	332,272.80	\$	3,273,219,346.50
1.3.3.4	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KG	4,330.00	\$	25,589.00	\$	33,266.00	\$	144,041,780.00	4,330.00	\$	144,041,780.00	\$	-	4,330.00	\$	144,041,780.00	
1.3.4	SISTEMA DE DRENAJE				\$													
1.3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PERMEADURAS TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	832.00	\$	150,348.00	\$	195,452.00	\$	162,616,094.00	4,581.60	\$	895,482,883.20	-	\$	4,581.60	\$	895,482,883.20	
1.3.5	ACABADOS GENERALES				\$													
1.3.5.1	PREPARACION DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACION Y/O RESANES CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	4,160.00	\$	30,779.00	\$	40,013.00	\$	166,454,080.00	4,160.00	\$	166,454,080.00	\$	-	4,160.00	\$	166,454,080.00	
1.3.5.2	ESTUPO PLASTICO SOBRE MURO	M2	4,160.00	\$	24,876.00	\$	32,339.00	\$	134,530,240.00	4,160.00	\$	134,530,240.00	\$	-	4,160.00	\$	134,530,240.00	
1.3.5.3	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAJO O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	4,160.00	\$	22,672.00	\$	29,474.00	\$	122,611,840.00	4,160.00	\$	122,611,840.00	\$	-	4,160.00	\$	122,611,840.00	
1.3.5.4	PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1	M2	1,906.88	\$	24,655.00	\$	32,052.00	\$	61,119,317.76	1,906.88	\$	61,119,317.76	\$	-	1,906.88	\$	61,119,317.76	
1.3.5.5	PSO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO FLUIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 ON SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO	M2	1,906.88	\$	83,616.00	\$	108,701.00	\$	207,279,763.00	1,906.88	\$	207,279,762.88	\$	-	1,906.88	\$	207,279,762.88	
1.3.5.6	PINTURA EPOXICA PARA PSO	M2	15,178.88	\$	47,863.00	\$	62,222.00	\$	944,460,271.36	15,178.88	\$	944,460,271.36	\$	-	15,178.88	\$	944,460,271.36	
1.4	ADICUACION INTERNA				\$													
1.4.1	PRELIMINARES				\$	-												
1.4.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACION	M2	43,000.00	\$	3,617.00	\$	4,702.00	\$	202,186,000.00	43,000.00	\$	202,186,000.00	\$	-	43,000.00	\$	202,186,000.00	
1.4.1.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	4,000.00	\$	23,942.00	\$	31,125.00	\$	124,500,000.00	4,000.00	\$	124,500,000.00	\$	-	4,000.00	\$	124,500,000.00	
1.4.1.3	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	M2	25,100.00	\$	15,477.72	\$	25,100.00	\$	388,480,772.60	15,477.72	\$	388,480,772.60	\$	-	15,477.72	\$	388,480,772.60	
1.4.1.4	DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	312.00	\$	63,820.00	\$	61,120.00	\$	19,818,552.00	312.00	\$	19,818,552.00	\$	-	312.00	\$	19,818,552.00	
1.4.1.5	DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	300.00	\$	35,788.00	\$	46,524.00	\$	13,957,200.00	300.00	\$	13,957,200.00	\$	-	300.00	\$	13,957,200.00	
1.4.1.6	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,200.00	\$	21,775.00	\$	28,133.00	\$	33,975,600.00	1,200.00	\$	33,975,600.00	\$	-	1,200.00	\$	33,975,600.00	
1.4.1.7	DESMONTE DE DIVISORES METALICAS	M2	2,500.00	\$	15,733.00	\$	20,433.00	\$	25,566,250.00	2,500.00	\$	25,566,250.00	\$	-	2,500.00	\$	25,566,250.00	
1.4.1.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	350.00	\$	40,054.00	\$	52,070.00	\$	18,224,500.00	350.00	\$	18,224,500.00	\$	-	350.00	\$	18,224,500.00	
1.4.1.9	DESMONTE DE ESPEJOS	M2	850.00	\$	15,084.00	\$	19,609.00	\$	16,667,650.00	850.00	\$	16,667,650.00	\$	-	850.00	\$	16,667,650.00	
1.4.1.10	DESMONTE DE MISIONES	M2	100.00	\$	60,429.86	\$	78,558.00	\$	7,855,800.00	100.00	\$	7,855,800.00	\$	-	100.00	\$	7,855,800.00	
1.4.1.11	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA INCLUYE RETIRO	M2	9,500.00	\$	37,975.00	\$	49,368.00	\$	468,996,000.00	9,500.00	\$	468,996,000.00	\$	-	9,500.00	\$	468,996,000.00	
1.4.1.12	DEMOLICION DE PLACA DE PISO O PLANTILLA	M2	42,049.86	\$	18,663.00	\$	24,262.00	\$	1,020,213,703.32	42,049.86	\$	1,020,213,703.32	\$	-	42,049.86	\$	1,020,213,703.32	
1.4.1.13	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	3,930.00	\$	11,412.00	\$	14,836.00	\$	58,305,480.00	3,930.00	\$	58,305,480.00	\$	-	3,930.00	\$	58,305,480.00	
1.4.1.14	TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR A 15KM	GLB	1.00	\$	19,200.000.00	\$	24,960.000.00	\$	24,960.000.00	1.00	\$	24,960.000.00	\$	-	1.00	\$	24,960.000.00	
1.4.1.15	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	183,708.34	\$	1,768.00	\$	2,298.00	\$	422,161,765.00	183,708.34	\$	422,161,765.00	\$	-	183,708.34	\$	422,161,765.00	
1.4.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METAULICAS																	
1.4.2.1	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUEZO	M3	59.13	\$	2,308,039.00	\$	3,000,451.00	\$	177,416,668.00	59.13	\$	177,416,667.63	\$	-	59.13	\$	177,416,667.63	
1.4.2.2	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 11-22	M2	5,213.00	\$	140,410.00	\$	182,533.00	\$	951,544,529.00	5,213.00	\$	951,544,529.00	\$	-	5,213.00	\$	951,544,529.00	
1.4.2.3	ACERO DE REFUEZO FIGURADO	KG	18,256.00	\$	7,578.00	\$	9,851.00	\$	179,839,856.00	18,256.00	\$	179,839,856.00	\$	-	18,256.00	\$	179,839,856.00	



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.: LP-017-2025
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL: \$ 172.969.667.780,00
VALOR ADICIONAL No.1:
VALOR ACTUAL: \$ 172.969.667.780,00
PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES
CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026
PRORROGA No.01: -
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA: 01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 24%
% DE AVANCE ACUMULADO: 40%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACOMULADO	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.4.3	MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS				\$	-										
1.4.3.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE Ø= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SHADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 8MM HORIZONTAL @ 5 HILADAS	M2	5.231,00	\$ 184.668,00	\$ 240.068,00	\$ 1.255.795.708,00	5.231,00	\$ 1.255.795.708,00		\$ -		\$ -		\$ -	5.231,00	\$ 1.255.795.708,00
1.4.3.2	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	10.462,00	\$ 28.473,00	\$ 37.015,00	\$ 387.250.930,00	10.462,00	\$ 387.250.930,00		\$ -		\$ -		\$ -	10.462,00	\$ 387.250.930,00
1.4.3.3	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E= 0.05 MTS	M2	3.589,00	\$ 51.071,00	\$ 66.392,00	\$ 238.280.888,00	3.589,00	\$ 238.280.888,00		\$ -		\$ -		\$ -	3.589,00	\$ 238.280.888,00
1.4.3.4	ESTUCCO PLÁSTICO SOBRE MURO	M2	30.012,62	\$ 24.876,00	\$ 32.339,00	\$ 970.578.118,00	30.012,62	\$ 970.578.118,00		\$ -		\$ -		\$ -	30.012,62	\$ 970.578.118,00
1.4.3.5	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX PINTUCO O SIMILAR	M2	30.012,62	\$ 20.530,00	\$ 26.689,00	\$ 801.006.815,00	30.012,62	\$ 801.006.815,00		\$ -		\$ -		\$ -	30.012,62	\$ 801.006.815,00
1.4.3.6	CIELO RASO EN YESO CARTÓN	M2	8.259,01	\$ 75.736,00	\$ 98.457,00	\$ 813.157.348,00	8.259,01	\$ 813.157.347,57		\$ -		\$ -		\$ -	8.259,01	\$ 813.157.347,57
1.4.3.7	IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS	M2	4.376,54	\$ 21.730,00	\$ 28.249,00	\$ 123.632.878,00	4.376,54	\$ 123.632.878,46		\$ -		\$ -		\$ -	4.376,54	\$ 123.632.878,46
1.4.3.8	PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O SIMILAR	M2	1.592,05	\$ 264.063,00	\$ 343.282,00	\$ 546.522.108,00	1.592,05	\$ 546.522.108,10		\$ -		\$ -		\$ -	1.592,05	\$ 546.522.108,10
1.4.3.9	PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO	M2	1.329,00	\$ 182.464,00	\$ 237.203,00	\$ 315.242.787,00	1.329,00	\$ 315.242.787,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.329,00	\$ 315.242.787,00
1.4.3.10	ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR	M2	1.160,00	\$ 98.059,00	\$ 127.477,00	\$ 147.873.320,00	1.160,00	\$ 147.873.320,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.160,00	\$ 147.873.320,00
1.4.3.11	DÓCULO MEDIANERA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO	ML	1.256,15	\$ 111.633,00	\$ 145.123,00	\$ 182.296.256,00	1.256,15	\$ 182.296.256,45		\$ -		\$ -		\$ -	1.256,15	\$ 182.296.256,45
1.4.3.12	ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS	M2	2.215,71	\$ 81.237,00	\$ 105.608,00	\$ 233.996.702,00	2.215,71	\$ 233.996.701,68		\$ -		\$ -		\$ -	2.215,71	\$ 233.996.701,68
1.4.3.13	CARPINTERÍA METALICA PUERTAS EN ALUMINIO	M2	1.263,00	\$ 749.133,00	\$ 973.873,00	\$ 2.330.001.598,00	1.263,00	\$ 2.330.001.598,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.263,00	\$ 2.330.001.598,00
1.4.3.14	CARPINTERÍA METALICA DIVISORES EN ACERO INOXIDABLE	M2	1.025,00	\$ 941.302,00	\$ 1.223.693,00	\$ 1.254.285.325,00	1.025,00	\$ 1.254.285.325,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.025,00	\$ 1.254.285.325,00
1.4.3.15	CARPINTERÍA METALICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM	M2	900,00	\$ 1.608.675,00	\$ 2.051.278,00	\$ 1.882.150.200,00	900,00	\$ 1.882.150.200,00		\$ -		\$ -		\$ -	900,00	\$ 1.882.150.200,00
1.5	PLAZA				\$	-										
1.5.1	PRELIMINARES				\$	-										
1.5.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	12.642,83	\$ 3.617,00	\$ 4.702,00	\$ 59.446.587,00	12.642,83	\$ 59.446.586,66		\$ -		\$ -		\$ -	12.642,83	\$ 59.446.586,66
1.5.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	6.550,00	\$ 23.113,00	\$ 30.047,00	\$ 196.807.850,00	6.550,00	\$ 196.807.850,00		\$ -		\$ -		\$ -	6.550,00	\$ 196.807.850,00
1.5.1.3	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	36.025,00	\$ 1.768,00	\$ 2.298,00	\$ 82.785.450,00	36.025,00	\$ 82.785.450,00		\$ -		\$ -		\$ -	36.025,00	\$ 82.785.450,00
1.5.2	ACABADOS DE PISOS				\$	-										
1.5.2.1	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0.10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	6.375,83	\$ 158.820,00	\$ 206.466,00	\$ 1.316.392.117,00	3.080,04	\$ 635.923.815,34		\$ -		\$ -		\$ -	3.080,04	\$ 635.923.815,34
1.5.2.2	GRANOS EN LAJOLLO COMÚN PAÑETADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN CONCRETO DE 17.5 MPA E= 5 CM. INCLUYE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	303,80	\$ 154.967,00	\$ 201.457,00	\$ 61.202.637,00	146,76	\$ 29.565.821,37		\$ -		\$ -		\$ -	146,76	\$ 29.565.821,37
1.5.2.3	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	309,76	\$ 2.308.039,00	\$ 3.000.451,00	\$ 929.419.702,00	149,64	\$ 448.984.854,33		\$ -		\$ -		\$ -	149,64	\$ 448.984.854,33
1.5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA PARA BANCAS FLOTANTES	M2	303,80	\$ 410.692,00	\$ 533.900,00	\$ 162.198.820,00	146,76	\$ 78.355.142,93		\$ -		\$ -		\$ -	146,76	\$ 78.355.142,93
1.5.2.5	SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA	M2	2.102,33	\$ 28.734,00	\$ 37.354,00	\$ 78.530.435,00	1.015,60	\$ 37.936.548,76		\$ -		\$ -		\$ -	1.015,60	\$ 37.936.548,76
1.5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANELES ELECTROSOLDADOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	2.280,00	\$ 357.203,00	\$ 464.364,00	\$ 1.058.749.920,00	1.101,42	\$ 511.461.805,36		\$ -		\$ -		\$ -	1.101,42	\$ 511.461.805,36
1.5.2.7	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.35 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI (LEGITIMO)	ML	2.560,00	\$ 56.836,00	\$ 73.887,00	\$ 189.150.720,00	1.236,69	\$ 91.375.089,54		\$ -		\$ -		\$ -	1.236,69	\$ 91.375.089,54
1.5.2.8	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI (LEGITIMO)	ML	2.780,00	\$ 61.026,00	\$ 79.334,00	\$ 220.548.520,00	1.342,96	\$ 106.542.765,27		\$ -		\$ -		\$ -	1.342,96	\$ 106.542.765,27
1.5.2.9	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	1.250,00	\$ 79.492,00	\$ 103.340,00	\$ 129.175.000,00	603,85	\$ 62.401.968,08		\$ -		\$ -		\$ -	603,85	\$ 62.401.968,08
1.5.2.10	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	850,00	\$ 83.620,00	\$ 108.706,00	\$ 92.400.100,00	410,62	\$ 44.636.718,33		\$ -		\$ -		\$ -	410,62	\$ 44.636.718,33
1.5.2.11	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1.776,00	\$ 101.436,00	\$ 131.867,00	\$ 234.195.792,00	857,95	\$ 113.135.500,95		\$ -		\$ -		\$ -	857,95	\$ 113.135.500,95
1.5.2.12	LOSETA PLANA 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1.289,00	\$ 267.204,00	\$ 347.365,00	\$ 447.753.485,00	622,69	\$ 216.301.131,62		\$ -		\$ -		\$ -	622,69	\$ 216.301.131,62
1.5.2.13	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	945,00	\$ 270.725,00	\$ 351.943,00	\$ 332.586.135,00	456,51	\$ 160.665.990,93		\$ -		\$ -		\$ -	456,51	\$ 160.665.990,93
1.5.2.14	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP.0.12M, INCLUYE LOSETA TÁCTIL	M2	489,00	\$ 278.538,00	\$ 362.099,00	\$ 177.066.411,00	236,23	\$ 85.537.391,34		\$ -		\$ -		\$ -	236,23	\$ 85.537.391,34
1.5.2.15	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	789,00	\$ 267.204,00	\$ 347.365,00	\$ 274.070.985,00	381,15	\$ 132.398.442,86		\$ -		\$ -		\$ -	381,15	\$ 132.398.442,86
1.5.2.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE ÁREAS VERDES.	M3	750,00	\$ 102.910,00	\$ 133.783,00	\$ 100.337.250,00	362,31	\$ 48.471.003,46		\$ -		\$ -		\$ -	362,31	\$ 48.471.003,46



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.: LP-017-2025
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL: \$ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL No.1:
VALOR ACTUAL: \$ 172.969.667.789,00
PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES
CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026
PRORROGA No.01: -
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA: 01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 24%
% DE AVANCE ACUMULADO: 40%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACOMULADO	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.5.2.17	CONTENEDOR DE RAICES DE 1.50X1.50X1.60 METROS EN CONCRETO REFORZADO CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15X0.15X1/4", PISO CON APERTURA DE HUECO DE 0.25X0.25 METROS SEGUN DISEÑO	UN	50,00	\$ 1.375.338,00	\$ 1.375.338,00	\$ 1.375.338,00	24,15	\$ 43.185.954,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24,15	\$ 43.185.954,09
1.5.2.18	ALCORNICES CUADRADOS DE 1.5X1,5 M	UN	50,00	\$ 1.884.198,00	\$ 2.449.457,00	\$ 122.472.850,00	24,15	\$ 59.164.287,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24,15	\$ 59.164.287,79
1.5.2.19	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.	M2	129,00	\$ 346.379,00	\$ 450.293,00	\$ 58.087.797,00	62,32	\$ 28.061.102,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	62,32	\$ 28.061.102,02
1.5.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M62	UN	189,00	\$ 389.661,00	\$ 506.559,00	\$ 95.739.651,00	150,00	\$ 75.983.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150,00	\$ 75.983.850,00
1.5.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	123,00	\$ 650.997,00	\$ 846.296,00	\$ 104.094.408,00	100,00	\$ 84.629.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100,00	\$ 84.629.600,00
1.5.2.22	TALA DE ARBOLÉS INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL	UN	120,00	\$ 1.014.157,00	\$ 1.318.404,00	\$ 158.208.480,00	100,00	\$ 131.840.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100,00	\$ 131.840.400,00
1.5.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CMS DE DIÁMETRO POR 60 CMS DE ALTO (VER DISEÑO)	UN	45,00	\$ 1.608.113,00	\$ 2.090.547,00	\$ 94.074.615,00	30,00	\$ 62.716.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 62.716.410,00
1.5.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGUN DISEÑO	ML	773,40	\$ 758.916,00	\$ 986.591,00	\$ 763.029.479,00	373,61	\$ 368.604.925,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	373,61	\$ 368.604.925,21
1.5.2.25	BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SHADUR ANCHOR FIX- 4 PARA FUER VARIILAS	MI	196,00	\$ 407.488,00	\$ 529.734,00	\$ 103.827.864,00	94,68	\$ 50.157.252,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	94,68	\$ 50.157.252,21
1.5.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN Y ACCESORIOS	ML	245,00	\$ 222.776,00	\$ 289.609,00	\$ 70.954.205,00	118,35	\$ 34.276.617,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	118,35	\$ 34.276.617,27
1.5.2.27	MURO EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 0.6 X 0.25 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", A CADA 0.25 METROS, 2 VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 METROS	ML	526,00	\$ 337.702,00	\$ 439.013,00	\$ 230.920.838,00	254,10	\$ 111.553.433,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	254,10	\$ 111.553.433,41
1.5.2.28	ENROSCADO DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLOPEA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 2000 PSI E=0.20 METROS	M3	321,00	\$ 515.064,00	\$ 669.583,00	\$ 214.936.143,00	155,07	\$ 103.831.539,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	155,07	\$ 103.831.539,45
1.5.2.29	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	489,00	\$ 269.432,00	\$ 350.262,00	\$ 171.278.118,00	236,23	\$ 82.741.177,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	236,23	\$ 82.741.177,87
1.6	FACHADA			\$ -	\$ -	\$ -										
1.6.1	ACABADO DE FACHADA			\$ -	\$ -	\$ -										
1.6.1.1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA FRONTSIDE VIEW FT 381 DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN	M2	4.200,00	\$ 2.958.975,00	\$ 3.846.668,00	\$ 16.156.005.600,00	784,63	\$ 3.018.214.859,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	784,63	\$ 3.018.214.859,99
1.6.1.2	AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS	UN	1,00	\$ 52.800.000,00	\$ 68.640.000,00	\$ 68.640.000,00	1,00	\$ 68.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 68.640.000,00
1.7	PROVISIONES DE OBRA			\$ -	\$ -	\$ -										
1.7.1	PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES, ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y DATOS)	GLB	1,00	\$ 5.980.800.000,00	\$ 7.775.040.000,00	\$ 7.775.040.000,00	0,46	\$ 3.605.726.855,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,46	\$ 3.605.726.855,50
1.7.2	PROVISIÓN RED CONTAINERNIDOS (INCLUYE EQUIPOS)	GLB	1,00	\$ 960.000.000,00	\$ 1.248.000.000,00	\$ 1.248.000.000,00	0,46	\$ 578.768.355,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,46	\$ 578.768.355,62
1.7.3	PROVISIÓN INYEC.	GLB	1,00	\$ 1.114.346.960,00	\$ 1.448.651.048,00	\$ 1.448.651.048,00	0,46	\$ 671.821.622,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,46	\$ 671.821.622,53
1.7.4	PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES)	GLB	1,00	\$ 960.000.000,00	\$ 1.248.000.000,00	\$ 1.248.000.000,00	0,46	\$ 578.768.355,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,46	\$ 578.768.355,62
1.7.5	PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA	GLB	1,00	\$ 288.000.000,00	\$ 374.400.000,00	\$ 374.400.000,00	0,46	\$ 173.630.506,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,46	\$ 173.630.506,69
1.8	ZONA PICK UP DROP OFF			\$ -	\$ -	\$ -										
1.8.1	PRELIMINARES			\$ -	\$ -	\$ -										
1.8.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1,00	\$ 3.617,00	\$ 4.702,00	\$ 4.702,00	1,00	\$ 4.702,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 4.702,00
1.8.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	1,00	\$ 23.113,00	\$ 30.047,00	\$ 30.047,00	1,00	\$ 30.047,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 30.047,00
1.8.1.3	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	1,00	\$ 2.768,00	\$ 2.298,00	\$ 2.298,00	1,00	\$ 2.298,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.298,00
1.8.2	PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES			\$ -	\$ -	\$ -										
1.8.2.1	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	1,00	\$ 84.562,00	\$ 109.911,00	\$ 109.911,00	1,00	\$ 109.911,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 109.911,00
1.8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO	M2	1,00	\$ 3.361,00	\$ 4.369,00	\$ 4.369,00	1,00	\$ 4.369,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 4.369,00
1.8.2.3	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR-4S, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" USO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, COSTADERO DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1,00	\$ 239.467,00	\$ 311.307,00	\$ 311.307,00	1,00	\$ 311.307,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 311.307,00
1.8.2.4	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	1,00	\$ 79.492,00	\$ 103.340,00	\$ 103.340,00	1,00	\$ 103.340,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 103.340,00
1.8.2.5	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1,00	\$ 101.436,00	\$ 131.867,00	\$ 131.867,00	1,00	\$ 131.867,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 131.867,00
1.8.2.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,00	\$ 114.768,00	\$ 149.198,00	\$ 149.198,00	1,00	\$ 149.198,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 149.198,00
1.8.2.7	PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y MOGADOR, SEGUN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO COMENTACIÓN DE CONCRETO EN CADA UNO DE LOS APOYOS MEDIANTE ZAPATAS DE CONCRETO	UN	1,00	\$ 47.085.684,00	\$ 61.211.389,00	\$ 61.211.389,00	1,00	\$ 61.211.389,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 61.211.389,00
1.9	PANQUEADERO			\$ -	\$ -	\$ -										
1.9.1	EDIFICIO PANQUEADERO			\$ -	\$ -	\$ -										
1.9.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1,00	\$ 3.617,00	\$ 4.702,00	\$ 4.702,00	1,00	\$ 4.702,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 4.702,00
1.9.1.2	DEMOLICIÓN DE ASFALTO	M2	1,00	\$ 18.161,00	\$ 23.609,00	\$ 23.609,00	1,00	\$ 23.609,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 23.609,00
1.9.1.3	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	1,00	\$ 614.108,00	\$ 798.340,00	\$ 798.340,00	1,00	\$ 798.340,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 798.340,00
1.9.1.4	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	\$ 1.010.290,00	\$ 1.313.377,00	\$ 1.313.377,00	1,00	\$ 1.313.377,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.313.377,00
1.9.1.5	VIGA DE CEMENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	\$ 1.035.348,00	\$ 1.345.952,00	\$ 1.345.952,00	1,00	\$ 1.345.952,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.345.952,00



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.780,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	\$ 172.969.667.780,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	24%
% DE AVANCE ACUMULADO:	40%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACUMULADO	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.9.1.6	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	\$ 1.533.677,00	\$ 1.993.780,00	\$ 1.993.780,00	1,00	\$ 1.993.780,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.993.780,00
1.9.1.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	\$ 1.763.268,00	\$ 2.292.248,00	\$ 2.292.248,00	1,00	\$ 2.292.248,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 2.292.248,00
1.9.1.8	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25	ML	1,00	\$ 82.200,00	\$ 106.860,00	\$ 106.860,00	1,00	\$ 106.860,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 106.860,00
1.9.1.9	COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 - 0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	\$ 174.016,00	\$ 226.221,00	\$ 226.221,00	1,00	\$ 226.221,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 226.221,00
1.9.1.10	LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	1,00	\$ 323.288,00	\$ 420.276,00	\$ 420.276,00	1,00	\$ 420.276,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 420.276,00
1.9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,00	\$ 357.203,00	\$ 464.364,00	\$ 464.364,00	1,00	\$ 464.364,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 464.364,00
NO PREVISTOS																
NP-02_001	CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES PAG ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00	\$ 171.775,00	\$ 223.308,00	\$ 223.308,00	1.181,43	\$ 263.822.431,01	\$ -	\$ -	1.181,43	\$ 263.822.431,01	1.181,43	\$ 263.822.431,01	0,00	\$ -
NP-02_002	PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES DOBLES PAG ANCLADOS A TERRENO Y ENMARCADO LAS HOJAS DEL PORTON INCLUYE REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00	\$ 282.587,00	\$ 367.363,00	\$ 367.363,00	30,00	\$ 11.020.890,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 11.020.890,00
NP-02_003	CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA MENOR	DIA	0,00	\$ 1.007.826,00	\$ 1.310.174,00	\$ 1.310.174,00	120,00	\$ 157.220.880,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	120,00	\$ 157.220.880,00
NP-02_004	CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGUN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRULICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO. NO INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO NI LA OPERACION DEL POZO	UN	0,00	\$ 26.657.757,00	\$ 34.655.084,00	\$ 34.655.084,00	6,00	\$ 207.930.504,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 207.930.504,00
NP-02_005	ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS DURANTE LAS VEINTICUATRO HORAS DIARIAS	DIA	0,00	\$ 2.174.240,00	\$ 2.826.512,00	\$ 2.826.512,00	120,00	\$ 339.181.440,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	120,00	\$ 339.181.440,00
NP-02_006	CONSTRUCCION PEZOMETRO CON TUBO ALTAMIRA COLUMNA 4PVC-P DE 2", ø=6.5mm. OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 2" SEGUN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRULICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO.	ML	0,00	\$ 776.484,00	\$ 1.009.429,00	\$ 1.009.429,00	264,00	\$ 266.489.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	264,00	\$ 266.489.256,00
NP-02_007	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA OCLOPEA, EN SECTORES AFECTADOS POR EL EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFLORAN A LA SUPERFICIE	M3	0,00	\$ 286.330,00	\$ 372.229,00	\$ 372.229,00	2.927,43	\$ 1.089.672.889,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.927,43	\$ 1.089.672.889,78
NP-02_008	TRASIEGO MECANICO HASTA 500M	M3	0,00	\$ 23.238,00	\$ 30.209,00	\$ 30.209,00	12.232,97	\$ 369.545.759,39	\$ -	\$ -	12.232,97	\$ 369.545.759,39	12.232,97	\$ 369.545.759,39	0,00	\$ -
NP-02_009	TRASIEGO MANUAL. HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAUP-GRADERIAS	M3	0,00	\$ 38.712,00	\$ 50.326,00	\$ 50.326,00	4.917,00	\$ 247.452.760,83	\$ -	\$ -	4.917,00	\$ 247.452.760,83	4.917,00	\$ 247.452.760,83	0,00	\$ -
NP-02_010	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA RUPTURA CAPILAR EN GRAVA TRITURADA 2" A 4"	M3	0,00	\$ 342.773,00	\$ 445.605,00	\$ 445.605,00	17.143,43	\$ 7.639.199.985,55	\$ -	\$ -	17.143,43	\$ 7.639.199.985,55	17.143,43	\$ 7.639.199.985,55	0,00	\$ -
NP-02_011	EXTENDIDA MANUAL DE LECHO FILTRANTE CON GRAVA TRITURADA GRADADO DE 3/4 A 1" EN ZANIAS TUBERIAS DE DRENAJES	M3	0,00	\$ 352.548,00	\$ 458.312,00	\$ 458.312,00	3.440,53	\$ 1.576.836.345,77	\$ -	\$ -	3.440,53	\$ 1.576.836.345,77	3.440,53	\$ 1.576.836.345,77	0,00	\$ -
NP-02_012	TRAZADO Y NIVELACION LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y AGUAS LLUVIAS	ML	0,00	\$ 9.276,00	\$ 12.059,00	\$ 12.059,00	6.127,00	\$ 73.885.493,00	\$ -	\$ -	6.127,00	\$ 73.885.493,00	6.127,00	\$ 73.885.493,00	0,00	\$ -
NP-02_013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500	ML	0,00	\$ 156.716,00	\$ 203.731,00	\$ 203.731,00	1.374,00	\$ 279.926.394,00	\$ -	\$ -	1.374,00	\$ 279.926.394,00	1.374,00	\$ 279.926.394,00	0,00	\$ -
NP-02_014	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 500 MM PERFORADA Y FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500	ML	0,00	\$ 626.813,00	\$ 813.557,00	\$ 813.557,00	380,00	\$ 309.151.660,00	\$ -	\$ -	380,00	\$ 309.151.660,00	380,00	\$ 309.151.660,00	0,00	\$ -
NP-02_015	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT-2500 SEPARACION RUPTURA CAPILAR	M2	0,00	\$ 20.100,00	\$ 26.130,00	\$ 26.130,00	11.056,38	\$ 288.903.144,08	\$ -	\$ -	11.056,38	\$ 288.903.144,08	11.056,38	\$ 288.903.144,08	0,00	\$ -
NP-02_016	SALIDA PUNTO DE EMPALME DE AGUAS DE DRENAJE CANCHA EN TUBERIA PVC SANITARIA 8" A ADOPLC CON TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO NOVAFORT	UN	0,00	\$ 929.587,00	\$ 1.208.463,00	\$ 1.208.463,00	96,00	\$ 116.012.448,00	\$ -	\$ -	96,00	\$ 116.012.448,00	96,00	\$ 116.012.448,00	0,00	\$ -
NP-02_017	EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO BIVIAS	M3	0,00	\$ 224.162,00	\$ 291.411,00	\$ 291.411,00	6.683,90	\$ 1.947.761.793,48	\$ -	\$ -	6.683,90	\$ 1.947.761.793,48	6.683,90	\$ 1.947.761.793,48	0,00	\$ -
NP-02_018	EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE GRAVA FRACTURADA DE 3/8" A 1/2" TRANSICION ENTRE LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA LAVADA. LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EN SU MAYORIA MANUAL	M2	0,00	\$ 58.457,00	\$ 75.994,00	\$ 75.994,00	7.992,00	\$ 607.344.048,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7.992,00	\$ 607.344.048,00
NP-02_019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA CONTENER EL ESTRATO CORRESPONDIENTE A LA GRAMA.	ML	0,00	\$ 50.028,00	\$ 65.036,00	\$ 65.036,00	374,00	\$ 24.323.464,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	374,00	\$ 24.323.464,00
NP-02_020	CORTE DE ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS DE Ø = 1/2" CON EQUIPO DE ONICORTE	UN	0,00	\$ 3.498,00	\$ 4.547,00	\$ 4.547,00	-	\$ 2.520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.520,00	\$ 11.458.440,00
NP-02_021	DESMONTE MANUAL DE SILLETERIA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA PARQUEADERO OCCIDENTAL CALLE 46	UN	0,00	\$ 12.425,00	\$ 16.153,00	\$ 16.153,00	-	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	40.000,00	\$ 646.120.000,00



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	\$ 172.969.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/02/2026 A 30/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	24%
% DE AVANCE ACUMULADO:	40%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.L.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N2	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 2	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CANT ACOMULADO	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
NP-02_022	CAJA DE INSPECCIÓN, PARA RECOLECCIÓN DE AGUA DE LOS DRENAJES, CONSTRUIDA EN DOS ETAPAS: LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X0.20 METROS PREFABRICADA EN CONCRETO 3000 PSI, SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS), LA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN CONCRETO DE 0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA LA INSTALACIÓN DE UNA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA Y ESCALERA TIPO GATO INCLUYE BASE EN GRAVA FRACTURADA DE 2 A 4" PARA RUPTURA CAPILAR Y BASE PERIMETRAL EN CONCRETO REFORZADO 0.30X0.05, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI ANCLAJES PARA ESCALERA	UN	0,00	\$ 8.032.626,00	\$ 10.442.414,00		6,00	\$ 62.654.484,00		\$ -		\$ -		\$ -	6,00	\$ 62.654.484,00
NP-02_023	CONSTRUCCION MICROPILOTE Ø=8" INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, BOMBA DE INYECCION, TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO.	ML	0,00	\$ 369.593,00	\$ 480.471,00		3.304,40	\$ 1.587.668.372,40		\$ -		\$ -		\$ -	3.304,40	\$ 1.587.668.372,40
NP-02_024	SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA 1=6.0M DIAMETRO 4.5". INCLUYE TUBO 1", CEMENTO	ML	0,00	\$ 230.100,00	\$ 299.130,00		3.304,40	\$ 988.445.172,00		\$ -		\$ -		\$ -	3.304,40	\$ 988.445.172,00
NP-02_025	MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACERADO A TRES DIAS, INCLUYE: FORMALETA, CURADOR, VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0,00	\$ 1.953.256,00	\$ 2.539.233,00		3.953,23	\$ 10.038.167.976,19		\$ -	3.953,23	\$ 10.038.167.976,19	3.953,23	\$ 10.038.167.976,19	0,00	\$ -
NP-02_026	ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8", L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.	ML	0,00	\$ 388.928,00	\$ 505.606,00		2.775,00	\$ 1.403.056.650,00		\$ -	2.775,00	\$ 1.403.056.650,00	2.775,00	\$ 1.403.056.650,00	0,00	\$ -
NP-02_027	ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8", L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.	ML	0,00	\$ 414.779,00	\$ 539.213,00		2.100,00	\$ 1.132.347.300,00		\$ -	2.100,00	\$ 1.132.347.300,00	2.100,00	\$ 1.132.347.300,00	0,00	\$ -
NP-02_028	DADOS Y/O CABEZAL DE FIACION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA DOS ANCLAJES, INCLUYE: PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	0,00	\$ 212.959,00	\$ 276.847,00		185,00	\$ 51.216.695,00		\$ -	185,00	\$ 51.216.695,00	185,00	\$ 51.216.695,00	0,00	\$ -
NP-02_029	DADOS Y/O CABEZAL DE FIACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA TRES ANCLAJES, INCLUYE: PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	0,00	\$ 222.959,00	\$ 289.847,00		100,00	\$ 28.984.700,00		\$ -	100,00	\$ 28.984.700,00	100,00	\$ 28.984.700,00	0,00	\$ -
NP-02_030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500	ML	0,00	\$ 54.405,00	\$ 70.727,00		1.374,00	\$ 97.178.898,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.374,00	\$ 97.178.898,00
NP-02_031	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	0,00	\$ 1.530.013,00	\$ 1.989.017,00		144,00	\$ 286.418.448,00		\$ -	144,00	\$ 286.418.448,00	144,00	\$ 286.418.448,00	0,00	\$ -
NP-02_032	ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE REFUERZO PLACAS AEREAES TUNELES	UN	0,00	\$ 47.646,00	\$ 61.940,00		11.520,00	\$ 713.548.800,00		\$ -		\$ -		\$ -	11.520,00	\$ 713.548.800,00
NP-02_033	PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=0.25M, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACERADO A TRES DIAS, INCLUYE: FORMALETA, CURADOR, VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0,00	\$ 521.915,00	\$ 678.490,00		827,00	\$ 561.111.230,00		\$ -		\$ -		\$ -	827,00	\$ 561.111.230,00
NP-02_034	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN CONCRETO 36" INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHI HASTA EL LUGAR DE INSTALACION	ML	0,00	\$ 1.726.491,00	\$ 2.244.438,00		81,60	\$ 183.146.140,80		\$ -		\$ -		\$ -	81,60	\$ 183.146.140,80
PROVISION																
	PROVISION LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	GLB	1,00	\$ 1.756.930.693,00	\$	\$ 1.756.930.693,00	1,00	\$ 1.756.930.693,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 1.756.930.693,00
	PROVISION PMA, PMT, PGSR	GLB	1,00	\$ 850.000.000,00	\$	\$ 850.000.000,00	1,00	\$ 850.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 850.000.000,00
	PROVISION JORNADAS EXTENDIDAS NOCTURNAS Y FESTIVOS	GLB	1,00	\$ 1.650.000.000,00	\$	\$ 1.650.000.000,00	1,00	\$ 1.650.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 1.650.000.000,00
				COSTO TOTAL DE OBRA		\$ 172.919.667.789,00		\$ 172.919.667.789,00		\$ 28.142.029.762,00		\$ 41.326.970.187,00		\$ 69.468.999.950,00		\$ 103.450.667.839,00
	AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	GLB	1,00	\$ 32.320.620,55	\$ 42.016.806,72	\$ 42.016.806,72	1,00	\$ 42.016.806,72		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 42.016.806,72
	IIVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	GLB	1,00	\$ 6.340.917,91	\$ 7.983.193,28	\$ 7.983.193,28	1,00	\$ 7.983.193,28		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 7.983.193,28
				COSTO TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE IVA		\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 50.000.000,00
				COSTO TOTAL PROYECTO		\$ 172.969.667.789,00		\$ 172.969.667.789,00		\$ 28.142.029.762,00		\$ 41.326.970.187,00		\$ 69.468.999.950,00		\$ 103.500.667.839,00

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los treinta (30) del mes de abril de 2026.


JAIME ENRIQUE LINDERO CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO
CONTRATISTA


ALEXANDER DE BEDOUT NULE
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA


ARMANDO MOVILLA
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	8,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	16,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	24,00



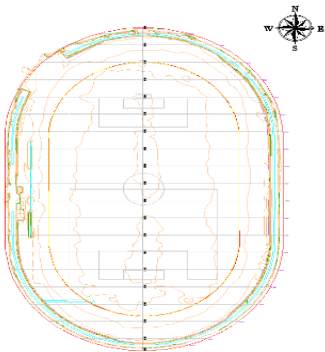
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.1.10	CAPITULO:	PRELIMINARES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO						U.M:	M3
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	EXP	TOTAL
 					1.1.2.1							
					EXCAVACION CANCHA							
					AREA CANCHA	111,00	72,00		1,83		1,20	17.550,43
					AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40		2,55		1,20	7.520,48
					TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50		2,55		1,20	1.865,71
					EXCAVACION TUBERIAS DRENAJE							
					TUBERIA DE 8" INTERIOR DE LA CANCHA	72,00	0,60	1,28		18,00	1,20	1.190,65
					TUBERIA DE 8" EXTERIOR DE LA CANCHA	1374,00	0,60	1,28			1,20	1.262,31
					TUBERIA DE 20"	380,00	2,40	3,33			1,20	3.642,88
					1.2.2.1							
					EXCAVACION GRADAS							
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO	449,68	21,70		1,32		1,20	15.515,36
SUB TOTAL												48.547,81

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		
	1.3.1.2	

[illegible]

CONTRATISTA:		CONSORCIO METRO ESTADIO		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO						
INTERVENTORIA:		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS				ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA						
PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026												
CÓDIGO DEL ITEM:		1.1.1.10	CAPITULO:	PRELIMINARES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO					U.M:	M3
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	EXP	TOTAL
					EXCAVACION SECCION TUNEL HORIZONTAL							
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	5,00		6,62		1,20	1.490,33
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	5,00		6,62		1,20	1.541,99
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	5,00		6,62		1,20	1.601,61
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	6,00		6,62		1,20	2.241,46
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	6,00		4,62		1,20	1.614,59
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	6,00		6,62		1,20	2.146,07
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	5,00		6,62		1,20	1.291,62
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	5,00		6,62		1,20	1.450,59
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	5,00		6,62		1,20	1.418,79
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	6,00		6,62		1,20	953,81
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
											1,20	
SUB TOTAL										15.750,86		
OBSERVACIONES:					Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:			Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:				
												
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										106.964,18		
TOTAL PRESENTE ACTA:										64.923,48		
ACUMULADO A PRESENTE ACTA										171.887,66		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	41.392,18
TOTAL PRESENTE ACTA:	27.527,05
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	68.919,22

[illegible]

	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
	TOTAL PRESENTE ACTA:	10.447,27
	ACUMULADO A PRESENTE ACTA	10.447,27

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	7.992,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	7.992,00

	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	860.668,49
	TOTAL PRESENTE ACTA:	518.504,28
	ACUMULADO A PRESENTE ACTA	1.379.172,78



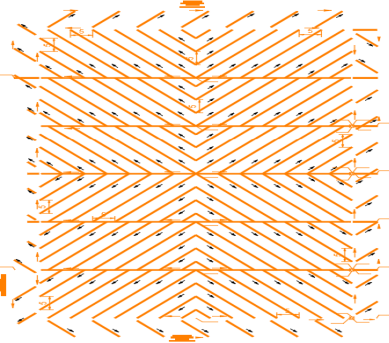
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.3.1	CAPITULO:	SISTEMA DE DRENAJE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12"						U.M:	ML
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUBERIA PLANAR TRANSVERSAL	70.00				5.00		350.00
					TUBERIA PLANAR DIAGONALES	17.65				136.00		2.400.00
												

SUB TOTAL 2.750,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	2.750,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	2.750,00



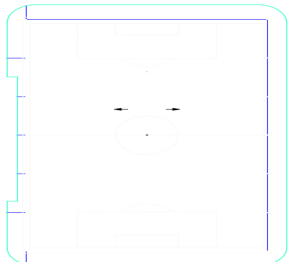
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.3.3	CAPITULO:	SISTEMA DE DRENAJE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10"					U.M:	ML				
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL			
					ORIENTAL	107,00				1,00		107,00			
					NORTE	72,00				1,00		72,00			
					SUB TOTAL										179,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	179,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	179,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:					
							
	MANEJO DE AGUA DE RUPTURA CAPILAR						



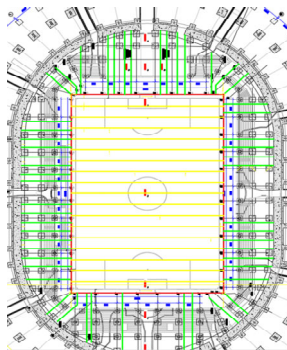
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.3.4	CAPITULO:	SISTEMA DE DRENAJE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8"					U.M:	ML	
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					CANCHA	76,50				16,00		1.224,00
SUB TOTAL											1.224,00	

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 
----------------	--	---

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	1.399,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	1.399,00



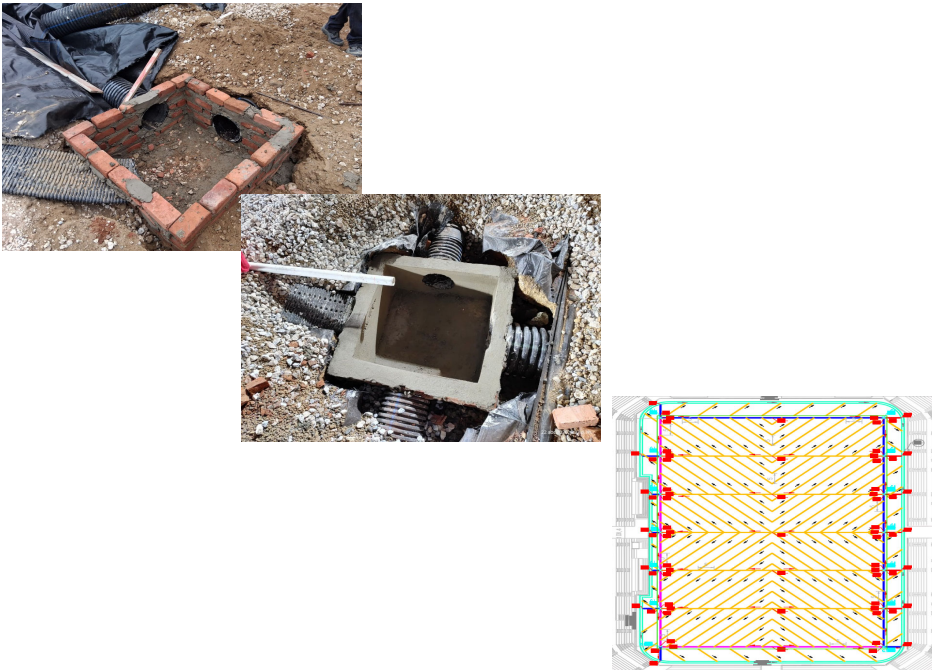
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.3.6	CAPITULO:	SISTEMA DE DRENAJE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI						U.M:	UN
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					REGISTROS					4,00		4,00

SUB TOTAL 4,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 
----------------	--	---

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	4,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	4,00

[illegible]



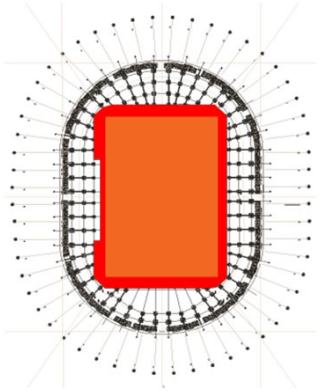
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.3.8	CAPITULO:	SISTEMA DE DRENAJE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4"						U.M:	M3
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					AREA CANCHA	111,00	72,00	0,15				1.198,80
					AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	0,15				368,29
					TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50	0,15				91,37

SUB TOTAL 1.658,46

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	1.776,25
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	1.776,25

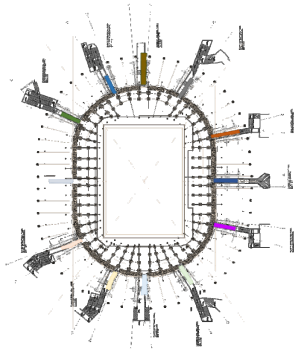


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA 2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.4.24	CAPITULO:	OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO,	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO						U.M:	M2
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	5,00			6,00			30,00
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	5,00			6,00			30,00
					TUNEL ENTRE EJE 12 AL 13	5,00			6,00			30,00
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	6,00			3,20			19,20
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	6,00			3,20			19,20
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	6,00			3,20			19,20
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	5,00			3,20			16,00
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	5,00			6,00			30,00
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	5,00			6,00			30,00
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	6,00			6,00			36,00
					(-)Acta anterior				-37,22			-37,22

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	37,22
TOTAL PRESENTE ACTA:	222,38
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	259,60

	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	9.537,00
	TOTAL PRESENTE ACTA:	9.758,09
	ACUMULADO A PRESENTE ACTA	19.295,09



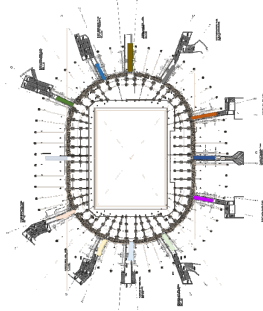
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.1.2	CAPITULO:	PRELIMINARES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA	U.M:	M2						
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL	
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	5,00			3,10			15,50	
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	5,00			3,10			15,50	
					TUNEL ENTRE EJE 12 AL 13	5,00			3,10			15,50	
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	6,00			3,10			18,60	
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	6,00			3,10			18,60	
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	6,00			3,10			18,60	
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	5,00			3,10			15,50	
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	5,00			3,10			15,50	
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	5,00			3,10			15,50	
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	6,00			3,10			18,60	
													
SUB TOTAL											151,90		

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	1.525,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	151,90
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	1.676,90



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.2.1	CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	U.M:		M3				
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	UND	CANT	TOTAL
					EXCAVACION GRADAS							
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO	449.68	21.70		1.32			12.929.47
					SUB TOTAL							

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	53.407,20
TOTAL PRESENTE ACTA:	12.929,47
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	66.336,67

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	9.758,09
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	9.758,09



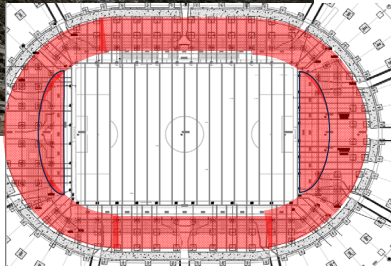
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.2.4	CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RETIRO DE MATERIAL	U.M:		M3/KM									
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	EXP	KM	TOTAL					
 					1.2.2.1												
					EXCAVACION GRADAS												
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO					449.68		21.70		1.32	1.20	15.00	232.730.37
SUB TOTAL											232.730.37						

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	985.662,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	232.730,37
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	1.218.392,37

[illegible]



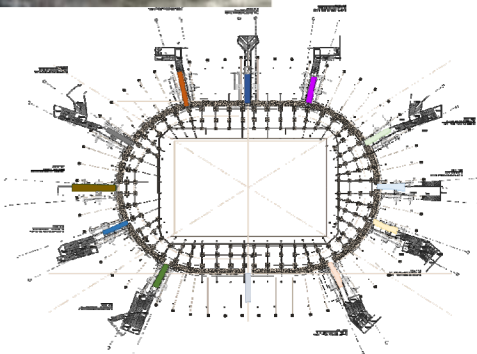
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.1.1	CAPITULO:	PRELIMINARES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN						U.M:	M2
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	5,00					187,50
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	5,00					194,00
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	5,00					201,50
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	6,00					282,00
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	6,00					291,00
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	6,00					270,00
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	5,00					162,50
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	5,00					182,50
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	5,00					178,50
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	6,00					120,00
					(-) ACTA ANTERIOR		-525,00					-525,00
												

SUB TOTAL 1.544,50

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 
----------------	--	---

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	525,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	1.544,50
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	2.069,50



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

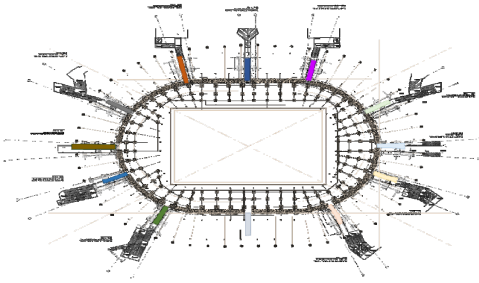
ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.1.2	CAPITULO:	PRELIMINARES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	U.M:	M3
------------------	---------	-----------	--------------	------------------------------	---	------	----

DESCRIPCION GRAFICA		LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
		DEMOLICION DE PISO							
		TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	5,00	0,18				34,32
		TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	5,00	0,18				35,51
		TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	5,00	0,18				36,88
		TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	6,00	0,18				51,62
		TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	6,00	0,18				53,27
		TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	6,00	0,18				49,42
		TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	5,00	0,18				29,74
		TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	5,00	0,18				33,41
		TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	5,00	0,18				32,67
		TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	6,00	0,18				21,97
		DEMOLICION DE VIGA ESTRUCTURAL							
		TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	5,00	0,50		1,22	3,00		9,15
		TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	5,00	0,50		1,22	3,00		9,15
		TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	5,00	0,50		1,22	3,00		9,15
		TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	6,00	0,50		1,22	3,00		10,98
		TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	6,00	0,50		1,22	3,00		10,98
		TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	6,00	0,50		1,22	3,00		10,98
		TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	5,00	0,50		1,22	3,00		9,15
		TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	5,00	0,50		1,22	3,00		9,15
		TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	5,00	0,50		1,22	3,00		9,15
		TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	6,00	0,50		1,22	3,00		10,98
		DEMOLICION DE CORONA							
		TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	5,00	0,15		0,37			0,27
		TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	5,00	0,15		0,37			0,27
		TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	5,00	0,15		0,37			0,27
		TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	6,00	0,15		0,37			0,33
		TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	6,00	0,15		0,37			0,33
		TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	6,00	0,15		0,37			0,33
		TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	5,00	0,15		0,37			0,27
		TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	5,00	0,15		0,37			0,27
		TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	5,00	0,15		0,37			0,27
		TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	6,00	0,15		0,37			0,33

SUB TOTAL 373,90

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 
----------------	--	---

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	373,90
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	373,90



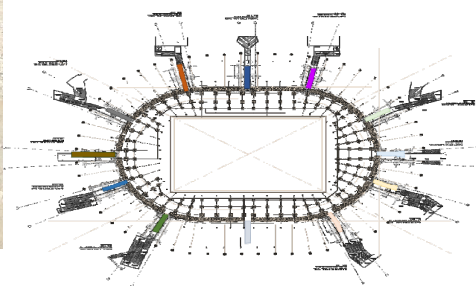
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2


CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026


CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.2.1	CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	U.M:		M3				
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	VOL	TOTAL
 					EXCAVACION SECCION TUNEL HORIZONTAL							
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	5,00		6,62			1.241,94
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	5,00		6,62			1.285,00
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	5,00		6,62			1.334,67
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	6,00		6,62			1.867,88
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	6,00		4,62			1.345,49
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	6,00		6,62			1.788,40
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	5,00		6,62			1.076,35
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	5,00		6,62			1.208,82
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	5,00		6,62			1.182,33
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	6,00		6,62			794,84
					(-) Acta anterior						-2892,96	-2.892,96
SUB TOTAL											10.232,76	

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	2.892,96
TOTAL PRESENTE ACTA:	10.232,76
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	13.125,72

CONTRATISTA:		CONSORCIO METRO ESTADIO		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
INTERVENTORIA:		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS														
PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026																
CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.3.2.2	CAPÍTULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ENTIBADO CONTINUO METÁLICO					U.M:	M2					
DESCRIPCIÓN GRÁFICA					LOCALIZACIÓN	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	VOL	TOTAL				
					TUBERÍA DE 20"	360,00				3,30	2,00	2.376,00				
					SUB TOTAL										2.376,00	
					OBSERVACIONES:					Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:				
																
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										0,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:										2.376,00						
ACUMULADO A PRESENTE ACTA										2.376,00						

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO													
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026														
CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.2.4	CAPÍTULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO						U.M:	M3		
DESCRIPCION GRAFICA				LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	VOL	TOTAL			
				TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	1,20		2,29	2,00		206,10			
				TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	1,20		2,29	2,00	213,24				
				TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	1,20		2,29	2,00	221,49				
				SUB TOTAL										841,44
				OBSERVACIONES:				Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:			Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			
ACUMULADO ACTA ANTERIOR										0,00				
TOTAL PRESENTE ACTA:										841,44				
ACUMULADO A PRESENTE ACTA										841,44				

M3/KM



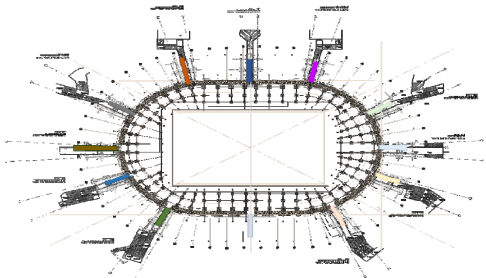
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA


2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.2.6	CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RETIRO DE MATERIAL						U.M:	M3/KM
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP/ALT	CANT	EXP	KM	TOTAL
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	5,00	0,15	0,37		1,30	15,00	5,35
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	5,00	0,15	0,37		1,30	15,00	5,35
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	5,00	0,15	0,37		1,30	15,00	5,35
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	6,00	0,15	0,37		1,30	15,00	6,42
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	6,00	0,15	0,37		1,30	15,00	6,42
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	6,00	0,15	0,37		1,30	15,00	6,42
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	5,00	0,15	0,37		1,30	15,00	5,35
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	5,00	0,15	0,37		1,30	15,00	5,35
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	5,00	0,15	0,37		1,30	15,00	5,35
												

SUB TOTAL 51,40

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	263.134,13
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	263.134,13



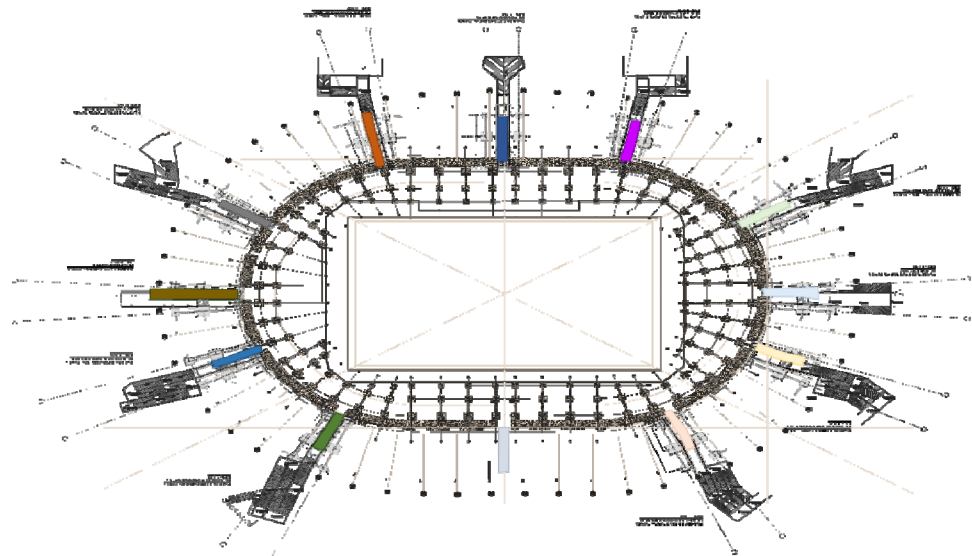
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.3.1	CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO METÁLICAS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI						U.M:	M3
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	1,20	0,05		2,00		4,77
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	1,20	0,05		2,00		4,94
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	1,20	0,05		2,00		5,13
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	1,20	0,05		2,00		5,98
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	1,20	0,05		2,00		6,17
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	1,20	0,05		2,00		5,72
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	1,20	0,05		2,00		4,13
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	1,20	0,05		2,00		4,64
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	1,20	0,05		2,00		4,54
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	1,20	0,05		2,00		2,54

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	48,56
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	48,56



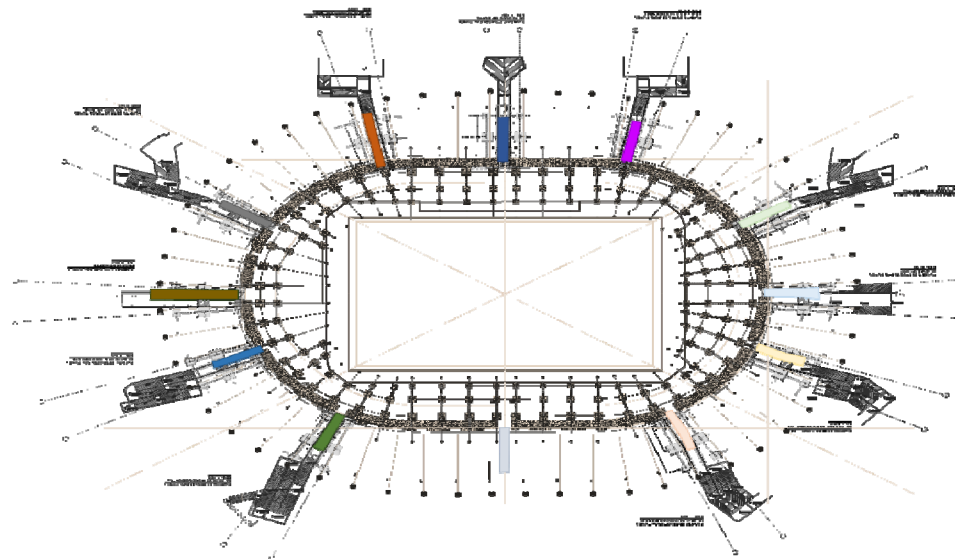
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.3.2	CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO METÁLICAS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y MUROS)					U.M:	M3	
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					(-) ACTA ANTERIOR					-152.87		-152.87
SUB TOTAL											-152,87	

Se hace memoria para descuento por tipo de concreto

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	152,87
TOTAL PRESENTE ACTA:	-152,87
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	0,00





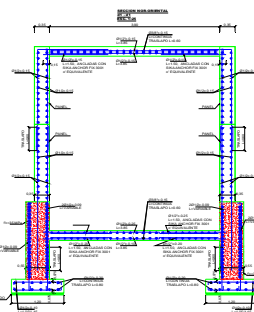
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.3.3	CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO METÁLICAS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	U.M:	KG					
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	BARRA #	PN	LONG	REPET	MUROS	CANT	TOTAL
  					PANELES MUROS							
					PANEL 1-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,10	14,00	2,00	10,00	862,79
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,10	14,00	2,00	10,00	862,79
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					PANEL 2-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00	1.029,78
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00	1.029,78
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					PANEL 3-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00	1.029,78
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00	1.029,78
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					PANEL 4-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	2,20	14,00	2,00	10,00	612,30
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	2,20	14,00	2,00	10,00	612,30
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					PANEL 5-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,10	14,00	2,00	10,00	862,79
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,10	14,00	2,00	10,00	862,79
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					PANEL 6-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00	1.029,78
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00	1.029,78
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00	1.081,47
					PANEL 7-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	10,00	3.383,58
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	10,00	3.562,50
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	10,00	3.383,58
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	10,00	3.562,50
					PANEL 8-14#4 12 M							
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	12,00	4.060,29
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00	4.275,00
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	12,00	4.060,29
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00	4.275,00
					PANEL 9-14#4 12 M							
REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	4,40	23,00	2,00	12,00	2.414,23					
REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00	4.275,00					
REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	4,40	23,00	2,00	12,00	2.414,23					
REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00	4.275,00					
SUB TOTAL											67.773,31	

Se hace memoria para descuento por tipo de concreto

Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:

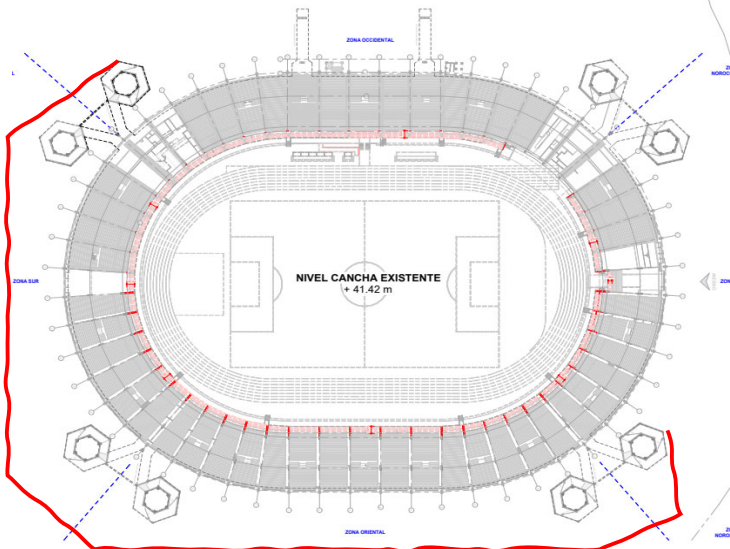

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

PANEL 10-14#4 12 M

REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,70	23,00	2,00	12,00	2.030,15
REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	28,00	2,00	12,00	2.137,50

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	4.581,60
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	4.581,60

CONTRATISTA:		CONSORCIO METRO ESTADIO		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
INTERVENTORIA:		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026												
CÓDIGO DEL ITEM:		NP-02_001	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES PAG ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI					U.M:	M2				
DESCRIPCION GRAFICA						LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL			
						CERRAMIENTO EN LAMINA DE SUPEROBARD	484,19	2,44					1.181,43			
												SUB TOTAL				
OBSERVACIONES:						Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:						
																
						ACUMULADO ACTA ANTERIOR					0,00					
						TOTAL PRESENTE ACTA:					1.181,43					
						ACUMULADO A PRESENTE ACTA					1.181,43					

	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
	TOTAL PRESENTE ACTA:	12.232,97
	ACUMULADO A PRESENTE ACTA	12.232,97

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	4.917,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	4.917,00



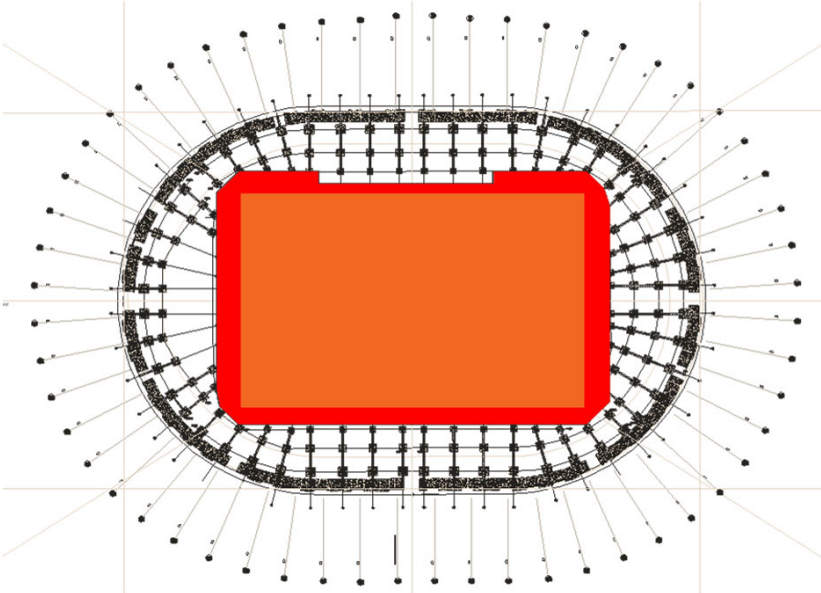
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_010	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA RUPTURA CAPILAR EN GRAVA TRITURADA 2" A 4"					U.M:	M3	
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					AREA CANCHA	111,00	72,00	0,30				2.397,60
					AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	1,15				2.823,55
					TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50	1,15				700,48
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO	449,68	21,70	1,15				11.221,80
SUB TOTAL												17.143,43

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	17.143,43
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	17.143,43



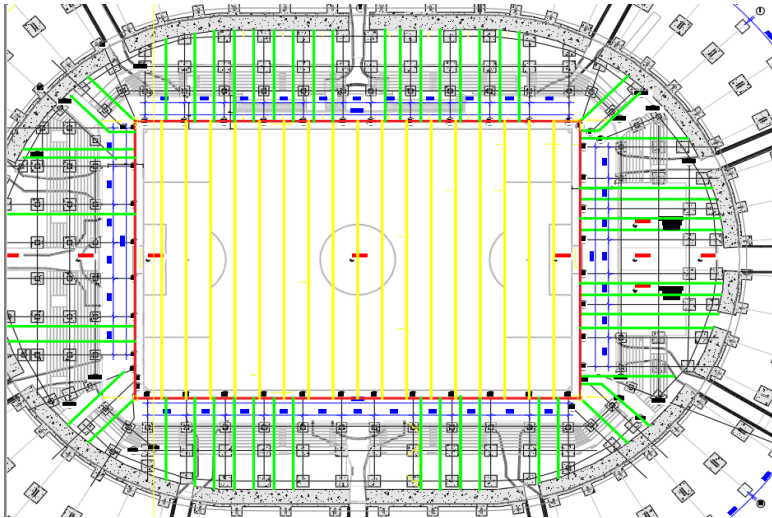
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_011	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXTENDIDA MANUAL DE LECHO FILTRANTE CON GRAVA TRITURADA GRADADO DE 3/4 A 1" EN ZANJAS TUBERIAS DE DRENAJES	U.M:	M3					
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUBERIA RUPTURA CAPILAR							
					TUBERIA DE 8" INTERIOR DE LA CANCHA	76,50	0,90		1,26	16,00		1.387,47
					TUBERIA DE 8" GRADERIA	21,81	0,90		1,66	63,00		2.053,07
					SUB TOTAL							

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 
----------------	--	---

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	3.440,53
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	3.440,53



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_012	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERÍAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y AGUAS LLUVIAS						U.M:	ML
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUBERIA RUPTURA CAPILAR							
					TUBERIA DE 8" INTERIOR DE LA CANCHA	1224,00						1.224,00
					TUBERIA DE 8" GRADERIA	1374,00						1.374,00
					TUBERIA DE 20"	360,00						360,00
					TUBERIA CAPTADORA DE AGUAS LLUVIA							
					TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12"	2750,00						2.750,00
					tuberia de 12"	33,00						33,00
					tuberia de 10"	211,00						211,00
					tuberia de 8"	175,00						175,00
SUB TOTAL												6.127,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

ACUMULADO ACTA ANTERIOR		0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:		6.127,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA		6.127,00

ACUMULADO A PRESENTE ACTA	1.374,00
---------------------------	----------

ACUMULADO A PRESENTE ACTA	380,00
---------------------------	--------

11.056.38



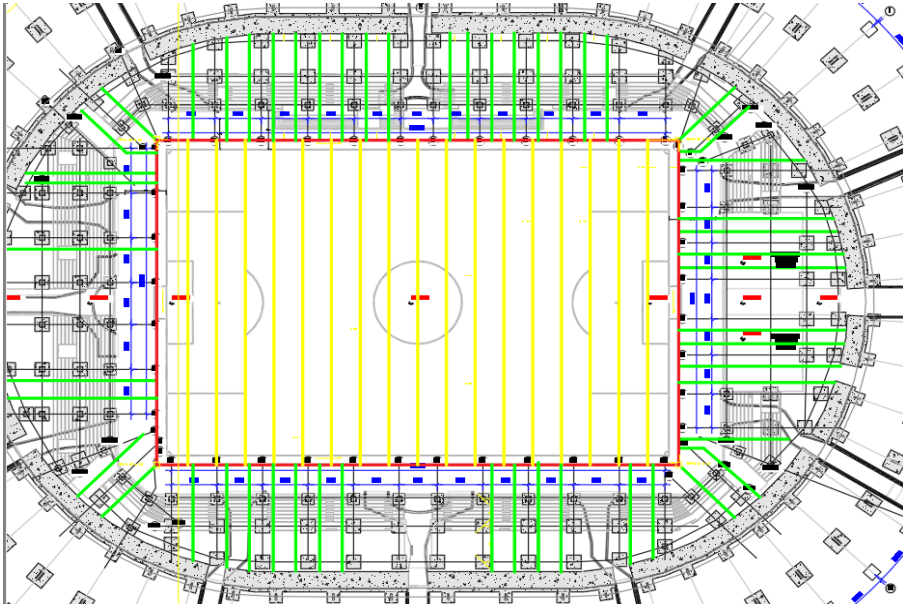
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

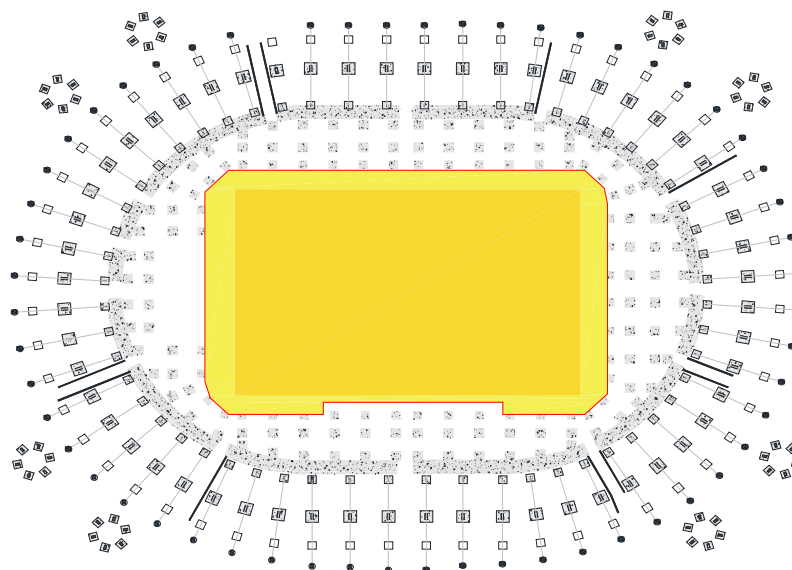

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_016	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SALIDA PUNTO DE EMPALME DE AGUAS DE DRENAJE CANCHA EN TUBERIA PVC SANITARIA 8" A ACOUPLE CON TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO NOVAFORT							U.M:	UN
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL	
					TUBERIA RUPTURA CAPILAR CONEXIONES					96,00		96,00	

SUB TOTAL 96,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	96,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	96,00

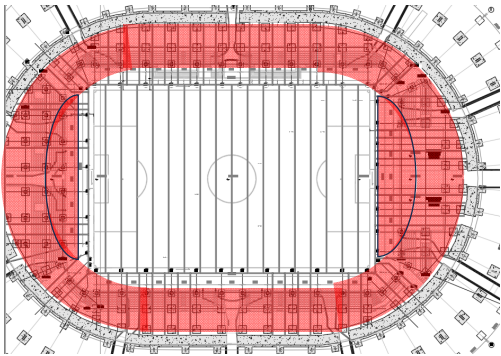
CONTRATISTA:		CONSORCIO METRO ESTADIO		OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
INTERVENTORIA:		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS													
PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026															
CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_017	CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS	U.M:	M3								
DESCRIPCION GRAFICA				LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL				
				AREA CANCHA	111,00	72,00	0,36					2.837,16			
				AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	0,30							736,58	
				TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50	0,30							182,73	
															SUB TOTAL
OBSERVACIONES:				Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:			Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:								
															



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS												
PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026													
CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_017	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS			U.M:	M3				
DESCRIPCION GRAFICA				LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL		
				GRADERIA ANCHO PROMEDIO	449,68	21,70	0,30				2.927,43		
				SUB TOTAL									2.927,43
OBSERVACIONES:				Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:								
													
				ACUMULADO ACTA ANTERIOR									0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:									6.683,90
ACUMULADO A PRESENTE ACTA									6.683,90				

CONTRATISTA:						CONSORCIO METRO ESTADO													
INTERVENTORIA:						PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS													
						OBJETO DEL CONTRATO:							OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA						
										PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026									
CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_025		CAPITULO:		NO PREVISTOS		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:				MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2". BAJA PERMEABILIDAD, ACCELERADO A TRES DIAS, INCLUYE: FORMALETA, CURADOR, VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN						U.M.		M3
DESCRIPCION GRAFICA										LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL		
										MUROS 55									
										TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	35,00		0,55	2,05	2,00		78,93		
										TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,50		0,55	2,05	2,00		86,82		
										TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	38,10		0,55	2,05	2,00		85,92		
										TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	33,90		0,55	2,05	2,00		76,44		
										TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	33,10		0,55	2,05	2,00		74,64		
										TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	32,60		0,55	2,05	2,00		73,51		
										TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,60		0,55	2,05	2,00		73,51		
										TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	34,40		0,55	2,05	2,00		77,57		
										TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	33,90		0,55	2,05	2,00		76,44		
										TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	34,00		0,55	2,05	2,00		76,67		
										MURO 35									
										TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	35,00		0,35	4,00	2,00		98,00		
										TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,50		0,35	4,00	2,00		107,80		
										TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	38,10		0,35	4,00	2,00		106,68		
										TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	33,90		0,35	4,00	2,00		94,92		
										TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	33,10		0,35	4,00	2,00		92,68		
										TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	32,60		0,35	4,00	2,00		91,28		
										TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,60		0,35	4,00	2,00		91,28		
										TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	34,40		0,35	4,00	2,00		96,32		
										TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	33,90		0,35	4,00	2,00		94,92		
										TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	34,00		0,35	4,00	2,00		95,20		
										GRADERIA									
										GRADERIA ANCHO PROMEDIO	461,00		0,45	4,30			892,04		
										SUB TOTAL								2.641,57	
OBSERVACIONES:											Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 				Vo.Bó. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 				
										ZARPA DE MUROS									

	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
	TOTAL PRESENTE ACTA:	3.953,23
	ACUMULADO A PRESENTE ACTA	3.953,23



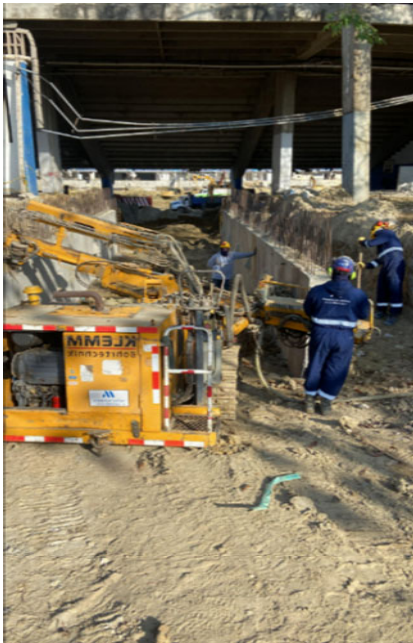
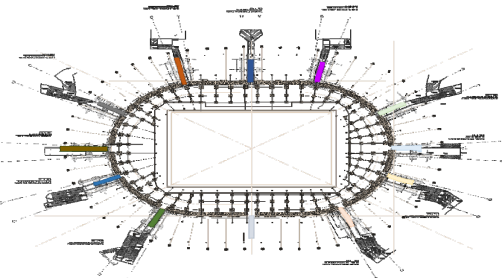
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_026	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8", L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.					U.M:	ML	
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	UND	CANT	TOTAL
 					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	15,00				15,00		225,00
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	15,00				15,00		225,00
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	15,00				15,00		225,00
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	15,00				15,00		225,00
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	15,00				15,00		225,00
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	15,00				15,00		225,00
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	15,00				15,00		225,00
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	15,00				14,00		210,00
					GRADERIA							
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO	15,00				66,00		990,00
SUB TOTAL											2.775,00	

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 
----------------	--	---

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	2.775,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	2.775,00



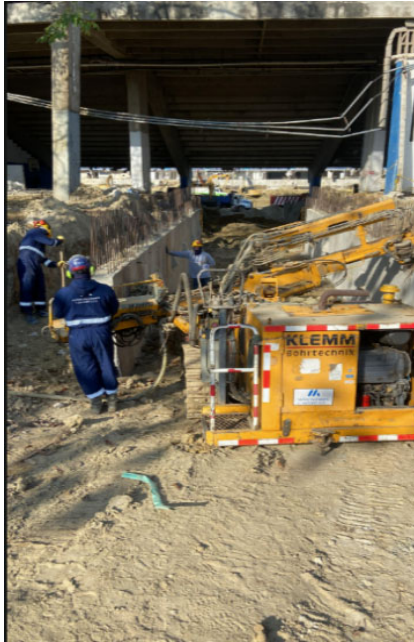
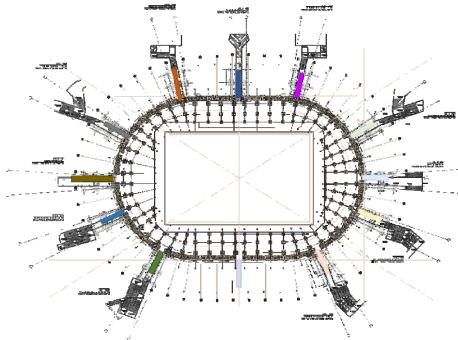
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_027	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8", L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.					U.M:	ML	
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	UND	CANT	TOTAL
 					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	21,00				7,00		147,00
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	21,00				7,00		147,00
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	21,00				7,00		147,00
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	21,00				7,00		147,00
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	21,00				7,00		147,00
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	21,00				6,00		126,00
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	21,00				6,00		126,00
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	21,00				6,00		126,00
					GRADERIA							
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO	21,00				47,00		987,00
					SUB TOTAL							

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
		

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	2.100,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	2.100,00

ACUMULADO A PRESENTE ACTA	185.00
---------------------------	--------



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_029	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA TRES ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		U.M:	UN				
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07					7,00		7,00
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11					7,00		7,00
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19					7,00		7,00
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25					7,00		7,00
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29					7,00		7,00
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33					6,00		6,00
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39					6,00		6,00
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46					6,00		6,00
					GRADERIA							
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO					47,00		47,00

SUB TOTAL 100,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
----------------	-------------------------------	--

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	100,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	100,00



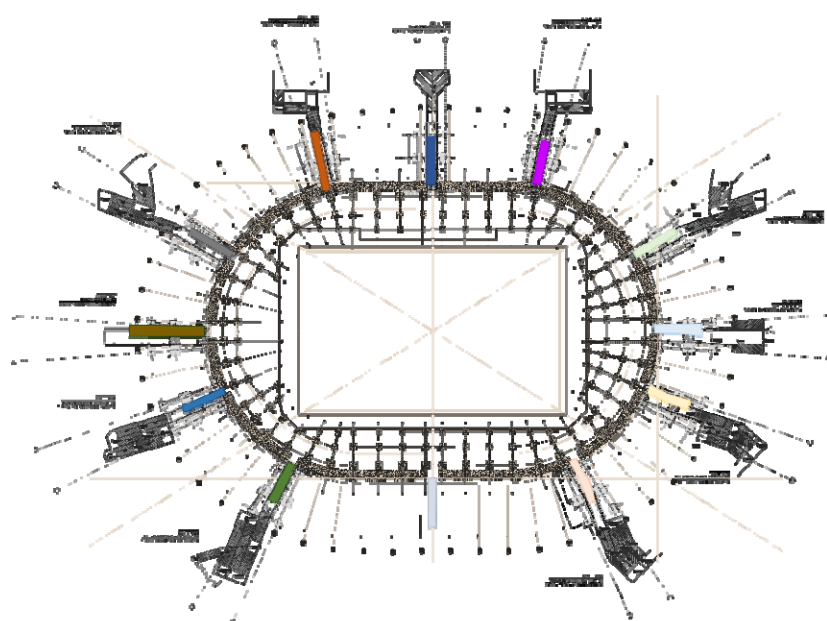
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA

2

CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS		

PERIODO: 01/02/2026 A 30/03/2026

CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_031	CAPITULO:	NO PREVISTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO					U.M:	ML	
DESCRIPCION GRAFICA					LOCALIZACION	LONG	ANCH	ESP	ALTU	CANT	NIVELES	TOTAL
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	36,00				4,00		144,00
SUB TOTAL												144,00

OBSERVACIONES:	Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 
----------------	--	---

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:	144,00
ACUMULADO A PRESENTE ACTA	144,00
