



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 11



Ilustración 1 CIV 16002708, VERAGUAS II.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 850 DE 2024

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ:	Santiago Carrillo Vargas	Representante legal de Interventoría.	

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
3. GENERALIDADES.....	6
3.1 Información General del Proyecto.....	6
3.2 Alcance, Estudios y Diseños.....	8
3.3 Localización del Proyecto.....	12
3.4 Descripción de Actividades Ejecutadas.....	24
4. Condiciones Contractuales Vigentes.....	25
4.1 Contrato de Obra.....	25
4.2 Contrato de Interventoría.....	26
5. ASPECTOS TÉCNICOS.....	27
5.1 Adición y prórroga al contrato de obra e interventoría.....	27
5.2 Ítems no previstos.....	27
5.3 Licencias y permisos.....	30
5.4 Avance del Proyecto en Tiempo.....	30
5.5 Descripción de actividades realizadas durante el periodo.....	31
5.6 Ensayos de laboratorio.....	31
Se realizaron ensayos LWD en el tramo Veraguas II CIV 16002708.....	31
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	32
6.1 Actas.....	32
6.2 Organigrama general del proyecto.....	32
7. ASPECTOS FINANCIEROS.....	32
7.1 Ejecución Financiera.....	32
7.1.1 Contrato de Obra.....	33
7.1.2 Contrato de Interventoría.....	33

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



8. ASPECTOS JURIDICOS.....	34
8.1 Garantía y vigencia de pólizas	34
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	36

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Listado de priorización inicial	8
Tabla 2 Listado de segmentos viales a incluir en el contrato de obra No 846 de 2024.....	10
Tabla 3 Listado de segmentos viales priorizados a intervenir en el contrato de obra No 846 de 2024.....	10
Tabla 4 Generalidades del contrato de obra.....	25
Tabla 5 Generalidades contrato de interventoría.....	26
Tabla 6 Tabla ítems no previstos N°1.....	27
Tabla 7 Tabla ítems no previstos N°2.....	28
Tabla 8 Tabla ítems no previstos N°3.....	29
Tabla 9 Avance en tiempo.....	30
Tabla 10 Actas levantadas durante el periodo evaluado	32
Tabla 11 Valores contrato de obra.....	33
Tabla 12 Valores contrato de interventoría	33
Tabla 13 Pólizas de Garantía iniciales del Contrato de Interventoría N° 850-FDLPA-2024	34
Tabla 14 Pólizas de Garantía acta de inicio y actualizaciones del Contrato de Interventoría N° 850-FDLPA-2024	34
Tabla 15 Pólizas de Garantía Adición- Prórroga y actualizaciones del Contrato de Interventoría N° 850-FDLPA-2024.....	35

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 CIV 16002708, VERAGUAS II.....	1
Ilustración 2 Zona de influencia del proyecto	12
Ilustración 3 Tramo # 1 PRIMAVERA OCCIDENTAL (CIV 16001611).....	13
Ilustración 4 Tramo # 2 PRIMAVERA OCCIDENTAL (CIV 16001664).....	13
Ilustración 5 Tramo # 3 SAN FRANCISCO (CIV 16000696).....	14
Ilustración 6 Tramo # 4 SAN FRANCISCO (CIV 16000586).....	14
Ilustración 7 Tramo # 5 AUTOPISTA MUZU (CIV 16003772)	15
Ilustración 8 Tramo # 6 PUENTE ARANDA (CIV 16000124).....	15
Ilustración 9 Tramo # 7 COMUNEROS (CIV 16002911)	16

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



Ilustración 10 Tramo # 8 COMUNEROS (16002866)	16
Ilustración 11 Tramo # 9 GALAN (CIV 16001545)	17
Ilustración 12 Tramo # GALAN (16001079).....	17
Ilustración 13 Tramo # 11 JORGE GAITAN CORTES (16002164)	18
Ilustración 14 Tramo # 12 SAN EUSEBIO (CIV 16002834)	18
Ilustración 15 Tramo # 13 REMANSO (CIV 16003336)	19
Ilustración 16 Tramo # 14 COMUNEROS (CIV 16002708)	19
Ilustración 17 Tramo # 15 COLON (CIV 16000940)	20
Ilustración 18 Tramo # 16 COLON (CIV 16000839)	20
Ilustración 19 Tramo # 17 CAMELIA II (CIV 16001839)	21
Ilustración 20 Tramo # 18 CAMELIA II (CIV 16001833)	21
Ilustración 21 Tramo # 19 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16002303)	22
Ilustración 22 Tramo # 20 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16002253)	22
Ilustración 23 Tramo # 21 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16002241)	23
Ilustración 24 Tramo # 22 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16001124)	23
Ilustración 25 Avance programado contra ejecutado.....	31
Ilustración 26 Organigrama profesionales PAVIAS 2025	32

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Informes técnicos semanales realizados durante el periodo evaluado.....	31
---	----



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



1. INTRODUCCIÓN.

EL Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda realizó la licitación pública No. FDLPA-LP-023 2024, en la cual se seleccionó la firma constructora CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA con la cual se suscribe el contrato de obra N° 846-2024 cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”.

De otra parte y paralela al contrato de obra, el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda ordenó la apertura del Concurso de Méritos Abierto No. FDLPA-CMA- 029-2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.” para realizar seguimiento a la ejecución de las obras garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para el Distrito Capital, por lo cual se efectuó este contrato de Interventoría.

Cabe resaltar que la adjudicación del contrato de interventoría se realizó al CONSORCIO INTER VIAL 029 G&J, donde ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO identificado con C.C. No. 72.227.511 expedida en Barranquilla (Atlántico), quien en adelante se denominará EL CEDENTE y por la otra SANTIAGO CARRILLO VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 75.518.952 en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO PAVIAS 2025 integrado por SAVIMAC S.A.S. (50%), con NIT. 900.984.598-9 y AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S. (50%), con NIT. 901.719.068-6 de conformidad con la carta de compromiso Consorcial, quien en adelante se denominará EL CESIONARIO.

Para el desarrollo de las actividades propuestas en el presente documento y la ejecución de las actividades, se cuenta con los recursos humanos y económicos establecidos y dispuestos para el presente contrato.

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



Se describe a continuación en el contenido del presente informe: Información de los contratos, Información general del proyecto, aspectos contractuales, actividades ejecutadas, personal y equipo del contratista, materiales, cantidades y costos de obra ejecutada, avance físico y financiero, actividades de la Interventoría, informe técnico y sus respectivos anexos.

2. OBJETIVOS.

Describir de forma concisa, pertinente y completa las actividades realizadas por el contratista, de tal manera que el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda esté enterado de los avances y sucesos ocurridos durante el desarrollo del contrato.

Generar un medio de consulta, de fácil acceso y comprensión, para cualquier persona o entidad que necesite información sobre los avances y acontecimientos del contrato de obra e interventoría.

Mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda sobre los seguimientos, procesos, revisiones, aprobaciones, recomendaciones y observaciones que la Interventoría hace al contratista en las diferentes actividades.

Cumplir con la obligación contractual de elaborar y presentar un informe mensual al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

3. GENERALIDADES.

3.1 Información General del Proyecto.

Posterior a la adjudicación de la licitación pública No. FDLPA-LP-023 2024, mediante la resolución de adjudicación No. 258 de fecha 24 de diciembre de 2024, se firma el contrato de obra pública No. 846–2024, entre el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA. Una vez cumplidas las actividades contractuales preliminares establecidas se procede a la firma del acta de inicio de obra el día 07 de abril de 2025. Dando inicio al contrato de interventoría No. 850-2024 y el contrato de obra pública 846–2024.

Teniendo en cuenta los tiempos contractuales el cual tiene un plazo inicial de ejecución de ocho (8) meses que comprenden desde la fecha de acta de inicio 07



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



de abril del 2025 hasta la fecha inicial de terminación 06 de diciembre de 2025, el contratista CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA realiza una solicitud de adición y prórroga del contrato de obra 846-2024 emitida mediante oficio COP-846-2024/034-2025, prórroga por un periodo de tres (3) meses, periodo comprendido entre el 07 de diciembre de 2025 al 06 de marzo de 2026 y una adición de tres mil ciento setenta y cinco millones setecientos ochenta y un mil novecientos diecinueve pesos (\$ 3.175.781.919,00) en el que se conceptuó el aval de la adición y prórroga N°1 y en consecuencia la adición del contrato de interventoría 850 – 2024 por doscientos veinticinco millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos doce pesos (\$ 225.450.312,00) y prórroga por el mismo periodo de tres (3) meses para un plazo total de ejecución de once (11) meses y fecha de terminación el 6 de marzo de 2026.

A lo anterior se realizó AVAL A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO DE OBRA 846-2024 mediante oficio CIN-850-2024-052 radicado al FDLPA N° 20256610055212 y SOLICITUD DE ADICION Y PROROGA No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA mediante oficio CIN-850-2024-055 radicado al FDLPA N° 20256610055222.

Que con la presente contratación, el efecto es directo sobre los beneficios frente a la población en general de la localidad de Puente Aranda, sin diferenciaciones de carácter social o de estrato; es ejecutar una estrategia fundamental en la articulación de intervenciones físicas, teniendo en cuenta temas sociales (participación ciudadana y organización comunitaria), desarrollando procesos pedagógicos que generen aprendizajes para las organizaciones, para las comunidades y para la institucionalidad y por ende contribuyan a fortalecer el tejido social. Por ello se debe contar con herramientas físicas que logren una mejor sinergia entre la comunidad en sus espacios públicos, crear el camino a una consolidación de la localidad en todos sus aspectos. Las prioridades del programa corresponden a la integración de las comunidades con el desarrollo de los proyectos, que promueva redes sociales de gestión, al desarrollo de acciones sinérgicas para generar y/o fortalecer condiciones favorables para la relación de los actores sociales con la institucionalidad, potencializar el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias, a través de intervenciones la infraestructura vial y espacio público además del desarrollo de una pedagogía para el enriquecimiento de la Vida Comunitaria.



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



3.2 Alcance, Estudios y Diseños.

De acuerdo a los pliegos de condiciones y el anexo técnico, con el presente contrato de obra se pretende intervenir 21 CIV'S en el marco de la conservación, mantenimiento y recuperación de la malla vial de la localidad, para realizar mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción en los segmentos priorizados por el FDLPA, con un presupuesto de obra de SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (6.351.563.839,00) de pesos, sin dejar a un lado que las obras se realizarán con el objeto claro de que el contrato es a monto agotable.

Tabla 1 Listado de priorización inicial

ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	ÁREA (m ²)	TIPO DE INTERVENCIÓN
1	16001611	CL 5C	KR 39D	KR 40	PRIMAVERA OCCIDENTAL	300,6	Mantenimiento periódico
2	16001664	KR 39D	CL 5 A	CL 5 C	PRIMAVERA OCCIDENTAL	670,08	Reconstrucción
3	16000696	DG 5FBIS	TV 47	TV 48	SAN FRANCISCO	664,05	Reconstrucción
4	16000586	DG 5FBIS	TV 48A	TV 48	SAN FRANCISCO	269,77	Reconstrucción
5	16003772	KR 39B	CL 29A S	CL 29B S	AUTOPISTA MUZU	455,93	Reconstrucción
6	16000124	CL 18	KR 55	KR 56	PUENTE ARANDA	594,25	Reconstrucción
7	16002911	KR 30A	AC 3	CL 4	COMUNEROS	405,96	Reconstrucción
8	16002866	KR 30A	CL 4	CL 4BIS	COMUNEROS	385,25	Rehabilitación
9	16001545	CL 2B	TV 53A	KR 53BBIS	GALAN	365,82	Rehabilitación
10	16001079	KR 57A	CL 2B	CL 2C	GALAN	406,97	Rehabilitación
11	16002164	CL 2D	KR 39	KR 39A	JORGE GAITAN CORTES	248,48	Rehabilitación

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



12	16002834	KR 51C	CL 24 S	AC 26 S	SAN EUSEBIO	578,47	Reconstrucción
13	16003336	CL 10A S	KR 36	KR 37	REMANSO	283,32	Mantenimiento rutinario
14	16002708	KR 31A BI	CL 4A	CL 5	COMUNEROS	702,65	Reconstrucción
15	16000940	CL 4A	KR 54	KR 55	COLON	282,7	Reconstrucción
16	16000839	KR 55	CL 4B	CL 4CBIS	COLON	665,3	Reconstrucción
17	16001839	TV 53BIS	CL 1 S	CL 1C	CAMELIA II	319,22	Reconstrucción
18	16001833	CL 1C	TV 53	TV 53 BIS	CAMELIA II	1986,3	Reconstrucción
19	16002303	KR 38B BIS	CL 2B	CL 2C	JORGE GAITAN CORTES	160,91	Reconstrucción
20	16002253	KR 38B BIS	CL 2C	CL 2C BIS	JORGE GAITAN CORTES	52,07	Reconstrucción
21	16002241	KR 38B BIS	CL 2C BIS	CL 2D	JORGE GAITAN CORTES	83,22	Reconstrucción

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

NOTA: Durante la ejecución del proyecto, el FDLPA podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas y/o elementos de espacio público, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías y/o elementos de espacio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local de la Localidad de Puente Aranda. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, requerimientos especiales según la necesidad de urgencia o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

Para el presente contrato nace la necesidad de realizar la inclusión del segmento vial CIV (16001124) Calle 15 entre carrera 35 y carrera 36 barrio Estación Central al contrato de obra pública No 846 de 2024. La cual se presentó mediante Acta el 1 de abril del 2025, donde se manifiesta los motivos por el cual se realiza la inclusión que según el JUZGADO CUARENTA ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN IV RADICADO: 110013337040202200194 00, ordena a la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA, que en cumplimiento de sus funciones legales y contractuales, adopte las medidas presupuestales, contractuales, administrativas y financieras a que haya lugar, para llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación del segmento vial en mención.

Tabla 2 Listado de segmentos viales a incluir en el contrato de obra No 846 de 2024.

ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE INTERVENCIÓN
22	16001124	CALLE 15	CARRERA 35	CARRERA 36	ESTACIÓN CENTRAL	Reconstrucción

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Tabla 3 Listado de segmentos viales priorizados a intervenir en el contrato de obra No 846 de 2024.

N°	ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	ÁREA (m ²)	TIPO DE INTERVENCIÓN
1	3	16000696	DG 5FBIS	TV 47	TV 48	SAN FRANCISCO	664,05	Reconstrucción
2	4	16000586	DG 5FBIS	TV 48A	TV 48	SAN FRANCISCO	269,77	Reconstrucción
3	6	16000124	CL 18	KR 55	KR 56	PUENTE ARANDA	594,25	Reconstrucción
4	16	16000839	KR 55	CL 4B	CL 4CBIS	COLON	665,3	Reconstrucción
5	17	16001839	TV 53BIS	CL 1 S	CL 1C	CAMELIA II	319,22	Reconstrucción
6	18	16001833	CL 1C	TV 53	TV 53 BIS	CAMELIA II	1986,3	Reconstrucción
7	22	16001124	CALLE 15	CARRERA 35	CARRERA 36	ESTACIÓN CENTRAL		Reconstrucción
8	7	16002911	KR 30A	AC 3	CL 4	VERAGUAS	405,96	Reconstrucción
9	15	16000940	CL 4A	KR 54	KR 55	COLON	282,7	Reconstrucción

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



10	14	16002708	KR 31A BI	CL 4A	CL 5	VERAGUAS	702,65	Reconstrucción
11	S.F	16000533	TV 48A	DG 5FBIS	DG 5F	SAN FRANCISCO	286,03	Acción de movilidad S. F
12	19	16002303	KR 38B BIS	CL 2B	CL 2C	JORGE GAITAN CORTES	160,91	Acción de movilidad
13	20	16002253	KR 38B BIS	CL 2C	CL 2C BIS	JORGE GAITAN CORTES	52,07	Acción de movilidad
14	21	16002241	KR 38B BIS	CL 2C BIS	CL 2D	JORGE GAITAN CORTES	83,22	Acción de movilidad
15	7	16002911	KR 30A	AC 3	CL 4	VERAGUAS		Acción de movilidad intersección
16	15	16000940	CL 4A	KR 54	KR 55	COLON		Acción de movilidad intersección
17	6	16000124	CL 18	KR 55	KR 56	PUENTE ARANDA		Acción de movilidad intersección
18	PKID	16000146	KR 57	CL 17	CL 17A	PUENTE ARANDA		Acción de movilidad
19	PKID	16000120- 32	CL 17A	KR 58	KR 57	PUENTE ARANDA		Acción de movilidad
20	PKID	16000131- 31	CL 17A	KR 57	KR 56	PUENTE ARANDA		Acción de movilidad
21	PKID	16000120- 33	CL 17A	KR 58	KR 57	PUENTE ARANDA		Acción de movilidad

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025.

En la tabla anterior se muestran la totalidad de segmentos viales a intervenir en el contrato de obra N° 846 de 2024. Con el objetivo de generar una cobertura más amplia de los segmentos de priorización inicial se dio el aval a la adición y prórroga del contrato de obra 846, con esto se ajusta el balance y programación para realizar la intervención de siete segmentos viales más de los cuales hacen parte del listado inicial del contrato para un total de intervención de 14 CIV´S.

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Cabe aclarar que se deja un rubro de acción de movilidad de los cuales cuatro de los CIV'S de los catorce priorizados se van a intervenir bajo esta modalidad además de intersecciones y PKID. Su intervención estará sujeto al presupuesto asignado para este ítem.

3.3 Localización del Proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá D.C. Este comprende los trabajos necesarios para el mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y señalización/demarcación de los tramos viales seleccionados en este anexo, en el marco de la conservación y mantenimiento de vías urbanas locales.

La localidad Puente Aranda limita al norte con la localidad Teusaquillo, con la Avenida de las Américas o Avenida Calle 23 y cruza la Avenida Ferrocarril de Occidente o Avenida Calle 22; al oriente con la localidad Los Mártires y cruza la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30; al sur con las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño, cruza la Avenida de Sur o Transversal 35 o Avenida Calle 45ª Sur; y al occidente con la localidad de Kennedy y cruza la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida Carrera 63.

Ilustración 2 Zona de influencia del proyecto

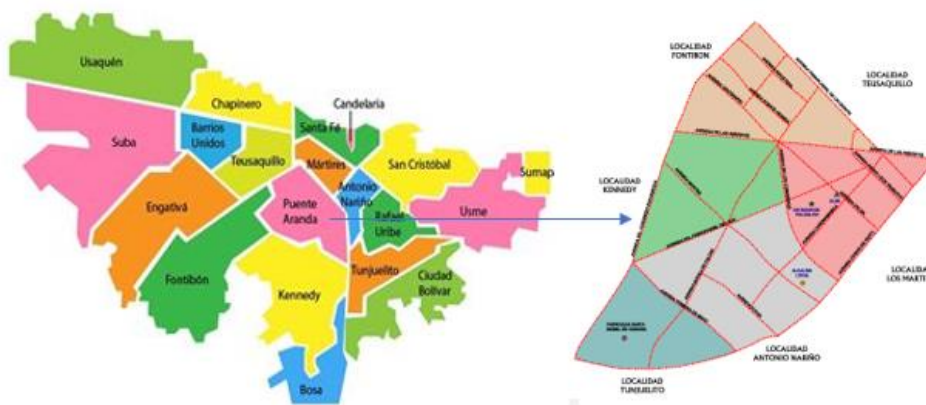

Fuente: Google




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 3 Tramo # 1 PRIMAVERA OCCIDENTAL (CIV 16001611)

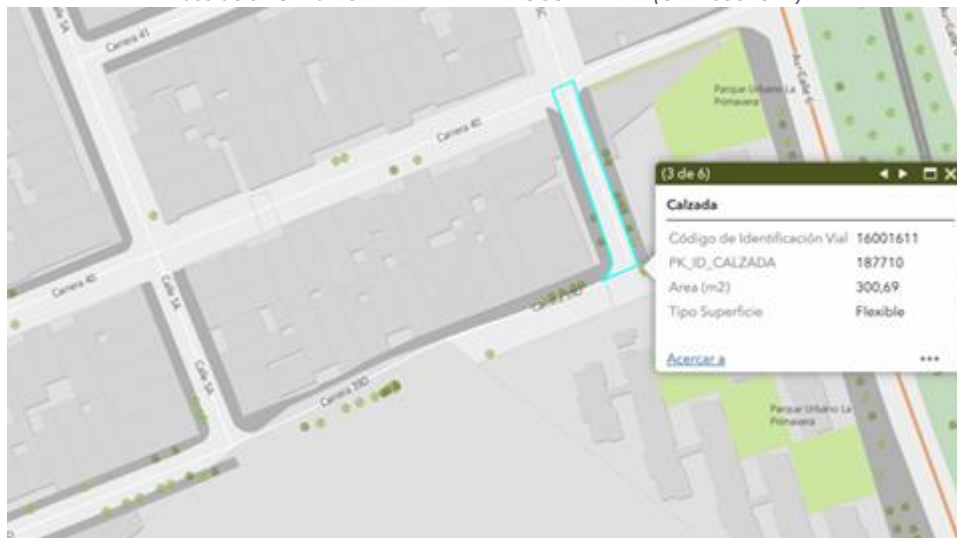

Fuente: SIGIDU

Ilustración 4 Tramo # 2 PRIMAVERA OCCIDENTAL (CIV 16001664)

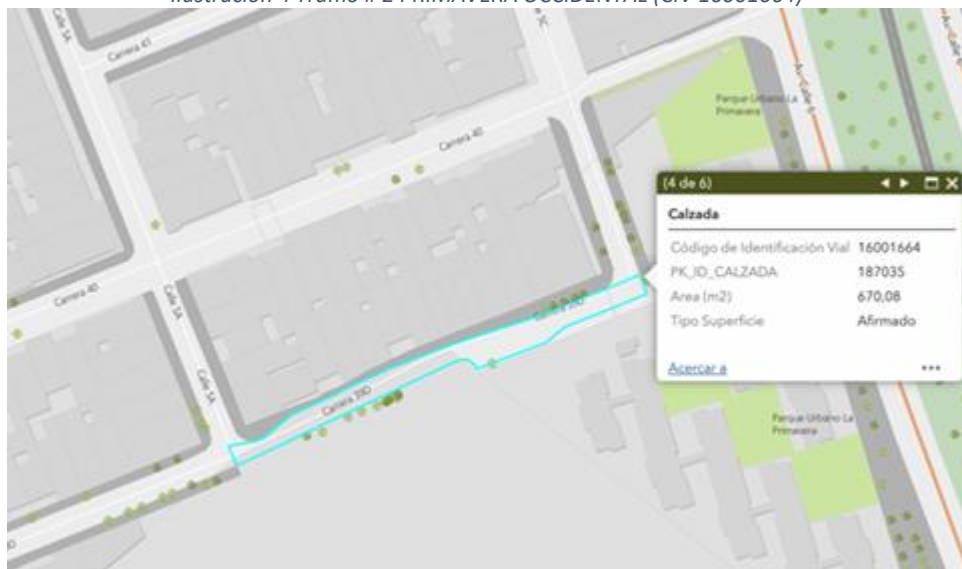

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 5 Tramo # 3 SAN FRANCISCO (CIV 16000696)

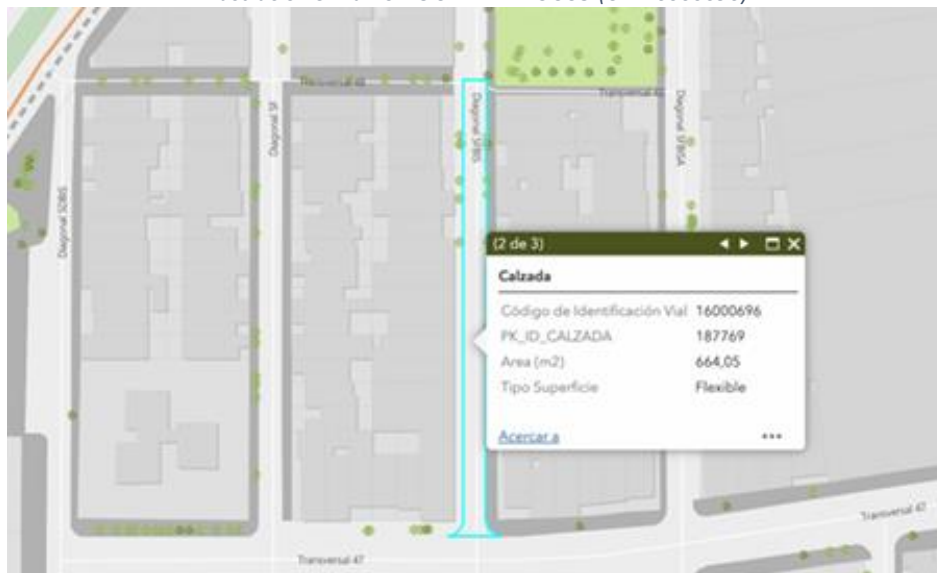

Fuente: SIGIDU

Ilustración 6 Tramo # 4 SAN FRANCISCO (CIV 16000586)

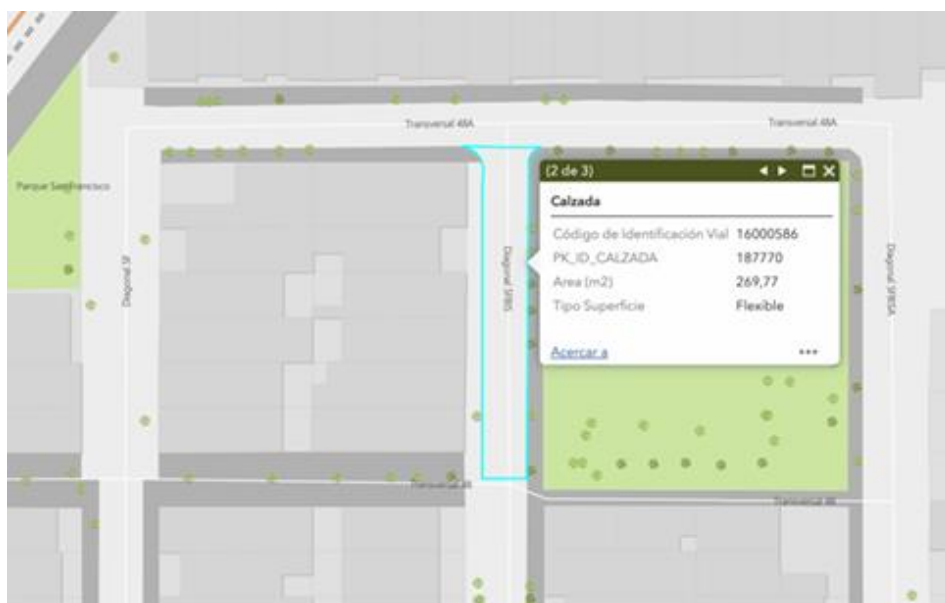

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consortiopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 7 Tramo # 5 AUTOPISTA MUZU (CIV 16003772)

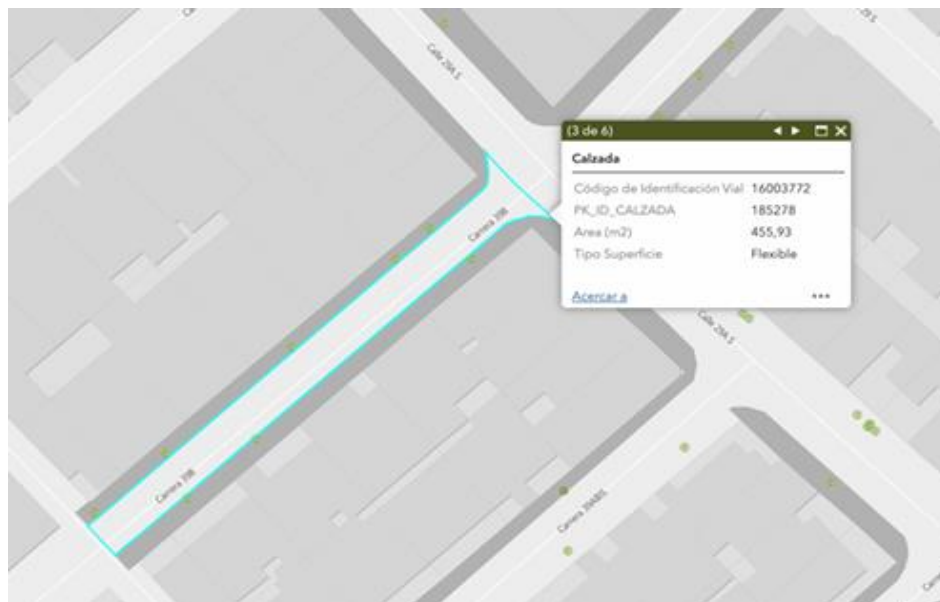

Fuente: SIGIDU

Ilustración 8 Tramo # 6 PUENTE ARANDA (CIV 16000124)

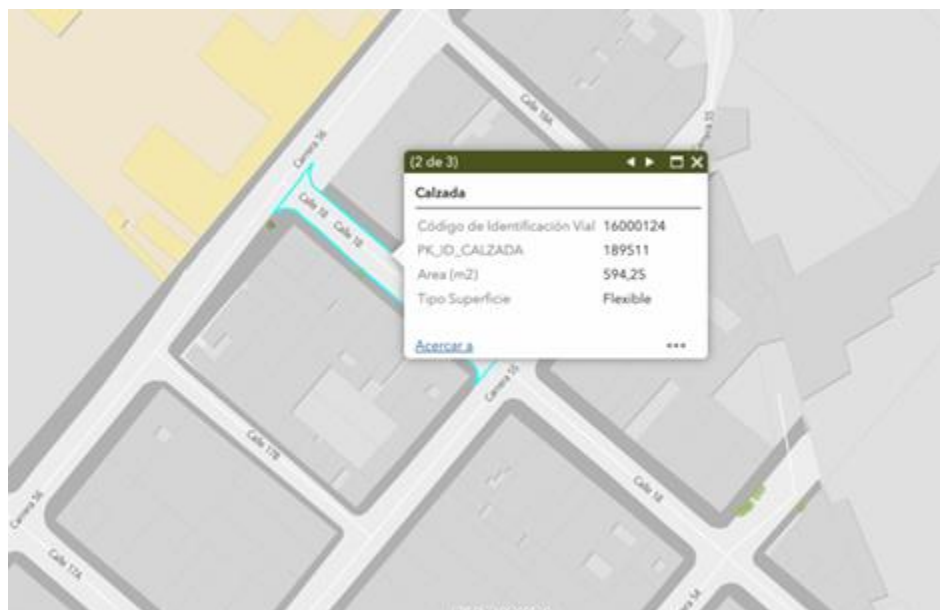

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 9 Tramo # 7 COMUNEROS (CIV 16002911)

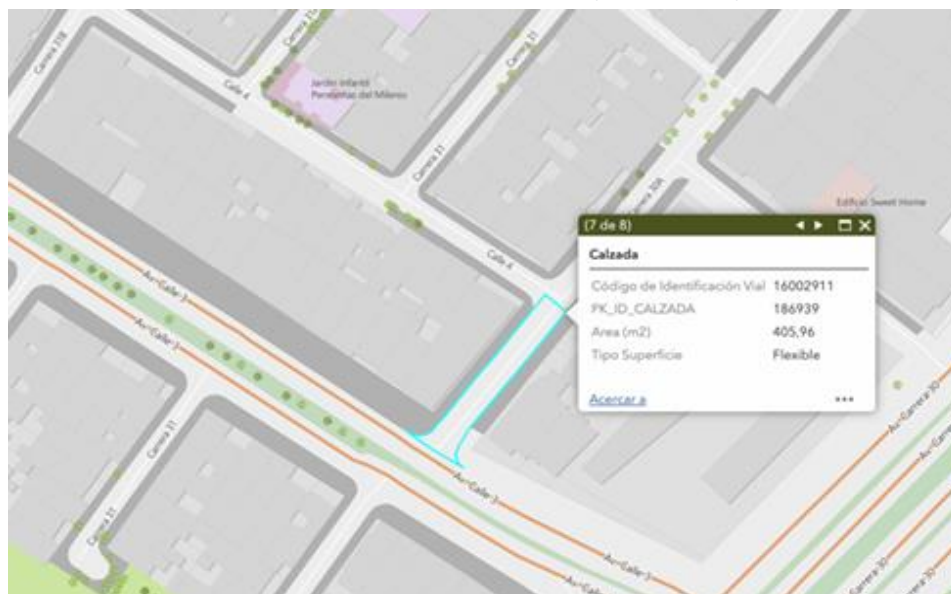

Fuente: SIGIDU

Ilustración 10 Tramo # 8 COMUNEROS (16002866)

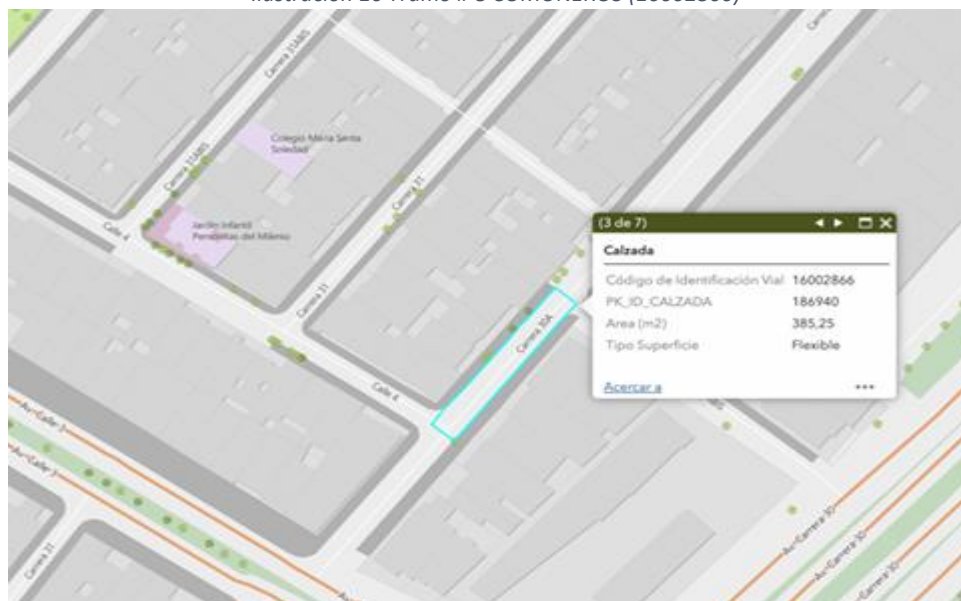

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consortiopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 11 Tramo # 9 GALAN (CIV 16001545)

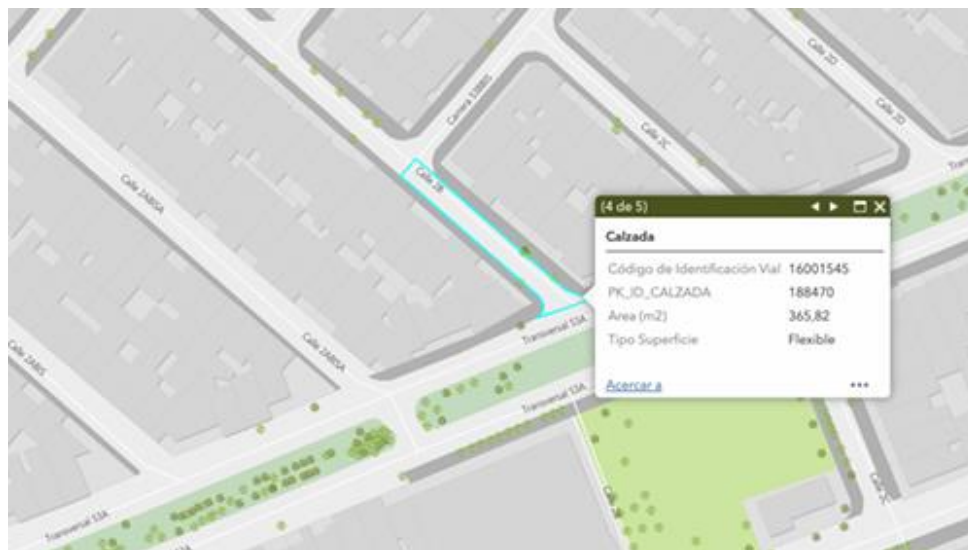

Fuente: SIGIDU

Ilustración 12 Tramo # GALAN (16001079)

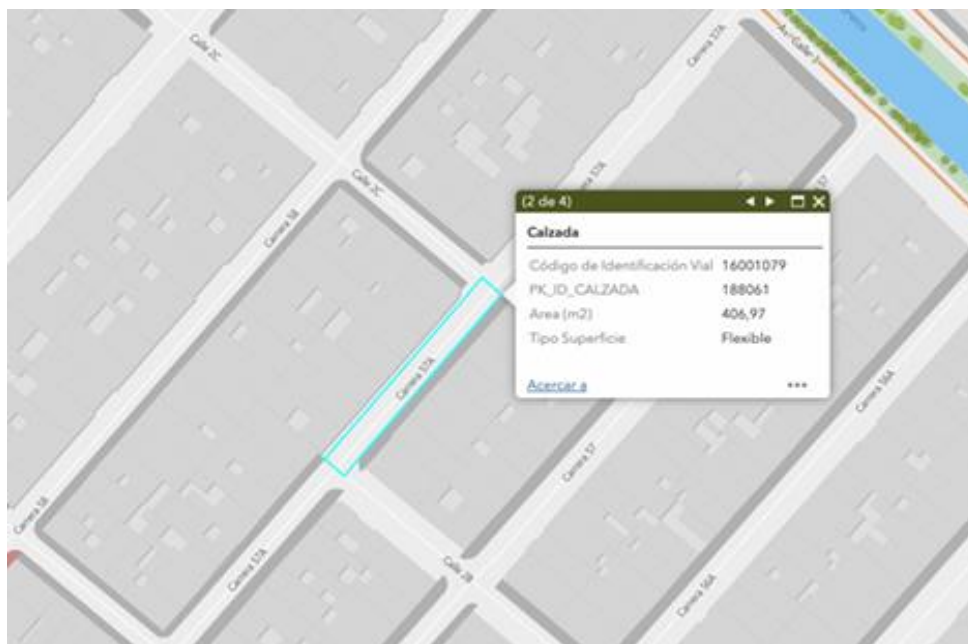

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 13 Tramo # 11 JORGE GAITAN CORTES (16002164)

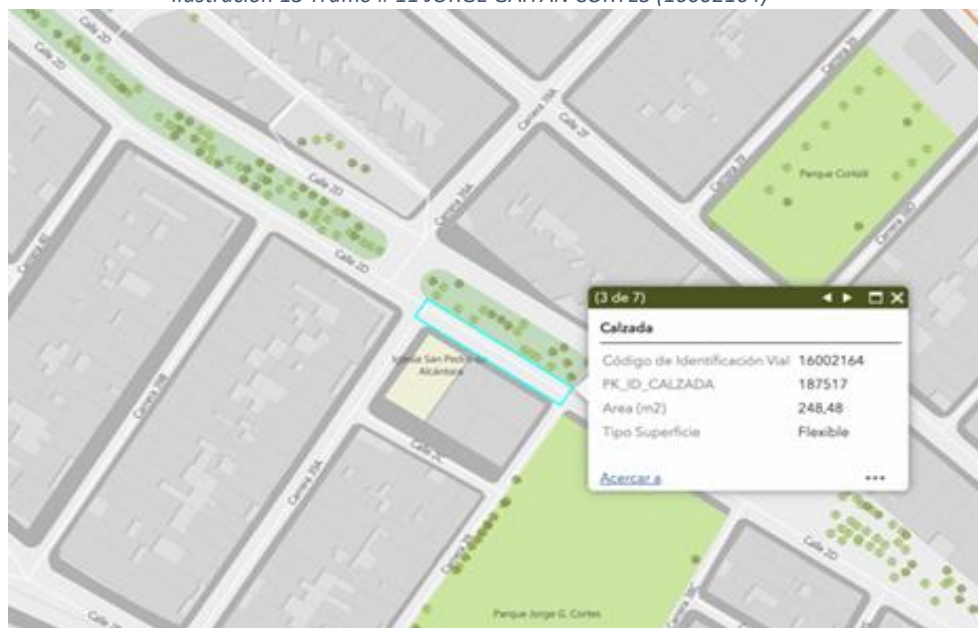

Fuente: SIGIDU

Ilustración 14 Tramo # 12 SAN EUSEBIO (CIV 16002834)

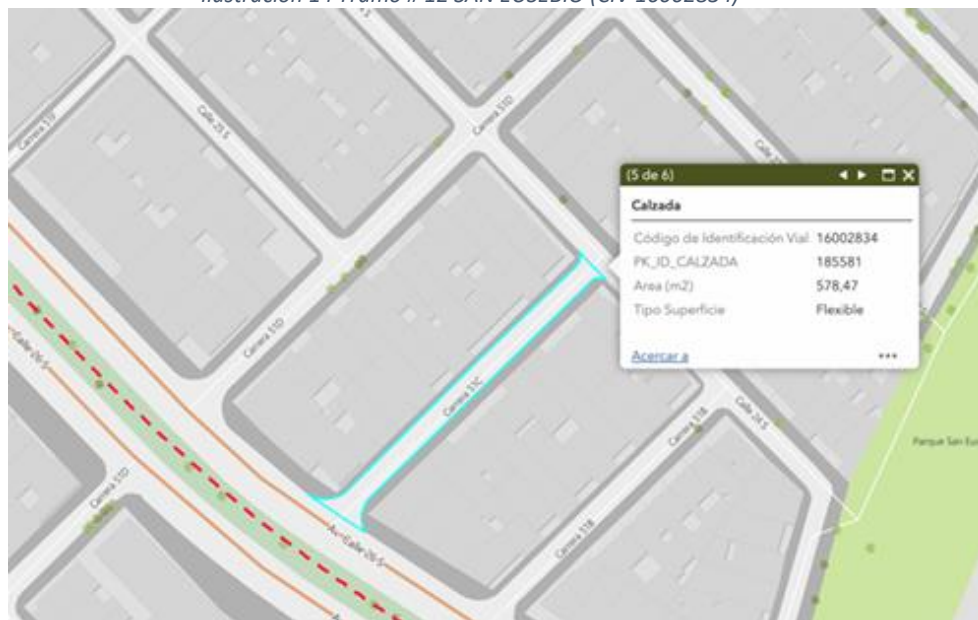

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consortiopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 15 Tramo # 13 REMANSO (CIV 16003336)

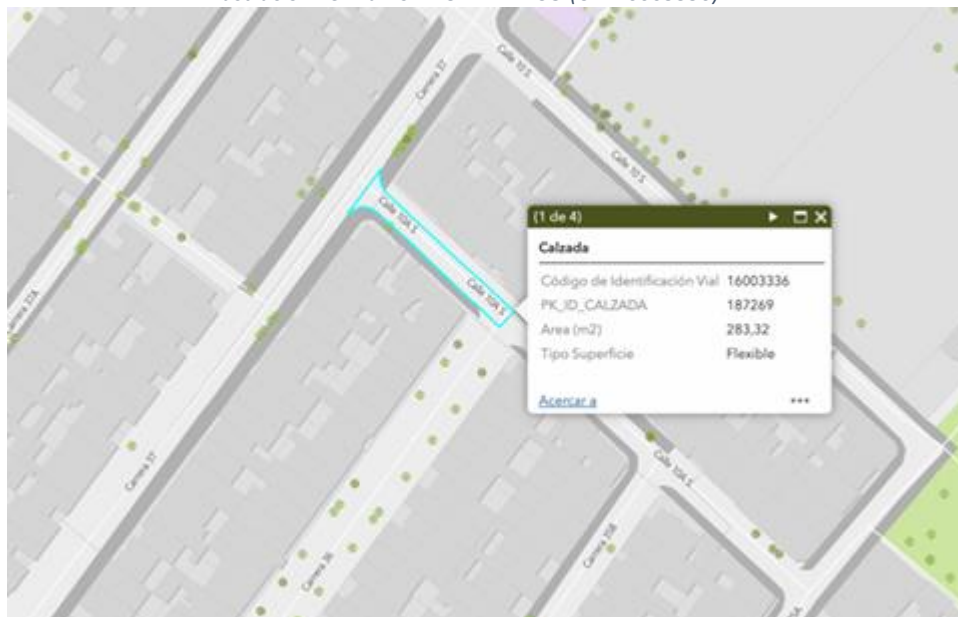

Fuente: SIGIDU

Ilustración 16 Tramo # 14 COMUNEROS (CIV 16002708)

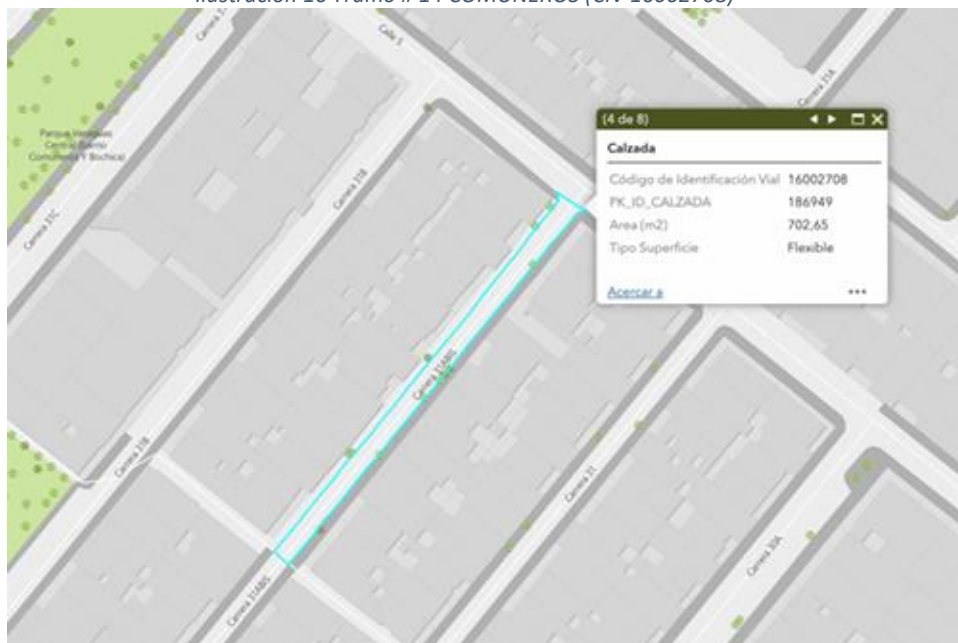

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 17 Tramo # 15 COLON (CIV 16000940)

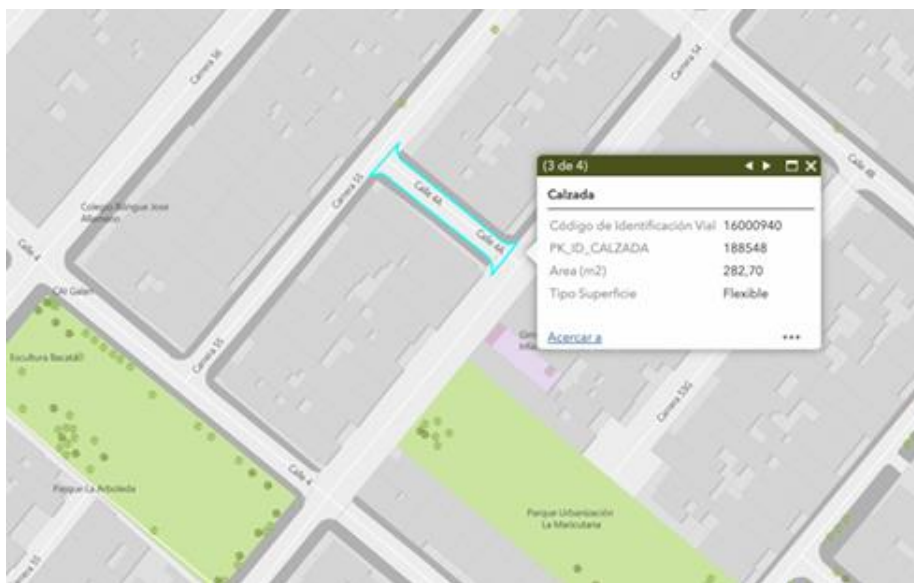

Fuente: SIGIDU

Ilustración 18 Tramo # 16 COLON (CIV 16000839)

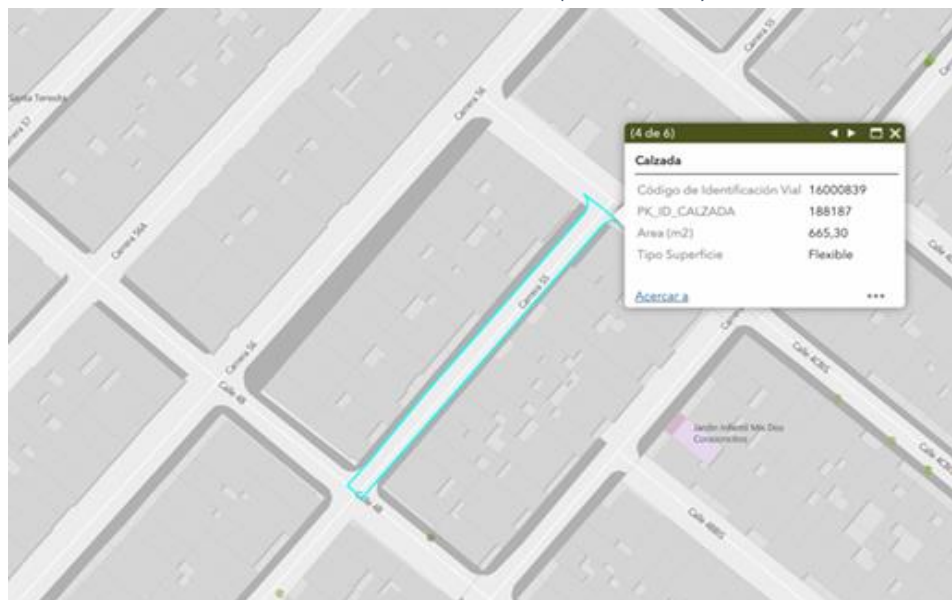

Fuente: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026

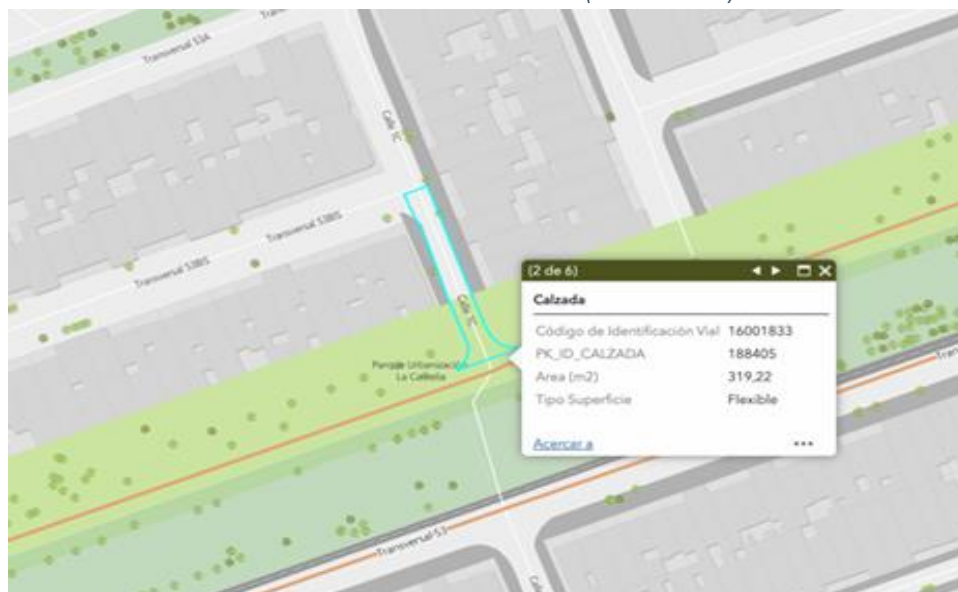


Ilustración 19 Tramo # 17 CAMELIA II (CIV 16001839)



Fuente: SIGIDU

Ilustración 20 Tramo # 18 CAMELIA II (CIV 16001833)



fuentes: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




Ilustración 21 Tramo # 19 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16002303)

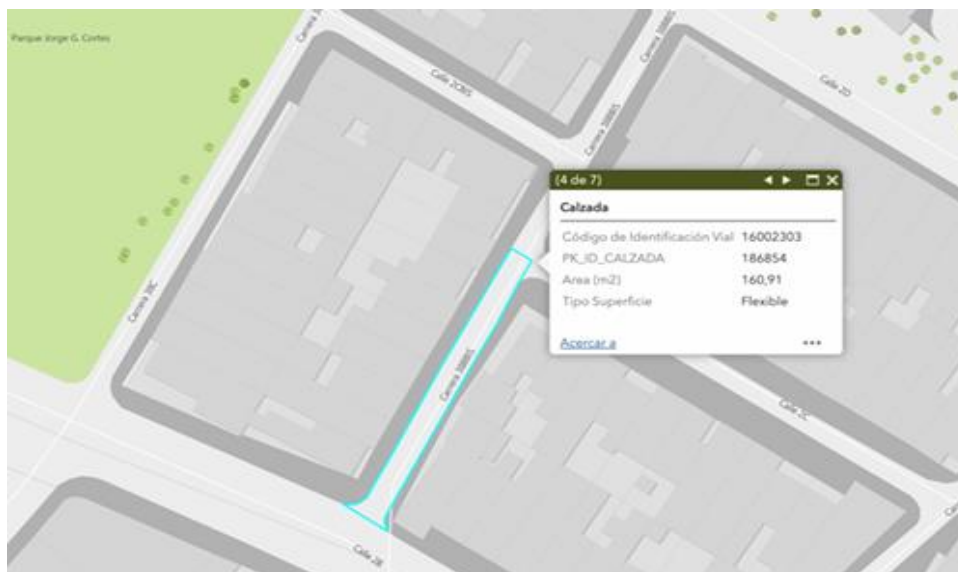

fuentes: SIGIDU

Ilustración 22 Tramo # 20 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16002253)

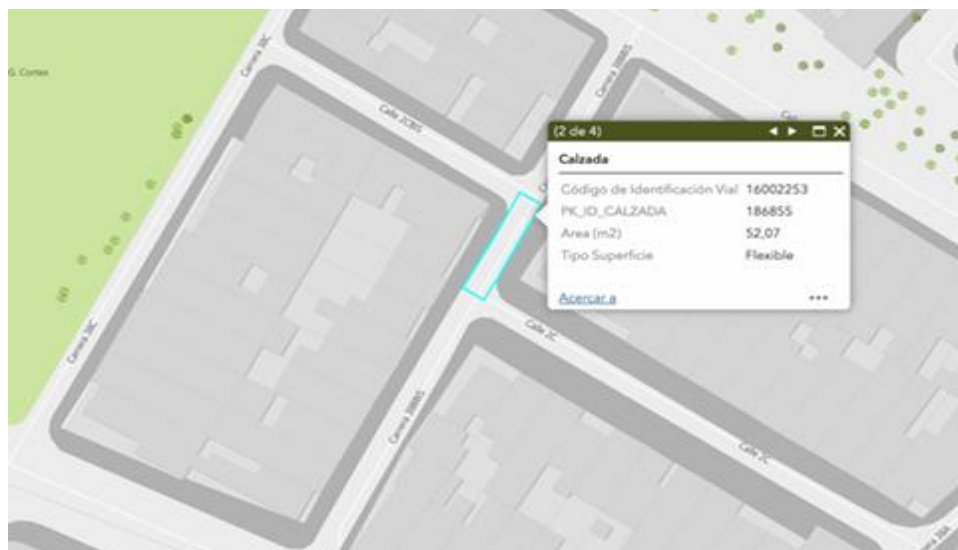

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026




fuelle: SIGIDU

Ilustración 23 Tramo # 21 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16002241)

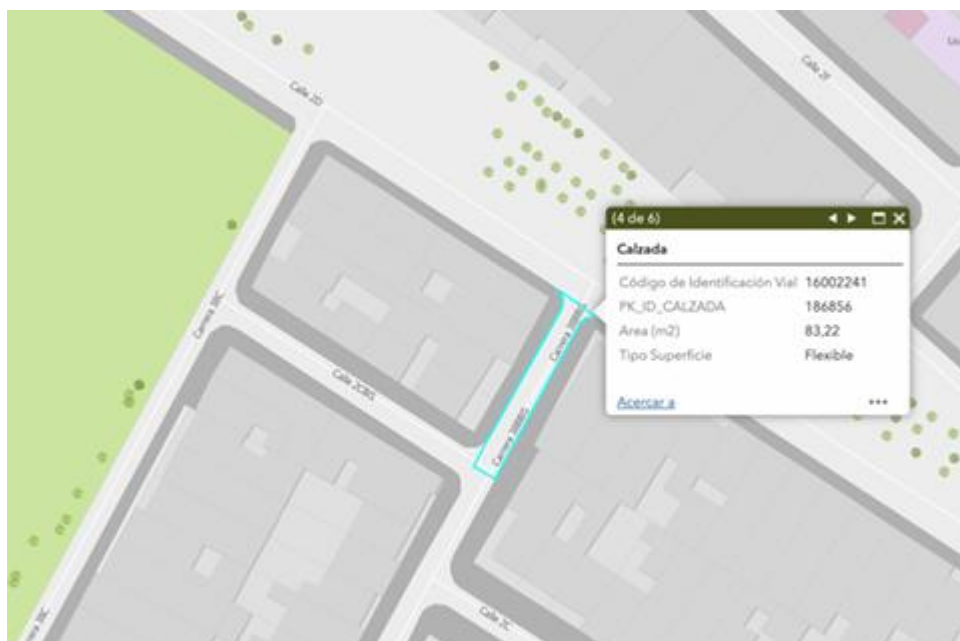

fuelle: SIGIDU

Ilustración 24 Tramo # 22 JORGE GAITAN CORTES (CIV 16001124)

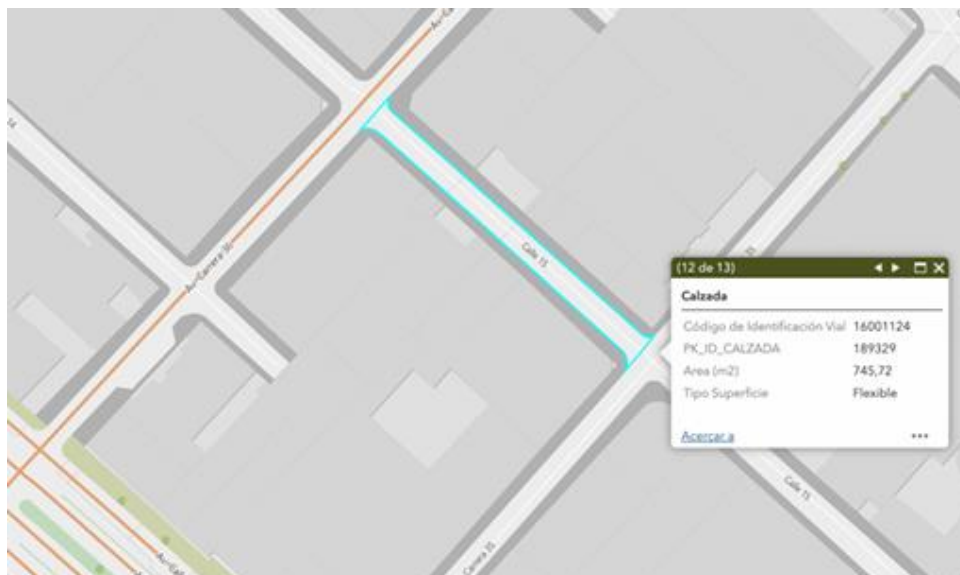

fuelle: SIGIDU

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



3.4 Descripción de Actividades Ejecutadas.

La Interventoría del contrato realiza la supervisión y control técnico, administrativo, legal, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, social y financiero del contrato de obra, de acuerdo a las obligaciones descritas en el contrato y los manuales de interventoría del IDU. Lo anterior mediante visitas técnicas de obra, revisión de especificaciones, seguimiento y control a las actividades desarrolladas, asistencia a comités.

La Interventoría se desarrolla implementando como primera medida los manuales de calidad del proceso de la empresa, utilizando herramientas y normas descritas en el Marco Teórico de este documento y realizando:

- ✓ Inspecciones diarias de procesos constructivos.
- ✓ Revisión de la implementación de PMT.
- ✓ Revisión del personal con afiliaciones y si se cumple con lo solicitado por el FDLPA en cuanto al porcentaje que debe ser de la zona.
- ✓ Revisión del estado de maquinaria.
- ✓ Revisión de materiales allegados a los frentes.
- ✓ Supervisión de ensayos tomados en sitio.
- ✓ Realización de Actas de Vecindad en conjunto con el Contratista
- ✓ Socialización de los CIV'S a Intervenir
- ✓ Atención de peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ Comités técnicos de obra para definir y solucionar problemas presentados en los frentes de obra.
- ✓ Recibo de capas de estructura con la comisión de topografía
- ✓ Control de gastos relacionados en los informes de buen manejo de anticipo
- ✓ Seguimiento a las vigencias de las Pólizas

Lo anterior con el equipo profesional capacitado para desarrollar estas actividades ya que el control y seguimiento que la interventoría realiza, está encaminada a hacer cumplir los requerimientos del cliente contemplados en las obligaciones contractuales.

Es importante resaltar que la Interventoría cuenta con un plan de calidad acorde para cubrir los requisitos solicitados, donde se incluyen los formatos para tomar los datos respectivos y soportar las acciones implementadas para cumplir cabalmente con el objeto del contrato, de esta información obtenida por parte de los inspectores

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



y residentes del proyecto se realiza el análisis para determinar si el contratista está cumpliendo o no con el objeto contractual y se toman las medidas respectivas que son informadas al cliente final que en esta caso es el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

4. Condiciones Contractuales Vigentes.

4.1 Contrato de Obra.

Tabla 4 Generalidades del contrato de obra

NÚMERO DEL CONTRATO:	846 – 2024
OBJETO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
VALOR INICIAL.	\$ 6.351.563.839 M/CTE
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	8 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	7 abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	6 diciembre 2025
PRORROGA #1	3 meses
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	11 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE PRORROGA #1	6 de marzo de 2026
ADICION #1	\$ 3.175.781.919 M/CTE
VALOR TOTAL.	\$ 9.527.345.758 M/CTE
ENTIDAD CONTRATANTE:	Fondo de desarrollo local de Puente Aranda.

Fuente: elaboración Consorcio Pavías 2025

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



4.2 Contrato de Interventoría.

Tabla 5 Generalidades contrato de interventoría

NÚMERO DEL CONTRATO:	850-2024
OBJETO:	“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”
CESION CONTRATO INTERVENTORIA:	28 marzo 2025
NOMBRE CONTRATISTA:	Consorcio Pavías 2025
VALOR INICIAL.	\$ 555.291.050 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	7 abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	6 diciembre 2025
PRORROGA #1	3 meses
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	11 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE PRORROGA #1	6 de marzo de 2026
ADICION #1	\$ 225.450.312 M/CTE
VALOR TOTAL.	\$ 780.741.362 M/CTE
ENTIDAD CONTRATANTE:	Fondo de desarrollo local de Puente Aranda.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Arq. Juan Alfredo Torres

Fuente: elaboración Consorcio Pavías 2025

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



5. ASPECTOS TÉCNICOS.

5.1 Adición y prórroga al contrato de obra e interventoría.

El día 31 de julio de 2025 se firmó el acta de adición y prórroga a los contratos de obra pública (COP 846-2024) e interventoría (CIN 850-2024) por un plazo adicional de tres (3) meses y un valor de \$ 3.175.781.919 para el contrato de obra y \$225.450.312 para el contrato de interventoría.

5.2 Ítems no previstos

En el periodo que comprende hasta el corte de este informe fueron incorporados ítems de cobro no previstos al contrato de obra 846-2024 los cuales ya fueron aprobados y se presentan a continuación.

Tabla 6 Tabla ítems no previstos N°1.

Ítem	Descripción	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CODIGO
NP-01	PERFORACIONES EN SECO DE 4". Incluye Equipo de Perforación y Accesorios, Suministro e Instalación de Cal Comercial al 6%.	ML	\$ 208.370	ESTRUCTURADO
NP-02	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN).	M2	\$ 30.940	4034
NP-03	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 189.556	8617
NP-04	GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 300 KN/M, RIGIDEZ COMPUESTA SUELO - GEOSINTETICO (KSGC) > 20 KN/M	M2	\$ 47.999	ESTRUCTURADO
NP-05	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO e=10 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).	M2	\$ 171.222	ESTRUCTURADO
NP-06	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargue, transporte y disposición final de sobrantes escombrera autorizada).	M2	\$ 12.658	8606
NP-07	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	\$ 2.508	9997
NP-08	ESTAMPADO PARA CONCRETO LOSETA GUÍA Y ALERTA (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	\$ 46.628	ESTRUCTURADO
NP-09	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	\$ 5.557	4262
NP-10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 233.301	6538
NP-11	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	\$ 157.651	5412

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



NP-13	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	\$ 5.315.563	4550
NP-16	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios).	MES	\$ 14.320.209	9575
NP-17	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE	\$ 1.107.979	4988
NP-18	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$ 193.249	8616
NP-19	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	\$ 1.151.212	8614
NP-20	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	\$ 1.173.196	8613
NP-21	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO PARA RAMPAS DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).	M2	\$ 199.183	ESTRUCTURADO
NP-22	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.	HR	\$ 168.226	5360

Fuente: elaboración Consorcio Pavías 2025

Tabla 7 Tabla ítems no previstos N°2.

Ítem	Descripción	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CODIGO
NP-23	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 6" EN MAMPOSTERÍA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	\$ 433.446	ESTRUCTURADO
NP-24	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 10" EN MAMPOSTERÍA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	\$ 497.555	ESTRUCTURADO
NP-25	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 12" EN MAMPOSTERÍA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	\$ 532.454	ESTRUCTURADO
NP-26	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 14" EN MAMPOSTERÍA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	\$ 605.834	ESTRUCTURADO
NP-27	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 6" CON BORDILLO PREFABRICADO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	\$ 303.694	ESTRUCTURADO
NP-28	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 12" CON SARDINEL PREFABRICADO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	\$ 454.370	ESTRUCTURADO
NP-29	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 12" EN MAMPOSTERÍA (PARED SENCILLA) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	\$ 353.371	ESTRUCTURADO

Fuente: elaboración Consorcio Pavías 2025

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



Tabla 8 Tabla ítems no previstos N°3.

Ítem	Descripción	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CODIGO
NP-30	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	\$ 7.402	4237
NP-31	TUBERIA CONCRETO D=10" CL.2 EXTRAREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.	ML	\$ 323.904	ESTRUCTURADO
NP-32	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	\$ 121.681	4128
NP-33	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	\$ 1.257.142	ESTRUCTURADO
NP-34	PISO EN CONCRETO MR41 ESTAMPADO PARA RAMPAS DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).	M2	\$ 251.587	ESTRUCTURADO
NP-35	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2" LOG. PROM = 6m, Y 2 UNIVERSALES CPVC 1/2").	UND	\$ 28.588	ESTRUCTURADO
NP-36	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UND	\$ 411.707	8970
NP-37	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 mm. EC = 14.200 MPA.	UND	\$ 1.892.100	8002
NP-38	DEMARCAACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE	ML	\$ 7.418	7862
NP-39	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 4.579	5225
NP-40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR NEGRO IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES ESPESOR HÚMEDO DE 12 MILS	M2	\$ 26.586	5227
NP-41	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA	M2	\$ 226.263	10263
NP-42	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64CM X 82.50CM REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4" H= 2.60M EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	\$ 614.360	6374
NP-43	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	\$ 575.926	7497
NP-44	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 649.145	7503
NP-45	TUBERIA CONCRETO D=12" CL.2 EXTRAREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.	ML	\$ 360.797	ESTRUCTURADO
NP-46	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UND	\$ 11.383	4569
NP-47	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)	UND	\$ 19.434	5241
NP-48	SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y EXTENDIDO MANUAL. INC. GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N Y TUBERIA PVC CORRUG.-FILTRO D=6").	ML	\$ 288.727	3704
NP-49	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	\$ 141.340	10257

Fuente: elaboración Consorcio Pavías 2025

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



5.3 Licencias y permisos.

Al ser un contrato de obra pública lo concerniente a licencias de construcción no aplica.

5.4 Avance del Proyecto en Tiempo.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio el 7 de abril de 2025 y fecha de terminación después de la prórroga el 6 de marzo de 2026, a la fecha de este corte han transcurrido un 100% que comprende entre el periodo de firma del acta de inicio el 7 de abril de 2025 al 6 de marzo de 2026.

Tabla 9 Avance en tiempo

Fecha de Inicio	07/04/2025
Fecha Final inicial	06/12/2025
Fecha Final después de prórroga	06/03/2026
Días de plazo	335
Fecha de corte	06/03/2026
Días Transcurridos	335
% transcurrido	100%

Fuente: elaboración Consorcio Pavías 2025




Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



Ilustración 25 Avance programado contra ejecutado

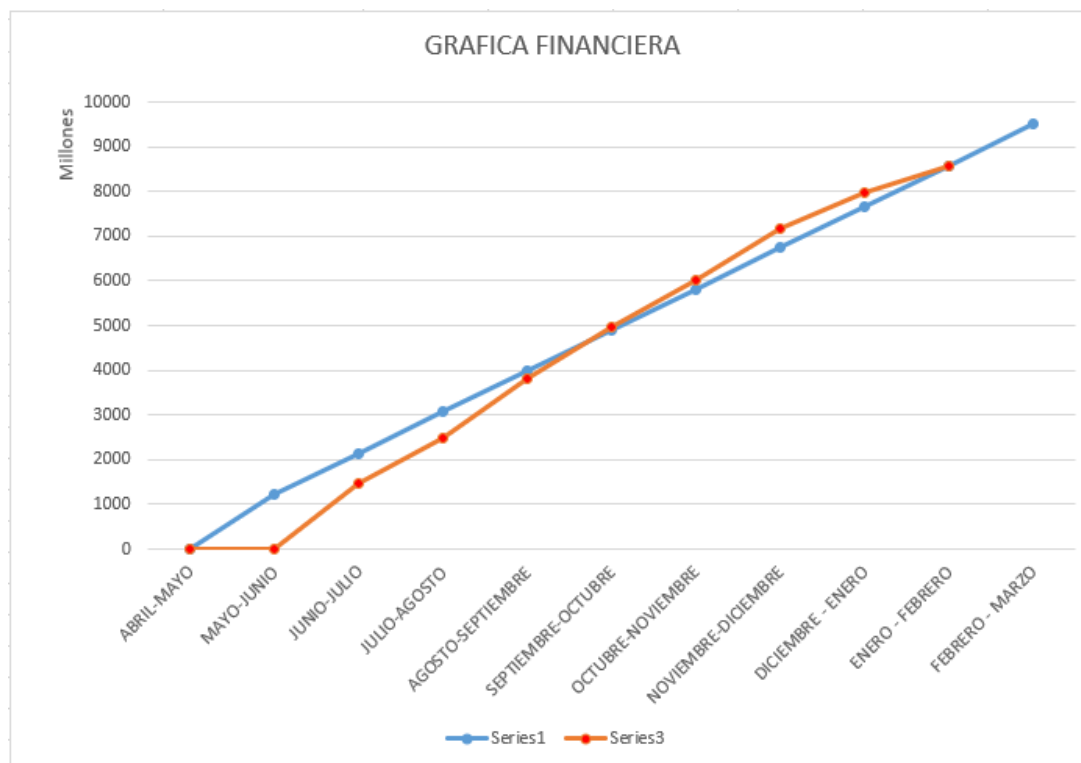

Fuente: elaboración Consorcio Pavías 2025.

5.5 Descripción de actividades realizadas durante el periodo

Las actividades realizadas dentro del periodo comprendido entre el 7 de febrero de 2026 al 6 de marzo de 2026, se evidencian en los informes semanales elaborados.

Anexo 1 Informes técnicos semanales realizados durante el periodo evaluado.

Además, se han desarrollado actividades como recopilación, revisión, verificación, análisis, complementación de la información.

5.6 Ensayos de laboratorio.

Se realizaron ensayos LWD en el tramo Veraguas II CIV 16002708 y tramo San Francisco (acción de movilidad) CIV 16000533.

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

6.1 Actas.

En el presente periodo se realizaron dos actas de comité para el seguimiento del contrato de obra 846-2024, entre el contratista CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, la Supervisión del FDLPA y la Interventoría CONSORCIO PAVÍAS 2025.


Tabla 10 Actas levantadas durante el periodo evaluado

Fecha	Descripción
18 febrero 2026	Seguimiento al COP 846-2024
27 febrero 2026	Seguimiento al COP 846-2024

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

6.2 Organigrama general del proyecto.

Ilustración 26 Organigrama profesionales PAVIAS 2025

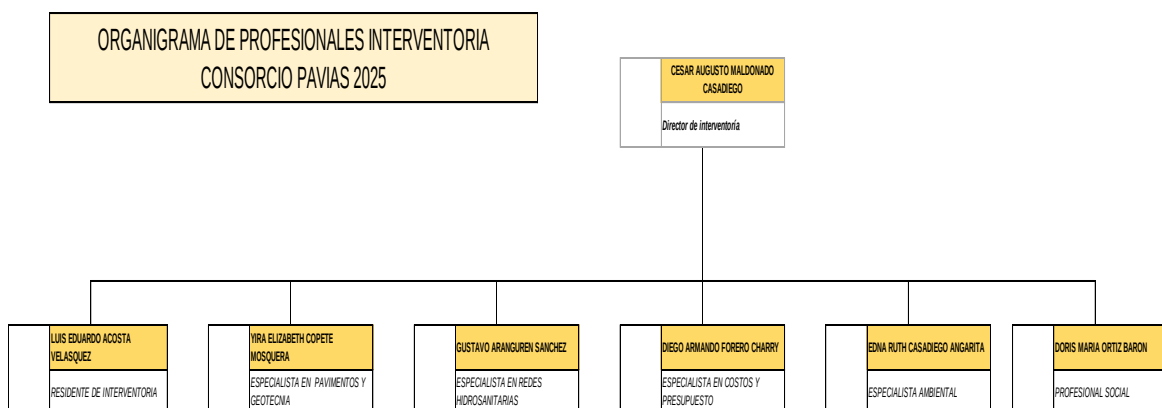

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

7. ASPECTOS FINANCIEROS.

7.1 Ejecución Financiera

A continuación, se resume los aspectos más relevantes de la ejecución financiera tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría.

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consortiopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



7.1.1 Contrato de Obra.

Tabla 11 Valores contrato de obra

Valor Inicial:	\$ 6.351.563.839
Valor adición:	\$ 3.175.781.919
Valor total:	\$ 9.527.345.758
Valor Cobrado:	\$ 8.574.611.182
% Cobrado:	90%
Saldo por Pagar.	\$ 952.734.576
% por Pagar.	10%

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

7.1.2 Contrato de Interventoría

Tabla 12 Valores contrato de interventoría

Valor Inicial:	\$ 555.291.050
Valor adición:	\$ 225.450.312
Valor total:	\$ 780.741.362
Valor Cobrado:	\$ 679.244.985
% Cobrado:	87%
Saldo por Pagar:	\$ 146.211.566
% Por pagar:	13%

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025.



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



8. ASPECTOS JURIDICOS.

8.1 Garantía y vigencia de pólizas

Garantía y vigencias de pólizas Contrato CIN-850-2024

Los siguientes cuadros corresponden a las pólizas de garantía y de cumplimiento a favor de entidades estatales del contrato de obra N° 846 de 2024 la cual esta interventoría realiza el seguimiento.

Tabla 13 Pólizas de Garantía iniciales del Contrato de Interventoría N° 850-FDLPA-2024

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	31/03/2025	21-44-101466486	\$ 249,880,972.50	28/03/2025 – 31/08/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°0

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Tabla 14 Pólizas de Garantía acta de inicio y actualizaciones del Contrato de Interventoría N° 850-FDLPA-2024

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	10/04/2025	21-44-101466486	\$ 249,880,972.50	28/03/2025 – 31/08/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°1

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	10/04/2025	21-44-101466486	\$ 249,880,972.50	07/04/2025 – 10/09/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°2

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	12/05/2025	21-44-101466486	\$ 249,880,972.50	07/04/2025 – 06/12/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°3

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	12/05/2025	21-44-101466486	\$ 249,880,972.50	07/04/2025 – 06/12/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°4

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Tabla 15 Pólizas de Garantía Adición- Prórroga y actualizaciones del Contrato de Interventoría N° 850-FDLPA-2024

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	14/08/2025	21-44-101466486	\$ 351,333,612.90	07/04/2025 – 06/12/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°5

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	14/08/2025	21-44-101466486	\$ 351,333,612.90	07/04/2025 – 06/03/2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°6

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	15/08/2025	21-44-101466486	\$ 351,333,612.90	07/04/2025 – 06/12/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°7

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Amparo	Fecha de expedición	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Anexo
CUMPLIMIENTO	15/08/2025	21-44-101466486	\$ 351,333,612.90	07/04/2025 – 06/03/2031	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	N°8

Fuente: Elaboración Consorcio Pavías 2025

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ En este periodo se realiza la recopilación y revisión por parte de la interventoría de la documentación entregada por el contratista CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA correspondiente al contrato de obra 846-2024 y posteriormente entrega y radicación de la documentación aprobada al FDLPA.
- ✓ Se ha realizado el seguimiento de las actividades de obra, verificando que se cumplan con los compromisos establecidos, tiempos estipulados y las especificaciones técnicas requeridas.
- ✓ Para este corte se tiene un avance de obra del 98,89%, en la siguiente tabla se muestra el avance por CIV.

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA			
CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO
16001124	99%	15,24%	15,09%
16001839	99%	25,40%	25,15%
16001833	99%	4,49%	4,45%
16000124	100%	7,60%	7,60%
16000696	99%	7,70%	7,62%
16000586	99%	1,48%	1,47%
16000839	99%	10,59%	10,48%
16002708	99%	11,60%	11,48%
16000940	99%	3,77%	3,73%
16002911	99%	4,90%	4,85%
ACCIONES MOVILIDAD			0,00%
16002303	99%	0,81%	0,80%
16002253	99%	0,24%	0,24%
16002241	99%	0,38%	0,38%
PKID 16000146	100%	0,14%	0,14%
PKID 16000120-32	100%	0,12%	0,12%
PKID 16000131-31	99%	1,42%	1,41%
PKID 16000120-33	99%	1,26%	1,25%
CRUCE P.A	100%	0,82%	0,82%
16000533 S.F	99%	1,68%	1,66%
VERAGUAS I	100%	0,16%	0,16%
COLON II	99%	0,20%	0,20%
TOTAL		100,0%	98,89%

- ✓ Los CIV's que se muestran con un 99% de avance se encuentran en remates y se esta espera para entrega a satisfacción de la interventoría.

Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme
Teléfono 6 211202 E-Mail: Consorciopavias2025@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204




Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11
PERIODO: 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2026



Anexo 1

Informes técnicos semanales realizados durante el periodo evaluado
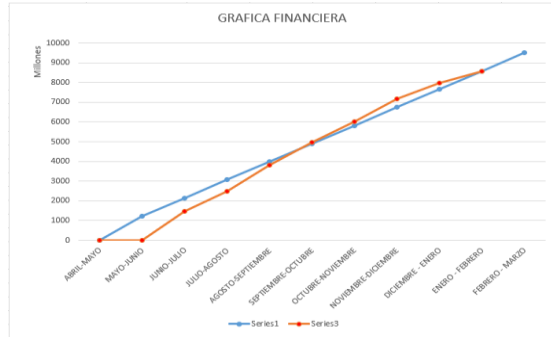
<div></div> <div>Consorcio Pavías 2025</div> <div>NIT: 901929491-1</div>		INFORME SEMANAL		<div></div> <div>ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div>	<div></div> <div>BOGOTÁ</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA</div>			
OBJETO		"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."							
INTERVENTOR		CONSORCIO PAVIAS 2025							
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA							
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE DE PUENTE ARANDA							
		Informe No.		38					
		Periodo evaluado		Desde:	9/02/2026	Hasta: 14/02/2026			
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA					
Contrato No .		850 DE 2024		Contrato No .		846 DE 2024			
Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025		Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025			
Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025		Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025			
Plazo Inicial		8 MESES		Plazo Inicial		8 MESES			
Prórroga		3 meses		Prórroga		3 meses			
Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026		Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026			
2. INFORMACION DE PERSONAL									
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS				PERSONAL EN LA OBRA					
N.A.		N.A.		DIRECTOR DE OBRA		1			
				INSPECTOR DE OBRA		1			
				RESIDENTES		4			
				ESPECIALISTA DE OBRA		3			
				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		1			
				INSPECTOR DE INTERVENTORIA		1			
				AREA SISOMA		1			
				AREA SOCIAL		1			
				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1			
				TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		14			
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA		15							
		TOTAL GENERAL		29					
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA				GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA					
CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO	<div>GRAFICA FINANCIERA</div> 					
16001124	98%	15,24%	14,94%						
16001839	99%	25,40%	25,15%						
16001833	99%	4,49%	4,45%						
16000124	100%	7,60%	7,60%						
16000696	99%	7,70%	7,62%						
16000586	99%	1,48%	1,47%						
16000839	99%	10,59%	10,48%						
16002708	45%	11,60%	5,22%						
16000940	99%	3,77%	3,73%						
16002911	99%	4,90%	4,85%						
ACCIONES MOVILIDAD			0,00%						
16002303	99%	0,81%	0,80%						
16002253	99%	0,24%	0,24%						
16002241	99%	0,38%	0,38%						
PKID 16000146	100%	0,14%	0,14%						
PKID 16000120-32	100%	0,12%	0,12%						
PKID 16000131-31	5%	1,42%	0,07%						
PKID 16000120-33	81%	1,26%	1,02%						
CRUCE P.A	100%	0,82%	0,82%						
16000533 S.F	80%	1,68%	1,34%						
VERAGUAS I	100%	0,16%	0,16%						
COLON II	99%	0,20%	0,20%						
TOTAL		100,0%	90,59%						
PLAZO (DÍAS)									
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES						
Contractual	245	245	0						
Prórroga	90	69	21						
TOTAL	335	314	21						
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN									
TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO						
14-feb-26	314	6-mar-26	93,73%						
CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA		
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA				PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA
	INICIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%	INICIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%	
DIRECTOS +AIU+IVA	\$ 6.351.563.839,00	\$ 6.351.563.839,00	\$ 8.574.611.182,00		\$ 555.291.050,00	\$ 555.291.050,00	\$ 634.529.796,00		
OBRAS ADICIONALES	N.A	\$ 3.175.781.919,00				\$ 225.450.312,00			
TOTAL	\$ 6.351.563.839,00	\$ 9.527.345.758,00	\$ 8.574.611.182,00	90,00%	555.291.050,00	\$ 780.741.362,00	\$ 634.529.796,00	81,27%	
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO									
CIV 16002708 - VERAGUAS II				SAN FRANCISCO CIV 16000533					
* Continúan actividades de instalación de tubería pluvial.				* Continúan actividades de construcción de sumideros, (acero de refuerzo)					
* Continúan actividades de construcción de cárcamo para protección de tubería pluvial.				* Continúan actividades de instalación de base granular estabilizada con cemento y aditivo.					
*Continúan actividades de instalación de geotextil, geocelda.				* Se realizan actividades de nivelación y compactación.					
* Continúan actividades de instalación de llenos de sub-base granular.				* Se realiza orden y aseo en el tramo.					
* Continúan actividades de instalación de malla multiaxial.				PKID 1600120-33-31					
* Se realizan actividades de instalación de primer capa de base granular estabilizada.				* Se realizan actividades de excavaciones.					
* Continúan actividades de construcción de cajas de inspección.				* Se realizan actividades de construcción de cajas de aforo.					
* Se realizan actividades de demolición de andenes y retiro de material del mismo.				* Se realizan actividades de instalacion de filtro.					
* Se realiza orden y aseo en el tramo.				* Continúan actividades de instalación de sardinel y confinamientos.					
ACCIONES DE MOVILIDAD				* Se realizan actividades de acondicionamiento de material granular en anden.					
JORGE GAITAN CORTES 16002203-2253-2241				* Se realiza orden y aseo en el tramo.					
* Se realizan actividades de remates.									



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME SEMANAL



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708




CIV 16002708




CIV 16002708


 <p>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <div>    </div>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002203-2253-2241</p>	<p>CIV 16002203-2253-2241</p>
	
<p>CIV 16000533</p>	<p>CIV 16000533</p>
	
<p>CIV 16000533</p>	<p>CIV 16000533</p>
	
<p>PKID 1600120-33-31</p>	<p>PKID 1600120-33-31</p>

	Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1	INFORME SEMANAL															
																	
PKID 1600120-33-31		PKID 1600120-33-31															
																	
PKID 1600120-33-31		PKID 1600120-33-31															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RESPONSABLE</td> <td style="text-align: center;">FECHA</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">NOMBRE</td> <td colspan="2">ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td colspan="2">REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> <tr> <td style="height: 50px; vertical-align: bottom;">FIRMA</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>						RESPONSABLE		FECHA	NOMBRE	ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS		CARGO	REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA		
RESPONSABLE		FECHA															
NOMBRE	ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS																
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL																
FIRMA																	
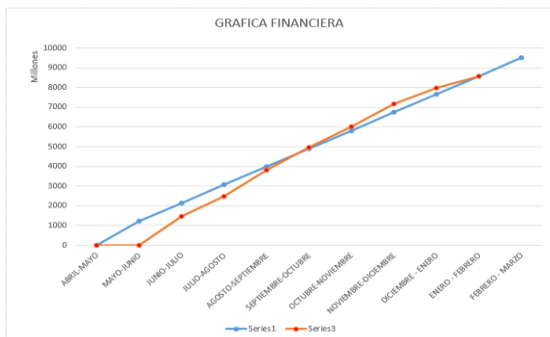
<div></div> <div>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</div>		INFORME SEMANAL		<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div>		<div></div> <div>BOGOTÁ</div>		<div></div> <div>ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA</div>					
OBJETO		"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."											
INTERVENTOR		CONSORCIO PAVIAS 2025											
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA											
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE DE PUENTE ARANDA											
		Informe No.		39									
		Periodo evaluado		Desde:	16/02/2026	Hasta:	21/02/2026						
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA								
Contrato No .		850 DE 2024			Contrato No .		846 DE 2024						
Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025			Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025						
Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025			Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025						
Plazo Inicial		8 MESES			Plazo Inicial		8 MESES						
Prórroga		3 meses			Prórroga		3 meses						
Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026			Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026						
2. INFORMACION DE PERSONAL													
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS					PERSONAL EN LA OBRA								
N.A.					DIRECTOR DE OBRA					1			
					INSPECTOR DE OBRA					1			
					RESIDENTES					4			
					ESPECIALISTA DE OBRA					3			
					DIRECTOR DE INTERVENTORIA					1			
					INSPECTOR DE INTERVENTORIA					1			
					AREA SISOMA					1			
					AREA SOCIAL					1			
					RESIDENTE DE INTERVENTORIA					1			
					TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO					14			
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA					15								
					TOTAL GENERAL		29						
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA					GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA								
CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO		<div>GRÁFICA FINANCIERA</div> 								
16001124	99%	15,24%	15,09%										
16001839	99%	25,40%	25,15%										
16001833	99%	4,49%	4,45%										
16000124	100%	7,60%	7,60%										
16000696	99%	7,70%	7,62%										
16000586	99%	1,48%	1,47%										
16000839	99%	10,59%	10,48%										
16002708	56%	11,60%	6,50%										
16000940	99%	3,77%	3,73%										
16002911	99%	4,90%	4,85%										
ACCIONES MOVILIDAD			0,00%										
16002303	99%	0,81%	0,80%										
16002253	99%	0,24%	0,24%										
16002241	99%	0,38%	0,38%										
PKID 16000146	100%	0,14%	0,14%										
PKID 16000120-32	100%	0,12%	0,12%										
PKID 16000131-31	10%	1,42%	0,14%										
PKID 16000120-33	83%	1,26%	1,05%										
CRUCE P.A	100%	0,82%	0,82%										
16000533 S.F	95%	1,68%	1,60%										
VERAGUAS I	100%	0,16%	0,16%										
COLON II	99%	0,20%	0,20%										
TOTAL		100,0%	92,37%										
PLAZO (DÍAS)													
CANT. DIAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES										
Contractual	245	245	0										
Prórroga	90	76	14										
TOTAL	335	321	14										
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN													
TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO										
21-feb-26	321	6-mar-26	95,82%										
CONTRATO DE OBRA										CONTRATO DE INTERVENTORIA			
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA						
	INICIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%	INICIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%					
DIRECTOS +AIU+IVA	\$ 6.351.563.839,00	\$ 6.351.563.839,00	\$ 8.574.611.182,00		\$ 555.291.050,00	\$ 555.291.050,00	\$ 634.529.796,00						
OBRAS ADICIONALES	N.A	\$ 3.175.781.919,00				\$ 225.450.312,00							
TOTAL	\$ 6.351.563.839,00	\$ 9.527.345.758,00	\$ 8.574.611.182,00	90,00%	555.291.050,00	\$ 780.741.362,00	\$ 634.529.796,00	81,27%					
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO													
CIV 16002708 - VERAGUAS II					ACCIONES DE MOVILIDAD								
* Culminan actividades de instalación de tubería pluvial.					SAN FRANCISCO CIV 16000533								
* Culminan actividades de construcción de cárcamo para protección de tubería pluvial.					* Se realizan ensayos de LWD.								
* Se realizan actividades de cabio de ductos y construcción de carcamo para proteccion de las mismas .					* Se realizan actividades de instalación de asfalto MD19, nivelación y compactación.								
* Continuan actividades de instalación de llenos de sub-base granular.					* Se realiza orden y aseo en el tramo.								
* Se realizan actividades de instalación de base granular estabilizada.					SAN FRANCISCO CIV 16000696, INTERSECCION								
* Continuan actividades de construcción de cajas de inspección.					* Se realizan actividades de demolición de carpeta asfáltica y retiro de material.								
* Se realizan actividades de instalación de sardiel.					* Se realizan actividades de nivelación y compactación de base.								
* Continuan actividades de demolición de andenes y retiro de material del mismo.					* Se realizan actividades de instalación de asfalto MD19, nivelación y compactación.								
* Se realizan actividades de contrucción de pozos.					PKID 1600120-33-31								
* Se realizan actividades de adecuacion de andenes (llenos, nivelación).					* Continuan actividades de instalación de sardinel y confinamientos.								
* Se realizan actividades de construcción de sumideros.					* Se realizan actividades de acondicionamiento de material granular en anden.								
* Se realiza orden y aseo en el tramo.					* Se realizan actividades de nivelación y compactación.								
CIV 16001124 - ESTACION CENTRAL					* Se realiza orden y aseo en el tramo.								
* Se realizan actividades de instalación de tapas de cajas y camaras.													
* Se realiza orden y aseo en el tramo.													

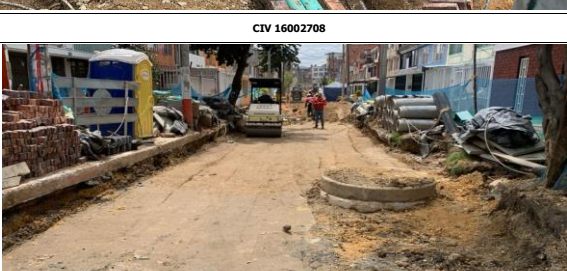
 <p>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <div>    </div>
<p>5. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>

 <p>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <div>    </div>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>

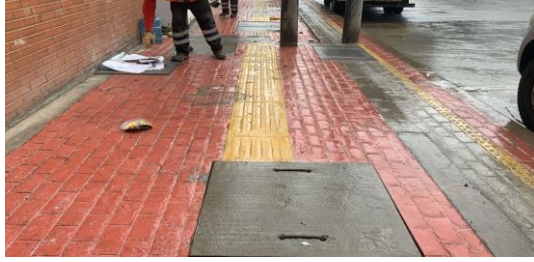 <p>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <div>    </div>
	
<p>CIV 16002708</p>	<p>CIV 16002708</p>
	
<p>CIV 16001124</p>	<p>CIV 16001124</p>
	
<p>CIV 16001124</p>	<p>CIV 16001124</p>
	
<p>CIV 16001124</p>	<p>CIV 16001124</p>
	
<p>CIV 16000533</p>	<p>CIV 16000533</p>
	
<p>CIV 16000533</p>	<p>CIV 16000533</p>

 <p>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <div>    </div>
	
<p>CIV 16000533</p>	<p>CIV 16000533</p>
	
<p>CIV 16000533</p>	<p>CIV 16000533</p>
	
<p>CIV 16000533</p>	<p>CIV 16000533</p>
	
<p>CIV 16000696 intersección</p>	<p>CIV 16000696 intersección</p>
	
<p>CIV 16000696 intersección</p>	<p>CIV 16000696 intersección</p>
	
<p>CIV 16000696 intersección</p>	<p>CIV 16000696 intersección</p>

 Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1		INFORME SEMANAL		 BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		 BOGOTÁ		 Alcaldía Local de Puente Aranda	
									
CIV 16000696 Intersección					CIV 16000696 Intersección				
									
PKID 1600120-33-31					PKID 1600120-33-31				
									
PKID 1600120-33-31					PKID 1600120-33-31				
NOMBRE		RESPONSABLE			FECHA				
CARGO		ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA									
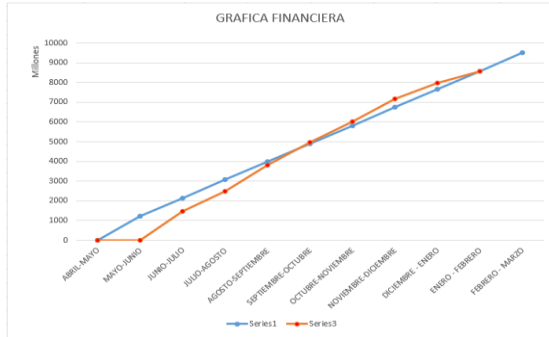
<div></div> <div>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</div>		INFORME SEMANAL		<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div>	<div></div> <div>BOGOTÁ</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA</div>		
OBJETO		"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."						
INTERVENTOR		CONSORCIO PAVIAS 2025						
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA						
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE DE PUENTE ARANDA						
		Informe No. 40						
		Periodo evaluado Desde: 23/02/2026 Hasta: 28/02/2026						
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA				
Contrato No .		850 DE 2024		Contrato No .		846 DE 2024		
Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025		Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025		
Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025		Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025		
Plazo Inicial		8 MESES		Plazo Inicial		8 MESES		
Prórroga		3 meses		Prórroga		3 meses		
Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026		Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026		
2. INFORMACION DE PERSONAL								
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS				PERSONAL EN LA OBRA				
N.A.		N.A.		DIRECTOR DE OBRA		1		
				INSPECTOR DE OBRA		1		
				RESIDENTES		4		
				ESPECIALISTA DE OBRA		3		
				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		1		
				INSPECTOR DE INTERVENTORIA		1		
				AREA SISOMA		1		
				AREA SOCIAL		1		
				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1		
				TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		14		
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA		15						
		TOTAL GENERAL		29				
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA				GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA				
CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO	<div>GRAFICA FINANCIERA</div> 				
16001124	99%	15,24%	15,09%					
16001839	99%	25,40%	25,15%					
16001833	99%	4,49%	4,45%					
16000124	100%	7,60%	7,60%					
16000696	99%	7,70%	7,62%					
16000586	99%	1,48%	1,47%					
16000839	99%	10,59%	10,48%					
16002708	80%	11,60%	9,28%					
16000940	99%	3,77%	3,73%					
16002911	99%	4,90%	4,85%					
ACCIONES MOVILIDAD			0,00%					
16002303	99%	0,81%	0,80%					
16002253	99%	0,24%	0,24%					
16002241	99%	0,38%	0,38%					
PKID 16000146	100%	0,14%	0,14%					
PKID 16000120-32	100%	0,12%	0,12%					
PKID 16000131-31	85%	1,42%	1,21%					
PKID 16000120-33	87%	1,26%	1,10%					
CRUCE P.A	100%	0,82%	0,82%					
16000533 S.F	99%	1,68%	1,66%					
VERAGUAS I	100%	0,16%	0,16%					
COLON II	99%	0,20%	0,20%					
TOTAL		100,0%	96,34%					
PLAZO (DÍAS)								
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES					
Contractual	245	245	0					
Prórroga	90	83	7					
TOTAL	335	328	7					
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN								
TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO					
28-feb-26	328	6-mar-26	97,91%					
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%	INICIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	\$ 6.351.563.839,00	\$ 6.351.563.839,00	\$ 8.574.611.182,00		\$ 555.291.050,00	\$ 555.291.050,00	\$ 634.529.796,00	
OBRAS ADICIONALES	N.A	\$ 3.175.781.919,00				\$ 225.450.312,00		
TOTAL	\$ 6.351.563.839,00	\$ 9.527.345.758,00	\$ 8.574.611.182,00	90,00%	555.291.050,00	\$ 780.741.362,00	\$ 634.529.796,00	81,27%
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO								
CIV 16002708 - VERAGUAS II				ACCIONES DE MOVILIDAD				
* Continúan actividades de construcción de cajas de inspección.				PKID 1600120-33-31				
* Se realizan actividades de instalación de sardiel.				* Continúan actividades de instalación de sardinel y confinamientos.				
* Se realizan actividades de adecuación de andenes (confinamientos, llenos, nivelación, compactación).				* Se realizan actividades de instalación de material granular en anden.				
* Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo en andenes.				* Se realizan actividades de nivelación y compactación.				
* Se realizan ensayos LWD .				* Se realiza orden y aseo en el tramo.				
* Se realizan actividades de instalación de concreto en andes.								
* Se realiza orden y aseo en el tramo.								

<div><div>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</div></div> <div>INFORME SEMANAL</div> <div><div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div></div><div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>Alcaldía Local de Puente Aranda</div></div></div>	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708

<div><div>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</div></div> <div>INFORME SEMANAL</div> <div></div>	
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME SEMANAL



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31



PKID 1600120-33-31

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS	
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA		

<div></div> <div>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</div>		INFORME SEMANAL		<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div>	<div></div> <div>BOGOTÁ</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA</div>		
OBJETO		"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."						
INTERVENTOR		CONSORCIO PAVIAS 2025						
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA						
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE DE PUENTE ARANDA						
		Informe No.	41					
		Periodo evaluado	Desde:	2/03/2026	Hasta:	6/03/2026		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA					
Contrato No .		850 DE 2024		Contrato No .		846 DE 2024		
Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025		Fecha de Inicio:		lunes, 7 de abril de 2025		
Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025		Fecha de Terminación Inicial		sábado, 6 de diciembre de 2025		
Plazo Inicial		8 MESES		Plazo Inicial		8 MESES		
Prórroga		3 meses		Prórroga		3 meses		
Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026		Fecha de Terminación final		viernes, 6 de marzo de 2026		
2. INFORMACION DE PERSONAL								
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS			PERSONAL EN LA OBRA					
N.A.		N.A.		DIRECTOR DE OBRA		1		
				INSPECTOR DE OBRA		1		
				RESIDENTES		4		
				ESPECIALISTA DE OBRA		3		
				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		1		
				INSPECTOR DE INTERVENTORIA		1		
				AREA SISOMA		1		
				AREA SOCIAL		1		
				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1		
				TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		14		
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA		15						
		TOTAL GENERAL		29				
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA			GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA					
CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO					
16001124	99%	15,24%	15,09%					
16001839	99%	25,40%	25,15%					
16001833	99%	4,49%	4,45%					
16000124	100%	7,60%	7,60%					
16000696	99%	7,70%	7,62%					
16000586	99%	1,48%	1,47%					
16000839	99%	10,59%	10,48%					
16002708	99%	11,60%	11,48%					
16000940	99%	3,77%	3,73%					
16002911	99%	4,90%	4,85%					
ACCIONES MOVILIDAD			0,00%					
16002303	99%	0,81%	0,80%					
16002253	99%	0,24%	0,24%					
16002241	99%	0,38%	0,38%					
PKID 16000146	100%	0,14%	0,14%					
PKID 16000120-32	100%	0,12%	0,12%					
PKID 16000131-31	99%	1,42%	1,41%					
PKID 16000120-33	99%	1,26%	1,25%					
CRUCE P.A	100%	0,82%	0,82%					
16000533 S.F	99%	1,68%	1,66%					
VERAGUAS I	100%	0,16%	0,16%					
COLON II	99%	0,20%	0,20%					
TOTAL		100,0%	98,89%					
PLAZO (DÍAS)								
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES					
Contractual	245	245	0					
Prórroga	90	90	0					
TOTAL	335	335	0					
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN								
TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO					
6-mar-26	335	6-mar-26	100,00%					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA					
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%	INCIAL	ACTUAL	\$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	\$ 6.351.563.839,00	\$ 6.351.563.839,00	\$ 8.574.611.182,00		\$ 555.291.050,00	\$ 555.291.050,00	\$ 679.244.985,00	
OBRAS ADICIONALES	N.A	\$ 3.175.781.919,00				\$ 225.450.312,00		
TOTAL	\$ 6.351.563.839,00	\$ 9.527.345.758,00	\$ 8.574.611.182,00	90,00%	555.291.050,00	\$ 780.741.362,00	\$ 679.244.985,00	87,00%
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO								
CIV 16002708 - VERAGUAS II			ACCIONES DE MOVILIDAD					
* Se realizan actividades de instalación de asfalto MD25.			PKID 1600120-33-31					
* Se realizan actividades de instalación de asfalto MD19.			* Se realizan actividades de instalación de concreto.					
* Se realizan actividades de nivelación y compactación.			* Se realizan actividades de demarcación y estampado.					
* Se realiza orden y aseo en el tramo.			* Se realizan actividades de terminados en sumideros.					
* Se entran en periodo de remates en el tramo.			* Se realiza orden y aseo en el tramo.					



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708

<div><div>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</div></div> <div>INFORME SEMANAL</div> <div></div>	
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708
	
CIV 16002708	CIV 16002708

<div><div></div><div>Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1</div></div>		<div><div>INFORME SEMANAL</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	
			
CIV 16002708		CIV 16002708	
			
CIV 16002708		CIV 16002708	
			
PKID 1600120-33-31		PKID 1600120-33-31	
			
PKID 1600120-33-31		PKID 1600120-33-31	
			
CIV 16001124		CIV 16001124	

 Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1		INFORME SEMANAL		 BOGOTÁ <small>Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</small>		 <small>Alcaldía Local de Puente Aranda</small>											
				CIV 16001124		CIV 16001124											
				CIV 16000533		CIV 16000533											
				CIV 16000533		CIV 16000533											
				CIV 16000533		CIV 16000533											
CIV 16000533		CIV 16000533		CIV 16000533		CIV 16000533											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RESPONSABLE</td> <td rowspan="3">FECHA</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td>  </td> <td></td> </tr> </table>		RESPONSABLE		FECHA	NOMBRE	ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA								
RESPONSABLE		FECHA															
NOMBRE	ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS																
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL																
FIRMA																	



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

INFORME EJECUTIVO No. 11



COMPONENTE AMBIENTAL

INTERVENTORÍA CONSORCIO PAVIAS 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA-850-2024

OBJETO FDLPA-850-2024: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.




Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

RESPONSABLES DEL INFORME:

Control Interno	
Elaboró:  Ing. Edna Ruth Casadiego Angarita Ingeniero Residente Ambiental CONSORCIO PAVIAS 2025	Aprobó:  Ing. Santiago Carrillo Representante Lega CONSORCIO PAVIAS 2025

INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 11

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	MARZO 2026	Primera entrega
02		
03		



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1. OBJETIVO GENERAL	7
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
3. MARCO REFERENCIAL	7
3.1 MARCO NORMATIVO:	10
4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13
4.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES	13
4.1.2 DESCRIPCION CONTRATO DE OBRA	14
5. GENERALIDADES	15
5.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	15
5.1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL	15
5.2.1 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	16
6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO	17
7 METODOLOGIA	19
7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO	20
8 GESTION AMBIENTAL	22
8.1 COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES	22
8.1.1 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	22
8.1.1 CAPACITACIONES AMBIENTALES	24
8.2 COMPONENTE B - GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION:	26
8.2.1 PROGRAMA B1 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES	29
8.2.2 PROGRAMA B2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	30
8.2.4 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	33
8.2.5 POLÍTICA DE RECICLAJE Y/O REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS – CONSORCIO PAVIAS 2025.	39
8.2.6 CONTROL DE EMISIONES ADMOSFERICAS	40



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

8.2.7	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS	41
8.3	COMPONENTE E – SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁFICO.....	42
9	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	42
10	CONCLUSIONES	43

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Aspectos Contractuales – CONSORCIO PAVIAS 2025	13
Tabla 2 Información general Contratista – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.....	14
Tabla 3 Listado de CIVS FDLPA-846-2024 – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	18
Tabla 4 Actividades periódicas a realizarse por la interventoría para la Gestión Ambiental y SST	20
Tabla 5 Personal Mínimo Requerido Ambiental y SST CONSORCIO PAVIAS 2025.....	23
Tabla 6 Personal SST-MA – Personal Mínimo requerido CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.....	23
Tabla 7 Personal Boal– CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	23
Tabla 8 Capacitaciones Componente Ambiental.....	24
Tabla 9 Proveedores de Materiales CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.....	26
Tabla 10 Sitios de Disposición Final – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	28
Tabla 11 Materiales utilizados (07 de mayo al 06 de junio de 2025).....	31
Tabla 12 Materiales Utilizados (07 de junio al 06 de julio de 2025).....	31
Tabla 13 Materiales Utilizados (07 de julio al 06 de agosto de 2025)	31
Tabla 14 Materiales Utilizados (07 de agosto al 06 de septiembre de 2025).....	31
Tabla 15 Materiales Utilizados (07 de septiembre al 06 de octubre de 2025)	32
Tabla 16 Materiales Utilizados (07 de octubre al 06 de noviembre de 2025)	32
Tabla 17 Materiales Utilizados (07 de noviembre al 06 de Diciembre de 2025).....	32
Tabla 18 Materiales Utilizados (07 de diciembre del 2025 al 06 de enero de 2026)	32
Tabla 19 Consolidado RCD por sitio de disposición final y centros de aprovechamiento (Excavación)	35
Tabla 20 Consolidado de RCD llevados a Centro de aprovechamiento (Demolición asfalto).....	37
Tabla 21 Consolidado total de RCD.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 23 Sumideros.....	41



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localidad de Puente Aranda	17
Ilustración 2 Elementos en los campamentos de obra	30
Ilustración 3 Registros Fotográficos Punto Ecológico - Consorcio Pavías 2025	40

ANEXOS

- ANEXO NO. 1 - EVALUACIÓN AMBIENTAL – SST – INFORME 11
- ANEXO No. 2 - POLITICA DE RECICLAJE
- ANEXO No. 3 - SEGUIMIENTO PMT
- ANEXO No. 4 - REGISTROS FOTOGRAFICOS



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describen las actividades realizadas por parte de la presente interventoría mediante la ejecución del componente Ambiental en el desarrollo del contrato de interventoría FDLPA-850-2024, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Ponte Aranda y el CONSORCIO PAVIAS 2025, cuyo objeto es *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUNTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”*

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente informe se encontrará consignado el avance del componente Ambiental teniendo en cuenta los lineamientos del Manual Ambiental de Obra MAO - Guía Ambiental IDU y la cual se relaciona a continuación:

- ✚ A Sistema de Gestión Ambiental.
- ✚ B Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción.
- ✚ C Manejo de la vegetación y paisajismo.
- ✚ D Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✚ E Señalización y Manejo de Trafico.

Dicho contrato de obra está programado para una ejecución de ocho (08) meses luego diligenciada debidamente el Acta de Inicio por las partes, y contando con una fecha prevista de terminación al 06 de diciembre del corriente año 2025.

De acuerdo a lo anterior, se precisa informar que el Fondo de Desarrollo Local de Ponte Aranda FDLPA, otorga una adición y prorroga por un tiempo de tres (3) meses, dado así un cambio en la fecha de finalización del presente contrato para el seis (6) de marzo del 2026, así mismo, a través de este documento se registrará el avance de la gestión adelantada, con el fin de tomar decisiones preventivas y correctivas en las obras futuras a ejecutar. En el presente informe se relacionan las actividades realizadas para el presente periodo.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades realizadas por parte del área ambiental de la Interventoría, así como las actividades realizadas por el contratista de obra, garantizando, el cumplimiento a los requerimientos y normatividad enmarcada en el componente ambiental para la ejecución de los contratos en mención (FDLPA-850-2024) y FDLPA-846-2024, así como, lo estipulado en el Manual Ambiental de Obra MAO.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Verificar y avalar la información recopilada por el contratista en el desarrollo de sus actividades ambientales, con el fin de ser aprobada y entregada al FDLPA.
- ❖ Confrontar el cumplimiento de las actividades programadas dentro del cronograma de actividades.
- ❖ Efectuar observaciones en los casos que se requieran al contratista, conforme se presenten situaciones de no cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental.
- ❖ Confirmar y revisar la información de volúmenes de materiales y Residuos de Construcción y Demolición RCD, así como los soportes del mismo para su aprobación.

3. MARCO REFERENCIAL

La localidad Ponte Aranda limita al norte con la localidad Teusaquillo, con la Avenida de las Américas o Avenida Calle 23 y la Avenida Ferrocarril de Occidente o Avenida Calle 22 de por medio; al oriente con la localidad Los Mártires, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio; al sur con las localidades Tunjuelito y Antonio Nariño, con la Avenida del Sur o Transversal 35 o Avenida Calle 45A Sur de por medio; y al occidente con la localidad de Kennedy, con la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida Carrera 68 de por medio.

La topografía de la localidad Ponte Aranda es plana, al interior de esta no se encuentran estribaciones montañosas.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, adjudico mediante licitación pública el contrato FDLPA-850-2024, cuyo objeto es: *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.*

De acuerdo con lo anterior, se precisa informar que el plazo total de ejecución del contrato de obra FDLPA-846.2024 es de ocho (08) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, De acuerdo a lo anterior, se precisa informar que el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda FDLPA, otorga una adición y prórroga por un tiempo de tres (3) meses, dado así un cambio en la fecha de finalización del presente contrato para el seis (6) de marzo del 2026, así mismo, a través de este documento se registrará el avance de la gestión adelantada en el desarrollo del componente ambiental.

El proyecto surge por la necesidad de mejorar y conservar la Infraestructura vial, para lograr dicho objetivo es necesario llevar a cabo acciones de intervención conservación de la malla vial con actividades de mantenimiento y rehabilitación, de las vías que sostienen dicho sistema tanto para la malla vial local, mejorando el nivel de servicio de esas vías, impidiendo el detrimento, prolongando su vida útil y mejorando las condiciones de movilidad en los tramos priorizados.

De acuerdo con lo anterior y en el desarrollo de sus actividades propias del presente Consorcio PAVIAS 2025, realizara el seguimiento y control al contratista de obra CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, quien realizara el cumplimiento durante la ejecución del contrato de obra FDLPA-846-2024, lineamientos, especificaciones técnicas y medidas establecidas por las entidades de carácter ambiental SDA, IDU y CAR, tomando como base los siguientes documentos.

- ❖ **Guía de Manejo Ambiental del IDU:** El objetivo de esta Guía de Manejo Ambiental es proporcionar a los contratistas una orientación práctica acerca de las medidas de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud en Trabajo, aplicables en la ejecución de los proyectos.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



- ❖ **Manual de seguimiento ambiental para proyectos de infraestructura urbana del IDU:** Este manual ayuda a fortalecer los procesos y procedimientos de control y seguimiento ambiental del proyecto, además sirve de instrumento para la supervisión y control de la gestión ambiental, con el fin de dar cumplimiento exitoso a las labores ambientales detalladas en el contrato y en la normatividad ambiental vigente.

- ❖ **MANUAL AMBIENTAL DE OBRA MAO – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA:** Para el presente periodo de tiempo, el consorcio en mención, se encuentra en la ejecución e implementación del Manual en mención, del cual se precisa informar al FDPA, que mediante el oficio COP-846-2024-019 del 06 de mayo, el consorcio vías de Ponte Aranda radico ante la presente interventoría el Manual Ambiental de Obra MAO, el cual trae dentro de sus componentes el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, así como el Programa de Manejo Ambiental de RCD, es de resaltar que luego de realizar la respectiva revisión y análisis de la documentación en mención, se emitieron observaciones por parte de la presente interventoría mediante el oficio CIN-850-2024-012 del 09 de mayo del 2025, así mismo, desde la presente interventoría se realiza el seguimiento y verificación al detalle en la ejecución del Manual Ambiental de Obra el cual en su componente E establece la inclusión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y ejecutado por el contratista, teniendo en cuenta la identificación de los aspectos ambientales y prevención de riesgos definidos en la Guía de manejo ambiental del IDU a través de sus programas.

El objetivo de este documento es garantizar el cumplimiento de cada uno de los componentes de la Guía de Manejo Ambiental, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, implementando las diferentes medidas de prevención, control, mitigación y corrección para evitar la posible generación de impactos negativos al ambiente.

Las medidas contempladas en este documento serán tenidas en cuenta durante las diferentes fases de ejecución del contrato incluyendo el plan de manejo integral de residuos Comunes, Residuos de Construcción y Demolición, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos. De igual manera el Anexo técnico del Contratista:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Establece los requerimientos en cuanto a la gestión ambiental para la ejecución del contrato cumpliendo con la normatividad legal vigente que aplique al objeto del contrato.

3.1 MARCO NORMATIVO:

En el desarrollo de las actividades propias de la presente interventoría, se realizará el seguimiento al contrato de obra FDLPA-846-2024, cuyo objeto es: *“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.*

Con la finalidad de dar estricto cumplimiento con la normatividad legal ambiental aplicable a una adecuada gestión ambiental, tomando como referencia la siguiente normatividad.

✓ COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

- Decreto Ley 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales.
- Resolución 991 de julio 25 de 2001 DAMA-IDU. Guía de Manejo Ambiental.
- Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio de Medio Ambiente.
- Acuerdo 19-1996. Crea el Estatuto General de Protección Ambiental del D.C. SIAC asignando competencias a las Entidades Distritales.
- Ley 388 de 1997. Ordenamiento Territorial Colombiano.
- Decreto 364 de 2013. Adopta el POT en Santa Fe de Bogotá D.C.
- Decreto 2041 de 2014. el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
- Acuerdo 79 de 2002. Código de Policía de Bogotá.
- Resolución 5589 de 2011. Procedimiento de cobro del servicio de Evaluación y Seguimiento ambiental.

✓ COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

- Decreto 507 del 2023 Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 1257 del 2021
- Decreto 112 de 1994. Horarios y Rutas de Transporte.
- Ley 142 de 1994. Servicios Públicos.
- Resolución 541 de 1994. transporte acarreo de materiales y limpieza de llantas.
- Decreto 357 de 1997. Manejo de escombros y materiales de construcción.
- Resolución 3353 de 2001, Directorio de Proveedores – IDU.
- Resolución 5772 de 2004. Modifica la resolución 3353 de 2001.
- Decreto 1713 de 2002. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Decreto 838 de 2005. Modifica el Decreto 1713 sobre la disposición final de residuos sólidos.

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

- Ley 26 de 1989. Ministerio de Minas.
- Decreto 283 de 1990. Ministerio de Minas.
- Decreto 353 de 1991. Ministerio de Minas.
- Decreto 2655 de 1988. Código de Minas. Explotaciones Mineras.
- Decreto 2222 de 1993. Ministerio de Minas y Energía.
- Resolución 249 de 1994. Explotaciones mineras de la Sabana de Bogotá.
- Resolución 1115 de 2012. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital.
- Resolución 932 de 2015. En la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 de 2012.
- Resolución 6981 de 2011, en la cual se dictan “lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital” secretaria de Movilidad y secretaria de Ambiente.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y VERTIMIENTOS.

- Decreto 2811 de 1974. Vertimientos.
- Decreto 1541 de 1978. Vertimientos – Reglamento Aguas.
- Decreto 1594 de 1984. Usos del Agua y Residuos Líquidos.
- Resolución 1074 de 1997. DAMA Vertimientos.
- Resolución 3957 de 2009. Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital".
- Resolución 631 de 2015. Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
- Decreto 901 de 1997 Tasa Retributivas por contaminación de aguas.
- Decreto 321 de 1999. Plan de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.

MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

- Decreto 417 de 2006. Medidas para reducir y mejorar la calidad del aire en Bogotá D.C.
- Decreto 02 de 1982. Calidad del Aire.
- Decreto 948 de 1995. Calidad del Aire.
- Decreto 2107 de 1995. Modifica el decreto 948 de 1995.
- Resolución 005 de 1996. Regula los niveles permisibles de emisiones de fuentes móviles.
- Resolución 909 de 1996. Modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996.
- Resolución 160 de 1996 DAMA. Emisiones fuentes móviles.
- Resolución 391 de 2001. DAMA, Prevención y control de la contaminación en Bogotá D.C.
- Resolución 1198 de 1998. Define zonas de nivel sonoro en Bogotá.
- Resolución 769 de 2002. Revisión técnico mecánica.
- Resolución 627 de 2006. Norma nacional de emisión de ruido ambiental.



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y PAISAJISMO

- Decreto 1791 de 1996. Régimen de aprovechamiento forestal.
- Decreto 531 de 2010. Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones
- Manual de arborización 8del Jardín Botánico de Bogotá. Arborización urbana y manejo silvicultural con fines paisajísticos en el espacio público de Bogotá.
- Resolución 619 de 2002. Salvoconducto Nacional para la movilización de productos primarios de plantaciones forestales.
- Ley 1021 de 2006. Ley General forestal.
- Resolución 475 de 2007. Delega al jardín botánico José Celestino Mutis los programas de arborización en Bogotá y el registro de inventarios de las mismas.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES

Tabla 1 Aspectos Contractuales – CONSORCIO PAVIAS 2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
INFORMACIÓN SE SESION DE CONTRATO	MINUTA DE SECCION DEL 28 DE MARZO DEL 2025
NÚMERO DEL CONTRATO:	FDLPA-850-2024
VALOR INICIAL CONTRATO.	\$ 555.291.050
VALOR TOTAL CONTRATO.	\$ 555.291.050



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIAS 2025
SUPERVISIÓN:	VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Arq. Juan Alfredo Torres Prieto
ENTIDAD CONTRATANTE:	Fondo De Desarrollo Local de Puente Aranda
DURACIÓN DEL CONTRATO	Ocho (08) meses
FECHA DE INICIO (Firma acta de inicio)	07 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 de diciembre de 2025
PRÓRROGA NRO. 1	Prórroga Nro. 1
TRES (03) MESES ES DECIR DESDE EL 7 DE DICIEMBRE	TRES (03) MESES ES DECIR DESDE EL 7 DE DICIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE MARZO DE 2026.

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

4.1.2 DESCRIPCION CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Información general Contratista – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.
NÚMERO DEL CONTRATO:	FDLPA-846-2024
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$6.351.563.839
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
INTERVENTORÍA	CONSORCIO PAVIAS 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11

PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Ocho (08) meses
FECHA DE INICIO (Firma acta de inicio)	07 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de diciembre de 2025
PRORROGA	Tres (3) Meses
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO	Once (11) Meses
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	06 de diciembre del 2025
FEHCA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06 de marzo de 2026

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

5. GENERALIDADES

5.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El desarrollo de los ya mencionados contratos de obra e interventoría se localizan en la zona central de Colombia, en el departamento de Cundinamarca y más específicamente en la capital Bogotá D.C.; las vías a intervenir son las identificadas con los códigos de identificación vial. En la Figura 1, se indica la localización del proyecto a nivel nacional; la Localidad N° 16 del Distrito Capital de Bogotá, Ponte Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada hacia el centro occidente de la ciudad. Deriva su nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. Ponte Aranda se caracteriza por ser el centro de la actividad industrial de Bogotá.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Ilustración 1. Mapa de Colombia con la localización del proyecto a nivel local.



Fuente: Mapa interactivo. Net

5.2.1 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

Puente Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada hacia el centro occidente de la ciudad. Deriva su nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. Puente Aranda. Su extensión Puente Aranda tiene una extensión total de 1.731 hectáreas (ha) todas ellas urbanas, de las cuales 48 ha corresponden a suelo protegido. Esta localidad no cuenta con suelo rural y es la octava localidad con menor extensión en el distrito.




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Ilustración 1. Localidad de Puente Aranda

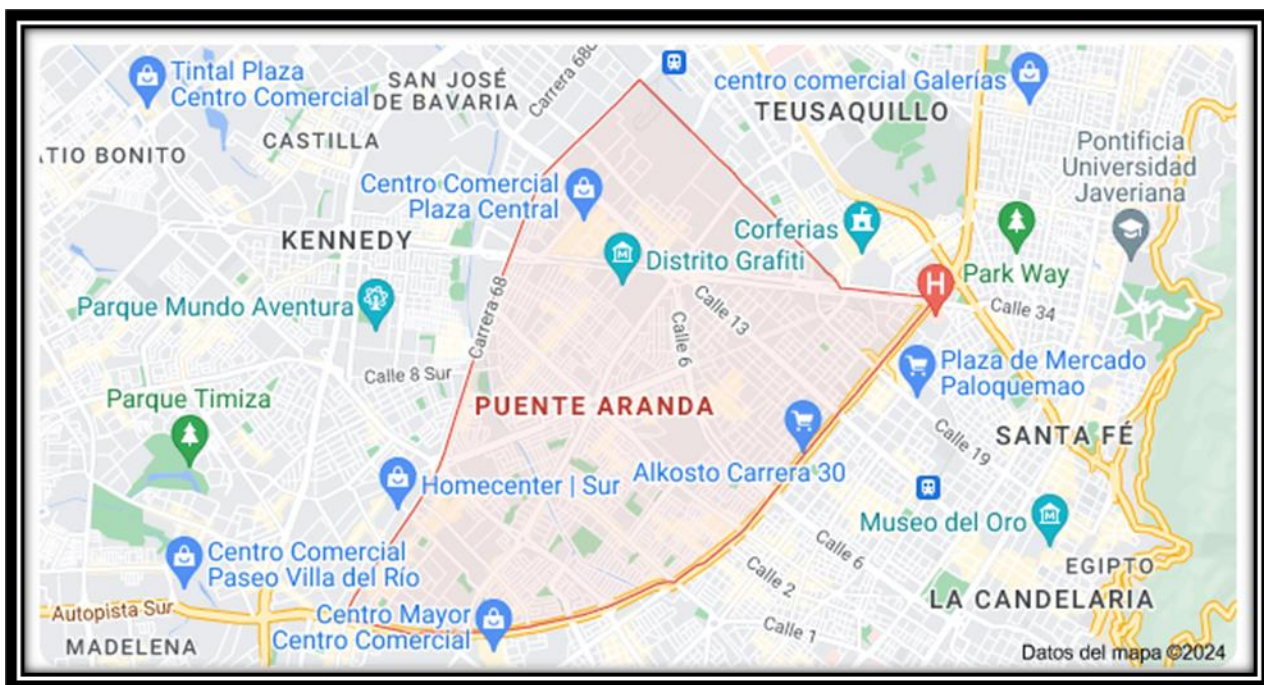

Fuente: <https://www.google.com/>

6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO

El proyecto se llevará a cabo en la localidad de Puente Aranda la cual es la N.º 16 del Distrito Capital de Bogotá, capital de Colombia en el centro occidente de la ciudad. Deriva su nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. Puente Aranda se caracteriza por ser el centro de la actividad industrial de Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la ubicación del desarrollo constructivo que se realizara en la ejecución del contrato de obra, nos permitimos presentar el listado de CIV contractuales otorgados por el FDLPA, así como su respectiva ubicación:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Tabla 3 Listado de CIVS FDLPA-846-2024 – CONSORCIO VIAS DE PUNTE ARANDA

Numero	CIV	EJE	DESDE	HASTA
1	16001611	CL 5C	KR 39D	KR 40
2	16001664	KR 39D	CL 5 A	CL 5 C
3	16000696	DG 5FBIS	TV 47	TV 48
4	16000586	DG 5FBIS	TV 48A	TV 48
5	16003772	KR 39B	CL 29A S	CL 29B S
6	16000124	CL 18	KR 55	KR 56
7	16002911	KR 30A	AC 3	CL 4
8	16002866	KR 30A	CL 4	CL 4BIS
9	16001545	CL 2B	TV 53A	KR 53BBIS
10	16001079	KR 57A	CL 2B	CL 2C
11	16002164	CL 2D	KR 39	KR 39A
12	16002834	KR 51C	CL 24 S	AC 26 S
13	16003336	CL 10A S	KR 36	KR 37
14	16002708	KR 31A BIS	CL 4A	CL 5
15	16000940	CL 4A	KR 54	KR 55
16	16000839	KR 55	CL 4B	CL 4CBIS
17	16001839	TV 53BIS	CL 1 S	CL 1C
18	16001833	CL 1C	TV 53	TV 53 BIS
19	16002303	KR 38B BIS	CL 2B	CL 2C
20	16002253	KR 38B BIS	CL 2C	CL 2C BIS



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

Numero	CIV	EJE	DESDE	HASTA
21	16002241	KR 38B BIS	CL 2C BIS	CL 2D
22	16001124	CL15	KR 5	KR 36

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

7 METODOLOGIA

El CONSORCIO PAVIAS 2025, realizo el seguimiento, inspección e interventoría de la gestión ambiental en cada uno de los frentes de trabajo con el fin de que se cumpla con los procedimientos y programas de manejo ambiental descritos por el contratista en el MAO, así mismo que las demás especificaciones técnicas y normatividad que se apliquen a los procesos constructivos para el desarrollo del objeto contractual apoyado en la lista de chequeo mensual.

Lo anterior mediante visitas técnicas de obra, revisión de especificaciones, seguimiento y control a las actividades desarrolladas, asistencia a comités. La interventoría realiza la verificación de los procesos propuestos e implementados que buscan la minimización de impactos ambientales, generados por la acción de las actividades constructivas y/o dotacionales desarrolladas en la localidad de Ponte Aranda en la ejecución del contrato de obra FDLPA-846-2024.

La interventoría para lograr el objetivo de la correcta ejecución de la obra en función de calidad, toma como bases lineamientos internos establecidos para la entidad (descritos a continuación en la Tabla 4, así como las diferentes Especificaciones técnicas generales de materiales de construcción, para proyectos de infraestructura vial, para Bogotá DC del IDU. Para minimizar los impactos ambientales y riesgos de laborales a la hora de la ejecución de actividades constructivas, se basa en los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura Urbana – IDU y el MAO establecido y aprobado para el presente contrato.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Tabla 4 Actividades periódicas a realizarse por la interventoría para la Gestión Ambiental y SST

Inspecciones diarias al personal inscrito al contratista.
Revisión de la implementación de PMT, y su mantenimiento.
Seguimiento y cumplimiento al MAO.
Revisión del estado de maquinaria y herramientas. Así como su documentación
Visita periódica a todos los CIV's
Revisión del manejo y Disposición final de los escombros y productos de excavación salidos de los frentes.
Realización de Comité ambiental una vez al mes o cuando se requiera
Aseguramiento de toda la información concerniente al programa ambiental
Asistencia a las reuniones programadas por la SDA, y referente Ambiental
Atención de quejas y reclamos en el área ambiental.
Comités técnicos de obra para definir y solucionar problemas presentados en los frentes.
Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición

Fuente: Ambiental – SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el presente periodo de tiempo en el seguimiento e interventoría realizada el contrato de obra FDLPA-846-2024 y de interventoría No FDLPA-850-2024.

1. Se realiza seguimiento a la gestión de RCD, los cuales deben ser dirigidos a su destino de disposición final o aprovechamiento en los sitios de disposición final que a la fecha del presente periodo cuentan con autorización por las autoridades ambientales como lo son la SDA, la CAR, así como las dispuestas y autorizadas por el IDU, así mismos, se realiza el seguimiento en el cumplimiento de la Normatividad Legal Ambiental aplicable al desarrollo del proceso constructivo Decreto 507 del 2023, realizando el respectivo seguimiento en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento, Circularidad y GCR, para el presente periodo de tiempo el contratista de obra mediante su componente ambiental, presento ante la interventoría



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



el reporte de RCD para el mes de DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026 para revisión y aprobación, dicho reporte se radico al FDLPA área PIGA para su respectivo cargue ante la SDA.

2. Se continúa verificando de acuerdo con la toma de georreferenciación de los CIV, que los mismos no estén afectados por Corredor Ecológico de Ronda, o estén afectados por alguna estructura ecológica principal de la Localidad.
3. En los recorridos realizados se verifica que los CIV no cuenten con Individuos arbóreos, o vegetación de la cual se requiera solicitar tratamientos silviculturales previos al inicio de las intervenciones contractivas, de acuerdo con los recorridos de seguimiento a los CIV, se precisa informar al FDLPA, que se evidencian individuos arbóreos a los costados de las vías objeto de intervención, sin embargo no serán objetos de podas, se realizara la respectiva protección a cada individuo arbóreo que se encuentra en la zona directa de intervención.
4. Para el presente periodo de tiempo desde el área ambiental de la presente interventoría, se realiza verificación y seguimiento a la ejecución de labores de construcción en la ejecución del contrato de obra FDLPA-846-2024, evidenciando la implementación de los componentes establecidos del el Manual Ambiental de Obra MAO, como se puede evidenciar en el anexo del registro fotográfico del presente informe.
5. Durante el presente periodo de tiempo, desde el componente ambiental de la presente interventoría, se continúa realizando recorridos de seguimiento y verificación en cuanto a los CIV`s que son objeto de intervenciones constructivas, de los cuales se evidencia que los mismos no cuentan con alguna determinante ambiental de la cual no se pueda realizar proceso constructivo, o requiera de permisos ambientales ante las Autoridades ambientales de Bogotá.
6. Durante el presente periodo de tiempo, desde el componente ambiental de la presente interventoría, se continúa realizando recorridos de seguimiento y verificación en cuanto a los CIV`s que son objeto de intervenciones constructivas, de los cuales se evidencia que los mismos no cuentan con alguna determinante ambiental de la cual no se pueda realizar proceso constructivo, o requiera de permisos ambientales ante las Autoridades ambientales de Bogotá.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



7. Para el presente periodo de tiempo, desde el componente ambiental de la presente interventoría, continúa realizando visitas de seguimiento e inspección a la protección de sumideros de aguas lluvias que se encuentran en la zona de influencia directa de los frentes de obra que se encuentran en ejecución constructiva, se realiza seguimiento al acopio de RCD y materiales, como se puede evidenciar en los registros fotográficos del presente informe.

8 GESTION AMBIENTAL

Así mismo, el desarrollo de las actividades ambientales ejecutadas por parte de la presente interventoría, se basan en visitas de seguimiento, verificación e inspección del componente Ambiental y SST, de igual manera por parte de la empresa contratista CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA. elaboraron y presentaron la documentación legal y contractual requerida realizada con base en los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental para el proyecto de infraestructura urbana – IDU y el MAO establecido.

8.1 COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES

8.1.1 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

1. Actividades de gestión Ambiental.
2. Implementación y ejecución del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición PMA-RCD.
3. Implementación del Manual Ambiental de obra MAO.
4. Recorridos de verificación a los CIV que se realizaran procesos de construcción.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del contrato de obra FDLPA-846-2024 se encuentra en su etapa de ejecución constructiva, se realiza el seguimiento al área ambiental en el cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el MAO, así como en el PMA-RCD, de igual manera dar cumplimiento con lo establecido en los pliegos de condiciones, con la finalidad de prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ocasionados por el proceso constructivo que se adelantara en cumplimiento del contrato de obra en mención.

Ejecutando el cumplimiento a los requerimientos ambientales, se verificó que el contratista contará con el personal idóneo y las herramientas adecuadas para la implementación del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Para el cumplimiento de los requerimientos ambientales en la ejecución del contrato de obra, el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, conforma un grupo de gestión ambiental y SST apoyado por el director de obra, el Ingeniero Residente, contando con personal Boales y auxiliares de tráfico, según lo evidenciado por la Interventoría realizado a las labores de implementación de estos componentes, de acuerdo con lo anterior el área ambiental del contratista conformara el siguiente grupo:

Tabla 5 Personal Mínimo Requerido Ambiental y SST CONSORCIO PAVIAS 2025

NOMBRE	CARGO
ING. EDNA RUTH CASADIEGO ANGARITA	RESIDENTE AMBIENTAL Y SST (Interventoría)

Tabla 6 Personal SST-MA – Personal Mínimo requerido CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

NOMBRE	CARGO
ING. JULIETH STEFANNY ORTIZ	RESIDENTE SISO (contratista)
ING. JUAN CAMILO CUBILLOS MORALES	INSPECTOR AMBIENTAL SST

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 7 Personal Boal– CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

PERSONAL BOAL – FRENTES DE OBRA – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	
Trabajador	Cedula
GERARDO CIFUENTES DIAZ	16160038
DAVIS FERNANDO GUAYARA LOAIZA	1005821005
OSCAR DAVID MARTINEZ ZAMORA	1193245734
JHON JAIRO MATOS BARRIOS	1006889235
CARLOS FRANCISCO TORRES	79519825
DIONEDISON GENES ESQUIVEL	1123991372

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Fuente: Consorcio Vías de Ponte Aranda

8.1.1 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Para el presente periodo de tiempo, el contrato de obra FDLPA-846-2024, se encuentra en etapa constructiva, en la cual el área Ambiental del CONSORCIO VIAS DE PUNTE ARANDA, se encuentra en la ejecución del Manual Ambiental de Obra MAO, el cual lleva incluido el cronograma de actividades a realizar en la ejecución de dicho contrato de obra.

Para el presente periodo de tiempo, se evidencia que el contratista de obra realiza DOS (2) capacitaciones en los temas ambientales de la siguiente manera:

Tabla 8 Capacitaciones Componente Ambiental

TEMA	FECHA
Capacitaciones informe No. 3	
Manejo adecuado de residuos	26/06/2025
Adecuado acopio de materiales	01/07/2025
Funciones orden y aseo	03/07/2025
Capacitaciones informe No. 4	
Control emisiones atmosféricas	28/07/2025
Manejo de residuos	16/07/2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

Capacitaciones informe No. 5	
Uso eficiente del agua y energía	04/08/2025 11/08/2025
Separación en la fuente (residuos)	22/08/2025 26/08/2025
Capacitaciones informe No. 6	
Procedimiento acopio de materiales	17/09/2025
Conservación y protección de fauna y flora	26/09/2025
Capacitaciones informe No. 7	
Identificación de emergencias laborales	09/10/2025
Manejo de derrames	14/10/2025
Capacitación mantenimiento de vehículos	23/10/2025
Capacitaciones informe No. 8	
Procedimiento acopio de materiales.	10/11/2025
Funciones de orden y aseo en los frentes de obra	26/11/2025
Capacitaciones informe No. 9	
Funciones de orden y aseo en los frentes de obra	12/12/2025
Clasificación de residuos en los frentes de obra	30/12/2025
Capacitaciones informe No. 10	
Manejo de residuos sólidos 9/01/2026	9/01/2026
Procedimiento limpieza y mantenimiento de sumideros	23/01/2026
Capacitaciones informe No. 11	
Manejo RCD en obra	4/02/2026
Control material particulado y polvo.	24/02/2026

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



- ❖ Los respectivos soportes se evidencian en el informe ambiental del contratista de obra, los mismos no se anexan al presente informe con la finalidad de no generar duplicidad en la información radicada al FDLPA.

8.2 COMPONENTE B - GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION:

Para el presente periodo de tiempo el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA se encuentra en ejecución del proceso constructivo, en el cual está realizando la implementación del Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición PMARCD, así como, el Manual Ambiental de Obra MAO y sus respectivos componentes de la siguiente manera:

A continuación, se presenta la tabla No. 9 mediante la cual se llevará el registro de los proveedores de materiales que manejará el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.

PROVEEDORES

Tabla 9 Proveedores de Materiales CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE PROVEEDOR
MINER GROPS SAS	CAR	Resolución 1043 de 06/07/2001- Resolucion 1334 de 12/11/02	Agregados pétreos.
DOBLE A INGENIERIA	CAR	Resolución 1857 del 27/06/06	Agregados pétreos.
INCOMINERIA SAS	CAR	Resolución 0237 del 15/02/2008	Agregados pétreos.
CONCREMOVIL	SDA	Comunicado No. 2022EE32282 del 21/02/2022	Concreto
CEMEX	SDA	Comunicado No. 2021EE28110 del 15/02/2021	Concreto



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE PROVEEDOR
CONCRETOS ARGOS	SDA	Comunicado N° 11222001710 del 27/04/2022	Concreto
CONCRETO TREMIX	SDA	Comunicado N° 2021EE111256 del 04/06/21	Concreto
RECICLADOS INDUSTRIALES	CAR	Comunicado N° 202120744043	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición.
CODEOBRAS	CAR	Comunicado No. 20222110851 del 14/12/2022	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición.
EL CONDOR	CAR	Comunicado N° 1121200475 del 30/08/21	Prefabricados
CONCRETARTE	CAR	Comunicado No. 0922020465 del 22/12/22	Prefabricados
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON	CAR	Comunicado No. 09222020464 del 22/12/2022	Prefabricados
DOBLE A	CAR	Resolución 50227000026 del 03/02/2022	Asfalto
INCOMINERIA	CAR	Resolución 0372 del 12/02/2019	Asfalto
SOFAN	CAR	Resolución 50207100797 del 17/04/20	Asfalto
PAVIOBRAS	CAR	Resolución 0689 del 08/03/18	Asfalto

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

Tabla 10 Sitios de Disposición Final – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DISPONER
GRECO	CAR	Comunicado No. 20222059313	Transformación y aprovechamiento de RCD
SECAM	CAR	Comunicado 2023000723	Transformación y aprovechamiento de RCD
MAQUINAS AMARILLAS	ANLA	Resolución 1480 del 4/12/2014 y Resolución 0228 del 07/03/2016	Disposición final de RCD
CEMEX	CAR	Resolución 1506 del 22/05/2006	Disposición final de RCD
PUENTE PIEDRA	CAR	Comunicado No. 20252010219	Transformación y aprovechamiento de RCD
VECOAGREINT	CAR	Comunicado No.20242095322	Transformación y aprovechamiento de RCD
SAN JOSE GREEN	CAR	Activo o 08/08/2024	Aprovechamiento y Disposición final RCD
MOLINO JN	CAR	Activo 23/08/2023	Aprovechamiento RCD



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DISPONER
F Y F	CAR	Resolución 10252000394	Disposición Final RCD
ECO-DESARROLLO	CAR	Resolución 10252000453 del 24/01/2025	Disposición Final RCD

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

8.2.1 PROGRAMA B1 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES

El campamento (oficina principal), Se cuenta con el punto CREA el cual se encuentra ubicado en la Carrera 33 # 4ª-92, el cual cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. El campamento corresponde a un predio estructura existente ubicado en el Barrio Veraguas, ubicado en la Localidad de Ponte Aranda El predio cuenta con los servicios públicos legales de gas, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica e internet; adicionalmente cuenta con dos unidades sanitarias. Se espera para el siguiente informe el anexo de los recibos públicos.

❖ Frentes de Obra:

Para el periodo del presente informe, se evidencia que el contratista de obra se encuentra en etapa de remates en algunos frentes de obra que fueron objeto de intervenciones constructivas en los cuales se evidencia la implementación de carpas tipo toldo color azul, dichas carpas cuentan con kit de emergencias menores botiquín, extintor, camilla, Kit de control de derrames de sustancias y punto ecológico, así como la cartelera informativa ambiental-SST, y unidad sanitaria portátil.



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Ilustración 2 Elementos en los campamentos de obra



Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

8.2.2 PROGRAMA B2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

En el desarrollo del presente programa, la interventoría mediante su área Ambiental y SST realizara el seguimiento y control a la procedencia de los materiales que ingresaran al desarrollo constructivo, los cuales deben corresponder a los proveedores propuestos en el Manual Ambiental de Obra MAO, desarrollando las medidas para controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de arenas, agregados, concretos, asfaltos y diferentes materiales para el desarrollo constructivo usados por el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA en la ejecución del FDLPA-846-2024.

Las cantidades Reportadas por el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA. utilizadas en el periodo son:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Tabla 11 Materiales reportados por el contratista (ABRIL 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m³ (ABRIL 2025)
B200	73
Triturado	14
AR-SBG	15

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 12 Materiales reportados por el contratista (MAYO 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m³ (MAYO 2025)
Triturado	29
AR-SBG	315
AR-BG	105

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 13 Materiales Reportados por el contratista (JUNIO 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m³ (JUNIO 2025)
Triturado	15
AR-SBG	315
AR-BG	120
B200	103

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 14 Materiales reportados por el contratista (JULIO 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m³ (JULIO 2025)
Triturado	74
Recebo	75
AR-SBG	412
B200	210

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Tabla 15 Materiales reportados por el contratista (AGOSTO 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m ³ (AGOSTO 2025)
Triturado	22
AR-SBG	649

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 16 Materiales reportados por el contratista (SEPTIEMBRE 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m ³ (SEPTIEMBRE 2025)
Triturado	15
B-200	105
AR-SBG	240
AR-BG	240
Asfalto	172

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 17 Materiales reportados por el contratista (OCTUBRE 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m ³ (OCTUBRE 2025)
AR-SBG	285
B-200	135
GCR	120
ASFALTO	97
AR-BG	60
TRITURADO	30
RAJON	15

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 18 Materiales reportados por el contratista (NOVIEMBRE 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m ³ (NOVIEMBRE 2025)
AR-SBG	330
B-200	75
AR-BG	210
TRITURADO	30

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Tabla 19 Materiales reportados por el contratista (DICIEMBRE 2025)

MATERIAL	CANTIDAD m ³ (DICIEMBRE 2025)
AR-SBG	203
AR-SBG	153
ASFALTO	60
B-200	8

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 20 Materiales reportados por el contratista (ENERO 2026)

MATERIAL	CANTIDAD m ³ (ENERO 2026)
ASFALTO	299
B-200	128
AR-BG	105
TRITURADO	38
AR-SBG	15

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Teniendo en cuenta lo anterior, en el desarrollo del contrato de la presente interventoría, y dando cumplimiento con su misionalidad contractual, realiza el respectivo seguimiento y verificación en la adquisición de materiales reciclados, así como el aprovechamiento que se pueda entregar a centros de tratamiento CTA con el fin de dar cumplimiento del 50% de material de aprovechamiento que exige la norma Decreto 507 del 2023.

Así mismo, los respectivos soportes se pueden evidenciar en el informe ambiental del contratista de obra, los mismos no se anexan al presente informe con la finalidad de no generar duplicidad en la información radicada al FDLPA.

8.2.4 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

En el desarrollo del contrato de obra y de acuerdo al proceso constructivo, el área ambiental de CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA contratista de obra en la ejecución del contrato FDLPA-846-2024, En el manejo de disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos se tiene en cuenta para el presente mes la



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



separación en la fuente y la gestión adecuada de residuos sólidos se adoptará el código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019 uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones el cual busca mejorar la eficiencia en el flujo de materiales, entre otros, mediante el aprovechamiento de residuos y su reincorporación en el ciclo productivo, lo cual se hace posible, entre otros, a través de la separación de los residuos en la fuente de generación. Se realizó instalación de punto ecológico, con caneca de tres (3) colores:

Por lo que el punto ecológico cuenta con las siguientes canecas para la disposición de residuos:

- BLANCO: Cartón, papel, plástico, vidrio y cualquier residuo reciclable
- VERDE: Residuos orgánicos como cascaras de frutas o restos de comida
- NEGRA: Residuos ordinarios no aprovechables

❖ **Aprovechamiento, reutilización y reciclaje de residuos de construcción y demolición RCD**

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los residuos de construcción y demolición en Bogotá, y se dictan otras disposiciones”, la cual rige a partir de su publicación en octubre de 2023, y retoma la presentación del reporte de manera mensual.

➤ **Generación de RCD**

En el periodo de ENERO 2026 se generaron; 464 m³ de excavación y 60 m³ de demolición, como se evidencia en las siguientes tablas:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



*Tabla 21 Consolidado RCD por sitio de disposición final y centros de aprovechamiento
(Excavación)*

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD m ³	TONELADAS
(07 de mayo al 06 de junio de 2025)		
MAQUINAS AMARILLAS	255	420,75
SECAM	75	123,75
(07 de junio al 06 de julio de 2025)		
MAQUINAS AMARILLAS	390	499.2
RYR	330	481.0
CEMEX	15	21.9
PUENTE PIEDRA	150	224.7
(07 de julio al 06 de agosto de 2025)		
MAQUINAS AMARILLAS	540	692.66
RYR	180	252.00
CEMEX	15	21.98
PUENTE PIEDRA	150	224.70
SECAM	45	70.57
(07 de agosto al 06 de septiembre de 2025)		
MAQUINAS AMARILLAS	105	134.4
RYR	150	210.0
PUENTE PIEDRA	525	787.5
VECOAGREINT	330	549.4
SAN JOSE	345	506
SEMILLEROS	210	307.8
ECODESARROLLO	60	87.9
F Y F	30	43.9
MAQUINAS AMARILLAS	105	134.4
(07 de septiembre al 06 de octubre de 2025)		



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD m ³	TONELADAS
MAQUINAS AMARILLAS	135	173.2
RYR	195	273.0
PUENTE PIEDRA	585	876.33
VECOAGREINT	30	50.8
SEMILLEROS	60	94.1
(07 de octubre al 06 de noviembre de 2025)		
PUENTE PIEDRA	600	898.95
MAQUINAS AMARILLAS	135	173.17
CEMEX	15	21.98
(07 de noviembre al 06 de diciembre de 2025)		
MAQUINAS AMARILLAS	225	288.6
MINERSA	165	272.1
PUENTE PIEDRA	120	180.0
CEMEX	30	44.0
(07 de diciembre del 2025 al 06 de enero de 2026)		
PUENTE PIEDRA	300	447.0
MAQUINAS AMARILLAS	180	230.89
ECODESARROLLO	60	84.0
CEMEX	30	43.96
MINERSA	15	24.73
(07 de enero del 2026 al 06 de febrero de 2026)		
PUENTE PIEDRA	435	650.0
MAQUINAS AMARILLAS	232	297.59
ECODESARROLLO	225	315.0
CEMEX	30	43.96
(07 de febrero del 2026 al 06 de marzo de 2026)		
ECODESARROLLO	345	483.0
PUENTE PIEDRA	75	112.35
CEMEX	30	43.96
MAQUINAS AMARILLAS	14	17.96

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Tabla 22 Consolidado de RCD llevados a Centro de aprovechamiento (Demolición asfalto)

CENTRO DE APROVECHAMIENTO	CANTIDAD m ³
(07 de mayo al 06 de junio de 2025)	
GRECO	45
(07 de julio al 06 de agosto de 2025)	
GRECO	60
(07 de agosto al 06 de septiembre de 2025)	
MOLINO JN	15
PUENTE PIEDRA	120
VECOAGREINT	247
(07 de septiembre al 06 de octubre de 2025)	
MOLINO JN	105
PUENTE PIEDRA	90
VECOAGREINT	76
(07 de octubre al 06 de noviembre de 2025)	
GRECO	30
SECAM	10
VECOAGREINT	30
MAQUINAS AMARILLAS	15
(07 de noviembre al 06 de diciembre de 2025)	
SECAM	60
(07 de diciembre del 2025 al 06 de enero de 2026)	
PUENTE PIEDRA	180
GRECO	30
VECOAGREINT	15
(07 de enero del 2026 al 06 de febrero de 2026)	
PUENTE PIEDRA	105
SECAM	15
(07 de febrero del 2026 al 06 de marzo de 2026)	
SECAM	60

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

Meta Aprov=

$$\frac{\text{Total de RCD aprovechado (sintener en cuenta excavacion y sobrantes de adecuacion de terreno)}}{\text{Total de RCD generado (sintener en cuenta excavacion y sobrantes de adecuacion del terreno)}}$$

Meta Circ=

$$\frac{\text{Peso total de materiales de construccion provenientes de la valorizacion de RCD petreos y no petreos incorporados}}{\text{Peso Total de materiales de construccion}}$$

Meta aprovechamiento: 60/60 100%

Meta Circularidad: 270/585 46%

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

- ❖ Es importante mencionar que, de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la presente interventoría, las respectivas certificaciones y soportes de RCD y Disposición final, se evidencian en el informe ambiental del contratista de obra, las cuales no se adjuntan al presente informe con la finalidad de no generar duplicidad en la información radicada al FDLPA.

❖ **Mezcla Asfáltica con Granulo de Caucho Reciclado**

Según el Decreto 442 de 2015 por el cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones. Respecto a la Mezcla asfáltica modificada con granulo de caucho reciclado (GCR), el Consorcio Vías de Ponte Aranda está comprometido a cumplir con el 25%. Para el presente periodo informamos que se no se instaló GCR.

Para el periodo del presenten periodo no se realizó la instalación de asfalto modificado con GCR



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



**8.2.5 POLÍTICA DE RECICLAJE Y/O REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS –
CONSORCIO PAVIAS 2025.**

En el marco de las labores correspondientes a la presente interventoría y en estricto acatamiento de la normativa ambiental legal aplicable al desarrollo de las actividades que rige la ejecución de las funciones de la interventoría, así como en concordancia con las disposiciones establecidas en el pliego de condiciones del proceso de contratación, **EL CONSORCIO PAVIAS 2025** implementa en el desarrollo de sus actividades, la **POLÍTICA DE RECICLAJE Y/O REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS**, siendo una estrategia clave para abordar el problema de la acumulación de residuos y la protección de los recursos naturales. Esta política se basa en promover prácticas sostenibles que permitan aprovechar al máximo los recursos y reducir la cantidad de desechos que terminan contaminando el entorno.

Como equipo de trabajo **CONSORCIO PAVIAS 2025** se compromete con:

- ✚ Emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental.
- ✚ La mejora continua que garantice un alto estándar del sistema de gestión; mediante la asignación de recursos, estableciendo, manteniendo y mejorando el desempeño de los procesos de reutilización y reciclaje.
- ✚ El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a las actividades de reciclaje y reutilización de materiales en todos los procesos y actividades que se generen dentro de la empresa.
- ✚ La preservación del medio ambiente; previniendo, controlando y minimizando impactos ambientales significativos, y evitando daños Socio ambientales.

De acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento de los estándares ambientales, en el ANEXO No. 2 - POLITICA DE RECICLAJE - CONSORCIO PAVIAS 2025, se presenta la Ficha Técnica del Papel utilizado en el desarrollo de la presente interventoría, así como la Norma Técnica Colombiana 6019 Etiquetas Ambientales Tipo 1 – Sello Ambiental Colombiano.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



Ilustración 3 Registros Fotográficos Punto Ecológico - Consorcio Pavías 2025



Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVÍAS 2025

8.2.6 CONTROL DE EMISIONES ADMOSFERICAS

En el desarrollo de nuestras obligaciones contractuales como Interventoría, desde el componente ambiental, se procede a realizar el respectivo seguimiento y verificación al contratista de obra en el desarrollo de su ejecución de obra, para el presente numeral se evidencia que el contratista de obra realiza las siguientes actividades:

- Se realizó mantenimiento al cerramiento del frente de obra con el fin de controlar la emisión de material particulado al medio ambiente.



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



- Las volquetas destinadas al transporte de los residuos de construcción y demolición, no se llenaron por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón).
- Se verificó que las volquetas estuviesen carpadas antes de iniciar su trayecto hacia el sitio de disposición final.
- La velocidad de las volquetas y maquinaria no superó los 20 Km/h dentro de los frentes de obra con el fin de no generar emisiones y accidentes en el área del proyecto.
- Los Brigadistas de Orden, Aseo y Limpieza (BOALS) se encargaron

8.2.7 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Para el presente periodo de tiempo, y de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la presente interventoría, se informa al FDLPA, que de acuerdo con las visitas realizadas a los frentes de obra donde se vienen realizando procesos constructivos y de rehabilitación no se evidencian cuerpos o rondas de agua cercanos, por lo que no se requiere permiso de ocupación de cauce. En cuanto a los sumideros se encontraron 35 sumideros en los frentes de intervención, los cuales se identificaron y se realizó la debida protección y limpieza con poli malla de color azul, buscando las mejores alternativas para evitar el aporte de sólidos al sistema de alcantarillado.

Tabla 23 Sumideros

BARRIO	CIV	NUMERO DE SUMIDEROS
Camelia	16001833-16001839	4
Calle 18	16000120034	3
Calle 15	16001124	3
Diagonal 5F	16000696-16000586	3
Colon	16000839	3
Veraguas 1	16002911	5
Veraguas 2	16002708	5



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11

PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026

Acción de movilidad	16002203- 16002253-16002241	5
Colon 2	16000940	4

Fuente: Área Ambiental y SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Fuente: Consorcio vías de puente Aranda

8.3 COMPONENTE E – SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁFICO

Para el presente periodo de tiempo, el contratista de obra CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA se encuentra en el desarrollo de su etapa constructiva, realizado labores constructivas en los frentes de obra de (Veraguas1, Andenes-modelo y acción de movilidad 5f) en los cuales se evidencia la instalación de cerramientos perimetrales en buenas condiciones, así mismo se realiza la instalación de señalización de seguridad en los frentes de obra, así como la instalación de los PMT's autorizados por la SDM.

9 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

La presente interventoría, en cumplimiento de sus actividades contractuales realiza la evaluación de la gestión ambiental ejecutada por el contratista de obra CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA para el presente periodo de tiempo el contratista de obra se encuentra en la ejecución de su etapa constructiva, de acuerdo con lo anterior, desde la presente interventoría se da inicio con el proceso de evaluación y seguimiento mediante la implementación de la fichas de seguimiento ambiental del IDU Anexo No. 1 FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_ el cual para el



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



presente periodo de tiempo se diligencia dando como resultado un cumplimiento del 100%

10 CONCLUSIONES

- ❖ En cumplimiento del Decreto 507 de 2023, el contratista CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA se encuentra en etapa de remates, evidenciando la aplicación de la normatividad vigente mediante la implementación continua del PMARCD. En este sentido, se destaca la adquisición de material reciclado y la adecuada disposición de residuos de demolición en centros de tratamiento autorizados. Asimismo, durante el presente periodo se realizó la radicación del reporte de RCD correspondiente a diciembre 2025 y enero de 2026 ante el FDLPA, para su posterior gestión y cargue por parte del área PIGA ante la SDA.
- ❖ En cumplimiento de las obligaciones contractuales, la interventoría, a través de su componente ambiental, llevó a cabo actividades de seguimiento y verificación orientadas a evaluar la correcta implementación y ejecución del PMARCD, así como el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el MAO.
- ❖ Durante el periodo evaluado, se efectuaron recorridos de inspección enfocados en verificar las condiciones de orden, aseo y limpieza en los frentes de obra, así como el estado de los cerramientos perimetrales, los cuales se encontraron en condiciones adecuadas.
- ❖ En el marco de las actividades de seguimiento, la interventoría realizó la verificación de las medidas de protección implementadas en los sumideros ubicados dentro de las áreas de influencia de los frentes de obra en ejecución, evidenciando que estos cuentan con protección adecuada mediante el uso de polisombras.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



ANEXO No. 1

EVALUACIÓN AMBIENTAL - INFORME 11

OBRA - FDLPA-850-2024

INTERVENTORIA - FDLPA-846-2024

FORMATO						FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO			PROCESO									VERSION					
FO-AC-32			GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST									4.0					
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: CONSORCIO PAVIAS 2025									SUBDIRECCIÓN GENERAL					
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.									DIRECCIÓN TÉCNICA					
6 MARZO 2026												SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
CONTRATO DE OBRA N°			FDLPA-846-2024									PERIODO ENTRE HASTA					
CONTRATO INTERVENTORIA N°			FDLPA-850-2024									DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO					
												7 FEBRERO 2026 6 MARZO 2026					
CONTRATO DE OBRA NO. 846 - 2024 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.																	
Porcentaje Total Componentes			100%			Calificación total									100%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%									COMPONENTE		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES															13%		
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2.0%	Aplica	100%										13.0%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2.0%	Aplica	100%												
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2.0%	Aplica	100%												
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3.0%	Aplica	100%												
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4.0%	Aplica	100%												
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS															35%		
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5.0%	Aplica	100%										35%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6.0%	Aplica	100%												
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5.0%	Aplica	100%												
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4.0%	Aplica	100%												
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3.0%	Aplica	100%												
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6.0%	Aplica	100%												
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6.0%	Aplica	100%												

FORMATO										
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN		
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: CONSORCIO PAVIAS 2025				SUBDIRECCIÓN GENERAL				
DÍA MES AÑO		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.				DIRECCIÓN TÉCNICA				
6 MARZO 2026						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO DE OBRA N°		FDLPA-846-2024				PERIODO ENTRE HASTA				
						DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO				
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		FDLPA-850-2024				7 FEBRERO 2026 6 MARZO 2026				
CONTRATO DE OBRA NO. 846 - 2024 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.										
Porcentaje Total Componentes		100%		Calificación total						100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%					COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2.0%	Aplica	100%						8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2.0%	Aplica	100%						
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	2.0%	Aplica	100%						
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2.0%	Aplica	100%						
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2.0%	Aplica	100%						
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2.0%	Aplica	100%						
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual seriados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAD aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5.0%	Aplica	100%						
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2.0%	Aplica	100%						
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2.0%	Aplica	100%						
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2.0%	Aplica	100%						
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2.0%	Aplica	100%						
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4.0%	Aplica	100%						
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5.0%	Aplica	100%						



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



ANEXO No. 2

POLÍTICA DE RECICLAJE – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025 ***NIT: 901929491-1***



POLÍTICA RECICLAJE CONSORCIO PAVIAS 2025

POLÍTICA RECICLAJE CONSORCIO PAVIAS 2025

EL CONSORCIO PAVIAS 2025; Es un consorcio dedicado a prestar servicios de construcción y consultoría de obras civiles y ambientales, obras de mitigación, construcción de vías y puentes, construcción de obras de urbanismo y recreación, actividades de perforación y geotecnia.

La política de reciclaje y reutilización de residuos o desechos generados es una estrategia clave para abordar el problema de la acumulación de residuos y la protección de los recursos naturales. Esta política se basa en promover prácticas sostenibles que permitan aprovechar al máximo los recursos y reducir la cantidad de desechos que terminan contaminando el entorno.

Como equipo de trabajo **CONSORCIO PAVIAS 2025** se compromete con:

-  Emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental.
-  La mejora continua que garantice un alto estándar del sistema de gestión; mediante la asignación de recursos, estableciendo, manteniendo y mejorando el desempeño de los procesos de reutilización y reciclaje.
-  El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a las actividades de reciclaje y reutilización de materiales en todos los procesos y actividades que se generen dentro de la empresa.
-  La preservación del medio ambiente; previniendo, controlando y minimizando impactos ambientales significativos, y evitando daños Socio ambientales.

A continuación, se presentan las medidas y principios comunes que suelen estar incluidos en las políticas de reciclaje y reutilización:

Recolección selectiva: Establecer un sistema de recolección de residuos que permita separar adecuadamente los materiales reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal, etc.) de los desechos no reciclables. Esto facilita el proceso de reciclaje y evita la mezcla de materiales que pueden ser reutilizados.

Educación y sensibilización: Implementar programas de concienciación y educación para informar a la población sobre la importancia del reciclaje y la reutilización. Esto incluye proporcionar información sobre cómo separar correctamente los residuos, la ubicación de los puntos de reciclaje y los beneficios ambientales de estas prácticas.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



POLÍTICA RECICLAJE CONSORCIO PAVIAS 2025

Infraestructura adecuada: Garantizar la existencia de infraestructuras y centros de reciclaje donde se puedan procesar y transformar los materiales reciclables en productos útiles. También es importante promover la creación de instalaciones para la reutilización y el reciclaje de productos específicos, como electrónicos o pilas.

Economía circular: Promover un modelo económico que fomente la reutilización, el reciclaje y la reducción del consumo de recursos naturales. Esto implica fomentar la reparación de productos y el uso de materiales reciclados en la ejecución de los contratos asignados a la empresa.

Incentivos y subsidios: Implementar incentivos económicos o fiscales para aquellas empresas y ciudadanos que participen activamente en programas de reciclaje y reutilización.

Cooperación público-privada: Fomentar la colaboración entre el sector público y privado para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos y desarrollar soluciones innovadoras para la reutilización de materiales.

Investigación y desarrollo: Invertir en investigación y desarrollo de tecnologías que faciliten el reciclaje y la reutilización de materiales, así como en la búsqueda de alternativas sostenibles para reducir la generación de residuos.

En general, la política de reciclaje y reutilización de residuos busca crear un cambio cultural en la sociedad, fomentando la responsabilidad individual y colectiva para reducir el impacto ambiental y promover una gestión más sostenible de los recursos. Cada país o comunidad puede adaptar estas políticas a sus necesidades y condiciones específicas, pero el objetivo principal es siempre avanzar hacia una economía más circular y respetuosa con el medio ambiente.

ING. SANTIAGO CARRILLO
Representante Lega
CONSORCIO PAVIAS 2025

PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR 500 HOJAS REPROGRAF RESMA 21.6X27.9CM



Código: 04008102

Marca: REPROGRAF

Familia: Papel Multipropósito

Grupo: Fotocopia Blanco

Dimensiones	
Longitud:	5.3 cm
Ancho:	21.7 cm
Alto:	28 cm
Peso:	2310 gr

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Elaborado a partir de la caña de azúcar



Biodegradable



Hecho en Colombia



Estándares de Control de Fatalidades



Consejo de Administración Forestal



Libre de Ácido



Reconocimiento de Certificación Forestal



Reciclable

PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF RESMA

- Marca: Reprograf
- Producto: Papel Fotocopia
- Modelo: Carta
- Formato: Envoltorio de Resma
- Cantidad: 500 hjs
- Material: A base de Caña de Azúcar
- Dimensiones: 21.6 x 27.9 cm
- Peso: 75 grs/m
- Color: Blanco
- Tolerancia: (+ o -) 5% en Cantidad.
- Fabricación: Colombiana

Características

- Papel Reprograf esta hecho a base de fibra Virgen de Bagazo de la Caña de Azúcar.
- Papeles Blancos, pulpa sin blanquear.
- Papel con excelencia ambiental, operacional, comercial y talento humano.
- Papeles amigable con el medio ambiente, 100% Reciclables.
- Producto de la más alta calidad.
- Papel biodegradable y compostable.
- Papel libre de ácido.

Usos

*Papeles Finos para oficina y hogar, usos en:

- Fotocopias
- Ink Jet
- Impresión Láser
- Fax Plano
- Pre-impresión Offset
- Escritura.

Recomendaciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- No exponer a la humedad ni al agua.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026



ANEXO No. 3

SEGUIMIENTO PMT

CONSORCIO PAVIAS 2025
SEGUIMIENTO A PMT COP-FDLPA-846-2024

TRAMO	CODIGO CIV		DIRECCION OBRA	HORARIO DE TRABAJO	N° COI (1era Aprobacion)	FECHA		OBSERVACIONES SDM
	INICIO	FIN				INICIO	FIN	
San Francisco Occidental (5f)	16000696	16000586	DG 5FBIS TV 47 DG 5FBIS TV 48A	07:00-17:00	COI No. 34	22/08/2025	18/12/2025	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSTRUCCION/REHABILITACION DELAMALLAVIAL
Cundinamarca Tutela	16001124	N/A	CL 15 KR 35 CL 15 AK 36	07:00-17:00	COI No. 35	29/08/2025	18/12/2025	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSTRUCCION/REHABILITACION DELAMALLAVIAL
Puente aranda (Modelo)	16000124	N/A	CL 18 KR 55 CL 18 KR 56	07:00-17:00	COI No. 34	22/08/2025	18/12/2025	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSTRUCCION/REHABILITACION DELAMALLAVIAL
Camelia	16001839	N/A	TV 53BIS CL 1C TV 53BIS CL 1 SU	07:00-17:00	COI No. 33	15/08/2025	18/12/2025	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSTRUCCION/REHABILITACION DELAMALLAVIAL
Camelia	16001833	N/A	CL 1C TV 53 CL 1C TV 53BIS	07:00-17:00	COI No. 33	15/08/2025	18/12/2025	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSTRUCCION/REHABILITACION DELAMALLAVIAL
San Gabriel - COLON	16000839	N/A	TV 55 CL 4B TV 55 CL 4CBIS	07:00-17:00	COI No. 33	15/08/2025	18/12/2025	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSTRUCCION/REHABILITACION DELAMALLAVIAL
Veraguas	16002708	N/A	KR 31ABIS CL 4 KR 31ABIS CL 5	07:00-17:00	COI No. 40	3/10/2025	22/01/2026	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSERVACIONDELAMALLAVIAL, POSICIONAMIENTO DE CARPA, ACOPIO DE MATERIALES Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA
Veraguas 2	16002911	N/A	KR 30A AC 3 KR 30A CL 4	07:00-17:00	COI No. 40	3/10/2025	22/01/2026	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSERVACIONDELAMALLAVIAL, POSICIONAMIENTODECARPA
Accion de Movilidad	16002303	16002241	KR 38BBIS CL 2B KR 38BBIS CL 2D	07:00-17:00	COI No. 46	14/11/2025	8/01/2026	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAPARAACIVIDADESDECONSERVACIONDELAMALLAVIAL, POSICIONAMIENTO DE CARPA, ACOPIO DE MATERIALES Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11
PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026




ANEXO No. 4

REGISTROS FOTOGRAFICOS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO - AMBIENTAL - SST		
	PERIODO 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026		
objeto contractual	OBJETO FDLPA-850-2024: _REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		
<div><div><p>11/02/2026 9:41:34 a. m. 5F- 51 Transversal 48a Puente Aranda Bogotá 4°37'27"N 74°6'31"W 275° W Altitud: 2578.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES</div></div> <div><p>21/01/2026 10:57:25 a. m. 4A- 4a Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°37'26"N 74°6'26"W 335° NW Altitud: 2580.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div> <div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO A ACOPIOS DE MATERIALES</div>			
<div><div><p>4/02/2026 12:10:48 p. m. 4A- 5a Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°37'27"N 74°6'30"W 159° S Altitud: 2578.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>SEGUIMIENTO E INSPECCION DE MAQUINARIA</div></div> <div><p>11/02/2026 9:40:28 a. m. # 48- 35 Diagonal 51 Bis Puente Aranda Bogotá, D.C. 4°37'27"N 74°6'30"W 159° S Altitud: 2580.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div> <div>INSPECCION DE CAMILLAS</div>			
OBSERVACIONES: RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION FRENTE DE OBRA CONTRATO FDLPA- COP-846-2024			

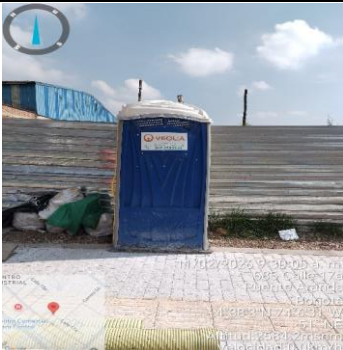	REGISTRO FOTOGRÁFICO - AMBIENTAL - SST		
	PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO DEL 2026		
objeto contractual	OBJETO FDLPA-850-2024: _REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		
<div><div><p>21/01/2026 11:02:30 a. m. 4A-45 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°0'44"W 21° N Altitud: 2587,5msnm Velocidad: 7km/h</p></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE CAMILLAS</div></div> <div><div><p>11/02/2026 12:10:46 p. m. 4A-56 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°0'44"W 21° N Altitud: 2587,5msnm Velocidad: 0km/h</p></div><div>SEGUIMIENTO E INSPECCION DE CAMPAMENTOS DE OBRA</div></div>			
<div><div><p>11/02/2026 9:40:40 a. m. 5F-59 Transversal 1da Puente Aranda Bogotá 4°37'26"N 74°0'30"W 21° N Altitud: 2578,8msnm Velocidad: 0km/h</p></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EEMERGENCIAS</div></div> <div><div><p>11/02/2026 9:39:05 a. m. 5F-59 Transversal 1da Puente Aranda Bogotá 4°37'26"N 74°0'30"W 21° N Altitud: 2578,8msnm Velocidad: 0km/h</p></div><div>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES</div></div>			
OBSERVACIONES: RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION FRENTES DE OBRA CONTRATO FDLPA- COP-846-2024			

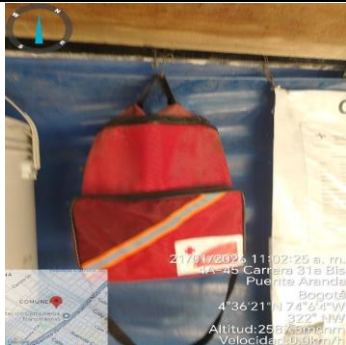	REGISTRO FOTOGRÁFICO - AMBIENTAL - SST		
	PERIODO 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026		
objeto contractual	OBJETO FDLPA-850-2024: _REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		
	 <p>11/02/2026 11:02:45 a. m. 55°55' Transversal 48a Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'30"W Altitud: 2575.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p>	 <p>21/01/2026 11:02:20 a. m. 4A-45 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'4"W Altitud: 2589.0msnm Velocidad: 0.0km/h</p>	
INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE CAMILLAS			
SEGUIMIENTO E INSPECCION A KIT DE CONTROL DE DERRAMES			
	 <p>21/01/2026 11:02:25 a. m. 4A-45 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'4"W Altitud: 2586.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p>	 <p>21/01/2026 11:02:27 a. m. 4A-45 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'4"W Altitud: 2586.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p>	
SEGUIMIENTO E INSPECCION A BOTIQUINES			
INSPECCION Y SEGUIMIENTO A CARTELERAS INFORMATIVAS SST-AMBIENTAL			
OBSERVACIONES: RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION FRENTE DE OBRA CONTRATO FDLPA- COP-846-2024			



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

INFORME EJECUTIVO No. 11

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

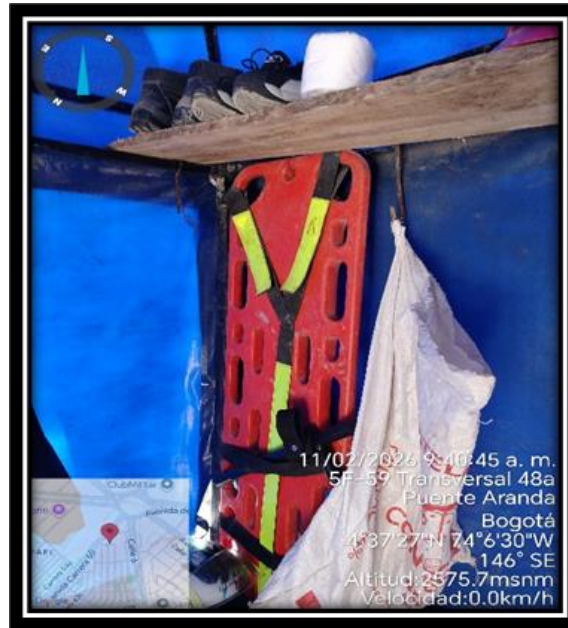

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

INTERVENTORÍA CONCORCIO PAVIAS 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA-850-2024

OBJETO FDLPA-850-2024: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.




Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



RESPONSABLES DEL INFORME

Control Interno	
Elaboró:  Ing. Edna Ruth Casadiego Angarita Ingeniero Residente Ambiental CONSORCIO PAVIAS 2025	Aprobó:  Ing. Santiago Carrillo Representante Lega CONSORCIO PAVIAS 2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST
No. 11

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	MARZO 2025	Primera entrega
02		
03		



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. OBJETIVOS.....	7
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
3. MARCO REFERENCIAL	8
3.1 MARCO NORMATIVO:.....	10
4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	13
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	13
4.1.1 ASPECTOS CONTRACTUALES.....	13
4.1.2 DESCRIPCION CONTRATO DE OBRA.....	14
5. GENERALIDADES	15
5.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	15
5.1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL	15
6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO	16
7. METODOLOGIA.....	18
7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO.....	20
8. COMPONENTE D- GESTIÓN SST	21
8.1 PERSONAL SST DEL CONTRATISTA PARA ESTE PERIODO	22
8.1.1 RELACIÓN DEL PERSONAL DURANTE EL PERÍODO	22
8.1.2 AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	24
8.1.3 AFILIACIÓN DEL PERSONAL A UNA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS)	25
8.1.4 AFILIACIÓN DEL PERSONAL A UN FONDO DE PENSIONES (AFP ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES)	25
8.1.5 AFILIACIÓN DEL PERSONAL A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL).....	25
8.1.6 PAGOS DE PARAFISCALES Y SGSS.....	26
8.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.....	27
8.2.1 EXAMEN DE INGRESO.....	27



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



8.2.1	EXAMEN DE RETIRO	27
8.2.2	DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD	28
8.2.3	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO	28
8.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	28
8.3.1	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28
8.3.2	REPORTE DE INCIDENTES.....	28
8.3.3	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	28
8.3.4	ESTADÍSTICA DE AUSENTISMO LABORAL	29
8.4	ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS.....	29
8.5	ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y DIVULGACIÓN	29
8.5.1	INDUCCION Y CAPACITACIÓN PAR NUEVOS TRABAJADORES	29
9.	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST	31
10.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL.	32
11.	CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA.....	32
12.2	Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal EPP	34
12.3	Registro de Inspecciones realizadas por CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.	35
13.	MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	35
14.	CONCLUSIONES.....	37



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Aspectos contractuales – CONSORCIO PAVIAS 2025	13
Tabla 2 Información general Contratista – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA....	14
Tabla 3 Listado de CIVS FDLPA-846-2024 – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	17
Tabla 4 CIV priorizados por el FDLPA.....	18
Tabla 5. Actividades periódicas de la interventoría para la Gestión Ambiental y SST	19
Tabla 6 Personal SST – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.....	22
Tabla 7 Personal Mínimo Requerido - FDLPA-846-2024	22
Tabla 8 Administrativo y Operativo Nuevo para el Periodo – FDLPA-846-2024	23
Tabla 9 Personal Minimizo Requerido – Interventoría CONSORCIO PAVIAS 2025	24
Tabla 10 Capacitaciones – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.....	30
Tabla 11 Elementos de Protección Personal - CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.....	33
Tabla 12 Inspecciones CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	35
Tabla 13 Listado de Maquinaria en Obra - Contratista de obra.....	36
Tabla 14 Listado de Volquetas Presentes en Obra	36

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localidad de Puente Aranda.....	16
---	----

ANEXOS

- **ANEXO NO. 1. CERTIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES.**
- **ANEXO NO. 2. FICHA DE EVALUACIÓN MENSUAL**
- **ANEXO NO. 3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS**



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del presente informe, se describen las actividades realizadas por la Interventoría CONSORCIO PAVIAS 2025 mediante su área de Seguridad y Salud en el Trabajo SST en cumplimiento de lo estipulado por el contrato FDLPA-850-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN” realizando el seguimiento, control e interventoría al contrato de obra FDLPA-846-2024, suscrito entre CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA y la Alcaldía Local de Puente Aranda, cuyo objeto “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”.

De acuerdo con lo anterior, en el presente informe se describen y consigna el avance del componente D -Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía Ambiental IDU, mediante la implementación y seguimiento del Manual Ambiental de Obra MAO, los cuales se relacionan a continuación:

- ❖ D Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- ❖ Programa D2.- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
- ❖ Programa D2.1- Manejo de maquinaria y equipos
- ❖ Programa D2.2 – Manejo de vehículos
- ❖ Programa D2.3 – Traslado de maquinaria, equipos y cargas
- ❖ Programa D2.4 – Abastecimiento de combustibles en el proyecto
- ❖ Programa D2.5 - Almacenamiento de combustibles en obra
- ❖ Programa D2.6 - Izaje mecánico de cargas
- ❖ Programa D2.7 – Manipulación de redes eléctricas

Dicho contrato de obra está programado para una ejecución de ocho (08) meses luego diligenciada debidamente el Acta de Inicio por las partes, y contando con una fecha prevista de terminación del 06 de diciembre del corriente año 2025.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



De acuerdo a lo anterior, se precisa informar que el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda FDLPA, otorga una adición y prórroga por un tiempo de tres (3) meses, dado así un cambio en la fecha de finalización del presente contrato para el seis (6) de marzo del 2026, así mismo, a través de este documento se registrará el avance de la gestión adelantada, con el fin de tomar decisiones preventivas y correctivas en las obras futuras a ejecutar. En el presente informe se relacionan las actividades realizadas para el presente periodo.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable, así como, los requerimientos establecidos en el MAO frente al componente D - Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo de los contratos FDLPA-850-2024 y FDLPA-846-2024.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Revisar, generar observaciones en caso que sea procedente, y aprobar la información allegada a la presente interventoría por parte de la empresa contratista CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA en el desarrollo del componente SST, y ser radicada ante el FDLPA.
- Verificar el cumplimiento de las actividades programadas dentro del cronograma de actividades SST.
- Efectuar observaciones al área Ambiental y SST de cuando se presentes situaciones de no cumplimiento de las obligaciones del componente SST.
- Realizar el seguimiento, revisión y aprobación de la documentación del personal que labora para CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA en el desarrollo del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (Afiliaciones, Exámenes de ingreso, Inducción etc.)



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



- Revisión, verificación y aprobación, de la documentación presentada para el ingreso de maquinaria y equipo que se exige dentro del área SST, y verificar su cumplimiento con lo estipulado en el Anexo Técnico.

3. MARCO REFERENCIAL

La localidad Ponte Aranda limita al norte con la localidad Teusaquillo, con la Avenida de las Américas o Avenida Calle 23 y la Avenida Ferrocarril de Occidente o Avenida Calle 22 de por medio; al oriente con la localidad Los Mártires, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio; al sur con las localidades Tunjuelito y Antonio Nariño, con la Avenida del Sur o Transversal 35 o Avenida Calle 45A Sur de por medio; y al occidente con la localidad de Kennedy, con la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida Carrera 68 de por medio.

La topografía de la localidad Ponte Aranda es plana, al interior de esta no se encuentran estribaciones montañosas.

El Fondo de Desarrollo Local de Ponte Aranda , adjudico mediante licitación pública el contrato FDLPA-850-2024, cuyo objeto es: *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUNTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.*

De acuerdo con lo anterior, se precisa informar que el plazo total de ejecución del contrato de obra FDLPA-846-2024 es de ocho (08) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, De acuerdo a lo anterior, se precisa informar que el Fondo de Desarrollo Local de Ponte Aranda FDLPA, otorga una adición y prorroga por un tiempo de tres (3) meses, dado así un cambio en la fecha de finalización del presente contrato para el seis (6) de marzo del 2026.

El proyecto surge por la necesidad de mejorar y conservar la Infraestructura vial, para lograr dicho objetivo es necesario llevar a cabo acciones de intervención conservación de la malla vial con actividades de mantenimiento y rehabilitación, de las vías que sostienen dicho sistema tanto para la malla vial local, mejorando el



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



nivel de servicio de esas vías, impidiendo el detrimento, prolongando su vida útil y mejorando las condiciones de movilidad en los tramos priorizados,

De acuerdo con lo anterior y en el desarrollo de sus actividades propias del presente CONSORCIO PAVIAS 2025, realizara el seguimiento y control al contratista de obra CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, quien realizara el cumplimiento durante la ejecución del contrato de obra FDLPA-846-2024, lineamientos, especificaciones técnicas y medidas establecidas por las entidades de carácter ambiental SDA, IDU y CAR, tomando como base los siguientes documentos.

La presente interventoría en el desarrollo de sus actividades, realizo el seguimiento al CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, para que, en el desarrollo del contrato en mención, den cumplimiento con todo lo relacionado a la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo que sea aplicable al desarrollo de las actividades en la ejecución de los contratos en mención, tomando como base los siguientes documentos.

Guía de Manejo Ambiental del IDU: El objetivo de esta Guía de Manejo Ambiental es proporcionar a los contratistas una orientación práctica acerca de las medidas de Manejo Ambiental, de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional aplicables en la ejecución de los proyectos.

Manual de seguimiento ambiental para proyectos de infraestructura urbana del IDU: Este manual ayuda a fortalecer los procesos y procedimientos de control y seguimiento ambiental del proyecto, además sirve de instrumento para la supervisión y control de la gestión ambiental, con el fin de dar cumplimiento exitoso a las labores ambientales detalladas en el contrato y en la normatividad ambiental vigente.

MANUAL AMBIENTAL DE OBRA MAO – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA: Para el presente periodo de tiempo, el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, se encuentra la etapa de ejecución constructiva en la cual se esta implementando el MAO, del cual desde la presente interventoría se continúa realizando el seguimiento, y la verificación en cuanto a la implementación completa del componente Del cual establece la inclusión del **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST**.



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



Las medidas contempladas en este documento serán tenidas en cuenta durante las diferentes fases de ejecución del contrato incluyendo el plan de manejo integral de residuos incluyendo Los Residuos de Construcción y Demolición RCD, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos.

Anexo técnico del Contratista: Establece los requerimientos en cuanto a la gestión ambiental para la ejecución del contrato cumpliendo con la normatividad legal vigente que aplique al objeto del contrato.

3.1 MARCO NORMATIVO:

En el desarrollo de las actividades propias de la presente interventoría, se realizará el seguimiento al contrato de obra FDLPA-846-2024, cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Se verificará que en el desarrollo tanto de interventoría como del contratista se tome como referencia y eje de cumplimiento obligatorio la siguiente normatividad:

- **Decreto 357 de mayo 21 de 1997 (DISTRITAL)**, por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.
- **Decreto 948 de 1995 (MINAMBIENTE)**, que reglamenta la prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire.
- **Resolución 541 de 1994 (MINAMBIENTE)**, por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
- **Decreto 312 de 2006 (DISTRITAL)**, por el cual se adopta el plan maestro para el manejo integral de residuos sólidos para Bogotá D.C.
- **Decreto 586 de 2015 (DISTRITAL)**, por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y demolición - RCD en Bogotá D.C.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



- **Resolución 1138 de 2013**, por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la Construcción y se toman otras determinaciones.
- **Ley 1259 de 2008**, por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros.
- **Decreto 1072 de 2015**, Reglamento Único del Sector Trabajo

DECRETOS:

- **Decreto 411 de 2020**, Medidas preventivas en materia de zonas francas para mitigación del riesgo del contagio del COVID-19.
- **Decreto 412 de 2020**, Medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los estados limítrofes de Colombia, con el fin de evitar que sigan ingresando al territorio nuevos casos de portadores del COVID-19.
- **Decreto 417 de 2020**, Declaración del estado de emergencia Económica, social y ecológica en todo el territorio nacional con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID-19.
- **Decreto 418 de 2020**, Medidas para organizar la expedición de actos y órdenes en materia de orden público, con ocasión de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus (COVID-19).
- **Decreto 441 de 2020**, Decreta la reinstalación y/o reconexión inmediata de servicios de acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados
- **Decreto 444 de 2020**, Crea el Fondo de Mitigación Emergencias - FOME.
- **Decreto 457 de 2020**, Se decreta aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, hasta el 13 de abril. Se establecen 34 excepciones y se garantiza prestación de servicios básicos y abastecimiento.
- **Decreto 637 de 2020**, Por el cual se declara un Estado de Emergencia, Económica, social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
- **Decreto 476 de 2020**, Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



- **Decreto 539 de 2020**, Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
- **Decreto 676 de 2020**, Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIONES

- **Resolución 679 de 2020**, Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.
- **Resolución 385 de 2020**, Declaración de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus.
- **Resolución 380 de 2020**, Se adoptan medidas preventivas en el país a causa del Coronavirus.
- **Resolución 666 de 2020**, Se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus.
- **Resolución 223 de 2021**, Por medio del cual se modifica la resolución 666 de 2020 en sentido de sustituir su anexo técnico
- **Resolución 392 de 2021**, Por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 666 de 2020 y los numerales 4,1 y 5 de su anexo técnico.

CIRCULARES

- **Circular DANE 08 de 2020**, Nuevos lineamientos a seguir frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y el aislamiento preventivo obligatorio.
- **Circular CNE 029 de 2020**, Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorio.
- **Circular Min transporte 001 de 2020**, Directrices para la prevención, detección y atención ante un caso de Coronavirus COVID-19.



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



- **Circular Min Salud 018 de 2020**, Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.
- **Circular 003 de 2020**, Protocolo de bioseguridad para la infraestructura de transporte.
- **Circular ANI 011 de 2020**, Medidas fijadas por el Gobierno Nacional, ante la presencia de la enfermedad COVID-19.
- **Circular 017 de 2020**, Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1.1 ASPECTOS CONTRACTUALES

Tabla 1. Aspectos contractuales – CONSORCIO PAVIAS 2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
INFORMACIÓN SE SESION DE CONTRATO	MINUTA DE SECCION DEL 28 DE MARZO DEL 2025
NÚMERO DEL CONTRATO:	FDLPA-850-2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 555.291.050
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 555.291.050
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIAS 2025
SUPERVISIÓN:	VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Arq. Juan Alfredo Torres Prieto



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	Fondo De Desarrollo Local de Puente Aranda
DURACIÓN DEL CONTRATO	Ocho (08) meses
FECHA DE INICIO (Firma acta de inicio)	07 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 de diciembre de 2025
PRÓRROGA NRO. 1	Prórroga Nro. 1
TIEMPO	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION	6 DE MARZO DE 2026.
ADICIÓN NRO. 1	Adición Nro. 1

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

4.1.2 DESCRIPCION CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Información general Contratista – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.
NÚMERO DEL CONTRATO:	FDLPA-846-2024
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$6.351.563.839
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
INTERVENTORÍA	CONSORCIO PAVIAS 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Ocho (08) meses



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026

FECHA DE INICIO (Firma acta de inicio)	07 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de diciembre de 2025
PRORROGA	Tres (3) Meses
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO	Once (11) Meses
FECHA ACTA DE INICIO	07 de abril del 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	06 de diciembre del 2025
FEHCA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06 de marzo de 2026

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

5. GENERALIDADES

5.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL

El desarrollo de los ya mencionados contratos de obra e interventoría se localizan en la zona central de Colombia, en el departamento de Cundinamarca y más específicamente en la capital Bogotá D.C.; las vías a intervenir son las identificadas con los códigos de identificación vial. En la Figura 1, se indica la localización del proyecto a nivel nacional; la Localidad N° 16 del Distrito Capital de Bogotá, Puente Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada hacia el centro occidente de la ciudad. Deriva su nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. Puente Aranda se caracteriza por ser el centro de la actividad industrial de Bogotá.




Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



Ilustración 1 Localidad de Puente Aranda



Fuente: <https://www.google.com/>

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO

El proyecto se llevará a cabo en la localidad de Puente Aranda la cual es la N.º 16 del Distrito Capital de Bogotá, capital de Colombia en el centro occidente de la ciudad. Deriva su nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. Puente Aranda se caracteriza por ser el centro de la actividad industrial de Bogotá.

- ❖ De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la ubicación del desarrollo constructivo que se realiza en la ejecución del contrato de obra, nos permitimos presentar el listado de CIV contractuales otorgados por el FDLPA, así como su respectiva ubicación:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



Tabla 3 Listado de CIVS FDLPA-846-2024 – CONSORCIO VIAS DE
PUENTE ARANDA

Numero	CIV	EJE	DESDE	HASTA
1	16001611	CL 5C	KR 39D	KR 40
2	16001664	KR 39D	CL 5 A	CL 5 C
3	16000696	DG 5FBIS	TV 47	TV 48
4	16000586	DG 5FBIS	TV 48A	TV 48
5	16003772	KR 39B	CL 29A S	CL 29B S
6	16000124	CL 18	KR 55	KR 56
7	16002911	KR 30A	AC 3	CL 4
8	16002866	KR 30A	CL 4	CL 4BIS
9	16001545	CL 2B	TV 53A	KR 53BBIS
10	16001079	KR 57A	CL 2B	CL 2C
11	16002164	CL 2D	KR 39	KR 39A
12	16002834	KR 51C	CL 24 S	AC 26 S
13	16003336	CL 10A S	KR 36	KR 37
14	16002708	KR 31A BIS	CL 4A	CL 5
15	16000940	CL 4A	KR 54	KR 55
16	16000839	KR 55	CL 4B	CL 4CBIS
17	16001839	TV 53BIS	CL 1 S	CL 1C
18	16001833	CL 1C	TV 53	TV 53 BIS
19	16002303	KR 38B BIS	CL 2B	CL 2C
20	16002253	KR 38B BIS	CL 2C	CL 2C BIS
21	16002241	KR 38B BIS	CL 2C BIS	CL 2D



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026

Numero	CIV	EJE	DESDE	HASTA
22	16001124	CL15	KR 5	KR 36

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 4 CIV priorizados por el FDLPA

N°	CIV	PK_ID	NOMENCLATURA	INICIO	FIN	ÁREA
1	16001124	189329	CL15	KR 35	KR 36	745,72
2	16001839	187820	TV 53 BIS	CL 1C	CL 1 SUR	1928,57
3	16001833	188405	CL 1C	TV 53 BIS	TV 53	319,22
4	16000124	189511	CL 18	KR 55	KR 56	594,25
5	16000696	187769	DG 5F BIS	TV 47	TV 48	664,05
6	16000586	187770	DG 5F BIS	TV 48A	TV 48	269,77
7	16000839	188187	KR 55	CLL 4B	CLL 4C BIS	665,3

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

7. METODOLOGIA

La presente interventoría realiza el seguimiento y verificación a la gestión realizada en el desarrollo de los componentes ambiental y SST la cual abarca de acuerdo a los establecido en el MAO el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en el componente D, así mismo, durante la ejecución constructiva de los frentes de obra se continúa con la verificación e inspección, con el objetivo de evidenciar el cumplimiento con los procedimientos y programas de manejo ambiental y de SST descritos por el contratista en el MAO, así mismo que las demás especificaciones técnicas y normatividad que se apliquen a los procesos constructivos para el desarrollo del objeto contractual apoyado en la lista de chequeo mensual.

Lo anterior mediante visitas técnicas de obra, revisión de especificaciones, seguimiento y control a las actividades desarrolladas, asistencia a comités. La interventoría realiza la verificación de los procesos propuestos e implementados que buscan la minimización tanto de impactos ambientales, como la exposición a riesgos y accidentes que se puedan presentar en la ejecución del presente contrato de obra, generados por la acción de las actividades constructivas y/o dotacionales desarrolladas en la localidad de los Mártires en la ejecución del contrato de obra FDLPA-846-2024.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



La presente interventoría para lograr el objetivo de la correcta ejecución de la obra en función de calidad y cumplimiento en materia de SST toma como bases lineamientos internos establecidos para la entidad (descritos a continuación en la Tabla 4, así como las diferentes Especificaciones técnicas generales de materiales de construcción, para proyectos de infraestructura vial, para Bogotá DC del IDU. Para minimizar los impactos ambientales y riesgos de laborales a la hora de la ejecución de actividades constructivas, se basa en los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura Urbana – IDU y el MAO establecido y aprobado para el presente contrato.

Tabla 5. Actividades periódicas de la interventoría para la Gestión Ambiental y SST

Inspecciones rutinarias a todo el personal que relacionan, así mismo el seguimiento directamente en los frentes de obra donde se estén ejecutando actividades constructivas, con la finalidad de evidenciar que el personal reportado sea el que está en campo.
Inspección, seguimiento y control a toda la maquinaria reportada, así mismo se realiza el seguimiento en campo para evidenciar que la maquinaria reportada sea la que se encuentra realizando actividades en cada frente de obra.
Inspecciones periódicas a todos los frentes de obra contando con su campamento o bodega, inspeccionando botiquines, extintores, camillas, kit de derrames, hojas de seguridad, acopio de sustancia peligrosas, y buen manejo de residuos comunes, especiales y de construcción, demolición y excavación.
Inspecciones a herramientas, así como su debida desinfección de acuerdo con lo estipulado en el Protocolo de Bioseguridad.
Visitas de seguimiento a todos los CIV's, así mismo a los frentes de obra implementados, evidenciando las situaciones que puedan generar un riesgo bien sea para la comunidad como para los trabajadores de la empresa contratista.
Verificación de los estados de cerramiento perimetral el cual debe ser acorde con lo autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad SDM y senderos peatonales en cada uno de los CIVs. Que se estén ejecutando.
Realización de Comité Ambiental-SST una vez al mes o cuando se requiera.
Seguimiento a las reuniones del COPASST y el COCOLA del CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA en el desarrollo del contrato de obra en mención.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



Seguimiento al traslado de maquinaria.

Comités técnicos de obra para definir y solucionar problemas presentados en los frentes.

Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por parte la interventoría en el presente periodo del informe:

- ❖ Durante el periodo evaluado, en el marco de la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría continuó con el seguimiento a la ejecución de las actividades propias del componente, así como a la gestión adelantada por el contratista en el desarrollo del proceso constructivo, verificando la adecuada implementación del Sistema de Gestión de SST. De igual manera, se realizó seguimiento al cumplimiento de reuniones del COPASST y COCOLA, ejecución de capacitaciones conforme al cronograma aprobado, así como a la realización de inspecciones y preoperacionales, entre otras actividades.
- ❖ Para el presente periodo, el componente SST de la interventoría mantuvo la ejecución de visitas de seguimiento e inspección en los diferentes frentes de obra donde se desarrollan actividades constructivas y remates, evidenciando la disponibilidad e implementación de elementos para la atención de emergencias, tales como camillas, botiquines y extintores. Así mismo, se constató la instalación de carteleras informativas relacionadas con SST.
- ❖ El CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA, a través de su área de SST y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, continúa con la implementación de los lineamientos establecidos en el Manual Ambiental de Obra (MAO) aprobado por la interventoría, evidenciando el cumplimiento de lo dispuesto en el componente D durante la ejecución de las actividades constructivas.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



- ❖ En el transcurso del periodo, la interventoría realizó la revisión y verificación de la documentación correspondiente al componente SST, incluyendo soportes de ingreso de personal, notificaciones de riesgos, exámenes médicos de ingreso, planillas de seguridad social y certificaciones de afiliación a EPS, ARL, CCF y AFP.
- ❖ Desde el componente SST, la interventoría participó en los comités de obra, en los cuales se expusieron los resultados del seguimiento efectuado. En estos espacios se informó al FDLPA que, para el periodo evaluado, el desempeño del contratista en materia de SST es satisfactorio, considerando que los frentes de obra se encuentran en adecuadas condiciones y que las observaciones realizadas por la interventoría son atendidas de manera oportuna.
- ❖ Con base en los recorridos de inspección efectuados, se evidenció que el personal operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos. No obstante, se reitera la recomendación al contratista respecto a la adecuada identificación de algunos overoles con la información del contrato de obra, así como la necesidad de instalar la señalización (stickers) correspondiente en la maquinaria, observaciones que han sido comunicadas de manera reiterada por la interventoría.

8. COMPONENTE D- GESTIÓN SST

Para el presente periodo de tiempo, y en el desarrollo del componente en mención, el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, en la ejecución de su componente de SST, realizó las siguientes actividades:

- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo SG-SST
- Inducción de personal para nuevos ingresos
- Revisión de exámenes de ingreso
- Inspecciones de elementos de emergencias
- Entregas de EPP
- Implementación de carteleras informativas que se implementaran en los campamentos de obra.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



- Implementación de la Brigada de Orden, aseo y Limpieza.
- Charlas informativas y capacitaciones.

De acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar el cumplimiento a cabalidad con lo propuesto en el cronograma de actividades, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST

8.1 PERSONAL SST DEL CONTRATISTA PARA ESTE PERIODO

Para dar cumplimiento a los requerimientos contractuales, normativos y los establecidos por el Manual Ambiental de Obra en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista cuenta con un Residente SST cuyo perfil cumple con los requisitos del anexo técnico para el contrato FDLPA-846-2024, a la fecha del presente informe no se cuenta con aprobación de hojas de vida del personal contractual.

Tabla 6 Personal SST – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.

NOMBRE	CARGO
ING. JULIETH STEFANNY ORTIZ	RESIDENTE SISO (contratista)
JUAN CAMILO CUBILLOS MORALES	INSPECTOR AMBIENTAL SST

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

8.1.1 RELACIÓN DEL PERSONAL DURANTE EL PERÍODO

- ❖ Teniendo en cuenta que el contrato de obra FDLPA-846-2024 se encuentra en etapa d ejecución de obra, se informa que, el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA allego las Hojas de vida de los profesionales del contrato de obra de manera digital, las cuales fueron objeto de revisión y se remitieron observaciones mediante el radicado interno CIN-850-2024-005 del 07 de mayo del 2025.

Tabla 7 Personal Mínimo Requerido - FDLPA-846-2024



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



PERSONAL CONTRACTUAL CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA					
No.	CARGO	NOMBRE	CEDULA	DEDICACIÓN	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	JULIAN CAMILO POVEDA MORENO	1.014.183.253	40%	HOJA DE VIDA APROBADA
2	ING. RESIDENTE DE OBRA	JUAN CARLOS AGUIRRE GUTIERREZ	1.014.304.643	90%	HOJA DE VIDA APROBADA
3	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	80.026.555	20%	HOJA DE VIDA APROBADA
4	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10.766.686	10%	HOJA DE VIDA APROBADA
5	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	11.000.758	20%	HOJA DE VIDA APROBADA
6	RESIDENTE AMBIENTAL	JULIETH STEFANNY ORTIZ	1.013.666.534	40%	HOJA DE VIDA APROBADA
7	RESIDENTE SOCIAL	DIANA MARCELA SANDOVAL AMAYA	1.023.936.212	40%	HOJA DE VIDA APROBADA
8	INSPECTOR AMBIENTAL SST	JUAN CAMILO CUBILLOS MORALES	1.069.747.844	40%	HOJA DE VIDA APROBADA

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Tabla 8 Administrativo y Operativo Nuevo para el Periodo – FDLPA-846-2024

LISTADO DE PERSONAL			
Nombre	Cedula	Cargo	Fecha Ingreso
No se evidencian ingresos			

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

- ❖ De acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar la documentación de soporte, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST.



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



Personal Mínimo Requerido Grupo Interventoría CONSORCIO PAVIAS 2025: mediante el radicado interno CIN-850-2024-001 con fecha del 01 de abril del 2025 se radicaron las hojas de vida del personal contractual de la presente interventoría al FDLPA, mediante el Radicado No. 20256610025782 con fecha del 02 de abril del 2025, el FDLPA.

Tabla 9 Personal Minimizo Requerido – Interventoría CONSORCIO PAVIAS 2025

PERSONAL CONTRACTUAL CONSORCIO INTERVENTENTORÍA PTE A 2023				
No.	CARGO	NOMBRE	CEDULA	DEDICACIÓN
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CESAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO	91.276.532	SEGÚN DEDICACION MES A MES
2	RESIDENTE INTERVENTORIA	LUIS EDUARDO ACOSTA VELASQUEZ	80.067.450	SEGÚN DEDICACION MES A MES
3	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y GEOTECTNIA	YIRA ELIZABETH COPETE MOSQUERA	52509001	SEGÚN DEDICACION MES A MES
4	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	GUSTAVO ARANGUREN SANCHEZ	79.543.833	SEGÚN DEDICACION MES A MES
5	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	DIEGO ARMANDO FORERO CHARRY	80.765.897	SEGÚN DEDICACION MES A MES
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	EDNA RUTH CASADIEGO ANGARITA	37.327.329	SEGÚN DEDICACION MES A MES
7	PROFESIONAL SOCIAL	DORIS MARIA ORTIZ BARON	1.049.643.137	SEGÚN DEDICACION MES A MES

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

8.1.2 AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En el desarrollo de las actividades propias de la presente interventoría, se verifica y se realiza el respectivo seguimiento desde el área de SST, donde la empresa contratista de obra CONSORCIO VIAS PUENTE ARANDA, presenta en sus informes mensuales el formato del listado de trabajadores el cual contiene toda la información de las personas que ingresan o se retiran del desarrollo del contrato



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



de obra en mención, así como toda la información de exámenes de ingreso y egreso y fechas de pagos de seguridad social. Con la finalidad de dar cumplimiento con la normatividad legal aplicable al desarrollo del componente D – SGSST, De acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar la documentación de soporte, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST.

**8.1.3 AFILIACIÓN DEL PERSONAL A UNA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD (EPS)**

Toda empresa debe afiliar a sus empleados a una EPS de su libre elección, los empleados que estén bajo el régimen subsidiado una vez inicien el vínculo laboral serán adscritos a una EPS, cuando el vínculo laboral desaparezca.

El Contratista entregará la respectiva carta para su reingreso al régimen subsidiado. El patrono descontará al empleado su aporte y pagará el suyo a la entidad correspondiente.

**8.1.4 AFILIACIÓN DEL PERSONAL A UN FONDO DE PENSIONES
(AFP ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES)**

El contratista debe afiliar a sus empleados a una Fondo de pensiones de libre elección del trabajador, allí deberá consignar su aporte para el auxilio de pensión correspondiente junto con el aporte del trabajador.

**8.1.5 AFILIACIÓN DEL PERSONAL A UNA ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES (ARL)**

Toda empresa legalmente constituida deberá afiliar a sus empleados a una ARL de elección del empleador, allí consignará el aporte correspondiente de acuerdo con la actividad económica establecida el decreto 1607 de 2002 y al decreto 1772 de 1994.

Todo el personal vinculado al proyecto conto con las afiliaciones y/o pagos al sistema general de seguridad social, requisito de carácter obligatorio para el ingreso de personal al proyecto.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



8.1.6 PAGOS DE PARAFISCALES Y SGSS

En el desarrollo del seguimiento realizado por parte de la presente interventoría, para el presente periodo de tiempo, de acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar la documentación de soporte, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST.

De acuerdo con lo anterior, es imperativo informar al FDLPA, que dicha documentación no se anexa al presente informe con la finalidad de no generar duplicidad en la información radicada al FDLPA:

Así mismo, todo el personal que ingrese al desarrollo del contrato de obra en mención contara con soportes de afiliación al SGSS (EPS; AFP y ARL), el personal que se vinculó al proyecto pero que viene trabajando con otra empresa o por una de las empresas del CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA contara con pagos al día, estos se presentan como anexos y previamente a su ingreso los soportes deben ser remitidos y aprobados por la Interventoría.

Pagos de Seguridad Social Grupo de Interventoría CONSORCIO PAVIAS 2025

En el desarrollo del presente contrato de Interventoría FDLPA-850-2024, y en la formulación de los informes de gestión del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el manejo y pagos de la seguridad social del personal contractual del CONSORCIO PAVIAS 2025, dará cumplimiento a lo estipulado en el en el pliego de condiciones de la siguiente manera:

(...)

PLIEGO DE CONDICIONES

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

3.4.1 PERSONAS JURÍDICAS

El Proponente persona jurídica debe diligenciar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



con los requerimientos de ley, por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.

Así mismo con lo estipulado en el Anexo Técnico de la presente interventoría de la siguiente manera:

ANEXO NO. 1 – CERTIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES – CONSORCIO PAVÍAS 2025.

8.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

8.2.1 EXAMEN DE INGRESO

En el desarrollo de las actividades de interventoría, se realiza el seguimiento en la realización de los exámenes de ingreso, dado cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 por medio de la cual se deben realizar exámenes médicos ocupacionales de ingresos a todo el personal antes de ingresar a laborar y prestar servicios para CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA , se precisa informar que, para el presente periodo de tiempo, el contratista en mención presenta exámenes de ingreso, los cuales son objeto de verificación por parte de la presente interventoría.

8.2.1 EXAMEN DE RETIRO

Se precisa informar que, para el presente periodo de tiempo CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, no se cuenta con exámenes de retiro.



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



8.2.2 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD

Se precisa informar que, para el presente periodo de tiempo, CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA se encuentra en su etapa de ejecución constructiva, de la cual al momento en que los trabajadores que van ingresando se toman los respectivos atamanes de ingreso, la residente SST les socializa los respectivos resultados, al momento de presentar las condiciones de salud del personal resultantes de la realización de los exámenes de salud ocupacional de ingreso, desde la presente interventoría se realizara el respectivo seguimiento y verificación de las diferentes condiciones de salud entre las cuales se encuentran: Higiene Postural, Cuidado de Columna, Control con EPS, Pausas activas, entre otros.

8.2.3 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO

Por parte de la presente interventoría, se realizará el respectivo seguimiento, para que cuando sea el caso se soliciten realizar o programar los exámenes médicos ocupacionales periódicos.

8.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL

8.3.1 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Para el presente periodo de tiempo, CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA no reporta Accidentes de trabajo de los cuales sea necesario realizar e implementar la respectiva investigación, al momento de presentar una situación, desde la presente interventoría se realizará el respectivo seguimiento a este componente.

8.3.2 REPORTE DE INCIDENTES

Para el presente periodo de tiempo, CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA no reporta accidentes de trabajo.

8.3.3 ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD

De acuerdo con los numerales anteriores, es claro que para el presente periodo de tiempo CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, se presenta una estadística de



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



accidentalidad en 0, con un índice de frecuencia del 0% y un índice de severidad del 0 %.

8.3.4 ESTADÍSTICA DE AUSENTISMO LABORAL

Para el presente periodo de tiempo, CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA se encuentra en su etapa de ejecución de obra de la cual reporta una estadística de ausentismo laboral del 0%.

8.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS.

8.4.1 MATRIZ DE PELIGROS

Para el presente periodo de tiempo, CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, implementa su Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo del contrato FDLPA-846-2024 en cual se formula la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y LA VALORACION DE RIESGOS, la cual se actualizará, en el momento que se realicen actividades que no se contemplen en la misma.

8.4.2 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Durante el período del presente informe el contratista realizara en la inducción al personal nuevo la socialización sobre la preparación y respuesta ante emergencias y la ubicación de los puntos de encuentro en cada frente de trabajo, así mismo, en los recorridos iniciales, la presente interventoría evidencia que, en la implementación de campamentos temporales, así como bodegas, se cuenta con (camilla, extintor, botiquín, kit de derrames).

8.5 ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y DIVULGACIÓN

8.5.1 INDUCCION Y CAPACITACIÓN PAR NUEVOS TRABAJADORES

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razón social de la empresa, la organización y la estructura de esta. Con el proceso de inducción se busca resaltar las recomendaciones médicas prescritas por el Medico



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



ocupacional del centro médico, el cual realizo al trabajador el examen de ingreso, de igual forma se da a conocer las políticas en Seguridad y Salud en el Trabajo y se notifica los riesgos a los que está expuesto el trabajador.

De acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar el cumplimiento a cabalidad con lo propuesto en el cronograma de actividades, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST

8.5.1 CAPACITACIONES

Durante el periodo reportado para el presente informe, el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA mediante su área de SST implementan el SGSST, de acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar el cumplimiento a cabalidad con lo propuesto en el cronograma de actividades, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST.

Tabla 10 Capacitaciones – CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.

No	NOMBRE CHARLA INDUCCIÓN O CAPACITACIÓN	FECHA	FRENTE DE OBRA	NUMERO DE ASISTENTES
1	Manejo Adecuado de Residuos	26/06/2025	16000124	4 personas
2	Funciones de Orden y Aseo	03/07/2025	16000124	4 personas
3	Procedimiento adecuado de acopio de Materiales	01/07/2025	16001833 - 1839	7 personas
4	Adecuado uso de EPP	26/06/2025	16000124	4 personas
5	Capacitación en levantamiento de cargas pesadas	03/07/2025	16001124	4 personas
6	Manipulación de cargas	07/07/2025	16001833 - 1839	7 personas
7	Ajuste horario laboral	15/07/2025	16001124	5 personas
8	Adecuado uso de EPP	22/07/2025 24/07/2025	16001833 - 1839	7 personas



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026

No	NOMBRE CHARLA INDUCCIÓN O CAPACITACIÓN	FECHA	FRENTE DE OBRA	NUMERO DE ASISTENTES
9	Cuidado de las manos Uso adecuado de EPP	22/08/2025 07/08/2025	Frentes de obra	16 personas 5 personas
10	Control de ruido (maquinaria)	10/09/2025	Frentes de obra	20 personas
11	Manipulación sustancias químicas	26/09/2025	Frentes de obra	16 personas
12	Manejo de quemaduras caídas y golpes	14/10/2025	Frentes de obra	20 personas
13	Técnicas seguras de levantamiento de cargas	23/10/2025	Frentes de obra	16 personas
14	Uso adecuado de EPP	09/10/2025	Frentes de obra	12 personas
15	Capacitación Pausas Activas	07/11/2025	Frentes de obra	15 personas
16	Capacitación planes de emergencia para obras viales	18/11/2025	Frentes de obra	16 personas
17	Pausas activas y/o gimnasio laboral Manejo de cargas	29/12/2025 17/12/2025	Frentes de obra	30 personas
18	Para el presente periodo de tiempo del 07 de enero al 06 de febrero no se evidencia, ya que a la fecha el contratista no ha presentado informe del componente SST			
19	Lección aprendida	12/02/2026	Frentes de obra	10 personas
20	Prevención daños redes de gas natural	16/02/2026	Frentes de obra	10 personas

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

Los respectivos soportes se pueden evidenciar en el informe mensual del contratista de obra componente SST, los mismos no se anexan al presente informe, con la finalidad de no generar duplicidad en la información radicada al FDLPA.

9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 2013 de 1986, el CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). La elección de sus integrantes se llevó a cabo el día 06 de junio de 2025 en las instalaciones del Punto CREA,



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



contando con la participación de los representantes designados, quienes asumieron el compromiso de ejercer sus funciones en pro del fortalecimiento de las políticas y la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el marco del seguimiento correspondiente al presente periodo, se evidenció que el contratista realizó la reunión del COPASST el día 27 de febrero de 2026, en cumplimiento de las actividades programadas dentro del componente de SST.

10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012, el CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA conformó el Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). Para tal efecto, el día 06 de junio de 2023 se llevó a cabo el proceso de elección de sus integrantes en las instalaciones del Punto CREA y en los diferentes frentes de obra, con la participación de los representantes designados, quienes asumieron el compromiso de dar cumplimiento a las funciones orientadas al fortalecimiento de las políticas y la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el presente periodo, se evidenció que el contratista de obra llevó a cabo la reunión del COCOLA el día 27 de febrero de 2026, en cumplimiento de las actividades programadas dentro del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA.

Tomando como base la siguiente normatividad legal aplicable, la Resolución 0256 de 2014 y la Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1016 de 1989, Decreto 2222 de 1993, Decreto 1443 de 2014 y la Ley 1575 de 2012, CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA conforma la Brigada de Emergencia, iniciando labores constructivas estableciendo que todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados para la prevención y extinción de incendios.

Es de resaltar que, en el desarrollo de las actividades propias de la presente interventoría, se realizarán visitas de seguimiento a la implementación de elementos de emergencia en la instalación de los campamentos de los frentes de



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



obra que en el desarrollo del contrato de obra se vayan dando inicio de actividades constructivas.

12. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

12.1 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

En el desarrollo del contrato de obra, el área SST mediante su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, presenta el Procedimiento para la entrega, uso y reposición de los Elementos de Protección Personal EPP, aquellos elementos de protección personal que hacen parte de la dotación cuyo objeto es proteger al personal de los riesgos de actividades y exposiciones que tienen de acuerdo a las labores que desempeñan minimizando los riesgos o en lo posible evitándolos completamente, así mismo, el contratista presenta la siguiente tabla donde plantea elementos básicos de protección de personal que deberá utilizar el personal para asegurar un riesgo mínimo y de seguridad y llevar un control en su entrega y uso.

Tabla 11 Elementos de Protección Personal - CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.

CARGO	EQUIPO DE DOTACION Y DOTACION
Director de obra Coordinación del proyecto	<ul style="list-style-type: none">○ Casco De Seguridad Blanco○ Gafas De Seguridad○ Botas De Cuero Con Punta De Acero○ Protector Auditivo○ Protector Respiratoria (Mascarilla Normal)○ Chaleco Tipo IDU
Ingeniero ambiental Residente de obra Geotécnico Topógrafo	<ul style="list-style-type: none">○ Casco De Seguridad Blanco○ Gafas De Seguridad○ Botas De Cuero Con Punta De Acero○ Protector Auditivo Inserción○ Protector Respiratoria (Mascarilla Normal)○ Chaleco Tipo IDU○ Impermeable Para Invierno○ Bota De Caucho Con Punta De Acero



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



CARGO	EQUIPO DE DOTACION Y DOTACION
Residente Social Auxiliar social	<ul style="list-style-type: none">○ Casco De Seguridad Blanco○ Monogafas De Seguridad○ Botas De Cuero Con Punta De Acero○ Protector Auditivo Inserción○ Protector Respiratoria (Mascarilla Normal)○ Chaleco Tipo IDU○ Impermeable Para Invierno○ Bota De Caucho Con Punta De Acero○ Guantes Vaqueta
Operador de maquina	<ul style="list-style-type: none">○ Casco De Seguridad Amarillo○ Overol○ Monogafas De Seguridad○ Botas De Cuero Con Punta De Acero○ Protector Auditivo Tipo Copa U Orejeras○ Protector Respiratoria (Mascarilla Normal)○ Impermeable Para Invierno○ Bota De Caucho Con Punta De Acero○ Guantes Nitrilo
Oficial Maestros Ayudantes Auxiliar de Trafico	<ul style="list-style-type: none">○ Casco De Seguridad Amarillo○ Overol○ Monogafas De Seguridad○ Botas De Cuero Con Punta De Acero○ Protector Auditivo Tipo Inserción○ Protector Respiratoria (Mascarilla Normal)○ Impermeable Para Invierno○ Bota De Caucho Con Punta De Acero○ Guantes Baqueta○ Guantes De Caucho

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

12.2 Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal EPP

De acuerdo con este numeral, se precisa informar al FDLPA, que de acuerdo con el seguimiento realizado por parte del componente SST de la presente interventoría, se informa al FDLPA que en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar la documentación de soporte, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST.



Consorcio Pavías 2025

NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



12.3 Registro de Inspecciones realizadas por CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.

En el desarrollo del contrato de obra, CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA formulo su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, en el cual se presenta la Matriz de Inspecciones a realizar para la vigencia en el desarrollo del contrato de obra, así como la prioridad de entrega de los soportes de las mismas, para el presente periodo de tiempo el contratista de obra reporta las siguientes inspecciones:

De acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar la documentación de soporte, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST.

Tabla 12 Inspecciones CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

N°	INSPECCION	FECHA	CANTIDAD
1	Orden y aseo	09/02/2026 27/02/2026	2
2	Revisión EPP	09/02/2026 27/02/2026	2
3	Inspección extintores (maquinaria y campamento)	09/02/2026 27/02/2026	2
4	Señalización	09/02/2026 27/02/2026	2
5	Inspección Botiquines	09/02/2026 27/02/2026	2

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

13.MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Teniendo en cuenta que en el desarrollo del contrato de obra FDLPA-846-2024, para el presente periodo de tiempo se encuentra en etapa DE EJECUCION CONSTRUCTIVA, de la cual se precisa informar que para el presente periodo de



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



tiempo se cuenta con la siguiente maquinaria en los frentes de obra donde se iniciaron actividades:

De acuerdo con lo anterior, en el presente periodo de tiempo no se puede evidenciar la documentación de soporte, ya que, a la fecha del presente, no se cuenta con el respectivo informe mensual del contratista de obra componente SST.

Tabla 13 Listado de Maquinaria en Obra - Contratista de obra

MAQUINARIA					OPERADOR	STICKER No. MOVIL	CONTRATISTA	CIV
ITEM	NOMBRE MAQUINARIA	MARCA	SERIAL	MODELO	NOMBRE OPERADOR			
1	RETROEXCAVADORA	Hitachi	RAS90C K15885	2019	ALEJANDRO CORREAL	029	INNOVAR CONSTRUCCIONES CASTILLO	16000696 - 16000586

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025

A continuación, se relacionan las volquetas presentes en la obra en el periodo del presente informe

Tabla 14 Listado de Volquetas Presentes en Obra

CONDUCTORES		VOLQUETAS					
NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	MODELO	SOAT	REVISION TECNIMECANICA	PIN	STICKER No. MOVIL	CONTRATISTA
DIXON JAVIER MORALES	JPP818	2025	04/07/2026		27471	023	CONSTRUPROYECTOS
FABIAN CHAPARRO ORTIZ	WGU929	2015	02/02/2026	18/03/2026	13249	PENDIENTE	INNOVAR
SANTIAGO GONZALEZ	STA474	2013	06/02/2026	21/04/2026	22746	PENDIENTE	CVPA
HERNANDO DELGADO	GDY715	2021	28/12/2025	03/02/2026	27776	PENDIENTE	CVPA
ANTONIO ARAGON ZAMORA	GDZ049	2021	12/01/2026	31/01/2026	27775	PENDIENTE	CVPA
OMAR PEREZ	SZV807	2012	16/05/2026	16/07/2026	16759	PENDIENTE	CVPA
CESAR SANTIAGO GONZALES	GDY603	2021	28/12/2025	20/01/2026	27563	PENDIENTE	CVPA
JAVIER GUTIERREZ	SPV583	2011	12/06/2026	19/04/2026	9595	PENDIENTE	CVPA

Fuente: Área Ambiental SST – CONSORCIO PAVIAS 2025



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



14. CONCLUSIONES

- ❖ En el marco de la evaluación del Componente D del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se evidenció que el CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA da cumplimiento a los lineamientos establecidos para la implementación del sistema en las actividades ejecutadas en campo. No obstante, durante el periodo objeto de análisis no fue presentado el informe correspondiente al componente SST, el cual debe contener los soportes y anexos que evidencien la gestión administrativa desarrollada en el marco del SG-SST.
- ❖ Durante el periodo evaluado, en el desarrollo de las actividades de seguimiento al contrato de obra FDLPA-846-2024, la interventoría realizó la verificación de la implementación del SG-SST por parte del CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA, evidenciando que no se registraron accidentes de trabajo ni incidentes laborales.
- ❖ Con base en los recorridos de inspección efectuados en los diferentes frentes de obra, se evidenció que el contratista mantiene condiciones adecuadas en materia de seguridad, incluyendo la implementación de elementos de protección personal, señalización y equipos para la atención de emergencias, lo cual contribuye a la prevención de riesgos laborales.
- ❖ A partir del seguimiento realizado, se concluye que el contratista atiende de manera oportuna las observaciones y recomendaciones emitidas por la interventoría en materia de SST; sin embargo, se reitera la necesidad de fortalecer los procesos documentales y de reporte, con el fin de garantizar la trazabilidad y soporte de las actividades ejecutadas dentro del SG-SST.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



ANEXO NO. 1

CERTIFICACIÓN PAGO DE

PARAFISCALES



Consorcio paviás 2025
NIT: 901929491-1

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, 828 DE 2003, LEY 1607
DE 2012 Y DECRETO 862 DE 2013**

Bogotá D.C 11 de marzo de 2026

Señores:

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Yo, **SANTIAGO CARRILLO VARGAS**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.518.952, expedida en Bogotá, actuando en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO PAVIAS 2025** y **OMAR ALBERTO CASTILLA**, con cedula de ciudadanía N°12.718.091 expedida en Valledupar, como Contador, manifestamos bajo la gravedad del juramento:

Que el contratista, ha cumplido durante los últimos (6) seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente certificado, con los pagos al sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud- EPS, Sociedades Administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías -AFP, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL y en lo aplicable respecto de aportes parafiscales en virtud del decreto 862 de 2013 vigente desde 1 de mayo de 2013.

Igualmente declaro que el personal que se encuentra contratado por modalidad de **PRESTACION DE SERVICIOS**, realiza los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral en los términos establecidos por la ley.

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
C.C N° 79.518.952 de Bogotá

OMAR ALBERTO CASTILLA
CC N° 12.718.091 de Valledupar
contador
T.P N° 27.465-T



*Un compromiso global:
Ingeniería líder en innovación sustentable*

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores:

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Bogotá D.C.

Yo, **NAYDU LISBETH LÓPEZ OROZCO**, Identificada con la Cedula de Ciudadanía N° 52.792.687 expedida en Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la empresa de **AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS**, con **NIT 901.719.068-6**, manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que el Contratista, ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL y en lo aplicable respecto de aportes parafiscales en virtud del decreto 862 de 2013 vigente desde el 1 de mayo de 2013.

Igualmente declaro que el personal que se encuentra contratado por modalidad de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, realiza los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos establecidos por la Ley.

La presente se expide en virtud de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría FDLPA-CIN-850-2024, con el **CONSORCIO PAVIAS 2025**, Celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

NAYDU LISBETH LÓPEZ OROZCO

C.C. No.: 52.792.687 de Bogotá

Representante Legal

AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS

**CALLE 50 No. 15-45 OFICINA 307, Bogotá, D.C. Tel: 601-7485476, Email:
ahlashuglimail.com**

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, 828 DE 2003, LEY 1607 DE 2012
Y DECRETO 862 DE 2013**

PERSONA NATURAL REGIMEN COMUN

Bogotá D.C 11 de marzo de 2026

Señores:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Bogotá

Yo, **SANTIAGO CARRILLO VARGAS**, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 79.518.952 expedida en Bogotá, actuando en mi condición de CONTRATISTA (En adelante el CONTRATISTA) y **OMAR ALBERTO CASTILLA** con C.C. No. 12.718.091, expedida en la ciudad de Valledupar (Cesar) como Contador, manifestamos bajo la gravedad del juramento:

Que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato de interventoría FDLPA-CIN-850-2024 ha cumplido durante los últimos (6) seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente certificado, con los pagos al Sistema general de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Igualmente declaro que el personal que se encuentra contratado por modalidad de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, realiza los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos establecidos por la Ley.

La presente se expide en virtud de las obligaciones derivadas del Contrato de interventoría, FDLPA-CIN-850-2024, Celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.



SANTIAGO CARRILLO VARGAS
C.C N° 79.518.952 de Bogotá



OMAR ALBERTO CASTILLA
CC N° 12.718.091 de Valledupar
contador
T.P N° 27.465-T



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026



ANEXO No. 2 - FICHA DE EVALUACIÓN MENSUAL

FORMATO						FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO			PROCESO									VERSION					
FO-AC-32			GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST									4.0					
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: CONSORCIO PAVIAS 2025						SUBDIRECCIÓN GENERAL								
DÍA MES AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA								
6 MARZO 2026			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO DE OBRA N°			FDLPA-846-2024						PERIODO ENTRE HASTA								
CONTRATO INTERVENTORIA N°			FDLPA-850-2024						DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO								
									7 FEBRERO 2026 6 MARZO 2026								
CONTRATO DE OBRA NO. 846 - 2024 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.																	
Porcentaje Total Componentes			100%		Calificación total								100%				
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%				COMPONENTE							
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%					
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2.0%	Aplica	100%					13.0%							
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2.0%	Aplica	100%												
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2.0%	Aplica	100%												
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3.0%	Aplica	100%												
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4.0%	Aplica	100%												
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%					
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5.0%	Aplica	100%					35%							
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6.0%	Aplica	100%												
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5.0%	Aplica	100%												
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4.0%	Aplica	100%												
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3.0%	Aplica	100%												
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6.0%	Aplica	100%												
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6.0%	Aplica	100%												

FORMATO										
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN		
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: CONSORCIO PAVIAS 2025				SUBDIRECCIÓN GENERAL				
DÍA MES AÑO		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA.				DIRECCIÓN TÉCNICA				
6 MARZO 2026						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO DE OBRA N°		FDLPA-846-2024				PERIODO ENTRE HASTA				
						DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO				
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		FDLPA-850-2024				7 FEBRERO 2026 6 MARZO 2026				
CONTRATO DE OBRA NO. 846 - 2024 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.										
Porcentaje Total Componentes		100%		Calificación total					100%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%				COMPONENTE	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO									8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2.0%	Aplica	100%					8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2.0%	Aplica	100%						
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	2.0%	Aplica	100%						
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2.0%	Aplica	100%						
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2.0%	Aplica	100%						
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2.0%	Aplica	100%						
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual seriados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAD aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5.0%	Aplica	100%						
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2.0%	Aplica	100%						
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2.0%	Aplica	100%						
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2.0%	Aplica	100%						
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2.0%	Aplica	100%						
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4.0%	Aplica	100%						
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5.0%	Aplica	100%						




Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – COMPONENTE SST
PERIODO: 7 DE FEBRERO DEL 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026




ANEXO NO. 3 - REGISTROS FOTOGRAFICOS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO - AMBIENTAL - SST		
	PERIODO 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026		
objeto contractual	OBJETO FDLPA-850-2024: _REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		
<div><div><div><p>11/02/2026 9:41:34 a. m. 5F- 51 Transversal 48a Puente Aranda Bogotá 4°37'27"N 74°6'31"W 275° W Altitud: 2578.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES</div></div><div><div><p>21/01/2026 10:57:25 a. m. 4A- 4a Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°37'26"N 74°6'26"W 335° NW Altitud: 2580.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO A ACOPIOS DE MATERIALES</div></div></div>			
<div><div><div><p>4/02/2026 12:10:48 p. m. 4A- 5a Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°37'21"N 74°6'24"W 159° S Altitud: 2578.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>SEGUIMIENTO E INSPECCION DE MAQUINARIA</div></div><div><div><p>11/02/2026 9:40:28 a. m. # 48- 35 Diagonal 51 Bis Puente Aranda Bogotá, D.C. 4°37'27"N 74°6'30"W 159° S Altitud: 2580.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>INSPECCION DE CAMILLAS</div></div></div>			
OBSERVACIONES: RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION FRENTE DE OBRA CONTRATO FDLPA- COP-846-2024			

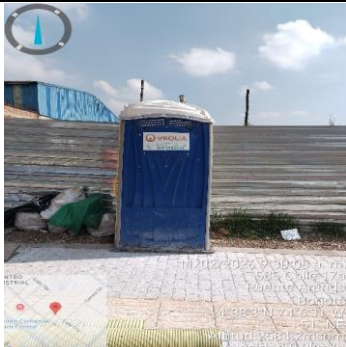
	REGISTRO FOTOGRÁFICO - AMBIENTAL - SST		
	PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO DEL 2026		
objeto contractual	OBJETO FDLPA-850-2024: _REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		
<div><div></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE CAMILLAS</div></div>	<div><div></div><div>SEGUIMIENTO E INSPECCION DE CAMPAMENTOS DE OBRA</div></div>		
<div><div></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EEMERGENCIAS</div></div>	<div><div></div><div>SEGUIMIENTO AL ESTADO DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES</div></div>		
OBSERVACIONES: RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION FRENTE DE OBRA CONTRATO FDLPA- COP-846-2024			

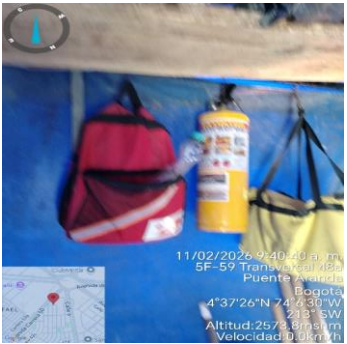

INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EEMERGENCIAS

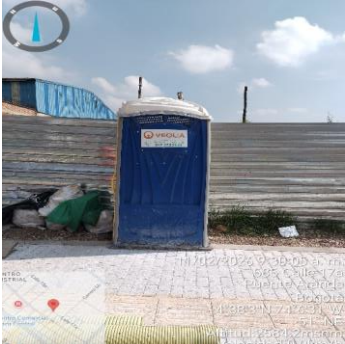

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES

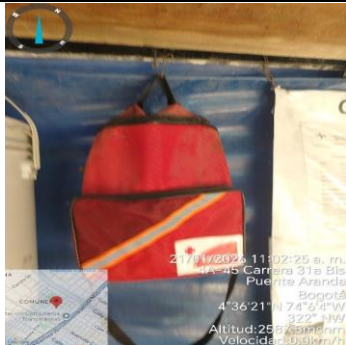	REGISTRO FOTOGRÁFICO - AMBIENTAL - SST		
	PERIODO 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2026		
objeto contractual	OBJETO FDLPA-850-2024: _REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLPA-LP-023-2024 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA		
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		
<div><div><p>11/02/2026 11:02:45 a. m. 55°55' Transversal 48a Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'30"W Altitud: 2575.7msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE CAMILLAS</div></div> <div><p>21/01/2026 11:02:20 a. m. 4A-45 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'4"W Altitud: 2589.0msnm Velocidad: 0.0km/h</p><div>SEGUIMIENTO E INSPECCION A KIT DE CONTROL DE DERRAMES</div></div>			
<div><div><p>21/01/2026 11:02:25 a. m. 4A-45 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'4"W Altitud: 2586.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p></div><div>SEGUIMIENTO E INSPECCION A BOTIQUINES</div></div> <div><p>21/01/2026 11:02:27 a. m. 4A-45 Carrera 31a Bis Puente Aranda Bogotá 4°36'21"N 74°6'4"W Altitud: 2586.9msnm Velocidad: 0.0km/h</p><div>INSPECCION Y SEGUIMIENTO A CARTELERAS INFORMATIVAS SST-AMBIENTAL</div></div>			
OBSERVACIONES: RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION FRENTE DE OBRA CONTRATO FDLPA- COP-846-2024			



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL No 11



CONTRATO DE INTERVENTORÍA 850 DE 2024

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”

CONSORCIO PAVIAS 2025

INFORME MENSUAL GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORÍA No 11
Periodo: 7 de febrero al 6 de marzo de 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN



Aprobado por		
Responsable Aprobación	Nombre	Ing. Santiago Carrillo
	Firma	
Elaborado por		
Responsable elaboración	Nombre	P.S Doris María Ortiz
	Firma	



TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	INFORMACIÓN DEL PROYECTO.....	6
3.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.	8
4.	RECURSOS HUMANOS ÁREA SOCIAL	9
5.	OBJETIVO GENERAL.	10
5.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
6.	PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL	11
6.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.....	11
6.1.1	Reunión de inicio.....	11
6.1.2	Reunión de finalización.....	11
6.1.3	Reuniones extraordinarias	11
6.2	PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO	12
6.2.1	Vallas móviles.....	12
6.2.2	Puntos satélites de información	13
6.2.3	Volantes informativos	14
6.2.4	Volantes de inicio de obra.....	14
6.2.5	Volantes de finalización de obra y/o folletos	14
6.3	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15
6.4	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	21
6.4.1	Conformación comité CREA.....	21
6.5	PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS EN OBRA	22
6.6	PROGRAMA APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.....	23
6.6.1	Contratación mano de obra no calificada y población vulnerable.....	23
6.6.2	Mano de obra no calificada de la localidad	23
6.6.3	Promoción de la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital	24
6.7	PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS AL SECTOR COMERCIAL	26
6.8	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TECNICAS	26
6.8.1	Actas de vecindad	26
6.8.2	Actas de rampas y accesos vehiculares.....	30
6.8.3	Actas de compromiso	30
6.8.4	Registro fílmico y fotográfico de andenes, fachadas y las vías que sean empleadas como desvíos	32
6.9	REPORTES	33
6.9.1	Soportes de gestión	33
6.9.2	Informe Mensual	33



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

6.9.3	Informe Final de gestión	33
6.9.4	Comités de seguimiento social	34
6.9.5	Tirilla mensual.....	34
7.	CONCLUSIONES	35

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Información del contratista.....	6
Tabla 2	Información de la interventoría.....	7
Tabla 3	CIV'S contractuales del proyecto	8
Tabla 4	CIV's priorizados.....	9
Tabla 5	Personal mínimo requerido área social	9
Tabla 6	Indicador programa de información a la comunidad	12
Tabla 7	Valla informativa instalada	13
Tabla 8	PSI instalados	13
Tabla 9	Volantes entregados durante el periodo.....	14
Tabla 10	Indicadores programa de divulgación a la comunidad.....	15
Tabla 11	información punto CREA contrato de obra	16
Tabla 12	Consolidado PQRS.....	16
Tabla 13	Indicador PQRS	20
Tabla 14	Indicador de cumplimiento puntos de atención	21
Tabla 15	Veedurías realizadas en el periodo evaluado	22
Tabla 16	Indicador programa de sostenibilidad.....	22
Tabla 17	Capacitación social realizada.....	23
Tabla 18	Indicadores programa de socialización del proyecto a los empleados de la obra	23
Tabla 19	Consolidado personal de obra	24
Tabla 20	Consolidado personal femenino interventoría.....	24
Tabla 21	Registro de población femenina para el contrato de interventoría.....	25
Tabla 22	Indicador programa de apoyo para la generación de empleo	25
Tabla 23	Indicador programa de manejo de impactos al sector comercial	26
Tabla 24	Actas de vecindad de inicio levantadas	27
Tabla 25	Actas de vecindad cerradas	28
Tabla 26	Consolidado actas de compromiso.....	30
Tabla 27	Indicador acompañamiento a actividades técnicas	32
Tabla 28	Informes semanales elaborados.....	34
Tabla 29	Indicador de reportes mensuales	35



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

INDICE DE ANEXOS

Anexo No 1 Correos aprobación área de prensa FDLPA	15
Anexo No 2 Informes semanales.....	34
Anexo No 3 Tirilla mensual.....	34



1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al contrato 850 de 2024, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023 2024 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.” se presenta el siguiente informe mensual, el cual tiene como propósito verificar y realizar el seguimiento de todas las actividades contractuales de orden social a las cuales hace referencia el apéndice de gestión Social para el periodo comprendido entre el **07 de febrero al 6 de marzo de 2026**.

Estableciendo las medidas de control y seguimiento que se realiza el área de gestión social del contratista CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA, en aras de efectuar un acompañamiento y verificación a las actividades contempladas en el Plan de gestión social, propuesto por la firma contratista; el cual se ejecutará durante el periodo establecido en los términos del contrato con la implementación de los siguientes programas:

Programas del plan de gestión social:

- + Programa de información a la comunidad
- + Programa de divulgación del proyecto
- + Programa de sostenibilidad
- + Programa de socialización del proyecto a empleados en obra
- + Programa apoyo para la generación de empleo
- + Programa de manejo de impactos en el sector comercial.
- + Programa de acompañamiento social a actividades técnicas

Generando de esta manera mejorar las condiciones sociales de la población beneficiada por el proyecto y el arreglo de las vías de la localidad de Puente Aranda.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 1 Información del contratista

NÚMERO DEL CONTRATO:	COP - 846 de 2024
OBJETO:	Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Ponte Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación”.
NOMBRE CONTRATISTA:	Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Ponte Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación”.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 6.351.563.839
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 meses
FECHA DE INICIO:	7 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICION Y PRORROGA	6 de marzo de 2026
PRÓRROGA No. 1	Tres (03) meses es decir desde el 7 de diciembre de 2025 al 6 de marzo de 2026.
ADICIÓN No. 1	\$3.175.781.919
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIÓN No. 1	\$ 9.527.345.758
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DESARROLLO LOCAL DE PUNTE ARANDA

Fuente: Anexo técnico COP 846-2024



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 2 Información de la interventoría

NÚMERO DEL CONTRATO:	6 de diciembre de 2025
OBJETO:	“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”
INFORMACIÓN SE SESION DE CONTRATO	Mediante la Resolución 026 del 18 de marzo del 2025 “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 850-2024”
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIAS 2025
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 555.291.050
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA ADICION Y PRORROGA	6 de marzo de 2026
PRÓRROGA No. 1	TRES (03) MESES ES DECIR DESDE EL 7 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 6 DE MARZO DE 2026.
ADICIÓN No. 1	\$ 225.450.312
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIÓN No. 1	\$ 780.741.362
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fuente: Anexo técnico CIN 850-2024



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto estará ubicado en la localidad de Ponte Aranda, en los tramos entregados por el fondo de desarrollo local, a continuación, se relacionan los CIV'S contractuales según el anexo técnico entregado:

Tabla 3 CIV'S contractuales del proyecto

ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ÁREA (m ²)
1	16001611	CL 5C	KR 39D	KR 40	300,6
2	16001664	KR 39D	CL 5 A	CL 5 C	670,08
3	16000696	DG 5FBIS	TV 47	TV 48	664,05
4	16000586	DG 5FBIS	TV 48A	TV 48	269,77
5	16003772	KR 39B	CL 29A S	CL 29B S	455,93
6	16000124	CL 18	KR 55	KR 56	594,25
7	16002911	KR 30A	AC 3	CL 4	405,96
8	16002866	KR 30A	CL 4	CL 4BIS	385,25
9	16001545	CL 2B	TV 53A	KR 53BBIS	365,82
10	16001079	KR 57A	CL 2B	CL 2C	406,97
11	16002164	CL 2D	KR 39	KR 39A	248,48
12	16002834	KR 51C	CL 24 S	AC 26 S	578,47
13	16003336	CL 10A S	KR 36	KR 37	283,32
14	16002708	KR 31A BI	CL 4A	CL 5	702,65
15	16000940	CL 4A	KR 54	KR 55	282,7
16	16000839	KR 55	CL 4B	CL 4CBIS	665,3
17	16001839	TV 53BIS	CL 1 S	CL 1C	319,22
18	16001833	CL 1C	TV 53	TV 53 BIS	1986,3
19	16002303	KR 38B BIS	CL 2B	CL 2C	160,91
20	16002253	KR 38B BIS	CL 2C	CL 2C BIS	52,07
21	16002241	KR 38B BIS	CL 2C BIS	CL 2D	83,22

Fuente: Anexo técnico.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL No 11



- Durante el periodo se inician las actividades del área social en los CIV's priorizados

Tabla 4 CIV's priorizados

CIV	PK_ID	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
16001124	189329	CL15	KR 35	KR 36
16001839	187820	TV 53 BIS	CL 1C	CL 1 SUR
16001833	188405	CL 1C	TV 53 BIS	TV 53
16000124	189511	CL 18	KR 55	KR 56
16000696	187769	DG 5F BIS	TV 47	TV 48
16000586	187770	DG 5F BIS	TV 48A	TV 48
16000839	188187	KR 55	CLL 4B	CLL 4C BIS
16002911	186939	KR 30 A	AC 3	CL 4
16002708	186949	KR 31 A BIS	CL 4 ^a	CL5

Fuente: elaboración propia

4. RECURSOS HUMANOS ÁREA SOCIAL

Para la ejecución de las labores tanto de Interventoría como contratista correspondiente al contrato, durante el presente periodo se mantuvo el personal solicitado de la siguiente manera:

Tabla 5 Personal mínimo requerido área social

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
Residente Social contratista	T.S Diana Marcela Sandoval	100 %
Auxiliar Social	Paula Alejandra Restrepo Rada	100%
Residente Social Interventoría	P.S Doris María Ortiz	50%

Fuente: elaboración propia.



5. OBJETIVO GENERAL.

Supervisar, asesorar y controlar en forma eficaz y oportuna las acciones del Contratista, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones del Plan de gestión social, descritas en el contrato y en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad para el contrato de la Interventoría.

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Revisar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de gestión social, conforme a los documentos contractuales.
- ✓ Promover mecanismos de comunicación que permitan brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades influenciadas por las obras proyectadas.
- ✓ Elaborar y desarrollar el Plan de Acción atendiendo a los procesos y lineamientos establecidos por la alcaldía local de puente Aranda.
- ✓ Garantizar que se implementen los requerimientos realizados por la interventoría y el FDLPA durante el desarrollo del Contrato de obra.
- ✓ Presentar al FDLPA los informes referidos en las obligaciones del apéndice social y el plan de gestión social del Contrato objeto de la Interventoría, revisados, conceptuados y aprobados.
- ✓ Aprobar todos los documentos, productos y actividades realizadas por el Contratista para el desarrollo del proyecto.
- ✓ Crear escenarios de participación comunitaria que faciliten los espacios de comunicación entre el FDLPA y la ciudadanía.
- ✓ Desarrollar acciones de participación comunitaria para promover la sostenibilidad proyecto por parte de las comunidades beneficiarias.
- ✓ Promover mecanismos de comunicación que permitan brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades influenciadas por las obras proyectadas.



6. PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL

6.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

Con este programa se busca, generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para promover el conocimiento, apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto, para ello el contratista realizara tres (3) tipos de reunión: reunión de inicio de obra, reunión de finalización de la obra y reuniones extraordinarias, las cuales serán determinadas en conjunto por la Interventoría, el Contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

6.1.1 Reunión de inicio

El área social de la interventoría revisará y aprobará las reuniones de inicio de obra, donde se verificará la socialización a la comunidad las características del proyecto por parte del área técnica, ambiental, social y SST; logística y recursos necesarios para su realización.

- Durante el presente periodo de tiempo no se realizan estas reuniones ya que fueron elaboradas en los periodos anteriores.

6.1.2 Reunión de finalización

Se garantizará que el contratista lleve a cabo las reuniones de finalización al 95% de la ejecución de la obra, de acuerdo al eje de la vía intervenida con el propósito de presentar la de los resultados obtenidos y el cumplimiento de los compromisos contractuales.

- Durante el presente periodo no se realizan estas reuniones, se programarán posterior a la finalización del contrato.

6.1.3 Reuniones extraordinarias

La residente social de la interventoría, velara para que se realicen las reuniones extraordinarias una vez se consideren necesarias y en temas puntuales, convocadas por la comunidad, contratista, interventoría o el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda se verificara la convocatoria, recursos técnicos y logísticos que generen el buen desarrollo de la reunión.

- Durante el presente periodo, no se realizan este tipo de reuniones, ya que no fueron requeridas por ninguna de las partes.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL No 11



Tabla 6 Indicador programa de información a la comunidad

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Reunión de inicio	$\frac{0 \text{ reuniones de inicio realizadas}}{0 \text{ reuniones de inicio programadas}} * 100$	N/A
Reunión extraordinaria	$\frac{0 \text{ reunión extraordinaria realizada}}{0 \text{ reunión extraordinaria programada}} * 100$	N/A
Reunión de finalización	$\frac{0 \text{ reunión de finalización realizada}}{0 \text{ reunión de finalización programada}} * 100$	N/A

Fuente: elaboración propia.

6.2 PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO

Por medio de este programa, el contratista bajo aprobación de la interventoría, realizara la entrega de diferentes piezas comunicativas, y realizara la instalación de otras, con el fin de garantizar la información continua de la comunidad, aferente al área de intervención del proyecto.

6.2.1 Vallas móviles

El contratista realizara la instalación de vallas móviles sobre las vías que se encuentren en intervención. Este elemento de divulgación debe estar ubicado en un punto estratégico de cada zona a intervenir, en la que se visualizará la información acerca del contrato.

- Durante el presente periodo se continua con la valla informativa instalada en el tramo de Veraguas 2, la cual se verifica durante recorrido de obra.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 7 Valla informativa instalada



Fuente: elaboración propia.

6.2.2 Puntos satélites de información

Estos tienen como función difundir por medio de las piezas de divulgación la información del proyecto a la comunidad, por ende, serán ubicados en lugares de gran afluencia de público, (5) días antes del inicio de las actividades constructivas.

- Durante el presente periodo se realiza la actualización/instalación/retiro de los PSI de la siguiente manera:

Tabla 8 PSI instalados

BARRIO	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Veraguas 2	Carrera 31 A bis No. 4 ^a - 04	
San Francisco Occidental	Dg 5 F Bis No. 47-41	Retiro
Colon 2	Carrera 54 No. 4 - 29	Retiro

Fuente: elaboración propia.



6.2.3 Volantes informativos

Describen aspectos específicos de la obra y que se distribuyen a la comunidad del área de influencia directa para informar sobre temas relacionados con el proyecto, para ello la interventoría velará por el cumplimiento de acuerdo a los anexos técnicos, estos volantes se distribuirán predio a predio, en el momento de ser requeridos, los cuales deben ser avalados por la interventoría y aprobados por el FDLPA.

6.2.4 Volantes de inicio de obra

Los volantes de inicio de obra son piezas que describen aspectos específicos del comienzo del proyecto; se elaboraran de acuerdo a los parámetros dados por el FDLPA, esta pieza se distribuirá a la comunidad en el inicio del contrato en el área de influencia del proyecto; predio a predio, adicional se instalaran en los puntos satélites de información.

6.2.5 Volantes de finalización de obra y/o folletos

El contratista realizara la entrega al 95% de la ejecución del contrato, incluyen información sobre la finalización de la obra, la ficha técnica, el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos específicos que el Contratista, la Interventoría y el FDLPA consideren pertinentes y relevantes a comunicar.

- Durante el presente periodo se realiza la entrega de los siguientes volantes, los cuales son avalados por la interventoría y aprobados por el área de prensa del FDLPA:

Tabla 9 Volantes entregados durante el periodo

FECHA	BARRIO	TIPO DE PIEZA	No. PIEZAS DIVULGADAS
23/02/2026	Veraguas Central	Convocatoria tercer comité de veeduría	5
10/2/2026	Colón	Notificación actas de vecindad de cierre 1 visita	5
10/2/2026	San Francisco	Notificación actas de vecindad de cierre 1 visita	30
12/2/2026	Colón	Notificación actas de vecindad de cierre 2 visita	2
12/2/2026	San Francisco	Notificación actas de vecindad de cierre 2 visita	8
12/1/2026	Veraguas Central	Informativo de obra	31
13/02/2026	Colón	Notificación actas de vecindad de cierre 3 visita	2
13/02/2026	San Francisco	Notificación actas de vecindad de cierre 3 visita	8



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

17/2/2026	San Eusebio	Vol. Informativo de obra	21
TOTAL			112

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10 Indicadores programa de divulgación a la comunidad

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Vallas móviles	1 vallas móviles instaladas	100%
	----- * 100	
	1 vallas móviles programadas	
Volantes informativos	112 volantes entregados	100%
	----- * 100	
	112 volantes programados	
Puntos satélites de información	1 PSI instalados y/o actualizados	100%
	----- * 100	
	1 PSI programados	

Fuente: elaboración propia.

Anexo No 1 Correos aprobación área de prensa FDLPA

6.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Por medio de este programa se garantizará que el Contratista cuente con el punto de atención a la comunidad - CREA, con el fin de brindar información, atender quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad inherente a la ejecución de la obra.

- Durante el presente periodo se recibieron tres (3) PQRS, la contratista continua con la atención en el punto CREA virtual, móvil y presencial, el cual tiene las siguientes características:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 11 información punto CREA contrato de obra

Dirección	Carrera 33 No. 4ª – 92 Barrio Veraguas
Línea celular	323-2061097
Correo electrónico	Socialpuentearanda846@gmail.com
Horario de Atención	Lunes a Viernes: 8:00 am - 11: 00 am



Fuente: elaboración propia.

Tabla 12 Consolidado PQRS

No	Fecha apertura	Peticionario	Petición	Estado
1	13//06/2025	José Gabriel Castiblanco Sosa	solicita el registro fílmico y fotográfico correspondiente al acta de vecindad de inicio de su predio, así como el acta de la reunión de inicio.	El día 26/07/2025 se realiza el envío de los registros fílmicos y fotográficos de la vivienda del peticionario.
2	04/07/2025	Elva Arévalo Briceño	La ciudadana se acerca al punto de atención CREA, para solicitar una alternativa para el parqueo de su vehículo, teniendo en cuenta que refiere situaciones que afectan su integridad, motivo por el cual solicita la posibilidad de permitirle dejar el vehículo cerca del cerramiento.	El día 24/07/2025 se realiza visita al predio en mención se le informa a la peticionaria las actividades a realizar para minimizar las afectaciones generadas por el proceso constructivo.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

3	11/07/2025	Guillermo Barbosa	El ciudadano se comunica, mediante el correo para presentar una queja por "Suspensión de obra CIV'S 16001829 y 16001833 Transversal 53 Bis Calle 1C y Calle 1 Sur", en la que solicita información por la aparente suspensión del contrato.	El día 22/07/2025 se envía respuesta al peticionario por medio de correo electrónico.
4	11/07/2025	Martha Blanco	solicita información con respecto a las actividades que se están adelantado en el frente de obra.	El día 28/07/2025 se realiza el envío del oficio COP-846-2024/043-2025 a la peticionaria
5	31/07/2025	Andrea Princess González Huérfano	solicita se realice la verificación de la información registrada en el acta de vecindad de inicio, ya que, refiere hay afirmaciones en el formato que no corresponden a la realidad del predio.	El día 13/09/2025 se realiza registro fotográfico del predio y se anexa al acta de vecindad de inicio
6	01/08/2025	Janerstibel González Leguizamón	envía derecho de petición a la alcaldía, para solicitar se tomen las medidas necesarias para el estacionamiento de los vehículos de los residentes del sector.	El día 4/08/2025 Se realiza envío de la respuesta mediante el oficio COP-846-2024/046-2025.
7	14/08/2025	María Eugenia Rubio	reporta que, durante el desarrollo de la obra, se presentó una afectación en la materia del antejardín frente a su predio.	El día 26/01/2026 Se realiza reparación a la materia



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

8	25/08/2025	Esther Marcela Gutiérrez Cargas	envía derecho de petición, mediante el correo electrónico en el que solicita el pago de subsidio para el pago del parqueadero para su vehículo.	09/09/2025 se da respuesta a la peticionaria por medio de oficio.
9	2/09/2025	Luz de Patiño	reporta afectaciones en el pañete de algunas áreas internas de su predio, como consecuencia del paso del vibro compactador.	12/09/2025 Se realiza envío de la respuesta mediante el oficio a la peticionaria
10	27/09/2025	Myriam Céspedes	afectaciones ocasionadas por el tránsito de la salida de una cama baja para la movilización de la retroexcavadora, el día viernes 26 de septiembre los cables fueron jalados y quedaron descolgados ocasionando daños en el servicio de internet y una teja.	El día 13/1/2026 Se realiza acercamiento al predio de la propietaria efectuando el pago
11	01/10/2025	Rusmeyer Rivera	afectación en la cajilla del medidor y obstrucción del mismo.	10/10/2025 se realiza la verificación de la instalación de la cajilla y la limpieza del medidor.
12	8/10/2025	Omar Rodríguez	afectación a los cables que se encuentran frente a su predio, dentro de los cuales se encuentra un cable de electricidad y otros de redes	Abierta
13	14/10/2025	Comunidad barrio Veraguas Central	Queja y solicitud de la no intervención de este tramo por afectación de parqueaderos	20/11/2025 se da cierre por medio de oficio
14	30/10/2025	Comunidad barrio Veraguas Central	asunto es "RADICADO 20256620436601".	18/12/2025 se da cierre por medio de oficio



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

15	1/11/2025	Luis Alberto Santamaria	reporta que con la maquinaria se halaron algunos cables que afectaron el circuito cerrado de cámaras que se tiene en la cuadra	27/01/2026 Se realizó el pago
16	7/11/2025	Angela Velandia	manifestar que no recibió información sobre la reunión de inicio de obra y, por ello, no pudo asistir al espacio convocado para socializar el alcance de la intervención. Expresa su interés en que el proyecto se ejecute.	05/01/2026 se da cierre por medio de oficio
17	12/11/2025	Luis Eduardo Orjuel	manifiestan su desacuerdo con la intervención proyectada para el levantamiento y reconstrucción del pavimento san Eusebio	4/02/2026 Se realiza el envío del oficio COP-846-2024/096-2026 al peticionario
18	23/11/2025	Esteban Cajamarca	daños causados en mi andén por la obra en curso en el barrio Gaitán cortes	10/2/2026 El peticionario realiza la adecuación del andén ya que refiere no querer dejarlo como se encuentra la obra.
19	25/11/2025	Sonia Gómez	afectaciones generadas por la obra en la carrera 38B. ruptura de la manguera de agua	Abierta
20	28/12/2025	Organización Vecinos de Veraguas	Solicitan información sobre avance de obra y tiempos de ejecución y retrasos	5/1/2026 luego de la revisión por parte de la interventoría se envía respuesta a la comunidad
21	29/12/2025	Maryori Vivas	Solicitan información sobre avance de obra y tiempos de ejecución y retrasos	17/2/2026 Se realiza envío de la respuesta mediante el oficio COP-846-2024-098-2026 vía correo electrónico



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

22	20/01/2026	Luz Dary Rubiano Chinchilla	envía derecho de petición con referencia a diferentes situaciones que se presentaron durante la ejecución de las actividades de obra y solicitan la atención de ocho peticiones.	4/02/2026 Se realiza envío del oficio COP-846-2024-095-2026 mediante el correo electrónico
23	08/02/2026	Amparo Montero	informa que, se encontraba fuera del país, motivo por el cual no pudo atender las visitas programadas para el levantamiento de las actas de vecindad de cierre, solicita registro fotográfico	10/2/2026 Se realiza envío de la carpeta con el registro filmo y fotográfico del acta de vecindad de inicio.
24	09/02/2026	Sintia Olarte	manifiesta que los propietarios de los apartamentos 405 y 306 del edificio, habían reportado filtraciones	16/2/2026 Se realiza envío del oficio COP-846-2024-103-2026 a la peticionaria
25	12/2/2026	Leonor Beltrán	Informa que presenta un trauma de carácter superficial en la rodilla izquierda, ocasionado por el impacto de una barra de hierro que se encontraba apoyada sobre la puerta de su vivienda	14/2/2026 Se realiza un acompañamiento a la señora al servicio de urgencias, en donde la atienden, se le realiza radiografías para validar si hubo afectación y donde le dan medicamentos para el dolor, donde finalmente informan que no presento ningún tipo de fractura

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13 Indicador PQRS

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
PQRS	$\frac{2 \text{ PQRS Abiertas}}{25 \text{ PQRS recibidas}} * 100$	92%

Fuente: elaboración propia.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 14 Indicador de cumplimiento puntos de atención

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Punto CREA	$\frac{1 \text{ punto CREA instalado}}{1 \text{ punto CREA solicitado}} * 100$	100%
Punto CREA Virtual	$\frac{1 \text{ correo electrónico instalado}}{1 \text{ correo electrónico solicitado}} * 100$	100%
Punto CREA móvil	$\frac{1 \text{ línea telefónica instalada}}{1 \text{ línea telefónica solicitada}} * 100$	100%

Fuente: elaboración propia.

6.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Mediante la ejecución de este programa se busca generar sentido de pertenencia en la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto, a través de la información de las actividades (técnicas, ambientales, SST y sociales) que se adelantaran en ejecución del proyecto y las recomendaciones necesarias para la sostenibilidad y cuidado de su entorno.

6.4.1 Conformación comité CREA

Estas atenciones se llevarán a cabo inicialmente con la conformación de los comités de veeduría ciudadana, el mismo día que se realice la reunión de inicio de obra por líderes de la comunidad y habitantes del área de influencia que estén interesados y tengan disponibilidad de participar y comprometerse a ser parte del mismo; adicional a ello se realizaran las reuniones de manera mensual, las cuales identificarán las problemáticas manifestadas por los asistentes, se ofrecerán alternativas y se implementarán actividades para la solución de estas.

- Durante el presente periodo no se realiza conformación de veedurías, ya que estas fueron creadas en los periodos anteriores,
- Se realizan veedurías ciudadanas de la siguiente manera:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 15 Veedurías realizadas en el periodo evaluado

Fecha	CIV	Barrio	No. asistentes	Registro fotográfico
25 de febrero de 2026	16002708	Veraguas 2	10	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 16 Indicador programa de sostenibilidad

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Conformación comité CREA	$\frac{0 \text{ comités creados en el mes}}{0 \text{ comités solicitados en el mes}} * 100$	N/A
Reuniones veeduría	$\frac{1 \text{ reuniones realizadas en el mes}}{1 \text{ reuniones programadas en el mes}} * 100$	100%

Fuente: elaboración propia.

6.5 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS EN OBRA

Con este programa se verificará que el Contratista establezca una capacitación mensual de, por lo menos, media hora, en cada uno de los frentes de obra, esta debe ser realizada a todos los empleados vinculados a la obra.

- Durante el presente periodo se realiza la capacitación social programada para el periodo de la siguiente manera:



Consorcio Pavías 2025 NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 17 Capacitación social realizada

Objeto	Registro fotográfico
Se realiza capacitación al personal de obra el día 25 de febrero de 2026, en la que se abordó el tema Árbol de propósitos, asisten 18 colaboradores.	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 18 Indicadores programa de socialización del proyecto a los empleados de la obra

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Formación a los colaboradores de la obra	$\frac{1 \text{ capacitación realizada en el mes}}{1 \text{ capacitación solicitada en el mes}} * 100$	100%

Fuente: elaboración propia.

6.6 PROGRAMA APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Con el desarrollo del programa se pretende crear oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o que enfrentan discriminación, buscando mejorar la empleabilidad de estas personas con el objetivo de integrarlas al mercado laboral y mejorar su calidad de vida.

6.6.1 Contratación mano de obra no calificada y población vulnerable

En el marco de la responsabilidad social, el Contratista contará como mínimo con el cinco (5%) del total de trabajadores vinculados de mano de obra no calificada, de población vulnerable, conforme al Decreto Distrital 380 de 2015, con el cual se generen oportunidades laborales para un porcentaje de la población que conlleve al mejoramiento de las condiciones socio- económicas y, por ende, al mejoramiento de su calidad de vida.

6.6.2 Mano de obra no calificada de la localidad

Se velará por que el Contratista cuente con un 15% del personal de mano de obra no calificado en el contrato, verificando que el domicilio del mismo se encuentre en la localidad de Ponte Aranda en la cual se enmarca el proyecto, los oficios que se entenderán como



mano de obra no calificada son: Cargue, descargue, excavación, limpieza, en general las actividades concernientes a un obrero raso.

6.6.3 Promoción de la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

Durante la ejecución de las obras, el Contratista vinculará personal femenino dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” a partir del cual el Contratista garantizará el 13,8% como porcentaje mínimo de mujeres vinculadas laboralmente a la ejecución del contrato generando los soportes correspondientes, que se entregarán a la Interventoría para su revisión y aprobación.

- Durante el presente periodo de tiempo por parte del contratista se tiene la vinculación de personal de la siguiente manera:

Tabla 19 Consolidado personal de obra

TOTAL, DE PERSONAL	PERSONAL	MONC LOCALIDAD		PERSONAL VULNERABLE		PERSONAL FEMENINO	
		Solicitado	implementado	Solicitado	implementado	Solicitado	implementado
24	MONC - 7 MONCL – 2	15%	28%	5%	(1) 14%	13.8%	(5) 20%

Fuente: elaboración propia.

- Por parte de la interventoría, se realiza la contratación de siete (7) profesionales, de los cuales tres (3) pertenecen al personal femenino para la ejecución del contrato, con lo cual realiza el cumplimiento del 42.8%, de contratación de esta población, a continuación, se relaciona el consolidado del mismo:

Tabla 20 Consolidado personal femenino interventoría

No	Nombre	Cargo
1	Yira Elizabeth Copete	Especialista en geotecnia y pavimentos
2	Edna Ruth Casadiego	Residente ambiental
3	Doris María Ortiz	Residente social

Fuente: elaboración propia.



Consorcio Pavías 2025 **NIT: 901929491-1**

INFORME MENSUAL No 11



Tabla 21 Registro de población femenina para el contrato de interventoría

Registro de Beneficiarias

Formulario de Contratación 902 2025 Bogotá, Colombia

consorcio-pavias2025@gmail.com | Dirección: Calle 100 No. 100-100

Se registrará el nombre de la beneficiaria y el correo electrónico de la beneficiaria en la Cuenta de Google de la Alcaldía Local de Ponte Aranda y se le enviará el correo de confirmación.

* Indica que la persona es obligatoria

Nombre de la empresa *

CONSORCIO PAVÍAS 2025

Nombre del representante legal *

La respuesta

NIT de la empresa (con dígito de verificación) *

La respuesta

Actividad Económica de la empresa *

Elige

Registro de Beneficiarias

Se registró la respuesta.

Enviar otra respuesta

Formulario de Contratación 902 2025

¿Cómo me comunico con ustedes? Informe

Google Formularios

Fuente: elaboración propia.

Tabla 22 Indicador programa de apoyo para la generación de empleo

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Contratación de población vulnerable	$\frac{14\% \text{ contratado de población vulnerable}}{5\% \text{ de contratación de población vulnerable requerido}} * 100$	100%
Contratación de MONCL	$\frac{28\% \text{ contratado de MONCL}}{15\% \text{ de contratación de MONCL requerido}} * 100$	100%
Contratación de personal femenino	$\frac{20\% \text{ contratado de personal femenino}}{13.8\% \text{ de contratación de personal femenino requerido contrato de obra}} * 100$	100%
Contratación de personal femenino interventoría	$\frac{42.8\% \text{ contratado de personal femenino}}{13.8\% \text{ de contratación de personal femenino requerido}} * 100$	100%

Fuente: elaboración propia.



6.7 PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS AL SECTOR COMERCIAL

El contratista bajo la supervisión de la interventoría apoyará todas las acciones necesarias para la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional antes y durante la ejecución del proyecto, se entregarán volantes informativos a la comunidad para dar a conocer a las entidades que prestan servicios en la zona de influencia directa o indirecta del proyecto.

- Durante las reuniones de inicio de obra, se informa a la comunidad comerciante, que se garantizará el acceso a sus comercios mediante la adecuación de senderos peatonales seguros que posibiliten el tránsito de residentes y transeúntes, así como de mercancías y demás sin que esto indique que podrán tener zonas de parqueo dentro del cerramiento, no se requirieron reuniones adicionales.

Tabla 23 Indicador programa de manejo de impactos al sector comercial

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Manejo sector comercial	$\frac{\text{No de reuniones realizadas con el sector comercial en el mes}}{\text{No de reuniones requeridas con el sector comercial}} * 100$	N/A

Fuente: elaboración propia.

6.8 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS

Dentro del desarrollo de este programa y dadas las actividades técnicas, se hace necesario el acercamiento a la comunidad, dichas actividades son responsabilidad del área técnica, sin embargo, dado que se requiere el contacto directo con la comunidad se realiza el acompañamiento del área de gestión social.

6.8.1 Actas de vecindad

La interventoría en su parte social previo inicio de las obras de construcción realizará seguimiento a la actualización de los inventarios físicos de los predios del área de influencia directa del proyecto, la interventoría junto con el contratista confirmará según el proceso constructivo si el acta será por fachada y/o interna.

- Durante el presente periodo se realiza levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre como se relaciona a continuación:



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 24 Actas de vecindad de inicio levantadas

UBICACIÓN	No ACTA	FECHA	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
CIV 16000533 - 16000532 TV 48A ENTRE DG 5F Y DG 5F BIS A SAN FRANCISCO	1	13/1/2026	TV 48A # 5F - 97	ACTA INTERNA
	2	13/1/2026	TV 48A # 5F - 91	ACTA INTERNA
	3	15/1/2026	TV 48A # 5F - 83	ACTA DE FACHADA POR TERCER VISITA
	4	13/1/2026	TV 48A # 5F - 75	ACTA INTERNA
	5	13/1/2026	TV 48A # 5F - 71	ACTA INTERNA
	6	15/1/2026	TV 48A # 5F - 67	ACTA DE FACHADA POR TERCER VISITA
	7	13/1/2026	TV 48A # 5F - 61	ACTA INTERNA
	8	15/1/2026	TV 48A # 5F - 59	ACTA DE FACHADA POR TERCER VISITA
	9	13/1/2026	TV 48A # 5F - 55	ACTA INTERNA
	10	15/1/2026	TV 48A # 5F - 51	ACTA DE FACHADA POR TERCER VISITA
	11	13/1/2026	TV 48A # 5F - 47	ACTA INTERNA
	12	15/1/2026	TV 48A # 5F - 41	ACTA DE FACHADA POR TERCER VISITA
	13	14/1/2026	DG 5F BIS # 48 - 35	ACTA INTERNA
	14	13/1/2026	TV 48A # 5F - 33	ACTA INTERNA
	15	15/1/2026	TV 48A # 5F - 29	ACTA INTERNA
	16	13/1/2026	TV 48A # 5F - 25	ACTA INTERNA
	17	13/1/2026	TV 48A # 5F - 19	ACTA INTERNA
	18	13/1/2026	TV 48A # 5F - 11	ACTA INTERNA
	19	15/1/2026	DG 5F # 48 - 36	ACTA INTERNA
	20	13/1/2026	TV 48A # 5F - 35	ACTA INTERNA
	21	13/1/2026	DG 5F BIS A ENTRE TV 48A Y TV 48	ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO DE VÍAS Y ANDENES
	22	15/1/2026	DG 5F ENTRE TV 48A Y TV 48	ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO DE VÍAS Y ANDENES
	23	13/1/2026	TV 48A CON DG 5F	ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO DE VÍAS Y ANDENES
	24	15/1/2026	DG 5F BIS ENTRE TV 48A Y TV 48 PARQUE	ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO DE VÍAS Y ANDENES
	25	13/1/2026	DG 5F BIS ENTRE TV 48A Y TV 48	ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO DE VÍAS Y ANDENES

Fuente: Consorcio Vías de Ponte Aranda



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 25 Actas de vecindad cerradas

UBICACIÓN	No ACTA	FECHA	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
CIV10000940 CLL 4A ENTRE CRA 54 Y CRA 55 COLON DALIAS	1	16/2/2026	CLL 4A #54-07	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	2	12/2/2026	CLL 4A #54-29	ACTA CERRADA
	2	12/2/2026	CLL 4A #54-02	ACTA CERRADA/REPORTE
	4	16/2/2026	CLL 4A #54-30	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	5	16/2/2026	CRA 54 ENTRE CLL 4A Y CLL 4B	ACTA CERRADA ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO VÍA Y ANDENES
	6	16/2/2026	CRA 54 ENTRE CLL 4 Y CLL 4A	ACTA CERRADA ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO VÍA Y ANDENES
	7	16/2/2026	CRA 55 ENTRE CLL 4A Y CLL 5	ACTA CERRADA ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO VÍA Y ANDENES
	8	16/2/2026	CRA 55 ENTRE CLL 4A Y CLL 4	ACTA CERRADA ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO VÍA Y ANDENES
CIV 16000586 DG 5F BIS ENTRE TV 48A Y TV 48- BARRIO SAN FRANCISCO OCCIDENTAL	1	13/2/2026	TV 47 # 5F -45	ACTA CERRADA/REPORTE
	2	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-24	ACTA CERRADA
	3	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-30	ACTA CERRADA
	4	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-36	ACTA CERRADA
	5	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-42	ACTA CERRADA
	6	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-48	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	7	13/2/2026	DG 5 F BIS # 47-54	ACTA CERRADA
	8	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-60	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	9	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-66	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	10	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-72	ACTA CERRADA
	11	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-78	ACTA CERRADA
	12	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-82	ACTA CERRADA



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

CIV 16000586 DG 5F BIS ENTRE TV 48A Y TV 48- BARRIO SAN FRANCISCO OCCIDENTAL	1	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-86	ACTA CERRADA
	2	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-92	ACTA CERRADA/REPORTE
	3	13/2/2026	DG 5 F BIS # 47-96	ACTA CERRADA
	4	13/2/2026	DG 5 F BIS # 47-95	ACTA CERRADA
	5	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-91	ACTA CERRADA
	6	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-85	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	7	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-81	ACTA CERRADA
	8	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-77	ACTA CERRADA
	9	13/2/2026	DG 5 F BIS # 47-71	ACTA CERRADA/REPORTE
	10	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-65	ACTA CERRADA
	11	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-59	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	12	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-53	ACTA CERRADA
	13	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-47	ACTA CERRADA
	14	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-41	ACTA CERRADA
	15	16/2/2026	DG 5 F BIS # 47-35	ACTA CERRADA POR TERCER VISITA
	16	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-31	ACTA CERRADA/REPORTE
	17	12/2/2026	DG 5 F BIS # 47-23	ACTA CERRADA
	18	12/2/2026	TV 47 # 5F -39	ACTA CERRADA
	19	16/2/2026	TV 47 ENTRE DG 5 F BIS Y DG 5F	ACTA CERRADA ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO VÍA Y ANDENES
	20	16/2/2026	TV 47 ENTRE DG 5 F BIS Y DG 5F BIS A	ACTA CERRADA ESPACIO PUBLICO/ REGISTRO VÍA Y ANDENES

Fuente: Consorcio Vías de Ponte Aranda



6.8.2 Actas de rampas y accesos vehiculares

Una vez el profesional técnico del contratista conceptúe sobre la adecuación de una rampa de acceso vehicular durante el desarrollo de las actividades, posterior a la aprobación de la interventoría, se generará un documento soporte sobre el uso y condiciones del garaje, acreditación de licencia de construcción y demás documentos exigidos por ley.

- Durante el presente periodo de tiempo no se realiza el levantamiento de estas actas.

6.8.3 Actas de compromiso

Se verificará que se cumplan los compromisos entre el contratista y la comunidad, estas actas se suscribirán entre el Contratista y el propietario del predio cuando la ejecución de la obra requiera de un permiso particular del propietario para realizar una intervención.

- Durante el presente periodo de tiempo se no realiza el levantamiento de estas actas a continuación se realiza el consolidado de las mismas:

Tabla 26 Consolidado actas de compromiso

No.	Fecha	Dirección	Barrio	Ciudadano (a)	OBJETO
1	19/07/2025	Diagonal 5F Bis No. 48 - 35	San Francisco Occidental	Marisol Acuña	uso adecuado el cerramiento y los riesgos a los que se pueden ver expuestos al irrumper en las zonas de trabajo
2	28/08/2025	Calle 18 No 55-36	Ponte Aranda	Edward Tafur	Ajuste de andén frente al inmueble, franja de ajuste realizada por el contratista de obra, adicionales por el propietario.
3	02/10/2025	Carrera 55 No 4B-34	Colon	Guillermo Sánchez	Se evidencia que la afectación de la manguera en el medidor es pre existente, se solicita el arreglo al propietario del inmueble.
4	31/10/2025	Carrera 38B Bis entre	Jorge Gaitán Cortes	María Aracely Hernández	Se informa sobre el inicio de las actividades



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

		Calle 2B y Calle 2D			de actividades de acciones de movilidad.
5	28/11/2025	Carrera 31ª bis No. 4 A 34	Veraguas	Hugo Castiblanco	Durante la visita técnica se evidenció la necesidad de construir una caja de inspección en el punto donde actualmente se encuentra ubicada una materia
6	28/11/2025	Carrera 31 a bis No. 4 A 23	Veraguas	Karen Yisbet Gómez	Durante la visita técnica se evidenció la necesidad de construir una caja de inspección en el punto donde actualmente se encuentra ubicada una materia
7	19/01/2026	16002911 / kr 30a entre cl. 4 y av. cl. 3-	Veraguas	Sintia Olarte Jaime Rueda Crisanto Morales	Se realiza acercamiento al predio ubicado en la carrera 30A N.º 3-85, donde nos recibe la administradora del edificio Ultra, con el fin de notificar el tiempo de fraguado del concreto instalado en la rampa del edificio.
8	21/01/2026	16000940 / calle 4 a entre carrera 54 y carrera 55	Colon	Nidia Lucia Bello y Johana Rodríguez	Se realizo la entrega de las tapas de las cajillas del medidor
9	5/02/2026	16002303/ Carrera 38B Bis entre Calle 2B y Calle 2D	Jorge Gaitán Cortez	William Leuro	Se realiza acercamiento al predio ubicado en la carrera 38B Bis N.º 2B- 13, con el fin de validar la aprobación de la intervención a ejecutar en el andén frente a su predio.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

10	5/02/2026	16002303/ Carrera 38B Bis entre Calle 2B y Calle 2D	Jorge Gaitán Cortez	Miguel Lombo	Se realiza acercamiento al predio ubicado en la carrera 38B Bis N.º 2B-07, con el fin de validar la aprobación de la intervención a ejecutar en el andén frente a su predio
----	-----------	---	------------------------	--------------	---

Fuente: elaboración propia.

6.8.4 Registro fílmico y fotográfico de andenes, fachadas y las vías que sean empleadas como desvíos

En acompañamiento con interventoría, el Contratista realizará el debido registro en el formato de acta de vecindad del estado actual de las vías acompañado de su respectivo registro fotográfico y fílmico, se registrará el estado actual de las vías, de tal forma que cuando finalicen las actividades de conservación, estas se dejen en el mismo o mejor estado en el que se encontraban al inicio de obra.

- El contratista no realizó el levantamiento de estas actas ya que no fueron requeridas.

Tabla 27 Indicador acompañamiento a actividades técnicas

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Actas de vecindad de inicio	24 actas de vecindad de inicio realizadas ----- * 100 24 actas de vecindad de inicio programadas	100%
Actas de vecindad de cierre	40 actas de vecindad de cierre realizadas ----- * 100 40 actas de vecindad de cierre programadas	100%
Actas de rampas y accesos vehiculares	0 actas de rampas y accesos vehiculares realizadas ----- * 100 0 actas de rampas y accesos vehiculares programadas	N/A
Actas de compromiso	0 acta de compromiso realizada ----- * 100 0 acta de compromiso programada	N/A



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

ÍTEMS	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Registro fílmico y fotográfico de andenes, fachadas y las vías que sean empleadas como desvíos	$\frac{0 \text{ registro fílmico y fotográfico de andenes, fachadas y las vías que sean empleadas como desvíos realizados}}{0 \text{ registro fílmico y fotográfico de andenes, fachadas y las vías que sean empleadas como desvíos programados}} * 100$	N/A

Fuente: elaboración propia.

6.9 REPORTE

6.9.1 Soportes de gestión

En la etapa de preliminares, el contratista deberá radicar a la interventoría, el documento donde contemple la metodología para el desarrollo del plan de gestión social y su correspondiente cronograma.

- Se realiza la radicación del plan de gestión social y plan de acción de interventoría el día 16 de mayo de 2025 con radicado No 20256610039322, al FDLPA.

6.9.2 Informe Mensual

Se exigirá al Contratista que cumpla con la entregar un (1) informe mensual a la Interventoría, en donde consigne la totalidad de las actividades desarrolladas. Adicionalmente, deberá entregar la programación de las actividades contractuales y de aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de las mismas.

- Durante el presente periodo, el contratista realiza el envío del informe mensual **No 11** el cual se revisa y aprueba por parte de la interventoría, al igual se envía el informe de gestión social de interventoría.

6.9.3 Informe Final de gestión

Se verificará que al finalizar el contrato el Contratista presente un (1) informe, donde se entregue el consolidado de la implementación del Plan de gestión social en la obra, así como el resultado de la evaluación del mismo, en donde incluya el análisis y las recomendaciones que surjan y permitan el mejoramiento continuo del acompañamiento en obra. La calidad y oportunidad del informe serán evaluadas por la Interventoría.



- Durante el presente periodo no se realiza la gestión de entrega de este informe ya que el contrato se encuentra en su etapa de ejecución.

6.9.4 Comités de seguimiento social

Los comités de seguimiento sociales se realizarán quincenalmente, en este se tratarán los temas de avance de la gestión por parte del contratista, las evidencias de posibles incumplimientos encontrados en los diferentes recorridos a campo, en la revisión documental e informes y demás documentos entregables, así como todas las actividades contractuales realizadas por el contratista. Se evaluará el desempeño social del contratista y se discutirán los eventos excepcionales que se presenten durante el desarrollo del proyecto.

- Durante el presente periodo no se realizan comités, se mantiene la comunicación durante los comités integrales de obra.
- Se realiza acompañamiento en recorridos de obra y se mantiene comunicación con el área social del contratista de obra, se inicia la entrega de los informes semanales de la siguiente manera:

Tabla 28 Informes semanales elaborados

No	PERIODO
35	02/02/2026 al 07/02/2026
36	09/02/2026 al 14/02/2026
37	16/02/2026 al 21/02/2026
38	23/02/2026 al 28/02/2026
39	2/03/2026 al 7/03/2026

Fuente: elaboración propia.

Anexo No 2 Informes semanales

6.9.5 Tirilla mensual

La interventoría realizará la elaboración de la lista de chequeo con el resumen de las actividades realizadas por el contratista y les dará calificación a la misma, de esta manera se establecerá el porcentaje de cumplimiento de esta área.

- Para el presente periodo se realiza la evaluación de las actividades, para lo cual se realiza la evaluación de treinta y dos (32) ítems con un valor de cumplimiento del 100%.

Anexo No 3 Tirilla mensual



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

Tabla 29 Indicador de reportes mensuales

ÍTEMES	FORMULA	% DE CUMPLIMIENTO
Informe Mensual	$\frac{1 \text{ informe mensual entregado en el mes}}{1 \text{ informe mensual solicitado en el mes}} * 100$	100%
Informe Final	$\frac{\text{No. informes finales entregados en el mes}}{\text{No. de informes finales solicitados en el mes}} * 100$	N/A
Comités sociales	$\frac{1 \text{ comité social realizado en el mes}}{1 \text{ comité social programado en el mes}} * 100$	100%

Fuente: elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

- El presente informe permite realizar el seguimiento continuo a las actividades de gestión social realizadas por el contratista y avaladas por la interventoría durante el periodo del 7 de febrero al 6 de marzo de 2026.
- Se recibió dos (2) PQRS, se continua con dos (2) en seguimiento para cierre, no se llevaron actas de compromiso.
- Se dio cumplimiento 20% contratado de personal femenino del contratista; 42.8% contratado de personal femenino de la interventoría, 28% de personal de MONC de la localidad, 14% de población vulnerable, cumpliendo de esta manera con los requerimientos del FDLPA.
- Se realiza la entrega de ciento veintidós (122) volantes informativos a la comunidad los cuales fueron aprobados por el área de prensa del FDLPA.
- Se tienen instalado una (1) vallas informativas y un (1) PSI a la comunidad.
- Se dio cumplimiento a lo requerido en el plan de gestión social aprobado por el FDLPA en los programas descritos en el presente informe.



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL No 11



ANEXOS

Anexo No 1

Correos aprobación área de prensa FDLPA



CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

Información Contrato para registro fotográfico

2 mensajes

CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

16 de febrero de 2026 a las 10:08 a.m.

Para: piezasalpa@gmail.com

CC: Juan.torres@gobiernobogota.gov.co

Buenos días sr. Prensa, cordial saludo, envío adjunto datos del contrato de obra pública 846-2024 y contrato de interventoría CIN 850-2024, para realizar el respectivo registro fotográfico de las vías finalizadas, según lo solicitado por el Arq. Juan Alfredo Torres (infraestructura).

Quedamos atentos para coordinar el recorrido.

Cordialmente

Gestión social

Interventoria

CONSORCIO PAVIAS 2025**documento - prensa.xlsx**

13K

CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

17 de febrero de 2026 a las 4:15 p.m.

Para: Juan.torres@gobiernobogota.gov.co

----- Mensaje reenviado -----

De: **CONSORCIO PAVIAS 2025** <consorciopavias2025@gmail.com>

Fecha: El lun, 16 feb. 2026 a la(s) 10:08 a.m.

Asunto: Información Contrato para registro fotográfico

Para: <piezasalpa@gmail.com>Cc: <Juan.torres@gobiernobogota.gov.co>

[Texto citado oculto]

**documento - prensa.xlsx**

13K



CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

Volantes de Notificación Actas de Vecindad de Cierre

4 mensajes

Consortio Vias de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>
Para: CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

9 de febrero de 2026 a las 9:51 a.m.

Buen dia

Cordial saludo, me permito enviar los volantes de notificación para el levantamiento de actas de vecindad de cierre primera, segunda y tercera visita correspondientes para los siguientes segmentos viales:

1. 16000940 - Colón 2
2. 16000696 - 16000586 San Francisco Occidental

Quedo atenta a sus comentarios

Saludos

Diana Sandoval
Residente Social
Consortio Vias de Puente Aranda

2 archivos adjuntos**Volante de actas de vecindad de cierre 1, 2 y 3 visita 940.pptx**
283K**Volante de actas de vecindad de cierre 1, 2 y 3 visita san francisco.pptx**
282K

CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>
Para: piezasalpa@gmail.com

10 de febrero de 2026 a las 8:12 a.m.

Buenos días Sr. Prensa, cordial saludo, envío adjunto piezas de divulgación para su respectiva aprobación.

cordialmente

Interventoría
CONSORCIO PAVIAS
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos**Volante de actas de vecindad de cierre 1, 2 y 3 visita 940.pptx**
283K**Volante de actas de vecindad de cierre 1, 2 y 3 visita san francisco.pptx**
282K

Solicitudes Prensa <piezasalpa@gmail.com>
Para: CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

10 de febrero de 2026 a las 3:02 p.m.

Buenas tardes cordial saludo, revisando los archivos informamos que se encuentra bien aplicado el logo institucional. continuar con el proceso.

PRENSA ALPA

[Texto citado oculto]

CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>
Para: Consorcio Vias de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>

10 de febrero de 2026 a las 3:05 p.m.

[Texto citado oculto]



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1


INFORME MENSUAL No 11



Anexo No 2

Informes semanales

		<h1>INFORME SEMANAL SOCIAL</h1>				  	
FECHA	7/02/2026	INFORME No	35	DEL	2/02/2026	AL	7/02/2026
INFORMACION GENERAL							
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA		COP- 846-2025 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"					
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA		CIN -850 -2024 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."					
Actividades sociales Realizadas en la semana							
FECHA	DESCRIPCIÓN				SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA		
3/02/2026	Se realizaron remates en el CIV 16001839 del barrio camelia..				Se realiza por parte de la interventoría aval de volantes informativos los cuales son enviados al área de prensa para aprobación, y posterior distribución, se realiza acompañamiento a reunión de finalización en el tramo de camelia, en donde se le indica a la comunidad las actividades realizadas.		
3/02/2026	se realizó recorrido de verificación y actualización de vallas informativas.						
4/02/2026	Se realizó reunión de finalización de los CIV's 16001833 - 16001839 del barrio camelia y entrega de plegables de sostenibilidad.						
5/02/2026	Se realiza acercamiento a los CIVS 16002303 - 16002253 – 16002241 del Barrio Gaitán Cortes para realizar acuerdos para las adecuaciones del espacio público en predios donde se realizará cintas de ajuste						
6/02/2026	Se mantuvo comunicación con los residentes del CIV 16001839 - 16001833 del Barrio Camelia para notificación de instalación de bolardos.						
2/2/2026 - 7/2/2026	Se mantuvo comunicación con la comunidad mediante los diferentes canales de atención y se logró dar respuesta a sus inquietudes mediante el WhatsApp.						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA							
1. Continuar seguimiento a remates en el CIV 16001839 barrio Camelia							
2. Realizar entrega de copias de actas de vecindad de inicio, CIVS 16002834 Barrio San Eusebio, 16000940 Colón 2 , 16002303 - 16002253 - 16002241 Barrio Gaitán cortes.							
3. Programar reuniones de finalización en los siguiente CIVS 16002303 - 16002253 – 16002241 Barrio Gaitán Cortes, 16002911 Veraguas Central Y 16000839 Barrio Colón.							
6. Seguimiento y cierre de PQRS.							
7. Recorrido de verificación de vallas informativas.							
9. Mantener los canales de comunicación habilitados para atención a ciudadanía.							
Registro fotográfico							
				 <p>4 feb 2026 3:06:37 p. m. # 53A-4 Calle 1a Sur Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>			
Recorrido de verificación y actualización de vallas informativas.				Se realizo reunión de finalización de los CIVS 16001833 - 16001839 del barrio camelia.			

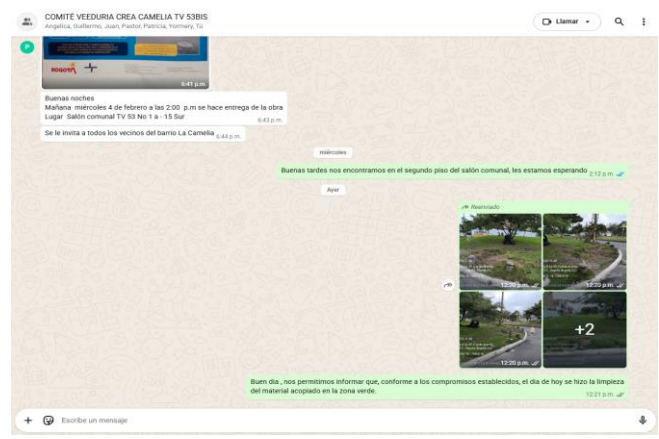

Se mantuvo comunicación con los residentes del CIV 16001839 - 16001833 del Barrio Camelia.

ELABORO

Firma:

Nombre: Diana Marcela Sandoval A.

Se realiza acercamiento a los CIVS 16002303 - 16002253 – 16002241 del Barrio Gaitán Cortes para socialización del espacio público.

APROBO

Firma:

Nombre: Doris Ortiz

		INFORME SEMANAL SOCIAL					
FECHA	14/02/2026	INFORME No	36	DEL	9/02/2026	AL	14/02/2026
INFORMACION GENERAL							
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA		COP- 846-2025 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"					
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA		CIN -850 -2024 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."					
Actividades sociales Realizadas en la semana							
FECHA	DESCRIPCIÓN				SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA		
10/02/2026	Se realizó notificación para el levantamiento de actas de vecindad de cierre primera notificación en los CIV's 16000696-16000586 y 16000940.				Por parte de la interventoría se realiza la verificación de los volantes informativo a entregar, los cuales son aprobados por prensa para su distribución, se realiza la verificación del cierre de actas de vecindad, se realiza acompañamiento a recorrido con contraloría, se revisa la adecuada instalación de los PSI y vallas informativas en los tramos en ejecución.		
11/02/2026	Se realizó recorrido interinstitucional con contraloría en el CIV 16000839 en el barrio Colón.						
12/02/2026	Levantamiento de actas de vecindad de cierre en los CIV 16000696-16000586 y 16000940, en su primera visita.						
12/02/2026	Se realiza acercamiento al CIV 16002708 para socialización de volante informativo de obra, sobre demolición de andenes.						
13/02/2026	Se realiza apertura de la PQR No. 24 por reporte de afectación a predios, se realiza la respectiva verificación y se procede con envío de la respuesta mediante el oficio COP-846-2024-102-2026						
14/02/2026	Se realizo recorrido de verificación y actualización de vallas informativas.						
9/2/2026 - 14/2/2026		Se mantuvo comunicación con la comunidad mediante los diferentes canales de atención y se logró dar respuesta a sus inquietudes mediante el WhatsApp.					
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA							
1. Capacitación a empleados en obra, tema "Árbol de propósitos"							
2. Realizar entrega de volante informativo de no intervención en el CIV 16002838 Barrio San Eusebio.							
3. Realizar entrega de copias de actas de vecindad de inicio, CIVS 16002834 Barrio San Eusebio, 16000940 Colón 2 , 16002303 - 16002253 - 16002241 Barrio Gaitán cortes.							
4. Programar reuniones de finalización en los siguiente CIVS 16002303 - 16002253 – 16002241 Barrio Gaitán Cortes, 16002911 Veraguas Central Y 16000839 Barrio Colón.							
5. seguimiento y cierre de PQRS.							
6. Recorrido de verificación de vallas informativas.							
7. Mantener los canales de comunicación habilitados para atención a ciudadanía.							
Registro fotográfico							
Cierre de actas de vecindad				Entrega de volantes de divulgación			




Recorrido contraloría	Valla informativa
ELABORO	APROBO
Firma: 	Firma: 
Nombre: Diana Marcela Sandoval A.	Nombre: Doris Ortiz

		INFORME SEMANAL SOCIAL					
FECHA	21/02/2026	INFORME No	37	DEL	16/02/2026	AL	21/02/2026
INFORMACION GENERAL							
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA		COP- 846-2025 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"					
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA		CIN -850 -2024 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."					
Actividades sociales Realizadas en la semana							
FECHA	DESCRIPCIÓN				SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA		
16/02/2026	Se realiza seguimiento a la PQR No. 25, mediante visita a la señora Leonor por afectación ocasionada en el CIV 16002708 Barrio Veraguas Central.				Por parte del área social se realiza la verificación de las atenciones ciudadanas y se aprueban oficios para cierre, se realiza verificación de volantes informativos para entrega a la comunidad, los cuales son aprobados para entrega por parte del área de prensa del FDLPA, se realiza recorrido social, en el cual se identifica la adecuada instalación de los PSI y vallas informativas.		
17/02/2026	Entrega de copias de actas de vecindad y entrega de volante de no intervención en el CIV 16002834 barrio San Eusebio						
18/02/2026	Se mantuvo comunicación con la comunidad del CIV 16002708 del barrio Veraguas Central.						
19/02/2026	Entrega de copias de actas de vecindad en los CIVS 1600940 barrio colón y 16002303 - 16002253 - 16002241 Barrio Gaitán cortes.						
20/02/2026	Se realiza entrega de volante informativo por intervención en andén del CIV 16001839 del barrio Camelia						
21/02/2026	Se realizó recorrido de verificación y actualización de vallas informativas.						
9/2/2026 - 14/2/2026	Se mantuvo comunicación con la comunidad mediante los diferentes canales de atención y se logró dar respuesta a sus inquietudes mediante el WhatsApp.						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA							
1. Capacitación a empleados en obra, tema "Árbol de propósitos"							
2. Tercer comité de veeduría ciudadana en el CIV 16002708 barrio Veraguas central							
3. Seguimiento a remates.							
4. Programar reuniones de finalización en los siguiente CIVS 16002303 - 16002253 – 16002241 Barrio Gaitán Cortes, 16002911 Veraguas Central Y 16000839 Barrio Colón.							
5. Seguimiento y cierre de PQRS.							
6. Recorrido de verificación de vallas informativas.							
7. Mantener los canales de comunicación habilitados para atención a ciudadanía.							
Registro fotográfico							
Se mantuvo comunicación con la comunidad del CIV 16002708 del barrio Veraguas Central.				Entrega de copias de actas de vecindad			



Entrega de medicamentos solicitados y seguimiento a la señora Leonor por afectación ocasionada en el CIV 16002708 Barrio Veraguas Central.	
ELABORO	APROBO
Firma: 	Firma: 
Nombre: Diana Marcela Sandoval A.	Nombre: Doris Ortiz

	INFORME SEMANAL SOCIAL						
FECHA	3/03/2026	INFORME No	38	DEL	23/02/2026	AL	28/02/2026
INFORMACION GENERAL							
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA	COP- 846-2025 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"						
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	CIN -850 -2024 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."						
Actividades sociales Realizadas en la semana							
FECHA	DESCRIPCIÓN					SEGUIMIENTO INTERVENTORIA	
24/02/2026	Se mantuvo comunicación con los residentes del CIV 16002708 del Barrio Veraguas central .					Por parte del área social de la interventoría se realiza la verificación de las atenciones ciudadanas, verificación de volantes informativos para entrega a la comunidad, los cuales son aprobados para entrega por parte del área de prensa del FDLPA, se realiza recorrido social, en el cual se identifica la adecuada instalación de los PSI y vallas informativas, se realiza acompañamiento a veeduría ciudadana y capacitación social mensual.	
24/02/2026	Se realizó el retiro de la valla informativa instalada en el frente de obra intervenido mediante acciones de movilidad en los CIV's 16000532-16000533 barrio San Francisco.						
25/02/2026	Se realiza tercer comité de veeduría ciudadana en el CIV 16002708 del barrio Veraguas Centra en el que se contó con la participación del equipo profesional del contratista y de la interventoría y 10 personas de la comunidad..						
25/02/2026	Se realizó la capacitación a 18 trabajadores en obra que se encontraba adelantando actividades en el CIV 16002708, en el barrio Veraguas en el que se dio a conocer el tema "Árbol de propósitos".						
28/02/2026	Se realiza actualización de la valla informativa del CIV 16002708 barrio Veraguas						
23/2/2026 - 28/2/2026	Se realiza acompañamiento en las actividades técnicas en el CIV 16002708 barrio Veraguas Central.						
23/2/2026 - 28/2/2026	Se mantuvo comunicación con la comunidad mediante los diferentes canales de atención y se logró dar respuesta a sus inquietudes mediante el WhatsApp y por vía telefónica.						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA							
1. Entrega de copias de actas de vecindad en los CIV's 16000532-16000533 en el barrio San Francisco.							
2. Seguimiento a remates.							
3. Programar reuniones de finalización en los siguiente CIVS 16002303 - 16002253 – 16002241 Barrio Gaitán Cortes, 16002911 Veraguas Central Y 16000839 Barrio Colón.							
4. Seguimiento y cierre de PQRS.							
5. Recorrido de verificación de vallas informativas.							
6. Mantener los canales de comunicación habilitados para atención a ciudadanía.							
Registro fotográfico							
							
Capacitación a empleados en obra, tema "árbol de propósitos".				Se realiza tercer comité de veeduría ciudadana en el CIV 16002708 del barrio Veraguas Central.			

	
<p>Se mantuvo comunicación con los residentes del CIV 16002708 del Barrio Veraguas central .</p>	<p>Se realizó actualización de valla informativa en el CIV 16002708.</p>
<p>ELABORO</p>	<p>APROBO</p>
<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>
<p>Nombre: Diana Marcela Sandoval A.</p>	<p>Nombre: Doris Ortiz</p>

	INFORME SEMANAL SOCIAL						
FECHA	9/03/2026	INFORME No	39	DEL	2/03/2026	AL	6/03/2026
INFORMACION GENERAL							
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA	COP- 846-2025 "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"						
NUMERO y OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	CIN -850 -2024 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."						
Actividades sociales Realizadas en la semana							
FECHA	DESCRIPCIÓN			SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA			
2/03/2026 - 6/03/2026	Se mantuvo comunicación con los residentes del CIV 16002708 del Barrio Veraguas central .			Por parte de la interventoría se realiza la verificación de la adecuada atención en el punto CREA, la instalación de la valla informativa y PSI, a la fecha se cumple con lo estipulado en el plan de gestión social aprobado para el contrato.			
28/02/2026	Se realiza actualización de la valla informativa del CIV 16002708 barrio Veraguas						
2/03/2026 - 6/03/2026	Se realiza acompañamiento en las actividades técnicas en el CIV 16002708 barrio Veraguas Central.						
2/03/2026 - 6/03/2026	Se mantuvo comunicación con la comunidad mediante los diferentes canales de atención y se logró dar respuesta a sus inquietudes mediante el WhatsApp y por vía telefónica.						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA							
1. Entrega de copias de actas de vecindad en los CIV´s 16000532-16000533 en el barrio San Francisco.							
2. Seguimiento a remates.							
3. Programar reuniones de finalización en los siguiente CIVS 16002303 - 16002253 – 16002241 Barrio Gaitán Cortes, 16002911 Veraguas Central Y 16000839 Barrio Colón.							
4. Seguimiento y cierre de PQRS.							
5. Recorrido de verificación de vallas informativas.							
6. Mantener los canales de comunicación habilitados para atención a ciudadanía.							
Registro fotográfico							
Se realiza acompañamiento en las actividades técnicas en el CIV 16002708 barrio Veraguas Central.				Se realiza tercer comité de veeduría ciudadana en el CIV 16002708 del barrio Veraguas Central.			
ELABORO				APROBO			
Firma:				Firma:			
Nombre: Diana Marcela Sandoval A.				Nombre: Doris Ortiz			



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL No 11



Anexo No 3

Tirilla mensual



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1

INFORME MENSUAL No 11



TIRILLA MENSUAL PERIODO 10 DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2026

ITEM	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	CALIFICACION
RECURSO HUMANO				
1	El Contratista conformó el equipo de gestión social de acuerdo con las obligaciones contractuales.	X		100%
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el plan de gestión social.	X		100%
3	El personal social cumple con las funciones establecidas en el plan de gestión social.	X		100%
4	El Contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de gestión social de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el Apéndice.	X		100%
PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD				
5	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	X		100%
6	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	X		100%
7	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	X		100%
8	El área Técnica del Contratista asistió a las reuniones de inicio, finalización y extraordinarias como se encuentra establecida en el plan de gestión social.	X		100%
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO				
9	Elaboró e implementó la estrategia de comunicaciones para el proyecto.	X		100%
10	Elaboró y distribuyó las piezas de información de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el plan.	X		100%
11	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	X		100%
12	Cumplió con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones del FDLPA, para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	X		100%
13	Elaboró y distribuyó predio a predio, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	X		100%
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
14	Instaló el punto CREA de acuerdo con los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos	X		100%



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

15	El punto CREA cuenta con la dotación establecida en el contrato	X		100%
16	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos	X		100%
17	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRS abiertas durante el período de evaluación.	X		100%
18	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la Interventoría.	X		100%
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD				
19	Conformó el número de comités CREA, de acuerdo con los requerimientos establecidos			
20	El comité CREA se reunió el número de veces establecidas cumpliendo con los requisitos relacionados.	X		100%
PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACION DE EMPLEO				
21	Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal de mano de obra no calificada que residan en la localidad	X		100%
22	Cumplió con el porcentaje de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido	X		100%
23	Cumplió con las gestiones para la vinculación de personal femenino de conformidad a lo establecido	X		100%
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TECNICAS				
24	Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad, de acuerdo con los requisitos establecidos			
25	Entregó a la Interventoría para su revisión el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad.			
26	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	X		100%
27	Elaboró las actas de vecindad de cierre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	X		100%
28	Para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos	X		100%
29	Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos			
30	El profesional del área social realizó el acompañamiento al área técnica para el levantamiento de las actas de rampa de acceso vehicular de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	X		100%



Consorcio Pavías 2025
NIT: 901929491-1



INFORME MENSUAL No 11

31	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	X		100%
32	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías de desvío de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	X		100%
33	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías de desvío a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	X		100%
REPORTES DE SEGUIMIENTO				
34	Tiene a disponibilidad del FDLPA y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de las actividades de conservación del proyecto	X		100%
35	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de gestión social, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas	X		100%
36	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de la gestión social adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos			
37	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/o el FDLPA, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	X		100%

TOTAL, DE ÍTEMS: 37

ÍTEMS EVALUADOS: 32

ÍTEMS CUMPLIDOS: 32

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%
