



21 de mayo de 2026

Al contestar Cite este N°. ICCU-S-2026-0004365

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Respuesta a Comunicación.

ASUNTO: Aprobación de informe mensual de interventoría No. 9 del Contrato No. 235 de 2025 - Proyecto de la vía claraaval a chuscales

Bogotá D, C. 21 de mayo de 2026

HECTOR DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ

CONSORCIO SGO VIAL

consorciosgovial@gmail.com

Asunto: Aprobación de informe mensual de interventoría No. 9 del Contrato No. 235 de 2025 - Proyecto de la vía claraaval a chuscales

Ref.: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL ACHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Reciba un cordial saludo,

En atención a la solicitud radicada por correo electrónico mediante el cual el CONSORCIO SGO VIAL, presenta el informe mensual de interventoría No 9, del periodo comprendido del 9 de febrero al 12 de marzo del 2026 para revisión y aprobación de esta entidad, una vez verificada la información aportada en este informe, esta supervisión envió observaciones versión 2 mediante correo electrónico el 4 de mayo del 2026 y dichas observaciones fueron subsanadas mediante correo electrónico el 15 de mayo de 2026.

Así las cosas, esta entidad manifiesta que el informe de interventoría No.9 CUMPLE y por lo tanto se da la aprobación.

Cordialmente,

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ

Subdirectora Técnica

Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM
 Revisó: SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM
 Projectó: SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM

QR Validación Documento:



SC-CER649789



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre 5.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 3624
 www.iccu.gov.co / @iccugov
 @CundiGov @Cundinamarca
 www.cundinamarca.gov.co



Contraseña:hSdAmBrMaN

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU-CTO-235 DE 2025
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU-CTO-184 DE 2025

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE
JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

INFORME MENSUAL No. 09
9 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2026
VERSIÓN 03

CONSORCIO SGO VIAL



BOGOTÁ D.C., 15 DE MAYO 2026

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

El informe mensual inicia con el siguiente Índice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Obra No.		ICCU-CTO- 184-2025	Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.	
Contrato de Interventoría No.		ICCU-CTO- 235-2025	Interventoría:	CONSORCIO SGO VIAL S.A.S.	
Objeto Contrato de Obra:					
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
INFORME MENSUAL No.		9	VERSIÓN 03	MES O PERÍODO:	09 febrero al 12 de marzo 2026
No.	CONTENIDO			FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría				2
1	Introducción				5
2	Descripción del proyecto				5
2.1	Localización			MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	5
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios				8
2.3	Estado inicial de la vía				8
2.4	Características técnicas del proyecto				10
3	Información Contrato de Obra				13
3.1	Información general contrato de obra				13
3.2	Actividades ejecutadas en el mes				14
3.2.1	Avance en ejecución de obra				14
3.3	Seguimiento ítems no previstos				16
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra				16
4.1	Informe semanal			MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra				16
4.3	Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra			MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	18

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		21
4.5	Estado General del Tiempo		22
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		23
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	23
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		24
4.8.1	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		24
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		24
4.9.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		24
4.9.2	Seguimiento Programa de Inversión		25
4.9.3	Seguimiento Programa de Obra		26
4.10	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		27
5	Información contrato de Interventoría		29
5.1	Información general del contrato de Interventoría		29
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		29
5.3	Informes especialistas y profesionales		33
5.3.1	Componente Social		33
5.3.2	Componente Ambiental.		33
5.3.3	Componente SST.		34
5.3.4	Topografía		35
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		35
5.5	Información Otros Programas y Aplicativos Según Pliegos de Condiciones de Obra e Interventoría.		35
6	Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría		36
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		36
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAAD SOCIAL	36
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		37

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	39
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		40
6.5.1	Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría		40
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		40
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		40
6.6.2	Seguimiento programa de inversión		40
6.6.3	Actas de comité	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	41
6.6.4	Actas de Reunión	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	41
7	Conclusiones y recomendaciones		42
8	Anexos		45
8.1	Correspondencia		45
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.		59
8.3	Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		61
8.4	Bitácora del mes correspondiente		61
8.5	Certificación componente ambiental y social		61
8.6	Acta de costos de Interventoría	MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	61

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 
 Nombre: ADOLFO BARRIGA PADILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
 Tarjeta Profesional: 25202-83017 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
 Copias: Interventor, Subdirección de Infraestructura Vial/ Supervisor

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual No. 9 corresponde al período comprendido entre 09 de febrero y el 12 de marzo de 2026, contiene el seguimiento a las actividades realizadas por la Interventoría ejercida mediante contrato ICCU-CTO-235 DE 2025 suscrito entre el ICCU y el CONSORCIO SGO VIAL que tiene como objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” para el seguimiento y control del contrato de obra No. ICCU-CTO-184 DE 2025 del 13 de febrero de 2025 que tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

En el presente informe se relacionan las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental realizadas por la Interventoría y los hechos más relevantes que han surgido para los contratos de obra posteriores a su fecha de suscripción e inicio, entre los que podemos citar, entrega y revisión de documentación de inicio, anticipo y ajustes y complementación de estudios y diseños.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La localización de las obras a intervenir se sitúa en el corredor Junín - Claraval – Chuscales, para la intervención se contempla un alcance aproximado de 1,8 km de longitud distribuidos en los originalmente en los siguientes tramos de intervención:

- Tramo 1: Longitud: 300 metros. Ubicación: Claraval – Chuscales.
- Tramo 2: Longitud: 600 metros. Ubicación: Junín - Claraval (placa huella existente)
- Tramo 3: Longitud: 900 metros. Ubicación: Junín - Claraval (Vereda San Antonio)

Nota: El tramo 2 se encuentra seccionado en dos subtramos comprendido antes y después de la placa huella existente.

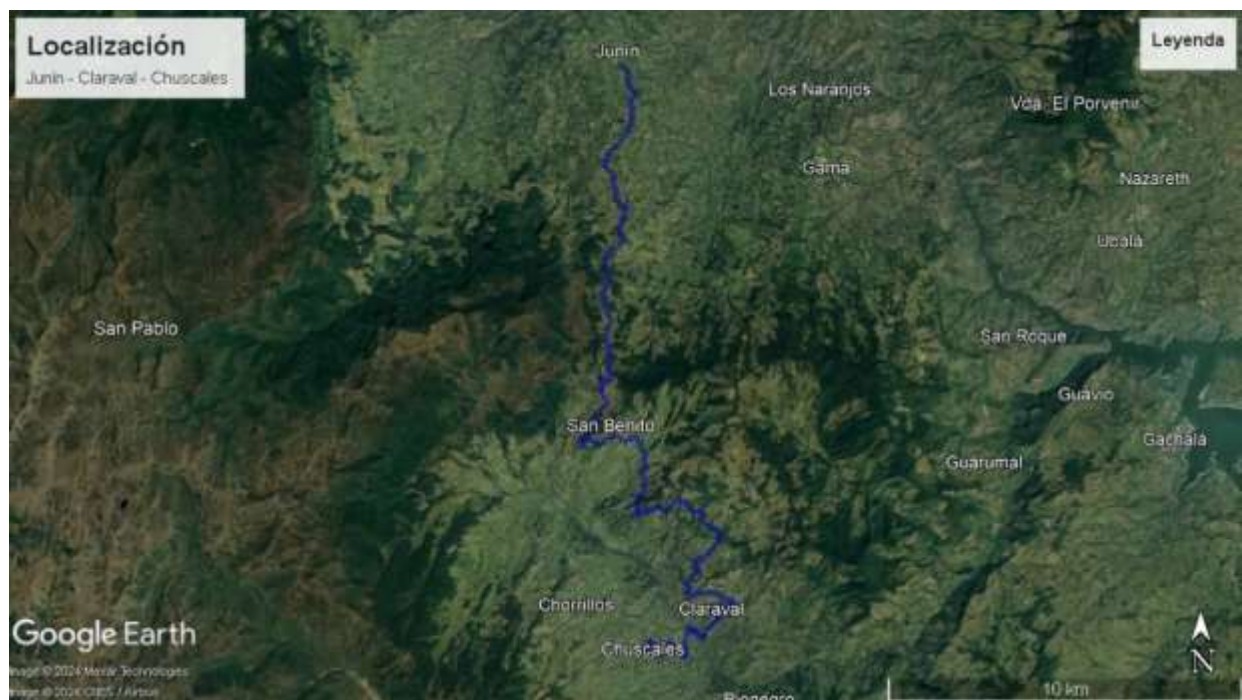


Ilustración 1: Localización del proyecto

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

La alternativa de solución contempla el mejoramiento de aproximadamente 1800 metros del

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

corredor vial. A continuación, se describen las intervenciones a realizar:

- Estructura de placa huella
- Reemplazo de estructuras de drenaje transversal por alcantarillas de 36''
- Construcción de alcantarillas nuevas de 36''
- Drenaje longitudinal y transversal compuesto por alcantarillas, filtros, cunetas, entre otros.

En el anexo 001, se encuentra el formato de localización MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION, con los tramos definitivos propuestos por el Contratista los cuales fueron aprobados por la Interventoría y a su vez remitidos a la entidad para su revisión y aprobación.

Los tramos aprobados por Interventoría son los siguientes

TRAMO 1. CHUSCALES– CLARAVAL

Abscisa inicial: K0+000, CN= 2070965,897; CE= 4928002,012

Abscisa final: k0+300 CN= 2,070,726,347; CE= 4928146,547

Longitud: 300 metros.



TRAMO 2. JUNÍN – CLARAVAL (PLACA HUELLA EXISTENTE)

Abscisa inicial: k0+000, CN=2071999,647; CE=4929465,657.

Abscisa final: k0+742.42 CN=2072152,77; CE=4929762,868.

Longitud: 600 metros

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025



TRAMO 3. JUNÍN – CLARAVAL (SECTOR SAN ANTONIO)

Abscisa inicial: K0+000, CN=2080495,61; CE=4926131,401

Abscisa final: k0+900 CN=2081302,245; CE=4926233,051

Longitud: 900 metros



2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios

El proyecto pretende mejorar la transitabilidad de los habitantes del sector comprendido entre la cabecera municipal de Junín con los centros poblados de Clavara y Chuscales, con la construcción de los tres tramos de placa huella, adicionalmente mejorando el descole de las aguas de escorrentía con la construcción de las obras transversales. Las obras de mejoramiento de las vías pretenden

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

mejorar la conectividad, facilitar el acceso a mercados, centros educativos y servicios de salud, y reducir costos y tiempos de traslado para los productores agrícolas. Estas intervenciones no solo benefician a los campesinos en su labor diaria, sino que también impulsan el crecimiento económico local y refuerzan el sentido de pertenencia de la comunidad, teniendo un mejor acercamiento con los municipios vecinos pertenecientes a la provincia del Guavio en el departamento de Cundinamarca (Guatavita, Gachetá Guasca, Gama, Gachalá, Fómeque y La Calera)

2.3 Estado inicial de la vía

El corredor vial se encuentra en la provincia del Guavio y comunica al municipio de Junín con sus inspecciones de Claraval y Chuscales. Cuenta con una longitud aproximada de 32,5 kilómetros y ancho promedio de 5,5 metros, tiene una pendiente longitudinal promedio de 7,2%. La superficie del terreno se cataloga como montañoso a escarpado. Se observan obras de drenaje tipo alcantarilla de 24” de diámetro a lo largo del corredor. La superficie de la vía en su mayoría se encuentra en afirmado en estado de deterioro alto, no cuenta con bermas, señalización ni indicaciones viales. Además, carece de estructuras de contención y de estructuras de drenaje longitudinales (cunetas).

ESTADO INICIAL VÍA	ESTADO ACTUAL VÍA
	
TRAMO 1. CHUSCALES– CLARAVAL	

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025



TRAMO 2. JUNÍN – CLARAVAL (PLACA HUELLA EXISTENTE)



TRAMO 3. JUNÍN – CLARAVAL (SECTOR SAN ANTONIO)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

2.4 Características técnicas del proyecto

El Contratista presentó un diseño de pavimentos para los tramos 2 y 3 con el comunicado GEAD-C083-2025, el cual había obtenido su aprobación por parte de la Interventoría con el comunicado SGO-082-2025 y se contemplaba realizar el retiro de la capa de rodadura superficial, y el aprovechamiento de los materiales nativos presentes en la plataforma, siempre que cumplan con las condiciones mínimas de soporte. Sobre esta plataforma de apoyo se dispondría el afirmado especificado en el diseño y, posteriormente, la estructura de placa huella en concreto reforzado. Sin embargo, en el período anterior el Contratista identificó la existencia de un material compactado en sitio, el cual no fue considerado en el diseño inicial. A fin de determinar su idoneidad como estructura de apoyo, se llevaron a cabo sondeos geotécnicos y toma de muestras representativas en los sectores identificados. y análisis de laboratorio en tres tramos representativos.

Con fundamento en los resultados técnicos obtenidos y en cumplimiento del marco normativo vigente, el Contratista, mediante comunicado GEAD-C112-2025 consideró la viabilidad de la utilización del material compactado existente en sitio como estructura de apoyo para la placa-huella diseñada y aprobada por la Interventoría, siempre que se implementen las medidas constructivas complementarias. En este documento se aclaró que las recomendaciones técnicas no implicaban modificación del diseño de pavimentos aprobado. De acuerdo con lo anterior, la Interventoría emitió una aprobación condicionada con el comunicado SGO-121-2025 del 25 de julio de 2025 de acuerdo con los requerimientos realizados por parte del especialista de pavimentos de la Interventoría, para que el Contratista de obra realice y presente ensayos adicionales para todos los tramos de intervención en cumplimiento de lo requerido normativamente.

De acuerdo con lo anterior, se establecieron las siguientes características técnicas del proyecto:

Condiciones geotécnicas del suelo

Tramo 1 – PR 31+680

- CBR: 69.81%: **Cumple**
- Finos: 8.6% **Cumple**
- LL: 29.7% **Ligeramente alto (4,7% por encima)**
- IP: 5.2% **Cumple**
- Granulometría: Muy dispersa

Tramo 2 – PR 26+100

- CBR: 63.2% **Cumple**

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

- Finos: 13.7% **Cumple**
- LL: 27.4% **Ligeramente alto (2,5% por encima)**
- IP: 5.8% **Cumple**

Tramo 3 – PR 7+580

- CBR: 66.1% **Cumple**
- Finos: 11.1% **Cumple**
- LL: 28.9% **Ligeramente alto (3,9 por encima)**
- IP: 5.6% **Cumple**

Superficie de apoyo de las losas.

Material existente en sitio como estructura de apoyo, realizando una renivelación con material de afirmado.

Material de las losas.

Concreto reforzado con una resistencia a la compresión $f'c = 21$ MPa (a los veintiocho días).

Refuerzo Longitudinal

Una varilla número 3 cada veinte centímetros (1#3@0,20).


Refuerzo transversal.

Una varilla número 3 cada veinte centímetros (1#3@0,20). La longitud de traslape de las varillas longitudinales #3 es de mínimo cincuenta y cuatro (54) centímetros.

Riostra

La riostra es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo anterior y con el acero de refuerzo de la riostra.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

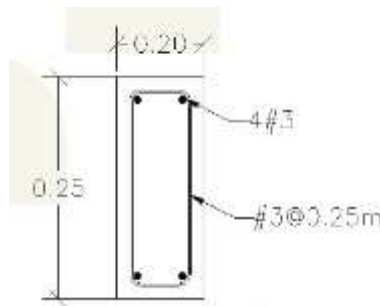

Cuneta y bordillo

Aunque la sollicitación sea eventual la cuneta debe poder soportar los esfuerzos producidos por el vehículo de diseño y, por ende, el espesor, el refuerzo requerido y las características de los materiales deben ser similares a los utilizados en la placa-huella. La cuneta tiene adosado el bordillo de confinamiento por lo que su geometría es sustancialmente diferente a la de la placa-huella.

Piedra Pegada

La piedra pegada es un material cuyo comportamiento ante la sollicitación de las cargas de los vehículos es incierto dada la dificultad de establecer un modelo que permita predecir dicho comportamiento. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el período de servicio del pavimento no puede ser inferior a veinte (20) años es apenas prudente evitar que los camiones y buses circulen por las franjas de piedra pegada.


COMPONENTES DEL DISEÑO GEOMETRICO PRELIMINAR

El diseño no debe cambiar la geometría de la vía existente. Las únicas modificaciones serían pequeños ajustes a la rasante para obtener un perfil longitudinal lo más uniforme posible y las ampliaciones de la banca hacia el interior de las curvas horizontales que requieran sobreancho.

Eventualmente sería necesario suplementar transversalmente la banca en aquellos sectores en donde la vía existente no alcance a tener el mínimo de cinco (5.0) metros de ancho.

El criterio es obtener un perfil longitudinal aceptable realizando su análisis de acuerdo a los requerimientos para este tipo de pavimento, cumpliendo con velocidades de diseño, y su composición geométrica final.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

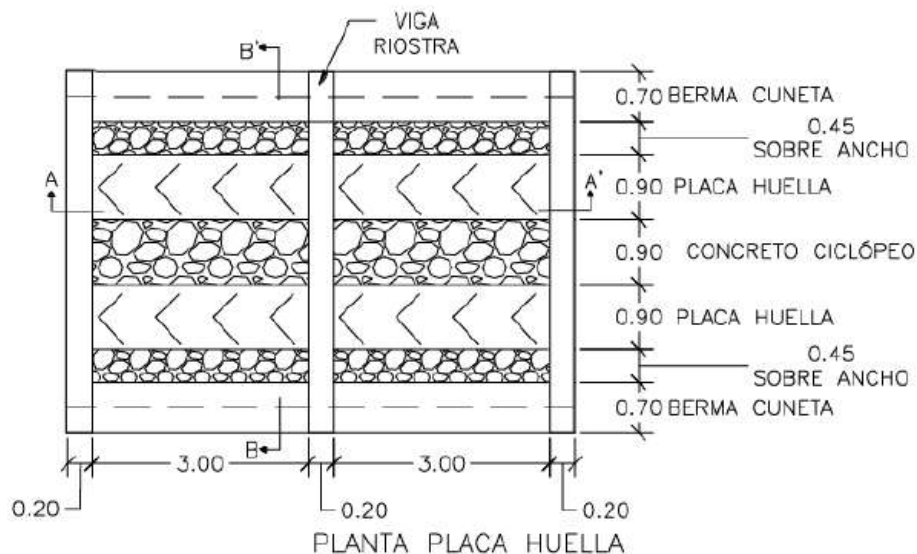

Nota: Es importante aclarar que el diseño Geométrico definitivo de los tramos aun no obtiene aprobación por parte de la Interventoría, ya que se emitió un aval a los diseños preliminares del tramo 2 en espera de los documentos debidamente suscritos por los profesionales encargados.

Para el tramo No. 1 aún no se presenta un diseño definitivo de pavimentos y geométrico.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general contrato de obra

Municipio	JUNIN (CUNDINAMARCA)
No Contrato	ICCU-CTO-184 DE 2025
Fecha de Suscripción del Contrato.	13 de febrero de 2025 Firma del Contratista 13 de febrero de 2025 Firma de la Entidad
Objeto Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Acta de Inicio	24 de abril de 2025
Plazo del Contrato	Ocho (08) meses
Fecha de suspensión No. 1	03 de octubre de 2025
Fecha de reinicio No. 1	22 de octubre de 2025
Fecha de suspensión No. 2	23 de octubre de 2025
Fecha de reinicio No. 2	04 de noviembre 2025
Fecha de suspensión No. 3	23 de enero de 2026
Fecha de reinicio No. 3	2 de febrero de 2026
Fecha de suspensión No. 4	2 de febrero de 2026
Fecha de reinicio No. 4	9 de febrero de 2026
Fecha de suspensión No. 5	13 de marzo de 2026
Fecha de reinicio No. 5	6 de abril de 2026
Fecha de suspensión No. 6	8 de abril de 2026
Fecha de reinicio No. 6	16 de abril de 2026
Prorroga No. 1	36 días
Prorroga No. 2	45 días
Fecha de terminación actual:	31 de mayo de 2026
No. Proceso	ICCU-LP-029-2024
Tramo	CHUSCALES - CLARAVAL
Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS
NIT	829.002.160-7
Representante legal:	LILIANA BAUTISTA ÁLVAREZ
Valor inicial:	\$ 2.390.638.458,00
Anticipo:	\$ 0,00

NOTA: El Contratista de obra solicito renuncia al Anticipo, de lo cual la Entidad realizó la modificación al contrato de obra.

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

3.2.1 Avance en Ejecución de Obra

Durante el presente período el Contratista de obra continúa con la ejecución de actividades asociadas a la construcción de placa huella en el tramo dos (2). En este sector se adelantan labores de instalación de formaleta, conformación de subrasante, instalación de piedra rajón para concreto ciclópeo e instalación de refuerzo en acero, para los vaciados de concreto en huellas, cunetas y vigas

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

riostras, con una resistencia especificada de 3000 PSI.

De igual manera, el Contratista interviene el tramo tres (3), donde finaliza la instalación de material para nivelación y mejoramiento de la subrasante, conforme a lo establecido en los diseños. Posteriormente, se desarrollan actividades constructivas propias del proceso de construcción de placa huella de estas características, tales como instalación de formaleta, conformación de subrasante, instalación de piedra rajón para ciclópeos e instalación de refuerzo en acero para los vaciados de concreto en huellas, cunetas y vigas riostras, con resistencia especificada de 3000 PSI.

El Contratista reporta, con corte al 12 de marzo de 2026, el siguiente avance en la ejecución de obra:

1. Tramo 2:

- 514.2 m de concreto ciclópeo.
- 514.2 m de huellas de concreto.
- 507.4 m de cunetas.
- 503.3 m de bordillo.

2. Tramo 3:

- 307.4 m de concreto ciclópeo costado derecho construido, 269.2 m de concreto ciclópeo sobre eje y 266.3 m de concreto ciclópeo en costado izquierdo.
- 307.4 m de huella en costado derecho y 266.3 m de huella costado izquierdo.
- 290.4 m de cuneta en costado derecho y 185 m de cuneta en costado izquierdo.
- 237.4 m de bordillo en costado derecho y 126.6 m de bordillo en costado izquierdo.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

Para el presente período el Contratista no presentó a la Interventoría gestión para creación de ítems No previstos, por lo tanto, continúan el contrato sin modificación alguna en este ámbito.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe semanal

Se anexan los informes semanales presentados durante el período del mes de febrero y marzo de 2026 de acuerdo con la siguiente relación.

Informe No.	Semana No.	Periodo
36	36	Del 09 al 15 de febrero de 2026
37	37	Del 16 al 22 de febrero de 2026
38	38	Del 23 de febrero al primero de marzo de 2026
39	39	Del 02 al 08 de marzo de 2026
40	40	Del 09 al 12 de marzo de 2026

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

El Contratista en comunicado GLO-ICCU-025-2026 del 16 de febrero de 2026, presenta a la Interventoría la documentación de la siguiente maquinaria:

MAQUINA AMARILLA Y VEHICULOS	MARCA	MODELO	TARJETA DE REGISTRO	DECLARACION DE IMPORTACION	GARANTIA AMPARO CIVIL	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
MINICARGADOR	CASE	2026	Si	Si	SI	N/A.
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	Si	SI	SI	PENDIENTE
VIBROCOMPACTADOR	AMMANN	2024	SI	Si	SI	PENDIENTE
EXCAVADORA	HITACHI	2024	Si	Si	SI	PENDIENTE

Ahora bien, dentro del informe el Contratista presenta la documentación de los siguientes vehículos:

MAQUINA AMARILLA Y VEHICULOS	PLACA	MODELO	TARJETA DE REGISTRO	DECLARACION DE IMPORTACION	GARANTIA AMPARO CIVIL	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
CAMION	SQC506	2011	Si	Si	SI	SI
VOLQUETA	NGQ506	2025	Si	SI	SI	PENDIENTE
VOLQUETA	NHP230	2024	SI	Si	SI	SI

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

MAQUINA AMARILLA Y VEHICULOS	PLACA	MODELO	TARJETA DE REGISTRO	DECLARACION DE IMPORTACION	GARANTIA AMPARO CIVIL	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
VOLQUETA	NHP473	2024	Si	Si	SI	SI

En el informe correspondiente al componente SST, se presenta la documentación de la maquinaria amarilla y vehículos, remitidos por el Contratista.

4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Para el período del mes de febrero de 2026, se contó con un total de 42 personas entre personal minero requerido y mano de obra, activas dentro del proyecto, como se evidencia a continuación:

No	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	SERGIO HERRERA
2	RESIDENTE DE OBRA	DANIELA JIMENEZ
3	PROFESIONAL SOCIAL	CONTRERAS SUPELANO MONICA CATERINE
4	ING AMBIENTAL	FABIO AUGUSTO CRUZ VEGA
5	PROFESIONAL ESP SST	MAGDA LUZ DAZA CASTELLANOS
6	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ALBERTO RONDON
7	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	DAVID ALBERTO SANTOS MONTERO
8	OFICIAL	BELTRAN MUÑOZ AMADO
9	OFICIAL	ROJAS CARLOS JULIO
10	OFICIAL	CASTRO ALMECIGA FABIO DARIO
11	OFICIAL	PARADA JIMENEZ JOSE VICENTE
12	OFICIAL	PACHECO HERNANDEZ LUIS EDUARDO
13	OFICIAL	RODRIGUEZ MARTINEZ WILSON
14	AYUDANTE DE OBRA	BOLAÑOS BRAVO ISIDRO MARTIN
15	AYUDANTE DE OBRA	PABLO EMILIO PACHECO
16	OFICIAL	JAIDER NORIEGA
17	AYUDANTE DE OBRA	WILMER EDUARDO RODRIGUEZ B
18	AYUDANTE DE OBRA	DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ LESMES
19	AYUDANTE DE OBRA	JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ
20	OFICIAL	GIOVANNY CARABALLO
21	AYUDANTE DE OBRA	ANDRES FELIPE ACERO
22	AYUDANTE DE OBRA	LUIS FELIPE ANAYA TORRES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

No	CARGO	NOMBRE
23	AYUDANTE DE OBRA	JORGE POSADA LOPEZ
24	CONTROLADORA VIAL	CARDENAS RODRIGUEZ BELSY YILENY
25	OFICIAL	ARCINIEGAS BERNAL CARLOS
26	OFICAL	RODRIGUEZ GALARACA CARLOS VICENTE
27	AYUDANTE DE OBRA	PEÑA CRISTIAN RENE
28	AYUDANTE DE OBRA	BELTRAN ACOSTA DEYSON ANDRES
29	TOPOGRAFO	SANABRIA DIAZ JAMITH
30	AYUDANTE DE OBRA	PEÑA BELTRAN JEFFERSON ALEXIS
31	OFICIAL	CARRILLO SUAREZ JESUS MARIA
32	AYUDANTE DE OBRA	BELTRAN ACOSTA JOHEN SAMIR
33	AYUDANTE DE OBRA	PEÑA ACOSTA MILTON FABIAN
34	OFICIAL	SILVA CAMELO MOISES SILVESTRE
35	AYUDANTE DE OBRA	VELASQUEZ MENDEZ SEBASTIAN OCTAVIO
36	AYUDANTE DE OBRA	JIMENEZ CARRION JUAN CAMILO
37	AYUDANTE DE OBRA	JIMENEZ PEÑA MIGUEL ANGEL
38	AYUDANTE DE OBRA	MIYER EZEQUIEL GUTIERREZ BELTRAN
39	AYUDANTE DE OBRA	YESID JULIAN CORTES BELTRAN
40	AYUDANTE DE OBRA	ELIAN STIVEN VELASQUEZ PRIETO
41	AYUDANTE DE OBRA	SAMIR HUMBERTO BELTRAN
42	AYUDANTE DE OBRA	JOHAN SEBASTRIAN MONROY CHOACHI

El Contratista presenta la documentación del personal ingresado durante el período, se evidencia: contrato, afiliaciones, examen de ingreso, inducción, notificación de riesgos y entrega de EPP y dotación, los cuales se encuentran consignados dentro del informe del componente SST del período en mención.

Así mismo, se evidencia que para el período del mes febrero, se tuvieron los siguientes retiros:

- Carlos Julio Rojas
- Fabio Darío Castro
- Jorge Posada López
- Juan Sebastián Gómez Hernández

El Contratista hace entrega de los paz y salvo, los cuales se encuentran consignados dentro del informe del componente SST del período en mención.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra


El valor del contrato de acuerdo con los documentos contractuales es de DOS MIL TRECIENTOS

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREITA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$2.390.638.458,00) MCTE, equivalentes a 1679,41 SMMLV para el año de suscripción del contrato (2025), para los cuales la entidad cuenta con los siguientes recursos

N° CDP	Fecha de CDP	Valor
DIS-2025000089	24 de enero de 2025	\$ 2.700.000.000,00

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		
PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO
\$ 1,181,416,132	\$ 814,251,459	\$ 367,164,673.21
49.42%	34.06%	15.36%

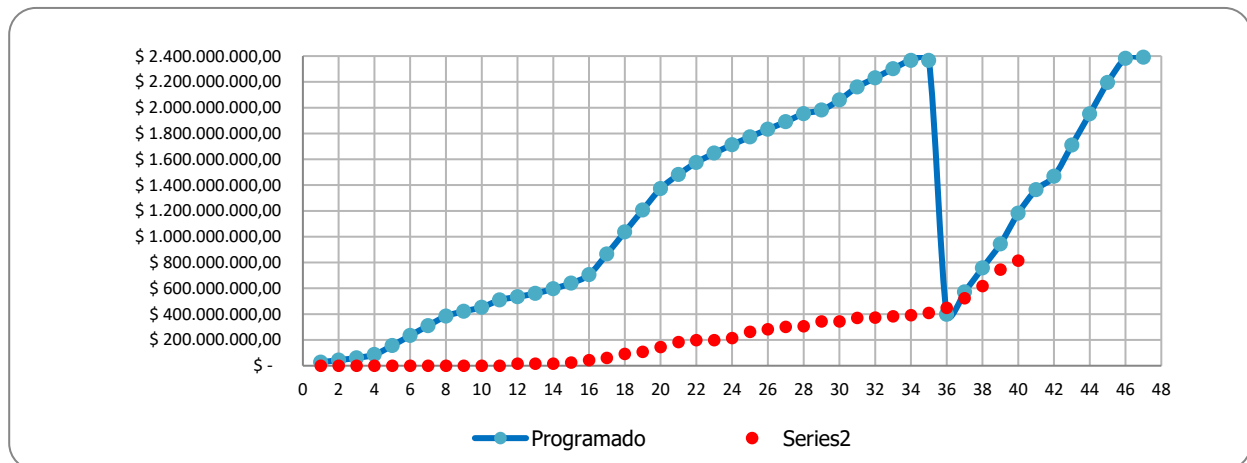

Como se puede visualizar en la anterior gráfica, la diferencia en la relación del avance programado y lo ejecutado alcanzó el 15.36% de atraso. El Contratista logra un avance financiero por el valor de OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MTE (\$814.21.459) Equivalentes al 34.06% del valor del contrato de obra.

A la fecha el Contratista ha presentado las actas de obra parciales de obra No. 1, 2 y 3 en ceros. El Acta parcial No. 4 fue aprobada para cobro, el 12 de marzo el Contratista de obra presentó actas

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

No. 5 y 6 en cero y acta parcial de cobro No. 7 la cual fue aprobada por parte de la Interventoría y la misma se encuentra en trámite ante la entidad. Ver anexo 004.

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado o Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	Cobro	Mayo	-		\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ 2.390.638.458	\$ 2.390.638.458
2	Cobro	Junio	-		\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ 2.390.638.458	\$ 2.390.638.458
3	Cobro	Julio	-		\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ 2.390.638.458	\$ 2.390.638.458
4	Cobro	Agosto	-		\$113.400.329	\$ -	\$ 113.400.329	0	\$ 2.277.238.129	\$ 2.277.238.129
5	Cobro	Septiembre			\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ 2.277.238.129	\$ 2.277.238.129
6	Cobro	Noviembre			\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ 2.277.238.129	\$ 2.277.238.129
7	Cobro	Diciembre			\$ 221.892.233	\$ -	\$ 221.892.233	0	\$ 1.941.945.567	\$ 1.941.945.567
TOTALES			\$ -	\$ -	\$335.292.562	\$ -	\$ 335.292.562	\$ -	\$ 1.941.945.567	\$ 1.941.945.567

Nota:

Se realiza un descuento por valor de \$48.358.790,98, correspondiente a la sanción pecuniaria impuesta mediante la Resolución No.1560 del 15 de diciembre de 2025, emitida por el ICCU. Dicho descuento se aplica en la presente acta de liquidación parcial en estricto cumplimiento de lo ordenado en la parte resolutoria del mencionado acto administrativo, el cual se derivó del proceso de apremio por el incumplimiento de cronograma de ejecución. Este ajuste se realiza con el fin de actualizar el saldo neto a pagar y dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales vigentes.

4.5 Estado General del Tiempo

Se presenta información primaria del estado del tiempo del municipio de Junín en donde se evidencia factores de precipitación (Horas). Estos datos fueron tomados desde el inicio hasta la fecha de entrega del presente informe. Ver anexo 005


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	17	19	24	15	20	24	12	20	20	21	24	18	24	24	24	24	0	0	0	425.5
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5	5	0	9	4	0	8	4	4	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	50.5
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA:																																
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																		
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																		
NOTA:																																		
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																		

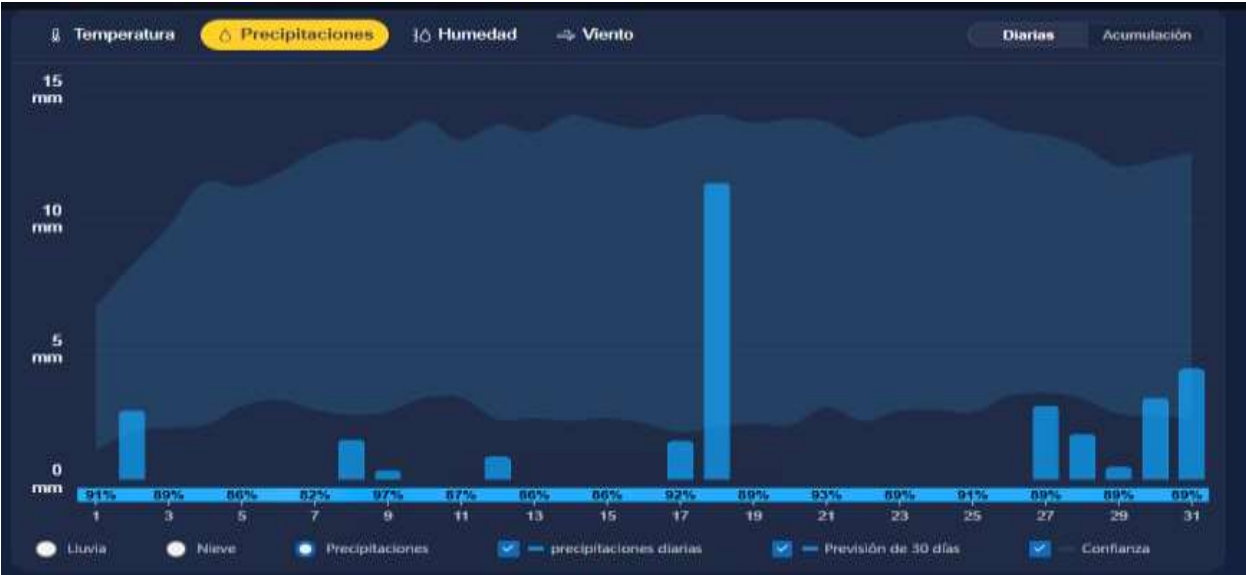

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

4.6.1 Resultados del Contratista de obra.

Durante el presente informe, el Contratista realizó toma de muestras de concreto, las cuales debe de remitir a la Interventoría con el respectivo informe técnico de febrero-marzo de 2026, a la fecha de elaboración del presente el Contratista no ha remitido información definitiva al respecto.

4.6.2 Resultados de Interventoría

La Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presenta los resultados de los ensayos realizados durante el período anterior y el presente, con el fin de verificar y garantizar que las obras ejecutadas cumplen con los requisitos de calidad establecidos para el proyecto.

En este sentido, se efectuaron ensayos al material de los agregados utilizados en la elaboración de concreto en sitio, verificando su conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), particularmente con lo dispuesto en el Artículo 630 – Concretos Hidráulicos. Los resultados obtenidos se encuentran en el Anexo 013 del plan de calidad de la Interventoría.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

Por otro lado, se realizó el control de calidad de la mezcla de concreto instalada, tomando muestras para fallar en el laboratorio.

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2025.

CILINDRO No.	TRAMO No.	SITIO DE FUNDIDA***	ABSCISA	FECHA DE TOMA	EDAD	FECHA ROTURA	f'c DISEÑO		ESFUERZO DE ROTURA	DESARROLLO (%)	CUMPLE/ NO CUMPLE
					DÍAS		(kg/cm²)	(MPa)	(MPa)		
1	2	CUNETA	K35+546 - K35+578	18/11/2025	83	9/02/2026	214	21	30,2	146,6	CUMPLE
2	2	CUNETA	K35+228 - K35+215	18/12/2025	53	9/02/2026	214	21	31,4	152,4	CUMPLE
3	2	CICLOPEO CD	K35+546 - K35+578	19/12/2025	52	9/02/2026	214	21	37,7	183	CUMPLE
4	2	CICLOPEO CENTRAL	K35+228 - K35+208	20/12/2025	51	9/02/2026	214	21	24,2	117,5	CUMPLE
5	2	CICLOPEO CENTRAL	K35+186 - K35+189	13/01/2026	27	9/02/2026	214	21	29,1	141,3	CUMPLE
6	2	CICLOPEO CENTRAL	K35+186 - K35+189	13/01/2026	27	9/02/2026	214	21	22,3	108,3	CUMPLE
7	2	CICLOPEO CENTRAL	K35+186 - K35+189	13/01/2026	27	9/02/2026	214	21	19	92,2	CUMPLE
8	2	CICLOPEO CENTRAL	K35+186 - K35+189	13/01/2026	27	9/02/2026	214	21	19,8	96,1	CUMPLE

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CILINDRO No.	TRAMO No.	SITIO DE FUNDIDA***	ABSCISA	FECHA DE TOMA	EDAD	FECHA ROTURA	f'c DISEÑO		ESFUERZO DE ROTURA	DESARROLLO (%)	CUMPLE/ NO CUMPLE
					DÍAS		(kg/cm²)	(MPa)	(MPa)		
9	2	HUELLA	K35+182 - K35+189	14/01/2026	26	9/02/2026	214	21	18,5	89,8	CUMPLE
10	2	HUELLA	K35+182 - K35+189	14/01/2026	26	9/02/2026	214	21	21,3	103,4	CUMPLE
11	2	HUELLA	K35+182 - K35+189	14/01/2026	26	9/02/2026	214	21	31,6	153,4	CUMPLE
12	2	HUELLA	K35+182 - K35+189	14/01/2026	26	9/02/2026	214	21	22,6	109,7	CUMPLE
13	3	HUELLA COSTADO IZQ	K17+396 - K17+408,8	19/02/2026	3	22/02/2026	214	21	13,2	64,1	CUMPLE
14	3	HUELLA COSTADO IZQ	K17+396 - K17+408,8	19/02/2026	7	26/02/2026	214	21	15,2	73,8	CUMPLE
15	3	HUELLA COSTADO DERECHO	K17+229,4 - K17+203,8	26/02/2026	7	9/03/2026	214	21	19,5	92,9	CUMPLE
16	3	HUELLA COSTADO DERECHO	K17+229,4 - K17+203,8	26/02/2026	14	12/03/2026	214	21	21,4	101,9	CUMPLE
17	3	HUELLA COSTADO DERECHO	K17+408,8 - K17+396,4	3/03/2026	7	10/03/2026	214	21	20,7	98,6	CUMPLE
18	3	CICLOPEO	K17+330 - K17+275,6	3/03/2026	7	10/03/2026	214	21	20	95,2	CUMPLE
19	3	HUELLA COSTADO IZQUIERDO	K17+408,8 - K17+396,4	5/03/2026	7	12/03/2026	214	21	20,5	97,6	CUMPLE
20	3	HUELLA COSTADO DERECHO	K17+351,5 - K17+330	5/03/2026	7	12/03/2026	214	21	20,3	96,7	CUMPLE
21	2	CUNETAS DERECHA	K35+521 -K35+477	11/02/2026	7	18/02/2026	214	21	19,5	92,9	CUMPLE
22	2	CUNETAS DERECHA	K35+521 -K35+477	11/02/2026	14	25/02/2026	214	21	20,7	98,6	CUMPLE
23	2	CUNETAS DERECHA	K35+521 -K35+477	11/02/2026	28	11/03/2026	214	21	25	119	CUMPLE

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CILINDRO No.	TRAMO No.	SITIO DE FUNDIDA***	ABSCISA	FECHA DE TOMA	EDAD	FECHA ROTURA	f'c DISEÑO		ESFUERZO DE ROTURA	DESARROLLO (%)	CUMPLE/ NO CUMPLE
					DÍAS		(kg/cm²)	(MPa)	(MPa)		
24	2	HUELLA IZQ	K35+107 - K35+082	2/03/2026	7	9/03/2026	214	21	18,9	90	CUMPLE
25	2	HUELLA DER	K35+094 - K35+065	5/03/2026	7	12/03/2026	214	21	18,6	88,6	CUMPLE

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a la compresión de los cilindros de concreto evaluados, se evidencia que el 100% de las muestras cumple con la resistencia especificada de diseño ($f'_c = 21 \text{ MPa} / 214 \text{ kg/cm}^2$).

Los valores registrados presentan desarrollos de resistencia acordes con la edad de ensayo, alcanzando e incluso superando el 100% de la resistencia de diseño en edades iguales o superiores a 28 días. Asimismo, los resultados a edades tempranas (3, 7 y 14 días) muestran un comportamiento adecuado, indicando una correcta ganancia de resistencia del material.

Si bien se observa cierta variabilidad en algunos grupos de muestras, esta no compromete el cumplimiento de los requisitos establecidos, manteniéndose todos los resultados dentro de los rangos aceptables.

En consecuencia, se concluye que el concreto evaluado cumple satisfactoriamente con las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando su capacidad estructural para los elementos construidos en los tramos analizados.

En el Anexo 013 se encuentran los resultados de laboratorio de las muestras ensayadas.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Contrato de Obra:	ICCU-CTO-184 DE 2025						
Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.						
Garantías No:	400-47-99400105820 Anexo 0 – Cumplimiento 400-74-994000026839 Anexo 0 – Responsabilidad Civil.						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$478.127.691,60	2025	02	13	2026	04	13
PRESTACIONES SOCIALES	\$478.127.691,60	2025	02	13	2028	10	13
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$717.191.537,40	2025	02	13	2026	04	13
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$717.191.537,40	Ampara Cinco Años a Partir del Recibo de la Obra					
RCE	\$427.050.000,00	2025	02	13	2025	10	13

Póliza de la firma del contrato

Contrato de Obra:	ICCU-CTO-184 DE 2025						
Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.						
Garantías No:	400-47-99400105820 Anexo 2 – Cumplimiento 400-74-994000026839 Anexo 2 – Responsabilidad Civil.						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$478.127.691,60	2025	04	24	2026	05	24
PRESTACIONES SOCIALES	\$478.127.691,60	2025	04	24	2028	12	24
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$717.191.537,40	2025	04	24	2026	05	24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$717.191.537,40	Ampara Cinco Años a Partir del Recibo de la Obra					
RCE	\$427.050.000,00	2025	04	24	2025	12	24

Póliza de acta de inicio.

Contrato de Obra:	ICCU-CTO-184 DE 2025						
Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.						
Garantías No:	400-47-99400105820 Anexo 3 – Cumplimiento 400-74-994000026839 Anexo 2 – Responsabilidad Civil.						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$478.127.691,60	2025	04	24	2026	05	24
PRESTACIONES SOCIALES	\$478.127.691,60	2025	04	24	2028	12	24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$717.191.537,40	Cinco a partir de la fecha de recibo de la obra					
RCE	\$427.050.000,00	2025	04	24	2025	12	24

Póliza Modificatorio No. 1, renuncia del anticipo del Contratista.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

Contrato de Obra:	ICCU-CTO-184 DE 2025						
Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.						
Garantías No:	400-47-99400105820 Anexo 4 – Cumplimiento 400-74-994000026839 Anexo 3 – Responsabilidad Civil.						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$478.127.691,60	2025	04	24	2026	06	24
PRESTACIONES SOCIALES	\$478.127.691,60	2025	04	24	2029	01	24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$717.191.537,40	Cinco a partir de la fecha de recibo de la obra					
RCE	\$427.050.000,00	2025	04	24	2026	01	24

Póliza de Suspensión No. 1 y 2

Contrato de Obra:	ICCU-CTO-184 DE 2025						
Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.						
Garantías No:	400-47-99400105820 Anexo 6 – Cumplimiento 400-74-994000026839 Anexo 5 – Responsabilidad Civil.						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$478.127.691,60	2025	04	24	2026	07	11
PRESTACIONES SOCIALES	\$478.127.691,60	2025	04	24	2029	02	11
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$717.191.537,40	Cinco a partir de la fecha de recibo de la obra					
RCE	\$427.050.000,00	2025	04	24	2026	02	11

Póliza Suspensión N.3 y N.4 y Prórroga N.1

Las pólizas y sus respectivos amparos fueron aprobadas por la entidad según MS-GC-FR-06 ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS las cuales se encuentran dentro del Anexo 006

Contrato de Obra:	ICCU-CTO-184 DE 2025						
Contratista:	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S						
Garantías No:	400-47-99400105820 Anexo 9 y 10 – Cumplimiento 400-74-994000026839 Anexo 8 – Responsabilidad Civil.						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$478.127.691,60	2025	04	24	2026	09	14
PRESTACIONES SOCIALES	\$478.127.691,60	2025	04	24	2029	04	16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$717.191.537,40	Cinco a partir de la fecha de recibo de la obra					
RCE	\$427.050.000,00	2025	04	24	2026	05	31

Póliza Suspensión No. 5, 6 y prorroga No. 2

Las pólizas y sus respectivos amparos se encuentran entregadas a la Entidad en trámite de

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

aprobación, también incluidas dentro del Anexo 006

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría, mediante comunicado SGO-099-2025, del 11 de julio de 2025, emitió el siguiente concepto sobre el plan de calidad presentado por el Contratista de obra:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la Interventoría CONSORCIO SGO VIAL, por medio del presente nos permitimos dar respuesta al comunicado del asunto, mediante el cual la firma Contratista de obra GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS da respuesta a las observaciones emitidas al Plan de Calidad del proyecto, el cual una vez revisado se, se aprueba haciendo aclaración que el control de ensayos y frecuencia de los mismos debe dar cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construcción de carreteras INVÍAS 2022.

4.8.1 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

La Interventoría, mediante comunicado SGO-078-2025 del 24 de junio de 2025, dio aprobación al Plan de Gerencia de manejo de obra, la Interventoría procederá a realizar el control y seguimiento al plan de acuerdo con lo estipulado, en el documento finalmente aprobado. Ver Anexo 021.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El Contratista, mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2025, remitió la modificación del contrato, en la cual se dio aval a la renuncia del anticipo de obra, por lo cual la forma de pago queda de la siguiente manera **CLAUSULA PRIMERA-MODIFICATORIO: Modificar la CLAUSULA 8-FORMA DE PAGO: RENUNCIA DEL ANTICIPO DE OBRA, la cual quedara de la siguiente de la siguiente manera**

El Contratista tendrá pagos mensuales mediante actas parciales de avance de obra, hasta cumplir el 95% del valor total del contrato y el 5% que corresponde al valor restante del total del contrato una vez sea recibida a satisfacción la obra.

Por lo anterior, ya quedó aprobado el modificatorio al contrato por parte de la entidad.

4.9.2 Seguimiento Programa de Inversión

Mediante comunicado SGO-135-2025 del 1 de agosto de 2025, la Interventoría emitió observaciones al Programa de Inversiones presentado manifestando lo siguiente:

Respetuosamente nos permitimos informar a la firma GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

SAS, que, con base al programa de inversiones presentado, este no cumple con lo estipulado en el anexo técnico del contrato del contrato de obra de la referencia, en el cual en su numeral 13.7 *PROGRAMA DE INVERSIONES*, establece qué:

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el Contratista se compromete a ejecutar. Para su presentación se utilizará el formato previsto en el Manual de Interventoría de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- *Consignará la inversión que ejecutará de acuerdo con el Manual de Interventoría.*
- *Concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem.*
- *Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior.*
- *Mensualmente se diligenciará el seguimiento al programa de inversiones.*

Por lo anterior, el programa de inversiones remitido no presenta una gráfica en donde se visualice, el flujo de inversión mensual de cada uno de los ítems a ejecutar, además como el anexo lo especifica, la consignación de la programación debe ser mensual, adicionalmente en el programa de inversiones se debe visualizar gráficamente la ejecución que ocurra mes a mes en obra, así como los porcentajes que representa cada ítem programado, frente a la inversión total del contrato. A la fecha de cierre de este informe el Contratista de Obra no subsana el requerimiento.


4.9.3 Seguimiento Programa de Obra

Como parte de los acuerdos y compromisos adquiridos por el Contratista de obra para la ampliación del plazo contractual, manifestados mediante el oficio GLO-ICCU-014-2026 del 7 de febrero de 2026, fueron presentados los documentos “Programa Detallado de Trabajo (PDT)” y “Flujo de Caja Conciliado”. Estos obtuvieron el visto bueno por parte de la Interventoría, al considerar que los objetivos allí planteados guardan coherencia con los tiempos y las necesidades del proyecto.

En ese sentido, todas las partes asumen que dichos instrumentos constituyen un sustento válido para el control de la ejecución de las obras, así como para el seguimiento de los tiempos, la calidad y la inversión.

Con base a la información suministrada se realiza el análisis de la programación de obra en la siguiente gráfica:

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

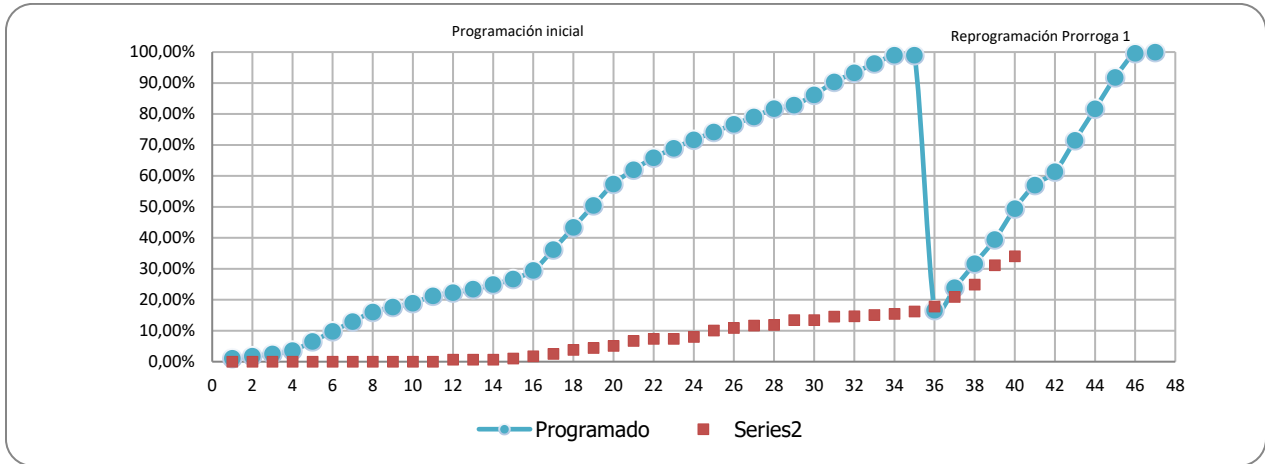

Para el período evaluado se registra un avance programado del 49,42 % y un avance ejecutado del 34,06%. Por lo tanto, aunque el Contratista ha cumplido parcialmente los compromisos establecidos, evidenciándose una mejoría en el ritmo de ejecución, aún debe implementarse de manera integral el plan de acción propuesto, dado que el atraso acumulado para este período se estima en 15,36%, como se detalla en la siguiente gráfica.

4.10 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

El contrato de obra se reanudó el día 9 de febrero de 2026, contando con un plazo contractual de dos (2) días calendario, el cual resultó insuficiente para la culminación de las actividades. Por tal motivo el Contratista presentó solicitud formal de prórroga.

En consecuencia, la supervisión, en conjunto con la Interventoría, condicionó la aprobación de dicha solicitud a la presentación de planes detallados de inversión y trabajo, así como la reestructuración de la planta técnica y administrativa, de manera que se pudiera soportar de forma clara, explícita y verificable la corrección de las deficiencias operativas y administrativas presentada en los períodos anteriores.

Una vez realizadas los ajustes y correcciones por parte del Contratista, en atención a las observaciones y requerimientos formulados por la Interventoría, se emitió concepto favorable parcial a la solicitud de prórroga. Lo anterior, considerando que el Contratista solicitó la ampliación del plazo contractual por tres (3) meses, sin embargo, la Interventoría dispone de recursos para la ejecución de las actividades únicamente por un término de treinta y seis (36) días calendario.

En el marco de la reanudación de las actividades operativas, el Contratista presentó las siguientes solicitudes:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

- GLO-ICCU-017-2026 "Evaluación técnica Manejo De Afluentes Subsuperficiales Y Estabilización De Subrasante Tramo 3"
- GLO-ICCU-034-2026 "Propuesta técnica solicitud para cambio del acabado de concreto ciclópeo por texturizado.

En respuesta, la Interventoría, mediante comunicado SGO-041-2026 emitió concepto al oficio GLO-ICCU1842025-017-2026 cuyo objeto tenía contemplado la solicitud del Manejo De Afluentes Subsuperficiales del Tramo 3 manifestando que, no es procedente la utilización del geodrén planar pues no comprensible la función final dentro de la solución propuesta. Adicionalmente indicó que “el manejo del flujo subsuperficial podría resolverse adecuadamente con un sistema de captación en la base del talud, sin que se evidencie técnicamente indispensable la incorporación del geodrén planar” teniendo en cuenta que “dentro del presupuesto contractual se contemplan materiales y actividades correspondientes a la construcción de filtro francés, solución que resulta igualmente técnica y funcionalmente adecuada para el encauzamiento de aguas subterráneas”, evitando así la necesidad de crear ítems adicionales.

Asimismo, mediante el comunicado SGO-042-2026, la Interventoría dio respuesta al oficio del Contratista GLO-ICCU1842025-034-2026, en relación con la propuesta de acabado de concreto ciclópeo, emitiendo concepto favorable al aceptar “la propuesta del Contratista respecto al acabado del concreto ciclópeo” y solicitando que, durante la ejecución de las placas huella, se garantice el correcto embebido de la piedra en el concreto, en cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables y priorizando la seguridad, la durabilidad y la calidad final de la obra.

El Contratista de obra alcanza, con corte al 12 de marzo de 2026, un avance en la meta física del 34,06%, lo cual representa un incremento en los rendimientos en comparación con períodos anteriores. No obstante, el atraso acumulado a la fecha se cuantifica en 15,6%, tal como se evidencia de manera objetiva en el capítulo 3.2.1 “Avance en ejecución de obra” del presente informe.

Por lo anterior, esta Interventoría requiere al Contratista adoptar las medidas correctivas necesarias, incluyendo la implementación integral del plan de trabajo propuesto, así como la disposición de los recursos en capital humano, técnico y operativo que permitan mitigar y corregir el atraso presentado en el cronograma de obra.

En ese sentido, se deja constancia que, de persistir los incumplimientos frente al cronograma de obra, esta Interventoría acudirá a los mecanismos establecidos en el marco contractual y normativo vigente, con el fin de que, en conjunto con la Supervisión, se evalúe su aplicación y se conmine al Contratista a ejecutar los correctivos correspondientes.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de Interventoría

Municipio	JUNIN (CUNDINAMARCA)
No Contrato	ICCU-CTO-235 DE 2025
Fecha de Suscripción del Contrato.	06 de marzo de 2025 firmado por Interventoría 07 de marzo de 2025 firmado por la Entidad
Objeto Contrato:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Acta de Inicio	24 de abril de 2025
Plazo del Contrato	Ocho (08) meses
Fecha de suspensión No. 1	03 de octubre de 2025
Fecha de reinicio No. 1	22 de octubre de 2025
Fecha de suspensión No. 2	23 de octubre de 2025
Fecha de reinicio No. 2	04 de noviembre 2025
Fecha de suspensión No. 3	23 de enero de 2026
Fecha de reinicio No. 3	2 de febrero de 2026
Fecha de suspensión No. 4	2 de febrero de 2026
Fecha de reinicio No. 4	9 de febrero de 2026
Fecha de suspensión No. 5	13 de marzo de 2026
Fecha de reinicio No. 5	6 de abril de 2026
Fecha de suspensión No. 6	8 de abril de 2026
Fecha de reinicio No. 6	16 de abril de 2026
Prorroga No. 1	36 días
Prorroga No. 2	45 días
Fecha de terminación actual:	31 de mayo de 2026
No. Proceso	ICCU-CM-043-2024
Tramo	CHUSCALES - CLARAVAL
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL
Integrantes:	INGENIERIA ARGOS SAS NIT 860.046.102-1 45% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS. NIT 900.871.862-3 45% URBACOLING 901.260.852-1 10%
NIT	901.922.324-6
Representante legal:	HECTOR DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ
Valor inicial:	\$ 666.671.435,00
Anticipo:	\$ 100.000.715,25

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

La Interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales adquiridas, continuó con el acompañamiento a la ejecución de actividades de obra, mencionadas en el capítulo **3.2.1 Actividades Ejecutadas en el Mes**, del presente informe técnico.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

Para finales del período correspondiente a enero de 2026 e inicios del mes de febrero, el contrato se encontraba en período de suspensión, hasta el 1 de febrero. No obstante, el Contratista solicitó la ampliación de dicha suspensión por un término de ocho (8) días, argumentando la persistencia de dificultades para la contratación de mano de obra no calificada local, debido a la celebración de festividades en la región y a la recolección de cosechas de productos agrícolas. En consecuencia, las actividades se reanudaron el día 9 de febrero de 2026.

El Contratista de obra, en cumplimiento de los compromisos adquiridos para la aprobación de prórroga al contrato solicitada en comité de obra realizado el 22 de enero del presente año, presentó los documentos “Programa de Trabajo detallado (PDT) y “Flujo de caja conciliados” en comunicado **GLO-ICCU-042-2026** el día 24 de febrero de 2026.

Dando respuesta a lo anterior, la Interventoría emitió concepto favorable mediante comunicado **SGO-049-2026** manifestando que se *“imparte visto bueno a los documentos presentados, al evidenciar tanto la atención de observaciones efectuadas, como su contenido técnico y financiero, el cual guarda coherencia con las metas físicas establecidas en el contrato”*.

Por otra parte, y en continuación con la estrategia implementada por la Supervisión del ICCU para la atención revisión y aprobación de informes mensuales, la Interventoría emite los siguientes

- SGO-032-2026 “Solicitud entrega de Informes mensual SST diciembre y enero de 2026”
- SGO-043-2026 “Observaciones Informes ambientales No. 3-V4; No. 4-V4; No. 5-V3; No. 6-V1; No. 7-V1 y No. 8-V1. Sus comunicaciones GLO-ICCU1842025-008-2026 y GLO-ICCU1842025-023-2026”.
- SGO-045-2026 “Observaciones Informe Social Contratista, No. 6 V1. Su comunicado GLO-ICCU1842025-028-2026”.
- SGO-046-2026 “SGO-046-2026. Observaciones Informe Social Contratista, No. 7 V1. Su com. GLO-ICCU1842025-029-2026”.
- SGO-051-2026 "Observaciones Informe Social Contratista, No. 8 V1. Su comunicado GLO-ICCU1842025-036-2026 (anterior GLO-ICCU1842025-031-2026)".
- SGO-052-2026 “Observaciones Informe SST Contratista, No. 6 V1. Su comunicado GLO-ICCU-033-2026”.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

- SGO-059-2026 “Respuesta al correo electrónico del 18 de febrero de 2026 y comunicados GLO-ICCU-035-2026, GLO-ICCU1842025-040-2026 – Observaciones a los Informes técnicos de Obra No. 5, 6 y 7.”
- SGO-061-2026 “Aprobación Informe SST Contratista, No. 6 V2. Su comunicado GLO-ICCU-047-2026”.
- SGO-063-2026 “Observaciones al Informe Social No. 6 V 2. Su comunicado GLO-ICCU1842025-048-2026”.
- SGO-064-2026 “Observaciones Informe Social No. 7 V 2. Su comunicado GLO-ICCU1842025-057-2026”.
- SGO-065-2026 “Aprobación Informe SST Contratista, No. 7 V1. Su com. GLO-ICCU-045-2026”.

Así mismo, la Interventoría, en ejercicio de las competencias contractuales, continuó realizando el control de calidad y el seguimiento al avance de obra detallados en capítulos anteriores, así como el acompañamiento en los comités de seguimiento del período evaluado.

Finalmente, el 12 de marzo/2026 el Contratista de obra presentó solicitud de suspensión del contrato, argumentando el incremento en los niveles de los ríos de los cuales se extrae el material granular para la elaboración del concreto ciclópeo. Frente a lo anterior esta Interventoría emite concepto favorable hacia la Supervisión quien finalmente decretó la suspensión del contrato por un período de 24 días calendario comprendidos entre el 13 de marzo de 2026 y el 5 de abril de 2026.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Los informes ejecutivos de los especialistas se relacionan mediante el Anexo 007 del presente informe.

A continuación, se describe un breve resumen de los conceptos emitidos por cada especialidad.

5.3.1 Componente Social

Guía de Manejo Ambiental – PAGA 2022: Se realizó seguimiento a las observaciones pendientes de subsanación del Documento PAGA V7R4.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

Mano de Obra con Enfoque de Género, Derechos y Diferencial: Se verificó un total de cincuenta y tres 53 personas reportadas durante el período, de las cuales veintidós 22 corresponden a mano de obra no calificada; de esta, trece 13 pertenecen a la vereda, equivalentes al 59,1%, y se identificó una 1 mujer dentro de esta categoría.

Infraestructura y Servicios Públicos: Se mantuvo seguimiento a las actas de vecindad de inicio y se requirió al Contratista la radicación del consolidado con sus soportes para revisión y validación.

Programa de Atención a la Comunidad: El Contratista reportó dieciocho 18 PQRS, de las cuales diez 10 fueron atendidas y cerradas; adicionalmente, la Interventoría efectuó seguimiento a su trazabilidad y a la atención del Punto SAU.

Programa de Información y Divulgación: Se realizaron espacios de socialización con la comunidad, así como seguimiento a las piezas de divulgación y a las actas derivadas de dichas actividades.

Cultura Vial y Participación Comunitaria: Se reiteró al Contratista la entrega de la metodología del Taller de Cultura Vial y la programación e implementación de comité COPACO.

5.3.2 Componente Ambiental.

La firma GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS Contratista de obra, cumplió con la elaboración del documento PAGAV7R3 y fue aprobado por la Interventoría del CONSORCIO VIAL SGO, acorde a la normativa ambiental vigente, lineamientos de la Guía de manejo ambiental del subsector vial modo carretero – GMAMC- 2022, desde el mes de julio de 2025, pero está pendiente de realizar la complementación del documento, acorde a las recomendaciones realizadas por las profesionales de apoyo de los componentes ambiental y social del ICCU, en el mes de agosto de 2025 y, requerimientos de la Interventoría, de actualización de permisos y otros, próximos a terminar el plazo de vencimiento de ejecución contractual.

En el período reportado, el Contratista continuó actividades constructivas en la obra en el tramo 2, pero, no se contó con el equipo de profesionales socioambiental y, en consecuencia, la implementación de las medidas ambientales en el marco del PAGA fue mínimas en la obra, lo cual se refleja en la evaluación de seguimiento de los indicadores realizado, menor al 40%, clasificado como cumplimiento crítico, con fallas recurrentes que requieren seguimiento prioritario.

Igualmente, pese a los requerimientos de la Interventoría, el incumplimiento en la presentación de los informes ambientales No.3,4 y 5 subsanados de parte del Contratista persiste, al igual que la entrega de los informes ambientales No. 6 y 7, debidamente soportados donde se evidencie la

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

gestión ambiental, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, afectando igualmente, los informes de la Interventoría, que dependen del complemento de la información con los soportes de los proveedores y prestadores de servicios.

Durante el mes de diciembre, la Interventoría recomendó a la entidad contratante el, ICCU, el inicio de un proceso de caducidad contractual, por presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en los términos establecidos en el contrato de obra y la normatividad vigente.

5.3.3 Componente SST

Durante el período del presente informe, el Contratista continuo con el desarrollo de actividades de obra en el marco del contrato ICCU-CTO-184 de 2025, para lo cual el Contratista reportó un total de 13 trabajadores vinculados al proyecto. No obstante, en el proceso de seguimiento y control realizado por la Interventoría se identificaron diversas inconsistencias dado los retrasos del Contratista para presentar la información completa en el informe del respectivo período.

Por otra parte, el Contratista realizó entrega del informe de enero de 2026 en su versión 2, incluyendo la planilla de pago de seguridad social correspondiente al período reportado, lo cual permitió avanzar en la regularización de algunos trabajadores. Asimismo, se evidenció la implementación de actividades propias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como capacitaciones, reuniones de COPASST y CCL, inspecciones a equipos y herramientas, así como la disponibilidad de elementos básicos del plan de emergencias en las instalaciones provisionales.

Finalmente, durante el período evaluado no se registraron accidentes laborales, enfermedades laborales ni ausentismo por causas médicas, lo cual se refleja en indicadores de accidentalidad en cero. No obstante, la Interventoría continuará realizando el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de garantizar condiciones seguras para el desarrollo de las actividades del proyecto.

5.3.4 Topografía

El control topográfico realizado en el tramo 2 permitió verificar el cumplimiento de las cotas y niveles establecidos en el diseño geométrico, evidenciando que la colocación del material de afirmado se ejecuta conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando así la calidad y estabilidad de la estructura vial.

El levantamiento topográfico del tramo 3 proporcionó información precisa y confiable sobre las condiciones finales de la vía, permitiendo determinar con exactitud los niveles del afirmado

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

instalado y sirviendo como base para el cálculo y validación de los volúmenes ejecutados durante el período.

El procesamiento y análisis de la información levantada permitió obtener resultados consistentes en el cálculo de volúmenes de afirmado, los cuales constituyen un insumo fundamental para el control de cantidades de obra y la correcta gestión técnica y administrativa del proyecto.

La revisión de los diseños geométricos y su comparación con la información topográfica base permitió verificar su coherencia y consistencia técnica, reduciendo la probabilidad de errores en la ejecución y asegurando que las actividades constructivas se desarrollen conforme a los lineamientos establecidos en el diseño.

5.4 Información Otros Programas y Aplicativos Según Pliegos de Condiciones de Obra e Interventoría.

De acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones, en los literales 4.2.1 *IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS* y 4.2.2 *PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD*, la Interventoría ha realizado el seguimiento de acuerdo con la información entregada por el Contratista tal como se describe a continuación:

Plan de Gerencia: Mediante comunicado SGO-061-2025 del 16 de junio de 2025, la Interventoría dio aprobación al Plan de Gerencia del contrato, sin embargo el Contratista no ha implementado en su totalidad ya que dentro del documento para la fase dos estipula la realización del diseño geométrico, el cual a la fecha del presente informe no se encuentra aprobado ya que el Contratista no ha terminado de subsanar las observaciones emitidas por la Interventoría, no ha realizado la programación de obra ajustada de acuerdo con las necesidades del proyecto, de igual forma no ha realizado el balance de cantidades de con base a los resultados de la revisión y ajuste de los estudios y diseños, de igual forma no ha movilizad maquinaria, al sitio de obra, generando atrasos y un presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato de obra.

Plan de Calidad: La Interventoría, mediante comunicado SGO-099-2025, del 11 de julio de 2025, emitió el siguiente concepto sobre el plan de calidad presentado por el Contratista de obra:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la Interventoría CONSORCIO SGO VIAL, por medio del presente nos permitimos dar respuesta al comunicado del asunto, mediante el cual la firma Contratista de obra GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS da respuesta a las observaciones emitidas al Plan de Calidad del proyecto, el cual una vez revisado se, se aprueba haciendo aclaración que el control de ensayos y frecuencia de los mismos debe dar cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construcción de carreteras INVÍAS 2022.:

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

De acuerdo con lo previsto en el presupuesto del contrato de Interventoría y dando cumplimiento a la cláusula 3 del contrato de Interventoría ICCU-CTO-235-2025, El Consorcio SGO Vial, se obliga a contar con los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales

Equipo	Cantidad	Modelo	Nota	Cumple requerimientos contractuales
Vehículo >2000 CC.	1	2012	En uso	SI
Equipo completo de topografía.	1	Topcon	En uso	SI
Oficina/ Campamento.	1	N/A	En uso	SI

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

El ICCU en atención a las comunicaciones de Interventoría ha dado respuesta a las mismas con la aprobación del siguiente personal.

ITEM	NOMBRE	% DEDICACIÓN	CARGO	No. DÍAS COTIZADOS
1	ADOLFO BARRIGA PADILLA	35%	Director de Interventoría	30
2	JUAN DAVID CUBILLOS	100%	Residente de Interventoría	30
3	BELEN ALEXANDRA CERON QUINTERO	20%	Especialista Ambiental	30
4	LADY VIVIANA PEÑA	30%	Profesional Social	30
5	ANGIE KATHERINE VERSOLATO GONZALEZ	30%	Profesional SISO	30
6	GERMAN VARON RODRIGUEZ	70%	Topógrafo	30
7	ANGEL DAVID FERNANDEZ	70%	Cadenero	30
8	JUAN CAMILO VARÓN HERNÁNDEZ	100%	Inspector de Interventoría	30

Se adjunta Anexo 010 haciendo uso del Formato MS-GC-FR-013 para el personal de la Interventoría, así como también se anexan las planillas de seguridad para el período.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

La Interventoría, durante el período de enero/2026, presentó a la entidad el acta de costos No. 7 correspondiente al mes de diciembre de 2025. El desglose de los costos se describe en la siguiente tabla:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
							\$ 100,000,715.00	\$ 666,671,435	
1	24-04-2025 al 30-05-2025	\$ 54,569,565.00	\$ 10,368,218.00	\$ 64,937,783.00	\$ 16,666,785.00	\$ 48,270,998.00	\$ 83,333,930.00	\$ 601,733,652.00	\$ 601,733,652.00
2	01-06-2025 al 30-06-2025	\$ 60,696,500.00	\$ 11,532,335.00	\$ 72,228,835.00	\$ 16,666,785.00	\$ 55,562,050.00	\$ 66,667,145.00	\$ 529,504,817.00	\$ 529,504,817.00
3	01-07-2025 al 31-07-2025	\$ 64,146,500.00	\$ 12,187,835.00	\$ 76,334,335.00	\$ 16,666,785.00	\$ 59,667,550.00	\$ 50,000,360.00	\$ 453,170,482.00	\$ 453,170,482.00
4	01-08-2025 al 31-08-2025	\$ 64,146,500.00	\$ 12,187,835.00	\$ 76,334,335.00	\$ 16,666,785.00	\$ 59,667,550.00	\$ 33,333,575.00	\$ 376,836,147.00	\$ 376,836,147.00
5	01-09-2025 al 30-09-2025	\$ 61,766,500.00	\$ 11,735,635.00	\$ 73,502,135.00	\$ 16,666,785.00	\$ 56,835,350.00	\$ 16,666,790.00	\$ 303,334,012.00	\$ 303,334,012.00
6	04-11-2025 al 30-11-2025	\$ 62,846,087.00	\$ 11,940,757.00	\$ 74,786,844.00	\$ 16,666,790.00	\$ 58,120,054.00	\$ -	\$ 228,547,168.00	\$ 228,547,168.00
7	01-12-2025 al 31-12-2026	\$ 61,766,500.00	\$ 11,735,635.00	\$ 73,502,135.00	\$ -	\$ 73,502,135.00		\$ 155,045,033.00	\$ 155,045,033.00
8	01-01-2026 al 22-01-2026	\$ 46,688,200.00	\$ 8,870,758.00	\$ 55,558,958.00	\$ -	\$ 55,558,958.00		\$ 99,486,075.00	\$ 99,486,075.00
TOTALES		\$ 476,626,352.00	\$ 90,559,008.00	\$ 567,185,360.00	\$ 100,000,715.00	\$ 467,184,645.00	\$ 0.00	\$ 99,486,075.00	\$ 99,486,075.00

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se presentan las pólizas del contrato de Interventoría emitidas por la Compañía Seguros del Estado S.A., con sus respectivos amparos

Contrato de Interventoría:	ICCU-CTO-235 DE 2025						
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL						
Garantías No:	21-44-101464585 – ANEXO 0						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$66.667.143,50	2025	03	05	2026	03	05
PRESTACIONES SOCIALES	\$33.333.571,75	2025	03	05	2028	11	05
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$100.000.715,25	2025	03	05	2026	03	05
CALIDAD DEL SERVICIO	\$200.001.430,50	2025	11	05	2030	11	05

Póliza de Suscripción del contrato

Contrato de Interventoría:	ICCU-CTO-235 DE 2025						
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL						
Garantías No:	21-44-101464585 – ANEXO 2						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$66.667.143,50	2025	04	24	2026	04	24
PRESTACIONES SOCIALES	\$33.333.571,75	2025	04	24	2028	12	25
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$100.000.715,25	2025	04	24	2026	04	24
CALIDAD DEL SERVICIO	200.001.430,50	2025	12	25	2030	12	25

Póliza de Acta de inicio

Contrato de Interventoría:	ICCU-CTO-235 DE 2025						
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL						
Garantías No:	21-44-101464585 – ANEXO 3						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$66.667.143,50	2025	04	24	2026	05	14
PRESTACIONES SOCIALES	\$33.333.571,75	2025	04	24	2029	01	14
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$100.000.715,25	2025	04	24	2026	05	14
CALIDAD DEL SERVICIO	200.001.430,50	2025	12	25	2030	12	25

Póliza de Suspensión No. 1

Contrato de Interventoría:	ICCU-CTO-235 DE 2025						
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL						
Garantías No:	21-44-101464585 – ANEXO 4						

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$66.667.143,50	2025	04	24	2026	05	26
PRESTACIONES SOCIALES	\$33.333.571,75	2025	04	24	2029	01	26
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$100.000.715,25	2025	04	24	2026	05	26
CALIDAD DEL SERVICIO	200.001.430,50	2025	12	25	2030	12	25

Póliza de Suspensión No. 2

Contrato de Interventoría:	ICCU-CTO-235 DE 2025						
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL						
Garantías No:	21-44-101464585 – ANEXO 5						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$66.667.143,50	2025	04	24	2026	07	15
PRESTACIONES SOCIALES	\$33.333.571,75	2025	04	24	2029	03	15
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$100.000.715,25	2025	04	24	2026	07	15
CALIDAD DEL SERVICIO	200.001.430,50	2025	12	25	2030	12	25

Póliza de Suspensión No. 3, 4 y prorroga No. 1

Contrato de Interventoría:	ICCU-CTO-235 DE 2025						
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL						
Garantías No:	21-44-101464585 – ANEXO 7 y 8						
CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	\$66.667.143,50	2025	04	24	2026	09	30
PRESTACIONES SOCIALES	\$33.333.571,75	2025	04	24	2029	05	31
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$100.000.715,25	2025	04	24	2026	09	30
CALIDAD DEL SERVICIO	200.001.430,50	2025	12	25	2030	12	25

Póliza de Suspensión No. 5, 6 y prorroga No. 2

Las pólizas y sus respectivos amparos fueron aprobadas por la entidad según MS-GC-FR-06 ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS, las cuales se encuentran dentro del Anexo 012.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

El objeto del contrato consiste en cumplir con el alcance de los trabajos de Interventoría consignado en el contrato suscrito con ICCU. El contrato de Interventoría comprende la realización de los trabajos, actividades y controles, y la entrega de productos establecidos en los pliegos de condiciones, especificaciones y en la metodología propuesta por GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

El Control del proceso de supervisión de las actividades del contrato de Interventoría lo realiza la profesional de calidad asignada al área, mediante los procesos indicados en el plan de calidad de Interventoría que se adjunta al presente informe como Anexo 013.

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

El Control del proceso de supervisión de las actividades del contrato de obra lo realiza mediante el proceso indicado en el cuadro del Anexo 013.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría, mediante comunicado SGO-003-2025, solicitó a la Entidad contratante el desembolso del anticipo del 15% del presupuesto oficial del contrato de Interventoría (\$100.000.715,25), a lo cual la entidad a realizó el desembolso el 06 de agosto de 2025 por un valor de \$94.204.884,00 de acuerdo con los impuestos y retenciones correspondientes. Es importante aclarar que este dinero no genero rendimientos ya que fue utilizado inmediatamente para liquidar a las entidades prestadoras quienes cubrieron los pagos programados para los meses de mayo y junio de 2025. En el anexo 022 se encuentran los soportes de las transferencias realizadas.

6.6.2 Seguimiento Programa de Inversión

Interventoría presentó a la entidad el Plan Anual de Caja en el cual se establecen los recursos a ejecutar mes a mes durante el desarrollo del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta la última Acta de costos presentada por la Interventoría y el valor total del contrato (\$666.671.435,00), para la fecha del presente informe se ejecutó un porcentaje acumulado del 85,08% \$ 567,185,360.00) del valor contractual, lo cual deja un saldo de \$ 99,486,075.00 por ejecutar, correspondiente al 14,92% del valor del contrato.

ACTA	FECHA	INVERSIÓN PROGRAMADA	INVERSIÓN EJECUTADA	SALDO POR EJECUTAR
1	abr - may 2025	\$ 83.238.134,10	\$ 64.937.783,00	\$ 601.733.652,00
2	jun-25	\$ 91.996.534,10	\$ 72.228.835,00	\$ 529.504.817,00
3	jul-25	\$ 87.699.444,10	\$ 76.334.335,00	\$ 453.170.482,00
4	ago-25	\$ 83.812.904,10	\$ 76,334,335,00	\$ 376,836,147,00
5	sep-25	\$ 79.981.104,10	\$73.502.135,00	\$303.334.012,00
6	nov-25	\$ 79.981.104,10	\$ 74,786,844.00	\$ 228,547,168.00
7	dic-25	\$ 79.981.104,10	\$ 73,502,135.00	\$ 155,045,033.00
8	ene-26	\$ 79.981.104,10	\$ 55,558,958.00	\$ 99,486,075.00
TOTALES		\$ 666.671.432,80	\$ 567,185,360.00	\$ 99,486,075.00

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

6.6.3 Actas de Comité de Obra

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA DESARROLLADOS		
FECHA	TIPO	PARTICIPANTES
12 de febrero de 2026	Técnico	Contratista, ICCU, Interventoría
23 de febrero de 2026	Técnico	Contratista, ICCU, Interventoría
03 de marzo de 2026	Técnico	Contratista, ICCU, Interventoría
10 de marzo de 2026	Técnico	Contratista, ICCU, Interventoría

6.6.4 Actas de Reunión

RELACIÓN DE LAS REUNIONES REALIZADAS		
FECHA	TIPO	PARTICIPANTES
12 de marzo de 2026	Ambiental	Contratista, ICCU, Interventoría
12 de marzo de 2026	SISO	Contratista, ICCU, Interventoría

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE
 CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el período evaluado, el Contratista de obra implementó cambios en la planta técnica, administrativa y ejecutiva, así como el cambio de las estrategias, planes de inversión y trabajo como parte de los compromisos adquiridos para la aprobación de la ampliación al plazo contractual.

Como resultado de la implementación de la estrategia previamente descrita y de la presentación formal de la prórroga mediante el comunicado GLO-ICCU-1842025-003-2026 del 2 de febrero de 2026, la Interventoría se pronunció a través del oficio SGO-028-2026 del 9 de febrero de 2026.

En el documento mencionado, la Interventoría señala que, en atención a la solicitud de prórroga presentada por el Contratista y a la documentación de soporte allegada —en especial la Programación de Obra ajustada y el Plan de Acción de Remate—, procedió a emitir concepto técnico de la revisión efectuada, evidenciando que el Contratista realizó un ejercicio integral de evaluación de los rendimientos en obra y de su esquema administrativo y operativo. Este análisis permitió identificar factores que afectaron la eficiencia inicialmente proyectada, particularmente aquellos asociados a la complejidad logística del área de intervención. Como resultado, el Contratista adoptó medidas correctivas, consistentes en la reestructuración de su organización interna y del esquema de dirección en campo, las cuales se consideran técnicamente pertinentes para dar continuidad a la ejecución de las actividades contratadas.

No obstante lo anterior, la Interventoría concluye que no es posible otorgar los tres (3) meses de prórroga solicitados por el Contratista de obra y precisa que únicamente resulta viable conceder una prórroga por el término de un (1) mes y seis (6) días, correspondiente al período que puede ser cubierto con los recursos actualmente disponibles para el contrato de Interventoría.

Con la reanudación de las actividades el día 9 de febrero de 2026, la Interventoría continuó ejerciendo las actividades de control y vigilancia de las obras realizadas, así como el seguimiento al cronograma de obra y el cumplimiento de los plazos contractuales, evidenciando que, pese a que se registró un incremento de los rendimientos en comparación con los períodos anteriores, no se lograron los objetivos plasmados en el Plan Detallado de Trabajo (PDT) pues se reportó un atraso del 15.36%.

Por tal motivo el Contratista deberá realizar las inversiones e implementación de acciones correctivas necesarias que garanticen el cumplimiento de las metas físicas proyectadas en el PDT en los plazos pactados.

Administrativamente se continuó implementando las estrategias orientadas por la Supervisión del ICCU para atender, revisar y aprobar los informes periódicos, en tal sentido se emitieron oficios con la actualización de las observaciones y aprobaciones a las que hubo lugar, así como también

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

se realizaron mesas de trabajo conjuntas entre los especialistas de la supervisión, Interventoría y Contratista.

Para finalizar, fue presentada, socializada y aprobada solicitud de suspensión del contrato indicando el 12 de marzo de 2026 y finalizando el 5 de abril de 2026.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

8. ANEXOS

8.1 Correspondencia

Se elaboraron comunicaciones, requerimientos y solicitudes de los diferentes conceptos, decisiones y/o revisiones técnicas que influyen en la operatividad y funcionabilidad de las obras para construcción. En el Anexo 016 se presenta la correspondencia recibida y enviada durante el período.

En la siguiente tabla se presenta la relación de la documentación recibida durante el período:

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
GLO-ICCU1842025-003-2026	2/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Solicitud de prórroga a la suspensión temporal del contrato (7 días).
GLO-ICCU1842025-005-2026	2/2/2026	ADMINISTRATIVO	ICCU	Presentación de hojas de vida para aprobación Ambiental - Social
correo electrónico	2/2/2026	SISO	CONSORCIO SGO VIAL	Remisión parcial de soportes - Subsanación Informe SST No. 6 (Noviembre)
GLO-ICCU-008-2026	4/2/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a los oficios SGO-296-2025; SGO-301-2026; SGO-010-2026; Ajustes a los informes ambientales 3, 4, 5, 6 acorde a mesa de trabajo del 05/01/2026 – Proyecto: Mejoramiento vía "Junín - ClaraVal - Chuscales".
GLO-ICCU-009-2026	6/2/2026	ADMINISTRATIVO	ICCU	Presentación de hojas de vida para aprobación - Especialista Geotécnico y Estructura - Especialista Pavimentos.
GLO-ICCU-008-2026	4/2/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a los oficios SGO-296-2025; SGO-301-2026; SGO-010-2026; Ajustes a los informes ambientales 3,

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
				4, 5, 6 acorde a mesa de trabajo del 05/01/2026 – Proyecto: Mejoramiento vía "Junín-Claraval - Chuscales".
GLO-ICCU-014-2026	7/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Alcance técnico y solicitud de prórroga en plazo de ejecución.
GLO-ICCU-017-2026	10/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA	Evaluación técnica Manejo De Afluentes Subsuperficiales Y Estabilización De Subrasante Tramo 3
GLO-ICCU-017-2026	10/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Diseño volante de convocatoria a reunión extraordinaria
GLO-ICCU-019-2026	10/2/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Radicación de documentos técnicos y legales – Suministro de materiales pétreos (Cantera Playa Holguín)
GLO-ICCU-020-2026	10/2/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA	Remisión de afiliaciones de ARL - personal
GLO-ICCU-021-2026	10/2/2026	SISO	SANDRA R. CASTILLO	Entrega de relación de maquinaria y equipos – Contrato de Obra No. 184 de 2025.
GLO-ICCU-022-2026	10/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a comunicación SGO-029-2026 – Observaciones Volante Convocatoria Reunión Extraordinaria.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
GLO-ICCU-023-2026	11/2/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a los oficios SGO-296-2025; SGO-301-2026; SGO-010-2026; Entrega de informes ambientales 7 y 8
correo electrónico	12/2/2026	PRESUPUESTO	CONSORCIO SGO VIAL	Propuesta presupuestal para la inclusión de ítems no previstos
correo electrónico	12/2/2026	TECNICO	CONSORCIO SGO VIAL	Entrega de Resultados de Ensayo Proctor - Material de Relleno (Cantera Playa Holguín) - Contrato 184 de 2025
correo electrónico	12/2/2026	ADMINISTRATIVO	CONSORCIO SGO VIAL	Radicación de Documentación Técnica y de Calidad - Laboratorio de Ensayos (GOMYSIL)
GLO-ICCU-024-2026	16/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Reconsideración y solicitud de validación de antecedentes – Laboratorio GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S..
GLO-ICCU-025-2026	16/2/2026	SISO	SANDRA R. CASTILLO	Respuesta a oficio SGO-031-2026 – Subsanación y entrega de soportes de afiliaciones y documentación de personal de obra.
GLO-ICCU-026-2026	16/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Solicitud de arte de valla publicitaria aprobada y de aviso de Punto de atención al Usuario – SAU

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
GLO-ICCU-027-2026	18/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Modificación en el manejo de tránsito de vehículos livianos para la ejecución de obras en el tramo 3 contrato de obra ICCU-184-2025
GLO-ICCU-028-2026	18/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Entrega de informe mensual social No. 6 (noviembre-2025) versión 1 CTO ICCU-184-2025
GLO-ICCU-029-2026	18/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Entrega de informe mensual social No. 7 (diciembre-2025) versión 1 CTO ICCU-184-2025
GLO-ICCU-030-2026	18/2/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta al oficio SGO-030-2026; Revisión permisos minero ambientales materiales pétreos, comunicación GLO-ICCU-1842025-019-2026 - Proyecto: Mejoramiento vía "Junín - Claraval - Chuscales".
GLO-ICCU-031-2026	18/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Notificación de canal oficial de comunicación y creación de correo electrónico exclusivo para el contrato.
correo electrónico	18/2/2026	TECNICO	CONSORCIO SGO VIAL	Entrega de subsanación y ajustes al Informe Mensual Técnico N° 5
GLO-ICCU-033-2026	19/2/2026	SISO	SANDRA R. CASTILLO	Radicación Informe No.6 SST correspondiente al mes de noviembre de 2025

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
GLO-ICCU-034-2026	19/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA	Propuesta técnica solicitud para cambio del acabado de concreto ciclópeo por texturizado.
GLO-ICCU-035-2026	19/2/2026	TECNICO	CONSORCIO SGO VIAL	Entrega de subsanación y ajustes al Informe Mensual Técnico N° 6
GLO-ICCU-036-2026	23/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Entrega de informe mensual social No. 8 (enero-2026) versión 1 CTO ICCU- 184-2025
GLO-ICCU-037-2026	23/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a observaciones Hojas de vida. Comunicado – SGO-033-2026
GLO-ICCU-038-2026	24/2/2026	SOCIAL	CONSORCIO SGO VIAL	Propuesta de atención presencial en cumplimiento de Sistema de Atención al Ciudadano.
GLO-ICCU-039-2026	24/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Notificación de corrección en secuencia de radicación y reenvío de documentación.
GLO-ICCU-040-2026	24/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA	Entrega y radicación del Informe Técnico Mensual No. 7.
GLO-ICCU-041-2026	24/2/2026	PRESUPUESTO	ADOLFO BARRIGA	Entrega y radicación de Actas de Cobro No. 5, 6 y 7.
GLO-ICCU-042-2026	24/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA	Remisión de Programa Detallado de Trabajo (PDT) y Flujo de Caja conciliados.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
GLO-ICCU-043-2026	25/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA	Solicitud de instrucción técnica por inestabilidad de taludes y pérdida de banca fuera del alcance contractual – Sector San Antonio.
GLO-ICCU-045-2026	3/3/2026	SISO	SANDRA R. CASTILLO	Radicación Informe No.7 SST correspondiente al mes de Diciembre de 2025
GLO-ICCU-046-2026	10/3/2026	SISO	SANDRA R. CASTILLO	Radicación Informe No.8 SST correspondiente al mes de Enero de 2026
GLO-ICCU-047-2026	4/3/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a oficio SGO-052-2026 – Respuesta a observaciones informe SST No 6-remision de informe numero 6 V2 de acuerdo a las observaciones emitidas por parte de la Interventoría
GLO-ICCU-048-2026	5/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a comunicado SGO-045-2026. Radicación IMS No. 6 versión 2
GLO-ICCU-049-2026	5/3/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Remisión informe mensual ambiental No. 9 correspondiente al mes de febrero de 2026 – Proyecto: Mejoramiento vía "Junín-ClaraVal - Chuscales".
GLO-ICCU-050-2026	6/3/2026	SOCIAL	Entidades públicas y privadas Organizaciones sociales Comerciantes del	Comunicación preventiva sobre acuerdos o compromisos

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
			sector Comunidad en general	comerciales con personal de obra.
GLO-ICCU-051-2026	6/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Remisión de comunicado informativo dirigido a la comunidad – Contrato ICCU-184-2025
GLO-ICCU-052-2026	6/3/2026	PRESUPUESTO	ADOLFO BARRIGA SANDRA R. CASTILLO	Entrega de documentos para facturación Acta parcial No. 5
GLO-ICCU-053-2026	6/3/2026	PRESUPUESTO	ADOLFO BARRIGA SANDRA R. CASTILLO	Entrega de documentos para facturación Acta parcial No. 6
GLO-ICCU-054-2026	6/03/2026 09/03/2026	PRESUPUESTO	ADOLFO BARRIGA SANDRA R. CASTILLO	Entrega de documentos para facturación Acta parcial No. 7
GLO-ICCU-055-2026	6/03/2026 16/03/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA SANDRA R. CASTILLO	Radicación de subsanciones a los Informes Técnicos No. 5, 6 y 7.
GLO-ICCU-056-2026	6/3/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta al oficio SGO-043-2026 del 20 de febrero de 2026. Observaciones Informes ambientales No. 3-V4; No. 4-V4; No. 5-V3; No. 6-V1; No. 7-V1 y No. 8-V1. – Proyecto: Mejoramiento vía "Junín-Claraval - Chuscales".
correo	9/3/2026	SOCIAL	CONSORCIO SGO VIAL	Remisión de formatos de PQRSD cerradas

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
GLO-ICCU-058-2026	10/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Informe Mensual Social No. 6 Versión 3. Alcance a observaciones remitidas mediante comunicado SGO-063-2026
GLO-ICCU-059-2026	10/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Informe Mensual Social No. 7 Versión 3. Alcance a observaciones remitidas mediante comunicado SGO-064-2026
GLO-ICCU-060-2026	10/3/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA	Radicación Informe No.9 SST correspondiente al mes de Febrero de 2026
correo	10/3/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA	Alcance 045 - Radicación Informe No.7 SST correspondiente al mes de Diciembre de 2025
GLO-ICCU-061-2026	11/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA	Remisión actas de reuniones con comunidad Febrero-2026
GLO-ICCU-062-2026	12/03/2026 06/04/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA SANDRA R. CASTILLO	Solicitud prorroga N.2 contrato 184 de 2025
GLO-ICCU-064-2026	12/3/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA	Respuesta a sus oficios SGO-294-2025 del 31/12/2025 y SGO-011-2026 del 16/01/2026 Actualización documento PAGA V7R5 para el cierre ambiental - Proyecto: Mejoramiento vía "Junín-Claraval - Chuscales".

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
GLO-ICCU-065-2026	12/3/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Solicitud de suspensión temporal del Contrato No. ICCU-CTO-184 de 2025 por fuerza mayor técnica y restricciones ambientales en la obtención de material.
GLO-ICCU-066-2026	12/3/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA	Modificación de zona de intervención del CONTRATO DE OBRA No. 184 DE 2025
correo electrónico	18/12/2025	SOCIAL	CONSORCIO SGO VIAL	Aprobación Informe Mensual Social de Interventoría No. 7 V1
correo electrónico	18/2/2026	SISO	CONSORCIO SGO VIAL	Observaciones SGO-035-2026. Remisión Informe Mensual SST de Interventoría, No. 8.
ICCU-S-2026-0001383	18/2/2026	TECNICO	HÉCTOR DAVID FERNÁNDEZ	Respuesta a comunicado SGO-025-2026 de Solicitud aprobar cambio Laboratorio de materiales, para de contrato de Interventoría. (APROBACIÓN)
correo electrónico	19/2/2026	ADMINISTRATIVO	CONSORCIO SGO VIAL	SOLICITUD DE INFORMACION
correo electrónico	19/2/2026	ADMINISTRATIVO	CONSORCIO SGO VIAL	SOLICITUD ENVIO POLIZAS
correo electrónico	22/2/2026	ADMINISTRATIVO	CONSORCIO SGO VIAL	Observaciones Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 6 V1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
correo electrónico	24/2/2026	SOCIAL	CONSORCIO SGO VIAL	DERECHO DE PETICIÓN - CONTRATO DE OBRA No. ICCU-CTO-184 DE 2025
oficio sin consecutivo	3/3/2026	SISO	CONSORCIO SGO VIAL	Revisión informe N07 componente de Seguridad y Salud en el trabajo mes de diciembre de 2025 (observaciones)
correo electrónico	4/3/2026	SISO	CONSORCIO SGO VIAL	Informe Mensual Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SISO de Interventoría No. 6
correo electrónico	9/3/2026	ADMINISTRATIVO	CONSORCIO SGO VIAL	Aprobación de pólizas según suspensión y reinicio 3 Y 4, además de la prórroga No 1.
correo electrónico	10/3/2026	ADMINISTRATIVO	CONSORCIO SGO VIAL	Observaciones acta No 6 Contrato 235-2025 RE: RADICACION ACTA DE COSTOS No 6 CONTRATO 235 DE INTERVENTORIA
correo electrónico	10/3/2026	AMBIENTAL	CONSORCIO SGO VIAL	Observaciones Informes Mensuales Ambientales Interventoría No. 3 y 4 V2, con anexos.
correo electrónico	12/3/2026	TECNICO	CONSORCIO SGO VIAL	OBSERVACIONES V1 RE: CONSORCIO SGO VIAL te ha enviado Info Mensual Técnico No. 7, Interv con Anexos
correo electrónico	12/3/2026	TECNICO	CONSORCIO SGO VIAL	OBSERVACIONES V1 RE: CONSORCIO SGO VIAL te ha enviado Informe

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	TIPO DE COMUNICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO
				mensual Interventoría No. 8
correo electrónico	12/3/2026	TECNICO	CONSORCIO SGO VIAL	OBSERVACIONES INFORME No 6 v3 CTO 235-2025
correo electrónico	12/3/2026	PRESUPUESTO	CONSORCIO SGO VIAL	OBSERVACIONES V1 RE: ENVIO ACTA DE COSTOS No. 7 CONTRATO 235
correo electrónico	12/3/2026	AMBIENTAL	CONSORCIO SGO VIAL	Continuidad del trámite condicionada a subsanaciones-componente ambiental (observaciones info ambientales 5, 6 y 7

En la siguiente tabla se presenta la relación de la documentación enviada durante el período:

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-026-2026	2/2/2025	ADMINISTRATIVO	HÉCTOR FERNÁNDEZ	SANDRA R. CASTILLO	Solicitud ampliación de plazo para suspensión a contratos de obra No. 184 de 2025 y de Interventoría No. 235 de 2025.
SGO-027-2026	2/2/2025	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	ALEXANDRA MARTÍNEZ	Remisión Informe Mensual Social Interventoría No. 8 V1, período: enero de 2026.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-028-2026	9/2/2026	ADMINISTRATIVO	HÉCTOR FERNÁNDEZ	SANDRA R. CASTILLO	Solicitud de prórroga para contrato de obra No. 184 de 2025 y de Interventoría No. 235 de 2025.
SGO-029-2026	10/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	LILIANA BAUTISTA ÁLVAREZ	Respuesta a comunicación SGO-029-2026 – Observaciones Volante Convocatoria Reunión Extraordinaria.
SGO-030-2026	12/2/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Respuesta oficio GLO-ICCU-1842025-019-2026 del 10 de febrero de 2026 – revisión permisos minero ambientales materiales pétreos - con alcance de requerimientos complemento y actualización de permisos de la obra– Interventoría CONSORCIO VIAL SGO.
SGO-031-2026	12/2/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Respuesta al comunicado GLO-ICCU-0020-2026 – Remisión de afiliaciones ARL-personal
SGO-032-2026	12/2/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Solicitud entrega de Informes mensual SST diciembre y enero de 2026

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-033-2026	12/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Respuesta a los comunicados GLO-ICCU-005-2026 y GLO-ICCU-009-2026 - Entrega Hojas de vida
SGO-034-2026	12/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Respuesta al correo electrónico del 11/02/2026 – Radicación de Documentación Técnica y de Calidad - Laboratorio de Ensayos (GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S.) - Contrato 184 de 2025
SGO-035-2026	13/2/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	NATALY DONCEL	Remisión de Informe Mensual SISO de Interventoría No. 8 – período 01 al 22 de enero de 2026.
SGO-036-2026	13/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Solicitud actualizar garantías, por prórroga contrato de obra.
SGO-037-2026	17/2/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones a relación de maquinaria y equipos. Su comunicado GLO-ICCU-021-2026.
SGO-038-2026	17/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Apremio atención y entrega documentación

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
					pendiente Área Social.
SGO-039-2026	18/2/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Rpta GLO-ICCU-025-2026 Documentos personal y maquinaria
SGO-040-2026	18/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Precisiones frente a Laboratorio ensayo materiales. Su comunicación GLO-ICCU1842025-024-2026
SGO-041-2026	20/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Rpta GLO-ICCU1842025-017-2026 – Manejo De Afluentes Subsuperficiales - Tramo 3
SGO-042-2026	20/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Rpta GLO-ICCU1842025-034-2026 – Propuesta acabado de concreto ciclópeo
SGO-043-2026	21/2/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones Informes ambientales No. 3-V4; No. 4-V4; No. 5-V3; No. 6-V1; No. 7-V1 y No. 8-V1. Sus comunicaciones GLO-ICCU1842025-008-2026 y GLO-ICCU1842025-023-2026.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-044-2026	24/2/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observación a su comunicado GLO-ICCU1842025-027-2026, con asunto: “Modificación en el manejo de tránsito de vehículos livianos para la ejecución de obras en el tramo 3 contrato de obra ICCU-184-2025”
SGO-045-2026	24/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones Informe Social Contratista, No. 6 V1. Su comunicado GLO-ICCU1842025-028-2026.
SGO-046-2026	24/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	SGO-046-2026. Observaciones Informe Social Contratista, No. 7 V1. Su com. GLO-ICCU1842025-029-2026.
SGO-047-2026	27/2/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SANDRA R. CASTILLO	Remisión póliza actualizada (Anexo 5) Contrato ICCU 235 de 2025.
SGO-048-2026	27/2/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Remisión Arte Valla Informativa Proyecto vial. Su comunicado GLO-ICCU1842025-026-2026.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-049-2026	27/2/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Respuesta a Programa Detallado de Trabajo (PDT) y Flujo de Caja conciliados. Su comunicado GLO-ICCU1842025-042-2026.
SGO-050-2026	28/2/2026	PRESUPUESTO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones Actas de Recibo Parcial de Obra No. 5, 6 y 7. Su comunicado GLO-ICCU1842025-041-2026, más trámite de Acta de Recibo Parcial No. 8.
SGO-051-2026	2/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones Informe Social Contratista, No. 8 V1. Su comunicado GLO-ICCU1842025-036-2026 (anterior GLO-ICCU1842025-031-2026).
SGO-052-2026	2/3/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones Informe SST Contratista, No. 6 V1. Su comunicado GLO-ICCU-033-2026.
SGO-053-2026	2/3/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO FABIAN ROMERO ABELLÓ	Remisión de Informe Mensual técnico de Interventoría No. 8

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-054-2026	2/3/2026	ADMINISTRATIVO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Aprobación Hojas Vida profesionales Contratista y requerimientos. Su com. GLO-ICCU-037-2026.
SGO-055-2026	3/3/2026	AMBIENTAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	MARÍA PAULA ESCOBAR FERNÁNDEZ	Remisión Informes Mensuales Ambientales Interventoría No. 3 y 4 V2, con anexos.
SGO-056-2026	3/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones a propuesta atención presencial Punto SAU. Su comunicado GLO-ICCU1842025-038-2026 (anterior GLO-ICCU1842025-033-2026).
SGO-057-2026	3/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Solicitud radicar consolidado actas de vecindad, con soportes.
SGO-058-2026	3/3/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Respuesta a comunicación GLO-ICCU1842025-043-2026. “Solicitud de instrucción técnica por inestabilidad de taludes y pérdida de banca fuera del alcance contractual

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-059-2026	4/3/2026	TECNICO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Respuesta al correo electrónico del 18 de febrero de 2026 y comunicados GLO-ICCU-035-2026, GLO-ICCU1842025-040-2026 – Observaciones a los Informes técnicos de Obra No. 5, 6 y 7
SGO-060-2026	6/3/2026	PRESUPUESTO	HÉCTOR FERNÁNDEZ	LAURA DANIELA NIETO	Requerimientos urgentes por finalización Contrato de Interventoría 235 de 2025.
SGO-061-2026	9/3/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Aprobación Informe SST Contratista, No. 6 V2. Su comunicado GLO-ICCU-047-2026.
SGO-062-2026	9/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	ALEXANDR A MARTINEZ	Remisión Informe Mensual Social Interventoría No. 9 V1, período: 9-28 de febrero/2026.
SGO-063-2026	9/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones al Informe Social No. 6 V 2. Su comunicado GLO-ICCU1842025-048-2026.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
SGO-064-2026	9/3/2026	SOCIAL	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Observaciones Informe Social No. 7 V 2. Su comunicado GLO-ICCU1842025-057-2026.
SGO-065-2026	12/3/2026	SISO	ADOLFO BARRIGA PADILLA	SERGIO HERRERA SERRANO	Aprobación Informe SST Contratista, No. 7 V1. Su com. GLO-ICCU-045-2026.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

	
TRAMO 2 VACIADO DE CONCRETO CUNETA COSTADO IZQUIERDO km 35 + 640 - km 35 + 638.5 Y km 35 + 593.45 - km 35 + 459. 25	TRAMO 3 VACIADO DE CONCRETO HUELLA DERECHA km 17+460 km 17+420

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

	
TRAMO 2 VACIADO DE CONCRETO CLOPEO CENTRAL km 35 + 169,5 - km 35 + 156,7	TRAMO 3 VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO CENTRAL COSTADO DERECHO Y HUELLA IZQUIERDA km 17+460 km 17+408,8
	
TRAMO 3 VACIADO DE CONCRETO HUELLA DERECHA km 17 + 330 - km 35 + 275,6	TRAMO 2 VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA EN CUNETA DERECHA km 35 + 107.54 - km 35 + 088

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 9	FECHA	12/03/2025

	
<p>TRAMO 3 VACIADO DE CONCRETO SARDINEL COSTADO IZQUIEDO EN (km 17 + 258 - km 17 +205)</p>	<p>TRAMO 2 VACIADO DE CONCRETO PARA CICLOPEO CENTRAL km 35 + 107.54 HASTA km 35 + 46,74</p>

8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

8.4 Bitácora del mes correspondiente

La copia de la bitácora de obra se reporta en el Anexo 015 del presente informe.

8.5 Certificación componente ambiental y social

La certificación en la que se acredita que a la fecha el Contratista respectivo no está sancionado o tiene un proceso de incumplimiento o multa del Contrato de Obra relacionado con asuntos ambientales y/o sociales se adjunta como Anexo 017.

8.6 Acta de costos de Interventoría

A fecha del corte del presente informe la Interventoría realizó el trámite del acta de costos de Interventoría No. 8, la cual se anexa como Anexo 018 del presente informe.
