

Bogotá D.C. 02 de junio de 2026

Ingeniero

JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN

Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

Dirección de Infraestructura

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Edificio Elemento torre 4 – Piso 12 y 13


ASUNTO: Remisión Cuenta de Cobro N° 05 del Contrato de Prestación de Servicios No. **USPEC-CTO-183-2026**

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito la cuenta de cobro N° 05 del Contrato de Prestación de Servicios **USPEC-CTO-183-2026** con sus respectivos soportes adjuntos, correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de mayo de 2026, del suscrito contratista BILLY FELIPE TELLO MARIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.884.302 En virtud de la supervisión del contrato en mención ejercida de su parte; lo anterior de conformidad con el Registro Presupuestal N° 22126 con fecha de enero 29 de 2026.

Agradezco la colaboración prestada.

Cordialmente,



Ing. BILLY FELIPE TELLO MARIN
C.C. 1.121.884.302
CONTRATISTA



**CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
"**

1 Ciudad	BOGOTÁ. D.C.				
2 Fecha de radicación	02 de junio de 2026				
3 Nombre del Contratista	BILLY FELIPE TELLO MARIN				
4 Cédula de Ciudadanía o Nit	1.121.884.302				
5 Banco	BANCOLOMBIA				
6 No. Cuenta	84461070247	7 Tipo de Cuenta	AHORROS		
8 Contrato No.	183-2026	9 No. CDP	24426	10 No. RP	22126
11 Pago No.	5	de	7		

¹² En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por valor de:

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. \$ 7.794.000

conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período comprendido entre:

13.

Año	Mes	Día
2026	5	1

Año	Mes	Día
2026	5	30

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN

¹⁴ **Nombre del Supervisor**

¹⁵ **Firma del Supervisor**

Elaboró: Billy Felipe Tello Marin *BFT*

Revisó: Lina Maria Salazar *Lina Maria Salazar*

¹⁶ PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

OBLIGACIÓN No.

ÓRDEN DE PAGO No.

BOGOTÁ D.C., 02 DE JUNIO DE 2026

CUENTA DE COBRO No 05

LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC
NIT 900.523.392-1

DEBE A

BILLY FELIPE TELLO MARIN
C.C. 1.121.884.302

LA SUMA DE: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. (\$ 7.794.000) por concepto de pago No 05 del contrato de prestación de servicios profesionales 183 de 2026, correspondiente al periodo del 01 al 30 de mayo de 2026.

Concepto:

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA”.

Aplicar al RP **22126** del 29 de enero de 2026 (\$7.794.000)

- **Código RUT:** 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERIA
- **Código RIT:** 71121 ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Cordialmente,



BILLY FELIPE TELLO MARIN
Ingeniero Civil – Especialista en formulación y evaluación de proyectos

Favor realizar el pago a:
Bancolombia

Cuenta de ahorros: **84461070247**

A nombre de: **Billy Felipe Tello Marin**
C.C. 1.121.884.302

1. INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

APOYO A LA GESTIÓN

2. CONTRATO No. 183 DEL 2026

DATOS GENERALES

3. CONTRATISTA: BILLY FELIPE TELLO MARIN

4. CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 1.121.884.302

5. NIT: 1121884302-2

6. REGISTRO PRESUPUESTAL No: 22126

7. FECHA: 29/01/2026

8. PERIODO DEL INFORME

DESDE: 01 DE MAYO DE 2026
HASTA: 30 DE MAYO DE 2026

9. SUPERVISOR: ING. JUAN JOSE CASASFRANCO
MEDELLIN

10. DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE
SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

11. OBJETO:

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA”.

12. OBLIGACIONES:

1. Realizar actividades de apoyo a los proyectos a cargo de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y/o de la Dirección de Infraestructura.

13. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Durante el periodo evaluado realicé seguimiento técnico al contrato de interventoría correspondiente al proyecto del Campamento para Mujeres “Mar Verde”, identificado con el contrato USPEC-CTO-297-2024, el cual contempla una prórroga de 106 días y fija como fecha de terminación actual el 16 de agosto de 2026. El valor del contrato se mantiene sin modificaciones respecto al valor inicial, correspondiente a \$44.624.694.436, manteniéndose las condiciones contractuales previamente aprobadas.

Durante la semana 66 del proyecto (semana 53 de obra), la Fase 2 de construcción del Campamento para Mujeres "Mar Verde" registró un avance acumulado de ejecución del 35,93% frente a un 35,67% programado según la versión V05 del cronograma, aprobada con la segunda prórroga el 9 de abril de 2026. Si bien el acumulado muestra una diferencia favorable del 0,26%, esta ventaja se redujo en 2,16 puntos porcentuales respecto al período anterior. En términos semanales, la ejecución alcanzó únicamente el 0,42% frente al 2,56% programado, lo que representa un atraso del 2,14% y marca la quinta semana consecutiva con desempeño por debajo de la meta. De los 457 días calendario de ejecución,

han transcurrido 373 (81,62%), quedando 84 días para la fecha contractual de terminación del 16 de agosto de 2026.

En cuanto al avance por edificaciones, se destacan los edificios con ejecución por encima del programado: Guardia Externa (GEX) con +21,12%, Alojamiento de Custodia y Vigilancia (ACV) con +17,92%, Asadero-Panadería (ASA) con +17,76%, Talleres (TLL) con +13,89% y Unidad de Atención Primaria (UAP) con +4,39%. Por el contrario, presentan atrasos significativos los edificios de Visitas (VIS) con -18,42%, Aulas Educativas (EDU) con -13,14% y Pabellón de Mujeres (PMU) con -0,44%. Las actividades principales de la semana incluyeron encofrado y vaciado de concreto de muros de celdas en PMU, instalación de tubería sanitaria y malla electrosoldada en UDI-PMA, armado de plataformas de entrepiso en RAN, VIS y UAP, relleno de mejoramiento y encofrado de columnas en ASA, vaciado de zapatas y amarre de acero de cimentación en RES, y avance en la construcción del Box Culvert con concreto ciclópeo para aletas y encofrado de muros.

En el componente financiero, la inversión ejecutada acumulada en costos directos de la Fase 2 alcanza el 12,40% frente al 14,44% programado, sobre un presupuesto contractual de \$31.927 millones. Se han autorizado egresos del anticipo por \$3.299 millones, equivalentes al 14,79% del valor total. A nivel general, incluyendo la Fase 1 de planeamiento (100% ejecutada por \$600 millones), el seguimiento a la inversión registra un 13,58% ejecutado frente al 15,59% programado, con un atraso del 2,01%. La provisional de energía se encuentra en proceso de revisión por la EMSA con observaciones por subsanar, y se mantienen pendientes las factibilidades de conexión para agua potable, aguas residuales y lluvias con la ESPA.

En materia de HSEQ, se ejecutaron satisfactoriamente las actividades de seguridad incluyendo charlas diarias, inducciones, entrega de EPP, pruebas de alcoholemia e inspecciones de campo. Se cerró la observación relacionada con trabajos en altura sin procedimientos aprobados, aunque persisten observaciones abiertas por actos y condiciones inseguras. En el componente ambiental se identificaron hallazgos de agua estancada y acumulación de residuos con riesgo de proliferación de vectores. El control de calidad registró la toma de muestras de resistencia a la compresión del concreto en los edificios VIS, ACO, PMU, RAN-PAP, UDI-PMA, GEX, EDU, TLL, UAP y Box Culvert, con resultados comparativos entre la resistencia esperada y la obtenida. Desde la gestión social se destaca la mejora en convivencia laboral en los frentes de obra, la gestión socioambiental con comunidades vecinas y la realización de jornadas de bienestar con alta participación del personal.

Se recomienda priorizar la recuperación del ritmo de ejecución semanal en los edificios con mayor atraso (VIS y EDU), acelerar la gestión de factibilidades de servicios públicos y trámites de permisos pendientes, y avanzar en la formulación


del PDT V06 que incluya las actividades de Reseñas, Acopio, Cerramientos, tanque de almacenamiento de agua y subestación eléctrica, a fin de cumplir con la meta contractual de terminación dentro de los 84 días restantes.

CONTRATO DE OBRA:

Objeto: LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

USPEC-CTO-293-2024

Contrato No.	CONSORCIO MAR VERDE CV	
Contratista	901900732-3	
NIT	JAIRO ENRIQUE VARELA FIORELLI	
Rep. Legal	No. 001071 del 23 de diciembre de 2024	
Res. Adjudicación	OTROSÍ No. 1 MODIFICACION Y PRORROGA	AGOSTO 16 DE 2025
Modificaciones	OTROSÍ No. 2 MODIFICACION Y PRORROGA	ABRIL 9 DE 2026
Fecha de Inicio	17/02/2025	
Tiempo de Ejecución	18 meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	
Fecha Recibo Final INICIAL	31/12/2025	
Fecha Recibo Final OTROSÍ No.2	16/08/2026	
Valor Total	44.624.694.436,00	
Anticipo	(50%) 22.312.347.218,00	




2. Elaborar y/o proyectar todos los documentos que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual, tales como adiciones, prórrogas, suspensiones, modificaciones contractuales, controversias y requerimientos en general.



Durante el periodo de ejecución, no se proyectó documentos para modificaciones contractuales. El proyecto cuenta con Otrosí No. 2 al contrato de obra e interventoría, con fecha de finalización el día 16 agosto de 2026.

3. Apoyar en la estructuración, verificación, aprobación de presupuestos y precios no previstos, en soporte de las memorias de cálculo y especificaciones técnicas.

Durante el periodo de ejecución, no se realizó apoyo en la estructuración, verificación, aprobación de presupuestos y NP.

4. Programar, asistir y participar en las reuniones, comités y demás actuaciones que le sean convocados y asignados en cumplimiento del objeto contractual, incluidas las que se requieran para el manejo de las gestiones administrativas al interior de la entidad, diligenciando los registros y documentos que correspondan, haciendo entrega oportuna de los mismos.

Durante el periodo de ejecución, participe en los comites de obra del proyecto MAR VERDE los días 7 (presencial), 14, 21 y 28 de mayo de manera virtual, con el fin de hacer seguimiento al desarrollo de la construcción del pabellon para mujeres dentro de la colonia penal de oriente de Acacias -Meta.

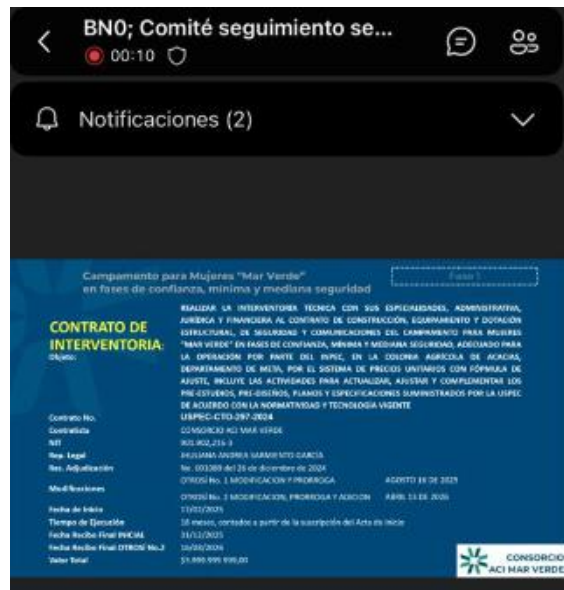BNO; Comité seguimiento se...
00:10

Notificaciones (2)

Campamento para Mujeres "Mar Verde" en fases de confianza, mínima y mediana seguridad

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MINIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACION POR PARTE DEL DPTO. EN LA ZONA RURAL DE AGUAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRECIOS, PRE-SIEMBROS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE USPEC-CT03-2014

Contrato No.	07000 No. 3 MODIFICACION, PRORROGA Y ADICION	ACREDITO 18 DE 2023
Contratista	USPEC	
NET	805.802,216.3	
Act. Legal	PRONUMAR ANDRES BARRONETTO GARCIA	
Act. Regulación	No. 003200 del 25 de diciembre de 2004	
Modificaciones	OPINION No. 1 MODIFICACION Y PRORROGA	ACREDITO 18 DE 2023
Fecha de Inicio	07/02/2023	
Fecha de Término	18 meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	
Fecha Recibo Final PRECMI	23/11/2023	
Fecha Recibo Final OTROCI-MUJ	30/04/2026	
Valor Total	31.880.000.000,00	

CONSORCIO ACTI MAR VERDE



BNO; Comité seguimiento semanal MAR VERDE
02:40

Campamento para Mujeres "Mar Verde" en fases de confianza, mínima y mediana seguridad

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA

BOX CULVERT

Se realiza excavación para la construcción de bordillos para barandas y construcción de muros de protección laderas aguas abajo del Box Culvert.



OS Olga Patri...
EB Edgar Gutie...
JG

<p>5. Apoyar en la elaboración de los planes operativos de construcción y/o mantenimiento a la infraestructura, entregando los reportes para la consolidación de los planes de acción, planes de mejora, y demás que se requieran y le sean asignados.</p>	<p>Durante el periodo de ejecución, no se realizó dicha actividad.</p>
<p>6. Realizar las visitas técnicas necesarias para la correcta gestión y seguimiento de los asuntos a cargo, emitiendo los respectivos informes y conceptos técnicos.</p>	<p>Durante el periodo evaluado realicé visita de campo para verificar el avance de la ejecución. A la fecha, el proyecto registra un avance acumulado del 35,93%, frente al 35,67% programado en la versión V05 del cronograma, aprobada con la segunda prórroga del 9 de abril de 2026. Aunque el acumulado presenta una diferencia favorable de 0,26%, esta se redujo en 2,16 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior. En la semana evaluada, la ejecución fue del 0,42% frente al 2,56% previsto, lo que evidencia un atraso del 2,14% y completa cinco semanas consecutivas con resultados por debajo de la meta.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> 
<p>7. Cumplir con las normas y procedimientos sobre Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas a obras, el (la) CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc.</p>	<p>Durante el periodo de ejecución, cumplí con las normas de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del objeto contractual en las visitas a obra del proyecto MAR VERDE.</p>
<p>8. Atender, tramitar o resolver toda consulta o requerimientos que le sean asignados, dentro de los términos legales y administrativos, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando</p>	<p>Durante el periodo de ejecución apoyé en dar respuesta a los requerimientos asignados mediante radicados R-2025-026247 y R-2025-026134.</p>

traslado de las que no lo sean a la dependencia y/o al profesional competente, adjuntando su concepto al respecto.

DETALLE RADICADO: - REGISTRO: 217798 - RADICADO: R-2025-026247

← Enlaces Imagen

Q DATOS GENERALES Q FLUJO DOCUMENTAL Q COPIAS Q ADJUNTOS Q EXPEDIENTES Q VERSIONES IMAGENES

Responsable	Estado	Decisión	Fecha Decisión	Comentario	Firma
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	FINALIZADO		25/11/2025 10:05:33	ASIGNACION INICIAL POR RADICACION	NO
INGRID MARCELA RUJZ ROMERO	FINALIZADO	ASIGNAR A FUNCIONARIO	27/11/2025 14:57:02	3950	
EDGAR GUTIERREZ BARRERA	FINALIZADO	ASIGNAR A FUNCIONARIO	20/03/2026 08:49:04	se remite para su conocimiento y fines pertinentes	
BILLY FELIPE TELLO MARIN	FINALIZADO	ASIGNAR A FUNCIONARIO	22/05/2026 22:41:48	Ing. Billy por favor subir el informe de aprobación. Muchas Gracias.	
BILLY FELIPE TELLO MARIN	FINALIZADO	GESTION FINAL	29/05/2026 12:16:45	Se finaliza dado que el informe mensual 7 fue aprobado.	

DETALLE RADICADO: - REGISTRO: 217632 - RADICADO: R-2025-026134

← Enlaces Imagen

Q DATOS GENERALES Q FLUJO DOCUMENTAL Q COPIAS Q ADJUNTOS Q EXPEDIENTES Q VERSIONES IMAGENES

Responsable	Estado	Decisión	Fecha Decisión	Comentario	Firma
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	FINALIZADO		24/11/2025 09:50:45	ASIGNACION INICIAL POR RADICACION	NO
INGRID MARCELA RUJZ ROMERO	FINALIZADO	ASIGNAR A FUNCIONARIO	27/11/2025 14:04:33	3935	
EDGAR GUTIERREZ BARRERA	FINALIZADO	ASIGNAR A FUNCIONARIO	20/03/2026 08:35:50	se remite para su conocimiento y fines pertinentes	
BILLY FELIPE TELLO MARIN	FINALIZADO	ASIGNAR A FUNCIONARIO	22/05/2026 22:40:16	Ing. Billy por favor subir el documento de aprobación. Muchas Gracias.	
BILLY FELIPE TELLO MARIN	FINALIZADO	GESTION FINAL	29/05/2026 12:18:44	Se finaliza tramite dado que los informes fueron aprobados.	

9. Entregar a la Entidad los Activos de información física y digital que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Unidad.

Durante el periodo de ejecución, fueron cargados los archivos digitalmente en el drive correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1uoKeSaDJlyO-0KcOIJ1IGQkqTnFlqB?usp=drive_link

14. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL *


CONCEPTO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	SALUD TOTAL	25/05/2026	\$456.500
PENSION	PORVENIR	25/05/2026	\$584.300
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	25/05/2026	\$89.000

- El pago debe ser sobre el 40% del valor de los ingresos recibidos durante el periodo (Decreto 1273 de 2018).
- Si el valor de los días laborados es inferior a 30 días del mes se debe calcular el valor de IBC; él mismo no debe estar por debajo de un (1) salario mínimo mensual vigente (título 7 artículo 3.2.7.1. Decreto. 1273)

15. Para todos los efectos, se suscribe el presente informe el 02 de junio del año 2026.



BILLY FELIPE TELLO MARIN
C.C. 1.121.884.302



Visto Bueno del Supervisor
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
Subdirector Seguimiento a la Infraestructura

PAUTAS DE DILIGENCIAMIENTO

1. **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN:** Marque una X dentro del cuadro correspondiente, señalando claramente, si el informe hace referencia al contrato de prestación de servicios o de apoyo a la gestión.
2. **CONTRATO.** Escriba el número del contrato
3. **CONTRATISTA:** Registre el nombre del contratista
4. **CÉDULA DE CIUDADANÍA.** Escriba la cedula de ciudadanía del contratista
5. **NIT.** Escriba el Número de Identificación Tributaria del contratista
6. **REGISTRO PRESUPUESTAL.** Escriba el número del registro presupuestal que garantiza el pago del contrato.
7. **FECHA:** Escriba la fecha de expedición del registro presupuestal que garantiza el pago del contrato.
8. **PERIODO DEL INFORME.** Describa el periodo dentro del cual se presenta el informe, relacionando la fecha de inicio y la final de periodo al que corresponde el informe.
9. **SUPERVISOR.** Escriba el nombre completo y cargo del supervisor del contrato
10. **DEPENDENCIA.** Escriba la dependencia en la cual se encuentra adscrito.
11. **OBJETO:** Escriba el objeto del contrato
12. **OBLIGACIONES:** Escriba las obligaciones contractuales
13. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** Escriba las actividades desarrolladas durante el término del informe.
14. **PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Relacione la entidad, fecha y el valor pagado por concepto de seguridad social (salud pensión, y riesgos laborales). El IBC debe calcularse sobre el 40% del valor de los ingresos recibidos durante el periodo, si el valor de los días laborados es inferior a 30 días del mes; se debe calcular el valor de IBC, él mismo no debe estar por debajo de un (1) salario mínimo mensual vigente (título 7 artículo 3.2.7.1. Decreto. 1273)

CUENTA DE COBRO MENSUAL

Ejemplo

VALOR DEL CONTRATO \$5.000.000

IBC = 40% DEL INGRESO NETO MENSUAL

$\$5.000.000 * 40\% = \$2.000.000$. IBC MENSUAL

CUENTA DE COBRO POR DÍAS

Ejemplo

VALOR DEL CONTRATO \$5.000.000

IBC=40% DEL INGRESO NETO MENSUAL

$\$5.000.000 * 40\% = \$2.000.000$ IBC MENSUAL

$\$2.000.000 / 30 * 5 = \333.333 IBC DE LOS DIAS.

15. **FECHA.** Escriba la fecha de presentación de informe



Bogotá D.C., 02 de junio de 2026

Señores
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
Ciudad

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Billy Felipe Tello Marin identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.884.302 expedida en Villavicencio con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales.

“He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos”. (Parágrafo 2 art.383 E.T.)

SI () NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Firma: Billy Felipe Tello Marin
Documento de Identificación C.C: 1.121.884.302 de Villavicencio - Meta

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1121884302	BILLY FELIPE TELLO MARIN		calle 16 No 39 A - 03	6086847260	felipe.tellomarin@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			META	VILLAVICENCIO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76544274	25/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.129.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	450.000	0		0		0	20	6.500	0	456.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	576.000	0	0	0	0	20	8.300	0	584.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	87.700				87.700	20	1.300	89.000			877	89.000	1

TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre						NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	450.000	456.500
Pensión	1	576.000	584.300
Riesgos Laborales	1	87.700	89.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.113.700	1.129.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1121884302	BILLY FELIPE TELLO MARIN		calle 16 No 39 A - 03	6086847260	felipe.tellomarin@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76544274	25/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.129.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Bolivia	Extranjero	Colom. exarator	Exonemado	ING	RET	TDE	TPE	TTP	UP	UPP	SEN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN											
1	CC 1121884302	TELLO MARIN BILLY FELIPE		59	0			N															230301	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS002	3.600.000	30	450.000	14-23	3.600.000	30	3	87.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Buscar...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	30/01/2026 11:22:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11/03/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	259.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	5/03/2026 11:39:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16/03/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.794.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	1/03/2026 10:51:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/04/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.794.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	21 días de tiempo transcurrido (12/05/2026 6:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13 días de tiempo transcurrido (21/05/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.794.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	1 minuto de tiempo transcurrido (3/06/2026 6:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.794.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	arl billy.pdf	arl billy.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	RP 22126 CTO 183-2026 DINFRA SUBSEG..pdf	RP 22126 CTO 183-2026 DINFRA SUBSEG..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 183 - 2025 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 1.pdf	CTO 183 - 2025 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Contrato No 183 - 2026 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 2 vb.pdf	Contrato No 183 - 2026 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 2 vb.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Contrato 183 - 2026 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 3 (1).pdf	Contrato 183 - 2026 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 3 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Contrato 183 - 2026 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 4 VB (1) (1).pdf	Contrato 183 - 2026 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 4 VB (1) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	USPEC-CTO-183-2026 (1).pdf	USPEC-CTO-183-2026 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>
