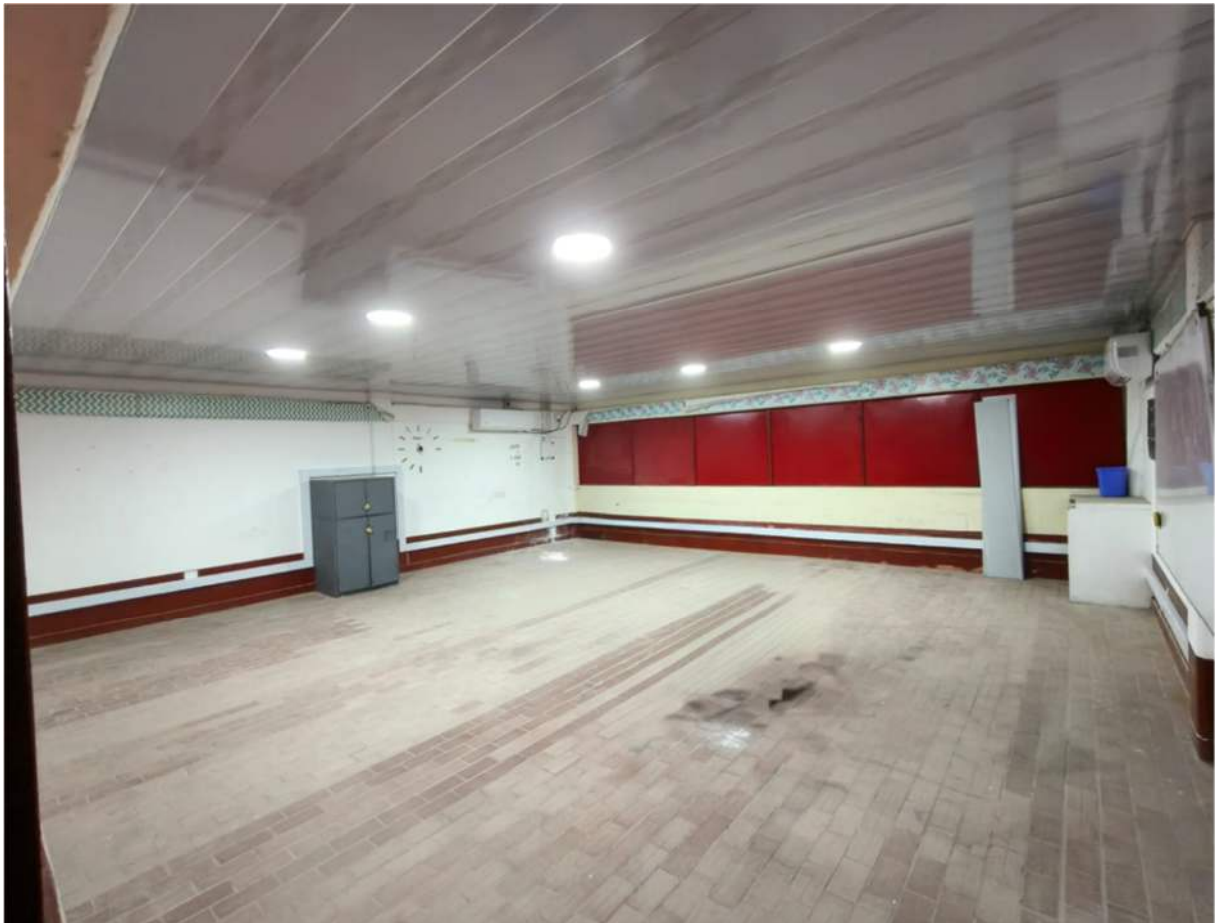


**CONTRATISTA DE OBRA
VEGA FORERO INGENIERIA SAS**



CONTRATO No IENSC-MC-O-07 del 28 de noviembre 2025

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYENTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

INFORME DE OBRA

ACTA FINAL

PERIODO DEL 21/03 AL 26/04/2026



@vegaforeroingenieria



www.vegaforeroingenieria.com



@vegaforeroingenieria



+(57) 321 211 84 47



Vegaforeroingenieria@gmail.com



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

1. INTRODUCCION

El presente informe de obra se elabora con el fin de dejar constancia del desarrollo, ejecución y culminación de las actividades correspondientes al contrato cuyo objeto es MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, durante el periodo comprendido entre el 21 de marzo al 26 de abril de 2026

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo **documentar y evidenciar de manera técnica, administrativa y financiera el desarrollo, ejecución y culminación de las actividades** realizadas en el marco del contrato de *MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA*, verificando el cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y la adecuada inversión de los recursos públicos, así como dejar soporte del avance físico y de las condiciones finales de la obra ejecutada.

1. OBLIGACIONES:

1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el anexo 1 "Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento" de la invitación pública y propuesta técnico-económica presentada.
2. Realizar el mantenimiento de acuerdo con las características y condiciones señaladas en el presupuesto según oferta económica.
3. Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.
4. Suscribir el acta de inicio con el supervisor una vez legalizado el contrato para su ejecución.
5. Constituir la póliza única de cumplimiento con los amparos exigidos.
6. Cumplir con las obligaciones ante al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.
7. Suscribir el acta de liquidación, previa acta de entrega para tramitar el respectivo pago.
8. Las demás que por naturaleza del objeto contractual surjan.

2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO.

El municipio de Coyaima, ubicado en el sur del departamento del Tolima, forma parte de la región del valle alto del río Magdalena y se encuentra dentro del área de influencia del valle del río Saldaña. Cuenta con una extensión aproximada de 667 km² y una población cercana a los 35.000 habitantes, distribuida mayoritariamente en el sector rural, lo que evidencia una marcada vocación agropecuaria, con actividades productivas orientadas principalmente a cultivos de pancoger, ganadería extensiva y economías propias de comunidades indígenas, predominantes en el territorio.

Desde el punto de vista geográfico, Coyaima se caracteriza por presentar altitudes que oscilan entre los 300 y 900 m s. n. m., con un relieve mayormente plano a ligeramente ondulado, propio de zonas de valle interandino. Estas condiciones generan un clima cálido seco, con temperaturas promedio entre los 26°C y 30°C, así como periodos de baja precipitación, lo cual incide directamente en las condiciones del suelo y en los criterios técnicos para el desarrollo de infraestructura. Los suelos predominantes corresponden a inceptisoles y entisoles, con niveles variables de fertilidad, susceptibles a procesos de erosión y compactación, lo que constituye un factor determinante en la planificación constructiva.

En términos hidrológicos, el municipio se encuentra influenciado por el río Saldaña y múltiples fuentes hídricas menores de carácter estacional, con un régimen de escorrentía que responde a las condiciones climáticas de la región. Esta situación implica la necesidad de considerar adecuadamente el manejo de aguas lluvias, drenajes y abastecimiento hídrico en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura.

Particularmente, la vereda Chinchín, ubicada en el sector de Buenos Aires del municipio de Coyaima, corresponde a un asentamiento rural con características propias de dispersión poblacional, limitado acceso a infraestructura y predominio de actividades agrícolas de subsistencia. En esta zona se localiza la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, escenario de intervención del presente proyecto, la cual cumple un papel fundamental en el desarrollo social y educativo de la comunidad. Su localización en un entorno rural con condiciones climáticas exigentes y limitaciones en servicios básicos resalta la importancia de las obras ejecutadas, orientadas a mejorar las condiciones físicas, funcionales y de confort del espacio educativo.



3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

Ítem	Descripción
Entidad contratante	Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
NIT entidad	809010059-1
Contratista	Vega Forero Ingeniería S.A.S
NIT	900.999.942-5
Representante legal	Jaime Alejandro Vega Forero
Tipo de contrato	Obra
Número de contrato	IENSC-MC-O-07
Fecha del contrato	28 de noviembre de 2025
Objeto	Mejoramiento de infraestructura educativa en el marco del plan de formación integral a través del proyecto del centro de interés: aula TIC segura y confortable, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
Modalidad de selección	Mínima cuantía
Valor inicial del contrato	\$26.298.893,57
Valor adición No 1	\$2.023.278,68
Valor adición No 2	\$ 11.126.127,75

Valor total del contrato	\$39'447.948,43
Plazo inicial	Treinta (30) días calendario
Prorroga	Treinta (30) días calendario
Plazo Final	Sesenta (60) días calendario.
Fecha de inicio	19 de diciembre de 2025
Fecha de suspensión	23 de diciembre de 2025
Fecha de reinicio	02 de marzo de 2026
Fecha acta de modificación y adición No 1	02 de marzo de 2026
Fecha acta de prórroga	27 de marzo de 2026
Fecha acta de modificación y adición No 2	16 de abril de 2026
Fecha final del contrato	26 de abril de 2026
Supervisor	Norma Faliría Rojas García – Docente
Póliza	Póliza No CHU 100063653 - Cumplimiento

4. ESTADO DE POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No	CHU 100063653		
ASEGURADORA:	Seguros Mundial.		
ANEXO:	Anexo 0: Legalización de contrato		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	28/11/2025	28/04/2026	\$ 2' 817.224,44
Prestaciones sociales	28/11/2025	28/12/2028	\$ 1'408.612,22
Calidad de servicio	28/11/2025	28/04/2026	\$ 5'634.448,88
Estabilidad de obra.	28/11/2025	28/12/2028	\$ 5'634.448,88
ANEXO:	Anexo 2: Acta de inicio		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	19/12/2025	19/05/2026	\$ 2' 817.224,44



@vegaforeroingenieria



www.vegaforeroingenieria.com



@vegaforeroingenieria



+(57) 321 211 84 47



Vegaforeroingenieria@gmail.com



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

Prestaciones sociales	19/12/2025	18/01/2029	\$ 1'408.612,22
Calidad de servicio	19/12/2025	19/05/2026	\$ 5'634.448,88
Estabilidad de obra.	19/12/2025	18/01/2029	\$ 5'634.448,88
ANEXO:	Anexo 3: Acta de reinicio		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimento	23/12/2025	25/07/2026	\$ 2' 817.224,44
Prestaciones sociales	23/12/2025	25/03/2029	\$ 1'408.612,22
Calidad de servicio	23/12/2025	25/07/2026	\$ 5'634.448,88
Estabilidad de obra.	23/12/2025	25/03/2029	\$ 5'634.448,88
ANEXO:	Anexo 4: Acta de Adición y modificación No 1		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimento	02/03/2026	25/07/2026	\$ 2' 832.217,23
Prestaciones sociales	02/03/2026	25/03/2029	\$ 1'416.108,61
Calidad de servicio	02/03/2026	25/07/2026	\$ 5'664.434,45
Estabilidad de obra.	25/03/2026	25/03/2030	\$ 5'664.434,45
ANEXO:	Anexo 5: Acta de Prorroga		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimento	27/03/2026	25/08/2026	\$ 2' 832.217,23
Prestaciones sociales	27/03/2026	25/04/2029	\$ 1'416.108,61
Calidad de servicio	27/03/2026	25/08/2026	\$ 5'664.434,45
Estabilidad de obra.	25/04/2026	25/04/2030	\$ 5'664.434,45
ANEXO:	Anexo 6: Acta de Adición y modificación No 2		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	



Cumplimento	16/04/2026	25/08/2026	\$ 3'944.833,00
Prestaciones sociales	16/04/2026	25/04/2029	\$ 1'972.415,00
Calidad de servicio	16/04/2026	25/08/2026	\$ 7'889.660,00
Estabilidad de obra.	25/04/2026	25/04/2030	\$ 7'889.660,00

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades principales:

AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE. TORNILLERIA, ACCESORIOS, PERFILES DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA (CORREAS, ANGULARES PERIMETRALES, PERFILES DE AMARRE) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA
- REFORZAMIENTO DE GABINETE TIPO BOVEDA ROBUSTO DE 1.5mX1mX1M CON ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS REFORZADAS TIPO CAJA FUERTE. EN LAMINA CAL. 16
- DESMONTE DE LAMPARA y VENTILADORES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 24W (INCLUYE LAMPARA LED)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE SWITCHE TRIPLE)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN PERFIL DE 8X4 COMO SOPORTE DE MALLA DE SEGURIDAD
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL 22 EN VENTANAS DE ACUERDO A MODULOS DE NAVE EXISTENTE (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA INSTITUCIONAL AMBAS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION)
- ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO, INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE DISTRIBUCION, POLO A TIERRA. varilla c. W. 2,40 ml
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE (INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)
- ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA EXISTENTE (INCLUYE PINTURA, Y CREACION DE CHISMOSA DE SEGURIDAD)

AULA DE INFORMATICA SEDE PRINCIPAL:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ETERBOARD LISTONES CRUDO DE 1,22mX2,44mX0,14mm (INC ACCESORIOS)
- ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO, INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



@vegaforeroingenieria



www.vegaforeroingenieria.com



@vegaforeroingenieria



+(57) 321 211 84 47



Vegaforeroingenieria@gmail.com



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
- SISTEMA DE POLO A TIERRA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)

DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE LAS PALMAS (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN CONCRETO E=10cm, CONCRETO DE 3000PSI
- CONSTRUCCION DE MURO EN TOLETE COMUN E=0.15m
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PARED, CALIDAD PRIMERA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA COCINA 0.5x0.35m CON SU RESPECTIVA GRIFERIA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA MESON, VARILLA DE 3/8

Las actividades se ejecutaron cumpliendo con las condiciones de calidad, seguridad y técnicas establecidas por la entidad contratante y bajo la supervisión designada.

6. AVANCE FISICO DE LA OBRA.

6.1 Cantidad ejecutada Acta parcial No 1

ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE CHENCHE BUENOS AIRES Y SEDE PRINCIPAL AULA DE INFORMATICA (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACION
1	AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION.	M2	60,4	53.69	Se realiza la elaboración de reja con espacios de 20x20 cm, anclando sobre muros. Se hace necesario una correa de soporte, se sigue trabajando para terminar con la instalación total
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO	M2	81.84	80	Se realiza instalación de teja de acuerdo a situación real, una vez desmontada la teja se observa que no es necesario realizar instalación de tejas de 5.20m, sino de 5m. incluyendo en el área total instalada. Se hace además el acondicionamiento del flanche existente.
INP 1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2	81.84	81,84	Se realiza desmonte de teja existente, que se encontraba en mal estado, con deformaciones evidentes.

6.2 Cantidad ejecutada Acta Parcial 2 (presente informe)

ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE CHENCHE BUENOS AIRES Y SEDE PRINCIPAL AULA DE INFORMATICA (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACION
1	AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION.	M2	60,4	6,71	Se realiza la elaboración de reja con espacios de 20x20 cm, anclando sobre muros. Se hace necesario una correa de soporte, se sigue trabajando para terminar con la instalación total Se realizo la cantidad total contratada una vez se suma lo realizado en el acta parcial No 1 y la presente acta, final No 2.
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE. TORNILLERIA, ACCESORIOS, PERFILES DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA (CORREAS, ANGULARES PERIMETRALES, PERFILES DE AMARRE) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA	M2	60,4	60,40	Se realizó el suministro e instalación de cielo raso en PVC en el área intervenida, incluyendo suministro de materiales, tornillería, accesorios y estructura metálica de soporte compuesta por correas, perfiles de amarre y angulares perimetrales. La actividad contempló nivelación, fijación de perfilera, instalación de láminas PVC, ajustes finales, limpieza del área intervenida y verificación de estabilidad y acabado, garantizando correcto funcionamiento y cumplimiento de especificaciones técnicas. Se realizo la cantidad total contratada.
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL.20 PARA VENTANA DE 2mx1.5m, INCLUYE CERRADURAS	M2	21	0,00	No se realizo actividad de acuerdo a que se reemplazo el item.
1.4	REFORZAMIENTO DE GABINETE TIPO BOVEDA ROBUSTO DE 1.5mX1mX1M CON ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS REFORZADAS TIPO CAJA FUERTE. EN LAMINA CAL. 16	GLOBAL	1	1,00	Se realizó el reforzamiento de gabinete tipo bóveda mediante suministro e instalación de estructura metálica de soporte y refuerzo, incorporando puertas reforzadas tipo caja fuerte elaboradas en lámina calibre 16. La actividad incluyó adecuación, corte, armado, soldadura, fijación, ajustes estructurales, acabados y verificación de resistencia y funcionamiento, garantizando



					estabilidad, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Adicional se instalo una "Chismosa" que permite dar mas seguridad a la bóveda.
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO	M2	60,4	0,00	Actividad que se realizo en el acta parcial No 1. Actividad realizada en su totalidad.
INP 1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2	81,84	0	Actividad que se realizo en el acta parcial No 1. Actividad realizada en su totalidad.
INP 2	DESMONTE DE LAMPARA y VENTILADORES	GL	1,00	1,00	Se realizó el desmonte de lámparas y ventiladores existentes en el área intervenida, incluyendo retiro cuidadoso de elementos, desconexión, desmontaje y disposición temporal del material retirado, garantizando condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores contempladas dentro del proyecto.
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 24W (INCLUYE LAMPARA LED)	UN	6,00	6,00	Se realizó el suministro e instalación de salida eléctrica para lámpara LED de 24W, incluyendo luminaria LED, conexiones, fijaciones, accesorios requeridos y pruebas básicas de funcionamiento. La actividad contempló montaje, conexión y verificación operativa, garantizando adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Se realizo antes de la instalación del cielo raso en PVC
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE SWITCHE TRIPLE)	UN	1,00	1,00	Se realizó el suministro e instalación de punto eléctrico, incluyendo switch triple, accesorios, conexiones y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. La actividad contempló tendido, conexión, fijación, pruebas operativas y verificación del sistema eléctrico instalado, garantizando condiciones seguras de operación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Para esto fue necesario realizar cableado



					eléctrico desde la caja de tacos hasta el punto indicado para su instalación.
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN PERFIL DE 8X4 COMO SOPORTE DE MALLA DE SEGURIDAD	M	15,56	15,56	Se realizó el suministro e instalación de perfiles metálicos tipo correa de sección 8x4, fijados sobre los muros existentes, con el fin de proporcionar un sistema adecuado de anclaje y soporte para la malla de seguridad. Esta solución fue implementada para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la malla, evitando intervenciones directas sobre la estructura principal existente y minimizando cualquier afectación a su comportamiento estructural. La actividad incluyó suministro de materiales, corte, ajuste, nivelación, fijación, soldadura, protección anticorrosiva y verificación final de la correcta instalación del sistema de soporte.
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL 22 EN VENTANAS DE ACUERDO A MODULOS DE NAVE EXISTENTE (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA INSTITUCIONAL AMBAS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION)	M2	15,31	15,31	Se realizó el suministro e instalación de lámina galvanizada calibre 22, ajustada a las dimensiones y módulos de las ventanas existentes de la nave. Previamente a su instalación, se efectuó la preparación de la superficie mediante la aplicación de pintura anticorrosiva y posteriormente pintura institucional color rojo por ambas caras, garantizando la protección del material frente a agentes ambientales y la uniformidad estética de la intervención. La fijación de las láminas se ejecutó mediante tornillería y elementos de anclaje adecuados, asegurando su correcta sujeción a la estructura existente de las ventanas. Posteriormente, se realizaron los ajustes necesarios en los encuentros entre láminas, ventanas y módulos estructurales, especialmente en las áreas correspondientes a las



					entradas de luz, con el fin de evitar filtraciones de agua, ingreso de polvo y espacios abiertos no deseados. Como acabado final, se ejecutó el resane y sellado de juntas y encuentros mediante repello, garantizando una adecuada terminación, mejorando la apariencia de la instalación y asegurando la protección de los puntos intervenidos. La actividad incluyó mano de obra, materiales, herramientas, equipos y limpieza final del área de trabajo.
INP 7	ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO, INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	1,00	Se realizó el suministro e instalación de la acometida eléctrica mediante cable antifraude trifilar 2x6+6 en aluminio, con una longitud de hasta 30 metros, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la alimentación eléctrica de la infraestructura intervenida. La actividad incluyó el tendido, fijación y protección del conductor, asegurando su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo con las normas técnicas vigentes para instalaciones eléctricas. Asimismo, se efectuó la instalación del soporte de llegada y de los elementos complementarios necesarios para la adecuada sujeción y conducción de la acometida, garantizando la estabilidad mecánica del sistema y la protección del cableado frente a esfuerzos, movimientos o condiciones ambientales que pudieran afectar su desempeño. Durante la ejecución se verificó la correcta conexión de los conductores, la continuidad del sistema y el cumplimiento de las condiciones de seguridad eléctrica requeridas. La actividad incluyó suministro de materiales, accesorios, conectores, elementos de

					fijación, mano de obra calificada, herramientas, equipos y pruebas básicas de funcionamiento, dejando la acometida debidamente instalada y operativa.
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	UN	1,00	1,00	Se realizó el suministro e instalación de una salida parcial bifásica mediante la implementación de una caja de distribución con capacidad para ocho (8) circuitos, destinada a la alimentación y protección de los equipos de aire acondicionado instalados o proyectados para la edificación. La actividad se ejecutó con el fin de disponer de circuitos independientes que garantizaran una adecuada distribución de cargas eléctricas y un funcionamiento seguro y eficiente de los equipos. La intervención incluyó el montaje de la caja de circuitos, la instalación de los breakers de protección requeridos según la capacidad de carga prevista, así como la organización y conexión de los conductores necesarios para la correcta operación del sistema. Se verificó la adecuada distribución de los circuitos, el correcto calibre de los elementos de protección y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para este tipo de instalaciones. Adicionalmente, se realizaron las conexiones, fijaciones y ajustes necesarios para dejar el sistema debidamente instalado, identificado y listo para su puesta en funcionamiento, garantizando la protección de los equipos de aire acondicionado frente a sobrecargas y cortocircuitos. La actividad incluyó materiales, accesorios, elementos de fijación, breakers, mano de obra especializada, herramientas, equipos y pruebas de funcionamiento.



INP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE DISTRIBUCION, POLO A TIERRA. varilla c. W. 2,40 ml	UN	1,00	1,00	Se realizó el suministro e instalación del sistema de puesta a tierra para el tablero de distribución eléctrica, mediante la hinc a instalación de una varilla tipo C.W. de 2,40 metros de longitud, con el propósito de proporcionar una trayectoria segura para la disipación de corrientes de falla y proteger tanto a los usuarios como a los equipos eléctricos conectados al sistema. La actividad comprendió la excavación y adecuación del punto de instalación, la hinc a de la varilla de puesta a tierra, la conexión mediante conductor apropiado al tablero de distribución y la instalación de los accesorios necesarios para garantizar una unión eléctrica segura, continua y de baja resistencia. Asimismo, se realizaron las verificaciones correspondientes para asegurar la correcta conexión entre el sistema de puesta a tierra y el tablero eléctrico. Con esta intervención se garantiza el adecuado funcionamiento de las protecciones eléctricas, la mitigación de riesgos por contactos indirectos y la protección de los equipos frente a sobretensiones o fallas eléctricas. La actividad incluyó suministro de materiales, conductor de puesta a tierra, conectores, varilla C.W. de 2,40 m, mano de obra especializada, herramientas, equipos y pruebas básicas de continuidad del sistema.
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE (INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE)	UN	8,00	8,00	Se realizó el suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble, en los puntos definidos dentro de la infraestructura intervenida, con el fin de garantizar la disponibilidad de conexiones

					eléctricas seguras y funcionales para la operación de equipos y dispositivos requeridos en el desarrollo de las actividades de la institución. La actividad comprendió la instalación del tomacorriente doble, incluyendo caja, conductores, accesorios de conexión, elementos de fijación y demás componentes necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo, se efectuaron las conexiones eléctricas correspondientes desde el circuito de alimentación existente, verificando la correcta polaridad, continuidad y ajuste de todos los elementos instalados. Durante la ejecución se realizaron las labores de montaje, fijación, conexión y pruebas de funcionamiento, garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y las buenas prácticas constructivas aplicables. La actividad incluyó suministro de materiales, tomacorriente doble, accesorios, mano de obra calificada, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida.
INP 11	SUMINISTRO E INTALACION DE CANALETA METALICA	M	30,00	28,80	Se realizó el suministro e instalación de canaleta metálica para la conducción, organización y protección del cableado eléctrico requerido en las áreas intervenidas, garantizando una distribución ordenada y segura de las redes eléctricas. La canaleta fue instalada en los recorridos definidos en obra, de acuerdo con las necesidades de la instalación y las condiciones físicas de la infraestructura existente. La actividad incluyó el trazado, corte, ajuste, nivelación y fijación de la canaleta metálica mediante los elementos de



					anclaje y soporte necesarios, asegurando su estabilidad mecánica y adecuada alineación. Asimismo, se efectuó la instalación de accesorios complementarios tales como uniones, tapas, terminales, curvas y demás elementos requeridos para garantizar la continuidad y protección del sistema. Una vez instalada la canaleta, se verificó su correcta fijación, capacidad de soporte y disposición para el alojamiento del cableado eléctrico, asegurando la protección de los conductores frente a impactos, manipulación indebida y condiciones ambientales propias del lugar de instalación. La actividad incluyó suministro de materiales, accesorios, elementos de fijación, mano de obra especializada, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida.
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)	UN	2,00	2,00	Se realizó el suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente de 220 voltios, destinada a la conexión y operación segura de equipos que requieren este nivel de tensión, tales como aires acondicionados y demás equipos de consumo especializado. La ubicación de los puntos fue ejecutada de acuerdo con los requerimientos funcionales del proyecto y las condiciones de la infraestructura existente. La actividad comprendió el suministro e instalación del tomacorriente de 220V, cajas de conexión, conductores, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo, se realizaron las conexiones al circuito correspondiente, verificando la compatibilidad de la tensión, la capacidad de carga y la correcta



					identificación de los conductores. Durante la ejecución se efectuaron labores de trazado, instalación, fijación, conexión y pruebas de funcionamiento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, las normas de seguridad eléctrica aplicables y los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). La actividad incluyó suministro de materiales, tomacorriente de 220V, accesorios, elementos de fijación, mano de obra calificada, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida.
INP 13	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA EXISTENTE (INCLUYE PINTURA, Y CREACION DE CHISMOSA DE SEGURIDAD)	UN	1,00	1,00	Se realizó el acondicionamiento integral de la puerta existente con el propósito de mejorar sus condiciones de funcionamiento, apariencia y seguridad. La actividad incluyó la preparación de la superficie mediante labores de limpieza, lijado y remoción de imperfecciones, permitiendo la adecuada adherencia del nuevo acabado. Posteriormente, se aplicó el sistema de pintura correspondiente, mejorando la protección de la puerta frente al desgaste y garantizando una apariencia uniforme acorde con las condiciones estéticas de la infraestructura intervenida. Adicionalmente, se efectuó el suministro e instalación de una manija nueva, reemplazando los elementos deteriorados y mejorando la operatividad del acceso. Como complemento de seguridad, se realizó el corte, adecuación e instalación de una chismosa o mirilla de seguridad, permitiendo la visualización del exterior sin necesidad de abrir la puerta, fortaleciendo las condiciones

					de control y seguridad del recinto. La actividad incluyó materiales, accesorios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida.
2	AULA DE INFORMATICA SEDE PRINCIPAL				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ETERBOARD LISTONES CRUDO DE 1,22mX2,44mX0,14mm (INC ACCESORIOS)	M2	1,925	1,925	Se realizó el suministro e instalación de placas de Eterboard de 1,22 m x 2,44 m y 14 mm de espesor, fijadas sobre la estructura de soporte correspondiente, con el fin de cubrir y cerrar las aberturas o luces existentes en el salón intervenido, mejorando las condiciones de seguridad, funcionalidad y presentación de los espacios. La actividad incluyó el corte, ajuste, nivelación y fijación de las placas mediante los accesorios y elementos de anclaje necesarios, garantizando una adecuada estabilidad y un correcto acople con los elementos constructivos existentes. Durante la instalación fue necesario realizar ajustes en los encuentros entre las placas y los muros, debido a las irregularidades propias de la construcción existente y a la necesidad de lograr un acabado continuo y uniforme. Adicionalmente, y con el propósito de obtener una terminación armónica y visualmente adecuada, se realizaron labores de resane y aplicación de estuco en las uniones entre muro y placa, eliminando espacios o aberturas que permitían el paso de la luz y afectaban la calidad estética de la intervención. Estas actividades complementarias permitieron mejorar significativamente el acabado final de la instalación, garantizando una apariencia homogénea y acorde con las



					condiciones requeridas para el espacio intervenido. La actividad incluyó suministro de materiales, accesorios, elementos de fijación, mano de obra especializada, herramientas, equipos y limpieza final del área de trabajo.
INP 14	ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO, INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,000	1,00	Se realizó el suministro e instalación de la acometida eléctrica mediante cable antifraude trifilar 2x6+6 en aluminio, con una longitud de hasta 30 metros, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la alimentación eléctrica de la infraestructura intervenida. La actividad incluyó el tendido, fijación y protección del conductor, asegurando su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo con las normas técnicas vigentes para instalaciones eléctricas. Asimismo, se efectuó la instalación del soporte de llegada y de los elementos complementarios necesarios para la adecuada sujeción y conducción de la acometida, garantizando la estabilidad mecánica del sistema y la protección del cableado frente a esfuerzos, movimientos o condiciones ambientales que pudieran afectar su desempeño. Durante la ejecución se verificó la correcta conexión de los conductores, la continuidad del sistema y el cumplimiento de las condiciones de seguridad eléctrica requeridas. La actividad incluyó suministro de materiales, accesorios, conectores, elementos de fijación, mano de obra calificada, herramientas, equipos y pruebas básicas de funcionamiento, dejando la acometida debidamente instalada y operativa.



INP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	UN	1,000	1,00	Se realizó el suministro e instalación de una salida parcial bifásica mediante la implementación de una caja de distribución con capacidad para ocho (8) circuitos, destinada a la alimentación y protección de los equipos de aire acondicionado instalados o proyectados para la edificación. La actividad se ejecutó con el fin de disponer de circuitos independientes que garantizaran una adecuada distribución de cargas eléctricas y un funcionamiento seguro y eficiente de los equipos. La intervención incluyó el montaje de la caja de circuitos, la instalación de los breakers de protección requeridos según la capacidad de carga prevista, así como la organización y conexión de los conductores necesarios para la correcta operación del sistema. Se verificó la adecuada distribución de los circuitos, el correcto calibre de los elementos de protección y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para este tipo de instalaciones. Adicionalmente, se realizaron las conexiones, fijaciones y ajustes necesarios para dejar el sistema debidamente instalado, identificado y listo para su puesta en funcionamiento, garantizando la protección de los equipos de aire acondicionado frente a sobrecargas y cortocircuitos. La actividad incluyó materiales, accesorios, elementos de fijación, breakers, mano de obra especializada, herramientas, equipos y pruebas de funcionamiento.
INP 16	SISTEMA DE POLO A TIERRA	UN	1,000	1,00	Se realizó el suministro e instalación del sistema de puesta a tierra para el tablero de distribución eléctrica, mediante la hinca e instalación de una varilla tipo C.W. de 2,40

					metros de longitud, con el propósito de proporcionar una trayectoria segura para la disipación de corrientes de falla y proteger tanto a los usuarios como a los equipos eléctricos conectados al sistema. La actividad comprendió la excavación y adecuación del punto de instalación, la hinca de la varilla de puesta a tierra, la conexión mediante conductor apropiado al tablero de distribución y la instalación de los accesorios necesarios para garantizar una unión eléctrica segura, continua y de baja resistencia. Asimismo, se realizaron las verificaciones correspondientes para asegurar la correcta conexión entre el sistema de puesta a tierra y el tablero eléctrico. Con esta intervención se garantiza el adecuado funcionamiento de las protecciones eléctricas, la mitigación de riesgos por contactos indirectos y la protección de los equipos frente a sobretensiones o fallas eléctricas. La actividad incluyó suministro de materiales, conductor de puesta a tierra, conectores, varilla C.W. de 2,40 m, mano de obra especializada, herramientas, equipos y pruebas básicas de continuidad del sistema.
INP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)	UN	1,000	1,00	Se realizó el suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente de 220 voltios, destinada a la conexión y operación segura de equipos que requieren este nivel de tensión, tales como aires acondicionados y demás equipos de consumo especializado. La ubicación de los puntos fue ejecutada de acuerdo con los requerimientos funcionales del proyecto y las condiciones de la infraestructura existente. La actividad comprendió el suministro e instalación del



					tomacorriente de 220V, cajas de conexión, conductores, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo, se realizaron las conexiones al circuito correspondiente, verificando la compatibilidad de la tensión, la capacidad de carga y la correcta identificación de los conductores. Durante la ejecución se efectuaron labores de trazado, instalación, fijación, conexión y pruebas de funcionamiento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, las normas de seguridad eléctrica aplicables y los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). La actividad incluyó suministro de materiales, tomacorriente de 220V, accesorios, elementos de fijación, mano de obra calificada, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida.
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE LAS PALMAS (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	
1	MESON				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN CONCRETO E=10cm, CONCRETO DE 3000PSI	M2	3,15	3,15	Se realizó el suministro, formateado, armado y fundido de una placa aérea en concreto de 3000 PSI y espesor de 10 cm, destinada a la construcción del mesón de cocina de la sede Las Palmas. La estructura fue ejecutada con el fin de proporcionar una superficie resistente, durable y apta para las actividades de preparación y manipulación de alimentos propias del funcionamiento de la institución. La actividad comprendió la adecuación de la estructura de soporte, la instalación de la formaleta requerida para la conformación del mesón, el

					vaciado del concreto, su vibrado, nivelación y acabado, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones definidas para el elemento. Asimismo, se verificó la correcta alineación, nivel y estabilidad de la estructura antes y durante el proceso de fundición. Posteriormente, se realizaron las labores de desencofrado y curado del concreto, con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo de la resistencia mecánica del elemento y garantizar su durabilidad en condiciones normales de servicio. Se efectuaron además los ajustes y resanes menores necesarios para obtener una superficie uniforme y apta para recibir los acabados finales contemplados en el proyecto. La actividad incluyó suministro de concreto de 3000 PSI, formaletería, materiales complementarios, mano de obra especializada, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida, dejando el mesón completamente construido, estable y en condiciones adecuadas para su utilización.
1.2	CONSTRUCCION DE MURO EN TOLETE COMUN E=0.15m	M2	1,45	0,96	Se realizó la construcción de muros en tolete común de 15 cm de espesor, destinados a servir como elementos de soporte para la placa aérea que conforma el mesón de cocina de la sede Las Palmas. Estos muretes fueron ejecutados con el propósito de garantizar una adecuada capacidad portante, estabilidad estructural y distribución de cargas del elemento superior. La actividad comprendió el replanteo, nivelación y ubicación de los muretes de acuerdo con las dimensiones requeridas para el mesón, así como el suministro e instalación de unidades de mampostería en tolete común,

					asentadas con mortero de pega y verificando permanentemente su alineación, plomo y nivel. Durante la ejecución se realizaron los ajustes necesarios para asegurar la correcta geometría de los apoyos y su adecuada integración con los demás elementos constructivos del mesón. Asimismo, se efectuó el llenado y acabado de juntas, garantizando la estabilidad y resistencia de la mampostería construida. Estos muros constituyen la estructura de apoyo sobre la cual se soporta la placa aérea de concreto de 10 cm de espesor, permitiendo la conformación de un mesón sólido, funcional y durable para las actividades desarrolladas en la cocina de la institución. La actividad incluyó suministro de materiales, mortero de pega, unidades de mampostería, mano de obra, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida.
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PARED, CALIDAD PRIMERA	M2	6,3	10,08	Se realizó el suministro e instalación de baldosa para pared de calidad primera como acabado final del mesón de cocina construido en la sede Las Palmas. La actividad comprendió el revestimiento tanto de la placa aérea de concreto fundida como de los muretes de mampostería construidos como elementos de soporte, con el fin de proporcionar una superficie de fácil limpieza, resistente a la humedad y adecuada para las actividades propias del área de cocina. Previamente a la instalación, se verificó el estado, nivelación y condiciones de las superficies de concreto y mampostería, efectuando los ajustes necesarios para garantizar una adecuada adherencia del revestimiento. Posteriormente, se realizó la colocación de las baldosas mediante pegante



					especializado, respetando la alineación, nivelación y modulación requerida para obtener un acabado uniforme y estéticamente agradable. Una vez instalada la baldosa, se ejecutó el emboquillado de juntas y la limpieza general de las superficies, garantizando un acabado continuo, higiénico y acorde con las condiciones de uso del espacio. La intervención permitió proteger los elementos constructivos del mesón frente a la humedad, facilitar las labores de mantenimiento y mejorar la apariencia general del área intervenida. La actividad incluyó suministro de baldosas de calidad primera, pegante, boquilla, materiales complementarios, mano de obra especializada, herramientas, equipos y limpieza final del área de trabajo.
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA COCINA 0.5x0.35m CON SU RESPECTIVA GRIFERIA	UND	1	1,00	Se realizó el suministro e instalación de lavaplatos para cocina de dimensiones aproximadas de 0,50 m x 0,35 m, integrado al mesón construido en la sede Las Palmas, con el propósito de dotar el área de cocina de un punto adecuado para el lavado de utensilios, elementos de preparación de alimentos y demás actividades propias del servicio. La actividad comprendió el replanteo y adecuación del espacio destinado para la instalación, el corte y ajuste del mesón según las dimensiones del lavaplatos, así como la correcta fijación del elemento, garantizando su estabilidad y funcionalidad. Posteriormente, se realizó el suministro e instalación de la grifería correspondiente, verificando su adecuado funcionamiento y estanqueidad. Asimismo, se ejecutaron las conexiones hidráulicas y



					sanitarias necesarias para garantizar el correcto suministro y evacuación de agua, incluyendo los accesorios requeridos para su puesta en funcionamiento. Se realizaron pruebas de operación para verificar la ausencia de fugas y el correcto desempeño del sistema instalado. La actividad incluyó suministro de lavaplatos, grifería, accesorios hidráulicos y sanitarios, elementos de fijación, materiales complementarios, mano de obra especializada, herramientas, equipos y limpieza final del área intervenida, dejando el sistema completamente instalado y en óptimas condiciones de funcionamiento.
INP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA MESON, VARILLA DE 3/8	KG	21,862	21,86	Se realizó el suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo en varilla corrugada de 3/8", utilizado como refuerzo estructural de la placa aérea de concreto que conforma el mesón de cocina de la sede Las Palmas. La instalación de este acero tuvo como finalidad garantizar la capacidad resistente del elemento, controlar la aparición de fisuras y asegurar un adecuado comportamiento estructural frente a las cargas de servicio. La actividad comprendió la medición, corte y armado de las varillas de acuerdo con las dimensiones del mesón, así como su amarre y posicionamiento dentro de la formaleta, garantizando los recubrimientos mínimos y la correcta distribución del refuerzo antes del proceso de fundición. Durante la ejecución se verificó la adecuada separación y fijación de las varillas para evitar desplazamientos durante el vaciado del concreto, asegurando que el acero



				quedara completamente embebido dentro de la placa aérea. Este refuerzo estructural permitió proporcionar la resistencia necesaria al mesón y garantizar su estabilidad y durabilidad a lo largo de su vida útil. La actividad incluyó suministro de varilla corrugada de 3/8", corte, figuración, amarre con alambre recocido, mano de obra especializada, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para la correcta instalación del acero de refuerzo previo a la fundición de la placa de concreto.
--	--	--	--	---

7. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO
1	AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES			
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION.	M2	60,4	\$ 141.906,31
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE. TORNILLERIA, ACCESORIOS, PERFILES DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA (CORREAS, ANGULARES PERIMETRALES, PERFILES DE AMARRE) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA	M2	60,4	\$ 85.626,56
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL.20 PARA VENTANA DE 2mx1.5m, INCLUYE CERRADURAS	M2	21	\$ 74.149,09
1.4	REFORZAMIENTO DE GABINETE TIPO BOVEDA ROBUSTO DE 1.5mX1mX1M CON ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS REFORZADAS TIPO CAJA FUERTE. EN LAMINA CAL. 16	GLOBAL	1	\$ 1.764.000,03



1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO	M2	60,4	\$	56.722,71
INP 1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2	81,84	\$	6.000,00
INP 2	DESMONTE DE LAMPARA y VENTILADORES	GL	1,00	\$	100.000,00
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 24W (INCLUYE LAMPARA LED)	UN	6,00	\$	125.460,65
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE SWITCHE TRIPLE)	UN	1,00	\$	119.510,85
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN PERFIL DE 8X4 COMO SOPORTE DE MALLA DE SEGURIDAD	M	15,56	\$	32.000,00
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL 22 EN VENTANAS DE ACUERDO A MODULOS DE NAVE EXISTENTE (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA INSTITUCIONAL AMBAS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION)	M2	15,31	\$	86.614,00
INP 7	ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO, INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$	969.504,55
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	UN	1,00	\$	959.063,68
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE DISTRIBUCION, POLO A TIERRA. varilla c. W. 2,40 ml	UN	1,00	\$	535.706,00
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE (INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE)	UN	8,00	\$	76.020,52
INP 11	SUMINISTRO E INTALACION DE CANALETA METALICA	M	30,00	\$	56.000,00
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)	UN	2,00	\$	94.531,73
INP 13	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA EXISTENTE (INCLUYE PINTURA, Y CREACION DE CHISMOSA DE SEGURIDAD)	UN	1,00	\$	400.000,00
2	AULA DE INFORMATICA SEDE PRINCIPAL				

2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ETERBOARD LISTONES CRUDO DE 1,22mX2,44mX0,14mm (INC ACCESORIOS)	M2	1,925	\$ 202.625,25
INP 14	ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO, INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,000	\$ 969.504,55
INP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	UN	1,000	\$ 959.063,68
INP 16	SISTEMA DE POLO A TIERRA	UN	1,000	\$ 535.706,00
INP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)	UN	1,000	\$ 94.531,73
COSTO DIRECTO DE OBRA (A)				
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE LAS PALMAS (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	MESON			
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN CONCRETO E=10cm, CONCRETO DE 3000PSI	M2	3,15	\$ 83.910,52
1.2	CONSTRUCCION DE MURO EN TOLETE COMUN E=0.15m	M2	1,45	\$ 142.877,88
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PARED, CALIDAD PRIMERA	M2	6,3	\$ 84.070,50
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA COCINA 0.5x0.35m CON SU RESPECTIVA GRIFERIA	UND	1	\$ 272.099,03
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2".	UND	1	\$ 37.386,09
INP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA MESON, VARILLA DE 3/8	KG	21,862	\$ 6.500,00

Con corte al 26 de abril de 2026, la obra correspondiente al contrato se encuentra ejecutada en un 100% de avance físico con un avance financiero del 99.80% de avance financiero.

Saldo a favor de la entidad: \$ 79.994,46

CONCLUSIONES

1. La obra fue ejecutada dentro de los plazos contractuales establecidos, cumpliendo oportunamente con las actividades programadas y permitiendo la entrega de los espacios intervenidos en las condiciones previstas por la entidad.
2. Se logró la ejecución del **100% de las actividades contempladas en el contrato inicial**, dando cumplimiento al objeto contractual y a los alcances definidos para el proyecto, garantizando la funcionalidad y el mejoramiento de las áreas intervenidas.
3. Durante la ejecución de las obras fue necesario desarrollar algunas actividades complementarias que, aunque no se encontraban expresamente contempladas dentro de las cantidades o actividades contratadas, resultaban indispensables para garantizar una adecuada terminación de los trabajos y la correcta funcionalidad de los elementos construidos.
4. Dentro de estas actividades complementarias ejecutadas sin costo adicional para la entidad se encuentra la **aplicación de estuco en las uniones entre los muros y las placas de Eterboard**, labor que permitió obtener acabados uniformes, eliminar espacios por donde ingresaba la luz y mejorar significativamente la presentación final de los elementos instalados.
5. Asimismo, se ejecutó la **adecuación del punto de desagüe para el mesón de la cocina de la sede Las Palmas**, actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del lavaplatos instalado y la adecuada evacuación de las aguas residuales generadas durante su uso.
6. De igual manera, en una de las sedes de la institución educativa se realizó el **suministro e instalación de un tomacorriente doble sobre un punto eléctrico existente**, actividad que no hacía parte de las obligaciones contractuales ni de la red eléctrica ejecutada dentro del presente contrato. Sin embargo, considerando que dicho punto se encontraba expuesto y representaba un posible riesgo para los estudiantes y demás usuarios de la institución, el contratista procedió a instalar el tomacorriente doble y realizar las adecuaciones necesarias para dejar el punto en condiciones seguras de uso, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de seguridad eléctrica de la sede educativa sin generar costos adicionales para la entidad.
7. Las actividades ejecutadas permitieron mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, salubridad y confort de los espacios intervenidos, beneficiando directamente a la comunidad educativa y garantizando una mayor durabilidad de las obras realizadas.
8. Finalmente, se deja constancia de que los trabajos fueron ejecutados siguiendo las buenas prácticas constructivas, empleando materiales adecuados y garantizando la calidad requerida para el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos intervenidos.
9. Las actividades complementarias ejecutadas por el contratista evidencian el compromiso con la calidad, funcionalidad y seguridad de las obras, priorizando la correcta terminación de los espacios intervenidos y el bienestar de la comunidad educativa por encima de los alcances estrictamente contratados.



JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R.L DE VEGA FORERO INGENIERIA SAS



@vegaforeroingenieria



+(57) 321 211 84 47



www.vegaforeroingenieria.com



Vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se anexa el registro fotográfico:





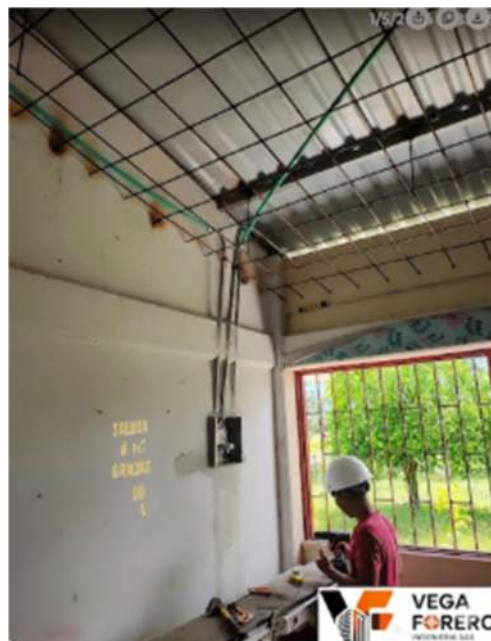












@vegaforeroingenieria



+(57) 321 211 84 47



www.vegaforeroingenieria.com



Vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila





@vegaforeroingenieria



+(57) 321 211 84 47



www.vegaforeroingenieria.com



Vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila



ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. IENSC-MC-O-07 DE 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

En el municipio de Coyaima, Tolima, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron por una parte la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, identificada con NIT 809010059-1, representada para efectos de la supervisión contractual por la señora NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA, en calidad de Supervisora del Contrato y de la representante legal la señora ARISALI AGUJA MALAMBO en calidad de RECTORA, y por la otra la sociedad VEGA FORERO INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT 900.999.942-5, representada legalmente por el ingeniero JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA del Contrato de Obra No. IENSC-MC-O-07 de 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Descripción
Entidad contratante	Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
NIT entidad	809010059-1
Contratista	Vega Forero Ingeniería S.A.S
NIT	900.999.942-5
Representante legal	Jaime Alejandro Vega Forero
Tipo de contrato	Obra
Número de contrato	IENSC-MC-O-07
Fecha del contrato	28 de noviembre de 2025
Objeto	Mejoramiento de infraestructura educativa en el marco del plan de formación integral a través del proyecto del centro de interés: aula TIC segura y confortable, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
Modalidad de selección	Mínima cuantía
Valor inicial del contrato	\$26.298.893,57
Valor adición No 1	\$2.023.278,68
Valor adición No 2	\$ 11.126.127,75
Valor total del contrato	\$39'448.300,00
Plazo inicial	Treinta (30) días calendario



@vegaforeroingenieria



+(57) 321 211 84 47



www.vegaforeroingenieria.com



Vegaforeroingenieria@gmail.com



@vegaforeroingenieria



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

Prorroga	Treinta (30) días calendario
Plazo Final	Sesenta (60) días calendario.
Fecha de inicio	19 de diciembre de 2025
Fecha de suspensión	23 de diciembre de 2025
Fecha de reinicio	02 de marzo de 2026
Fecha acta de modificación y adición No 1	02 de marzo de 2026
Fecha acta de prórroga	27 de marzo de 2026
Fecha acta de modificación y adición No 2	16 de abril de 2026
Fecha final del contrato	26 de abril de 2026
Supervisor	Norma Faliria Rojas García – Docente
Póliza	Póliza No CHU 100063653 - Cumplimiento

3. RECIBO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

La Supervisión del Contrato deja constancia que el contratista VEGA FORERO INGENIERÍA S.A.S. ejecutó satisfactoriamente las actividades previstas en el contrato principal, las modificaciones contractuales, adiciones e ítems no previstos debidamente aprobados, desarrollando entre otras las siguientes intervenciones:

- Mejoramiento integral del Aula TIC de la sede Chenche Buenos Aires.
- Instalación de cielo raso en PVC.
- Construcción e instalación de sistema de reja de seguridad.
- Instalación de luminarias LED y adecuaciones eléctricas.
- Construcción y adecuación de acometidas eléctricas, tableros, circuitos bifásicos y sistemas de puesta a tierra.
- Adecuación de puertas y elementos de seguridad.
- Instalación de láminas metálicas de protección en ventanas.
- Adecuaciones en Aula TIC de la sede principal.
- Construcción de mesón de cocina en la sede Las Palmas, incluyendo estructura, enchape, lavaplatos, grifería y elementos complementarios.

Una vez realizada la inspección física de las obras ejecutadas, se verificó que las mismas fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas, cumpliendo con los requisitos de calidad, funcionalidad y seguridad exigidos por la Institución Educativa.

4. ESTADO FINAL DE LA EJECUCIÓN

La Supervisión certifica que:

- a) El objeto contractual fue ejecutado en su totalidad.

- b) Las cantidades de obra contratadas y aprobadas mediante modificaciones fueron ejecutadas conforme a las actas de obra y al informe final presentado por el contratista.
- c) Las obras se encuentran terminadas, funcionales y en condiciones adecuadas para su utilización por parte de la Institución Educativa.
- d) No se evidencian observaciones técnicas pendientes que impidan el recibo final de la obra.

5. ENTREGA DE LA OBRA

El contratista hace entrega formal de las obras ejecutadas a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, quien las recibe a satisfacción mediante la presente acta, sin perjuicio de las garantías de estabilidad, calidad y demás amparos constituidos a través de la póliza de cumplimiento vigente.

6. GARANTÍAS

Las obras entregadas quedan amparadas por las garantías constituidas por el contratista dentro de la póliza de cumplimiento No. CHU 100063653 expedida por Seguros Mundial, incluyendo los amparos de calidad del servicio y estabilidad de la obra, conforme a las vigencias contractualmente aprobadas.

7. CONSTANCIA

En señal de aceptación y conformidad, las partes suscriben la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE



ARISALÍ AGUJA MALAMBO
Rectora
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen



NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA
Supervisora del Contrato
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen


POR EL CONTRATISTA



JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
Representante Legal
VEGA FORERO INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.999.942-5

ACTA FINAL DE OBRA														
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYENTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.														
COYAIMA TOLIMA														
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NIT: 809010059-1		NUMERO DE CONTRATO	12/SC-MC-0-07	FECHA DE ACTA DE INICIO	19/12/2025	FECHA DE REINICIO	2/03/2026	VALOR ADICION	\$ 13.149.406,43	VALOR PRESTENTE ACTA	\$ 14.990.369,33	VALOR PRESTENTE ACTA	\$ 39.368.305,54	FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATISTA: VEGA FORERO INGENIERIA SAS 900.999.942-5		NIT: FECHA DE SUSCRIPCION	28/11/2025	FECHA SUSPENSION	23/12/2025	VALOR INICIAL	\$ 26.298.893,57	VALOR ACTUAL	\$ 39.448.300,00	VALOR POR EJECUTAR	\$ 54.438.669,33	VALOR POR EJECUTAR	\$ 79.994,45	26/04/2026
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE CHENCHE BUENOS AIRES Y SEDE PRINCIPAL AULA DE INFORMATICA (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de balance No 2)			ACTA PARCIAL No 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		
1	AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES													
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION.	M2	60,4	\$ 141.906,31	\$ 8.571.140,87	60,40	\$ 141.906,31	\$ 8.571.140,87	53,69	\$ 7.619.515,62	6,71	\$ 951.625,25	60,40	\$ 8.571.140,87
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE. TORNILLERIA, ACCESORIOS, PERFILES DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA (CORREAS, ANGULARES PERIMETRALES, PERFILES DE AMARRE) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA	M2	60,4	\$ 85.626,56	\$ 5.171.843,95	60,40	\$ 85.626,56	\$ 5.171.843,95	0,00	\$ -	60,40	\$ 5.171.843,95	60,40	\$ 5.171.843,95
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL.20 PARA VENTANA DE 2mx1.5m. INCLUYE CERRADURAS	M2	21	\$ 74.149,09	\$ 1.557.130,94	0,00	\$ 74.149,09	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.4	REFORMAZAMIENTO DE GABINETE TIPO BOVEDA ROBUSTO DE 1.5mX1mX1M CON ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS REFORZADAS TIPO CAJA FUERTE. EN LAMINA CAL. 16	GLOBAL	1	\$ 1.764.000,03	\$ 1.764.000,03	1,00	\$ 1.764.000,03	\$ 1.764.000,03	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.764.000,03	1,00	\$ 1.764.000,03
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO	M2	60,4	\$ 56.722,71	\$ 3.426.051,66	80,00	\$ 56.722,71	\$ 4.537.816,77	80,00	\$ 4.537.816,77	0,00	\$ -	80,00	\$ 4.537.816,77
INP 1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2				81,84	\$ 6.000,00	\$ 491.040,00	81,84	\$ 491.040,00	0	\$ -	81,84	\$ 491.040,00
INP 2	DESMONTE DE LAMPARA y VENTILADORES	GL				1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 24W (INCLUYE LAMPARA LED)	UN				6,00	\$ 125.460,65	\$ 752.763,90	0,00	\$ -	6,00	\$ 752.763,90	6,00	\$ 752.763,90
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE SWITCHE TRIPLE)	UN				1,00	\$ 119.510,85	\$ 119.510,85	0,00	\$ -	1,00	\$ 119.510,85	1,00	\$ 119.510,85
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN PERFIL DE 8X4 COMO SOPORTE DE MALLA DE SEGURIDAD	M				15,56	\$ 32.000,00	\$ 497.920,00	0,00	\$ -	15,56	\$ 497.920,00	15,56	\$ 497.920,00
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL. 22 EN VENTANAS DE ACUERDO A MODULOS DE NAVE EXISTENTE (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA INSTITUCIONAL AMBAS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION)	M2				15,31	\$ 86.614,00	\$ 1.326.060,27	0,00	\$ -	15,31	\$ 1.326.060,27	15,31	\$ 1.326.060,27
INP 7	ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO. INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN				1,00	\$ 969.504,55	\$ 969.504,55	0,00	\$ -	1,00	\$ 969.504,55	1,00	\$ 969.504,55
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	UN				1,00	\$ 959.063,68	\$ 959.063,68	0,00	\$ -	1,00	\$ 959.063,68	1,00	\$ 959.063,68
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE DISTRIBUCION. POLO A TIERRA. varilla c. W. 2,40 ml	UN				1,00	\$ 535.706,00	\$ 535.706,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 535.706,00	1,00	\$ 535.706,00
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE (INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE)	UN				8,00	\$ 76.020,52	\$ 608.164,16	0,00	\$ -	8,00	\$ 608.164,16	8,00	\$ 608.164,16
INP 11	SUMINISTRO E INTALACION DE CANALETA METALICA	M				30,00	\$ 56.000,00	\$ 1.680.000,00	0,00	\$ -	28,80	\$ 1.612.800,00	28,80	\$ 1.612.800,00
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)	UN				2,00	\$ 94.531,73	\$ 189.063,45	0,00	\$ -	2,00	\$ 189.063,45	2,00	\$ 189.063,45
INP 13	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA EXISTENTE (INCLUYE PINTURA, Y CREACION DE CHISMOSA DE SEGURIDAD)	UN				1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 400.000,00	1,00	\$ 400.000,00
2	AULA DE INFORMATICA SEDE PRINCIPAL													
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ETHERBOARD LISTONES CRUDO DE 1.22mX2.44mX0.14mm (INC ACCESORIOS)	M2	1,925	\$ 202.625,25	\$ 390.053,62	1,925	\$ 202.625,25	\$ 390.053,62	0,00	\$ -	1,925	\$ 390.053,62	1,93	\$ 390.053,62
INP 14	ACOMETIDA ELECTRICA HASTA 30m EN CABLE ANTIFRAUDE TRIFILIAR 2x6+6 EN ALUMINIO. INCLUYE SOPORTE DE LLEGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN				1,000	\$ 969.504,55	\$ 969.504,55	0,00	\$ -	1,00	\$ 969.504,55	1,00	\$ 969.504,55
INP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL BIFASICA CAJA DE CIRCUITOS (8 CIRCUITOS) INCLUYE BREAKERS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	UN				1,000	\$ 959.063,68	\$ 959.063,68	0,00	\$ -	1,00	\$ 959.063,68	1,00	\$ 959.063,68
INP 16	SISTEMA DE POLO A TIERRA	UN				1,000	\$ 535.706,00	\$ 535.706,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 535.706,00	1,00	\$ 535.706,00
INP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V (INCLUYE TOMACORRIENTE)	UN				1,000	\$ 94.531,73	\$ 94.531,73	0,00	\$ -	1,00	\$ 94.531,73	1,00	\$ 94.531,73
COSTO DIRECTO DE OBRA (A)					\$ 20.880.221,08			\$ 31.622.458,05		\$ 12.648.372,39		\$ 18.906.885,66		\$ 31.555.258,05

ACTA FINAL DE OBRA														
 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYENTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.														
COYAIMA TOLIMA														
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NIT: 809010059-1		NUMERO DE CONTRATO	IENSC-MC-O-07	FECHA DE ACTA DE INICIO	19/12/2025	FECHA DE REINICIO	2/03/2026	VALOR ADICION	\$ 13.149.406,43	VALOR PRESTENTE ACTA	\$ 14.990.369,33	VALOR PRESTENTE ACTA	\$ 39.368.305,54	FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATISTA: VEGA FORERO INGENIERIA SAS 900.999.942-5		NIT: FECHA DE SUSCRIPCION	28/11/2025	FECHA SUSPENSION	23/12/2025	VALOR INICIAL	\$ 26.298.893,57	VALOR ACTUAL	\$ 39.448.300,00	VALOR POR EJECUTAR	\$ 54.438.669,33	VALOR POR EJECUTAR	\$ 79.994,45	26/04/2026
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE CHENCHE BUENOS AIRES Y SEDE PRINCIPAL AULA DE INFORMATICA (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de balance No 2)			ACTA PARCIAL No 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE LAS PALMAS (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	MESON													
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN CONCRETO E=10cm, CONCRETO DE 3000PSI	M2	3,15	\$ 83.910,52	\$ 264.318,12	3,150	\$ 83.910,52	\$ 264.318,12	0,00	\$ -	3,15	\$ 264.318,12	3,15	\$ 264.318,12
1.2	CONSTRUCCION DE MURO EN TOLETE COMUN E=0.15m	M2	1,45	\$ 142.877,88	\$ 206.458,53	0,955	\$ 142.877,88	\$ 136.448,37	0,00	\$ -	0,96	\$ 136.448,37	0,96	\$ 136.448,37
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PARED, CALIDAD PRIMERA	M2	6,3	\$ 84.070,50	\$ 529.644,15	10,084	\$ 84.070,50	\$ 847.727,29	0,00	\$ -	10,08	\$ 847.430,65	10,08	\$ 847.430,65
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA COCINA 0.5x0.35m CON SU RESPECTIVA GRIFERIA	UND	1	\$ 272.099,03	\$ 272.099,03	1,000	\$ 272.099,03	\$ 272.099,03	0,00	\$ -	1,00	\$ 272.099,03	1,00	\$ 272.099,03
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2".	UND	1	\$ 37.386,09	\$ 37.386,09	0,000	\$ 37.386,09	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
INP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA MESON, VARILLA DE 3/8	KG				21,862	\$ 6.500,00	\$ 142.105,60	0,00	\$ -	21,86	\$ 142.105,60	21,86	\$ 142.105,60
COSTO DIRECTO DE OBRA (B)					\$ 1.309.905,93			\$ 1.662.698,42		\$ -		\$ 1.662.401,77		\$ 1.662.401,77
COSTO DIRECTO DE OBRA (A+B)					\$ 22.190.127,02			\$ 33.285.156,47		\$ 12.648.372,39		\$ 20.569.287,43		\$ 33.217.659,83
			A	13,52%	\$ 2.999.260,20			\$ 4.498.885,70		\$ 1.709.578,32		\$ 2.780.184,41		\$ 4.489.762,73
			I	1%	\$ 221.901,27			\$ 332.851,56		\$ 126.483,72		\$ 205.692,87		\$ 332.176,60
			U	4%	\$ 887.605,08			\$ 1.331.406,26		\$ 505.934,90		\$ 822.771,50		\$ 1.328.706,39
COSTO TOTAL DE MEJORAMIENTO					\$ 26.298.893,57			\$ 39.448.300,00		\$ 14.990.369,33		\$ 24.377.936,21		\$ 39.368.305,54
OBSERVACIONES:														
VALOR DE LA PRESENTE ACTA: VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MCTE. (\$24'377.936,21)														
SALDO SIN EJECUTAR a favor de la entidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATROS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$79.994,46)														


 JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
 R.L. VEGA FORERO INGENIERIA SAS


 ARISALI AGUJA MALAMBO
 RECTORA


 NORMA FALIRIA ROJAS GARCIA
 SUPERVISION

Certificado Bancario

Martes, 14 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VEGA FORERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900999942, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45368182811	2016/11/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO identificado con cedula de ciudadanía No. 1'094.914.167 de Pitalito, Huila , en mi condición de contadora de VEGA FORERO INGENIERIA S.A.S. identificada con el NIT 900.999.942 – 5, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud —EPS— los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales —ARP— las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF— y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—.

En constancia, se firma en Pitalito – Huila, a los 14 días del mes de abril de 2026

JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R.L. VEGA FORERO INGENIERIA S.A.S



+(57) 321 211 84 47



@vegaforeroingenieria



Vegaforeroingenieria@gmail.com



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

No. PÓLIZA	CHU-100063653	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	533155820	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 19/12/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 26/04/2030	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	VEGA FORERO INGENIERIA SAS					No. DOC. IDENTIDAD	900.999.942-5
DIRECCIÓN	CALLE 7 CRA 1 A ESQUIN A					TELÉFONO	3162914759
ASEGURADO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN					No. DOC. IDENTIDAD	809.010.059-1
DIRECCIÓN	VEREDA CHENCHE BUENOS AIRES					TELÉFONO	3120000000
BENEFICIARIO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN					No. DOC. IDENTIDAD	809.010.059-1
DIRECCIÓN	VEREDA CHENCHE BUENOS AIRES					TELÉFONO	3120000000

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL CON FECHA DEL 26 DE ABRIL DE 2026, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IENSC-MC-O-07 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.


NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/04/2026	24:00 Horas Del 25/08/2026	3.944.830,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/04/2026	24:00 Horas Del 25/04/2029	1.972.415,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 16/04/2026	24:00 Horas Del 25/08/2026	7.889.660,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/04/2026	24:00 Horas Del 26/04/2030	7.889.660,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 21.696.565,00	

INTERMEDIARIOS		TIPO		% PARTICIPACIÓN	
MARIA JIMENA LIZCANO ZAMBRANO		AGENTES		100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO					
COMPAÑÍA		TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO		DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/06/2026			

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CHU-100063653	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	533155820	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/12/2025	24:00 Horas Del	26/04/2030	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100063653** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **VEGA FORERO INGENIERIA SAS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN / INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**, expedida por la Compañía en **09/06/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **09** días del mes **JUNIO** del año **2026**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

533155820

Fecha de Facturación

09/06/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

CHU-100063653

Periodo Facturado

19/12/2025

26/04/2030

Fecha Límite de Pago

09/07/2026

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VEGA FORERO INGENIERIA SAS

CALLE 7 CRA 1 A ESQUIN A

900.999.942

Intermediario

MARIA JIMENA LIZCANO

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

533155820

Fecha de Facturación

09/06/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

CHU-100063653

Periodo Facturado

19/12/2025

26/04/2030

Fecha Límite de Pago

09/07/2026

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VEGA FORERO INGENIERIA SAS

CALLE 7 CRA 1 A ESQUIN A

900.999.942

Intermediario

MARIA JIMENA LIZCANO

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000533155820(3900)000000000000(96)20260709

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990533155820(3900)000000000000(96)20260709

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	163681721	368443722	05/06/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900999942**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.51.91.34**

Su transacción fue **APROBADA** por la
Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 98,620.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 98,620.00	COP\$ 98,620.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

Nro. Transacción
163681721

No. Autorización/CUS
368443722

Fecha y Hora
05/06/2026

Número de Identificación

900999942

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

5

Departamento

HUILA

Dirección de Domicilio

Cra 1a No 6a-23

Localización

Nacional

Correo electrónico

vegaforeroingenieria@gmail.com

Regional

Tolima

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

CONTRATO DE OBRA

Fecha Terminación Obra

26/04/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

NEIVA (HUILA)

Ciudad de Domicilio

Pitalito

Teléfono de Contacto

+57,3162914759

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-073-000000

Número Contrato de Obra

IENSC-MC-O-07

Fecha Inicio Obra

19/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

COYAIMA

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

39447948.43

Número de Trabajadores en el Periodo

1

Aporte FIC

98620.00

Valor del Pago

98620.00

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-13
FECHA DE PAGO:	2026-04-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37102755
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37102755
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 280.200	\$ 281.000
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 280.200	\$ 281.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.200	\$ 9.300
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.200	\$ 9.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 429.600	\$ 430.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/05/2026

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-10
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36601786
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36601786
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600	\$ 429.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/04/2026

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-12
FECHA DE PAGO:	2026-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37390838
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37390838
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 112.200	\$ 112.300
Subtotal Salud		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 112.200	\$ 112.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 280.200	\$ 280.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 168.100	\$ 168.300
Subtotal Pensión		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 448.300	\$ 448.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 82.400	\$ 82.500
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 82.400	\$ 82.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 42.100	\$ 42.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 70.100	\$ 70.200
Subtotal CCF		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 112.200	\$ 112.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 755.100	\$ 756.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

10/06/2026



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd9d53e5487cdf96ae14040c512d1fd11c9ae7beb9ffc950e29421efb58b8c05676c405496f151f4cbc22866e6d0c454

Número de Factura: FEVF-12

Fecha de Emisión: 02/06/2026

Fecha de Vencimiento: 02/06/2026

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Débito Ahorro

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Nombre Comercial: VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Nit del Emisor: 900999942

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4330

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Pital

Dirección: CR 6 7 35

Teléfono / Móvil: 3212118447

Correo: vegaforeroingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 809010059

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Coyaima

Dirección: VDA CHENCHE BUENOS AIRES MCP COYAIMA

Teléfono / Móvil: 3138154333

Correo: arisali.aguja@sedtolima.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	NSC1	COSTO DIRECTO CONTRATO No IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 20.569.287,43	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.569.287,43
2	NSC2	ADMINISTRACION CONTRATO No IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 2.780.184,41	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.780.184,41
3	NSC3	IMPREVISTOS CONTRATO IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 205.692,87	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 205.692,87
4	NSC4	UTILIDAD CONTRATO No IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 822.771,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 822.771,50

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: Acta parcial No 2 y final del contrato IENSC-MC-O-07 de 28 de nov de 2025 cuyo objeto es Mejoramiento de infraestructura educativa en el marco del plan de formación integral a través del proyecto del centro de interés: aula TIC segura y confortable, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/06/2026 11:14:35
Documento validado por la
DIAN:
02/06/2026 11:14:36
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	24377936.21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24377936.21
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	24377936.21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 24377936.21

Valores informativos


ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00


MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	24.377.936,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.377.936,21
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	24.377.936,21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 24.377.936,21


Valores informativos


ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103572756 Rango desde: 6 Rango hasta: 20 Vigencia: 2027-12-23

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141177854995			
		 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 9 9 9 4 2		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	
14. Buzón electrónico 1 3					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres					
35. Razón social VEGA FORERO INGENIERIA SAS					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Huila		40. Ciudad/Municipio Pital	
41. Dirección principal CR 6 7 35					
42. Correo electrónico vegaforeroingenieria@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 2 1 2 1 1 8 4 4 7		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 6 0 8 1 6		48. Código 4 3 3 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 7 1 0 1 3		50. Código 1 4 2 9 0 4		51. Código 6 6 3	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exógena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			Servicio 1 2 3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2025-05-08 / 10:25:40AM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre VEGA FORERO JAIME ALEJANDRO		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141177854995		
 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 9 9 4 2 5		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	
				14. Buzón electrónico 1 3	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número		0 0 0 0 0			
73. Fecha		2 0 1 6 0 8 0 9			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 6 0 8 1 7			
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 2 8 5 6 1 1			
78. Departamento		4 1			
79. Ciudad/Municipio		5 5 1			
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 6 0 8 0 9		82. Nacional 1 0 0 %	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1		83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 6 0 8 1 6		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141177854995			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 9 9 9 4 2		5		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 2 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 9 4 9 1 4 1 6 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VEGA		105. Segundo apellido FORERO		106. Primer nombre JAIME		107. Otros nombres ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141177854995			
 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 9 9 9 4 2		5		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		3 6 2 9 0 0 4 6		1 9 3 7 3 4 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	SANDOVAL		ORTIZ		PAOLY		EUGENIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 1 6 0 8 1 6							

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES - COYAIMA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-EC-06	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (2) FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IENSC-MC-O-07	Fecha:	28 de noviembre 2025
Objeto del contrato: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.			
Contratista:	VEGA FORERO INGENIERÍA SAS		
C.C. o NIT. No.:	900999942-5		
Valor inicial del contrato:	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS \$ 26.298.893,57 M/CTE., INCLUYE AIU		
Valor Adición No. 1:	DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS \$ 2.023.278,68 M/CTE. – INCLUYE AIU		
Valor Adición No. 2:	ONCE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS \$ 11.126.127,75 M/CTE. – INCLUYE AIU		
Valor total del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS \$ 39.448.300,00 M/CTE. - INCLUYE AIU		
Plazo inicial de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
Prorroga No. 1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
Plazo total de ejecución:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	007 del 11/11/2025		
RP (No. y Fecha):	007 del 28/11/2025		
CDP Adición 1 (No. y Fecha):	2026:0004 del 02/03/2026		
RP Adición 1 (No. y Fecha):	2026:0004 del 02/03/2026		
CDP Adición 2 (No. y Fecha):	2026:0005 del 16/04/2026		
RP Adición 2 (No. y Fecha):	2026:0005 del 16/04/2026		
Fecha legalización:	18/12/2025		
Fecha Inicio:	19/12/2025		
Fecha Suspensión 1:	23/12/2025		
Fecha Reinicio 1:	02/03/2026		
Fecha Adición y Modificatoria No. 1:	02/03/2026		
Fecha Prorroga No. 1:	27/03/2026		
Fecha Adición y Modificatoria No. 2:	16/04/2026		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	26/04/2026		

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES - COYAIMA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-EC-06	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN			

Fecha de recibo de la obra:	26/04/2026
-----------------------------	------------

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 21-03-2025	HASTA: 26-04-2026
------------------	-------------------	-------------------

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe final recibido con un valor a pagar de \$ 24.377.936,21 M/CTE. - INCLUYE AIU.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución final de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (09) días del mes de junio 2026.



NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA ROMERO
Supervisora del Contrato
