



**ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.**

CONTRATISTA:

CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
CONTRATO DE OBRA No. – 494 - DE 2025

INTERVENTOR:

KEVVIN DANIEL TORRES LÓPEZ

PERIODO

**DESDE EL 07 DE MAYO 2026 HASTA EL 05 DE JUNIO DE
2026**



TABLA DE CONTENIDO

2.DESCRIPCION DEL PROYECTO	3
3. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA	4
4.ESTADO DE GARANTIAS	5
POLIZAS.	6
5.ESTADO FINANCIERO	8
5.1_BALANCE GENERAL	8
6.ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL PERIODO (07 DE MAYO 2026 HASTA EL 05 DE JUNIO DE 2026).....	8
7. INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES	10
8. CLIMATOLOGIA.....	35
9. REGISTRO DE PERSONAL	36
10.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	36
10. GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO.....	39
10.1 GESTION SOCIAL	39
12. INFORME SOCIAL.	42
13. CONCLUSIONES	43



CONTRATO DE OBRA -494-2025

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.”

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES.

El municipio de San Vicente del Caguán adelantó el proceso de selección abreviada No. LP-002-2025 a través de la plataforma SECOP II, con el propósito de atender necesidades prioritarias en materia de infraestructura comunitaria en la zona urbana. En este contexto, se identificó la importancia de fortalecer los espacios destinados a la integración social, la convivencia ciudadana y el desarrollo de actividades comunitarias.

El proyecto denominado “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ” surge como una iniciativa orientada a garantizar instalaciones adecuadas, seguras y funcionales que promuevan la participación ciudadana, el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo de actividades culturales, recreativas y formativas.

Con esta intervención se busca mejorar las condiciones físicas del centro de convivencia, brindando un espacio digno para la comunidad, contribuyendo al bienestar general, la inclusión social y el fortalecimiento de la convivencia pacífica en el municipio.

2.DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto se ejecuta en el marco del proceso de selección abreviada No. LP-002-2025, adelantado por el municipio de San Vicente del Caguán a través de la plataforma SECOP II, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente del centro de convivencia en la zona urbana, garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de actividades comunitarias.

La intervención contempla actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, incluyendo obras de reparación estructural, adecuación de espacios interiores y exteriores, mejoramiento de acabados, mantenimiento de cubiertas, optimización de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como la adecuación de áreas destinadas a reuniones, eventos y actividades sociales.

Estas labores se desarrollan conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes, asegurando condiciones óptimas de funcionalidad, accesibilidad y seguridad. Con la ejecución de este contrato, el municipio fortalece los espacios de participación comunitaria, promueve la integración social y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana de San Vicente del Caguán.



3. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA

3. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA						
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		LP-002-2025			
			Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025			
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.					
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN					
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS		PN	X	PJ	
C.C / NIT N°	6805417 EXPEDIDA EN FLORENCIA, CAQUETÁ					
PLAZO:	TRES (03) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 532.000.00,00			
PLAZO FINAL:	CINCO (05) MESES	VALOR TOTAL DEL CONTRATO FINAL	\$633.699.979,00			
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: La entidad pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera: a PRECIOS UNITARIOS mediante actas parciales de obra, conforme las cantidades ejecutadas por el contratista y aprobadas. Por el Interventor. En todo caso para el pago final del contrato, no será inferior al 10% del valor contratado y se hará una vez el contratista entregue al Municipio de San Vicente del Caguán, al Acta de Recibo Final a satisfacción de todas las actividades objeto del presente contrato y el Acta de Liquidación, debidamente soportada, de conformidad con los requisitos establecidos por el Municipio de San Vicente del Caguán y sus respectivos anexos, tales como: informes, copia pago de seguridad social, certificados de calidad de los materiales, resultados de ensayos de laboratorio, conformación de veeduría entre otras que solicite la entidad contratante. Para efectos de los desembolsos y/o pagos mencionados anteriormente por actas de avances ejecutados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.					
FECHA INICIO:	24-11-2025	FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	23-02-2026			
CDP	1125 22/08/2025	RP	1225 18/11/2025			
CDP	426 01/06/2026	RP	426 03/06/2026			



INTERVENTOR:	KEVVIN DANIEL TORRES LÓPEZ
POLIZA	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento CHU-100062545– Anexo 0; Cumplimiento de contrato y pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra. Valor asegurado total: \$ 133.000,000.00 M/CTE. Póliza de Responsabilidad Civil CHU-100011853-Anexo 0 Amparos: Predios, labores y operaciones Valor asegurado total: \$284.700.000,00 M/CTE

4.ESTADO DE GARANTIAS

POLIZAS Y SEGUROS DE GARANTIA CONTRATISTA

LEGALIZACION:

El contratista legalizó el presente contrato y para tal efecto presentó la siguiente documentación:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	CHU-100062545
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CHU-100011853

GARANTIAS:

El Contrato se encuentra amparado por las garantías exigidas por el Municipio de San Vicente del Caguán, de acuerdo a las pólizas presentadas por el Contratista, expedidas por SEGUROS MUNDIAL, las cuales amparan por Póliza de Seguro de Cumplimiento el valor total de \$ 133.000,000.00 M/CTE. y por Responsabilidad Civil y Extracontractual un valor total de \$284.700.000,00 y se resumen a continuación:



POLIZAS.

GARANTÍA ANEXO 0			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	24-11-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	14/11/2025-15/06/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	14/11/2025-15/02/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	14/02/2026-14/02/2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	14/11/2025-14/02/2026	

GARANTÍA ANEXO 2			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	12-12-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	24/11/2025-25/06/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	24/11/2025-25/02/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	24/02/2026-24/02/2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	24/11/2025-24/02/2026	

GARANTÍA ANEXO 3			
------------------	--	--	--



MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	21-05-2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	19/02/2026-25/07/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	19/02/2026-25/03/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	24/03/2026-24/03/2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	19/02/2026-24/03/2026	

GARANTÍA ANEXO 4			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SEGÚN CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	21-05-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100062545	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CHU-100011853	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	\$ 53.000.000	23/02/2026-07/10/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 26.600.000	23/02/2026-07/06/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.000.000	07/06/2026-07/06/2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 284.700.000,00	23/02/2026-07/06/2026	

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 – 02 – 2026		
MODIFICATORIO N°1	19 – 02 – 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN	23 – 02 – 2026		

Carrera 4ª No. 15- 06 Barrio Porvenir
 Celular: 313-4193851
 Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
 Florencia - Caquetá



FECHA DE AMPLIACIÓN N°1	23 – 03 – 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN N°2	07 – 04 – 2026
FECHA DE REINICIO	07 – 05 – 2026
MODIFICATORIO N°2 ADICIÓN Y PRORROGA:	02 – 06 – 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	07 – 07 – 2026

5. ESTADO FINANCIERO

5.1 BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	\$ 0		0%
ADICIÓN	\$ 101.699.979,00	02-06-2025	N/A
VALOR EJECUTADO CORTE 1	\$ 346.947.448,00	24-11-2025 al 23-02-2026	55%
VALOR EJECUTADO CORTE 2	\$ 221.819.078,00	07-05-2026 al 05-06-2026	35%
VALOR A GIRAR	\$ 221.819.078,00	07-05-2026 al 05-06-2026	35%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00		0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUAL	\$ 633.699.979,00		100%

6. ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL PERIODO (07 DE MAYO 2026 HASTA EL 05 DE JUNIO DE 2026)

Durante el periodo de ejecución se desarrollaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO
PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA)
MURO CORTINA EN CONCRETO REFORSAO H<0,1 MTS.
PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO
PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)
PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y VIDRIO)
CIELO RASO EN PVC



CERAMICA PISO
TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE
TOMA CORRIENTE 220V
SALIDA ILUMINACIÓN
INTERRUPTOR
PANEL LED 40W L/FRIA
REUBICAION DE AIRES ACONDICIONADO
SIFON DE DESAGUEN (INCUYE TUBERIA Y ACCESORIOS)
ADECUACION DE CAJILLA EXISTENTE (INCLUYE CONSTRUCCION DE TAPA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"
BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC
DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE
RELLENO CON ARENA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM)
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.
DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE
MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4
PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABLIZANTE)
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO
PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)
PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA)
MANTENIEMIENTO DE PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA
ADECUACIÓN DE CORDON FINAL EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA
BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC
SANITARIO BLANCO
LAVAMANOS DE SOBREPONER
GRIFERIA PARA ORINAL
GRIFERIA PARA LAVAMANOS
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80X0,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14"
ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE INSPECCION CON ALTURA MENOR A 1 METRO
LOSETA TRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - TRANSPORTE HASTA 5KM)



7. INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

1.5 SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO



2.9 PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPa (INCLUYE DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA)



2.10 MURO CORTINA EN CONCRETO REFORSAO $H < 0,1$ MTS.



3.2 PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)



3.3 ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO



3.4 PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)



4.1 PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y VIDRIO)



4.4 CIELO RASO EN PVC



Carrera 4ª No. 15- 06 Barrio Porvenir
Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá



5.1 CERAMICA PISO



6.1 TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE





6.2 TOMA CORRIENTE 220V



6.3 SALIDA ILUMINACIÓN



6.4 INTERRUPTOR





6.5 PANEL LED 40W L/FRIA



6.6 REUBICAION DE AIRES ACONDICIONADO



7.1 SIFON DE DESAGUEN (INCUYE TUBERIA Y ACCESORIOS)





7.2 ADECUACION DE CAJILLA EXISTENTE (INCLUYE CONSTRUCCION DE TAPA)



7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"



8.3 BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC





1.11 DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE



1.12 RELLENO CON ARENA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM)



1.13 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.



3.1 MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4



3.2 PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)



3.3 ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO



3.4 PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)



4.1 PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA)





4.2 MANTENIMIENTO DE PUERTAS



8.2 CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,80M DE DESARROLLO





8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE



8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA





8.5 ADECUACIÓN DE CORDON FINAL EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA



8.6 BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC





10.1 SANITARIO BLANCO



10.2 LAVAMANOS DE SOBREPONER



10.3 GRIFERIA PARA ORINAL





10.4 GRIFERIA PARA LAVAMANOS



10.5 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80X0,80



10.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6"






10.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14"



10.8 ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE INSPECCION CON ALTURA MENOR A 1 METRO



10.9 CERAMICA PISO

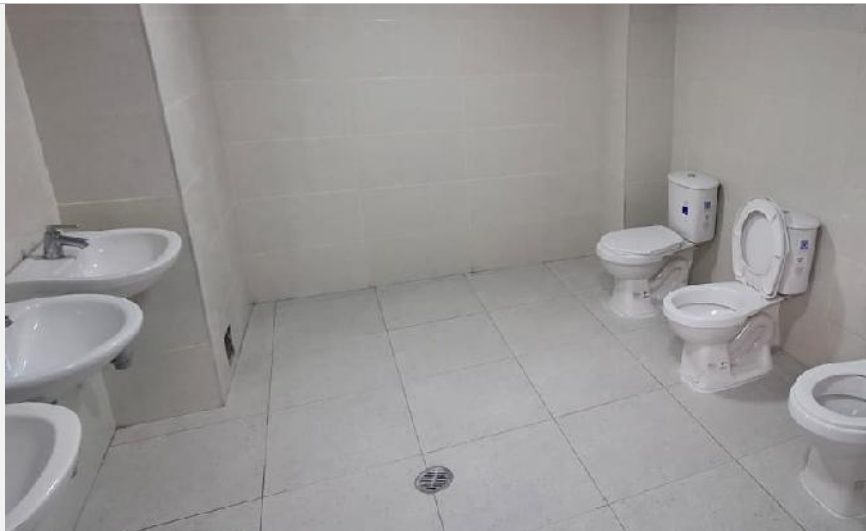



10.10 CERAMICA MURO



11.1 LOSETA TRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - TRANSPORTE HASTA 5KM)





ACTA DE RECIBO PARCIAL

TEMS	CONDICIONES ACTUALES					COBRO PARCIAL N°1		COBRO PARCIAL N°2		SALDO POR COBRAR	
	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
OFICINA DE ARCHIVO											
1	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA										
1.1	CERRAMIENTO CON LONA VERDE H=2.00	ML	32,1	12.330,0	395.546,4	32,1	395.546,4				
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	42,4	6.036,0	256.035,0	42,4	256.035,0				
1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	42,4	8.689,0	368.570,0	42,4	368.570,0				
1.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.	M3	21,7	43.532,0	943.561,5	21,7	943.561,5				
1.5	SUM., RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL SELECCIONADO	M3	21,9	23.047,0	505.333,1			21,9	\$ 505.333,1		
1.6	RETIRO DE SOBRANTES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	M3	11,2	32.026,0	359.495,9	11,2	359.495,9				
2	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
2.1	SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA	M2	11,0	38.847,0	427.317,0	11,0	427.317,0				
2.2	CONCRETO ZAPATAS R-21MPA	M3	3,3	832.115,0	2.745.979,5	3,3	2.745.979,5				
2.3	CONCRETO CICLOPEO (F'C=17.5MPA)	M3	3,1	471.141,0	1.452.998,8	3,1	1.452.998,8				
2.4	VIGA 0.25*0.25 CIMENTACIÓN R-21MPA	ML	35,4	104.778,0	3.704.950,1	35,4	3.704.950,1				

Carrera 4ª No. 15- 06 Barrio Porvenir
Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá



2.5	COLUMNA PEDESTAL 0.25*0.25 R-21MPA	ML	57,4	139.769,0	8.026.933,7	57,4	8.026.933,7				
2.6	VIGA AEREA 0.25*0.25 R-21MPA	ML	38,2	157.479,0	6.017.272,6	38,2	6.017.272,6				
2.7	VIGA DE CONFINAMIENTO 0.20*0.20 R-21MPA	ML	38,2	125.678,0	4.802.156,4	38,2	4.802.156,4				
2.8	ACERO FY=420MPA	KG	2.019,0	13.347,0	26.947.593,0	2019,0	26.947.593,0				
2.9	PISO CONCRETO E=0.10M R-21MPA (INCLUYE DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	41,7	118.735,0	4.954.870,9			41,7	\$ 4.954.870,9		
2.10	MURO CORTINA EN CONCRETO REFORADO H<0,1 MTS.	M3	1,3	1.170.132,0	1.526.250,0			1,3	\$ 1.526.250,0		
3	MAMPOSTERIA Y PAÑETES										
3.1	MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4	M2	61,51	86.877,0	5.343.491,5	61,51	5.343.804,3	0,0	-\$ 312,8		
3.2	PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)	M2	180,8	58.817,0	10.634.113,6			180,8	\$ 10.634.113,6		
3.3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	180,8	22.397,0	4.049.377,6			180,8	\$ 4.049.377,6		
3.4	PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)	M2	180,8	25.101,0	4.538.260,8			180,8	\$ 4.538.260,8		
4	CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS Y CUBIERTA										
4.1	PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA Y VIDRIO)	M2	10,0	653.714,0	6.563.288,6			10,0	\$ 6.563.288,6		
4.3	CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,60M DE DESARROLLO	ML	12,7	141.928,0	1.802.485,6	12,7	1.802.485,6				
4.4	CIELO RASO EN PVC	M2	38,3	77.588,0	2.968.051,4			38,3	\$ 2.968.051,4		



5	ACABADO DE PISOS										
5,1	CERAMICA PISO	M2	37,8	88.733,0	3.357.772,1			37,8	\$ 3.357.772,1		
6	INSTALACIONES ELECTRICAS										
6,1	TOMA CORRIENTE MONOF. DOBLE	UND	7,0	245.119,0	1.715.833,0	0,0		7,0	\$ 1.715.833,0		
6,2	TOMA CORRIENTE 220V	UND	3,0	246.705,0	740.115,0	0,0		3,0	\$ 740.115,0		
6,3	SALIDA ILUMINACIÓN	UND	8,0	141.842,0	1.134.736,0	0,0		8,0	\$ 1.134.736,0		
6,4	INTERRUPTOR	UND	2,0	135.199,0	270.398,0	0,0		2,0	\$ 270.398,0		
6,5	PANEL LED 40W L/FRIA	UND	8,0	156.494,0	1.251.952,0	0,0		8,0	\$ 1.251.952,0		
6.6	REUBICAION DE AIRES ACONDICIONADO	UND	3,0	712.593,0	2.137.779,0			3,0	\$ 2.137.779,0		
7	INSTALACIONES SANTARIAS										
7,1	SIFON DE DESAGUEN (INCUIE TUBERIA Y ACCESORIOS)	UND	2,0	193.406,0	386.812,0	0,0		2,0	\$ 386.812,0		
7.2	ADECUACION DE CAJILLA EXISTENTE (INCLUYE CONSTRUCCION DE TAPA)	UND	3,0	727.707,0	2.183.121,0			3,0	\$ 2.183.121,0		
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"	ML	14,0	131.019,0	1.834.266,0			14,0	\$ 1.834.266,0		
8	CUBIERTA										
8,1	CUBIERTA TEJA MASTER MIL	M2	43,7	88.050,0	3.846.728,4	43,7	3.846.728,4				
8,2	CORREA METALICA PERFIL C 203*65*3 MM	ML	50,8	97.885,0	4.972.558,0	50,8	4.972.558,0				



8,3	BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC	ML	17,4	41.949,0	730.332,1			17,4	\$ 730.332,1		
ADECUACIONES CENTRO DE CONVIVENCIA											
1	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO										
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	486,7	6.036,0	2.937.787,6	486,7	2.937.787,6				
1.7	DESMONTAJE Y DISPOSICION DE TEJA DE ASBESTO-CEMENTO (Eternit)	M2	486,7	16.857,0	8.204.487,3	486,7	8.204.487,3				
1.8	RETIRO DE ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EXISTENTE EN MUROS	M2	1.855,5	13.741,0	25.496.473,6	1855,5	25.496.473,6				
1.9	DEMOLICION DE UNIDADES SANITARIAS (INODORO)	UND	8,0	14.785,0	118.280,0	8,0	118.280,0				
1.10	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES	UND	7,0	13.713,0	95.991,0	7,0	95.991,0				
1,11	DEMOLICION DE LOSETA TRAFICO PEATONAL EXISTENTE	M2	95,1	15.388,0	1.464.014,3			95,1	\$ 1.464.014,3		
1,12	RELLENO CON ARENA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDENES (INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5KM)	M3	14,3	130.394,0	1.860.852,8			14,3	\$ 1.860.852,8		
1.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN / H<5 MTS.	M3	12,2	43.532,0	532.309,3			12,2	\$ 532.309,3		
3	MAMPOSTERIA Y PAÑETES										
3,1	MURO EN LADRILLO FAROL, MORTERO 1:4	M2	6,27	86.877,0	544.718,8	4,0	343.164,2	2,3	\$ 201.554,6		
3,2	PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE)	M2	22,9	58.817,0	1.346.909,3	7,9	464.654,3	15,0	\$ 882.255,0		



3,3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	1.868,0	22.397,0	41.838.491,9	1863,4	41.734.648,2	4,6	\$ 103.843,7		
3,4	PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS)	M2	1.868,0	25.101,0	46.889.672,0	1863,4	46.773.291,3	4,6	\$ 116.380,8		
3,5	MURO SUPERBOARD 10CMS	M2	17,3	242.500,0	4.203.737,5				\$ -	17,34	4.203.737,5
4	CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y CIELO RASO										
4,1	PUERTAS EN ALUMINO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA)	M2	6,1	653.714,0	4.006.613,1			6,1	\$ 4.006.613,1		
4,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	24,0	328.972,0	7.895.328,0			24,0	\$ 7.895.328,0		
4,4	CIELO RASO EN PVC	M2	328,0	77.588,0	25.444.984,6	328,0	25.444.984,6		\$ -		
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DEL PORTON (PUERTA PRINCIPAL)	UND	5,0	561.459,0	2.829.753,4				\$ -	5,04	2.829.753,4
8	CUBIERTA										
8,1	CUBIERTA TEJA MASTER MIL	M2	486,7	88.050,0	42.854.903,6	486,7	42.854.903,6		\$ -		
8,2	CANAL EN LAMINA Cal. 22 DE 0,80M DE DESARROLLO	ML	68,8	248.817,0	17.118.609,6			68,8	\$ 17.118.609,6		
8,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	ML	34,4	225.535,0	7.758.404,0			34,4	\$ 7.758.404,0		
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA	ML	68,8	116.978,0	8.048.086,4			68,8	\$ 8.048.086,4		
8,5	ADECUACIÓN DE CORDON FINAL EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA	ML	68,8	150.958,0	10.385.910,4			68,8	\$ 10.385.910,4		
8,6	BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC	ML	13,4	41.949,0	562.116,6			13,4	\$ 562.116,6		



9	ASCENSOR										
9,1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ASCENSOR	UND		29.819.890,0							
9,2	ACONDICIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA (INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO, INSTALACION DE TUBERIA SUBTERRANEA, PERAPACIÓN DE MURO, CAMBIO DE TUBERIA GALVANIZADA DESDE CONEXIÓN DE CONTADOR A POSTE) ACONDICIONAMIENTO DE REDES INTERNAS(CABLEADO Y ACCESORIOS)	UND	1,0	16.504.723,0	16.504.723,0				\$ -	1,00	16.504.723,0
9,3	INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR	UND	38,0	103.506,0	3.933.228,0				\$ -	38,00	3.933.228,0
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										
10,1	SANITARIO BLANCO	UND	6,0	717.422,0	4.304.532,0			6,0	\$ 4.304.532,0		
10,2	LAVAMANOS DE SOBREPONER	UND	2,0	534.653,0	1.069.306,0			2,0	\$ 1.069.306,0		
10,3	GRIFERIA PARA ORINAL	UND	6,0	249.264,0	1.495.584,0			6,0	\$ 1.495.584,0		
10,4	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UND	12,0	294.626,0	3.535.512,0			12,0	\$ 3.535.512,0		
10,5	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80X0,80	UND	3,0	718.295,0	2.154.885,0			3,0	\$ 2.154.885,0		
10,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6"	ML	13,6	168.038,0	2.276.914,9			13,6	\$ 2.276.914,9		



10,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 14"	ML	9,8	400.637,0	3.926.242,6			9,8	\$ 3.926.242,6		
10,8	ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE INSPECCION CON ALTURA MENOR A 1 METRO	UND	1,0	791.854,0	791.854,0			1,0	\$ 791.854,0		
10,9	CERAMICA PISO	M2	41,4	88.733,0	3.675.516,1			41,4	\$ 3.675.516,1		
10,10	CERAMICA MURO	M2	129,1	88.733,0	11.454.010,6			129,1	\$ 11.454.010,6		
10,11	DIVISIONES DE BAÑOS Y PUERTAS EN ALUMINIO INCLUYE PERFILES, ANGULOS, CHAPAS, BISAGRAS Y PASADORES	UND	4,0	2.597.490,0	10.389.960,0				\$ -	4,00	10.389.960,0
11	ANDEN										
11,1	LOSETA TRAFICO PEATONAL (INCLUYE ARENA DE SELLO - TRANSPORTE HASTA 5KM)	M2	95,1	247.289,0	23.527.075,5			95,1	\$ 23.527.075,5		
11,2	BORDILLO DE CONFINAMIENTO PARA ANDEN	ML	54,4	222.195,0	12.087.408,0					54,40	12.087.408,0
					\$ 487.461.522,00		\$ 266.882.652,00		\$ 170.630.060,00		\$ 49.948.810,00
	ADMINISTRACIÓN		25%	\$ 121.865.381,00		\$ 66.720.663,00		\$ 42.657.515,00		\$ 12.487.203,00	
	IMPREVISTOS		1%	\$ 4.874.615,00		\$ 2.668.827,00		\$ 1.706.301,00		\$ 499.488,00	
	UTILIDAD		4%	\$ 19.498.461,00		\$ 10.675.306,00		\$ 6.825.202,00		\$ 1.997.952,00	
					\$ 633.699.979,00		\$ 346.947.448,00		\$ 221.819.078,00		\$ 64.933.453,00

Carrera 4ª No. 15- 06 Barrio Porvenir
 Celular: 313-4193851
 Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
 Florencia - Caquetá



8. CLIMATOLOGIA

Durante el periodo analizado en el presente informe correspondiente al mes de mayo del 2026, se observó la ocurrencia de lluvias lleves e intermitentes aproximadamente 7.66% del tiempo, mientras que el 60,50% predominó los días soleados. Estos datos proporcionan un panorama general de las condiciones meteorológicas predominantes durante el mes, indicando un periodo mayormente seco y cálido.

CLIMA	MAYO 2026													
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
SOLEADO														
LLUVIA LEVE INTERMITENTE														
LLUVIA FUERTE PROLONGADA														
CLIMA	MAYO 2026													
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO														
LLUVIA LEVE INTERMITENTE														
LLUVIA FUERTE PROLONGADA														
CLIMA	JUNIO 2026													
	L	M	M	J	V	M	J	V	S	D	L	M	M	J
	01	02	03	04	05									
SOLEADO														
LLUVIA LEVE INTERMITENTE														
LLUVIA FUERTE PROLONGADA														



9. REGISTRO DE PERSONAL

Durante el periodo comprendido entre el **24 DE ENERO HASTA EL 23 DE FEBERO DE 2025** se ha controlado el registro de ingreso de personal y se registra el siguiente promedio del personal en obra.

REGISTRO DE PERSONAL	
PERSONAL	CANTIDAD
Ing. director de obra	1
Ing. Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Mano de obra no calificada	2
TOTAL	5

Tabla 1. Registro de personal en obra

10.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS como **CONTRATISTA** del contrato de obra N°494-De 2025 realizó todas las afiliaciones pertinentes para el personal presente en obra para llevar a cabo las actividades constructivas para el periodo del presente informe.

MES DE DICIEMBRE-DIRECTOR CELSO ANDRES

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 180.000
PENSIÓN	\$ 180.000
ARL	\$ 313.200
N° DE PLANILLA	36049788

MES DE DICIEMBRE-RESIDENTE ANDRES MAURICIO

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 180.000
PENSIÓN	\$ 180.000
ARL	\$ 313.200



N° DE PLANILLA	36049788
----------------	----------

MES DE ENERO-DIRECTOR CELSO ANDRES

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 180.000
PENSIÓN	\$ 180.000
ARL	\$ 313.200
N° DE PLANILLA	36044418

MES DE DICIEMBRE-ENERO ANDRES MAURICIO

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 180.000
PENSIÓN	\$ 180.000
ARL	\$ 313.200
N° DE PLANILLA	36044418

MES DE FEBRERO-DIRECTOR CELSO ANDRES

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 180.000
PENSIÓN	\$ 180.000
ARL	\$ 313.200
N° DE PLANILLA	36099658

MES DE FEBRERO-ENERO ANDRES MAURICIO

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 180.000



PENSIÓN	\$ 180.000
ARL	\$ 313.200
N° DE PLANILLA	36099658

MES DE MAYO-DIRECTOR CELSO ANDRES

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 144.000
PENSIÓN	\$ 576.000
ARL	\$ 250.600
N° DE PLANILLA	9492492989

MES DE MAYO-RESIDENTE ANDRES MAURICIO

IBC	\$ 4.500.000
SALUD	\$ 144.000
PENSIÓN	\$ 576.000
ARL	\$ 250.600
N° DE PLANILLA	9492492989

Personal relacionado para la ejecución del contrato: DICIEMBRE

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	IBC	PENSION	SALUD	ARL
CUBILLOS ORTEGA JEILER ANDREI	36049753	\$ 1.423.500	\$227.800	\$57.000	\$99.100
DOMINGUEZ CALDERON RAYVER OSWALDO	36049753	\$ 1.423.500	\$227.800	\$57.000	\$99.100
FLORIANO HERNANDEZ DIEGO	36049753	\$ 1.423.500	\$227.800	\$57.000	\$99.100

Personal relacionado para la ejecución del contrato: ENERO

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	IBC	PENSION	SALUD	ARL
--------	----------------------------	-----	---------	-------	-----



CUBILLOS ORTEGA JEILER ANDREI	36049659	\$ 1.750.905	\$190.200	\$72.600	\$82.970
DOMINGUEZ CALDERON RAYVER OSWALDO	36049659	\$ 1.750.905	\$190.200	\$72.200	\$82.970
FLORIANO HERNANDEZ DIEGO	36049659	\$ 1.750.905	\$190.200	\$72.200	\$82.970

Personal relacionado para la ejecución del contrato: FEBRERO

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	IBC	PENSION	SALUD	ARL
CUBILLOS ORTEGA JEILER ANDREI	36049449	\$ 1.750.905	\$190.200	\$72.600	\$82.970
DOMINGUEZ CALDERON RAYVER OSWALDO	36049449	\$ 1.750.905	\$190.200	\$72.200	\$82.970
FLORIANO HERNANDEZ DIEGO	36049449	\$ 1.750.905	\$190.200	\$72.200	\$82.970

Personal relacionado para la ejecución del contrato: MAYO

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	IBC	PENSION	SALUD	ARL
CUBILLOS ORTEGA JEILER ANDREI	9492492989	\$ 1.750.905	\$224.200	\$56.100	\$97.500
DOMINGUEZ CALDERON RAYVER OSWALDO	9492492989	\$ 1.750.905	\$224.200	\$56.100	\$97.500
FLORIANO HERNANDEZ DIEGO	9492492989	\$ 1.750.905	\$224.200	\$56.100	\$97.500

10. GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

10.1 GESTION SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL									
COMPONENTE	N°	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	1	Capacitación personal	x			x			
	2	Dotación de elementos de protección personal	x			x			
	3	Adopción de medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	x			x			



	4	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	x			x			
	5	Programa de información a la comunidad	x			x			
	6	Socializaciones							
CALIFICACION	Bueno 8-10		Deficiente 0-4			PROMEDIO FINAL			5
	Aceptable 5-7					VALOR FINAL			5

10.2 SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN									
COMPONENTE	N°	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	1	Capacitación personal	x			x			
	2	Demarcación del perímetro	x			x			
	3	Zonificación de la obra	x			x			
	4	Lona de Cerramiento	x			x			
	5	Cinta de Reflectiva	x			x			
	6	Señales Informativas y preventivas	x			x			
	7	Iluminación Nocturna	x			x			
CALIFICACION	Bueno 8-10		Deficiente 0-4			PROMEDIO FINAL			10
	Aceptable 5-7					VALOR FINAL			10

10.3 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
COMPONENTE	N°	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	1	Capacitación personal	x			x			
	2	Mantenimiento Preventivo	x			x			
	3	Definición de Horarios de trabajo	x			x			
	4	Uso de equipos en buen estado, Certificados	x			x			



	5	Elementos de protección personal	x			x			
	6	Señales Informativas y preventivas	x			x			
	7	Extintores	x			x			
CALIFICACION	Bueno 8-10		Deficiente 0-4			PROMEDIO FINAL			10
	Aceptable 5-7					VALOR FINAL			10

10.4 MANEJO DE MATERIAL DE ESCOMBROS

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS									
COMPONENTE	N°	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	1	Capacitación personal	x			x			
	2	Mantenimiento Preventivo	x			x			
	3	Definición de Horarios de trabajo	x			x			
	4	Uso de equipos en buen estado, Certificados	x			x			
	5	Elementos de protección personal	x			x			
	6	Señales Informativas y preventivas	x			x			
	7	Volumen de excavación (m3)	x			x			
	CALIFICACION	Bueno 8-10		Deficiente 0-4			PROMEDIO FINAL		
Aceptable 5-7		VALOR FINAL					10		

10.5 CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES									
COMPONENTE	N°	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y	1	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	x			x			



COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	2	Localización y señalización en el Campamento	x			x			
	3	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	x			x			
	4	Obras de contención	x			x			
	5	Capacitación del Personal	x			x			
CALIFICACION	Bueno 8-10		Deficiente 0-4		PROMEDIO FINAL				10
	Aceptable 5-7				VALOR FINAL				10

12. INFORME SOCIAL.

El proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura centro de convivencia del municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá constituye una intervención de alto impacto social, orientada a dignificar y optimizar los espacios destinados al proceso de atención de la población san vicentina.

A través de la ejecución de actividades como la localización y replanteo, el desmonte de cubiertas y estructuras existentes, así como la limpieza y resane de muros, se logró recuperar áreas que presentaban deterioro físico y condiciones inadecuadas para el desarrollo de las actividades. Estas intervenciones permitieron habilitar espacios más seguros, funcionales y adecuados, mejorando significativamente el entorno laboral.

Adicionalmente, la ejecución de la obra contribuyó al fortalecimiento de la economía local mediante la generación de empleos temporales, priorizando la vinculación de mano de obra de la región. Esto permitió dinamizar la economía del sector y facilitar la transferencia de conocimientos básicos en actividades de mantenimiento y construcción a los trabajadores locales.



13. CONCLUSIONES

Durante la ejecución de las actividades de adecuación y acabados, se logró cumplir satisfactoriamente con los procesos de retiro de estuco y pintura existente, demolición de unidades sanitarias y desmonte de puertas y ventanas, garantizando la correcta preparación de las áreas para la intervención y renovación de la infraestructura.

La construcción de muros en ladrillo farol con mortero 1:4, junto con la aplicación de pañete con impermeabilizante, permitió obtener superficies uniformes, resistentes y protegidas contra la humedad, asegurando condiciones óptimas para la aplicación de los acabados finales.

Asimismo, la aplicación de estuco plástico y pintura vinilo tipo 1 en tres manos contribuyó significativamente al mejoramiento estético y funcional de los espacios intervenidos, logrando acabados de calidad, durables y acordes a las necesidades de la edificación.

La instalación del cielo raso en PVC proporcionó un sistema liviano, de fácil mantenimiento y con buenas condiciones de presentación, mientras que la ejecución de la cubierta en teja tipo Master Mil garantizó una adecuada protección frente a factores climáticos, asegurando la funcionalidad y durabilidad de la estructura.

En términos generales, las actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas, cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y desempeño, lo cual permitió mejorar significativamente las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura intervenida.

ELABORADO POR:
CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
Contratista
C.C. 6.805.417 de Florencia

Carrera 4ª No. 15- 06 Barrio Porvenir
Celular: 313-4193851
Email: ingcivilcarlos84@hotmail.com
Florencia - Caquetá
