



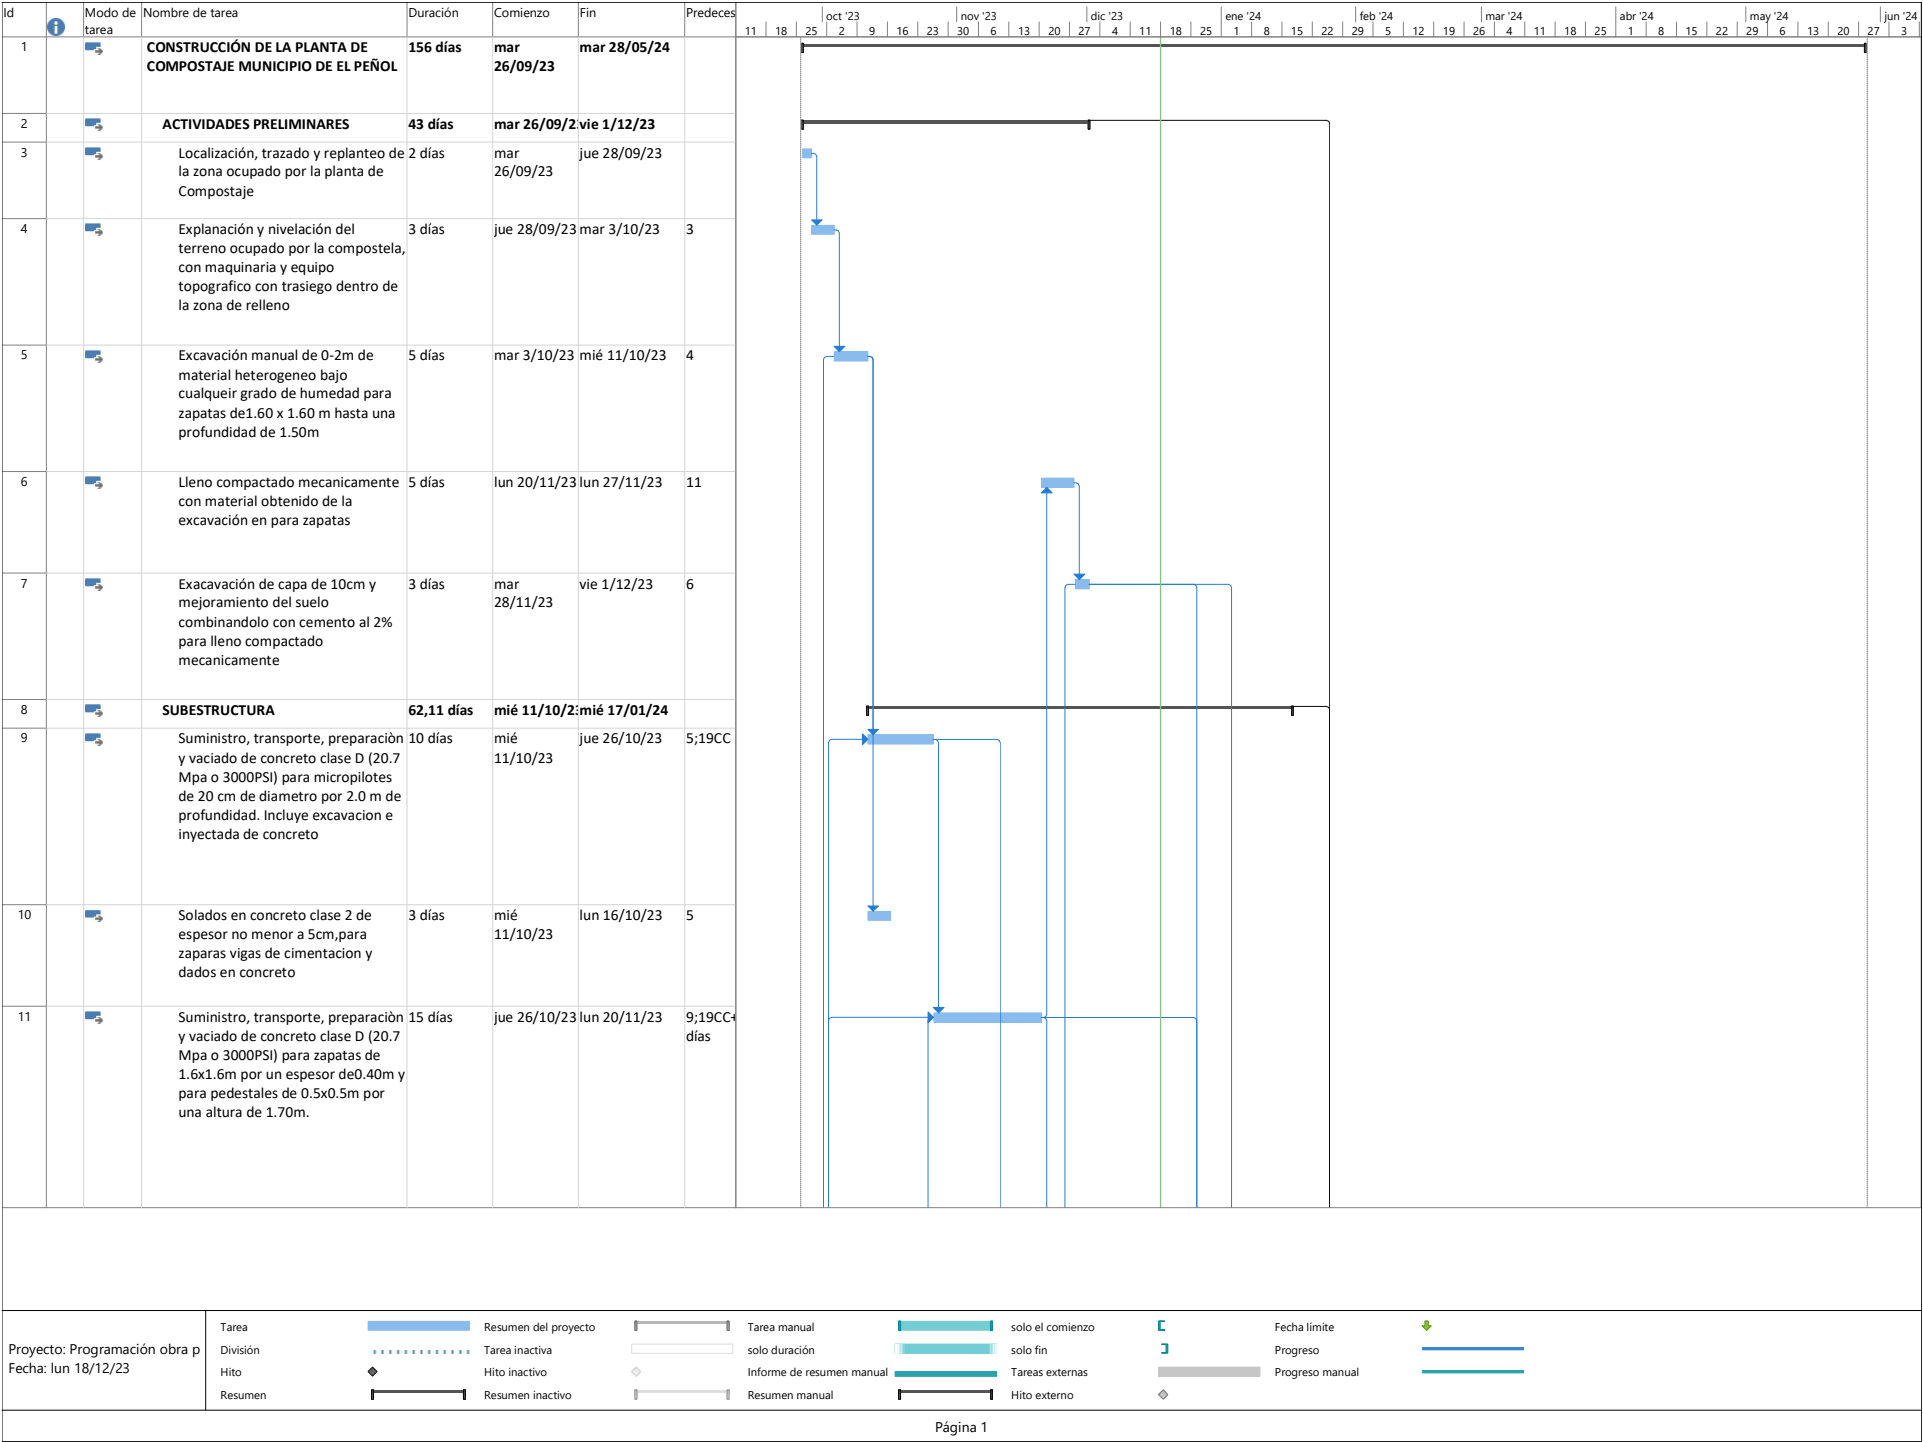

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesores	Cronograma																																							
							11	18	25	oct '23	2	9	16	23	30	nov '23	6	13	20	dic '23	27	4	11	18	25	ene '24	1	8	15	22	feb '24	29	5	12	19	26	4	11	18	25	abr '24	1	8	15	22	29
12		Suministro, transporte, preparación y vaciado de concreto clase D (20.7 Mpa o 3000PSI) para vigas de fundación de 0.35x0.40m, y para dados de concreto de 0.80x0.80x0.80	8 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	9;11CC+ días;190																																								
13		Suministro, transporte, preparación y vaciado de concreto clase D (20.7 Mpa o 3000PSI) para Rampa con e=0.20m	2 días	vie 12/01/24	mié 17/01/24	14																																								
14			Suministro, transporte, preparación y vaciado de concreto clase D (20.7 Mpa o 3000PSI) para losa de contrapiso de 0.15m de espesor	7 días	mié 3/01/24	vie 12/01/24	7;20CC+ días																																							
15		MAMPOSTERÍA	4 días	vie 12/01/24	vie 19/01/24																																									
16		Construcción de sobrecimiento en bloque de concreto de 15x20x40 a 3 hiladas	3 días	vie 12/01/24	jue 18/01/24	14																																								
17		Aplicación de impermeabilizante integral tipo IGOL DENSOL PLUS o similar equivalente en sobrecimiento y pedestales	1 día	jue 18/01/24	vie 19/01/24	16																																								
18		ESTRUCTURAS DE ACERO	65,11 días	mar 3/10/23	vie 12/01/24																																									
19		Suministro, figuración y colocación de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (Ref. 600000 PSI)	18 días	mar 3/10/23	mar 31/10/23	5CC																																								
20			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (D-084)	3 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	11;7;30																																							
21		Suministro Fabricacion y montaje de Estructura metálica, para Zona de Compostaje	49 días	vie 27/10/23	vie 12/01/24	14FF;22																																								
22		Platinas de anclaje a pedestales en lamina de 3/4" con mortero Grautin de nivelacion, y pernos de anclaje	3 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	11																																								
23		CUBIERTA Y DESAGÜES DE CUBIERTA	4 días	lun 8/01/24	vie 12/01/24																																									
24		Cubierta en Teja UPVC para cubierta, incluye, tornilleria de fijacion y caballetes en UPVC	4 días	lun 8/01/24	vie 12/01/24	21FF																																								
25		Suministro, transporte e instalación de Bajante PVC sanitaria Ø4"	2 días	mié 10/01/24	vie 12/01/24	24FF																																								

Proyecto: Programación obra p Fecha: lun 18/12/23	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
	Página 2									

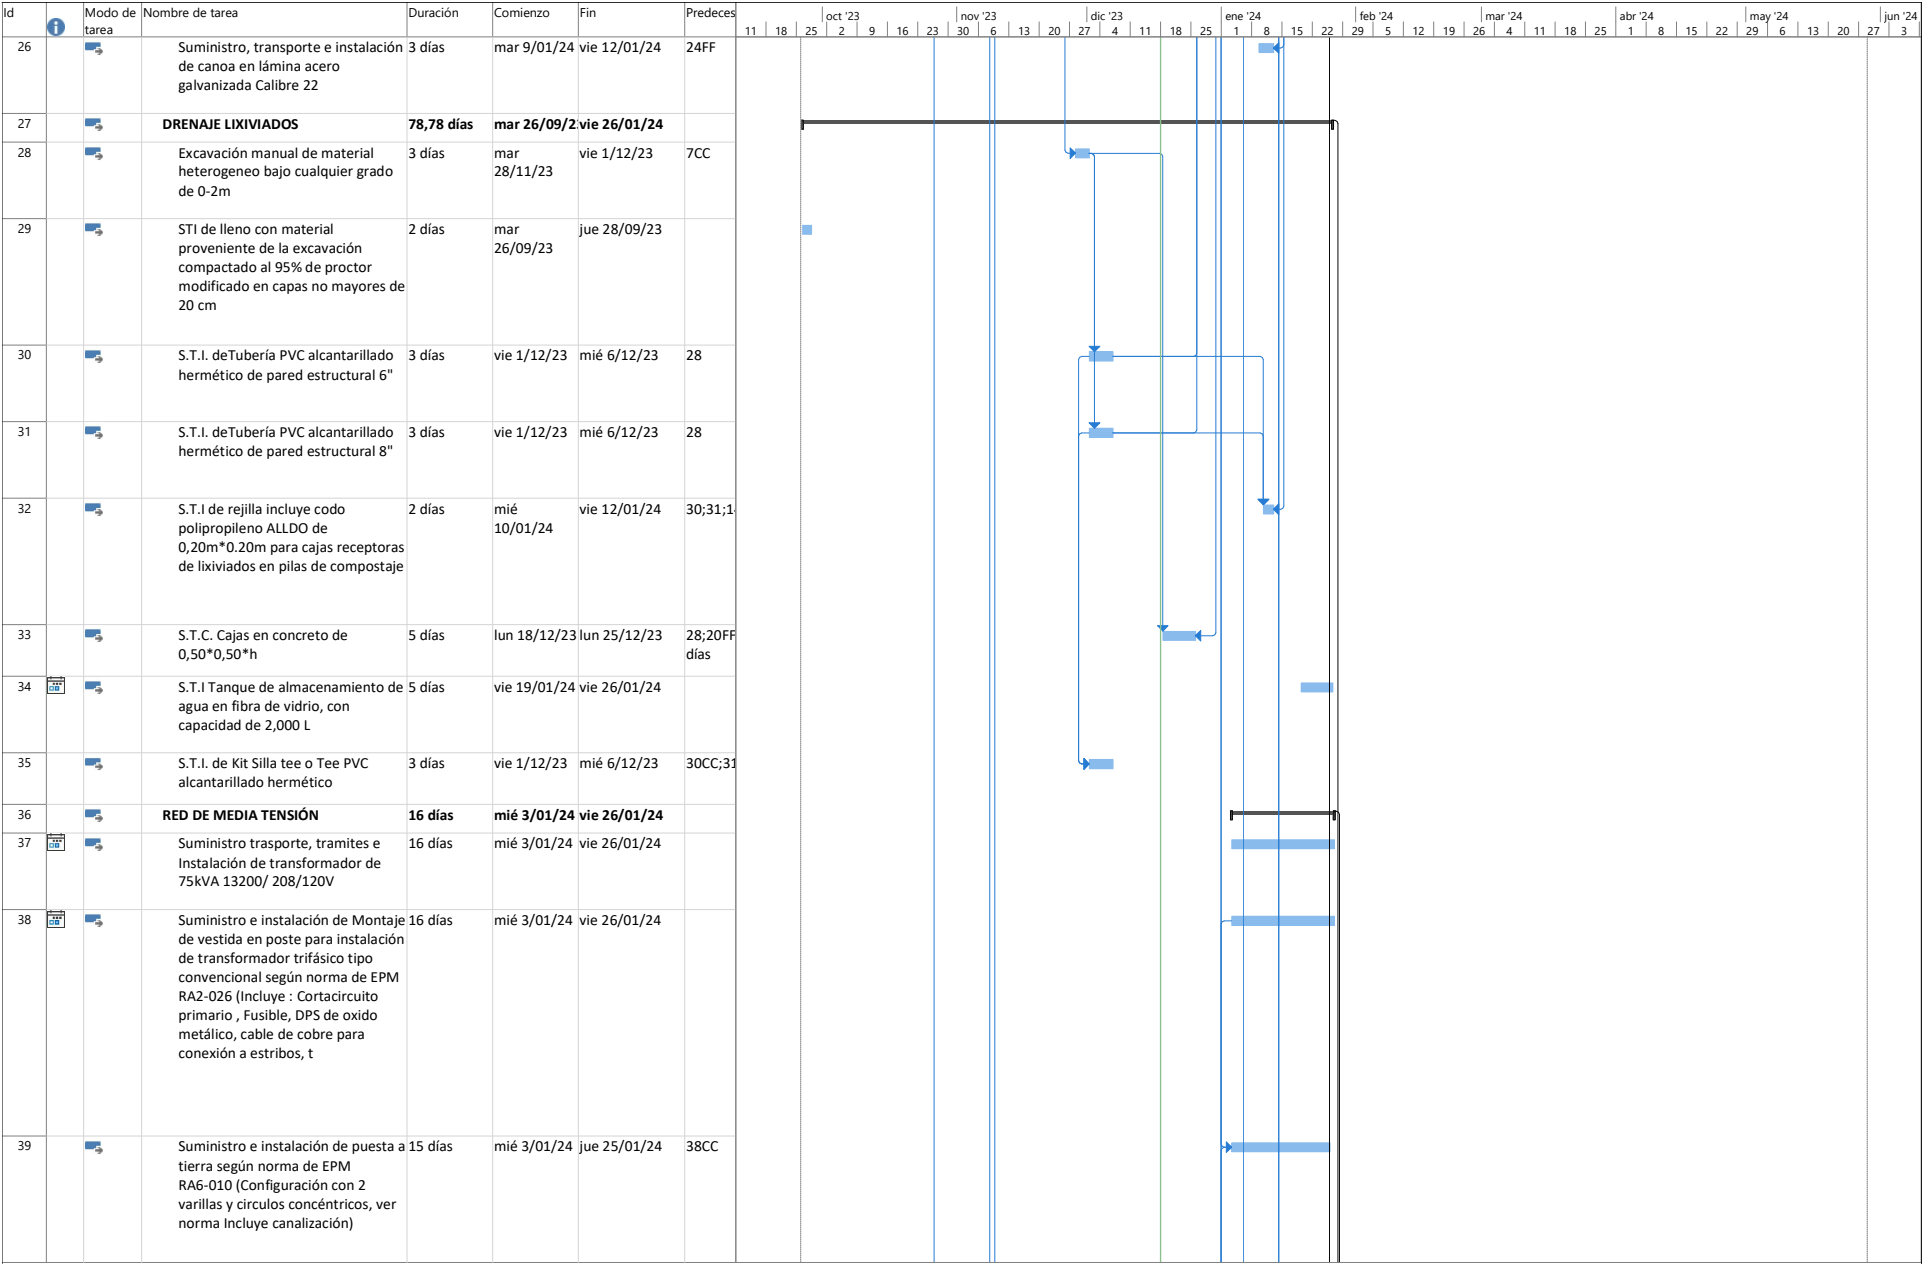

Proyecto: Programación obra p
Fecha: lun 18/12/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

[illegible]

i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	11 18 25 oct '23 2 9 16 23 nov '23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 ene '24 1 8 15 22 feb '24 29 5 12 19 26 4 11 18 25 mar '24 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 jun '24																													
47		Suministro e instalación de gabinete de uso exterior para alojar equipo de medida de 60x35x16 fabricado en lamina cold rolled electroestática ral 7032 incluye cinta bandit hebillas de 5/8" y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	46CC																														
48		Suministro e instalación de Medidor de energía activa 3x58/100 277/120V 5(100A) ,bidireccional con perfil de carga, bornera tipo corredera landi, anclajes y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	3 días	vie 5/01/24	mié 10/01/24	47																														
49		Suministro e instalación de acometida en cable cu-THHN 6Nº2/0+2Nº1/0 en bajante del poste y demás elementos para su correcta instalación.	15 días	mié 3/01/24	jue 25/01/24	45CC																														
50		Certificación RETIE de transformación y distribución incluye de uso final)	15 días	jue 4/01/24	vie 26/01/24	49FC-14 días																														
51		RED ELECTRICA INTERNA	12 días	jue 4/01/24	mar 23/01/24																															
52		Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado 10x8cm incluye espárragos, RL riel mecano, menzula y demás elementos para su correcta instalación	3 días	jue 4/01/24	mar 9/01/24	21CC																														
53		Suministro e instalación de salida para iluminación Incluye Tubería EMT de 3/4", caja 12x12x5cm cable cu 3#12 AWG THWN y demás elementos para su correcta instalación a una altura aproximada de 6m.	5 días	jue 4/01/24	jue 11/01/24	52CC																														
54		Suministro e instalación de salida para iluminación Incluye Tubería PVC Schedule 40 de 3/4", caja 4x4cm metálica, cable cu 3#12 AWG THWN y demás elementos para su correcta instalación.	5 días	jue 4/01/24	jue 11/01/24	53CC																														

Proyecto: Programación obra p
Fecha: lun 18/12/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

—

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

◆

Progreso manual

[illegible]

Proyecto: Programación obra p Fecha: lun 18/12/23	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

[illegible]

Proyecto: Programación obra p Fecha: lun 18/12/23	Tarea	 Resumen del proyecto	 Tarea manual	 solo el comienzo	 Fecha límite	
	División	 Tarea inactiva	 solo duración	 solo fin	 Progreso	
	Hito	 Hito inactivo	 Informe de resumen manual	 Tareas externas	 Progreso manual	
	Resumen	 Resumen inactivo	 Resumen manual	 Hito externo		

[illegible]

Proyecto: Programación obra p Fecha: lun 18/12/23	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
	<div>Página 8</div>									

[illegible]

Proyecto: Programación obra p Fecha: lun 18/12/23	Tarea	 Resumen del proyecto	 Tarea manual	 solo el comienzo		Fecha límite	
	División	 Tarea inactiva	 solo duración	 solo fin		Progreso	
	Hito	 Hito inactivo	 Informe de resumen manual	 Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen	 Resumen inactivo	 Resumen manual	 Hito externo			

