

	MINISTERIO DE TRANSPORTE <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b>		CÓDIGO	MEPI-FR-1		
	<b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE          INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b>		VERSIÓN	1		
	<b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>		PÁGINA	1	DE	12

DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO  
 Ingeniera: María Cristina Riascos Eraso  
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato 2135-2025.
PERIODO:	1 a 31 de marzo de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0252 de 05/02/2026

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **“CARRETERA TERCIARIA 03101 GUAPUSCAL ALTO – LA VEGA”**.

**1.1. CONTRATO DE OBRA No. 2135-2025**

**1.2. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>CONTRATO DE OBRA No.</b>	2135 DE 2025		
<b>CONTRATISTA:</b>	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	NIT:	901.765.653-0
<b>REPRESENTANTE</b>	SERGIO FERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ	CC	1.004.214.277
<b>INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):</b>	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS 100%		
<b>Objeto:</b>	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SOBRE LA VÍA GUAPUSCAL ALTO LA VEGA, CÓDIGO 03101, DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FUNES A CARGO DEL INVÍAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DT NARIÑO.		
<b>Fecha de Inicio:</b>	30/12/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	INVIAS-DTNAR-OS-R25-0014
<b>Valor Inicial:</b>	\$142.100.000,00		
<b>Valor Adiciones:</b>			
<b>Adición 1:</b>			
<b>Adición 2:</b>			
<b>Adición 3:</b>			

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		2	DE

Adición 4:	
Adición 5:	
Valor Actual:	\$142.100.000,00
Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2025
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	03 meses 00 días
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/03/2026

### **1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
893925 de 27/12/2025	2025	Nación 10	C-2402-0600-13-51102A-2402096-02	142.100.000,00	0	142.100.000,00
					62,040,713.00	80.059.287,00
					78,765,966.00	1.293.321,00
TOTAL				142.100.000,00	\$140.806.679,00	1.293.321,00

### **1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

### **1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

El contrato de obra 2135-2025 no tiene para su seguimiento y control contrato de interventoría, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### **1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 142,10	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	140,81	99,00

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 140,81	99,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 140,81	99,00

#### 1.4.2 ANTICIPO

<b>Otorgado</b>	\$ 0
<b>Amortizado</b>	\$ 0
<b>Saldo</b>	\$ 0

#### 1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100,00

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la supervisión se realiza con los soportes de acuerdo la ejecución de obra verificada en campo.

#### 1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

#### 1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

#### 1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		4	DE

### 1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

### 1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prórroga	Aprobada

### 1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Prórroga 1

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/12/2025

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Aprobada

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI  O NO

<b>CONTROL DE GARANTÍAS</b> <b>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA</b> <b>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A</b> <b>Póliza de Cumplimiento</b>				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101301111 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$14,210,000.00	Prórroga 1	26/12/2025	30/09/2026
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	\$28.420.000,00	Prórroga 1	26/12/2025	31/03/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$42.630.000.00	Prórroga 1	31/03/2026	31/03/2031

#### Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101058801 Anexo 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 284,700,000.00	Orden de inicio	26/12/2025	31/03/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$ 284,700,000.00		26/12/2025	31/03/2026

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	12

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$ 284,700,000.00	Orden de inicio	26/12/2025	31/03/2026
----------------------------------	-------------------	-----------------	------------	------------

### 1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

### 1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

### 1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

#### 2.1.2. INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A		
CONTRATISTA:		NIT:	
REPRESENTANTE		CC.	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. de	



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	12

	Oficio:	
VALOR INICIAL:		
VALOR ADICIONES:		
ADICIÓN 1:		
ADICIÓN 2:		
VALOR ACTUAL:		
ANTICIPO ENTREGADO:		
ANTICIPO AMORTIZADO:		
SALDO POR AMORTIZAR:		
PLAZO INICIAL:		
TOTAL PRÓRROGAS:		
PRÓRROGA 1:		
PRÓRROGA 2:		
PRÓRROGA 3:		
FECHA DE FINALIZACIÓN:		

## 2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

## 8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

## 8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. x de fecha xx de xxxx de 202x para el período xxxxxx 202x el contrato reporta un avance de:

## 8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		7	DE

Total inversión programada:

Total inversión ejecutada:

### 8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

### 8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

### 8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

### 8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

<b>CONTROL DE GARANTÍAS</b> <b>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA</b> <b>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> <b>Póliza de Cumplimiento</b>				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286121 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		8	DE

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.				
Calidad del Servicio				

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS: SI \_ O NO \_**

**8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

**8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	02/03/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	Envío modelo acta de recibo parcial de obra
2026S-VNAR-002651	04/02/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	Solicitud Subsanación documentos técnicos contrato de obra 2135 de 2025
Correo electrónico	05/03/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	RE: RADICACION ITEMS NO PREVISTOS Y ACTA PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA
Correo electrónico	06/03/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	RE: RADICACION ACTA PARCIAL DE OBRA #2
2026I-VNAR-018310	24/03/2026	SVR	Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-017694
Correo electrónico	14/04/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	Envío Acta de visita previa al recibo de obra
2026S-VNAR-022982	15/04/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	Solicitud limpieza de batea de la tubería de la alcantarilla contrato de obra 2135 de 2025
2026S-VNAR-024880	22/04/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	Observaciones documentos acta final de obra contrato 2135 de 2026
Correo electrónico	29/04/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	RE: ACTA FINAL DE OBRA CONTRATO FUNES (devolución)
...			

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE

### **8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

### **9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

#### **9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**


El contratista de obra realizó la socialización con la comunidad y la alcaldía de Funes – Nariño el día 30/01/2026, para garantizar la capacidad portante del suelo de cimentación el contratista realiza un plinto de mejoramiento.

A continuación se muestran los diseños de la obra propuesta (muro alcantarilla) proyectados por el contratista luego de analizar las condiciones del terreno




MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	12

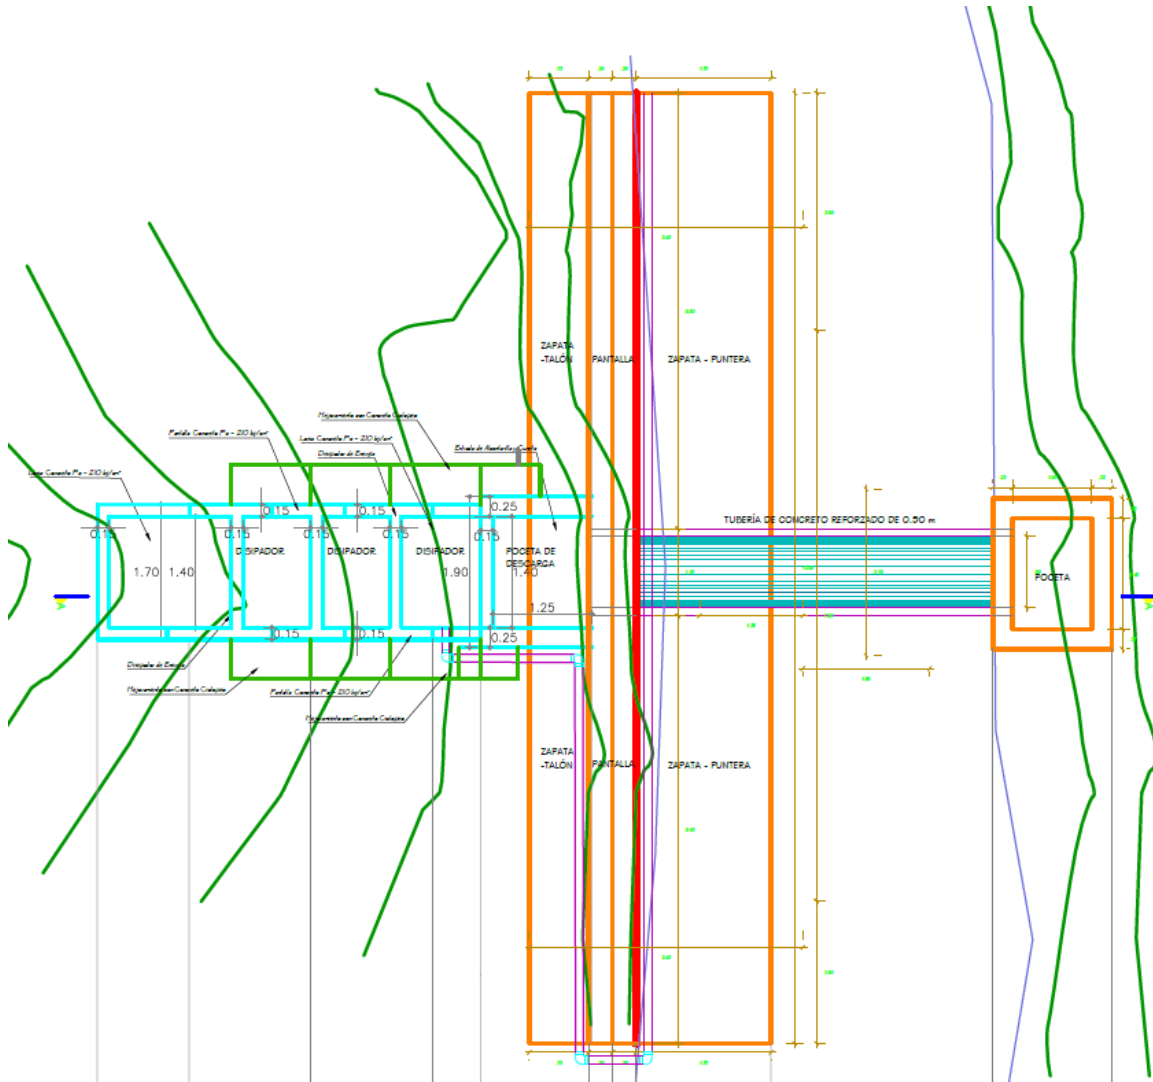

Planta muro alcantarilla y descole o dissipador de energía

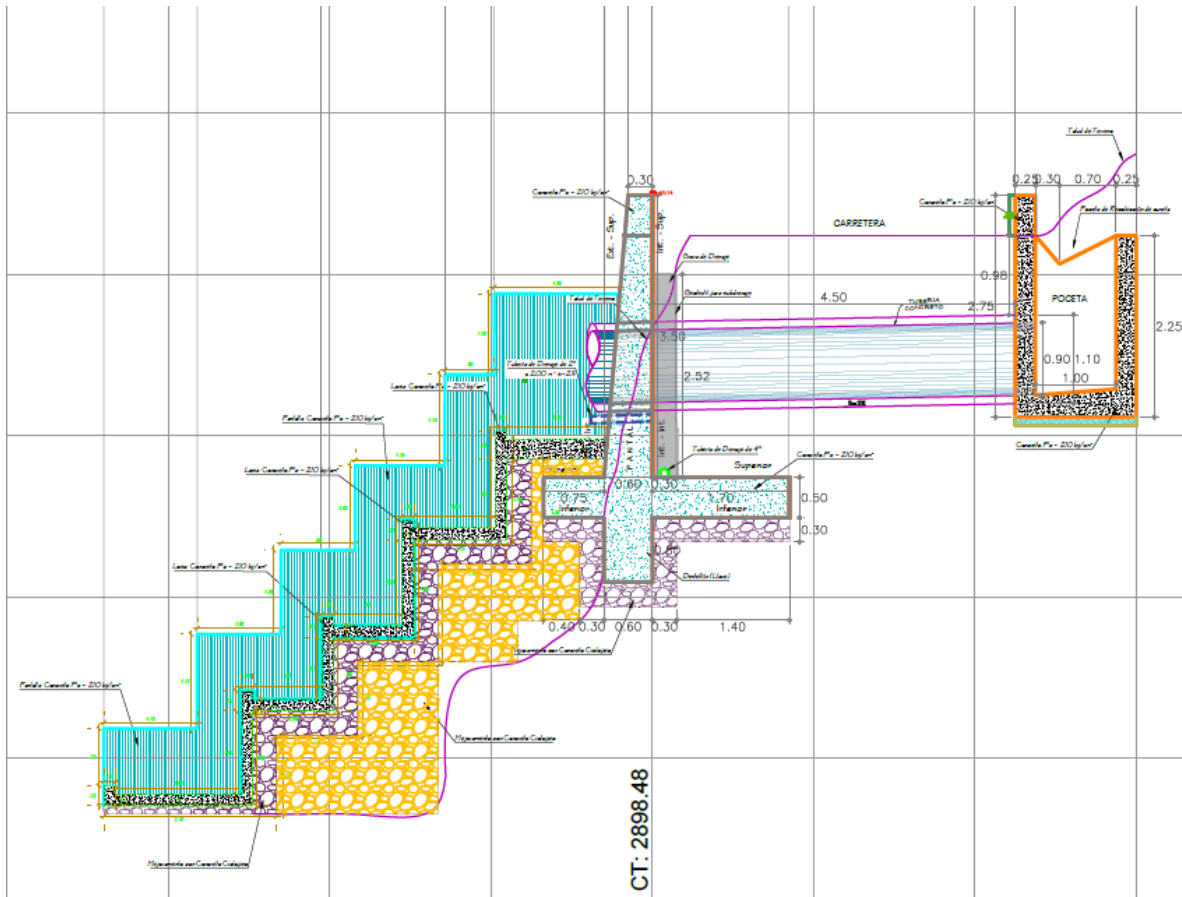

Perfila muro alcantarilla

## 9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El contrato de obra finalizó el día 31/03/2026

## 9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

## 9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

## 10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visita al sitio de obra el día 20/03/2026


## 11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comunicación permanente con el contratista de obra

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b> <b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		12	DE

**12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA**  
 CC. 98.387.529
