

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
105-4-25

TRAMO 2



TRAMO 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

SANTA ROSA DE VITERBO-BOYACÀ.
2026

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
105-4-25

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

INFORME No. 6

01 DE MAYO DE 2026 – 31 DE MAYO 2026

ELABORÓ: ING. JHON BRAYAN DIAZ LEIVA FECHA: 30-05-2026	APROBÓ: ING. LUIS SANTIAGO CELY. FECHA: 31-05-2026
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0	31/05/2026	EMISION INFORME No. 6



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Contenido

1. GENERALIDADES.....	5
1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	7
1.3. DATOS GENERALES	7
1.4 OBJETIVO DEL INFORME	8
2. CONTROL DE CONTRATOS	9
2.1. ASPECTO JURIDICO	9
2.2. ASPECTO FINANCIERO	12
2.2.1. BALANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA.....	12
2.2.2. BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA	12
2.3. ASPECTO TÉCNICO	13
2.3.1. SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN	13
2.3.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO	14
2.3.3. AVANCE DEL PROYECTO	23
2.3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	27
2.3.5. ITEMS NO PREVISTOS	30
2.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.....	91
2.5. ASPECTO AMBIENTAL	97
2.5.2 CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL	98
2.5.3 MANEJO DE OFICINAS Y CENTROS DE ACOPIO	98
2.5.4 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:.....	99
2.5.5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.....	100
2.5.6 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.....	100
2.5.7 OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	101
2.5.8. GESTIÓN RESPTEL	102
2.5.9. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES	102
2.6. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). 102	
2.6.1. TABLA DE PERSONAL EN OBRA	103
2.6.2. RELACION PERSONAL OPERATIVO	104
2.6.3. EGRESO DE PERSONAL	107
2.6.4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	108

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 6 01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026	
---	--	---

2.6.5. HALLAZGOS EN OBRA.....	110
2.6.6. INSPECCIONES	112
2.6.7. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	118
2.7. INFORME DE CALIDAD	119
2.7.1. INFORME Y RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE MATERIALES.	119
2.7.2. ENSAYOS REALIZADOS	120
2.7.3. CERTIFICACIONES Y/O FICHAS TÉCNICAS.....	123
3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	124
ANEXOS	125

Listado de tablas

Tabla 1 Datos generales del proyecto	8
Tabla 2 Relación pólizas de interventoría	10
Tabla 3 Relación pólizas contrato de obra	11
Tabla 4 Balance financiero contrato de obra	12
Tabla 5 Balance financiero contrato interventoría.....	13

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000009-2024 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL Y EL FONDO ROTATORO DE LA POLICIA” proyecto la contratación de la “CONSTRUCCION DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES- ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000009-2024”, el cual tiene fundamento en factores principales fortalecer la seguridad de las instalaciones de la unidad policial ya que han sido objeto de intenciones terroristas por grupos al margen de la ley, dado lo anterior se encuentra la necesidad de las obras de construcción el cual requiere de una interventoría, en ese orden de ideas se van a contratar por parte del FORPO para la dirección de educación policial y con el fin único de realizar el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato, cuando este supone conocimiento especializado en la materia.

Es importante establecer que las obras a ejecutar y en verificación por la interventoría presentan estudios y diseños técnicos de los cuales las firmas contratistas tanto de obra como de interventoría realizan las respectivas validaciones, es así que de presentarse observaciones será informado a la entidad contratante con el fin de buscar alternativas de solución y conllevar a términos ideales la ejecución de las obras.

El proyecto consiste en la construcción de 1.700 metros lineales (ml) de cerramiento, diseñado en cuatro tipos diferentes, según el paquete planimétrico formulado por la consultoría responsable del diseño.

El diseño contempla en dos tramos, detallados de la siguiente manera:

- Tramo #1 sector norte: longitud de 560 ml.
- Tramo #2 sector sur longitud restante de 1.140 ml.

Adicional y como consecuencia de las necesidades operativas de la entidad el proyecto contempla construcción de 4 garitas ubicadas según planos y especificaciones de diseño.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026

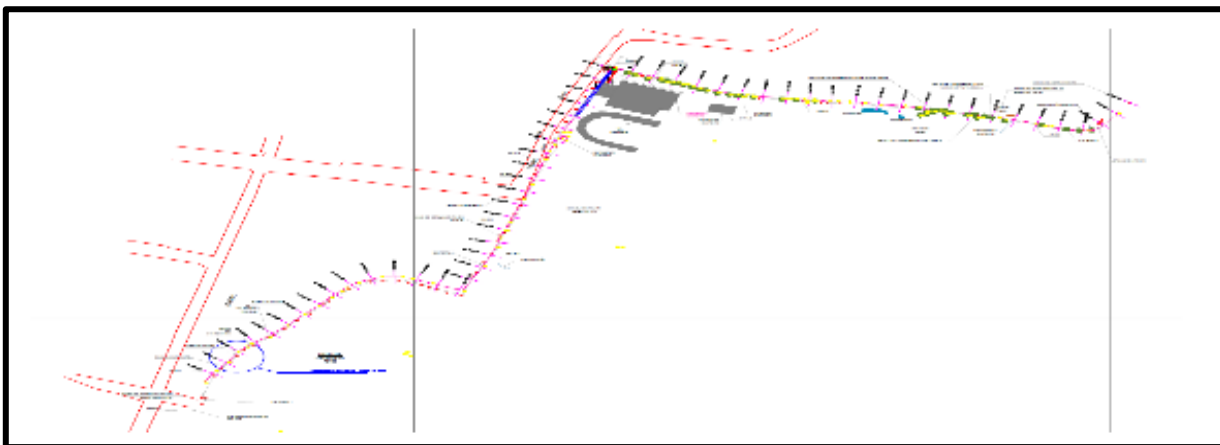


Ilustración 1 Distribución cerramiento a construir tramo #1

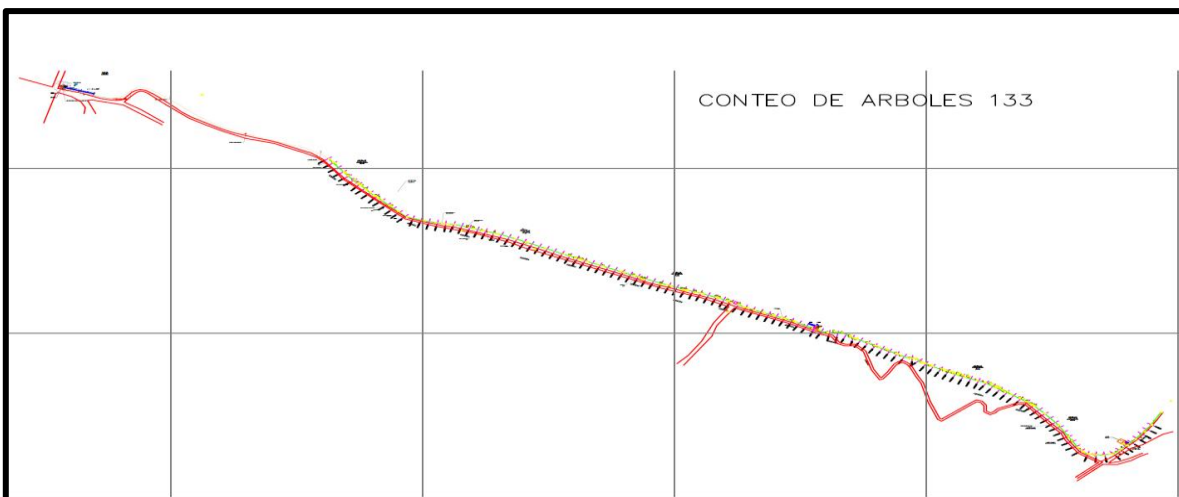


Ilustración 2 Distribución cerramiento a construir tramo #2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto abarca un total de 1.700 metros lineales (ml), ubicados dentro del perímetro de las instalaciones de la Escuela de Policía Rafael Reyes, ubicada en la Carrera 2 No. 8-98, Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Esta zona de influencia se define como el espacio inmediato sobre el cual las actividades del proyecto pueden generar impactos directos o indirectos, incluyendo intervenciones en infraestructura, movilidad de personal y posibles efectos sobre la vegetación y el entorno urbano adyacente. El desarrollo del proyecto sobre esta área del perímetro mejorar la seguridad en la zona y la coordinación con la entidad educativa para minimizar afectaciones durante en la operatividad de la entidad.



Ilustración 3 Localización identificación del área a intervenir

1.3. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S Nit: 800205914-1 R/L. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ C.C. 4.266.600 Avenida carrera 27 No.18-44 Bogotá (601) 3600541 administrativa@siu.com.co	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. Nit: 900.436.622-8 R/L. EHIDA JULIET RAMIREZ GÜINA C.C. 1.118.537.436 Carrera 51 No. 64- 83 OF 201 +57(1) 365 67 24 Bogotá D.C. interventorialogiaforpo@gmail.com logiatres@gmail.com /
Contrato: 110-3-25 de 2025	Contrato: 105-4-2025

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024”	objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”
Valor: \$4.194.963.733,98	Valor: \$124.569.260,77
Valor Adición No. 1: No Aplica	Valor Adición No. 1: \$165.006.473,78
Valor Total contrato de obra: \$4.194.963.733,98	Valor total interventoría: \$289.575.734,55
Estado de contrato: En ejecución	Estado de contrato: En ejecución
Acta de Inicio: 24/11/2025	Acta de Inicio: 24/11/2025
Fecha de terminación inicial: Hasta el 31 de diciembre del 2025	Fecha de terminación inicial: Hasta el 31 de diciembre del 2025
Prorroga No.1 Hasta el 23 de marzo del 2026	Prorroga No.1 Hasta el 23 de marzo del 2026
Fecha de terminación prorroga #1: Hasta el 23 de marzo de 2026	Fecha de terminación prorroga #1: Hasta el 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación prorroga #2: Hasta el 30 de agosto de 2026	Fecha de terminación prorroga #2: Hasta el 30 de agosto de 2026
Plazo de ejecución: 119 días	Plazo de ejecución: 119 días

Tabla 1 Datos generales del proyecto

1.4 OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento, control y evaluación técnica, administrativa y financiera de la ejecución del contrato de obra, N. 110-3-25 que tiene “CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024”.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



El objetivo del informe es documentar y evaluar el avance de la obra, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los planos estructurales, las normas de calidad, seguridad y ambientales, así como los requisitos contractuales establecidos.

Durante el periodo de seguimiento, el informe identifica y registra:

- El avance físico y financiero del proyecto, comparando lo planificado frente a lo ejecutado.
- El cumplimiento de los requerimientos técnicos, verificando la correcta ejecución de cada tramo y tipo de cerramiento.
- Las problemáticas y riesgos presentados en obra, incluyendo obstáculos en campo, manejo de especies arbóreas y desviaciones detectadas.
- Las acciones correctivas y recomendaciones sugeridas para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.

Este informe se constituye como un documento de evidencia objetiva, que permite a la entidad contratante contar con información confiable sobre el estado actual del proyecto y la gestión del contratista, facilitando la toma de decisiones oportunas y la planificación de medidas correctivas cuando sea necesario.

2. CONTROL DE CONTRATOS

2.1. ASPECTO JURIDICO

FIRMA DE ACTA DE INICIO	FECHA
ACTA DE INICIO OBRA.	24/11/2025
ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	24/11/2025

OTROS MODIFICATORIOS AL CONTRATO	FECHA
Prorroga No.1 contrato de interventoría	31/12/2025
Prorroga No.2 contrato de obra	23/03/2026
Prorroga No.2 obra e interventoría	30/08/2026

POLIZAS INTERVENTORÍA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA INTERVENTORÍA - CUMPLIMIENTO					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	16/10/2025	23/03/2026	\$37,370,778.23	Vigente
	Pagos de salarios, prestaciones	16/10/2025	23/03/2029	\$6,228,463.04	Vigente

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



14-44-101247400	sociales legales e indemnizaciones laborales				
	Calidad del servicio	16/10/2025	23/03/2027	\$37.370.778,23	Vigente

Nota: Modificación correspondiente acta de inicio

Tabla 2 Relación pólizas de interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA INTERVENTORÍA – RESPONSABILIDAD CIVIL					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 14-40-101076996	Predios labores y operaciones	16/10/2025	23/03/2026	\$350,181,000	Vigente
	Daño emergente y lucro cesante	16/01/2025	23/03/2026	\$35,018,100.	Vigente
	Perjuicios extrapatrimoniales	16/01/2025	23/03/2026	\$35,018,100.00	Vigente

Nota: Modificación correspondiente suscripción prórroga #1

POLIZAS DE INTERVENTORÍA PRORROGA 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA INTERVENTORÍA - CUMPLIMIENTO					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 14-44-101247400	Cumplimiento del contrato	16/10/2025	23/09/2027	\$86,872,720.37	Vigente
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/10/2025	23/03/2029	\$14,478,786.73	Vigente
	Calidad del servicio	16/10/2025	23/03/2027	\$86,872,720.37	Vigente

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA INTERVENTORÍA – RESPONSABILIDAD CIVIL					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 14-40-101076996	Predios labores y operaciones	16/10/2025	30/08/2026	\$350,181,000	Vigente
	Daño emergente y lucro cesante	16/10/2025	30/08/2026	\$35,018,100	Vigente
	Perjuicios extrapatrimoniales	16/10/2025	30/08/2026	\$35,018,100	Vigente

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



POLIZAS CONTRATO DE OBRA PRORROGA #2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA OBRA					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTAD O
Berkley International Seguros Colombia S.A 99181	Cumplimiento del contrato	07/11/2025	13/03/2028	\$1.258.489.120,19	Vigente
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/11/2025	30/08/2029	\$ 209.748.186,70	Vigente
	Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 1.258.489.120,19	Vigente
	Calidad del servicio	07/11/2025	30/08/2027	\$ 1.258.489.120,19	Vigente
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	07/11/2025	30/08/2029	\$ 1.258.489.120,19	Vigente
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL OBRA –					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
Berkley International Seguros Colombia S.A 28567	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/11/2025	30/08/2026	\$ 700.362.000	Vigente
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07/11/2025	30/08/2026	\$ 700.362.000	Vigente
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIO	07/11/2025	30/08/2026	\$ 700.362.000	Vigente

Nota: Modificación correspondiente suscripción prórroga #2

Tabla 3 Relación pólizas contrato de obra



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.2. ASPECTO FINANCIERO

Forma de pago contrato de obra

El Fondo Rotatorio de la Policía se compromete a pagar el valor total del contrato parcial, en pesos colombianos, de acuerdo con el avance de ejecución de la obra, los cuales deben contar con el respectivo recibo a satisfacción por parte de la interventoría del proyecto.

Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el oferente tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de recepción de los avances de la obra proyectados previo cumplimiento de los siguientes requisitos.

PAGO ACTAS PARCIALES MENSUALES: *Equivalente al noventa y cinco (95%) del valor total del contrato, y se pagara según el avance de obra, previa suscripción de las respectivas actas parciales mensuales de obra, hasta llegar al cien por ciento (100%) del avance físico real de la obra; estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra, y avaladas por la interventoría.*

2.2.1. BALANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo de actividades no se evidencia gestión de pagos al contratista de obra

A continuación, se presenta resumen financiero del contrato de obra No. 110-3-25 del 2025

BALANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PAGO TRAMITADO	SALDO POR TRAMITAR
Valor contrato	\$ 4.194.963.733,98	-	\$ 3.627.346.177,81
Acta #1		\$ 567.617.556.17	
Pagos mensuales hasta el 95% del valor del contrato	-	-	-
Liquidación (5 %)	-	-	-
Sumatoria	\$ 4.194.963.733,98	\$567.617.556.17	\$ 3.627.346.177,81

Tabla 4 Balance financiero contrato de obra

Nota: Para el periodo reportado el contratista de obra envió a la interventoría el acta de corte #1 que está pendiente de pago por la entidad contratante.

2.2.2. BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA

Forma de pago contrato de interventoría

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



El Fondo Rotatorio de la Policía, se compromete a pagar el valor del contrato en pagos mensuales conforme el equipo efectivamente activado para el seguimiento del contrato de obra, sin que de ninguna manera se supere el valor total del contrato. Dichos pagos se realizarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aceptación de la factura, de conformidad en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020.

Si el oferente tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el párrafo transitorio del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de recepción.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORIA			
DESCRIPCIÓN	VALOR	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 289.575.734,55	-	\$ 133.889.855,79
CORTE 1		\$ 155.685.878,76	
CORTE 2			
CORTE 3			
CORTE 4			
CORTE 5			
CORTE 6			
Total sumatoria	\$ 289.575.734,55	\$ 155.685.878,76	

Tabla 5 Balance financiero contrato interventoría

Nota: La interventoría envía por medio de correo electrónico con oficio 107 a la Arq. Janet Iveth Entrega de documentación para pago No. 1 contrato de interventoría No. 105-4-25, sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente de pago.

2.3. ASPECTO TÉCNICO

2.3.1. SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN


Se realiza seguimiento a la programación semanal físico

Fechas	Semanas	Programado semanal	Ejecutado semanal	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado
4 mayo al 10 mayo	Semana 24	2,89%	3,00%	25,94%	39,87%
11 mayo al 17 mayo	Semana 25	4,06%	5,00%	30,00%	44,87%
18 mayo al 24 mayo	Semana 26	3,00%	2,33%	33,00%	47,20%
25 mayo al 31 mayo	Semana 27	4,00%	1,00%	37,00%	48,20%

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026

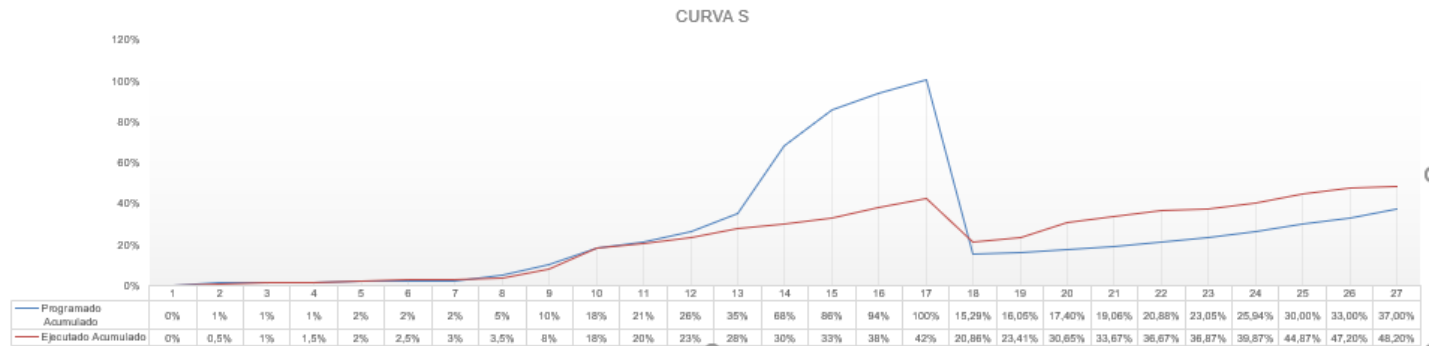

ACTIVIDADES EN ATRASO SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA

Actividad atrasada	¿Atribuible al contratista?			Fechas Programadas de Ejecución		Observación
	SI	X	NO	INICIO	FIN	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	SI	X	NO	30/12/2025	11/2/2026	Falta las excavaciones de pilotes desde garita 3 hasta finalizar el tramo 2. Nota: El contratista tiene cuatro personas trabajando desde garita 3 subiendo por la zona boscosa y 2 desde garita 4 bajando.
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=28MPa	SI	X	NO	12/2/2026		Falta la construcción de la garita #4

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



					FIN	23/2/2026	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO $f_c=28MPa$	SI	X	NO		INICIO	12/3/2026	
					FIN	12/5/2026	
PILOTES $f_c= 28 Mpa$, concreto tipo tremie, $d=0.25 m$	SI	X	NO		INICIO	30/12/2025	Falta los pilotes desde garita 3 hasta garita 4 y desde garita 1 pasando por casas fiscales y falta desde garita 4 hasta finalizar el tramo 2.
					FIN	26/3/2026	
COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO $f_c=28 Mpa$ (sin refuerzo, incluye formaleta)	SI	X	NO		INICIO	24/2/2026	Falta las columnas que no se han fundido del cerramiento tipo 2 mixto tramo 2 y garita 4 primer nivel y segundo nivel
					FIN	11/3/2026	
PLACA ENTREPISO STEEL DECK $h=0.25m$ EN CONCRETO $f_c=28 MPa$, TORTA SUPERIOR $e=0.10m$ (No incluye refuerzo)	SI	X	NO		INICIO	8/4/2026	Falta la construcción de la garita 4
					FIN	23/4/2026	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



PLACA ENTREPISO STEEL DECK h=0.25m EN CONCRETO f'c=28 MPa, TORTA SUPERIOR e=0.07m (No incluye refuerzo)	SI	X	NO		INICIO	8/4/2026	Falta la construcción de la garita 4, Falta la de la garita 3
					FIN	23/4/2026	
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO f'c=28 Mpa	SI	X	NO		INICIO	12/3/2026	Falta la construcción de la garita 4 y las vigas áreas de garita 3.
					FIN	7/4/2026	
MMURO CERRAMIENTO TIPO 1 LLENO H= 2.50 mt. Incluye: muro en bloque concreto e=20 cm con celdas rellenas en grouting, alfajía en concreto de 10 x 40 cm, pañete, pintura, concertina diámetro = 45 cm. Ver especificaciones técnicas y detalles arquitectónicos	SI	X	NO		INICIO	6/5/2026	El contratista no ha dado inicio a esta actividad.
					FIN	27/8/2026	
MURO EN LISO BLOQUE DE CONCRETO (19 * 19 * 39) E= 0.19 cm, Altura mayor de 60 cm, INCLUYE CELDAS RELLENAS EN GROUTING DE 21 Mpa, MORTERO DE PEGA 1:3	SI	X	NO		INICIO	24/4/2026	
					FIN	11/6/2026	
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO (14 * 19 * 39) E = 0.14 cm, INCLUYE CELDAS RELLENAS EN	SI	X	NO		INICIO	24/4/2026	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



GROUTING DE 21 Mpa, MORTERO DE PEGA 1:3 PARA GARITAS					FIN	11/6/2026	Falta el primer nivel de la garita 1,3,4 y segundo nivel de la misma
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO (9 * 19 * 39) E= 0.09 cm. Altura menor o igual 60 cm, INCLUYE CELDAS RELLENAS EN GROUTING DE 21 Mpa, MORTERO DE PEGA 1:3 PARA CUBIERTA GARITA	SI	X	NO		INICIO	24/4/2026	
					FIN	11/6/2026	
ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=VARIABLE. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE	SI	X	NO		INICIO	24/4/2026	
					FIN	11/6/2026	
ACERO DE REFUERZO FS = 420 MPA PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (INCLUYE EL SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO, GRAFILES, ESCALERILLA, ETC., JUNTO CON EL ALAMBRE NEGRO DE AMARRE)	SI	X	NO		INICIO	24/4/2026	
					FIN	11/6/2026	
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO f'c=28 Mpa (sin refuerzo, incluye formaleta)	SI	X	NO		INICIO	13/4/2026	Falta fundir el cuerpo del muro.
					FIN	11/5/2026	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA POLIMERICA TIPO SIKAPLAN 15G CO e=1.5mm. INCLUYE REMATES	SI	X	NO		INICIO	26/5/2026	El contratista no ha dado inicio a esta actividad
					FIN	9/7/2026	
MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 EN CUBIERTA (INCLUYE DILATACIÓN)	SI	X	NO		INICIO	24/4/2026	El contratista no ha dado inicio a esta actividad
					FIN	25/5/2026	
CAÑUELA CENTRAL CUBIERTA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	SI	X	NO		INICIO	24/4/2026	El contratista no ha dado inicio a esta actividad
					FIN	25/5/2026	
TUBERÍA EN PEAD Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	SI	X	NO		INICIO	15/5/2026	El contratista trabaja en excavaciones pero no ha instalado la tubería PEAD que va desde garita 4 hasta garita 3.
					FIN	29/5/2026	
TUBERÍA PVC-S 2" (INCLUYE UNIONES)	SI	X	NO		INICIO	28/4/2026	Falta instalar la de garita 4 que es la tubería de lavamanos.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



					FIN	12/5/2026	
TUBERÍA PVC-S 4" (INCLUYE UNIONES)	SI	X	NO		INICIO	28/4/2026	Falta instalar la de garita 4 que es del sanitario y la totalidad del proyecto.
					FIN	12/5/2026	
SALIDA SANITARIA DESAGÜE 2" (SIFÓN DE PISO)	SI	X	NO		INICIO	13/5/2026	Falta la garita 4
					FIN	27/5/2026	
SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	SI	X	NO		INICIO	13/5/2026	Falta la garita 4
					FIN	27/5/2026	
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	SI	X	NO		INICIO	13/5/2026	Falta la garita 4
					FIN	27/5/2026	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



CODO 45° PVC-S 4"	SI	X	NO					INICIO	13/5/2026	Falta la garita 4
								FIN	25/5/2026	
CODO 45° PVC-S 2"	SI	X	NO					INICIO	13/5/2026	Falta la garita 4
								FIN	25/5/2026	
YEE PVC-S (4" X 2")	SI	X	NO					INICIO	13/5/2026	Falta la garita 4
								FIN	25/5/2026	
YEE PVC-S 4"									13/5/2026	Falta la garita 4
									25/5/2026	
YEE PVC-S 2"	SI	X	NO					INICIO	13/5/2026	Falta la garita 4

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



					FIN	25/5/2026	
CAJA DE INSPECCION 60 X 60	SI	X	NO		INICIO	13/5/2026	El contratista inicio excavaciones pero no se ha construido ninguna caja hasta el momento.
					FIN	29/5/2026	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80	SI	X	NO		INICIO	13/5/2026	El contratista inicio excavaciones pero no se ha construido ninguna caja hasta el momento.
					FIN	29/5/2026	
MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	SI	X	NO		INICIO	28/5/2026	El contratista no ha dado inicio a esta actividad, debido a que no se ha iniciado con el alistado y enchape del baño para instalarlos.
					FIN	16/6/2026	
MONTAJE DE APARATOS LAVAMANOS	SI	X	NO		INICIO	28/5/2026	El contratista no ha dado inicio a esta actividad, debido a que no ha dado inicio a los enchapes del baño para instalarlos.
					FIN	16/6/2026	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



SISTEMA FAFA 1650 L INCLUYE ACCESORIOS	SI	X	NO		INICIO	1/6/2026	El contratista no ha llevado a obra el sistema FAFA o pozo séptico
					FIN	7/7/2026	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	SI	X	NO		INICIO	14/4/2026	Falta las excavaciones total del proyecto en desagues.
					FIN	27/4/2026	
FILTRO BAJO PISO 4" PERFORADO H=0.50 m	SI	X	NO		INICIO	28/4/2026	El contratista no ha dado inicio a esta actividad
					FIN	3/6/2026	
Banco 1Ø2" PVC	SI	X	NO		INICIO	12/2/2026	Falta tubería para la conexión de garita 4 hacia el tablero
					FIN	27/5/2026	

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 6 01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026	
---	--	---

2.3.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Fechas	Semanas	Programado		Ejecutado		Atraso/Adelanto
		Programado semanal	Programado Acumulado	Ejecutado semanal	Ejecutado Acumulado	
4 mayo al 10 mayo	semana 24	\$ 39.013.162,73	\$ 1.578.564.853,14	\$ 68.606.525,20	\$ 1.142.683.425,43	-10,39%
11 mayo al 17 mayo	semana 25	\$ 39.432.659,10	\$ 1.617.997.512,24	\$ 255.849.270,24	\$ 1.398.532.695,67	-5,23%
18 mayo al 24 mayo	semana 26	\$ 39.432.659,10	\$ 1.657.430.171,34	\$ 76.189.924,33	\$ 1.474.722.620,00	-4,36%
25 mayo al 31 mayo	semana 27	\$ 39.432.659,10	\$ 1.696.862.830,44	\$ 39.922.408,37	\$ 1.514.645.028,37	-4,34%




Según el análisis financiero a la semana 27 el contratista tiene un atraso financiero del -11,10%, se le recomienda al contratista contratar más cuadrillas para dar inicio a varias actividades que ingresaron al contrato según cronograma.

2.3.3. AVANCE DEL PROYECTO

Para el período comprendido entre el 01 de mayo de 2026 y el 31 de mayo de 2026, el contratista adelantó las actividades que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta los siguientes determinantes técnicos, administrativos y ambientales:

1. TRAMO 2:

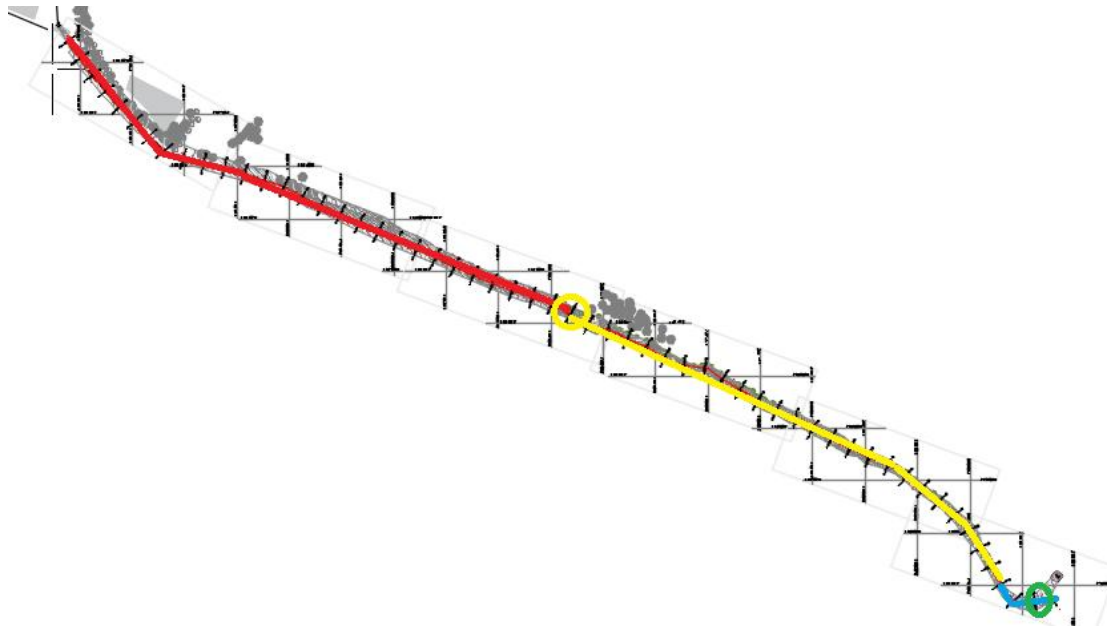

Se trabajo las siguientes actividades en el color rojo, amarillo y azul y el circulo amarillo y verde son garita 3,4.

Actividades en color Rojo

- Base en concreto pobre
- Viga de contra cimentación en concreto
- Dado de cimentación
- Columnas y pantallas de concreto
- Alfajía en concreto/o fundida en obra
- Acero de refuerzo
- Muro cerramiento tipo 2 mixto (Pegue de bloque en concreto, tubería galvanizada, Pañete impermeabilizado interno, instalación de 40 mallas solamente punteadas)

Actividades en color Amarillo

- Localización, trazado y replanteo muro de cerramiento
- Descapote manual
- Excavación manual en material común para tubería eléctrica y pilotes
- Banco 1Ø2" pvc



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Actividades en color Azul

- Localización, trazado y replanteo muro de cerramiento
- Desmonte de cerramiento en postes, alambre y concertina
- Cerramiento en poli sombra h=2.10m
- Descapote manual
- Excavación manual en material común para tubería eléctrica y pilotes
- Banco 1ø2" PVC
- Perfilado terreno

Actividades en color Amarillo Garita 3.

- Columnas y pantallas de concreto primer nivel y segundo nivel.
- Vigas aéreas en concreto segundo nivel
- Placa entrepiso steel deck Segundo nivel
- Acero de refuerzo

Actividades en color Verde Garita 4.

- Localización, trazado y replanteo garitas
- Descapote manual garitas
- Excavación manual en material común para zapatas.
- Concreto ciclópeo

2. Tramo 1



Se trabajo las siguientes actividades en el color Naranja, verde claro, gris, café, negro y circulo amarillo es garita 1.

Actividades en color Naranja



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



- Muro cerramiento tipo 3a malla, (Instalación de la segunda malla, con anticorrosivo)

Actividades en color verde claro.

- Muro cerramiento tipo 3 malla (Instalación de mallas faltantes, ángulos, soldaduras, anticorrosivo, pintura, concertina.).
- Excavación manual en material (Tubería eléctrica y Cajas 60*60 y 30*30)
- Banco 1Ø2" PVC
- Banco 1Ø11/2" PVC
- Cajas de 60*60 y Cajas de 30*30 Eléctricas

Actividades en color gris.

- Muro cerramiento tipo 2 mixto (Instalación de mallas eslabonadas, ángulos, anticorrosivo, pintura, soldadura y concertina)

Actividades en color Café (Muro de contención)

- Excavación manual en material común.
- Relleno en material granular
- Base en concreto pobre
- Aceros de refuerzo (Zarpa y Cuerpo de muro)
- Muro de contención de concreto (Fundida de Zarpa)


Actividades en color Negro

- Desmonte de cerramiento en postes, alambre y concertina
- Demolición de muros de cerramiento en tapia pisada y cimientos enterrados existentes
- Desmonte de cerramiento en bolsacreto
- Excavación manual en material (Tubería eléctrica y Cajas 60*60 y 30*30)
- Banco 1Ø2" PVC
- Cajas de 60*60

Actividades en color Amarillo (Garita 1)

- Columnas y pantallas de concreto primer nivel y segundo nivel.
- Vigas aéreas en concreto segundo nivel
- Placa entrepiso steel deck Segundo nivel
- Vigas aéreas en concreto Cubierta
- Placa entrepiso steel deck Cubierta
- Acero de refuerzo

GARITA 2

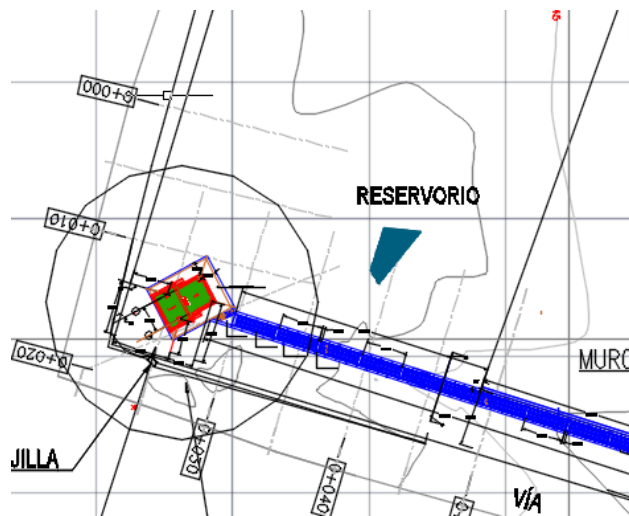

- Excavación manual en material (Tubería eléctrica hacia garita tablero, Filtro Frances 4”, Tubería suministro de 1/2”)
- Banco 1Ø2" PVC
- Pañete liso interior garitas
- Pañete impermeabilizado para fachadas
- Suministro transporte e instalación de Tablero de distribución TWP-12M de 12 circuitos tipo enchufables
- Tubería PVC-p RDE 9 ø 1/2

2.3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS

GARITA 2, TRAMO 1, GARITA 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA 3

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



<p>4 may 2026 4:07:19 p.m.</p>	<p>4 may 2026 4:07:21 p.m.</p>
<p>4 may 2026 3:37:52 p.m.</p>	<p>4 may 2026 4:08:50 p.m.</p>
<p>TRAMO 1: No hay actividades en cerramiento tipo 2 y 3 en mallas, se continua con el trabajo de cajas eléctricas y excavaciones con rellenos del mismo.</p>	
<p>GARITA 2: Se continúan trabajos de pañetes exteriores impermeabilizados</p>	
<p>GARITA 1: Se coloca vinipel para curado propio de las columnas.</p>	
<p>TRAMO 2: Se continúa trabajando en aceros y formaleta de las alfajías de 10x40, se continua con el pegue de bloque en concreto del cerramiento tipo 2 mixto, se funden 12 módulos, se funden solados</p>	
<p>GARITA 3: Se coloca vinipel para el curado de las columnas</p>	
<p>TRAMO 1, GARITA 2</p>	

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



5 may 2026 9:13:33 a.m.



5 may 2026 2:11:11 p.m.



5 may 2026 2:11:29 p.m.



5 may 2026 2:16:49 p.m.



5 may 2026 2:26:02 p.m.



5 may 2026 2:25:16 p.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA3

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



5 may 2026 3:53:48 p.m.



5 may 2026 3:54:06 p.m.



5 may 2026 3:54:22 p.m.



5 may 2026 4:09:09 p.m.



5 may 2026 4:30:10 p.m.

TRAMO 1: Se continua con los trabajos de grata o Lija al cerramiento tipo 3, se trabaja en fundida de cintas de las cajas eléctricas de 60x60, se continua con la instalación de las mallas del cerramiento tipo 2 mixto.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



GARITA 2: Se continua con los pañetes exteriores impermeabilizado

GARITA 1: Se trabaja en el armado de testero para la placa de entepiso

GARITA 3: Sin actividad

TRAMO 2: Se funden 10 alfajías de 10*40 y se funden pedestales del cerramiento tipo 2 mixto, se toma muestra de cilindros para la fundida de alfajías, se continua con el pegue de bloque en concreto, se encofra 12 módulos más con sus respectivos aceros de refuerzo, se instalan la tubería galvanizada de 2"1/2

Nota: Ingres a obra el Ing. Santiago director de interventoría a realizar recorrido para verificar el avance en obra.

TRAMO 1, GARITA 2

TRAMO 2

TRAMO 1: Jornada de aseo y orden en la obra

GARITA 2: Jornada de aseo y orden.

TRAMO 2: Se trabajo en el encofrado de unas secciones de vigas y se realizo jornada de aseo y orden.

GARITA 1, GARITA 2, TRAMO 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA 3

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



6 may 2026 2:56:09 p.m.



6 may 2026 3:00:43 p.m.



6 may 2026 3:00:46 p.m.



6 may 2026 3:04:11 p.m.

TRAMO 1: Se continúa aplicando el sellante y anticorrosivo después de realizar una estricta limpieza con grata o lija en el cerramiento malla tipo 3, Foto del producto aplicado en las mallas y tubería galvanizada, se continúa con las excavaciones eléctricas para la tubería de 1"1/2", se continúa con la instalación de la malla eslabonada con sus respectivos ángulos y soportes, se da inicio a la excavación para el muro de contención

GARITA 1: Se continúa con el encofrado y armado de aceros de las vigas de entepiso

GARITA 2: Se continúa trabajando el pañete exterior

TRAMO 2: se trabaja en desencofrado de las alfajías anteriores fundidas y se encofra 12 alfajías más para ser fundidas con sus aceros, Se funden 10 pedestales del cerramiento tipo 2 mixto, se continúa con el armado de aceros de las vigas de cimiento, se continúa con el pegue de bloque de concreto, se funde 12 módulos más del cerramiento tipo 2.

GARITA 3: Se continúa con el armado de aceros de las vigas aéreas.

TRAMO 1, GARITA 2, GARITA 1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA 3



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



7 may 2026 4:13:42 p.m.



7 may 2026 4:22:21 p.m.

TRAMO 1: Se continua con la aplicación del producto anticorrosivo y sellante 2*1 Wash Primer en cerramiento tipo 3, y se viene pintando, se continua con la instalación de malla eslabonada con su respectivos ángulos y soportes, se finalizó la excavación del muro de contención.

GARITA 2: Se continua con el pañete impermeabilizante interno y externo y se inicia con el sobre piso en la cubierta y se instala dos gárgolas.

GARITA 1: Se continua con el armado de aceros de las vigas aéreas.

TRAMO 2: Se continua con fundida de alfajías y pedestales, grouting de 21 MPA, se simbra los modulos para continuar con el pegue de bloque en concreto, se decencofra las vigas fundidas el día anterior, y se encofra otros 12 módulos más, y se da inicio al descapote desde garita 3 actual hasta la antigua ubicación garita 3

GARITA 3: Se continua con el armado de aceros de las vigas aéreas.

TRAMO 1, GARITA 2, GARITA 1



8 may 2026 3:22:34 p.m.



8 may 2026 3:40:22 p.m.



8 may 2026 3:46:27 p.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA 3



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se continúan trabajos de anticorrosivo y sellante y a su vez se da espera para aplicar la Pintura

GARITA 2: Se continúa con el pañete impermeabilizado exterior

GARITA 1: Se continúa con el armado de aceros y encofrado de la misma.

TRAMO 2: Se encofra 12 alfajías en el cerramiento tipo 2 mixto, se funden pedestales, se funde grouting de 21MPA, se continúa con el pegue de bloque en concreto.

GARITA 3: Se trabaja con las vigas aéreas.

GARITA 2, TRAMO 1, GARITA 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se inicia con la soldadura de la malla eslabonada para el cerramiento tipo 3A doble altura, se da inicio a excavaciones eléctricas desde el tramo de garita 1 hacia casas fiscales.

GARITA 2: Se continua en trabajos de pañete impermeabilizado exterior.

GARITA 1: Se realiza la verificación según planos del acero de las vigas aéreas y los respectivos espacios

TRAMO 2: Se funden alfajías, pegue de bloque en concreto.

GARITA 3: Se continua con el armado de vigas aéreas y encofrado de la misma.

GARITA 2, TRAMO 1, GARITA 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



<p>11 may 2026 1:57:46 p.m.</p>	<p>11 may 2026 1:50:23 p.m.</p>
<p>11 may 2026 2:32:18 p.m.</p>	
<p>TRAMO 1: Se trabaja en instalación de doble altura, aplicación de pintura y a su vez en otros módulos aplicación de grata y Aplicación de Whasprimer anticorrosivo, se trabaja en pañete de los muros de cerramiento tipo 2 mixto y se trabaja en la misma instalación de malla eslabonada con sus respectivos ángulos y soportes, excavaciones para instalación de tubería de. 2" desde garita 1 hasta finalizar el tramo 1, se trabaja en el muro de contención.</p>	
<p>GARITA 2: Se trabaja en Filos</p>	
<p>GARITA 1: Se fundió según planos para después instalar el Stell Delk y la malla electrosoldada</p>	
<p>TRAMO 2: Se trabaja en fundida de 10 alfajías para un total de 56 fundidas, se funden 10 pedestales, se continua con el pegue de bloque en concreto, se funden 12 módulos, se inicia con el replanteo desde garita 3 para poder iniciar con pilotes, se trabaja en excavación para tubería eléctrica desde garita 3.</p>	
<p>GARITA 3: No hay actividad</p>	
<p>TRAMO 2</p>	

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



12 may 2026 8:05:33 a.m.



12 may 2026 11:16:01 a.m.



12 may 2026 6:48:08 a.m.



12 may 2026 8:27:16 a.m.



12 may 2026 9:46:03 a.m.



12 may 2026 11:45:48 a.m.

TRAMO 1: Se continuaron trabajos del muro de contención

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



GARITA 2: Se continuaron con los fillos

GARITA 1: Sin actividad

GARITA 3: Se trabaja en aceros de vigas aéreas y formaleta.

TRAMO 2: Se continua con la instalación de aceros de las vigas de contra cimiento de los módulos de cerramiento tipo 2 mixto, se realiza el trazado con hilo por donde se debe realizar la excavación de la red eléctrica desde garita 4 hasta terminar el cerramiento, se trabaja en aceros de las columnas del cerramiento tipo 2, se continua con las excavaciones para la tubería de 2" desde garita 3 subiendo por zona boscosa.

TRAMO 1, GARITA 2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA 3



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



GARITA 1: Se funde la placa de entrepiso con su respectivo Stell delk y malla electrosoldada.

GARITA 2: No hay actividad.

TRAMO 2: se trabaja en decencofrado de las alfajía anteriores fundidas y se encofra 12 alfajías mas para ser fundidas con sus aceros, Se funden 10 pedestales del cerramiento tipo 2 mixto, se continua con el armado de aceros de las vigas de cimient, se continua con el pegue de bloque de concreto, se funde 12 modulos más del cerramiento tipo 2.

GARITA 3: Se encofra para ser fundidas las vigas segun planos y después la instalación del stell delk.

TRAMO 2, GARITA 3



14 may 2026 11:33:00 a.m.



14 may 2026 11:53:56 a.m.



14 may 2026 12:12:46 p.m.



14 may 2026 12:45:22 p.m.



14 may 2026 1:01:20 p.m.



14 may 2026 1:01:52 p.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se continua trabajando en wash primer anticorrosivo de la malla eslabonada y sus soportes del cerramiento tipo 2, se continua con trabajos de muro de contención

GARITA 2: Se continuan en filis

GARITA 1: Se decencofra las columnas y se instala el vinipel para el mejor curado

TRAMO 2: Se trabaja en pedestales para soportes de la tubería de luminación exterior, se realiza recorrido con el contratista SIU y AMG por la obra, se continua con la instalación de flejes de los pedestales del cerramiento tipo 2 mixto, se continua con el pegue de bloque en concreto, se realiza descapote para la excavación de la tuberia electrica de 2" en garita 4, se realiza trazado y ubicación donde va a ir cada pilote desde garita 3 actual, se continua el encofrado de 12 modulos.

GARITA 3: Se continua con el armado de aceros de las columnas del segundo nivel.

Nota: Ingresas a obra el Director de interventoría Ing. Santiago Cely y se realiza recorrido y se verifica el avance del proyecto.

TRAMO 1, GARITA 2, GARITA 1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA 3

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se trabaja en la instalación de concertina por modulo cerramiento tipo 2 mixto, se continua trabajos de solados de muro de contención.

GARITA 2: No hay actividad

GARITA 1: Se trabaja en aceros de columnas de segundo nivel

TRAMO 2: Se realizo recorrido con topografía y realizar la ubicación de la garita 4 y cerramiento.

GARITA 3: Se instala la Stell Delk y después se funde la placa completa.

GARITA 2, TRAMO 1, GARITA 1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se trabaja en instalación de otras dos mallas eslabonadas de doble altura, se trabaja en la instalación de aceros del cuerpo del muro de contención.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



GARITA 2: Sin actividad

GARITA 1: Se encofra las columnas y se funden del segundo nivel

TRAMO 2: Se trabaja en fundida de 12 modulos, alfajias.

GARITA 3: Sin actividad.

GARITA 2, TRAMO 1, GARITA 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



19 may 2026 2:56:12 p.m.



19 may 2026 3:55:47 p.m.



19 may 2026 3:56:38 p.m.

TRAMO 2



19 may 2026 9:54:08 a.m.



19 may 2026 9:57:31 a.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se instalan concertina del cerramiento tipo 2 mixto, se trabaja en aceros de la zarpa de muro de contención, se trabaja en algunas mallas faltantes por instalar en cerramiento tipo 3.

GARITA 2: Se trabaja en actividades electricas.

GARITA 1: Se decencofra las columnas y se instala vinipel para su curado

TRAMO 2: se trabaja en armado de formaleta para fundir alfajias 10*4, se trabaja en armado de aceros para las alfajias, se trabaja en formaletear las columnas del cerramiento tipo 2 mixto, se continua el pegue de bloque en concreto, se da inicio a la excavaciones de los pilotes, se da inicio al desmonte de la concertina cerca a garita 4, se realiza trazado y localización de la garita 4, se da inicio a la excavación de zanja para la red suministro de agua potable de 3/4" desde garita 4 hasta conectar a garita 3, se da inicio al pañete impermeabilizado de los muros de antepecho del cerramiento tipo 2 mixto

GARITA 3: Se termina el armado de aceros de las columnas del segundo nivel.

TRAMO 1, GARITA 2, MURO DE CONTENCIÓN



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



20 may 2026 9:55:53 a.m.



20 may 2026 9:57:58 a.m.



20 may 2026 9:58:48 a.m.



20 may 2026 10:00:38 a.m.



20 may 2026 10:09:20 a.m.



20 may 2026 10:10:28 a.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



20 may 2026 10:21:36 a.m.



20 may 2026 10:53:00 a.m.



20 may 2026 10:52:25 a.m.



20 may 2026 11:44:36 a.m.



20 may 2026 11:51:09 a.m.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se realiza distribución por el cerramiento tipo 3 de paquetes de concertina, se continua con la instalación de concertina en cerramiento tipo 3, se trabajan en muro de contención de aceros, se realiza el trazado del cerramiento tipo 1 muro lleno

GARITA 2: Se continua con las instalaciones eléctricas de tablero de 12 circuitos, tomas.

GARITA 1: Sin actividad

GARITA 3: Se encofra las 4 columnas para ser fundidas

Garita 4: Sin actividad

TRAMO 2: Se continua con el pañete interno del muro de cerramiento tipo 2, se realiza limpieza de los tubos galvanizados, se realiza limpieza de las alfajías fundidas día anterior, se trabaja en encofrado para las fundidas de 10 alfajías nuevas, se funden el grouting de los antepechos, se continua con el pegue de bloque en concreto, se continua con la localización por donde se piensa construir el cerramiento tipo 4 en proceso de aprobación, se trabaja en la tubería de PDEA 3/4" para suministro de garitas, se continua con el desmonte de concertina cerca garita 4, se funde últimos dos módulos en viga, dado y columna del cerramiento tipo 2 mixto.

TRAMO 1, GARITA 2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2, GARITA 3

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



21 may 2026 11:09:56 a.m.

TRAMO 1: Se continua con instalación de concertina en cerramiento tipo 3, se inicia con el cableado electrico del tramo 1, se realiza la verificación del acero de las zarpa del muro de contención.

GARITA 1: se inicia con el desmonte de parales y formaleta de la fundida de la placa de entrepiso pero se deja apuntalado.

GARITA 2: Se continua con trabajos electricos.

TRAMO 2: Se inicia con el acabado de las columnas, se continua con la limpieza de la tubería galvanizada, se funden 10 alfajias, se continua con el encofrado de las columnas del cerramiento tipo 2 mixto, se funde el grouting para el muro, llega personal para toma de medidas para las mallas eslabonada, se trabaja en pegue de bloque en concreto.

GARITA 3: Se decencofra la formaleta de la placa de entrepiso pero se deja apuntalado.

TRAMO 1, GARITA 2, GARITA 1



22 may 2026 8:59:19 a.m.



22 may 2026 9:02:39 a.m.



22 may 2026 9:04:00 a.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se continua con el cableado del circuito del tramo 1, se funde zarpa de muro de contención, se sacan muestras de cilindros de la fundida.

GARITA 2: Se trabaja en los puntos hidráulicos.

GARITA 1: Se trabaja en el armado de formaleta para las vigas aéreas y placa entepiso de cubierta.

TRAMO 2: Se da inicio con el pañete exterior del cerramiento tipo 2 mixto impermeabilizado, se continua con el encofrado de las 10 alfajías, cilindros de muestras marcados para ser llevados al laboratorio, aceros y encofrado de columnas, se evidencia que la vía usada para el trabajo del cerramiento tipo 2 está en óptimas condiciones, se continua con la fundida del grouting.

GARITA 3: Sin actividad

GARITA 4: Se continua con las excavaciones de las zapatas,

Nota: Ingres a obra el director de interventoría Ing. Santiago Cely, Ing. Julieth Ramírez Representante legal, se realizó la verifica del avance del proyecto y se realiza comité de obra donde se hablaron varios temas importantes para la obra.

GARITA 1, GARITA 2, TRAMO 1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se trabaja en mallas de doble altura del cerramiento tipo 3, se trabaja en instalación de concertina y se trabaja en el armado de aceros del cuerpo de muro de contención.

GARITA 2: Se trabaja en excavaciones para el filtro frances.

GARITA 1: Se inicia con el armado de aceros de las vigas aéreas de cubierta.

TRAMO 2: Se da inicio a la instalación de la malla para el cerramiento tipo 2 mixto solamente estan punteadas, se continua con el pañete interno del mismo, se inicia con el acabado de los pedestales del mismo, se funden 10 alfajas, se funden 10 columnas, se funden grouting, se inicia con la excavación de los pilotes para el cerramiento tipo 4.

GARITA 3: Sin actividad.

TRAMO 1, GARITA 2, GARITA 1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



26 may 2026 1:22:03 p.m.



26 may 2026 1:22:27 p.m.



26 may 2026 1:23:01 p.m.



26 may 2026 1:48:15 p.m.



26 may 2026 1:49:46 p.m.



26 may 2026 1:51:53 p.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se trabaja en fundida de cajas 60*60, se continua con soldadura del cerramiento tipo 3.

GARITA 2: Se instalaron las mirillas una de 60*60 y las otras 3 de 10x10 como pide planos y Moldes para las mirillas de las garitas 1.2.3.4

GARITA 1: Se trabaja en armado de formaleta en madera y armado de aceros de la viga contra cimientto y se funden, se sacas cilindros de la fundida, Llegan bloques en concreto para garita 1

TRAMO 2: Se funden 10 pedestales del cerramiento tipo 2, para un total de 18, Se toman muestras de cilindros de la fundidas de 12 módulos de vigas y dados de 4000 psi, se funden 12 módulos, se fundieron 7 solados, se continua el relleno y compactación de otros módulos, Se trabaja cerca a garita 3 el Cableado que será usado para la laminación exterior del cerramiento y suministros de la garita 3,

GARITA 3: Se verifica los aceros de los pedestales para ser fundidos.


TRAMO 1, GARITA 2, GARITA 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026

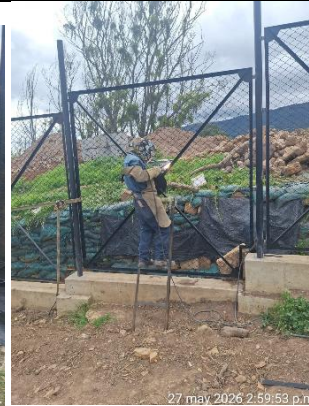

TRAMO 2, GARITA 3



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



27 may 2026 9:49:22 a.m.



27 may 2026 10:00:22 a.m.



27 may 2026 10:02:59 a.m.



27 may 2026 10:05:11 a.m.



27 may 2026 10:07:20 a.m.



27 may 2026 10:11:10 a.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



27 may 2026 10:18:15 a.m.



27 may 2026 10:45:59 a.m.



27 may 2026 10:46:36 a.m.



27 may 2026 10:50:50 a.m.



27 may 2026 11:04:02 a.m.

TRAMO 1: Se continua con la concertina del cerramiento tipo 3, se inicia instalación de 4" del desagüe de la garita 1, se trabaja en excavaciones de las cajas e 60*60*90 eléctricas desde garita 1 hasta finalizar el tramo 1, se instala las mallas faltantes del cerramiento tipo 3 con su respectivo anticorrosivo y pintura, llegan 40 sardineles de 80*20 para el andén en adoquín.

GARITA 1: Se da inicio a la fundía de las vigas aéreas de cubierta.

GARITA 2: Se da inicio a la excavación para la red Hidráulico de suministro de la garita.

TRAMO 2: Se continua los trabajos de pañete interno impermeabilizado, acabado de las columnas del cerramiento tipo 2 mixto, fundida de alfajías de 10*40 con su respectivo acero, se trabaja en encofrado de 10 columnas, se trabaja en armado de aceros de las alfajías y columnas, se continua trabajando en excavaciones de pilotes del cerramiento tipo 4, se trabaja en relleno de material de excavación de la tubería de 2" eléctrica, se inicia con el desmonte de cerca, alambre y concertina y descapote desde donde finaliza el cerramiento tipo 4 e inicia el cerramiento tipo 3 hasta el portón existente del sinani, se realiza excavación para los anclajes de la lona verde.

GARITA 3: Sin actividad.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



GARITA 4: Sin actividad.

TRAMO 1, GARITA 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2



28 may 2026 10:03:13 a.m.



28 may 2026 10:04:22 a.m.



28 may 2026 10:04:52 a.m.



28 may 2026 10:20:13 a.m.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”




CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
 INFORME MENSUAL No. 6
 01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026**

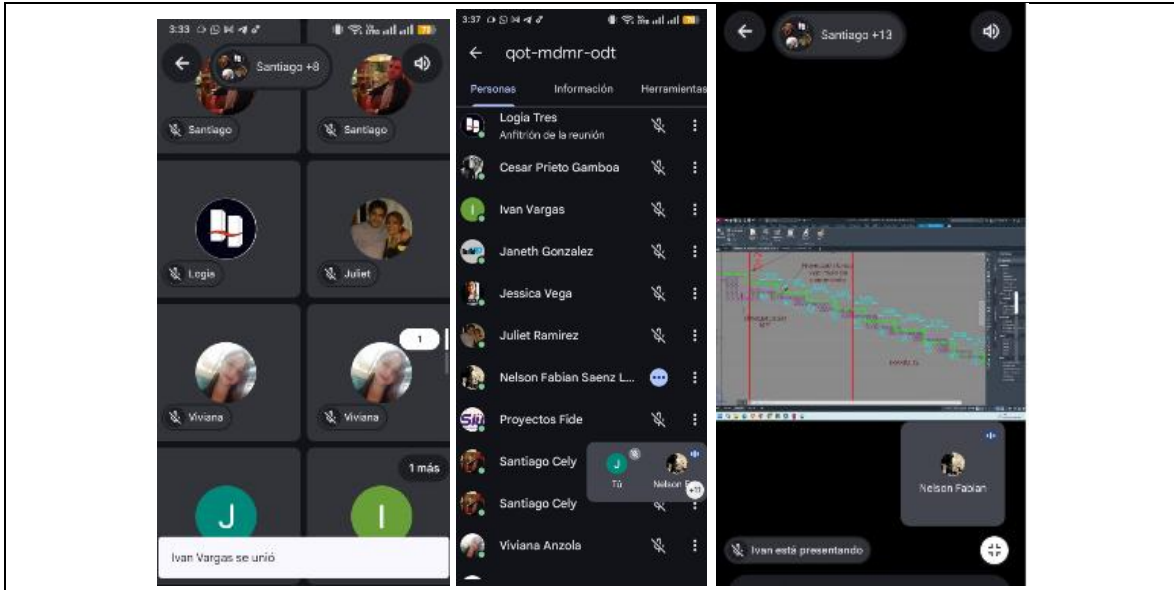

TRAMO 1: Se verifica las cajas cercanas de desagüe para mirar la conexión y pendientes, se inicia con la demolición de tapia pisada, bolsacreto, desmonte de concertina.

GARITA 2: Sin actividad.

GARITA 1: Se fundió la placa de entepiso de cubierta con su respectivo Stell Delk

TRAMO 2: Se continua con los pañetes impermeabilizados internos, se continua con el armado de columnas del cerramiento tipo 2 mixto, se inicia con el replanteo del cerramiento tipo 3 en el sinai, concertina desmontada, se continua con la excavación de pilotes del cerramiento tipo 4, se encofra las alfajías de 10*40.

GARITA 3: Se trabaja instalación de tubería eléctrica que llega hasta el tablero eléctrico de 12 circuitos.

GARITA 4: Se inicia fundida de concreto ciclópeo.

Nota: Se realizo un comité de obra virtual para tratar el tema del colcho gavión con la interventoría Logia 3, Contratista SIU, con sus respectivos especialistas hidráulicos, la Arq. Juliet Iveth supervisora del contrato.

TRAMO 2, GARITA 3

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se continua trabajos del cerramiento tipo 3A doble altura, se continua con la demolición de tapia pisada, bolsacreto, desmonte de concertina, se instala cerramiento de lona verde, se trabaja en fundida de cajas de 60*60*90 eléctricas.

GARITA 2: No hay actividad

GARITA 1: Sin actividad.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 2: Se inicia con el pañete exterior impermeabilizado, encofrado de alfajías, encofrado de columnas del cerramiento tipo 2 mixto, se continua con la excavación de los pilotes del cerramiento tipo 4, se continua con la excavación para los módulos del cerramiento tipo 3 en sinai.

GARITA 3: Sin actividad.

GARITA 4: Sin actividad.

TRAMO 1, GARITA 2, GARITA 1



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



TRAMO 1: Se da inicio a la subsanación de nivelación de las platinas de soportes del cerramiento tipo 2 mixto, se da inicio a las excavaciones de las cajas de desagüe, se continua con la demolición de tapia pisada desde garita 1 hasta finalizar el tramo 1.

GARITA 2: Sin actividad

GARITA 1: Se realiza el replanteo de los muros de la garita para iniciar con el pegue de bloque concreto.

TRAMO 2: Se continua con el pañete exterior impermeabilizado, alfajias, pedestales.

GARITA 3: Sin actividad.

GARITA 4: Sin actividad.

2.3.5. ITEMS NO PREVISTOS

Para el periodo reportado del 01 de mayo 2026 al 31 de mayo 2026 se presentan los siguientes NPS con visto bueno de la interventoría el día 29 de mayo del 2026 por la interventoría, sin embargo, se encuentra trasladados a la entidad para aprobación e incluirlo en el contrato mediante modificatorio de contrato.

ITEMS NO PREVISTOS			
ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO
NP1	MURO CERRAMIENTO TIPO 4 MALLA H= 2.50 mt, Incluye: Tubos de 3", módulo con marco en ángulo y malla eslabonada con refuerzo, anticorrosivo y pintura, concertina diámetro 45 cm. Ver especificaciones técnicas y detalles arquitectónicos y estructurales	UND	\$ 2.065.116,45
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA NEGRA AL 80%	M2	\$ 5.377,05

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS DE COMITÉ EXTRAORDINARIO	
Mes ----	
ACTA	FECHA
N/A	N/A

Nota: Durante el mes reportado del 01 de marzo 2026 al 31 de marzo 2026 no se presenta comités de seguimiento de carácter extraordinario.

ACTAS DE COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA	
Informe No.1 (24 de noviembre al 31 de diciembre del 2025)	
ACTA	FECHA
Comité de obra No.1	27/11/2015
Comité de obra No.2	05/12/2025
Comité de obra No.3	11/12/2025
Comité de obra No.4	18/12/2025
Informe No.2 (01 al 31 enero del 2026)	
ACTA	FECHA
Comité de obra N. 5	07/01/2026
Comité de obra N.6	26/01/2026
Comité de obra N.7	30/01/2026
Informe No.3 (01 de febrero al 28 febrero)	
N/A	N/A
Informe No.4 (01 de marzo al 31 marzo)	
Comité de obra N. 8	12/03/2026
Comité de obra N. 9	20/3/2026
Comité de obra N. 10	25/03/2026
Informe No.5 (01 de abril al 30 abril)	
Comité de obra N. 11	9/04/2026
Comité de obra N. 12	17/04/2026
Comité de obra N. 13	24/04/2026
Informe No.6 (01 de mayo al 31 mayo)	
Comité de obra N. 14	06/05/2026
Comité de obra N. 15	22/05/2026
Comité de obra N. 16	28/05/2026

Tabla 2 Actas de comité. Elaboración propia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA	OFICIO / CORREO ASUNTO	DESTINATARIO
4/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 115	SIU

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



	al Fondo Rotatorio y con copia al contratista Traslado comunicado OFICIO-067-FORPOLICIA-2025 – Respuesta técnica al documento de alcance de la consultoría y solicitud de definición técnica, aprobación de traslado de garita 3 y validación de APU módulo de cerramiento tipo 4	
4/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado oficio 117 al contratista y con copia al contratista sobre Solicitud respuesta al requerimiento de revisión por afectaciones en vía – Vereda El Sinaí por parte de la Secretaria de Planeación	SIU
5/5/2026	La interventoría envía al contratista y con copia al Fondo rotatorio por medio de comunicado Oficio 118 sobre Solicitud acta de vecindad	SIU
5/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 119 al Fondo Rotatorio con copia al contratista sobre Entrega acta de vecindad carreteable para el acceso al tramo 1 costado norte	SIU
5/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 120 al Fondo Rotatorio con copia al contratista sobre Traslado y solicitud certificación para adquisición de vidrio multilaminado de seguridad nivel 3	SIU
6/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 121 al contratista con copia al Fondo Rotatorio sobre Mesa técnica especialistas eléctrico de obra e interventoría	SIU
6/5/2026	La interventoría envía por medio de correo electrónico al contratista dando respuesta al correo enviado el día 6 de mayo 2026 sobre la documentación de personal de muro de contención.	SIU
6/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 122 al Fondo Rotatorio con copia al contratista Entrega acta de vecindad costado norte y costado sur – tramite forestal ESREY.	FORPO
7/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 123 al Fondo Rotatorio con copia al contratista sobre Trazado de alineamiento modulo tipo 4	FORPO-SIU
7/5/2026	La interventoría envía al fondo rotatorio por medio de correo electrónico sobre la respuesta de la documentación de acta de corte interventoría	SIU
7/5/2026	La interventoría envía al contratista con copia fondo rotatorio por medio de comunicado Oficio 124 sobre Actividades atrasadas según cronograma de obra y solicitud plan de contingencia	FORPO
12/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 125 a la Arquitecta Janet Iveth la entrega de informes semanales	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



	23 y 24	
12/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 126 a la Arquitecta Janet Iveth la entrega de informes mensuales #5 interventoría	FORPO
12/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 127 al contratista y con copia a Fondo rotatorio solicitud de certificado de ensayos de laboratorios y concepto especialista eléctrico	FORPO-SIU
19/5/2026	La interventoría envía a la Arq. Janet Iveth con copia a Contratista por medio de comunicado Oficio 129 sobre Traslado precisiones a diseños eléctricos de sistema contra rayos y apantallamiento, y solicitud de mesa de trabajo virtual.	FORPO-SIU
21/5/2026	La interventoría envía al contratista con copia a la supervisora por medio de comunicado 132 haciendo Reiteración No. 2. actividades atrasadas según cronograma de obra y solicitud plan de contingencia	FORPO-SIU
21/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 133 al contratista y con copia a Fondo rotatorio sobre Respuesta OFICIO-80-FORPOLICIA-2025. Solicitud inclusión ítems no previstos	FORPO-SIU
21/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 135 al contratista y con copia a Fondo rotatorio sobre Respuesta OFICIO-83-FORPOLICIA-2025. Solicitud de aval para construcción demodulo tipo 4, definición de colores para garitas y evaluación técnica de obras de drenaje pluvial proyectada.	FORPO-SIU
21/5/2026	La interventoría envía por medio de comunicado Oficio 136 al Fondo rotatorio con copia al contratista sobre Traslado solicitud de color de pintura interior y exterior a aplicar en las (4) garitas	FORPO-SIU
25/5/2026	La interventoría envía a la Arq. Janet Iveth con copia a Contratista por medio de comunicado Oficio 138 sobre Entrega informe semanal No. 25	FORPO-SIU
26/5/2026	La interventoría envía a la Arq. Janet Iveth con copia a Contratista por medio de comunicado Oficio 139 sobre Entrega informe semanal No. 26	FORPO-SIU
27/5/2026	La interventoría envía al contratista de obra con copia al fondo rotatorio por medio de comunicado Oficio 140 sobre Solicitud orden y aseo	FORPO-SIU
27/5/2026	La interventoría envía al contratista de obra con copia al fondo rotatorio por medio de correo electrónico dando respuesta a la solicitud del contratista sobre Solicitud de comité de obra - Obras de drenaje	FORPO-SIU
28/5/2026	La interventoría envía por a la Arq. Janet ivet supervisora del contrato por medio de correo electrónico el Formato acta de	FORPO-SIU

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



	recibo parcial de obra e interventoría firmado por los representantes de obra e interventoría.	
29/5/2026	La interventoría envía al Contratista con copia a la Arq. Janet Iveth por medio de comunicado Oficio 141 sobre aprobación Concepto favorable a los NP-1 y NP-3	FORPO-SIU

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
FECHA	OFICIO / CORREO ASUNTO	REMITENTE
5/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de comunicado Oficio 077 sobre Solicitud de gestión ante supervisión – Certificación para adquisición de vidrio blindado	FORPO
6/5/2026	El contratista envía por medio de comunicado OFICIO 78 FORPO a la interventoría sobre Actas de Vecindad	SIU
6/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electrónico sobre DOCUMENTACION PERSONAL MURO DE CONTENCION para las siguientes personas: 1. Andrés Maldonado Rivera, 2. Bladimir Ordóñez Valencia, 3. Edier Humberto Ospina, 4. Eurípides León 5. José Fernando Maldonado Pérez.	SIU
6/5/2026	El contratista envía la interventoría por medio de correo electrónico respondiendo al correo enviado por la interventoría sobre documentación de muro contención	SIU
6/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electrónico el plano de alineamiento modulo tipo 4	SIU
6/5/2026	La escuela ESREY envía a la interventoría por medio de oficio 004694 Sobre cumplimiento cláusula contractual Nro 21	SIU
7/5/2026	La Arq. Janet envía a la interventoría la solicitud de documentación para el acta de corte #1 105-4-25	SIU
7/5/2026	La Arq. Janet envía al contratista de obra con copia a la interventoría por medio de correo electrónico sobre la solicitud de limpieza de instalaciones con motivo de la ceremonia programada para el 12 de mayo de 2026.	SIU
12/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electrónico sobre documentación de ingreso personal de Pilotes: Juan Forero, Julián Cortes, Yeferson Trujillo, Edien González	SIU
13/5/2026	El contratista envía por medio de correo electrónico a la interventoría sobre DOCUMENTACION DE AYUDANTES PARA INGRESO siguientes: Laureano García - Kenny Daniel Franky Peña - José Guillermo Holguín	SIU

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



14/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de comunicado Oficio 80 sobre Solicitud inclusión de 4 ítems no previstos	SIU
15/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de comunicado Oficio 82 sobre Sistema puesta a tierra y apantallamiento	SIU
12/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electrónico sobre documentación de ingreso personal de Pilotes: Juan Forero, Julián Cortes, Yeferson Trujillo, Edien González	SIU
19/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electrónico sobre concepto técnico modificación cimentación cerramiento Tipo 4.	SIU
19/5/2026	El contratista envía por medio de correo electrónico a la interventoría los informes semanales e informe mensual marzo 2026	SIU
19/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electrónico sobre Entrega informes semanales mes de abril e informe mensual abril	SIU
20/5/2026	La Arq. Janet Iveth supervisora del contrato envía a la interventoría con copia al contratista sobre el Certificado contratista para compa vidrio - Proyecto ESREY	FORPO
20/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de comunicado 084 sobre Presentación de alineamientos y sectores definidos para la ejecución del módulo Tipo 4	SIU
21/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electronico sobre DOCUMENTACION PARA INGRESO DE PERSONAL de los señores Jorge Andrés Rodríguez y Jorge Andrés Rojas.	SIU
21/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electronico la Entrega ensayos de laboratorio concretos	SIU
21/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electronico Certificado materiales componente eléctrico	SIU
21/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo electronico DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL - MOBIESTRUCTURAS de la siguientes personas: Cristin camilo, Edwin alexander, John fredy, Ruben dario, Yonayker jose, Yulian llampier	SIU
22/5/2026	La arq. Janet Iveth supervisora del contrato envía a la interventoría con copia al contratista sobre la viabilidad para la ejecución de la vía provisional propuesta.	FORPO
22/5/2026	La Arq. Janet Iveth supervisora del contrato envía a la interventoría con copia al contratista sobre respuesta solicitud aprobación colores de placas, cerca metálica del cerramiento, garitas y muro ESREY	FORPO
22/5/2026	El contratista envía a la interventoría por medio de correo	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



	electronico sobre Entrega balance de obra	
22/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de correo electronico sobre acta parcial 02	SIU
25/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de correo electronico los informes semanales de mes de mayo 23,24,25,26	SIU
26/5/2026	La Arq. Janet Iveth supervisora del contrato envió a la interventoría por medio de correo electronico el Formato acta de recibo parcial de obra e interventoría	FORPO
26/5/2026	La Arq. Janet Iveth supervisora del contrato envió a la interventoría por medio de correo electronico el CERTIFICADO DE CUMPLIMINETO	SIU
27/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de correo electronico sobre Solicitud de comité de obra - Obras de drenaje	SIU
26/5/2026	La Arq. Janet Iveth supervisora del contrato envio a la interventoría con copia al contratista por medio de correo electronico Remisión Formato de información tributaria	FORPO
28/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de correo electronico sobre DOCUMENTACION PARA INGRESO DE PERSONAL HIDRAULICAS FM de las siguientes personas: Edwin Leonardo Carrillo y Jaime Hernando Vargas	SIU
28/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de correo electronico sobre la subsanación de los ítems no previstos NP1,NP03,NP02	SIU
28/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de correo electronico sobre DOCUMENTACION PARA INGRESO DE PERSONAL HIDRAULICAS FM de las siguientes personas: Jair Palacios y Hamilton Mosquera	SIU
28/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de correo electronico sobre DOCUMENTACION PARA INGRESO DE PERSONAL DE JOSE MALDONDO de las siguientes personas: Carlos Julio Duarte Parra , Mariano Vargas León y David Leonardo Vargas Martínez	SIU
28/5/2026	La Arq. Janet Iveth supervisora del contrato envio a la interventoria por medio de correo electronico el Formato acta parcial Cto 110-3-25	FORPO
29/5/2026	El contratista envia a la interventoría por medio de comunicado 088 sobre Radicación de concepto técnico modificación cimentación cerramiento Tipo 4.	SIU
29/5/2026	La Arq. Janet Iveth supervisora del contrato envio a la interventoria por medio de correo electronico Solicitud de autorización para trámite de ingreso de personal por parte de la interventoría	FORPO

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



PLAZO TRANSCURRIDO CONTRATO DE OBRA	
HITO	DÍAS
Tiempo contractual Inicial	37
Tiempo contractual actualizado (prorroga 2)	279
Plazo transcurrido	188
% Transcurrido	67,38%

Tabla 3 Plazo contrato de obra transcurrido. Elaboración propia

PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	
HITO	DÍAS
Tiempo contractual Inicial	37
Tiempo contractual actualizado (prorroga2)	279
Plazo transcurrido	188
% Transcurrido	67,38%

Tabla 4 Plazo contrato de interventoría transcurrido. Elaboración propia

ESTADO DEL CLIMA

De acuerdo con la siguiente ilustración No.2, se evidencia que durante el periodo reportado del mes del 01 al 31 de mayo de 2026 se presenta un 80% de días soleados, un 10% de días nublados/lluviosos en la jornada nocturna un 10% de días con descanso.

CALENDARIO CONDICIONES ATMOSFERICAS							
DIAS LABORADOS							
MES DE MAYO 2026							
SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
24	4	5	6	7	8	9	10
25	11	12	13	14	15	16	17
26	18	19	20	21	22	23	24
27	25	26	27	28	29	30	31

Convenciones	
	Dias soleados
	Dias nublados
	Dias lluviosos
	Descanso

Ilustración 2. Condiciones atmosféricas

2.5. ASPECTO AMBIENTAL

Mediante comunicado No. LOGIA-CTO 105-4-25-051 del 06 de enero de 2026, la interventoría emitió aval al Plan de Manejo Ambiental. Sin embargo, para el período reportado se evidencia el cumplimiento en la entrega del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026**



por parte del contratista de obra, documento indispensable para asegurar la correcta gestión ambiental del proyecto.

2.5.1 GESTIÓN DE RCD EN OBRA.

Durante el periodo reportado, se debe tener en cuenta que el contratista de obra no realiza actividades de retiro de excavaciones y/o generación de RCD en obra, por lo cual no aplica retiro de disposición final a predios debidamente autorizados por vecinos propietarios del área de influencia indirecta.

2.5.2 CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL

Durante el período objeto de reporte, se encuentran pendientes la carta de certificado de disposición final. No obstante, se adjuntan las correspondientes autorizaciones otorgadas por los propietarios de los predios, las cuales avalan la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y/o materiales producto de excavaciones, en cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables.

MES No.1 (24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025)				
FECHA	TIPO DE MATERIAL	CANT. M3	EMPRESA GESTORA Y/O AUTORIZACION	CERTIFICADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MES No.2 (01 AL 31 DE ENERO DEL 2026)				
FECHA	TIPO DE MATERIAL	CANT. M3	EMPRESA GESTORA Y/O AUTORIZACION	CERTIFICADO
7/01/2026	RCD	14	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
14/01/2026	RCD	8	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
15/01/2026	RCD	9	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
27/01/2026	RCD	24	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
28/01/2026	RCD	9	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
Mes No.3 (01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026)				
FECHA	TIPO DE MATERIAL	CANT. M3	EMPRESA GESTORA Y/O AUTORIZACION	CERTIFICADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.5.3 MANEJO DE OFICINAS Y CENTROS DE ACOPIO

Durante el período reportado, el contratista de obra implementa centros de acopio temporales para el almacenamiento de materiales, así como la instalación de oficinas temporales.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Almacén temporal área de influencia directa del proyecto

2.5.4 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

En las imágenes anexas se evidencia la bodega de almacenamiento de materiales de la obra, así como los diferentes acopios implementados, los cuales permiten la adecuada organización, manejo y conservación de los materiales utilizados durante la ejecución del proyecto.



Almacenamiento temporal de materiales



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.5.5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista de obra implementa puntos ecológicos ubicados estratégicamente en los frentes de obra activos para la adecuada segregación de residuos. No obstante, se recomienda garantizar el retiro periódico y oportuno de los residuos sólidos convencionales, conforme a la frecuencia del servicio de recolección, con el fin de prevenir la acumulación de desechos y la posible proliferación de plagas.



Implementación puntos ecológicos en obra

2.5.6 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se verificó por parte del contratista la implementación de medidas orientadas al control y manejo de las emisiones atmosféricas, tales como la reducción del material particulado generado por el tránsito de maquinaria y el manejo y protección adecuada del material granulado (mediante cobertura con lonas o acopio controlado). Estas acciones preventivas se mantienen activas, lo que contribuye a minimizar los impactos sobre la calidad del aire y garantiza el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Ausencia implementación controles ambientales para emisiones atmosféricas

2.5.7 OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el período reportado, el contratista de obra mantiene en el proyecto los equipos necesarios para la ejecución de las actividades programadas, garantizando la continuidad operativa para las actividades establecidas.



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Maquinaria y/o equipos utilizados en obra

2.5.8. GESTIÓN RESPALDO

Para el periodo reportado no aplica

2.5.9. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES

Para el periodo reportado la interventoría envió a la entidad contratante las actas de vecindad de los tramos faltantes por intervenir y donde se necesita permiso de poda de árboles y tratamiento de raíces.

2.5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El plan de seguridad y salud en el trabajo es de gran importancia en todas las organizaciones, puesto que previene la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los colaboradores en una empresa. Asimismo, son muchas las organizaciones conscientes de la importancia de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, como por ejemplo en el sector de obras civiles, el cual es uno de los sectores donde más se identifican riesgos y peligros.

Mediante comunicado No. LOGIA-CTO 105-4-25-051 del 06 de enero de 2026, la interventoría otorgó aval al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual se encuentra en proceso de implementación por parte del contratista de obra, conforme a las disposiciones normativas y contractuales aplicables.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.6.1. TABLA DE PERSONAL EN OBRA

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PLACAS VEHÍCULO
Ana Milena Gómez Sánchez	1.014.207.008	INGENIERA APOYO A DIRECCION	
Flaminio Sánchez Sánchez	4.266.600	R/L SIU	TOYOTA PRADO BLANCA EMQ 111
Cristian David Sánchez Torres	1.014.251.071	R/L Suplente	MAZDA CX-30 LOR 168
Jaime Esteban Hernández Escobar	1.033.694.118	ASESOR AMBIENTAL	LOM520 PEUGO
Rosalba Orjuela Gaona	46.372.821	PROFESIONAL SST	
Jose Vicente Calixto Nocua	74.301.942	RESIDENTE DE OBRA	
Karen Daniela Fontecha Cuadros	1.099.216.657	Residente Administrativo	
Jhoan Sebastian Fontecha Cuadros	1.007.555.206	ARQUITECTO RESIDENTE	
Ricardo Balvuenza	7.222.005	TOPOGRAFO	FORD LASER MAR 921
Nelson Fabian Sáenz	1.049.608.073	DIRECTOR DE OBRA	
Camilo Andres Rodriguez Rodriguez	7.186.587	RESIDENTE DE OBRA	
Jhoan Sebastian Fontecha Cuadros	1.007.555.206	ARQUITECTO RESIDENTE	
PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PLACAS VEHÍCULO
Jhon Brayan Diaz Leiva	1075627902	Residente de interventoria	GDE05E (NS200 Pulsar)
Deisy Tatiana Cotame Vargas	1.048.850.099	HSE interventoría	
Ehida Juliet Ramírez Guina	1.118.537.436	Esp. Hidrosanitario	
Luis Santiago Cely Báez	91.289.666	Director de interventoría	NJW240
José Absalon Leguizamón Diaz	74.860.754	Cadenero	
Laura Daniela Combata Farias	1.052.403.908	SST	
Cesar Fernando Montes Neme	1.118.533.503	Arq. Urbanista	
Jhonatan Andrés Rojas Hernández	1.121.816.929	Asesor Estructural	
Edwin Alexander Palacios Vargas	7.183.596	Asesor Geotecnia	
Rafael Darío Spinel Peñuela	79.784.285	Asesor eléctrico	
Jhoan Alexander Galán Largo	1.118.572.511	Secretaria	



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.6.2. RELACION PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PLACAS VEHÍCULO
Angel Maria Gomez Gomez	4.245.226	Maestro de obra 2	JIO530
Luis Eduardo Gómez Archila	79.766.683	Maestro de obra	
Luis Asdrubal Gómez Rivera	79.260.876	OFICIAL DE OBRA	
José Abelino Gómez Rivera	1.013.581.135	OFICIAL DE OBRA	
Rito Antonio Archila Rincón	80.396.282	OFICIAL DE OBRA	
Víctor Manuel Gómez Rivera	1.022.366.196	OFICIAL DE OBRA	
Ricardo Alberto Martinez	1.129.566.002	Oficial de obra	
Johnnathan Cortes	1.073.680.555	Oficial de obra	
Luis Alberto Quintero	80.453.101	Oficial de obra	
Jhon Frank Alexis Pineda	74.374.171	Volquetero	UVK 682- Chevrolet (Volqueta) TZR 134 International (Volqueta)
German Yovanny Becerra Jimenez	74.378.859	Volquetero	OXD 254 - Chevrolet (Volqueta)
Jorge Florez Prieto	7.227.511	Volquetero	OFJ 415 DODGE- (Volqueta)
Edison Alberto Jimenez	1.056.928.038	Volquetero	FSB 530- DODGE- (Volqueta)
Estiven Adiolfo Hurtado Beltran	1.030.678.784	Ayudante	
Jose Francisco Rocha Baron	80.758.743	Oficial Pilotaje manual	
Alberto Beltran Fino	74.245.078	Ayudante	
Deywis Jiovani Morantes Ochoa	74.302.683	Ayudante	
Yeferson Andres Trujillo Hernandez	1.033.727.199	Oficial Pilotaje manual	
Julian Damian Cortez Rocha	1.028.664.095	Oficial Pilotaje manual	
William Eslava Burgos	88.188.081	Ayudante	
Juan David Forero Ceron	1.019.008.223	operario de pilotaje	
Carlos Daniel Gutierrez Rodriguez	66.792.89	ayudante	
Jose Abelino Gomez Rivera	1.013.581.135	Oficial de obra	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Moises Canole Lora	92.522.343	Oficial de obra	
Jhon Henry Caceres Rojas	1.053.664.644	operador	
Juan Esteban Caceres Gonzalez	1.002.459.827	operador de minicargador	
Benjamin Bernal Perez	74.302.556	Ayudante	
Miguel Angel Velandia	74.302.922	Ayudante	
Ramiro Antonio Chinome Cely	74.301.221	Ayudante	
Ferney Rico Baquero	1.069.735.347	Tecnico Electricista	
Oscar Miguel Tejada Ruiz	78.110.629	Tecnico Electricista	
Juan Carlos Tejada Meza	1.003.286.816	Tecnico Electricista	
luis alexis gomez archila	1.025.140.686	Tecnico Electricista	
fredy lizandro arevalo ruiz	1.002.456.643	Tecnico Electricista	
Yeison Orlando Serrato Silva	1.003.786.869	Ayudante	
Cristian Stiven Serrato Silva	1.033.764.451	Ayudante	
Duver Andrey Castillo Velasquez	1.018.485.351	Oficial de obra	
Erick Fabian Rodriguez Diaz	1.012.436.533	Oficial de obra	
Jairo Alberto Buitrago Reyes	79.910.706	soldador	
Jorman Jair Orozco Feria	1.045.758.628	instalador	
Jose Joaquin santana Osorio	72.341.181	instalador	
Carlos Ivan Martinez Rodriguez	1.005.273.072	auxiir electricista	
Albeiro Sachica	1.073.320.744	conductor	NUY247
Alexander Mesa	7.838.211	conductor	NUY249
William Hernando Bermudez	79.992.642	conductor	FSC343
Fredy Andres Chaparro Castro	1.056.572.410	conductor	TWA006
Hermel Rengifo Torres	1.110.086.587	Ayudante	
Juan Manuel Caballero Tique	1.026.580.632	soldador	
Yeison Fabian LomboJaimes	1.098.624.104	Ayudante	
Jaimes Wilfon Morales Albarracin	74.302.852	Ayudante	
Ismael Cristiano Mariño	13.452.858	Oficial de obra	
Belarmino Alvarez Holguin	7.224.123	Oficial de obra	
Leonardo Romero Espitia	79.974.763	Instalador	
William Romero Garzon	80.811.660	Instalador	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Edisson Cristobal Gutierrez Orjuela	1,002,605,863	Ayudante	
Carlos Orlando Puerto Solano	7.225.130	OFICIAL DE OBRA	
Mery Garcia	23.945.600	conductor	EWO974
Rafael Andres Moreno	74.376.683	conductor	
Erwin Joel Garcia Morantes	1.052.412.578	Ayudante	
Manuel Alfonso Martinez Coca	74.302.013	Auxiliar	QKM76F (moto Aero roja)
Duberney Morera Cardenas	1.023.896.983	instalador	
Luis Mario Romero Espitia	94.472.551	soldador	
Hernan Dario Guarin Fonseca	1.055.273.216	Oficial de obra	
Dario Rodrigo Mariño Ortiz	7.174.203	Oficial de obra	
Julian Andres Arevalo Ruiz	1.057.918.512	Ayudante Electrico	
Edwin Fernando Ruiz Caceres	74.379.386	conductor	SST021
Alexander Mesa	7.838.211	conductor	NUY249
William Hernando Bermudez	79.992.642	conductor	FSC343
Jeferson Alexis Castro Pardo	1.053.613.993	conductor	NUY247
Carlos Arrielmateus Palacios	80.124.020	conductor	NUY246
Franyer Valcarcel	1.052.398.359	conductor	WLN327
Duvan Alveiro Gomez Gomez	1.052.406.134	conductor	XIC793
Felipe Muñoz Fonseca	1.024.492.538	Hidráulica	
Jose Fernando Maldonado perez	9.432.736	oficial	
Andres Alexander Maldonado Rivera	1.118.573.354	Ayudante	
Bladimir Ordoñez Velandia	1.082.156.122	oficial	
Edier Humberto Ospina Bedoya	1.006.131.133	Ayudante	
Edien Gonzales Hernandez	1.033.685.033	Ayudante de polotaje	
yonatan Estiven Gutierrez Varon	1.006.904.592	Ayudante	
Jose Guillermo Holguin	79.740.547	Ayudante	
Kenny Daniel Franky Peña	74.378.720	Ayudante	
Laureano Garcia Holguin	74.301.270	Ayudante	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Eurípides León Fonseca	74.300.127	Ayudante	
Jhon Cesar Valencia Estacio	: 1.007.059.593	Ayudante	
Yoiler Andres Mosquera Angulo	1.022.949.799	Ayudante	
Jorge Andres Rojas Parra	80.772.679	soldador	
Ivan Andres Rodriguez Cortes	80.259.468	Jefe de producción	
Yulian LLampier Avila Plazas	1.032.468.743	Ayudante	
Yonayker Jose Betancourt Garcia	6.638.324	Ayudante	
Ruben Dario Núñez Arteaga	15.611.721	Ayudante	
John Fredy Diaz Serrato	1.012.364.348	soldador	
.Edwin Alexander Bacca	1.124.314.331	Ayudante	
Cristian Camilo Bernal Caicedo	1.024.567.427	soldador	

2.6.3. EGRESO DE PERSONAL

Para el periodo reportado se presentaron los siguientes egresos:

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE EGRESO	GRUPO DE TRABAJO
Albeiro Anacona Meneses	31/01/2026	Cerramiento
Diego Alejandro Navarro Pérez	03/02/2026	Garitas
Miguel Ángel Velandia	30/03/2026	Cerramiento
Edisson Cristóbal Gutiérrez Orjuela	22/04/2026	Cerramiento
yovany alexander alvares velandia	02/05/2026	Eléctrico

Tabla 5 Egreso de personal



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.6.4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo reportado se presento un accidente de trabajo, el cual ocurrió el día 15 de Mayo del 2026 se presenta un accidente de trabajo categorizado como accidente grave, en el cual un trabajador se encontraba realizando la actividad de retito de testers recibiendo un golpe en el pie izquierdo con la barra lo cual sufre una fractura, el cual es reportado a la ARL y dirigido al centro de salud, por lo cual la interventoría solicita al contratista de obra, presentar soportes del respectivo soportes del accidente de trabajo, se debe tener en cuenta que el trabajador tiene una incapacidad de 30 días, el cual va a hacer de seguimiento por parte de la interventoría.

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo

IF AT = $\frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$

No. de trabajadores en el mes

IF AT = 0

IF AT = $\frac{1 * 100}{43}$

IF AT = 2.33

Resultado: IF AT = 2.33

Índice de severidad de accidente de trabajo

IS AT = $\frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes} + \text{No. de días cargados en el mes}}{\text{No. de trabajadores en el mes}} * 100$

IS AT = $\frac{30 + 0}{43} * 100$

ISAT = 69.77

Resultado IS AT = 69.77

IF AT = 2.13

Proporción de letalidad de accidentes de trabajo

Letalidad AT = $\frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año} * 100}{\text{No. Total, de AT que se presentaron en el año}}$

No. Total, de AT que se presentaron en el año

Letalidad AT = 0

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



$$\text{Letalidad} = \frac{0 * 100}{1}$$

Resultado: Letalidad AT= 0%

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de accidentalidad del proyecto.

TIPO DE EVENTO	ACTUAL	MES	PROYECTO
Incidentes ambientales	0	0	0
Incidentes seguridad	0	0	0
Casos de primeros auxilios en locación	0	0	0
Casos de primeros auxilios médicos	0	0	0
Casos de tratamiento medico	0	0	0
Casos de trabajo restringido	0	0	0
Accidentes incapacitantes	1	1	1
Número de días de trabajo restringido	0	0	0
Número de días de incapacitante	30	30	30
Total, eventos	1	1	1

Tabla 6 Reporte de Incidentes y/o Accidentes



AUSENTISMO




El contratista SIU lleva el control de la permanencia en obra de sus trabajadores y subcontratistas, de tal manera que pueden clasificarse las ausencias relacionadas con salud de las no justificadas y estas las reportas a interventoría semanalmente en el control del personal, para así llevar un control del personal en el proyecto.

TIPO	DIAS INC.	TRABAJADOR
Enfermedad General	0	0
Permiso personal	0	0
No justificada	0	0
Total	0	0

Tabla 7 Ausentismo

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 6 01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026	
---	--	---

	Resultado	Interpretación
Frecuencia de accidentalidad	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD 	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100 Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron x accidentes de trabajo
Severidad	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD 	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes+ número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100 Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron x días por AT
Ausentismo	INDICE DE AUSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDAD GENERAL 	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/Número de días de trabajo programados en el mes) *100 En el mes se perdió x de días programados de trabajo por incapacidad médica

2.6.5. HALLAZGOS EN OBRA

Durante el periodo reportado se presentan tres hallazgos en obra.

Durante el periodo reportado se presentan los siguientes hallazgos en obra:

HALLAZGOS MES No.1				
ITEM	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	FECHA ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS CERRADOS	FECHA SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
1.	Ausencia de botiquín en obra	23/12/2025	SI	25/01/2026

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.	Ausencia de extintor en obra	23/12/2025	SI	25/01/2026
3	Ausencia de señalética en obra	23/12/2025	SI	25/01/2026
HALLAZGOS MES No.2				
ITEM	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	FECHA ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS CERRADOS	FECHA SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
1.	Personal sin adecuado uso de EPP	30/01/2026	SI	13/02/2026
2.	Material granular sin cubrimiento, ni señalización	30/01/2026	SI	13/02/2026
3	Fuente hídrica sin medidas ambientales	30/01/2026	SI	13/02/2026
4	Mezcla de mortero y/o concreto sin cubrimiento del suelo	30/01/2026	SI	13/02/2026
HALLAZGOS MES No.3				
ITEM	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	FECHA ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS CERRADOS	FECHA SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
1	Se evidencia falta de documentación SST en obra	16/02/2026	SI	16/02/2026
HALLAZGOS MES No.5				
ITEM	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	FECHA ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS CERRADOS	FECHA SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
1	En repetidas ocasiones de se hace llamado de	07/04/2026	SI	08/04/2026

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



	atención a trabajadores por el mal uso de los EPP			
HALLAZGOS MES No.6				
ITEM	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	FECHA ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS CERRADOS	FECHA SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
1	Se realiza socialización, lecciones aprendidas	29/05/2026	SI	16/02/2026

Nota: El día 13 de febrero por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-067 la interventoría informa del cierre de los hallazgos emitidos el día 30 de enero del 2026,

El día 16 de febrero del 2026 la interventoría genera cierre del hallazgo el mismo día el cual se evidencia en bitácora.

El día 8 de abril del 2026 la interventoría informa el cierre del hallazgo emitido el día 7 de abril del 2026

2.6.6. INSPECCIONES

Elementos de protección personal

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

Por lo anterior el contratista de obra, por medio de su profesional en seguridad y salud en el trabajo, organiza, fomenta y realiza seguimientos al uso correcto de los elementos de protección personal, además de instruir a los empleados la forma correcta que se deben de utilizar.

Los elementos de protección para el personal de obra se presentan a continuación:

1. Casco de seguridad
2. Gafas Botas de seguridad
3. Tapabocas
4. Tapa oídos de inserción
5. Guantes

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Camilla, extintor y botiquín

Para el período reportado, se evidencia que el contratista de obra dispone en el proyecto de camillas para atención de emergencias, fabricadas en material polimérico con estructura rígida, provistas de manijas y soportes laterales para la cabeza que limitan la rotación del cuello. Estos elementos contribuyen a la adecuada atención y movilización segura de personas en caso de presentarse un evento o incidente en obra



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



INSPECCION DE EXTINTORES					
No	TIPO DE EXTINTOR	FECHA INSPECCION	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE LA PROXIMA RECARGA
	Multipropósito	25/05/2026	campamento	20L	11/2026

Foto extintor

Tabla 9 Inspecciones de extintores



Inspección de extintores

ELEMENTOS	EXISTENCIAS		UBICACIÓN	FECHA DE INSPECCION
	SI	NO		
Guantes	X		Proyecto	22/05/2026
Gasas	X			
Suero fisiológico	X			
Termómetro	X			

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

	<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 6 01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026</p>	
---	---	---

Isodine	x			
---------	---	--	--	--

Tabla 10 Inspección de botiquín



SEÑALIZACIÓN

Durante el período reportado, se evidencia la correcta implementación de la señalización en obra, la cual permite identificar riesgos, delimitar áreas de trabajo y guiar de manera segura el tránsito de personal y vehículos. Esta medida contribuye a la prevención de accidentes y al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Implementación señalización en obra

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Durante el período reportado, el contratista de obra utiliza herramientas menores —como porros, palas, mazos, picas, carretillas, hoyadora, barras, martillos, serrucho y machete, mezcladora, — para la ejecución de las actividades relacionadas con la instalación del cerramiento provisional. La disponibilidad y uso adecuado de estas herramientas contribuye al cumplimiento eficiente de las labores programadas y al mantenimiento de condiciones seguras en el área de trabajo.



Uso de herramientas manuales para instalación de cerramiento en obra.

SANEAMIENTO

Durante el período reportado, el contratista de obra realiza uso de las baterías sanitarias disponibles en la escuela ESREY para el personal en los frentes de obra. Su uso contribuye a garantizar condiciones de higiene, salud y bienestar para los trabajadores, cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo y los lineamientos ambientales aplicables al proyecto.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



2.6.7. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Durante el período reportado, el contratista de obra realiza inducciones y capacitaciones dirigidas al personal, con el fin de fortalecer los conocimientos en seguridad, salud en el trabajo, procedimientos operativos y cumplimiento ambiental. Estas acciones contribuyen a garantizar que los trabajadores desarrollen sus actividades de manera segura, eficiente y conforme a las normas aplicables del proyecto.

CAPACITACIONES CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	FECHA	TEMA	No TRAB	TIEMPO (Min)
1	08/05/2026	Inducción	1	45
2	09/05/2026	Inducción	1	60
3	09/05/2026	Inducción	4	60
4	15/05/2026	Inducción	2	60
5	19/05/2026	Inducción	3	60
6	21/05/2026	Inducción	3	60
7	22/05/2026	Inducción	1	60

Tabla 11 Capacitaciones – Contratista de Obra

CHARLAS CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	FECHA	TEMA	No TRAB	TIEMPO (Min)
1	04/ 05/2026	Socialización Ats, Riesgos medidas de control	28	10
2	05/05/2026	Presentación personal	31	10
3	06/05/2026	Orden y aseo	32	10
4	07/05/2026	Uso EPP obligatorio	34	10
5	08/05/2026	Riesgo biológico lavado de manos	34	10
6	09/05/2026	10 claves para cuidar el planeta, política no alcohol no drogas	37	12
7	11/05/2026	Orden y aseo ATS	33	10

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



8	12/05/2026	Riesgo biomecánico identificación y controles	31	13
9	13/05/2026	Cuidado de manos	36	10
10	14/05/2026	Material granulado tapado	36	10
11	15/05/2026	Riesgos y medidas de control para el desarrollo en actividades en alturas	35	10
12	16/05/2026	El respeto	33	10
13	19/05/2026	Orden y aseo en las áreas de trabajo	38	10
14	20/05/2026	Limpieza del área de trabajo	38	40
15	21/05/2026	Socialización boja de seguridad	37	35
16	22/05/2026	Riesgo químico	38	10
17	23/05/2026	Accidentabilidad laboral en Colombia cifras 2026	34	10
18	25/05/2026	ATS, riesgos	38	10
19	26/05/2026	Como cuidar el planeta, las 3 R: reducir, reciclar, reutilizar	37	10
20	27/05/2026	Riesgos locativo identificación medidas de control	39	10
21	28/05/2026	Manipulación segura de piezas de madera	38	10
22	29/05/2026	Socialización lección aprendida AT golpe con barra	38	15
23	30/05/2026	Accidentes y lesiones por pisar una puntilla	32	15

2.7. INFORME DE CALIDAD

2.7.1. INFORME Y RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE MATERIALES

Para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 28 de mayo de 2026, se realizó la toma de muestras y ensayos al concreto empleado en la ejecución de las actividades programadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de resistencia establecidas en el contrato y en la normatividad vigente.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



Las pruebas fueron efectuadas conforme a los procedimientos técnicos correspondientes, garantizando la trazabilidad de las muestras y el adecuado control de calidad del material utilizado en obra.

2.7.2. ENSAYOS REALIZADOS

EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-03-05	22	28 MPA	VIGA CIMENTACION COSTADO SUR
14	2026-03-12	24		
28	2026-03-26	28		
EDAD DE ENSAYO		RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-03-13	23	28 MPA	VIGA CIMENTACION COSTADO SUR
14	2026-03-20	25,1		
28	2026-04-03	29,4		
EDAD DE ENSAYO		RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-03-20	22,5	28 MPA	DADOS COSTADO SUR
14	2026-03-27	24,9		
28	2026-04-10	28,5		
EDAD DE ENSAYO		RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-02-07	22,7	28 MPA	VIGAS DE CIMENTACION GARITA 2
14	2026-02-14	24,8		
28	2026-02-28	29,6		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-02-12	23,2	28 MPA	COLUMNA GARITA 2
14	2026-02-19	25,1		
28	2026-03-05	29,9		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-01-30	21	28 MPA	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



14	2026-02-06	25		PILOTES COSTADO NORTE
28	2026-02-20	30		

EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-01-31	22,6	28 MPA	ZAPATAS GARITA 2
14	2026-02-07	23,8		
28	2026-02-21	28,8		

EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-02-18	21,6	28 MPA	PILOTES COSTADO SUR
14	2026-02-25	23,9		
28	2026-03-11	29,4		

EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	18/04/2026	22,6	28 MPA	Vigas de contra cimientto tramo 2
14	2026-04-25	24,6		
28	2026-05-09	28,8		

EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-04-24	21,9	28 MPA	Vigas de contra cimientto tramo 2
14	2026-05-01	25,3		
28	2026-05-15	28,7		

EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-05-04	22,4	28 MPA	Vigas de contra cimientto tramo 2
14	2026-05-11	24,1		
28	2026-05-18	Pendiente.		

EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-05-06	21,5	28 MPA	Columnas Garita 1
14	2026-05-13	25,6		
28	2026-05-20	Pendiente		

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"




CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-03-28	22,3	28 MPA	Vigas de contra cimientto tramo 2
14	2026-04-04	24,9		
28	2026-04-18	29,3		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-04-07	22,9	28 MPA	Vigas de contra cimientto tramo 2
14	2026-04-14	24,7		
28	2026-04-28	29,5		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-04-08	23	28 MPA	Vigas de contra cimientto tramo 2
14	2026-04-15	25,3		
28	2026-04-29	29,7		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-05-06	21,5	28 MPA	Columnas Garita 1
14	2026-05-13	25,6		
28	2026-05-20	Pendiente		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-02-20	22,7	28 MPA	PILOTES TRAMO 2
14	2026-02-27	25		
28	2026-03-13	30,8		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-02-24	22,9	28 MPA	PLACA DE ENTRE PISO GARITA 2
14	2026-03-03	24,6		
28	2026-03-17	29,3		
EDAD DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	RESISTENCIA MPA	RESISTENCIA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN
7	2026-02-27	21,9	28 MPA	PILOTES TRAMO 2
14	2026-03-06	24,8		

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 6 01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026	
---	--	---

28	2026-03-20	28,7	
14	2026-05-13	25,6	
28	2026-05-20	Pendiente	

 <p style="font-size: small; text-align: center;">5 may 2026 3:47:06 p.m.</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">22 may 2026 12:06:39 p.m.</p>
Cilindros 12 modulos de vigas de cerramiento tramo 2	Cilindros viga de contracimiento de garita 1
 <p style="font-size: small; text-align: center;">11 may 2026 1:53:16 p.m.</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">5 may 2026 2:38:04 p.m.</p>
Cilindros de Columnas de Garita 1	Cilindros de fundida de 12 modulos el día 11 abril 2026

2.7.3. CERTIFICACIONES Y/O FICHAS TÉCNICAS.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



El contratista envía certificados de los resultados de los cilindros

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, se describe el porcentaje en Físico de programado: 37% y ejecutado: 48,20% y Porcentaje Financiero: Programado; 40,45% y ejecutado: 36,11%

Se le solicita al contratista que mantenga el orden de cada área de trabajo para evitar llamados de atención u oficios de la entidad contratante.

Se solicita al contratista continuar enviando certificados de calidad de los materiales utilizados en obra

RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista ingresar más personal de trabajo para tener más ejecución de obra y así poder tener un acta de corte de alto porcentaje

Se le recomienda al contratista continuar enviando resultado de cilindros para garantizar la calidad y resistencia de lo ejecutado.

Se le recomienda al contratista enviar los informes semanales y mensuales pendientes por entregar.

CONCLUSIONES

El contratista ha cumplido con las obligaciones específicas y generales del contrato de obra.

Se le recomienda al contratista avanzar en las actividades atrasadas para subsanar estas

Se le solicita al contratista acatar la solicitud realizada por la Arq. Janet Iveth supervisora del contrato sobre hacer doble altura en 3 módulos de cerramiento tipo 3A iniciando el tramo 1 y hacer una puerta de acceso para mantenimiento de la misma.

La interventoría realizó un revisión exhaustiva para el balance de obra donde se reportaron observaciones que el contratista deberá subsanar.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 6
01 de mayo 2026 – 31 de mayo de 2026



ANEXOS

- Anexo No.1:** Informes semanales
- Anexo No.2:** Actas de comité
- Anexo No.3:** Correspondencia
- Anexo No.4:** Anexos de calidad
- Anexo No.5:** Anexos HSE
- Anexo No.6:** Bitácora de obra
