

INFORME FINAL

CONTRATO: MV-MC-OBRA - 003 / 2025.

**"ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES
SOBRE LA VIA PATIO BONITO - CANCHA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE
VIJES VALLE DEL CAUCA"**



INGENICO Y CONSULTORIA SAS
R.L : XIMENA BECHARA RAMIREZ

1.3 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar actividades de suministro e instalación de luminarias tipo solares como lo son las siguientes:

- 1,1 INSTALACION POSTE CONCRETO 8 X 510 KG
- 1,2 SOPORTE PARA LUMINARIA
- 1,3 LUMINARIA S6 60 W UND

2.0 DATOS CONTRACTUALES

2.1 CONTRATO DE OBRA CIVIL

CONTRATO N°.	MV-MC-OBRA - 003 / 2025.
OBJETO.	"ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES SOBRE LA VIA PATIO BONITO – CANCHA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VIJES
CONTRATISTA Y C.C.	INGENICO SAS NIT: 900.889.941-1 representado legalmente por la ingeniera XIMENA BECHARA RAMIREZ con CC . 25.273.051, de Popayan Dir: KM 3.5 Vía Chipaya Parcelación Océano Verde Casa 35 B, CEL: 3113679527, E-mail: Ingenico.administracion@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO	\$ \$ 39.638.926
VALOR TOTAL	\$ 39.638.926
VALOR LIQUIDADO	\$ 39.638.926
SALDO	\$0.00
PLAZO	1 mes
CDP	1588 de diciembre 16 de 2025
RP	2584 de diciembre 20 de 2025
SUPERVISOR	SANDRA MARCELA ORTIZ COBO secretaria PLANEACION 315823775 TEL 2520280, email: planeacion@vijos-valle.gov.co
FORMA DE PAGO	Acta final
INICIO	22 de diciembre de 2025
GARANTIAS	Conforme Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III, de las Disposiciones Especiales del Presente Decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlos o no debe estar en los estudios y documentos previos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Vijos Valle NO exigirá al contratista la constitución de la Garantía dada su forma de pago, por considerarse que NO existe riesgo que amparar

"ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES SOBRE LA VIA PATIO BONITO – CANCHA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA"

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo principal realizar un informe integral de las diversas actividades realizadas por parte del contratista para dar cumplimiento a las obras ejecutadas en el contrato: MV-MC-OBRA - 003 / 2025

INDICE

1.0 INTRODUCCIÓN	3
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL	3
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	3
1.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
2.0 DATOS CONTRACTUALES	4
2.1 CONTRATO DE OBRA CIVIL	4
2.2 DESARROLLO DEL CONTRATO	5
2.3 ACTA DE LIQUIDACION	5
2.4 INTERVENCIONES REALIZADAS	6
2.5 PERSONAL DE OBRA	9
3.0 INFORMACIÓN GENERAL	10
3.1 COMITÉ TECNICO	10



Luminaria S6 60 W.

Las diferentes áreas de intervención se encuentran en un 100 % terminadas

2.5. PERSONAL DE OBRA

El personal utilizado para las diversas actividades son 1 cuadrillas compuestas por 3 personas cada una con sus respectiva dotacion y equipos necesarios para los trabajos encomendados ,no esta de mas decir que todos cuenta con una experiencia suficiente para la ejecucion de las actividades sugeridas de la mejor manera.

1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto se planteó a partir de las necesidades básicas y fundamentales para el buen desarrollo y funcionamiento de los espacios públicos existentes teniendo como objeto principal prestar los servicios de obra civil para garantizar la iluminación pública en las vías rurales cerca al casco urbano la cual carecía del servicio de iluminación pública, evidenciado un alto grado de inseguridades a los transeúntes y vehículos que usan esta vía.

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades se realizaron en diferentes zonas del centro poblado del municipio de Vijes -Valle del Cauca, siguiendo las directrices de la planificación de la secretaria de infraestructura



2.4. INTERVENCIONES REALIZADAS

Se realizan actividades tales como :

- INSTALACION POSTE CONCRETO 8 X 510 KG
- SOPORTE PARA LUMINARIA
- LUMINARIA S6 60 W

Registro fotografico



Postes existentes

2.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El 22 de diciembre del año 2025, el contratista de obra inicia actividades haciendo reconocimiento de las zonas de intervención y corroborando la información dada por la entidad contratante.

Se da paso a la ejecución de las actividades como lo son apertura de los diferentes huecos para la instalación de postes y luminarias.

2.3. ACTA DE LIQUIDACION

 MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA		CONTRATO No. MV MC-OBRA-003 DE 2025							
		ACTA DE LIQUIDACION FINAL							
MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA		OBJETO: "ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES SOBRE LA VIA PATIO BONITO - CANCHA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA"							
		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA				\$ 39.638.926.00		OBRA EJECUTADA FINAL	
		CONTRATISTA: INGENICO SAS							
		SUPERVISOR: SANDRA MARCELA ORTIZ COBO							
CONTRATO No. MV MC-OBRA-003 DE 2025		INICIACION: 22 DE DICIEMBRE 2025				FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 19 DE DICIEMBRE DE 2025			
CONTRATO No. MV MC-OBRA-003 DE 2025						OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	LUMINARIAS SOLARES								
1.1	INSTALACION POSTE PORTE CONCRETO 8 X 118 KG	UND	10	463.769,00	4.637.690	10,00	4.637.690	10,00	4.637.690
1.2	SOPORTE PARA LUMINARIA	UND	10	177.024,00	1.770.240	10,00	1.770.240	10,00	1.770.240
1.2	LUMINARIA 85 W	UND	10	2.319.545,00	23.195.450	10,00	23.195.450	10,00	23.195.450
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 29.603.380		\$ 29.603.380		\$ 29.603.380
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 10.035.546		\$ 10.035.546		\$ 10.035.546
ADMINISTRACION		24,90%			\$ 7.371.242		\$ 7.371.242		\$ 7.371.242
IMPREVISTOS		1%			\$ 296.034		\$ 296.034		\$ 296.034
UTILIDAD		8%			\$ 2.368.270		\$ 2.368.270		\$ 2.368.270
COSTO TOTAL (DIRECTO +INDIRECTO)					\$ 39.638.926		\$ 39.638.926		\$ 39.638.926

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C.T.E.


BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	\$ 39.638.926	\$	15.933.819
ANTICIPO (40%) NO SUMA		\$ 15.933.819	
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA		\$ 39.638.926	\$
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 0	\$
SUMAS IGUALES	\$ 39.638.926	\$ 39.638.926	

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 31 días de diciembre de 2025

OSCAR FERNANDO MUÑOZ PERLAZA
ALCALDE MUNICIPAL


INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENICO
P. LEGAL: XIMENA BECHARA RAMIR
CONTRATISTA

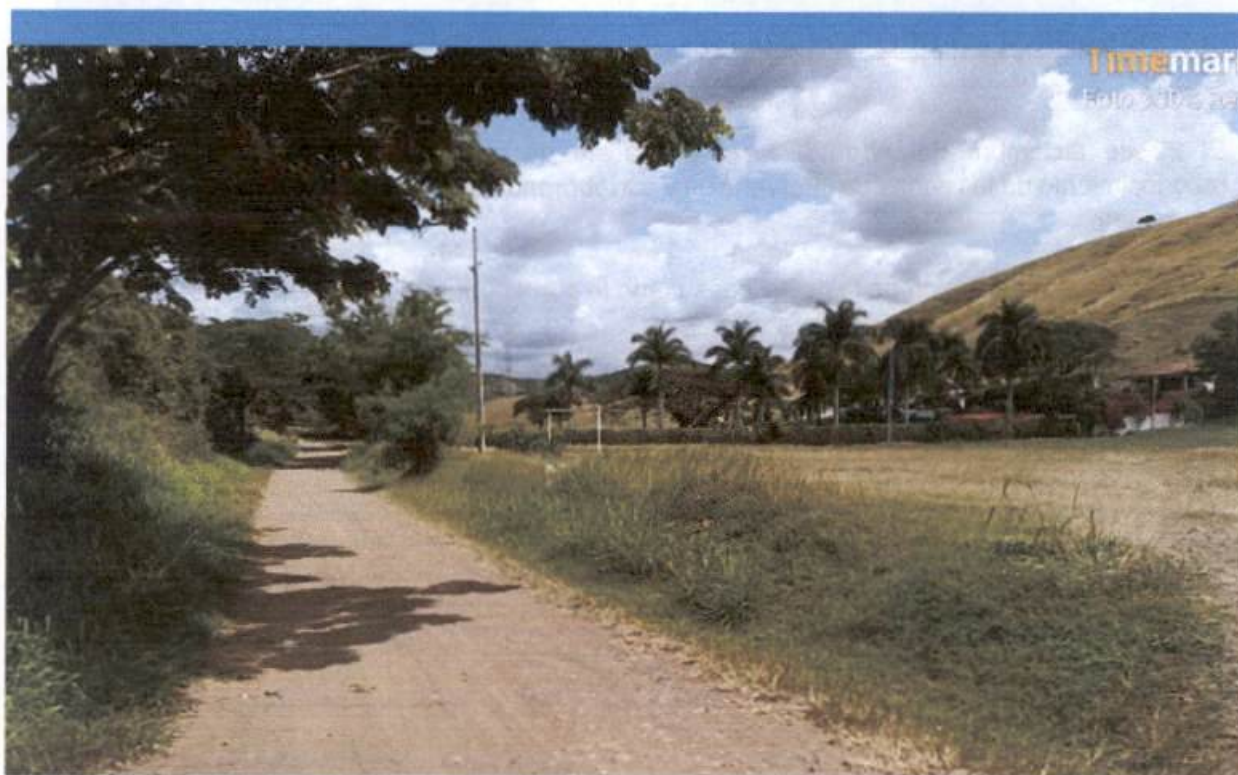

Via a instalar luminarias



Elementos de soporte de luminarias

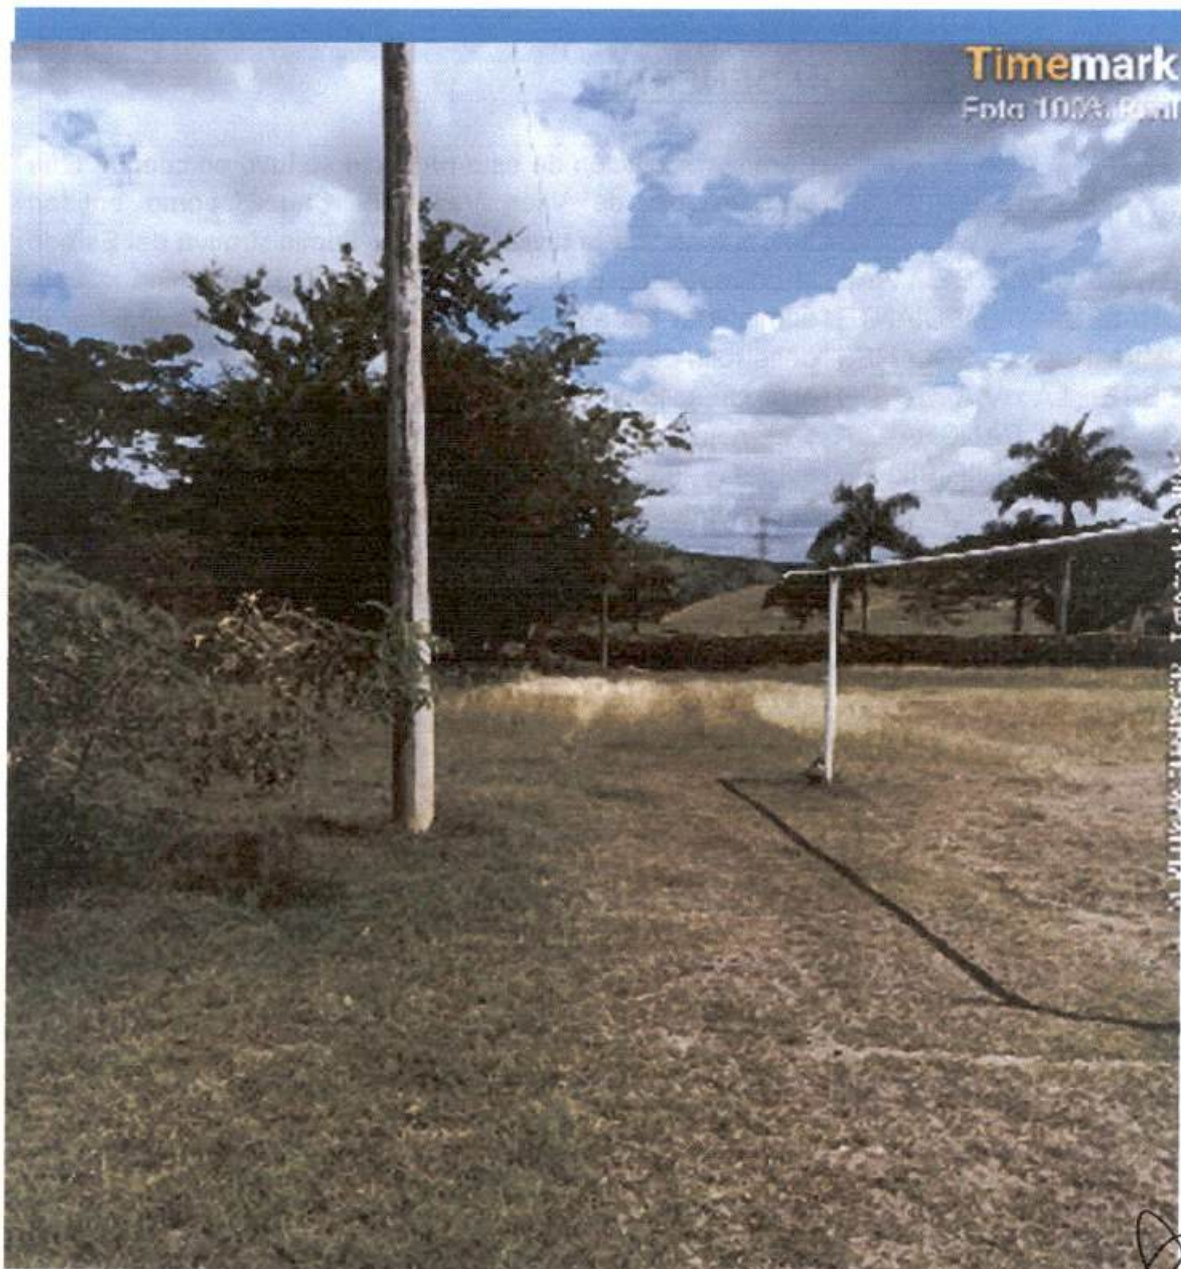

Instalacion de postes

3.0 INFORMACION GENERAL

"ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES SOBRE LA VIA PATIO BONITO – CANCHA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA"	Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta Que el Municipio de Vives Valle del Cauca, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios que determine la Ley, administrar los asuntos municipales; igualmente ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso local; la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes I para esto la secretaria de planeación hizo un análisis de necesidades por parte del personal técnico a las vías y zonas del casco urbano con más necesidades de tipo iluminación pública . esto con el fin de realizar las labores del presente contrato cuyo marco general se encuentra en el actual plan de desarrollo del municipio
Municipio, Departamento:	Vives, Valle del Cauca.
Nombre de Contratista:	INGENICO SAS
Nombre del supervisor:	SANDRA MARCELA ORTIZ COBO

3.1 COMITE TECNICO

COMITÉ TÉCNICO		
Descripción	Fecha	Lugar
Comité técnico N° 1	26 - diciembre - 2025	ZONA DE INTERVENCIÓN

Ximena Bechara R.
INGENICO SAS

XIMENA BECHARA RAMIREZ
REP. LEGAL
