

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

INTERVENTORIA

INFORME CONSOLIDADO DE INTERVENTORIA PARCIAL

DEL 16 DE FEBRERO DE 2026 AL 26 DE MAYO DE 2026

OBJETO

"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 085 DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 084 DE 2026

MAYO de 2.026

....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

INFORME CONSOLIDADO DE INTERVENTORÍA

FINAL **PARCIAL** **X**

PERIODO DEL INFORME: 16 de febrero de 2026 al 26 de mayo de 2026.

Contrato de Interventoría No: 085 del 29/01/2026		
Nombre del Contratista:	WORKOVES PROFESIONAL S.A.S.	NIT. 901.793.388 - 2
Representante Legal:	WILMER RODRIGO PASOS PÉREZ	CC. 7.718.630
Objeto: Ejecutar la interventoría contractual, técnica administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado: "optimización del sistema de micromedición del acueducto de la vereda los cauchos, municipio de Guadalupe – huila.	Valor: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$15.692.768) Fecha Aprobación Póliza: 31-01-2026 Fecha aprobación de póliza acta de inicio: 26/03/2026 Fecha aprobación de póliza acta de reinicio: 25/03/2026 FCVP: 30/09/2026	
Duración:	La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza interventoría, es de dos (02) meses más el plazo de liquidación del contrato de obra que son cuatro (4) meses y el contrato mantendrá vigencia por seis (6) meses más. el proponente deberá tener en cuenta que este plazo podrá ser prorrogado. El plazo del contrato de obra a realizar interventoría es de dos (02) meses, equivalentes a 60 días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización de este.	Municipio: Guadalupe – huila
Nombre del supervisor:	ESPERANZA ORTIZ MARTÍNEZ	
Nombre del Contratista:	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR	Contrato No: 084 DE 2026 No de Convenio: Recursos Propios
Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA."	Valor: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 169.475.443) MCTE Fecha Aprobación Póliza inicial: 31/01/2026 Fecha Aprobación Póliza acta de inicio: 26/03/2026 Fecha Aprobación Póliza acta de reinicio: 25/05/2026 FVCP: 27/09/2026	

....llevarnos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

Duración:	Dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más	Municipio:	Guadalupe – Huila
------------------	--	-------------------	-------------------

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

En zona rural del departamento del Huila, en el municipio de Guadalupe; realiza la ejecución del proyecto cuyo Objeto es: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA" y que para realizar el control de calidad de las obras a construir se contrató al ingeniero WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ, representante legal de WORKOVES PROFESIONAL S.A.S, mediante contrato de interventoría No. 085 DE 2026 y cuyo objeto es: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA"

El interventor ejerce su control realizando ensayos de laboratorio a los concretos ejecutados, además del control diario de las actividades que realiza el contratista en el día a día de la obra.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Las actividades realizadas hasta la fecha van de acuerdo con el cronograma de obra entregado por el contratista de obra, presentando un avance superior al programado inicialmente.

Para garantizar una obra de excelente calidad las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar fueron suministradas por la entidad contratante, supervisadas y aprobadas por la interventoría del contrato.

Del periodo comprendido del 17 de febrero de 2026 al 26 de mayo del 2026, se realizaron las siguientes actividades en la optimización del sistema de micromedidores en la vereda los cauchos del municipio de Guadalupe – Huila. A continuación, se enumera las actividades realizadas hasta la fecha:

- Demolición de concreto a todo costo, incluye desmonte de tapa metálica si existe.
- Excavación manual en material común, incluye mano de obra materiales y equipo.
- Suministro e instalación de acometidas domiciliarias, incluye: tubería de ½" PVC RDE 13.5, registro antifraude, registro de bola de incorporación de ½", cajilla plástica con lave de seguridad y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	  
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

- Suministro e instalación de tubería PVC de ½" pulg RED 13,5. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Estado y avance del proyecto reportado en la presente acta parcial es el siguiente:

- En el periodo de febrero a mayo se han instalado un total de 302 micromedidores en la vereda los cauchos

El proyecto a la fecha alcanza un avance del 90% acumulado.

1.2. Estado de las pólizas de INTERVENTORÍA – ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

ANEXO 0 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015				
Fecha de expedición: 30/01/2026		fecha de aprobación: 31/01/2026		
Numero de póliza	Amparos	Valor asegurado	vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063624	Cumplimiento	\$ 4.707.830,40	30/01/2026	31/07/2026
61-44-101063624	Anticipo	\$ 6.277.107,20	30/01/2026	31/07/2026
61-44-101063624	Prestaciones sociales	\$ 3.138.553,60	30/01/2026	31/03/2026
61-44-101063624	Calidad del servicio	\$ 4.707.830,40	31/01/2026	31/03/2031
ANEXO 0 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 30/01/2026		fecha de aprobación: 31/01/2026		
Numero de póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023105	Predios, labores y operaciones	\$ 350.181.000	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023105	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023105	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000	30/01/2026	31/03/2026
ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015				
Fecha de expedición: 26/03/2026		fecha de aprobación: 26/05/2026		
Numero de póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063624	Cumplimiento			
61-44-101063624	Anticipo			
61-44-101063624	Prestaciones sociales			
61-44-101063624	Calidad del servicio			
ANEXO 1 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 26/03/2026		fecha de aprobación: 26/05/2026		
Numero de Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

61-40-101023105	Predios, labores y operaciones			
61-40-101023105	Contratistas y subcontratistas			
61-40-101023105	Vehículos propios y no propios			
ANEXO 2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015				
Fecha de expedición: 26/03/2026		fecha de aprobación: 26/03/2026		
Numero de Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063624	Cumplimiento	\$ 4.707.830,40	16/02/2026	17/08/2026
61-44-101063624	Anticipo	\$ 6.277.107,20	16/02/2026	17/08/2026
61-44-101063624	Prestaciones sociales	\$ 3.138.553,60	16/02/2026	17/04/2029
61-44-101063624	Calidad del servicio	\$ 4.707.830,40	16/02/2026	17/04/2031
ANEXO 2 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 26/03/2026		fecha de aprobación: 26/03/2026		
Numero de Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023105	Predios, labores y operaciones	\$ 350.181.000	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023105	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023105	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000	16/02/2026	17/04/2026
ANEXO 3 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015				
Fecha de expedición: 25/05/2026		fecha de aprobación: 25/05/2026		
Numero de Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063624	Cumplimiento	\$ 4.707.830,40	16/02/2026	30/09/2026
61-44-101063624	Anticipo	\$ 6.277.107,20	16/02/2026	30/09/2026
61-44-101063624	Prestaciones sociales	\$ 3.138.553,60	16/02/2026	31/05/2029
61-44-101063624	Calidad del servicio	\$ 4.707.830,40	17/04/2026	17/04/2031
ANEXO 3 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 25/05/2026		fecha de aprobación: 25/05/2026		
Numero de Póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023105	Predios, labores y operaciones	\$ 350.181.000	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023105	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023105	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000	16/02/2026	31/05/2026

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	  
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

1.1.1 Estado de las pólizas CONTRATISTA DE OBRA – ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S. A				
ANEXO 0. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Fecha de expedición: 30/01/2026			Fecha de Aprobación: 31/01/2026	
No. póliza	amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	30/01/2026	31/07/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	30/01/2026	31/07/2026
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	30/01/2026	31/03/2029
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90	5 años a partir de acta de recibo	
ANEXO 0. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 30/01/2026			Fecha de Aprobación: 31/01/2026	
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023104	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023104	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023104	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023104	Vehiculos propios y no propios	\$ 350.181.000	30/01/2026	31/03/2026
ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Fecha de expedición: 26/03/2026			Fecha de Aprobación: 26/03/2026	
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90		
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20		
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60		
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90		
ANEXO 1 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 26/03/2026			Fecha de Aprobación: 26/03/2026	
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023104	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000		
61-40-101023104	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000		
61-40-101023104	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000		
ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Fecha de expedición: 26/03/2026			Fecha de Aprobación: 26/03/2026	
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	16/02/2026	17/08/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	16/02/2026	17/08/2026

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C. (Certification)  ISO 14001 U.C. (Certification)  OHSAS U.C. (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	16/02/2026	17/04/2029
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90	5 años a partir de acta de recibo	
ANEXO 2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 26/03/2026		Fecha de Aprobación: 26/03/2026		
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023104	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023104	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023104	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023104	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000	16/02/2026	17/04/2026
ANEXO 3. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Fecha de expedición: 25/05/2026		Fecha de Aprobación: 26/05/2026		
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	16/02/2026	27/05/2029
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90	5 años a partir de acta de recibo	
ANEXO 3. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
Fecha de expedición: 25/05/2026		Fecha de Aprobación: 26/05/2026		
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023104	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023104	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023104	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023104	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000	16/02/2026	31/05/2026
ANEXO 4. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Fecha de expedición: 26/05/2026		Fecha de Aprobación: 26/05/2026		
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	16/02/2026	27/05/2029
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90	5 años a partir de acta de recibo	

1.3. Estado y Avance Físico del Proyecto				
El proyecto a la fecha se encuentra en ejecución con un avance físico y presupuestal del 90% acumulado.				

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	  
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

Historial Cronológico del Proyecto				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	16/ 02/2026			15/04/2026
Suspensión No. 1	27/03/2026	39		
Reiniciación No. 1	7/05/2026		41	27/05/2026
ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)				
Tipo de Acta		No	Fecha	
Acta de inicio		1	16/02/2026	
Acta de recibo parcial		1	25/05/2026	
Acta de Suspensión		1	27/03/2026	
Acta de Reinicio		1	07/05/2026	
1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)				
En el periodo comprendido entre del 16 de febrero del 2026 al 26 de mayo del 2026, se realizó la demolición de concreto a todo costo, incluye desmonte de tapa metálica si existe, excavación manual en material común, incluye mano de obra materiales y equipo, Suministro e instalación de acometidas domiciliarias, incluye: tubería de ½" PVC, registro anti fraude, registro de bola de incorporación de ½", cajilla plástica con lave de seguridad y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. / suministro e instalación de tubería PVC de ½" pulg RED 13,5. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra, para un acumulado en el avance de obra de 90 %. La interventoría tiene un valor de quince millones seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos (\$ 15.692.768) Mcte. No realizó cobro de anticipo.				
1.4. Recomendaciones y Conclusiones				
Conclusiones 1. No se han presentado inconvenientes con la comunidad 2. El contratista de obra lleva un avance del 90%				
2. INFORME BÁSICO				
2.1. Estado Financiero del Contrato de obra				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)				\$ 67.790.177,2
Acta Parcial No. 1		\$ 152.512,163,0	\$ 67.790.177,2	\$ 84.721.985,80

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 169.475.443	N/A	\$ 169.475.443	\$ 152.512,163,0	\$ 16.963.280,0

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

NOMBRE	CEDULA	CARGO	DÍAS PAGADOS SEGURIDAD SOCIAL			
			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Edmundo Rumualdo Josa Rosero	12.751.481	Maestro	13	30	1	15
José Sebastián Rosero Salazar	12.754.497	Oficial	8	4	0	0
Jesús Armando Villada Muñoz	87.471.760	Ayudante	13	30	1	0
Daniel Andrés Gualguan Urresti	1.080.042.526	Ayudante	8	4	0	0
Edwin Guillermo Josa Rosero	1.084.221.045	Ayudante	13	30	1	15
Juan Cruz Muñoz Ñañez	12.144.169	S.S.T.	8	13	0	13
Jorge Enrique Cediel Tovar	12.136.262	Ing. Dir. de obra	30	30	30	30

El personal mencionado previamente está debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con todas las disposiciones de la Ley y los requisitos exigidos por la entidad contratante.

2.3. Estado Financiero del Contrato de interventoría

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)				\$ 0,0
Acta Parcial No. 1	26/05/2026	\$ 14.123.491,0	\$ 0,0	\$ 14.123.491,0
Acta Parcial No. 2				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 15.692.768	N/A	\$ 15.692.768	\$ 14.123.491,0	\$ 1.569.277,0

2.4. Personal y Equipo Empleado por el Interventor

CARGO	NOMBRE	CEDULA
Director de Interventoría	WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ	7.718.630

El personal mencionado previamente está debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con todas las disposiciones de la Ley y los requisitos exigidos por la entidad contratante.

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)  ISO 14001 U-C (Certification)  OHSAS U-C (Certification)
	INFORME DE INTERVENTORÍA VERSIÓN: 6.0	

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento a las actividades correspondientes a la optimización del sistema de micromedición del acueducto de la vereda Los Cauchos del municipio de Guadalupe, evidenciando que no se han presentado modificaciones en obra respecto a los diseños, especificaciones técnicas y alcance contractual inicialmente aprobados.

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Durante el periodo evaluado, no se evidenciaron problemas técnicos, administrativos ni operativos que afectaran la ejecución del proyecto de optimización del sistema de micromedición del acueducto de la vereda Los Cauchos del municipio de Guadalupe (Huila). En consecuencia, no fue necesario adoptar medidas correctivas, manteniéndose el desarrollo de la obra conforme a lo programado y a las especificaciones técnicas aprobadas.

Es de anotar que se ha detectado la falta del ítem de restitución de los andenes que se demuelan durante la ejecución del proyecto, para lo cual se realizara un balance de obra del proyecto, igualmente se detectó que en la descripción del ítem de la instalación de las domiciliarias se incluyó el suministro de los micromedidores elemento que fue suministro de parte de aguas del Huila. Es de aclarar que en los APU'S presentados por el contratista de obra al inicio del proyecto no se tiene contemplado el suministro del micromedidor

Además cabe anotar que por motivos ajenos al contratista se vio la necesidad de realizar un acta de suspensión.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Para este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Durante el periodo evaluado, no se requirió la realización de pruebas de laboratorio, en razón a la naturaleza de las actividades ejecutadas en el proyecto de optimización del sistema de micromedición del acueducto de la vereda Los Cauchos del municipio de Guadalupe (Huila). No obstante, la interventoría realizó seguimiento y verificación en campo del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales e instalaciones.

4.3. Comentarios y Conclusiones

Con base en el seguimiento técnico, administrativo y de campo realizado durante el periodo evaluado, la interventoría concluye que el contrato de obra para la optimización del sistema de micromedición del acueducto de la vereda Los Cauchos del municipio de Guadalupe se viene ejecutando conforme a las condiciones contractuales, diseños y especificaciones técnicas aprobadas.

No se evidencian desviaciones, incumplimientos ni modificaciones en el alcance del contrato, manteniéndose el desarrollo de las actividades acorde con lo programado. La interventoría continuará realizando seguimiento permanente con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Se anexa al presente informe anexos de los certificados de calibración de los micromedidores, actas de recibo a satisfacción de los micromedidores y registro fotográfico. Se entrega en físico y medio digital.

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

4.4. Comité de Obra

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
27-02-2026	Guadalupe	Se verifico el avance del proyecto. Se trataron temas como la falta de los ítems de reposición de andenes y el error cometido en la descripción del ítem de instalación de micromedidores donde se incluyó el suministro del micromedidor, el cual fue suministrado por aguas del Huila.
26/03/2026	Guadalupe	Se verifica avance del proyecto, El contratista solicita un acta de suspensión por motivos ajenos al contratista de obra.

5. INFORME AMBIENTAL

1. Identificación de situaciones Ambientales

El proyecto no tiene afectaciones ambientales

2. Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

N/A

3. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo

Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo la instalación de trescientos dos (302) micromedidores en el sistema de acueducto de la vereda Los Cauchos del municipio de Guadalupe, incluyendo la implementación de sus respectivos accesorios y elementos complementarios requeridos para su adecuado funcionamiento.

Las actividades se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas, garantizando una correcta instalación y operación de los equipos. Durante las verificaciones realizadas por la interventoría, se evidenció que los micromedidores fueron entregados en óptimas condiciones, sin presentar anomalías ni inconsistencias en su funcionamiento.

Finalmente se ha realizado un acta de pago parcial para el contrato de obra arrojando finalmente un avance del 90% acumulado.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



....llevarnos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).





....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

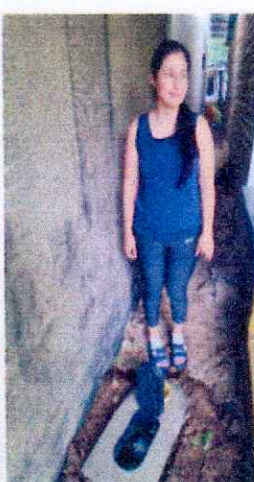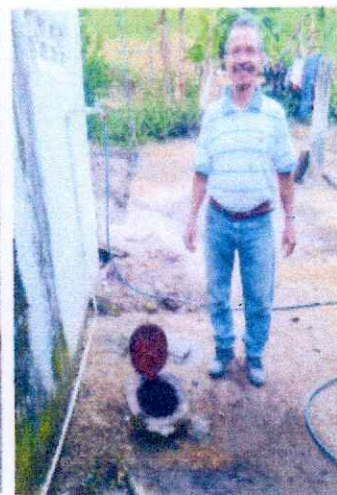

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17


Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



Para constancia de lo anterior se firma el presente documento


WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA


Revisó: Chao Rivas
Apoyo a la Supervisión
