



INFORME MENSUAL 10 INTERVENTORIA





**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**



**GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10

NOMBRE DEL PROYECTO

**"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA CÓRDOBA"**

CONTRATISTA: Consorcio vías del Sinú

INTERVENTOR: Consocio IDC

PERÍODO: 6 de marzo al 5 de abril de 2026.

ABRIL 2026




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Tabla de contenido.

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	8
2.1	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	8
3	DATOS GENERALES.....	9
3.1	Datos generales del Contrato de obra.....	9
3.2	Datos generales del Contrato de Interventoría.....	9
4	ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTAN LAS OBRAS.....	10
4.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO.....	21
5	Estado de las pólizas y garantías contractuales.....	92
5.1	Pólizas del contrato de obra.....	92
5.2	Pólizas del contrato de interventoría.....	92
6	ACTAS SUSCRITAS.....	93
7	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	93
8	INFORME DE AVANCE DE OBRA.....	118
8.1	AVANCE DE OBRA PROGRAMADA, EJECUTADA Y ACUMULADA DEL CONTRATO DE OBRA.....	118
8.2	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.....	122
9	INFORMACIÓN FINANCIERA DE OBRA.....	122
10	ACTAS DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA.....	123
11	CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA.....	124
12	CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....	124
13	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....	125
14	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS.....	126
15	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.....	127
16	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 127	
17	CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA.....	127
18	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.....	128



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**



**GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA**

19	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	128
20	PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	129
21	INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL.....	129
22	INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD	130
23	CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO)	130
24	REGISTRO FOTOGRAFICO	131
25	INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA	131
26	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	132



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA


1 INTRODUCCIÓN.

El presente documento corresponde al DECIMO informe mensual de interventoría, en el que se relacionan las actividades desarrolladas en el periodo contractual comprendido entre los días **06 de marzo al 05 de abril de 2026**; realizadas en el marco de ejecución del contrato de obra No. SI-LP-003-2024, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DEL MONTERÍA CÓRDOBA"**, el cual reviste una importancia fundamental para la administración departamental, al buscar impactar positivamente la calidad de vida de la población monteriana y en especial de los sectores a intervenir. Este proyecto, además de mejorar la conectividad vial, contribuirá al desarrollo urbano y al bienestar de la comunidad de Montería.

El presente informe contiene las actividades desarrolladas a cargo del Contratista **CONSORCIO VIAS DEL SINÚ** con NIT. 901.919.377-5, que se encuentra integrado por la empresa ING CONSTRUGENESIS S.A.S. con una participación del 10%, el señor MARIO POMPILO SINISTERA JALLER con una participación del 50% y el señor FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA con una participación del 40%; y cuyo consorcio es representado legalmente por CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ, con Contrato No. SI-LP-003-2024, el cual cuenta con un plazo contractual de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio (6 de junio de 2025); y con un valor por la suma de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TERCIENTOS PESOS MCTE (\$27.717.434.300,00), equivalentes a 19.471.3272 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025. El día 20 de marzo de 2026 el contrato tuvo una adición de recursos por la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETEMIL OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.882.347.089.00), quedando el valor total del contrato con la suma de VEINTINUEVEMIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (29.599.781.389.00).

La interventoría es realizada por el **CONSORCIO IDC** con NIT. 901.947.262-6, representado legalmente por el ingeniero DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA, mediante Contrato No. SI-CMA-001-2025, con un plazo contractual de DOCE (12) meses y un valor total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 1.480.084.416,00), equivalentes a 1.039,7502 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025. Esto con el fin de realizar el adecuado control, seguimiento y supervisión a los trabajos para la ejecución de las obras civiles comprendidas en el contrato de obras mencionado anteriormente; el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la verificación del cumplimiento de los plazos y normatividades legales y ambientales vigentes.

El presente informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con la metodología indicada para la presentación del Informe para la supervisión de contratos de obras civiles, y describe las actividades desarrolladas y las labores técnicas, administrativas y financieras que se llevan a cabo en el transcurso de la ejecución de las actividades para cada uno de los componentes que integran el proyecto.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

El seguimiento y control de la ejecución de esta obra, aquí detallado, se orienta en garantizar que los objetivos pactados y contratados se cumplan a cabalidad, y de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación. SI-CMA-001-2025, los cuales hacen parte integral del mismo.

La interventoría es la figura de control, vigilancia y seguimiento que se ejerce sobre la ejecución del contrato, y cuya labor es garantizar que las obligaciones pactadas se cumplan en estricta conformidad con las condiciones técnicas, administrativas, legales, financieras y ambientales establecidas en el mismo y en la normativa vigente. En el contexto del presente proyecto, la interventoría constituye un mecanismo esencial de supervisión externa que actúa en representación del contratante, velando por la correcta inversión de los recursos y la adecuada ejecución de los trabajos.

La interventoría integral abarca unos componentes fundamentales:

Técnico: Verifica que los procesos constructivos, los materiales empleados, las especificaciones de diseño y los estándares de calidad sean los acordados contractualmente. Implica el control de planos, memorias de cálculo, ensayos de laboratorio, topografía y cumplimiento de normas técnicas.

Administrativo: Supervisa la gestión documental del contrato, el manejo del personal, el cumplimiento de cronogramas, la correcta aplicación de los procedimientos contractuales y la oportuna presentación de informes y actas requeridas para la ejecución ordenada del proyecto.


Legal: Garantiza que la ejecución del contrato se enmarque en el ordenamiento jurídico vigente, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la legalidad de las actuaciones de las partes, la correcta suscripción de actas, la constitución y vigencia de garantías, y el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social.

Ambiental: Controla que la ejecución de la obra se realice en cumplimiento de los permisos, licencias y obligaciones ambientales correspondientes, minimizando los impactos sobre el entorno natural y social, y asegurando el manejo adecuado de residuos, fuentes hídricas, flora, fauna y comunidades aledañas.

Los informes de interventoría que detallan el avance físico mensual de una obra no son un simple requisito formal; son instrumentos técnicos y jurídicos de vital importancia para la adecuada gestión de los proyectos de infraestructura. A continuación, se exponen las razones que justifican plenamente su elaboración:

1. Transparencia y rendición de cuentas

En el marco de la contratación pública, los recursos ejecutados en obra pertenecen al Estado y, por ende, a la ciudadanía. Los informes de avance físico mensual constituyen el registro sistemático y objetivo del estado real de la obra, permitiendo demostrar de manera clara y verificable que los recursos invertidos corresponden efectivamente al progreso ejecutado. Esto protege tanto a la entidad



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

contratante como al contratista y al interventor frente a eventuales cuestionamientos de los organismos de control.

2. Control y seguimiento al cronograma de ejecución

La comparación periódica entre el avance programado y el avance real ejecutado permite identificar oportunamente desviaciones en el cronograma de obra. Esta información es la base para la toma de decisiones en tiempo real: aplicación de medidas correctivas, ajuste de recursos, reprogramaciones justificadas o inicio de procedimientos contractuales como el requerimiento formal al contratista. Sin este control mensual documentado, las alertas tempranas desaparecen y los retrasos se convierten en problemas de difícil solución.

3. Soporte para el reconocimiento y pago de actas de obra

El avance físico mensual debidamente verificado y certificado por la interventoría es el fundamento sobre el cual se elaboran las actas de obra y se procesan los pagos al contratista. Un informe riguroso, que relacione las cantidades de obra ejecutadas con los ítems contractuales, garantiza que los pagos realizados correspondan fielmente al trabajo efectivamente realizado, evitando reconocimientos injustificados o pagos en exceso que comprometan la viabilidad financiera del proyecto.

4. Instrumento de prueba y respaldo legal


Los informes de interventoría son documentos con plena validez jurídica. En caso de controversias contractuales, reclamaciones, procesos sancionatorios o acciones de responsabilidad, estos informes constituyen la prueba documental del estado de la obra en cada momento, de las instrucciones impartidas, de los incumplimientos advertidos y de las decisiones adoptadas. Su ausencia o deficiencia puede generar graves consecuencias legales para todas las partes.

5. Gestión de riesgos e identificación de problemas

El seguimiento mensual sistemático permite detectar con anticipación situaciones que puedan comprometer la calidad, el plazo o el costo de la obra: problemas geotécnicos no previstos, desabastecimiento de materiales, debilidades en la capacidad operativa del contratista, incumplimientos ambientales, entre otros. La identificación oportuna de estos riesgos, plasmada en los informes de interventoría, permite activar mecanismos de mitigación antes de que se conviertan en contingencias críticas.

6. Memoria técnica del proyecto

Los informes mensuales conforman el expediente técnico integral de la obra, un archivo histórico que documenta cada etapa del proceso constructivo. Esta memoria resulta indispensable para futuras intervenciones de mantenimiento, para la liquidación del contrato, para auditorías posteriores y para la transferencia de conocimiento institucional. Una obra bien documentada es una obra que puede ser gestionada eficientemente durante toda su vida útil.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

7. Cumplimiento normativo y contractual

La elaboración de informes periódicos de interventoría es una obligación expresamente establecida en los contratos y en el marco normativo de la contratación estatal colombiana —en particular, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los manuales de contratación de las entidades—. Su omisión configura un incumplimiento de las obligaciones del interventor y puede dar lugar a investigaciones disciplinarias, fiscales y hasta penales.

En conclusión, la elaboración mensual de informes de interventoría que detallen el avance físico de obra es una práctica técnicamente indispensable, jurídicamente obligatoria y éticamente ineludible. Estos documentos son el pilar sobre el cual descansa la correcta gestión del presente proyecto de pavimentos: garantizan la transparencia en el uso de los recursos, protegen los intereses del Estado y de los involucrados, sustentan las decisiones contractuales y aseguran que cada peso invertido se traduzca en obra real, de calidad y en los tiempos pactados. Una interventoría que no documenta, no controla; y un proyecto que no se controla, está condenado a la improvisación y al fracaso.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto objeto de interventoría corresponde al mejoramiento de vías urbanas en Montería, Córdoba, tiene como propósito rehabilitar la infraestructura vial de los barrios El Recreo, IMAT, Canta Claro, 6 de marzo - Pasatiempo - Villa Rocío, Monteverde, Ranchos del Inat y el corregimiento El Tapao. Las intervenciones incluyen la pavimentación de calles, vías rurales y la instalación de sistemas de drenaje pluvial, con el fin de optimizar el tránsito vehicular y peatonal, y así reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de los residentes. Adicionalmente, se implementará señalización para fortalecer la seguridad vial y minimizar riesgos en la circulación. Este proyecto, además de mejorar la conectividad, contribuirá al desarrollo urbano y rural y al bienestar de la comunidad de Montería.


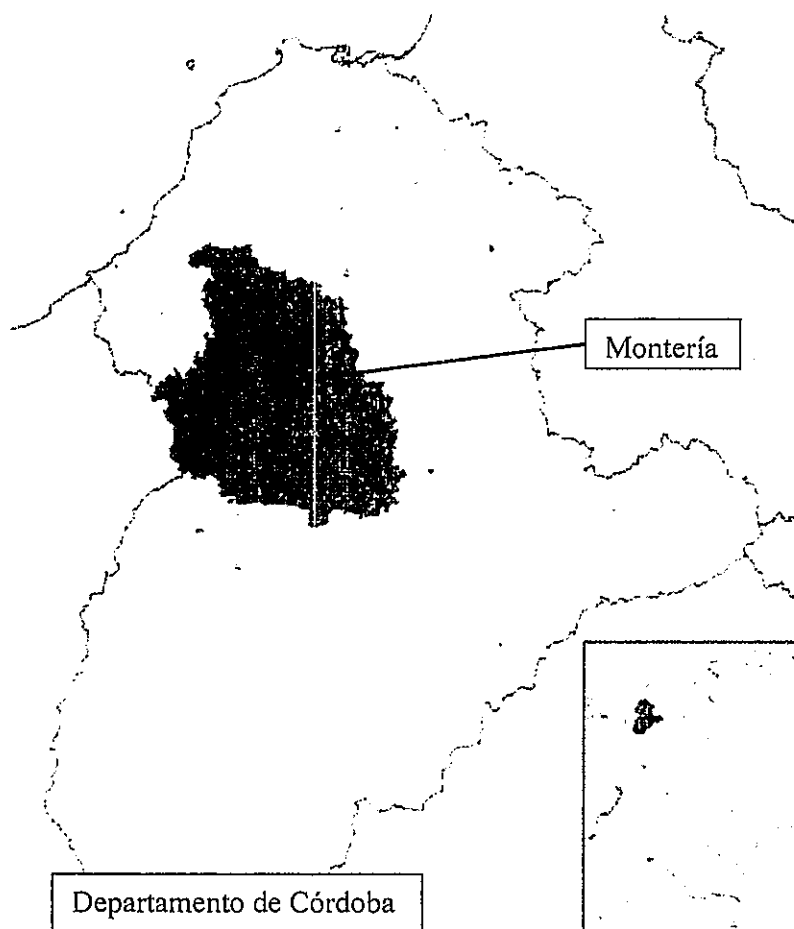


Ilustración 1. Localización del proyecto.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

3 DATOS GENERALES


3.1 Datos generales del Contrato de obra.

No. CONTRATO Y FECHA:	SI-LP-003-2024 14/05/2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMETNO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL SINÚ NIT No.: 901.919.377-5 R.L: CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ. C.C. No.: 1.062.679.310
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TERCIENTOS PESOS MCTE (\$27.717.434.300,00)
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIEMIL OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.882.347.089.00)
FECHA DE ADICIÓN:	20 DE MARZO DE 2026
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	VEINTINUEVEMIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (29.599.781.389.00)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN: (según acta de inicio)	05 DE JUNIO DE 2026
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	31 DE OCTUBRE DE 2025 DIEZ MIL CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 10.180.149.492,00)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	12 DE DICIEMBRE DE 2025 OCHOMIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$8.319.430.911,62)

Tabla 1. Información general contrato de obra

3.2 Datos generales del Contrato de Interventoría.

No. CONTRATO Y FECHA:	SI-CMA-001-2025 23/05/2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMETNO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE (\$1.480.084.416,00)
INTERVENTORÍA	CONSORCIO IDC NIT. No: 901.947.262-6 Rep. Legal DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA C.C. No.: 1067.957.385
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

FECHA TERMINACIÓN: <i>(según acta de inicio)</i>	05 DE JUNIO DE 2026
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1	22 DE SEPTIEMBRE 2025 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 246.805.685,84)
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2	02 DE DICIEMBRE DE 2025 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 369.069.103,76)

Tabla 2. Información general contrato de interventoría

4 ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTAN LAS OBRAS.

Las zonas para intervenir en el proyecto de mejoramiento vial corresponden a vías construidas en terreno natural en varios barrios del municipio de Montería, las cuales actualmente presentan condiciones desfavorables para la movilidad. Estas vías, distribuidas en los barrios El Recreo, IMAT, Canta Claro, 6 de marzo - Pasatiempo - Villa Rocío, Monteverde, Ranchos del Inat y el corregimiento de El Tapao carecen de una estructura adecuada, exhiben múltiples baches y se tornan intransitables durante la temporada de lluvias, lo que dificulta la circulación vehicular y peatonal y afecta el acceso a servicios básicos.

En los distintos barrios y corregimiento donde se desarrolla del proyecto, aunque inicialmente hubo intentos de estabilización, las vías se encuentran en condiciones similares, con problemas de erosión y deficiencia estructural lo que evidencia que requieren intervención inmediata. Por esta razón, el proyecto contempla la construcción de pavimento rígido en todas las vías objeto de intervención, mejorando la funcionalidad, conectividad y seguridad en estos sectores urbanos; y contempla mejoramiento de la calzada con material de afirmado en el sector Ranchos del Inat.

La ejecución del proyecto busca resolver los problemas de movilidad generados por la falta de infraestructura adecuada, ofreciendo a los residentes vías más seguras y duraderas que impulsen el desarrollo social y económico de Montería.


A continuación, se muestra registro fotográfico de algunos de los sectores ya fueron intervenidos y a intervenir en el presente proyecto:



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

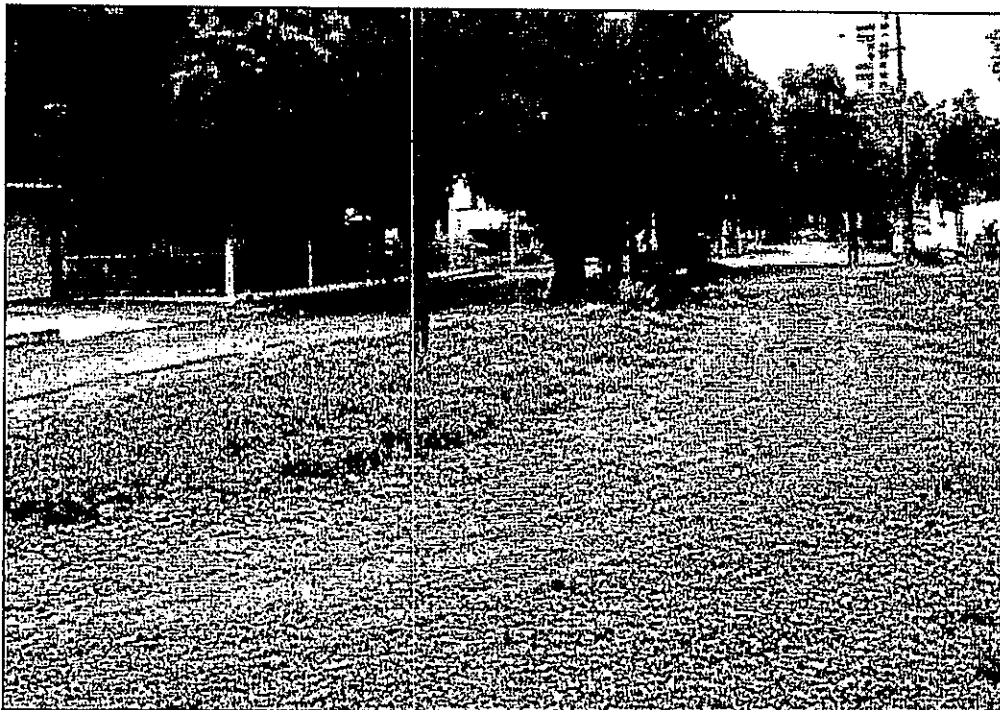

RECREO – CALLE 68 ENTRE CRA 1ª Y 1D, LATITUD: 8°46'56.73"N Y LONGITUD: 75°52'19.61"O




RECREO CALLE 62B ENTRE CARRERA 2 Y 4, LATITUD: 8°46'29.67"N Y LONGITUD: 75°52'8.68"O




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

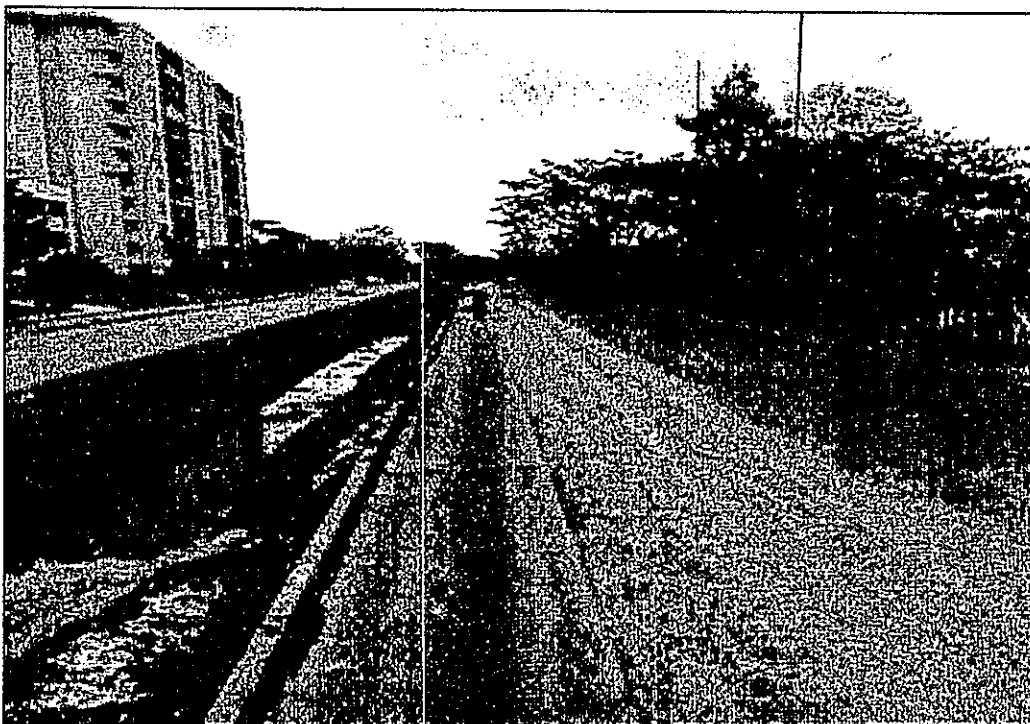

IMAT CALLE 68 ENTRE CARRERA 9A Y CARRERA 10, LATITUD: 8°46'38.76"N Y LONGITUD: 75°51'37.03"

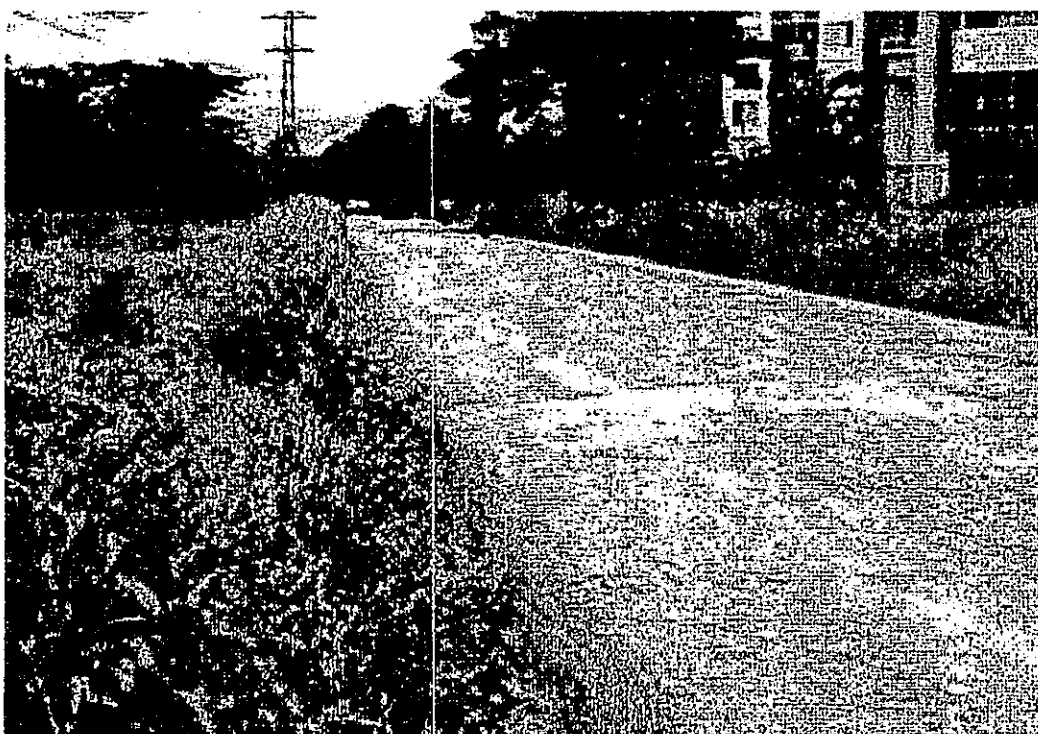

IMAT CARRERA 13 ENTRE CALLE 68 Y 72 LATITUD: 8°46'42.70"N Y LONGITUD: 75°51'32.04"O



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA



CANTA CLARO CALLE 15A ENTRE CARRERA 34A Y 36, LATITUD: 8°44'3.93"N Y LONGITUD: 75°52'0.72"



CANTA CLARO CALLE 18 ENTRE CARRERA 34A Y 36, LATITUD: 8°44'6.21"N Y LONGITUD: 75°51'59.72"O



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈



6 DE MARZO CARRERA 17A ENTRE CLL 22 Y 11C, LATITUD: 8°44'28.09"N Y LONGITUD: 75°52'38.94"O



VILLA ROCIO CARRERA 27B ENTRE CALLE 22 Y CALLE 9, LATITUD: 8°43'56.04"N Y LONGITUD: 75°52'28.61"O



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA



PASATIEMPO CALLE 22C ENTRE CARRERA 18A Y 16, LATITUD: 8°44'38.31"N Y LONGITUD: 75°52'37.06"



MONTEVERDE CALLE 52 ENTRE CRA 12 Y 14D, LATITUD: 8°45'39.83"N Y LONGITUD: 75°51'55.62"



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈



MONTEVERDE CRA 14D ENTRE CALLE 51 Y 52, LATITUD: 8°45'40.74"N Y LONGITUD: 75°51'54.09"O



MONTEVERDE CALLE 53 ENTRE CRA 12 Y 14D, LATITUD: 8°45'41.39"N Y LONGITUD: 75°51'54.68"O



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA



CORREGIMIENTO EL TAPAO LATITUD: 75°52'37.06" Y LONGITUD: 75°49'34.90"O



CALLE RANCHOS DEL INAT ENTRE CALLE 60 Y 78, LATITUD: 8°45'51.49"N Y LONGITUD: 75°51'28.78"O



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Localización de los sectores: El proyecto se divide en siete sectores los cuales se localizan en los barrios de El Recreo, IMAT, Cantaclaro, 6 de marzo que incluye Pasatiempo y Villa Rocío, Monteverde, el corregimiento de El Tapao y Ranchos del Inat.

A continuación, se describen los alineamientos en cada uno de los barrios o sectores a intervenir, en los que se detalla la nomenclatura, los PR inicial y final, y las coordenadas geográficas:

Sector	Barrio	Nomenclatura Catastral	PR Inicial	PR Final	Coordenadas Inicial		Coordenadas Final	
					Este	Norte	Este	Norte
1	EL RECREO	A-1 CALLE 68 ENTRE CRA 1A Y 1D	K0+000.00	K0+222.48	1.132.611.536	1.463.178.241	1.132.816.468	1.463.091.630
		A-2 CALLE 68 ENTRE CRA 1A Y 1B	K0+000.00	K0+035.26	1.132.614.654	1.463.185.619	1.132.647.119	1.463.171.869
		A-3 CRA 3 ENTRE CALLE 71 Y 72	K0+000.00	K0+042.78	1.133.274.485	1.463.282.978	1.133.290.877	1.463.322.496
		A-4 CRA 3 ENTRE CALLE 72 Y 73	K0+000.00	K0+045.47	1.133.293.862	1.463.329.516	1.133.311.654	1.463.371.362
		A-5 CRA 2 ENTRE CALLE 71 Y 72	K0+000.00	K0+041.20	1.133.078.950	1.463.366.383	1.133.094.730	1.463.404.439
		A-6.1 CRA 2 ENTRE CALLE 72 Y 73	K0+000.00	K0+045.61	1.133.095.116	1.463.412.955	1.133.115.224	1.463.453.893
		A-6.2 CRA 2 ENTRE CALLE 72 Y 73	K0+000.00	K0+045.47	1.133.087.349	1.463.416.218	1.133.107.394	1.463.457.027
		A-7 INTERSECCION CALLE 72 CON CRA 3	K0+000.00	K0+069.45	1.133.055.064	1.463.425.445	1.133.119.089	1.463.398.543
		A-8 CALLE 62B ENTRE CRA 3 Y 4	K0+000.00	K0+192.93	1.132.903.560	1.462.349.194	1.133.088.382	1.462.304.315
		A-10 CRA 4 ENTRE CALLE 62B Y 63	K0+000.00	K0+053.95	1.133.082.633	1.462.311.726	1.133.104.429	1.462.361.078
		A-11 CRA 4 ENTRE CALLE 63 Y 64	K0+000.00	K0+080.18	1.133.107.010	1.462.367.495	1.133.138.385	1.462.441.284
		A-12 CARRERA 3 ENTRE CALLE 62B Y 63	K0+000.00	K0+030.82	1.132.917.692	1.462.405.960	1.132.929.793	1.462.434.307



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

		A-13.1 CARRERA 4 ENTRE CALLE 69 Y 71	K0+000.00	K0+143.69	1.133.374.632	1.462.975.197	1.133.430.155	1.463.107.727
		A-13.2 CARRERA 4 ENTRE CALLE 69 Y 71	K0+000.00	K0+100.20	1.133.381.340	1.463.019.686	1.133.420.057	1.463.112.103
2	IMAT	A-1 CALLE 68 ENTRE CARRERA 9A Y CARRERA 10	K0+000.00	K0+159.17	1.133.913.710	1.462.626.862	1.134.060.866	1.462.566.196
		A-2 CARRERA 13 ENTRE CALLE 68 Y 72	K0+000.00	K0+368.13	1.134.076.545	1.462.581.919	1.134.123.464	1.462.930.642
		A-3 CALLE 73 ENTRE AVEN CIRCUNVALAR Y CRA 7	K0+000.00	K0+185.00	1.133.870.843	1.463.192.578	1.134.044.182	1.463.128.488
		A-4 CARRERA 7 ENTRE CALLE 72 Y 73	K0+000.00	K0+047.25	1.134.017.816	1.463.085.009	1.134.034.989	1.463.129.023
3	CANTACLARO	A-1 CALLE 15A ENTRE CARRERA 34A Y 36	K0+000.00	K0+155.00	1.133.210.963	1.457.865.452	1.133.357.535	1.457.815.139
		A-2 CALLE 18 ENTRE CARRERA 34A Y 36.	K0+000.00	K0+145.71	1.133.236.398	1.457.939.276	1.133.373.470	1.457.889.866
		A-3 CARRERA 36 ENTRE CALLE 15A Y 18	K0+000.00	K0+081.47	1.133.352.346	1.457.819.993	1.133.379.234	1.457.896.865
4	6 DE MARZO	A-1 CARRERA 17A ENTRE CLL 22 Y 11C	K0+000.00	K0+327.11	1.132.055.425	1.458.599.346	1.131.857.341	1.458.339.296
		A-2 CALLE 11C ENTRE CRA 17A Y 15A	K0+000.00	K0+395.00	1.131.489.197	1.458.448.405	1.131.866.002	1.458.330.983
		A-3 CRA 15A ENTRE CALLE 11B Y 11C	K0+000.00	K0+055.00	1.131.460.972	1.458.412.482	1.131.492.690	1.458.457.371
		A-4 CRA 15B ENTRE CALLE 11C Y 12A	K0+000.00	K0+152.50	1.131.544.485	1.458.433.711	1.131.586.806	1.458.580.221
		A-5 CALLE 12A ENTRE CR 15B Y 17A	K0+000.00	K0+374.03	1.131.587.373	1.458.571.373	1.131.945.181	1.458.462.569




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

	PASATIEMPO	A-6 CALLE 22C ENTRE CARRERA 18A Y 16	K0+000.00	K0+253.06	1.131.972.159	1.459.090.693	1.132.121.881	1.458.887.025
	VILLAROCIO	A-7 CARRERA 27B ENTRE CALLE 22 Y CALLE 9	K0+000.00	K0+223.05	1.132.255.197	1.457.544.232	1.132.448.391	1.457.655.664
5	MONTEVERDE	A-1 CALLE 54 ENTRE CRA 13 Y CRA 11	K0+000.00	K0+129.72	1.133.285.603	1.461.097.182	1.133.389.105	1.461.018.980
		A-2 CALLE 54 ENTRE CRA 11 Y CRA 12	K0+000.00	K0+021.19	1.133.405.826	1.461.006.355	1.133.422.618	1.460.993.434
		A-3 CALLE 54 ENTRE CRA 12 Y CRA 13	K0+000.00	K0+073.86	1.133.438.490	1.460.981.480	1.133.496.564	1.460.935.873
		A-4 CALLE 53A DESDE CARRERA 11 Y 11B	K0+000.00	K0+109.75	1.133.278.874	1.461.054.394	1.133.366.192	1.460.987.911
		A-5 CARRERA 11A ENTRE CALLE 55 Y 53A	K0+000.00	K0+138.36	1.133.305.701	1.461.037.739	1.133.386.993	1.461.149.700
		A-6 CRA 12A ENTRE CALLE 53 Y 54	K0+000.00	K0+116.77	1.133.401.824	1.460.856.699	1.133.470.526	1.460.951.117
		A-7 CALLE 53 ENTRE CRA 12 Y 14D	K0+000.00	K0+072.94	1.133.363.235	1.460.880.724	1.133.422.244	1.460.837.842
		A-8 CALLE 52 ENTRE CRA 12 Y 14D	K0+000.00	K0+068.80	1.133.328.904	1.460.834.978	1.133.384.818	1.460.794.925
		A-9 CRA 14D ENTRE CALLE 52 Y 53	K0+000.00	K0+037.25	1.133.397.392	1.460.805.555	1.133.420.150	1.460.835.048
		A-10 CRA 14D ENTRE CALLE 51 Y 52	K0+000.00	K0+071.92	1.133.337.991	1.460.729.079	1.133.382.222	1.460.785.780
6	EL TAPAO	A-1 CORREGIMIENTO EL TAPAO	K0+000.00	K0+775.00	1.137.680.131	1.462.774.488	1.137.171.697	1.463.304.312
7	RANCHOS DEL INAT	A-1 CALLE RANCHOS DEL INAT ENTRE CALLE 60 Y 78	K0+000.00	K1+700.00	1.134.190.300	1.461.160.063	1.135.245.474	1.462.436.456



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO.

En la ejecución de este proyecto se intervendrán 7.387 km de vías urbanas para su respectivo mejoramiento, el cual está conformado por siete sectores, los cuales se relacionan en la siguiente tabla en los que se detalla el tipo de intervención y la longitud de cada alineamiento y el sector en general:

SECTOR	BARRIO	NOMENCLATURA CATASTRAL	LONGITUD DEL TRAMO (M)	TIPO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD TOTAL (KM)
1	EL RECREO	A-1 CALLE 68 ENTRE CRA 1A Y 1D	222.48	PAVIMENTO RIGIDO	1.149
		A-2 CALLE 68 ENTRE CRA 1A Y 1B	35.26	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-3 CRA 3 ENTRE CALLE 71 Y 72	42.78	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-4 CRA 3 ENTRE CALLE 72 Y 73	45.47	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-5 CRA 2 ENTRE CALLE 71 Y 72	41.20	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-6.1 CRA 2 ENTRE CALLE 72 Y 73	45.61	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-6.2 CRA 2 ENTRE CALLE 72 Y 73	45.47	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-7 INTERSECCIÓN CALLE 72 CON CRA 3	69.45	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-8 CALLE 62B ENTRE CRA 3 Y 4	192.93	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-10 CRA 4 ENTRE CALLE 62B Y 63	53.95	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-11 CRA 4 ENTRE CALLE 63 Y 64	80.18	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-12 CARRERA 3 ENTRE CALLE 62B Y 63	30.82	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-13.1 CARRERA 4 ENTRE CALLE 69 Y 71	143.69	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-13.2 CARRERA 4 ENTRE CALLE 69 Y 71	100.20	PAVIMENTO RIGIDO	
2	IMAT	A-1 CALLE 68 ENTRE CARRERA 9A Y CARRERA 10	159.17	PAVIMENTO RIGIDO	0.760
		A-2 CARRERA 13 ENTRE CALLE 68 Y 72	368.13	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-3 CALLE 73 ENTRE AVEN CIRCUNVALAR Y CRA 7	185.00	PAVIMENTO RIGIDO	



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

		A-4 CARRERA 7 ENTRE CALLE 72 Y 73	47.25	PAVIMENTO RIGIDO	
3	CANTA CLARO	A-1 CALLE 15A ENTRE CARRERA 34A Y 36	155.00	PAVIMENTO RIGIDO	0.382
		A-2 CALLE 18 ENTRE CARRERA 34A Y 36.	145.71	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-3 CARRERA 36 ENTRE CALLE 15A Y 18	81.47	PAVIMENTO RIGIDO	
4	BARRIO 6 DE MARZO	A-1 CARRERA 17A ENTRE CLL 22 Y 11C	327.11	PAVIMENTO RIGIDO	1.780
		A-2 CALLE 11C ENTRE CRA 17A Y 15A	395.00	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-3 CRA 15A ENTRE CALLE 11B Y 11C	55.00	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-4 CRA 15B ENTRE CALLE 11C Y 12A	152.50	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-5 CALLE 12A ENTRE CR 15B Y 17A	374.03	PAVIMENTO RIGIDO	
	PASATIEMPO	A-6 CALLE 22C ENTRE CARRERA 18A Y 16	253.06	PAVIMENTO RIGIDO	
	VILLA ROCIO	A-7 CARRERA 27B ENTRE CALLE 22 Y CALLE 9	223.05	PAVIMENTO RIGIDO	
5	MONTEVERDE	A-1 CALLE 54 ENTRE CRA 13 Y CRA 11	129.72	PAVIMENTO RIGIDO	0.858
		A-2 CALLE 54 ENTRE CRA 11 Y CRA 12	21.19	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-3 CALLE 54 ENTRE CRA 12 Y CRA 13	73.86	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-4 CALLE 53A DESDE CARRERA 11 Y 11B	109.75	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-5 CARRERA 11A ENTRE CALLE 55 Y 53A	138.36	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-6 CRA 12A ENTRE CALLE 53 Y 54	116.77	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-7 CALLE 53 ENTRE CRA 12 Y 14D	72.94	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-8 CALLE 52 ENTRE CRA 12 Y 14D	68.80	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-9 CRA 14D ENTRE CALLE 52 Y 53	37.25	PAVIMENTO RIGIDO	
		A-10 CRA 14D ENTRE CALLE 51 Y 52	71.92	PAVIMENTO RIGIDO	
6	EL TAPAO	A-1 CORREGIMIENTO EL TAPAO	775.00	PAVIMENTO RIGIDO	0.775



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

7	RANCHOS DEL INAT	A-1 CALLE RANCHOS DEL INAT ENTRE CALLE 60 Y 78	1700.00	MEJORAMIENTO CON AFIRMADO	1.700
TOTAL, INTERVENCIÓN			7387		7.387

En el comité de seguimiento a la obra (10 de junio de 2025) entre las partes, contratista e interventoría, se acuerdan las siguientes acciones y compromisos:

- **Revisión de presupuesto y mejoramiento de diseños:** una vez revisado el presupuesto y los diseños de obra, se evidencia el requerimiento de unos ajustes a dichos diseños de acuerdo a las condiciones reales de campo.

Componente Eléctrico:

Este componente eléctrico contempla la reubicación de varios postes de media y baja tensión que actualmente se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto y representan un obstáculo para el desarrollo adecuado y seguro de las actividades constructivas. La inclusión de estas actividades eléctricas en el presupuesto del proyecto responde a la necesidad técnica y operativa de garantizar la continuidad del servicio eléctrico y al mismo tiempo permitir la ejecución eficiente de las obras de pavimentación.


Es importante resaltar que, aunque el componente eléctrico no constituye el objeto principal del proyecto, su ejecución es indispensable para la viabilidad técnica del mismo. En este sentido, se propuso una mejora en el presupuesto del componente eléctrico, con el fin de ajustar los recursos de manera más precisa a las condiciones reales del terreno y a los requerimientos técnicos actuales.

La propuesta de ajuste busca, además, optimizar la ejecución del proyecto en su conjunto, minimizando riesgos de retrasos, reprocesos y afectaciones a la infraestructura eléctrica y garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables (RETIE, NTC, regulaciones locales).

Componente hidráulico:

El contratista manifiesta que desde que el contrato fue adjudicado, inició una fase de verificación a los estudios y diseños del proyecto, manifiesta que lo ha realizado para conocer de manera detallada todas las características técnicas del proyecto, para así tener certeza de una buena ejecución y desarrollar un cronograma realista con las condiciones técnicas diseñadas, de tal manera que se inició por recorrer todas y cada una de las vías a intervenir en compañía de dos comisiones topográficas, para replantear todo el proyecto y determinar en campo verazmente todas y cada una de las condiciones reales del proyecto como tal.

Por tal razón el contratista se compromete a realizar un balance de cantidades de obra de acuerdo a los ajustes propuestos en los diseños, y en este verificar además de la parte hidráulica y eléctrica,



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

hacer una verificación de los otros ítems del proyecto teniendo en cuenta que pueden existir mayores y menores cantidades que se equilibren aprovechando el balance.

Se realiza balance de obra con mayores y menores cantidades e ítems no previstos debidamente justificado, el cual es revisado y aprobado por la entidad contratante.

De acuerdo a los objetivos específicos del contrato, se vienen realizando los comités de obra semanales, entre contratista e interventoría los cuales son cruciales para:

1. Control del Progreso y Programación:

- * Permiten revisar el avance real frente al cronograma reprogramado propuesto.
- * Facilitan la identificación temprana de retrasos y la toma de acciones correctivas inmediatas.

2. Gestión de Calidad:

- * Se revisan los resultados de los ensayos de calidad de la semana anterior (materiales, compactación, concretos, etc.).
- * Se aseguran de que los trabajos futuros cumplan con las especificaciones técnicas antes de que se conviertan en problemas mayores.

3. Coordinación Interdisciplinaria:

- * Sirven como foro para que todos los involucrados (contratista, interventoría, supervisión y comunidad) sincronicen esfuerzos.
- * Se resuelven problemas logísticos, de diseño o de interferencias que puedan afectar el ritmo ejecución y rendimiento de la obra.

4. Seguridad y Medio Ambiente:

- * Se revisan los indicadores de seguridad y se discuten incidentes o riesgos potenciales.
- * Se verifica el cumplimiento de las normativas ambientales relativas a la obra.


5. Toma de Decisiones y Asignación de Recursos:

- * Se aprueban cambios menores o se toman decisiones rápidas sobre materiales o procedimientos.
- * Se asegura que los recursos (personal, maquinaria, materiales) estén disponibles según lo programado.

En resumen, estos comités garantizan que la obra se mantenga a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

A continuación, se relacionan las actividades y el alcance de los ítems contractuales (mayores y menores cantidades) y los ítems no previstos a ejecutar para este proyecto, de acuerdo al balance de obra debidamente justificado y aprobado, para cada uno de los sectores que integran el proyecto.

En resumen, este balance se implementa como una herramienta técnica y legal para reflejar la realidad de la ejecución física del proyecto frente a lo inicialmente contratado.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

- **Revisión de mayores y menores cantidades e ítems no previstos (balance 2) y adición de recursos:**

Se reitera que se hizo imperativo la revisión y formalización de un Balance de obra 2 esto debido a la aparición de circunstancias imprevistas y a la necesidad de ajustar algunas cantidades de obra inicialmente presupuestadas. La naturaleza progresiva de la obra evidenció la concurrencia de ítems no contemplados en el alcance original, así como variaciones significativas en las cantidades de las actividades ya definidas y contractuales. Este balance se requiere para documentar, justificar y reconocer económicamente las obras adicionales y las modificaciones de cantidades ejecutadas en el proyecto, asegurando la correcta liquidación contractual del mismo. Para iniciar oficialmente su trámite se llevó a cabo un comité de obra con las partes involucradas, en las que se hace un análisis detallado ítem por ítem y de las necesidades técnicas en campo.

Tras un riguroso proceso de seguimiento y control ejecutado por la Interventoría, en conjunto con la supervisión y el equipo técnico de obra, se ha consolidado el Balance de Obra No. 2. Este documento es el resultado de una evaluación exhaustiva y detallada de la realidad ejecutoria en campo, comparada frente a las proyecciones iniciales del contrato.

1. Diagnóstico y Revisión Técnica

La elaboración de este balance surge de la necesidad de ajustar el presupuesto contractual a las condiciones reales encontradas durante la fase de construcción. Para ello, se realizó una revisión pormenorizada de:


Mayores y Menores Cantidades: Se determinaron los ítems en los que, por condiciones del terreno o ajustes en los diseños finales, se superaron las cantidades inicialmente estimadas (mayores), así como aquellos en los que hubo una reducción (menores).

Ítems No Previstos (Nuevos Precios): Se identificaron actividades técnicamente necesarias para la funcionalidad de la obra que no fueron contempladas en el pliego de condiciones original. Estos ítems fueron analizados bajo precios de mercado y aprobados por la interventoría para su inclusión en el presupuesto.

Realidad de Campo: La revisión no fue meramente documental, sino que partió de la medición directa en el sitio, garantizando que cada ajuste responda a una necesidad física real de la estructura y el entorno.

2. Justificación de la Adición de Recursos

Como consecuencia del balance mencionado, se ha determinado que el presupuesto remanente es insuficiente para cubrir la totalidad de las actividades necesarias para concluir el proyecto bajo los estándares de calidad, diseño y seguridad requeridos. Por lo tanto, se procedió a la gestión de una adición de recursos financieros.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

Esta adición tiene como objetivos fundamentales:

- Garantizar la Continuidad: Evitar la parálisis de la obra por falta de disponibilidad presupuestal en ítems críticos.
- Sustentar los Ítems No Previstos: Financiar las soluciones técnicas de ingeniería que surgieron durante la ejecución y que son indispensables para la estabilidad de la obra.
- Equilibrio Económico: Mantener la viabilidad financiera del contrato, permitiendo que el contratista cumpla con sus obligaciones de suministro, personal y maquinaria hasta el último día de ejecución.


3. Conclusión:

Este ejercicio de planeación técnica y financiera refuerza la transparencia en la inversión de los recursos y proporciona el soporte legal necesario para la liquidación final del contrato sin contratiempos.

La adición de recursos corresponde a la suma de: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETEMIL OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.882.347.089.00), quedando el valor total del contrato por la suma de: VEINTINUEVEMIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (29.599.781.389.00).



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VASURBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CORDOBA

BALANCE DE OBRA No. 2

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS 2					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	CANT T (+)	CANT T (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	CANT (+)	CANT (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CAPITULO I RECREO							\$ 7.176.779.667,00	RECREO					RECREO			\$ 5.466.229.046,00	
1.1	PRELIMINARES																
1.1.1		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	319,51	\$ 58.103,00	\$ 18.564.490,00	319,51	0,00	0,00	\$ 58.103,00	\$ 18.564.490,00	324,31	4,80	0,00	\$ 58.103,00	\$ 18.843.384,00	
1.1.2		DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	693,56	\$ 37.682,00	\$ 26.134.728,00	693,56	0,00	0,00	\$ 37.682,00	\$ 26.134.728,00	1253,75	560,19	0,00	\$ 37.682,00	\$ 47.243.716,00	
1.1.3		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	5.251,46	\$ 29.095,00	\$ 152.791.229,00	5251,46	0,00	0,00	\$ 29.095,00	\$ 152.791.229,00	5249,36	0,00	2,10	\$ 29.095,00	\$ 152.730.246,00	
1.1.4		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	722,53	\$ 33.334,00	\$ 24.084.815,00	229,89	0,00	492,64	\$ 33.334,00	\$ 7.663.120,00	728,40	488,51	0,00	\$ 33.334,00	\$ 24.280.326,00	
1.1.5		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (12100)	M2	8.907,51	\$ 20.428,00	\$ 181.962.614,00	8016,75	0,00	890,76	\$ 20.428,00	\$ 163.766.169,00	8084,85	68,13	0,00	\$ 20.428,00	\$ 163.157.894,00	
1.1.6		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	7.912,38	\$ 36.161,00	\$ 286.119.573,00	7271,94	0,00	640,44	\$ 36.161,00	\$ 262.960.622,00	8222,40	950,46	0,00	\$ 36.161,00	\$ 297.330.383,00	
2.1.7		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (ITALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUDE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND				3,00					3,00	3,00	0,00	\$ 441.297,00	\$ 1.323.891,00	




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

[illegible]




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	3.213,72	\$ 24.975,00	\$ 80.262.657,00	3213,72	0,00	0,00	\$ 24.975,00	\$ 80.262.657,00	\$	80.262.657,00
1.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (60X80X20). INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.008,65	\$ 166.143,00	\$ 333.723.137,00	2008,65	0,00	0,00	\$ 166.143,00	\$ 333.723.137,00	\$	296.997.227,00
				Subtotal	\$ 2.973.743.320,00					\$ 2.973.743.320,00		\$ 2.918.618.046,00
1.4	PREVIAS											
1.4.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLORACION Y CAVALES	M3	1.127,10	\$ 29.095,00	\$ 32.792.975,00	0,00	0,00	1127,10	\$ 29.095,00	\$	\$ 29.095,00	\$ 2.401.042,00
1.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCION DE TERRENO.	M3	1.127,10	\$ 423.349,00	\$ 477.156.658,00	0,00	0,00	1127,10	\$ 423.349,00	\$	\$ 423.349,00	\$ 863.607,00
1.4.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	63,51	\$ 37.682,00	\$ 2.393.184,00	0,00	0,00	63,51	\$ 37.682,00	\$	\$ 37.682,00	\$
1.4.4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	74,31	\$ 33.334,00	\$ 2.477.050,00	0,00	0,00	74,31	\$ 33.334,00	\$	\$ 33.334,00	\$
1.4.5	CONCRETO CLASE F PARA SOLADO DE LIMPIEZA e= 0.05m	M2	38,11	\$ 46.360,00	\$ 1.766.780,00	0,00	0,00	38,11	\$ 46.360,00	\$	\$ 46.360,00	\$ 1.050.796,00
1.4.6	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3.375,54	\$ 12.864,00	\$ 43.422.947,00	0,00	0,00	3375,54	\$ 12.864,00	\$	\$ 12.864,00	\$ 10.723.067,00
1.4.7	CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	M	57,51	\$ 697.735,00	\$ 40.126.740,00	0,00	0,00	57,51	\$ 697.735,00	\$	\$ 697.735,00	\$ 12.691.800,00
1.4.8	CAJA DE HIDRÁULICAS DE 1.8 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0X1.52.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RÍGIDO, TIPO VERTEDERO.	UN	1,00	\$ 3.561.000,00	\$ 3.561.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 3.561.000,00	\$	\$ 3.561.000,00	\$
1.4.9	CAJA DE HIDRÁULICAS DE 1.6 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0X1.52.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RÍGIDO, TIPO VERTEDERO.	UN	1,00	\$ 3.280.074,00	\$ 3.280.074,00	0,00	0,00	1,00	\$ 3.280.074,00	\$	\$ 3.280.074,00	\$




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1.4.10	TAPAS DE INSPECCIÓN PARA CARCAMBO DE 0.9 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO	UN	6.00	\$ 189.591,00	\$ 1.137.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	\$ 189.591,00	\$	2,00	0,00	\$ 189.591,00	\$	379.182,00
3.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRNADO E=40 CM)	M3											32,93	0,00	\$ 158.015,00	\$	5.203.118,00
			Subtotal		\$ 808.114.955,00	\$ 0,00						\$ 0,00					\$ 33.312.612,00
1.5	ESPACIO PÚBLICO (ANDES Y MOLLINO)																
1.5.1	S/I/ TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20x0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (JUNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	159.21	\$ 292.537,00	\$ 46.574.816,00	0,00	0,00	159,21			\$ 292.537,00	\$	8,40	0,00	\$ 292.537,00	\$	2.457.311,00
1.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON LOSETA GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EXIBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	786.17	\$ 71.199,00	\$ 55.974.518,00	1126,27	342,10	0,00			\$ 71.199,00	\$ 80.331.696,00	1010,10	0,00	\$ 71.199,00	\$	71.918.110,00
1.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EXIBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	786.17	\$ 46.543,00	\$ 36.590.710,00	1287,09	500,92	0,00			\$ 46.543,00	\$ 59.905.030,00	1010,10	0,00	\$ 46.543,00	\$	47.013.084,00




GOVERNACIÓN DE
CÓRDOBA
INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10

1.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	468,03	\$ 182.483,00	\$ 85.407.518,00	\$ 854,32	396,89	0,00	\$ 182.483,00	\$ 157.833.196,00	725,27	0,00	139,65	\$ 182.483,00	\$	132.349.445,00
1.5.5	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	35,75	\$ 1.357.718,00	\$ 48.538.419,00	\$ 0,00	0,00	35,75	\$ 1.357.718,00	\$		0,00	0,00	\$ 1.357.718,00	\$	-
1.5.6	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00	\$ 1.494.956,00	\$ 0,00	0,00	1,00	\$ 1.494.956,00	\$		0,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$	-
1.5.7	S/IBOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	57,00	\$ 475.652,00	\$ 27.112.164,00	\$ 93,00	36,00	0,00	\$ 475.652,00	\$ 44.235.635,00	52,00	0,00	41,00	\$ 475.652,00	\$	24.733.904,00
			Subtotal			\$ 301.693.101,00				\$ 342.306.558,00				\$	278.471.864,00	
1.6	REALIZACIÓN Y DEMARCACIONES															
1.6.1	DEMARCAACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM), (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	3.642,43	\$ 11.293,00	\$ 41.133.962,00	\$ 3642,43	0,00	0,00	\$ 11.293,00	\$ 41.133.962,00	3413,16	0,00	229,27	\$ 11.293,00	\$	38.544.816,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR SP Y/O SI TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETROREFLECTIVA (BOX60 CM)	UND	46,00	\$ 896.973,00	\$ 41.260.758,00	46,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	1,00	\$ 896.973,00	\$ 41.260.758,00	\$ 896.973,00	\$ 40.363.785,00
1.6.3	DEMARCAÇÃO HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	274,97	\$ 104.900,00	\$ 28.844.353,00	274,97	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00	17,73	\$ 104.900,00	\$ 28.844.353,00	\$ 104.900,00	\$ 26.984.896,00
1.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNAO	M	73,07	\$ 467.929,00	\$ 34.191.572,00	73,07	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	39,47	\$ 467.929,00	\$ 34.191.572,00	\$ 467.929,00	\$ 15.722.414,00
	Subtotal				\$ 145.430.645,00									\$ 145.430.645,00		\$ 121.515.911,00
1.7	OBRAS DE REUBICACIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS (ACUEDUCTO, ALICANTARILLADO, GAS NATURAL)															
1.7.1	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	26,00	\$ 213.904,00	\$ 5.561.504,00	26,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10,00	0,00	\$ 213.904,00	\$ 5.561.504,00	\$ 213.904,00	\$ 7.700.544,00
1.7.2	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	1,00	\$ 477.758,00	\$ 477.758,00	1,00	0,00	0,00	0,00	28,00	27,00	0,00	\$ 477.758,00	\$ 477.758,00	\$ 477.758,00	\$ 13.377.224,00
1.7.3	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	26,00	\$ 238.115,00	\$ 6.190.990,00	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26,00	\$ 238.115,00	\$ 6.190.990,00	\$ 238.115,00	-
	Subtotal				\$ 12.230.252,00									\$ 12.230.252,00		\$ 21.077.765,00
1.8	REUBICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS															
	RED DE MEDIA TENSION (13.200 VOL)															
1.8.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	M	50,00	\$ 5.432,00	\$ 271.600,00	50,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00	\$ 5.432,00	\$ 271.600,00	\$ 5.432,00	\$ -



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**



**GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA**

1.8.2	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00	0,00	1,00	1,00	\$.	1,00	0,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00
1.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1,00	\$ 775.489,00	\$ 775.489,00	0,00	1,00	1,00	\$.	1,00	0,00	\$ 775.489,00	\$ 775.489,00
1.8.4	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	1,00	\$ 5.115.579,00	\$ 5.115.579,00	2,00	1,00	2,00	\$ 10.231.158,00	0,00	0,00	\$ 5.115.579,00	\$ 10.231.158,00
1.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	1,00	\$ 922.037,00	\$ 922.037,00	2,00	1,00	2,00	\$ 1.844.074,00	0,00	0,00	\$ 922.037,00	\$ 1.844.074,00
1.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN LINEA CON DISPOSICION CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	\$ 6.078.923,00	\$ 6.078.923,00	2,00	1,00	2,00	\$ 12.157.846,00	0,00	0,00	\$ 6.078.923,00	\$ 12.157.846,00
1.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2,00	\$ 3.880.278,00	\$ 3.880.278,00	2,00	0,00	2,00	\$ 7.760.556,00	0,00	0,00	\$ 3.880.278,00	\$ 7.760.556,00
1.8.8	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AVG.	M	50,00	\$ 104.792,00	\$ 5.239.600,00	0,00	0,00	50,00	\$.	50,00	0,00	\$ 104.792,00	\$ 5.239.600,00




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10

1.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 MTS.	UND	2,00	\$ 2.108.765,00	\$ 4.217.530,00	0,00	0,00	2,00	\$ 2.108.765,00	\$ -	3,00	0,00	\$ 2.108.765,00	\$ 6.326.295,00
1.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMAJO PARA ESTRUCTURA DE MIT TIRASICO A 13.2 KV.	UND	3,00	\$ 4.717.204,00	\$ 14.151.612,00	4,00	1,00	0,00	\$ 4.717.204,00	\$ 18.868.816,00	5,00	0,00	\$ 4.717.204,00	\$ 23.586.020,00
1.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	2,00	\$ 8.299.515,00	\$ 16.599.030,00	2,00	0,00	0,00	\$ 8.299.515,00	\$ 18.599.030,00	2,00	0,00	\$ 8.299.515,00	\$ 16.599.030,00
1.8.12	RETIRO CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	GLB	26,00	\$ 2.103.798,00	\$ 54.898.748,00	0,00	0,00	26,00	\$ 2.103.798,00	\$ -	2,00	0,00	\$ 2.103.798,00	\$ 4.207.596,00
1.8.13	RED DE BAJA TENSION (240/120 VOL) LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	50,00	\$ 2.805,00	\$ 140.250,00	0,00	0,00	50,00	\$ 2.805,00	\$ -	0,00	0,00	\$ 2.805,00	\$ -
1.8.14	SUMINISTRO, INSTALACION E HINDADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	1,00	\$ 3.285.223,00	\$ 3.285.223,00	4,00	3,00	0,00	\$ 3.285.223,00	\$ 13.140.892,00	4,00	0,00	\$ 3.285.223,00	\$ 13.140.892,00
1.8.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	1,00	\$ 528.256,00	\$ 528.256,00	4,00	3,00	0,00	\$ 528.256,00	\$ 2.113.024,00	4,00	0,00	\$ 528.256,00	\$ 2.113.024,00
1.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION-ANGULO-FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	1,00	\$ 799.429,00	\$ 799.429,00	4,00	3,00	0,00	\$ 799.429,00	\$ 3.197.716,00	4,00	0,00	\$ 799.429,00	\$ 3.197.716,00
1.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	2,00	\$ 1.770.541,00	\$ 3.541.082,00	0,00	0,00	2,00	\$ 1.770.541,00	\$ -	1,00	0,00	\$ 1.770.541,00	\$ 1.770.541,00




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INODIMABLE.	UND	1,00	\$ 1.130.176,00	\$ 1.130.176,00	2,00	1,00	0,00	\$ 1.130.176,00	\$ 2.260.352,00	2,00	0,00	0,00	\$ 1.130.176,00	\$ 2.260.352,00
1.8.19	RETRO CONTENSION A 240V. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	35,00	\$ 1.850.974,00	\$ 64.784.090,00	0,00	0,00	35,00	\$ 1.850.974,00	\$ 5.552.922,00	3,00	3,00	0,00	\$ 1.850.974,00	\$ 5.552.922,00
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.														
1.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.INCLUDE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	4,00	\$ 10.019.826,00	\$ 40.079.304,00	1,00	0,00	3,00	#####	\$ 10.019.826,00	1,00	0,00	0,00	\$ 10.019.826,00	\$ 10.019.826,00
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.														
1.8.21	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (240. 6 + 13No. 6 / AVG.	M	60,00	\$ 69.405,00	\$ 4.164.300,00	60,00	0,00	0,00	\$ 69.405,00	\$ 4.164.300,00	60,00	0,00	0,00	\$ 69.405,00	\$ 4.164.300,00
1.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	3,00	\$ 969.687,00	\$ 2.909.061,00	4,00	1,00	0,00	\$ 969.687,00	\$ 3.878.748,00	4,00	0,00	0,00	\$ 969.687,00	\$ 3.878.748,00
1.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	3,00	\$ 762.648,00	\$ 2.287.944,00	5,00	2,00	0,00	\$ 762.648,00	\$ 3.813.240,00	5,00	0,00	0,00	\$ 762.648,00	\$ 3.813.240,00
	POSTES TELEFONICOS														




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF).	UND	10,00	\$ 2.913.280,00	\$ 29.132.800,00	5,00	0,00	5,00	\$ 14.566.400,00	5,00	0,00	0,00	\$ 2.913.280,00	\$	14.566.400,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF).	UND	10,00	\$ 553.114,00	\$ 5.531.140,00	5,00	0,00	5,00	\$ 2.765.570,00	5,00	0,00	0,00	\$ 553.114,00	\$	2.765.570,00
1.8.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	10,00	\$ 705.352,00	\$ 7.053.520,00	4,00	0,00	4,00	\$ 2.821.448,00	4,00	0,00	0,00	\$ 705.352,00	\$	2.821.448,00
				Subtotal	\$ 285.500.547,00				\$ 130.202.996,00					\$	163.095.811,00
ITEMS NO PREVISTOS															
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL. ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND		\$ 519.838,00		20,00	20,00	0,00	\$ 519.838,00	23,00	3,00	0,00	\$ 519.838,00	\$	11.956.274,00
NP 27	ADECUACION DE CÁMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		\$ 784.145,00		12,00	12,00	0,00	\$ 784.145,00	6,00	0,00	4,00	\$ 784.145,00	\$	6.273.160,00
NP21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND		\$ 1.494.956,00		1,00	1,00	0,00	\$ 1.494.956,00	19,00	18,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$	28.404.164,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND								1,00	1,00	0,00	\$ 737.702,00	\$	737.702,00



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

11. 149



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP 10	INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO A 240V.	UND	\$ 4.392.376,00		20,00	20,00	0,00	\$ 4.392.376,00	\$ 87.847.520,00	4,00	0,00	16,00	\$ 4.392.376,00	\$ 17.569.504,00
NP 11	INSTALACION EN TENSION A 240V. DE POSTE EN CONCRETO 96/10 kgf	UND	\$ 784.145,00		12,00	12,00	0,00	\$ 784.145,00	\$ 9.409.740,00	3,00	0,00	9,00	\$ 5.682.709,00	\$ 17.948.127,00
NP 12	DESINSTALACIÓN O RETIRO EN TENSION DE ARMADO. RED ABIERTA O TRENZADA DE BAJA TENSION	GLB	\$ 1.494.956,00		1,00	1,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$ 1.494.956,00	5,00	4,00	0,00	\$ 3.971.500,00	\$ 19.857.500,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UND								22,00	22,00	0,00	\$ 3.129.750,00	\$ 66.854.500,00
NP 14	DESHINCADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSION A 13.2 KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND								2,00	2,00	0,00	\$ 4.551.733,00	\$ 9.103.466,00
NP 15	DESARMADO EN TENSION DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIA TENSION A 13.2 KV	UND								4,00	4,00	0,00	\$ 5.085.166,00	\$ 20.340.664,00
NP 16	DESHINCADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSION A 240V. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND								3,00	3,00	0,00	\$ 3.129.750,00	\$ 9.389.250,00
NP 17	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSION A 13.2 KV. INCLUYE EXCAVACION - RELLENO DE HOYADA	UND								1,00	1,00	0,00	\$ 3.276.473,00	\$ 3.276.473,00
NP 18	DESAMARRE Y AMARRE DE RED DE MEDIA TENSION. EN TENSION PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA	UND								1,00	1,00	0,00	\$ 3.113.973,00	\$ 3.113.973,00



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

[illegible]



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

2.1.8	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	30.00	\$ 227.187,00	\$ 6.815.610,00	30,00	0,00	0,00	\$ 227.187,00	\$ 6.815.610,00	60,00	30,00	0,00	\$ 227.187,00	\$ 13.631.220,00
				Subtotal	\$ 361.136.703,00					\$ 330.433.841,00					\$ 379.641.914,00
2.2	SUBRASANTE SURBIDE														
2.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	410.53	\$ 158.015,00	\$ 64.869.898,00	2148,27	0,00	1737,74	\$ 158.015,00	\$ 339.468.884,00	2445,99	297,72	0,00	\$ 158.015,00	\$ 386.502.399,00
2.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	856.68	\$ 287.872,00	\$ 246.614.185,00	856,68	0,00	0,00	\$ 287.872,00	\$ 246.614.185,00	833,90	0,00	22,78	\$ 287.872,00	\$ 240.056.529,00
2.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	593.62	\$ 285.909,00	\$ 169.721.301,00	593,62	0,00	0,00	\$ 285.909,00	\$ 169.721.301,00	657,30	63,68	0,00	\$ 285.909,00	\$ 187.926.556,00
2.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	222.61	\$ 144.928,00	\$ 32.262.422,00	222,61	0,00	0,00	\$ 144.928,00	\$ 32.262.422,00	226,69	4,08	0,00	\$ 144.928,00	\$ 32.854.301,00
				Subtotal	\$ 513.467.806,00					\$ 788.056.792,00					\$ 847.339.785,00
2.3	PAVIMENTO BORTILLOS														
2.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA, E= 0.20 CM	M3	1.058.81	\$ 1.389.242,00	\$ 1.470.943.322,00	1058,81	0,00	0,00	\$ 1.389.242,00	\$ 1.470.943.322,00	1088,46	0,00	0,36	\$ 1.389.242,00	\$ 1.470.446.973,00
2.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17.432.31	\$ 12.864,00	\$ 224.249.236,00	17432,31	0,00	0,00	\$ 12.864,00	\$ 224.249.236,00	17391,58	0,00	40,73	\$ 12.864,00	\$ 223.725.280,00
2.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	2.099.32	\$ 24.975,00	\$ 52.430.517,00	2099,32	0,00	0,00	\$ 24.975,00	\$ 52.430.517,00	2146,72	47,40	0,00	\$ 24.975,00	\$ 53.614.270,00



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

[illegible]



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

2.5.1	S/I/ TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	111.45	\$ 292.537,00	\$ 32.603.249,00	\$ 0,00	111,45	\$ 292.537,00	\$ -	3,60	0,00	\$ 292.537,00	\$ 1.053.133,00
2.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO. APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	550.32	\$ 71.199,00	\$ 39.182.234,00	881,33	331,01	\$ 71.199,00	\$ 62.749.815,00	808,44	0,00	\$ 71.199,00	\$ 67.560.120,00
2.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	550.32	\$ 46.543,00	\$ 25.613.544,00	989,67	439,35	\$ 46.543,00	\$ 48.062.211,00	887,59	0,00	\$ 46.543,00	\$ 41.311.101,00
2.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA 21.MPA (3.000 PSI). E=0,08m FUNDIDO EN SITEO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	327.62	\$ 182.483,00	\$ 59.785.080,00	863,27	535,65	\$ 182.483,00	\$ 157.532.099,00	788,68	0,00	\$ 182.483,00	\$ 143.921.057,00



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE CORDOBA



2.5.5	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	25.03	\$ 1.357.718,00	\$ 33.983.692,00	\$ 0,00	0,00	25,03	\$ 1.357.718,00	\$ -	0,00	0,00	\$ 1.357.718,00	\$ -
2.5.6	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00	\$ 1.494.956,00	\$ 0,00	0,00	1,00	\$ 1.494.956,00	\$ -	0,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$ -
2.5.7	S/1 BOLDADOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	40,00	\$ 475.652,00	\$ 19.026.080,00	\$ 65,00	25,00	0,00	\$ 475.652,00	\$ 30.917.380,00	56,00	0,00	\$ 475.652,00	\$ 26.635.512,00
Subtotal				\$ 211.688.825,00					\$ 257.261.505,00				\$ 270.481.923,00	
2.6	SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES													
2.6.1	DEMACACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	3.057,17	\$ 11.293,00	\$ 34.524.621,00	\$ 2278,63	0,00	778,54	\$ 11.293,00	\$ 25.732.562,00	2221,32	0,00	\$ 11.293,00	\$ 25.085.367,00
2.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA (60X60 CM)	UND.	25,00	\$ 896.973,00	\$ 22.424.325,00	\$ 25,00	0,00	0,00	\$ 896.973,00	\$ 22.424.325,00	25,00	0,00	\$ 896.973,00	\$ 22.424.325,00
2.6.3	DEMACACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	84,25	\$ 104.900,00	\$ 8.837.825,00	\$ 84,25	0,00	0,00	\$ 104.900,00	\$ 8.837.825,00	84,25	0,00	\$ 104.900,00	\$ 8.682.783,00




GOVERNACIÓN DE
CÓRDOBA
INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



2.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	12,00	\$ 467.929,00	\$ 5.615.148,00	12,00	0,00	\$ 467.929,00	\$ 5.615.148,00	12,00	0,00	\$ 467.929,00	\$ 5.615.148,00
2.6.5	RITO DELINEADOR VIAL FLEXIBLE NARANJA	UND	12,00	\$ 151.341,00	\$ 1.816.092,00	12,00	0,00	\$ 151.341,00	\$ 1.816.092,00	21,00	9,00	\$ 151.341,00	\$ 3.178.161,00
2.6.6	SEGREGADORES TEMPORALES	ML	19,00	\$ 309.356,00	\$ 5.877.764,00	19,00	0,00	\$ 309.356,00	\$ 5.877.764,00	37,00	18,00	\$ 309.356,00	\$ 11.448.172,00
Subtotal					\$ 79.095.775,00				\$ 79.095.775,00				\$ 79.095.775,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS													
2.7.1	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	6,00	\$ 213.904,00	\$ 1.283.424,00	6,00	0,00	\$ 213.904,00	\$ 1.283.424,00		0,00	\$ 213.904,00	\$ -
2.7.2	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6,00	\$ 238.115,00	\$ 1.428.690,00	6,00	0,00	\$ 238.115,00	\$ 1.428.690,00		0,00	\$ 238.115,00	\$ -
1.7.2	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND								2,00		\$ 477.758,00	\$ 955.516,00
Subtotal					\$ 2.712.114,00				\$ 2.712.114,00				\$ 955.516,00
ITEMS NO PREVISTOS													
Obra Civil													
NP 02	CONCRETO DE 24MPA PARA BOX CULVERT - SECCIÓN 1.0X1.0 M LONGITUD 9 M	M3		\$ 1.305.935,00	\$ 0,00	15,15	15,15	\$ 1.305.935,00	\$ 19.784.915,00	15,15	0,00	\$ 1.305.935,00	\$ 19.784.915,00
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3								63,64	63,64	\$ 117.066,00	\$ 7.450.549,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP 19	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO. (ANCHO 1.50 M)	UND	\$ 689.147,00		4,00	4,00	0,00	\$ 689.147,00	2.756.588,00	5,00	1,00	0,00	\$ 689.147,00	\$	3.445.735,00
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (ANCHO 0.50)	UND	\$ 519.838,00	\$ 0,00	16,00	16,00	0,00	\$ 519.838,00	8.317.408,00	18,00	2,00	0,00	\$ 519.838,00	\$	9.357.084,00
NP 27	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	\$ 784.145,00		5,00	5,00	0,00	\$ 784.145,00	3.920.725,00	5,00	0,00	0,00	\$ 784.145,00	\$	3.920.725,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND								2,00	2,00	0,00	\$ 737.702,00	\$	1.475.404,00
NP 37	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO MEDIDAS INTERNAS 1.00X1.00M - ALTURA VARIABLE, E=0,20M	UND								1,00	1,00	0,00	\$ 2.832.631,00	\$	2.832.631,00
NP 38	TAPA PARA CAJA DE RED ELECTRICA, DIMENSIONES (1.32X2.42)M.	UND								1,00	1,00	0,00	\$ 4.370.410,00	\$	4.370.410,00
Subtotal				\$ 0,00					34.779.636,00					\$	52.637.453,00
3.1 PRELIMINARES															
3.1.1	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	105,06	\$ 37.682,00	\$ 105,06	0,00	0,00	\$ 37.682,00	3.958.871,00	447,93	342,87	0,00	\$ 37.682,00	\$	16.878.913,00
3.1.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.771,31	\$ 29.095,00	\$ 1771,31	0,00	0,00	\$ 29.095,00	51.536.264,00	1778,15	7,84	0,00	\$ 29.095,00	\$	51.764.427,00




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

3.1.3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CAÑALES PARA FALLOS	M3	96,42	\$ 33.334,00	3.214.064,00	\$ 96,42	0,00	0,00	\$ 33.334,00	3.214.064,00	257,10	160,68	0,00	\$ 33.334,00	\$ 8.570.171,00
3.1.4	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (M2100)	M2	2.466,62	\$ 20.428,00	50.388.113,00	\$ 17.266,62	0,00	739,99	\$ 20.428,00	35.271.598,00	1740,27	13,64	0,00	\$ 20.428,00	\$ 35.550.261,00
3.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	2.437,62	\$ 36.161,00	88.146.777,00	\$ 2.437,62	0,00	0,00	\$ 36.161,00	88.146.777,00	2895,46	457,84	0,00	\$ 36.161,00	\$ 104.702.828,00
3.1.6	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	20,00	\$ 441.297,00	8.825.940,00	20,00	0,00	0,00	\$ 441.297,00	8.825.940,00	20,00	0,00	0,00	\$ 441.297,00	\$ 8.825.940,00
3.1.7	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	8,00	\$ 615.987,00	4.927.896,00	8,00	0,00	0,00	\$ 615.987,00	4.927.896,00	36,00	28,00	0,00	\$ 615.987,00	\$ 22.175.532,00
3.1.8	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	140,00	\$ 227.187,00	31.806.180,00	140,00	0,00	0,00	\$ 227.187,00	31.806.180,00	520,00	360,00	0,00	\$ 227.187,00	\$ 118.137.240,00
				Subtotal	242.804.105,00										\$ 366.605.312,00
3.2	SUBRASANTE Y SUBBASE														
3.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (AFIRMAO E=25 CM)	M3	1.041,11	\$ 158.015,00	164.510.997,00	\$ 759,21	0,00	281,90	\$ 158.015,00	119.966.568,00	762,82	3,61	0,00	\$ 158.015,00	\$ 120.537.595,00
3.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	352,37	\$ 287.872,00	101.437.457,00	\$ 352,37	0,00	0,00	\$ 287.872,00	101.437.457,00	353,96	1,59	0,00	\$ 287.872,00	\$ 101.695.893,00
3.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJON PARA FALLOS	M3	257,12	\$ 285.909,00	73.512.922,00	\$ 257,12	0,00	0,00	\$ 285.909,00	73.512.922,00	257,12	0,00	0,00	\$ 285.909,00	\$ 73.512.922,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

3.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO 8=15CM)	M3	96,42	\$ 144.928,00	\$ 13.973.958,00	\$ 96,42	0,00	0,00	0,00	\$ 144.928,00	\$ 13.973.958,00	\$ 96,42	0,00	0,00	0,00	\$ 144.928,00	\$ 13.973.958,00
	Subtotal				\$ 353.435.334,00						\$ 308.890.905,00						\$ 309.920.368,00
3.3	PAVIMENTO BORDILLOS																
3.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2). INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CAJASTILLA. E= 0.20 CM	M3	435,88	\$ 1.389.242,00	\$ 606.932.045,00	\$ 435,88	0,00	0,00	0,00	\$ 1.389.242,00	\$ 606.932.045,00	\$ 435,88	0,00	0,00	2,32	\$ 1.389.242,00	\$ 603.708.074,00
3.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL).	KG	7.237,57	\$ 12.864,00	\$ 93.104.100,00	\$ 7.237,57	0,00	0,00	0,00	\$ 12.864,00	\$ 93.104.100,00	\$ 7.237,57	0,00	0,00	0,00	\$ 12.864,00	\$ 93.104.100,00
3.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	1.036,14	\$ 24.975,00	\$ 25.877.597,00	\$ 1.036,14	0,00	0,00	0,00	\$ 24.975,00	\$ 25.877.597,00	\$ 1.036,14	0,00	0,00	54,64	\$ 24.975,00	\$ 24.512.963,00
3.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20). INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	784,35	\$ 166.143,00	\$ 126.991.402,00	\$ 784,35	0,00	0,00	0,00	\$ 166.143,00	\$ 126.991.402,00	\$ 784,35	0,00	0,00	155,06	\$ 166.143,00	\$ 101.229.268,00
	Subtotal				\$ 852.905.144,00						\$ 852.905.144,00						\$ 822.554.405,00
3.4	DRENAJES																
3.4.1	DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	ML	402,00	\$ 31.356,00	\$ 12.605.112,00	\$ 503,00	101,00	0,00	0,00	\$ 31.356,00	\$ 15.772.068,00	\$ 546,00	43,00	0,00	0,00	\$ 31.356,00	\$ 17.120.376,00
3.4.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CAVALES	M3	248,23	\$ 29.095,00	\$ 7.222.252,00	\$ 245,69	0,00	2,54	0,00	\$ 29.095,00	\$ 7.148.351,00	\$ 187,26	0,00	0,00	58,43	\$ 29.095,00	\$ 5.448.330,00
3.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=40 CM)	M3	82,85	\$ 158.015,00	\$ 13.091.543,00	\$ 112,92	30,07	0,00	0,00	\$ 158.015,00	\$ 17.843.054,00	\$ 17,03	0,00	0,00	95,89	\$ 158.015,00	\$ 2.680.995,00
3.4.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C e+ 15cm	M3	31,07	\$ 287.872,00	\$ 8.944.183,00	\$ 0,00	0,00	31,07	0,00	\$ 287.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 287.872,00	\$ 0,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

3.4.5	SOLADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) H=3CM	M2	129.39	\$ 46.360,00	\$ 5.988.520,00	1,63	0,00	127,78	\$ 46.360,00	\$ 75.587,00	1,63	0,00	0,00	0,00	\$ 46.360,00	\$	75.587,00
3.4.6	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0,6M Y ALTURA VARIABLE	ML	270,00	\$ 544.993,00	\$ 147.148.110,00	46,44	0,00	223,56	\$ 544.993,00	\$ 25.309.475,00	-46,44	0,00	0,00	0,00	\$ 544.993,00	\$	25.309.475,00
3.4.7	TAPAS EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CANAL DIMENSIONES 0,9x1,0M	UND	21,00	\$ 241.649,00	\$ 5.074.629,00	0,00	0,00	21,00	\$ 241.649,00	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 241.649,00	\$	
3.4.8	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN CONCRETO 24 MPA SECCIÓN 2,5x1,5 M LONGITUD: 6 M	UND	1,00	\$ 26.759.546,00	\$ 26.759.546,00	0,00	0,00	1,00	#####	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 26.759.546,00	\$	
3.4.9	REJILLA DE CAPTACIÓN PARA SUMIDERO EN PLÁSTICO RECICLADO 90CMx50CMx10CM	UND	12,00	\$ 934.671,00	\$ 11.216.052,00	38,00	26,00	0,00	\$ 934.671,00	\$ 35.517.498,00	0,00	0,00	0,00	38,00	\$ 934.671,00	\$	
3.4.10	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	10.838,54	\$ 12.864,00	\$ 139.426.979,00	3372,29	0,00	7466,25	\$ 12.864,00	\$ 43.381.139,00	3825,20	452,91	0,00	0,00	\$ 12.864,00	\$	49.207.352,00
1.4.2	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO.	M3	0,00	\$ 423.349,00		0,43	0,43	0,00	\$ 423.349,00	\$ 182.040,00	0,43	0,00	0,00	0,00	\$ 423.349,00	\$	182.040,00
				Subtotal	\$ 377.488.628,00					\$ 145.229.192,00						\$	100.034.135,00
3.5	ESPACIO PÚBLICO (ANDENES Y MOBILIARIO)																
3.5.1	S/I/ TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0,20mX0,20m X 0,08m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, RELLENO ARENA H=0,04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0,20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	63,69	\$ 292.537,00	\$ 18.631.662,00	0,00	0,00	63,69	\$ 292.537,00	\$	7,20	7,20	0,00	0,00	\$ 292.537,00	\$	2.106.266,00




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CORDOBA

3.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm x 20cm x 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO. APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA 1:4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	314,47	\$ 71.199,00	22.389.950,00	\$ 641,25	326,78	0,00	\$ 71.199,00	\$ 45.656.359,00	424,23	0,00	217,02	\$ 71.199,00	\$ 30.204.752,00
3.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUIA EN CONCRETO DE 20cm x 10cm x 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO. APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA 1:4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	314,47	\$ 46.543,00	14.636.377,00	739,86	424,39	0,00	\$ 46.543,00	\$ 34.388.761,00	424,23	0,00	314,63	\$ 46.543,00	\$ 19.744.937,00
3.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA 21.MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO ENSITO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	187,21	\$ 182.483,00	34.162.642,00	473,40	286,19	0,00	\$ 182.483,00	\$ 86.387.452,00	306,00	0,00	167,40	\$ 182.483,00	\$ 55.839.433,00
3.5.5	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	14,30	\$ 1.357.718,00	19.415.367,00	0	0,00	14,30	\$ 1.357.718,00	\$ -	0	0,00	0,00	\$ 1.357.718,00	\$ -
3.5.6	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00	1.494.956,00	0,00	0,00	1,00	\$ 1.494.956,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$ -



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

3.5.7	S/I BORDADOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	23,00	\$ 475.652,00	\$ 10.939.996,00	46,00	23,00	0,00	\$ 475.652,00	\$ 21.879.992,00	36,00	0,00	11,00	\$ 475.652,00	\$ 16.647.820,00
				Subtotal	\$ 121.870.970,00					\$ 188.312.664,00				\$ 124.543.208,00	
3.6	SERIALIZACIÓN Y DEMARACIONES														
3.6.1	DEMARCAÇÃO HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROSEFAS)	M	1.146,53	\$ 11.293,00	\$ 12.947.763,00	1146,53	0,00	0,00	\$ 11.293,00	\$ 12.947.763,00	1146,53	0,00	0,00	\$ 11.293,00	\$ 12.947.763,00
3.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA (60X80 CM)	UND.	3,00	\$ 896.973,00	\$ 2.690.919,00	24,00	21,00	0,00	\$ 896.973,00	\$ 21.527.352,00	24,00	0,00	0,00	\$ 896.973,00	\$ 21.527.352,00
3.6.3	DEMARCAÇÃO HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROSEFAS)	M2	17,14	\$ 104.900,00	\$ 1.797.986,00	37,34	20,20	0,00	\$ 104.900,00	\$ 3.916.966,00	37,34	0,00	0,00	\$ 104.900,00	\$ 3.916.966,00
3.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNAO	M	17,00	\$ 467.929,00	\$ 7.954.793,00	17,00	0,00	0,00	\$ 467.929,00	\$ 7.954.793,00	17,00	0,00	0,00	\$ 467.929,00	\$ 7.954.793,00
				Subtotal	\$ 25.981.461,00					\$ 46.346.874,00				\$ 46.346.874,00	
3.7	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
3.7.1	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	7,00	\$ 213.904,00	\$ 1.497.328,00	7,00	0,00	0,00	\$ 213.904,00	\$ 1.497.328,00	42,00	35,00	0,00	\$ 213.904,00	\$ 8.983.968,00




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

3.7.2	REBIRACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALICANTARILLO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UND	7,00	\$ 238.115,00	\$ 1.666.805,00	7,00	0,00	0,00	\$ 238.115,00	\$ 1.666.805,00	0,00	0,00	7,00	\$ 238.115,00	\$	-
				Subtotal	\$ 3.164.133,00					\$ 3.164.133,00					\$	8.983.968,00
3.8	REBIRACION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS															
3.8.1	RED DE MEDIA TENSION (13.200 VOL) LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	320,00	\$ 5.432,00	\$ 1.738.240,00	0,00	0,00	320,00	\$ 5.432,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 5.432,00	\$	-
3.8.2	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00	2,00	1,00	0,00	\$ 4.303.168,00	\$ 8.606.336,00	1,00	0,00	1,00	\$ 4.303.168,00	\$	4.303.168,00
3.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1,00	\$ 775.489,00	\$ 775.489,00	2,00	1,00	0,00	\$ 775.489,00	\$ 1.550.978,00	2,00	0,00	0,00	\$ 775.489,00	\$	1.550.978,00
3.8.4	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	2,00	\$ 5.115.579,00	\$ 10.231.158,00	1,00	0,00	1,00	\$ 5.115.579,00	\$ 5.115.579,00	0,00	0,00	1,00	\$ 5.115.579,00	\$	-
3.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	2,00	\$ 922.037,00	\$ 1.844.074,00	1,00	0,00	1,00	\$ 922.037,00	\$ 922.037,00	0,00	0,00	1,00	\$ 922.037,00	\$	-
3.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FIN DE LINEA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	\$ 4.637.182,00	\$ 9.274.364,00	2,00	0,00	0,00	\$ 4.637.182,00	\$ 9.274.364,00	0,00	0,00	2,00	\$ 4.637.182,00	\$	-



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10



3.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	\$ 4.371.600,00	\$ 4.371.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	\$ 4.371.600,00	\$ 4.371.600,00	0,00	\$ 4.371.600,00	\$ 4.371.600,00
3.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BARRERA BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	\$ 4.490.025,00	\$ 4.490.025,00	0,00	0,00	0,00	1,00	\$ 4.490.025,00	\$ 4.490.025,00	1,00	\$ 4.490.025,00	\$ 4.490.025,00
3.8.9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/O AVG.	M	200,00	\$ 104.792,00	\$ 20.958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 104.792,00	\$ 104.792,00	0,00	\$ 104.792,00	\$ 104.792,00
3.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1.00	\$ 4.761.524,00	\$ 4.761.524,00	0,00	0,00	0,00	1,00	\$ 4.761.524,00	\$ 4.761.524,00	1,00	\$ 4.761.524,00	\$ 4.761.524,00
3.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	3,00	\$ 4.717.204,00	\$ 14.151.612,00	0,00	0,00	0,00	3,00	\$ 4.717.204,00	\$ 14.151.612,00	3,00	\$ 4.717.204,00	\$ 14.151.612,00
3.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	3,00	\$ 8.299.515,00	\$ 24.898.545,00	0,00	0,00	0,00	3,00	\$ 8.299.515,00	\$ 24.898.545,00	3,00	\$ 8.299.515,00	\$ 24.898.545,00
3.8.13	RED DE BAJA TENSION (240/120 VOL.) LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	560,00	\$ 2.836,00	\$ 1.588.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 2.836,00	\$ 1.588.160,00	560,00	\$ 2.836,00	\$ 1.588.160,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA11.165



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE CORDOBA

3.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL. INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMORTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	3,00	\$ 10.019.826,00	\$ 30.059.478,00	2,00	0,00	1,00	#####	\$ 20.039.652,00	1,00	0,00	1,00	\$ 10.019.826,00	\$ 10.019.826,00
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.														
3.8.21	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2ano. 6 + 3ano. 6) / AVG.	M	950,00	\$ 69.405,00	\$ 65.934.750,00	91,17	0,00	859,83	\$ 69.405,00	\$ 6.327.654,00	100,00	8,83	0,00	\$ 69.405,00	\$ 6.940.500,00
3.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	9,00	\$ 969.687,00	\$ 8.727.183,00	0,00	0,00	9,00	\$ 969.687,00		0,00	0,00	0,00	\$ 969.687,00	
3.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	9,00	\$ 762.648,00	\$ 6.863.832,00	6,00	0,00	3,00	\$ 762.648,00	\$ 4.575.888,00	6,00	0,00	1,00	\$ 762.648,00	\$ 3.813.240,00
	POSTES TELEFONICOS														
3.8.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	8,00	\$ 705.362,00	\$ 5.642.896,00	10,00	2,00	0,00	\$ 705.362,00	\$ 7.053.620,00	1,00	0,00	9,00	\$ 705.362,00	\$ 705.362,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF).	UND		\$ 553.114,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 553.114,00		0,00	0,00	0,00	\$ 553.114,00	\$ -



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ITEMS NO. PREVI 5105		Subtotal		\$ 267.879.337,00		\$ 139.614.593,00		\$ 57.806.419,00	
Obra Civil									
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0,00	\$ 519.838,00	21,00	21,00	0,00	\$ 519.838,00	\$ 7.277.732,00
NP 02	CONCRETO DE 24MPA PARA BOX CULVERT - SECCIÓN 2,0x1,20 M LONGITUD: 6 M	M3	0,00	\$ 1.305.935,00	18,81	18,81	0,00	\$ 1.305.935,00	\$ 24.584.637,00
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	\$ 117.066,00	157,29	157,29	0,00	\$ 117.066,00	\$ 18.413.311,00
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA 10"	ML	0,00	\$ 209.651,00	18,63	18,63	2,37	\$ 209.651,00	\$ 4.402.671,00
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA 12"	ML	0,00	\$ 280.400,00	356,11	356,11	11,94	\$ 280.400,00	\$ 103.201.220,00
NP 06	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO MEDIDAS INTERNAS 0,8X0,8M - ALTURA VARIABLE	UND	0,00	\$ 1.488.427,00	24,00	24,00	0,00	\$ 1.488.427,00	\$ 31.256.967,00
NP 09	RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	0,00	\$ 122.092,00	12,56	12,56	0,00	\$ 122.092,00	\$ 1.533.476,00
NP 27	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		\$ 784.145,00	8,00	8,00	1,00	\$ 784.145,00	\$ 7.057.305,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00	1,00	1,00	8,00	\$ 1.494.956,00	\$ 11.959.648,00




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND										33,00	33,00	0,00	\$ 737.702,00	\$ 24.344.166,00
NP 24	TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M										71,40	71,40	0,00	\$ 191.615,00	\$ 13.681.311,00
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3										220,68	220,68	0,00	\$ 45.500,00	\$ 10.036.572,00
NP 31	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2". EXCAVACIÓN Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND										29,00	29,00	0,00	\$ 194.532,00	\$ 5.641.428,00
NP 32	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2". EXCAVACIÓN Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR	UND										2,00	2,00	0,00	\$ 280.332,00	\$ 560.664,00




**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

[illegible]



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

11.12



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

[illegible]




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

4.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2). INCLUYE ACERO DE TRANSVERSIÓN, ANCLAJE Y CAJASTILLA E=0.20 CM	M3	2.216,87	\$ 1.389.242,00	\$ 3.079.768.913,00	\$ 2216,87	0,00	\$ 1.389.242,00	\$ 3.079.768.913,00	2216,02	0,00	1,85	\$ 1.389.242,00	\$ 3.077.192.008,00
4.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL).	KG	39.401,04	\$ 12.864,00	\$ 506.854.979,00	39.401,04	0,00	\$ 12.864,00	\$ 506.854.979,00	44681,05	5280,02	0,00	\$ 12.864,00	\$ 574.777.103,00
4.3.4	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	4.809,07	\$ 24.975,00	\$ 120.106.523,00	4809,07	0,00	\$ 24.975,00	\$ 120.106.523,00	4877,81	168,74	0,00	\$ 24.975,00	\$ 124.320.821,00
4.3.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X60X20). INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	952,20	\$ 166.143,00	\$ 158.201.365,00	3559,49	2607,29	\$ 166.143,00	\$ 591.384.347,00	2599,97	0,00	959,52	\$ 166.143,00	\$ 431.966.483,00
				Subtotal	\$ 3.864.931.780,00				\$ 4.295.114.762,00					\$ 4.208.266.415,00
4.4.1	DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	ML	248,28	\$ 31.355,00	\$ 7.785.068,00	248,28	0,00	\$ 31.355,00	\$ 7.785.068,00	781,00	532,72	0,00	\$ 31.355,00	\$ 24.489.036,00
4.4.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CAVALES	M3	953,14	\$ 29.095,00	\$ 27.731.608,00	32,30	0,00	\$ 29.095,00	\$ 939.769,00	43,30	11,00	0,00	\$ 29.095,00	\$ 1.289.892,00
4.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=35 CM)	M3	170,05	\$ 158.015,00	\$ 26.870.451,00	97,81	0,00	\$ 158.015,00	\$ 16.465.447,00	97,81	0,00	0,00	\$ 158.015,00	\$ 15.455.865,00
4.4.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	72,88	\$ 287.872,00	\$ 20.960.111,00	0,00	0,00	\$ 287.872,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 287.872,00	\$ -
4.4.5	SOJADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) H=5CM	M3	368,73	\$ 46.360,00	\$ 17.094.323,00	0,00	0,00	\$ 46.360,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 46.360,00	\$ -
4.4.6	CONSTRUCCIÓN DE CANAL BAJO ANDÉN EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS B=0.90 M Y ALTURA VARIABLE	ML	318,00	\$ 704.138,00	\$ 223.915.864,00	0,00	0,00	\$ 704.138,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 704.138,00	\$ -
4.4.7	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.5M Y ALTURA VARIABLE	ML	137,00	\$ 494.206,00	\$ 67.706.222,00	0,00	0,00	\$ 494.206,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 494.206,00	\$ -



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

4.4.8	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS A CARCAMO PRINCIPAL	ML	7.04	\$ 107.941,00	\$ 759.905,00	0,00	0,00	7.04	\$ 107.941,00	\$.	0,00	0,00	0,00	\$ 107.941,00	\$.
4.4.9	TAPAS EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CAVAL ANDEN DIMENSIONES 1.2x1.0M	UND	18.00	\$ 277.325,00	\$ 4.591.850,00	0,00	0,00	18,00	\$ 277.325,00	\$.	0,00	0,00	0,00	\$ 277.325,00	\$.
4.4.10	TAPAS EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CARCAMO DIMENSIONES 0.9x1.0M	UND	6,00	\$ 241.649,00	\$ 1.449.894,00	0,00	0,00	6,00	\$ 241.649,00	\$.	0,00	0,00	0,00	\$ 241.649,00	\$.
4.4.11	CONSTRUCCIÓN DE CAVAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO MEDIDAS INTERNAS 0.6X0.6M	UND	2,00	\$ 1.848.942,00	\$ 3.697.884,00	0,00	0,00	2,00	\$ 1.848.942,00	\$.	0,00	0,00	0,00	\$ 1.848.942,00	\$.
4.4.12	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.3X0.5X ALTURA VARIABLE	UND	2,00	\$ 6.677.916,00	\$ 13.355.832,00	0,00	0,00	2,00	\$ 6.677.916,00	\$.	0,00	0,00	0,00	\$ 6.677.916,00	\$.
4.4.13	REJILLA DE CAPTACIÓN PARA SUMIDERO EN PLASTICO RECICLADO 90CMx50CMx10CM	UND	22,00	\$ 934.671,00	\$ 20.562.762,00	30,00	8,00	0,00	\$ 934.671,00	\$ 28.040.130,00	30,00	0,00	0,00	\$ 934.671,00	\$ 28.040.130,00
4.4.14	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	24.392,70	\$ 12.864,00	\$ 313.787.693,00	1126,80	0,00	2326,590	\$ 12.864,00	\$ 14.495.155,00	1296,38	169,58	0,00	\$ 12.864,00	\$ 16.676.632,00
1.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO.	M3									11,00	11,00	0,00	\$ 423.349,00	\$ 4.656.839,00
			Subtotal		\$ 750.639.487,00					\$ 66.716.569,00					\$ 90.578.394,00
4.5.1	S/I/ TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mx0.20m X 0.06m COLOR ANARILLO TIPO TOPEROL (JURA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	79.61	\$ 292.537,00	\$ 23.288.871,00	0,00	0,00	79,61	\$ 292.537,00	\$.	34,80	34,80	0,00	\$ 292.537,00	\$ 10.180.288,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

4.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	393,09	\$ 71.199,00	27.987.615,00	\$ 2673,14	2280,05	0,00	\$ 71.199,00	190.324.895,00	2579,02	0,00	94,12	\$ 71.199,00	\$	183.623.645,00
4.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	393,09	\$ 46.543,00	18.295.588,00	\$ 3272,78	2879,69	0,00	\$ 46.543,00	152.325.000,00	2570,05	0,00	602,73	\$ 46.543,00	\$	124.272.091,00
4.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO ROLDA, 21.MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITEO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	234,02	\$ 182.483,00	42.704.672,00	\$ 1905,95	1671,93	0,00	\$ 182.483,00	347.803.474,00	1940,02	34,07	0,00	\$ 182.483,00	\$	354.020.122,00
4.5.5	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	17,88	\$ 1.357.718,00	24.275.998,00	\$ 0,00	0,00	17,88	\$ 1.357.718,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 1.357.718,00	\$	
4.5.6	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPE, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO CEMENTIS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00	1.494.956,00	\$ 0,00	0,00	1,00	\$ 1.494.956,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$	



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

	4.5.7	S/1 BOLLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	29,00	\$ 475.652,00	\$ 13.793.908,00	\$ 359,00	330,00	0,00	\$ 475.652,00	\$ 170.759.069,00	360,00	1,00	0,00	\$ 475.652,00	\$	171.234.720,00
					Subtotal	\$ 475.652,00					\$ 170.759.069,00					\$	843.330.866,00
	4.6.1	DEMARCAACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM), (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROSEFERAS)	M	5.339,23	\$ 11.293,00	\$ 60.295.924,00	\$ 5339,23	0,00	0,00	\$ 11.293,00	\$ 60.295.924,00	6105,12	0,00	233,12	\$ 11.293,00	\$	57.663.357,00
	4.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA (70X60 CM)	UND	167,00	\$ 896.973,00	\$ 149.794.491,00	\$ 167,00	0,00	0,00	\$ 896.973,00	\$ 149.794.491,00	165,00	0,00	2,00	\$ 896.973,00	\$	148.000.545,00
	4.6.3	DEMARCAACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2, (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROSEFERAS)	M2	355,80	\$ 104.900,00	\$ 37.323.420,00	\$ 355,80	0,00	0,00	\$ 104.900,00	\$ 37.323.420,00	352,33	6,53	0,00	\$ 104.900,00	\$	38.008.207,00
	4.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	104,00	\$ 467.929,00	\$ 48.664.616,00	\$ 104,00	0,00	0,00	\$ 467.929,00	\$ 48.664.616,00	103,22	0,00	0,78	\$ 467.929,00	\$	48.299.631,00
					Subtotal	\$ 467.929,00					\$ 48.664.616,00					\$	291.871.740,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS																
	4.7.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	21,00	\$ 213.904,00	\$ 4.491.984,00	\$ 21,00	0,00	0,00	\$ 213.904,00	\$ 4.491.984,00	199,00	78,00	0,00	\$ 213.904,00	\$	21.176.496,00
	4.7.2	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	2,00	\$ 477.758,00	\$ 955.516,00	\$ 2,00	0,00	0,00	\$ 477.758,00	\$ 955.516,00	2,00	0,00	0,00	\$ 477.758,00	\$	955.516,00




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

4.7.3	REBIBICACION DE CUA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UND	42,00	\$ 238.115,00	\$ 10.000.830,00	\$ 42,00	0,00	0,00	\$ 238.115,00	\$ 10.000.830,00	42,00	0,00	0,00	\$ 238.115,00	\$ 10.000.830,00
				Subtotal	\$ 15.448.330,00					\$ 15.448.330,00					\$ 32.132.842,00
4.8	REBIBICACION DE CUA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UND	42,00	\$ 238.115,00	\$ 10.000.830,00	\$ 42,00	0,00	0,00	\$ 238.115,00	\$ 10.000.830,00	42,00	0,00	0,00	\$ 238.115,00	\$ 10.000.830,00
4.8.1	RED DE MEDIA TENSION (12.200) VOLTS LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	320,00	\$ 5.432,00	\$ 1.738.240,00	\$ 0,00	0,00	320,00	\$ 5.432,00	\$ 1.738.240,00	0,00	0,00	0,00	\$ 5.432,00	\$ 1.738.240,00
4.8.2	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCAJO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00	\$ 2,00	1,00	0,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00	2,00	0,00	0,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00
4.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1,00	\$ 775.489,00	\$ 775.489,00	\$ 2,00	1,00	0,00	\$ 775.489,00	\$ 775.489,00	2,00	0,00	0,00	\$ 775.489,00	\$ 775.489,00
4.8.4	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCAJO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	2,00	\$ 5.115.579,00	\$ 10.231.158,00	\$ 2,00	0,00	0,00	\$ 5.115.579,00	\$ 10.231.158,00	3,00	1,00	0,00	\$ 5.115.579,00	\$ 15.346.737,00
4.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	2,00	\$ 922.037,00	\$ 1.844.074,00	\$ 2,00	0,00	0,00	\$ 922.037,00	\$ 1.844.074,00	3,00	1,00	0,00	\$ 922.037,00	\$ 2.766.111,00
4.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FIN DE LINEA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	\$ 3.880.278,00	\$ 3.880.278,00	\$ 0,00	0,00	1,00	\$ 3.880.278,00	\$ 3.880.278,00	2,00	0,00	0,00	\$ 3.880.278,00	\$ 7.760.556,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

4.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	\$ 4.371.600,00	\$ 4.371.600,00	0,00	0,00	0,00	\$ 4.371.600,00	\$
4.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	\$ 4.490.025,00	\$ 4.490.025,00	2,00	0,00	0,00	\$ 4.490.025,00	\$ 8.980.050,00
4.8.9	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	200,00	\$ 104.792,00	\$ 20.958.400,00	0,00	0,00	0,00	\$ 104.792,00	\$
4.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1,00	\$ 4.761.524,00	\$ 4.761.524,00	2,00	0,00	4,00	\$ 4.761.524,00	\$ 19.046.096,00
4.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	3,00	\$ 4.717.204,00	\$ 14.151.612,00	4,00	0,00	4,00	\$ 4.717.204,00	\$ 18.868.816,00
4.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	3,00	\$ 8.299.515,00	\$ 24.898.545,00	4,00	0,00	4,00	\$ 8.299.515,00	\$ 33.198.060,00
4.8.13	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL. LOCALIZACION Y REPLANTO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	768,00	\$ 2.836,00	\$ 2.178.048,00	0,00	0,00	0,00	\$ 2.836,00	\$



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10

4.8.14	SUMINISTRO, INSTALACIONE HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	18,00	\$ 3.285.223,00	\$ 59.134.014,00	24,00	6,00	0,00	\$ 3.285.223,00	\$ 78.846.352,00	17,00	0,00	7,00	\$ 3.285.223,00	\$ 55.846.791,00
4.8.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	18,00	\$ 528.256,00	\$ 9.508.608,00	24,00	6,00	0,00	\$ 528.256,00	\$ 12.670.144,00	17,00	0,00	7,00	\$ 528.256,00	\$ 8.980.352,00
4.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION -ANGULO- FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	14,00	\$ 799.429,00	\$ 11.192.006,00	22,00	8,00	0,00	\$ 799.429,00	\$ 17.587.438,00	19,00	0,00	3,00	\$ 799.429,00	\$ 15.189.151,00
4.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	4,00	\$ 928.826,00	\$ 3.715.304,00	0,00	0,00	4,00	\$ 928.826,00	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 928.826,00	\$ -
4.8.18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AVG.	M	384,00	\$ 84.229,00	\$ 32.343.936,00	150,00	0,00	234,00	\$ 84.229,00	\$ 12.634.350,00	100,00	0,00	50,00	\$ 84.229,00	\$ 8.422.800,00
4.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUNTE DE RED TRENADA	UND	1,00	\$ 2.032.388,00	\$ 2.032.388,00	2,00	1,00	0,00	\$ 2.032.388,00	\$ 4.064.776,00	2,00	0,00	0,00	\$ 2.032.388,00	\$ 4.064.776,00
4.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	1,00	\$ 1.770.541,00	\$ 1.770.541,00	1,00	0,00	0,00	\$ 1.770.541,00	\$ 1.770.541,00	0,00	0,00	1,00	\$ 1.770.541,00	\$ -
4.8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	3,00	\$ 1.130.176,00	\$ 3.390.528,00	5,00	2,00	0,00	\$ 1.130.176,00	\$ 5.650.860,00	6,00	1,00	0,00	\$ 1.130.176,00	\$ 6.781.056,00

11.179



**GOBIERNO DE
CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10**

4.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CABA DE CONEXION (4 USUARIOS) A RED TENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	5,00	\$ 2.460.552,00	\$ 12.302.760,00	7,00	2,00	0,00	\$ 2.460.552,00	\$ 17.223.864,00	10,00	3,00	0,00	\$ 2.460.552,00	\$ 24.605.520,00
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.														
4.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00	\$ 10.019.826,00	\$ 10.019.826,00	0,00	0,00	1,00	#####	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 10.019.826,00	\$ -
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.														
4.8.24	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (240. 6 + 140. 6) AVG.	M	800,00	\$ 69.405,00	\$ 55.524.000,00	205,26	0,00	594,74	\$ 69.405,00	\$ 14.246.070,00	0,00	0,00	205,26	\$ 69.405,00	\$ -
4.8.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	21,00	\$ 762.648,00	\$ 16.015.608,00	23,00	2,00	0,00	\$ 762.648,00	\$ 17.540.904,00	19,00	0,00	4,00	\$ 762.648,00	\$ 14.490.312,00
	POSTES TELEFONICOS														
1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCAJO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGf).	UND		\$ 2.913.280,00	\$ -	8,00	8,00	0,00	\$ 2.913.280,00	\$ 23.306.240,00	8,00	0,00	0,00	\$ 2.913.280,00	\$ 23.306.240,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGf).	UND		\$ 553.114,00	\$ -	8,00	8,00	0,00	\$ 553.114,00	\$ 4.424.912,00	8,00	0,00	0,00	\$ 553.114,00	\$ 4.424.912,00



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

11. 190




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10

NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00				39,00	38,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$ 56.303.284,00	104,00	65,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$ 155.475.424,00
NP 23	CONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO INFERIORES A 0.90 M. INCLUYE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL	UND											10,00	10,00	0,00	\$ 502.763,00	\$ 5.027.630,00
NP 24	TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML											198,71	198,71	0,00	\$ 191.615,00	\$ 38.075.500,00
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3											147,01	147,01	0,00	\$ 45.500,00	\$ 6.688.953,00
NP 31	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 1/2" , EXCAVACIÓN Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND											71,00	71,00	0,00	\$ 194.532,00	\$ 13.811.772,00
NP 32	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 1/2" , EXCAVACIÓN Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLÁSTICA PARA MEDIDOR	UND											48,00	48,00	0,00	\$ 280.332,00	\$ 13.455.936,00



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

	NP 09	RAMPA PARA USO VEHICULAR CON DIMENSIONES MAYORES DE 4.2M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	M/L			\$ 0.00	20.00	20.00										34.91	34.91	0.00	\$ 355,941.00	\$ 12,425,900.00
																					\$ 605,273,432.00	
Electrificación																						
	NP 10	INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO A 240V.	LND			\$ 4,392,376.00	20.00	20.00		\$ 0.00								20.00	0.00	0.00	\$ 4,392,376.00	\$ 87,847,520.00
	NP 11	INSTALACION EN TENSION A 240V. DE POSTE EN CONCRETO Ø510 kgf	LND			\$ 5,982,709.00	14.00	14.00										19.00	4.00	0.00	\$ 5,982,709.00	\$ 107,698,762.00
	NP 12	DESINSTALACIÓN O RETIRO EN TENSIÓN DE ARMADO, RED ABIERTA O TRENCADA DE BAJA TENSIÓN	GLB			\$ 3,971,500.00	19.00	19.00										19.00	0.00	0.00	\$ 3,971,500.00	\$ 75,458,500.00
	NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	LND															49.00	49.00	0.00	\$ 3,129,750.00	\$ 153,357,750.00
	NP 14	DESHINCADO DE POSTE D= 12 MTS EN TENSIÓN A 13.2 KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	LND															4.00	4.00	0.00	\$ 4,551,733.00	\$ 18,208,932.00
	NP15	DEARMADO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICIÓIN EN BANDERA TRIFASICO - RIFAISCO DE RED MEDIA TESIÓN A 13.2 KV	LND															4.00	4.00	0.00	\$ 5,085,168.00	\$ 20,340,664.00





**GOBIERNO DE
CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10**



NP 16	DESHINCADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSION A 240V. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	3.129.750,00	\$	16,00	16,00	0,00	\$	3.129.750,00	\$	50.076.000,00	18,00	2,00	0,00	\$	3.129.750,00	\$	56.335.500,00
Subtotal						\$ 0,00					\$	297.139.946,00					\$	519.236.628,00
CAPITULO V	MONTEVERDE		\$ 2.410.549.573,00								\$	3.573.938.298,00	MONTEVERDE				\$	4.129.470.804,00
5.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	49,62	\$ 58.103,00	\$	2.883.071,00	\$	49,62	0,00	0,00	\$ 58.103,00	\$	213,02	163,40	0,00	\$ 58.103,00	\$	12.377.246,00
5.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	950,82	\$ 37.682,00	\$	35.828.799,00	\$	950,82	0,00	0,00	\$ 37.682,00	\$	1804,17	853,35	0,00	\$ 37.682,00	\$	67.984.807,00
5.1.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.069,83	\$ 29.095,00	\$	118.411.704,00	\$	4069,83	0,00	0,00	\$ 29.095,00	\$	3909,94	0,00	159,89	\$ 29.095,00	\$	113.759.826,00
5.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES PARA FALLOS	M3	223,10	\$ 33.334,00	\$	7.436.815,00	\$	74,37	0,00	148,73	\$ 33.334,00	\$	135,10	60,73	0,00	\$ 33.334,00	\$	4.503.423,00
5.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (MT2100)	M2	764,13	\$ 20.428,00	\$	15.609.648,00	\$	4893,41	4129,28	0,00	\$ 20.428,00	\$	4891,33	0,00	2,08	\$ 20.428,00	\$	99.920.081,00
5.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3 - KM	5.680,23	\$ 36.161,00	\$	205.402.791,00	\$	5486,88	0,00	193,35	\$ 36.161,00	\$	5708,29	221,41	0,00	\$ 36.161,00	\$	206.417.364,00
5.1.7	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M. INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	11,00	\$	441.297,00	\$	4.854.267,00	\$	11,00	0,00	\$ 441.297,00	\$	27,00	16,00	0,00	\$ 441.297,00	\$	11.816.019,00
5.1.8	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M. INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	8,00	\$	615.987,00	\$	4.927.896,00	\$	8,00	0,00	\$ 615.987,00	\$	8,00	0,00	0,00	\$ 615.987,00	\$	4.927.896,00



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10

5.1.9	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	95,00	\$ 227.187,00	\$ 21.582.765,00	95,00	0,00	0,00	\$ 227.187,00	\$ 21.582.765,00	122,00	27,00	0,00	\$ 227.187,00	\$ 27.716.814,00
			Subtotal		\$ 418.997.762,00										\$ 549.522.556,00
5.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2.117,99	\$ 158.015,00	\$ 334.674.190,00	1910,86	0,00	207,13	\$ 158.015,00	\$ 301.944.543,00	2036,02	124,16	0,00	\$ 158.015,00	\$ 321.563.306,00
5.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	776,73	\$ 287.872,00	\$ 223.598.819,00	776,73	0,00	0,00	\$ 287.872,00	\$ 223.598.819,00	780,51	13,78	0,00	\$ 287.872,00	\$ 227.566.702,00
5.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	594,93	\$ 285.909,00	\$ 170.095.841,00	198,31	0,00	396,62	\$ 285.909,00	\$ 58.698.814,00	135,10	0,00	63,21	\$ 285.909,00	\$ 38.626.477,00
5.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	223,10	\$ 144.928,00	\$ 32.333.437,00	74,37	0,00	148,73	\$ 144.928,00	\$ 10.776.295,00	35,92	0,00	38,45	\$ 144.928,00	\$ 5.205.524,00
Subtotal					\$ 760.702.287,00					\$ 593.020.271,00				\$ 592.962.009,00	
5.3	PAVIMENTO POR FALLOS														
5.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAVE Y CAVASTILLA, E= 0.20 CM	M3	133,58	\$ 1.389.242,00	\$ 185.574.946,00	911,51	807,93	0,00	\$ 1.389.242,00	\$ 1.307.985.235,00	977,00	35,49	0,00	\$ 1.389.242,00	\$ 1.357.287.350,00
5.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17.678,37	\$ 12.864,00	\$ 227.414.552,00	17678,37	0,00	0,00	\$ 12.864,00	\$ 227.414.552,00	18421,01	742,64	0,00	\$ 12.864,00	\$ 238.967.856,00
5.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	2.256,40	\$ 24.975,00	\$ 56.353.590,00	2256,40	0,00	0,00	\$ 24.975,00	\$ 56.353.590,00	2290,39	33,99	0,00	\$ 24.975,00	\$ 57.202.574,00



GOVERNACIÓN DE
CÓRDOBA

GOVERNACIÓN DE
CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10

5.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (60x60x20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1.439,11	\$ 166.143,00	\$ 239.098.053,00	1439,11	0,00	0,00	\$ 166.143,00	\$ 239.098.053,00	887,08	0,00	572,03	\$ 166.143,00	\$ 144.059.272,00
				Subtotal	\$ 708.441.141,00					\$ 1.830.851.430,00					\$ 1.795.517.052,00
5.4.1	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	114,63	\$ 292.537,00	\$ 33.533.516,00	0,00	0,00	114,63	\$ 292.537,00	\$	2,00	2,00	0,00	\$ 292.537,00	\$ 585.074,00
5.4.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBESER EN MORTERO. APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	566,04	\$ 71.199,00	\$ 40.301.482,00	915,26	349,22	0,00	\$ 71.199,00	\$ 66.165.597,00	873,60	0,00	41,66	\$ 71.199,00	\$ 62.199.446,00
5.4.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBESER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	566,04	\$ 46.543,00	\$ 26.345.200,00	1120,04	554,00	0,00	\$ 46.543,00	\$ 52.130.022,00	873,60	0,00	246,44	\$ 46.543,00	\$ 40.659.965,00
5.4.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPa (3.000 PSI) E=0.08M FUNDIDO ENSITEO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	336,98	\$ 181.851,00	\$ 61.263.520,00	846,53	528,55	0,00	\$ 181.851,00	\$ 157.406.151,00	685,26	0,00	210,27	\$ 181.851,00	\$ 119.166.239,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

5.4.5	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	25,74	\$ 1.357.718,00	\$ 34.947.861,00	\$ 0,00	0,00	25,74	\$ 1.357.718,00	\$ 0,00	\$ 1.357.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.357.718,00	\$
5.4.6	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00	\$ 1.494.956,00	\$ 0,00	0,00	1,00	\$ 1.494.956,00	\$ 0,00	\$ 1.494.956,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.494.956,00	\$
5.4.7	S/1 BOLLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO MB3 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	41,00	\$ 475.652,00	\$ 19.501.732,00	\$ 246,00	208,00	0,00	\$ 475.652,00	\$ 118.437.348,00	\$ 213,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36,00	\$ 475.652,00	\$ 101.313.876,00
4.7.2	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND									\$ 19,00	\$ 19,00	\$ 0,00	\$ 477.758,00	\$ 9.077.402,00	\$
				Subtotal	\$ 217.408.087,00				\$ 393.139.118,00						\$ 333.002.002,00	\$
5.5.1	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM), INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	2.574,06	\$ 11.293,00	\$ 29.068.860,00	\$ 2574,06	0,00	0,00	\$ 11.293,00	\$ 29.068.860,00	\$ 2649,06	\$ 75,00	\$ 0,00	\$ 11.293,00	\$ 29.915.835,00	\$
5.5.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60X60 CM)	UND.	48,00	\$ 896.973,00	\$ 43.054.704,00	\$ 48,00	0,00	0,00	\$ 896.973,00	\$ 43.054.704,00	\$ 60,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 896.973,00	\$ 53.818.380,00	\$



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

5.5.3	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	180,05	\$ 104.900,00	\$ 18.887.245,00	180,05	0,00	0,00	0,00	\$ 104.900,00	188,33	0,00	10,72	\$ 104.900,00	\$ 17.762.507,00
Subt otal					\$ 91.010.809,00					\$ 91.010.809,00				\$ 101.456.722,00	
5.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
5.6.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	19,00	213.904,00	\$ 4.064.176,00	19,00	0,00	0,00	0,00	\$ 213.904,00	157,00	138,00	0,00	\$ 213.904,00	\$ 33.592.928,00
5.6.2	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UND	40,00	238.115,00	\$ 9.524.600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	\$ 238.115,00	0,00	0,00	40,00	\$ 238.115,00	\$ -
	Subtotal				\$ 13.588.776,00					\$ 13.588.776,00				\$ 33.592.928,00	
5.8	REUBICACION DE RED ELECTRICA TELEFONICA														
	RED DE MEDIA TENSION (13.300) VOL														
5.8.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	M	320,00	\$ 5.432,00	\$ 1.738.240,00	0,00	0,00	320,00	0,00	\$ 5.432,00		0,00	0,00	\$ 5.432,00	\$ -
5.8.2	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF.)	UND	2,00	4.303.168,00	\$ 8.606.336,00	1,00	0,00	1,00	0,00	\$ 4.303.168,00	1,00	0,00	0,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00
5.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF.)	UND	2,00	775.489,00	\$ 1.550.978,00	2,00	0,00	0,00	0,00	\$ 775.489,00	2,00	0,00	0,00	\$ 775.489,00	\$ 1.550.978,00
5.8.4	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 3050 KGF.)	UND	1,00	5.115.579,00	\$ 5.115.579,00	1,00	0,00	0,00	0,00	\$ 5.115.579,00	1,00	0,00	0,00	\$ 5.115.579,00	\$ 5.115.579,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

5.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE 112 MTS - 1050 NGF).	UND	1,00	\$ 922.037,00	\$ 922.037,00	1,00	0,00	0,00	0,00	\$ 922.037,00	\$ 922.037,00	\$ 922.037,00
1.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FIN DE LINEA CON DISPOSICION CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV. E INCLUDE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		\$ 6.078.923,00	\$ 6.078.923,00	3,00	0,00	0,00	2,00	\$ 18.236.769,00	\$ 6.078.923,00	\$ 12.157.846,00
5.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV. E INCLUDE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	3,00	\$ 3.880.278,00	\$ 11.640.834,00	0,00	2,00	0,00	1,00	\$ 3.880.278,00	\$ 3.880.278,00	\$ 3.880.278,00
6.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUDE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		\$ 4.637.182,00	\$ -	2,00	0,00	0,00	2,00	\$ 9.274.364,00	\$ 4.637.182,00	\$ -
5.8.7	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	160,00	\$ 104.792,00	\$ 16.766.720,00	0,00	130,00	0,00	30,00	\$ 3.143.760,00	\$ 104.792,00	\$ 3.143.760,00
5.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	3,00	\$ 4.717.204,00	\$ 14.151.612,00	0,00	0,00	0,00	2,00	\$ 14.151.612,00	\$ 4.717.204,00	\$ 9.434.408,00




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

5.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 132 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	3,00	\$ 8.299.515,00	\$ 24.898.545,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	\$ 8.299.515,00	\$ 24.898.545,00				
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.																	
5.8.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	480,00	\$ 2.836,00	1.361.280,00	0,00	0,00	480,00	0,00		0,00	0,00	\$ 2.836,00	\$		\$		
5.8.11	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCAO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	6,00	\$ 3.285.223,00	19.711.338,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	\$ 3.285.223,00	\$ 9.855.669,00		\$		
5.8.12	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	6,00	\$ 528.256,00	3.169.536,00	3,00	0,00	3,00	0,00		12,00	0,00	\$ 528.256,00	\$ 1.594.768,00		\$		
5.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION-ANGULO-FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	6,00	\$ 799.429,00	4.796.574,00	6,00	0,00	0,00	0,00		6,00	0,00	\$ 799.429,00	\$ 4.796.574,00		\$		
3.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND		\$ 928.826,00		2,00	2,00	0,00	0,00			2,00	\$ 928.826,00	\$ 1.857.652,00		\$		
5.8.14	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO No. 1/O AVG.	M	100,00	\$ 92.577,00	9.257.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00		40,00	0,00	\$ 92.577,00	\$		\$		
4.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENADA	UND		\$ 2.032.388,00		2,00	2,00	0,00	0,00		3,00	1,00	\$ 2.032.388,00	\$ 4.064.776,00		\$		
5.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	6,00	\$ 1.130.176,00	6.781.056,00	3,00	0,00	3,00	0,00		2,00	1,00	\$ 1.130.176,00	\$ 3.390.528,00		\$		



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA


5.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CUA DE CONEXION (4 USUARIOS) A RED TENSADA DE BT A 120/240 VOL	UND	6,00	\$ 2.460.552,00	\$ 14.763.312,00	4,00	0,00	2,00	\$ 2.460.552,00	\$ 9.842.208,00	5,00	1,00	0,00	\$ 2.460.552,00	\$	12.302.760,00
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL															
5.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL. INCLUYE: DE INSTALACION PUENTES DE PROTECCION, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00	\$ 10.019.826,00	\$ 10.019.826,00	1,00	0,00	0,00	#####	\$ 10.019.826,00	1,00	0,00	0,00	\$ 10.019.826,00	\$	10.019.826,00
	ALUMBRADO PUBLICO ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL															
5.8.19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (240. 5 + 120. 6) AWG.	M	500,00	\$ 69.405,00	\$ 34.702.500,00	149,19	0,00	350,81	\$ 69.405,00	\$ 10.354.532,00	50,00	0,00	99,19	\$ 69.405,00	\$	3.470.250,00
3.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL	UND		\$ 969.687,00	\$ -	21,00	21,00	0,00	\$ 969.687,00	\$ 20.363.427,00	60,00	39,00	0,00	\$ 969.687,00	\$	58.181.220,00
5.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	9,00	\$ 762.648,00	\$ 6.863.832,00	7,00	0,00	2,00	\$ 762.648,00	\$ 5.338.536,00	7,00	0,00	0,00	\$ 762.648,00	\$	5.338.536,00
	POSTES TELEFONICOS															
1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (3 MTS - 510 KGf)	UND		\$ 2.913.280,00	\$ -	5,00	5,00	0,00	\$ 2.913.280,00	\$ 14.566.400,00	5,00	1,00	0,00	\$ 2.913.280,00	\$	17.479.680,00



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10



1.5.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS. x 5.10 KGF).	UND	553.114,00	\$	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2.765.570,00	6,00	1,00	0,00	\$ 553.114,00	\$	3.318.684,00
5.8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	705.362,00	\$	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.526.810,00	17,00	12,00	0,00	\$ 705.362,00	\$	11.991.154,00
			Subtotal	\$	202.450.731,00	187.804.366,00									\$	212.261.105,00
ITEMS NO REVISADOS																
Obra Civil																
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	519.838,00	\$	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	18.194.330,00	34,00	0,00	1,00	\$ 519.838,00	\$	17.674.492,00
HP 27	ADECUACION DE CÁMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	784.145,00	\$	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	11.762.175,00	12,00	0,00	3,00	\$ 784.145,00	\$	9.409.740,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR EXCAVACION MANUAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1.494.956,00	\$	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	110.626.744,00	122,00	48,00	0,00	\$ 1.494.956,00	\$	182.364.632,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND									44,00	44,00	0,00	\$ 737.702,00	\$	32.458.888,00
NP 23	CONEXION Y ADECUACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON ALCANTARILLADO PROFUNDIDADES INFERIORES A 0.50 M. INCLUYE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL	UND									48,00	48,00	0,00	\$ 502.763,00	\$	24.132.624,00




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



NP 25	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO	ML																246,20	246,20	0,00	\$ 14.160,00	\$ 3.485.192,00
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3																41,76	41,76	0,00	\$ 45.500,00	\$ 1.900.153,00
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLA DO DE 4"	ML																8,00	8,00	0,00	\$ 161.559,00	\$ 1.292.472,00
NP 28	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3																16,85	16,85	0,00	\$ 224.250,00	\$ 3.779.120,00
NP 31	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2" EXCAVACION Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA	UND																84,00	84,00	0,00	\$ 194.532,00	\$ 16.340.688,00
NP 32	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2" EXCAVACION Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR	UND																7,00	7,00	0,00	\$ 280.332,00	\$ 1.962.324,00
NP 24	TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M																151,00	151,00	0,00	\$ 191.515,00	\$ 28.933.865,00



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

[illegible]



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP 16	DESHINCADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	\$ 3.129.750,00		3,00	3,00	0,00	\$ 3.129.750,00	9.389.250,00	3,00	0,00	0,00	\$ 3.129.750,00	\$ 9.389.250,00
NP 26	ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	UND								61,00	61,00	0,00	\$ 791.049,00	\$ 48.253.989,00
NP 36	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 8 MTS	UND								1,00	1,00	0,00	\$ 2.049.017,00	\$ 2.049.017,00
Subt otial			\$ 0,00						134.699.080,00					\$ 175.255.187,00
6.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CAUALES	M3	2.994,37	\$ 29.095,00	87.121.195,00	3029,65	35,28	0,00	\$ 29.095,00	3953,30	23,65	0,00	\$ 29.095,00	\$ 88.835.618,00
6.1.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CAUALES PARA FALLOS	M3	116,25	\$ 33.334,00	3.875.078,00	38,75	0,00	77,50	\$ 33.334,00	490,00	361,25	0,00	\$ 33.334,00	\$ 13.333.600,00
6.1.3	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (MT2100)	M2	4.528,20	\$ 20.428,00	92.502.070,00	4075,38	0,00	452,82	\$ 20.428,00	4110,75	35,37	0,00	\$ 20.428,00	\$ 83.974.401,00
6.1.4	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3-KM	4.089,67	\$ 36.161,00	147.886.557,00	3988,92	0,00	100,75	\$ 36.161,00	4608,17	619,25	0,00	\$ 36.161,00	\$ 166.635.991,00
5.1.7	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (ITALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND								2,00	2,00	0,00	\$ 441.297,00	\$ 882.594,00




**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**

[illegible]



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

[illegible]



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

6.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H-4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	628.94	\$ 46.543,00	29.272.754,00	\$ 1552,08	923,14	0,00	\$ 46.543,00	72.238.459,00	1552,08	33,27	0,00	\$ 46.543,00	\$ 72.238.459,00
6.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	374.42	\$ 182.483,00	68.325.285,00	\$ 1050,34	675,92	0,00	\$ 182.483,00	191.669.194,00	1050,34	33,27	0,00	\$ 182.483,00	\$ 191.669.194,00
6.5.5	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERÍA Y PLANILLA EN CONCRETO	M2	28,60	\$ 1.357.718,00	38.830.735,00	\$ 0,00	0,00	28,60	\$ 1.357.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	33,27	0,00	\$ 1.357.718,00	\$ 0,00
6.5.6	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	\$ 1.494.956,00	1.494.956,00	\$ 0,00	0,00	1,00	\$ 1.494.956,00	\$ 0,00	\$ 0,00	33,27	0,00	\$ 1.494.956,00	\$ 0,00
6.5.7	S/1 BOLLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - 10U EMPOTRADOS EN CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	45,00	\$ 475.652,00	21.404.340,00	\$ 25,00	0,00	19,00	\$ 475.652,00	12.366.952,00	25,00	33,27	0,00	\$ 475.652,00	\$ 12.366.952,00
			Subtotal		241.368.407,00	\$ 382.246.485,00				\$ 382.246.485,00				\$ 384.001.707,00	

6.6.1 BORDILLOS Y DEMARCACIONES




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10

6.6.1	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO AGRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	2.325,00	\$ 11.293,00	\$ 26.256.225,00	2325,00	0,00	0,00	0,00	\$ 11.293,00	\$ 26.256.225,00	33,27	0,00	\$ 11.293,00	\$ 26.256.225,00
6.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60X60 CM)	UND	21,00	\$ 896.973,00	\$ 18.836.433,00	21,00	0,00	0,00	0,00	\$ 896.973,00	\$ 18.836.433,00	33,27	0,00	\$ 896.973,00	\$ 18.836.433,00
6.6.3	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	10,00	\$ 467.929,00	\$ 4.679.290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	\$ 467.929,00	\$ 4.679.290,00	33,27	0,00	\$ 467.929,00	\$ 9.368.580,00
	Subtotal				\$ 49.771.948,00						\$ 49.771.948,00				\$ 54.451.238,00
6.7.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	4,00	\$ 213.904,00	\$ 855.616,00	4,00	0,00	0,00	0,00	\$ 213.904,00	\$ 855.616,00	33,27	0,00	\$ 213.904,00	\$ 23.315.536,00
6.7.2	REUBICACION TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	5,00	\$ 477.758,00	\$ 2.388.790,00	5,00	0,00	0,00	0,00	\$ 477.758,00	\$ 2.388.790,00	33,27	0,00	\$ 477.758,00	\$ 2.388.790,00
6.7.3	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCAÑARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UND	15,00	\$ 238.115,00	\$ 3.571.725,00	15,00	0,00	0,00	0,00	\$ 238.115,00	\$ 3.571.725,00	33,27	0,00	\$ 238.115,00	\$ 1.190.575,00
	Subtotal				\$ 6.816.131,00						\$ 6.816.131,00				\$ 26.894.801,00
6.8.1	REUBICACION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS														
6.8.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	1.440,00	\$ 5.432,00	\$ 7.822.080,00	0,00	0,00	1440,00	0,00	\$ 5.432,00	\$ -	33,27	0,00	\$ 5.432,00	\$ -
6.8.2	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF.)	UND	12,00	\$ 4.303.168,00	\$ 51.638.016,00	4,00	0,00	8,00	0,00	\$ 4.303.168,00	\$ 17.212.672,00	33,27	0,00	\$ 4.303.168,00	\$ 21.515.840,00




**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**



**GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA**

6.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	12.00	\$ 775.489,00	\$ 9.305.868,00	\$ 4,00	0,00	8,00	\$ 775.489,00	\$ 3.101.956,00	4,00	33,27	0,00	\$ 775.489,00	\$ 3.101.956,00
6.8.4	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00	\$ 5.115.579,00	\$ 15.346.737,00	\$ 0,00	0,00	3,00	\$ 5.115.579,00	\$ -	6,00	33,27	0,00	\$ 5.115.579,00	\$ 30.693.474,00
6.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00	\$ 922.037,00	\$ 2.766.111,00	\$ 0,00	0,00	3,00	\$ 922.037,00	\$ -	6,00	33,27	0,00	\$ 922.037,00	\$ 5.532.222,00
6.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	12,00	\$ 4.371.600,00	\$ 52.459.200,00	\$ 4,00	0,00	8,00	\$ 4.371.600,00	\$ 17.486.400,00	8,00	33,27	0,00	\$ 4.371.600,00	\$ 34.972.800,00
6.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	3,00	\$ 4.637.182,00	\$ 13.911.546,00	\$ 2,00	0,00	1,00	\$ 4.637.182,00	\$ 9.274.364,00	7,00	33,27	0,00	\$ 4.637.182,00	\$ 32.450.274,00
6.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	15,00	\$ 4.717.204,00	\$ 70.758.090,00	\$ 4,00	0,00	11,00	\$ 4.717.204,00	\$ 18.869.816,00	15,00	33,27	0,00	\$ 4.717.204,00	\$ 70.758.090,00
6.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	15,00	\$ 8.299.515,00	\$ 124.492.725,00	\$ 4,00	0,00	11,00	\$ 8.299.515,00	\$ 33.198.060,00	12	33,27	0,00	\$ 8.299.515,00	\$ 99.594.180,00
6.8.10	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	800,00	\$ 2.836,00	\$ 2.268.800,00	\$ 0,00	0,00	800,00	\$ 2.836,00	\$ -	0,00	33,27	0,00	\$ 2.836,00	\$ -




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

6.8.11	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCAO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	10.00	\$ 3.285.223,00	\$ 32.852.230,00	5,00	0,00	5,00	\$ 3.285.223,00	16.428.115,00	1,00	33,27	0,00	\$ 3.285.223,00	\$ 3.285.223,00
6.8.12	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	10.00	\$ 528.256,00	\$ 5.282.560,00	5,00	0,00	5,00	\$ 528.256,00	2.641.280,00	0,00	33,27	0,00	\$ 528.256,00	\$ -
6.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION-ANGULO- FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	10.00	\$ 799.429,00	\$ 7.994.290,00	5,00	0,00	5,00	\$ 799.429,00	3.997.145,00	16,00	33,27	0,00	\$ 799.429,00	\$ 12.790.894,00
4.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENADA	UND		\$ 2.032.388,00	\$ -	2,00	2,00	0,00	\$ 2.032.388,00	4.064.776,00	0,00	33,27	0,00	\$ 2.032.388,00	\$ -
6.8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	10.00	\$ 1.130.176,00	\$ 11.301.760,00	5,00	0,00	5,00	\$ 1.130.176,00	5.650.880,00	0,00	33,27	0,00	\$ 1.130.176,00	\$ -
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.														
6.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIPASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.-INCLUYE: DE INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	3.00	\$ 10.019.826,00	\$ 30.059.478,00	2,00	0,00	1,00	#####	20.039.652,00	0,00	33,27	0,00	\$ 10.019.826,00	\$ -
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.														




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE CORDOBA

6.8.16	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2-avo. 6 + 3-avo. 6) AVG.	M	250,00	\$ 69.405,00	17.351.250,00	\$ 50,00	0,00	200,00	\$ 69.405,00	3.470.250,00	0,00	33,27	0,00	\$ 69.405,00	\$	
6.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	10,00	762.648,00	7.626.480,00	\$ 10,00	0,00	0,00	\$ 762.648,00	7.626.480,00	0,00	33,27	0,00	\$ 762.648,00	\$	
	POSTES TELEFONICOS															
6.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	10,00	705.362,00	7.053.620,00	\$ 0,00	0,00	10,00	\$ 705.362,00		0,00	33,27	0,00	\$ 705.362,00	\$	
	Subtotal			470.290.811,00						163.058.846,00					\$	314.704.893,00
ITEMS NO REVISADOS																
Obra Civil																
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0,00	\$ 519.838,00	\$ 0,00	16,00	0,00	0,00	\$ 519.838,00	8.317.408,00	16,00	33,27	0,00	\$ 519.838,00	\$	8.317.408,00
NP21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND									16,00	33,27	0,00	\$ 1.494.956,00	\$	22.424.340,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMILIARIO DE ALICANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND									10,00	33,27	0,00	\$ 737.702,00	\$	7.377.020,00
NP 34	REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN 3". INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION	UND									10,00	33,27	0,00	\$ 365.756,00	\$	3.657.560,00



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA


11.202



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA



11.203



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

5 Estado de las pólizas y garantías contractuales

5.1 Pólizas del contrato de obra.

Control de pólizas y garantías: A la fecha las pólizas del contrato de obra se encuentran actualizadas y legalizadas en los periodos de amparo pertinentes para cada una ellas, como se indica a continuación:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
POLIZA No.	CMT-100016442	ANEXO: 4	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICION	27/03/2026		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.959.978.138,90	06/06/2025	10/12/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$2.959.978.138,90	06/06/2025	09/06/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$2.959.978.138,90	06/06/2026	09/06/2031
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$8.315.230.290,00	06/06/2025	10/12/2026
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
POLIZA No.	CMT-100003668		
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICION	24/03/2026		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.479.989.069,45	06/06/2025	09/06/2026
PATRONAL	\$ 1.479.989.069,45	06/06/2025	09/06/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 1.479.989.069,45	06/06/2025	09/06/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 1.479.989.069,45	06/06/2025	09/06/2026

Tabla 3. Seguimiento a garantías contractuales del contrato de obra

OBSEVACIONES: Se verificó la actualización de las pólizas de garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista de obra, en concordancia con la aprobación del del valor adicional, suscrita el día 20 de marzo de 2026.

5.2 Pólizas del contrato de interventoría.

Control de pólizas y garantías: A la fecha las pólizas del contrato de interventoría se encuentran actualizadas y legalizadas en los periodos de amparo pertinentes para cada una, como se indica a continuación:



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

COMPANIA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA No. CRC 100025110
No. ANEXO: 0

DATOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 18. GARANTIAS

DATOS PRESENTES EN LAS PÓLIZAS

Riesgo / Amparo	VIGENCIA		Valor Asegurado	Aprobación
	Desde	Hasta		
Cumplimiento	23/05/2025	30/11/2026	\$ 148.0880441,60	
Buen manejo del anticipo	23/05/2025	30/05/2029	\$ 148.0880441,60	25/05/2025
prestaciones sociales	30/05/2025	30/05/2031	\$ 148.0880441,60	

OBSEVACIONES: Se verificó la actualización de las pólizas de garantías de acuerdo a acata de inicio

Tabla 4. Garantías contractuales de interventoría


6 ACTAS SUSCRITAS

Para el presente periodo, se cuenta con actas suscritas correspondiente a los espacios de socialización en los diferentes sectores intervenidos en el proyecto. Hasta la fecha se cuenta con la socialización hecha para los sectores de IMAT, 6 de Marzo-Villa Rocío-Pasatiempo, Santa Claro, El Tapao, El Recreo y Monteverde.

En lo referentes a actas de visitas de obra con la supervisión y los comités de seguimiento y control al proyecto, se anexan al presente informe.

7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El avance actual de la obra mantiene un ritmo óptimo, superando las proyecciones de ejecución que habían sido reprogramadas en el Balance de obra No. 2; las actividades representativas para este periodo ejecutadas en los diferentes frentes son: excavación sin clasificar de la explanación y canales, geotextil para separación de suelos y capas granulares (t2100), cargue y retiro de material sobrante hasta sitio de disposición final, mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, subbase granular clase c e= 15cm, pavimento en concreto hidráulico (40 kg/cm²), e= 0.20 cm, acero de refuerzo (para construcción de losa longitudinal y transversal), construcción de juntas transversales según diseño, incluye corte de juntas y sellado, instalación de tableta guía pref. táctil para discapacitados en concreto de 0.20mx0.20m x 0.06m color amarillo tipo toperol (una hilera) con mortero 1:4, incluye arena h.=0.04 m, relleno con material compactado seleccionado de 0.20m y juntas selladas, franja demarcadora para limitados visuales con adoquín en concreto de 20cm x 10cm x 6cm color amarillo para embeber en mortero, aparejado según diseño. incluye mortero 1:4, arena h.=4 cm, instalación, compactación, juntas selladas con arena, franja demarcadora para limitados visuales con adoquín guía en concreto de 20cm x 10cm x 6cm color amarillo para embeber en mortero, aparejado según diseño. incluye mortero 1:4, arena h.=4 cm, instalación, compactación, juntas selladas con arena, rampas peatonales incluyen bordillos de cambio de nivel, sardinell, adoquín táctil tipo alerta y plantilla en concreto, entre otras actividades dentro de las practicas constructivas.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

Los recursos se gestionaron eficientemente, y no se presentaron desviaciones críticas en el cronograma proyectado o el presupuesto aprobado en el balance de obra No. 2.

- De acuerdo al reporte de actividades técnicas ejecutadas para el presente mes, se continua con la ejecución de los diferentes ítems en los frentes de obra correspondiente a el Tapao y avance en 6 de Marzo – Villa Rocío - Pasa Tiempo; ajuste y remate de actividades en Monteverde, Canta Claro y sector El Recreo; con la intervención de los siguientes tramos o alineamientos; la gran mayoría con ajustes y resane de detalles:

- Sector 6 DE MARZO - Alineamientos (1, 2, 3, 4 y 5)
- Sector El Tapao -Alineamiento (1)
- Sector CANTA CLARO - Alineamientos (1, 2 y 3)
- Sector EL RECREO – Alineamientos (1, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 13.1 y 13.2)
- Sector MONTEVERDE – Alineamientos (1, 2, 3, 4, 5 y 6)
- Sector IMAT Alineamiento (1 y 2)


De igual forma hacen parte del consolidado los frentes ya intervenidos y entregados parcialmente (algunos pendientes de ajustes y resanes propios de este tipo de proyecto) como son:

- Sector IMAT Alineamiento (1 y 2)
- Sector VILLA ROCÍO Alineamiento (7)
- Sector CANTA CLARO - Alineamientos (1, 2 y 3)
- Sector EL RECREO – Alineamientos (1, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 13.1 y 13.2)
- Sector MONTEVERDE – Alineamientos (1, 2, 3, 4, 5 y 6)

A continuación, se muestra en detalle el avance en cuanto a las cantidades contractuales y ajustadas en el balance de obra, que fueron ejecutadas en el presente mes y el acumulado total del proyecto:



GOVERNACIÓN DE
CORDOBA



GOVERNACIÓN DE
CORDOBA

AVANCE FÍSICO ACUMULADO


A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMANA A SEMANA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE REPORTE, Y LAS CANTIDADES ACUMULADAS DE LOS ITEMS INTERVENIDOS A LA FECHA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO Y DEL BALANCE 2 DE OBRA:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT. PRESU	BALANCE	BALANCE 2	ACUM. ANTE.	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43	ACUM. MES	ACUM. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL EJEC. MES	Vr. TOTAL EJECUTADO
SECTOR EL RECREO															
1.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	319,51	319,51	324,31	319,51		4,80			4,80	324,31	\$ 58.103,00	\$ 278.894,40	\$ 5.449.413.181,82
1.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	693,56	693,56	1253,75	693,56		392,13	112,04	56,02	560,19	1253,75	\$ 37.682,00	\$ 21.108.988,11	\$ 47.243.716,03
1.1.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	5251,46	5251,46	5249,36	5249,36					0,00	5249,36	\$ 29.095,00	\$ -	\$ 152.730.245,58
1.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES PARA FALLOS	M3	722,53	229,89	728,40	229,89		324,03	174,48		498,51	728,40	\$ 33.334,00	\$ 16.817.205,67	\$ 24.280.325,60
1.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (T2100)	M2	8907,51	8016,75	8094,88	8016,75		43,46	24,67		68,13	8094,88	\$ 20.428,00	\$ 1.391.724,91	\$ 165.157.893,91
1.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3	7912,38	7271,94	8222,40	7271,94		723,64	226,82		950,46	8222,40	\$ 36.161,00	\$ 34.368.760,34	\$ 297.330.382,68
2.1.7	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	0,00	0,00	3,00	0,00		3,00			3,00	3,00	\$ 441.297,00	\$ 1.323.891,00	\$ 1.323.891,00
3.1.7	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	0,00	0,00	3,00			3,00			3,00	3,00	\$ 615.987,00	\$ 1.847.961,00	\$ 1.847.961,00
1.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2449,07	2236,96	2097,62	2097,62					0,00	2097,62	\$ 158.015,00	\$ -	\$ 331.454.811,99
1.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	1272,50	1272,50	1258,57	1258,57					0,00	1258,57	\$ 287.872,00	\$ -	\$ 362.308.120,97
1.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	4135,41	306,52	728,40	306,52		203,78	218,10		421,88	728,40	\$ 285.909,00	\$ 120.517.916,56	\$ 208.254.743,24
1.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	1550,78	114,95	172,35	114,95		24,20	33,20		57,40	172,35	\$ 144.928,00	\$ 8.318.410,68	\$ 24.977.884,28
1.3.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), E= 0.20 CM	M3	1575,63	1575,63	1562,43	1562,43					0,00	1562,43	\$ 1.369.242,00	\$ -	\$ 2.170.588.515,71
1.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	28826,66	28826,66	28822,27	28822,27					0,00	28822,27	\$ 12.864,00	\$ -	\$ 370.769.646,27
1.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	3213,72	3213,72	3213,72	3213,71					0,00	3213,71	\$ 24.975,00	\$ -	\$ 80.262.407,25
1.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2008,65	2008,65	1787,60	1787,60					0,00	1787,60	\$ 166.143,00	\$ -	\$ 296.997.226,80

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**

1.4.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1127.10	0.00	82.52		82.52	\$	29,095.00	\$	2,401,041.60	\$	2,401,041.60
1.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO.	M3	1127.10	0.00	2.04		2.04	\$	423,349.00	\$	863,606.56	\$	863,606.56
1.4.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	63.51	0.00	0.00		0.00	\$	37,682.00	\$	-	\$	-
1.4.4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	74.31	0.00	0.00		0.00	\$	33,334.00	\$	-	\$	-
1.4.5	CONCRETO CLASE F PARA SOLADO DE LIMPIEZA e= 0.05m	M2	38.11	0.00	22.67		22.67	\$	46,360.00	\$	1,050,795.76	\$	1,050,795.76
1.4.6	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3375.54	0.00	833.57		833.57	\$	12,864.00	\$	10,723,066.52	\$	10,723,066.52
1.4.7	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERIAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	M	57.51	0.00	18.19		18.19	\$	697,735.00	\$	12,691,799.65	\$	12,691,799.65
1.4.8	CAJA DE HIDRÁULICAS DE 1.8 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0-H=2.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RÍGIDO, TIPO VERTEDERO.	UN	1.00	0.00	0.00		0.00	\$	3,561,001.00	\$	-	\$	-
1.4.9	CAJA DE HIDRÁULICAS DE 1.8 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0-H=2.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RÍGIDO, TIPO VERTEDERO.	UN	1.00	0.00	0.00		0.00	\$	3,280,074.00	\$	-	\$	-
1.4.10	TAPAS DE INSPECCIÓN PARA CARCAMO DE 0.9 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO	UN	6.00	0.00	2.00		2.00	\$	189,591.00	\$	379,182.00	\$	379,182.00
3.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=40 CM)	M3	0.00	0.00	32.93		32.93	\$	158,015.00	\$	5,203,117.92	\$	5,203,117.92
1.5.1	SIT TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	159.21	0.00	8.40		8.40	\$	292,537.00	\$	2,457,310.80	\$	2,457,310.80
1.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON LOSETA GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	786.17	1128.27	1010.10		0.00	\$	71,199.00	\$	-	\$	71,918,109.90
1.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ACOQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	786.17	1287.09	1010.10		0.00	\$	46,543.00	\$	-	\$	47,013,084.30
1.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3,000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITEO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	468.03	664.92	725.27		0.00	\$	182,483.00	\$	-	\$	132,349,445.41


1.8,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 MTS.	UND	2,00	0,00	3,00							3,00	3,00	\$ 2.108.765,00	\$ 6.326.295,00	\$ 6.326.295,00
1.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT. TRESASICO A 13,2 KV	UND	3,00	4,00	5,00	4,00						1,00	1,00	\$ 4.717.204,00	\$ 4.717.204,00	\$ 23.586.020,00
1.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13,2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	2,00	2,00	2,00	2,00							0,00	\$ 8.299.515,00	\$ -	\$ 16.599.030,00
1.8.12	RETRO CON TENSION A 13,2 KV. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	GLB	26,00	0,00	2,00							2,00	2,00	\$ 2.103.798,00	\$ 4.207.596,00	\$ 4.207.596,00
1.8.14	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	1,00	4,00	4,00	4,00							0,00	\$ 3.285.223,00	\$ -	\$ 13.140.892,00
1.8.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	1,00	4,00	4,00	4,00							0,00	\$ 528.256,00	\$ -	\$ 2.113.024,00
1.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL	UND	1,00	4,00	4,00	4,00							0,00	\$ 799.429,00	\$ -	\$ 3.197.716,00
1.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	2,00	0,00	1,00							1,00	1,00	\$ 1.770.541,00	\$ 1.770.541,00	\$ 1.770.541,00
1.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENASADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	2,00	2,00	2,00							0,00	\$ 1.130.176,00	\$ -	\$ 2.260.352,00
1.8.19	RETRO CON TENSION A 240 V. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	35,00	0,00	3,00							1,00	3,00	\$ 1.850.974,00	\$ 5.552.922,00	\$ 5.552.922,00
1.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL. INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	4,00	1,00	1,00	1,00							0,00	\$ 10.019.826,00	\$ -	\$ 10.019.826,00
1.8.21	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	60,00	60,00	60,00	60,00							0,00	\$ 69.405,00	\$ -	\$ 4.164.300,00
1.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	3,00	4,00	4,00	4,00							0,00	\$ 969.687,00	\$ -	\$ 3.878.748,00
1.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	3,00	5,00	5,00	5,00							0,00	\$ 762.648,00	\$ -	\$ 3.813.240,00
1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF).	UND	10,00	5,00	5,00	5,00							0,00	\$ 2.913.280,00	\$ -	\$ 14.566.400,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF).	UND	10,00	5,00	5,00	5,00							0,00	\$ 553.114,00	\$ -	\$ 2.765.570,00



**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10**

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	UNID	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	\$	\$	\$	\$
NP 15	DESARMADO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA TRIFÁSICO - BIFÁSICO DE RED DE MEDIA TENSIÓN A 13,2 KV	UND							5,085,165,00		20,340,664,00	\$ 20,340,664,00
NP 16	DESHINADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V, INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND							3,129,750,00		9,389,250,00	\$ 9,389,250,00
NP 17	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 13,2 KV, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO DE HOYADA	UND							3,276,473,00		3,276,473,00	\$ 3,276,473,00
NP 18	DESARMAR Y ANARRE DE RED DE MEDIA TENSIÓN, EN TENSIÓN, PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA	UND							3,113,973,00		3,113,973,00	\$ 3,113,973,00
NP 36	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 8 MTS	UND							2,049,017,00		2,049,017,00	\$ 2,049,017,00
SECTOR IMAT												
2.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	33,32	33,32	40,00	33,32	6,68	40,00	58,103,00		388,128,04	\$ -2,324,120,00
2.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	76,79	76,79	191,85	34,00	44,79	157,85	37,682,00		5,948,192,00	\$ 7,229,380,00
2.1.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	2625,97	2800,18	2897,47	1772,61	134,56	452,80	29,095,00		13,168,384,32	\$ 64,742,427,59
2.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES PARA FALLOS	M3	296,81	296,81	302,25	226,91		0,00	33,334,00		-	\$ 7,563,937,94
2.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (INT2100)	M2	5996,74	4197,72	4873,43	3778,12		0,00	20,428,00		-	\$ 77,179,517,07
2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3 - KM	3815,45	3842,52	4340,82	2604,11	174,93	638,44	38,161,00		23,086,481,79	\$ 117,253,728,22
2.1.7	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ITALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	6,00	6,00	6,00	6,00		0,00	441,297,00		-	\$ 2,647,782,00
2.1.8	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1,5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	30,00	30,00	60,00			0,00	227,187,00		-	\$ -
2.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	410,53	2148,27	2445,99	1828,70	2,49	1831,19	158,015,00		392,888,50	\$ 289,355,092,66
2.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	856,68	856,68	933,90	547,14	45,91	631,60	287,872,00		24,315,151,66	\$ 181,620,743,20
2.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	593,62	593,62	637,30	581,95		0,00	285,909,00		-	\$ 166,384,742,55
2.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	222,61	222,61	226,69	170,19		0,00	144,928,00		-	\$ 24,664,600,67
2.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA, E= 0,20 CM	M3	1058,81	1058,81	1058,45	787,74		1,18	1,385,242,00		1,633,748,59	\$ 1,055,989,684,70



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10



2.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17432,31	17432,31	17391,58	10405,23	705,36	676,92			1381,88	11787,11	\$	17.776.527,29	\$	151.623.375,17
2.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	2099,32	2099,32	2146,72	1506,21				4,76	4,76	1510,97	\$	118.930,25	\$	37.736.413,31
2.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1345,90	1345,90	1383,06	873,66	116,00				116,00	995,66	\$	19.272.588,00	\$	165.421.939,38
2.4.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	79,68	6,75	6,75	6,75					0,00	6,75	\$	-	\$	196.391,25
2.4.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=35 CM)	M3	17,49	4,05	4,05	4,05					0,00	4,05	\$	-	\$	639.960,75
2.4.4	SOLADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) H=5CM	M2	37,00	1,13	1,13	1,13					0,00	1,13	\$	-	\$	52.386,80
2.4.9	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2256,78	1073,92	1073,92	1073,92					0,00	1073,92	\$	-	\$	13.814.906,88
2.5.1	SU TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	111,45	0,00	3,60						0,00	0,00	\$	-	\$	
2.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	550,32	881,33	808,44	433,93					0,00	433,93	\$	-	\$	30.895.392,07
2.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	550,32	599,67	887,59	435,38					0,00	435,38	\$	-	\$	20.263.891,34
2.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO ENSITO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	327,62	863,27	788,68	478,93			8,20		8,20	487,13	\$	1.495.360,60	\$	88.893.308,76
2.5.7	SU BOLLAROS ALTO EN HIERRO TIPO MB3- IDU/ EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	40,00	65,00	56,00	10,00					0,00	10,00	\$	-	\$	4.756.520,00
2.6.1	DEMACACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (120CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROFESFERS)	M	3057,17	2278,63	2221,32	1096,72	301,80	178,05			479,85	1576,57	\$	5.418.946,05	\$	17.804.205,01
2.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA (60X60 CM)	UND.	25,00	25,00	25,00	12,00					0,00	12,00	\$	-	\$	10.763.676,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

2.6.3	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROSEFERS)	M2	84,25	84,25	82,77	35,59							0,00	35,59	\$ 104.900,00	\$ -	\$ 3.733.600,80
2.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	12,00	12,00	12,00	7,00							0,00	7,00	\$ 467.929,00	\$ -	\$ 3.275.503,00
2.6.5	HITO DELINEADOR VIAL FLEXIBLE NARANJA	UND	12,00	12,00	21,00	12,00			9,00				9,00	21,00	\$ 151.341,00	\$ 1.362.089,00	\$ 3.178.161,00
2.6.6	SEGREDADORES TEMPORALES	ML	19,00	19,00	37,00	19,00						18,00	18,00	37,00	\$ 309.356,00	\$ 5.558.408,00	\$ 11.446.172,00
1,7,2	REUBICACION TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	0,00	0,00	2,00				2,00				2,00	2,00	\$ 477.758,00	\$ 955.516,00	\$ 955.516,00
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (ANCHO 0.90)	UND	0,00	0,00	18,00	3,00							0,00	3,00	\$ 519.838,00	\$ -	\$ 1.559.514,00
NP 02	CONCRETO DE 24MPA PARA BOX CULVERT - SECCIÓN 1,0X1,0 M LONGITUD 9 M	M3	0,00	0,00	15,15	15,15							0,00	15,15	\$ 1.305.935,00	\$ -	\$ 19.778.395,58
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	0,00	63,64				63,64				63,64	63,64	\$ 117.066,00	\$ 7.450.548,50	\$ 7.450.548,50
NP 19	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO. (ANCHO 1,50 M)	UND	0,00	0,00	5,00	4,00			1,00				1,00	5,00	\$ 689.147,00	\$ 689.147,00	\$ 9.445.735,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND	0,00	0,00	2,00				2,00				2,00	2,00	\$ 737.702,00	\$ 1.475.404,00	\$ 1.475.404,00
NP 27	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0,00	0,00	5,00	3,00							0,00	3,00	\$ 784.145,00	\$ -	\$ 2.352.435,00
NP 37	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO MEDIDAS INTERNAS 1,00X1,00M - ALTURA VARIABLE. E=0,20M	UND	0,00	0,00	1,00				1,00				1,00	1,00	\$ 2.832.631,00	\$ 2.832.631,00	\$ 2.832.631,00
NP 38	TAPA PARA CAJA DE RED ELECTRICA, DIMENSIONES 1,32X2,42M.	UND	0,00	0,00	1,00				1,00				1,00	1,00	\$ 4.370.410,00	\$ 4.370.410,00	\$ 4.370.410,00
SECTOR CANTA CLARO																	
\$ 182.242.793,73 \$ 2.115.135.368,16																	
3,1,1	DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO	M2	105,06	105,06	447,93	105,06			342,87				342,87	447,93	\$ 37.682,00	\$ 12.920.041,78	\$ 16.878.912,70
3,1,2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1771,31	1771,31	1779,15	1771,31			7,84				7,84	1779,15	\$ 29.095,00	\$ 228.162,99	\$ 51.764.427,44
3,1,3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	96,42	96,42	257,10	96,42			160,68				160,68	257,10	\$ 33.334,00	\$ 5.356.107,12	\$ 8.570.171,40
3,1,4	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (M2/100)	M2	2466,62	1726,63	1740,27	1726,63			13,64				13,64	1740,27	\$ 20.428,00	\$ 278.663,45	\$ 35.550.261,10
3,1,5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	2437,62	2437,62	2895,46	2437,62			457,84				457,84	2895,46	\$ 36.161,00	\$ 16.556.051,68	\$ 104.702.828,50




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

3.1.6	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M. INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	\$ 441.297,00	\$ -	\$ -	8.825.940,00
3.1.7	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M. INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	8,00	8,00	38,00	8,00	25,00	25,00	33,00	\$ 615.987,00	\$ 15.399.675,00	\$ -	20.327.571,00
3.1.8	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ABOÑO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	140,00	140,00	520,00			0,00	0,00	\$ 227.187,00	\$ -	\$ -	
3.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=25 CM)	M3	1041,11	759,21	762,82	759,21	3,61	3,61	762,82	\$ 138.015,00	\$ 571.026,71	\$ -	120.537.594,66
3.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	352,37	352,37	353,96	352,37	1,59	1,59	353,96	\$ 287.872,00	\$ 458.436,16	\$ -	101.895.892,80
3.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	257,12	257,12	257,12	257,10		0,00	257,10	\$ 285.909,00	\$ -	\$ -	73.507.203,90
3.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	96,42	96,42	96,42	96,42		0,00	96,42	\$ 144.928,00	\$ -	\$ -	13.973.957,76
3.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2). INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA, E=0.20 CM	M3	436,88	436,88	434,56	434,56		0,00	434,56	\$ 1.389.242,00	\$ -	\$ -	603.708.074,11
3.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	7237,57	7237,57	7237,57	7237,30		0,00	7237,30	\$ 12.864,00	\$ -	\$ -	93.100.594,64
3.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	1036,14	1036,14	981,50	981,50		0,00	981,50	\$ 24.975,00	\$ -	\$ -	24.512.962,50
3.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	764,35	764,35	609,29	609,29		0,00	609,29	\$ 166.143,00	\$ -	\$ -	101.229.268,47
3.4.1	DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	ML	402,00	503,00	546,00	503,00	43,00	43,00	546,00	\$ 31.356,00	\$ 1.348.308,00	\$ -	17.120.376,00
3.4.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	248,23	245,69	187,26	187,26		0,00	187,26	\$ 29.095,00	\$ -	\$ -	5.448.329,70
3.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=40 CM)	M3	82,85	112,92	17,03	17,03		0,00	17,03	\$ 158.015,00	\$ -	\$ -	2.890.995,45
3.4.5	SOLADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) H=5CM	M2	129,39	1,63	1,63	1,63		0,00	1,63	\$ 46.380,00	\$ -	\$ -	75.565,80
3.4.6	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.8M Y ALTURA VARIABLE	ML	270,00	46,44	46,44	46,44		0,00	46,44	\$ 544.993,00	\$ -	\$ -	25.309.474,92
3.4.10	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	10838,54	3372,29	3825,20	3372,29	452,91	452,91	3825,20	\$ 12.864,00	\$ 5.826.213,10	\$ -	49.207.351,66
1.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO.	M3	0,00	0,43	0,43	0,43		0,00	0,43	\$ 423.349,00	\$ -	\$ -	182.040,07

11.215



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10

3.5.1	SA TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.05m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELADAS	M2	63.69	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	\$ 292.537,00	\$ 2.105.266,40	\$ 2.105.266,40
3.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA ENBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELADAS CON ARENA	M	314,47	641,25	424,23	424,23	0,00	424,23	\$ 71.199,00	\$ -	\$ 30.204.751,77
3.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 8cm COLOR AMARILLO PARA ENBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELADAS CON ARENA	M	314,47	738,66	424,23	424,23	0,00	424,23	\$ 46.543,00	\$ -	\$ 19.744.936,89
3.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO ENSITO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	187,21	473,40	306,00	306,00	0,00	306,00	\$ 182.483,00	\$ -	\$ 55.839.433,03
3.5.7	SU BOLLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	23,00	46,00	35,00	35,00	0,00	35,00	\$ 475.652,00	\$ -	\$ 16.647.820,00
3.6.1	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	1146,53	1146,53	1146,53	1146,53	0,00	1146,53	\$ 11.293,00	\$ 22,59	\$ 12.947.763,29
3.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SL, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA (60X60 CM)	UND.	3,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	\$ 896.973,00	\$ -	\$ 21.527.352,00
3.6.3	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	17,14	37,34	37,34	37,34	0,00	37,34	\$ 104.900,00	\$ 419,60	\$ 3.916.966,00
3.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	\$ 467.929,00	\$ -	\$ 7.954.793,00
3.7.1	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	7,00	7,00	42,00	42,00	35,00	42,00	\$ 213.904,00	\$ 7.486.640,00	\$ 8.993.969,00
3.8.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS. - 750 KGF).	UND	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$ 4.303.168,00	\$ -	\$ 4.303.168,00



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10


3.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$ 775.489,00	\$ -	\$ 1.550.978,00
3.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$ 4.371.600,00	\$ -	\$ 4.371.600,00
3.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$ 4.717.204,00	\$ -	\$ 4.717.204,00
3.8.12	DE POSTE EN CONCRETO		3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$ 8.299.515,00	\$ -	\$ 8.299.515,00
3.8.14	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$ 3.285.223,00	\$ -	\$ 6.570.446,00
3.8.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$ 528.256,00	\$ -	\$ 1.056.512,00
3.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	6,00	3,00	4,00	3,00	3,00	1,00	1,00	4,00	\$ 799.429,00	\$ 799.429,00	\$ 3.197.716,00
3.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$ 1.130.176,00	\$ -	\$ 2.260.352,00
3.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL., INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	\$ 10.019.826,00	\$ -	\$ 10.019.826,00
3.8.21	SUMINISTRO, RIESO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xno. 6 + 1xno. 6) AWG.	M	950,00	91,17	100,00	91,17	8,83	8,83	8,83	100,00	\$ 69.405,00	\$ 612.846,15	\$ 6.940.500,00
3.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	9,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	\$ 762.648,00	\$ -	\$ 3.813.240,00
3.8.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	8,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	\$ 705.362,00	\$ -	\$ 705.362,00
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0,00	21,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	\$ 519.838,00	\$ -	\$ 7.277.732,00
NP02	CONCRETO DE 24MPA PARA BOX CULVERT.	M3	0,00	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00	0,00	18,81	\$ 1.305.935,00	\$ -	\$ 24.564.637,35
NP03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	157,29	157,29	157,29	156,14	1,15	1,15	157,29	\$ 117.065,00	\$ 134.625,90	\$ 18.413.311,14




**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10**



NP04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA 10" (incluye excavación)	ML	0,00	18,63	21,00	18,63	2,37	2,37	21,00	\$ 209.651,00	\$	495.872,87	\$	4.402.671,00
NP05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA 12" (incluye excavación)	ML	0,00	355,11	358,05	355,11	11,94	11,94	358,05	\$ 280.400,00	\$	3.347.976,00	\$	103.201.220,00
NP06	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO REFORZADO, MEDIDAS INTERNAS 0,80x0,80 - ALTURA VARIABLE E=0,12m	UND	0,00	24,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	\$ 1.488.427,00	\$	-	\$	31.258.957,00
NP09	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	0,00	12,56	12,56	11,59	0,97	0,97	12,56	\$ 122.092,00	\$	118.429,24	\$	1.533.475,52
NP27	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3/30 PSI	UND	0,00	8,00	9,00	8,00	1,00	1,00	9,00	\$ 784.145,00	\$	784.145,00	\$	7.057.305,00
NP 21	RANPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEPOL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0,00	1,00	8,00	1,00	7,00	7,00	8,00	\$ 1.494.956,00	\$	10.464.692,00	\$	11.959.648,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	\$ 737.702,00	\$	24.344.166,00	\$	24.344.166,00
NP 24	TUBERIA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	MA	0,00	0,00	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	\$ 191.615,00	\$	13.681.311,00	\$	13.681.311,00
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	0,00	0,00	220,58	220,58	220,58	220,58	220,58	\$ 45.500,00	\$	10.036.572,00	\$	10.036.572,00
NP 31	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 12", EXCAVACIÓN Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	\$ 194.532,00	\$	5.641.428,00	\$	5.641.428,00
NP 32	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 12" EXCAVACIÓN Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLÁSTICA PARA MEDIDOR	UND	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	\$ 280.332,00	\$	550.654,00	\$	550.654,00
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE DESAGUE PARA AGUAS LLUVIAS. EN PLATINAS DE 3" x 1/4" Y ANGULOS DE 3" x 3/8", DE 60CM DE ANCHO. INCLUYE BISAGRAS CILINDRICAS PARA ABERTURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	0,00	0,00	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	\$ 1.266.200,00	\$	42.683.602,00	\$	42.683.602,00
NP 10	INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO A 240V.	UND	0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	\$ 4.392.376,00	\$	-	\$	21.951.880,00
NP 11	INSTALACION EN TENSION A 240V. DE POSTE EN CONCRETO 9510 kgf	UND	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	\$ 5.982.709,00	\$	-	\$	11.955.418,00
NP 12	DESINSTALACION O RETIRO EN TENSION DE ARMADO, RED ABIERTA O TRENZADO DE BAJA TENSION	GLB	0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	\$ 3.971.500,00	\$	-	\$	19.857.500,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UND	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	\$ 3.129.750,00	\$	-	\$	15.648.750,00
NP 14	DESHINCADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSION A 13.2 KV, INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	\$ 4.551.733,00	\$	-	\$	4.551.733,00




GOBIERNO DE
CÓRDOBA



GOBIERNO DE
CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10

NP 15	DESARMADO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA TRIFÁSICO - BIFÁSICO DE RED DE MEDIA TENSIÓN A 13.2 KV	UND	0,00	2,00	1,00	1,00						0,00	1,00	\$ 5.085.166,00	\$ -	\$ 5.085.166,00
NP 16	DESARMADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V, INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	2,00	2,00	2,00						0,00	2,00	\$ 3.129.750,00	\$ -	\$ 6.259.500,00
NP 17	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 132 KV, INCLUYE: EXCAVACIÓN - RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	1,00	1,00	1,00						0,00	1,00	\$ 3.276.473,00	\$ -	\$ 3.276.473,00
NP 18	DESARMAR Y AMARRE DE RED DE MEDIA TENSIÓN, EN TENSIÓN, PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA	UND	0,00	1,00	1,00	1,00						0,00	1,00	\$ 3.113.973,00	\$ -	\$ 3.113.973,00
SECTOR DE 6 MARZO - VILLA ROCIO - PASA TIEMPO																
4.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	1838,61	1838,61	3046,10	1838,61		355,55	421,23	313,60	1090,39	2929,00	\$ 37.692,00	\$	\$ 41.088.075,98	\$ 110.370.578,00
4.1.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	9075,20	9075,2	8344,6	7335,78					0,00	7335,78	\$ 29.095,00	\$	\$ -	\$ 213.424.658,76
4.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES PARA FALLOS	M3	652,59	190,9	594,1	190,90		106,67	125,37	134,76	367,80	558,70	\$ 33.334,00	\$	\$ 12.260.245,20	\$ 18.623.705,00
4.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (M2100)	M2	12438,12	11348,5	10530,6	9240,99					0,00	9240,99	\$ 20.428,00	\$	\$ -	\$ 168.775.005,00
4.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3	12826,26	12225,9	12155,5	10819,10					0,00	10819,10	\$ 36.161,00	\$	\$ -	\$ 391.228.382,24
4.1.7	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	45,00	45,0	69,0	45,00		24,00			24,00	69,00	\$ 441.297,00	\$	\$ 10.591.128,00	\$ 30.449.493,00
4.1.8	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	39,00	39,0	12,0						12,00	12,00	\$ 615.987,00	\$	\$ 7.391.844,00	\$ 7.391.844,00
4.1.9	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	420,00	420,0	420,0						0,00	0,00	\$ 227.187,00	\$	\$ -	\$ -
4.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	4397,13	4033,9	3894,5	3355,36					0,00	3355,36	\$ 158.015,00	\$	\$ -	\$ 530.355.146,39
4.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	1776,87	1776,9	1744,6	1527,72					0,00	1527,72	\$ 287.872,00	\$	\$ -	\$ 435.769.190,99
4.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RALÓN PARA FALLOS	M3	1305,18	381,5	594,1	381,53		177,17			177,17	558,70	\$ 285.909,00	\$	\$ 50.654.497,53	\$ 155.737.358,30
4.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	489,44	143,1	120,1	93,50					0,00	93,50	\$ 144.928,00	\$	\$ -	\$ 13.550.788,00
4.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA, E= 0.20 CM	M3	2216,87	2216,9	2215,0	1862,21					0,00	1862,21	\$ 1.389.242,00	\$	\$ -	\$ 2.587.053.123,30



GOBIERNO DE
CÓRDOBA



GOBIERNO DE
CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10

4.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL).	KG	39401,04	39401,0	44681,1	38827,87						0,00	38827,87	\$ 12.884,00	\$ -	\$ 499.481.663,02
4.3.4	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	4809,07	4809,1	4977,8	4108,29	166,61					166,61	4274,91	\$ 24.975,00	\$ 4.161.168,00	\$ 106.765.794,00
4.3.5	BORRILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (60x80x20), INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	952,20	3539,5	2600,0	2086,38	45,44					45,44	2133,82	\$ 166.143,00	\$ 7.549.537,92	\$ 354.519.256,26
4.4.1	DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	ML	248,28	248,3	781,0	248,28					208,77	223,45	781,00	\$ 31.355,00	\$ 16.703.988,32	\$ 24.489.036,00
4.4.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	953,14	0,0	43,3						11,00		11,00	\$ 29.095,00	\$ 320.045,00	\$ 320.045,00
4.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=35 C/A)	M3	170,05	0,0	97,8								0,00	\$ 158.015,00	\$ -	\$ -
4.4.13	REJILLA DE CAPTACIÓN PARA SUMIDERO EN PLÁSTICO RECICLADO 90CMx50CMx10CM	UND	22,00	30,0	30,0								0,00	\$ 934.671,00	\$ -	\$ -
4.4.14	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	24392,70	1126,8	1256,4								0,00	\$ 12.864,00	\$ -	\$ -
1.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO	M3	0,00	0,0	11,0						7,15	3,85	11,00	\$ 423.349,00	\$ 4.656.839,00	\$ 4.656.839,00
4.5.1	SIN TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mx0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	79,61	0,0	34,0							5,40	5,40	\$ 292.537,00	\$ 1.579.699,80	\$ 1.579.699,80
4.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	393,09	2673,1	2579,0	2121,62							2121,62	\$ 71.199,00	\$ -	\$ 161.057.222,98
4.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	393,09	3272,8	2670,0	2121,62						208,29	2329,91	\$ 46.543,00	\$ 9.694.441,47	\$ 108.441.001,13
4.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.09M FUNDIDO EN SITO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	234,02	1906,0	1940,0	1469,95						158,17	158,17	\$ 162.483,00	\$ 28.863.701,08	\$ 300.754.084,44
4.5.7	SIN BOLLARDO ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	29,00	359,0	360,0	57,00					266,00		323,00	\$ 475.652,00	\$ 126.523.432,00	\$ 159.655.596,00
4.5.1	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM), INCLUYE	M	5339,23	5339,2	5106,1	1621,02	2050,52	642,59					4314,14	\$ 11.293,00	\$ 30.413.347,70	\$ 48.719.526,56

11. 274




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10



4.8.14	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF.)	UND	18,00	24,0	17,0	7,00	6,00				6,00	13,00	\$ 3.285.223,00	\$	19.711.336,00	\$	42.707.899,00
4.8.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF.)	UND	18,00	24,0	17,0	7,00	6,00				6,00	13,00	\$ 528.256,00	\$	3.169.536,00	\$	6.867.328,00
4.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	14,00	22,0	19,0	11,00	4,00				4,00	15,00	\$ 799.429,00	\$	3.197.716,00	\$	11.991.435,00
4.8.18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	384,00	150,0	100,0	90,00					0,00	90,00	\$ 84.229,00	\$	-	\$	7.580.610,00
4.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENADA	UND	1,00	2,0	2,0	2,00					0,00	2,00	\$ 2.032.388,00	\$	-	\$	4.084.776,00
4.8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	5,0	6,0	1,00	3,00				3,00	4,00	\$ 1.130.176,00	\$	3.390.528,00	\$	4.520.704,00
4.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXION (4 USUARIOS) A RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	5,00	7,0	10,0	3,00	4,00				4,00	7,00	\$ 2.460.552,00	\$	9.842.208,00	\$	17.223.864,00
4.8.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	21,00	23,0	19,0	9,00	3,00				6,00	15,00	\$ 762.648,00	\$	4.575.888,00	\$	11.439.720,00
1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF.)	UND	0,00	8,0	8,0		8,00				8,00	8,00	\$ 2.913.280,00	\$	23.305.240,00	\$	23.305.240,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF.)	UND	0,00	8,0	8,0		8,00				8,00	8,00	\$ 553.114,00	\$	4.424.912,00	\$	4.424.912,00
NP01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANILLA EN CONCRETO	UND	0,00	105,0	121,0	59,00					10,00	69,00	\$ 519.838,00	\$	5.198.380,00	\$	35.888.822,00
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	178,8	178,8						97,32	97,32	\$ 117.056,00	\$	11.392.863,12	\$	11.392.863,12
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 12"	ML	0,00	63,8	68,8	63,80					5,00	68,80	\$ 280.400,00	\$	1.402.000,00	\$	19.291.520,00
NP 06	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA MEDIDAS INTERNAS 0.8X0.8M - ALTURA VARIABLE	UND	0,00	15,0	20,0						17,00	17,00	\$ 1.488.427,00	\$	25.303.259,00	\$	25.303.259,00
NP07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 14"	ML	0,00	364,3	457,0	364,34					52,46	416,80	\$ 393.646,00	\$	20.650.689,16	\$	164.071.652,80
NP 09	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	19,0	26,3	19,04					5,24	24,28	\$ 122.052,00	\$	639.762,08	\$	2.954.393,76
NP 20	CONSTRUCCION DE CARCAJO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.4M Y ALTURA VARIABLE	ML	0,00	50,5	50,5						36,00	36,00	\$ 480.827,00	\$	17.309.772,00	\$	17.309.772,00




**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10**



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1.00	39.0	104.0	39.00	65.00									65.00	\$ 1,494,955.00	\$ 97,172,140.00	\$ 155,475,424.00	
NP 23	CONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CON PROFUNDIDADES INFERIORES A 0.90 M. INCLUYE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL	UND	0.00	0.0	10.0		10.00									10.00	\$ 502,763.00	\$ 5,027,630.00	\$ 5,027,630.00	
NP 24	TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	0.00	0.0	198.7		198.71									198.71	\$ 191,615.00	\$ 38,075,500.00	\$ 38,075,500.00	
NP 27	EXCAVACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 1/2". EXCAVACIÓN Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND	0.00	17.0	23.0	17.00	6.00									6.00	\$ 784,145.00	\$ 4,704,870.00	\$ 18,035,335.00	
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	0.00	0.0	147.0		133.46									147.01	\$ 45,500.00	\$ 6,888,955.00	\$ 6,888,955.00	
NP 31	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 1/2". EXCAVACIÓN Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLÁSTICA PARA MEDIDOR	UND	0.00	0.0	71.0		71.00									71.00	\$ 194,532.00	\$ 13,811,772.00	\$ 13,811,772.00	
NP 32	RAMPA PARA USO VEHICULAR CON DIMENSIONES MAYORES DE 4.2M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0.00	0.0	48.0		4.00									5.00	\$ 280,332.00	\$ 1,401,660.00	\$ 1,401,660.00	
NP 35	INSTALACIÓN EN TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN EN CABLE TREZADO A 240V.	ML	0.00	0.0	34.9											0.00	\$ 355,941.00	\$	\$	
NP40	INSTALACIÓN EN TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN EN CABLE TREZADO A 240V.	UND	0.00	20.0	20.0	11.00	5.00									5.00	\$ 4,392,376.00	\$ 21,961,880.00	\$ 70,278,016.00	
NP11	CONCRETO 9510 kgf	UND	0.00	14.0	18.0	3.00	11.00									11.00	\$ 5,982,709.00	\$ 65,809,799.00	\$ 83,757,926.00	
NP12	DESINSTALACIÓN O RETIRO EN TENSIÓN DE ARMADO, RED ABIERTA O TREZADO DE BAJA TENSIÓN	GLB	0.00	19.0	19.0	11.00	4.00									4.00	\$ 3,971,500.00	\$ 15,886,000.00	\$ 59,572,500.00	
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFÓNICA (FIBRA ÓPTICA)	UND	0.00	0.0	49.0		18.00									25.00	\$ 3,129,750.00	\$ 78,243,750.00	\$ 78,243,750.00	
NP 14	DESHINCADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 13.2 KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0.00	0.0	4.0		2.00									4.00	\$ 4,551,733.00	\$ 18,206,932.00	\$ 18,206,932.00	
NP15	DESARMADO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA TRIFÁSICO - BIFÁSICO DE RED DE MEDIA TENSIÓN A 13.2 KV	UND	0.00	0.0	4.0		2.00									4.00	\$ 5,085,166.00	\$ 20,340,664.00	\$ 20,340,664.00	
NP16	DESHINCADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V, INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0.00	16.0	18.0	3.00	5.00									11.00	\$ 3,129,750.00	\$ 34,427,250.00	\$ 43,816,500.00	
SECTOR MONTEVERDE																			\$ 405,998,102.73	\$ 3,994,616,641.71



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

5.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	49,62	49,62	213,0	49,62				163,40	213,02	\$ 58.103,00	\$ 9.494.175,46	\$ 12.377.246,32
5.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	950,82	950,8	1804,2	950,82				187,65	1138,47	\$ 37.882,00	\$ 7.071.178,03	\$ 42.899.977,27
5.1.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4069,83	4069,8	3909,9	3909,94				0,00	3909,94	\$ 29.095,00	\$ -	\$ 113.759.826,50
5.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES PARA FALLOS	M3	223,10	74,4	135,1	74,37				60,73	135,10	\$ 33.334,00	\$ 2.024.373,82	\$ 4.503.423,40
5.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (INT2100)	M2	764,13	4893,4	4891,3	4891,33				0,00	4891,33	\$ 20.428,00	\$ -	\$ 99.920.081,07
5.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3 - KM	5680,23	5485,9	5708,3	5485,88				221,41	5708,29	\$ 36.161,00	\$ 8.006.285,97	\$ 206.417.353,65
5.1.7	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	11,00	11,0	27,0	11,00				16,00	27,00	\$ 441.297,00	\$ 7.060.752,00	\$ 11.915.019,00
5.1.8	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	8,00	8,0	8,0	8,00				0,00	8,00	\$ 615.987,00	\$ -	\$ 4.927.886,00
5.1.9	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1,5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABOÑO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	95,00	95,0	122,0					0,00	0,00	\$ 227.187,00	\$ -	\$ -
5.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2117,99	1910,9	2035,0	1910,86				124,16	2035,02	\$ 158.015,00	\$ 19.618.763,16	\$ 321.563.306,06
5.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	776,73	776,7	790,5	766,87				23,65	790,51	\$ 287.872,00	\$ 6.806.934,95	\$ 227.566.702,27
5.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	594,93	199,3	135,1	135,10				0,00	135,10	\$ 285.909,00	\$ -	\$ 38.626.477,45
5.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	223,10	74,4	35,9	35,92				0,00	35,92	\$ 144.928,00	\$ -	\$ 5.205.523,90
5.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA. E= 0,20 CM	M3	133,58	941,5	977,0	941,51				0,00	941,51	\$ 1.389.242,00	\$ -	\$ 1.307.985.235,42
5.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17678,37	17678,4	18421,0	17427,41				608,05	18035,45	\$ 12.864,00	\$ 7.821.982,07	\$ 232.008.167,21
5.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	2256,40	2256,4	2290,4	2212,09				58,91	2271,00	\$ 24.975,00	\$ 1.471.277,25	\$ 56.718.308,25
5.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (60X80X20), INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1439,11	1439,1	867,1	867,08				0,00	867,08	\$ 166.143,00	\$ -	\$ 144.059.272,44
5.4.1	SIN TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0,20mx0,20m X 0,05m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILER) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0,04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0,20m Y JUNTAS SELLADAS	M	114,63	0,0	2,0					2,00	2,00	\$ 292.537,00	\$ 585.074,00	\$ 585.074,00




GOBIERNO DE CORDOBA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10

5.4.2	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CONADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	565,04	915,3	873,6	873,60						0,00	873,60	\$ 71.199,00	\$ -	\$ 62.199.446,40
5.4.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CONADOQUIN GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	565,04	1120,0	873,6	873,60						0,00	873,60	\$ 46.543,00	\$ -	\$ 40.559.984,80
5.4.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=008M FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACION, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	336,98	865,5	655,3	655,26						0,00	655,26	\$ 181.861,00	\$ -	\$ 119.165.238,86
5.4.7	SI BOLLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	41,00	249,0	213,0	213,00						0,00	213,00	\$ 475.652,00	\$ -	\$ 101.313.876,00
5.5.1	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M(12CM). INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	2574,06	2574,1	2649,1	2574,06						0,00	2574,06	\$ 11.293,00	\$ -	\$ 28.068.833,23
5.5.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60X60 CM)	UND	48,00	49,0	60,0	48,00					10,00	10,00	58,00	\$ 896.973,00	\$ 8.969.730,00	\$ 52.024.434,00
5.5.3	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	180,05	180,1	169,3	150,41					18,92	18,92	169,33	\$ 104.900,00	\$ 1.984.708,00	\$ 17.762.507,20
5.6.1	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	19,00	19,0	157,0	19,00					138,00	138,00	157,00	\$ 213.904,00	\$ 29.516.752,00	\$ 33.582.928,00
4.7.2	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	0,00	0,0	19,0					19,00	19,00	19,00	19,00	\$ 477.758,00	\$ 9.077.402,00	\$ 9.077.402,00
5.8.2	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS. - 750 KGF).	UND	2,00	1,0	1,0	1,00				1,00		0,00	1,00	\$ 4.303.168,00	\$ -	\$ 4.303.168,00
5.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS. - 750 KGF.)	UND	2,00	2,0	2,0	2,00						0,00	2,00	\$ 775.489,00	\$ -	\$ 1.550.978,00
5.8.4	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS. - 1050 KGF).	UND	1,00	1,0	1,0	1,00				1,00		0,00	1,00	\$ 5.115.579,00	\$ -	\$ 5.115.579,00
5.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS. - 1050 KGF.)	UND	1,00	1,0	1,0	1,00						0,00	1,00	\$ 922.037,00	\$ -	\$ 922.037,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FIN DE LINEA CON DISPOSICION CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	3,0	2,0	2,00					0,00	2,00	\$ 6.078.923,00	\$ -	\$ 12.157.846,00
5.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	3,00	1,0	1,0	1,00					0,00	1,00	\$ 3.880.278,00	\$ -	\$ 3.880.278,00
5.8.7	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 10AWG.	M	160,00	30,0	30,0	30,00					0,00	30,00	\$ 104.792,00	\$ -	\$ 3.143.760,00
5.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	3,00	3,0	2,0	2,00					0,00	2,00	\$ 4.717.204,00	\$ -	\$ 9.434.408,00
5.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	3,00	3,0	2,0	2,00					0,00	2,00	\$ 8.299.515,00	\$ -	\$ 16.599.030,00
5.8.11	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9MTS - 510 KGF).	UND	6,00	3,0	3,0	3,00					0,00	3,00	\$ 3.285.223,00	\$ -	\$ 9.855.669,00
5.8.12	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF).	UND	6,00	3,0	12,0	3,00					0,00	3,00	\$ 528.256,00	\$ -	\$ 1.584.769,00
5.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	6,00	6,0	6,0	6,00					0,00	6,00	\$ 799.429,00	\$ -	\$ 4.796.574,00
5.8.14	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 10AWG.	M	100,00	0,0	40,0						40,00	40,00	\$ 92.577,00	\$ 3.703.080,00	\$ 3.703.080,00
4.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENADA	UND	0,00	2,0	3,0	2,00					1,00	3,00	\$ 2.032.388,00	\$ 2.032.388,00	\$ 6.097.164,00
5.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	6,00	3,0	2,0	2,00					0,00	2,00	\$ 1.130.176,00	\$ -	\$ 2.260.352,00
5.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXION (4 USUARIOS) A RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	6,00	4,0	5,0	4,00					1,00	5,00	\$ 2.460.552,00	\$ 2.460.552,00	\$ 12.302.760,00
5.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120 VOL., INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00	1,0	1,0	1,00					0,00	1,00	\$ 10.019.826,00	\$ -	\$ 10.019.826,00



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CORDOBA

5.8.19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AVG.	M	500,00	1492	50,0	50,00					0,00	50,00	\$ 69.405,00	\$	-	\$	3.470.250,00
3.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		21,0	60,0	21,00				39,00	39,00	60,00	\$ 969.687,00	\$	37.817.793,00	\$	50.181.220,00
5.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	9,00	7,0	7,0	7,00					0,00	7,00	\$ 762.648,00	\$	-	\$	5.338.535,00
1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF.).	UND	0,00	5,0	5,0	5,00					0,00	5,00	\$ 2.913.280,00	\$	-	\$	14.586.400,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF.).	UND	0,00	5,0	5,0	5,00					0,00	5,00	\$ 553.114,00	\$	-	\$	2.765.570,00
5.8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	8,00	5,0	17,0	5,00				12,00	12,00	17,00	\$ 705.352,00	\$	8.464.344,00	\$	11.991.154,00
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCT. TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0,00	35,0	34,0	34,00					0,00	34,00	\$ 519.838,00	\$	-	\$	17.574.492,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0,00	74,0	122,0	74,00				37,00	37,00	111,00	\$ 1.494.555,00	\$	55.313.372,00	\$	165.940.116,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND	0,00	0,0	44,0					44,00	44,00	44,00	\$ 737.702,00	\$	32.458.888,00	\$	32.458.888,00
NP 23	CONEXION Y ADECUACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CON PROFUNDIDADES INFERIORES A 0,90 M. INCLUYE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL.	UND	0,00	0,0	48,0					48,00	48,00	48,00	\$ 502.763,00	\$	24.132.624,00	\$	24.132.624,00
NP 24	TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO.	M	0,00	0,0	151,0					151,00	151,00	151,00	\$ 191.615,00	\$	28.933.855,00	\$	28.933.855,00
NP 25	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	0,00	0,0	245,2					246,20	246,20	246,20	\$ 14.160,00	\$	3.486.192,00	\$	3.486.192,00
NP 27	ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0,00	15,0	12,0	12,00					0,00	12,00	\$ 784.145,00	\$	-	\$	9.409.740,00
NP 26	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0,00	0,0	16,9					16,85	16,85	16,85	\$ 224.250,00	\$	3.779.419,80	\$	3.779.419,80
NP 29	EXCAVACION MANUAL	M3	0,00	0,0	41,8					41,76	41,76	41,76	\$ 45.500,00	\$	1.900.152,80	\$	1.900.152,80
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLA DO DE 4"	ML	0,00	0,0	8,0					8,00	8,00	8,00	\$ 161.559,00	\$	1.292.472,00	\$	1.292.472,00
NP 31	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	0,00	0,0	84,0					84,00	84,00	84,00	\$ 194.532,00	\$	16.340.888,00	\$	16.340.888,00

[illegible]




INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

6.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2044.05	1850.0	1883.3	1849.98		33.27		1883.25	\$ 158.015,00	\$	5.257.159,05	\$	297.581.748,75
6.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	646.89	646.9	646.9	646.89		0.00		646.89	\$ 287.872.00	-\$	0.24	\$	186.221.517.84
6.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJON PARA FALLOS	M3	485.00	155.0	400.0	155.00		245.00		400.00	\$ 285.909.00	\$	70.047.705.00	\$	114.363.600.00
6.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15cm)	M3	174.38	58.1	100.0	58.13		41.87		100.00	\$ 144.928.00	\$	6.088.135.36	\$	14.492.800.00
6.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA, E= 0.20 CM	M3	783.82	783.8	783.8	775.00		8.82		783.82	\$ 1.309.242.00	\$	12.253.114.44	\$	1.088.915.664.44
6.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	11964.97	11953.0	12890.2	11802.62		1087.55		12890.17	\$ 12.864.00	\$	13.990.277.49	\$	165.819.146.88
6.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	2076.67	2076.7	2076.7	2056.67		10.00		2076.67	\$ 24.975.00	\$	249.833.25	\$	51.864.833.25
6.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1553.03	1553.0	1553.0	0.00		0.00		0.00	\$ 166.143.00	\$	-	\$	-
6.4.1	DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	M	300.00	300.0	670.0	300.00		370.00		670.00	\$ 31.356.00	\$	11.601.720.00	\$	21.008.520.00
6.7.1	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	4.00	4.0	109.0	4.00		105.00		109.00	\$ 213.904.00	\$	22.459.920.00	\$	23.315.556.00
NP 34	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO EN 3°. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	0.00	0.0	10.0	0.00		10.00		10.00	\$ 385.756.00	\$	3.857.560.00	\$	3.857.560.00
OTROS COMPONENTES															
	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO	GL	1.00			0.67				0.82	\$ 166.800.000.00	\$	3.313.284.63	\$	137.153.804.51
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	GL	1.00			0.67				0.82	\$ 390.280.000.00	\$	7.752.450.39	\$	320.913.590.08
	TRAMITE Y LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED, INCLUYE: PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACIÓN DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISIÓN DE OBRAS (10 UND)	GL	1.00								\$ 30.000.000.00	\$	-	\$	-
	CERTIFICACIÓN RETIE PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION (10 UND)	GL	1.00								\$ 25.000.000.00	\$	-	\$	-
TOTAL EJECUTADO															
AVANCE FISICO A LA FECHA															
													\$ 2.600.561.654.28	\$	24.796.932.084.23
													8,79%		83,77%
													MES		TOTAL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

8 INFORME DE AVANCE DE OBRA

8.1 AVANCE DE OBRA PROGRAMADA, EJECUTADA Y ACUMULADA DEL CONTRATO DE OBRA

En el siguiente grafico se reporta el avance general de la obra, reprogramado según balance de obra No. 2 vs ejecutado durante el periodo comprendido entre el 6 marzo y el 5 de abril de 2026. El avance físico de las actividades ejecutadas acumuladas a la fecha corresponde al **83.77%** frente al **79.93%** reprogramado, lo que indica que la ejecución marcha con buen ritmo y con rendimientos óptimos conservando aun un 3.84% por encima de lo programado, muy a pesar de algunos días de intensa lluvia que conllevaron a suspender actividades en algunas jornadas de los diferentes sectores intervenidos.

En cuanto al avance físico correspondiente del periodo o mes reportado, se indica un avance del **8.79%** frente al **4.92%** programado, indicando que se presenta un superávit del 3.87% por encima de lo reprogramado para el presente mes. Es importante destacar que, en medio de las circunstancias típicas de la época de lluvias, el contratista continua con la eficiencia operacional y administrativa con:

- * Optimización de Procesos: El equipo de obra continúa implementando métodos de trabajo rápidos y eficientes, aumentando las cuadrillas de trabajo cuando es requerido.
- * Mejor Coordinación: se mantiene una buena logística en la entrega de materiales y una adecuada sincronización entre las cuadrillas que redujo los tiempos muertos.
- * Productividad del Personal: La mano de obra demostró ser rápida y experimentada para ciertas tareas, como instalación de losetas, instalación de tuberías, ejecución de andenes entre otros.


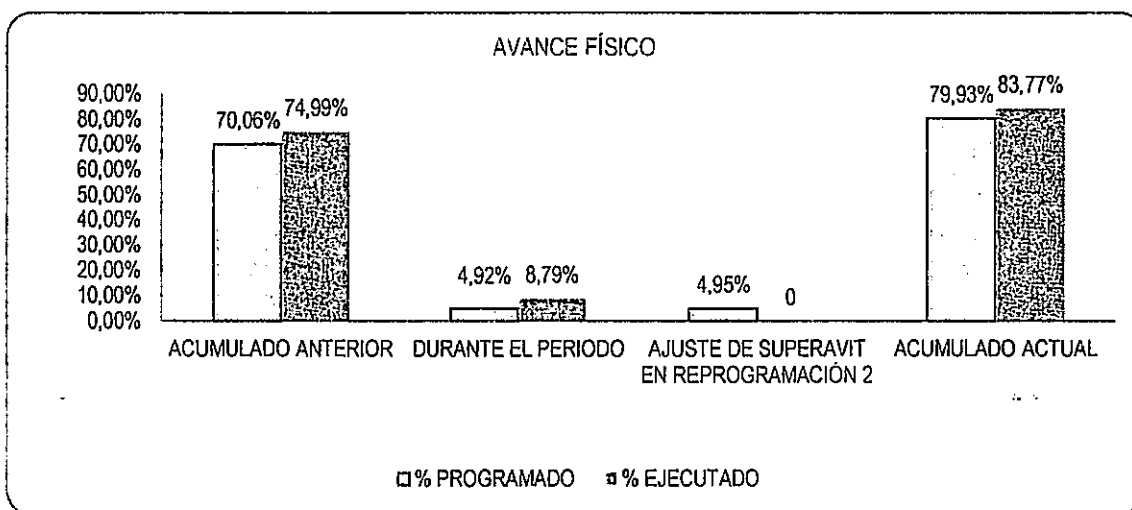


Tabla 5. Avance programado vs Avance ejecutado




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

AVANCE FINANCIERO

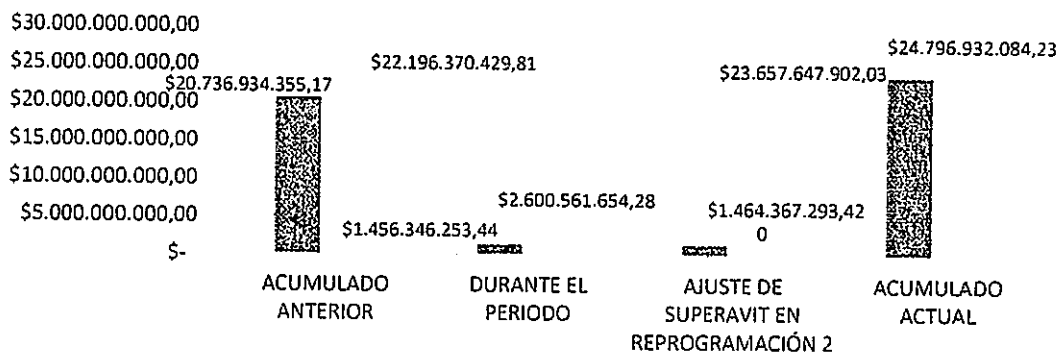


■ VALOR PROG ■ V. EJECUT

Cuadro comparativo programado Vs ejecutado en porcentajes y valores:

	(%) PROGR.	(%) EJECUTADO	DIFERENCIA (%) PROG Vs (%) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	70,06%	74,99%	3,849%
DURANTE EL PERIODO	4,92%	8,79%	
AJUSTE DE SUPERAVIT EN REPROGRAMACIÓN 2	4,95%		
ACUMULADO ACTUAL	79,93%	83,77%	

	(Vr) PROGR	(Vr) EJECU	DIFERENCIA (\$) PROG Vs (\$) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 20.736.934.355,17	\$ 22.196.370.429,81	\$ 1.139.284.182,20
DURANTE EL PERIODO	\$ 1.456.346.253,44	\$ 2.600.561.654,28	
AJUSTE DE SUPERAVIT EN REPROGRAMACIÓN 2	\$ 1.464.367.293,42		
ACUMULADO ACTUAL	\$ 23.657.647.902,03	\$ 24.796.932.084,23	

NOTA: El contratista dentro de lo reprogramado en el balance de obra No. 2, ajusta el valor de \$1.464.367.293.42 el cual ya fue ejecutado y que se venía reportando como superávit, esto con el fin de reprogramar en el tiempo restante solo los recursos realmente faltantes por ejecutar incluido el valor adicional; por lo que se ajusta el acumulado programado en la semana 41 (inicio balance No. 2 y adición) de \$21.087.334.153,67 a \$22.971,108,584,36 incluido lo programado para esa misma semana.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente corte, se han identificado nuevas actividades no previstas que han surgido durante la ejecución del proyecto, adicionales a las consideradas en el Balance de Obra No. 1 y otras que se revisaran en un balance de obra 2. Estas corresponden a situaciones imprevistas que, por su naturaleza técnica, no fueron contemplados en la planificación inicial de la obra y que van surgiendo a medida que se avanza en la ejecución del proyecto.

Se solicitó al contratista que cada uno de estos ítems sea debidamente justificado, documentado y soportado técnicamente, con el fin de que sean reportados oportunamente a esta interventoría y a la entidad contratante, para adelantar los trámites correspondientes a su revisión y aprobación.

Tras la identificación detallada de los nuevos ítems no previstos, se procedió con rigor técnico a su integración en el balance de obra No. 2. Cabe resaltar que dichos ítems ya cuentan con la aprobación oficial emitida por la interventoría y la entidad contratante el pasado 20 de marzo de 2026, asegurando así la trazabilidad y el equilibrio financiero del proyecto.

DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto, las dificultades técnicas que se han presentado han sido gestionadas de manera oportuna y eficiente por parte del contratista. Cada eventualidad ha sido debidamente reportada a la interventoría de obra dentro de los tiempos establecidos, garantizando una comunicación fluida y transparente entre las partes. Frente a cada dificultad identificada, se han analizado y adoptado las soluciones técnicas más adecuadas, permitiendo la continuidad de las actividades y el cumplimiento de los estándares de calidad y diseño exigidos en el contrato.

Gracias a esta gestión colaborativa y a la respuesta oportuna de ambas partes, fue posible minimizar los impactos sobre el cronograma de obra, garantizar la calidad de los trabajos ejecutados y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos establecidos para este tipo de proyectos.



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

AVANCE POR SECTOR: a continuación, se detalla el avance de cada sector frente al proyecto en general y frente a su propio valor

AVANCE GENERAL POR SECTORES CORTE 5 DE ABRIL 2025

SECTOR	VALOR CONTRACTUAL SECTOR	VALOR SECTOR SEGUN BALANCE	VALOR SECTOR SEGUN BALANCE N°7	(%) EN PROY.	ACUMULADO TOTAL	(%) AVANCE SECTOR	(%) AVANCE PROYEC.
EL RECREO	\$ 7.176.779.567,00	\$ 5.281.164.401,00	\$ 5.456.229.045,00	18,43%	\$ 5.449.413.181,82	59,88%	18,41%
INIAI	\$ 3.218.893.173,00	\$ 1.522.492.189,00	\$ 3.619.783.454,00	12,23%	\$ 2.645.878.130,20	73,10%	6,94%
CANTAGUARO	\$ 2.244.737.410,00	\$ 2.223.549.581,00	\$ 2.235.429.792,00	7,55%	\$ 2.115.135.368,16	94,63%	7,15%
6 DE MARZO - PASA TIEMPO - VILLA ROCIO	\$ 8.265.724.760,00	\$ 8.937.133.465,00	\$ 9.319.614.572,00	34,55%	\$ 7.812.718.245,43	83,65%	26,39%
MONTEVERDE	\$ 2.410.549.573,00	\$ 3.873.938.228,00	\$ 4.129.400.634,00	13,95%	\$ 3.994.616.641,71	56,73%	13,40%
EL TOPAO	\$ 3.529.194.240,00	\$ 3.022.581.779,00	\$ 3.747.983.345,00	12,65%	\$ 2.521.403.121,31	61,95%	7,84%
RANCHOS DEL INAI	\$ 459.532.577,00	\$ 459.532.577,00	\$ 459.532.577,00	1,53%	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OBRAS	\$ 27.105.354.340,00	\$ 27.405.354.340,00	\$ 28.987.701.989,00		\$ 24.348.864.689,64		
PGIO	\$ 166.893.000,00	\$ 152.300.000,00	\$ 165.800.000,00	0,55%	\$ 137.153.804,51	82,23%	0,45%
PMT	\$ 340.280.000,00	\$ 330.280.000,00	\$ 339.280.000,00	1,32%	\$ 320.913.580,03	82,23%	1,38%
OPERADOR DE REDES	\$ 30.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,10%	\$ -	0,00%	0,00%
RETIE	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	0,03%	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS COMPONENTES	\$ 612.000.000,00	\$ 612.000.000,00	\$ 612.000.000,00		\$ 458.067.104,59		
VALOR TOTAL	\$ 27.717.334.340,00	\$ 27.717.334.340,00	\$ 29.599.701.989,00	14,00%	\$ 24.196.932.094,23		13,77%



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

8.2 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, esta Interventoría elaboró y remitió a la supervisión del contrato de la Secretaría de Infraestructura Física Departamental, un total de cuatro (4) informes semanales con los que se busca asegurar la transparencia, el control y la gestión proactiva del proyecto.

Estos documentos fueron enviados vía correo electrónico y físicos, y en ellos se detalla el seguimiento de todas las actividades de construcción ejecutadas durante cada una de las semanas reportadas.

Las finalidades clave de dichos informes son:

1. Monitoreo del Cronograma: Comparar el avance físico real con el programado para identificar desviaciones (retrasos o adelantos) de manera oportuna.
2. Control de Calidad: Documentar y verificar que los trabajos ejecutados durante la semana cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad definidos en el contrato.
3. Gestión de Riesgos y Problemas: Servir como foro formal para reportar y solicitar soluciones a los inconvenientes encontrados (problemas de diseño, inconvenientes con la comunidad, manejo de aguas entre otros), permitiendo la toma de decisiones rápidas.
4. Seguimiento Financiero: Justificar las cantidades de obra ejecutadas que servirán de base para las actas parciales de pago al contratista.
5. Comunicación Formal: Mantener a todas las partes interesadas (supervisión, interventoría, contratista) informadas del estado real de la obra y de las acciones tomadas.

En resumen, en cada informe semanal se plasmó el avance físico de las obras, las novedades relevantes, el estado de cumplimiento del cronograma aprobado, el control de calidad, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y cualquier otra información pertinente para el adecuado seguimiento y control del proyecto. Estos informes son la bitácora oficial que sustenta la gestión, el avance y la futura liquidación del contrato (VER ANEXO)

9 INFORMACIÓN FINANCIERA DE OBRA.

El contrato de Obra Pública No. SI-LP-003-2024 cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"**, y cuyo valor es por la suma de **VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TERCIENTOS PESOS MCTE (\$27.717.434.300,00)**; cuenta con un anticipo del 30% del valor del contrato el cual se detalla contractualmente de la siguiente manera; así como la forma de pago del mismo.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

CLAUSULAS DE ANTICIPO Y FORMA DE PAGO:

- CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este proyecto, a la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato. Este porcentaje se determinó con el objetivo de generar un apalancamiento financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten oportunamente y sin contratiempos. PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregado a título de anticipo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. En todo caso, el costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.


- CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera:
1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 30% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el Interventor y/o supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestión social y planos. 2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

A la fecha el contratista cuenta con desembolso de anticipo y ha presentado dos actas parciales de obra con su respectiva amortización de anticipo, los cuales se describen más adelante en el resumen financiero.

10 ACTAS DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

En el marco del seguimiento y control del programa de obra, se llevaron a cabo diversas reuniones y comités de seguimiento y control, relevantes durante el periodo de ejecución, reportado en el presente informe; con el fin de mantener el proyecto alineado en tiempo, costo y calidad.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Adicionalmente, se efectuaron comités técnicos de obra con la supervisión de obras a cargo de la secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Córdoba. En estos espacios de trabajo en conjunto con el contratista, se abordaron temas cruciales para el desarrollo del proyecto, incluyendo el seguimiento y control detallado de la ejecución de las actividades en curso y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, con especial énfasis en los componentes de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Las conclusiones y compromisos derivados de estos comités técnicos son fundamentales para asegurar el avance adecuado en el plazo pactado, el cumplimiento de los diseños y la calidad de las obras. (VER ANEXOS)


11 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo objeto del presente informe, se ha verificado de manera constante la presencia y operatividad de los equipos mínimos requeridos en el anexo técnico del contratista en los diferentes frentes de trabajo. Se corrobora que el contratista ha mantenido en obra los equipos necesarios para llevar a cabo todas las actividades pertinentes, tales como: retroexcavadoras (3), minicargadores (3), volcos dobles (4) y sencillos (3), carmix (1), retroexcavadoras pajarita (2), vibrocompactador (3), Bulldozer (1), camión de transporte de materiales (1), carro canasta (1), carrotanque (1), y equipos menores como: equipos de topografía, compresores, bombas de espalda, taladros percutores, cizalla, vibrocompactador manual, reglas vibratorias, motobombas, cortadora de concreto, equipo de soldadura, equipo de oxi-corte, equipo de demarcación, escaleras, formaleas metálicas, mezcladora de 1 saco, pulidora, motosierra, kit de pavimento, entre otros.

Es importante destacar que, cada sector en intervención, cuenta con su propio kit de maquinaria disponible y equipos menores, que son puestos en marcha de acuerdo a cada una de las activia.

12 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT	DEDICACIÓN (%)
PERSONAL DE OBRA		
Director de obra - Ingeniero con postgrado – LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ	1	40%
Residente de obra - Ingeniero Civil – WILSON RUIZ HERNANDEZ y JOSE CARLOS ROMERO LOBO	2	100%
Profesional SISO - Especialista	1	40%
Auxiliar Siso – ARTHUN PAOLO ROMERO PEREZ y BERNARDO LUIS DORIA MARTINEZ	2	100%
Ingeniero Civil - Especialista en Vías – HAROLDO LOZANO SUAREZ	1	40%
Ingeniero Civil – Especialista en Geotecnia – LUIS EDUARDO GARCIA MEDINA	1	40%



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Ingeniero Civil - Especialista Hidráulico – RAFAEL ANTONIO LUJAN ESQUIVIA	1	40%
Profesional ambiental – Especialista – JAMILTON ECHEVERRI DIAZ	1	40%
Comisión Topográfica	2	60%
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO		
Secretaria - Tecnólogo	1	60%
Almacenista - Técnico	2	100%
PERSONAL DE VIGILANCIA		
Celador	2	100%

Tabla. Relación de Personal del Contratista de Obra

Durante el periodo de este informe, se observó que los profesionales designados por el contratista para la ejecución del proyecto demostraron la dedicación requerida y atendieron de manera diligente las responsabilidades inherentes a sus respectivos cargos.

Por su parte, el personal de obra, mantuvo la conformación de las cuadrillas de trabajo en cada uno de los sectores activos, en concordancia con la planificación establecida para las diferentes actividades constructivas.

Adicionalmente, se destaca la disposición del personal técnico y administrativo del contratista para atender las solicitudes de información y coordinación por parte de la Interventoría, lo cual ha facilitado el seguimiento y la resolución de aspectos técnicos y operativos del proyecto.

13 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron levemente el normal desarrollo de las actividades constructivas.

En el periodo reportado comprendido entre el 6 de marzo y el 5 de abril, se presentaron lluvias, de diversa intensidad y duración, que, dado a la naturaleza del proyecto, generaron impacto y afectaciones en la programación de algunas actividades ya que se desarrollan a la intemperie, como las excavaciones, mejoramientos, rellenos y fundición las losas de concreto, y como es de conocimiento de todos, estas actividades requieren condiciones de terreno seco para su correcta ejecución.

En los días de lluvias, se generaron las siguientes situaciones en algunos frentes de obra:

- Suspensión de actividades, generando pagos de stand by de la maquinaria presente en obra y gastos de mano de obra sin ejecutar actividades, por parte del contratista de obra.
- Las excavaciones se llenan totalmente de agua, por lo que se hace necesaria la implementación y uso de motobombas para su debida evacuación.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

- Los tramos que ya cuentan con la estructura del pavimento conformada, se ven afectados debido a la saturación del material.
- Se ven afectadas las fundiciones y construcción de andenes programados en los diferentes frentes de obra

El contratista tomó las medidas necesarias para mitigar los efectos de las lluvias, sin embargo, es importante considerar estos eventos climáticos al analizar el avance general de la obra

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO																																		
FRETE DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CLIMA	Feb-2020																																
		V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
SOLADO	SOLEADO	x	x		x	x		x	x	x										x	x	x	x	x										
	LUVIOSO																																	
	NUBLADO							x																										
	FORMADO NO OPERATIVA																																	

Tabla Estado del tiempo

14 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, se llevó a cabo el control de calidad en cuanto al cumplimiento normativo, ya que los ensayos aseguran que el proyecto cumpla con las normas y estándares de calidad establecidos por las autoridades y la normativa competentes.

En el control de calidad de los materiales, se verifica que los materiales utilizados (concretos, agregados, cemento, acero, material subbase, llenos, etc.) cumplan con las especificaciones técnicas en cuanto a granulometría, composición química, resistencia, etc. También se verifica que los procesos de construcción (compactación, extendido, vaciado, corte, etc.) se realicen correctamente para asegurar la homogeneidad y resistencia del pavimento.

El objetivo de estas pruebas es verificar el cumplimiento de la resistencia especificada en los diseños y garantizar la calidad estructural de la estructura de los pavimentos en todos los frentes intervenidos.

Los resultados detallados de estos ensayos, incluyendo las fechas de muestreo, los elementos evaluados, las resistencias obtenidas a diferentes edades (ej. 7, 14 y 28 días) y su comparación con los valores de diseño, algunos de los resultados de muestras tomadas en este periodo se adjuntarán al siguiente informe mensual, debido a que aún se está a la espera la entrega de estos resultados por parte del laboratorio.

El análisis de estos resultados es fundamental para esta Interventoría en su labor de control de calidad.
(VER ANEXOS)



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

15 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

En cumplimiento de las labores de supervisión y control, se procedió a la revisión de los pagos de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) correspondientes al personal del contratista de obra que labora en el proyecto durante el periodo evaluado.

La documentación soporte de estos pagos, proporcionada por el contratista, se adjunta al presente informe para su debida verificación y archivo. La verificación del cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para asegurar los derechos laborales de los trabajadores y el adecuado desarrollo del contrato en el marco de la legislación vigente.

16 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la labor de esta Interventoría se centró en el seguimiento integral de las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el marco de la ejecución del Contrato N° SI-LP-003-2024, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA".

Esta supervisión incluyó el control y verificación del avance de las actividades constructivas, tal como se detalla en el literal "DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES" del presente documento, a través de visitas permanentes a los diferentes sectores y frentes de trabajo y de la revisión de la documentación de soporte.

De manera periódica, se informó a la entidad contratante sobre el progreso de la obra mediante la elaboración y envío de informes semanales, los cuales incluyeron registros fotográficos que evidenciaron el estado de las actividades. Asimismo, se convocaron y realizaron los comités técnicos necesarios para abordar aspectos específicos del proyecto, analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y dar seguimiento a los temas de calidad y SST.

Esta Interventoría mantiene una presencia activa en el proyecto, buscando identificar de manera oportuna cualquier novedad o situación que pudiera afectar el normal desarrollo del objeto contractual, para así informar de inmediato a la entidad contratante para su conocimiento y toma de decisiones.

El objetivo primordial de estas acciones es garantizar un control total de la obra en todas sus etapas y asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato para lograr un feliz término del mismo.

17 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Para el adecuado desempeño de las labores de supervisión e inspección en los diversos frentes de trabajo del proyecto, esta Interventoría dispuso de dos (2) vehículos tipo camioneta 4x4 de manera permanente.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Este recurso móvil resultó esencial para garantizar la presencia oportuna del equipo de interventoría en los diferentes sectores intervenidos, facilitando el seguimiento diario de las actividades, la verificación en sitio de la calidad de los trabajos y la atención eficiente a cualquier requerimiento o eventualidad que surgiera durante la ejecución de la obra.

Los vehículos se mantuvieron operativos y en condiciones óptimas para cumplir con las exigencias de desplazamiento inherentes a la naturaleza dispersa geográficamente del proyecto.

18 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	100%
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	HERNAN ALONSO VELAZQUEZ CABEZA	50%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	BLEIDY MARÍA ESCOBAR HERNANDEZ	100%
ESPECIALISTA EN VÍAS	HERNAN ALONSO VELAZQUEZ CABEZA	20%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE	20%
ESPECIALISTA HIDRAULICO	JORGE DAVID BITAR ALVAREZ	20%
PROFESIONAL AMBIENTAL		50%
PROFESIONAL SISO		100%

Tabla Personal de interventoría

Durante el periodo de este informe, se reporta que los profesionales designados por esta interventoría para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto; demostraron la dedicación requerida y atendieron de manera diligente las responsabilidades inherentes a sus respectivos roles.

19 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría de N° SI-CMA-001-2025 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA". El valor del contrato corresponde a MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 1.480.084.416,00).

FORMA DE PAGO INTERVENTORIA:

- La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

A la fecha se reporta el siguiente tramite de pago por parte de la interventoría.

No.	CONCEPTO/OBRA	FECHA	VALOR (\$)	ESTADO
1	Acta parcial de interventoría No. 1	22-sep-25	\$ 246.805.685,84	Pagado
2	Acta parcial de interventoría No. 2	03-dic-2025	\$ 369.069.103,76	Pagado
3	Acta parcial de interventoría No. 3	27-mar-2026	\$ 369.937.803,76	Trámite
TOTAL, DESEMBOLSOS			\$ 615.874.789,60	
TOTAL ACTAS PARCIALES TRAMITADAS			\$ 985.812.593,36	

20 PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y normativos, se adjunta al presente informe la documentación soporte de los pagos correspondientes a los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, si aplica) del personal de la Interventoría asignado al seguimiento y control del contrato respectivo durante el periodo evaluado.

Se espera que la supervisión realice la revisión y verificación pertinente de estos pagos para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del equipo interventor. (VER ANEXOS)


21 INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Durante el periodo del presente informe, la gestión socio-ambiental del proyecto se centró en el seguimiento del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y en las actas de cierre con las comunidades de los sectores Santa Clara, y Villa Rocío en el sector 6 de Marzo. Se verificó la implementación de las veedurías ciudadanas conformadas en estos sectores, como mecanismo de participación y control social del proyecto.

Para este componente se gestionó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, el cual fue expedido por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS mediante RESOLUCIÓN N° 107 de 03 de Julio de 2025.

En cuanto al componente social, se mantuvo la comunicación con las comunidades de los diferentes frentes en intervención, a través de los canales establecidos. Es de anotar que no se reportaron incidentes significativos durante este periodo.

El seguimiento a estos aspectos continuará siendo prioritario para esta Interventoría, buscando garantizar un desarrollo del proyecto que minimice impactos ambientales negativos y fomente la participación de las comunidades beneficiarias de esta importante obra.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

22 INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la gestión del Plan de Calidad se enfocó en asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos para la ejecución del proyecto.

Se realizaron densidades y ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales empleados, cuyos resultados se reportan en el presente informe y algunos están a la espera por parte del laboratorio tal y como se especificó anteriormente. Adicionalmente, se llevó a cabo un monitoreo y evaluación de los procedimientos constructivos implementados por el contratista, mediante visitas técnicas y permanencia en campo.

Los reportes semanales emitidos por esta Interventoría reflejan, en general, una adecuada ejecución de estas actividades, cumpliendo con los parámetros de calidad exigidos. Es de anotar que el contratista, tomó las medidas correctivas inmediatas para subsanar las situaciones de curado de los concretos, fisuras en losas y estampado de andenes, atendiendo las observaciones hechas por esta interventoría.

Se reiteró la importancia de la implementación sistemática del curado las losas fundidas para garantizar su durabilidad y óptima resistencia, se verifica que los ensayos de laboratorio (densidades, granulometrías, resistencias) se realicen correctamente y cumplan las especificaciones contratadas, se supervisa la correcta ejecución de las capas que conforman la estructura del pavimento.


Esta Interventoría continuará realizando estricto seguimiento a los procesos constructivos y a los resultados de los ensayos para asegurar la calidad y estabilidad de la obra.

23 CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO)

Durante el periodo del presente informe, el avance físico acumulado del proyecto es del 83.77% de ejecución, en relación con la reprogramación establecida en el balance de obra 2 que representa un 79.93%. En este porcentaje de avance se refleja el progreso con un superávit del 3.84% en la ejecución de las actividades descritas anteriormente en el presente documento.

En cuanto al aspecto financiero, el valor del anticipo por \$8.315.230.290.00, equivalente al 30% del valor del contrato, se reporta como pagado mediante desembolso al contratista, el cual se viene amortizando en igual proporción de las actas parciales de obra.

El avance financiero a la fecha, con respecto a los pagos recibidos por parte del contratista, corresponde a un 66.24% (descontados los imprevistos no ejecutados) del valor total del contrato, y asociado a las actividades efectivamente realizadas por el contratista y supervisadas y certificadas por la presente interventoría. El contratista a la fecha ha presentado dos actas parciales de obra en estado PAGADO por parte de la entidad contratante.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA											
VALOR DEL PROYECTO			\$		27.717.434,300						
ANTICIPO DEL (30%)			\$		8.315.230,290						
IMPREVISTOS (1%)			\$		208.602,608						
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR EJECUTADO	(%) AVANCE EJECUTADO	DESCUENTO IMPREVISTOS (No Ejecutados)	VALOR A FACTURAR	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR BRUTO A PAGAR (Antes de impuestos)	(%) FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO
1	31/10/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	\$ 10.160.149.492,00	36,73%	\$ 76.579.516,56	\$ 10.103.569.975,44	\$ 3.031.070.992,83	\$ 7.072.498.983	36,45%	\$ 17.537.284.803	PAGADA
2	9/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	\$ 8.319.430.311,62	30,02%	\$ 62.582.381,30	\$ 3.256.848.530,32	\$ 2.477.054.559,10	\$ 5.779.793.971	29,79%	\$ 9.217.853.895	PAGADA
3											
4											
TOTALES			\$ 18.499.580.403,62	66,74%	\$ 139.161.897,86	\$ 16.360.418.505,76	\$ 5.508.125.551,73	\$ 12.852.292.954,03	66,24%		

Tabla de Pagos

24 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta al presente informe mensual un registro fotográfico que documenta el avance de las actividades constructivas desarrolladas durante el periodo respectivo en los diferentes sectores de trabajo del proyecto.

Este material visual anexo al presente documento complementa la información detallada en los apartados anteriores del informe, permitiendo una mejor comprensión del progreso físico de la obra y evidenciando las condiciones de ejecución en sitio. (VER ANEXOS SEMANALES)

25 INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA


Durante el este periodo de ejecución de la obra, la Interventoría continúa desplegando una gestión integral orientada al cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y legal del objeto contractual, certificando el avance y la correcta ejecución de las actividades iniciales conforme a los requerimientos técnicos pertinentes.

En la fase preliminar o de planeación, se realizó la respectiva gestión documental, con la revisión y verificación de la documentación presentada por el contratista de obra, incluyendo las hojas de vida del personal clave evaluable, la relación del equipo propuesto para la ejecución, y la totalidad de los documentos necesarios para la formalización y suscripción del acta de Inicio.

Adicionalmente, se verificó la existencia y suficiencia de los planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones técnicas indispensables para el inicio y la correcta ejecución de las obras pactadas.

Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y un seguimiento proactivo del proyecto, se programan y coordinan con el contratista, reuniones y comités de seguimiento periódico, asegurando así un flujo constante de información clara y veraz con la supervisión de obras.

La Interventoría ha establecido y mantiene la trazabilidad y un expediente de archivos organizado y actualizado de toda la documentación relevante del proyecto. Este expediente incluye la correspondencia oficial, la información preliminar, los informes técnicos detallados, las actas de los comités de obra, los planos constructivos y cualquier otro documento necesario para el control del desarrollo del proyecto.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Esta gestión documental garantiza el conducto regular y la disponibilidad de la información necesaria para determinar las características completas de la obra ejecutada y facilita la toma de decisiones oportuna por parte de la entidad contratante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las obras se continúan ejecutando de conformidad con los diseños y reajustes suministrados por la entidad contratante para cada uno de los sectores que conforman el proyecto; dando cumplimiento a las especificaciones técnicas de construcción, de calidad y de acuerdo a los plazos y tiempos establecidos contractualmente.


En relación con el recorrido de inspección técnica realizado en compañía del contratista de obra en el frente 6 de Marzo, se informa que se han atendido formalmente las observaciones referentes al resane de fisuras identificadas tanto en las losas del pavimento como en las zonas de andenes. Al respecto, el contratista ya ha adoptado las medidas correctivas pertinentes y, a la fecha, se encuentra ejecutando activamente las labores de resane y subsanación de los inconvenientes presentados en sitio. Estas actividades de intervención buscan garantizar que los acabados y la integridad estructural de los elementos cumplan a cabalidad con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad exigidos para el proyecto.

El día 20 de marzo de 2026, se formalizó la aprobación del balance de obra No. 2 por parte de la interventoría y, posteriormente, por la entidad contratante, consolidando así el balance de mayores y menores cantidades de obra ejecutadas y algunas por ejecutar. En este proceso se integraron además los ítems no previstos identificados durante el desarrollo del proyecto, los cuales fueron debidamente soportados mediante una adición de recursos. Esta inyección presupuestal permitió cubrir tanto las cantidades adicionales como las nuevas actividades necesarias, garantizando el respaldo técnico y financiero para la culminación exitosa del alcance contractual

El contratista remite a esta interventoría la comunicación emitida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), mediante la cual se acusa recibo del reporte de las cantidades de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) correspondientes al contrato de la referencia, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1257 de 2021

Se destaca y resalta la disposición del personal del contratista en la atención de las solicitudes de información y coordinación, y su cooperación y acciones inmediatas ante los requerimientos y observaciones que se le han dado en el transcurso de la ejecución de la obra con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos.

La gestión socio-ambiental continua con acercamientos con la comunidad beneficiaria y las veedurías. Se cuenta el con cierre de actas de vecindad en sectores 6 de marzo en el frente de Villa Rocío, Monteverde, El Recreo y Santa Claro, y aperturadas las del sector de El Tapao



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

El proyecto presenta un avance acumulado ejecutado del 83.77% frente a un avance programado del 79.93%, lo que refleja a la fecha un avance superior del 3.84% asociado al buen rendimiento en obra debido a la disposición del personal, materiales y equipos permanentes en campo para cada uno de los sectores en intervención.

Los procesos de verificación de materiales y procedimientos ejecutados por la interventoría han sido efectivos, resultando en trabajos que cumplen con las especificaciones técnicas, de calidad y de diseño establecidas.

La gestión de imprevistos ha sido mínima o inexistente, lo que indica una buena planificación inicial y una coordinación fluida entre las partes.

Los informes de avance semanal reflejan que cantidades ejecutadas corresponden a la realidad del proyecto en campo y están debidamente verificadas y soportadas para la certificación de pagos.

Se recomienda mantener el ritmo ejecución y la calidad de la obra, ya que es fundamental que el contratista mantenga el nivel actual de rendimiento y que la interventoría continúe aplicando los controles de calidad de manera rigurosa, especialmente en las fases críticas restantes (ej. Llenos, subbase, resistencia de los concretos, entre otros).


Es importante asegurarse que todos los soportes administrativos y legales (seguridad social, pólizas, permisos, etc.) se mantengan vigentes y al día, ya que el buen avance técnico no exime el cumplimiento de estas obligaciones.

Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista CONSORCIO VIAS DEL SINÚ, en lo que corresponde a la parte técnica, financiera y jurídica del contrato.

En términos generales, la Interventoría evalúa y verifica que el proyecto, en su fase de ejecución, se encuentra por encima de los parámetros esperados para su etapa de avance, a excepción de los casos fortuitos como las lluvias. Se percibe una gestión activa por parte del contratista en el desarrollo de las actividades constructivas, demostrando un compromiso con el avance de la obra.

No obstante, desde esta interventoría se reitera la necesidad de mantener un seguimiento constante para asegurar la continuidad de esta gestión positiva y garantizar el cumplimiento de las especificaciones y plazos establecidos a medida que el proyecto avance en sus diferentes etapas y así evitar futuros atrasos considerables en la reprogramación aprobada.

Se concluye que la ejecución física de la obra se encuentra alineada con el cronograma contractual, sin desviaciones negativas significativas que afecten el plazo de entrega.



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA N°10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Se adjuntan todos los anexos descritos en el presente documento.

Cordialmente,

Diego Villadiego
DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPÍTA
Representante Legal
CONSORCIO IDC
Interventor



**INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026**



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS															
FECHA DE PRESENTACIÓN:		viernes, 10 de abril de 2026		MES		10		DEL		6-mar-26		AL		2-abr-26	
CONTRATO DE INTERVENTORIA															
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTIPIERRE, CORDOBA"															
CONTRATISTA:		CONSORCIO DC		NIT:		901.947.262-6		DIRECCIÓN:				FECHA DE INICIO:		6/06/2025	
REP. LEGAL:		DIEGO VALADUEGO ESPITIA		FECHA DE INICIO:				FECHA DE FINAL:				5/06/2025			
CONTRATO No. SI-CMA-001-2025															
PLAZO INICIAL:		12 MESES		VALOR INICIAL INTER:		\$ 1.480.084.416,00		ADICIONES:				FECHA ADICIÓN:			
PRORROGA 1:		FECHA PRORROGA:		VALOR TOTAL:		\$ 1.480.084.416,00									
CONTRATO DE OBRA															
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTIPIERRE, CORDOBA															
CONTRATISTA:		CONSORCIO VAS DEL SINU		NIT:		901.919.377-5		DIRECCIÓN:				FECHA DE INICIO:		6/06/2025	
REP. LEGAL:		CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ		CONTRATO No. SI-P-003-2024		CONSORCIO DC		DIRECCIÓN:				FECHA DE FINAL:		5/06/2026	
PLAZO INICIAL:		12 MESES		VALOR INICIAL OBRA:		\$ 27.717.434.300,00		ADICIONES:				FECHA ADICIÓN:			
PRORROGA 1:		FECHA PRORROGA:		VALOR TOTAL:		\$ 29.599.741.339,00						20 DE MARZO DE 2026			
II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA															
ESQUEMA FINANCIERO		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		30%		SOBRE VALOR INICIAL (\$27.717.434.300,00)		\$ 8.315.230.250,00		DESEMBOLESAO?				SI	
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS:															
PARCIAL 1:		\$ 10.180.149.492,00		RESUMEN DE AMORTIZACIONES DEL ANTICIPO:											
PARCIAL 2:		\$ 8.319.430.911,62													
PARCIAL 3:															
ACTA FINAL:															
TOTAL PAGADO:		\$ 18.499.580.403,62													
PENDIENTE POR PAGAR:		\$ 11.100.200.935,38													
III. INFORMACIÓN PÓLIZAS															
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNIUAL		FECHA DE EXPEDICIÓN:		10/06/2025		BENEFICIARIO:		DEPARTAMENTO DE CORDOBA		CONSORCIO VAS DEL SINU			
IV. AVANCE FÍSICO															
CUMPLIMIENTO		N° ANEXO		N° ANEXO		N° ANEXO		N° ANEXO		N° ANEXO		N° ANEXO		N° ANEXO	
HOMBRE AMPARO		SUMA ASEGURADA		DESDE		HASTA		VICENCIA		5% Y CONT		SUMA ASEGURADA		T. CONTRACT	
CUMPLIMIENTO		\$ 2.959.978.136,90		6/06/2025		10/12/2026		LIQ. CONT		AMPARO BASICO, PREMIOS, LABORES Y OPERACIONES		\$ 1.479.999.069,45		HASTA	
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2.959.978.136,90		6/06/2025		9/06/2029		CONT Y 3 AÑOS		PATRONAL		\$		9/06/2029	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		\$ 2.959.978.136,90		6/06/2025		9/06/2031		5 AÑOS FIN OBRA		CONSTRATISTA Y SUBCONTRATISTA		\$		9/06/2029	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		\$ 8.315.230.250,00		6/06/2025		10/12/2026		LIQ. o AMORT		VEHICULOS PROPIOS Y HO PROPIOS		\$		9/06/2029	
V. AVANCE FÍSICO															
A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMANA A SEMANA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE REPORTE, Y LAS CANTIDADES ACUMULADAS DE LOS ÍTEMES INTERVENIDOS A LA FECHA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO Y DEL BALANCE 2 DE OBRA:															
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNID.		CANT. PRESU		BALANCE		BALANCE 2		ACUM. ANTE		ACUM. MES	
Vr. TOTAL EJEC.		Vr. UNITARIO		Vr. TOTAL EJEC.		MES		Vr. TOTAL EJEC.		MES		Vr. TOTAL EJEC.		MES	



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECTOR EL RECREO																		
1.1.1	DEMOICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	319.51	324.31	319.51		4.60			324.31	\$	544,411.181,82						
1.1.2	DEMOICIÓN DE ANDETES DE CONCRETO	M2	69.56	69.56	69.56		56.07			125.25	\$	278,844.40						
1.1.3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLORACION Y CANALES	M3	5.25	5.25	5.25		302.13			112.04	\$	21,109,983.11						
1.1.4	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLORACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	5.25	5.25	5.25		302.13			112.04	\$	21,109,983.11						
1.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (T2/D0)	M2	728.09	728.09	728.09		324.03			174.39	\$	16,617,205.87						
1.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	89.57	89.57	89.57		43.46			24.67	\$	1,391,724.91						
2.1.7	RELOCACION DE ESPECIES VEGETALES (PALA DE ARBOLES AL TIPO ENTRE SI Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACTACION DE RAIZ)	UNID	0.00	0.00	0.00		3.00			3.00	\$	34,363,620.34						
3.1.7	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	244.97	223.98	207.52		207.52			207.52	\$	615,597.00						
1.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	244.97	223.98	207.52		207.52			207.52	\$	615,597.00						
1.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C+1cm	M3	127.50	127.50	125.57		125.57			125.57	\$	32,338,120.97						
1.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA PAVO PARA FALLOS	M3	415.41	365.52	728.40		305.52			207.78	\$	120,617,916.56						
1.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO P=15CUI)	M3	1550.78	114.95	172.35		114.95			21.20	\$	8,318,410.68						
1.3.1	PAVAMENTO EN CONCRETO HOMOGENEO (40 KG/CMT) E=0.20 CM	M2	1575.63	1575.63	1562.43		1562.43			1562.43	\$	1,369,742.00						
1.3.2	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCION DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL	KG	28385.66	28385.66	28322.27		28322.27			28322.27	\$	3,707,769,646.27						
1.3.3	CONSTRUCCION DE JUNITAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNITAS Y SELLADO	M	3213.72	3213.72	3213.72		3213.72			3213.72	\$	24,575.00						
1.3.4	BORILLADO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50x40x20), INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2005.65	1787.60	1787.60		1787.60			1787.60	\$	1,847,961.00						
1.4.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLORACION Y CANALES	M3	1127.10	0.00	82.52		82.52			82.52	\$	29,055.00						
1.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCION DE TERRENO	M3	1127.10	0.00	2.04		2.04			2.04	\$	423,149.00						
1.4.3	DEMOICION DE ANDETES DE CONCRETO	M2	63.51	0.00	0.00		0.00			0.00	\$	37,622.00						
1.4.4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	74.31	0.00	0.00		0.00			0.00	\$	33,334.00						
1.4.5	CONCRETO CLASE F PARA SOLADO DE LIMPEZA E=0.06cm	M2	33.11	0.00	22.67		22.67			22.67	\$	45,360.00						
1.4.6	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPa	KG	3375.64	0.00	833.57		833.57			833.57	\$	10,723,166.52						
1.4.7	CONSTRUCCION DE CARCAJO EN CONCRETO 21 MPa MEDIDAS INTERNAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	M	57.51	0.00	18.19		18.19			18.19	\$	637,155.00						
1.4.8	CAJA DE INUNDACIONES DE 1.8 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RIGIDO, TIPO VEREDERO	UN	1.00	0.00	0.00		0.00			0.00	\$	3,561,000.00						
1.4.9	CAJA DE INUNDACIONES DE 1.8 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RIGIDO, TIPO VEREDERO	UN	1.00	0.00	0.00		0.00			0.00	\$	3,561,000.00						
1.4.10	TAPAS DE INSPECCION PARA CARCAJO DE 0.9 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO	UN	6.00	0.00	2.00		2.00			2.00	\$	189,591.00						
3.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (AFERIDO E=40 CM)	M3	0.00	0.00	32.93		32.93			32.93	\$	158,015.00						
1.5.1	SI TABLETA GUIA PREF. FACIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20x0.20x0.20 M X 0.06 M COLOR AMARILLO TIPO TOPERO (UNA PIEZA CON MORTERO 1:4, INCLUYE AREIA H=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20 M Y JUNITAS SELLADAS	M2	159.21	0.00	8.40		8.40			8.40	\$	265,537.00						
1.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA UNIDADES VISUALES CON LOSETA GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4, AREIA H=4 CM, INSTALACION COMPACTADA, JUNITAS SELLADAS CON AREIA	M	786.17	1128.27	490.10		490.10			490.10	\$	71,199.00						
1.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA UNIDADES VISUALES CON LOSETA GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4, AREIA H=4 CM, INSTALACION COMPACTADA, JUNITAS SELLADAS CON AREIA	M	786.17	1128.27	490.10		490.10			490.10	\$	71,199.00						
1.5.4	CONSTRUCCION FIBRO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RIGIDA, 21 MPa (3.000 PSI), E=0.08 M FUNDIDO EN SITIO, JUNITAS SEGUN DISEÑO INCLUYE EXCAVACION, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	493.03	261.92	725.27		725.27			725.27	\$	182,433.00						
1.5.7	SA BORDADOS ALTO EN HIERRO TIPO A63 - 10M EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNID	51.00	92.00	52.00		52.00			52.00	\$	475,652.00						
1.6.1	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM) INCLUYE SUPLENTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROSEFAS	M	3642.43	3642.43	3413.16		3413.16			3413.16	\$	11,253.00						
1.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO BR. SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA (20X60 CM)	UNID	46.00	46.00	45.00		45.00			45.00	\$	636,973.00						
1.6.3	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE SUPLENTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROSEFAS)	M2	271.97	271.97	257.24		257.24			257.24	\$	104,900.00						
1.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERMANENTE	M	73.07	73.07	33.60		33.60			33.60	\$	47,529.00						
1.7.1	REPARACION DE DOMICULIARAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNID	25.00	25.00	26.00		26.00			26.00	\$	213,904.00						
1.7.2	REPARACION TIPO MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UNID	1.00	1.00	1.00		1.00			1.00	\$	2,139,040.00						
1.8.2	SUMINISTRO, INSTALACION E HIGADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MIS. - 750 KG.)	UNID	1.00	0.00	1.00		1.00			1.00	\$	12,659,460.00						
1.8.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON CONCRETO DE 400 PSI POSTE EN CONCRETO DE (12 MIS. - 750 KG.)	UNID	1.00	0.00	1.00		1.00			1.00	\$	4,303,163.00						
1.8.4	SUMINISTRO, INSTALACION E HIGADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MIS. - 750 KG.)	UNID	1.00	2.00	2.00		2.00			2.00	\$	5,115,579.00						

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026



**GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA**

1.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS. - 1050 KGF)	UNID	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$	922.037,00	\$	-	\$	1.844.074,00
1.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FRI DE LINEA CON DISPOSICION CENTRAL. TRESASO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO RONDABLE	UNID	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$	6.078.923,00	\$	-	\$	12.157.846,00
1.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL. TRESASO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO RONDABLE	UNID	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$	3.150.278,00	\$	-	\$	7.760.556,00
1.8.8	SUMINISTRO, RECOR, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA. M1 BIFASICA. AEREA. EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - 180. 104KV	IA	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	\$	104.782,00	\$	5.239.600,00	\$	5.239.600,00
1.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 MTS	UNID	2,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	\$	2.108.765,00	\$	6.328.285,00	\$	6.328.285,00
1.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE M1 TRESASO A 13.2 KV	UNID	3,00	4,00	5,00	4,00	4,00	1,00	1,00	\$	4.717.204,00	\$	4.717.204,00	\$	23.588.020,00
1.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UNID	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	\$	8.299.515,00	\$	-	\$	16.599.030,00
1.8.12	RETRO CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	GLB	28,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	\$	2.103.798,00	\$	4.207.596,00	\$	4.207.596,00
1.8.14	SUMINISTRO, INSTALACION E HIGADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS. - 510 KGF)	UNID	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	\$	3.285.223,00	\$	-	\$	13.140.892,00
1.8.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS. - 510 KGF)	UNID	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	\$	538.258,00	\$	-	\$	2.113.024,00
1.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 20KV/20 VOL	UNID	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	\$	799.429,00	\$	-	\$	3.197.716,00
1.8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UNID	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	\$	1.770.541,00	\$	1.770.541,00	\$	1.770.541,00
1.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRESASO DE BT A 120KV VOL. EN CINTA DE ACERO RONDABLE	UNID	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$	1.130.178,00	\$	-	\$	2.260.352,00
1.8.19	RETRO CON TENSIÓN A 20 V. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	UNID	35,00	0,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	\$	1.850.971,00	\$	5.552.922,00	\$	5.552.922,00
1.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.2KV/20KV) VOL. INCLUYE INSTALACION PUNTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	UNID	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$	10.019.825,00	\$	-	\$	10.019.825,00
1.8.21	SUMINISTRO, RECOR ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2x30 6 - 1x30 6) AWG	IA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	\$	69.425,00	\$	-	\$	4.164.300,00
1.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/20) VOL	UNID	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	\$	569.887,00	\$	-	\$	3.878.748,00
1.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNID	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	\$	762.645,00	\$	-	\$	3.812.240,00
1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HIGADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS. - 510 KGF)	UNID	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	\$	2.913.286,00	\$	-	\$	14.566.420,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS. - 510 KGF)	UNID	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	\$	553.114,00	\$	-	\$	2.765.570,00
1.8.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UNID	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	\$	705.357,00	\$	-	\$	2.821.448,00
NP 01	RANPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARNIEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANILLA EN CONCRETO	UNID	0,00	20,00	23,00	20,00	20,00	3,00	3,00	\$	519.838,00	\$	1.595.214,00	\$	11.595.214,00
NP 04	RELLENO EN AREA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	IA	0,00	0,00	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	\$	474.385,00	\$	26.034.248,80	\$	26.034.248,80
NP 09	RELLENO EN AREA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	IA	0,00	0,00	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	\$	122.087,00	\$	402.024,54	\$	402.024,54
NP 21	RANPA PARA USO VEHICULAR DE 120M X 120M INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPELOR, PLACA EN CONCRETO O 15MIS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNID	0,00	1,00	19,00	1,00	1,00	12,00	18,00	\$	1.434.955,00	\$	26.809.308,00	\$	28.404.164,00
NP 22	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOBLIZADO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UNID	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	\$	737.702,00	\$	737.702,00	\$	737.702,00
NP 24	TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO.	IA	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	\$	191.615,00	\$	2.414.149,00	\$	2.414.149,00
NP 25	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO	GLB	0,00	0,00	777,50	777,50	777,50	777,50	777,50	\$	14.160,00	\$	11.009.400,00	\$	11.009.400,00
NP 27	ADECUACION DE CAJAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNID	0,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	\$	784.145,00	\$	-	\$	6.373.180,00
NP 28	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	IA	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	\$	224.250,00	\$	364.406,25	\$	364.406,25
NP 33	ANGULOS DE 3" x 30". DE 90CM DE ANCHO, INCLUYE BISAGRAS CILINDRICAS PARA ABERTURA. ANTI CORROSIVO Y PINTURA	IA	0,00	0,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	\$	1.266.200,00	\$	14.581.300,00	\$	14.581.300,00
NP 35	DE NIVEL, LOSETA, TOPELOR, PLACA EN CONCRETO O 15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL Y RELLENO SELECCIONADO.	IA	0,00	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	\$	355.941,00	\$	3.608.568,70	\$	3.608.568,70
NP 16	INSTALACION EN TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN EN CABLE TREJAZADO A 240V	UNID	0,00	20,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	\$	4.392.376,00	\$	17.569.504,00	\$	17.569.504,00
NP 11	DE INSTALACION EN TENSIÓN A 20V DE POSTE EN CONCRETO 5510 kgf	UNID	0,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	\$	5.582.709,00	\$	17.948.327,00	\$	17.948.327,00
NP 12	DE INSTALACION DE RETIRO EN TENSIÓN DE ARMADO, RED ABERTA O TREJAZADA DE BAJA TENSIÓN	GLB	0,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	\$	3.971.500,00	\$	19.857.500,00	\$	19.857.500,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UNID	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	\$	3.179.750,00	\$	68.854.500,00	\$	68.854.500,00
NP 14	DESARMADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 13.2 KV INCLUYE RELLENO DE LOTADE	UNID	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	\$	4.551.733,00	\$	8.103.466,00	\$	9.903.466,00
NP 15	DE ARMADO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDEJA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIA TENSION A 13.2 KV	UNID	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	\$	5.085.106,00	\$	20.340.684,00	\$	20.340.684,00



**INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026**



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP 16	DESHUCCIO DE POSTE DE 9 UITS CON TENSIÓN 200V INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UITD	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
-------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



**INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026**



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

Nº 22	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026



GOBERNACIÓN DE
CORDOBA

3.6.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS. * 750 NCF.)	UNID	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$	775.489,00	\$	-	\$	1.550.978,00
3.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALIMENTACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFÁSICA A 132 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UNID	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$	4.371.600,00	\$	-	\$	4.371.600,00
3.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 132 KV	UNID	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	3,00	\$	4.717.204,00	\$	-	\$	4.717.204,00
3.6.12	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 132 KV	UNID	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	3,00	\$	8.299.515,00	\$	-	\$	8.299.515,00
3.6.14	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 132 KV	UNID	5,00	2,00	2,00	2,00	0,00	5,00	\$	3.285.220,00	\$	-	\$	6.570.440,00
3.6.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS. * 510 NCF.)	UNID	5,00	2,00	2,00	2,00	0,00	5,00	\$	528.258,00	\$	-	\$	1.056.516,00
3.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALIMENTACION - ANILLO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UNID	6,00	3,00	4,00	3,00	1,00	6,00	\$	799.429,00	\$	-	\$	3.197.718,00
3.6.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TENSIÓN DE BT A 120/40 VOL. EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UNID	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00	3,00	\$	1.130.176,00	\$	-	\$	2.260.352,00
3.6.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/20/120 VOL. INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMAYE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	UNID	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	\$	10.019.816,00	\$	-	\$	10.019.816,00
3.6.21	SUMINISTRO, RIEGO, MUDAJE Y TENSIÓNADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (24x6 6 + UNO 6) JAVG.	M	950,00	91,17	100,00	91,17	8,83	9,83	\$	69.405,00	\$	612.842,15	\$	6.940.990,00
3.6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINTELALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	UNID	9,00	6,00	5,00	5,00	0,00	9,00	\$	762.648,00	\$	-	\$	3.813.240,00
3.6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINTELALACION DE RED TELEFONICA	UNID	8,00	10,00	1,00	1,00	0,00	8,00	\$	705.362,00	\$	-	\$	705.362,00
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UNID	0,00	21,00	14,00	14,00	0,00	14,00	\$	519.838,00	\$	-	\$	7.277.732,00
NP 02	CONCRETO DE ZAMPA PARA BOX CULTVERT	M3	0,00	18,81	18,81	18,81	0,00	18,81	\$	1.305.535,00	\$	-	\$	24.564.637,35
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	157,29	156,14	156,14	1,15	1,15	\$	117.066,00	\$	134.625,50	\$	18.413.311,14
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 10" (INCLUYE ARMADURA)	M	0,00	38,53	21,00	18,53	2,37	2,37	\$	209.851,00	\$	468.872,87	\$	4.402.871,00
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 12" (INCLUYE ARMADURA)	M	0,00	356,11	356,11	356,11	11,94	11,94	\$	289.400,00	\$	3.347.978,00	\$	103.201.220,00
NP 06	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO REFORZADO, MEDIDAS INTERIAS 0,80X0,80 M. - ALTURA VARIABLE 0,40-1,20m	UNID	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	\$	1.488.427,00	\$	-	\$	31.258.967,00
NP 09	RELLENO EN AREIA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	12,56	12,56	11,56	0,97	0,97	\$	122.092,00	\$	118.429,24	\$	1.533.475,52
NP 27	ADecuación de CAMARAS DE INSPECCION (MURROSES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNID	0,00	8,00	9,00	8,00	1,00	1,00	\$	784.145,00	\$	764.145,00	\$	7.671.305,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20M X 1,20M. INCLUYE BORILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNID	0,00	1,00	8,00	8,00	1,00	7,00	\$	1.494.955,00	\$	10.464.592,00	\$	11.959.648,00
NP 22	DEMOICION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALUMBRADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UNID	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	\$	737.702,00	\$	24.344.168,00	\$	24.344.168,00
NP 24	TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	0,00	0,00	71,40	71,40	71,40	71,40	\$	191.615,00	\$	13.581.311,00	\$	13.581.311,00
NP 28	EXCAVACION MANUAL	M3	0,00	0,00	228,58	228,58	228,58	228,58	\$	45.500,00	\$	10.038.572,00	\$	10.038.572,00
NP 31	REUBRICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 12" EXCAVACION Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UNID	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	\$	194.532,00	\$	5.641.428,00	\$	5.641.428,00
NP 32	REUBRICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 12" EXCAVACION Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR	UNID	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	\$	260.332,00	\$	560.661,00	\$	560.661,00
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE PARA AGUAS LLUVIAS, EN PLATINAS DE 3" X 1M Y ANCHOS DE 3" X 36". DE 60CM DE ANCHO. INCLUYE BISAGRAS CILINDRICAS PARA ABERTURA, ANTICORROSION Y PINTURA	M	0,00	0,00	33,71	33,71	33,71	33,71	\$	1.265.200,00	\$	42.683.602,00	\$	42.683.602,00
NP 10	INSTALACION EN TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN EN CABLE TREJIZADO A 240V.	UNID	0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	6,00	\$	4.392.376,00	\$	-	\$	21.951.880,00
NP 11	INSTALACION EN TENSIÓN A 240V. DE POSTE EN CONCRETO 540/10 Lf	UNID	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$	5.952.709,00	\$	-	\$	11.905.418,00
NP 12	DEINSTALACION O RETIRO EN TENSIÓN DE ARMADO, RED ABIERTA O TREJIZADA DE BAJA TENSIÓN	UNID	0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	6,00	\$	3.971.500,00	\$	-	\$	19.837.500,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UNID	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	\$	3.129.750,00	\$	-	\$	15.648.750,00
NP 14	DESHIQUADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 132 KV INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UNID	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	\$	4.551.733,00	\$	-	\$	4.551.733,00
NP 15	DESHIQUADO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALIMENTACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFÁSICO DE RED DE MEDIA TENSIÓN A 132 KV	UNID	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	\$	5.045.166,00	\$	-	\$	5.045.166,00
NP 16	DESHIQUADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UNID	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	\$	3.129.750,00	\$	-	\$	6.259.500,00
NP 17	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 132 KV. INCLUYE EXCAVACION - RELLENO DE HOYADA	UNID	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$	3.276.473,00	\$	-	\$	3.276.473,00
NP 18	DESHIQUADO Y AMARRE DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN TENSIÓN. PARA ARMADO EN ALIMENTACION CON DISPOSICION EN BANDERA	UNID	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	\$	3.113.973,00	\$	-	\$	3.113.973,00
SECTOR DE 6 MARZO - VILLA ROCIO - PASA TIEMPO											\$	1.132.142.311,93	\$	2.812.18.246,43



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026



GOBERNACIÓN DE
CORDOBA

4.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDARQUES DE CONCRETO	M2	1838.61	1838.61	3048.10	1838.61	355.56	421.23	313.60	1050.39	37.682.00	\$	41,098,075.98	\$	110,170,571.00
4.1.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CAÑALES	M3	5012.20	5012.20	834.6	733.78				0.00	755.78	\$	20,095.00	\$	213,434,658.78
4.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CAÑALES PARA FALLOS	M3	652.28	190.9	594.1	190.90	105.87	125.37	114.76	587.85	553.70	\$	33,334.00	\$	12,260,245.20
4.1.5	GEDTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (1717.00)	M2	12438.12	1114.6	10320.5	9240.99				0.00	9240.99	\$	20,028.00	\$	18,775,028.00
4.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3	12325.26	12225.9	12152.5	10819.10				0.00	10819.10	\$	35,161.00	\$	391,220,382.24
4.1.7	REMOCIÓN DE ESPÉCIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE 8/12)	U100	45.00	45.0	69.0	45.00	24.00			24.00	69.00	\$	441,297.00	\$	10,591,128.00
4.1.8	REMOCIÓN DE ESPÉCIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5 Y 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE 8/12)	U100	39.00	39.0	12.0		12.00			12.00	12.00	\$	615,597.00	\$	7,391,844.00
4.1.9	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES INADERABLES DE ESPÉCIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	U100	420.00	420.0	420.0					0.00	0.00	\$	227,187.00	\$	-
4.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	437.13	403.9	334.5	355.36				0.00	355.36	\$	158,015.00	\$	530,355,146.39
4.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C + 15cm	M3	1775.87	1775.9	1744.6	1527.72				0.00	1527.72	\$	287,812.00	\$	435,788,190.69
4.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	1305.18	381.5	594.1	381.53	171.14			171.14	553.70	\$	285,959.00	\$	50,654,487.23
4.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECUBRIMIENTO)	M3	459.44	145.1	120.1	95.50				0.00	95.50	\$	144,978.00	\$	13,550,768.00
4.3.1	PAYMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 N/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CAJASTILLA, E=0.20 CM	M3	2215.87	2215.9	2215.0	1852.21				0.00	1852.21	\$	1,389,242.00	\$	2,587,003,121.30
4.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	39401.04	39401.0	44881.1	38827.87				0.00	38827.87	\$	12,854.00	\$	499,451,633.02
4.3.4	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	4809.07	4809.1	4977.8	4108.26	165.61			165.61	4274.91	\$	24,975.00	\$	4,161,168.00
4.3.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (60x40x20), INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	952.20	3559.5	2500.0	2683.38	45.44			45.44	2153.02	\$	165,143.00	\$	7,549,537.92
4.4.1	DE MOLICIÓN DE CUEVAS EXISTENTES	M3	249.28	245.3	781.0	245.28	208.71	223.45	100.50	532.72	781.00	\$	31,556.00	\$	16,700,883.32
4.4.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CAÑALES	M3	551.14	0.0	43.3		11.00			11.00	11.00	\$	29,095.00	\$	320,045.00
4.4.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CAÑALES (AFIRADO E=35 CM)	M3	170.05	0.0	97.8					0.00	0.00	\$	158,015.00	\$	-
4.4.4	REJALADO DE CAPACIÓN PARA SUBSIDIO EN PLASTICO RECICLADO SOCIAL/COMUN	U100	22.00	30.0	30.0					0.00	0.00	\$	914,671.00	\$	-
4.4.14	ACERO DE REFUERZO PY 400 JAPA	KG	24392.70	1126.8	1265.4					0.00	0.00	\$	12,284.00	\$	-
4.4.2	CONCRETO C/0.020 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO	M3	0.00	0.0	11.0		7.15		3.85	11.00	11.00	\$	423,349.00	\$	4,558,839.00
4.5.1	SA TABLETA GUÍA PREF. TACTIL PARA DSCAP, EN CONCRETO DE 0.20mx0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOFEROLO (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA 11-0.04m RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	79.61	0.0	34.8			5.40			5.40	\$	292,537.00	\$	1,578,689.80
4.5.2	FRANJA DEMARCADORA PARA UNIDADES VISUALES CON ADICIÓN DE CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA ENBIEREN EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO, INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA 11-0.04m, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	391.09	257.1	257.0	212.82				0.00	212.82	\$	71,199.00	\$	151,057,222.38
4.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA UNIDADES VISUALES CON ADICIÓN DE CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA ENBIEREN EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO, INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA 11-0.04m, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	391.09	3072.8	2670.0	212.82			208.26	208.26	208.26	\$	49,543.00	\$	9,694,441.47
4.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO ROMBO, 21 UPA 0.000 PSI, E=0.08m FUNDIDO ENBITO, JUNTAS SEGUN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	234.02	1906.0	1940.0	1489.55			153.17	153.17	153.17	\$	182,483.00	\$	28,863,701.08
4.5.7	SA BOLLAROS ALTO EN HIERRO TIPO M3 - 100 EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	U100	29.00	359.0	369.0	57.00	268.00			268.00	323.00	\$	475,622.00	\$	126,523,432.00
4.6.1	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M(12CM) (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROSEFERS)	M	5339.23	5339.2	5108.1	1831.00	2650.60	612.50			2650.60	\$	415,414.00	\$	30,413,347.70
4.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR PY 50 SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA (60x60 CM)	U100	167.00	167.0	165.0	16.00	79.00	43.00		122.00	122.00	\$	655,973.00	\$	109,430,706.00
4.6.3	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROSEFERS)	M2	355.80	355.8	382.3	112.76	154.19	83.03		237.22	237.22	\$	101,500.00	\$	24,884,160.20
4.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERMANENTE	M	30.00	104.0	103.2	12.06	50.19	27.03		77.22	80.23	\$	487,929.00	\$	38,133,477.38
4.7.1	REPARACIÓN DE DOMICILIAS DEL ADJUDICATARIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	U100	21.00	21.0	69.0	21.00	78.00			78.00	78.00	\$	213,904.00	\$	16,684,512.00
4.7.2	REUBICACIÓN TIPO MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	U100	2.00	2.0	2.0	2.00				0.00	0.00	\$	477,758.00	\$	95,515.00
4.7.3	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALICATILADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	U100	42.00	42.0	42.0	42.00				0.00	0.00	\$	238,115.00	\$	-
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 (12 MTS - 750 KGF)	U100	1.00	2.0	2.0	2.00				0.00	0.00	\$	4,307,168.00	\$	-
4.8.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI/A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	U100	1.00	2.0	2.0	2.00				0.00	0.00	\$	775,489.00	\$	1,550,978.00
4.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 (12 MTS - 1050 KGF)	U100	2.00	2.0	3.0	2.00				0.00	0.00	\$	5,115,573.00	\$	-
4.8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI/A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	U100	2.00	2.0	3.0	2.00				0.00	0.00	\$	922,037.00	\$	-
4.8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARBOLADO FIJO DE LINEA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BASADO A 13.2 KV, E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	U100	0.00	0.0	2.0		2.00			2.00	2.00	\$	3,889,278.00	\$	7,789,556.00



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026



4.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA EN POSTE DE 12M A POSTE DE 6M BANDEIRA BIFÁSICO A 132 KV. INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CHITA DE ACERO INDELEBLE	UNID	1,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,00	2,00	4.490.025,00	\$	-	\$	8.980.050,00
4.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA EN POSTE DE 12M A POSTE DE 6M	UNID	1,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,00	4,00	4.761.524,00	\$	9.523.048,00	\$	19.048.096,00
4.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE 132 KV. BIFÁSICO A 132 KV.	UNID	3,00	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,00	4,00	4.717.204,00	\$	-	\$	18.868.816,00
4.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSIÓN A 132 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UNID	3,00	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,00	4,00	8.259.515,00	\$	-	\$	33.138.060,00
4.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INICIO DE POSTE EN CONCRETO DE 6 (6M) - 510 (510 KG)	UNID	18,00	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	6,00	13,00	3.285.223,00	\$	19.711.338,00	\$	42.707.859,00
4.8.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE 19 MTS - 510 (510 KG)	UNID	18,00	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	6,00	13,00	528.256,00	\$	3.169.556,00	\$	6.867.328,00
4.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ASUADO EN ALIENACION - ANILLO - FINAL DE CIRCUITO PARA B.T.A. 240/120 VOL.	UNID	14,00	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	4,00	15,00	719.429,00	\$	3.197.716,00	\$	11.091.435,00
4.8.18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIÓNADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - 16, 2 ANO	AL	38,400	150,0	100,0	100,0	90,00	90,00	0,00	90,00	84.229,00	\$	-	\$	7.580.110,00
4.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENZADA	UNID	1,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,00	2,00	2.032.358,00	\$	-	\$	4.064.716,00
4.8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENZADA DE B.T.A. 120/40 VOL. EN CHITA DE ACERO FUNDIBLE	UNID	3,00	5,0	6,0	6,0	1,00	3,00	3,00	4,00	1.130.176,00	\$	3.390.528,00	\$	4.520.704,00
4.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENZADA DE B.T.A. 120/40 VOL.	UNID	5,00	7,0	10,0	10,0	3,00	4,00	4,00	7,00	2.469.552,00	\$	9.847.208,00	\$	17.233.864,00
4.8.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REMISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNID	21,00	23,0	10,0	9,00	3,00	3,00	6,00	15,00	762.646,00	\$	4.575.888,00	\$	11.439.720,00
1.8.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE INICIO DE POSTE EN CONCRETO DE 6 (6M) - 510 (510 KG)	UNID	0,00	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,00	8,00	2.913.280,00	\$	23.308.240,00	\$	23.308.240,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE 18 MTS - 510 (510 KG)	UNID	0,00	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,00	8,00	553.114,00	\$	4.424.912,00	\$	4.424.912,00
NP01	RANPA PRATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINIELA ADOSADO TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UNID	0,00	10,0	12,0	59,00	10,00	10,00	10,00	69,00	519.638,00	\$	5.184.380,00	\$	35.868.722,00
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	178,8	178,8	63,8	63,8	63,8	97,20	97,20	117.066,00	\$	11.392.653,12	\$	11.392.653,12
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 12"	ML	0,00	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	5,00	68,80	289.400,00	\$	1.402.000,00	\$	19.291.520,00
NP 06	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA MEDIDAS INTERNAS 0,60X0,60X0,60 - ALTURA VARIABLE	UNID	0,00	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,00	17,00	1.489.427,00	\$	25.303.295,00	\$	25.303.295,00
NP07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 14"	ML	0,00	35,3	45,0	35,34	35,34	35,34	52,48	415,80	393.646,00	\$	20.550.669,16	\$	164.071.652,80
NP 09	RELLENO EN ANILLO SELECCIONADO PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	19,0	25,3	19,04	19,04	19,04	5,24	24,28	122.092,00	\$	639.762,08	\$	2.964.333,76
NP 20	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO 21 CM MEDIDAS INTERNAS 0,60X0,60X0,60 - ALTURA VARIABLE	ML	0,00	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	38,00	38,00	469.827,00	\$	17.359.772,00	\$	17.359.772,00
NP21	RANPA PARA USO VEHICULAR DE 4,20X1,20M INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNID	1,00	38,0	104,0	38,00	38,00	38,00	65,00	104,00	1.494.956,00	\$	97.172.140,00	\$	155.415.424,00
NP 23	CONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACUEDUCTOS DANCILINARIS DE ALICATILLADO CON PROFUNDIDADES SUPERIORES A 0,90M INCLUYE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL	UNID	0,00	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,00	10,00	592.783,00	\$	5.027.630,00	\$	5.027.630,00
NP 24	TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LUPAS EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	0,00	0,0	18,7	18,7	18,7	18,7	18,71	18,71	191.615,00	\$	32.076.500,00	\$	32.076.500,00
NP 27	ADECUACIÓN DE CHUARNAS DE INSPECCIÓN (MANIOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNID	0,00	17,0	23,0	17,00	17,00	17,00	6,00	23,00	784.145,00	\$	4.704.870,00	\$	18.035.335,00
NP 29	ALICATILLADO DE PAVIMENTO DE 19 CM INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAJERO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,00	0,0	147,0	13,55	13,55	13,55	13,55	147,01	45.500,00	\$	6.688.555,00	\$	6.688.555,00
NP 31	ALICATILLADO DE PAVIMENTO DE 19 CM INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAJERO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNID	0,00	0,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,00	71,00	194.532,00	\$	13.811.772,00	\$	13.811.772,00
NP 32	REPARACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 10" EXCAVACIÓN Y RELLENO INCLUYE CAJA PLÁSTICA PARA MEDIDOR	UNID	0,00	0,0	48,0	48,0	48,0	48,0	4,00	5,00	280.332,00	\$	1.401.660,00	\$	1.401.660,00
NP 35	RANPA PARA USO VEHICULAR CON QUERQUES MAYORES DE 4,20M INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	0,00	0,0	31,9	31,9	31,9	31,9	0,00	0,00	355.941,00	\$	-	\$	-
NP 40	INSTALACION EN TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN EN CABLE TRENZADO A 240V.	UNID	0,00	20,0	20,0	11,00	11,00	5,00	5,00	15,00	4.392.376,00	\$	21.961.860,00	\$	70.219.016,00
NP11	INSTALACION EN TENSIÓN A 240V. DE POSTE EN CONCRETO 6,50X1,00	UNID	0,00	14,0	18,0	3,00	11,00	11,00	11,00	14,00	5.827.709,00	\$	65.809.799,00	\$	63.175.996,00
NP12	DESINSTALACION O RETIRO EN TENSIÓN DE ARMADO, RED ABERTA O TRENZADA DE BAJA TENSIÓN	UNID	0,00	18,0	19,0	11,00	4,00	4,00	4,00	15,00	3.971.500,00	\$	15.886.000,00	\$	59.571.500,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UNID	0,00	0,0	48,0	18,00	7,00	18,00	25,00	25,00	3.129.750,00	\$	78.243.750,00	\$	78.243.750,00
NP 14	DESARROLLO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 132 KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UNID	0,00	0,0	4,0	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4.551.733,00	\$	18.208.937,00	\$	18.208.937,00
NP15	DESARROLLO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALIENACION CON DISPOSICION EN BANDEIRA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIA TENSIÓN A 132 KV	UNID	0,00	0,0	4,0	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	5.085.166,00	\$	20.340.664,00	\$	20.340.664,00
NP16	DESARROLLO DE POSTE DE 6 MTS CON TENSIÓN A 240V. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UNID	0,00	18,0	18,0	3,00	3,00	3,00	11,00	11,00	3.129.750,00	\$	34.427.250,00	\$	43.161.500,00
SECTOR MONTEVERDE															
5.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍDIDO	M2	49,62	49,6	213,0	49,62	49,62	49,62	163,40	213,02	58.103,00	\$	9.494.176,48	\$	12.277.246,32
5.1.2	REMEDIACIÓN DE ANHEDES DE CONCRETO	M2	550,82	550,8	1804,2	550,82	550,82	550,82	187,65	1135,47	37.882,00	\$	7.071.176,03	\$	42.958.972,27
5.1.3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLORACIÓN Y CAÑALES	M3	4069,83	4069,8	3909,9	3909,94	3909,94	3909,94	60,73	3993,94	25.055,00	\$	-	\$	113.759.825,50
5.1.4	EXCAVACIÓN PARA CLASIFICAR DE LA EXPLORACIÓN Y CAÑALES PARA FALLOS	M3	223,10	74,4	135,1	74,37	74,37	74,37	60,73	155,19	33.331,00	\$	2.024.373,82	\$	4.300.423,40



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

5.8.7	SUMINISTRO, REGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA INT. BIFASICA AEREA EN CABLE DESINDO DE ALUMINIO ACSR - No. 10 AWG	MI	160.00	30.0	30.0	30.00					9.00	30.00	\$	104.172.00	\$	-	\$	3.143.720.00
5.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE INT. BIFASICA A 132 KV.	UNID	3.00	3.0	2.0	2.00								2.00	\$	4.717.284.00	\$	9.334.405.00
5.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 132 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UNID	3.00	3.0	2.0	2.00								2.00	\$	8.269.515.00	\$	15.599.020.00
5.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION E INICIO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF.)	UNID	6.00	3.0	3.0	3.00								3.00	\$	3.255.222.00	\$	5.855.680.00
5.8.12	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF.)	UNID	6.00	3.0	12.0	3.00								3.00	\$	535.556.00	\$	1.584.766.00
5.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALIMENTACION - ANILLO - FINAL DE CIRCUITO PARA BIT A 240/270 VOL.	UNID	6.00	6.0	6.0	6.00								6.00	\$	799.429.00	\$	4.796.574.00
5.8.14	SUMINISTRO, REGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BIT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 10 AWG.	MI	100.00	0.0	40.0									40.00	\$	92.517.00	\$	3.703.660.00
5.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TENSIONADA DE BIT A 120/240 VOL. EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UNID	0.00	2.0	3.0	2.00								1.00	\$	2.032.388.00	\$	6.097.164.00
5.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXION (1 USUARIO) A RED TENSIONADA DE BIT A 120/240 VOL.	UNID	6.00	4.0	5.0	4.00								1.00	\$	2.460.552.00	\$	12.302.760.00
5.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (113.200/240/20) VOL. INCLUIE INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UNID	1.00	1.0	1.0	1.00								1.00	\$	10.019.526.00	\$	10.019.526.00
5.8.19	SUMINISTRO, REGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2x No. 6 + 1x No. 6) AWG.	MI	500.00	140.2	50.0	50.00								50.00	\$	69.405.00	\$	3.470.520.00
5.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/20) VOL.	UNID		21.0	60.0	21.00								30.00	\$	950.687.00	\$	37.917.293.00
5.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUEBLO	UNID	9.00	7.0	7.0	7.00								7.00	\$	765.648.00	\$	5.338.250.00
5.8.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF.)	UNID	0.00	5.0	5.0	5.00								5.00	\$	2.913.203.00	\$	14.566.602.00
5.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF.)	UNID	0.00	5.0	5.0	5.00								5.00	\$	553.114.00	\$	2.765.579.00
5.8.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UNID	8.00	5.0	17.0	5.00								17.00	\$	705.382.00	\$	8.461.244.00
NP 01	RAMPA PASADUAL INCLUIE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOPCION TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UNID	0.00	35.0	34.0	34.00								34.00	\$	519.838.00	\$	17.674.422.00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 1.20M X 1.20M INCLUIE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPERA, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNID	0.00	74.0	122.0	74.00								74.00	\$	1.451.955.00	\$	55.313.372.00
NP 22	CONEXION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALICATILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UNID	0.00	0.0	44.0									44.00	\$	737.710.00	\$	32.658.885.00
NP 23	CONEXION Y ADECUACION DE ACUEDUCTOS DOMICILIARIOS DE ALICATILLADO CON PROFUNDIDADES SUPERIORES A 0.80 M. INCLUIE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL	UNID	0.00	0.0	43.0									43.00	\$	502.763.00	\$	24.132.624.00
NP 24	TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LUVIA EN 4". INCLUIE EXCAVACION Y RELLENO.	MI	0.00	0.0	151.0									151.00	\$	191.615.00	\$	28.933.885.00
NP 25	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	0.00	0.0	242.2									242.20	\$	14.160.00	\$	3.486.192.00
NP 27	ADECUACION DE CAJAS DE INSPECCION (MANHOLE) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNID	0.00	15.0	12.0	12.00								12.00	\$	784.115.00	\$	9.409.740.00
NP 28	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	NO	0.00	0.0	15.9									15.90	\$	22.250.00	\$	3.779.419.00
NP 29	EXCAVACION MANUAL	ML	0.00	0.0	41.8									41.76	\$	45.500.00	\$	1.500.152.00
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALICATILLADO DE 4"	ML	0.00	0.0	8.0									8.00	\$	161.559.00	\$	1.292.472.00
NP 31	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO INCLUIE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2" EXCAVACION Y RELLENO. NO INCLUIE CAJA	UNID	0.00	0.0	84.0									84.00	\$	194.572.00	\$	16.340.653.00
NP 32	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO INCLUIE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2" EXCAVACION Y RELLENO. INCLUIE CAJA PLASTICA PARA REDDOR	UNID	0.00	0.0	7.0									7.00	\$	200.332.00	\$	1.962.324.00
NP 35	RAMPA PARA USO VEHICULAR CON DIMENSIONES MAYORES DE 4.2M, INCLUIE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPERA, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	0.00	0.0	34.0									34.01	\$	355.941.00	\$	12.105.553.44
NP 10	INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TENSIONADO A 240V.	UNID	0.00	6.0	6.0	6.00								6.00	\$	4.392.376.00	\$	26.354.258.00
NP 11	INSTALACION EN TENSION A 240V. DE POSTE EN CONCRETO 9610 M.F.	UNID	0.00	3.0	3.0	3.00								3.00	\$	5.592.709.00	\$	17.848.127.00
NP 12	DESINSTALACION O RETIRO EN TENSION DE ARMADO REDABERTA O TENSIONADA DE BAJA TENSION	GLB	0.00	6.0	6.0	6.00								6.00	\$	3.971.500.00	\$	23.859.020.00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UNID	0.00	9.0	9.0	9.00								9.00	\$	3.125.750.00	\$	25.107.750.00
NP 14	DESINICIADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSION A 132 KV. INCLUIE RELLENO DE LOTAJA	UNID	0.00	3.0	2.0	2.00								2.00	\$	4.551.733.00	\$	9.103.466.00
NP 15	DESARMADO EN TENSION DE ESTRUCTURA EN ALIMENTACION CON DISPOSICION EN BANDERA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIA TENSION A 132 KV	UNID	0.00	3.6	2.0	2.00								2.00	\$	5.085.166.00	\$	10.110.332.00

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026												GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA					
NP 16	DESEÑADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN 4.20KV. INCLUYE RELLENDO DE HOYUDA	UNID	0,00	3,0	3,0	3,00				0,00	3,00	3.129.750,00	\$	\$	9.983.250,00		
NP 26	ACORDACIÓN DE ADQUETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	UNID	0,00	0,0	6,0					6,00	6,00	791.249,00	\$	\$	48.253.950,00		
NP 38	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 8 MTS	UNID	0,00	0,0	1,0					1,00	1,00	2.049.017,00	\$	\$	2.049.017,00		
SECTOR EL TAPAD																	
6.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLAMACION Y CANALES	M3	2994,37	3029,7	3493,3	3029,95				23,65	23,65	3053,30	\$	\$	182.513.000,48		
6.1.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLAMACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	116,25	33,6	400,0	38,75				361,25	361,25	400,00	\$	\$	607.561,27		
6.1.3	GRADIENTE PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (R12) (200)	M2	4525,20	4075,4	4110,8	4075,38				35,37	35,37	4110,75	\$	\$	12.041.507,50		
6.1.4	CARBIDE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3 - KM	4035,67	3988,6	4988,2	3988,92				619,25	619,25	4608,17	\$	\$	772.559,36		
6.1.7	RENOVACION DE ESPECIES VEGETALES (ITALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE PAUL)	UNID	0,00	0,0	2,0	0,00				2,00	2,00	36.161,00	\$	\$	22.352.645,01		
6.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	2041,05	1850,0	1833,3	1849,58				33,27	33,27	1853,25	\$	\$	602.594,00		
6.2.2	SUBRA DE GRANULAR CLASE C o + 10cm	M3	642,83	646,9	646,9	646,89				0,00	0,00	646,89	\$	\$	287.872,00		
6.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA PARA FALLOS	M3	445,00	145,0	409,0	155,00				245,00	245,00	400,00	\$	\$	285.929,00		
6.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECUBRIMIENTO)	M3	374,38	54,1	100,0	53,13				41,87	41,87	100,00	\$	\$	14.922.000,00		
6.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (40/18/042), INCLUYE ACRERO DE TRANSMISION, ANCLAJE Y CAJASTILLA, E= 0-20 CM	M3	763,82	763,8	763,8	775,00				8,82	8,82	763,82	\$	\$	1.383.242,00		
6.3.2	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCION DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL	KG	1185,97	1195,0	1250,2	1180,52				1087,55	1087,55	1259,17	\$	\$	12.564,00		
6.3.3	CONSTRUCCION DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	2076,67	2076,7	2076,7	2066,87				10,00	10,00	2076,67	\$	\$	24.875,00		
6.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (60/80/20), INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1553,03	1553,0	1553,0	0,00				0,00	0,00	166.143,00	\$	\$	51.684.833,25		
6.4.1	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	M	300,00	300,0	370,0	300,00				370,00	370,00	670,00	\$	\$	31.356,00		
6.7.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACOMETIDO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNID	4,00	4,0	108,0	4,00				105,00	105,00	109,00	\$	\$	22.459.520,00		
NP 34	REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN 3". INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION	UNID	0,00	0,0	10,0	0,00				10,00	10,00	387.756,00	\$	\$	3.857.560,00		
OTROS COMPONENTES																	
	IMPLENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO	GL	1,00			0,67				0,67	0,67	165.800,00,00	\$	\$	458.887.391,59		
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	GL	1,00			0,67				0,67	0,67	350.250,00,00	\$	\$	127.153.824,31		
	TRAMITE Y LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED. INCLUYE PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACION DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISION DE OBRAS (10 UNID)	GL	1,00									30.000.000,00	\$	\$	323.913.520,04		
	CERTIFICACION RETIE PARA REDES DE MEDA Y BAJA TENSION (10 UNID)	GL	1,00									25.000.000,00	\$	\$	51.684.833,25		
TOTAL EJECUTADO																	
AVANCE FISICO A LA FECHA																	
														\$	2.650.561.851,28	\$	24.764.932.054,23
														\$	8,75%	\$	83,77%
														MES		TOTAL	




INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA
ACUMULADO MES (10) - DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026



	(%) PROGR.	(%) EJECUTADO	DIFERENCIA (%) PROG Vs (%) EJECUT
ACUMULADO ANTERIOR	70.06%	74.95%	3.88%
DURANTE EL PERIODO	4.92%	8.75%	
ACUMULADO ACTUAL	75.53%	83.77%	

	(N) PROGR	(N) EJECUT	DIFERENCIA (N) PROG Vs (N) EJECUT
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 20.738.594.355,17	\$ 22.195.370.429,81	\$ 1.135.284.182,20
DURANTE EL PERIODO	\$ 1.456.346.253,44	\$ 2.600.561.654,28	
ACUMULADO ACTUAL	\$ 22.194.940.608,61	\$ 24.795.932.084,09	

NOTA: El contratista dentro de lo programado en el balance de obra No. 2, ajusta el valor de \$1.464.367.293,42 el cual ya fue ejecutado y que se viene reportando como superávit, esto con el fin de reprogramar en el tiempo restante solo los recursos realmente faltantes por ejecutar incluyendo el valor adicional por lo que se ajusta el acumulado programado en la semana 41 (nuevo balance No. 2 y adición de \$21.087.354.153,67 a \$22.971.108.694,35 incluido lo programado para esa misma semana).

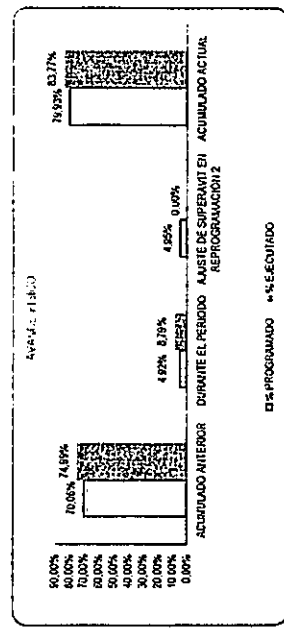

AVANCE FINANCIERO



Diego Villalongo

DIEGO LUIS VILLALONGO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL - CONDOMINIO DE
ELABORADO

	INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
---	--	---

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS.

FECHA DE PRESENTACIÓN: lunes, 6 de abril de 2025		SEMANA No.: 43	DEL: 30-mar-26	AL: 5-abr-26
CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CORDOBA			FECHA DE INICIO: 6/06/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO IQC			FECHA DE FINAL: 5/06/2026
REP. LEGAL:	DIEGO VILLADIEGO ESPITA			DIRECCIÓN: CR 6 # 65 24 OFIC. 410 CC PLACE MALL
CONTRATO No.:	SI-CMA-001-2025			
PLAZO INICIAL:	12 MESES		VALOR INICIAL INTER: \$ 1.480.084.416,00	ADICIONES:
ACTA DE INICIO:	06 DE JUNIO 2025		VALOR TOTAL \$ 1.480.084.416,00	FECHA ADICIÓN:
PRORROGA 1:	FECHA PRORROGA:			
CONTRATO DE OBRA				
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CORDOBA			FECHA DE INICIO: 6/06/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL SINU			FECHA DE FINAL: 5/06/2026
REP. LEGAL:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ			DIRECCIÓN: CR 6 # 65 24 OFIC. 501 CC PLACE MALL
CONTRATO No.:	SI-IP-003-2024			
PLAZO INICIAL:	12 MESES		VALOR INICIAL OBRA: \$ 27.717.434.300,00	ADICIONES:
ACTA DE INICIO:	06 DE JUNIO 2025		VALOR TOTAL \$ 29.599.781.369,00	FECHA ADICIÓN: 20 DE MARZO DE 2026
PRORROGA 1:	FECHA PRORROGA:			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA		ESQUEMA FINANCIERO		PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	SOBRE VALOR INICIAL \$ 8.879.934.416,70	DESEMBOLSADO? SI
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		RESUMEN DE AMORTIZACIONES:				
ACTA PARCIAL 1:	\$ 10.180.149.492,00	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:		\$ 3.054.044.847,60	% AVANCE FINANCIERO: 62,50%	
ACTA PARCIAL 2:	\$ 8.319.430.911,62			\$ 2.495.829.273,49		
ACTA PARCIAL 3:	\$			\$		
ACTA FINAL:	\$			\$		
TOTAL PAGADO:	\$ 18.499.580.403,62	TOTAL AMORTIZADO:		\$ 5.549.874.121		
PENDIENTE X PAGAR	\$ 11.100.200.985,38	PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$ 3.330.060.286		

III. INFORMACIÓN PÓLIZAS			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/06/2025	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	12 MESES
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
TOMADOR:	CONSORCIO VIAS DEL SINU		

CUMPLIMIENTO					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL																																																										
N°	CMT	100016442	N° ANEXO	4	N°	CMT	100003558	N° ANEXO	3																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>AMPARO</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> <th>PERIODO</th> </tr> <tr> <td>NOMBRE AMPARO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>\$ 2.959.978.138,00</td> <td>6/06/2025</td> <td>10/12/2025</td> <td>LIQ. CONT</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES SOCIALES</td> <td>\$ 2.959.978.138,00</td> <td>6/06/2025</td> <td>9/06/2029</td> <td>CONT Y 3 AÑOS</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD DE LA OBRA</td> <td>\$ 2.959.978.138,00</td> <td>6/06/2025</td> <td>9/06/2031</td> <td>5 AÑOS FIN OBRA</td> </tr> <tr> <td>BUEN MANEJO DEL ANTICIPO</td> <td>\$ 8.315.230.290,00</td> <td>6/06/2025</td> <td>10/12/2026</td> <td>LIQ. e AMORT</td> </tr> </table>					AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA	PERIODO	NOMBRE AMPARO					CUMPLIMIENTO	\$ 2.959.978.138,00	6/06/2025	10/12/2025	LIQ. CONT	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.959.978.138,00	6/06/2025	9/06/2029	CONT Y 3 AÑOS	ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 2.959.978.138,00	6/06/2025	9/06/2031	5 AÑOS FIN OBRA	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 8.315.230.290,00	6/06/2025	10/12/2026	LIQ. e AMORT	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>AMPARO</th> <th>5% V. CONT</th> <th>VIGENCIA</th> <th>T. CONTRACT</th> </tr> <tr> <td>NOMBRE AMPARO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td> <td>\$ 1.479.989.069,45</td> <td>6/06/2025</td> <td>9/06/2029</td> </tr> <tr> <td>PATRONAL</td> <td>\$ 1.479.989.069,45</td> <td>6/06/2025</td> <td>9/06/2029</td> </tr> <tr> <td>CONSTRATISTA Y SUBCONSTRATISTA</td> <td>\$ 1.479.989.069,45</td> <td>6/06/2025</td> <td>9/06/2029</td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td> <td>\$ 1.479.989.069,45</td> <td>6/06/2025</td> <td>9/06/2029</td> </tr> </table>					AMPARO	5% V. CONT	VIGENCIA	T. CONTRACT	NOMBRE AMPARO				AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029	PATRONAL	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029	CONSTRATISTA Y SUBCONSTRATISTA	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029
AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA	PERIODO																																																											
NOMBRE AMPARO																																																															
CUMPLIMIENTO	\$ 2.959.978.138,00	6/06/2025	10/12/2025	LIQ. CONT																																																											
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.959.978.138,00	6/06/2025	9/06/2029	CONT Y 3 AÑOS																																																											
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 2.959.978.138,00	6/06/2025	9/06/2031	5 AÑOS FIN OBRA																																																											
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 8.315.230.290,00	6/06/2025	10/12/2026	LIQ. e AMORT																																																											
AMPARO	5% V. CONT	VIGENCIA	T. CONTRACT																																																												
NOMBRE AMPARO																																																															
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029																																																												
PATRONAL	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029																																																												
CONSTRATISTA Y SUBCONSTRATISTA	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029																																																												
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 1.479.989.069,45	6/06/2025	9/06/2029																																																												

GARANTIAS ACTUALIZADAS CON VALOR ADICIÓN 2003/2025

IV. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. PRESUP.	CANT. MODIF.	CANT. EJEC.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL EJECUTADO SEMANA
EL RECREO							
1.1.2	DEMOLUCIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	693,56	1253,75	58,02	\$ 37.682,00	\$ 2.110.898,81
1.5.1	SA TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA OISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.05m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.+0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELADAS	M2	159,21	8,40	8,40	\$ 292.537,00	\$ 2.457.310,80
4.5	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	50,00	50,00	50,00	\$ 104.792,00	\$ 5.239.600,00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 MTS.	UND	2,00	3,00	3,00	\$ 2.108.765,00	\$ 6.326.295,00
1.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT TRIFASICO A 13.2 KV.	UND	3,00	1,00	1,00	\$ 4.717.204,00	\$ 4.717.204,00
3.2	RETIRO CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	GLB	25,00	2,00	2,00	\$ 2.103.798,00	\$ 4.207.596,00
3.5	RETIRO CON TENSION A 240 V. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	35,00	3,00	2,00	\$ 1.850.974,00	\$ 3.701.948,00
NP 01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0,00	23,00	3,00	\$ 519.838,00	\$ 1.559.514,00




INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

NP 35	RAMPA PARA USO VEHICULAR CON DIMENSIONES MAYORES A 4.2M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO A CAMBIO DE NIVEL, LOSETA, TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL Y RELLENO SELECCIONADO.	M	0,00	10,70	10,70	\$	355.941,00	\$	3.806.568,70
6 DE MARZO - PASATIEMPO - VILLA RÓCIO									
4.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	1838,61	3046,1	313,60	\$	37.682,00	\$	11.817.075,20
4.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES PARA FALLOS	M3	652,59	594,1	134,76	\$	33.334,00	\$	4.492.189,84
4.4.1	DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	ML	248,28	781,0	100,50	\$	31.356,00	\$	3.151.278,00
4.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO.	M3	0,00	11,0	3,85	\$	423.349,00	\$	1.629.893,65
4.5.3	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	393,09	2670,0	268,29	\$	46.543,00	\$	9.694.441,47
4.5.4	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	234,02	1940,02	158,17	\$	182.483,00	\$	28.853.701,08
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	0,00	192,2	13,55	\$	45.500,00	\$	616.525,00
NP 32	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 1/2" EXCAVACIÓN Y RELLENO INCLUYE CAJA PLÁSTICA PARA MEDICOR	UND	0,00	278,8	1,00	\$	280.332,00	\$	280.332,00
MONTEVERDE									
5.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	49,62	213,02	163,40	\$	58.103,00	\$	9.494.175,46
5.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	950,82	1804,17	187,65	\$	37.682,00	\$	7.071.178,03
5.1.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES PARA FALLOS	M3	223,10	135,10	60,73	\$	33.334,00	\$	2.024.373,82
5.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3	5680,23	5708,29	221,41	\$	36.151,00	\$	8.005.285,97
5.1.7	RELOCACIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ITALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	11,00	27,00	16,00	\$	441.297,00	\$	7.060.752,00
5.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2117,99	2035,02	124,16	\$	158.015,00	\$	19.618.753,16
5.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C a= 15cm	M3	776,73	790,51	23,65	\$	287.872,00	\$	6.806.934,95
5.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17678,37	18421,01	608,05	\$	12.864,00	\$	7.821.982,07
5.3.3	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	2258,40	2290,39	58,91	\$	24.975,00	\$	1.471.277,25
5.4.1	SI TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.03m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	114,63	2,00	2,00	\$	292.537,00	\$	585.074,00
5.5.2	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA (60X60 CM)	UND	48,00	60,00	10,00	\$	896.973,00	\$	8.959.730,00
5.5.3	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	180,05	169,33	18,92	\$	104.900,00	\$	1.984.708,00
5.6.1	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	19,00	157,00	138,00	\$	213.904,00	\$	29.518.752,00
4.7.2	REUBICACIÓN DE CAJA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	0,00	19,0	19,00	\$	477.758,00	\$	9.077.402,00
5.8.14	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	100,00	40,0	40,00	\$	92.577,00	\$	3.703.080,00
4.8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENADA	UND	0,00	3,0	1,00	\$	2.032.388,00	\$	2.032.388,00
5.8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	6,00	5,0	1,00	\$	2.450.552,00	\$	2.450.552,00
3.8.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	60,0	39,00	\$	969.687,00	\$	37.817.793,00
5.8.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE RED TELEFÓNICA	UND	8,00	17,0	12,00	\$	705.362,00	\$	8.464.344,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0,00	122,0	37,00	\$	1.494.956,00	\$	55.313.372,00
NP 22	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND	0,00	44,0	44,00	\$	737.702,00	\$	32.458.858,00
NP 23	CONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CON PROFUNDIDADES INFERIORES A 0.90 M INCLUYE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL	UND	0,00	48,0	48,00	\$	502.763,00	\$	24.132.524,00
NP 24	TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0,00	151,0	151,00	\$	191.615,00	\$	28.933.865,00
NP 25	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	0,00	246,2	246,20	\$	14.160,00	\$	3.466.192,00
NP 28	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	0,00	16,9	16,85	\$	224.250,00	\$	3.779.419,80
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	0,00	41,8	41,76	\$	45.500,00	\$	1.900.152,80
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 4"	ML	0,00	8,0	8,00	\$	161.559,00	\$	1.292.472,00
NP 31	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 1/2" EXCAVACIÓN Y RELLENO, NO INCLUYE CAJA	UND	0,00	84,0	84,00	\$	194.532,00	\$	16.340.688,00
NP 32	REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 1/2" EXCAVACIÓN Y RELLENO, INCLUYE CAJA PLÁSTICA PARA MEDIDOR	UND	0,00	7,0	7,00	\$	280.332,00	\$	1.962.324,00
NP 35	CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	0,00	34,0	34,01	\$	355.941,00	\$	12.105.553,41
NP 28	ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS	UND	0,00	61,0	61,00	\$	791.049,00	\$	48.253.989,00
NP 36	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 8 MTS	UND	0,00	1,0	1,00	\$	2.049.017,00	\$	2.049.017,00

**INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA**

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

EL TAPAO								\$	3,857,560.00
NP 34	REPARACIÓN DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN 3" INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	0.00	10.0	10.00	\$	385.756,00	\$	3.657.660,00
OTROS COMPONENTES								\$	2.498.918,35
	IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO	GL	1.00	1.00		\$	165.800.000,00	\$	748.222,12
	PLAN DE MAHEJO DE TRANSITO - PMT	GL	1.00	1.00		\$	350.280.000,00	\$	1.750.696,23
	TRAMITE Y LEGAUZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED, INCLUYE PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACIÓN DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISIÓN DE OBRAS (10 UND)	GL	1.00	1.00		\$	30.000.000,00	\$	-
	CERTIFICACIÓN RETIE PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (10 UND)	GL	1.00	1.00		\$	25.000.000,00	\$	-
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA								\$	507.028.952,63
AVANCE FISICO A LA FECHA:									1,71%




INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

	(%) PROGR.	(%) EJECUTADO	DIFERENCIA (%) PROG Vs (%) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	78,92%	82,05%	3,85%
DURANTE EL PERIODO	1,01%	1,71%	
ACUMULADO ACTUAL	79,93%	83,77%	

	(Vr) PROGR	(Vr) EJECU	DIFERENCIA (\$) PROG Vs (\$) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 23.359.219.058,51	\$ 24.289.903.131,61	\$ 1.139.284.182,20
DURANTE EL PERIODO	\$ 298.428.843,53	\$ 507.028.952,63	
ACUMULADO ACTUAL	\$ 23.657.647.902,03	\$ 24.796.932.084,23	



AVANCE FINANCIERO



■ VALOR PROG ■ V. EJECUT

AVANCE GENERAL POR SECTORES

SECTOR	VALOR CONTRACTUAL SECTOR	VALOR SECTOR SEGÚN BALANCE 2	(%) EN PROY.	AVANCE GENERAL POR SECTORES					(%) AVANCE SECTOR	(%) AVANCE PROYECTO
				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO TOTAL				
EL RECREO	\$ 7.176.779.567,00	\$ 5.456.229.045,00	18,43%	\$ 5.415.284.246,51	\$ 34.128.935,31	\$ 5.449.413.181,82			99,88%	18,41%
IMAT	\$ 3.218.868.173,00	\$ 3.619.763.454,00	12,23%	\$ 2.645.878.130,20	\$ -	\$ 2.645.878.130,20			73,10%	8,94%
CANTA CLARO	\$ 2.244.737.410,00	\$ 2.235.129.792,00	7,55%	\$ 2.115.135.358,16	\$ -	\$ 2.115.135.358,16			94,63%	7,18%
6 DE MARZO - PASA TIEMPO - VILLA ROCIO	\$ 8.265.724.760,00	\$ 9.339.614.572,00	31,55%	\$ 7.752.172.810,20	\$ 60.545.436,24	\$ 7.812.718.246,43			83,65%	26,39%
MONTEVERDE	\$ 2.410.549.573,00	\$ 4.129.470.804,00	13,96%	\$ 3.588.618.538,58	\$ 406.998.102,73	\$ 3.994.616.641,71			96,73%	13,50%
EL TAPAO	\$ 3.329.194.240,00	\$ 3.747.993.345,00	12,66%	\$ 2.317.245.561,31	\$ 3.857.560,00	\$ 2.321.103.121,31			61,93%	7,84%
RANCHOS DEL INAT	\$ 459.500.577,00	\$ 459.500.577,00	1,55%	\$ -	\$ -	\$ -			0,00%	0,00%
TOTAL OBRAS	\$ 27.105.354.300,00	\$ 28.987.701.389,00		\$ 23.834.334.855,37	\$ 504.530.034,28	\$ 24.338.864.889,64				
PGIO	\$ 166.800.000,00	\$ 166.800.000,00	0,56%	\$ 136.405.582,39	\$ 748.222,12	\$ 137.153.804,51			82,23%	0,46%
PMT	\$ 390.280.000,00	\$ 390.280.000,00	1,32%	\$ 319.162.893,86	\$ 1.750.656,23	\$ 320.913.550,09			82,23%	1,38%
OPERADOR DE REDES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,10%	\$ -	\$ -	\$ -			0,00%	0,00%
RETE	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	0,08%	\$ -	\$ -	\$ -			0,00%	0,00%
TOTAL OTROS COMPONENTES	\$ 612.080.000,00	\$ 612.080.000,00		\$ 455.588.476,24	\$ 2.498.918,35	\$ 458.086.394,59				
VALOR TOTAL	\$ 27.717.434.300,00	\$ 29.599.781.389,00	100,00%	\$ 24.289.903.131,61	\$ 507.028.952,63	\$ 24.796.932.084,23				83,77%
				82,06%	1,71%	83,77%				


V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES:

- La interventoría verifica la situación actual en campo antes del inicio de cada una de las actividades en obra.
- La interventoría revisó los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, y especificaciones técnicas de la obra.
- La interventoría solicita al contratista el cronograma de trabajo con la ruta crítica y flujo de inversión.
- También verifica los demás documentos técnicos y hojas de vida del personal evaluable del contratista, los cuales cumplen con lo requeridos en el pliego de condiciones.
- Hace controles y seguimientos en obra.
- Hace revisiones y balances de las obras, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos.
- Lleva a diario la bitácora de obra en conjunto con el contratista.
- Hace cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional.
- Acata las disposiciones normativas locales, departamentales y nacionales que afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos.
- La interventoría verifica que todos los trabajadores y personal de obra se encuentren afiliados a la Seguridad Social y exige el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP en obra.

COMENTARIOS:

- El contratista instala valla informativa del proyecto con el diseño y las especificaciones dadas, en el sector IMAT, cada frente consta de vallas movibles con la información de cada sector.



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

- El Contratista activa el componente social iniciando con el levantamiento de los actos de vecindad en el tramo de Villa Rocio (11 de junio 2025).
- El día viernes 30 de mayo 2025 se socializa con la comunidad el inicio de obras en sector 6 de Marzo - Pasa Tiempo - Villa Rocio y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana por parte de la supervisión de obras.
- Se realiza comité técnico de obra con el contratista en donde se abordan temas varios preliminares al inicio de obra. (anexo al presente informe)
- Se actualizan las pólizas a fecha de acta de inicio.
- El día lunes 16 de junio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el tramo de El Tapao y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día lunes 7 de julio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente III correspondiente al barrio Santa Clara y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día viernes 1 de agosto de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente IV correspondiente al barrio Monteverde y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- Se continúa con el normal desarrollo constructivo de las actividades en los sectores de Santa Clara, 6 de Marzo, Monteverde y el sector de El Recreo.
- El sábado 25 de octubre de 2025 se hace entrega y se pone en servicio el tramo del frente Villa Rocio, se hace entrega por parte del contratista y se recibe a satisfacción por parte de la Gobernación de Córdoba y la supervisión de obra, la interventoría y la comunidad.

COMPONENTE DE CALIDAD:

- El Plan de Calidad se enfocó en asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos para la ejecución del proyecto.
- Se realizaron densidades y ensayos de laboratorio para el control de calidad de los concretos y materiales empleados.
- Se llevó a cabo un monitoreo y evaluación de los procedimientos constructivos implementados por el contratista, mediante visitas técnicas y permanencia en campo.
- Se verifica que los ensayos de laboratorio (densidades, granulometrías, resistencias) se realicen correctamente y cumplan las especificaciones contratadas, se supervisa la correcta ejecución de las capas que conforman la estructura del pavimento.
- Esta interventoría continuará realizando estricto seguimiento a los procesos constructivos y a los resultados de los ensayos para asegurar la calidad de la obra.
- El día 12 de diciembre de 2025, se hace entrega parcial del frente de obra sector Monteverde y se socializa inicio de actividades en el sector de Pasa Tiempo, ambos actos contaron con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría, veeduría ciudadana y comunidad en general.
- El día 18 de diciembre se socializa el inicio de obra con la comunidad de El Tapao, contando con la presencia de la Gobernación de Córdoba.
- El día 23 de diciembre se hace entrega mediante acto protocolario del frente de obra Santa Clara, contando con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría y la comunidad en general.
- Se hace recorrido de obra, interventoría y contratista, en el frente 6 de marzo para identificar ajustes y resanes en los elementos que hacen parte del pavimento en ejecución.
- El día 23 de diciembre se hace entrega parcial mediante acto protocolario del frente de obra Santa Clara, contando con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría y la comunidad en general.
- El 20 de marzo de 2026 se aprueba balance de obra No. 2, donde se reporta ajuste de mayores y menores cantidades de obra, de más no previstos y valor adicional de recursos por la suma de \$1,882,347,089.00, quedando el contrato con un nuevo valor por la suma de \$29,599,781,389.00
- Se inician actividades de resane y reparación de placas fisuradas y andenes en el frente de 6 de Marzo

COMPONENTE SOCIAL:

- Permanentemente se resuelven inquietudes de la comunidad y se da respuesta a los requerimientos y consultas de la misma.
- Se realizó la distribución de volantes a la comunidad del barrio donde se estaba llevando a cabo el proyecto.
- Se elaboraron las actas de vecindad del barrio Villa Rocio, y se encuentran en levante de información de actas los barrios 6 de Marzo y Santa Clara (acta de apertura).
- Se levantan las actas de cierre de vecindad en los tramos donde se hace entrega parcial de obra a la comunidad y se pone en funcionamiento la vía.

COMPONENTE SST:

- Se verifica que se realicen los chartas de seguridad en el trabajo, con el personal vinculado y afiliado al proyecto.
- Se realiza la inspección preoperacional de la maquinaria pesada que se encuentra en obra.
- Diariamente y durante la ejecución de los trabajos, se verifica que se cuente con la señalización y demarcación de la zona de intervención.

COMPONENTE AMBIENTAL/FORESTAL:

- A la fecha se cuenta con: SOLICITUD DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (17/02/2025) por parte de la CVS mediante el cual se establecen los parámetros para realizar las gestiones ambientales antes y durante la ejecución del proyecto.

FIRMAS:

Diego Villadiego

DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITA

REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO IDC





ELABORÓ




INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

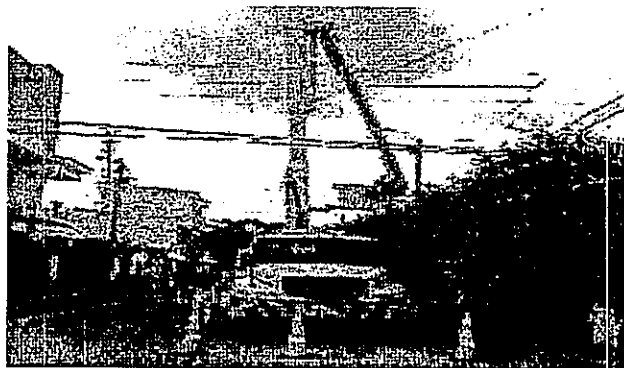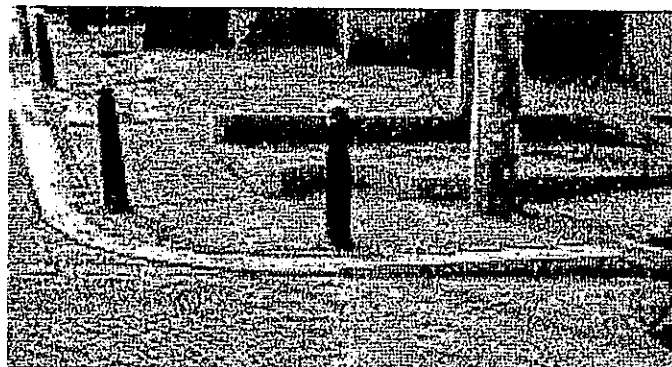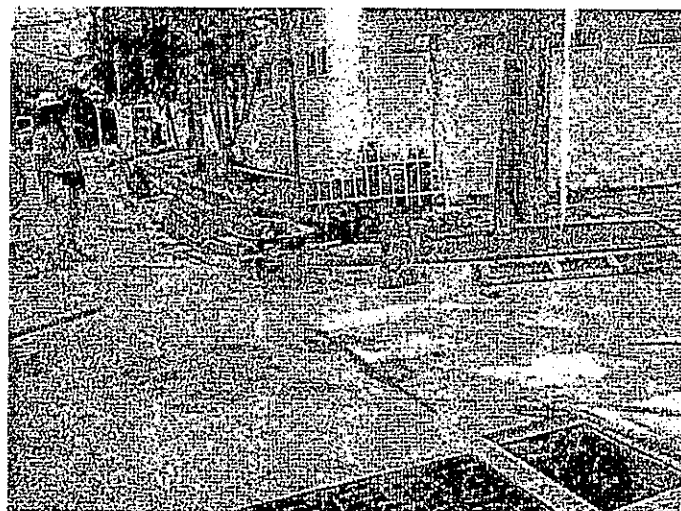



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 30 de marzo de 2025	SEMANA No.:	42	DEL	23-mar-26	AL	29-mar-26
CONTRATO DE INTERVENTORIA							
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA				FECHA DE INICIO:	6/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO IDC				FECHA DE FINAL:	5/05/2025	
REP. LEGAL:	DIEGO VILLADIEGO ESPITA				DIRECCIÓN:	CR 6 # 65 24 OFIC. 410 CC PLACE MALL	
CONTRATO No.	SI-CMA-001-2025				NIT:	901.947.262-6	
PLAZO INICIAL:	12	MESES	VALOR INICIAL INTER:	\$	1.480.084.416,00	ADICIONES:	FECHA ADICIÓN:
ACTA DE INICIO:	06 DE JUNIO 2025		VALOR TOTAL	\$	1.480.084.416,00	\$	
PRORROGA 1:		FECHA PRORROGA:					
CONTRATO DE OBRA							
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA				FECHA DE INICIO:	6/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL SINU				FECHA DE FINAL:	5/05/2025	
REP. LEGAL:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ				DIRECCIÓN:	CR 6 # 65 24 OFIC. 501 CC PLACE MALL	
CONTRATO No.	SI LP-003-2024				INTERVENTORIA:		
PLAZO INICIAL:	12	MESES	VALOR INICIAL OBRA:	\$	27.717.434.300,00	ADICIONES:	FECHA ADICIÓN:
ACTA DE INICIO:	06 DE JUNIO 2025		VALOR TOTAL	\$	29.599.781.389,00	\$	1.882.347.089,00 20 DE MARZO DE 2025
PRORROGA 1:		FECHA PRORROGA:					

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ESQUEMA FINANCIERO		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		30%	SOBRE VALOR INICIAL	\$	8.879.934.416,70	DESEMBOLSADO?	SI	
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		RESUMEN DE AMORTIZACIONES:							% AVANCE FINANCIERO:	62,50%
ACTA PARCIAL 1:	\$	10.180.149.492,00	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$			3.054.044.847,60			
ACTA PARCIAL 2:	\$	8.319.430.911,62		\$			2.495.829.273,49			
ACTA PARCIAL 3:	\$	-		\$			-			
ACTA FINAL:				\$			-			
TOTAL PAGADO:	\$	18.499.580.403,62	TOTAL AMORTIZADO:	\$			5.549.874.121			
PENDIENTE X PAGAR	\$	11.100.200.985,38	PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$			3.330.060.296			

III. INFORMACIÓN PÓLIZAS

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/05/2025	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	12 MESES
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
TOMADOR:	CONSORCIO VIAS DEL SINU		

CUMPLIMIENTO					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
N°	CMT	100016442	N° ANEXO	4	N°	CMT	100003658	N° ANEXO	3
AMPARO		VIGENCIA		PERIODO	AMPARO		VIGENCIA		T. CONTRACT
NOMBRE AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA		NOMBRE AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	\$ 2.953.978.138,50	6/05/2025	10/12/2026	LIQ. CONT	AMPARO BASICO, PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.479.989.069,45	6/05/2025	9/06/2029	
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.959.978.138,90	6/05/2025	9/06/2029	CONT Y 3 AÑOS	PATRONAL	\$ 1.479.989.069,45	6/05/2025	9/06/2029	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 2.959.978.138,90	6/05/2025	9/06/2031	5 AÑOS FIN OBRA	CONSTRATISTA Y SUBCONSTRATISTA	\$ 1.479.989.069,45	6/05/2025	9/06/2029	
PLAN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 8.315.230.290,00	6/05/2025	10/12/2025	LIQ. o AMORT	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 1.479.989.069,45	6/05/2025	9/06/2029	

GARANTIAS ACTUALIZADAS CON VALOR ADICIÓN 20/03/2025

IV. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. PRESUP.	CANT. MODIF.	CANT. EJEC.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL EJECUTADO SEMANA
EL RECREO							\$ 285.944.380,65
1.1.2	DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO	M2	693,56	1253,75	112,04	\$ 37.692,00	\$ 4.221.797,62
1.1.4	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	722,53	728,40	174,48	\$ 33.334,00	\$ 5.816.021,98
1.1.6	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (72100)	M2	8907,51	8064,83	24,87	\$ 20.428,00	\$ 503.959,76
1.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	7912,38	8222,40	228,82	\$ 38.161,00	\$ 8.202.049,63
1.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJON PARA FALLOS	M3	4135,41	728,40	218,10	\$ 285.909,00	\$ 62.355.741,50
1.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	1550,78	172,35	33,20	\$ 144.928,00	\$ 4.811.609,60
1.4.6	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3375,54	833,57	330,54	\$ 12.664,00	\$ 4.252.068,56
1.4.7	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	M	57,51	18,19	9,20	\$ 697.735,00	\$ 6.419.162,00
1.4.10	TAPAS DE INSPECCION PARA CARCAMO DE 0.9 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO	UN	6,00	2,00	1,00	\$ 189.591,00	\$ 189.591,00
1.5	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF.)	UND	1,00	1,00	1,00	\$ 4.303.168,00	\$ 4.303.168,00
1.5.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF.)	UND	1,00	1,00	1,00	\$ 775.489,00	\$ 775.489,00
1.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	2,00	1,00	1,00	\$ 1.770.541,00	\$ 1.770.541,00



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

	RETIRO CON TENSION A 240 V. DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	35,00	3,00	1,00	\$ 1.850.974,00	\$ 1.850.974,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL. LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0,00	19,00	6,00	\$ 1.494.956,00	\$ 8.969.736,00
NP 10	INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO A 240V	UND	0,00	4,00	4,00	\$ 4.392.376,00	\$ 17.569.504,00
NP 11	INSTALACION EN TENSION A 240V DE POSTE EN CONCRETO, YESO Y F	UND	0,00	1,00	3,00	\$ 5.982.709,00	\$ 17.948.127,00
NP 12	DESINSTALACION O RETIRO EN TENSION DE ARMADO RED ABIERTA O TRENZADA DE BAJA TENSION	GLB	0,00	5,00	5,00	\$ 3.971.500,00	\$ 19.857.500,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA FIBRA OPTICA	UND	0,00	22,00	22,00	\$ 3.129.750,00	\$ 68.854.500,00
NP 14	DESHINGADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSION A 12 KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	2,00	2,00	\$ 4.551.733,00	\$ 9.103.466,00
NP 15	DESARMADO EN TENSION DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIA TENSION A 12 KV	UND	0,00	4,00	4,00	\$ 5.085.166,00	\$ 20.340.664,00
NP 16	DESHINGADO DE POSTE DE 12 MTS CON TENSION A 12KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	3,00	3,00	\$ 3.129.750,00	\$ 9.389.250,00
NP 17	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSION A 12 KV. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	1,00	1,00	\$ 3.276.473,00	\$ 3.276.473,00
NP 18	DESARMADO O ARMADO DE RED DE MEDIA TENSION, EN TENSION, PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA	UND	0,00	1,00	1,00	\$ 3.113.973,00	\$ 3.113.973,00
NP 36	TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 3 MTS	UND	0,00	1,00	1,00	\$ 2.049.017,00	\$ 2.049.017,00
IMAT							\$ 46.539.585,32
2.1.2	DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO	M2	78,79	191,85	113,36	\$ 37.682,00	\$ 4.250.415,22
2.1.3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2625,97	2997,47	252,17	\$ 29.095,00	\$ 7.336.873,47
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	3815,45	4340,82	377,88	\$ 36.161,00	\$ 13.684.407,79
2.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C a= 15cm	M3	856,69	833,90	34,55	\$ 287.872,00	\$ 11.098.372,40
2.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISION, ANCLAJE Y CANASTILLA E= 0.20 CM	M3	1058,81	1058,45	1,18	\$ 1.389.242,00	\$ 1.633.748,59
2.3.3	CONSTRUCCION DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	2099,32	2146,72	4,76	\$ 24.975,00	\$ 118.930,25
2.5.4	JUNTAS SEGUN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACION, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	327,62	788,68	8,20	\$ 182.483,00	\$ 1.496.360,60
2.6.5	HITO DELINEADOR VIAL FLEXIBLE NARANJA	UND	12,00	21,00	9,00	\$ 151.341,00	\$ 1.352.069,00
2.6.6	SEGREGADORES TEMPORALES	ML	19,00	37,00	18,00	\$ 309.356,00	\$ 5.568.408,00
CANTA CLARO							\$ 16.524.832,45
3.6.1	DEMARCAACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	1146,53	1146,53	0,0020	\$ 11.293,00	\$ 22,59
3.6.3	DEMARCAACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	17,14	37,34	0,0040	\$ 104.900,00	\$ 419,60
3.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	6,00	4,00	1,00	\$ 799.429,00	\$ 799.429,00
3.8.21	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	950,00	100,00	8,83	\$ 69.405,00	\$ 612.846,15
NP04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 10" (incluye excavación)	ML	0,00	21,0	2,37	\$ 209.651,00	\$ 496.872,87
NP05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 12" (incluye excavación)	ML	0,00	368,1	11,94	\$ 280.400,00	\$ 3.347.976,00
NP09	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	12,6	0,97	\$ 122.092,00	\$ 118.429,24
NP27	ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0,00	9,0	1,00	\$ 784.145,00	\$ 784.145,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M. INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL. LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0,00	8,0	7,00	\$ 1.494.956,00	\$ 10.464.692,00
6 DE MARZO - PASATIEMPO - VILLA ROCIO							\$ 147.836.193,23
4.1.2	DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO	M2	1838,61	3046,1	421,23	\$ 37.682,00	\$ 15.872.788,86
4.1.4	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	652,59	594,1	126,37	\$ 33.334,00	\$ 4.212.364,25
4.4.1	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	ML	248,28	781,0	223,45	\$ 31.358,00	\$ 7.006.498,20
4.4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (AFIRMADO E=35 CM)	M3	170,05	97,8	0,00	\$ 158.015,00	\$
4.5	SI TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILER) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	79,61	34,8	5,40	\$ 282.537,00	\$ 1.579.689,80
NP01	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0,00	121,0	10,00	\$ 519.833,00	\$ 5.198.380,00
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	178,8	97,32	\$ 117.066,00	\$ 11.392.863,12
NP 05	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO MEDIDAS INTERNAS 0.8X0.8M - ALTURA VARIABLE	UND	0,00	20,0	17,00	\$ 1.468.427,00	\$ 25.303.259,00
NP 20	CONSTRUCCION DE CARCAMIO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.4M Y ALTURA VARIABLE	ML	0,00	50,5	35,00	\$ 480.827,00	\$ 17.309.772,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA FIBRA OPTICA	UND	0,00	49,0	7,00	\$ 3.129.750,00	\$ 21.908.250,00
NP 14	DESHINGADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSION A 12 KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	4,0	2,00	\$ 4.551.733,00	\$ 9.103.466,00
NP15	DESARMADO EN TENSION DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIA TENSION A 12 KV	UND	0,00	4,0	2,00	\$ 5.085.166,00	\$ 10.170.332,00
NP16	DESHINGADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSION A 240V. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	18,0	6,00	\$ 3.129.750,00	\$ 18.778.500,00



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

EL TAPAO

EL TAPAO							\$	178.855.500,49	
6.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2994,37	3053,3	23,65	\$	29.095,00	\$	697.951,27
6.1.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	116,25	400,0	351,25	\$	33.334,00	\$	12.041.907,50
6.1.3	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2	4528,20	4110,8	35,37	\$	20.428,00	\$	722.538,36
6.1.4	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3 - VLT	4089,67	4508,2	619,25	\$	35.161,00	\$	22.392.645,01
5.1.7	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	0,00	2,0	2,00	\$	441.297,00	\$	892.594,00
6.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	2044,05	1863,3	33,27	\$	158.015,00	\$	5.257.159,05
6.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJON PARA FALLOS	M3	465,00	400,0	245,00	\$	285.909,00	\$	70.047.705,00
6.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO a=15CM)	M3	174,38	100,0	41,87	\$	144.928,00	\$	6.068.135,36
6.3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISION, ANCLAJE Y CANASTILLA, E= 0.20 CM	M3	783,82	783,8	8,82	\$	1.389.242,00	\$	12.253.114,44
6.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCION DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	11954,97	12890,2	1087,55	\$	12.864,00	\$	13.990.277,49
6.3.3	CONSTRUCCION DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	2076,67	2076,7	10,00	\$	24.975,00	\$	249.833,25
6.4.1	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	M	300,00	670,0	370,00	\$	31.356,00	\$	11.601.720,00
6.7.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	4,00	109,0	105,00	\$	213.904,00	\$	22.459.920,00

OTROS COMPONENTES


OTROS COMPONENTES								\$	3.346.223,92
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO	GL	1,00	1,00			\$	166.800.000,00	\$	1.001.921,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	GL	1,00	1,00			\$	390.280.000,00	\$	2.344.302,92
TRAMITE Y LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED INCLUYE: PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACIÓN DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISION DE OBRAS (10 UND)	GL	1,00	1,00			\$	30.000.000,00	\$	
CERTIFICACIÓN RETIE PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION (10 UND)	GL	1,00	1,00			\$	25.000.000,00	\$	

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

\$ 678.946.716,05

AVANCE FISICO A LA FECHA:

2,29%




INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

	(%) PROGR.	(%) EJECUTADO	DIFERENCIA (%) PROG Vs (%) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	77,61%	78,77%	3,14%
DURANTE EL PERIODO	1,31%	2,29%	
ACUMULADO ACTUAL	78,92%	82,06%	

	(V) PROGR	(V) EJECU	DIFERENCIA (\$) PROG Vs (\$) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 22.971.108.584,36	\$ 23.610.956.415,54	\$ 930.684.073,10
DURANTE EL PERIODO	\$ 388.110.474,15	\$ 678.946.716,05	
ACUMULADO ACTUAL	\$ 23.359.219.058,51	\$ 24.289.903.131,61	



AVANCE FINANCIERO

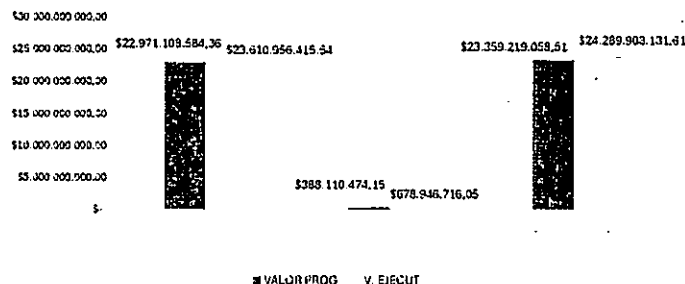

AVANCE GENERAL POR SECTORES

SECTOR	VALOR CONTRACTUAL SECTOR	VALOR SECTOR SEGÚN BALANCE 2	(%) EN PROY.	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	(%) AVANCE SECTOR	(%) AVANCE PROYECTO
EL RECREO	\$ 7.176.779.567,00	\$ 5.456.229.045,00	18,43%	\$ 5.129.339.868,66	\$ 285.944.380,65	\$ 5.415.284.249,31	99,25%	18,30%
IMAT	\$ 3.216.868.173,00	\$ 3.619.763.454,00	12,23%	\$ 2.599.338.544,88	\$ 46.539.585,32	\$ 2.645.878.130,20	73,10%	8,94%
CANTA CLARO	\$ 2.244.737.410,00	\$ 2.235.129.792,00	7,55%	\$ 2.098.510.535,72	\$ 16.624.832,45	\$ 2.115.135.368,16	94,63%	7,15%
6 DE MARZO - PASA TIEMPO - VILLA ROCIO	\$ 8.265.724.760,00	\$ 9.339.614.972,00	31,55%	\$ 7.604.336.516,97	\$ 147.836.193,23	\$ 7.752.172.810,20	83,00%	26,19%
MONTEVERDE	\$ 2.410.549.573,00	\$ 4.129.470.604,00	13,56%	\$ 3.588.618.538,98	\$ -	\$ 3.588.618.538,98	86,90%	12,12%
EL TAPAO	\$ 3.329.194.240,00	\$ 3.747.993.345,00	12,66%	\$ 2.138.590.060,62	\$ 178.695.500,49	\$ 2.317.285.561,11	61,83%	7,83%
RANCHOS DEL INAT	\$ 459.500.577,00	\$ 459.500.577,00	1,55%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OBRAS	\$ 27.105.354.300,00	\$ 28.987.791.389,00		\$ 23.158.734.163,23	\$ 675.600.492,14	\$ 23.834.334.655,37		
PGIO	\$ 169.800.000,00	\$ 166.600.000,00	0,56%	\$ 135.403.661,23	\$ 1.001.921,00	\$ 136.405.582,23	81,78%	0,46%
PMT	\$ 390.280.000,00	\$ 390.280.000,00	1,32%	\$ 316.818.590,94	\$ 2.344.302,92	\$ 319.162.893,86	81,78%	1,08%
OPERADOR DE REDES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,10%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
RETE	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	0,08%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS COMPONENTES	\$ 612.080.000,00	\$ 612.080.000,00		\$ 452.222.252,17	\$ 3.348.222,92	\$ 455.568.475,09		
VALOR TOTAL	\$ 27.717.434.300,00	\$ 29.599.781.389,00	100,00%	\$ 23.610.956.415,54	\$ 678.946.716,05	\$ 24.289.903.131,61		82,06%

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES:

- La interventoría verifica la situación actual en campo antes del inicio de cada una de las actividades en obra.
- La interventoría revisó los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, y especificaciones técnicas de la obra.
- La interventoría solicita al contratista el cronograma de trabajo con la ruta crítica y flujo de inversión.
- También verifica los demás documentos técnicos y hojas de vida del personal evaluado del contratista, los cuales cumplen con lo requeridos en el pliego de condiciones.
- Hace controles y seguimientos en obra.
- Hace revisiones y balances de las obras, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos.
- Lleva a diario la bitácora de obra en conjunto con el contratista.
- Hace cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional.
- Acata las disposiciones normativas locales, departamentales y nacionales que afectan la ejecución de las obras en los aspectos técnicos.
- La interventoría verifica que todos los trabajadores y personal de obra se encuentren afiliados a la Seguridad Social y exige el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP en obra.

COMENTARIOS:

- El contratista instala valla informativa del proyecto con el diseño y las especificaciones dadas, en el sector IMAT, cada frente consta de vallas móviles con la información de cada sector.
- El Contratista activa el componente social iniciando con el levantamiento de las actas de veeduría en el tramo de Villa Rocio (11 de junio 2025).
- El día viernes 30 de mayo 2025 se socializa con la comunidad el inicio de obras en sector 6 de Marzo - Pasa Tiempo - Villa Rocio y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana por parte de la supervisión de obras.
- Se realiza comité técnico de obra con el contratista en donde se abordan temas varios preliminares al inicio de obra. (anexo al presente informe e)
- Se actualizan las pólizas a fecha de acta de inicio.
- El día lunes 16 de junio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el tramo de El Tapao y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día lunes 7 de julio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente III correspondiente al barrio Canta Claro y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día viernes 1 de agosto de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente IV correspondiente al barrio Monteverde y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- Se continúa con el normal desarrollo constructivo de las actividades en los sectores de Canta Claro, 6 de Marzo, Monteverde y el sector de El Recreo.
- El sábado 25 de octubre de 2025 se hace entrega parcial y se pone en servicio el tramo del frente Villa Roco, se hace entrega por parte del contratista y se recibe a satisfacción por parte de la Gobernación de Córdoba y la supervisión de obra, la interventoría y la comunidad.
- Se hace recorrido de obra, interventoría y contratista, en el frente 6 de marzo para identificar ajustes y resacas en los elementos que hacen parte del pavimento en ejecución.



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

- El día 23 de diciembre se hace entrega mediante acto protocolario del frente de obra Santa Clara, contando con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría y la comunidad en general.
- El 20 de marzo de 2026 se aprueba balance de obra No. 2, donde se reporta ajuste de mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y valor adicional de recursos por la suma de \$1.882.347.089,00, quedando el contrato con un nuevo valor por la suma de \$29.599.781.389,00

COMPONENTE DE CALIDAD:

- El Plan de Calidad se enfocó en asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos para la ejecución del proyecto.
- Se realizaron densidades y ensayos de laboratorio para el control de calidad de los concretos y materiales empleados.
- Se llevo a cabo un monitoreo y evaluación de los procedimientos constructivos implementados por el contratista, mediante vistas técnicas y permanencia en campo.
- Se verifica que los ensayos de laboratorio (densidades, granulometrías, resistencias) se realicen correctamente y cumplan las especificaciones contratadas, se supervisa la correcta ejecución de las capas que conforman la estructura del pavimento.
- Esta interventoría continuará realizando estricto seguimiento a los procesos constructivos y a los resultados de los ensayos para asegurar la calidad de la obra.
- El día 12 de diciembre de 2025, se hace entrega parcial del frente de obra sector Monteverde y se socializa inicio de actividades en el sector de Pasatiempo, ambos actos contaron con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría, veeduría ciudadana y comunidad en general.
- El día 18 de diciembre se socializa el inicio de obra con la comunidad de El Tapao, contando con la presencia de la Gobernación de Córdoba.
- El día 23 de diciembre se hace entrega mediante acto protocolario del frente de obra Santa Clara, contando con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría y la comunidad en general.

COMPONENTE SOCIAL:

- Permanente se resuelven inquietudes de la comunidad y se da respuesta a los requerimientos y consultas de la misma.
- Se realizó la distribución de volantes a la comunidad del barrio donde se estaba llevando a cabo el proyecto.
- Se elaboraron las actas de vecindad del barrio Villa Roca, y se encuentran en levante de información de actas los barrios 6 de Marzo y Santa Clara (acta de oportuna).
- Se levantan las actas de cierre de vecindad en los tramos donde se hace entrega parcial de obra a la comunidad y se pone en funcionamiento la vía.

COMPONENTE SST:

- Se verifica que se realicen las charlas de seguridad en el trabajo, con el personal vinculado y afiliado al proyecto.
- Se realiza la inspección preoperacional de la maquinaria pesada que se encuentra en obra.
- Diariamente y durante la ejecución de los trabajos, se verifica que se cuente con la señalización y demarcación de la zona intervenida.

COMPONENTE AMBIENTAL/FORESTAL:

- A la fecha se cuenta con: SOLICITUD DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (17/02/2025) por parte de la CVS mediante el cual se establecen los parámetros para realizar las gestiones ambientales antes y durante la ejecución del proyecto.

VI. FIRMAS

Diego Villadiego

DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA

REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO IDC



ELABORÓ



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

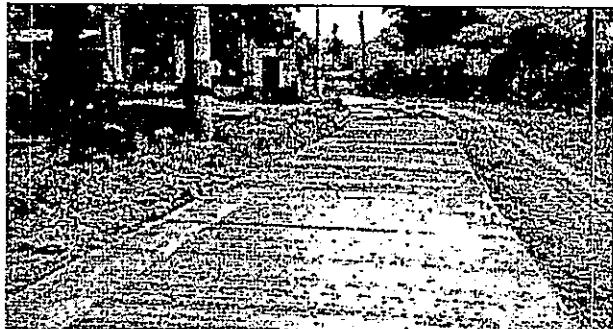



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

FECHA DE PRESENTACIÓN:			lunes, 23 de marzo de 2026			SEMANA No.:		41	DEL	16-mar-26		AL	22-mar-26				
CONTRATO DE INTERVENTORIA																	
OBJETO:		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CORDOBA							FECHA DE INICIO:			6/09/2025					
									FECHA DE FINAL:			5/06/2026					
CONTRATISTA:		CONSORCIO IDC					NIT:		901.947.252-6			DIRECCIÓN:		CR 6 # 65 24 OFIC. 410 CC PLACE MALL			
REP. LEGAL:		DIEGO VILLADIEGO ESPINA															
CONTRATO No.:		SI-CMA-001-2025															
PLAZO INICIAL:		12	MESES		VALOR INICIAL INTER:		\$		1.480.084.416,00		ADICIONES:			FECHA ADICIÓN:			
ACTA DE INICIO:		06 DE JUNIO 2025				VALOR TOTAL		\$		1.480.084.416,00		\$					
PRORROGA 1:				FECHA PRORROGA:													
CONTRATO DE OBRA																	
OBJETO:		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CORDOBA							FECHA DE INICIO:			6/09/2025					
									FECHA DE FINAL:			5/06/2026					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS DEL SINU					NIT:		901.919.377-5			DIRECCIÓN:		CR 6 # 65 24 OFIC. 501 CC PLACE MALL			
REP. LEGAL:		CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ					INTERVENTORIA:										
CONTRATO No.:		SI-LP-003-2024					REP. LEGAL INTER:										
PLAZO INICIAL:		12	MESES		VALOR INICIAL OBRA:		\$		27.717.434.300,00		ADICIONES:			FECHA ADICIÓN:			
ACTA DE INICIO:		05 DE JUNIO 2025				VALOR TOTAL		\$		29.599.781.389,00		\$		1.882.347.089,00		20 DE MARZO DE 2026	
PRORROGA 1:				FECHA PRORROGA:													

III. INFORMACIÓN PÓLIZAS

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/09/2025	LICUACIÓN DEL CONTRATO:
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	BENEFICIARIO:
TOMADOR:	CONSORCIO VÍAS DEL SINU	DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CUMPLIMIENTO					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
N°	CMT	100015442	N° ANEXO	4	N°	CMT	100003508	N° ANEXO	3
AMPARO		VIGENCIA		PERIODO	AMPARO		% V.CONT	VIGENCIA	T. CONTRACT
HOMBRE AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA		HOMBRE AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	\$ 2.959.978.138,90	6/06/2025	10/12/2026	UQ. CONT	AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.479.989.089,45	5/05/2025	9/05/2029	
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.959.978.138,90	6/06/2025	9/06/2029	CONT Y 3 AÑOS	PATROIAL	\$ 1.479.989.089,45	6/06/2025	9/06/2029	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 2.959.978.138,90	6/06/2025	9/06/2031	5 AÑOS FIN OBRA	CONSTRATISTA Y SUBCONSTRATISTA	\$ 1.479.989.089,45	6/06/2025	9/06/2029	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 8.315.230.290,00	6/06/2025	10/12/2026	UQ o AMORT	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 1.479.989.089,45	6/06/2025	9/06/2029	

GARANTIAS ACTUALIZADAS CON VALOR ADICIÓN 20/03/2026

IV. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. PRESUP.	CANT. MODIF.	CANT. EJE.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL EJECUTADO SEMANA
EL RECREO							\$ 228.805.873,80
1.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	319,51	324,31	4,80	\$ 58.103,00	\$ 278.894,40
1.1.2	DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	693,56	1253,75	392,13	\$ 37.682,00	\$ 14.776.291,68
1.1.4	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	722,53	728,40	324,03	\$ 33.334,00	\$ 10.801.183,69
1.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (T2100)	M2	8907,51	8084,88	43,46	\$ 20.428,00	\$ 887.766,15
1.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	7912,38	8222,40	723,64	\$ 36.161,00	\$ 26.167.710,71
2.1.7	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	0,00	3,00	3,00	\$ 441.297,00	\$ 1.323.891,00
3.1.7	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	0,00	3,00	3,00	\$ 615.987,00	\$ 1.847.961,00
1.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJON PARA FALLOS	M3	4135,41	728,40	203,78	\$ 265.909,00	\$ 58.262.175,06
1.2.4	RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO a=15CM)	M3	1550,78	172,35	24,20	\$ 144.928,00	\$ 3.506.901,08
1.4.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1127,10	82,52	82,52	\$ 29.095,00	\$ 2.401.041,60
1.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCION DE TERRENO.	M3	1127,10	2,04	2,04	\$ 423.349,00	\$ 863.605,56
1.4.5	CONCRETO CLASE F PARA SOLADO DE LIMPIEZA a=0.05m	M2	38,11	22,67	22,67	\$ 46.360,00	\$ 1.050.795,76
1.4.6	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3375,54	833,57	503,03	\$ 12.864,00	\$ 6.470.999,96

11.272

		INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA						 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	
1.4.7	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	M	57.51	18,19	8,99	\$	697.735,00	\$	6.272.637,65
1.4.10	TAPAS DE INSPECCION PARA CARCAMO DE 0.9 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO	UN	6,00	2,00	1,00	\$	189.591,00	\$	189.591,00
3.4.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (AFIRMADO E=40 CM)	M3	0,00	32,93	32,93	\$	158.015,00	\$	5.203.117,92
1.7.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	26,00	36,00	10,00	\$	213.904,00	\$	2.139.040,00
1.7.2	REUBICACION TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	1,00	28,00	27,00	\$	477.758,00	\$	12.899.456,00
NP 21	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0,00	19,00	12,00	\$	1.494.956,00	\$	17.939.472,00
NP 22	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND	0,00	1,00	1,00	\$	737.702,00	\$	737.702,00
NP 25	DEMOLUCION DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	0,00	777,50	777,50	\$	14.160,00	\$	11.009.400,00
NP 24	TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LUVIA EN 4" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO.	M	0,00	12,60	12,60	\$	191.515,00	\$	2.414.349,00
NP 28	DEMOLUCION DE ESTRUCTURAS	M3	0,00	1,63	1,63	\$	224.250,00	\$	364.406,25
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE PARA AGUAS LUVIAS, EN PLATINAS DE 3" x 1/4" Y ANGULOS DE 3" x 3/8", DE 60CM DE ANCHO. INCLUYE BISAGRAS CILINDRICAS PARA ABERTURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	0,00	11,50	11,50	\$	1.268.200,00	\$	14.561.300,00
NP 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 16" (incluye excavacion)	M	0,00	54,88	54,88	\$	474.385,00	\$	26.034.248,80
NP 09	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	3,29	3,29	\$	122.092,00	\$	402.024,54
IMAT								\$	33.888.269,69
2.1.1	DEMOLUCION DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	33,32	40,00	8,68	\$	58.103,00	\$	388.128,04
2.1.3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2625,97	2997,47	65,87	\$	29.095,00	\$	1.916.487,65
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	3815,45	4340,82	85,63	\$	36.161,00	\$	3.096.502,59
2.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCION DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17432,31	17391,58	876,52	\$	12.864,00	\$	8.702.776,25
2.6.1	DEMARCAACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	3057,17	2221,32	178,05	\$	11.293,00	\$	2.010.718,65
1.7.2	REUBICACION TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	0,00	2,00	2,00	\$	477.758,00	\$	955.516,00
NP 03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	63,64	63,64	\$	117.066,00	\$	7.450.548,50
NP 19	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (ANCHO 1.50 M)	UND	0,00	5,00	1,00	\$	689.147,00	\$	689.147,00
NP 22	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND	0,00	2,00	2,00	\$	737.702,00	\$	1.475.404,00
NP 37	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO MEDIDAS INTERIAS 1.00X1.00M - ALTURA VARIABLE. E=0.20M	UND	0,00	1,00	1,00	\$	2.832.631,00	\$	2.832.631,00
NP 38	TAPA PARA CAJA DE RED ELECTRICA, DIMENSIONES (1.32X2.42)M	UND	0,00	1,00	1,00	\$	4.370.410,00	\$	4.370.410,00
CANTA CLARO								\$	165.617.961,29
3.1.1	DEMOLUCION DE ANDENES DE CONCRETO	M2	105,06	447,93	342,87	\$	37.682,00	\$	12.920.041,78
3.1.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1771,31	1779,15	7,84	\$	29.095,00	\$	220.162,99
3.1.3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	96,42	257,10	160,68	\$	33.334,00	\$	5.356.107,12
3.1.4	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2	2465,62	1740,27	13,64	\$	20.428,00	\$	278.663,45
3.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	2437,62	2895,46	457,84	\$	36.161,00	\$	16.556.051,68
3.1.7	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M. INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	8,00	36,00	25,00	\$	615.987,00	\$	15.399.675,00
3.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (AFIRMADO E=25 CM)	M3	1041,11	762,82	3,61	\$	158.015,00	\$	571.026,71
3.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	352,37	353,96	1,59	\$	287.872,00	\$	458.436,16
3.4.1	DEMOLUCION DE CUNETAS EXISTENTES	ML	402,00	546,00	43,00	\$	31.356,00	\$	1.348.308,00
3.4.10	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	10838,54	3825,20	452,91	\$	12.864,00	\$	5.826.213,10
3.5.1	SI TABLETA GUIA PREF TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mx0.20m X 0.03m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	63,69	7,20	7,20	\$	292.537,00	\$	2.106.266,40
3.7.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	7,00	42,00	35,00	\$	213.904,00	\$	7.486.640,00
NP03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0,00	157,3	1,15	\$	117.066,00	\$	134.625,90
NP 22	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO, PARA TRASLADO DE EXISTENTES	UND	0,00	33,0	33,00	\$	737.702,00	\$	24.344.166,00
NP 24	TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO.	M	0,00	71,4	71,40	\$	191.515,00	\$	13.681.311,00
NP 29	EXCAVACION MANUAL	M3	0,00	220,6	220,58	\$	45.500,00	\$	10.036.572,00
NP 31	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2". EXCAVACION Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND	0,00	29,0	29,00	\$	194.532,00	\$	5.641.428,00
NP 32	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2" EXCAVACION Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR	UND	0,00	2,0	2,00	\$	280.332,00	\$	560.664,00
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE PARA AGUAS LUVIAS, EN PLATINAS DE 3" x 1/4" Y ANGULOS DE 3" x 3/8", DE 60CM DE ANCHO. INCLUYE BISAGRAS CILINDRICAS PARA ABERTURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	0,00	33,7	33,71	\$	1.268.200,00	\$	42.883.602,00
6 DE MARZO - PASATIEMPO - VILLA ROCIO								\$	625.722.270,92
4.1.2	DEMOLUCION DE ANDENES DE CONCRETO	M2	1838,61	3046,1	355,56	\$	37.682,00	\$	13.388.211,92



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

4.1.4	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	652,59	594,1	109,67	\$	33.334,00	\$	3.555.671,11
4.1.7	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	45,00	69,0	24,00	\$	441.297,00	\$	10.591.128,00
4.2.3	MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	1305,18	594,1	177,17	\$	285.909,00	\$	50.654.497,53
4.4.1	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	ML	249,29	781,0	208,77	\$	31.356,00	\$	6.546.192,12
4.4.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	953,14	43,3	11,00	\$	29.095,00	\$	320.045,00
4.4.2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO.	M3	0,00	11,0	7,15	\$	423.349,00	\$	3.026.945,35
4.5.7	SI BOLLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M3 - 10U EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	29,00	360,0	266,00	\$	475.652,00	\$	125.523.432,00
4.6.1	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	5339,23	5106,1	642,59	\$	11.293,00	\$	7.256.771,69
4.6.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA (60X60 CM)	UND	167,00	165,0	43,00	\$	896.973,00	\$	38.569.839,00
4.6.3	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	355,80	362,3	83,03	\$	104.900,00	\$	8.709.458,87
4.6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	104,00	103,2	27,03	\$	467.929,00	\$	12.646.717,08
4.7.1	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	21,00	99,0	78,00	\$	213.904,00	\$	16.694.512,00
4.8.6	DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	2,0	2,00	\$	3.880.278,00	\$	7.760.558,00
4.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1,00	4,0	2,00	\$	4.761.524,00	\$	9.523.048,00
4.8.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	21,00	19,0	3,00	\$	762.648,00	\$	2.287.944,00
1.8.24	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF).	UND	0,00	8,0	8,00	\$	2.913.280,00	\$	23.306.240,00
1.8.25	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF).	UND	0,00	8,0	8,00	\$	553.114,00	\$	4.424.912,00
NP 09	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	0,00	26,3	5,24	\$	122.092,00	\$	639.762,08
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA 12"	ML	0,00	68,8	5,00	\$	280.400,00	\$	1.402.000,00
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA 14"	ML	0,00	457,0	52,46	\$	393.646,00	\$	20.650.669,16
NP 27	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0,00	23,0	6,00	\$	784.145,00	\$	4.704.870,00
NP21	LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON	UND	1,00	104,0	65,00	\$	1.494.956,00	\$	97.172.140,00
NP 23	CONEXION Y ADECUACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CON PROFUNDIDADES INFERIORES A 0.90 M. INCLUYE EL EMPALME HASTA LA CAJA DE REGISTRO PRINCIPAL	UND	0,00	10,0	10,00	\$	502.763,00	\$	5.027.630,00
NP 24	TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	0,00	198,7	198,71	\$	191.615,00	\$	38.075.500,00
NP 29	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	0,00	192,2	133,46	\$	45.500,00	\$	6.072.430,00
NP 31	TUBERÍA PVC DE 1/2" . EXCAVACIÓN Y RELLENO. NO INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND	0,00	235,5	71,00	\$	194.532,00	\$	13.811.772,00
NP 32	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 1/2" EXCAVACIÓN Y RELLENO. INCLUYE CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR	UND	0,00	278,8	4,00	\$	280.332,00	\$	1.121.328,00
NP 13	TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UND	0,00	49,0	18,00	\$	3.129.750,00	\$	58.335.500,00
NP 14	DESHINCADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 13.2 KV. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	4,0	2,00	\$	4.551.733,00	\$	9.103.466,00
NP15	DESARMADO EN TENSIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIA TENSIÓN A 13.2 KV	UND	0,00	4,0	2,00	\$	5.065.166,00	\$	10.170.332,00
NP16	DESHINCADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V. INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND	0,00	18,0	5,00	\$	3.129.750,00	\$	15.648.750,00



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

OTROS COMPONENTES

						\$	5.220.592,76
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA - PGIO	GL	1,00	1,00			\$	166.800.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	GL	1,00	1,00			\$	390.280.000,00
TRAMITE Y LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED, INCLUYE PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACIÓN DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISIÓN DE OBRAS (10 UND)	GL	1,00	1,00			\$	30.000.000,00
CERTIFICACIÓN RETE PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (10 UND)	GL	1,00	1,00			\$	25.000.000,00


TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

\$ 1.059.254.968,45

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

3,58%

	(%) PROGR	(%) EJECUTADO	DIFERENCIA (%) PROG Vs (%) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	71,24%	76,18%	2,16%
DURANTE EL PERIODO	1,42%	3,58%	
AJUSTE REPROGRAMACIÓN No 2	4,95%		
ACUMULADO ACTUAL	77,61%	79,77%	




	(V) PROGR	(V) EJECU	DIFERENCIA (\$) PROG Vs (\$) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 21.087.334.153,67	\$ 22.551.701.447,09	\$ 639.847.831,19
DURANTE EL PERIODO	\$ 419.407.137,27		
AJUSTE REPROGRAMACIÓN No 2	\$ 1.464.367.293,42		
ACUMULADO ACTUAL	\$ 22.971.108.584,36	\$ 23.610.956.415,54	

1484357293

NOTA: El contratista dentro de lo reprogramado en el balance de obra No. 2, ajusta el valor de \$1.464.367.293,42 el cual ya fue ejecutado y que se venía reportando como supervál, esto con el fin de reprogramar en el tiempo restante solo los recursos realmente faltantes por ejecutar incluido el valor adicional; por lo que se ajusta el acumulado programado en la semana 41 (nuevo balance No. 2 y adición) de \$21.087.334.153,67 a \$22.971.108.584,36 incluido lo programado para esa misma semana.

AVANCE FINANCIERO



AVANCE GENERAL POR SECTORES

SECTOR	VALOR CONTRACTUAL SECTOR	VALOR SECTOR SEGÚN BALANCE 2	(%) EN PROY.	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	(%) AVANCE SECTOR	(%) AVANCE PROYECTO
EL RECREO	\$ 7.176.779.567,00	\$ 5.456.229.045,00	18,43%	\$ 4.900.533.992,05	\$ 228.805.873,80	\$ 5.129.339.865,86	94,01%	17,33%
INAT	\$ 3.218.868.173,00	\$ 3.619.763.454,00	12,23%	\$ 2.565.450.275,19	\$ 33.888.269,69	\$ 2.599.338.544,88	71,81%	8,78%
ANTA CLARO	\$ 2.244.737.410,00	\$ 2.235.129.792,00	7,55%	\$ 1.932.892.574,43	\$ 165.617.961,29	\$ 2.098.510.535,72	93,65%	7,05%
6 DE MARZO - PASA TIEMPO - VILLA ROCIO	\$ 8.265.724.750,00	\$ 9.339.614.572,00	31,55%	\$ 6.978.614.346,05	\$ 925.722.270,92	\$ 7.904.336.616,97	81,42%	23,69%
MONTEVERDE	\$ 2.410.549.573,00	\$ 4.129.470.604,00	13,95%	\$ 3.588.518.538,98	\$ -	\$ 3.588.518.538,98	88,90%	12,12%
EL TAPAO	\$ 3.329.184.240,00	\$ 3.747.993.345,00	12,66%	\$ 2.138.560.060,82	\$ -	\$ 2.138.560.060,82	57,05%	7,23%
RANCHOS DEL INAT	\$ 459.500.577,00	\$ 459.500.577,00	1,55%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OBRAS	\$ 27.105.354.300,00	\$ 28.987.701.389,00		\$ 22.104.699.787,63	\$ 1.054.034.375,70	\$ 23.158.734.163,23		
PGIO	\$ 166.800.000,00	\$ 166.800.000,00	0,56%	\$ 133.840.519,72	\$ 1.563.141,51	\$ 135.403.661,23	81,18%	0,46%
PMT	\$ 390.280.000,00	\$ 390.280.000,00	1,32%	\$ 313.161.139,69	\$ 3.657.451,25	\$ 316.818.590,94	81,18%	1,07%
OPERADOR DE REDES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,10%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
RETE	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	0,08%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS COMPONENTES	\$ 612.080.000,00	\$ 612.080.000,00		\$ 447.001.659,41	\$ 5.220.592,76	\$ 452.222.252,17		
VALOR TOTAL	\$ 27.717.434.300,00	\$ 29.599.781.389,00	100,00%	\$ 22.551.701.447,09	\$ 1.059.254.968,45	\$ 23.610.956.415,54		79,77%
				76,19%	3,58%	79,77%		

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES:

- La interventoría verifica la situación actual en campo antes del inicio de cada una de las actividades en obra.
- La interventoría revisó los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, y especificaciones técnicas de la obra.
- La interventoría solicita al contratista el cronograma de trabajo con la ruta crítica y flujo de inversión.
- También verifica los demás documentos técnicos y hojas de vida del personal evaluable del contratista, los cuales cumplen con los requeridos en el pliego de condiciones.
- Hace controles y seguimientos en obra.
- Hace revisiones y balances de las obras, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos.
- Lleva a diario la bitácora de obra en conjunto con el contratista.
- Hace cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional.
- Acata las disposiciones normativas locales, departamentales y nacionales que afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos.
- La interventoría verifica que todos los trabajadores y personal de obra se encuentren afiliados a la Seguridad Social y exige el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP en obra.

COMENTARIOS:

- El contratista instala valla informativa del proyecto con el diseño y las especificaciones dadas, en el sector INAT, cada frente consta de vallas móviles con la información de cada sector.
- El Contratista activa el componente social iniciando con el levantamiento de las actas de vecindad en el tramo de Villa Rocio (11 de junio 2025).
- El día viernes 30 de mayo 2025 se socializa con la comunidad el inicio de obras en sector 6 de Marzo - Pasa Tiempo - Villa Rocio y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana por parte de la supervisión de obras.
- Se realiza comita técnica de obra con el contratista en donde se abordan temas varios preliminares al inicio de obra. (anexo al presente informe)
- Se actualizan las pólizas a fecha de acta de inicio.
- El día lunes 16 de junio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el tramo de El Tapao y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día lunes 7 de julio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente III correspondiente al barrio Canta Claro y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día viernes 1 de agosto de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente IV correspondiente al barrio Monteverde y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- Se continúa con el normal desarrollo constructivo de las actividades en los sectores de Canta Claro, 6 de Marzo, Monteverde y el sector de El Recreo.
- El sábado 25 de octubre de 2025 se hace entrega parcial y se pone en servicio el tramo del frente Villa Roco, se hace entrega por parte del contratista y se recibe a satisfacción por parte de la Gobernación de Córdoba y la supervisión de obra, la interventoría y la comunidad.
- Se hace recorrido de obra, interventoría y contratista, en el frente 6 de marzo para identificar ajustes y resacas en los elementos que hacen parte del pavimento en ejecución.
- El día 23 de diciembre se hace entrega mediante acto protocolario del frente de obra Canta Claro, contando con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría y la comunidad en general.
- El 20 de marzo de 2025 se aprueba balance de obra No. 2, donde se reporta ajuste de mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y valor adicional de recursos por la suma de \$1.682.347.089,00, quedando el contrato con un nuevo valor por la suma de \$29.599.781.389,00

COMPONENTE DE CALIDAD:

- El Plan de Calidad se enfocó en asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos para la ejecución del proyecto.
- Se realizaron densidades y ensayos de laboratorio para el control de calidad de los concretos y materiales empleados.
- Se llevó a cabo un monitoreo y evaluación de los procedimientos constructivos implementados por el contratista, mediante vistas técnicas y permanencia en campo.
- Se verifica que los ensayos de laboratorio (densidades, granulometría, resistencias) se realicen correctamente y cumplan las especificaciones contratadas, se supervisa la correcta ejecución de las capas que conforman la estructura del pavimento.
- Esta interventoría continuará realizando estricto seguimiento a los procesos constructivos y a los resultados de los ensayos para asegurar la calidad de la obra.
- El día 12 de diciembre de 2025, se hace entrega parcial del frente de obra sector Monteverde y se socializa inicio de actividades en el sector de Pasa tiempo, ambos actos contaron con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría, veeduría ciudadana y comunidad en general.
- El día 18 de diciembre se socializa el inicio de obra con la comunidad de El Tapao, contando con la presencia de la Gobernación de Córdoba.

COMPONENTE SOCIAL:

- Permanentemente se resuelven inquietudes de la comunidad y se da respuesta a los requerimientos y consultas de la misma.
- Se realizó la distribución de volantes a la comunidad del barrio donde se estaba llevando a cabo el proyecto.
- Se elaboraron las actas de vecindad del barrio Villa Rocio, y se encuentran en levante de información de actas los barrios 6 de Marzo y Canta Claro (acta de apertura).
- Se levantan las actas de cierre de vecindad en los tramos donde se hace entrega parcial de obra a la comunidad y se pone en funcionamiento la vía.

COMPONENTE SST:

- Se verifica que se realicen las charlas de seguridad en el trabajo, con el personal vinculado y afiliado al proyecto.
- Se realiza la inspección preoperacional de la maquinaria pesada que se encuentra en obra.
- Diariamente y durante la ejecución de los trabajos, se verifica que se cuente con la señalización y demarcación de la zona intervenida.

COMPONENTE AMBIENTAL/FORESTAL:

- A la fecha se cuenta con: SOLICITUD DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (17/02/2025) por parte de la CVS mediante el cual se establecen los parámetros para realizar las gestiones ambientales antes y durante la ejecución del proyecto.

VI. FIRMAS:

Diego Villadiego
DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO IBO
ELABORÓ






INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

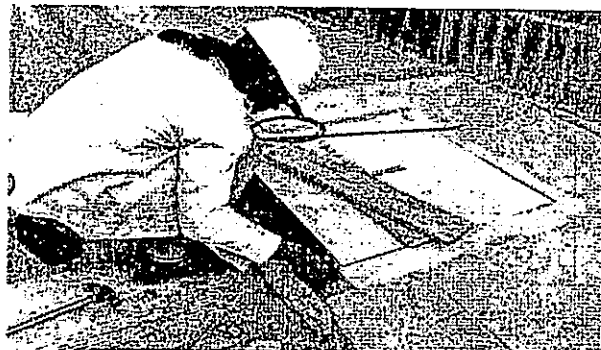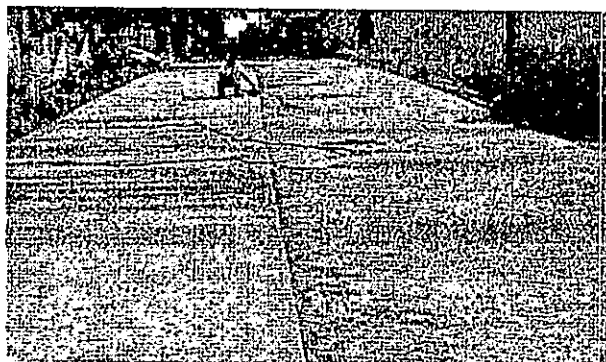



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

FECHA DE PRESENTACIÓN:			lunes, 16 de marzo de 2025			SEMANA No.:		40	DEL	9-mar-26		AL	15-mar-26	
CONTRATO DE INTERVENTORIA														
OBJETO:		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CORDOBA"							FECHA DE INICIO:		6/06/2025			
CONTRATISTA:		CONSORCIO IDC			NIT:		901.947.262-6		FECHA DE FINAL:		5/06/2026			
REP. LEGAL:		DIEGO VILLADIEGO ESPITIA												
CONTRATO No.		SI-CMA-001-2025												
PLAZO INICIAL:		12 MESES		VALOR INICIAL INTER:		\$ 1.480.084.416,00		ADICIONES:		FECHA ADICIÓN:				
ACTA DE INICIO:		06 DE JUNIO 2025		VALOR TOTAL		\$ 1.480.084.416,00		\$						
PRORROGA 1:		FECHA PRORROGA:												
CONTRATO DE OBRA														
OBJETO:		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CORDOBA							FECHA DE INICIO:		6/06/2025			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS DEL SINU			NIT:		901.919.377-5		FECHA DE FINAL:		5/06/2026			
REP. LEGAL:		CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ			INTERVENTORIA:		DIRECCIÓN: CR 6 # 65 24 OFIC. 501 CC PLACE MALL							
CONTRATO No.		SI-LP-003-2024			REP. LEGAL INTER:									
PLAZO INICIAL:		12 MESES		VALOR INICIAL OBRA:		\$ 27.717.434.300,00		ADICIONES:		FECHA ADICIÓN:				
ACTA DE INICIO:		06 DE JUNIO 2025		VALOR TOTAL		\$ 27.717.434.300,00		\$						
PRORROGA 1:		FECHA PRORROGA:												

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO: SI	PORCENTAJE:		30%	\$	8.315.230.290,00	DESEMBOLSADO?	SI
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		RESUMEN DE AMORTIZACIONES:					
ACTA PARCIAL 1:	\$	10.180.149.492,00			\$	3.054.044.847,60	
ACTA PARCIAL 2:	\$	8.319.430.911,62			\$	2.495.829.273,49	
ACTA PARCIAL 3:	\$				\$		
ACTA FINAL:	\$				\$		
TOTAL PAGADO:	\$	18.499.580.403,62			\$	5.549.874.121	
PENDIENTE X PAGAR	\$	9.217.853.896,38			\$	2.765.356.169	
						% AVANCE FINANCIERO:	66,74%

III. INFORMACIÓN PÓLIZAS

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/06/2025	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
TOMADOR:	CONSORCIO VÍAS DEL SINU		
			12 MESES

CUMPLIMIENTO					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
N°	CMT	100016442	N° ANEXO	2	N°	CMT	100003668	N° ANEXO	2
AMPARO		VIGENCIA		PERIODO	AMPARO		5% V.CONT		T. CONTRACT
NOMBRE AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA		NOMBRE AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	\$ 2.771.743.430,00	6/06/2025	10/12/2025	LIQ. CONT	AMPARO BASICO, PREGIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.385.871.715,00	6/06/2025	9/06/2025	
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.771.743.430,00	6/06/2025	9/06/2025	CONT Y 3 AÑOS	PATRONAL	\$ 1.385.871.715,00	6/06/2025	9/06/2025	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 2.771.743.430,00	6/06/2025	9/06/2031	5 AÑOS FIN OBRA	CONSTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	\$ 1.385.871.715,00	6/06/2025	9/06/2025	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 8.315.230.290,00	6/06/2025	10/12/2025	LIQ. o AMORT	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 1.385.871.715,00	6/06/2025	9/06/2025	

IV. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT. PRESUP.	CANT. MODIF.	CANT. EJEC.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL EJECUTADO SEMANA
IMAT							\$ 57.292.605,59
2.1.2	DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO	M2	78,79	78,79	44,79	\$ 37.682,00	\$ 1.687.776,78
2.1.3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2625,97	2800,18	134,56	\$ 29.095,00	\$ 3.915.023,20
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	3815,45	3942,52	174,93	\$ 36.161,00	\$ 6.325.571,41
2.2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	410,53	2148,27	2,49	\$ 158.015,00	\$ 392.888,50
2.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	856,68	856,68	45,91	\$ 287.872,00	\$ 13.216.779,26
2.3.2	ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCION DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17432,31	17432,31	705,56	\$ 12.864,00	\$ 9.073.751,04
2.3.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1345,90	1345,90	116,30	\$ 166.143,00	\$ 19.272.588,00
2.6.1	DEMARCAION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	3057,17	2278,63	301,80	\$ 11.293,00	\$ 3.408.227,40
5 DE MARZO - PASATIEMPO - VILLA ROCIO							\$ 298.038.411,55
4.3	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	39,00	30,0	12,00	\$ 615.987,00	\$ 7.201.844,00
4.3.4	CONSTRUCCION DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGUN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO.	M	4809,07	4809,1	166,81	\$ 24.975,00	\$ 4.161.168,00
4.3.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	952,20	3559,5	45,44	\$ 166.143,00	\$ 7.549.537,92

**INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA**[illegible]




INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA




GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

	(%) PROGR.	(%) EJECUTADO	DIFERENCIA (%) PROG Vs (%) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	74,82%	80,08%	5,28%
DURANTE EL PERIODO	1,28%	1,28%	
ACUMULADO ACTUAL	76,08%	81,36%	

	(V) PROGR	(V) EJECU	DIFERENCIA (\$) PROG Vs (\$) EJECU
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 20.736.934.355,17	\$ 22.196.370.429,81	\$ 1.454.367.293,42
DURANTE EL PERIODO	\$ 350.399.798,50	\$ 355.331.017,14	
ACUMULADO ACTUAL	\$ 21.087.334.153,67	\$ 22.551.701.447,09	



AVANCE FINANCIERO

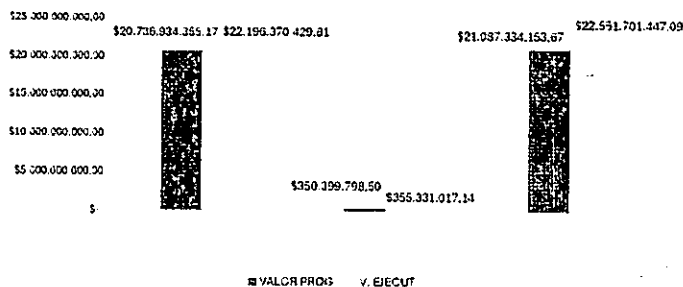

AVANCE GENERAL POR SECTORES

SECTOR	VALOR CONTRACTUAL SECTOR	VALOR SECTOR SEGÚN BALANCE	(%) EN PROY.	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	(%) AVANCE SECTOR	(%) AVANCE PROYECTO
EL RECREO	\$ 7.176.779.567,00	\$ 5.081.184.401,00	18,33%	\$ 4.900.533.992,06	\$ -	\$ 4.900.533.992,06	66,44%	17,68%
IMAT	\$ 3.218.868.173,00	\$ 3.509.486.189,00	12,65%	\$ 2.508.157.669,61	\$ 57.292.605,59	\$ 2.565.450.275,19	73,10%	9,26%
CANTA CLARO	\$ 2.244.737.410,00	\$ 2.223.549.591,00	8,02%	\$ 1.932.892.574,43	\$ -	\$ 1.932.892.574,43	86,93%	6,97%
6 DE MARZO - PASA TIEMPO - VILLA ROCÍO	\$ 8.265.724.750,00	\$ 8.937.133.465,00	32,24%	\$ 6.620.575.924,50	\$ 298.033.411,55	\$ 6.918.614.346,05	78,06%	25,18%
MONTEVERDE	\$ 2.410.549.573,00	\$ 3.673.938.298,00	13,99%	\$ 3.588.618.538,59	\$ -	\$ 3.588.618.538,59	92,63%	12,95%
EL TAPAO	\$ 3.329.194.240,00	\$ 3.020.581.779,00	10,90%	\$ 2.138.550.060,82	\$ -	\$ 2.138.550.060,82	70,60%	7,72%
RANCHOS DEL INAT	\$ 459.500.577,00	\$ 459.500.577,00	1,66%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OBRAS	\$ 27.105.354.300,00	\$ 27.105.354.300,00		\$ 21.749.388.770,40	\$ 355.331.017,14	\$ 22.104.699.787,53		
PGIO	\$ 166.800.000,00	\$ 166.800.000,00	0,60%	\$ 133.840.519,72	\$ -	\$ 133.840.519,72	80,24%	0,48%
PMT	\$ 390.280.000,00	\$ 390.280.000,00	1,41%	\$ 313.161.139,69	\$ -	\$ 313.161.139,69	80,24%	1,13%
OPERADOR DE REDES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,11%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
RETE	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	0,09%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS COMPONENTES	\$ 612.080.000,00	\$ 612.080.000,00		\$ 447.001.659,41	\$ -	\$ 447.001.659,41		
VALOR TOTAL	\$ 27.717.434.300,00	\$ 27.717.434.300,00	100,00%	\$ 22.196.370.429,81	\$ 355.331.017,14	\$ 22.551.701.447,09		81,36%

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES:

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES:

- La Interventoría verifica la situación actual en campo antes del inicio de cada una de las actividades en obra.
- La Interventoría revisa los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, y especificaciones técnicas de la obra.
- La Interventoría solicita al contratista el cronograma de trabajo con la ruta crítica y flujo de inversión.
- También verifica los demás documentos técnicos y hojas de vida del personal evaluable del contratista, los cuales cumplen con lo requeridos en el pliego de condiciones.
- Hace controles y seguimientos en obra.
- Hace revisiones y balances de las obras, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos.
- Lleva a diario la bitácora de obra en conjunto con el contratista.
- Hace cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional.
- Acata las disposiciones normativas locales, departamentales y nacionales que afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos.
- La Interventoría verifica que todos los trabajadores y personal de obra se encuentren afiliados a la Seguridad Social y exige el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP en obra.

COMENTARIOS:

- El contratista instala valla informativa del proyecto con el diseño y las especificaciones dadas, en el sector IMAT, cada frente consta de vallas móviles con la información de cada sector.
- El Contratista activa el componente social iniciando con el levantamiento de las actas de vecindad en el barrio de Villa Rocio (11 de junio 2025).
- El día viernes 30 de mayo 2025 se socializa con la comunidad el inicio de obras en sector 6 de Marzo - Pasa Tiempo - Villa Rocio y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana por parte de la supervisión de obras.
- Se realiza comité técnico de obra con el contratista en donde se abordan temas varios preliminares al inicio de obra. (anexo al presente informe)



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

- Se actualizan las pólizas a fecha de acto de inicio.
- El día lunes 16 de junio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el tramo de El Topao y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día lunes 7 de julio de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente III correspondiente al barrio Santa Clara y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- El día viernes 1 de agosto de 2025 se socializa con la comunidad el alcance del proyecto en el frente IV correspondiente al barrio Monteverde y se levantan las actas de conformación de Veeduría Ciudadana y de la socialización; en la que participan: el contratista, la interventoría, la supervisión de obras y la comunidad del sector.
- Se continúa con el normal desarrollo constructivo de las actividades en los sectores de Santa Clara, 6 de Marzo, Monteverde y el sector de El Recreo.
- El sábado 25 de octubre de 2025 se hace entrega parcial y se pone en servicio el tramo del frente Villa Roca, se hace entrega por parte del contratista y se recibe a satisfacción por parte de la Gobernación de Córdoba y la supervisión de obra, la interventoría y la comunidad.

COMPONENTE DE CALIDAD:

- El Plan de Calidad se enfocó en asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos para la ejecución del proyecto.
- Se realizaron densidades y ensayos de laboratorio para el control de calidad de los concretos y materiales empleados.
- Se llevó a cabo un monitoreo y evaluación de los procedimientos constructivos implementados por el contratista, mediante vistas técnicas y permanencia en campo.
- Se verifica que los ensayos de laboratorio (densidades, granulometrias, resistencias) se realicen correctamente y cumplan las especificaciones contratadas, se supervisan la correcta ejecución de las capas que conforman la estructura del pavimento.
- Esta interventoría continuará realizando estricto seguimiento a los procesos constructivos y a los resultados de los ensayos para asegurar la calidad de la obra.
- El día 12 de diciembre de 2025, se hace entrega parcial del frente de obra sector Monteverde y se socializa inicio de actividades en el sector de Pasatiempo, ambos actos contaron con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría, veeduría ciudadana y comunidad en general.
- El día 18 de diciembre se socializa el inicio de obra con la comunidad de El Topao, contando con la presencia de la Gobernación de Córdoba.
- El día 23 de diciembre se hace entrega mediante acto protocolario del frente de obra Santa Clara, contando con la participación de la Gobernación de Córdoba, contratista, interventoría y la comunidad en general.

COMPONENTE SOCIAL:

- Permanentemente se resuelven inquietudes de la comunidad y se da respuesta a los requerimientos y consultas de la misma.
- Se realizó la distribución de folletos a la comunidad del barrio donde se estaba llevando a cabo el proyecto.
- Se elaboraron las actas de vecindad del barrio Villa Roca, y se encuentran en levante de información de actas los barrios 6 de Marzo y Santa Clara (acta de apertura).
- Se levantan las actas de cierre de vecindad en los tramos donde se hace entrega parcial de obra a la comunidad y se pone en funcionamiento la vía.

COMPONENTE SST:

- Se verifica que se realicen las charlas de seguridad en el trabajo, con el personal vinculado y afiliado al proyecto.
- Se realiza la inspección preoperacional de la maquinaria pesada que se encuentra en obra.
- Diariamente y durante la ejecución de los trabajos, se verifica que se cuente con la señalización y demarcación de la zona intervenida.

COMPONENTE AMBIENTAL/FORESTAL:

- A la fecha se cuenta con: SOLICITUD DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (17/02/2025) por parte de la CVS mediante el cual se establecen los parámetros para realizar las gestiones ambientales antes y durante la ejecución del proyecto.

VI. FIRMAS:

Diego Villadiego

DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPINOSA

REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO IJC

ELABORÓ



INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

