

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

**CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9403729 CELEBRADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y HC INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S**

INFORME DE ACTA PARCIAL

SUPERVISIÓN	JOSE DE JESUS MORENO RUIZ	ENTIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9403729		
OBJETO	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CERRAMIENTO SEDE B	PERIODO DEL INFORME	
CONTRATISTA	HC INGENIERIA & CONSTRUCCION INTEGRAL S.A.S.	NIT	900.949.029-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	C.C	1.079.182.594
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	20/03/2026		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	25/03/2026		
PLAZO INICIAL	(2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A) (Si aplica):	N/A		
PLAZO TOTAL	(2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
SUSPENSION DEL CONTRATO	15-05-2026 A 05-06-2026		
PRORROGA DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	06-06-2026 A 09-06-2026		
REINICIO DEL CONTRATO	10-06-2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	18-06-2026		
VALOR INICIAL	\$ 96.489.489,00		
VALOR ADICIONAL (si aplica):	\$ 16,272,170.67		
VALOR TOTAL	\$ 112,761,658.67		
INTERVENTOR	JOHAN MANUEL TORRES PARRA		
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
El proyecto "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CERRAMIENTO SEDE B ", se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de Bucaramanga, Santander en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SEDE B.			

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SEDE B.

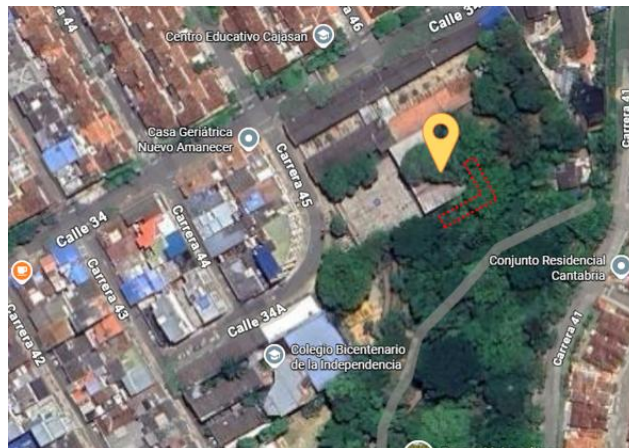


Ilustración No. 1 – INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SEDE B.

Fuente: Google maps.

ACTAS SUSCRITAS

No.	TIPO DE ACTA	No. ACTA	FECHA
1	Firma del contrato	00	20 de marzo de 2026
2	Acta de inicio	01	25 de marzo de 2026
3	Acta 1 de suspensión	02	15 de mayo de 2026
4	Acta 2 de Prorroga de la Suspensión del contrato	03	6 de junio del 2026
5	Acta 3 de reinicio	04	10 de junio del 2026
6	Otro si Modificadorio No. 1	05	10 de junio del 2026

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se basa realizar la construcción de un muro de contención y cerramiento para el INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA del municipio de Bucaramanga – Santander;

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1. Descapote y replanteo topográfico

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
2	Excavación manual por las condiciones del terreno	M3	129.00	100%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (-)	% EJECUTADO
2	Excavación manual por las condiciones del terreno	M3	-3.55	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
2	Excavación manual por las condiciones del terreno	M3	125.45	100%

(ver memoria de cantidades)

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
3	Demolición muro de cerramiento existente	M2	30.00	100%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
3	Demolición muro de cerramiento existente	M2	12.00	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
3	Demolición muro de cerramiento	M2	42.00	100%

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

	existente			
	(ver memoria de cantidades)			
	• CANTIDAD CONTRACTUAL			
	ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD
	4	Concreto pobre de limpieza, e= 5 cms	M2	40.00
	100%			
	• CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES			
	ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)
	4	Concreto pobre de limpieza, e= 5 cms	M2	3.94
	100%			
	• CANTIDAD EJECUTADA			
	ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1
	4	Concreto pobre de limpieza, e= 5 cms	M2	43.94
	100%			
	(ver memoria de cantidades)			
	• CANTIDAD CONTRACTUAL			
	ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD
	5	Concreto de 3000 psi para zapata del muro	M3	13.00
	100%			
	• CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES			
	ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)
	5	Concreto de 3000 psi para zapata del muro	M3	0.69
	100%			
	• CANTIDAD EJECUTADA			
	ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1
	5	Concreto de 3000 psi para zapata del muro	M3	13.17
	96%			
	(ver memoria de cantidades)			

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
6	Filtro francés	ML	19.00	100%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
6	Filtro francés	ML	1.00	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
6	Filtro francés	ML	20.00	100%

(ver memoria de cantidades)

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
7	Concreto de 3000 psi para cuerpo del muro	M3	12.00	100%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
7	Concreto de 3000 psi para cuerpo del muro	M3	4.26	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
7	Concreto de 3000 psi para cuerpo del muro	M3	15.28	94%

(ver memoria de cantidades)

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
8	Acero de refuerzo de 60.000psi	Kg	2.601.00	100%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
8	Acero de refuerzo de 60.000psi	Kg	33.57	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
8	Acero de refuerzo de 60.000psi	Kg	2.634.57	100%

(ver memoria de cantidades)

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
9	Mampostería en ladrillo estructural	M2	30.00	0%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
9	Mampostería en ladrillo estructural	M2	10.18	0%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
9	Mampostería en ladrillo estructural	M2	00.00	0%

(ver memoria de cantidades)

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
10	Relleno en relleno compactado	M3	102.00	100%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
10	Relleno en relleno compactado	M3	4.17	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
10	Relleno en relleno compactado	M3	106.17	100%

(ver memoria de cantidades)

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
11	Aseo general, retiro de escombros y limpieza	Viajes	5.00	0%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (-)	% EJECUTADO
11	Aseo general, retiro de escombros y limpieza	M3	-3.00	0%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
11	Aseo general, retiro de escombros y limpieza	M3	00.00	0%

(ver memoria de cantidades)

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
NP1	Desmante malla eslabonada altura 2 metros.	ML	0.00	0%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
NP1	Desmante malla eslabonada altura 2 metros.	ML	16.00	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
NP1	Desmante malla eslabonada altura 2 metros.	ML	16.00	100%

(ver memoria de cantidades)

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
NP2	Demolición de Viga de cimentación en concreto y ciclópeo existente ancho 0.45 m y alto 0.50 m	ML	0.00	0%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
NP2	Demolición de Viga de cimentación en concreto y ciclópeo existente ancho 0.45 m y alto 0.50 m.	ML	4.70	100%

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
NP2	Demolición de Viga de cimentación en concreto y ciclópeo existente ancho 0.45 m y alto 0.50 m.	ML	4.70	100%

(ver memoria de cantidades)

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
NP3	Demolición de Canaleta existente con medidas 0.50 m ancho E= 0.08 m	ML	0.00	0%

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
NP3	Demolición de Canaleta existente con medidas 0.50 m ancho E= 0.08 m	ML	12.70	100%

- CANTIDAD EJECUTADA**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
NP3	Demolición de Canaleta existente con medidas 0.50 m ancho E= 0.08 m	ML	12.70	100%

(ver memoria de cantidades)

- CANTIDAD CONTRACTUAL**

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	% EJECUTADO
NP4	Demolición en roca.	M3	0.00	0%

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

		Koraza Exterior 2 Manos			
--	--	----------------------------	--	--	--

- CANTIDAD DE MAYORES Y MENORES ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD (+)	% EJECUTADO
NP6	Suministro y aplicación de estuco plástico Y Pintura Tipo Koraza Exterior 2 Manos	M2	33.60	0%

- CANTIDAD EJECUTADA

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	% EJECUTADO
NP5	Suministro y aplicación de estuco plástico Y Pintura Tipo Koraza Exterior 2 Manos	ML	0.0	0%

(ver memoria de cantidades)

5. CONTROL DE ACTAS

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo x materiales (50%)	12-05-2026	\$48.244.745.00	0	\$48.244.745.00
Pago No. 1	12-06-2026	\$101,654,448.0	\$48.244.745.00	\$53,409,703.00
Pago No. 2	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago No. 3	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor x Ejecutar
\$ 96.489.489,00	\$16,272,170.67	\$ 112,761,658.67	\$101,654,448	\$ 11,107,210.67

6. RELACION DE PERSONAL

PROFESIONAL	CARGO
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	DIRECTOR DE OBRA
LUIS GILBERTO LEON JAIMES	RESIDENTE DE OBRA
MAURO CORREA PARRA	MAESTRO DE OBRA

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

BRAVO JAIMES GABRIEL	AYUDANTE DE OBRA
FOSE ABILICIO FORASTERO PEDROZA	AYUDANTE DE OBRA
JOSEFITO ARIAS ROZO	AYUDANTE DE OBRA
GERARDO TOVAR RAMOS	AYUDANTE DE OBRA
YIDALY ANDRES PORRAS CAMPOS	AYUDANTE DE OBRA
LUIS ENRIQUE GARZONVILLABON	OFICIAL DE OBRA
JHON JAIRO GOMEZ FLOREZ	OFICIAL DE OBRA

7. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ABRIL-2026

FECHA PAGO	No. De PLANILLA	PENSIÓN	SALUD	ARL	No AFILIADOS	VR PAGADO
2026-05-07	37376334	2026-04	2026-05	ARL SURA - 14-11	9	2.328.700

MAYO-2026

FECHA PAGO	No. De PLANILLA	PENSIÓN	SALUD	ARL	No AFILIADOS	VR PAGADO
2026-06-12	37666066	2026-05	2026-06	ARL SURA - 14-11	7	3.871.900

8. PÓLIZAS DE GARANTÍA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR LEGALIZACION DE CONTRATO							
ASEGURADORA	No.	ANEXO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000199013	3	18/06/2026	Cumplimiento	10/06/2026	26/12/2026	\$ 22,552,331.80
				Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	10/06/2026	26/0/2029	\$ 11.276.165.90
				Estabilidad y calidad de la obra	21/05/2026	21/05/2029	\$ 22.552.331.80

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

POLIZA DE RESPONSABILIDAD POR LEGALIZACION DE CONTRATO							
ASEGURADORA	No.	ANEXO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-74-994000037479	3	18/06/2026	Responsabilidad civil extracontractual	25/03/2026	20/06/2026	\$ 350,181,000.00
9. PLANOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO							

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

10. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS											
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						EJECUCIÓN DE OBRA			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECCION
1	Descapote y replanteo topográfico	m2	66.11	\$ 10,000.00	\$ 661,100.00	66.11	\$661,100.00	100,00 %	66.11	\$661,100.00	100,00%
2	Excavación manual por las condiciones del terreno	m3	143.45	\$ 48,113.00	\$ 6,901,713.62	125.45	\$6,035,679.62	100,00 %	125.45	\$6,035,679.62	100,00%
3	Demolición muro de cerramiento existente	m2	42.00	\$ 22,076.00	\$ 927,192.00	42.00	\$927,192.00	100,00 %	42.00	\$927,192.00	100,00%
4	Concreto pobre de limpieza, e= 5 cms	m2	43.94	\$ 25,094.00	\$ 1,102,630.36	43.94	\$ 1,102,630.36	100,00 %	43.94	\$ 1,102,630.36	100,00%
5	Concreto de 3000 psi para zapata del muro	m3	13.69	\$ 1,102,457.00	\$ 15,093,474.20	13.17	\$ 14,516,624.60	96,00 %	13.17	\$ 14,516,624.60	96,00%
6	Filtro francés	ml	20.00	\$ 86,887.00	\$ 1,737,740.00	20.00	\$1,737,740.00	100,00 %	20.00	\$1,737,740.00	100,00%
7	Concreto de 3000 psi para cuerpo del muro	m3	16.26	\$ 1,302,835.00	\$ 21,185,399.94	15.28	\$19,903,410.30	94,00 %	15.28	\$19,903,410.30	94,00%
8	Acero de refuerzo de 60.000psi	kg	2634.57	\$ 9,717.00	\$ 25,600,087.54	2,634.57	\$ 25,600,087.54	100,00 %	2,634.57	\$ 25,600,087.54	100,00%
9	Mampostería en ladrillo estructural	m2	40.18	\$ 78,208.00	\$ 3,142,397.44	0	0	0	0	0	0
10	Relleno en relleno compactado	m3	106.17	\$ 62,076.00	\$ 6,590,499.67	106.17	\$6,590,499.67	100,00 %	106.17	\$6,590,499.67	100,00%
11	Aseo general, retiro de escombros y limpieza	viajes	5.00	\$ 501,604.00	\$ 2,508,020.00	0	0	0	0	0	0
NP 1	Desmonte malla eslabonada altura 2 metros.	ml	16.00	\$ 18,375.00	\$ 294,000.00	16.00	\$294,000.00	100,00 %	16.00	\$ 294,000.00	100,00%
NP 2	Demolicion de Viga de cimentacion en concreto y ciclopeo existente ancho 0.45 m y alto 0.50 m. Incluye retiro	ml	4.70	\$104,750.00	\$492,325.00	4.70	\$492,325.00	100,00 %	4.70	\$492,325.00	100,00%
NP 3	Demolición de Canaleta existente con medidas 0.50 m ancho E= 0.08 m	ml	12.70	\$ 89,125.00	\$1,131,887.50	12.70	\$1,131,887.50	100,00 %	12.70	\$1,131,887.50	100,00%
NP 4	Demolición en roca. Incluye retiro	m3	18.00	\$95,388.00	\$1,716,984.00	18.00	\$ 1,716,984.00	100,00 %	18.00	\$ 1,716,984.00	100,00%
NP 5	Pañete Liso muros 1:4 impermeabilizado, e=2 cm	m2	33.60	\$39,774.00	\$1,336,406.40	0	0	0	0	0	0
NP 6	Suministro y aplicación de estuco plastico Y Pintura Tipo Koraza Exterior 2 Manos	m2	33.60	\$43,985.00	\$ 1,477,896.00	0	0	0	0	0	0

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 89,528,907.67		\$ 80,710,160.59			\$ 80,710,160.59	
	Administración	18%			\$ 16,115,203.00		\$14,527,829.00			\$14,527,829.00	
	Imprevistos	2%			\$ 1,790,578.00		\$1,614,203.00			\$1,614,203.00	
	Utilidad	5%			\$ 4,476,445.00		\$4,035,508.00			\$4,035,508.00	
	Iva/ utilidad	19%			\$ 850,525.00		\$766,747.00			\$766,747.00	
	TOTAL COSTO				\$ 112,761,658.67		\$101,654,448.0			\$101,654,448.0	
								90 %			90, %



ING. DIEGO ARAMANDO HERNANDEZ LEIVA
DIRECTOR DE OBRA

ING. JOHAN MANUEL TORRES PARRA
INTERVENTOR

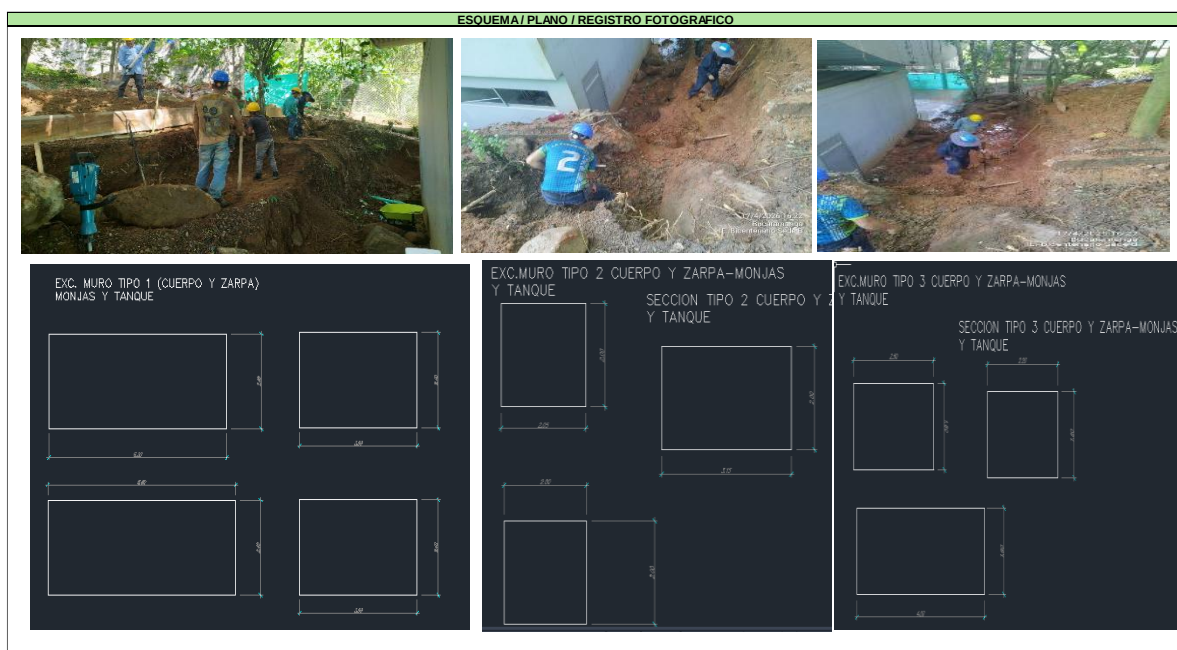
	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

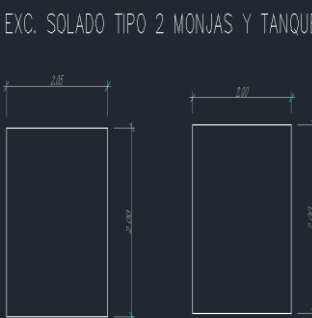
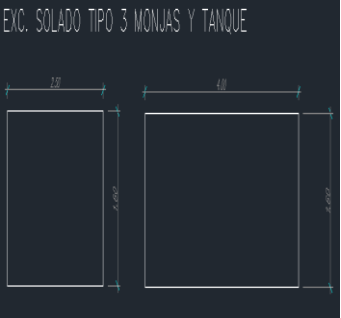
ÍTEM DE PAGO:	1	Descapote y replanteo topográfico	m2
----------------------	----------	--	-----------






ÍTEM DE PAGO:	2	excavacion manual por las condiciones del terreno	M3
----------------------	----------	--	-----------



	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

ESQUEMA / PLANO / REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
EXC. SOLADO TIPO 1 MONJAS Y TANQUE 	EXC. SOLADO TIPO 2 MONJAS Y TANQUE 	EXC. SOLADO TIPO 3 MONJAS Y TANQUE 

ESQUEMA / PLANO / REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
EXC. DENTELLON TIPO 1 MONJAS Y TANQUE 	EXC. DENTELLON TIPO 2 MONJAS Y TANQUE 	EXC. DENTELLON TIPO 3 MONJAS Y TANQUE 

ÍTEM DE PAGO:	3	Demolición muro de cerramiento existente	M3
----------------------	----------	---	-----------

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

ESQUEMA / PLANO / REGISTRO FOTOGRAFICO



DEMOLICION MURO EXISTEN MONJAS

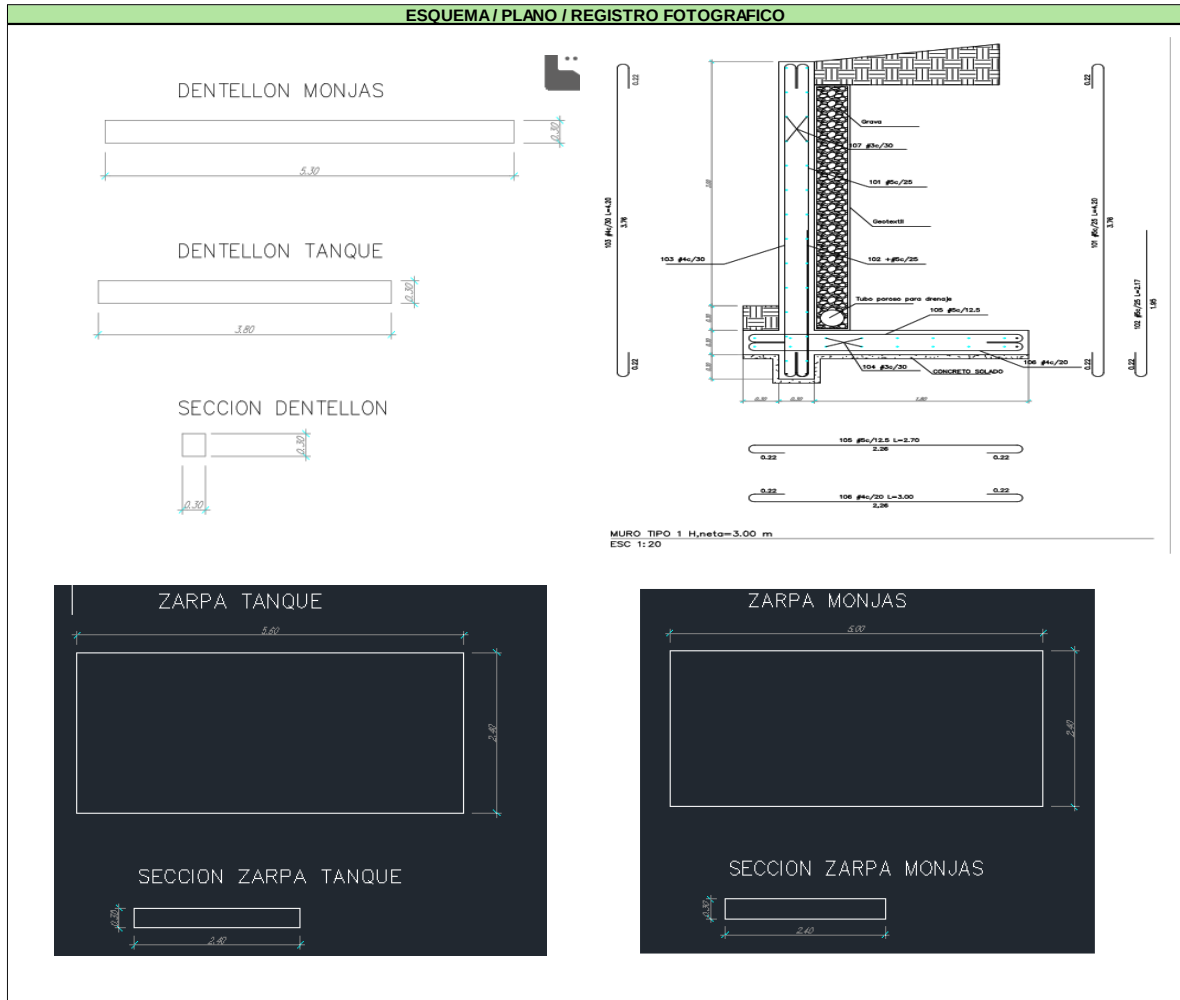


ÍTEM DE PAGO: 4

Concreto pobre de limpieza, e= 5 cms

M2

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

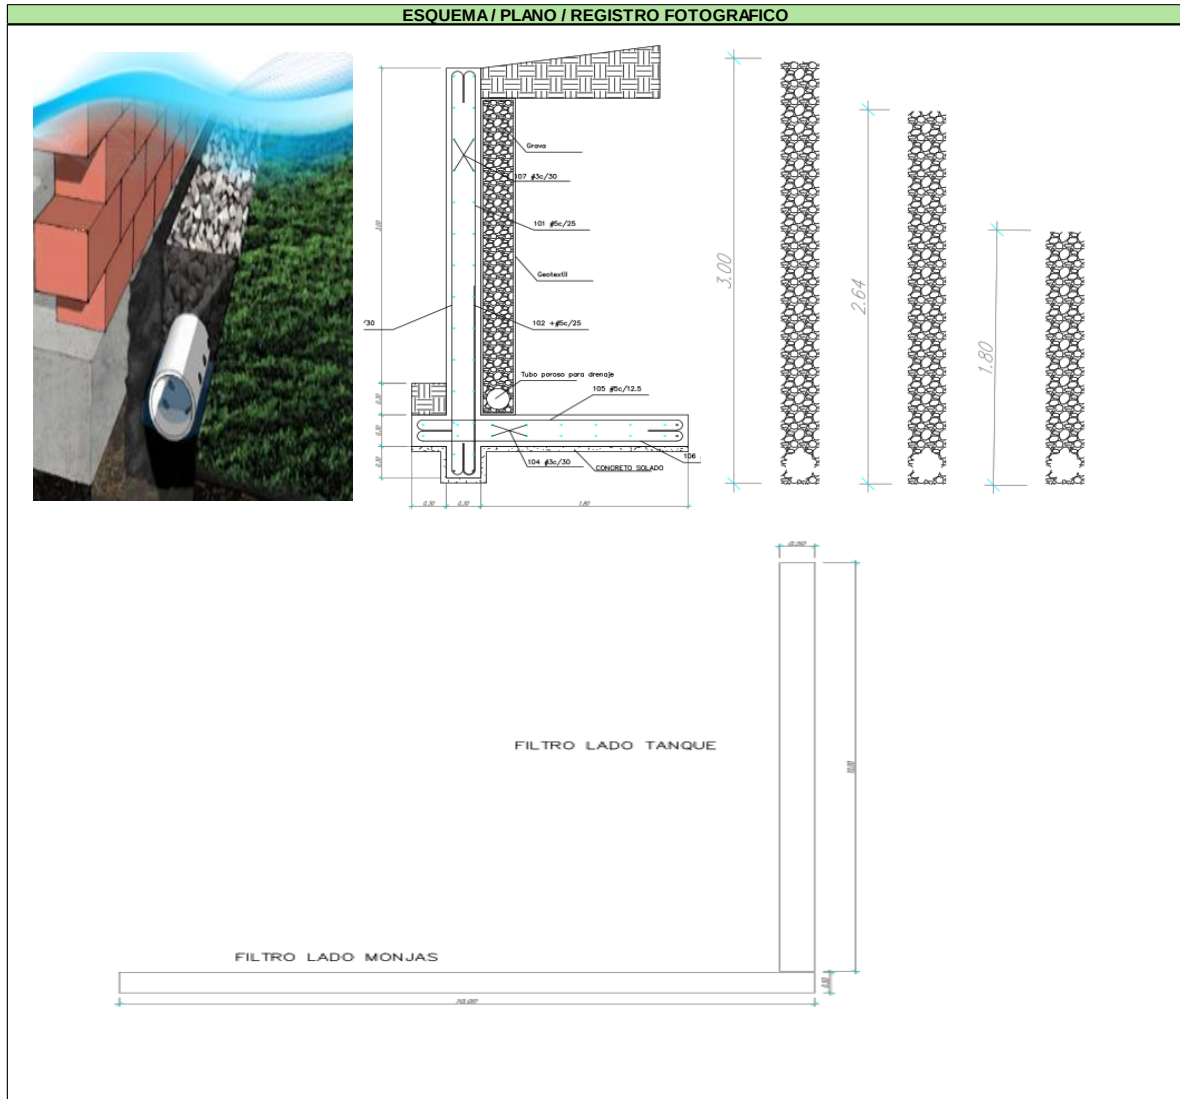


ÍTEM DE PAGO: 6

Filtro francés

ml

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

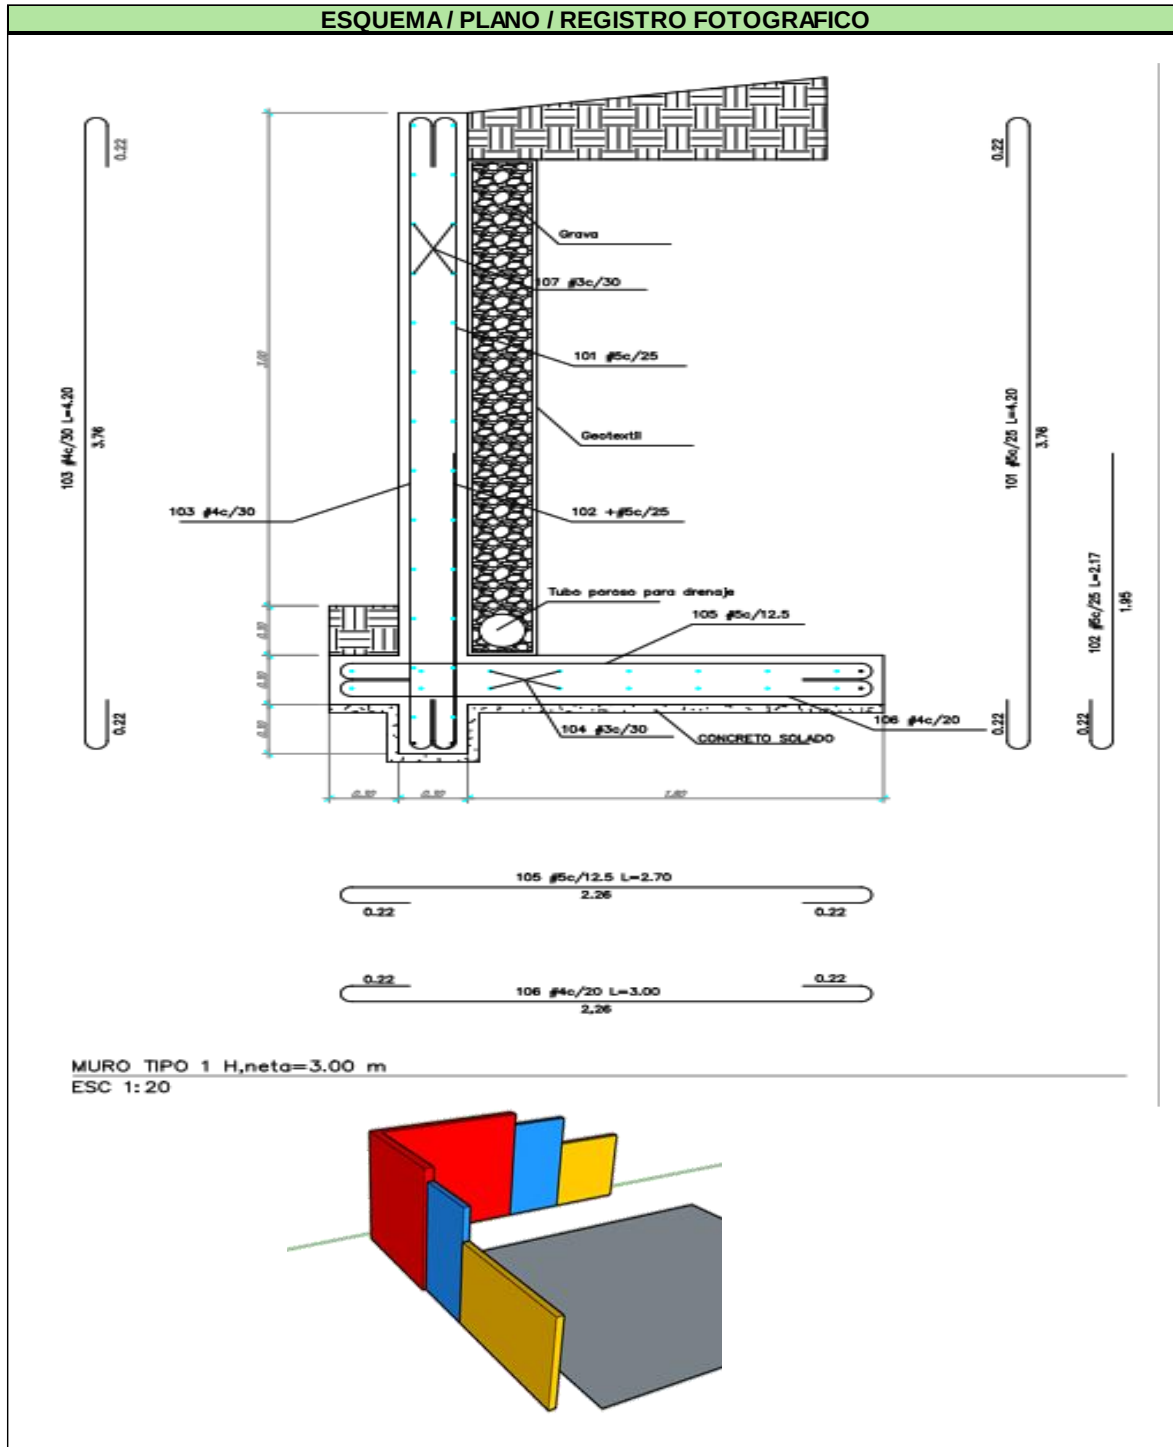


ÍTEM DE PAGO: 7

concreto de 3000 psi para cuerpo del muro

M3

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001



	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

ÍTEM DE PAGO:	8	Acero de refuerzo de 60.000psi	KG
----------------------	----------	---------------------------------------	-----------



ÍTEM DE PAGO:	9	Mamposteria en ladrillo estructural	M2
----------------------	----------	--	-----------

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

ÍTEM DE PAGO:	10	Relleno en relleno compactado	M3
----------------------	-----------	--------------------------------------	-----------



	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

ÍTEM DE PAGO:	NP 1	Desmorte malla eslabonada altura 2 metros.	ML
----------------------	-------------	---	-----------



ÍTEM DE PAGO:	NP 2	Demolicion de Viga de cimentacion en concreto y ciclopeo existente ancho 0.45 m y alto 0.50 m. Incluye retiro	ML
----------------------	-------------	--	-----------



	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

ÍTEM DE PAGO:	NP 3	Demolicion de Canaleta existente con medidas 0.50 m ancho E= 0.08 m	ML
----------------------	-------------	--	-----------

ESQUEMA / PLANO / REGISTRO FOTOGRAFICO



DEMOLICION CANALETA L=12.70m A=0.50 m



ÍTEM DE PAGO:	NP 4	Demolicion en roca.	M3
----------------------	-------------	----------------------------	-----------

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001



	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1				VIGENCIA:	20/03/2026
					VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL				CÓDIGO	HC-BC-AP-001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN
Nº 90169816	4	LC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B	0	ARL SUR - 14-11	ÚNICA
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL	
08-1		CRA 17A 7A 05	3153404630		LCONSTRUCCIONES2021@GMAIL.COM	
					EXENTO DE PARAFISCALES	S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-05	2025-05	37690065	E	2025-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.871.900	22.900
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	37690065	2025-05-04	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.462.709	12.462.709	12.462.709	12.462.709	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.992.200	0	11.700	0	2.003.900
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.072.000	0	6.300	0	1.078.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN
Nº 90349822	1	HC INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS	B	0	ARL SUR - 14-11	ÚNICA
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL	
01-1		CL 76C NO 14B 71	888108		HCONSTRUCION@GMAIL.COM	
					EXENTO DE PARAFISCALES	S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-04	2025-05	37338652	E	2025-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.242.855	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
8	37338652	2025-05-11	Pagada						

EMPLEADO									
Nº	CI	EMPLEADO	VALOR	FECHA PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
1	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
8	90169816	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	1.750.000	2025-05-12	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

- CERTIFICADO DE MATERIALES
ACERO

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

Sidoc **REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS**

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA CDP#: 320799
 Sucursal: Placa: FLP950
 Ciudad: Yumbo Tiqueta: 179.616
 Dirección: Despacho: 150.452
 Remisiones: 479168, Tren: POMINI

Fecha Impresión: martes, 10 de febrero de 2025





NTC 228-2009: Bases corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto.
 Resolución 2003-2002: Bases corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto, que se fabrican, importen o comercialicen en Colombia.
 Certificado: No. SC-446-1

Producto: Rollo Corrugado de [3/8] 9.52 mm										Area Nom. (mm2) 71.03		Designación: 3		Norma NTC-2289										
										Marcado: GYL 50 3 W 48		Grado: 60 (403)												
Fecha Recorrido y Ensayo	N° Reg Físico	Código	PROPIEDADES MECÁNICAS				CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
			Tensión Fluencia (MPa)	Alargamiento (MPa)	Relación (R _e /R _m)	% de elongación	Peso Usual (Kg/m)	Altura del Perfil (mm)	Capacidad Resistente (mm)	Modulo Elastico (N/mm²)	Resistencia a la Tracción (N/mm²)	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Al	%N	%O	
24/12/2023	19620	48267	430	910	1.40	17.00	0.931	0.89	0.30	84	1.44	327.503	0.282	0.350	0.011	0.003	0.170	0.005	0.210	0.070	0.100	0.008	0.002	0.437
06/02/2025	146750	48742	439	831	1.38	16.00	0.909	0.50	0.30	55	1.29	326.595	0.273	0.320	0.011	0.027	0.160	0.002	0.190	0.080	0.140	0.008	0.002	0.440
16/02/2025	146751	48693	431	827	1.25	17.00	0.948	0.40	0.30	56	1.50	326.055	0.280	0.320	0.012	0.032	0.160	0.003	0.170	0.090	0.130	0.011	0.002	0.460
16/02/2025	146757	48698	431	829	1.42	17.50	0.949	0.52	0.30	56	1.58	329.858	0.284	0.360	0.011	0.033	0.160	0.002	0.190	0.090	0.090	0.012	0.002	0.457
16/02/2025	146756	48699	432	827	1.30	18.30	0.949	0.40	0.30	56	1.50	328.894	0.280	0.028	0.011	0.031	0.150	0.002	0.210	0.090	0.093	0.012	0.002	0.457
16/02/2025	146756	48812	433	818	1.42	18.00	0.944	0.40	0.30	56	1.45	328.878	0.282	0.030	0.011	0.036	0.160	0.002	0.230	0.090	0.120	0.012	0.002	0.430
Especificaciones del Producto			Mínimo	420	592	1.25	14	0.920	0.30	45														
			Máximo	540					0.70	70	3.60		0.300	1.800	0.036	0.040	0.060							
			Unidad	MPa	MPa		MPa	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
			DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	DLR	

Observaciones:
 Los niveles de ensayo aplicados fueron basados en las normas NTC-228 "Definiciones y métodos para las pruebas mecánicas" NTC-2 "Grupo de ensayo" NTC-1 "Método de ensayo" NTC-116 "Método de ensayo químico", NTC-228-2009 "Bases corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto en construcciones de concreto armado".
 SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución 2003-2002 "Bases corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto, que se fabrican, importen o comercialicen en Colombia". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las pruebas o muestras analizadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la oficina del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

MARCO ANTONIO ALOMIA
Analista Físico

JUAN DIEGO SANCLEMENTE
Analista Químico

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlántico S.A.S.
 NIT: 901131909-1
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Via Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia



INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD
 Dirección: CR 49 AUT SUR 60 84 SABANETA
 Teléfono: 4444344
 Fecha Impresión: 2026/04/03
 Nro. Remisión: 187329420
 Nro. Informe: 104933
 Nro. Informe Ant: 104933
 Centro: Centro Planta Atlántico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000631A	2436	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000631U	2380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000632B	2265	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000632C	2492	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000632D	2352	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000632E	2603	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000632J	2366	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN5000632K	2617	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN50006394	2325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN50006395	2339	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN50006397	2404	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN50006402	2436	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN50006410	2380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001214	BARRA COR 1/2"(No.4) 14m NTC2289-G60	BN50006418	2464	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

- CONCRETO



CONCRETOS SERSAR
90038564-4

Somos una empresa fundada en el año 2011, dedicada a la elaboración y comercialización de diferentes tipos de concreto en Bucaramanga y su área metropolitana. Enfocamos nuestro esfuerzo en suministrar un producto de calidad, cumpliendo con especificaciones técnicas y tiempos de entrega requeridos para la ejecución de las obras.

Contamos con personal capacitado, proveedores con los más altos estándares de calidad para poder brindar un servicio eficaz y eficiente a cada uno de nuestros clientes.

AGREGADO

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001





CONCRETOS SERSAR

Somos una empresa fundada en el año 2011, dedicada a la elaboración y comercialización de diferentes tipos de concreto en Bucaramanga y su área metropolitana. Enfocamos nuestro esfuerzo en suministrar un producto de calidad, cumpliendo con especificaciones técnicas y tiempos de entrega requeridos para la ejecución de las obras.

Contamos con personal capacitado, proveedores con los más altos estándares de calidad para poder brindar un servicio eficaz y eficiente a cada uno de nuestros clientes.





	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001



Holcim (Colombia) S.A.
Calle 113 N° 7-45
Torre B. Piso 12
Edificio Teleport Business Park
Bogotá D.C.

Teléfono: (1) 6575300
Fax: (1) 6294629

HC - 010443

HOLCIM COLOMBIA S.A
NIT 860.009.808-5

CERTIFICA

Que la compañía **SERSAR DISTRIBUCIONES S.A.S** Identificado con el número de **NIT 900.456.564-4** tiene relaciones comerciales con HOLCIM (Colombia) S.A, desde el año 2022 a través de la compra de cemento de contado.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Medellín a los veintiocho (28) días del mes de mayo del 2024.

Cordialmente,

Diana Milena Avendaño
Supervisor Servicio al Cliente
Holcim (Colombia) S.A

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
ARENERA CHICAMUCHA S.A.S
NIT: 900.177.688-1**

CERTIFICA

Que la empresa **SERSAR DISTRIBUCCIONES S.A.S.** identificada con Nit número **900.456.564-4**, mantiene una relación comercial como cliente, realizando compras de materiales de río desde el año 2025. Los materiales adquiridos son arena y triturado 3/4.

El presente se expide a solicitud del interesado a los 07 días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,


LESLY JOHANNA REY FIGUEROA
C.C. 37.725.397 de Bucaramanga
Representante Legal

Dirección planta: Finca El Tamarindo Corregimiento Pescadero vía Bucaramanga – San Gil
 Dirección oficina: Carrera 14 4A-39 barrio Las Delicias en Piedecuesta
 Celular: 3186954280-3178493082-320422
 Correo: are_chicamocha@hotmail.com

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001



CONCRETO BOMBEABLE

Es un concreto diseñado con diferentes condiciones de manejabilidad y de consistencia media para ser conducido a presión a través de tuberías de bombeo necesarias para alcanzar distancias verticales y/o horizontales según los requerimientos de colocación.




CONCRETOS SERSAR

CONCRETOS SERSAR
 KM 3 ANILLO VIAL VIA GIRÓN – FLORIDABLANCA
 SANTANDER.
WWW.CONCRETOSERSAR.COM

•

	HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1	VIGENCIA:	20/03/2026
		VERSIÓN:	001
	FORMATO ACTA PARCIAL	CÓDIGO	HC-BC-AP-001

		
ING. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA		ING. JOHAN MANUEL TORRES PARRA
FIRMA CONTRATISTA	FECHA DE ENTREGA	VoBo INTERVENTOR
