

		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 05 PARCIAL		Código: FO-GD-02-018						
				Versión: 28						
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	Fecha de Modificación: 05/02/2026 viernes, 8 de mayo de 2026						
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		SECOP II: LP-SI-004-2025 CO1.PCCNTR.8265537	Número Radicado Interno del Contrato:	17092025-1535						
Número de Identificación del contratista - NIT		901499915-4	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)							
CONTRATISTA		INGENIERIA RYD SAS								
CONTRATO CEDIDO (DERECHOS ECONOMICOS) A:		INGEVIAL PYM SAS								
CODIGO VIA		50A01	NOMBRE DE LA VIA	Puente La Libertad (Marizales) - Arriero (Sector: Puente La Libertad (Enea) - El Arbolito - (Límite Tolima)						
Actividad Económica		4210	Tipo de Contrato	OBRA PÚBLICA						
Objeto del Contrato:		MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN								
Valor del Contrato		Valor Adición	Valor Anticipo							
\$ 3,090,518,083		\$ 817,000,030	\$ 618,103,617							
APORTANTES		%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD						
Aporte Departamento:		100%	\$ 3,097,518,083	PÚBLICA						
Aporte Convenio No										
Aporte Convenio No										
			Duración Contrato:	Fecha de Inicialización SEPTIEMBRE 30 DE 2025						
			Fecha de Terminación de ejecución	MAYO 30 DE 2026						
			Prorrogas	CINCO (5) MESES						
Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FVE 45	4500028846	1	\$ 647,374,902.00	\$ 129,474,980.00	\$ 517,899,922.00	6- FMN0376	16INF	23201010010302	C240131459303A AA	INF-P- 240093.01.03
FVE 46	4500030544	1	\$ 308,521,544.00	\$ -	\$ 308,521,544.00	2- FMN0376	16INF	23201010010302	C240131459303A AA	INF-P- 240093.01.03
VALOR ACTA			\$ 955,896,446.00	\$ 129,474,980.00	\$ 826,421,466.00					

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO				
Valor del Contrato:				\$ 3,907,518,083.00				
Adición del Contrato				Valor del Anticipo:				
				\$ 618,103,617.00				
Valor Acta Nro. 1	\$	332,066,085.00		Amortización Acta 1	\$	66,413,217.00		
Valor Acta Nro. 2	\$	312,807,968.00		Amortización Acta 2	\$	62,561,594.00		
Valor Acta Nro. 3	\$	930,967,829.00		Amortización Acta 3	\$	186,191,568.00		
Valor Acta Nro. 4	\$	867,311,300.00		Amortización Acta 4	\$	173,462,260.00		
Valor Acta Nro. 5	\$	955,896,446.00		Amortización Acta 5	\$	129,474,980.00		
Valor Acta Nro. 6				Amortización Acta 6				
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 7				
Saldo del Contrato:	\$	508,478,456.00		Saldo por Amortizar:	\$	-		
SUMAS IGUALES	\$	3,907,518,083.00	\$	3,907,518,083.00	\$	618,103,617.00	\$	618,103,617.00

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 17092012 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esto involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre:

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del gasto

Firma

Nombre:

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

Supervisor (a)

Firma

Nombre

ROBLE INGENIERIA SAS

Interventor (a) - (SI APLICA)



INGENIERIA RYD S.A.S.
 NIT 901.499.915-4
 CALLE 35 # 17 -77
 Tel: (037) 6703719
 Bucaramanga - Colombia
 ingenieriaryd@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FVE 45

Señores DEPARTAMENTO DE CALDAS
 NIT 890.801.052-1 Teléfono (606) 8982444 - Ext. 000
 Dirección CR 21 CL 22 23 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 08/05/2026, 13:19
 Expedición 08/05/2026, 13:19
 Vencimiento 08/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	COSTO DIRECTO	1.00	412,571,712.00	0 %
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	123,771,514.00	0 %
3	UTILIDAD 5%	1.00	20,628,586.00	0 %
4	PGIO (PMT - PAGA)	1.00	90,403,090.00	0 %

Total ítems: 4

Total Bruto 647,374,902.00
 Total a Pagar 647,374,902.00

Valor en Letras:

Seiscientos cuarenta y siete millones trescientos setenta y cuatro mil novecientos dos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 647,374,902.00

Observaciones:

Acta de obra No. 05 del contrato de obra No. 1535-2025 Cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LALIBERTAD - EL ARBOLITO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN.

Favor Cancelar el Valor de la Presente factura a la cuenta ahorros: Banco Bancolombia No. 35986262548 a Nombre de INGEVIAL PYM SAS NIT. 900.985.618-2.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18784103302185 aprobado en 20251217 perfillo FVE desde el número 39 al 18000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
 CUFE: cd55o364fo1a8883e35a2267d9ccc74db042e329ed5ed7e74c1a1a3b4cd7ec464f7c05123f5d0ed82f3d4bb5cc35



INGENIERIA RYD S.A.S.
 NIT 901.499.915-4
 CALLE 35 # 17 -77
 Tel: (037) 5703719
 Bucaramanga - Colombia
 ingerierlaryd@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FVE 46

Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS		
NIT	890.801.052-1	Teléfono	(606) 8982444 - Ext. 000
Dirección	CR 21 CL 22 23	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 13:23
Expedición	08/05/2026, 13:23
Vencimiento	08/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	COSTO DIRECTO	1.00	228,534,477.00	0 %
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	66,560,343.00	0 %
3	UTILIDAD 5%	1.00	11,426,724.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto	308,521,544.00
Total a Pagar	308,521,544.00

Valor en Letras:

Trescientos ocho millones quinientos veintitrés mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cto

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 308,521,544.00

Observaciones:

Acta de obra No. 05 del contrato de obra No. 1535-2025 Cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LALIBERTAD - EL ARBOLITO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN.

Favor Cancelar el Valor de la Presente factura a la cuenta ahorros: Banco Bancolombia No. 85986262546 a Nombre de INGEVIAL PYM SAS NIT. 900.986.618-2.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comorador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103362186 aprobado en 20251217 prefijo FVE desde el número 38 al 10000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
 CUFE: b842c7a9802bedf634235ecad34c47ea9a57727d799e09b74c7ea8cad15c2cc56d14a984526ab42d314eeaa8ff7ee0c7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijge SAS - Nit 870 048 145-8 Nombre Software: Sijge Nubc. Firma electrónica: ver en el XML

Certificado Bancario

Lunes, 23 de febrero de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGEVIAL PYM SAS identificado(a) con NIT 900985618, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	85966262546	2016/09/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

 **Bancolombia**



INGENIERIA RYD S.A.S

Manizales, 04 de mayo de 2026

Ingeniero,
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CALDAS


REFERENCIA: CONTRATO 17092025-1535.
OBJETO: "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA
LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN.

ASUNTO: Aclaración pago de retenciones, IVA e ICA del
contrato de obra.

Cordial Saludo,

Por medio del presente, INGENIERIA RYD SAS, contratista del proyecto cuyo objeto contractual es la "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN", se permite informar que todas las retenciones, el IVA y el impuesto de industria y comercio (ICA) correspondientes a la ejecución de dicho contrato se causan y se pagan exclusivamente en el municipio de Villamaria, lugar donde la empresa se encuentra registrado tributariamente y donde realiza la respectiva declaración y pago de sus obligaciones fiscales. Lo anterior se comunica para efectos de claridad y correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, evitando así cualquier confusión respecto a la jurisdicción de los pagos mencionados.

Cordialmente,


JULIO CÉSAR SERNA OSORIO
DIRECTOR DE OBRA
INGENIERÍA RYD SAS

CALLE 35 # 17 -77 EDIFICIO BANCOQUIA - BUCARAMANGA SANTANDER
TELÉFONO: 6703719

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO identificado con C. C. No. 37.615.950 DE PIEDECUESTA y con tarjeta profesional T.P. 225421-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **INGENIERIA RYD SAS** identificada con el NIT 901.499.915-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUCARAMANGA**, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que **INGENIERIA RYD SAS** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 08 días del mes de mayo del año 2026.



SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO
C.C. 37.615.950 de Piedecuesta
REVISOR FISCAL
T.P. 225421-T

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	4
--------	----------------	---------	---

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

225421-T

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO
C.C. 37615950
RES. INSCRIPCION 116 DEL 10/02/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO




Oscar Eduardo Fuentes Peña
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229397 241794

Kartificación Plástica S.A. 170814-0117


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.615.950**

AGUILAR APARICIO

APELLIDOS

SAILY YESENIA

NOMBRES

Saily Aparicio
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1980**

PIEDRECUESTA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

28-OCT-1998 **PIEDRECUESTA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vaca
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACA



A-2708200-00778926-F-0337615950-20151222

004782124CA 1

7183873409

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

① 4 6 0 8 9 6 0 9 2 2 F 0 2 0 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37615950 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 225421-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO**
No.17092025-1535**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DEPARTAMENTO DE CALDAS**

Acta de Protocolización de Cesión de Derechos Económicos del Contrato de Obra Pública N° 17092025-1535 cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN**".

Entre los suscritos a saber: **JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA**, mayor de edad y vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.253.209 Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto No. 296 del 28 de junio de 2024 y posesionado mediante Acta del 02 de julio de 2024, actuando como delegatario del señor Gobernador según la delegación realizada a través del Decreto No. 4 del primero de enero de 2024 *"por medio del cual se delegan unas funciones en materia de contratación y ordenación del gasto y se derogan unas disposiciones"* quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte, y de otra, **INGENIERIA RYD S.A.S.** identificada con el NIT número 901.499.915-4, representada legalmente por **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA** quien se identifica con cédula de ciudadanía número 1.098.697.084; quien para efectos del presente documento se denominará **CEDENTE** y, el señor **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía número 71.799.110 quien funge como representante legal de la Sociedad **INGEVIAL PYM S.A.S.**, persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2 en adelante el **CESIONARIO**, se suscribe la presente acta de protocolización de Cesión de Derechos Económicos, previstas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- I. Que la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas suscribió el Contrato de Obra Pública número 17092025-1535 derivado de la Licitación LP-SI-004-2025 con **INGENIERIA RYD S.A.S.** el cual tiene por objeto el **MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN**.
- II. Que, el contratista de Obra **INGENIERIA RYD S.A.S.**; mediante oficio radicado el día seis (06) de octubre de 2025, presentó a través de su representante **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, solicitud de autorización para la Cesión de 100% DE Derechos Económicos de la totalidad del contrato No. 17092025-1535.

Dicha solicitud fue acompañada con el "Contrato de Cesión de Derechos Económicos" celebrado el 21 de octubre de 2025, mediante documento privado suscrito entre **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, en calidad de **CEDENTE**, y el señor **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.799.110 quien funge como representante legal de la Sociedad **INGEVIAL PYM S.A.S.** persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2 en calidad de **CESIONARIO**.
- III. Que, la Cesión del 100% de los Derechos Económicos, deviene del acuerdo civil, privado y particular entre las partes que lo acuerdan, esto se ve reflejado y materializado por Cedente y Cesionario en el acuerdo de voluntades que, para el caso concreto aporta el contratista de obra.
- IV. Que, el contrato Cesión del 100% de los Derechos Económicos, se suscribió como documento privado y fue aportado por el representante de **INGENIERIA RYD S.A.S.** tal como se puede evidenciar en la copia allegada por el Contratista con el oficio del 6 de octubre de 2025.
- V. Que, de acuerdo con el contrato de Obra Pública número 17092025-1535 derivado de la Licitación LP-SI-004-2025, el valor de la cesión es por la suma de **TRES MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$3.090.518.083,50)**



- VI. Que, a propósito de la cesión de Derechos Económicos o cesión de créditos derivados de un contrato estatal, ha manifestado el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero¹ que:

"En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la negocial (...). La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (...). La cesión de crédito solo transfiere el cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda. (...)"

- VII. Que, Respecto al fundamento doctrinario, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE emitió concepto No. 4201714000004797 - cesión derechos económicos, 2018-04-17: "(...) en el contrato de cesión de derechos económicos debe quedar expresado el valor a ceder. La cesión de derechos económicos de un contrato estatal está permitida y produce efectos cuando: (i) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor del derecho de crédito) y cesionario, y (ii) es aceptada por la Entidad Estatal (...)". Por ende, de los referidos desarrollos doctrinario y jurisprudencial, se puede concluir que un contratista está en capacidad legal de ceder a un tercero los créditos por concepto de honorarios causados a su favor en los términos de los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, y que una vez cedido el crédito, el cesionario puede proceder al cobro de dicha acreencia a la entidad deudora presentando el documento a que haya lugar según la normatividad que le aplique.
- VIII. Que, el Contratista **INGENIERIA RYD S.A.S.**, hoy en calidad de **CEDENTE** de los créditos económicos del contrato de Obra Pública No. 17092025-1535, declara con la suscripción del contrato de Cesión de Derechos Económicos, que no se encuentra incurso en demandas o en fallos judiciales donde se ordenen cumplimientos de obligaciones, que puedan defraudar acreedores y terceros con la cesión de los créditos derivados del contrato estatal; de lo contrario, la Gobernación de Caldas representada en la Secretaría de Infraestructura, no asumirá responsabilidades y anulará la aceptación de la Cesión de los Derechos Económicos aquí materializada.
- IX. Que el supervisor del contrato, mediante oficio del 5 de noviembre de 2024 solicitó al secretario de Infraestructura, aprobar la Cesión de Derechos Económicos presentada por el señor **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, representante legal de **INGENIERIA RYD S.A.S.** corroborando que, a la fecha, el contratista se encuentra ejecutando el objeto contractual y que no existen pagos pendientes de realizar, sujetos al avance y a la ejecución del contrato.
- X. Que, la Gobernación de Caldas contempla en el Manual de Contratación - Decreto 633 del 29 de noviembre de 2022, subnumeral 8.5, las modificaciones durante la ejecución contractual incluyendo la Cesión de los Derechos Económicos, estableciendo que será la entidad contratante quien autorice previa verificación, dicha Cesión de Derechos Económicos, advirtiendo que en ningún caso el contratista se sustraerá de sus obligaciones primigenias.
- XI. Que, en virtud de la Cesión del 100% de los Derechos Económicos realizada por **INGENIERIA RYD S.A.S.** quien se identifica con el NIT número 901.499.915-4 y está representado legalmente por el señor **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.098.697.084, al señor **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.799.110 representante legal de la Sociedad **INGEVIAL PYM S.A S** persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2; la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, realiza las siguientes constancias:
- XII. Que, de acuerdo al documento privado suscrito entre los particulares, se realiza la Cesión del 100% de los Derechos Económicos suscrita el 21 de octubre de 2025, por valor de **TRES MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$3.090.518.083,50)** la cual en ningún momento puede entenderse como la Cesión de la Posición Contractual ni como la Cesión plena del Contrato de obra, mismo que fuere adjudicado a **INGENIERIA RYD S.A.S.** en el la Licitación Pública No. LP-SI-004-2025 de la cual derivó el Contrato No. 17092025-1535.

¹ Bogotá, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). 25000- 23-26-000-1994-09759-01(20817)

- A. Que, **INGENIERIA RYD S.A.S.** identificada con el NIT número 901.499.915-4, representada legalmente por **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA** quien se identifica con cédula de ciudadanía número 1.098.697.084, es la responsable de las obligaciones contractuales que le asisten en virtud del contrato de obra Pública No. 17092025-1535.
- B. Que, la Gobernación de Caldas – Secretaría de Infraestructura, en su condición de deudor cedido, conserva la potestad de oponer al cesionario o nuevo acreedor de las prestaciones económicas derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato No. 17092025-1535, las mismas excepciones que hubiera podido oponer al Contratista cedente, que se encuentren fundamentadas en la falta de cumplimiento, cumplimiento defectuoso o cumplimiento tardío por su parte, de las obligaciones derivadas de dicho Contrato.
- C. Se precisa que la Cesión del 100% de los Derechos Económicos, realizada por el **INGENIERIA RYD S.A.S.**, es sin perjuicio de eventuales multas o sanciones que se pudieran imponer al contratista por incumplimientos dentro del negocio jurídico celebrado con la entidad estatal, las cuales le serán descontadas del saldo pendiente de ejecutar dentro del contrato, y tendrán alcance sobre los derechos del Cesionario de los derechos económicos.
- D. Bajo las condiciones señaladas, la Secretaría de Infraestructura de Caldas tramita la Cesión del 100% de los Derechos Económicos, correspondiente a **TRES MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$3.090.518.033,50)**, correspondiente al valor total del Contrato de Obra, y en favor del Cesionario **INGEVIAL PYM S.A.S.**, persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2 representada legalmente por **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.799.110.

Para constancia se suscribe el presente documento a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura de Caldas

DIEGO FERNANDO SIERRA GARCÍA
C.c No 1.098.697.084
En nombre y representación
INGENIERIA RYD S.A.S
Cedente

ALEXANDER GARCÍA OROZCO
C.C 71.799.110
Representante Legal
INGEVIAL PYM S.A.S.
Cesionario

Proyectó: **Juan David Arias Marín**
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura

Revisó y Complementó: **María del Pilar Gómez Valencia**
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura

NOTARIA PRESENTACIÓN PERSONAL

CINTEIRO NOTARIO del Circuito de Bucaramanga CERTIFICA QUE:
el contenido de este documento y la firma que lo suscribe fue reconocida como cierta ante el suscrito notario por su compareciente.

SIERRA GARCIA DIEGO FERNANDO
Identificado con C.C. 1098697084

X El compareciente

Bucaramanga - 2025-11-18 Hora: 4:04:26 de 20:10:06

JAIRO ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
NOTARIO NOVENO DE CIRCULO DE BUCARAMANGA

Ingresar a www.colnotariosenl.com para verificar este documento
Cod.: z3bnv

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141230927657



{415}7707212489984{8020} 0000141230927657

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 8 5 6 1 8 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de identificación: 27. Lugar de expedición: 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: 31. Primer apellido: 32. Segundo apellido: 33. Primer nombre: 34. Otros nombres:

35. Razón social: INGEVIAL PYM S.A.S.

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Caldas 40. Ciudad/Municipio: Manizales 1 6 9 1 7 0 0 1

41. Dirección principal: AV CENTENARIO CL 10 30 58

42. Correo electrónico: facturaingeval@gmail.com

43. Código postal: 44. Teléfono 1: 3 1 6 4 7 2 6 0 2 8 45. Teléfono 2: 3 0 5 2 3 8 2 1 3 1


CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 2 1 0	2 0 1 6 0 6 3 0	4 2 9 0	2 0 1 6 0 6 3 0	4 2 2 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2

- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 47- Régimen Simple de Tributación - SIM
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico



Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1561 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GARCIA OROZCO ALEXANDER
985. Cargo: Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230927657



(415)7707212489984(8020) 0000141230927657

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 8 5 6 1 8

6. DV

2

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduana de Matanzas

14. Buzón electrónico

1 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0	2	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 6 0 6 2 9	2 0 1 9 0 1 2 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 6 3 0	2 0 1 9 0 1 2 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	1 7 9 9 0 6	1 7 9 9 0 6	
78. Departamento	1 7	1 7	
79. Ciudad/Municipio	2 0	2 0	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 6 0 6 2 9		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

85. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 3 0		-
2	1 0 1	2 0 2 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controante			
170. Número de Identificación Tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230927657



(415)7707212489984(8020) 0000141230927657

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 8 5 6 1 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 1 2 3		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 9 9 1 1 0		
104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido OROZCO	106. Primer nombre ALEXANDER	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 1 2 3		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 2 4 3 2 4 7 1 9		
104. Primer apellido OROZCO	105. Segundo apellido PUERTA	106. Primer nombre FLOR	107. Otros nombres MARIA
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141202433004



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 4 9 9 9 1 5 | 4

6. DV
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento
1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA RYD SAS

36. Nombre comercial

INGENIERIA RYD SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 35 17 77 OF 908 ED BANCOQUIA

42. Correo electrónico

ingenieriaryd8@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 5 3 9 4 7 8 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código 47. Fecha inicio actividad

48. Código 49. Fecha inicio actividad

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0 | 2 0 2 1 0 7 0 6

4 2 1 0 | 2 0 2 1 0 7 0 6

4 6 6 3 | 4 2 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 | 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se acelerarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1561 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELASCO ANGARITA YEIMY ALEXANDER
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202433004



{415;7707212489984(8020) 0000141202433004}

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 9 9 9 1 5 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4

Características y formas de las organizaciones

52. Naturaleza | 53. Formas asociativas | 54. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 55. Fondos | 56. Cooperativas | 56. Cooperativas | 57. Sociedades y organismos extranjeros | 58. Sin personería jurídica | 58. Otras organizaciones no clasificadas | 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		62. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número			63. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 0 2		64. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			65. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3		66. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 0 8		67. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 9 4 6 8 0		
78. Departamento	6 8		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 1 0 7 0 2		
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 7 0 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV | 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | 170. Número de identificación tributaria otorgada en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202433004



(413)7707212489984(8020) 0000141202433004

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 9 9 9 1 5 | 4

4

4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 1 3 8 7 3 0 7 7
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VELASCO	105. Segundo apellido ANGARITA	106. Primer nombre YEIMY
		107. Otros nombres ALEXANDER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 1 0 9 8 6 9 7 0 8 4
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SIERRA	105. Segundo apellido GARCIA	106. Primer nombre DIEGO
		107. Otros nombres FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Manizales, 08 de mayo de 2026.

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Secretaría de Hacienda
Gobernación de Caldas

Asunto: Cesión derechos económicos acta pago 05 parcial ingeniería RyD SAS

Referencia: Contrato 17092025-1535

Por medio de la presente me permito autorizar la Cesión del pago del acta número cinco (05) parcial del contrato 17092025-1535, de acuerdo a los documentos de cesión enviados por el señor DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA, representante legal ingeniería R y D SAS de acuerdo a la siguiente relación:

INGEVIAL P Y M SAS (NIT: 900.985.618-2) por valor de \$ 955,896,446.00

Cordialmente,



JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de despacho
Secretaría de Infraestructura

Proyectado:

Juan Sebastián Meza B.
Profesional Universitario grado 3
Secretaría de Infraestructura

Anexo: Cesión de derechos económicos contrato 17092025-1535

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202433004



(415)7707212489984(8020) 000014120243300 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 9 9 9 1 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

11. Buzón electrónico

4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 6 1 5 9 5 0		2 2 5 4 2 1 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUILAR	APARICIO	SAILY	YESENIA	
132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
135. Fecha de nombramiento	2 0 2 4 0 7 0 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 5 3 3 7 2 9 0	6	3 2 7 4 9 1 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	SEQUEDA	GEINY	CAROLINA	
156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento	2 0 2 4 0 7 0 4			



INGENIERIA RYD S.A.S

**CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA
LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN**

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

**PERÍODO
ABRIL 2026**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL CUBIERTA UNICRIDA TIPO APORTANTE TIPO EMPRESA FORMA DE PRESENTACION APORTANTE CREDITADO PAGO APORTES SALUD, SEENA E IOSP, PRE-CORONA TRIBUNAL		DATOS GENERALES DEL APORTANTE: NIT: 9088518 INDICADOR PTMISOS: 000 BARRIOS DE REG. COTIZANTES: 01 - TERMINES TERMINACION Y MANEJO DE APORTES: 00-24-00-19		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: NUMERO PLANILLA: 6018846520 PERIODO COTIZACION: 000 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACION SILLER DIAS DE MORA: 000 FECHA PAGO: 00/00/00 MES: 000 AÑO: 0000 NUMERO AUTOLIQUIDACION: 00000000		DATOS GENERALES DEL APORTANTE: NIT: 9088518 INDICADOR PTMISOS: 000 BARRIOS DE REG. COTIZANTES: 01 - TERMINES TERMINACION Y MANEJO DE APORTES: 00-24-00-19		DATOS DEL COTIZANTE: NIT: 9088518 NOMBRE: 00000000 TIPO: 000 BALAZO: 00000000 TIPO DE BALAZO: 00000000 VALOR: 00000000		MUNICIPIOS: MUNICIPIO: 000 DEPARTAMENTO: 000 TIPO DE MUNICIPIO: 000 CLASIFICACION: 000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 000 SECTORIAL: 000 SUBSECTORIAL: 000		MOVILIDAD: MUNICIPIO: 000 DEPARTAMENTO: 000 TIPO DE MUNICIPIO: 000 CLASIFICACION: 000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 000 SECTORIAL: 000 SUBSECTORIAL: 000		SEGURIDAD SOCIAL: APORTES VOLUNTARIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000		LOQUIDACION RESERVA APORTES: APORTES VOLUNTARIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000		SEGURO: APORTES VOLUNTARIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000		PARAFISCALES: APORTES VOLUNTARIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000 APORTES OBLIGATORIOS ESPECIAL: 000	
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--

TOTAL PAGADO: \$ 25.547.300

Planilla Pagada



Planilla Pagada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9977331		SEJIMA OSORIO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 4C-02	VILLAMARICA-CALDAS	8542364	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2026-03	2026-03	9501884975	1	Planilla	2026/04/10	2026/04/29	19	\$505,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Tip. Af.	No. Id.	Nombre	Tip. Contribuyente	Razon Laborativa	Sexo	Edad	Fecha Insc. en el Estruct.	NOVEDADES
1	CC	9977331	OSORIO JULIO CESAR	Independiente	Independiente	M	40		
Total Afiliados(1)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9977331		SEJIMA OSORIO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 4C-02	VILLAMARICA-CALDAS	8542364	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2026-03	2026-03	9501884975	1	Planilla	2026/04/10	2026/04/29	19	\$505,700	

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$3,700	\$0	\$283,900
PROTECCION	210201	800.229.739	0	1	\$280,200	\$3,700	\$0	\$283,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$2,900	\$0	\$221,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	175010	800.088.702	2	1	\$218,900	\$2,900	\$0	\$221,800
TOTAL				1	\$499,100	\$6,600	\$0	\$505,700

C	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
	EPS Decuato	Administradora	Prm	RC	Tarifa	Valor Contribución	Administradora	Prm	RC	Tarifa	Caso Reserva	Valor Cobertura	Dev.	RC	Tarifa SENA	Valor Cobertura SENA	Tarifa Cesantía KCF	Valor Cesantía KCF	Tarifa EAP	Valor Cesantía EAP	Tarifa MVA + IMN	Valor Cesantía MVA + IMN	Exoneración MVA + KCF	
	5218,800																							
	5218,800																							
	5218,800																							
SC	5218,800		0		0,00	0,00		0	0,00	0,00	1	50	0	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50
	5218,800																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e	KCRF
CC 1033750048		CORTES LLANOS LEYDY ESTUDARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 4 e 02	VILLAMARIA-CALDAS	310652034	na	na

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2026-03	16500344	950194716	1	2026-04-14	2026-03-25	NU		\$513,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$288,000	50	\$288,000		
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$288,000	50	\$288,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$225,000	50	\$225,000		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		\$225,000	50	\$225,000		
TOTAL				1	\$513,000	\$0	\$513,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	
CC 905-989161		ORDECO VELAZQUEZ XIMENA	INDIVIDUANTE	PRINCIPAL	CAR 85 No 25-170 entre ayora 202	MANIZALES CALDAS	8403617	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Año	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	950220236	1	2026/04/16	2026/04/17	2026/04/17	HEQUI	11	\$383,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	MIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$299,200	\$2,300	\$0	\$0	\$301,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,453	6	1	\$45,600	\$400	\$0	\$0	\$46,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUB)	EPS010	800,088,702	2	1	\$233,800	\$1,800	\$0	\$0	\$235,600
TOTAL				1	\$578,600	\$4,500	\$0	\$0	\$583,100

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta : Jueves, 30 de abril de 2026

Concepto	Descripción		
No. Rad cede Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP.	4500028846		
NIT o RUT:	901499915-4		
Contratista	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3,090,518,083.00	Aporte Departamento:	\$ 3,907,518,084.00
Valor Adición	\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028846	FONDO	6-FMN0376
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
1	200.1.1			DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0.00	4,639,565.00	0.00
2	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	203,447.00	0.00
3	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	0.00	26,741.00	0.00
4	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y	m3	0.00	23,183.00	0.00
5	320.1.1			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3	0.00	204,562.00	0.00
6	330.1.2			BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para NT3, tipo de gradación SG 43, clase A.)	m3	0.00	225,258.00	0.00
7	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	1,615.00	6,410.00	10,352,153.00
8	450.2			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	129.20	1,466,575.00	192,085,490.00
9	500.1.1P			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DIAS	m3	164.04	1,456,813.00	240,618,005.00
10	540.1P			SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m	0.00	26,990.00	0.00
11	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0.00	45,243.00	0.00
12	610.4			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO B80-38 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	0.00	166,796.00	0.00
13	671.3			CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU (INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	m3	0.00	607,818.00	0.00
14	672.4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 24 MPA	m	0.00	142,956.00	0.00
15	630.1.3.2			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3	0.00	1,693,292.00	0.00
16	630.1.3.2P			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3	8.00	1,266,844.00	10,134,752.00
17	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1.0 m	m	0.00	2,051,470.00	0.00
18	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0.00	7,605.00	0.00
19	640.1.1			ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0.00	7,605.00	0.00
20	630.1.3.2PP			Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	m	66.70	210,000.00	14,007,200.00
21	630.1.3.2P2			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3	0.00	1,266,844.00	0.00
22	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m	0.00	267,446.00	0.00
23	600.2.3P			Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diametro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenosos. Incluye transporte del material excavado	m	0.00	167,739.00	0.00
24	621.1.1			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 0,35m	m	0.00	164,257.00	0.00
25	623.1P			ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2,54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m	0.00	209,341.00	0.00
26	600.1.1P			EXCAVACIONES MANUALES	m3	0.00	81,143.00	0.00
27	930.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análizado para volqueta de 6 m3)	m3 - Km	0.00	1,568.00	0.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 467,170,897.00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
3	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	729.10	26,741.00	19,059,403.00
4	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	399.60	23,183.00	11,261,927.00
5	320.1.1			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3	166.60	204,562.00	34,060,026.00
10	540.1P			SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m	197.20	29,560.00	5,716,828.00
11	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	9.90	45,243.00	448,896.00
12	610.4			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO B80-38 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	6.10	166,796.00	1,017,456.00
15	630.1.3.2			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3	31.20	1,693,292.00	52,830,716.00
18	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	9,196.40	7,605.00	69,936,622.00
26	600.1.1P			EXCAVACIONES MANUALES	m3	1.50	81,143.00	121,715.00

Secretaría: INFRAESTRUCTURA
Fecha acta: jueves, 30 de abril de 2026

Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028846		
NT o RUT:	901499915-4		
Contratista:	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3,090,518,083.00	Aporte Departamento:	\$ 3,907,518,084.00
Valor Adición:	\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto de contrato:	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal:	4500028846	FONDO:	6-FMN0378
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación:	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación:	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento:	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		
27	930.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Analizado para volúmenes de 6 m3)	m3 - Km 3,236.90 1.558.00 5,043,092.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)			

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
28	INP 1			BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML	211.40	68.887.00	18,790,712.00
29	INP 2			BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML	0.00	908,901.00	0.00
30	INP 3			SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizado para tipo de gradación SOB-50 clase B)	M3	0.00	200,450.00	0.00
31	INP 4			BASE GRANULAR CLASE B (Analizado para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B.)	M3	420.80	219,143.00	92,215,374.00
32	INP 5			TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	0.00	2,813,591.00	0.00
33	INP 6			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	8.90	1,526,522.00	13,675,046.00
34	INP 7			CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3	0.00	2,103,079.00	0.00
35	INP 8			EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	820,030.00	0.00
36	INP 9			EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	1,216,674.00	0.00
37	INP 10			EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	1,035,579.00	0.00
38	INP 11			EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	1,665,997.00	0.00
39	INP 12			PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGIA TREMIE - DIAMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML	0.00	5,325,091.00	0.00
40	INP 13			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARD-TAPA HD DE 0.80 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un	0.00	3,715,237.00	0.00
41	INP 14			TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIAMETRO 315 mm	ml	0.00	250,869.00	0.00
42	INP 15			EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3	352.00	111,273.00	39,201,478.00
43	INP 16			MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	0.00	188,105.00	0.00
44	INP 17			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión)	m2	0.00	19,307.00	0.00
45	INP 18			TUBERIA DE PVC 4"	ml	11.00	24,265.00	267,135.00
46	INP 19			PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACCELERADO A 7 DIAS	M3	0.00	1,655,352.00	0.00
47	INP 20			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	239.70	136,646.00	33,473,148.00
48	INP 21			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO)	Un	36.00	32,872.00	1,175,192.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 198,799,083.00

OBRA PAGO

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				VALOR PNT			75,502,580.00	75,502,580.00
				VALOR PAGA (TALA Y MANEJO DE FAUNA)			14,900,500.00	14,900,500.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 90,403,080.00

Valor Acta PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL	<input type="checkbox"/>	\$955,896,448.00
Amortización Antidote				\$129,474,980.00
Valor Ordenación del Gasto:				\$826,421,468.00

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta : jueves, 30 de abril de 2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo	N/A
No. Pedido en SAP	4500028846		
NIT o RUT	601499915-4		
Contratista:	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3.090,518,083.00	Aporte Departamento	\$ 3,907,518,084.00
Valor Adicional	\$ 617,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028846	FONDO	8-FMN0378
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA		


RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		3,907,518,084.00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	332,096,085.00	
Valor Acta No. 2:	312,607,968.00	
Valor Acta No. 3:	930,657,828.00	
Valor Acta No. 4:	867,311,300.00	
Valor Acta No. 5:	955,896,446.00	
Valor Acta No. 6:		
Valor Acta No. 7:		
Saldo del contrato	503,478,457.00	
Sumas iguales	3,507,518,084.00	3,907,518,084.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		618,103,617.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	66,413,217.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	62,561,594.00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	186,191,566.00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	173,462,280.00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	129,474,960.00	
Amortización del Anticipo Acta 6:		
Amortización del Anticipo Acta 7:		
Saldo por amortizar:	0.00	
Sumas iguales:	618,103,617.00	618,103,617.00

SE HACE CONSTAR


Que el INGENIERIA RYD SAS representado legalmente por DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 829 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma: 
JORGE EDUARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma: 
INGENIERIA RYD S.A.S
Contratista

Firma: 
ROBLE INGENIERIA S.A.S
Interventor

Firma: 
MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
Supervisor contrato

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARROLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENCIÓN EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

**OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL**

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0.30	4,838,565.00	1,451,575.50
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	5.00	203,447.00	1,017,235.00
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2	140.00	26,141.00	3,659,740.00
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	140.00	26,183.00	3,845,620.00
5	320.1.1	SUB BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para tipo de gradación SG(9-50) clase A)	m3	1728.00	204,362.00	353,074,012.00
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para NT3, tipo de gradación BG 40, clase A)	m3	1350.00	225,259.00	313,110,010.00
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	5558.00	5,410.00	35,026,780.00
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compara de mezcla)	m3	445.00	1,466,575.00	661,525,875.00
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DIAS	m3	504.00	1,466,813.00	739,273,752.00
10	640.1P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m	580.00	28,990.00	16,234,400.00
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	400.00	45,343.00	18,137,200.00
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO S10-38 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	24.00	166,766.00	4,003,104.00
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	123.00	857,618.00	105,467,014.00
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO * 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m	585.00	142,858.00	83,671,830.00
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas preentizado)	m3	21.00	1,653,292.00	35,559,132.00
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3	54.00	1,266,844.00	68,429,576.00
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.0 m	m	48.00	2,851,470.00	127,270,560.00
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg	17353.00	7,505.00	131,969,565.00
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg	3878.00	7,605.00	29,492,190.00
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	m	434.00	210,003.00	91,141,302.00
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3	10.00	1,266,844.00	12,668,440.00
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m	150.00	267,446.00	40,115,900.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICA Y PAVIMENTACIÓN
CONTRATISTA: INGENIERIA RYO S.A.S
INTERVENTOR EXTERNO: ROGUE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
**OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL**

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de tipo arenoso. Incluye transporte del material excavado	m ³	63,00	167.739,00	10.567.557,00
24	601.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m	63,00	164.767,00	10.349.191,00
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN Ø=2,54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m	540,00	209.341,00	113.044.140,00
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m ³	50,00	81.143,00	4.057.150,00
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Anclaje para voladura de 6 m ³)	m ³ - Km	140,00	1.558,00	218.120,00
ITEM NO PREVISTOS						
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML	0,00	88.887,00	0,00
29	INP 2	BARANDA METALICA VEHICULAR	ML	0,00	906.901,00	0,00
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Anclaje para tipo de gradación SUB-50 clase B)	M3	0,00	200.450,00	0,00
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Anclaje para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B.)	M3	0,00	219.143,00	0,00
32	INP 5	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 900 mm.	ML	0,00	2.613.461,00	0,00
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (f) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	1.536.522,00	0,00
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3	0,00	2.103.079,00	0,00
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1,2 M DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0,00	820.053,00	0,00
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1,2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0,00	1.216.674,00	0,00
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1,2 M DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0,00	1.038.579,00	0,00
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1,2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0,00	1.665.667,00	0,00
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGIA TREMIE - DIÁMETRO DE 1,0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML	0,00	3.325.051,00	0,00



GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 08 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARDOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

**OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPIETA Y ESTUDIO PREVIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL**

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE RÍJLA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un	0.00	3,715,237.00	0.00
41	INP 14	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIAMETRO 315 mm	m1	0.00	256,989.00	0.00
42	INP 15	EXCAVACION DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE NO INCLUYE DEMOLICION DE ASFALTO	m3	0.00	111,273.00	0.00
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	0.00	188,105.00	0.00
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Análisis para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión (grao mínima de 720 n.)	m2	0.00	18,307.00	0.00
45	INP 18	TUBERIA DE PVC 4"	m1	0.00	24,285.00	0.00
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 ACELERADO A 7 DIAS	M3	0.00	1,855,353.00	0.00
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Análisis sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	0.00	139,646.00	0.00
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 56" L-15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	Lin	0.00	32,672.00	0.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)						\$ 3,014,981,070.50

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)
VALOR COSTO DIRECTO 3,014,981,070.50
ADMINISTRACION 29% 2,249,896,873.51
UTILIDAD 5% 652,489,503.32
VALOR PGIC (incluye PMT - PAGA) (INMODIFICABLE) 112,489,203.68
VALOR TOTAL 75,537,013.00
VALOR TOTAL 3,090,518,083.51

INGENIERIA RYD S.A.S
CONTRATISTA

ROBLE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EXTERNO

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
SUPERVISOR CONTRATO



RESUMEN DE ACTIVIDADES 66 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17062025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ASBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S
INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA/
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CAMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un
41	INP 14	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIAMETRO 315 mm	m
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Anillado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión mín. de 720 n)	m2
45	INP 18	TUBERIA DE PVC 4"	m
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Anillado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=16 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	Un

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR FGIO (incluy

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL
SUBTOTAL	11,189,061.00	66,489,217.00	264,387,807.00	264,387,807.00	264,387,807.00	332,066,086.00	332,066,086.00

11,189,061.00 66,489,217.00 264,387,807.00 264,387,807.00 332,066,086.00

8,350,046.00 49,618,613.00 189,841,647.00 189,841,647.00 247,810,511.00

2,421,513.00 14,269,459.00 55,054,078.00 55,054,078.00 71,855,048.00

417,502.00 2,480,541.00 9,492,082.00 9,492,082.00 12,390,426.00

11,189,061.00 66,489,216.00 264,387,807.00 264,387,807.00 332,066,085.00

VALOR ACTA UNO PARCIAL \$	332,066,086.00
AMORTIZACION ANTICIPO \$	66,413,217.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$	265,652,869.00



RESUMEN DE ACTIVIDADES 04 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA'

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-60 clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradación BG 40, clase A.)	m3
7	420.2	REGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-07	m2
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCELERADO A 7 DIAS	m3
10	640.1P	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 38" Y 14"	m
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	810.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG 38 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CURNETA DE CONCRETO VAGADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPa	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muros y pantallas permeabilidad)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para vga - zarpa)	m3
17	821.1.2	PILOTE DE CONCRETO VAGADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.0 m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	m
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para vga - zarpa)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2											
OBRA SEGÚN CONTRATO			MAYOR CANTIDAD			NO PREVISTA			TOTAL EJECUTADO		
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	
23.00	4.679.281,00										
			1.020,00	28.863.820,00					1.020,00	28.863.820,00	
			246,00	6.833.018,00					246,00	6.833.018,00	
449,80	92.011.988,00								449,80	92.011.988,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
150,50	6.824.122,00								150,50	6.824.122,00	
41,50	6.922.034,00								41,50	6.922.034,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
5,00	6.334.270,00								5,00	6.334.270,00	
									0,00	0,00	
1.295,70	9.853.799,00								1.295,70	9.853.799,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	



RESUMEN DE ACTIVIDADES 05 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092026-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPIETARIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para NT3, tipo de gradación BG 40, clase A.)	m3
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-37	m2
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DIAS	m3
10	640.1P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SGB-38 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPa	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas perneado)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.0 m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 MPa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 MPa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reforzada de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	m
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3

OBRA SEGUN CONTRATO			MAYOR CANTIDAD			NO PREVISTA			TOTAL EJECUTADO		
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00		1.20	244.136.00			1.20	244.136.00		1.20	244.136.00
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
160.30	34.427.785.00			0.00			0.00		160.30	34.427.785.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
329.80	9.560.902.00			0.00			0.00		329.80	9.560.902.00	
400.00	18.137.200.00		171.70	7.785.350.00			0.00		571.70	25.922.550.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
3.00	500.388.00			0.00			0.00		3.00	500.388.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
21.00	55.559.132.00		13.20	22.361.454.00			0.00		34.20	57.910.586.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
11.864.40	90.228.762.00			0.00			0.00		11.864.40	90.228.762.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PLENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLETO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENITOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA:

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0.35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenosos incluye transporte del material excavado	m ³
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0.35m	m
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS. INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2.54CM. PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m ³
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRETAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Anclizado para volqueta de 6 m ³)	m ³ - Km
ITEM NO PREVISTOS			
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML
29	INP 2	BARANDA METALICA VEHICULAR	ML
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Anclizada para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Anclizada para NT2, tipo de gradación BG 38 clase B)	M3
32	INP 5	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 900 mm.	ML
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML

DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3

OBRA SEGUN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
68.00	14,235,168.00		0.00		0.00	68.00	14,235,168.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
		308.40	27,412,751.00		0.00	308.40	27,412,751.00
				140.90	28,243,405.00	140.90	28,243,405.00
					0.00	0.00	0.00
		16.10	24,738,004.00		0.00	16.10	24,738,004.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00



RESUMEN DE ACTIVIDADES 05 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROYECTO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	OBRA SEGÚN CONTRATO				MAYOR CANTIDAD				NO PREVISTA				TOTAL EJECUTADO	
				OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL		
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	300.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para tipo de gradación SCS-50 clase A)	m3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análizado para NT3, tipo de gradación B10, clase A.)	m3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	420.2	RIFGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DIAS	m3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10	640.1P	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml		6,673,498.00	24.80	718,952.00							255.00	7,392,450.00		
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		0.00	167.00	7,572,281.00							167.00	7,572,281.00		
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SDG-30 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3		0.00		0.00							0.00	0.00		0.00
13	611.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3		0.00		0.00							0.00	0.00		0.00
14	672.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPa	m		0.00		0.00							0.00	0.00		0.00
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezado)	m3		0.00	30.30	51,306,748.00							30.30	51,306,748.00		
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3		0.00		0.00							0.00	0.00		0.00
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 m	m		0.00		0.00							0.00	0.00		0.00
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 MPa)	kg		31,867,005.00	1,364.50	10,377,023.00							9,567.40	42,264,028.00		
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 MPa)	kg		0.00		0.00							0.00	0.00		0.00
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	ml		19,688,281.00		0.00							93.80	19,688,281.00		
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3		0.00		0.00							0.00	0.00		0.00
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m		28,081,830.00		0.00							105.00	28,081,830.00		



GOBIERNO DE
CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 05 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENIDOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0.35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenoso incluye transporte del material excavado	m ³
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0.35m	m
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2.54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m
26	600.1.5P	EXCAVACIONES MANUALES	m ³
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Anulado para volqueta de 6 m ³)	m ³ - Km
		ITEM NO PREVISTOS	
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML
29	INP 2	BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Anulado para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE D (Anulado para N 2, tipo de gradación BG 38, clase B.)	M3
32	INP 5	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5056 DE DIÁMETRO 900 mm	ML
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANEJAL	ML

OBRA CIVIL EJECUTADA - MAYOR CANTIDAD - OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
178.50	37,367,369.00		0.00			178.50	37,367,369.00
	0.00	1.50	121,715.00			1.50	121,715.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
				410.20	82,224,590.00	410.20	82,224,590.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				12.20	18,745,568.00	12.20	18,745,568.00
				22.30	46,898,662.00	22.30	46,898,662.00
					0.00	0.00	0.00
				4.50	5,475,033.00	4.50	5,475,033.00
					0.00	0.00	0.00
				13.50	22,489,205.00	13.50	22,489,205.00
				15.00	49,876,365.00	15.00	49,876,365.00



RESUMEN DE ACTIVIDADES 05 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPIUESTA
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA:OBRA CIVIL EJECUTADA* MAYOR CANTIDAD* OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCION-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un
41	INP 14	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722 2 DE DIAMETRO 315 mm	m
42	INP 15	EXCAVACION DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICION DE ASFALTO	m3
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Avalzado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión (grab mínima de 720 n)	m2
45	INP 18	TUBERIA DE PVC 4"	m
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Avalzado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5MP L=15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	Un

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR POJO (Incluye

VALOR POJO (Incluye

OBRA SEGUN CONTRATO			MAYOR CANTIDAD			NO PREVISTA			TOTAL EJECUTADO		
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	
						1.00	3,715,237.00		1.00	3,715,237.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
			1.50	297,158.00		1.50	297,158.00		1.50	297,158.00	
			15.20	278,268.00		15.20	278,268.00		15.20	278,268.00	
			7.60	184,566.00		7.60	184,566.00		7.60	184,566.00	
			229.40	425,617,978.00		229.40	425,617,978.00		229.40	425,617,978.00	
			65.60	11,963,698.00		65.60	11,963,698.00		65.60	11,963,698.00	
			176.00	5,750,272.00		176.00	5,750,272.00		176.00	5,750,272.00	
SUBTOTAL	123,707,983.00		SUBTOTAL	70,096,719.00		SUBTOTAL	673,506,598.00		SUBTOTAL	867,311,300.00	

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% I

VALOR ACTA TRES PARCIAL \$	867,311,299.00
AMORTIZACION ANTICIPO \$	173,462,266.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$	693,849,033.00



GOBIERNO DE
CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 05 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17082025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUUESTA
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análizada para N13, tipo de gradación BG 40, clase A.)	m3
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2
8	460.2	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO M13C-19 (Mezcla de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCELERADO A 7 DÍAS	m3
10	640.1P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3"x3" Y 1"x1"	m
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBC-38 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPa	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zapata)	m3
17	621.1.2	PLOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.0 m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 MPa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 MPa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 MPa	m
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zapata)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m

DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 6
OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA

OBRA SEGÚN CONTRATO			MAYOR CANTIDAD			NO PREVISTA			TOTAL EJECUTADO		
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL		OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00		739.10	19,059,403.00		739.10	19,059,403.00				
	0.00		369.60	11,261,927.00		369.60	11,261,927.00				
	0.00		166.60	34,080,029.00		166.60	34,080,029.00				
	0.00			0.00			0.00			0.00	
1.615.00	10,352,150.00			0.00			0.00		1.615.00	10,352,150.00	
129.20	192,005,480.00			0.00			0.00		129.20	192,005,480.00	
164.04	240,616,005.00			0.00			0.00		164.04	240,616,005.00	
	0.00		197.20	5,716,828.00		197.20	5,716,828.00				
	0.00		9.90	448,896.00		9.90	448,896.00				
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00		6.10	1,017,455.00			0.00		6.10	1,017,455.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00		31.20	52,630,710.00		31.20	52,630,710.00				
8.00	10,134,752.00			0.00			0.00		8.00	10,134,752.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00		9.196.40	69,838,622.00		9.196.40	69,838,622.00				
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
66.70	14,007,200.00			0.00			0.00		66.70	14,007,200.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	
	0.00			0.00			0.00			0.00	

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL
0.00	0.00
47.50	9,663,732.00
4,154.10	108,592,329.00
845.10	23,817,454.00
784.70	150,519,602.00
0.00	0.00
1,615.00	10,352,150.00
129.20	192,065,480.00
164.04	240,616,005.00
762.00	22,670,160.00
899.10	40,767,892.00
50.60	8,439,878.00
0.00	0.00
0.00	0.00
95.70	162,048,044.00
13.00	16,466,972.00
0.00	0.00
27,913.90	212,285,211.00
0.00	0.00
160.50	33,705,481.00
0.00	0.00
105.00	26,061,830.00



RESUMEN DE ACTIVIDADES 05 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17082025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENIOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENZIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA		DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 5															
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRA		OBRA SEGUN CONTRATO				MAYOR CANTIDAD				NO PREVISTA				TOTAL EJECUTADO			
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VR.TOTAL	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
23	600.2.3P	Excavación mecánica de bóveda de 0,35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenoso Incluye transporte del material excavado	m³		0.00		0.00									27.00	4.528.953.00
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0.35m	m		0.00		0.00									27.00	4.434.839.00
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCION DE MORTERO PERFORACION D=2.54CM PERFORACION EN MATERIAL COMUN	m		0.00		0.00									246.50	51.602.657.00
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3		0.00	1.50	321.715.00					1.50	121.715.00			117.50	9.534.304.00
27	800.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análisis para volqueta de 6 m3)	m3 - Km		0.00	3.236.80	5.043.080.00					3.236.80	5.043.080.00			6.244.00	9.728.152.00
ITEM NO PREVISTOS																	
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML					211.40	18.790.712.00					211.40	18.790.712.00	519.80	46.203.463.00
29	INP 2	BARANDA METALICA VEHICULAR	ML													0.00	0.00
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Análisis para tipo de gradacion SGR-50 clase B)	M3													551.10	110.467.595.00
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Análisis para R12, tipo de gradacion HG, III, clase B)	M3					420.80	62.215.374.00					420.80	62.215.374.00	420.80	92.215.374.00
32	INP 5	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5065 DE DIAMETRO 900 mm	ML													24.00	62.725.464.00
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3					8.90	13.675.046.00					8.90	13.675.046.00	37.20	57.158.618.00
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3													22.30	46.898.662.00
35	INP 8	EXCAVACION COMUN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML													21.00	17.220.893.00
36	INP 9	EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML													30.70	37.351.892.00
37	INP 10	EXCAVACION COMUN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML													2.00	2.077.159.00
38	INP 11	EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML													28.50	47.477.210.00
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGIA TREMIE - DIAMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACION MANUAL	ML													75.10	249.714.334.00



**GOBIERNO DE
CALDAS**

PREACTA NRO CINCO (05) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 17092025-1535
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 17092025-1535

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta : jueves, 30 de abril de 2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028846		
NIT o RUT:	901499915-4		
Contratista:	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3,090,518,083.00	Aporte Departamento:	\$ 3,907,518,084.00
Valor Adición	\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028846	FONDO	6-FMN0376
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación:	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
1	200.1.1			DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0.00	0.00
2	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	0.00
3	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	729.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	399.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
5	320.1.1			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	m3	166.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
6	330.1.2			BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 40, clase A.)	m3	0.00	0.00
7	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	1,615.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
8	450.2			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	129.20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
9	500.1.1P			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DIAS	m3	184.04	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
10	640.1P			SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	197.20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
11	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	9.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
12	610.4			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO S9G-38 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	6.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
13	671.3			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0.00	0.00
14	672.4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m	0.00	0.00
15	630.1.3.2			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3	31.20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
16	630.1.3.2P			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga -zarpa)	m3	6.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
17	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.0 m	m	0.00	0.00

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta jueves, 30 de abril de 2026

Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028846		
NIT o RUT:	901499915-4		
Contratista:	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3.090.518.083.00	Aporte Departamento	\$ 3.907.518.084.00
Valor Adición	\$ 817.000.000.00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028846	FONDO	6-FMN0376
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg 9,196.40 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg 0.00 0.00
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	ml 66.70 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpas)	m3 0.00 0.00
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m 0.00 0.00
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenosos. Incluye transporte del material excavado	ml 0.00 0.00
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m 0.00 0.00
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2.54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m 0.00 0.00
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3 1.50 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3 - Km 3,236.90 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
28	INP 1			BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML	211.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
29	INP 2			BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML	0.00	0.00
30	INP 3			SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3	0.00	0.00
31	INP 4			BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B.)	M3	420.80	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
32	INP 5			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-6055 DE DIÁMETRO 800 mm	ML	0.00	0.00
33	INP 6			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	8.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
34	INP 7			CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3	0.00	0.00
35	INP 8			EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	0.00
36	INP 9			EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	0.00



GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO CINCO (05) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 17092025-1535
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 17092025-1535

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta : jueves, 30 de abril de 2026

Concepto		Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra		17092025-1535	Acto Administrativo:		N/A
No. Pedido en SAP:		4500028846			
NIT o RUT:		901499915-4			
Contratista:		INGENIERIA RYD SAS			
Representante Legal:		DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA			
Valor del Contrato (\$):		\$ 3.090,518,083.00	Aporte Departamento:		\$ 3,907,518,084.00
Valor Adición		\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades:		N/A
Objeto del contrato		MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN			
Disponibilidad presupuestal		4500028846	FONDO	6-FMN0376	
Duración del contrato (Plazo):		OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación		SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación:		MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento		MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA			
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE Ø A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	0.00
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE Ø A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	0.00
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML	0.00	0.00
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un	0.00	0.00
41	INP 14	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIAMETRO 315 mm	m	0.00	0.00
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3	352.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	0.00	0.00
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 720 n)	m2	0.00	0.00
45	INP 18	TUBERÍA DE PVC 4'	m	11.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3	0.00	0.00
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	239.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO)	Un	36.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

Firma

INGENIERIA RYD S.A.S
Contratista

Firma

ROBLE INGENIERIA S.A.S
Interventor externo

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO: VILLAMARÍA
ACTA No. 4 (Número de modif. correspondiente) POR CANTIDADES DE OBRA X
PÁGINA: 20/20 (Total de páginas)

CONTRATO No. 1703025-1535 (Número original) PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según contrato original) 30 MESES (En meses según las modificaciones en suspensores)
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA FUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS * (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
CONTRATISTA: INGENIERIA RYD SAS INTERVENCIÓN: SOBRE INGENIERIA SAS VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (COP\$) \$ 3.987.518.984,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B) \$ 517.000.000

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS				
								CONDICIONES ACTUALIZADAS	ACTA ANTERIOR	ACTA ACTUAL	PRESENTES	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	GR.	PART.						CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	200.1.1		DEBARRIETE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	m²	0.3	\$ 4.938,666.00	\$ 1,481,579.80	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
2	201.7		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m³	5	\$ 203,447.00	\$ 1,017,235.00	69.00	\$ 13,834,306.00	+	3.50	\$ 712,065.00	\$ 5,663,732.00	71.50	\$ 14,545,461.00
3	201.8		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m²	140	\$ 26,141.00	\$ 3,659,740.00	3785.00	\$ 99,943,695.00	+	675.00	\$ 17,645,175.00	\$ 89,532,920.00	4460.00	\$ 116,548,660.00
4	210.1.1		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	140	\$ 24,193.00	\$ 3,347,020.00	948.50	\$ 15,406,559.00	+	536.00	\$ 15,106,088.00	\$ 12,555,537.00	1085.50	\$ 20,992,417.00
5	300.1.1		SUB BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para tipo de gradación 2010-40 clase A)	m³	1726	\$ 204,562.00	\$ 353,074,012.00	969.86	\$ 199,307,013.00	-	-164.00	\$ (33,850,449.00)	\$ 126,456,773.00	805.86	\$ 164,746,564.00
6	300.1.2		BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para NT3, tipo de gradación BG 40, clase A)	m³	1390	\$ 229,259.00	\$ 313,110,010.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7	400.2		REGO DE IMPERMEACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CIL 37	m²	5659	\$ 6,410.00	\$ 36,226,790.00	2185.00	\$ 14,005,950.00		0.00	\$ 0.00	\$ 14,005,950.00	2185.00	\$ 14,005,950.00
8	400.2		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (CONCRETO DE INGRESO)	m³	445	\$ 1,406,575.00	\$ 625,525,875.00	174.80	\$ 259,853,310.00		0.00	\$ 0.00	\$ 259,853,310.00	174.80	\$ 259,853,310.00
9	500.1.1P		PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALUJO ACCELERADO A 7 DIAS	m³	504	\$ 1,466,813.00	\$ 739,273,752.00	164.20	\$ 240,850,695.00		0.00	\$ 0.00	\$ 240,850,695.00	164.20	\$ 240,850,695.00
10	040.1P		SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3"X" Y 1"	m²	560	\$ 26,990.00	\$ 16,224,400.00	1014.70	\$ 29,416,151.00	-	-232.70	\$ (6,745,973.00)	\$ 16,953,352.00	564.80	\$ 22,070,180.00
11	600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m³	400	\$ 43,343.00	\$ 18,137,200.00	971.40	\$ 44,046,190.00	+	504.80	\$ 22,889,146.00	\$ 40,318,936.00	1476.20	\$ 66,935,337.00
12	610.4		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBD-38 (Análisis sin preparación de la superficie base del relleno)	m³	24	\$ 166,796.00	\$ 4,002,104.00	63.79	\$ 10,624,305.90	-	-19.20	\$ (3,202,483.30)	\$ 7,422,422.00	44.50	\$ 7,422,422.00
13	671.3		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m³	120	\$ 61,616.00	\$ 7,393,920.00	0.00	\$ 0.00	+	11.60	\$ 9,948,369.00	\$ 9,948,369.00	11.60	\$ 9,948,369.00
14	672.4		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPa	m	585	\$ 142,668.00	\$ 83,571,930.00	0.00	\$ 0.00	+	100.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	100.00	\$ 15,000,000.00
15	630.1.3.2		(Concreto resistencia 28MPa (C-1 - para mazo y panelas premezclado)	m³	21	\$ 1,693,292.00	\$ 35,559,132.00	82.00	\$ 138,848,544.00	+	4.70	\$ 7,958,472.00	\$ 109,217,334.00	86.70	\$ 146,806,816.00
16	630.1.3.2P		(Concreto resistencia 28MPa (C-1 - mezcla in situ para viga - zapca)	m³	54	\$ 1,796,944.00	\$ 96,409,576.00	58.40	\$ 73,983,690.00	-	-2.80	\$ (5,347,103.00)	\$ 6,334,220.00	55.60	\$ 70,436,526.00
17	631.1.2		PAVIMENTO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE 10 CM DE ESPESOR	m	48	\$ 2,851,470.00	\$ 137,270,560.00	0.00	\$ 0.00		0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
18	640.1		ACERO DE REFORZO #7 - 10 MPa (Análisis para acero de refuerzo de Fy=4200 MPa)	kg	17353	\$ 7,606.00	\$ 131,969,965.00	37000.00	\$ 281,365,000.00	+	9061.50	\$ 38,482,708.00	\$ 142,346,588.00	18117.50	\$ 319,877,708.00

46	NP-19						\$ 1,850,383.00		579.30		\$	1,014,865,993.00		-	-51.50		(95,550,680.00)	527.80	\$	979,255,313.00	527.80	\$	979,255,313.00		819,255,313.00
47	NP-20	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MIR 46 ACERAMADO A TIRAS REFLEJOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Avance en preparación de la superficie base del tráfico).	M3				\$ 139,646.00		100.00		\$	13,964,800.00		+	343.35		47,947,454.00	360.50	\$	50,342,384.00	443.35	\$	61,912,054.00		
48	NP-21	ADMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 58" L-15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	Lm				\$ 32,672.00		144.00		\$	4,704,768.00		+	32.00		1,049,504.00	176.00	\$	5,750,272.00	176.00	\$	5,750,272.00		
		VALOR TOTAL OBRA									\$	2,640.00					(147.00)					\$	2,540.00		
		VALOR PGD (Incluye PNT - PAGA) (MODIFICABLE)									\$	3,831,801,071.00					(170,029,618.00)					\$	2,443,143,181.00		
		VALOR TOTAL									\$	75,537,013.00					170,029,618.00					\$	245,566,631.00		
											\$	3,907,610,084.00										\$	2,443,143,181.00		

* Los conceptos deben compararse a los relacionados en la propuesta económica 20700003.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).

Con el propósito de dar cumplimiento al alcance físico del proyecto, la presente acta de modificación contempla las cantidades totales para cumplir con lo, por lo que se limita esta acta a la modificación únicamente de obra, de acuerdo a las actividades por ejecutar.

La presente acta de modificación de contrato se suscribe por el supervisor de obra con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Edm
Alfonso J. Torres
Obrero
Obrero
Código de matrícula No. 17200-16797-010

Firma
Nombre: JOSÉ ALEJANDRO ORDOÑO RECURVIDE
Cargo: Obra
Matrícula Profesional No. 17200-01216-010

Firma
Nombre: MICHAEL DEL PLANT GONZALEZ VALENZUELA
Cargo: Supervisora del contrato
Matrícula Profesional No. 17200-01216-010

GOBERNACIÓN DE CALDAS

FORMULARIO DE PRESUPUESTO MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN


Modificación Abril de 2026

PLAN DE MANEJO DE GESTION INTERGAL PGIO

COMPONENTE AMBIENTAL					
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
PUNTOS ECOLOGICOS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS	PUNTO ECOLOGICO 8 PUNTOS. NO RECICLABLE, PAPEL CARTÓN, PLÁSTICO.	FACTURA	3	\$ 280,000.00	\$ 840,000.00
KIT DE CONTROL DE DERRAMES	KIT DE CONTROL DE DERRAMES DE 55 GALONES	FACTURA	3	\$ 585,000.00	\$ 1,755,000.00
ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES	CONTENEDORES PARA ACOPIO RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES	FACTURA	2	\$ 85,000.00	\$ 170,000.00
LAVADO DE HERRAMIENTAS	CANECA DE 55 GALONES PARA LAVADO DE HERRAMIENTAS	FACTURA	2	\$ 85,000.00	\$ 170,000.00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	UNIDAD	1	\$ 155,194,724.00	\$ 155,194,724.00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	PRESUPUESTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PAGA)	UNIDAD	1	\$ 60,979,761.47	\$ 60,979,761.47
KIT DE ASEO	KIT DE ASEO SOCIAL Y COMUNITARIO (ESCOBA, TRAPERO, RECOGEDOR, CEPILLO, BALDE 25 L Y OTROS)	FACTURA	5	\$ 30,500.00	\$ 152,500.00
GENERACION DE INFORMES. EJE AMBIENTAL	GENERACION DE INFORMES, IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN, ADQUISICION DE INFORMACIÓN, CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PLAN PGIO EJE AMBIENTAL	MENSUAL	7	\$ 180,000.00	\$ 1,260,000.00
SUBTOTAL COMPONENTE AMBIENTAL					\$ 220,521,985.47

COMPONENTE S&SO					
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
KIT ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS POR PERSONA. INCLUYE: BOTAS, CASCO, CHALECO, TAPA OÍDOS, GUANTES)	FACTURA	120	\$ 90,000.00	\$ 10,800,000.00
KIT DE EMERGENCIAS	INCLUYE EXTINTOR 10 LBS CON SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO, CAMILLA, CONOS REFLECTIVOS Y BOTIQUIN CON LOS ELEMENTOSDE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS	FACTURA	3	\$ 534,900.00	\$ 1,604,700.00
KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS	KIT PARA TRABAJO EN ALTURAS CERTIFICADO INCLUYE ARNES, BARBUQUEO, ESLINGA EN Y, LINEA DE VIDA, PUNTO DE ANCLAJE FIJO.	FACTURA	7	\$ 870,000.00	\$ 6,090,000.00
EQUIPO ESPECIALES PARA RESCATE Y EMERGENCIAS	DETECTOR DE GASES	FACTURA	10	\$ 100,000.00	\$ 1,000,000.00
SEÑALIZACIÓN S&SO	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA. INTERNA (en el parque)	FACTURA	1	\$ 209,946.00	\$ 209,946.00
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO	EXAMENDEINGRESOYEGRESOQUEINCLUYE:AGUDEZAVISUAL,TALLYPESO,TENSIÓN ARTERIAL, SEROLOGÍAPARATODOELPERSONALEXCEPTOPERSONALDE TRABAJO EN ALTURAS.	FACTURA	120	\$ 40,000.00	\$ 4,800,000.00
GENERACION DE INFORMES EJE S&SO	GENERACIÓN DE INFORMES, IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN, ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN, CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PGIO EJE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.	MENSUAL	3	\$ 180,000.00	\$ 540,000.00
SUBTOTAL COMPONENTE S&SO					\$ 25,044,646.00
TOTAL COMPONENTE PGIO					\$ 245,566,631.00

Elaboró:


JULIO CÉSAR SERNA OSORIO
Director de Obra

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE CALDAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ISRAE DEL PROYECTO: PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL No. 1 (Marque una X)

FECHA: 20 / 4 / 26 (Día) (Mes) (Año)

LICENCIADO: (Indicar con una X) NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X (Indicar con una X)

Resolución N°: (Indicar N° de Resolución día, mes y año) 3 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUNTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A				CONDICIONES PROYECTADAS				VALOR CON CARGO A			OBSERVACIONES	
				CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) (\$)	VR. UNITARIO + IVA (\$)	VR. TOTAL (\$)	VR. ÍTEM NO PREVISTO (\$)	VR. REEMBOLSO DE GASTOS (\$)		
DVGA-1.3-03	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento de requerimientos legales.	Trámites legales (Ocupación de causal)	X	X	X		1	Evento y actibus							
PAC-2.1-04		Mantenimiento integral de materiales de construcción	Trámites de conexión de agua	X	X	X		1	Evento y actibus							
PAC-2.1-06		Mantenimiento integral de materiales de construcción	Trámites de aprovechamiento forestal	X	X	X		1	Evento y actibus							
		Manejo integral de materiales de construcción	Suministro e instalación de pilotes negro (Plástico), calibre B. Para protección de materiales	X	X	X		1800	m2	\$ 1,957	\$ 3,522,600	\$ 3,522,600	\$	\$	\$ 3,522,600	
		Specialización de frentes de obras y sitios lentocostales.	Carrizamiento en yute y guabua	X	X	X		50	ML	\$ 10,405	\$ 520,250	\$ 520,250	\$	\$	\$ 520,250	
			Ciudad demarcación producción (2 Hillside)	X	X	X		3000	ML	\$ 294	\$ 882,000	\$ 882,000	\$	\$	\$ 882,000	
			Construcción o instalación de puntos ecológicos	X	X	X		0	Unidad	\$ 323,721	\$ -	\$ -	\$	\$	\$ -	
			Instalación bridas (de colores para juntas ecológicas (unif., unif. verde y roja)	X	X	X		2304	Unidad	\$ 1,561	\$ 3,598,544	\$ 3,598,544	\$	\$	\$ 3,598,544	
			Reubicación de Residuos Convencionales en punto de acopio.	X	X	X		38.8	Día	\$ 175,736	\$ 5,272,140	\$ 5,272,140	\$	\$	\$ 5,272,140	
			Gestión y pagos a empresas certificadas que realicen la recolección y disposición final de residuos peligrosos	X	X	X		600	Kg	\$ 5,600	\$ 3,360,000	\$ 3,360,000	\$	\$	\$ 3,360,000	
			Jornal Brigada de Orden y Aseo 2026	X	X	X		6	Día	\$ 98,855	\$ 769,237	\$ 769,237	\$	\$	\$ 769,237	Factor prestacional 2025
			Jornal Ligada de Orden y Aseo 2026	X	X	X		24	Día	\$ 121,533	\$ 2,916,600	\$ 2,916,600	\$	\$	\$ 2,916,600	Factor prestacional 2026
			Derechos del sitio de Disposición RCU					0.00	m3				\$	\$		Esta actividad se encuentra incluida en los APUs de excavación de material común y roca
			Confirmación de zona RCD					0.00	m3				\$	\$		Son 3 unidades por mes, para un total 6 unidades por 2 meses
			Manejo y disposición final de escombros	X	X	X		23	Mes - Unidad	\$ 600,000	\$ 13,800,000	\$ 13,800,000	\$	\$	\$ 13,800,000	
			Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	X	X	X		0		\$ 720,000	\$ -	\$ -	\$	\$	\$ -	
			Pago servicios unidades sanitarias o instalación de baños portátiles - Mantenimiento de las unidades sanitarias 2025	X	X	X		0		\$ 21,654,000	\$ 21,654,000	\$ 21,654,000	\$	\$	\$ 21,654,000	Segun cotizaciones
			Pago servicios unidades sanitarias o instalación de baños portátiles - Mantenimiento de las unidades sanitarias 2026	X	X	X		1	Factura	\$ 1,224,680	\$ 1,224,680	\$ 1,224,680	\$	\$	\$ 4,696,190	
			Aprovechamiento Forestal	X	X			1	Ha	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$	\$ -	
			Compensación Forestal	X	X			0	Un	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$	\$ -	
			Compensación individual por árboles frutales	X	X			0	Un	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$	\$ -	
										\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	\$	\$ 60,979,765	

VR. ÍTEM NO PREVISTO (\$)

VR. IVA DE INVERSIÓN AMBIENTAL (\$)

VR. TOTAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL (\$)

Julio César Sierra Osorio
Director de Obra

MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	TOTAL JR	% dedicación	Valor mensual	Valor parcial
Controladores de tráfico 2025	Jornal	4	2	8	100%	\$ 2,959,641	\$ 23,677,124
Controladores de tráfico 2026	Jornal	6	5.5	33	100%	\$ 3,715,200	\$ 122,601,600
Elemento	Unidad	Cantidad	Cantidad			Valor parcial	Valor Total
Alquiler Señal Inicio de obra	Unidad-mes		36			\$ 25,000	\$ 900,000
Alquiler Señal Fin de Obra	Unidad-mes		36			\$ 25,000	\$ 900,000
Alquiler Señal obra en la via	Unidad-mes		36			\$ 25,000	\$ 900,000
Alquiler Señal auxiliar de transito	Unidad-mes		36			\$ 25,000	\$ 900,000
Alquiler Señal angostamiento a la izquierda	Unidad-mes		36			\$ 25,000	\$ 900,000
Alquiler Señal angostamiento a la derecha	Unidad-mes		36			\$ 25,000	\$ 900,000
Alquiler Señal trabajos en la via	Unidad-mes		36			\$ 25,000	\$ 900,000
Alquiler Señal Barricada	Unidad-mes		36			\$ 50,000	\$ 1,800,000
Alquiler Señal Bombones	Unidad-mes		50			\$ 7,500	\$ 375,000
Señalización con cinta de demarcación	m		1500			\$ 294	\$ 441,000
Subtotal Señalización						\$	\$ 8,916,000
TOTAL						\$	\$ 155,194,724

Elaboró:

JULIO CESAR SERNA OSORIO
Director de Obra



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
Codigo:
Versión aprobada: 1

Página 1 de 1

FECHA 30 04 2026

PREACTA N° 5

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

**PREACTA DE ÍTEMS DE OBRA
ACTA DE OBRA No. 05
ABRIL DE 2026**



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato Registro
Código:
Versión aprobada:
Página 1 de 1

FECHA 30 04 2026

PREACTA N° 5

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS


CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	UBICACIÓN	Fecha	DIMENSIONES				ÁREA (M2)
						UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
	3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	Villamaría, Caldas	30/04/2026	Tramo 1. Demolicion de asfalto	208.30	3.50		729.05
						% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD				729.05
						TOTAL CUBROS ANTERIORES				3.425.00
						TOTAL ACUMULADO				4.154.05
						TOTAL CUBRO PRESENTE ACTA				729.10

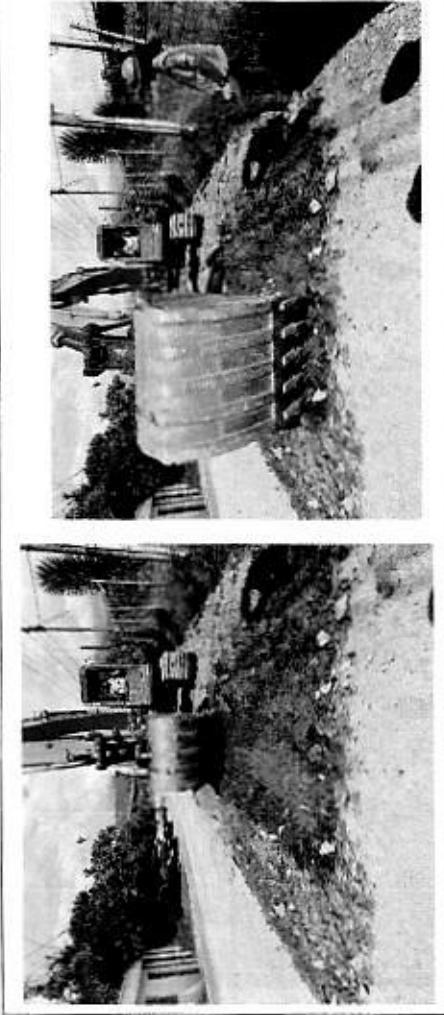

Julian David Sanchez Hernández
Julian David Sánchez Hernández
Director de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Diego Fernández Alarcón
Diego Fernández Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio Cesar Serma Osorio
Julio Cesar Serma Osorio
Director de Obra
Mat. Profesional 17202-167977 CLD

Jorge Andres Grajo Homández
Jorge Andres Grajo Homández
Director de Interventoría
Mat. Profesional 17202-313215 CLD

TABLA DE VOLUMENES EXPLANACIÓN TRAMO 3

ESTACIÓN	AREA DE CORTE	VOLUMEN DE CORTE	ACUMULADO VOL CORTE
5+855.00	0.00	0.00	0.00
5+856.00	0.00	0.00	0.00
5+858.00	0.39	0.32	0.32
5+860.00	1.71	1.79	2.12
5+862.00	2.67	3.80	5.92
5+864.00	5.83	7.55	13.46
5+866.00	6.92	11.31	24.77
5+868.00	10.83	15.75	40.53
5+870.00	12.22	20.59	61.12
5+872.00	15.31	24.69	85.81
5+874.00	13.85	26.36	112.17
5+876.00	15.85	27.04	139.21
5+878.00	13.34	26.36	165.57
5+880.00	16.48	28.11	193.68
5+882.00	15.35	31.82	225.51
5+884.00	15.34	30.69	256.19
5+886.00	15.90	31.24	287.43
5+888.00	12.70	28.60	316.03
5+890.00	10.76	23.46	339.49
5+892.00	8.05	18.81	358.30
5+894.00	5.09	13.14	371.44
5+896.00	3.88	8.97	380.41
5+898.00	2.20	6.08	386.49
5+900.00	1.98	4.18	390.67
5+902.00	1.41	3.39	394.06
5+904.00	2.57	3.98	398.04
5+905.00	0.58	1.57	399.62

SECCIONES EXPLANACIÓN TRAMO 3

OBJETO "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD
- EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA,
VEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS"



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+855.00)	
ESTACION	5+855.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+866.00)	
ESTACION	5+866.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+856.00)	
ESTACION	5+856.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+866.00)	
ESTACION	5+866.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50




TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+858.00)	
ESTACION	5+858.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+870.00)	
ESTACION	5+870.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+860.00)	
ESTACION	5+860.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+872.00)	
ESTACION	5+872.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+862.00)	
ESTACION	5+862.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+874.00)	
ESTACION	5+874.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+864.00)	
ESTACION	5+864.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50



TITULO: SECCION DE EXPLANACION (5+876.00)	
ESTACION	5+876.00
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA
FECHA	15/05/2011
PROYECTISTA	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
REVISOR	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
APROBADO	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
ESCALA	1:50

Informe de volumen

Cliente:

Client

Client Company

Address 1

Fecha: 27/04/2026 11:18:04 a. m.

Alienación: EJE

Grupo de líneas de muestreo: SL SUBBASE TRAMO 1





P.K. inicial: -0+100.00

P.K. final: 0+508.98

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
0+112.00	1.19	0.00	0.00
0+115.00	1.22	3.60	3.60
0+120.00	1.46	6.69	10.29
0+125.00	1.18	6.59	16.88
0+130.00	1.33	6.26	23.14
0+135.00	1.32	6.61	29.75
0+140.00	1.08	6.00	35.76
0+145.00	1.17	5.63	41.38
0+150.00	1.15	5.79	47.17
0+155.00	1.53	6.70	53.88
0+160.00	1.58	7.78	61.66
0+165.00	1.85	8.57	70.23
0+170.00	1.46	8.28	78.51
0+175.00	1.20	6.65	85.16
0+180.00	2.52	9.29	94.45
0+185.00	1.56	10.20	104.65
0+190.00	1.73	8.24	112.89
0+195.00	1.65	8.46	121.35
0+200.00	1.75	8.51	129.86
0+205.00	1.66	8.55	138.40
0+210.00	1.44	7.77	146.17
0+215.00	1.30	6.86	153.03
0+220.00	1.46	6.91	159.94
0+225.00	1.50	7.41	167.35
0+230.00	1.55	7.64	174.99
0+235.00	1.55	7.77	182.76
0+240.00	1.35	7.26	190.02
0+245.00	1.40	6.88	196.90
0+250.00	1.42	7.06	203.96
0+255.00	1.43	7.13	211.09
0+260.00	1.35	6.95	218.05
0+265.00	1.59	7.34	225.38
0+270.00	1.71	8.24	233.63
0+275.00	1.97	9.21	242.83
0+280.00	1.93	9.76	252.60
0+285.00	1.83	9.40	262.00
0+290.00	1.63	8.65	270.65
0+295.00	1.46	7.73	278.37
0+300.00	1.50	7.41	285.79
0+305.00	1.78	8.20	293.98
0+310.00	2.01	9.47	303.45
0+315.00	2.16	10.43	313.88
0+320.00	1.71	9.67	323.55
0+325.00	0.98	6.71	330.26





SECCIONES SUBBASE TRAMO *

OBJETO "MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL
 ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS"







SECCIONES SUBBASE TRAMO 1

OBJETO "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS"



SECCIONES SUBBASE TRAMO 1

OBJETO "MEJORAMIENTO EN LA MA PUNTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS"



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
 Código:
 Versión aprobada: 1

FECHA 30 04 2026

PREACTA N° 5

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS


CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	m3	UBICACIÓN	DIMENSIONES				VOLUMEN (M3)	
						LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD		
	15	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)			Villamaría, Caldas						
			Fecha								
			24/04/2026			Losa de aproximación línea 2	9.80	5.10	0.35	17.49	
			24/04/2026			viga espolon losa de aproximación línea 2	9.00	0.60	0.60	3.24	
			24/04/2026			Vastago muro complementario	9.95	0.35	3.00	10.45	

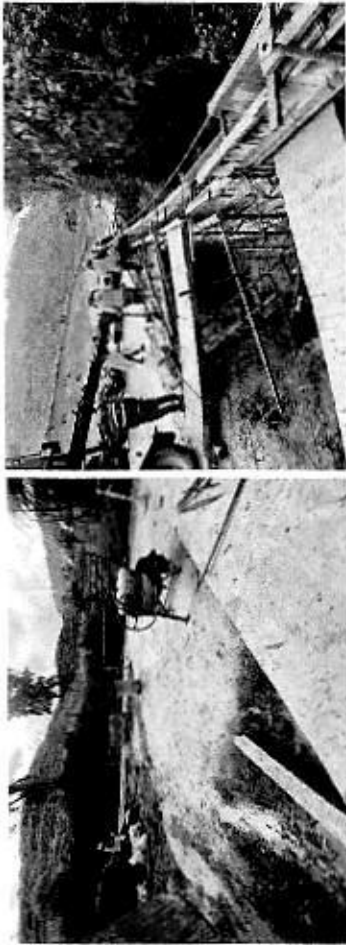

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD

31.18

TOTAL COBROS ANTERIORES


64.66

TOTAL ACUMULADO

95.74

TOTAL COBRO PRESENTE ACTA


31.20


 Julian David Sanchez Hernandez
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD


 Leonario Hernandez Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 05 1037-0507092 CLD


 Julio Cesar Serna Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD


 Jorge Andrés Giraldo Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD

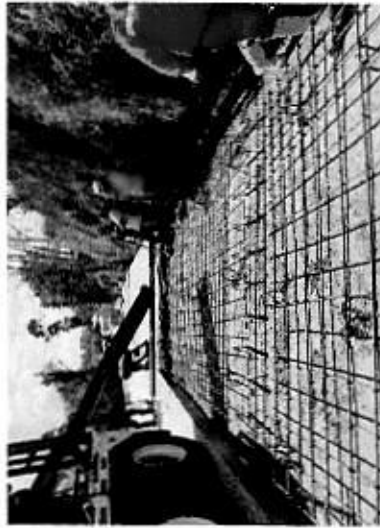

30/04/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 2, parrilla inferior	5.50	81.00	3.06	1.00	1,363.23
30/04/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 2, parrilla inferior	4.45	4.00	3.06	1.00	54.47
30/04/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 2, parrilla superior	5.60	45.00	3.06	1.00	771.12
30/04/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 2	9.00	42.00	1.55	1.00	585.90
30/04/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 2	0.80	10.00	1.00	1.00	8.00
30/04/2026	Tramo 3. Acero viga losa de aproximación, línea 2	9.00	6.00	3.06	1.00	165.24
30/04/2026	Tramo 3. Acero viga losa de aproximación, línea 2, flejes	2.25	87.00	0.56	1.00	109.62
30/04/2026	Tramo 3. Acero aleta derecha discole ponton	2.00	32.00	1.00	1.00	64.00
30/04/2026	Tramo 3. Acero aleta derecha discole ponton	3.00	22.00	1.00	1.00	66.00
30/04/2026	Tramo 3. Acero aleta derecha discole ponton	3.00	14.00	1.00	1.00	42.00
30/04/2026	Tramo 3. Acero aleta derecha discole ponton	2.00	12.00	1.00	1.00	24.00
30/04/2026	Acero Viga Rectangular Longitudinal No. 5	1.00	4.00	1.55	66.7	411.95
30/04/2026	Acero Viga Rectangular Flejes No. 3/8	0.50	10.00	0.56	66.7	186.70

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD

TOTAL COBROS ANTERIORES


TOTAL COBRO PRESENTE ACT


9,196.37


18,717.58

27,913.94

9,196.40


 Julio Cesar Sarmiento Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-16797 / CLD


 Leonardo Fernandez Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507052 CLD


 David Sanchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD


 Jorge Andrés Giraldo Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PRACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro

Código:

Versión aprobada:

Página 1 de 1

FECHA 30 04 2026

PRACTA N° 8

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17082025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

DOBLE INGENIERIA S.A.B

ACTIVIDAD

ITEM 20

DESCRIPCION


Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa

UNID.

ml

UBICACIÓN

Villamaría, Caldas

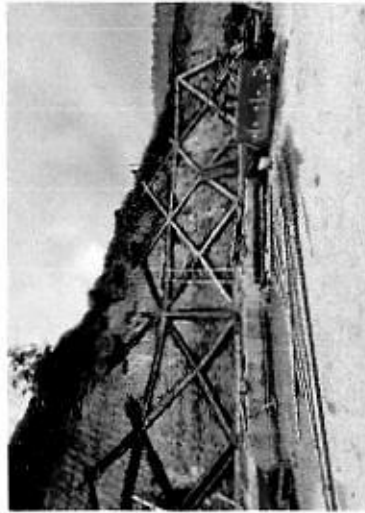

Fecha	UBICACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN (M3)
		LONGITUD (M)	UNIDAD (M)		
24/04/2026	Viga Vertical Línea 1 y Línea 2	3.00	4.00		12.00
24/04/2026	Viga horizontal Línea 2	25.00	1.00		25.00
24/04/2026	Diagonales Línea 3	2.12	14.00		29.68
% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD					56.68
TOTAL COBROS ANTERIORES					93.84
TOTAL ACUMULADO					150.52
TOTAL COBRO PRESENTE A VÍA					66.70

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Diego Fernando Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio César Sama Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD

Jorge Andrés Girardo Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD

FECHA 30 04 2026

PREACTA N° 5

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

**CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	INP 1	DESCRIPCION	UNID.	MIL	UBICACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD (UN)	
							LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		
			BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM			Villamaría, Caldas					
							Fecha	UBICACIÓN			
							30/04/2026	Tramo 1. Ajuste Bordillo Lado Izquierdo hasta la K0+112	-10.00	1.00	-10.00
							30/04/2026	Tramo 1. Bordillo Lado Derecho K0+112 al K0+325	211.00	1.00	211.00
							30/04/2026	Tramo 1. Bordillo Lado Derecho K0+385 al K0+396	10.40	1.00	10.40



% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD
TOTAL COBROS ANTERIORES
TOTAL ACUMULADO

211.40
 308.40
 519.80
 211.40

[Signature]
 Julio Cesar Serna Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD

[Signature]
 Leonardo Hernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 081037-0507092 CLD




[Signature]
 Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

[Signature]
 Jorge Andrés Giraldo Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD

TABLA DE VOLUMENES			
ESTACIÓN	AREA DE LLENO	VOLUMEN DE LLENO	ACUMULADO VOL LLENO
0+080.00	2.11	0.00	0.00
0+085.00	4.22	15.83	15.83
0+090.00	2.62	17.10	32.93
0+095.00	3.11	14.32	47.25
0+100.00	3.19	15.73	62.98
0+105.00	2.43	14.04	77.02
0+110.00	2.04	11.17	88.19
0+115.00	1.87	9.77	97.97
0+120.00	2.19	10.15	108.12
0+125.00	2.21	10.99	119.11
0+130.00	1.86	10.17	129.29
0+135.00	2.11	9.95	139.23
0+140.00	1.77	9.71	148.94
0+145.00	2.29	10.15	159.09
0+150.00	2.26	11.37	170.46
0+155.00	2.96	13.04	183.50
0+160.00	3.68	16.61	200.10
0+165.00	3.05	16.83	216.94
0+170.00	3.99	17.61	234.55
0+175.00	3.54	18.82	253.36
0+180.00	2.82	15.88	269.24
0+185.00	2.14	12.39	281.63
0+190.00	2.06	10.51	292.15
0+195.00	1.84	9.75	301.90
0+200.00	2.50	10.83	312.72
0+205.00	1.69	10.46	323.18
0+210.00	1.51	7.99	331.17
0+215.00	1.39	7.25	338.42
0+220.00	2.03	8.54	346.96
0+225.00	1.92	9.86	356.82
0+230.00	1.87	9.46	366.28
0+235.00	1.82	9.21	375.49
0+240.00	2.13	9.86	385.35
0+245.00	2.74	12.16	397.52
0+250.00	1.77	11.27	408.79
0+255.00	1.52	8.23	417.02
0+260.00	0.00	3.81	420.83
0+265.00	0.00	0.00	420.83
0+270.00	0.00	0.00	420.83






SECCIONES BASE TRAMO 2

OBJETO "MEJORAMIENTO EN LA VIA FUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS"




SECCIONES BASE TRAMO 2

OBJETO "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL
ARCOJITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS"

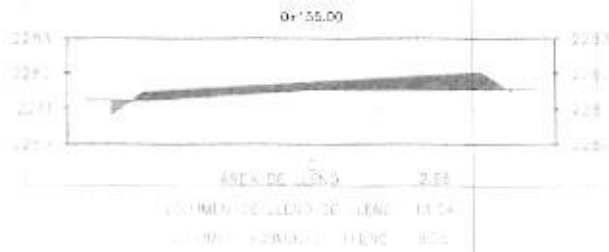

SECCIONES BASE TRAMO 2


OBJETO "MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ABSOLUTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS"



AREA DE LLENO 2.00
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 8.04
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 3.40



AREA DE LLENO 2.00
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 8.04
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 3.40



AREA DE LLENO 1.92
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 7.68
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 3.26



AREA DE LLENO 0.00
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 0.00
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 0.00




AREA DE LLENO 1.87
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 7.48
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 3.04



AREA DE LLENO 0.00
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 0.00
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 0.00




AREA DE LLENO 1.82
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 7.28
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 2.94



AREA DE LLENO 0.00
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 0.00
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 0.00



AREA DE LLENO 2.12
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 8.48
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 3.65



AREA DE LLENO 2.74
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 10.96
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 4.52



AREA DE LLENO 3.77
 VOLUMEN DE LLENO DE LLENO 15.08
 VOLUMEN COMPRESO LLENO 6.03

FECHA	30	64	2026	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PÁGINA	1	DE	1
-------	----	----	------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA

ACTIVIDAD	ITEM	INP 6	DESCRIPCIÓN	UNID.	M3	UBICACIÓN	Ubicación
			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA				Villamaría, Caldas

Fecha	DIMENSIONES						VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD		
30/04/2026	Tramo 3. Limpieza base de aproximación	9.90	5.10	0.05	0.70		1.77
30/04/2026	Tramo 3. Alca de arriba descole ponton	2.00	0.50	4.10	1.00		4.30
30/04/2026	Tramo 1. concreto cuneta entrada a sumidero del K0+100	4.95	1.20	0.20	1.00		1.19
30/04/2026	Tramo 1. concreto cuneta salida a sumidero del K0+370	14.20	0.80	0.07	0.70		0.56
30/04/2026	Tramo 1. acceso a cancha costado izquierdo	6.00	1.23	0.15	1.00		1.10



% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	8.91
TOTAL COBROS ANTERIORES	26.33
TOTAL ACUMULADO	37.25
TOTAL COBRÓ PRESENTE ACTA	8.90

[Signature]
 Juan Carlos Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

[Signature]
 Leonardo Hernández Alarcón
 Responsable de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

[Signature]
 Julio Cesar Sierra Osorno
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD

[Signature]
 Jorge Andrés Garayó Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formulario-Registro

Código:

Versión aprobada:

1

Página 1 de 1

FECHA 30 04 2026

PREACTA N° 5

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

PREACTAS PAGA No. 1 ACTA No. 5 DE AVANCE DE OBRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica: 7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Razón Social: JAIME ANDRES ALZATE RESTREPO

Identificación: 93295511-6

Teléfono: 3205005044

Dirección: CR 8B N. 57C 08 MZ D CASA 15, Manizales, Caldas, Colombia.

Condición IVA: No Aplica

Responsabilidad fiscal: Régimen Simple de Tributación

Número: FE-77

Fecha: 08/01/2026 17:13

Fecha Vto.: 08/01/2026

Forma de pago: Crédito

Sr. (es): INGEVIAL PYM S.A.S.

Dirección:

Municipio: Manizales, Caldas, Colombia.

NIT: 900985618-2

Tel: 3164726028

Muni. Dest.: Manizales

Lín. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	CONSULTORIA FORESTAL	MANEJO DE ESPECIES VASCULARES Y REHABILITACIÓN ECOLOGICA	1.00	Und	0%	8,770,500.00	0.00	8,770,500.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal: 8,770,500.00

Descuento: 0.00

Total Bruto: 8,770,500.00

Fecha y hora de validación: 08/01/2026 17:17

CUPE: fbdb0d76cc5320535b9c861c08b5524f5c71c9e8e0144e635388ec272e267edd443f55152db5e5e14fb10b60cd3f8ed6

Firma Digital: ERILlJm4NFTpK3ti0dkONcOauUXWzFrTFXxJkgPrXCiW7TtVW2aTrbhElafzXtS
qvyqBGJFnRC5S9p8SVUV6RJPL4q1jiuccBTYAjImJfwCvj2CzehdVBcR9cOYayo
HmnqHLJX8U0Ydy3wXgLg6MIU/pizjKZjBrQEa8bfw70lr747hTraY9c2JDzG
m5VBZXkuOpQladScJFZN3RPPAFSg6yqh0cBv4pUNeZhlVRqA0vwMwBH91Mii7+FQ
Mx2s9pNlskbq9TCYcEywW1IXVN6//P0BdeJXXBYNoEniWbA/JoRCEgama6Mc8E
FGDWT4POfzFmfA9MnF289Q==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764101854857 del 2025-11-21 al 2026-05-21. Rango: FE-72 al FE-200.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 8,770,500.00



HECHO EN
XUBIO.com

Página 1 / 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p

Razón Social: JAIME ANDRES ALZATE RESTREPO
Identificación: 93295511-6
Teléfono: 3205005044
Dirección: CR 8B N. 57C 08 MZ D CASA 15, Manizales, Caldas, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: Régimen Simple de Tributación

Número: FE-76
Fecha: 04/12/2025 15:33
Fecha Vto.: 04/12/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): INGEVIAL PYM S.A.S.
Dirección:
Municipio: Manizales, Caldas, Colombia.

NIT: 900985618-2
Tel: 3164726028

Muni. Dest.: Manizales

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	CanL.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	TALA	SECTOR PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO. VILLAMARIA - CALDAS	1.00	Und	0%	6,130,000.00	0.00	6,130,000.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal: 6,130,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 6,130,000.00

Fecha y hora de validación: 04/12/2025 15:40

CUFE: a8bc0d82164b32cbe1af0608dc730e2b904c1ae9ef8adb753e249cc66ed11f18c912926a86acb74c1d9b9952763d63

Firma Digital: JvGgcCsKmbkREytSwF1vvCtmopN/eSG/NCavVnPtTs0JmbGjLkX1gSZzO6ZBeltCkP4jAxxckDMR9MPSpxkyLrONzyOyP0gkFXzPW4PGMGa6fR8cBSonwivXelQ1QpGXJ1PJLYnuqGGHmg9V0u1KFJewlaK125rD6gdW+//SWCLCLJ8/PNdXH5pLc5VjJXT8O6aXAg2eWWZaj+84KroL6UZa0/KRUaxEkAojfexUGqPKVL5td04ZurZdBslid+1OJQqQu6SHZFromkgDv+ER7HCkgt4rov0VUpQpBCkg9mP/t8VLSZepOZXbiGSOT/y/VNRJpmiqH1Xgbd5VYMLg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764101854857 del 2025-11-21 al 2026-05-21. Rango: FE-72 al FE-200.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 6,130,000.00



HECHO EN
XUBIO.com

Página 1 / 1



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro

Código:

Versión aprobada:

1

Página 1 de 1

FECHA 30 04 2026

PREACTA N° 5

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYO S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

PREACTAS PMT No. 1 ACTA No. 5 DE AVANCE DE OBRA



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formulario-Registro
Código:
Versión aprobada: 1

FECHA 30 04 2026

PREACTA N° 5

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYO S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD

PGIO

ITEM

PMT

DESCRIPCION

JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO

UNID.

JORNAL

URCACION

Villamaria, Caldas

Fecha	UBICACIÓN		DIMENSIONES			VALOR TOTAL
	CANTIDAD (UNI)	VALOR UNITARIO	ALTURA (M)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
30/04/2026	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO NOVIEMBRE 2025	75.30	\$ 86,504.8		\$ 6,513,009.3	
30/04/2026	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO DICIEMBRE 2025	125.00	\$ 86,504.8		\$ 10,813,096.5	
30/04/2026	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO ENERO 2026	93.80	\$ 108,415.4		\$ 10,169,361.2	
30/04/2026	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO FEBRERO 2026	216.50	\$ 108,415.4		\$ 23,471,926.3	
30/04/2026	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO MARZO 2026	175.00	\$ 108,415.4		\$ 18,972,688.7	
30/04/2026	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO ABRIL 2026	51.30	\$ 108,415.4		\$ 5,561,708.2	

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	75,502,590.00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0.00
TOTAL ACUMULADO	75,502,590.00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	75,502,590.00

Julian David Sanchez-Herrera
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047-GBD

Leonardo Fernandez Alarcon
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio Cesar Semia Osorio
Director de Obra
Mat. Profesional 17202-187977 CLD

Jorge Andres Giraldo Hernandez
Director de Interventoria
Mat. Profesional 17202-313215 CLD



GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal		
1/11/2025	sábado		Control de Transito		0	0	0.00
2/11/2025	domingo		Control de Transito		0	0	0.00
3/11/2025	lunes		Control de Transito		0	0	0.00
4/11/2025	martes		Control de Transito		2	2	2.00
5/11/2025	miércoles		Control de Transito		2	2	4.00
6/11/2025	jueves		Control de Transito		2	2	6.00
7/11/2025	viernes		Control de Transito		2	2	8.00
8/11/2025	sábado		Control de Transito		2.5	2.5	10.50
9/11/2025	domingo		Control de Transito			0	10.50
10/11/2025	lunes		Control de Transito		2	2	12.50
11/11/2025	martes		Control de Transito		3	3	15.50
12/11/2025	miércoles		Control de Transito		3	3	18.50
13/11/2025	jueves		Control de Transito		3	3	21.50
14/11/2025	viernes		Control de Transito		3	3	24.50
15/11/2025	sábado		Control de Transito		3.75	3.75	28.25
16/11/2025	domingo		Control de Transito			0	28.25
17/11/2025	lunes		Control de Transito			0	28.25
18/11/2025	martes		Control de Transito		3	3	31.25
19/11/2025	miércoles		Control de Transito		3	3	34.25
20/11/2025	jueves		Control de Transito		3	3	37.25
21/11/2025	viernes		Control de Transito		3	3	40.25
22/11/2025	sábado		Control de Transito		3.75	3.75	44.00



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535
CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533
INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal	Total	Acumul.
23/11/2025	domingo		Control de Transito			0	44.00
24/11/2025	lunes		Control de Transito		5	5	49.00
25/11/2025	martes		Control de Transito		5	5	54.00
26/11/2025	miércoles		Control de Transito		5	5	59.00
27/11/2025	jueves		Control de Transito		5	5	64.00
28/11/2025	viernes		Control de Transito		5	5	69.00
29/11/2025	sábado		Control de Transito		6.25	6.25	75.25
30/11/2025	domingo		Control de Transito			0	75.25
TOTAL						75.30	

JULIAN DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 17202-305047 CLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 051037-0507092 CLD




OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN


REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM PMT_2 UNIDAD DE MEDIDA Jornal DESCRIPCIÓN Jornales para manejo de tránsito

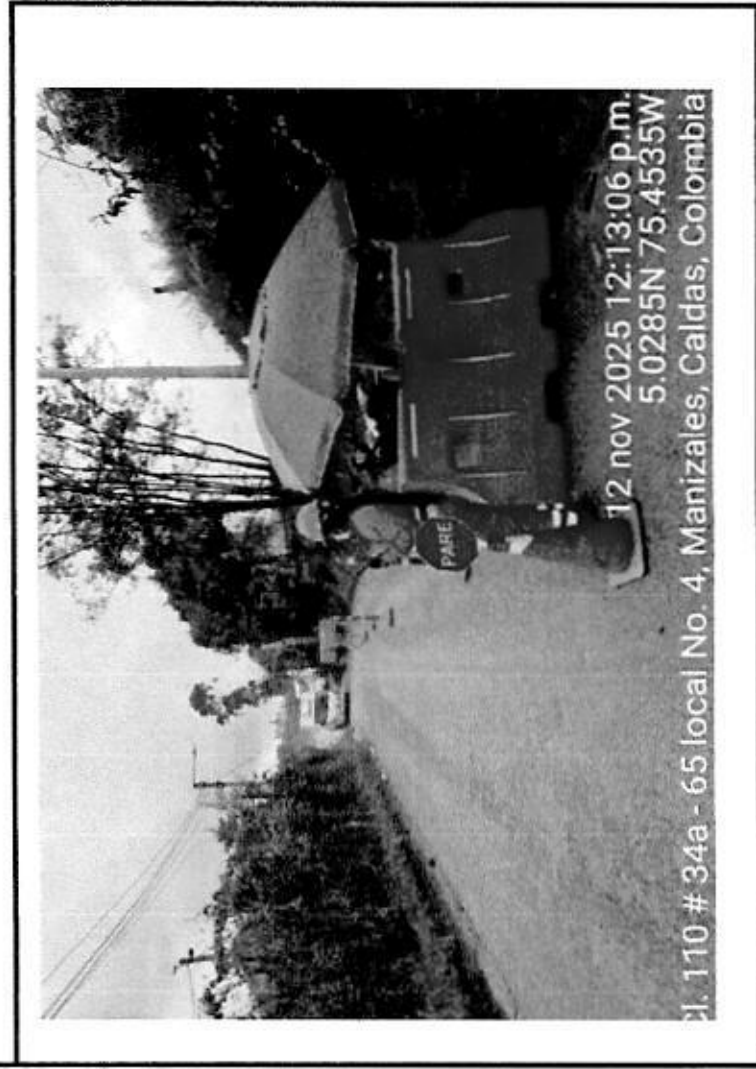

CONTROLADORAS DE TRANSITO

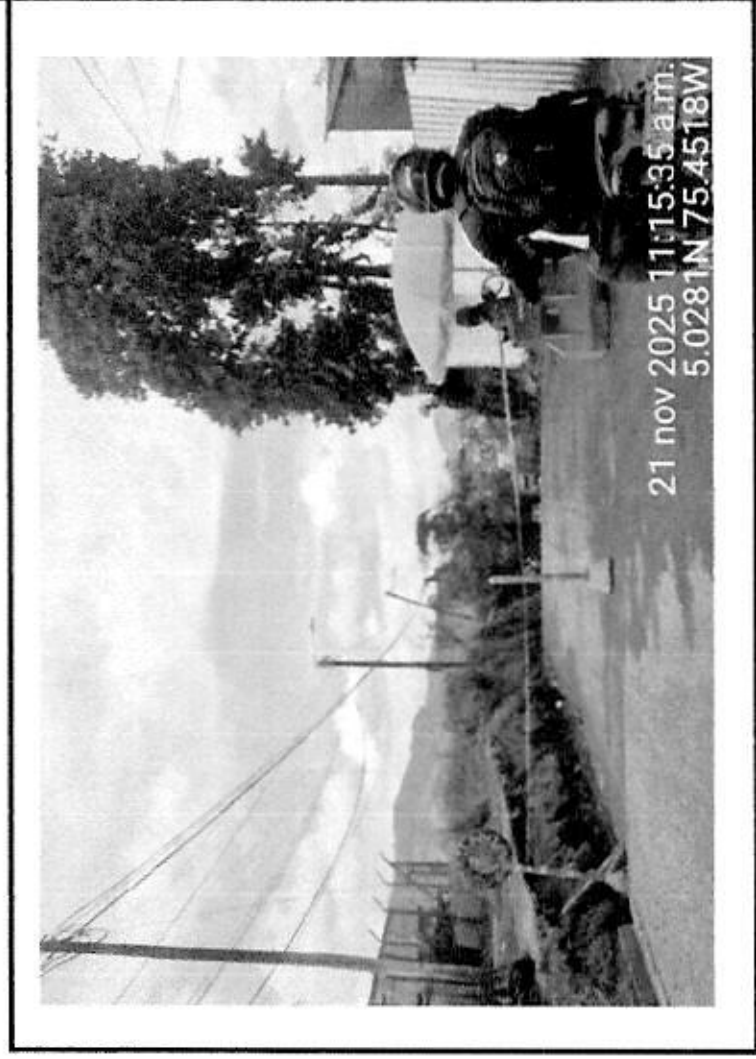

CONTROLADORAS DE TRANSITO




OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN
				Jornales para manejo de tránsito

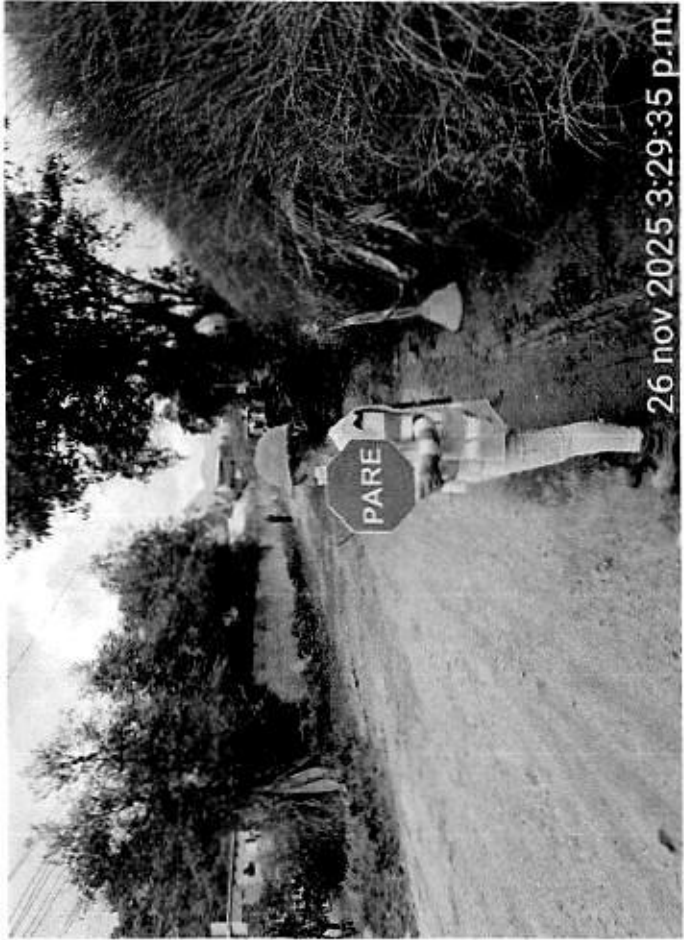

CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO



GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17092025-1533

CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal		
1/12/2025	lunes		Control de Transito		5	5	5.00
2/12/2025	martes		Control de Transito		5	5	10.00
3/12/2025	miércoles		Control de Transito		5	5	15.00
4/12/2025	jueves		Control de Transito		5	5	20.00
5/12/2025	viernes		Control de Transito		5	5	25.00
6/12/2025	sábado		Control de Transito		6.25	6.25	31.25
7/12/2025	domingo		Control de Transito			0	31.25
8/12/2025	lunes		Control de Transito			0	31.25
9/12/2025	martes		Control de Transito		5	5	36.25
10/12/2025	miércoles		Control de Transito		5	5	41.25
11/12/2025	jueves		Control de Transito		5	5	46.25
12/12/2025	viernes		Control de Transito		5	5	51.25
13/12/2025	sábado		Control de Transito		6.25	6.25	57.50
14/12/2025	domingo		Control de Transito			0	57.50
15/12/2025	lunes		Control de Transito		5	5	62.50
16/12/2025	martes		Control de Transito		5	5	67.50
17/12/2025	miércoles		Control de Transito		5	5	72.50
18/12/2025	jueves		Control de Transito		5	5	77.50
19/12/2025	viernes		Control de Transito		5	5	82.50
20/12/2025	sábado		Control de Transito		6.25	6.25	88.75
21/12/2025	domingo		Control de Transito			0	88.75
22/12/2025	lunes		Control de Transito		5	5	93.75



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

INTERVENTORÍA

ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de tránsito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal	Total	Acumul.
23/12/2025	martes		Control de Tránsito		5	5	98.75
24/12/2025	miércoles		Control de Tránsito		5	5	103.75
25/12/2025	Jueves		Control de Tránsito		0	0	103.75
26/12/2025	viernes		Control de Tránsito		5	5	108.75
27/12/2025	sábado		Control de Tránsito		6.25	6.25	115.00
28/12/2025	domingo		Control de Tránsito		0	0	115.00
29/12/2025	lunes		Control de Tránsito		5	5	120.00
30/12/2025	martes		Control de Tránsito		5	5	125.00
TOTAL						125.00	

JULIAN DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 T.P 17202-305047 CLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 T.P 051037-0507092 CLD



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17092025-1533 INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------





GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No

17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

17092025-1533

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------

CONTROLADORAS DE TRANSITO

CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal		
1/01/2026	jueves		Control de Transito		0	0	0.00
2/01/2026	viernes		Control de Transito		0	0	0.00
3/01/2026	sábado		Control de Transito		0	0	0.00
4/01/2026	domingo		Control de Transito		0	0	0.00
5/01/2026	lunes		Control de Transito		0	0	0.00
6/01/2026	martes		Control de Transito		0	0	0.00
7/01/2026	miércoles		Control de Transito		0	0	0.00
8/01/2026	jueves		Control de Transito		0	0	0.00
9/01/2026	viernes		Control de Transito		0	0	0.00
10/01/2026	sábado		Control de Transito		0	0	0.00
11/01/2026	domingo		Control de Transito		0	0	0.00
12/01/2026	lunes		Control de Transito		3.5	3.5	3.50
13/01/2026	martes		Control de Transito		3	3	6.50
14/01/2026	miércoles		Control de Transito		3	3	9.50
15/01/2026	jueves		Control de Transito		3	3	12.50
16/01/2026	viernes		Control de Transito		3	3	15.50
17/01/2026	sábado		Control de Transito		3.75	3.75	19.25
18/01/2026	domingo		Control de Transito			0	19.25
19/01/2026	lunes		Control de Transito		6	6	25.25
20/01/2026	martes		Control de Transito		6	6	31.25
21/01/2026	miércoles		Control de Transito		6	6	37.25
22/01/2026	jueves		Control de Transito		6	6	43.25



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito	Total	Acumuli.
23/01/2026	viernes		Control de Transito		6	6	49.25
24/01/2026	sábado		Control de Transito		7.5	7.5	56.75
25/01/2026	domingo		Control de Transito			0	56.75
26/01/2026	lunes		Control de Transito		6	6	62.75
27/01/2026	martes		Control de Transito		6	6	68.75
28/01/2026	miércoles		Control de Transito		6	6	74.75
29/01/2026	jueves		Control de Transito		9	9	83.75
30/01/2026	viernes		Control de Transito		10	10	93.75
TOTAL						93.80	

JULIAN DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 T.P 17202-305047 CLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 T.P 051037-0507092 CLD



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

INGENIERIA RYD SAS
ROBLE INGENIERIA SAS

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

17092025-1535
17092025-1533

CONTRATO DE OBRA No
CONTRATO DE INTERVENTORIA No

Jornales para manejo de transito


DESCRIPCIÓN

Jornal

UNIDAD DE MEDIDA

PMT_2

ÍTEM

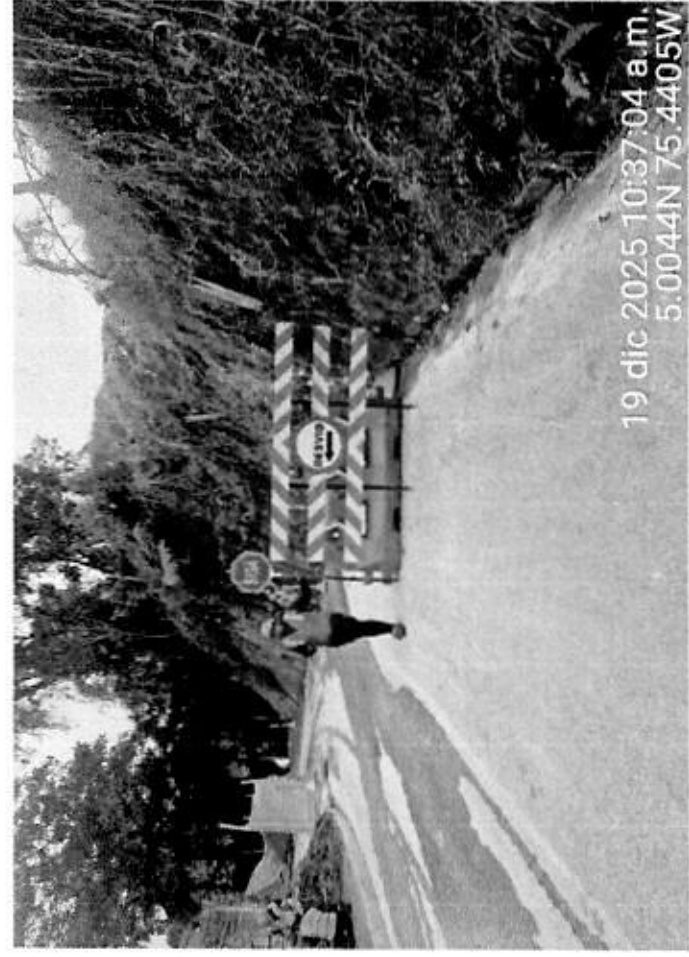



GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17092025-1533 INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM PMT_2 UNIDAD DE MEDIDA Jornal DESCRIPCIÓN Jornales para manejo de transito

CONTROLADORAS DE TRANSITO

CONTROLADORAS DE TRANSITO

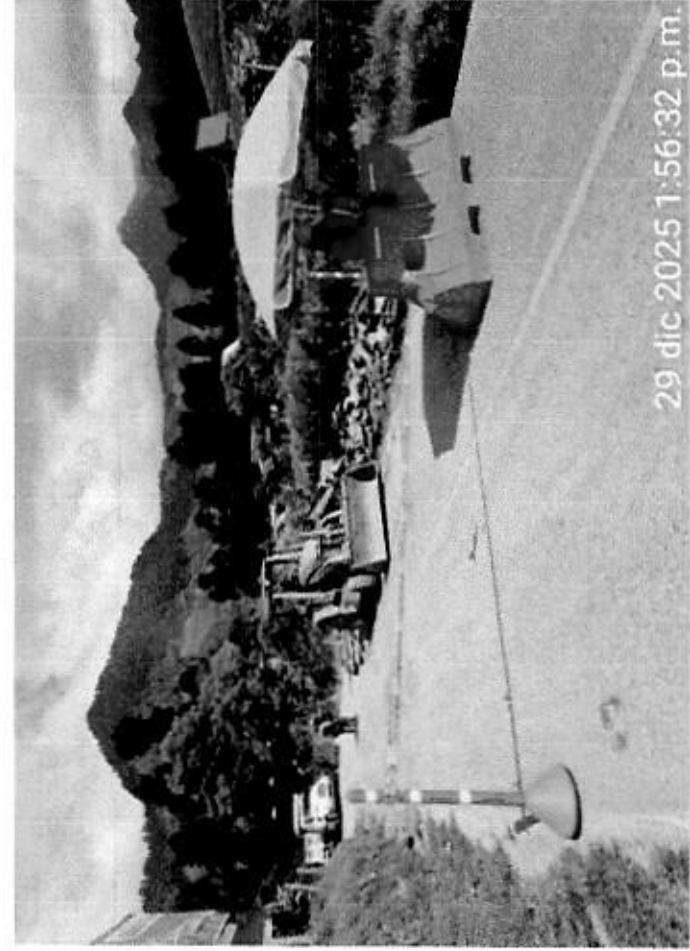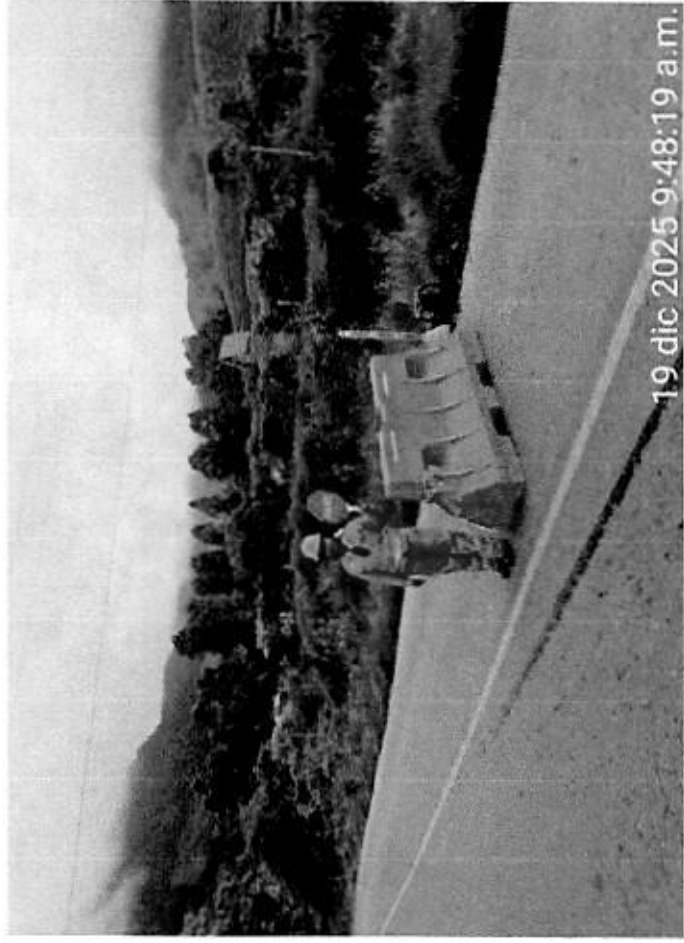

CONTROLADORAS DE TRANSITO

CONTROLADORAS DE TRANSITO



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal		
1/02/2026	domingo		Control de Transito			0	0.00
2/02/2026	lunes		Control de Transito		9	9	9.00
3/02/2026	martes		Control de Transito		9	9	18.00
4/02/2026	miércoles		Control de Transito		9	9	27.00
5/02/2026	jueves		Control de Transito		9	9	36.00
6/02/2026	viernes		Control de Transito		9	9	45.00
7/02/2026	sábado		Control de Transito		11.25	11.25	56.25
8/02/2026	domingo		Control de Transito			0	56.25
9/02/2026	lunes		Control de Transito		9	9	65.25
10/02/2026	martes		Control de Transito		9	9	74.25
11/02/2026	miércoles		Control de Transito		9	9	83.25
12/02/2026	jueves		Control de Transito		9	9	92.25
13/02/2026	viernes		Control de Transito		9	9	101.25
14/02/2026	sábado		Control de Transito		11.25	11.25	112.50
15/02/2026	domingo		Control de Transito			0	112.50
16/02/2026	lunes		Control de Transito		9	9	121.50
17/02/2026	martes		Control de Transito		9	9	130.50
18/02/2026	miércoles		Control de Transito		9	9	139.50
19/02/2026	jueves		Control de Transito		9	9	148.50
20/02/2026	viernes		Control de Transito		8	8	156.50
21/02/2026	sábado		Control de Transito		10	10	166.50
22/02/2026	domingo		Control de Transito			0	166.50



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535

CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de tránsito	Jornal	Total	Acumuli.	
Fecha	Día		Descripción	Observaciones					
23/02/2026	lunes		Control de Tránsito			8	8	174.50	
24/02/2026	martes		Control de Tránsito			8	8	182.50	
25/02/2026	miércoles		Control de Tránsito			8	8	190.50	
26/02/2026	jueves		Control de Tránsito			8	8	198.50	
27/02/2026	viernes		Control de Tránsito			8	8	206.50	
28/02/2026	sábado		Control de Tránsito			10	10	216.50	
TOTAL							216.50		

JULIAN DAVID-SANCHEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 T.P 17202-305047 GLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 T.P 051037-0507092 GLD



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

INGENIERIA RYD SAS
ROBLE INGENIERIA SAS

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

17092025-1535
17092025-1533

CONTRATO DE OBRA No
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

Jornales para manejo de tránsito



DESCRIPCIÓN

Jornal

UNIDAD DE MEDIDA

PMT_2

ÍTEM

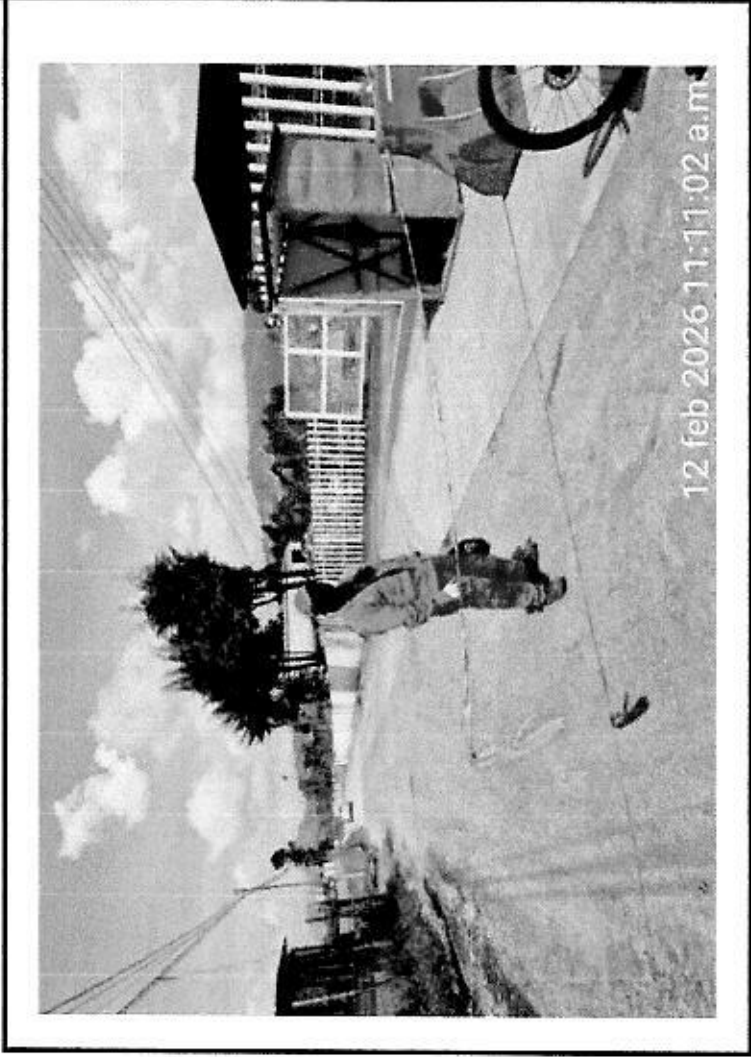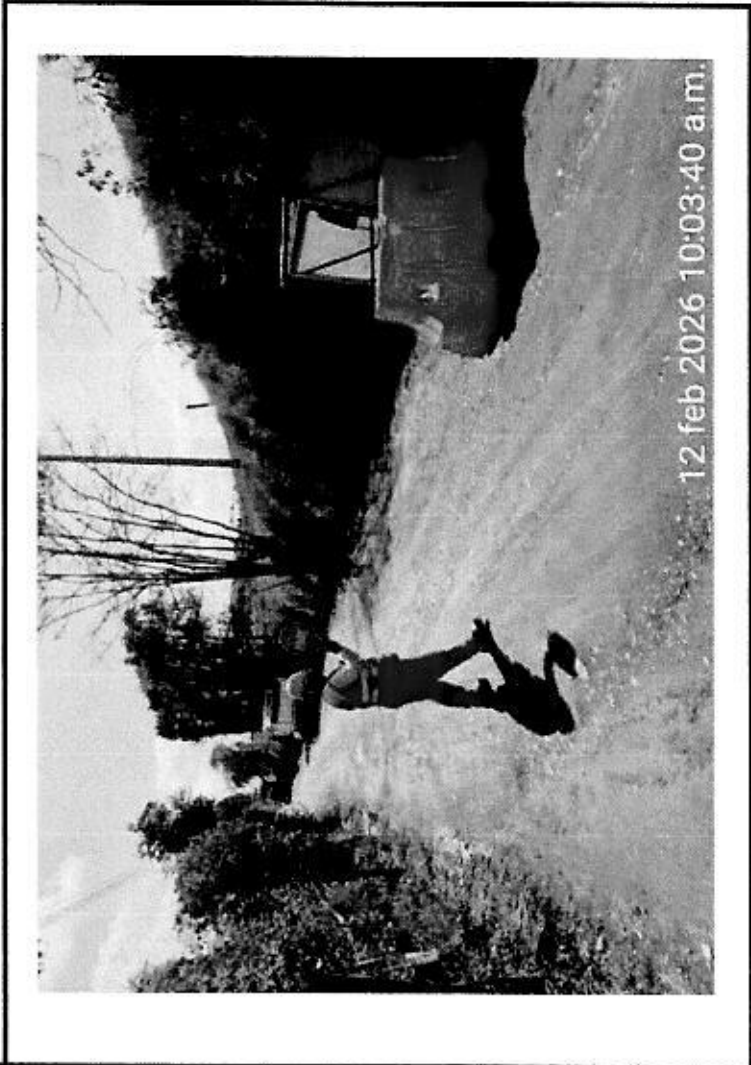



GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No

17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

17092025-1533

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA SAS


ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------

CONTROLADORAS DE TRANSITO

CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO

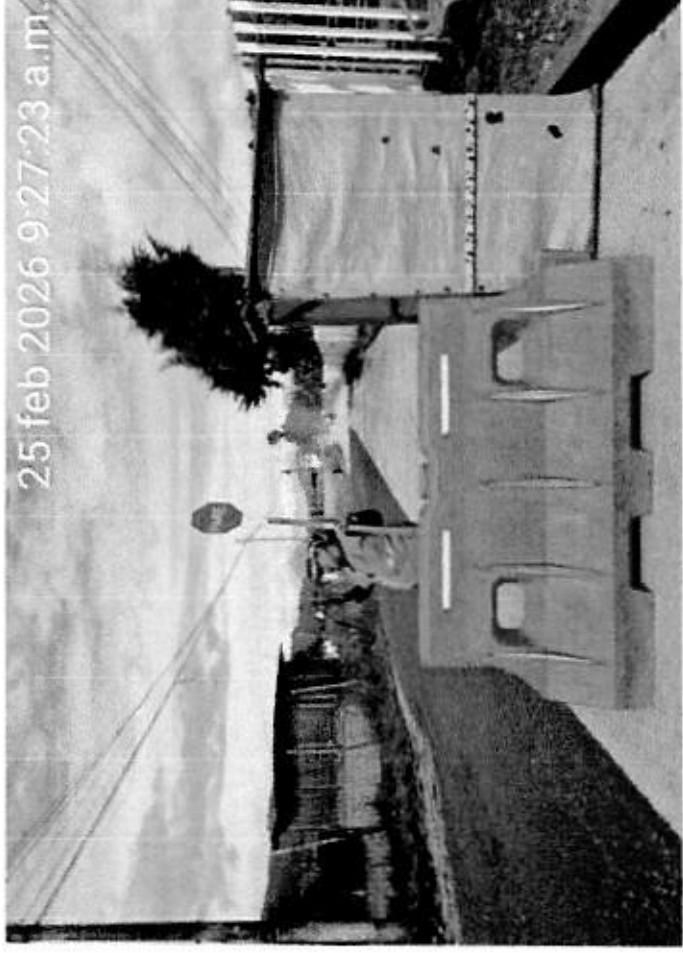

CONTROLADORAS DE TRANSITO



GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de tránsito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal		
1/03/2026	domingo		Control de Tránsito			0	0.00
2/03/2026	lunes		Control de Tránsito		8	8	8.00
3/03/2026	martes		Control de Tránsito		8	8	16.00
4/03/2026	miércoles		Control de Tránsito		8	8	24.00
5/03/2026	jueves		Control de Tránsito		8	8	32.00
6/03/2026	viernes		Control de Tránsito		8	8	40.00
7/03/2026	sábado		Control de Tránsito		10	10	50.00
8/03/2026	domingo		Control de Tránsito			0	50.00
9/03/2026	lunes		Control de Tránsito		8	8	58.00
10/03/2026	martes		Control de Tránsito		8	8	66.00
11/03/2026	miércoles		Control de Tránsito		8	8	74.00
12/03/2026	jueves		Control de Tránsito		8	8	82.00
13/03/2026	viernes		Control de Tránsito		8	8	90.00
14/03/2026	sábado		Control de Tránsito		10	10	100.00
15/03/2026	domingo		Control de Tránsito			0	100.00
16/03/2026	lunes		Control de Tránsito		6	6	106.00
17/03/2026	martes		Control de Tránsito		6	6	112.00
18/03/2026	miércoles		Control de Tránsito		6	6	118.00
19/03/2026	jueves		Control de Tránsito		6	6	124.00
20/03/2026	viernes		Control de Tránsito		6	6	130.00
21/03/2026	sábado		Control de Tránsito		7.5	7.5	137.50
22/03/2026	domingo		Control de Tránsito			0	137.50



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de tránsito	Total	Acumuli.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal	Total	Acumuli.
23/03/2026	lunes		Control de Tránsito			0	137.50
24/03/2026	martes		Control de Tránsito		6	6	143.50
25/03/2026	miércoles		Control de Tránsito		6	6	149.50
26/03/2026	jueves		Control de Tránsito		6	6	155.50
27/03/2026	viernes		Control de Tránsito		6	6	161.50
28/03/2026	sábado		Control de Tránsito		7.5	7.5	169.00
29/03/2026	domingo		Control de Tránsito			0	169.00
30/03/2026	lunes		Control de Tránsito		6	6	175.00
TOTAL						175.00	

JULIAN DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 T.P 17202-305047 CLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 T.P 051037-0507092 CLD



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

INGENIERIA RYD SAS

CONTRATISTA

17092025-1535

CONTRATO DE OBRA No



ROBLE INGENIERIA SAS

INTERVENTORÍA

17092025-1533

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------

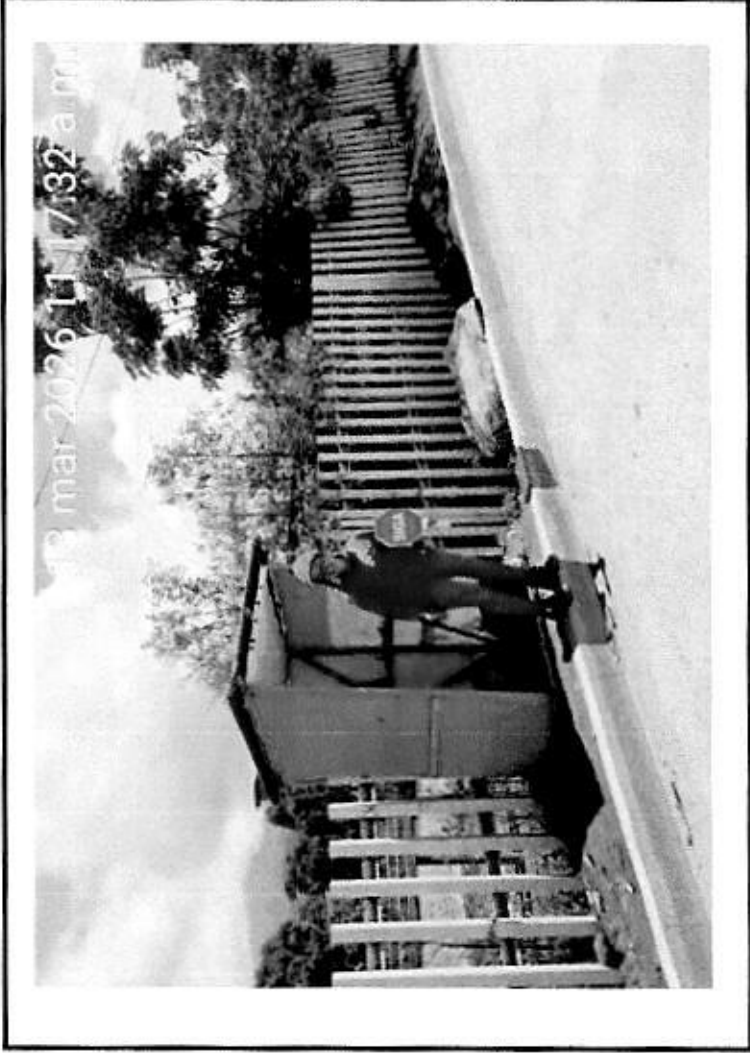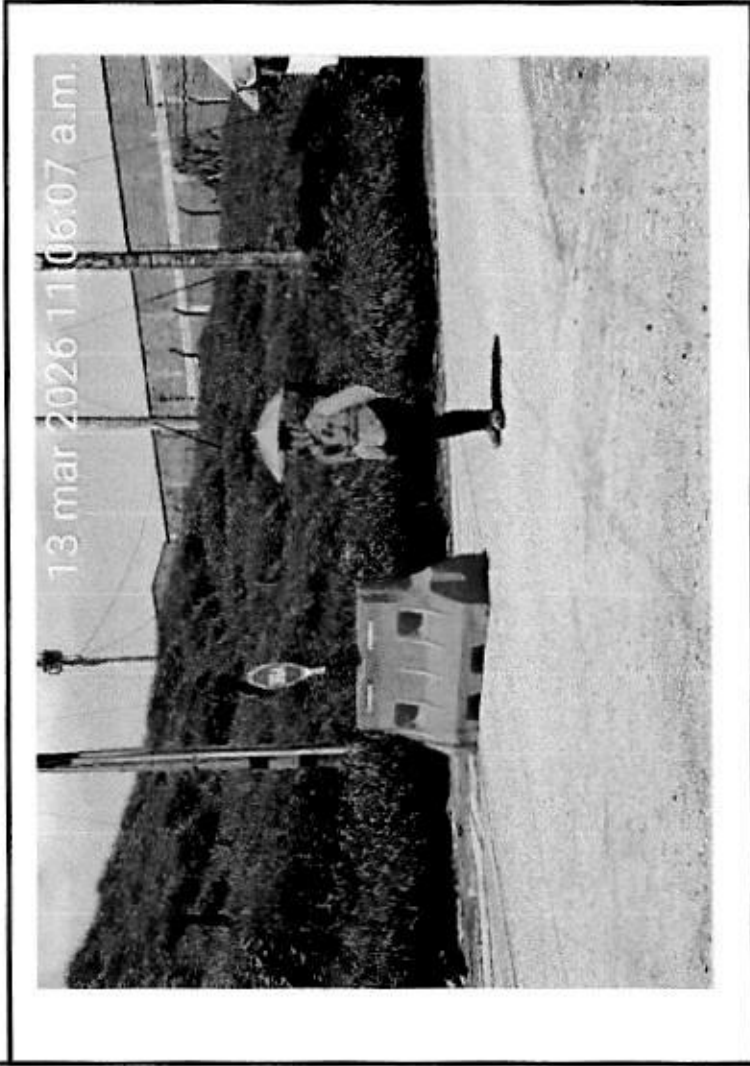



GOBIERNO DE CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN


REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS


ÍTEM PMT_2 UNIDAD DE MEDIDA Jornal DESCRIPCIÓN Jornales para manejo de transito

CONTROLADORAS DE TRANSITO

CONTROLADORAS DE TRANSITO

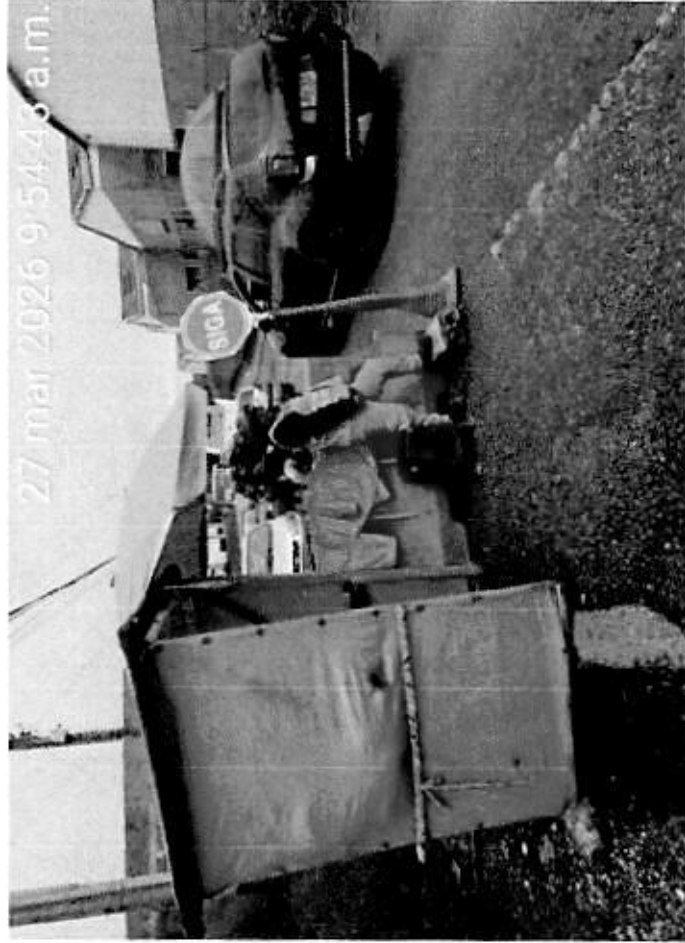

CONTROLADORAS DE TRANSITO

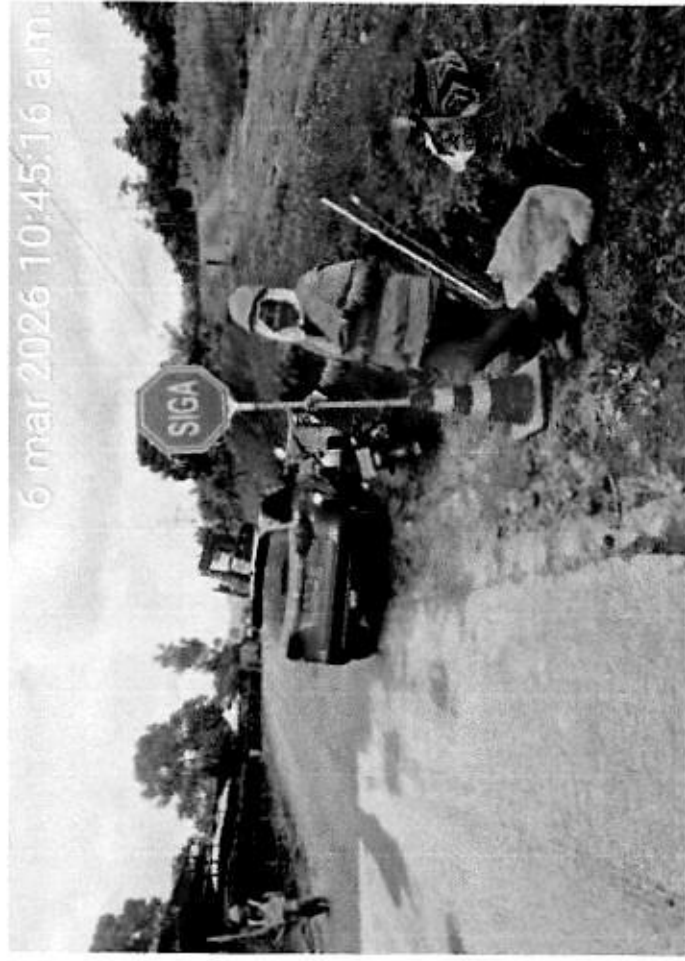

CONTROLADORAS DE TRANSITO



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 5 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito	Total	Acumul.
Fecha	Día		Descripción	Observaciones			
1/04/2026	miércoles		Control de Transito		5	5	5.00
2/04/2026	jueves		Control de Transito		0	0	5.00
3/04/2026	viernes		Control de Transito		0	0	5.00
4/04/2026	sábado		Control de Transito		0	0	5.00
5/04/2026	domingo		Control de Transito		0	0	5.00
6/04/2026	lunes		Control de Transito		5	5	10.00
7/04/2026	martes		Control de Transito		5	5	15.00
8/04/2026	miércoles		Control de Transito		5	5	20.00
9/04/2026	jueves		Control de Transito		5	5	25.00
10/04/2026	viernes		Control de Transito		5	5	30.00
11/04/2026	sábado		Control de Transito		6.25	6.25	36.25
12/04/2026	domingo		Control de Transito			0	36.25
13/04/2026	lunes		Control de Transito		5	5	41.25
14/04/2026	martes		Control de Transito		5	5	46.25
15/04/2026	miércoles		Control de Transito		5	5	51.25
TOTAL						51.30	

JULIAN DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 17202-305047 CLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P 051037-0507092 CLD

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

INGENIERIA RYD SAS

17092025-1535 CONTRATISTA

ROBLE INGENIERIA SAS

17092025-1533 INTERVENTORÍA

Jornales para manejo de tránsito

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN
				Jornales para manejo de tránsito





GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 5

CONTRATO DE OBRA No

17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

17092025-1533


INTERVENTORÍA

ROBLE INGENIERIA SAS


ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------

CONTROLADORAS DE TRANSITO

CONTROLADORAS DE TRANSITO

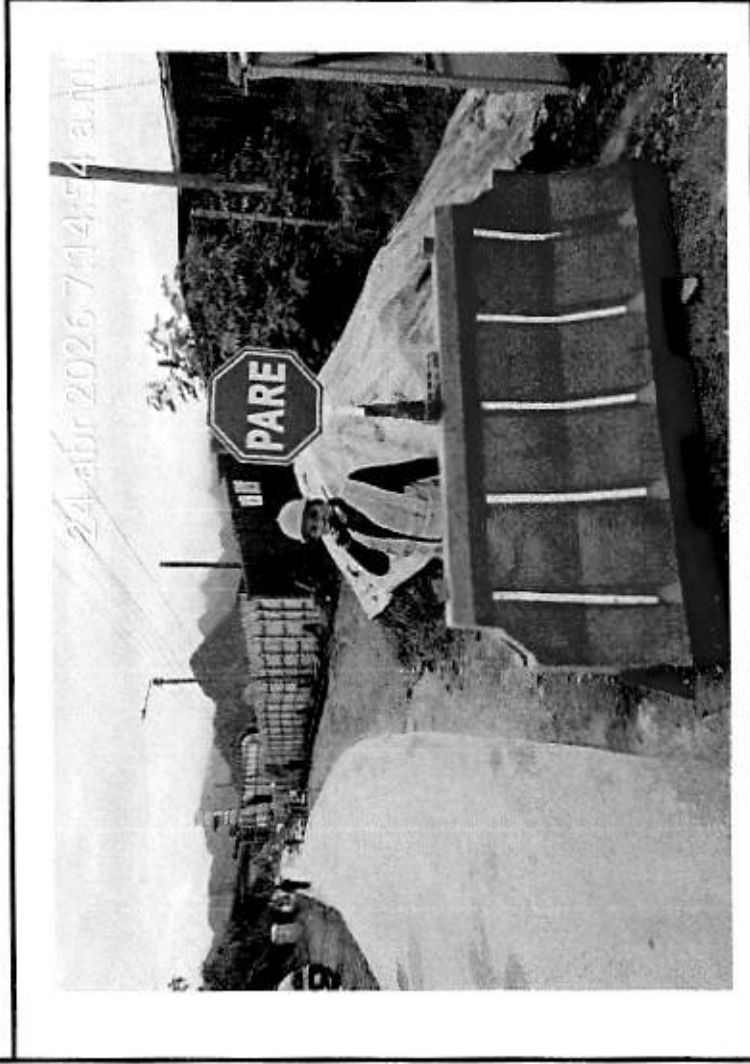

CONTROLADORAS DE TRANSITO

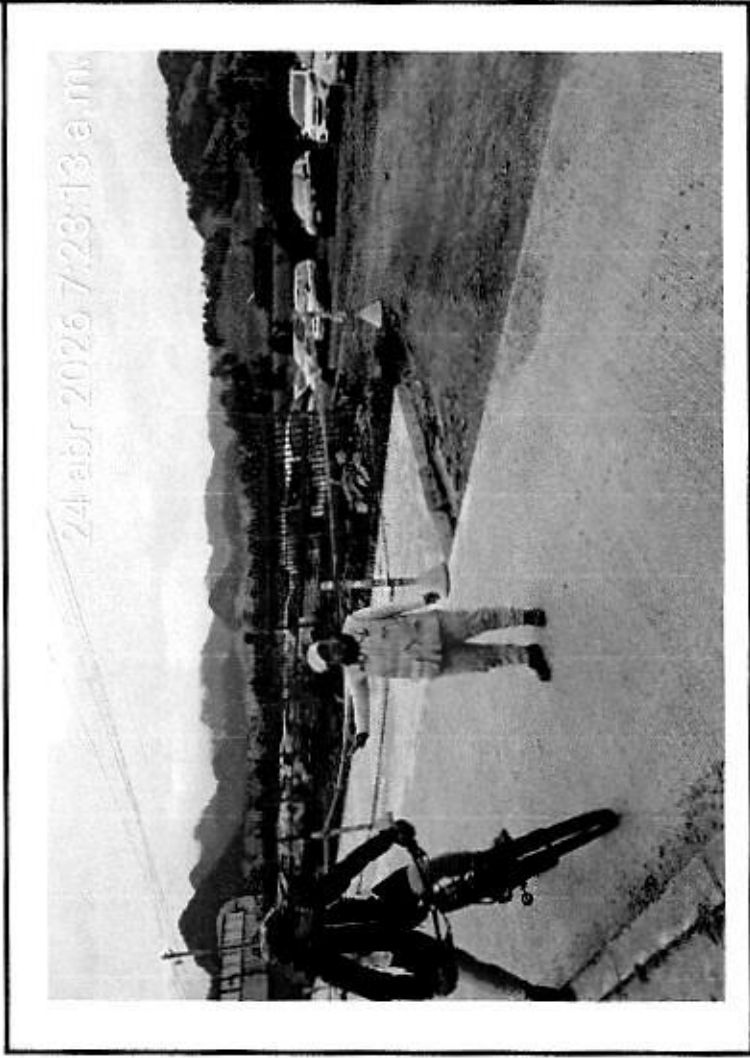

CONTROLADORAS DE TRANSITO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 05 PARCIAL**

CONTRATO	17092025-1535	RADICADO JURID. NRO:		17092025-1535	
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA RYD SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S A S				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			MODIFICATORIO 01	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U. (34%)	\$ 3,090,518,083.0	PORCENTAJE A.U. %	34	MODIFICATORIO 02	DOS (2) MESES
VALOR TOTAL	\$ 3,907,518,084.0				
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL					
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	DIFER. %	OBRA EJECUTADA
					CANT. VALOR PESO %
DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	0.30	\$ 1,451,575.50	0.05%	-0.05%	0.00 0.00 0.00%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	5.00	\$ 1,017,235.00	0.03%	0.29%	47.50 9,663,732.00 0.32%
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	140.00	\$ 3,659,740.00	0.12%	3.48%	4,154.10 108,592,328.00 3.60%
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)	1726.00	\$ 353,074,012.00	11.42%	-6.10%	784.70 160,519,802.00 5.32%
BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradación BG 40, clase A)	1360.00	\$ 313,110,010.00	10.13%	-10.13%	0.00 0.00 0.00%
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-67	5558.00	\$ 35,628,780.00	1.15%	-0.81%	1,615.00 10,352,150.00 0.34%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	445.00	\$ 661,525,875.00	21.41%	-15.03%	129.20 192,065,490.00 6.37%
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DIAS	504.00	\$ 739,273,752.00	23.92%	-15.94%	164.04 240,616,005.00 7.68%
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	560.00	\$ 16,234,400.00	0.53%	0.23%	782.00 22,670,180.00 0.75%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	400.00	\$ 16,137,200.00	0.59%	0.77%	699.10 40,767,892.00 1.35%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SGB-39 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	24.00	\$ 4,003,104.00	0.13%	0.15%	50.60 8,439,878.00 0.28%
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	123.00	\$ 105,487,014.00	3.41%	-3.41%	0.00 0.00 0.00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	556.00	\$ 83,571,930.00	2.70%	-2.70%	0.00 0.00 0.00%
(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	21.00	\$ 35,569,132.00	1.15%	4.22%	95.70 182,048,044.00 5.37%
(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	54.00	\$ 68,409,576.00	2.21%	-1.67%	13.00 16,468,972.00 0.55%
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 m	48.00	\$ 127,270,560.00	4.12%	-4.12%	0.00 0.00 0.00%
ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	17353.00	\$ 131,969,565.00	4.27%	2.77%	27,913.90 212,285,211.00 7.04%
ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	3979.00	\$ 29,492,190.00	0.95%	-0.95%	0.00 0.00 0.00%
Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	434.00	\$ 91,141,302.00	2.95%	-1.83%	160.50 33,705,481.00 1.12%
(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	10.00	\$ 12,668,440.00	0.41%	-0.41%	0.00 0.00 0.00%
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	150.00	\$ 40,118,900.00	1.30%	-0.37%	105.00 28,061,830.00 0.93%
Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diametro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenosos. Incluye transporte del material excavado	63.00	\$ 10,567,557.00	0.34%	-0.19%	27.00 4,528,953.00 0.15%
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	63.00	\$ 10,348,191.00	0.33%	-0.16%	27.00 4,434,939.00 0.15%
ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2.54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	540.00	\$ 113,044,140.00	3.66%	-1.85%	246.50 51,602,557.00 1.71%
EXCAVACIONES MANUALES	50.00	\$ 4,057,150.00	0.13%	0.15%	117.50 9,534,304.00 0.32%
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Analizado para volquete de 6 m3)	140.00	\$ 218,120.00	0.01%	0.32%	6,244.00 9,728,152.00 0.32%
ITEM NO PREVISTOS					
BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	0.00	\$ 0.00	0.00%	1.53%	519.80 46,203,483.00 1.53%
BARANDA METALICA VEHICULAR	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00 0.00 0.00%
SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase B)	0.00	\$ 0.00	0.00%	3.96%	551.10 110,467,995.00 3.65%

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION C5 PARCIAL**

CONTRATO	17092025-1535	RADICADO JURID. NRO:	17092025-1535
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA RYD SAS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	ROBLE INGENIERIA S.A.S		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO	MODIFICATORIO 01	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U. (34%)	\$ 3.090.518.083.0	PORCENTAJE AU %	34
VALOR TOTAL	\$ 3.907.518.084.0	MODIFICATORIO 02	DOS (2) MESES

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				OBRA EJECUTADA			
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	DIFER. %	CANT.	VALOR	PESO %
BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para NT2, tipo de gradación 9G 36 clase B.)	0.00	\$ 0.00	0.00%	3.08%	420.80	92,215,374.00	3.08%
TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	0.00	\$ 0.00	0.00%	2.08%	24.00	62,725,464.00	2.08%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	0.00	\$ 0.00	0.00%	1.90%	37.20	57,158,618.00	1.90%
CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	0.00	\$ 0.00	0.00%	1.56%	22.30	46,898,662.00	1.56%
EXCAVACION COMUN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE Ø A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.57%	21.00	17,220,693.00	0.57%
EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE Ø A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	0.00	\$ 0.00	0.00%	1.24%	30.70	37,351,892.00	1.24%
EXCAVACION COMUN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE Ø A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.07%	2.00	2,077,158.00	0.07%
EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE Ø A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	0.00	\$ 0.00	0.00%	1.57%	28.50	47,477,210.00	1.57%
PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGIA TREMIE - DIAMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGUN DISEÑO; NO INCLUYE LA EXCAVACION MANUAL	0.00	\$ 0.00	0.00%	8.28%	75.10	249,714,334.00	8.28%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.80 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCION ANTI RUIDO PARA TRAFICO	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.12%	1.00	3,715,237.00	0.12%
TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIAMETRO 315 mm	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.11%	12.90	3,315,158.00	0.11%
EXCAVACION DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICION DE ASFALTO	0.00	\$ 0.00	0.00%	2.73%	740.70	82,419,911.00	2.73%
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.55%	84.30	16,700,252.00	0.55%
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión gram mínima de 720 n.)	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.30%	501.60	5,188,283.00	0.30%
TUBERIA DE PVC 4"	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.13%	159.20	3,856,172.00	0.13%
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	0.00	\$ 0.00	0.00%	32.48%	527.80	979,255,313.00	32.48%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	0.00	\$ 0.00	0.00%	2.78%	600.20	83,815,530.00	2.78%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	0.00	\$ 0.00	0.00%	0.23%	212.00	6,926,464.00	0.23%
VALOR COSTO DIRECTO		\$ 3,014,981,070.50				\$ 3,308,636,537.00	107.06%
VALOR PGIO (Incluye PMT - PAGA) (INMODIFICABLE)		\$ 75,537,013.00				\$ 90,403,090.00	2.93%
VALOR TOTAL		\$ 3,090,518,083.50				\$ 3,399,039,627.00	109.98%

INFORMACION DE CONTRATO

CONTRATISTA	INGENIERIA RYD SAS
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.014.981.070.50
VALOR ADICIONAL	\$ 617.000.001
VALOR TOTAL	\$ 3.631.981.071.50
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO
FECHA INICIACION	SEPTIEMBRE 30 DE 2025
FECHA TERMINACION	MAYO 30 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ES EJECUTADA POR ROBLE INGENIERIA S.A.S. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DE LA ING. MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES, EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, EXCAVACION MECANICA DE PILOTES, TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACION, ADEMAS DE ITEM NO PREVISTOS COMO: TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm, BORDILLO EN CONCRETO, SUB-BASE GRANULAR CLASE B, CONCRETO RESISTENCIA 21MPa, MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO, TUBERIA DE PVC 4", PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS, RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, EXCAVACION COMUN DE CAISSON, EXCAVACION EN ROCA DE CAISSON, EXCAVACION COMUN DE CAISSONS BAJO AGUA, EXCAVACION EN ROCA EN CAISSONS BAJO AGUA Y PILOTES EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU, CON UNA INVERSION DE \$ 3.399.039.627,00 EQUIVALENTE AL 109.98% DE EJECUCION DEL CONTRATO INCLUIDA UN AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%);

ROBLE INGENIERIA S.A.S
Interventor Externo



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA

jueves, 30 de abril de 2026

ACTA NRO. 05 PARCIAL INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISION

CONTRATO 17092025-1535 CONSULTORIA OBRA:

Nro. CONTRATO RADICADO: 17092025-1535

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN


CONTRATISTA: INGENIERIA RYD SAS

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora	X			
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.	X			
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas	X			
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X			
Cambio de aceites se realiza en la obra		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega folletos informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:


ROBLE INGENIERIA S.A.S
Interventor Externo
