



ROBLE
INGENIERÍA

INFORMES SEMANALES



ACTA INFORME SEMANAL



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Informe semanal N°: 22 Semana de contrato N° 22 Del: 1-mar-26 Al: 7-mar-26
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 158 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 17002025-1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARRIÓLITO EN EL MUNICIPIO DE YELAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 7 de marzo de 2026		
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	5,48%	36,64%
Valor	\$ 109.397.432	\$ 1.126.256.795

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 7 de marzo de 2026		
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	6,28%	58,83%
Valor	\$ 193.323.659	\$ 1.812.036.847

CONTRATO DE OBRA

Contratista: **INGENIERIA RYD S.A.S**
Representante Legal: **YENNY ALEXANDER VELASCO ANGARITA**
Contrato No.: **17002025-1533**
Valor inicial (Estudios y Diseños):
Valor de Obras: \$ **3.090.518.083,50**
Valor de Ajustes:
Valor Gastos Manejo Ambiental:
Valor Total Actualizado: \$ **3.090.518.083,50**
Valor Anticipo: \$ **610.103.616,70**
Plazo inicial: **Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio**
Plazo Actualizado: **Hasta el 31 de marzo de 2026**
Fecha de Inicio: **30 de septiembre de 2025**
Fecha de Terminación: **31 de diciembre de 2025**
Fecha de Suspensión:
Fecha de Reintegración:
Nueva fecha de terminación: **31 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: **ROBLE INGENIERIA S.A.S.**
Representante Legal: **GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO**
Contrato No.: **17002025-1533**
Valor Total Inicial: (Con IVA) \$ **337.767.808,00**
Valor Total Actualizado:
Valor Anticipo:
Plazo Inicial: **Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio.**
Fecha de Inicio: **30 de septiembre de 2025**
Fecha de Terminación: **31 de diciembre de 2025**
Fecha de Suspensión:
Fecha de Reintegración:
Nueva fecha de finalización: **31 de marzo de 2026**
Plazo actualizado: **Hasta el 31 de marzo de 2026**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DOMINGO (1):	- No se generan labores.
LUNES (2):	- Sector Temilum: Compactación de subbase. - Sector Termaltes: Mejoramiento de estructura para pavimento flexible. - Sector Pontón: Vaciado de concreto premezclado de 4000 psi en pantalla de los caissons 5, 6, 7 y 8/ Figurado e instalación de acero para pantalla de los caissons 1, 2, 3 y 4 / Toma de muestras de concreto. - Sector Pantalla: Se continúa con las actividades para anclajes (perforación e inyección).
MARTES (3):	- Sector Temilum: Instalación y compactación de subbase. / Vaciado de bordillo. / Durante horas de la tarde se presentaron precipitaciones de alta intensidad que afectaron la subbase, la cual ya cumplía con las condiciones de compactación requeridas para proceder con la actividad de vaciado. Esta situación generó afectaciones en el punto intervenido, haciendo necesario realizar reprocesos para restablecer las condiciones técnicas del material. - Sector Termaltes: Mejoramiento de estructura para pavimento flexible. - Sector Pontón: Figurado e instalación de acero para pantalla de los caissons 1, 2, 3 y 4. - Sector Pantalla: Se continúa con las actividades para anclajes (perforación e inyección).
MIÉRCOLES (4):	- Sector Temilum: Instalación y compactación de subbase. / Toma de muestras de densidad y humedad. / Instalación de acero en losas reforzadas. - Sector Termaltes: Mejoramiento de estructura para pavimento flexible. - Sector Pontón: Figurado e instalación de acero para pantalla de los caissons 1, 2, 3 y 4. - Sector Pantalla: Se continúa con las actividades para anclajes (perforación e inyección).
JUEVES (5):	- Sector Temilum: Instalación y compactación de subbase. / Vaciado de concreto MR 45 premezclado. / Toma de muestras de concreto (viguetas) / instalación de formaleta. - Sector Termaltes: Mejoramiento de estructura para pavimento flexible. / Durante la ejecución de las actividades se presentó daño en una tubería de gas que se encontraba expuesta en el área de intervención. De manera inmediata se procedió a desviar el tráfico con el fin de prevenir posibles accidentes, se controló la fuga presentada y se realizó el reporte a la empresa encargada para la atención y verificación correspondiente. - Sector Pontón: Vaciado de concreto 4000 psi en pantalla de los caissons 1, 2, 3 y 4. - Sector Pantalla: Se continúa con las actividades para anclajes (perforación e inyección).
VIERNES (6):	- Sector Temilum: Instalación y compactación de subbase. / Instalación de formaleta. / Instalación de acero de refuerzo y formaleta para bordillo. / Vaciado de concreto MR 45 premezclado en horas de la noche teniendo en cuenta la disponibilidad de Argos. - Sector Termaltes: Mejoramiento de estructura para pavimento flexible. / Se realizan apiques para localizar y señalar tubería de gas. - Sector Pontón: Figurado e instalación de acero para pantalla de los caissons 1, 2, 3 y 4. - Sector Pantalla: Se continúa con las actividades para anclajes (perforación e inyección).
SÁBADO (7):	- Sector Pontón: Se da inicio a las actividades de excavación de los caissons correspondientes a la obra complementaria; sin embargo, se evidenció que no se contaba con la aprobación de la documentación mínima legal requerida para el ingreso del personal subcontratado. En razón a lo anterior, se solicitó la suspensión inmediata de las actividades hasta tanto se subsane y apruebe la documentación correspondiente.

ACTIVIDADES PARA LA PRÓXIMA SEMANA

- Sector Temilum: Vaciado de concreto MR 45 y construcción de bordillo.
- Sector Termaltes: Instalación y compactación de subbase granular.
- Sector Pantalla: Perforación y llenado para anclajes pasivos y drenes horizontales.
- Sector Pontón: Excavación de Caisson para obra complementaria salida del pontón, excavaciones adicionales para culminación de pantallas laterales.

OBSERVACIONES

INTERVENTORIA


Firma Residente de Interventoría
Ingeniero Leonardo Fernández Alarcón

	ROBLE	CÓDIGO: 1414-F-47	VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	26/09/2020	PÁGINA:
OBJETO CONTRATO:			CONTRATO N° 17090025 - 1533			
Servicio Número:	22	Dat:	1-mar-2020	Al:	7-may-2020	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	158	días				
Contratista de interventoría:	ROBLE INGENIERIA S.A.S.					
Representante legal:	GLADYS STELLA PINEDA AGUILOE					
Contrato No:	17090025-1533					
Duración del contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2020 a partir de la suscripción del acta de inicio.	Del	30 de septiembre de 2020	Hasta	31 de diciembre de 2020	
Fórmula:	3 meses	Fecha terminación:	Hasta el 31 de marzo de 2020			
Acción:	N/A					
Coordinador de Zona:	Juan David Duque					

PROGRAMADO		SEMANAL	ACUMULADO
Inversión programada (%)	3.63%		64.82%
Inversión del contrato :	\$ 12,901,070		\$ 263,803,530
Costo de personal	\$ 9,750,240		\$ 214,372,275
Primas de socialización	\$ 1,123,894		\$ 24,723,670
Costos Directos Fijos	\$ 569,227		\$ 12,505,192
Gastos Remunerativos	\$ 1,544,154		\$ 33,971,385
Valor del contrato			\$ 337,397,606.09

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA,
ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANEJO EN EL MUNICIPIO DE VILAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HEDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Acumpleminto y participación en reuniones de coordinación y recibiendo planeación por la unidad contratante y por el contratista.
Elaboración de Informe mensual y trimestral
Turno de trabajo en campo (domingo y viernes) - Turno (V)
Trámites administrativos, solicitud adicional y transporte.
Verificación en campo de la ejecución de las obras, revisión por el cumplimiento de los normas técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Corte de pendientes, acondicionamiento y refortificación en áreas de abstracción de precipitación para evitar.
Revisión al terreno actual
Señalar con la empresa Tercero para distribución de aspectos de seguridad civil
Revisión de proyecto actualizado sobre obra complementaria en proceso
Brindar de informe mensual

PERSONAL DE INTERVENCIÓN		RELACION SEMANAL DE PERSONAL													DEDICACIÓN	
L	M	N	J	V	S	D	L	M	N	J	V	S	D			
X							X	X	X	X	X	X	X		20%	
							X	X	X	X	X	X	X		100%	
							X	X	X	X	X	X	X		100%	
							X	X	X	X	X	X	X		50%	
							X	X	X	X	X	X	X		50%	
							X	X	X	X	X	X	X		100%	
							X	X	X	X	X	X	X		50%	
							X	X	X	X	X	X	X		50%	
							X	X	X	X	X	X	X		100%	
							X	X	X	X	X	X	X		50%	
							X	X	X	X	X	X	X		50%	

Firma Presidente de Interventoría:
Interveniente: Eusebio Ramírez Alarcón

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Para este semestre se otorga el porcentaje inicial según su cumplimiento un aporte semanal de \$ 48%, lo que se traduce en un acumulado del 35.48%. En relación a la adjudicación para la semana se tiene una ejecución del 6.2% para un monto acumulado del 58.03%. No presenta retrasos.

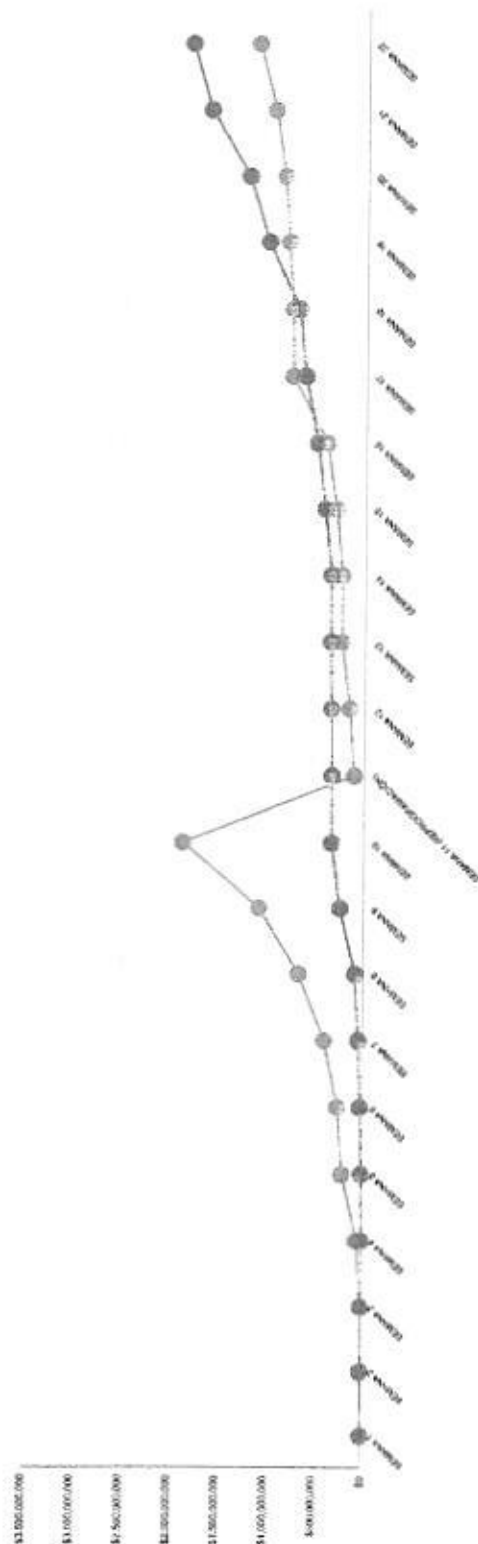
[illegible]

1

GRÁFICA SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

AVANCE GENERAL DE LA OBRA





ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07

VERSION: 01

FECHA DE VERSION:

26/09/2020

PAGINA:

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA	CLIMA	ESTADO DEL TIEMPO	INICIO	FIN	PRECIPITACIÓN (mm).	OBSERVACIONES
1 de marzo de 2026	Templado	Lluvia ligera	7:00:00 a. m.	5:00 pm	1,80	Ninguna
2 de marzo de 2026	Templado	Lluvia ligera	7:00:00 a. m.	5:00 pm	2,40	Ninguna
3 de marzo de 2026	Templado	Lluvia moderada	7:00:00 a. m.	5:00 pm	6,40	Ninguna
4 de marzo de 2026	Templado	Lluvia moderada	7:00:00 a. m.	5:00 pm	7,20	Ninguna
5 de marzo de 2026	Templado	Soleado	7:00:00 a. m.	5:00 PM	0,00	Ninguna
6 de marzo de 2026	Templado	Soleado	7:00:00 a. m.	12:00 m	0,00	Ninguna

Convenciones:

CLIMA:

Cálido: Se caracterizan por unas temperaturas elevadas, y se encuentran ubicados en zonas con latitudes bajas.

Templado: Las temperaturas por lo general son moderadas, inclinándose más hacia las temperaturas frías en algunas épocas del año. Estos climas se localizan en latitudes medias.

Polar: Estos son los climas donde la predominancia del frío es completa.

ESTADO DEL TIEMPO

Soleado: Que presenta un cielo sin nubes y en el que brilla el sol.

Parcialmente Nublado: El estado del tiempo cuando las nubes están visiblemente presentes, pero no totalmente cubierto el cielo

Mayormente Nublado: 50% a 90% del Cielo está cubierto por Nubes

Nublado: 100% del Cielo está cubierto por Nubes

Lluvia Ligera: Tipo de precipitación que se caracteriza por tener un tamaño de gota pequeño

Lluvia Moderada: Tipo de precipitación con intensidad intermedia

Lluvia Intensa: Tipo de precipitación de alta intensidad, generalmente acompañada de fuertes viento y truenos y relámpagos

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

Residente de Interventoría



ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07 FECHA DE VERSION: 26/09/2020 PAGINA:

MAQUINARIA Y PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PERIODO EVALUADO: 1 AL 7 DE MARZO DE 2020 DE 2020

DESCRIPCION	Cant.	1	2	3	4	5	6	7
PERSONAL CONTRATISTA								
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6	6	6	6	6	6	6	6
OPERADORES DE EQUIPOS	5	5	5	5	5	5	5	5
PERSONAL TOPOGRAFIA	1	1	1	1	1	1	1	1
ALMACENISTA DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1
CELADOR	1	1	1	1	1	1	1	1
AYUDANTES DE OBRA	20	17	19	19	19	19	19	19
OFICIALES DE OBRA	4	4	4	4	4	4	4	4
CONDUCTORES	5	5	5	5	5	5	5	5
MAESTROS DE OBRA	2	2	2	2	2	2	2	2
CONTROLADORES DE TRANSITO	9	6	7	7	8	8	8	8
MECANICO	1	1	1	1	1	1	1	1
SUBCONTRATISTA DE PAVIMENTO	7	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL PERSONAL EN OBRA	62	6	54	57	57	58	58	58
Maquinaria								
EXCAVADORA HITACHI SX70	1	0	0	0	0	0	0	0
EXCAVADORA SHANTUI SE135	1	0	0	0	0	0	0	0
MOTO NIVELADORA	1	0	0	R	R	R	R	R
CONCRETADORA	2	0	0	0	0	0	0	0
REGLA DE PERFORACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA ELECTRICA	1	0	0	0	0	0	0	0
CILINDRO VIBROCOMPACTADOR BENITIN	3	0	0	0	0	0	0	0
BOBCAT	1	0	0	0	0	0	0	0
CANGURO VIBROCOMPACTADOR	1	0	0	0	0	0	0	0
MOTOBOMBA	1	0	0	0	0	0	0	0
VIBRADOR DE PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0
MARTILLO DEMOLETOR	3	0	0	0	0	0	0	0
TRONZADORAS DE 9"	2	0	0	0	0	0	0	0
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA OML220	1	0	0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA OFTM029	1	0	0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA OML204	1	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL INTERVENTORIA	Cant.							
Dir. Director de Interventoría	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL



CÓDIGO: 1764-41

PROYECTO: VUELO

SECTOR:

FORMA DE SEGUIMIENTO: 22

FECHA:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 1764-41, CON INTERVENCIÓN TÉCNICA, INFRAESTRUCTURA, RECONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNAS DE ESTACIONACIÓN, REPARACIÓN Y ALMACÉN DE

INTERVENIENTE:

ROBLE CALDAS S.A.S.

CONTRATISTA:

FRANCISCA RIVERA S.A.S.

SUPERVISOR:

MINISTERIO DEL INTERIOR CALDAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

COMPLETADO

SI

NO

NA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COMPONENTE AMBIENTAL

Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

1.1. Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental, conformación grupo de gestión social y ambiental.

Se dio el primer día de febrero se llevó a cabo reunión de comité, conformado por Contratista, Interventoría, Supervisión e Invas.

X

1.2. Capacitación y sensibilización para el personal de obra

Después la semana no se realizaron capacitaciones.

1.3. Cumplimiento de "trastornos" legales

Después la semana no se realizaron actividades relacionadas.



Programa Actividades Constructivas

2.1. Manejo integral de residuos de Construcción

Se verificó el adecuado manejo de materiales de construcción (arena, cemento y material gránulo).

X

2.2. Señalización dentro de obra y áreas temporales

Se verificó que los diferentes elementos de señalización estén en su lugar y correctamente instalados en las áreas de obra.

X

2.4. Manejo y disposición de escombros y lodos

Se verificó el acopio y carga de RCD generado en las obras 2 y 3.

X

2.5. Manejo y disposición final de residuos sólidos, orgánicos y especiales.

Se realizó la verificación y cumplimiento de los puntos acopiados y el adecuado acopio de los RESPEL.

X



Programa de Gestión Hídrica

3.1. Manejo de aguas superficiales

Después la semana no se han realizado labores relacionadas.

3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Se verificó las condiciones de los unidades sanitarias para las, se realizaron mantenimientos por mantenimiento los días 4 y 5 de marzo.

X



Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

4.1. Manejo de desechos y la cobertura vegetal

Se realizó y se dio mantenimiento vegetal y del suelo para la construcción de la parcela de la zona del Hondon en el campo 3.

X

4.2. Restauración de áreas afectadas

No se han realizado actividades relacionadas.

4.3. Protección de Fauna

No se han realizado actividades relacionadas.



Programa de Manejo de Instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.

5.1. Instalación, funcionamiento y mantenimiento de campamentos y áreas de acopio

Se cuenta con un campamento en el terreno 2, donde están ubicados los oficios (contratista e interventoría), BAJ, Almacén y sala RESPEL. En el terreno 1, hay un campamento para el personal de obra y el personal de obra.

X

5.3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Se verificó la correcta conservación y el funcionamiento de la maquinaria y vehículos. La maquinaria está correctamente mantenida.

X





INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN SST



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

8/28/2014

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17092025 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENTOR:

ROBLE INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA:

INGENIERIA RYO S.A.S

SUPERVISOR:

MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPONENTE SST

PERSONAL EN OBRA

	I	R	T			
INGRESOS - REINGRESOS	3					
RETIROS		1				
ADMINISTRATIVOS	6					
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1					
ALMACENISTA	1					
AYUDANTE DE OBRA	20					
OFICIALES	4					
CONDUCTORES (volqueta / onaga)	5					
MAESTRO	2					
CELADOR	1					
OPERARIOS DE MAQUINARIA	5					
CONTROLADOR DE TRAFICO	9					
MECANICO	1					
SUBCONTRATISTA PAVIMENTO	7					
TOTAL TRABAJADORES	62	1	0			



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL: Se presentan los certificados de aptitud médicos laborales.

X

ORDEN EXAMEN DE RETIRO

ORDENES PARA LA PRACTICA DEL EXAMEN DE RETIRO: Se presentan las cartas de remisión al examen de retiro.

X

LIQUIDACIONES

LIQUIDACIONES: El contratista presenta los certificados de liquidación del personal retirado.

X

ACCIDENTES E INCIDENTES

ACCIDENTES E INCIDENTES: No se han presentado incidentes ni accidentes laborales.

X

CONTROL DEL TRAFICO

REGULADORAS: Se cuenta con 8 reguladores de tránsito en obra.

X



SEÑALIZACION Y DEMARCAACION

SEÑALIZACION Y DEMARCAACION: Se tiene implementado el Plan de Manejo de Tránsito de la obra.

X



INDUCCIONES

INDUCCION SST: Se realizan las inducciones al personal nuevo.

X



CAPACITACION	CAPACITACIÓN SST: Se realiza capacitación en buen trato y comunicación asertiva.	X			
INSPECCIONES	INSPECCIONES PLANEADAS / DIARIAS: Se realizan pro operaciones de vehículos, maquinaria, inspección de EPP, herramientas manuales.	X			
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION : Se realiza entrega de los elementos de protección personal necesarios para cada labor.	X			
ORDEN Y ASEO	PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO: Se realizan jornadas de orden, limpieza y aseo.	X			
COMITES DE OBRA	COMITÉ TECNICO: Se realizó reunión de comité de obra el día 5 de marzo de 2026.	X			



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SOCIAL



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

26/09/2020

PÁGINA:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17032025 - 1533 INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARSOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENIOR: ROBLE INGENIEROS S.A.S. CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S. SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENZUELA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA

Durante la semana no se evidencian que hay ingreso de personas en la zona de la obra y de alrededores como la Enea y también del municipio de Villamaría. La permanencia de controladores viales tanto en el día como en la noche han permitido que se evidencie una mejor movilidad evitando accidentes de tránsito además de una adecuada señalización.

Desde la gestión social se tiene un acompañamiento continuo al personal de obra sobre casos específicos del control de emociones y sobre problemáticas familiares que mal canalizadas puedan desencadenar en un accidente de obra. El acompañamiento social es fundamental brindando un bienestar al trabajador y su familia.

Se evidencia un buen uso de los elementos de protección personal garantizando para prevenir un accidente en obra.

El día jueves 05 de marzo se realiza capacitación con el personal de la obra en general, donde todas las Áreas intervinieron con su respectiva temática, es así como la profesional social del contratista participa con el tema de la importancia de la comunicación asertiva.

GENERACION DE EMPLEO

MOC INT	MOC INT	MOC CONT	MOC CONT	MCF	TOTAL
9	0	42	20	9	80

CHARLAS

No DE EVENTOS

No DE ASISTENTES

1

30



PROYECTO INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La profesional social del contratista ha estado en comunicación constante realizando respuesta inmediata por los chats de la comunidad, además de estar en comunicación permanente con la empresa Temium y con la comunidad en general por medio del Comité de Participación Comunitaria informando sobre las actividades de obra, relacionadas con los pape y siga ubicados en los tres puntos de intervención. La información ha sido transmitida por medio de los chats comunitarios y el voz a voz.

Teniendo en cuenta que ya se tiene más del 50% de ejecución de obra, desde el área social del Contratista, interventoría y la Supervisión se empieza con la programación para la socialización de avance de ejecución de obra con la comunidad en general, la cual se realizará el día jueves 19 de marzo a las 4:00 de la tarde en el Restaurante El Resero. La divulgación de información para la convocatoria será apoyada por la supervisión y por el Comité de Participación Comunitaria.

La anterior información se dio a conocer en Comité de Obra donde se tuvo la participación de la Profesional Social Tatiana Ospina del INVIAS, quien se involucra también en el proyecto y solicita se le envíe informes sobre las actividades que se están realizando desde el área social contempladas en el PAGA, por lo cual también solicita se le envíe el PAGA aprobado por la interventoría.

Se continúa con la divulgación de información sobre las diferentes actividades de la obra, por medio de los chats comunitarios, Whatsapp y el Comité de Participación Comunitaria.

REUNIONES DE SOCIALIZACION

No DE EVENTOS

No DE ASISTENTES

1

2



PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Durante la semana no se recibieron PQRs por parte de la comunidad en general relacionadas con la ejecución de la obra.

Sin embargo, el día martes 03 de marzo en horas de la tarde - noche se presentaron fuertes lluvias en la vereda Gallinazo ocasionando deslizamientos y desbordamiento de la quebrada lo que afectó a varias viviendas del sector, donde el contratista se solidarizó con su equipo de trabajo y maquinaria frente a la situación, gesto que fue agradecido por la comunidad en general.

PQR

No RECIBIDOS

No ATENDIDOS

1

1



PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Durante la semana no se presentaron alegatos de actas de vecindad y/o entorno, ni tampoco peticiones de intervención en predios. Sin embargo, en el Comité de Obra desde el INVIAS, se solicitó al área social la programación de un encuentro entre los administrativos de Temium, la Supervisión, Interventoría y el Inviat, para revisar la posibilidad de que Temium pueda ceder un espacio para construir el orden de la vía aportando a la seguridad vial.

ACTAS DE VECINDAD

ACTAS DE RINCO / ENTORNO

PERMISOS

0

0



PROYECTO CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Desde la gestión social del contratista se ha tenido una comunicación permanente con los integrantes del Comité de Participación para mantenerlos informados sobre cada actividad de la ejecución de obra, quienes se convierten en pieza fundamental para transmitir información a la comunidad en general sobre obras totales y parciales de la vía.		
	Al comité de participación Comunitaria se le invita a la reunión general de socialización de la obra del avance del 50 %, para el próximo jueves 19 de marzo a las 4 de la tarde en el Restaurante el Relevo.		
	CAPACITACIONES	No DE EVENTOS 1	No DE ASISTENTES 3
PROYECTOS PRODUCTIVOS	A la fecha no aplica		
PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL	A la fecha no aplica		
OTRAS ACTIVIDADES	El día jueves 05 de febrero se realiza el acta de pares de lo social, para revisar lo realizado y los pendientes de obra, para tenerlo en cuenta para el Comité Técnico de obra. También se recuerda sobre entregar el Informe mensual con sus respectivos anexos. El día viernes 06 de febrero se participa en Comité Técnico de Obra, con el acompañamiento de la profesional social del INVIAS		





ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 14104-07

VERSION: 01

25/09/2020

PAGINA

REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número:

22

Del:

1-mar-2026

Al:

7-mar-2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

158 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 17092025 - 1533 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN



PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE ANCLAJES - TRAMO 3 PANTALLA



SEÑALIZACIÓN- TRAMO 3 PONTÓN



VACIADO DE CONCRETO DE PANTALLA CAISSON 5, 6, 7 Y 8 - TRAMO 03 PONTÓN



TOMA MUESTRAS DE CONCRETO - PANTALLA CAISSON 5, 6, 7 Y 8 - TRAMO 03 PONTÓN



INSTALACION FORMALETA DE PANTALLA CAISSON 1, 2, 3 Y 4 - TRAMO 3



INSTALACIÓN DE SUBBASE - TRAMO 02 TERMALES



ACTA INFORME SEMANAL



CÓDIGO: 1419-F-07

VERSIÓN: 01

25/09/2020

PÁGINA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 22 Del: 1-mar-2020 Al: 7-mar-2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 156 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 17082020 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARSOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN



CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA SOBRE IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA



COMPACTACIÓN DE SUBBASE - TRAMO 01 TERNIUM



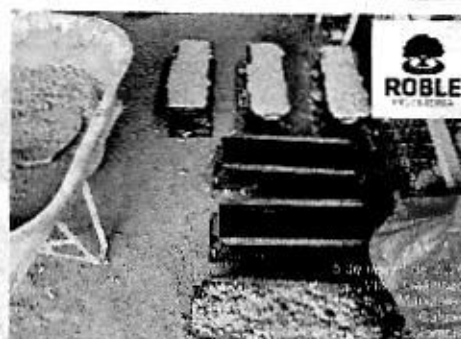
TOMA DE DENSIDADES- TRAMO 01- TERNIUM



ACERO DE REFUERZO - TRAMO 01 TERNIUM



VACIADO DE CONCRETO- TRAMO 01 TERNIUM



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO - TRAMO 01 TERNIUM



ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1416-F-07

VERSION: 01

26/09/2020

PAGINA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 22 Del: 1-mar-2020 Al: 7-mar-2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 156 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

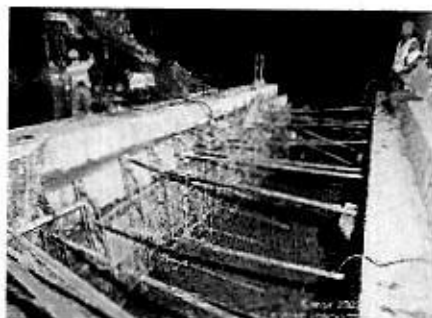
CONTRATO N° 17092025 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN



LOCALIZACION TUBERÍA DE GAS - TRAMO 02 TERMALES



COMPACTACIÓN DE SUBBASE - TRAMO 01 TERNIUM



VACIADO DE CONCRETO EN PANTALLA CAISSON 1, 2, 3 Y 4 - TRAMO 3



VACIADO DE CONCRETO- TRAMO 01 TERNIUM



VACIADO DE CONCRETO- TRAMO 01 TERNIUM



VACIADO DE CONCRETO- TRAMO 01 TERNIUM



ACTA INFORME SEMANAL



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Informe semanal N°: 23 Semana de contrato N° 23 Del: 8-mar-26 Al: 14-mar-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 165 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO N° 17092025-1533

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARRILOJO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 14 de marzo de 2026		
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	8,53%	45,97%
Valor	\$ 294.550.865	\$ 1.420.807.660

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 14 de marzo de 2026		
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	4,24%	62,87%
Valor	\$ 131.092.450	\$ 1.943.129.397

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	INGENIERIA RYD S.A.S
Representante Legal:	YEINY ALEXANDER VELASCO ANGARITA
Contrato No.:	17092025-1533
Valor Inicial Estudios y Diseños:	
Valor de Obras	\$ 3.060.518.083,50
Valor de Ajustes	
Valor Obras Manejo Ambiental	
Valor Total Actualizado:	\$ 3.060.518.083,50
Valor Anticipo	\$ 618.103.616,70
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio
Plazo Actualizado:	Hasta el 31 de marzo de 2026
Fecha de Iniciación:	30 de septiembre de 2025
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Nueva fecha de terminación:	31 de marzo de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ROBLE INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
Contrato No.:	17092025-1533
Valor Total Inicial: (Con IVA)	5 337.767.808,00
Valor Total Actualizado:	
Valor Anticipo:	
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de Iniciación:	30 de septiembre de 2025
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Nueva fecha de finalización:	31 de marzo de 2026
Plazo actualizado:	Hasta el 31 de marzo de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DOMINGO (8):	- No se generan labores.
LUNES (9):	- Sector Temiun: Instalación y compactación de subbase // Instalación de formaleta // Figurado de acero para bordillo y losas reforzadas. - Sector Pontón: Excavación e instalación de formaleta para complementar pantalla. // Figurado de acero para Caisson. // Se recibe documentación correspondiente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la ejecución de actividades en caisson; sin embargo, esta se encuentra incompleta. Por lo anterior, se solicita remitir la documentación en su totalidad con el fin de realizar la respectiva revisión y aprobación para el inicio de los trabajos. - Sector Pantalla: Instalación y figurado de acero para viga reticular
MARTES (10):	- Sector Temiun: Instalación y compactación de subbase // Vaciado de pavimento MR 45 premezclado a celerado a 7 días // Toma de muestras de concreto. // Toma de muestras de densidad y humedad. - Sector Pontón: Excavación e instalación de formaleta para complementar pantalla. // Excavación de caisson para obra complementaria. // Figurado de acero para Caisson. - Sector Pantalla: Instalación y figurado de acero para viga reticular
MIÉRCOLES (11):	- Sector Temiun: Instalación y compactación de subbase // Vaciado de bordillo. - Sector Pontón: Excavación e instalación de formaleta para complementar pantalla. // Excavación de caisson para obra complementaria. // Figurado de acero para Caisson. - Sector Pantalla: Instalación y figurado de acero para viga reticular
JUEVES (12):	- Sector Temiun: Instalación y compactación de subbase. // Instalación de formaleta para vaciado de bordillo y vía. // Toma de muestras de densidad y humedad. - Sector Pontón: Excavación e instalación de formaleta para complementar pantalla. // Excavación de caisson para obra complementaria. // Figurado de acero para Caisson. - Sector Pantalla: Instalación y figurado de acero para viga reticular
VIERNES (13):	- Sector Temiun: Instalación y compactación de subbase // Vaciado de pavimento MR 45 premezclado a celerado a 7 días // Vaciado de bordillo. // Toma de muestras de concreto - Sector Pontón: Excavación e instalación de formaleta para complementar pantalla. // Excavación de caisson para obra complementaria. // Figurado de acero para Caisson. - Sector Pantalla: Instalación y figurado de acero para viga reticular - Se realiza comité técnico y recorrido por los frentes de obra en compañía del INVIAS, la supervisión, la interventoría y el contratista.
SÁBADO (14):	- Sector Pontón: Excavación e instalación de formaleta para complementar pantalla. // Excavación de caisson para obra complementaria. // Figurado de acero para Caisson. - Sector Pantalla: Instalación y figurado de acero para vigas de unión de los anclajes

ACTIVIDADES PARA LA PROXIMA SEMANA

- Sector Temiun: Vaciado de concreto MR 45 y construcción de bordillo. Construcción de sumidero.
- Sector Termalos: Instalación y compactación de subbase granular.
- Sector Pantalla: Armado de acero y vaciado de vigas reticulares.
- Sector Pontón: Vaciado de caisson obra complementaria y demolición de box culvert existente.

OBSERVACIONES

INTERVENTORIA

Firma Residente de Interventoría
Ingeniero Leonardo Fernández Alarcón

	ACTA INFORME SEMANAL			ACTA 03 INFORME SEMANAL	PAGINA:																																																																																																												
CÓDIGO: 1410-F-07	VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	FECHA DE VERSIÓN: 20/09/2020																																																																																																														
OBJETO CONTRATO:																																																																																																																	
CONTRATO N° 7090205 - 1533																																																																																																																	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA																																																																																																																	
Semana Número: 22	Del: 08-mar-2026	Al: 14-mar-2026																																																																																																															
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 165 días																																																																																																																	
Contratista de interventoría: ROBLE INGENIERIA S.A.S.																																																																																																																	
Representante legal: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO																																																																																																																	
Contrato N°: 7090205-1533																																																																																																																	
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio.																																																																																																																	
Prórroga: 3 meses																																																																																																																	
Adición: N/A																																																																																																																	
Coordinador de Zona: Juan David Durque																																																																																																																	
FECHA TERMINACIÓN																																																																																																																	
Del 30 de septiembre de 2025																																																																																																																	
Hasta 31 de diciembre de 2025																																																																																																																	
PERSONAL DE INTERVENTORIA																																																																																																																	
RELACION SEMANAL DE PERSONAL																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>M</th> <th>M</th> <th>J</th> <th>V</th> <th>S</th> <th>D</th> <th>DEDICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Director de Interventoría</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Ing. Responsable de Interventoría</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ing. Auxiliar de Interventoría</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Estudios</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Profesional Ambiental</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Profesional SVEO</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Profesional Social</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Inspector</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ciudadanos</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Secretaría</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>							L	M	M	J	V	S	D	DEDICACIÓN	Ing. Director de Interventoría								20%	Ing. Responsable de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%	Ing. Auxiliar de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%	Ing. Especialista en Estudios	X	X	X	X	X	X	X	50%	Profesional Ambiental	X	X	X	X	X	X	X	50%	Profesional SVEO	X	X	X	X	X	X	X	100%	Profesional Social	X	X	X	X	X	X	X	30%	Topógrafo	X	X	X	X	X	X	X	50%	Inspector	X	X	X	X	X	X	X	100%	Ciudadanos	X	X	X	X	X	X	X	50%	Secretaría	X	X	X	X	X	X	X	50%
	L	M	M	J	V	S	D	DEDICACIÓN																																																																																																									
Ing. Director de Interventoría								20%																																																																																																									
Ing. Responsable de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																									
Ing. Auxiliar de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																									
Ing. Especialista en Estudios	X	X	X	X	X	X	X	50%																																																																																																									
Profesional Ambiental	X	X	X	X	X	X	X	50%																																																																																																									
Profesional SVEO	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																									
Profesional Social	X	X	X	X	X	X	X	30%																																																																																																									
Topógrafo	X	X	X	X	X	X	X	50%																																																																																																									
Inspector	X	X	X	X	X	X	X	100%																																																																																																									
Ciudadanos	X	X	X	X	X	X	X	50%																																																																																																									
Secretaría	X	X	X	X	X	X	X	50%																																																																																																									
Ejecución Acumulada del Contrato																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PROGRAMADO</th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión programada (%)</td> <td>3.85%</td> <td>88.46%</td> </tr> <tr> <td>Inversión del contrato :</td> <td>\$ 12,991,070</td> <td>\$ 224,794,909</td> </tr> <tr> <td>Costo de personal</td> <td>\$ 8,750,260</td> <td>\$ 224,320,560</td> </tr> <tr> <td>Primeros de localización</td> <td>\$ 1,123,804</td> <td>\$ 25,847,481</td> </tr> <tr> <td>Costos Directos Fijos</td> <td>\$ 588,827</td> <td>\$ 13,105,019</td> </tr> <tr> <td>Gastos Reembolsables</td> <td>\$ 1,544,154</td> <td>\$ 35,916,530</td> </tr> <tr> <td>Valor del contrato</td> <td>\$ 337,767,890.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	Inversión programada (%)	3.85%	88.46%	Inversión del contrato :	\$ 12,991,070	\$ 224,794,909	Costo de personal	\$ 8,750,260	\$ 224,320,560	Primeros de localización	\$ 1,123,804	\$ 25,847,481	Costos Directos Fijos	\$ 588,827	\$ 13,105,019	Gastos Reembolsables	\$ 1,544,154	\$ 35,916,530	Valor del contrato	\$ 337,767,890.00																																																																																					
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO																																																																																																															
Inversión programada (%)	3.85%	88.46%																																																																																																															
Inversión del contrato :	\$ 12,991,070	\$ 224,794,909																																																																																																															
Costo de personal	\$ 8,750,260	\$ 224,320,560																																																																																																															
Primeros de localización	\$ 1,123,804	\$ 25,847,481																																																																																																															
Costos Directos Fijos	\$ 588,827	\$ 13,105,019																																																																																																															
Gastos Reembolsables	\$ 1,544,154	\$ 35,916,530																																																																																																															
Valor del contrato	\$ 337,767,890.00																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL INCENDIARIO EN LA VIA PUEBLO LA LIBERTAD - ARIQUITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN																																																																																																																	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																																																																	
Montepolías y participación en reuniones de coordinación y reuniones por lo ordinario, por el correo electrónico.																																																																																																																	
Elaboración de informe final																																																																																																																	
Trámites administrativos, solicitud de pago.																																																																																																																	
Verificación en campo de la ejecución de actividades, validando por el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vial en el trabajo.																																																																																																																	
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																	
Toma de candidaturas, acompañamiento y validación en el uso de sistemas de protección personal.																																																																																																																	
Revisión de informe semanal																																																																																																																	
Elaboración de acta de interventoría																																																																																																																	
Revisión en el día de obra.																																																																																																																	
Revisión y aprobación de PGO																																																																																																																	
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																																																																																																																	
OBSERVACIONES																																																																																																																	
Para esta semana de obra el contratista indica según su programación un avance semanal de 9.53% lo que se traduce en un acumulado del 45.07%. En relación a la ejecución para la semana se tiene una ejecución del 4.24% para un avance acumulado del 62.80%. No presenta retrasos.																																																																																																																	
					REPRESENTANTE INTERVENTORIA																																																																																																												
					Firma Representante de Interventoría Ing. Roberto Lugo																																																																																																												

[illegible]



ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07

VERSION: 01

FECHA DE VERSION:

26/09/2020

PAGINA:

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

FECHA	CLIMA	ESTADO DEL TIEMPO	INICIO	FIN	PRECIPITACIÓN (mm).	OBSERVACIONES
9 de marzo de 2026	Templado	Parcialmente nublado	7:00:00 a. m.	5:00 pm	0,00	Ninguna
10 de marzo de 2026	Templado	Soleado	7:00:00 a. m.	5:00 pm	0,00	Ninguna
11 de marzo de 2026	Templado	Lluvia intensa	7:00:00 a. m.	5:00 pm	20,80	Ninguna
12 de marzo de 2026	Templado	Lluvia moderada	7:00:00 a. m.	5:00 pm	4,00	Ninguna
13 de marzo de 2026	Templado	Parcialmente nublado	7:00:00 a. m.	5:00 PM	0,00	Ninguna
14 de marzo de 2026	Templado	Soleado	7:00:00 a. m.	12:00 m	0,00	Ninguna

Convenciones:

CLIMA:

Cálido: Se caracterizan por unas temperaturas elevadas, y se encuentran ubicados en zonas con latitudes bajas.

Templado: Las temperaturas por lo general son moderadas, inclinándose más hacia las temperaturas frías en algunas épocas del año. Estos climas se localizan en latitudes medias.

Polar: Estos son los climas donde la predominancia del frío es completa.

ESTADO DEL TIEMPO

Soleado: Que presenta un cielo sin nubes y en el que brilla el sol.

Parcialmente Nublado: El estado del tiempo cuando las nubes están visiblemente presentes, pero no totalmente cubierto el cielo

Mayormente Nublado: 50% a 90% del Cielo está cubierto por Nubes

Nublado: 100% del Cielo está cubierto por Nubes

Lluvia Ligera: Tipo de precipitación que se caracteriza por tener un tamaño de gota pequeño

Lluvia Moderada: Tipo de precipitación con intensidad intermedia

Lluvia Intensa: Tipo de precipitación de alta intensidad, generalmente acompañada de fuertes viento y truenos y relámpagos

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

Residente de Interventoría



ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07 FECHA DE VERSION : 26/09/2020 PAGINA:

MAQUINARIA Y PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PERIODO EVALUADO: 9 AL 14 DE MARZO DE 2026 DE 2026

DESCRIPCION	Cant.	8	9	10	11	12	13	14
PERSONAL CONTRATISTA								
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6		6	6	6	6	6	6
OPERADORES DE EQUIPOS	5		5	5	5	5	5	5
PERSONAL TOPOGRAFIA	1		1	1	1	1	1	1
ALMACENISTA DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1
CELADOR	1		1	1	1	1	1	1
AYUDANTES DE OBRA	19		19	19	19	19	19	19
OFICIALES DE OBRA	4		4	4	4	4	4	4
CONDUCTORES	5		5	5	5	5	5	5
MAESTROS DE OBRA	2		2	2	2	2	2	2
CONTROLADORES DE TRANSITO	8		6	5	5	5	5	5
MECANICO	1		1	1	1	1	1	1
SUBCONTRATISTA DE PAVIMENTO	8		6	6	6	5	6	5
SUBCONTRATISTA DE CAISSON	6		0	3	3	3	3	3
TOTAL PERSONAL EN OBRA	67	0	57	59	59	58	59	57
Maquinaria	Cant.							
EXCAVADORA HITACHI SX70	1		0	0	0	0	0	0
EXCAVADORA SHANTUI SE135	1		0	0	0	0	0	0
MOTO NIVELADORA	1		R	R	R	R	R	R
CONCRETADORA	2		0	0	0	0	0	0
REGLA DE PERFORACION	1		0	0	0	0	0	0
PLANTA ELECTRICA	1		0	0	0	0	0	0
CILINDRO VIBROCOMPACTADOR BENITIN	3		0	0	0	0	0	0
BOBCAT	1		0	0	0	0	0	0
CANGURO VIBROCOMPACTADOR	1		0	0	0	0	0	0
MOTOBOMBA	1		0	0	0	0	0	0
VIBRADOR DE PUNTA	1		0	0	0	0	0	0
MARTILLO DEMOLEDOR	3		0	0	0	0	0	0
TRONZADORAS DE 9"	2		0	0	0	0	0	0
CORTADORA DE PAVIMENTO	1		0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA CML220	1		0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA OFTM229	1		0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA CML204	1		0	0	0	0	0	0

PERSONAL INTERVENTORIA	Cant.							
Ing. Director de Interventoria	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Ing. Residente de Interventoria	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Ing. Auxiliar de Interventoria	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Ing. Especialista estructural	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Profesional Ambiental	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Profesional Siso	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Profesional Social	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Topógrafo	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Inspector	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC

CONVENCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO

D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.
R:	REPARACIÓN Y AJUSTES.
O:	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL

DTP:	DEDICACIÓN TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
	NO SE LABORÓ
I	INCAPACIDAD
X*	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

CÓDIGO 1204-40		NOMBRE DE LA OBRA		NOMBRE DEL PROYECTO		NOMBRE DEL RESPONSABLE		NOMBRE DEL RESPONSABLE	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA									
INTERVENCIÓN		REGLA FUNDAMENTAL		CONTRATISTA		FELICIDAD DEL		SUPERVISOR	
PROGRAMA		PROYECTO		ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
						SI		NO	
COMPONENTE AMBIENTAL									
Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	1.1. Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental, conformación grupo de gestión local y ambiental.	El día viernes 13 de marzo se llevó a cabo reunión de comité, conformado por Contrama, Interventor, Supervisores de Gobierno e Inioy.	X						
	1.2. Capacitación y sensibilización para el personal de obra	Durante la semana no se realizaron capacitaciones.					X		
	1.3. Cumplimiento de reglamentos legales	Durante la semana no se realizaron actividades relacionadas.						X	
Programa Actividades Constructivas	2.1. Manejo Integral de Residuos de Construcción	Se verifica el adecuado manejo de residuos de construcción (serrín, cemento y material general).	X						
	2.2. Señalización de obras y sitios temporales	Se verifica que los diferentes elementos de señalización no encuentren deterioros ni faltantes en los trabajos de obra.	X						
	2.4. Manejo y disposición de escombros y basuras	Se verifica el acopio y carga de RCD generado en los lotes 2 y 3.	X						
	2.5. Limpieza y desbroce con fines de restauración ecológica	Se realiza la verificación y cumplimiento de los puntos ecológicos y el adecuado acopio de los RESPEL.	X						
Programa de Gestión Hídrica	3.1. Manejo de aguas superficiales	Durante la semana no se han realizado labores relacionadas.					X		
	3.2. Manejo de residuos líquidos, domoesticos e industriales	Se verifican las condiciones de los unidades sanitarias portátiles, se realizan mantenimientos por Mantisop los días 10 y 12 de marzo.	X						
Programa de Bloqueo de Servicios Ecológicos	4.1. Manejo de desechos y la cobertura vegetal	En el lote 3 se realizaron actividades de manejo de material vegetal y material del talud en el área de intervención, así como la cobertura de los caminos, entre otros de las obras relacionadas para la recuperación de la zona de protección en la zona del parque.	X						
	4.2. Restauración de Áreas afectadas	No se han realizado actividades relacionadas.					X		
	4.3. Protección de fauna	No se han realizado actividades relacionadas.						X	
Programa de Manejo de Instalaciones Temporales, de maquinaria y equipos.	5.1. Instalación, funcionamiento y mantenimiento de campamentos y sitios de acopio	Se cuenta con un campamento en el lote 2, donde están ubicados los talleres (mecánica e intervención), SAI, Almacén y sala RESPEL. En el lote 1, hay un campamento para guardar equipos y maquinaria nueva.	X						
	5.2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Se verifican los niveles de gasolina y el funcionamiento de la maquinaria y vehículos, la mayoría de ellos actualmente están siendo reparados.	X						



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN SST



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

8/28/2014

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 17092025 - 1533 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENTOR:

ROBLE INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA:

INGENIERIA RYO S.A.S

SUPERVISOR:

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENZUELA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO

SI

No

NA

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERSONAL EN OBRA

COMPONENTE SST

	I	R	T
INGRESOS - REINGRESOS	6		
RETIROS		6	
ADMINISTRATIVOS	5		
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1		
ALMACENISTA	1		
AYUDANTE DE OBRA	19		
OFICIALES	4		
CONDUCTORES (volqueta / oniga)	5		
MAESTRO	2		
CELADOR	1		
OPERARIOS DE MAQUINARIA	5		
CONTROLADOR DE TRAFICO	8		
MECANICO	1		
SUBCONTRATISTA PAVIMENTO	8		
SUBCONTRATISTA CAISSON	6		
TOTAL TRABAJADORES	67	6	0



PERSONAL EN OBRA

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL: Se presentan los certificados de aptitud medicos laborales

X

ORDEN EXAMEN DE RETIRO

ORDENES PARA LA PRACTICA DEL EXAMEN DE RETIRO: Se presentan las cartas de remisión al examen de retiro.

X

LIQUIDACIONES

LIQUIDACIONES: El contratista presenta los certificados de liquidación del personal retirado.

X

ACCIDENTES E INCIDENTES

ACCIDENTES E INCIDENTES: No se han presentado incidentes ni accidentes laborales.

X

CONTROL DEL TRAFICO

REGULADORAS: Se cuenta con 7 reguladores de tránsito en obra.

X



SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN: Se tiene implementado el Plan de Manejo de Tránsito de la obra.

X



INDUCCIONES

INDUCCION SST: Se realizan las inducciones al personal nuevo

X



CAPACITACION	CAPACITACIÓN SST: Se realiza divulgación del procedimiento seguro de construcción de Caisson a los trabajadores del subcontratista Orlonaciones AMC S.A.S.	X			
INSPECCIONES	INSPECCIONES PLANEADAS / DIARIAS: Se realizan pre operacionales de vehículos, maquinaria, inspección de EPP, herramientas manuales, inspección de condiciones de seguridad en espacios confinados y trabajo en alturas.	X			
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN : Se realiza entrega de los elementos de protección personal necesarios para cada labor.	X			
ORDEN Y ASEO	PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO: Se realizan jornadas de orden, limpieza y aseo.	X			
COMITES DE OBRA	COMITÉ TÉCNICO: Se realizó reunión de comité de obra el día 13 de marzo de 2026.	X			



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SOCIAL



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

26/09/2020

PÁGINA:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17062026 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S. CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S. SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENZUELA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA

Durante la semana se evidencia que hay ingreso de personal de la zona de influencia de la obra y de sectores aledaños como la Enea y también del municipio de Villamaría. La permanencia de controladores viales tanto en el día como en la noche han permitido que se evidencia una mayor movilidad evitando accidentes de tránsito además de una adecuada señalización.

Desde la gestión social se tiene un acompañamiento continuo al personal de obra sobre casos específicos del control de emociones y sobre problemáticas familiares que mal canalizadas pueden desencadenar en un accidente de obra. El acompañamiento social es fundamental brindando un bienestar al trabajador y su familia.

Se evidencia un buen uso de los elementos de protección personal garantizando para prevenir un accidente en obra.

GENERACION DE EMPLEO

MOC INT	MONC INT	MOC CGMT	MONC CGMT	MCF	TOTAL
9	0	48	19	8	84

CHARLAS

No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES
0	0



PROYECTO INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La profesional social del contratista ha estado en comunicación constante realizando respuesta inmediata por los chats de la comunidad, además de estar en comunicación permanente con la empresa Ternium y con la comunidad en general por medio del Comité de Participación Comunitaria informando sobre las actividades de obra, relacionadas con los para y siga ubicados en los tres puntos de intervención. La información ha sido transmitida por medio de los chats comunitarios y el voz a voz.

Se está realizando la convocatoria a la reunión de socialización general de avances del 50 % de ejecución de obra a la comunidad en general, para el día jueves 19 de marzo, con el apoyo de la profesional social de la Supervisión de la secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, con la elaboración de pieza comunicativa, además de la colaboración del Comité de Participación Comunitaria para la divulgación de información, por medio de chats comunitarios, WhatsApp y voz a voz.

REUNIONES DE SOCIALIZACION

No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES
1	3



PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La profesional social del contratista recibe la solicitud de la administración del Hotel Vahala, relacionada con realizar el acceso hacia la cancha sintética, teniendo en cuenta que ya se está realizando la pavimentación de la vía, a la cual se da respuesta inmediata y se afirma que apenas se termine de pavimentar el otro lado de la vía, se construirá inmediatamente dicho acceso.

PQR

No RECIBIDOS	No ATENDIDOS
1	1



PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Durante la semana no se presentaron diligenciamientos de actas de vecindad y/o entorno, ni tampoco permisos de intervención en predios. Sin embargo, en el Comité de Obra desde el INVIA, se solicitó al área social la programación de un encuentro entre los administrativos de Ternium, la Supervisión, Interventoría y el INVIA, para revisar la posibilidad de que Ternium pueda ceder un espacio para construir el andén de la vía aportando a la seguridad vial.

Desde el área social del Contratista se está a la espera de coordinar la fecha de disponibilidad del secretario de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, para programar nuevamente la reunión que se había solicitado en comité de obra con la gerencia de Ternium, frente a la temática relacionada con la posibilidad de la construcción del andén.

ACTAS DE VECIDAD

ACTAS DE INICIO / ENTORNO	PERMISOS
0	0



PROYECTO CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Desde la gestión social del contratista se ha tenido una comunicación permanente con los integrantes del Comité de Participación para mantenerlos informados sobre cada actividad de la ejecución de obra, quienes se convierten en pieza fundamental para transmitir información a la comunidad en general sobre cierre totales y parciales de la vía.		
	Al comité de participación Comunitaria se le invita a la reunión general de socialización de la obra del avance del 50 %, para el próximo jueves 19 de marzo a las 4 de la tarde en el Restaurante El Resero.		
	CAPACITACIONES	No DE EVENTOS 1	No DE ASISTENTES 3
PROYECTOS PRODUCTIVOS	A la fecha no aplica		
PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL	A la fecha no aplica		
OTRAS ACTIVIDADES	El día jueves 12 de marzo se realiza el acta de paros de lo social, para revisar lo realizado y los pendientes de obra, para tenerlo en cuenta para el Comité Técnico de obra. El día viernes 13 de marzo se participa en Comité Técnico de Obras, con el acompañamiento del Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Caldas.		





ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

26/09/2020

PAGINA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 23 Del: 8-mar-2020 Al: 14-mar-2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 165 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17092025 - 1533 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN



CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA RETICULAR



VERIFICACIÓN DE PERMISOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS



MEDICIONES ATMOSFÉRICAS DE GASES EN ESPACIOS CONFINADOS



CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA RETICULAR



CONSTRUCCIÓN DE CAISSONS



AMARRE DE HIERRO PARA VACIADO DE CAISSON



ACTA INFORME SEMANAL



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Informe semanal N°: 24 Semana de contrato N° 24 Del: 15-mar-26 Al: 21-mar-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 172 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 17092025 - 1533

INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLEO EN EL MUNICIPIO DE VILAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 21 de marzo de 2025		
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	28,89%	74,87%
Valor	\$ 892.918.376	\$ 2.313.728.836

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 21 de marzo de 2025		
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	16,47%	79,35%
Valor	\$ 509.134.510	\$ 2.452.263.997

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: INGENIERIA RYD S.A.S.
Representante Legal: YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA
Contrato No.: 17092025-1533
Valor Inicial Estudios y Diseños:
Valor de Obras \$ 3.090.518.083,50
Valor de Ajustes:
Valor Obras Manajo Ambiental:
Valor Total Actualizado: \$ 3.090.518.083,50
Valor Anticipo \$ 618.103.616,70
Plazo Inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio
Plazo Actualizado: Hasta el 31 de marzo de 2026
Fecha de Inicio: 30 de septiembre de 2025
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2025
Fecha de Suspensión:
Fecha de Reiniciación:
Nueva fecha de terminación: 31 de marzo de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: ROBLE INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
Contrato No.: 17092025-1533
Valor Total Inicial: (Coo IVA) \$ 337.767.808,00
Valor Total Actualizado:
Valor Anticipo:
Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de Inicio: 30 de septiembre de 2025
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2025
Fecha de Suspensión:
Fecha de Reiniciación:
Nueva fecha de finalización: 31 de marzo de 2026
Plazo actualizado: Hasta el 31 de marzo de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DOMINGO (15):	- No se generan labores.
LUNES (16):	- Pontón: Excavación de caisson para obra complementaria.
MARTES (17):	- Sector Termal: Instalación de sellos // Instalación de formaleta para vaciado de vía. // Instalación y compactación de subbase. - Sector Pontón: Figurado de acero para Caisson. - Sector Pantalla: Instalación de formaleta para viga reticular.
MIÉRCOLES (18):	- Sector Termal: Instalación y compactación de subbase // Vaciado de pavimento MR 45 premezclado a celerado a 7 días // Toma de muestras de concreto - Sector Pontón: Instalación de formaleta (fondo) para losa entre pantallas - Sector Pantalla: Vaciado de viga reticular
JUEVES (19):	- Sector Termal: Instalación y compactación de subbase // Instalación de formaleta para vaciado de vía y sumidero - Sector Termal: Instalación y compactación de subbase. - Sector Pontón: Instalación de acero de refuerzo de Caisson // Vaciado de Caisson // Instalación de formaleta (fondo) para losa entre pantallas. - Sector Pantalla: Instalación de formaleta para vaciado de viga reticular. - Se realiza reunión de socialización con la comunidad
VIERNES (20):	- Sector Termal: Instalación y compactación de subbase // Toma de muestras de densidad y humedad // Vaciado de pavimento MR 45 premezclado a celerado a 7 días // Vaciado de bordillo. // Toma de muestras de concreto - Sector Termal: Instalación y compactación de subbase. - Sector Pontón: Instalación y figurado de acero para losa. - Sector Pantalla: Vaciado de viga reticular - Se realiza comité técnico en compañía del INVÍAS, la supervisión, la interventoría y el contratista.
SÁBADO (21):	- Sector Termal: Vaciado de la bordillo y sumidero

ACTIVIDADES PARA LA PROXIMA SEMANA

- Sector Termal: Vaciado de concreto MR 45 y construcción de bordillo.
- Sector Termal: Instalación y compactación de subbase granular.
- Sector Pantalla: Armado de acero y vaciado de vigas reticulares.
- Sector Pontón: Instalación de acero para zapata y vástago de obra complementaria // Demolición de box coulverti existente. // Vaciado de losa.

OBSERVACIONES

INTERVENTORIA

Firma Representante de Interventoría
Ingeniero Leonor Fernández Alarcón

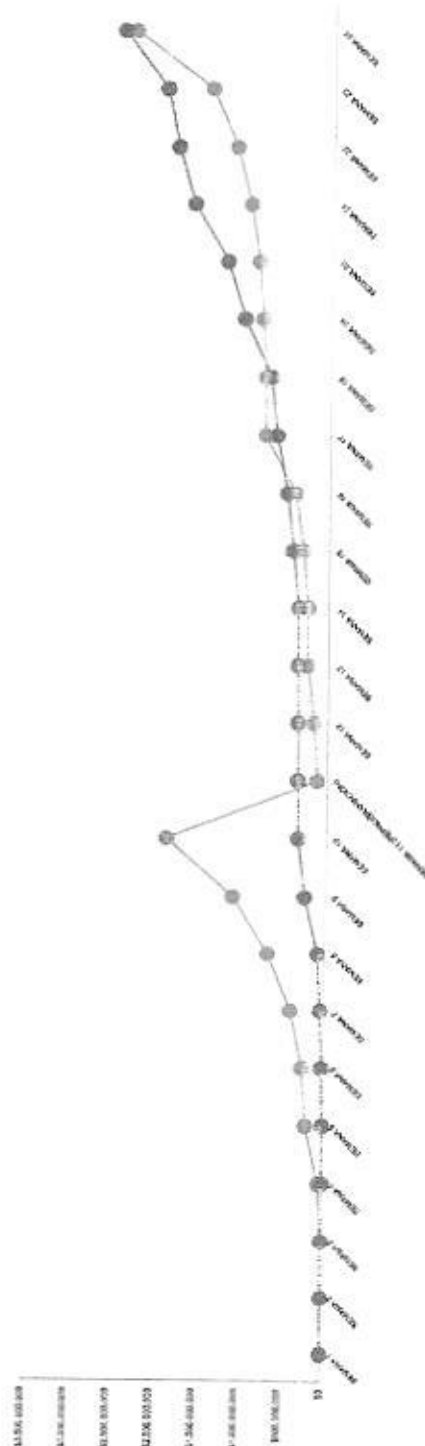
 ROBLE INGENIERÍA S.A.S.	ACTA INFORME SEMANAL																																																																																																																
CÓDIGO: 14184-47	VERSIÓN: 01	FECHA DE VERSIÓN:	30/09/2020		PÁGINA: 1																																																																																																												
OBJETO CONTRATO: CONTRATO N° 17042025 - 1533																																																																																																																	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA																																																																																																																	
Semana Número: 24 Del: 15-mar-2026 Al: 21-mar-2026																																																																																																																	
Tiempo transcurrido desde la adjudicación del contrato: 172 días																																																																																																																	
Contratista de Interventoría: ROBLE INGENIERÍA S.A.S.																																																																																																																	
Representante legal: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO																																																																																																																	
Contrato No: 1702025-1533																																																																																																																	
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio. Del 30 de septiembre de 2025 Hasta 31 de diciembre de 2025																																																																																																																	
Plazo: 3 meses																																																																																																																	
Adición: N/A																																																																																																																	
Coordinador de Zona: Juan David Durque																																																																																																																	
Fecha terminación: Hasta el 31 de marzo de 2026																																																																																																																	
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO																																																																																																																	
<table><thead><tr><th>PROGRAMADO</th><th>SEMANAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Inversión programada (%)</td><td>3,05%</td><td>92,31%</td></tr><tr><td>Inversión del contrato :</td><td>\$ 12.961.870</td><td>\$ 3.111.765.669</td></tr><tr><td>Costo de personal</td><td>\$ 9.753.285</td><td>\$ 2.541.075.846</td></tr><tr><td>Primas de localización</td><td>\$ 1.123.904</td><td>\$ 26.071.265</td></tr><tr><td>Costos Directos Fijas</td><td>\$ 569.827</td><td>\$ 13.675.946</td></tr><tr><td>Gastos Reembolsables</td><td>\$ 1.044.164</td><td>\$ 37.009.692</td></tr><tr><td>Valor del contrato</td><td></td><td>\$ 337.787.306,00</td></tr></tbody></table>						PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	Inversión programada (%)	3,05%	92,31%	Inversión del contrato :	\$ 12.961.870	\$ 3.111.765.669	Costo de personal	\$ 9.753.285	\$ 2.541.075.846	Primas de localización	\$ 1.123.904	\$ 26.071.265	Costos Directos Fijas	\$ 569.827	\$ 13.675.946	Gastos Reembolsables	\$ 1.044.164	\$ 37.009.692	Valor del contrato		\$ 337.787.306,00																																																																																				
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO																																																																																																															
Inversión programada (%)	3,05%	92,31%																																																																																																															
Inversión del contrato :	\$ 12.961.870	\$ 3.111.765.669																																																																																																															
Costo de personal	\$ 9.753.285	\$ 2.541.075.846																																																																																																															
Primas de localización	\$ 1.123.904	\$ 26.071.265																																																																																																															
Costos Directos Fijas	\$ 569.827	\$ 13.675.946																																																																																																															
Gastos Reembolsables	\$ 1.044.164	\$ 37.009.692																																																																																																															
Valor del contrato		\$ 337.787.306,00																																																																																																															
PERSONAL DE INTERVENTORIA																																																																																																																	
<table><thead><tr><th>RELACION SEMANAL DE PERSONAL</th><th>L</th><th>M</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th>DEDICACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ing. Director de Interventoría</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20%</td></tr><tr><td>Ing. Residente de Interventoría</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr><tr><td>Ing. Auxiliar de Interventoría</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr><tr><td>Ing. Especialista en Estimación</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50%</td></tr><tr><td>Profesional Ambiental</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50%</td></tr><tr><td>Profesional SISO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr><tr><td>Profesional Social</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50%</td></tr><tr><td>Topógrafo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50%</td></tr><tr><td>Inspector</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr><tr><td>Chiveros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50%</td></tr><tr><td>Secretaria</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50%</td></tr></tbody></table>						RELACION SEMANAL DE PERSONAL	L	M	M	J	V	S	D	DEDICACIÓN	Ing. Director de Interventoría								20%	Ing. Residente de Interventoría								100%	Ing. Auxiliar de Interventoría								100%	Ing. Especialista en Estimación								50%	Profesional Ambiental								50%	Profesional SISO								100%	Profesional Social								50%	Topógrafo								50%	Inspector								100%	Chiveros								50%	Secretaria								50%
RELACION SEMANAL DE PERSONAL	L	M	M	J	V	S	D	DEDICACIÓN																																																																																																									
Ing. Director de Interventoría								20%																																																																																																									
Ing. Residente de Interventoría								100%																																																																																																									
Ing. Auxiliar de Interventoría								100%																																																																																																									
Ing. Especialista en Estimación								50%																																																																																																									
Profesional Ambiental								50%																																																																																																									
Profesional SISO								100%																																																																																																									
Profesional Social								50%																																																																																																									
Topógrafo								50%																																																																																																									
Inspector								100%																																																																																																									
Chiveros								50%																																																																																																									
Secretaria								50%																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LUZ - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN																																																																																																																	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Acompañamiento y participación en reuniones de coordinación y reuniones de trabajo por la entidad contratante y por el contratista.																																																																																																																	
Ejecución del informe semanal																																																																																																																	
Trámites administrativos, salidas de campo y diligencias																																																																																																																	
Realización del informe semanal																																																																																																																	
Elaboración de Acta 03 de intervención																																																																																																																	
Revisión Acta 04 de obra																																																																																																																	
Revisión y aprobación de PGO																																																																																																																	
Verificación en campo de la ejecución de actividades, validación por el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.																																																																																																																	
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																	
Trabajo de campo, supervisión y verificación en campo de cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.																																																																																																																	
Realización del informe semanal																																																																																																																	
Verificación en campo de la ejecución de actividades, validación por el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.																																																																																																																	
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																																																																																																																	
OBSERVACIONES																																																																																																																	
Para esta semana de obra el contratista no según su programación se avanza semanal de 28,59% lo que se traduce en un acumulado del 74,81%. En relación a la ejecución para la semana se tiene una ejecución del 15,47% para un avance acumulado del 73,55%. No se presentaron incidencias.																																																																																																																	
REPRESENTANTE INTERVENTORIA  Roberto Leonardo Fariñas Alarcón																																																																																																																	

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks	Amount	Balance	Signature
1967	12	31	12:00	Home	Income	Salary	100.00	100.00	
1968	1	1	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	90.00	
1968	1	15	12:00	Home	Expense	Food	20.00	70.00	
1968	2	1	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	20.00	
1968	2	15	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	10.00	
1968	3	1	12:00	Home	Expense	Food	20.00	(10.00)	
1968	3	15	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	(60.00)	
1968	4	1	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	(70.00)	
1968	4	15	12:00	Home	Expense	Food	20.00	(90.00)	
1968	5	1	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	(140.00)	
1968	5	15	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	(150.00)	
1968	6	1	12:00	Home	Expense	Food	20.00	(170.00)	
1968	6	15	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	(220.00)	
1968	7	1	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	(230.00)	
1968	7	15	12:00	Home	Expense	Food	20.00	(250.00)	
1968	8	1	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	(300.00)	
1968	8	15	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	(310.00)	
1968	9	1	12:00	Home	Expense	Food	20.00	(330.00)	
1968	9	15	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	(380.00)	
1968	10	1	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	(390.00)	
1968	10	15	12:00	Home	Expense	Food	20.00	(410.00)	
1968	11	1	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	(460.00)	
1968	11	15	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	(470.00)	
1968	12	1	12:00	Home	Expense	Food	20.00	(490.00)	
1968	12	15	12:00	Home	Expense	Rent	50.00	(540.00)	
1968	12	31	12:00	Home	Expense	Utilities	10.00	(550.00)	

GRÁFICA SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

AVANCE GENERAL DE LA OBRA





ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07

VERSION: 01

FECHA DE VERSION:

26/09/2020

PAGINA:

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

DATOS ESPECIFICOS

FECHA	CLIMA	ESTADO DEL TIEMPO	INICIO	FIN	PRECIPITACIÓN (mm)	OBSERVACIONES
16 de marzo de 2026	Templado	Soleado	7:00:00 a. m.	5:00 pm	0,00	Ninguna
17 de marzo de 2026	Templado	Lluvia intensa	7:00:00 a. m.	5:00 pm	23,20	Ninguna
18 de marzo de 2026	Templado	Lluvia moderada	7:00:00 a. m.	5:00 pm	21,80	Ninguna
19 de marzo de 2026	Templado	Parcialmente nublado	7:00:00 a. m.	5:00 pm	0,00	Ninguna
20 de marzo de 2026	Templado	Soleado	7:00:00 a. m.	5:00 PM	0,00	Ninguna
21 de marzo de 2026	Templado	Lluvia intensa	7:00:00 a. m.	12:00 m	27,80	Ninguna

Convenciones:

CLIMA:

Cálido: Se caracterizan por unas temperaturas elevadas, y se encuentran ubicados en zonas con latitudes bajas.

Templado: Las temperaturas por lo general son moderadas, inclinándose más hacia las temperaturas frías en algunas épocas del año. Estos climas se localizan en latitudes medias.

Polar: Estos son los climas donde la predominancia del frío es completa.

ESTADO DEL TIEMPO

Soleado: Que presenta un cielo sin nubes y en el que brilla el sol.

Parcialmente Nublado: El estado del tiempo cuando las nubes están visiblemente presentes, pero no totalmente cubierto el cielo

Mayormente Nublado: 50% a 90% del Cielo está cubierto por Nubes

Nublado: 100% del Cielo está cubierto por Nubes

Lluvia Ligera: Tipo de precipitación que se caracteriza por tener un tamaño de gota pequeño

Lluvia Moderada: Tipo de precipitación con intensidad intermedia

Lluvia Intensa: Tipo de precipitación de alta intensidad, generalmente acompañada de fuertes viento y truenos y relámpagos

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

Residente de Interventoría



ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07 FECHA DE VERSION: 26/09/2020 PAGINA:

MAQUINARIA Y PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PERIODO EVALUADO: 9 AL 14 DE MARZO DE 2026 DE 2026

DESCRIPCION	Cant.	15	16	17	18	19	20	21
PERSONAL CONTRATISTA								
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6			6	6	6	6	6
OPERADORES DE EQUIPOS	5			5	5	5	5	5
PERSONAL TOPOGRAFIA	1			1	1	1	1	1
ALMACENISTA DE OBRA	1			1	1	1	1	1
CELADOR	1		1	1	1	1	1	1
AYUDANTES DE OBRA	14			12	13	12	12	12
OFICIALES DE OBRA	4			4	4	4	4	4
CONDUCTORES	4			4	4	4	4	4
MAESTROS DE OBRA	2			2	2	2	2	2
CONTROLADORES DE TRANSITO	6		3	5	5	5	5	5
MECANICO	1			1	1	1	1	1
SUBCONTRATISTA DE PAVIMENTO	8			6	6	6	6	6
SUBCONTRATISTA DE CAISSON	6		6	6	0	0	0	0
TOTAL PERSONAL EN OBRA	59	0	10	54	49	48	48	48

Maquinaria	Cant.							
EXCAVADORA HITACHI SX70	1		O	O	O	O	O	O
EXCAVADORA SHANTUI SE135	1		O	O	O	O	O	O
MOTO NIVELADORA	1		R	R	R	R	O	O
CONCRETADORA	2		O	O	O	O	O	O
REGLA DE PERFORACIÓN	1		O	O	O	O	O	O
PLANTA ELECTRICA	1		O	O	O	O	O	O
CILINDRO VIBROCOMPACTADOR BENETIN	3		O	O	O	O	O	O
BOBCAT	1		O	O	O	O	O	O
CANGURO VIBROCOMPACTADOR	1		O	O	O	O	O	O
MOTOBOMBA	1		O	O	O	O	O	O
VIBRADOR DE PUNTA	1		O	O	O	O	O	O
MARTILLO DEMOLEDOR	1		O	O	O	O	O	O
TRONZADORAS DE 9"	3		O	O	O	O	O	O
CORTADORA DE PAVIMENTO	2		O	O	O	O	O	O
VOQUETA PLACA OML220	1		O	O	O	O	O	O
VOQUETA PLACA OFTM329	1		O	O	O	O	O	O
VOQUETA PLACA OML204	1		O	O	O	O	O	O

PERSONAL INTERVENTORIA	Cant.							
Ing. Director de Interventoria	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Ing. Residente de Interventoria	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Ing. Auxiliar de Interventoria	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Ing. Especialista estructural	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Profesional Ambiental	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Profesional Syso	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Profesional Social	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Topógrafo	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Inspector	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC

CONVENCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO

D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.
R:	REPARACIÓN Y AJUSTES.
O:	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL

DTP:	DEDICACIÓN TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
	NO SE LABORÓ
I:	INCAPACIDAD
X:	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL



COLOMBIA - BOGOTÁ

PROYECTO: VILLAVIEJA

SECTOR: VILLAVIEJA

FECHA:

INFORME SEMANAL No. 24

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 000255 - 133 INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA UNIÓN - RESOLUTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENIENTE:

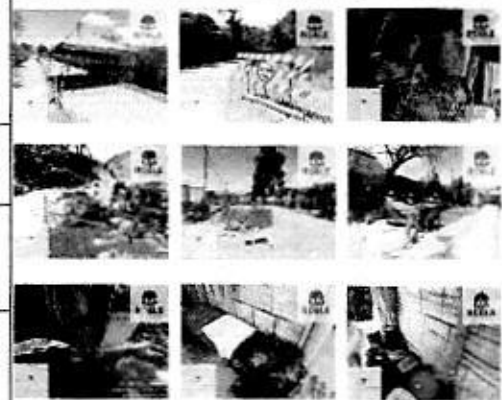
ROBLE INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA:

PRAXINCA Y CAJAS

SUPERVISOR:

MAPA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO			REGISTRO FOTOGRÁFICO
			S	NI	NA	
COMPONENTE AMBIENTAL						
Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	1.1. Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental, conformación grupo de gestión social y ambiental.	El día viernes 20 de marzo se llevó a cabo reunión de comité, conformado por Contratista, Interventista, Supervisión de Gobernación e Inviaga.	X			
	1.2. Capacitación y formación técnica al personal de obra	Durante la semana no se realizaron capacitaciones.			X	
	1.3. Cumplimiento de requerimientos legales	Durante la semana no se realizaron actividades relacionadas.			X	
Programa Actividades Constructivas	2.1. Manejo integral de Residuos de Construcción	Se verifica el adecuado manejo de materiales de construcción (suelo, cemento y material granular).	X			
	2.2 Señalización de obras y obras temporales	Se verifica que los diferentes elementos de señalización se encuentren correctamente instalados en las zonas de obra.	X			
	2.3 Manejo y disposición de escombros y lodos	Se verifica el acopio y manejo de RCD generado en las obras 2 y 3.	X			
	2.4. Manejo y disposición final de residuos sólidos domésticos y comerciales.	Se realiza la verificación y cumplimiento de los puntos ecológicos y el adecuado acopio de los RESPT.	X			
Programa de Gestión Hídrica	3.1 Manejo de aguas superficiales	Durante la semana no se han realizado labores relacionadas.			X	
	3.2 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	Se verifican las condiciones de las unidades sanitarias portátiles, se realizaron mantenimientos por Mantenap los días 17 y 20 de marzo.	X			
Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	4.1 Manejo de desarrollo y la cobertura vegetal	En el tramo 2 se continúa con las actividades en el laboreo para la construcción de caminos, como parte de las obras necesarias para la ejecución de la obra de protección en la zona de porción.	X			
	4.2 Recuperación de Áreas afectadas	No se han realizado actividades relacionadas.			X	
	4.3 Protección de Fauna	No se han realizado actividades relacionadas.			X	
Programa de Manejo de Instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.	5.1 Instalación, funcionamiento y mantenimiento de campamentos y áreas de acopio	Se cuenta con un campamento en el tramo 2, donde están ubicados los equipos (coordinación e instrumental), SAG, Almacén y el RESPEL. En el tramo 1, hay un campamento para los guardas de obra y el equipo de apoyo.	X			
	5.2 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Se verifican los niveles de combustible y el funcionamiento de la maquinaria y vehículos, la mayoría de ellos se encuentran funcionando.	X			



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN SST



CÓDIGO: 1416-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

8/28/2014

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17092020 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S. CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S. SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPONENTE SST

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL EN OBRA

INGRESOS - REINGRESOS

RETIROS

ADMINISTRATIVOS

EQUIPO DE TOPOGRAFIA

ALMACENISTA

AYUDANTE DE OBRA

OFICIALES

CONDUCTORES (volqueta / oruga)

MAESTRO

CELADOR

OPERARIOS DE MAQUINARIA

CONTROLADOR DE TRAFICO

MECANICO

SUBCONTRATISTA PAVIMENTO

SUBCONTRATISTA CAISSON

TOTAL TRABAJADORES

I

R

T

SI

No

NA



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL: No se presentaron ingresos.

X

ORDEN EXAMEN DE RETIRO

ORDENES PARA LA PRACTICA DEL EXAMEN DE RETIRO: Se presentan las cartas de remisión al examen de retiro.

X

LIQUIDACIONES

LIQUIDACIONES: El contratista presenta los certificados de liquidación del personal retirado.

X

ACCIDENTES E INCIDENTES

ACCIDENTES E INCIDENTES: No se han presentado incidentes ni accidentes laborales.

X

CONTROL DEL TRAFICO

REGULADORAS: Se cuenta con 6 reguladores de tránsito en obra.

X



SEÑALIZACION Y DEMARCAACION

SEÑALIZACION Y DEMARCAACIÓN: Se tiene implementado el Plan de Manejo de Tránsito de la obra

X



INDUCCIONES

INDUCCION SST: No se presentaron ingresos.

X

CAPACITACION	CAPACITACIÓN SST: No se realiza capacitación			X	
INSPECCIONES	INSPECCIONES PLANEADAS / DIARIAS: Se realizan pre operacionales de vehículos, maquinaria, inspección de EPP y herramientas manuales.	X			
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN : Se realiza entrega de los elementos de protección personal necesarios para cada labor.	X			
ORDEN Y ASEO	PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO: Se realizan jornadas de orden, limpieza y aseo.	X			
COMITES DE OBRA	COMITÉ TÉCNICO: Se realizó reunión de comité de obra el día 13 de marzo de 2026.	X			



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SOCIAL



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

26/09/2020

PAGINA:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 17082025 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUNTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S. CONTRATISTA: INGENIERIA RYO S.A.S. SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA

Durante la semana se evidencia que hay ingreso de personal de la zona de influencia de la obra y de sectores aledaños como la Enea y también del municipio de Villamaría. La permanencia de controladores viales tanto en el día como en la noche han permitido que se evidencia una mejor movilidad evitando accidentes de tránsito además de una adecuada señalización.

Desde la gestión social se tiene un acompañamiento continuo al personal de obra sobre casos específicos del control de emociones y sobre problemáticas familiares que mal canalizadas pueden desencadenar en un accidente de obra. El acompañamiento social es fundamental brindando un bienestar al trabajador y su familia.

Se evidencia un buen uso de los elementos de protección personal garantizando para prevenir un accidente en obra.

GENERACION DE EMPLEO

MOC INT	MOC INT	MOC CONT	MOC CONT	MOC CONT	MOC CONT	TOTAL
9	0	45	14	6	74	

CHARLAS

No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES
0	0



PROYECTO INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La profesional social del contratista ha estado en comunicación constante realizando respuesta inmediata por los chats de la comunidad, además de estar en comunicación permanente con la empresa Ternium y con la comunidad en general por medio del Comité de Participación Comunitaria informando sobre las actividades de obra, relacionadas con los pare y siga ubicados en los tres puntos de intervención. La información ha sido transmitida por medio de los chats comunitarios y el vos a vos.

Se estuvo realizando la convocatoria a la reunión de socialización general de avance del 50 % de ejecución de obra a la comunidad en general, para el día jueves 19 de marzo, con el apoyo de la profesional social de la Supervisión de la secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, con la elaboración de pieza comunicativa, además de la colaboración del Comité de Participación Comunitaria para la divulgación de información, por medio de chats comunitarios, WhatsApp y voz a voz. También se entregaron volantes informativos a la comunidad en general en los pare y siga.

Se participó en la reunión de socialización de avance del 50 % de ejecución de obra, con la participación de la Supervisión de la Gobernación de Caldas, Invias, Contratista y la Interventoría con su equipo social y técnico, donde se dieron a conocer generalidades de la obra y se percibió que la comunidad está satisfecha con el avance de la misma. La comunidad reiteró que se revisara la posibilidad de que los pare y siga que son prolongados se trate de no realizarlos en horas pico por comodidad de las personas que salen y entran a Gaitanero. La asistencia fue de 30 personas.

Desde el área social de INVIA ya se recibieron los formatos para el informe trimestral. Para el próximo miércoles 25 de marzo a las 8 de la mañana se tiene programada una reunión virtual con los profesionales de INVIA del área ambiental y social, con la Interventoría para revisar y dar claridad que formatos aplican para este contrato, según el PAGA.

REUNIONES DE SOCIALIZACION

No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES
1	30



PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

En la reunión de socialización del avance del 50% de ejecución de la obra, surge la PQR relacionada con las avarias de una vivienda ubicada cerca al puente de Tierra Viva, donde el propietario argumenta que es por el paso de las volquetas y maquinaria pesada. La profesional social de la Supervisión de la Gobernación toma la inquietud para revisarla, porque según lo explicado por el propietario fue ocasionado con el anterior contrato. Se realizaron la investigación y seguimiento para dar respuesta al propietario.

PQR

No RECIBIDOS	No ATENDIDOS
1	1



PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Durante la semana no se presentaron diligenciamientos de actas de vecindad y/o entorno, ni tampoco permisos de intervención en predios. Sin embargo, en el Comité de Obra desde el INVIAS, se solicitó al área social la programación de un encuentro entre los administrativos de Ternium, la Supervisión, Interventoría y el Invias, para revisar la posibilidad de que Ternium pueda ceder un espacio para construir el andén de la vía aportando a la seguridad vial. Desde la Supervisión de la Gobernación de Caldas se tuvo una reunión con la empresa Ternium para hablar sobre la posibilidad de construcción del andén al lado de su cerca, para dar garantía de seguridad vial, a lo que la gerente de Ternium responde no poder dar una respuesta inmediata y que realizaría reunión con el señor Alejandro Gutierrez para llegar a un acuerdo los dos, debido a que el señor Alejandro le alquila zona del parqueadero a Ternium. La reunión en conjunto se realizará el 06 de abril de 2026.		
	ACTAS DE VECINDAD	ACTAS DE INICIO / ENTORNO	PERMISOS
		0	0
PROYECTO CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Desde la gestión social del contratista se ha tenido una comunicación permanente con los integrantes del Comité de Participación para mantenerlos informados sobre cada actividad de la ejecución de obra, quienes se convierten en pieza fundamental para transmitir información a la comunidad en general sobre cierre totales y parciales de la vía. Los integrantes del Comité de participación Comunitaria asisten a la reunión general de socialización de la obra del avance del 50 %, el día jueves 19 de marzo a las 4 de la tarde en el Restaurante el Resero, quienes dan fe del buen desarrollo de la obra en sus tres frentes de trabajo.		
	CAPACITACIONES	No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES
		1	3
PROYECTOS PRODUCTIVOS	A la fecha no aplica		
PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL	A la fecha no aplica		
OTRAS ACTIVIDADES	El día jueves 19 de marzo se realiza el acta de pares de lo social, para revisar lo realizado y los pendientes de obra, para tenerlo en cuenta para el Comité Técnico de obra. El día viernes 20 de marzo se participa en Comité Técnico de Obra, con el acompañamiento de Supervisión de la Gobernación de Caldas con su equipo técnico y social, al igual que INVIAS, Contratista y la Interventoría, para dar a conocer lo realizado de las diferentes áreas y lo técnico.		





ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

26/09/2020

PAGINA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 24 Del: 15-mar-2025 Al: 21-mar-2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 172 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17092025 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN



FIGURADO DE ACERO PARA CAISSON - SECTOR PONTÓN



VACIADO DE MR 45 - SECTOR TERNUM



INSTALACIÓN DE ACERO CAISSON - SECTOR PONTÓN



REUNION DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DEL 50% DE EJECUCIÓN DE OBRA



VIGAS RETICULARES - SECTOR PANTALLA



INSTALACIÓN FORMALETA (FONDO) PARA LOSA - SECTOR PONTÓN



ACTA INFORME SEMANAL



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Informe semanal N°: 25 Semana de contrato N° 25 Del: 22-mar-25 Al: 28-mar-25

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 179 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° 17092025-1533

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - AREOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AL 28 de marzo de 2025		
PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	4,48%	79,13%
Valor	\$ 138.528.614	\$ 2.452.254.650

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AL 28 de marzo de 2025		
EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
(%)	1,78%	61,13%
Valor	\$ 54.925.284	\$ 2.507.189.191

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	INGENIERIA RYD S.A.S	
Representante Legal:	YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA	
Contrato No:	17092025-1533	
Valor inicial Estudios y Diseños:		
Valor de Obras	\$	3.090.518.083,50
Valor de Ajustes		
Valor Obras Manaja Ambiental		
Valor Total Actualizado:	\$	3.090.518.083,50
Valor Anticipo	\$	618.103.616,70
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio	
Plazo Actualizado:	Hasta el 31 de marzo de 2026	
Fecha de Iniciación:	30 de septiembre de 2025	
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025	
Fecha de Suspensión:		
Fecha de Reiniciación:		
Nueva fecha de terminación:	31 de marzo de 2026	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ROBLE INGENIERIA S.A.S.	
Representante Legal:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	
Contrato No:	17092025-1533	
Valor Total inicial: (Con IVA)	\$	337.767.800,00
Valor Total Actualizado:		
Valor Anticipo:		
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha de Iniciación:	30 de septiembre de 2025	
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025	
Fecha de Suspensión:		
Fecha de Reiniciación:		
Nueva fecha de finalización:	31 de marzo de 2026	
Plazo actualizado:	Hasta el 31 de marzo de 2026	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


DOMINGO (22):	- No se generan labores.
LUNES (23):	- No se generan labores, día festivo
MARTES (24):	- Sector Termitum: Instalación y compactación de subbase // Instalación de formateo para caja de sumidero y bordillo. // Se realizan llenos al costado de la vía. - Sector Termiales: Compactación de subbase. - Sector Pontón: Instalación y figurado de acero para losa y viga de baranda. - Sector Pantalla: Figurado e instalación de acero para vigas reticuladas.
MIÉRCOLES (25):	- Sector Termitum: Instalación y compactación de subbase // Toma de muestras de densidad y humedad // Vaciado de concreto MR 45 // Toma de muestras de concreto - Sector Termiales: Compactación de subbase. - Sector Pontón: Instalación y figurado de acero para losa y viga de baranda. - Sector Pantalla: Figurado e instalación de acero para vigas reticuladas.
JUEVES (26):	- Sector Termitum: Instalación y compactación de subbase // Vaciado de bordillo. // Figurado de acero para losas reforzadas // Cortes de pavimento - Sector Termiales: Compactación de subbase. - Sector Pontón: Instalación y figurado de acero para losa y viga de baranda. - Sector Pantalla: Figurado e instalación de acero para vigas reticuladas.
VIERNES (27):	- Sector Termitum: Instalación y compactación de subbase // Toma de muestras de densidad y humedad // Vaciado de bordillo. // Instalación de acero de losas de concreto que requieren refuerzo // Limpieza de material en cancha del Hotel Vahulla - Sector Termiales: Compactación de subbase. - Sector Pontón: Instalación y figurado de acero para losa y viga de baranda. - Sector Pantalla: Figurado e instalación de acero para vigas reticuladas. // Perfilación y mejoramiento geométrico de ingreso y salida al pontón. - Se realiza comité técnico en compañía del INVIAS, la supervisión, la interventoría y el centralista.
SÁBADO (28):	- Sector Termitum: Vaciado de pavimento MR 45 premezclado acelerado a 7 días // Toma de muestras de concreto // Instalación refuerzo para bordillo

ACTIVIDADES PARA LA PRÓXIMA SEMANA

- Sector Termitum: Vaciado de concreto MR 45 y construcción de bordillo.
- Sector Termiales: Instalación y compactación de subbase granular.
- Sector Pantalla: Armado de acero y vaciado de vigas reticuladas.
- Sector Pontón: Instalación de acero para zapata y vástago de obra complementaria // Demolición de box oculto existente. // Vaciado de losa.

OBSERVACIONES

INTERVENTORIA


Firma Representante de interventoría
Ingeniero Leonardo Fernández Aragón

ACTA INFORME SEMANAL

CÓDIGO: 14104-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN: 30/09/2020

PÁGINA:

OBJETO CONTRATO:

CONTRATO N° 17092025 - 1533

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 25

Del: 22-mar-2026

Al: 28-mar-2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 179 días

Contratista de Interventoría: ROBLE INGENIERÍA S.A.S.

Representante legal: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

Contrato No: 17092025-1533

Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio.

Del: 30 de septiembre de 2025

Hasta: 31 de diciembre de 2025

Plazo: 3 meses

Adición: N/A

Coordinador de Zona: Juan David Duque

Fecha terminación: Hasta el 31 de marzo de 2026

PROGRAMADO

SEMANAL

ACUMULADO

Inversión programada (%)

3,85%

94,15%

Inversión del contrato :

\$ 12.801.070

\$ 324.776.730

Costo de personal

\$ 0.753.265

\$ 243.932.131

Primes de localización

\$ 1.123.804

\$ 28.092.068

Costos Directos Fijos

\$ 559.827

\$ 14.245.673

Gastos Reembolsables

\$ 1.544.154

\$ 38.603.846

Valor del contrato

\$ 337.987.208,00

PERSONAL DE INTERVENTORIA

RELACIÓN SEMANAL DE PERSONAL

	L	M	M	J	V	S	D	DEDICACIÓN
Ing. Directora de Interventoría					X			20%
Ing. Residente de Interventoría			X	X	X	X	X	100%
Ing. Auxiliar de Interventoría			X	X	X	X	X	100%
Ing. Especialista en Estructuras					X			50%
Profesional Ambiental					X			50%
Profesional SISO			X	X	X	X	X	100%
Profesional Social			X	X	X	X	X	100%
Topógrafo			X	X	X	X	X	100%
Ingeniero			X	X	X	X	X	100%
Calificador						X	X	50%
Secretaria						X	X	50%

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA SIERRITA - APARCITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Selección de Puntos para la obra
Elaboración de informe ambiental
Trámites administrativos asociados a la obra
Revisión y aprobación de PDCO
Elaboración acta de junta y control técnico.
Verificación en campo de la ejecución de obras, velando por el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Trámites de licencias, acompañamiento y verificación en el uso de elementos de protección personal.
Redacción del informe mensual

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Verificación y revisión del informe mensual de la obra.
Verificación en campo de la ejecución de obras, velando por el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

OBSERVACIONES
Para esta semana de obra el contratista debe seguir a reprogramación un avance semanal de 28,85%, lo que se reduce en un acumulado del 70,33%. En relación a la ejecución para la semana se tiene una ejecución del 1,78% para un avance acumulado del 1,13%. No se presentaron retardos.

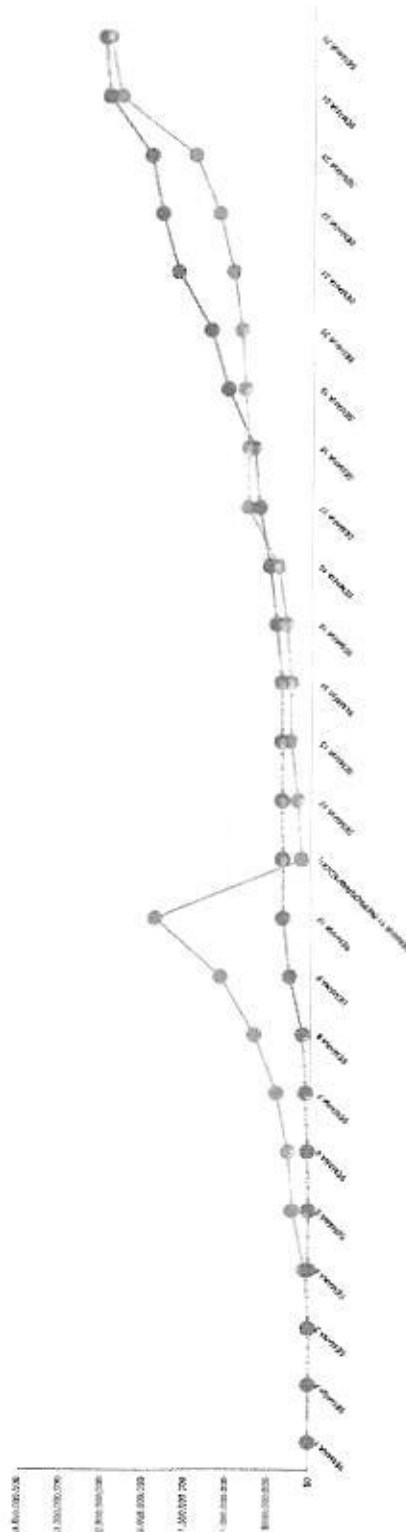
REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Firma del representante de Interventoría
Juan David Duque

[illegible]

GRÁFICA SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

[illegible]

AVANCE GENERAL DE LA OBRA





ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07

VERSION: 01

FECHA DE VERSION:

26/09/2020

PAGINA:

ESTADO DEL TIEMPO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACION

DATOS ESPECIFICOS

FECHA	CLIMA	ESTADO DEL TIEMPO	INICIO	FIN	PRECIPITACION (mm).	OBSERVACIONES
23 de marzo de 2026	Calido	Lluvia ligera	7:00:00 a. m.	5:00 pm	2.80	Ninguna
24 de marzo de 2026	Calido	Lluvia moderada	7:00:00 a. m.	5:00 pm	12.60	Ninguna
25 de marzo de 2026	Calido	Soleado	7:00:00 a. m.	5:00 pm	0.00	Ninguna
26 de marzo de 2026	Calido	Lluvia Ligera	7:00:00 a. m.	5:00 pm	4.20	Ninguna
27 de marzo de 2026	Calido	Lluvia moderada	7:00:00 a. m.	5:00 PM	9.00	Ninguna
28 de marzo de 2026	Calido	Soleado	7:00:00 a. m.	12:00 m	0.00	Ninguna

Convenciones:

CLIMA:

Calido: Se caracterizan por unas temperaturas elevadas, y se encuentran ubicados en zonas con latitudes bajas.

Templado: Las temperaturas por lo general son moderadas, inclinándose más hacia las temperaturas frías en algunas épocas del año. Estos climas se localizan en latitudes medias.

Polar: Estos son los climas donde la predominancia del frío es completa.

ESTADO DEL TIEMPO

Soleado: Que presenta un cielo sin nubes y en el que brilla el sol.

Parcialmente Nublado: El estado del tiempo cuando las nubes están visiblemente presentes, pero no totalmente cubierto el cielo

Mayormente Nublado: 50% a 90% del Cielo está cubierto por Nubes

Nublado: 100% del Cielo está cubierto por Nubes

Lluvia Ligera: Tipo de precipitación que se caracteriza por tener un tamaño de gota pequeño

Lluvia Moderada: Tipo de precipitación con intensidad intermedia

Lluvia Intensa: Tipo de precipitación de alta intensidad, generalmente acompañada de fuertes viento y truenos y relámpagos

Los eventos de precipitación moderada o intensa, determinan la suspensión temporal de las actividades de ejecución de Obra.

Residente de Interventoria



ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07 FECHA DE VERSION : 26/09/2020 PAGINA:

MAQUINARIA Y PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

PERIODO EVALUADO: 9 AL 14 DE MARZO DE 2020 DE 2020

DESCRIPCION	Cant.	22	23	24	25	26	27	28
PERSONAL CONTRATISTA								
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6		6	6	6	6	6	6
OPERADORES DE EQUIPOS	5		5	5	5	5	5	5
PERSONAL TOPOGRAFIA	1		1	1	1	1	1	1
ALMACENISTA DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1
CELADOR	1		1	1	1	1	1	1
AYUDANTES DE OBRA	12		12	12	12	11	11	11
OFICIALES DE OBRA	3		3	3	3	3	3	3
CONDUCTORES	4		4	4	4	5	5	5
MAESTROS DE OBRA	2		2	2	2	2	2	2
CONTROLADORES DE TRANSITO	6		5	5	5	5	5	5
MECANICO	1		1	1	1	1	1	1
SUBCONTRATISTA DE PAVIMENTO	6		6	6	6	6	6	6
TOTAL PERSONAL EN OBRA	48	0	47	47	47	47	47	47

Maquinaria	Cant.							
EXCAVADORA HITACHI SX70	1		0	0	0	0	0	0
EXCAVADORA SHANTUI SE135	1		0	0	0	0	0	0
MOTO NIVELADORA	1		0	0	0	0	0	0
CONCRETADORA	2		0	0	0	0	0	0
REGLA DE PERFORACIÓN	1		0	0	0	0	0	0
PLANTA ELECTRICA	1		0	0	0	0	0	0
CLINDRO VIBROCOMPACTADOR BENITIN	3		0	0	0	0	0	0
BOBCAT	1		0	0	0	0	0	0
CANGURO VIBROCOMPACTADOR	1		0	0	0	0	0	0
MOTOBOMBA	1		0	0	0	0	0	0
VIBRADOR DE PUNTA	1		0	0	0	0	0	0
MARTILLO DEMOLEDOR	3		0	0	0	0	0	0
TRONZADORAS DE 9"	2		0	0	0	0	0	0
CORTADORA DE PAVIMENTO	1		0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA OML220	1		0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA OFTM029	1		0	0	0	0	0	0
VOLQUETA PLACA OML204	1		0	0	0	0	0	0

PERSONAL INTERVENTORIA	Cant.							
Ing. Director de Interventoria	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Ing. Residente de Interventoria	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Ing. Auxiliar de Interventoria	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Ing. Especialista estructural	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Profesional Ambiental	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Profesional Syso	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC
Profesional Social	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Topografo	1		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP	DTP
Inspector	1		DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC

CONVENCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO

D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.
R:	REPARACIÓN Y AJUSTES.
O:	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL

DTP:	DEDICACIÓN TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
	NO SE LABORÓ
I	INCAPACIDAD
X*	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

CONTRATO: INTERVENCIÓN		FECHA DE INICIO: 15/01/2011		FECHA DE TÉRMINO: 31/12/2011		PÁGINA: 1	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO EN OBRA							
CONTRATO: N° 17000-01-1001 INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ANDESOL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, NORMALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN							
INTERVENCIÓN		NÚMERO DE FOLIO		CONTRATISTA		INTERVENIDOR	
PROGRAMA		PROYECTOS		ACTIVIDADES		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
COMPONENTE AMBIENTAL							
Programa de Desarrollo y Aplicación en la Gestión Ambiental	1.1. Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental, con énfasis en el grupo de gestión ambiental, ambiental	El día viernes 27 de marzo se llevó a cabo reunión de consejo, convocada por Comisaría, Interventora, Subcomisión de Gobernación y Leve.		X			
	1.2. Capacitación y sensibilización para el personal de obra	Se realizó la sensibilización a los trabajadores de la obra.			X		
	1.3. Cumplimiento de obligaciones legales	Se realizó la entrega de los documentos legales correspondientes.			X		
Programa Actividades Constructivas	2.1. Manejo Integral de Residuos de Construcción	Se verifica el adecuado manejo de residuos de construcción de obra, cemento y material granular.		X			
	2.2. Seleccionar y aplicar los tipos de obra y a los materiales	Se verifica que los diferentes elementos de construcción se encuentren conformes a los estándares en los trabajos de obra.		X			
	2.3. Manejo y disposición de residuos y basura	Se verifica el manejo y disposición de residuos generados en la obra.		X			
	2.4. Manejo y disposición de residuos de construcción y demolición	Se verifica el manejo y cumplimiento de los puntos ecológicos y el adecuado manejo de los residuos.		X			
Programa de Gestión y Mantenimiento	3.1. Manejo de residuos sólidos	Se verifica el manejo y disposición de residuos sólidos.			X		
	3.2. Manejo de residuos líquidos, atmosféricos o ruidos	Se verifican los estándares de las unidades sanitarias, se realizan monitoreos por Vicio los días 24 y 27 de marzo.		X			
Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	4.1. Manejo de residuos y basura orgánica	En el mes 3 se continuó las actividades en el sitio de obra, se construyeron los muros, se continuó con los trabajos necesarios para la ejecución de la obra.		X			
	4.2. Manejo de residuos sólidos	No se han realizado actividades relacionadas.			X		
	4.3. Protección del suelo	No se han realizado actividades relacionadas.			X		
Programa de Manejo de Instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.	5.1. Instalación, funcionamiento y mantenimiento de maquinaria y equipos	Se verificó el funcionamiento de la maquinaria, se continuó con los trabajos necesarios para la ejecución de la obra.		X			
	5.2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Se verificó el control de emisiones y el funcionamiento de la maquinaria y vehículos, la maquinaria se encuentra en funcionamiento.		X			



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN SST



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

8/28/2014

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17092025 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S. CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S. SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENZUELA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPONENTE SST

PERSONAL EN OBRA

	I	R	T			
INGRESOS - REINGRESOS	1					
RETIROS		2				
ADMINISTRATIVOS	6					
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1					
ALMACENISTA	1					
AYUDANTE DE OBRA	12					
OFICIALES	5					
CONDUCTORES (volqueta / oruga)	4					
MAESTRO	2					
CELADOR	1					
OPERARIOS DE MAQUINARIA	5					
CONTROLADOR DE TRAFICO	6					
MECÁNICO	1					
SUBCONTRATISTA PAVIMENTO	8					
TOTAL TRABAJADORES	52	2	0			



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL: Se presentan los certificados de aptitud médico ocupacional de ingreso del personal nuevo.

X

ORDEN EXAMEN DE RETIRO

ORDENES PARA LA PRACTICA DEL EXAMEN DE RETIRO: Se presentan las cartas de remisión al examen de retiro.

X

LIQUIDACIONES

LIQUIDACIONES: El contratista presenta los certificados de liquidación del personal retirado.

X

ACCIDENTES E INCIDENTES

ACCIDENTES E INCIDENTES: No se han presentado incidentes ni accidentes laborales.

X

CONTROL DEL TRAFICO

REGULADORAS: Se cuenta con 6 reguladores de tránsito en obra.

X



SEÑALIZACION Y DEMARCAACION

SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN: Se tiene implementado el Plan de Manejo de Tránsito de la obra

X



INDUCCIONES

INDUCCION SST: Se realiza la inducción SST al personal nuevo.

X

CAPACITACION	CAPACITACIÓN SST: Se realiza socialización del MEDEVAC procedimiento de evacuación médica.	X			
INSPECCIONES	INSPECCIONES PLANEADAS / DIARIAS: Se realizan pre operacionales de vehículos, maquinaria, Inspección de EPP y herramientas manuales.	X			
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION : Se realiza entrega de los elementos de protección personal necesarios para cada labor.	X			
ORDEN Y ASEO	PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO: Se realizan jornadas de orden, limpieza y aseo.	X			
COMITES DE OBRA	COMITÉ TÉCNICO: Se realizó reunión de comité de obra el día 28 de marzo de 2026.	X			



INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SOCIAL



CÓDIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

FECHA DE VERSIÓN:

26/09/2020

PAGINA:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: N° 17092025 - 1530 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACION

INTERVENTOR:

ROBLE INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA:

INGENIERIA RYD S.A.S

SUPERVISOR:

MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

PROGRAMAS

ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA

Durante la semana se evidencia que hay ingreso de personal de la zona de influencia de la obra y de sectores aledaños como la Ensa y también del municipio de Villamaría. La permanencia de controladores viales tanto en el día como en la noche han permitido que se evidencia una mejor movilidad evitando accidentes de tránsito además de una adecuada señalización.

Se evidencia un buen uso de los elementos de protección personal garantas para prevenir un accidente en obra.

Se evidencia que hay un buen manejo con los pare y siga por medio de los controladores viales.

GENERACION DE EMPLEO

MOC INT	MONC INT	MOC CONT	MONC CONT	MCF	TOTAL
3	0	40	14	6	63

CHARLAS

No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES
0	0



PROYECTO INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

El día viernes 20 de marzo, en el tramo de Ternium cuando se encontraban vaciando la losa una Tractomula paso y afecto el concreto al pasar sus llantas lo que ocasionó daños en el vaciado, inmediatamente el contratista saca un oficio hacia la empresa Ternium comentando la situación para salvaguardar las actividades de obra y sentar precedente de lo ocurrido.

El día miércoles 25 de marzo se participó en reunión virtual, programada por la profesional social de Invias, participaron tres funcionarios y entre ellas las encargadas del área social y ambiental, con el objetivo de resolver inquietudes referentes al diligenciamiento de los formatos que componen los informes trimestrales, donde tanto desde el área social como ambiental de la Interventoría se dió a conocer cómo se está manejando la información a través de los informes semanales, informes mensuales con sus respectivos anexos y todos ellos basados en los programas que se especifican en el PAGA y lo entregado por el contratista, los cuales son enviados a la Supervisión de la Gobernación de Caldas. En conclusión INVIAS ya recibió el PAGA pero no lo han revisado para poder dar las respectivas indicaciones sobre el diligenciamiento de los formatos, a lo cual estaremos atentos desde el área social y ambiental.

La profesional social del contratista ha estado en comunicación constante realizando respuesta inmediata por los chats de la comunidad, además de estar en comunicación permanente con la empresa Ternium y con la comunidad en general por medio del Comité de Participación Comunitaria informando sobre las actividades de obra, relacionadas con los pare y siga ubicados en los tres puntos de intervención. La información ha sido transmitida por medio de los chats comunitarios y el vos a vos.

REUNIONES DE SOCIALIZACION

No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES
1	30



PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El contratista da cumplimiento a la solución de la PQR presentada por la administración del Hotel Valhalla, donde se construye el acceso a la cancha sintética.

El día jueves 26 de marzo se presentó PQR por parte de la Administración del Hotel Valhalla, relacionada con deslizamiento presentado de la vía hacia la cancha sintética del hotel, por lo cual el día viernes 27 de marzo se realizó limpieza al talud con maquinaria para revisar que obra de estabilidad realizar allí.

PQR

No RECIBIDOS	No ATENDIDOS
1	1



PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Durante la semana no se presentaron diligenciamientos de actas de vecindad y/o entorno, ni tampoco permisos de intervención en predios. Sin embargo, en el Comité de Obra desde el INVIAS, se solicitó al área social la programación de un encuentro entre los administrativos de Ternium, la Supervisión, Interventoría y el Invias, para revisar la posibilidad de que Ternium pueda ceder un espacio para construir el andén de la vía aportando a la seguridad vial. El día jueves 26 de marzo se presenta deslizamiento de la vía hacia la cancha sintética del Hotel Valhjala, el contratista realizó limpieza del talud con maquinaria para revisar que manejo se lo puede dar para estabilizarlo, cuando se defina dicha acción se le informará al propietario de la cancha sintética.			
	ACTAS DE VECINDAD	ACTAS DE INICIO / ENTORNO	PERMISOS	
		0	0	
PROYECTO CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Desde la gestión social del contratista se ha tenido una comunicación permanente con los integrantes del Comité de Participación para mantenerlos informados sobre cada actividad de la ejecución de obra, quienes se convierten en pieza fundamental para transmitir información a la comunidad en general sobre cierre totales y parciales de la vía.			
	CAPACITACIONES	No DE EVENTOS	No DE ASISTENTES	
		1	3	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	A la fecha no aplica			
PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL	A la fecha no aplica			
OTRAS ACTIVIDADES	El día jueves 26 de marzo se realiza el acta de pares de lo social, para revisar lo realizado y los pendientes de obra, para tenerlo en cuenta para el Comité Técnico de obra. El día viernes 27 de marzo se participa en Comité Técnico de Obra, con el acompañamiento de Supervisión de la Gobernación de Caldas con su equipo técnico y social, al igual que INVIAS, Contratista y la Interventoría, para dar a conocer lo realizado de las diferentes áreas y lo técnico. Durante el comité Técnico se solicitó desde la Interventoría al INVIAS dar claridad en cuanto a la presentación de los informes trimestrales desde el área social y ambiental, donde se entiende que la Interventoría envía informes a la Supervisión de la Gobernación de Caldas y debería ser la Supervisión quien envíe esta información			



ACTA INFORME SEMANAL



CODIGO: 1410-F-07

VERSIÓN: 01

26/09/2020

PAGINA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 25 Del: 22-mar-2020 Al: 28-mar-2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 179 días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO: N° 17092025 - 1533 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN



INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA BORDILLO - TRAMO 01
TERNIUM



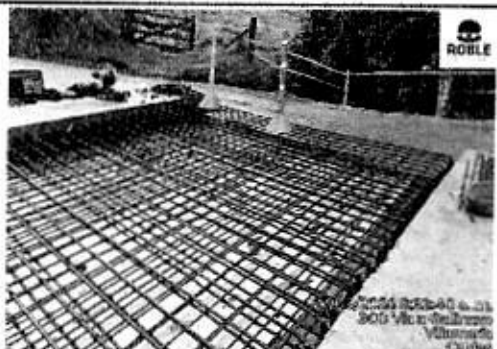
VACIADO DE CONCRETO - TRAMO 1 TERNIUM



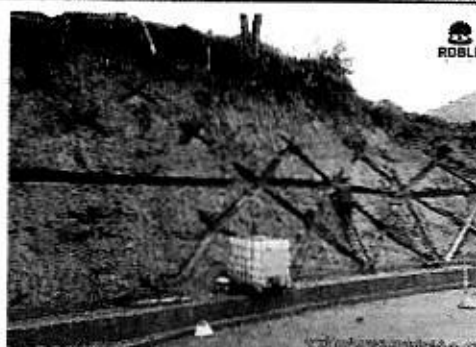
INSTALACIÓN DE SUBBASE - TRAMO 02 TERMALES



PERFILACION DE MEJORAMIENTO GEOMÉTRICO - TRAMO 03
PANTALLA



ACERO DE REFUERZO LOSA - TRAMO 03 PONTÓN



INSTALACIÓN DE ACERO VIGA RETICULAR - TRAMO 03 PANTALLA



ROBLE
INGENIERÍA

ACTAS DE PARES



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 18

INGENIERÍA RYD S.A.S

Fecha: marzo 05 del 2026

Hora: 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Lugar: FRENTE DE TRABAJO

MIEMBROS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	Ingeniero Residente de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	Ingeniero Residente de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	Ingeniera Auxiliar de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	Profesional Social de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTÉS	Profesional SST de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
VICTORIA FERNANDA SUÁREZ PAVA	Profesional SST de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	Profesional Social de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
LEYDY ESTEFANY CORTÉS LLANO	Profesional Ambiental de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	Profesional Ambiental de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	

TEMAS

- 1- Área Ambiental
- 2- Área Social
- 3- Área SST
- 4- Área Técnico



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 18

INGENIERÍA RYD S.A.S

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Área Ambiental

Conforme al avance de obra en la semana, en los aspectos ambientales se resalta lo siguiente:

1.1 En el marco de las lluvias intensas registradas recientemente en la zona, se destacan las medidas preventivas que se vienen implementando en los frentes de obra:

- La semana pasada se realizó la limpieza del cauce en el tramo 3, donde se adelanta la construcción del pontón.
- Se ha venido dando cumplimiento a las medidas de demarcación, señalización y cobertura de materiales en obra.
- En este mismo sentido, se recomienda continuar procurando que los frentes de obra permanezcan libres de escombros o desechos al finalizar cada jornada.

Estas acciones contribuyen a mantener condiciones adecuadas de orden y organización en los frentes de trabajo, lo cual resulta especialmente relevante como medida preventiva frente a los eventos de lluvia que se vienen presentando en la región.

2. Área Social

2.1 Teniendo en cuenta que ya se tiene más del 50% de ejecución de obra, desde el área social del Contratista, interventoría y la Supervisión se empieza con la programación para la socialización de avance de ejecución de obra con la comunidad en general, la cual se realizará el día jueves 19 de marzo a las 4:00 de la tarde en el Restaurante El Resero. La divulgación de información para la convocatoria será apoyada por la supervisión y por el Comité de Participación Comunitaria.

2.2 El día jueves 05 de marzo se realiza capacitación con el personal de la obra en general, donde todas las Áreas intervinieron con su respectiva temática, es así como la profesional social del contratista participa con el tema de la importancia de la comunicación asertiva.

2.3 Se continua con la divulgación de información sobre las diferentes actividades de la obra, por medio de los chats comunitarios, WhatsApp y el Comité de Participación Comunitaria.

3. Área de seguridad y salud en el trabajo

3.1 El personal en obra es de 58 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

- 1 Representante legal
- 1 Director de obra
- 1 Ingeniero Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional ambiental
- 1 Profesional social



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NRO 18

INGENIERÍA RYD S.A.S

- 1 Inspector
- 1 Maestro
- 1 Topógrafo
- 5 Operadores de maquinaria
- 5 Conductores
- 4 Oficiales
- 19 Ayudantes
- 1 Celador
- 1 Almacenista
- 8 Reguladores de tránsito
- 1 Mecánico
- 5 operarios de concreto subcontratista

3.2. Se presentaron las afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médicos ocupacionales de ingreso e inducciones SST del personal nuevo.

3.3. Se realizó capacitación sobre buen trato y comunicación asertiva.

3.4. Se realizó entrega de los elementos de protección personal.

3.5. Se realizó inspección de herramientas manuales, EPP y pre operacionales de maquinaria.

3.6. No se presentaron incidentes ni accidentes de origen laboral, tampoco casos de ausentismo nuevos por causa médica.

3.7. Se revisaron los documentos que respaldan los trabajos seguros en alturas para la construcción de los anclajes en la pantalla reticular, se genera un concepto favorable por parte de la Interventoría.

3.8. Se revisan los permisos de trabajo seguro en alturas, el Análisis de Trabajo Seguro y las medidas de seguridad en la construcción de la pantalla reticular.

4. Área Técnica:

Durante la semana y a partir del avance en cada uno de los frentes, se ejecuta reunión entre residentes de obra estableciendo los siguientes aspectos de importancia.

4.1 En relación al aspecto financiero de la obra el contratista describe para la presente semana una programación acumulada de \$1.126.256.795 que corresponde a un 36.44% y una ejecución acumulada de \$ 1.674.373.878 correspondiente a un 54.18%. Esto significa un avance del 17.74%. Se recalca que el valor ejecutado es obtenido con los ítems ejecutados a fecha de elaboración de la presente acta.



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NRO 18

INGENIERÍA RYD S.A.S

4.2 Para el frente 01 (**Pavimento Rígido**) el contratista ya inicio la instalación de pavimento **MR-45** en la margen derecha reforzando aquellas losas requeridas. De igual manera se continua con la adecuación y compactación de la subbase granular en la zona inferior debido a los continuos episodios de lluvia que han afectado el material instalado. Son ejecutadas pruebas de densidad corroborando el cumplimiento de la normativa.

4.3 En frente 02 (**Pavimento Flexible**) el contratista ya culmino con las obras hidráulicas previas, ejecuto el mejoramiento de la subrasante mediante sustitución de material incompetente, a la fecha se encuentra en la instalación de estructura granular. Durante la semana el personal técnico de interventoría solicita cubrir la subbase con plástico evitando perdida de finos, dicha recomendación es acatada por el contratista al extender y compactar el material.

4.4 Las intervenciones en el frente 03 (**Pantalla reticular**) transcurren sin contratiempos, actualmente el contratista se encuentra realizando las perforaciones para la segunda línea de anclajes. Desde interventoría se genera la solicitud en la aplicación de la lechada para los anclajes conforme a los diseños suministrados por la entidad contratante.

4.5 Respecto a los avances generales para el frente 03 (**Pontón**) durante la semana el contratista ejecuta el vaciado de un porcentaje de la pantalla entre Caisson 5-6-7-8 y planea realizar la misma actividad con una sección de igual dimensión entre los Caisson 1-2-3-4.

4.6 El contratista ejecuta actividades preliminares para obra de estabilidad complementaria que permita el ingreso y salida del pontón construido. Se suministró adecuaciones al diseño propuesto, este es estudiado nuevamente por el profesional especializado de la interventoría y su respuesta se remitirá mediante informe con copia a la entidad contratante.

4.7 Se indica el avance en los tramites administrativos de las solicitudes presentadas por contratista de obra e interventoría respecto a la adición y proroga de los contratos. La documentación se encuentra en proceso de análisis por parte de la entidad contratante

4.8 Finalmente se indica a la entidad que según las intervenciones en tramo 01 (pavimento rígido) es indispensable un análisis de seguridad vial dado que la zona no presenta andenes, se evidencia alto flujo peatonal y tránsito de vehículos pesados. Lo anterior busca que se establezcan medidas que permitan la seguridad vial de la zona.









NOTA: Toda la información suministrada en el presente documento fue determinada en conjunto generando claridad acerca de los aportes y necesidades que a la fecha conllevan el proyecto.

	ROBLE INGENIERIA S.A.S NIT: 901526157-4	INGENIERÍA RYD S.A.S
	ACTA DE REUNIÓN	
	ACTA NRO <u>19</u>	

Fecha: marzo 12 del 2026

Hora: 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Lugar: FRENTES DE TRABAJO

MIEMBROS ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	Ingeniero Residente de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	Ingeniero Residente de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	Ingeniera Auxiliar de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	Profesional Social de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTÉS	Profesional SST de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
VICTORIA FERNANDA SUÁREZ PAVA	Profesional SST de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	Profesional Social de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
LEYDY ESTEFANY CORTÉS LLANOS	Profesional Ambiental de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	Profesional Ambiental de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	

TEMAS
1- Área Ambiental
2- Área Social
3- Área SST
4- Área Técnico

	ROBLE INGENIERIA S.A.S NIT: 901526157-4	INGENIERÍA RYD S.A.S
	ACTA DE REUNIÓN	
	ACTA NRO <u>19</u>	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ÁREA AMBIENTAL

En desarrollo de las actividades de seguimiento al componente ambiental del proyecto, se realizó recorrido de verificación por los diferentes frentes de obra, con el propósito de evaluar las condiciones de manejo ambiental y de seguridad asociadas a las actividades constructivas. Durante la visita se evidenció que la señalización y la demarcación de los frentes de trabajo se encuentran instaladas y operando adecuadamente. De igual manera, se verificó que las unidades sanitarias portátiles (UPS) y los puntos ecológicos se encuentran disponibles y en funcionamiento, garantizando condiciones básicas de saneamiento para el personal que labora en obra.

No obstante, teniendo en cuenta las precipitaciones registradas en las últimas semanas, se observó que parte del material granular acopiado en algunos tramos presenta procesos de lavado y arrastre, generando que pequeñas cantidades de material se depositen sobre la superficie de la vía. Esta situación, además de representar una pérdida del material dispuesto, puede generar condiciones de menor adherencia sobre la calzada y, en consecuencia, aumentar el riesgo de accidentes para los usuarios.

En este sentido, se recomienda fortalecer las medidas de manejo y cubrimiento del material granular dispuesto en los frentes de obra, así como realizar la limpieza o retiro oportuno del material que llegue a la calzada, con el fin de prevenir su arrastre por escorrentía, mantener el orden en obra y garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial.

2. ÁREA SOCIAL

2.1 Se está realizando la convocatoria a la reunión de socialización general de avance del 50 % de ejecución de obra a la comunidad en general, para el día jueves 19 de marzo, con el apoyo de la profesional social de la Supervisión de la secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, con la elaboración de pieza comunicativa, además de la colaboración del Comité de Participación Comunitaria para la divulgación de información, por medio de chats comunitarios, WhatsApp y voz a voz.

2.2 Desde el área social del Contratista se está a la espera de coordinar la fecha de disponibilidad del secretario de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, para programar nuevamente la

	ROBLE INGENIERIA S.A.S NIT: 901526157-4	INGENIERÍA RYD S.A.S
	ACTA DE REUNIÓN	
	ACTA NRO <u>19</u>	

reunión que se había solicitado en comité de obra con la gerencia de Ternium, frente a la temática relacionada con la posibilidad de la construcción del andén.

2.3 La profesional social del contratista recibe la solicitud de la administración del Hotel Valhala, relacionada con realizar el acceso hacia la cancha sintética, teniendo en cuenta que ya se está realizando la pavimentación de la vía, a lo cual se da respuesta inmediata y se afirma que apenas se termine de pavimentar el otro lado de la vía, se construirá inmediatamente dicho acceso.

3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1 El personal en obra es de 67 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

- 1 Representante legal
- 1 Director de obra
- 1 Ingeniero Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional ambiental
- 1 Profesional social
- 1 Inspector
- 1 Maestro
- 1 Topógrafo
- 5 Operadores de maquinaria
- 5 Conductores
- 4 Oficiales
- 19 Ayudantes
- 1 Celador
- 1 Almacenista
- 8 Reguladores de tránsito
- 1 Mecánico
- 8 operarios de concreto subcontratista
- 6 Operarios de construcción de caisson.

3.2. Se presentaron las afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médicos ocupacionales de ingreso e inducciones SST del personal nuevo.

3.3. Se realizó divulgación del procedimiento seguro para la construcción de los caissons al subcontratista Detonaciones AMC S.A.S.

3.4. Se realizó entrega de los elementos de protección personal

	ROBLE INGENIERIA S.A.S NIT: 901526157-4	INGENIERÍA RYD S.A.S
	ACTA DE REUNIÓN	
	ACTA NRO <u>19</u>	

3.5. Se realizó inspección de herramientas manuales, EPP y pre operacionales de maquinaria.

3.6. No se presentaron incidentes ni accidentes de origen laboral, tampoco casos de ausentismo nuevos por causa médica.

3.7. Se revisaron los documentos que respaldan los trabajos seguros en alturas para la construcción de los caissons, se genera un concepto favorable por parte de la Interventoría.

3.8. Se revisan los permisos de trabajo seguro en alturas, el Análisis de Trabajo Seguro y las medidas de seguridad en la construcción de la pantalla reticular. Se realiza seguimiento a los permisos de alturas, espacios confinados y mediciones de gases atmosféricos en los Caisson.

4. ÁREA TÉCNICA

En cumplimiento a las obligaciones contractuales que rigen tanto para el contratista de obra **INGENIERÍA RYD S.A.S** como el contratista de interventoría **ROBLE INGENIERÍA S.A.S**, se ejecuta reunión entre ingenieros residentes determinando los siguientes aspectos de importancia.

4.1 ASPECTO FINANCIERO: Para la presente semana el contratista indica en su última programación de obra remitida donde incluye los ítems no previstos un acumulado de **\$1.420.807.660** que corresponde a un **45.97%**, respecto a la ejecución acumulada se tienen un valor de **\$1.905.941.785** correspondiente a un **61.67%**. lo anterior se traduce en un avance del cronograma del **15.7%**.

4.2 FRENTE 01 PAVIMENTO RÍGIDO: Actualmente el contratista presenta un avance significativo en las intervenciones con más de **400 m3** de pavimento **MR 45** aplicados sobre la superficie, esto incluye la instalación de subbase granular con su debida compactación, instalación de canastillas con dovelas y la posterior construcción de bordillo. Debido a la precipitación recurrente en la zona se ha presentado afectación de la estructura granular de soporte lo que ha obligado a continuos procesos, este hecho es puesto a consideración por parte del contratista. En otros aspectos fundamentales se debe determinar actividades que permitan un control y manejo a procesos de escorrentía en margen derecha evitando afectación por socavaciones y lavado de la superficie de apoyo de las placas o losas.

4.3 FRENTE 02 PAVIMENTO FLEXIBLE: Para las intervenciones en este frente el contratista ha ejecutado instalación de subbase granular, sin embargo, debido a las continuas precipitaciones se



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 19

INGENIERÍA RYD S.A.S

ha presentado afectación a la estructura generando el lavado de finos y pérdida de la capacidad de soporte. Se hace indispensable el uso de maquinaria especializada (motoniveladora y cilindro compactador) y la ejecución de actividades que permitan el manejo adecuado de las aguas especialmente sobre la margen derecha. Ante los aspectos mencionados tanto el contratista como la interventoría evidencian la necesidad en la construcción de cuneta en la margen derecha favoreciendo el manejo de las aguas y permitiendo la durabilidad del pavimento a instalar.

4.4 FRENTE 03 PANTALLA RETICULAR: Para las intervenciones en este frente el contratista ejecuta las perforaciones de la tercera línea de anclajes, se inicia la instalación de acero de refuerzo para las vigas reticulares según diseño. Desde la interventoría se solicita culminar la perfilación del talud de manera adecuada cumpliendo con el ángulo de diseño y aplicar un solado en la zona donde se construyen las vigas, el contratista es receptivo y realiza las adecuaciones conforme a las solicitudes. Se recuerda al contratista que los procesos para vaciar las estructuras deben contar con la autorización o liberación previa de la interventoría.

4.5 FRENTE 04 PONTÓN: En relación a las actividades de este frente el contratista se encuentra ejecutando las excavaciones y retiro de material para la culminación de pantallas laterales del pontón. Ejecuta las perforaciones para anclajes con epóxico y la instalación de acero de refuerzo. Durante el proceso de excavación se encuentran rocas de gran dimensión que impiden la continuación normal de la pantalla, ante esto se solicita la demolición de las mismas permitiendo el cumplimiento del diseño.

4.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS: Actualmente el contratista se encuentra realizando las excavaciones para Caisson de estructura adicional para el ingreso y salida del pontón, esto permite dar la amplitud de la vía y conformar la zona adecuadamente. Durante las excavaciones predomina un estrato rocoso debido a la zona cercana al lecho de la quebrada.

4.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: ante estos aspectos se indica la radicación de las solicitudes para adición y prórroga generadas por el contratista y avalada por la interventoría. a su vez la radicación de las solicitudes para adición y prórroga del contrato de interventoría. A la fecha la entidad contratante se encuentra en proceso de análisis por parte de su equipo jurídico. Se solicita a la entidad contratante información sobre el estado para pago de las actas generadas, esto a partir del avance financiero y flujo de caja necesario para continuar las actividades restantes.

NOTA: Toda la información suministrada en el presente documento fue determinada en conjunto generando claridad acerca de los aportes y necesidades que a la fecha conllevan el proyecto



ROBLE INGENIERIA S.A.S

NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NRO 20

INGENIERÍA RYD S.A.S

Fecha: marzo 19 del 2026

Hora: 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Lugar: FRENTES DE TRABAJO

MIEMBROS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	Ingeniero Residente de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	Ingeniero Residente de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	Ingeniera Auxiliar de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	Profesional Social de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTÉS	Profesional SST de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
VICTORIA FERNANDA SUÁREZ PAVA	Profesional SST de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	Profesional Social de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
LEYDY ESTEFANY CORTÉS LLANOS	Profesional Ambiental de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	Profesional Ambiental de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	

TEMAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ÁREA AMBIENTAL

En el marco del seguimiento ambiental a los frentes de obra, se realizó un recorrido de verificación durante la presente semana para evaluar las condiciones de manejo ambiental y el cumplimiento de las medidas establecidas.



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 20

INGENIERÍA RYD S.A.S

En la visita, se evidenció el adecuado manejo de la señalización y demarcación de las áreas de trabajo, así como la correcta cobertura del material granular acopiado, contribuyendo a la seguridad en obra. Así mismo, se verificó que los baños portátiles se encuentran en buenas condiciones de limpieza y funcionamiento.

Se identificaron situaciones puntuales que requirieron el uso del kit antiderrames, asociadas al manejo de lubricantes. En este sentido, se recomienda al contratista realizar la reposición oportuna de los elementos consumidos, de manera que se garantice la disponibilidad permanente de estos insumos ante cualquier eventualidad.

2. ÁREA SOCIAL

1.1 Se estuvo realizando la convocatoria a la reunión de socialización general de avance del 50 % de ejecución de obra a la comunidad en general, para el día jueves 19 de marzo, con el apoyo de la profesional social de la Supervisión de la secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, con la elaboración de pieza comunicativa, además de la colaboración del Comité de Participación Comunitaria para la divulgación de información, por medio de chats comunitarios, WhatsApp y voz a voz. También se entregaron volantes informativos a la comunidad en general en los pare y siga

2.2 El contratista elaboró la presentación de la reunión de socialización con la comunidad en general del avance del 50% de ejecución, con el apoyo de las áreas involucradas, y el aval de la supervisión de la Gobernación de Caldas, Invias y la Interventoría. Se participa en la reunión de socialización y se percibe que la comunidad está muy receptiva con el avance de la ejecución de obra y agradecimiento por desarrollo de la misma, sin embargo, solicitan la posibilidad de no realizar pare y siga tan prolongados en horas pico por las diferentes necesidades de la comunidad para salir o entrar por la vía Ternium hacia termales del otoño.

2.3 Se estuvo en contacto con la profesional social del Invias y se recibieron los formatos para presentar el informe trimestral, para lo cual se está pendiente en realizar reunión con los profesionales sociales y ambiental del Invias y la Interventoría, para de esta manera aclarar cuáles formatos aplican para la obra en ejecución.

3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1 El personal en obra es de 54 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

- 1 Representante legal
- 1 Director de obra
- 1 Ingeniero Residente



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 20

INGENIERÍA RYD S.A.S

- 1 Profesional SST
- 1 Profesional ambiental
- 1 Profesional social
- 1 Inspector
- 1 Maestro
- 1 Topógrafo
- 5 Operadores de maquinaria
- 4 Conductores
- 4 Oficiales
- 12 Ayudantes
- 1 Celador
- 1 Almacenista
- 5 Reguladores de tránsito
- 1 Mecánico
- 6 operarios de concreto subcontratista
- 6 Operarios de construcción de caisson.

3.2. Se realizó entrega de los elementos de protección personal.

3.3. Se realizó inspección de herramientas manuales, EPP y pre operacionales de maquinaria.

3.4. No se presentaron incidentes ni accidentes de origen laboral, tampoco casos de ausentismo nuevos por causa médica.

4. ÁREA TÉCNICA

Se ejecuta reunion entre ingeniero residente de obra e ingeniero Residente de Interventoria estableciendo los siguientes aspectos:

4.1 ASPECTO FINANCIERO: Para la presente semana el contratista indica en su última programación de obra remitida donde incluye los ítems no previstos un acumulado de \$2.313.726.036 que corresponde a un 74.87%, respecto a la ejecución acumulada se tienen un valor de \$2.417.662.617 correspondiente a un 78.23%. lo anterior se traduce en un avance del cronograma del 3.36%.

4.2 FRENTE 01 PAVIMENTO RÍGIDO: Respecto a las intervenciones de este frente se indica el avance con las intervenciones en la margen derecha, actualmente se trabaja en la instalación final del pavimento MR-45 sobre la margen derecha, construcción de bordillo, corte y sello de placas. Para la fecha de elaboración de esta acta se trabaja en la construcción de sumidero para el adecuado control de las aguas producto de la escorrentía. En relación a este último aspecto se debe



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 20

INGENIERÍA RYD S.A.S

priorizar un adecuado manejo de las aguas principalmente en la margen derecha sobre el talud evitando afectación directa de la estructura por socavación, esto implica la construcción de zanja de coronación y el lleno del espaldón de las losas con material competente.

4.3 FRENTE 02 PAVIMENTO FLEXIBLE: El contratista ya realizó las obras hidráulicas y los mejoramientos de la subrasante conforme a los diseños suministrados. Posterior al comité técnico 19 se ejecuta recorrido donde se evidencia afectación de la estructura por episodios de lluvia determinando la importancia en la construcción de las cunetas. Desde la interventoría se solicita celeridad en este frente de trabajo.

4.4 FRENTE 03 PANTALLA RETICULAR: El contratista culminó la línea cuatro de anclajes pasivos a una profundidad de 8.5 metros y una inclinación de 15°. Actualmente se encuentra perfilando el talud y realizando excavaciones para vigas reticulares de unión entre anclajes. Se reitera al contratista la aplicación de un solado de protección previo en las retículas y de preservar los lineamientos de diseño respetando los nodos de los anclajes.

4.5 FRENTE 04 PONTÓN: Durante el presente periodo el contratista instala formaleta para losa de pontón y procede al armado de acero de refuerzo permitiendo así el vaciado de esta. Aún resta por construir las losas de aproximación.

4.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS: Para este punto obligatorio que permite el ingreso y salida adecuadamente sobre el pontón ya se ejecutaron las excavaciones para caisson. A fecha de elaboración del presente documento el contratista procede con el vaciado de estos. La interventoría ejecuta el chequeo del acero, disposición de este y estará presente durante el proceso de vaciado verificando que se ejecute por metodología tremie y conforme a los diseños suministrados por la entidad contratante.

4.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Durante la semana tanto contratista de obra como de interventoría ejecutaron conforme a las solicitudes y requerimientos de la supervisión las actas 04 y 03 respectivamente. Se realiza la verificación de cada uno de los ítems contractuales y de las cantidades predispuestas, así mismo, la documentación adicional necesaria. Desde la supervisión se indica el avance en las solicitudes de adición y prórroga presentadas con anterioridad planteando la presente semana o el inicio de la próxima la generación de los modificatorios de ambos contratos.

NOTA: Toda la información suministrada en el presente documento fue determinada en conjunto generando claridad acerca de los aportes y necesidades que a la fecha conllevan el proyecto



ROBLE INGENIERIA S.A.S

NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NRO 21

INGENIERÍA RYD S.A.S

Fecha: marzo 26 del 2026

Hora: 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Lugar: FRENTES DE TRABAJO

MIEMBROS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	Ingeniero Residente de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	Ingeniero Residente de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	Ingeniera Auxiliar de Interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	Profesional Social de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTÉS	Profesional SST de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
VICTORIA FERNANDA SUÁREZ PAVA	Profesional SST de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	Profesional Social de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	
LEYDY ESTEFANY CORTÉS LLANOS	Profesional Ambiental de obra (Ingeniería RYD S.A.S)	
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	Profesional Ambiental de interventoría (Roble Ingeniería S.A.S)	

TEMAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ÁREA AMBIENTAL

En el marco del seguimiento ambiental a los frentes de obra, se realizó un recorrido de verificación con el fin de evaluar las condiciones de manejo ambiental y el cumplimiento de las medidas establecidas.



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 21

INGENIERÍA RYD S.A.S

Durante la visita, se evidenció que, en términos generales, los frentes de obra presentan buenas condiciones, tanto en lo relacionado con la señalización y demarcación, como con el manejo de los baños portátiles, los puntos ecológicos, los residuos peligrosos y la organización de los puntos de acopio. No obstante, en el tramo 1 se observó la necesidad de mejorar las condiciones de orden, aseo y señalización, con el fin de garantizar la seguridad vial. Al respecto, el contratista se compromete a reforzar las actividades de orden, aseo y limpieza, dando continuidad a las acciones que se vienen implementando en todos los tramos, con especial énfasis en este sector

Así mismo, se considera pertinente realizar una capacitación articulada entre las áreas ambiental y SST para reforzar los temas relacionados con el manejo de fauna, teniendo en cuenta que su adecuada gestión no solo responde a criterios ambientales, sino que también incide directamente en la seguridad de los trabajadores en obra. Frente a lo cual, el contratista manifiesta que ese tema en conjunto será incluido en la programación de abril.

2. ÁREA SOCIAL

1.1 El día miércoles 25 de marzo se participó en reunión virtual, programada por la profesional social de Invias, participaron tres funcionarias y entre ellas las encargadas del área social y ambiental, con el objetivo de resolver inquietudes referentes al diligenciamiento de los formatos que componen los informes trimestrales, donde tanto desde el área social como ambiental de la Interventoría se dio a conocer cómo se está manejando la información a través de los informes semanales, informes mensuales con sus respectivos anexos y todos ellos basados en los programas que se especifican en el PAGA y lo entregado por el contratista, los cuales son enviados a la Supervisión de la Gobernación de Caldas. En conclusión INVIAS ya recibió el PAGA pero no lo han revisado para poder dar las respectivas indicaciones sobre el diligenciamiento de los formatos, a lo cual estaremos atentos desde el área social y ambiental.

1.2 El día viernes 20 de marzo, en el tramo de Ternium cuando se encontraban vaciando la losa una Tractomula paso y afecto el concreto al pasar sus llantas lo que ocasionó daños en el vaciado, inmediatamente el contratista saca un oficio hacia la empresa Ternium comentando la situación para salvaguardar las actividades de obra y sentar precedente de lo ocurrido.

1.3 El contratista da cumplimiento a la solución de la PQR presentada por la administración del Hotel Valhalla, donde se construye el acceso a la cancha sintética.

1.4 La profesional social del contratista sigue teniendo un contacto directo con las empresas y comunidad del sector por medio de los chats comunitarios y con el apoyo del Comité de Participación Comunitaria, sobre las actividades de obra y en especial de los par y siga.

	ROBLE INGENIERIA S.A.S NIT: 901526157-4	INGENIERÍA RYD S.A.S
	ACTA DE REUNIÓN	
	ACTA NRO <u>21</u>	

3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1 El personal en obra es de 48 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

- 1 Representante legal
- 1 Director de obra
- 1 Ingeniero Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional ambiental
- 1 Profesional social
- 1 Inspector
- 1 Maestro
- 1 Topógrafo
- 5 Operadores de maquinaria
- 5 Conductores
- 3 Oficiales
- 12 Ayudantes
- 1 Celador
- 1 Almacenista
- 5 Reguladores de tránsito
- 1 Mecánico
- 6 operarios de concreto subcontratista

3.2. Se presentaron las afiliaciones a la seguridad social integral y certificado de aptitud médica ocupacional del personal nuevo.

3.3. Se realizó la inducción SST al personal nuevo.

3.4. Se realizó entrega de los elementos de protección personal.

3.5. Se realizó inspección de herramientas manuales, EPP y pre operacionales de maquinaria.

3.6. No se presentaron incidentes ni accidentes de origen laboral, tampoco casos de ausentismo nuevos por causa médica.

3.7. Se realizó socialización al personal en MEDEVAC procedimiento de evacuación médica de pacientes.



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 21

INGENIERÍA RYD S.A.S

4. ÁREA TÉCNICA

En cumplimiento a las obligaciones contractuales se ejecuta reunión entre profesionales del área técnica tanto de **INGENIERÍA R&D S.A.S** como **ROBLE INGENIERIA S.A.S**, estableciendo los siguientes aspectos de importancia:

4.1 ASPECTO FINANCIERO: Teniendo en cuenta los trámites administrativos llevados a cabo para la adición y prórroga de ambos contratos y la programación 3 remitida por el contratista tenemos valor un total de **\$2.450.254.650**, equivalente al **62.71%** del valor contractual más la adición. En cuanto a la ejecución, se reporta un valor aproximado de **\$2.504.612.455** con corte al jueves correspondiente a un **64.10%**. Lo anterior representa un avance del **1.39%** en relación con la última programación emitida donde se incluye la adición presupuestal.

4.2 FRENTES 01 PAVIMENTO RÍGIDO: Durante la semana en curso se continuó con la ejecución de pavimento rígido **MR-45** sobre la margen derecha. Actualmente restan aproximadamente 35 metros para alcanzar las abscisas definidas juntamente con la entidad, en el marco del balance financiero del contrato. Se deja constancia de las afectaciones recurrentes sobre la estructura de apoyo debido a procesos de escorrentía en la margen derecha, situación que requiere la definición de una solución técnica que mitigue los impactos directos sobre la obra.

4.3 FRENTES 02 PAVIMENTO FLEXIBLE: El contratista continúa con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular. No obstante, se hace necesario definir un cronograma que garantice el cumplimiento de la meta establecida, para el plazo restante del contrato y las actividades planteadas con el nuevo alcance presupuestal.

4.4 FRENTES 03 PANTALLA RETICULAR: Durante la semana se avanzó en las actividades de excavación y perfilación del terreno, armado de acero de refuerzo y vaciado de vigas reticulares entre anclajes, conforme al diseño suministrado. De igual manera, se ejecutaron drenes horizontales con el fin de reducir la presión hidrostática, disminuir los esfuerzos actuantes y mejorar la resistencia del terreno.

4.5 FRENTES 04 PONTÓN: En este frente, el contratista adelantó la instalación del acero de refuerzo para la losa en voladizo. Se considera indispensable proceder con el vaciado de la losa conforme al cronograma establecido. Así mismo, se solicita iniciar las actividades de demolición, excavación y demás procesos requeridos para la construcción de las losas de aproximación, de manera paralela a la culminación de las obras correspondientes a la zapata y el vástago de la obra complementaria.



ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901526157-4

ACTA DE REUNIÓN
ACTA NRO 21

INGENIERÍA RYD S.A.S

4.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS: El contratista culminó la cimentación de la obra complementaria, la cual permitirá la ampliación de la sección vial y la adecuación del diseño geométrico. Según lo informado, se prevé iniciar durante la semana el armado de acero para zapata y vástago. Se reitera la necesidad de ejecutar los filtros y lloraderos correspondientes a esta obra de estabilidad, así como realizar el proceso de lleno por capas debidamente compactadas, una vez se alcance la resistencia mínima de diseño.

4.7 OTROS ASPECTOS TÉCNICOS: Durante la semana, y en cumplimiento de lo establecido en comités técnicos anteriores, así como en recorridos realizados con la supervisión directa de ingenieros del INVÍAS, se efectuó el levantamiento topográfico del talud en la entrada del pontón. Con base en los resultados obtenidos, se determinó la viabilidad de ejecutar un corte en el marco del presente contrato, con el fin de mejorar el diseño geométrico.

4.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Durante la semana y conforme a los lineamientos establecidos por la entidad contratante se suministran los modificatorios a los contratos al evidenciarse el cumplimiento de las exigencias mínimas y la viabilidad de las solicitudes presentadas tanto por el contratista de obra como la interventoría.

NOTA: Toda la información suministrada en el presente documento fue determinada en conjunto generando claridad acerca de los aportes y necesidades que a la fecha conllevan el proyecto



ROBLE
INGENIERÍA

ACTAS DE COMITÉ



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA



FECHA 06 03 2026
Día Mes Año

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13.
y su continuación (si corresponde)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535 DE 2025

CONTRATISTA: INGENIERÍA RYD S A S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA,
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 17092025-1533 DE 2025

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERÍA S A S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JORGE ANDRÉS GIRALDO HERNÁNDEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	ING. AUXILIAR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTES	SST INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	PROF. AMBIENTAL INTERVENTOR	ROBLE INGENIERÍA SAS
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	PROF. SOCIAL INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
JULIO CESAR SERNA OSORIO	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	INGENIERO RESIDENTE	CONTRATISTA
VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA	PROFESIONAL SST	CONTRATISTA
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	PROFESIONAL SOCIAL	CONTRATISTA
LEYDY ESTAFANY CORTES LLANOS	INGENIERA AMBIENTAL	CONTRATISTA
MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE CALDAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conocer los avances e inquietudes sobre los procesos de ejecución del proyecto

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Conocer los procesos y avances respecto a las fases técnicas, ambientales, socio, sociales y demás inherentes al proyecto

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

SE INICIA COMITÉ TÉCNICO # 18 CON LECTURA DE ACTA ANTERIOR. INVIAS PRESENTA PROFESIONAL SOCIAL PARA UN MEJOR MANEJO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

SE INICIA CON LECTURA DE ACTA DE PARES EN AREA AMBIENTAL, SE INFORMA EL MANEJO DE LA SEÑALIZACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA. A LA FECHA NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS VISITAS DE CORPUCAMAS. EN AREA SOCIAL SE INFORMA SOBRE LA CONVOCATORIA PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL SUCO DE LA OBRA EL 19 DE MARZO A LAS 4:00 DE LA TARDE. MEDIANTE COMITÉ DE PARTICIÓN SE INFORMA DE LAS ACTIVIDADES ESPECIALMENTE PARE Y SIGA. ES IMPORTANTE SE GENERE ACERCAMIENTO CON LA EMPRESA TERNUM Y UN ACTA DONDE SE EXPLIQUE LA IMPORTANCIA DE DEJAR UNA ZONA DE TRANSITO OPERACIONAL.

SE CONTINUA CON AREA SST SE INDICA DISCRIMINADO EL PERSONAL DE OBRA 56 PERSONAS, SE ENTREGAN AFILIACIONES, EXAMENES, INDUCCIONES, CAPACITACIONES INSPECCIONES. NO EXISTEN ACCIDENTES NI AUSENTISMO. SE EJECUTA UN CONTROL EN EL INFORME PRESENTADO PARA OBRA DE ESTABILIDAD.

EN AREA TECNICA SE TIENE UNA PROGRAMACION DE 36.44 % Y UNA EJECUCION ACUMULADA DE 54.18 % PARA UN AVANCE DEL 17.74 %.

PARA FRENTE 07 PAVIMENTO RIGIDO EL CONTRATISTA AVANZA NORMALMENTE CON INSTALACION DE PAVIMENTO MR-4S, EL CONTRATISTA EXPRESA INCONVENIENTES CON LA PROGRAMACION DEL CONCRETO. ACTUALMENTE APLICA EN MARLEN DERECHO MR-4S, SE TIENE PROGRAMACION NUEVAMENTE PARA EL DIA MARTES EN LA PARTE INTERIOR.

GENERA APLICACIÓN DE SUBBASE POR PRECIPITACIÓN RECURRENTE.

PARA EL FRENTÉ 02 SE CULMINARON OBRAS HIDRAULICAS Y SE INICIA CON APLICACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, EL CONTRATISTA EXPRESA PREOCUPACIÓN (INCONVENIENTE CON MOTONVELADORA).

PARA FRENTÉ 03 EN PANTALLA SE TRABAJA EN LINEA 2 PARA ANCLAJES PASIVOS. EN RELACIÓN AL PONTON EL DIA DE AYER SE FUNDE UNA SECCIÓN DE LA PANTALLA ENTRE CAISSON 1-2-3-4.

COMPROMISOS PACTADOS

ENTREGA INFORMES MENSUALES
ENTREGA INFORMES MENSUALES
INTERVENCIÓN
ENTREGA DOCUMENTACIÓN SOCIAL
A LÍNEA - TRIMESTRAL Y PAGA

FECHA DE CUMPLIMIENTO

11/03/2020
11/03/2020
INTERVENCIÓN
11/03/2020

RESPONSABLES

CONTRATISTA
INTERVENCIÓN
11/03/2020

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquier de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Intervención suscritos.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Tatiana Ospina Gándera	Tatiana O.
Leticia Mestre Orozco	Leticia Mestre O.
JULIO E. GUEVARA	
Julio Cesar Selva Dorro	
Nana Del Pilar Gomez	
Juan Sebastián Meza	
Julián David Sánchez JI	
Ximeno Orozco Velásquez	
Leidy Estefany Cortés Llanos	
Juliana Rubio Arango	
Jorge Andrés Giraldo Hernández	
Nina Edgarmy Sánchez	
Pablo Smith Larrea Giraldo	
Mildray Julianna Lopez Cortés	
Sandra Milena Osorio Arias	
LEONARDO FERNANDEZ ALARCÓN	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA



FECHA 13 03 2026
(Día) (Mes) (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No. 19

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535 DE 2025

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 17092025-1533 DE 2025

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERIA S.A.S.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JORGE ANDRÉS GIRALDO HERNÁNDEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERIA SAS
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERIA SAS
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	ING. AUXILIAR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERIA SAS
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTES	SST INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERIA SAS
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	PROF. AMBIENTAL INTERVENTO	ROBLE INGENIERIA SAS
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	PROF. SOCIAL INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERIA SAS
JULIO CESAR SERNA OSORIO	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	INGENIERO RESIDENTE	CONTRATISTA
VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA	PROFESIONAL SST	CONTRATISTA
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	PROFESIONAL SOCIAL	CONTRATISTA
LEYDY ESTAFANY CORTES LLANOS	INGENIERA AMBIENTAL	CONTRATISTA
MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE CALDAS
<i>Jorge R. Giraldo Hernández</i>	<i>Secretario SATN</i>	<i>Gobernación de Caldas</i>

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conocer los avances e inquietudes sobre los procesos de ejecución del proyecto

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Conocer los procesos y avances respecto a las fases técnicas, ambientales, sysó, sociales y demás inherentes al proyecto

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

SE INICIA CONITE TECNICO # 19 CON LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS. SE ENTREGAN INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENORIA. SE SOLICITAN FURNITOS SOCIALES AL INVIAS PARA PODER ENTREGAR INFORMES SOLICITADOS.

SE CONTINUA CON LECTURA DE ACTA DE PARES EN AREA AMBIENTAL, ES IMPORTANTE LIMPIEZA DE LA VIA POR MATERIAL DE ARRASTRE, SE HACE CONTROL DE LA SEÑALIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS.

EN AREA SOCIAL SE INDICA LA ELABORACION DE FORMATO PARA INFORMAR SOBRE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO EL JUEVES 19 DE MARZO A LAS 4:00 P.M. ES IMPORTANTE REUNION CON EMPRESA TERNUM PARA SOCIALIZAR ASPECTOS DE SEGURIDAD VIAL. SE INFORMA SOLICITUD PROPIETARIO DE CANCHA SINTETICA PARA EL MEJORAMIENTO DE INGRESO, ESTE SS EJECUTARA CONFORME A CUMPLIMIENTO.

EN AREA SST SE ENTREGA REPORTE DE PERSONAS, SE PERSONAS DISCRIMINADAS, PROCEDIMIENTOS SEGUROS, INSPECCIONES, PRELPERACIONES, CAPACITACIONES Y DOCUMENTOS DE TRABAJOS SEGUROS EN ALTURA Y ESPACIO CONFINADO PARA CAISSON Y OBRAS DE ESTABILIDAD.

FINALMENTE EN AREA TECNICA SE TIENE UNA PROGRAMACION ACUMULADA DE 45.97% VS UNA EJECUCION ACUMULADA A 61.67% PARA UN AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL 15.7%.

PARA FRENTE 01 PAVIMENTO RIGIDO YA SE CUENTA CON MAS DE 400 M² DE MR-45, DEBIDO A PRECIPITACION SE VE AFECTADA CONTINUAMENTE LA SUBBASE GRANULAR.

PARA EL FRENTE 02 SE APLICA SUBBASE GRANULAR PERO DEBIDO A LA PRECIPITACION TAMBIEN SE AFECTA EL MATERIAL INSTALADO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

PARA EL FRENTÉ O3 EN OBRA DE ESTABILIDAD SE TRABAJA EN TERCER LÍNEA DE ANCLAJES PASIVOS SE SOLICITA POR INTERVENCIÓN PERFILEAR SEGÚN ANCLAJE DE DISEÑO Y SOLDADO DE LIMPIEZA.

PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTOÓN SE TRABAJA EN CULMINACIÓN DE SECCIONES RESTANTES DE PANTALLAS, SE EJECUTAN LABORES EN OBRA DE ESTABILIDAD COMPLEMENTARIA, YA SE TIENE AVANCE SIGNIFICATIVO EN EXCAVACIONES DE CAISSON.

LA SUPERVISIÓN INDICA QUE DESDE HACIENDA SE PERMITE RECEPCIÓN DE ACTAS EN FECHAS PREESTABLECIDAS. EN RELACIÓN A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SE EXPRESA AVANCE EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE ADICIÓN Y PRORROGA.

IMPORTANTE UN ADECUADO ANÁLISIS Y MANEJO DE AGUAS CULMINADAS INTERVENCIÓNES EN FRENTÉ O1

[Handwritten signature]

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

FORMATOS INFORMES TRIMESTRALES	16/03/2026	INDIA.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	16/03/2026	CONTRATISTA.
ELABORACION ACTA Y ENTREGA ACTA DE MODIFICACION.	16/03/2026	CONTRATISTA.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA TOTALIDAD DE PERSONAS TRABAJANDO PARA EL CONTRATISTA SON 67 Y NO SE COMO SE HARIA DESCRITO EN LA PAGINA 02.

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA

(Dia)

(Mes)

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Juliana Hestia Orozco	Juliana Hestia O.
WILIO E. GUEVARA	
Juan David Duque Piedraza	
Diana Del Pilar Gomez Valencia	Diana Gomez
Juan Sebastian Meza Betancur	
Juan David Sanchez	
Estefany Cortes Llanos	
Pablo Smith Larios Giraldo	Pablo Larios
Jorge Andrés Giraldo Hernández	
Juliana Rubio Arango	
LEONARDO FERNANDEZ ALARCON	

Original: Informe mensual de Interventoría

Copia: Contratista Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA



FECHA 20 03 2026
(Día) (Mes) (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535 DE 2025

CONTRATISTA: INGENIERÍA RYD S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 17092025-1533 DE 2025

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERÍA S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JORGE ANDRÉS GIRALDO HERNÁNDEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	ING. AUXILIAR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTES	SST INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	PROF. AMBIENTAL INTERVENTO	ROBLE INGENIERÍA SAS
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	PROF. SOCIAL INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
JULIO CESAR SERNA OSORIO	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	INGENIERO RESIDENTE	CONTRATISTA
VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA	PROFESIONAL SST	CONTRATISTA
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	PROFESIONAL SOCIAL	CONTRATISTA
LEYDY ESTAFANY CORTES LLANOS	INGENIERA AMBIENTAL	CONTRATISTA
MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE CALDAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conocer los avances e inquietudes sobre los procesos de ejecución del proyecto

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Conocer los procesos y avances respecto a las fases técnicas, ambientales, syso, sociales y demás inherentes al proyecto

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

SE INICIA COMITÉ TÉCNICO # 20 CON LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS, LOS TPOS PACTADOS O ESTABLECIDOS SE CUMPLEN.

SE CONTINUA CON LECTURA DE ACTA DE PARES EN AREA AMBIENTAL SE GENERAN RECORRIDOS EVIDENCIANDO LA SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA, SE EXCUTA USO DE KIT DE HERRAMIENTAS POR AFECTACIONES CON COMESTIBLES.

DESDE EL AREA SOCIAL SE INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DEL 50% DE LA OBRA, LA ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN, DIVULGACIÓN LA COMUNIDAD SOLICITA LOS PARES Y SI NO SE EJECUTEN EN HORAS PICO O SE DISMINUYA SU TIEMPO DESDE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SE PLANTEA REUNIÓN EL DIA 06 DE ABRIL PARA UN ACERCAMIENTO CON FABRICANTE DE ACERO TERNUM Y PROPIETARIO DE PREDIO EN MARGEN DERECHA PARA EL TEMA DE SEGURIDAD VIAL.

EN AREA SST SE INDICA EL PERSONAL PRESENTE EN OBRA, CAPACITACIONES, PREOPERACIONALES, NO EXISTEN ACCIDENTES NI INCIDENTES.

FINALMENTE PARA EL AREA TECNICA SE INDICA UNA PROGRAMACIÓN DEL 74.87% Y UNA EJECUCIÓN DEL 78.23% PARA UN AVANCE DE CROMOGRAMA DEL 3.36%.

PARA EL FRENTE 01 SE AVANZA EN INSTALACIÓN DE MR45, SE CONSTRUYE SUMIDERO PARA DISMINUIR CARGA HIDRAULICA, SE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR AFECTACIÓN EN MARGEN DERECHO DE LAS PLACAS O LOSAS CONSTRUIDAS BAJO QUE NO SE CONTEMPLAN OBRAS ADICIONALES QUE EVITEN SUCAVACIÓN Y AFECTACIONES FUTURAS.

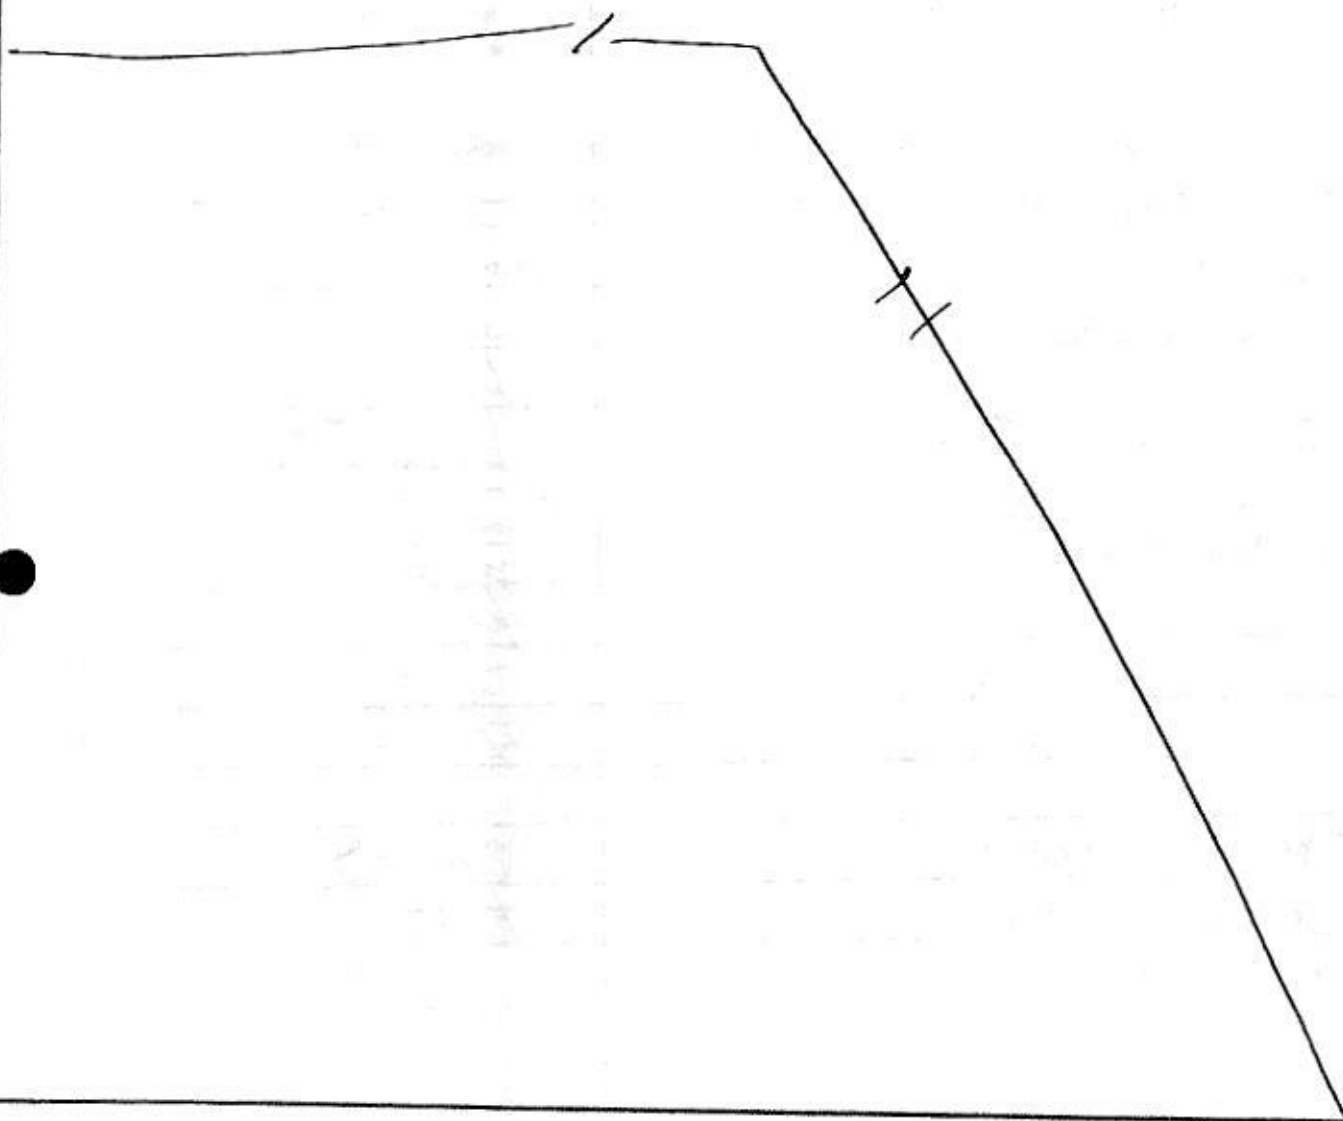
PARA FRENTE 02 EL CONTRATISTA INICIA CON EL CEREO DE LA SUBBASE INSTALADO COMPROMETIENDOSE CON UN AVANCE DURANTE LA PROXIMA SEMANA.

PARA FRENTE 03 SE AVANZA NORMALMENTE CON LINEA 4 DE ANCLAJES Y VIGAS RETICULARES, SE SOLICITA RETIRO DE ACERO SOBRE TERRENO SI NO SE REALIZA EL SOLADO.

EN RELACION AL AVANCE DEL PUNTON YA SE EJECUÓ EL FONDO DE LA LOSA Y SE PLANTEA FUNDIR LA PRÓXIMA SEMANA PARA LA OBRA COMPLEMENTARIA. EL DÍA DE AYER SE FUNDEN LOS CAISSON PERMITIENDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO.

ES IMPORTANTE SE GESTIONE EL AREA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DEBIDO A QUE EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VIA EN FRENTE OI AUMENTA LA VELOCIDAD CONSIDERABLEMENTE, ANTE ESTO DESDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SE EXPRESA EL COMPROMISO Y MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 06 DE ABRIL

LA SOLICITUD PARA EL AREA DE ANDEN ES GENERADA PRINCIPALMENTE POR EL INVIAS



COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

REPROGRAMACIÓN DE ACUERDOS AL ESTADO
REAL DE LA OBRA

06/09/2016

COMITATITA E
INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Juliana Urrutia Crespo

Juliana Urrutia Crespo

Tatiana Ospina Riquelme

Tatiana O.C.

Julian Rubio Arango

Julio Cesar Sierra Osorio

Juan Sebastián Meza Betancourt

I. Estefany Cortes Uanos

Ximena Orozco Velazquez

Fernanda Suarez Palla

Julian David Sanchez el

Pablo Smith Larios G.

Nicol Echeverry Sanchez

Jorge Andrés Giraldo Hernández

Andra Hilma Osorio Araya

Pablo Larios G.

Nicol Echeverry



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA



FECHA 27 03 2026
(Día) (Mes) (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535 DE 2025

CONTRATISTA: INGENIERÍA RYD S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA,
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 17092025-1533 DE 2025

INTERVENTOR: ROBLE INGENIERÍA S.A.S.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JORGE ANDRÉS GIRALDO HERNÁNDEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
NICOL FERNANDA ECHEVERRY SÁNCHEZ	ING. AUXILIAR INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
MILDREY JULIANA LÓPEZ CORTES	SST INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
PAULO SMITH LARIOS GIRALDO	PROF. AMBIENTAL INTERVENTOR	ROBLE INGENIERÍA SAS
SANDRA MILENA OSORIO ARIAS	PROF. SOCIAL INTERVENTORIA	ROBLE INGENIERÍA SAS
JULIO CÉSAR SERNA OSORIO	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA
JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	INGENIERO RESIDENTE	CONTRATISTA
VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA	PROFESIONAL SST	CONTRATISTA
XIMENA OROZCO VELÁSQUEZ	PROFESIONAL SOCIAL	CONTRATISTA
LEYDY ESTAFANY CORTES LLANOS	INGENIERA AMBIENTAL	CONTRATISTA
MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN DE CALDAS

OBJETIVOS DE LA REUNION

Conocer los avances e inquietudes sobre los procesos de ejecución del proyecto

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Conocer los procesos y avances respecto a las fases técnicas, ambientales, syso, sociales y demás inherentes al proyecto

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

SE INICIA COMITÉ TÉCNICO # 21 CON LECTURA DE ACTA ANTERIOR NO SE PACIARON COMPROMISOS QUE CUMPLIR PARA LA PRESENTE SEMANA SE CONTINUA CON LECTURA DE ACTA DE PARES COMO DOCUMENTO PASE Y FUNDAMENTAL DE CADA COMITÉ.

EN EL ÁREA AMBIENTAL SE REALIZAN RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN, SE ENCUENTRAN BUENAS CONDICIONES, ES NECESARIO MEJORAR CONDICIÓN DE ASFO Y LIMPIEZA PARA FRENTE 01; EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON ESTE ASPECTO EJECUTANDO LA ACCIÓN. SE SOLICITA CAPACITACIÓN POR LA EVIDENCIA DE SERPIENTES Y SU MANEJO EN FRENTE 03.

PARA ÁREA SOCIAL SE EJECUTA REUNIÓN VIRTUAL CON PROFESIONALES DEL INVIAS; MANEJO DE FORMATOS, INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA.

DURANTE LA SEMANA SE SOLUCIONA PDOS PARA INGRESO DE CANCHA AL HOTEL VALHALLA; DE IGUAL MANERA SE INFORMA UN PROCESO ECOSIVO EN CERCANÍAS A DICHA CANCHA SE TRABAJA EN MANEJO DESDE LA PARTE TÉCNICA Y SOCIAL.

PARA ÁREA SST SE INFORMA LA TOTALIDAD DE PERSONAL 48 PERSONAS, SE PRESENTAN INDUCCIONES, CAPACITACIONES, INSPECCIONES, ENTREGA DE EPPS,

FINALMENTE PARA EL ÁREA TÉCNICA SE INFORMA SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA SE TRABAJA CON NUEVA PROGRAMACIÓN REMITIDA DONDE SE INCLUYE LA ADICIÓN.

PARA FRENTE 01 PAVIMENTO P16.00 RESTAN APROXIMADAMENTE 35 m) PARA LLEGAR A LA ABSCISA PLANTEADA; SE REITERA LA PREOCUPACIÓN POR AFECTACIONES EN PAVIMENTO MARGEN DERECHA, EL CONTRATISTA PLANTEA EL DÍA SÁBADO CULMINAR LA APLICACIÓN DE UR-45 RESTARIA BORDILLO. EL CONTRATISTA PLANTEA INICIAR PRONTAMENTE ACTIVIDADES EN SECCIÓN UR-42.

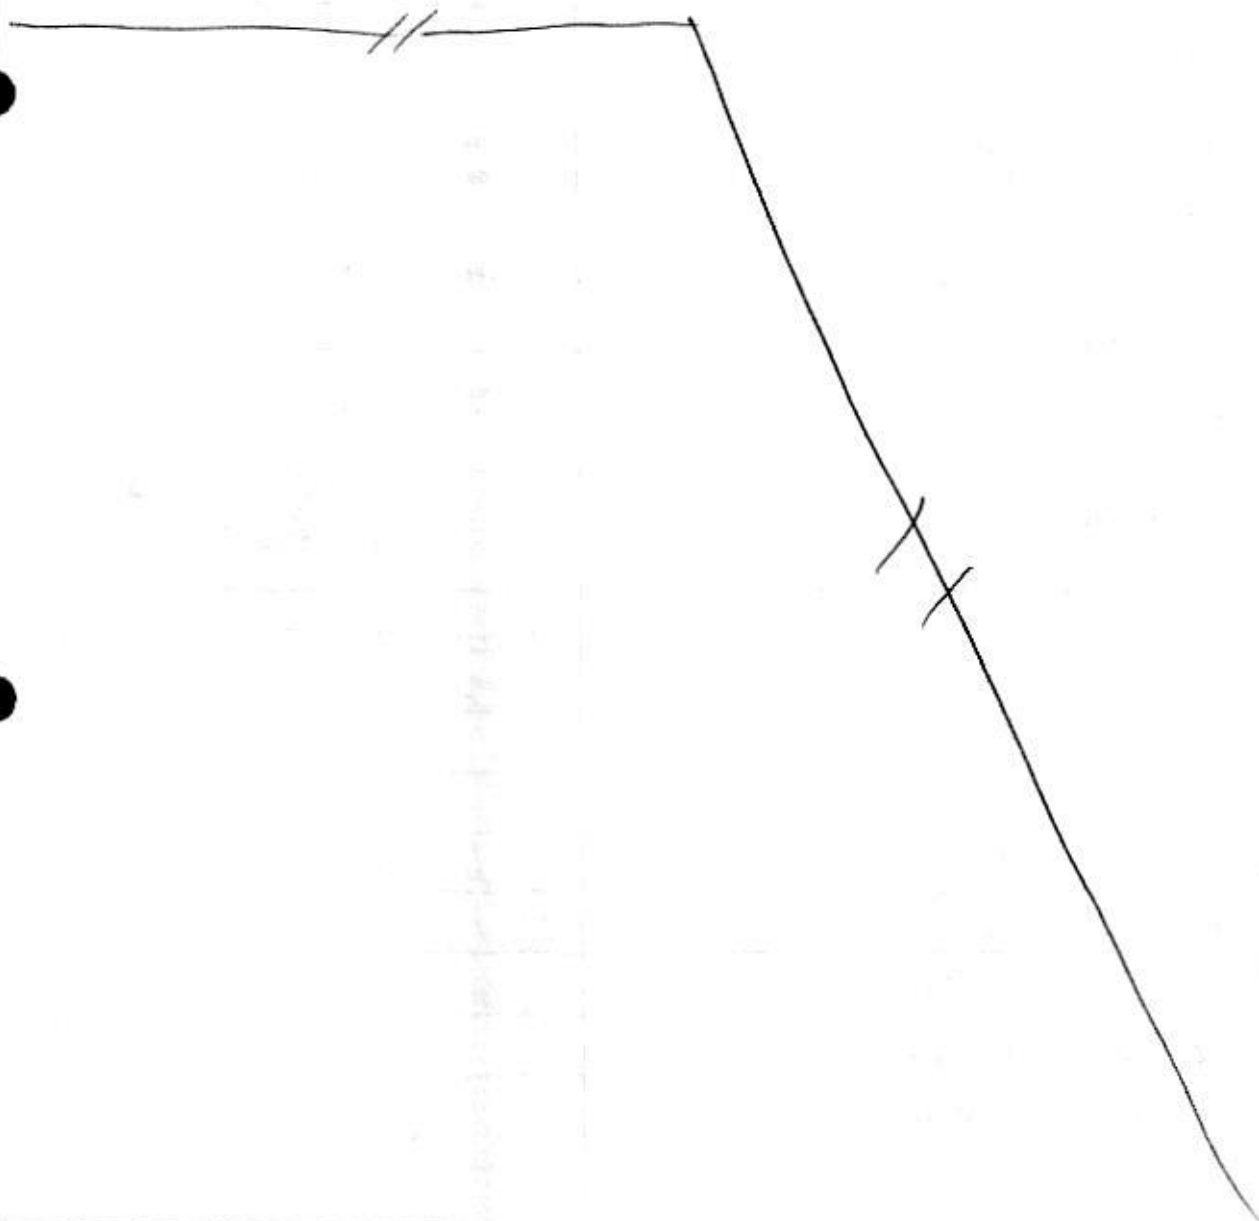
EN FRENTE 02 SE TRABAJA CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA GRANULAR SE EJECUTA CUNETA PROVISIONAL PARA EVITAR AFECTACIÓN POR

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

LLENIA.

EN FRENTE 03 SE TRABAJA CON LA OBRA DE ESTABILIDAD DRENES HORIZONTALES Y VIGAS RETICULARES.

PARA EL DIA LUNES SE PLANTEA FUNDIR LA LOSA DEL PONTÓN POR ESTE MOTIVO NO SE HAN INICIADO PROCESOS EN LOSAS DE APROXIMACIÓN. SEGUN EL BALANCE EJECUTADO AL CONTRATO Y LAS SOLICITUDES EXPUERTAS POR SUPERVISIÓN SE AUTORIZA REALIZAR CORTE EN TALLO PARA MEJORAR DISEÑO GEOMETRICO.



COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

REPROGRAMACIÓN PARA INVIAJES

31 / 03 / 2026

INTERVENTORIA P.

OBSERVACIONES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Juliana Mejía Orozco

Juliana Mejía Orozco

Julian Rubio H

Nicol Echeverry Sanchez

Julio Cesar Sierra O

Alexander Garcia Orozco

Geidy Estefany Cates Uanos

Ximena Ochoa Velazquez

FERNANDO SANCES RUIZ

Julian David Sanchez H

Pablo Smith Larios Giraldo

Jorge Andres Giraldo Hernandez

Miguel Juliana Lopez Cates

LEONARDO FERNANDEZ ALARCON

Sandra Milena Ochoa Arias



ROBLE
INGENIERÍA

BIT ÁCORA

* Lunes 02 de Marzo de 2026

- Personal en obra
 - Ing. Director, Ing. Residente, Profesional SST, Maestro, Oficiales (4), Ayudantes (23), Controladores (8)
- Clima = Seco
- Actividades
 - Se continua con el cerco de subbase para pavimento en el tramo 1
 - Se continua con el cajeo para mejoramiento de la subrasante en el tramo 2
 - Se realiza el vaciado en concreto de la pantalla Derecha del ponton
 - Se continua con la perforación de anclaje pasivo en el tramo 3.



Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENORIA

* Martes 03 de Marzo de 2026

- Personal en obra
 - Ing. Directo, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional SST, Profesional Ambiental, Maestro, Ayudantes (23), Oficiales (4), Controladores (8)
- Clima: lluvioso
- Actividades
 - Se realiza instalación de formaleta para pavimento en el tramo 1
 - Se continua con el cajeo para mejoramiento de la subrasante en el tramo 2
 - Se realiza extensión y compactación de subbase en el tramo 2
 - Se continua con el figurado de acero para pantalla Izquierda del ponton.

- Se continuo con la perforación de anclajes para la pantalla reticular


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTOR/A

* Miércoles 04 de Marzo de 2026

- Personal en obra

Ing. Residente, Profesional social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficiales (4), Ayudantes (23), controladores (8)

- clima: seco

- Actividades:


- Se continua con el cereo en subbase para pavimento

- se realiza instalación de acero para refuerzo de losas de pavimento ME-US

- Se continua con el cajeo para mejoramiento de la rosante en el trame

- se continua con la instalación de acero y formateo de pantalla Izquierda del ponton.

- se continua con la perforación de anclaje de la pantalla reticular.


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTOR/A

* Jueves 05 de Marzo de 2026


- Personal en obra


Ing. Director, Ing. Residente, Profesional social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficiales (4), Ayudantes (23), controladores (8)

- clima = lluvioso

- Actividades

- Se realiza vaciado en concreto de pavimento MR-45
- Se continua con la extensión y compactación de subbase para pavimento en el tramo 1
- Se continua con el cajeo para mejoramiento de la rasante en el tramo 2
- Se realiza vaciado de pantalla Izquierda del pontón
- Se continua con la perforación de anclaje de la pantalla reticular


Ing. Residente.


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

* Viernes 06 de Marzo de 2025


- Personal en obra


Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial (C), Ayudantes (21) controladoras (8)

- clima: Soleado

- Actividades

- Se realiza vaciado de pavimento MR-45
- Se continua con el cerco de subbase en el tramo 1
- Se continua con el cajeo para mejoramiento de la rasante en el tramo 2.
- Se continua con la perforación de anclaje en el tramo 3
- Se realiza vaciado de solado para caisson de muros complementarios



Ing. Residente.


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

Robado 04 de Marzo de 2026

Se evidencio desde la interventoria de la obra, que el subcontratista, encargado de realizar la construcción de los Caissons en el Pontón, se encuentra en obra desarrollando labores sin la grabación de la documentación mínima legal de ingreso del personal.

Por lo anterior, se solicita la suspensión inmediata de la actividad de construcción de los caissons, hasta que el contratista remita y la interventoria revise y apruebe la documentación mínima requerida, garantizando el cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para la ejecución segura de la obra.


Mildrey Juliana López Cortés
Profesional SST - Roble Ingeniería SAS.


• Personal en obra:


Ing. Residente, Maestro, Oficial (u), Ayudantes (21)
Controladores (8)

• clima: Seco

• Actividades:

- se continua con el cero de subbase para pavimento
- se continua con el cajeo para mejoramiento de la rasante en el tramo 2
- Se inicia la excavación del pontón en el tramo 3
- se continua con la perforación de anclajes pasivos
- se inicia la excavación de caisson del muro lateral.


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

* Lunes 09 de Marzo de 2026


• Personal en obra


Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social,
Profesional Ambiental, Profesional SST, Almacenista,
Maestro, Oficiales (4), Ayudantes 21, controladores (8)

• clima = Soleado

• Actividades

- Se continua con el cereo de subbase para pavimento en el tramo 1
- Se continua con el cajeo para mejoramiento de la rosante en el tramo 2
- Se continua con la excavación del ponton
- Se continua con la perforación de anclajes pasivos en el tramo 3
- Se continua con la excavación de cauzon para muro lateral.


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

* Martes 10 de Marzo de 2026

• Personal en obra

Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social,
Profesional Ambiental, Profesional SST, Almacenista,
Maestro, Oficiales (4), Ayudantes (21), controladores (8)

• clima = Soleado

• Actividades

- Se continua con la extensión de subbase para pavimento en el tramo 1
- Se realiza Uciado de pavimento MR-US en el tramo 1
- Se continua con la excavación de la pantalla del ponton y perimetro de pantallas


- Se continua con la perforación de anclajes pasivos en el tramo 3
- Se continua con la excavación de caisson para muro complementario



Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

* Miércoles 11 de Marzo de 2026

- Personal en obra
Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Ambiental, Profesional social, Profesional SST, Maestro, Oficial (4) Ayudantes (21)
- clima: Soleado (mañana), lluvioso (tarde)
- Actividades
 - Se continua con el reseo de subbase para pavimento en el tramo 1
 - se continua con el formateo para pantalla lateral del ponton en el tramo 3
 - Se continua con la perforación de anclajes pasivos
 - Se continua con la excavación de caisson para muro en el tramo 3.


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA.


* Jueves 12 de Marzo de 2026

- Personal en obra
Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Ambiental, Profesional Social, Profesional SST, Maestro, Oficial (4) Ayudantes (21), contralaboras (8)
- clima: Soleado
- Actividades
 - Se continua con la extensión de subbase para pavimento

en el tramo 1

- Se continua con el figurado y formalismo de pantalla lateral del ponton
- Se continua con la perforación de anclajes positivos en el tramo 3
- Se inicia con el figurado y armado de acero para viga reticular de la pantalla
- Se continua con la excavación de caisson para muro


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA.

* Viernes 13 de Marzo de 2026


- Personal en obra


Ing. Director, Ing. Residente, Profesional social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro Oficiales, (4), Ayudantes (21) contra labores (8)

- clima: Soleado

- Actividades

- Se continua con la extensión de subbase para pavimento en el tramo 1
- Se realiza vaciado de pantalla lateral del ponton
- Se continua con la perforación de anclaje positivo en el tramo 3
- Se continua con el figurado y armado de acero para vigas reticular de la pantalla
- Se continua con la excavación de caisson para muro lateral
- Se realiza vaciado de ~~corrosion~~ pavimento NP-45


Ing. Residente.


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA.

* Sábado 14 de Marzo de 2026

• Personal en obra

- Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial (4), Ayudantes (21), controladores (8)

• clima: Soleado

• Actividades:


- Se continua con el cese de subbase para pavimento en el tramo 1

- Se continua con la perforación de anclajes pasivos

- Se continua con el figurado y armado de acero para vigas reticulares de la pantalla


- Se continua con la excavación de caissons para muro



Ing. Residente.


ING. RESIDENTE INTERVENCIÓN

* Lunes 16 de Marzo de 2026

Día no laborado


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENCIÓN

* Martes 17 de Marzo de 2026

• Personal en obra

Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial (4), Ayudantes (21), controladores (8)

• clima: Soleado


• Actividades:

- Se continua con el cese de subbase para pavimento en el tramo 1

- Se continua con la perforación de anclajes pasivos


- Se continua con el figuado y armado de acero para vigas reticubres
- Se continua con el figuado y formateo de pantalla lateral del ponton
- Se continua con la excavación de caisson para muro lateral



Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA.

* Miércoles 18 de Marzo de 2026

- Personal en obra
 - Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficiales (4), Ayudantes (21), controladoras (8)
- Clima: Soleado (mañana), lluvioso (tarde)
- Actividades
 - Se continua con el cazo y formateo para pavimento en el tramo 1
 - Se continua con la perforación de anclajes positivos
 - Se continua con el figuado y armado de acero para viga reticular
 - Se continua con la excavación de caisson para muro lateral
 - se realiza vaciado de pavimento MP-15 en el tramo 1


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA.

* Jueves 19 de Marzo de 2026


- Personal en obra.
 - Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro.

Oficiales (4), Ayudantes (21), controladores (8)

• clima: Soleado

• Actividades

- Se continua con el reseo y formateo de subbase para pavimento en el tramo 1.
- Se continua con la perforación de anclajes pasivos
- Se continua con el figurado y armado de acero para vigas reticulares
- Se continua con la excavación de caisson para muro lateral
- Se realiza vaciado de caisson del muro lateral
- Se realiza socialización del 50% de obra.


Ing. Residente.


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA.

* Viernes 20 de Marzo de 2026


• Personal en obra


Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial (4), Ayudante (21) controladores (8)

• clima: Soleado

• Actividades

- Se realiza vaciado de pavimento MP-25 en el tramo 1
- Se inicia el figurado y formateo de losa para pontón
- Se continua con el figurado y vaciado de viga reticular
- Se continua con el reseo de subbase en el tramo 2
- Se realiza vaciado de solado para zapato de muro lateral


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA.

* Sábado 21 de Marzo de 2026


• Personal en obra

- Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Ambiental
Profesional Social, Profesional SST, Maestro, Oficial (4)
Ayudantes (21), controladoras (8)

• clima: Soleado

• Actividades

- Se continua con la extensión de subbase para pavimento en el tramo 1
- Se continua con el formateo y figurado de acero para pavimento ME-US
- Se continua con el formateo y figurado de acero para pontón
- Se realiza vaciado de bordillo para pavimento


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

* Martes 24 de Marzo de 2026

• Personal en obra

- Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Ambiental
Profesional social, Profesional SST, Maestro, Oficial (4)
Ayudantes (21), controladoras (8)

• clima: Soleado

• Actividades

- Se continua con el cerco de subbase para pavimento en el tramo 1
- Se continua con el figurado y formateo para losa del pontón
- Se continua con el figurado y vaciado de lig a reticular


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

* Miércoles 25 de Marzo de 2026

• Personal en obra

- Ing. Director, Ing. Residente, Profesional social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial (4), Ayudantes (21), controladores (8)

• clima = soleado

• Sotando Actividades


- Se continua con la extensión y compactación de subbase para pavimento en el tramo 1

- Se continua con la extensión y compactación de subbase para pavimento en el tramo 2

- Se continua con el figurado y formateo de losa para ponton.

- Se realiza vaciado de pavimento MR-45

- Se continua con el figurado y vaciado de viga reticular.



Ing. Residente



Ing. Residente INTERVENTORIA

* Jueves 26 de Marzo de 2026

• Personal en obra

- Ing. Director, Ing. Residente, Profesional social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial (4), Ayudantes (21), controladoras (8)

• clima = Soleado

• Actividades:


- Se continua con la extensión y compactación de subbase para pavimento en el tramo 1


- Se continua con la extensión de subbase en el tramo 2

- Se continua con el figurado y armado de acero para ponton

- Se continua con el figurado y vaciado de viga


reticular para pantalla



Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

* Viernes 27 de Marzo de 2026

- Personal en obra
 - Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial (4), Ayudantes (21), controladores (6)
- clima: lluvioso
- Actividades
 - Se continua con la extensión y compactación de Subbase en el tramo 1
 - Se continua con la extensión y compactación de Subbase en el tramo 2.
 - Se continua con el formateo y figurado de acero par losa del ponton
 - Se continua con el vaciado de viga reticular de la pantalla



Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA

* Sábado, 28 de Marzo de 2026

- Personal en obra
 - Ing. Director, Ing. Residente, Profesional SST, Maestro, Oficial (4), Ayudantes (21), controladores (6)
- clima: Soleado
- Actividades
 - se realiza vaciado de pavimento MR-US
 - se continua con la extensión de Subbase para pavimento en el tramo 2.


- Se continua con el pormonteo y figurado de acero para ponton
- se continua con el vaciado de uiga reticular en el tramo 3


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

* Lunes 30 de Marzo de 2026

- Personal en obra.
- Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficiales (2), Ayudantes controladores (6)
- clima = Soleado (mañana), lluvioso (tarde)
- Actividades
 - se continua con el vaciado de bordillo para pavimento en el tramo 1
 - se continua con el reseo de subbase en el tramo 2
 - se realiza vaciado de losa para el ponton en el tramo 3
 - se continua con el vaciado de uiga reticular en el tramo 3


Ing. Residente


ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

* Martes 31 de Marzo de 2026

- Personal en obra
- Ing. Director, Ing. Residente, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, Maestro, Oficial, (2), Ayudantes controladores (6)
- clima = Soleado
- Actividades

- Se continua con el vaciado de bordillo para pavimento en el tramo 1
- Se continua con la extensión de subbase para pavimento en el tramo 2.
- Se continua con el vaciado de viga reticular en el tramo 3
- Se inicia el figurado de acero para muro lateral.


Ing. Residente


ING. RESIDENTE
34301534
INTE
