
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 24/12/2025		
CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/06/2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
FORMA DE PAGO	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
	PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE AGOSTO	OCTUBRE
	SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
	TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 15 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
	Notas:		
	<p>1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p>2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>3. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.</p>		

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana – CACOM 6, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.</p> <p>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>5. La forma de pago establecida no será obstáculo, para que, de una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegara a existir disponibilidad de recursos en el PAC del MINISTERIO y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia del año 2024.</p> <p>6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El pago se realizará 45 días posterior al cumplimiento del trámite administrativo para pago (entrega de bienes y/o servicios y documentos para pago aprobados por DECOP y DEFIN).</p>
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	1.379.276.488,57
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CESION DE DERECHOS ECONÓMICOS
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	1.379.276.488,57
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ITEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACION FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
	Vigencia:	12-12-2024

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE AGOSTO	OCTUBRE
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE OCTUBRE	DICIEMBRE
CUARTO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 15 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA) 15 de diciembre 2025


CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 15/12/2025


OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO MODIFICACION FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE AGOSTO	OCTUBRE
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE OCTUBRE	DICIEMBRE
CUARTO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 21 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

FORMA DE PAGO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	21 de diciembre 2025		
<p>En Tres Esquinas, Caquetá, el día 24 del mes de diciembre de 2025, el señor CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LEVISDAN DE LEON ALEMAN en su calidad de Representante Legal de la empresa JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S, Contratista; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
Actividades de obra descritas en el contrato principal y recibidas a satisfacción	01	Se anexa cuadro de ejecución de actividades de obra (corte de obra parcial No.4 con corte del 21 de diciembre) y documentos que soportan lo referenciado.	
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	011037-0727806 ANT
EDNA TATIANA BEJARANO RUBIANO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESOLUCION S2019060048777 DEL 23/05/2019
JOSÉ GUILLERMO ASSIA DE LA ROSA	INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS	22202-324081 COR

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

Incrementa el valor del bien:

SI: NO: Valor del incremento:

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: NO: Años a incrementar: 3 AÑOS


En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI NO N/A

DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	No DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	VALOR
TALLERES GRUAL CACOM-6	8004050000000000000535703	163600000729	\$ 72,129,841.47
IN25 SUBESTACION ELECTRICA CACOM6	8004050000000000000333980	163600000720	\$ 4,759,573.72
HORNO INCINERADOR NUEVO	8004050000000000000599775	163600000719	\$ 175,618,940.18
BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6	800405000000000000062063	163600000716	\$ 91,980,721.80
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6	800405000000000000046554	163600000721	\$ 90,371,121.49
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6	800405000000000000047312	163600000722	\$ 58,102,247.72
OP05 TORRE DE CONTROL VIEJA CACOM6	800405000000000000046804	163600000732	\$ 29,189,652.26
TOTAL			\$ 522,152,098.640

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	1.379.276.488,57	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	1.379.276.488,57	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 PAC (SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE)	\$ 186,296,745.06	Factura No. FEDM-5033



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 PAC (OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE)	\$ 391,162,006.33	Factura No. FEVT 1
TERCER PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 3 PAC (NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE)	\$ 221,309,730.87	Factura No. FEVT 3
CUARTO PAGO FINAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 4 PAC (DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR)	\$ 580,508,006.31	Factura No. FEVT 8
SALDO	\$ 0,00	N/A

OBSERVACIONES

Mediante documento suscrito entre las partes el 16 de septiembre de 2025 y aprobado el 30 de septiembre de 2025, se efectuó la cesión total de los derechos económicos derivados del presente contrato por parte del señor Levisdan de León Alemán, identificado con cédula de ciudadanía N.º 92.540.211, en calidad de representante legal de la empresa JML Lo Máximo en Construcciones S.A.S., identificada con NIT 900.358.850-6, quien actúa como cedente, a favor del señor Camilo Andrés Vergara López, identificado con cédula de ciudadanía N.º 1.102.836.720, en calidad de representante legal de la empresa Ingeniería Vergara López S.A.S., identificada con NIT 901.408.644-4, quien actúa como cesionario. En consecuencia, a partir de la fecha de aprobación, los derechos económicos del contrato recaen en el cesionario, conforme a las condiciones y autorizaciones establecidas en la cesión publicada

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 LEVISDAN DE LEON ALEMAN CONTRATISTA	 ST. BAUTISTA GARCIA DIZON STIWARD SUPERVISOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO ORDENADOR DEL GASTO

Espacio para
Logo Corporativo

JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES
SAS
NIT 900.358.850-6
CR 39 10 A 12
Tel: 3004046551
Sincelejo - Colombia
jmlconstruccionesas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEVT 8

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 6		
NIT	800.141.638-5	Teléfono	(000) 0000000
Dirección	VEREDA TRES ESQUINAS- COMANDO AEREO DE COMBATE No 6	Ciudad	Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 15:45
Expedición	22/12/2025, 23:47
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTOS DIRECTOS	1.00	458,645,813.63
2	ADMINISTRACIÓN (22%)	1.00	100,902,079.00
3	IMPREVISTOS (1%)	1.00	4,586,458.14
4	UTILIDAD (3%)	1.00	16,373,655.54

Total items: 4

Valor en Letras:

Quinientos ochenta millones quinientos ocho mil pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por \$ 580,508,006.31


Observaciones:

VALOR POR ACTA DE CORTE 04 DE CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 CUYO OBJETO ES "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6.#\$15-0105008;1CONTRATO021-00-I-CACOM-6-GRUAL 2025;didson.bautista@fac.mil.co#\$ FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 55000003763

Total Bruto	577,893,725.17
IVA 19%	2,614,281.14
Total a Pagar	580,508,006.31

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099860249 aprobado en 20251007 prefijo FEVT desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**


Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: dbb6a696a2d2830fec589bfb4463d78bdea4cb5a4ca78c87c91c9b08744558c54ae29155014fd0784ccfa748343dee5a

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Ordenador del Gasto	CACOM-6
No. Contrato	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
Objeto del contrato	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
Valor inicial del contrato	\$ 1,379,276,488.57
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 1,379,276,488.57

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-001-002-11		10		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 1,103,422,039.74
02-02-02-005-004-01-2		10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 275,854,448.83
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 1,379,276,488.57
TOTAL VIGENCIAS						\$ 1,379,276,488.57
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)						\$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 140,078,544.42	\$ 186,296,745.0600	\$ 963,343,495.32
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 46,218,200.64		\$ 229,636,248.19
2	OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	==O16	\$ 252,863,053.49	\$ 391,162,006.3300	\$ 710,480,441.83
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 138,298,952.84		\$ 91,337,295.35
3	NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 188,328,343.1900	\$ 221,309,730.8700	\$ 522,152,098.64
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 32,981,387.68		\$ 58,355,907.67
4	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 522,152,098.64	\$ 580,508,006.3100	\$ 0.00
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL- MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL y CALIDAD DE LOS ACABADOS	\$ 58,355,907.67		\$ 0.00
TOTALES							\$ 580,508,006.31	\$ 1,379,276,488.57	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA	24/12/2025



**CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

DIOMEDES ARCESIO MONTERROSA CONTRERAS identificado con C.C No 92498683 de SINCELEJO (SUCRE), y con tarjeta profesional No. 126980-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de la empresa JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 900.358.850-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Sincelejo, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que el consorcio se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

DIOMEDES ARCESIO MONTERROSA CONTRERAS
C.C No 92498683
TP No. 126980-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

126980-T

DIOMEDES ARCESIO
MONTERROSA CONTRERAS
C.C. 92498683
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE 

LUIS ALONSO COLMENARI TRIGUEZ 137182



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.498.683**


MONTERROSA CONTRERAS

APELLIDOS
DIOMEDES ARCESIO

NOMBRES

 FIRMA





FIRMA DEL TITULAR 48560

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1960**

SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-JUN-1979 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 INDICE DERECHO

 REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-2800100-00620940 M-0092498683-20140910 0039929741A 1 7533047165

UNIDAD DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E1F992FA77E0E0A7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIOMEDES ARCESIO MONTERROSA CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 92498683 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 126980-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LISTADO DE PERSONAL - CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

LISTADO DEL PERSONAL			
DICIEMBRE 20245			
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
No	Nombre Completo	Número de identificación	Cargo
1	Diego Armando López Sánchez	1,193,029,002	Ing. Residente
2	Karen Lizeth Bastidas Meneses	1,006,504,771	Profesional SST
3	Jose Guillermo Assia de la Rosa	1,103,096,213	Ing. Estructural
PERSONAL OBRERO			
No	Nombre Completo	Número de identificación	Cargo
1	Luis Manuel Mercado Ledesma	1,100,542,817	Ayudante
2	Josy Esteban Acosta Ortega	1,005,418,692	Oficial
3	Erik Daniel Barragán Rodríguez	92,099,787	Maestro de Obra
4	José Domingo Ortega Leiva	1,094,164,315	Ayudante
5	Luis Mario Trejo Ordoñez	1,102,575,083	Ayudante
6	Daniel Eduardo Barragán Palomino	1,100,548,145	Electrico
7	William Jose Mendez Rivera	1,051,887,231	Pintor
8	Joselino Mejia Ortiz	1,127,074,102	Pintor



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Jose Domingo Ortega Leyva identificado con CC. 1094164315 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/09/13	Tipo de Vinculación	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	Fecha Retiro	2025/12/21
Clase de Riesgo	5	Código Actividad Económica	5711001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025N1094164315A1794132**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Luis Manuel Mercado Ledesma identificado con CC. 1100542817 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/09/10	Tipo de Vinculación	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	Fecha Retiro	2025/12/21
Clase de Riesgo	5	Código Actividad Económica	5711001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025N1100542817A1794143**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Luis Mario Trejo Ordoñez identificado con CC. 1102575083 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/09/10	Tipo de Vinculación	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	Fecha Retiro	2025/12/21
Clase de Riesgo	5	Código Actividad Económica	5711001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025N1102575083A1794151**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | **Línea Gratuita Nacional:** (+57) 01-8000-111-170 - **Teléfono:** +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

JOSY ESTEBAN ACOSTA ORTEGA identificado con CC. 1005418692 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS
Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2025/08/15	Fecha inicio contrato	2025/08/11
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2025/12/15
Riesgo	5	Código actividad económica	5711001 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de
Estado afiliación	Activa	Estado del contrato	Activa
Fecha retiro	-		

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025J1005418692A1794156**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ identificado con CC. 1193029002 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS
Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2025/08/15	Fecha inicio contrato	2025/08/11
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2025/12/15
Riesgo	5	Código actividad económica	5711001 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	Estado del contrato	Activa

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025D1193029002L1794163**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
 Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
 Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
 DE TODOS LOS
 COLOMBIANOS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

ERIK DANIEL BARRAGAN RODRIGUEZ identificado con CC. 92099787 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS
Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2025/08/15	Fecha inicio contrato	2025/08/11
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2025/12/15
Riesgo	5	Código actividad económica	5711001 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	Estado del contrato	Activa

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025E92099787B1794179**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
 Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
 Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
 DE TODOS LOS
 COLOMBIANOS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

KAREN LIZETH BASTIDAS MENESES identificado con CC. 1006504771 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS
Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2025/08/25	Fecha inicio contrato	2025/08/11
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2025/12/15
Riesgo	5	Código actividad económica	5711001 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	Estado del contrato	Activa

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025K1006504771B1794185**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
 Nit. 860.011.153-6 | **Línea Gratuita Nacional:** (+57) 01-8000-111-170 - **Teléfono:** +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
 Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
 DE TODOS LOS
 COLOMBIANOS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Daniel Eduardo Barragan Palomino identificado con CC. 1100548145 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	Tipo y Numero de Documento	NI - 900358850

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/12/07	Tipo de Vinculación	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	Fecha Retiro	2025/12/21
Clase de Riesgo	5	Código Actividad Económica	5711001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre del 2025.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22122025N1100548145A1794320**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

Medellín, 24 de November de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de V&L PROCESOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000112 RIESGO 3				Clase: 3	Porcentaje Cotización:	2.436 %
C1051887231	MELENDEZ RIVERA WILLIAM JOSE	25/11/2025		22015919	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
 Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/11/2025 16:37:59 .
 Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.102.2.12, 192.230.104.12, 172.16.42.57

Medellín, 24 de November de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de V&L PROCESOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000112 RIESGO 3				Clase: 3	Porcentaje Cotización:	2.436 %
C1127074102	MEJIA ORTIZ JOSELINO	25/11/2025		13154255	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
 Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/11/2025 16:25:24 .
 Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
 Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.102.2.12, 192.230.104.12, 172.16.42.57

PAGADA 2025-11-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VYL PROCESOS SAS			
Documento	NI 901912094	Dirección	CR 19 #17 - 32	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3202088413	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	
Ciudad	FUNZA	Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal	ARENAS LIBERATO JOSE JAVIER		Identificación	CC 80383343
		Total Afiliados	2	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1127074102	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento		Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	
Tipo Cotizante	01 00	Residente	Exonerado	S	MEJIA ORTIZ JOSELINO	95001000 - 95		CUNDINAMARCA	

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja			Parafiscales											
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	F	\$ 1.423.500	230301	16 %	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	EPS002		4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 1.423.500	\$ 34.700	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

PAGADA 2025-11-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VYL PROCESOS SAS		
Documento	NI 901912094	Dirección	CR 19 #17 - 32
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3202088413
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL
Ciudad	FUNZA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	ARENAS LIBERATO JOSE JAVIER		Total Afiliados 2
		Identificación	CC 80383343

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1051887231	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento		Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	
Tipo Cotizante	01 00	Residente	Exonerado S	MELENDEZ RIVERA WILLIAM JOSE	95001000 - 95			CUNDINAMARCA	

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja			Parafiscales											
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
															0	30	30	0	F			16 %	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	EPS002		4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 1.423.500	\$ 34.700	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 92099787
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900358850	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									92099787
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:									JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	APELLIDOS:	BARRAGAN RODRIGUEZ NOMBRES:									ERIK DANIEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:									ATLANTICO	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:									CAQUETA
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									4656446	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:										Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																
7999254531		E		diciembre - 2025		enero - 2026		15/12/2025		SUCURSAL		002 - CACOM 6 FLORENCIA																																		
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES																															
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		SALUD		ARP		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU													
																						FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
\$ 1.423.500																		230201-PROTECCION	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450		\$ 69.400	21	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 308.700

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																
7998196765		E		noviembre - 2025		diciembre - 2025		09/12/2025		SUCURSAL		002 - CACOM 6 FLORENCIA																																		
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES																															
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		SALUD		ARP		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU													
																						FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
\$ 1.423.500																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 440.900



Entregado por: _____

Recibido por: _____

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1005418692
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE																													
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					900358850					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1005418692														
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS					ATLANTICO					APELLIDOS:					ACOSTA ORTEGA NOMBRES:					JOSY ESTEBAN														
CIUDAD/MUNICIPIO:					BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:					4656446					CIUDAD/MUNICIPIO:					FLORENCIA DEPARTAMENTO:					CAQUETA														
DIRECCIÓN:					CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:					NO									
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO									
TIPO EMPRESA:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					SI					SI					TIPO DE SALARIO:					FIJO					SI									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
7999254531		E		diciembre - 2025		enero - 2026		15/12/2025				002 - CACOM 6 FLORENCIA																																			
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						FSP
\$ 1.423.500																		230301-PORVENIR	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450		\$ 69.400	21	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 308.700

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
7998196765		E		noviembre - 2025		diciembre - 2025		09/12/2025				002 - CACOM 6 FLORENCIA																																			
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						FSP
\$ 1.423.500																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 440.900

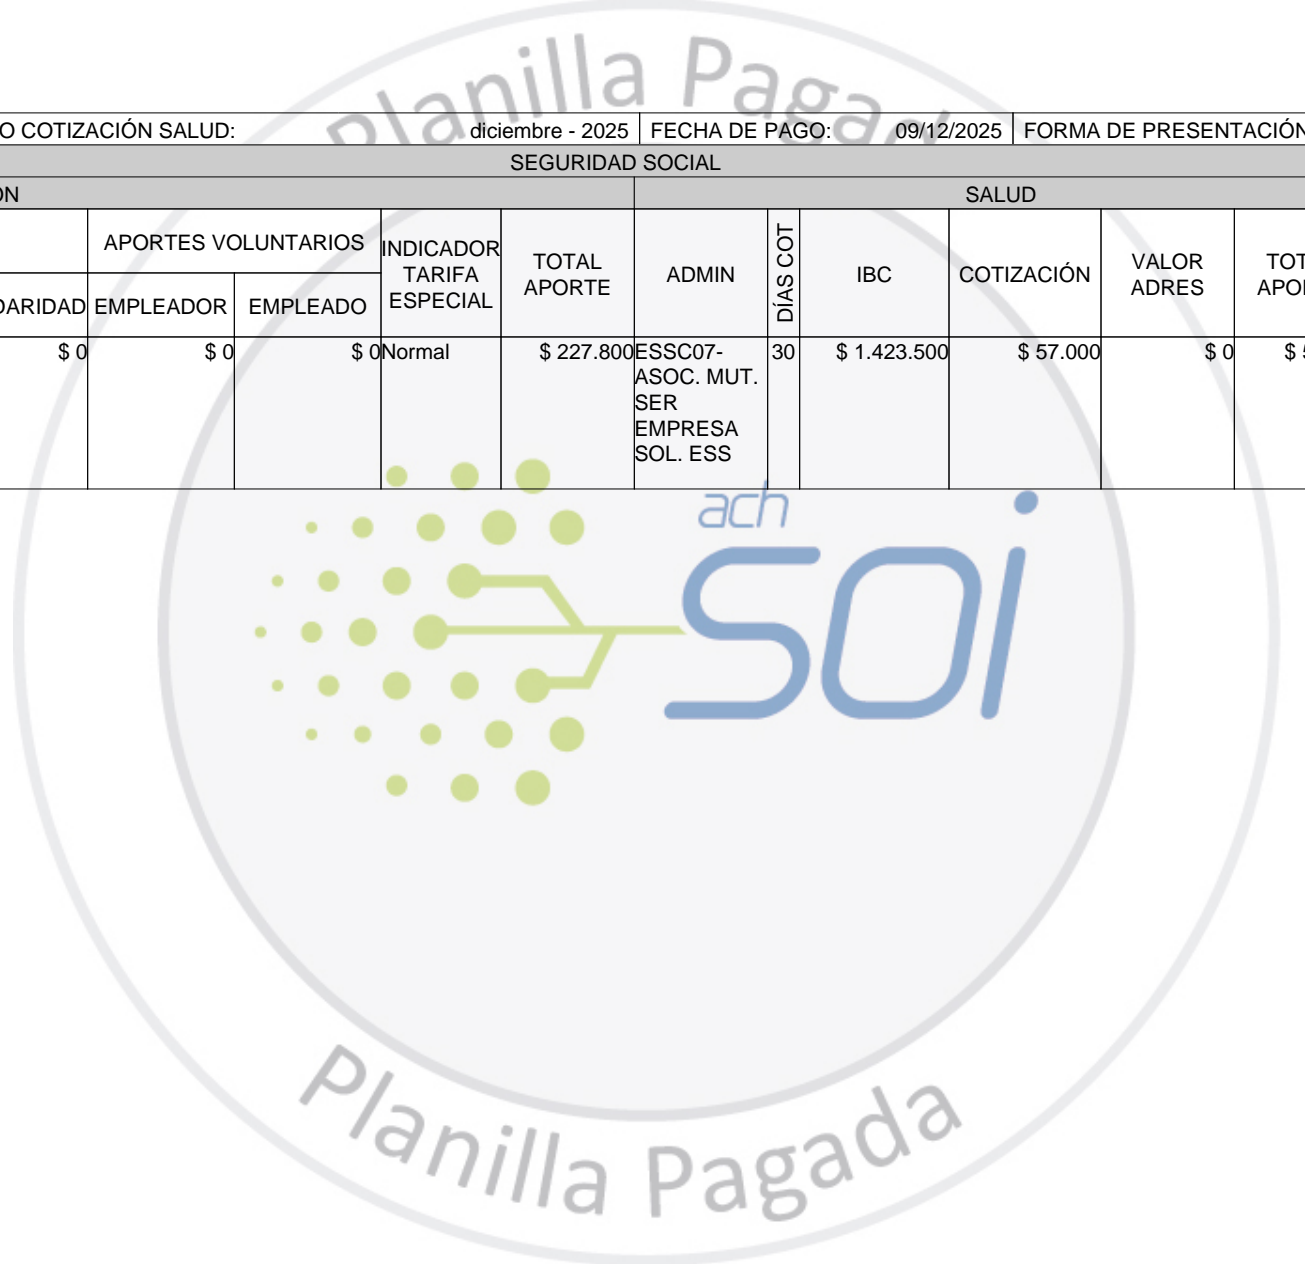

Entregado por: _____

Recibido por: _____

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1006504771
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900358850	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									1006504771
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:									JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	APELLLIDOS:	BASTIDAS MENESES NOMBRES:									KAREN LIZETH
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:									ATLANTICO	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:									CAQUETA
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									4656446	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:										Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																		
7999254531		E		diciembre - 2025		enero - 2026		15/12/2025		SUCURSAL		002 - CACOM 6 FLORENCIA																																				
NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					PARAFISCALES																		
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						EMPLEADOR	EMPLEADO
\$ 1.423.500																		230301-PORVENIR	21	\$ 996.450	\$ 159.500	A	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	ESSC62-ASMET SALUD EPS	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450		\$ 69.400	21	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 308.700

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																		
7998196765		E		noviembre - 2025		diciembre - 2025		09/12/2025		SUCURSAL		002 - CACOM 6 FLORENCIA																																				
NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					PARAFISCALES																		
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						EMPLEADOR	EMPLEADO
\$ 1.423.500																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	A	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 440.900



Entregado por: _____

Recibido por: _____

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1094164315
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE																													
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					900358850					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1094164315														
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS					ATLANTICO					APELLEDOS:					ORTEGA LEYVA NOMBRES:					JOSE DOMINGO CAQUETA														
CIUDAD/MUNICIPIO:					BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:					4656446					CIUDAD/MUNICIPIO:					FLORENCIA DEPARTAMENTO:																			
DIRECCIÓN:					CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras					SI					TIPO DE SALARIO:					FIJO														
TIPO EMPRESA:																																							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

PLANILLA No:		7999254531		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		diciembre - 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		enero - 2026		FECHA DE PAGO:		15/12/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - CACOM 6 FLORENCIA																																								
NOVEDADES																				PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					CCF					PARAFISCALES					SENA					ICBF					ESAP					MINEDU				
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CIOR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE																														
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450		\$ 69.400	21	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																												

TOTAL PAGADO: \$ 308.700

PLANILLA No:		7998196765		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		noviembre - 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		diciembre - 2025		FECHA DE PAGO:		09/12/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - CACOM 6 FLORENCIA																																								
NOVEDADES																				PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					CCF					PARAFISCALES					SENA					ICBF					ESAP					MINEDU				
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CIOR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE																														
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																												

TOTAL PAGADO: \$ 440.900



Entregado por: _____

Recibido por: _____

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1100542817
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900358850	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									1100542817
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:									JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	APELLIDOS:	MERCADO LEDESMA NOMBRES:									LUIS MANUEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:									ATLANTICO	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:									CAQUETA
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									4656446	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:										Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																		
7999254531		E		diciembre - 2025		enero - 2026		15/12/2025		SUCURSAL		002 - CACOM 6 FLORENCIA																																				
NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				PARAFISCALES																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						EMPLEADOR	EMPLEADO
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	21	\$ 996.450	\$ 159.500	A	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450		\$ 69.400	21	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 308.700

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																		
7998196765		E		noviembre - 2025		diciembre - 2025		09/12/2025		SUCURSAL		002 - CACOM 6 FLORENCIA																																				
NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				PARAFISCALES																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						EMPLEADOR	EMPLEADO
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	A	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 440.900



Entregado por: _____

Recibido por: _____

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1100548145
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900358850	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									1100548145
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:									JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	APELLIDOS:	BARRAGAN PALOMINO NOMBRES:									DANIEL EDUARDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:									ATLANTICO	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:									CAQUETA
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									4656446	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:										Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI

PLANILLA No:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	FECHA DE PAGO:	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL:	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:
7999254531	E	diciembre - 2025	enero - 2026	15/12/2025			002 - CACOM 6 FLORENCIA

SALARIO BÁSICO	NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
	ING	RET	TDE	TAE	TDL	TAP	CIC	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		SALUD		ARP		CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU														
																						FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT						IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
\$ 1.423.500	06	21																230301-PORVENIR	16	\$ 759.200	\$ 121.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 121.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS	16	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 30.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 759.200		\$ 52.900	16	\$ 759.200	CCF13-COMFACA	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 235.200



Entregado por: _____

Recibido por: _____

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1102575083
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					900358850					TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1102575083				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:					JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO					APELLLIDOS: TREJO ORDONEZ NOMBRES:					LUIS MARIO CAQUETA				
CIUDAD/MUNICIPIO: CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:					4656446					CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA DEPARTAMENTO:									
DIRECCIÓN: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES					TIPO COTIZANTE: DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: NO				
TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras					TIPO DE SALARIO: COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					FIJO SI				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI														

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																
7999254531		E		diciembre - 2025		enero - 2026		15/12/2025				002 - CACOM 6 FLORENCIA																																		
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES																															
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450		\$ 69.400	21	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 308.700

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																
7998196765		E		noviembre - 2025		diciembre - 2025		09/12/2025				002 - CACOM 6 FLORENCIA																																		
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES																															
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 440.900



Entregado por: _____

Recibido por: _____

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1193029002
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900358850	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									1193029002
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:									JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	APELLIDOS:	LOPEZ SANCHEZ NOMBRES:									DIEGO ARMANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 39 NRO 10A-12 TELÉFONO:									ATLANTICO	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:									CAQUETA
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									4656446	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:										Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
7999254531		E		diciembre - 2025		enero - 2026		15/12/2025				002 - CACOM 6 FLORENCIA																																			
NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					PARAFISCALES																	
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						SUBSISTENCIA
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450		\$ 69.400	21	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 308.700

PLANILLA No:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		FECHA DE PAGO:		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
7998196765		E		noviembre - 2025		diciembre - 2025		09/12/2025				002 - CACOM 6 FLORENCIA																																			
NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					PARAFISCALES																	
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COK	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						SUBSISTENCIA
\$ 1.423.500																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 440.900



Entregado por: _____

Recibido por: _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1103096213		ASSIA DE LA ROSA JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 #15 91	SINCELEJO-SUCRE	3016111108	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1992650073	9494907486	I	2025/12/03	2025/12/09	BANCOLOMBIA	6	\$437,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																								
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
1	CC	1103096213	ASSIA DE LA ROSA JOSE GUILLERMO																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$187,500	0	50	50	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	0	50	50	No	\$435,400																	
Total Afiliados(1)																								\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			50	50			\$1,500,000	\$7,900			50	50															\$435,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1103096213		ASSIA DE LA ROSA JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 #15 91	SINCELEJO-SUCRE	3016111108	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	1992650073	9494907486	I	2025/12/03	2025/12/09	BANCOLOMBIA		6	\$437,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$1,000	\$0	\$241,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$240,000	\$1,000	\$0	\$241,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,900	\$100	\$0	\$8,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,900	\$100	\$0	\$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,500	\$800	\$0	\$188,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$187,500	\$800	\$0	\$188,300
TOTAL				1	\$435,400	\$1,900	\$0	\$437,300

		FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-092		
		FORMATO BALANCE DE OBRA				Versión N°:	8		
						Vigencia:	30/12/2024		
INFORMACION GENERAL									
FECHA DE BALANCE	30/09/2025								
CONTRATO No.	021-004-CACOM-6-GRUAL-2025								
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6								
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S								
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIBSON STWARD								
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA									
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACION MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
1	PRELIMINARES								
1.1	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS Y RETIRO.	M²	15.66	\$ 22.935.00	\$ 359.162.10	31.74	\$ 728.055.52	16.08	MAYOR Se adiciono otro espacio.
1.2	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE SOBRESANTES	M²	328.50	\$ 15.425.00	\$ 5.067.112.50	267.42	\$ 4.124.996.36	- 61.08	MENOR
1.3	DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M²	6.06	\$ 11.925.00	\$ 72.205.88	11.30	\$ 134.740.58	5.24	MAYOR Se lavataron cuchillas para un mejor sello en con la cubierta.
1.4	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA. EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERÍA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE. SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR	m	956.78	\$ 20.141.00	\$ 19.270.103.16	1.579.62	\$ 31.815.126.42	622.86	MAYOR Se hizo mantenimiento a la periferia interna de la cubierta.
1.5	MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS. EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERÍA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE. SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS POR AMBAS CARAS, DEL COLOR A CONVENIR	M²	7.40	\$ 21.796.00	\$ 161.290.40	8.82	\$ 192.240.72	1.42	MAYOR Se abarcó un área mayor del elemento.
1.6	REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE Ø 12" A Ø 4" (INCLUYE RESANE)	M	6.00	\$ 22.029.00	\$ 132.174.00	-	\$ -	- 6.00	MENOR
1.7	DESMONTE DE VENTANERA, INCLUYE VIDRO Y ANCHOS Y RETIRO DE SOBRESANTES	M²	3.27	\$ 21.269.00	\$ 69.549.63	44.51	\$ 946.581.10	41.24	MAYOR Se intervino un frente adicional.
1.8	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M²	51.69	\$ 133.988.00	\$ 6.920.904.61	46.61	\$ 6.240.291.90	- 5.08	MAYOR
1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES	Un	4.00	\$ 15.912.00	\$ 63.648.00	6.00	\$ 95.472.00	2.00	MAYOR Se adiciono otro espacio.
1.10	RETIRO DE LUMINARIAS Y Tomas INTERNAS UBICADAS EN EL ÁREA A INTERVENIR. INCLUYE RESANE DE PARED Y ADOBOS, LAS CUALES DEBERAN SER ENTREGADAS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	GBL	1.00	\$ 505.479.00	\$ 505.479.00	1.00	\$ 505.479.00	-	IGUAL
1.11	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES	UN	12.00	\$ 24.986.00	\$ 299.832.00	15.00	\$ 374.790.00	3.00	MAYOR Se adiciono otro espacio.
1.12	DESMONTE DE ARCHIVO RODANTE O SIMILAR INCLUYE DIVISIONES, RIELES Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN	M²	20.46	\$ 19.559.00	\$ 400.177.14	23.32	\$ 456.115.88	2.86	MAYOR Se ajusta a la necesidad del frente de trabajo
1.13	REINSTALACION DE ARCHIVO RODANTE O SIMILAR INCLUYE DIVISIONES, RIELES Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN	M²	20.46	\$ 34.451.00	\$ 704.867.46	23.32	\$ 803.397.32	2.86	MAYOR Se ajusta a la necesidad del frente de trabajo
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ -		\$ -		IGUAL
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M³	64.90	\$ 231.319.00	\$ 15.012.047.93	64.83	\$ 14.996.138.97	- 0.07	MENOR
2.2	NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE HASTA OBTENER UN CBR URBANO DEL 95%.	M²	200.00	\$ 17.305.00	\$ 3.461.000.00	209.08	\$ 3.618.051.53	9.08	MAYOR
2.3	EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA VERDE, NORMA COLOMBIANA CS308 (0.84MX0.50M), INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACION Y RECUPERACION DE LA ZONA VERDE	M³	32.00	\$ 138.718.00	\$ 4.438.976.00	-	\$ -	- 32.00	MENOR
2.4	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGUN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M³	54.00	\$ 198.235.00	\$ 10.704.690.00	40.11	\$ 7.950.699.56	- 13.89	MENOR
3	CIMENTACION, CONCRETOS Y MORTEROS				\$ -		\$ -		IGUAL
3.1	ALISTADO DE PISO ACM	M²	120.00	\$ 27.817.00	\$ 3.338.040.00	137.28	\$ 3.818.717.76	17.28	MAYOR Se ajusta a la necesidad del frente de trabajo
3.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3- E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES*	M²	474.69	\$ 34.247.00	\$ 16.256.639.94	466.11	\$ 15.962.852.04	- 8.58	MENOR
3.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGUN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M²	32.00	\$ 27.076.00	\$ 866.432.00	135.41	\$ 3.666.225.78	103.41	MAYOR
3.4	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M²	9.00	\$ 573.136.00	\$ 5.158.224.00	1.75	\$ 1.002.988.00	- 7.25	MENOR
3.5	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	1.40	\$ 1.403.727.00	\$ 1.965.217.80	1.40	\$ 1.965.217.80	-	IGUAL
3.6	ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	10.00	\$ 1.652.037.00	\$ 16.520.370.00	9.49	\$ 15.677.831.13	- 0.51	MENOR
3.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	147.96	\$ 201.569.00	\$ 29.824.149.24	139.84	\$ 28.187.408.96	- 8.12	MENOR
3.8	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS	M²	1.33	\$ 1.418.263.00	\$ 1.889.126.32	1.22	\$ 1.735.953.91	- 0.11	MENOR
3.9	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M²	10.00	\$ 1.703.981.00	\$ 17.039.810.00	8.25	\$ 14.062.955.19	- 1.75	MENOR
3.11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.15/0.30 EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	14.80	\$ 155.098.00	\$ 2.295.450.40	13.60	\$ 2.109.332.80	- 1.20	MENOR
3.11	COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	0.29	\$ 1.505.748.00	\$ 433.655.42	1.35	\$ 2.032.759.80	1.06	MAYOR
3.12	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	5.00	\$ 1.855.885.00	\$ 9.279.425.00	3.71	\$ 6.889.894.68	- 1.29	MENOR
3.13	VIGAS AREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	5.00	\$ 1.817.878.00	\$ 9.089.390.00	3.80	\$ 6.900.483.10	- 1.20	MENOR
3.14	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI (m³) INCLUYE FORMALETAS	M³	0.11	\$ 905.688.00	\$ 97.814.30	-	\$ -	- 0.11	MENOR
3.15	MESON EN CONCRETO, INCLUYE FORMALETAS Y ACERO DE REFUERZO	M²	2.94	\$ 152.248.00	\$ 447.809.12	1.50	\$ 228.372.00	- 1.44	MENOR
3.16	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E= 0.13M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA	M²	41.00	\$ 139.356.00	\$ 5.713.596.00	72.02	\$ 10.036.697.83	31.02	MAYOR Se ajusta a la necesidad del frente de trabajo
3.17	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR	M²	175.00	\$ 9.802.00	\$ 1.715.350.00	135.84	\$ 1.331.503.88	- 39.16	MENOR
3.18	CONSTRUCCION DE CUNETAS - BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI SEGUN PLANOS INCLUYE FORMALETAS	M	9.00	\$ 85.961.00	\$ 773.829.00	10.10	\$ 866.408.10	1.10	MAYOR Se ajusta a la necesidad del frente de trabajo
4	ESTRUCTURA				\$ -		\$ -		IGUAL
4.1	ACERO DE REFUERZO				\$ -		\$ -		IGUAL
4.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA - NTC 8806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO (kg)	KG	599.86	\$ 8.194.00	\$ 4.915.233.17	285.54	\$ 2.339.734.43	- 314.32	MENOR
4.1.2	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY- 420 MPA GR 60- NTC 2289 INCLUYE EPONICO, ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO	KG	4.180.99	\$ 10.567.00	\$ 44.180.562.24	4.311.31	\$ 45.557.626.30	130.32	MAYOR Mejoramiento de la estructura
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ -		\$ -		IGUAL
5.1	INSTALACION HIDRAULICA				\$ -		\$ -		IGUAL
5.1.1	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	2.00	\$ 26.869.00	\$ 53.738.00	1.00	\$ 26.869.00	- 1.00	MENOR
5.1.2	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	40.00	\$ 29.104.00	\$ 1.164.160.00	25.50	\$ 742.152.00	- 14.50	MENOR
5.1.3	PRUEBA HIDRAULICA	UN	1.00	\$ 137.249.00	\$ 137.249.00	1.00	\$ 137.249.00	-	IGUAL
5.1.4	DRENAJE AIRE ACONDICIONADO TUBERIA PVC RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	18.00	\$ 20.612.00	\$ 371.016.00	3.00	\$ 61.836.00	- 15.00	MENOR
5.1.5	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" - 1"	UN	1.00	\$ 382.103.00	\$ 382.103.00	-	\$ -	- 1.00	MENOR
5.1.6	Llave TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA	UN	3.00	\$ 66.780.00	\$ 200.340.00	2.00	\$ 133.560.00	- 1.00	MENOR
5.2	INSTALACION SANITARIA				\$ -		\$ -		IGUAL
5.2.1	PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	1.00	\$ 60.437.00	\$ 60.437.00	1.00	\$ 60.437.00	-	IGUAL
5.2.2	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	10.00	\$ 33.363.00	\$ 333.530.00	10.50	\$ 350.206.50	0.50	MAYOR Se ajusta a la necesidad del frente de trabajo
5.2.3	PRUEBA SANITARIA	UN	1.00	\$ 136.256.00	\$ 136.256.00	1.00	\$ 136.256.00	-	IGUAL
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ -		\$ -		IGUAL
6.1	BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA				\$ -		\$ -		IGUAL
6.1.1	DUCTO PVC - DB DE 1X Ø 1 1/2" INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJA, TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M	37.00	\$ 21.884.00	\$ 809.708.00	-	\$ -	- 37.00	MENOR
6.1.2	DUCTO EMT DE 1X Ø 3/4" INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJA, UNIONES, TAPA CIEGAS, ELEMENTOS DE SUECCION Y ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M	150.00	\$ 32.415.00	\$ 4.862.250.00	-	\$ -	- 150.00	MENOR
6.1.3	MANTENIMIENTO DE DUCTERIA EMT EXISTENTE, LIMPIEZA Y AJUSTE, INCLUYE ELEMENTOS DE SUECCION Y ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA RESTAURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	GLB	1.00	\$ 578.304.00	\$ 578.304.00	-	\$ -	- 1.00	MENOR
6.1.4	CANALETA METALICA PROFESIONAL 120X60MM X 2 MTS DE LARGO (INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, T, TERMINALES, DIVISION Y TROQUEL)	M	26.50	\$ 84.128.00	\$ 2.229.392.00	-	\$ -	- 26.50	MENOR
6.2	TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION Y CAJAS DE CONTROL				\$ -		\$ -		IGUAL
6.2.1	TABlero DE DISTRIBUCION TRFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (m)	Un	3.00	\$ 1.028.210.00	\$ 3.024.630.00	3.00	\$ 3.024.630.00	-	IGUAL

6.2.2	MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES. INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR. ASÍ MISMO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	2.00	\$	2,276,391.00	\$	4,552,782.00	2.00	\$	4,552,782.00	-	-	IGUAL
6.2.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL DIN MONOPOLAR DX3 16 A, ICU 16 KA a 110 V / 10 KA a 230 V, CURVA C DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Un	3.00	\$	102,106.00	\$	306,318.00	-	\$	-	-	3.00	MENOR
6.3	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
6.3.1	ACOMETIDA EN CABLE 1 X (NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO. 12 CUXAWG NEUTRO + 12 CUXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS). INCLUYE DUCTERÍA, CURVAS, UNIONES, Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	180.00	\$	73,341.00	\$	13,201,380.00	112.10	\$	8,221,526.10	-	67.90	MENOR
6.3.2	ACOMETIDA EN CABLE 3/4 CU AWG PE-HF-FR-LS (FASES) + 1/4 CU AWG PE-HF-FR-LS (NEUTRO) + 1/4 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	M	67.00	\$	114,525.00	\$	7,673,175.00	70.00	\$	8,016,750.00	-	3.00	MAYOR
6.4	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
6.4.1	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO. 12 AWG, TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, RESANE, PANETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	1.00	\$	131,672.00	\$	131,672.00	2.00	\$	263,344.00	-	1.00	MAYOR
6.4.2	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO. 12 AWG, CAJA PLÁSTICA UNIVERSAL, TUBERÍA PVC 3/4", RESANE, PANETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	17.00	\$	115,263.00	\$	1,959,471.00	18.00	\$	2,074,734.00	-	1.00	MAYOR
6.4.3	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	Un	2.00	\$	23,372.00	\$	46,744.00	4.00	\$	93,488.00	-	2.00	MAYOR
6.4.4	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO	Un	2.00	\$	33,493.00	\$	66,986.00	-	\$	-	-	2.00	MENOR
6.4.5	INTERRUPTOR SENCILLO, EN SALIDA DE TUBERÍA EMT, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	7.00	\$	161,874.00	\$	1,133,118.00	4.00	\$	647,496.00	-	3.00	MENOR
6.4.6	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, RESANE, PANETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	5.00	\$	181,908.00	\$	909,540.00	6.00	\$	1,091,448.00	-	1.00	MAYOR
6.4.7	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (10/40+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1 X 10CUAWG-HF-FR-LS FASES + 1 X 10CUAWG-HF-FR-LS NEUTRO + 1 X 10 CUAWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RAWELT, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	6.00	\$	207,310.00	\$	1,865,790.00	10.00	\$	2,073,100.00	-	1.00	MAYOR
6.4.8	TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(20+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3.00	\$	214,566.00	\$	643,698.00	1.00	\$	214,566.00	-	2.00	MENOR
6.4.9	TOMACORRIENTE BIFÁSICA TRIFILAR 20A/220V(20+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3.00	\$	242,580.00	\$	727,740.00	3.00	\$	727,740.00	-	-	IGUAL
6.4.10	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (10/40+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO, CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PANETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	42.00	\$	203,296.00	\$	8,538,012.00	20.00	\$	4,065,720.00	-	22.00	MENOR
6.4.11	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/120V	Un	2.00	\$	18,269.00	\$	36,538.00	-	\$	-	-	2.00	MENOR
6.4.12	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	68.00	\$	179,073.00	\$	12,176,964.00	62.00	\$	11,102,526.00	-	6.00	MENOR
6.4.13	LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP#9.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	38.00	\$	238,066.00	\$	9,046,508.00	34.00	\$	8,094,244.00	-	4.00	MENOR
6.4.14	LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY 100W DL 600K, 1250LM, 100-240V, IP65, K08, FP#0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	17.00	\$	354,282.00	\$	6,022,454.00	15.00	\$	5,313,930.00	-	2.00	MENOR
6.4.15	SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED TORTUGA 12W DL P27751 DE SYLVANIA, 6500K, 1080LM, 12W, IP65, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	2.00	\$	158,766.00	\$	317,532.00	-	\$	-	-	2.00	MENOR
7	MAMPUESTERIA			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
7.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO S PERFORACION HORIZONTAL E=10 1/2 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	M ²	234.94	\$	134,639.00	\$	31,632,625.22	196.96	\$	26,518,564.76	-	37.98	MENOR
7.2	MURO SUPERBOARD TEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARA E=1.12 MTS	M ²	73.50	\$	119,148.00	\$	8,757,378.00	73.50	\$	8,757,378.00	-	-	IGUAL
8	CIELO RASO			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
8.1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (H ²)	M ²	407.50	\$	113,260.00	\$	46,153,450.00	340.13	\$	38,523,339.90	-	67.37	MENOR
9	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
9.1	PISO PORCELANATO 56.6X56.8CM INCLUYE BOQUILLA	M ²	48.00	\$	116,678.00	\$	5,600,544.00	50.30	\$	5,868,903.40	-	2.30	MAYOR
9.2	GUARDESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56.6 X 56.6 CM H=8CM INCLUYE BOQUILLA	m	28.00	\$	24,473.00	\$	685,244.37	44.10	\$	1,079,259.30	-	16.10	MAYOR
9.3	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M ²	43.00	\$	78,210.00	\$	3,363,030.00	30.82	\$	2,410,745.04	-	12.18	MENOR
9.4	PISO CERÁMICA ZONAS HÚMEDAS Y EXTERIORES INCLUYE BOQUILLA	M ²	15.00	\$	67,254.00	\$	1,008,810.00	20.95	\$	1,408,655.21	-	5.95	MAYOR
9.5	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO CON SIKAFELT POWER 12, DOS CAPAS Y REFUERZO DE TELA TIPO DE SIKAFELT SPP 30, INCLUYE TRATAMIENTO FISURAS	M ²	40.96	\$	67,366.00	\$	2,759,311.36	-	\$	-	-	40.96	MENOR
9.6	MEDICACIÓN DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-29 N PURCEM®, COLOR OSCURO CLARO	M	233.35	\$	28,035.00	\$	6,541,967.25	153.43	\$	4,301,325.95	-	79.92	MENOR
9.7	ESCARIFICACIÓN DE PISO Y REMOCIÓN DE TORNILLOS O ELEMENTOS SOBRESALIENTES DEL PISO + LAVADO PARA REMOCIÓN DE IMPRESAS Y GRASAS + TRATAMIENTO RELLENO Y PULIDO DE JUNTAS CON ELASTOMERO DE POLIURETANO + IMPRIMACION EN POLIURETANO DE ALTA ADHESIÓN + CAPA DE MORTERO DE NIVELACIÓN FLUIDO DE POLIURETANO + APLICACIÓN DE POLIURETANO A 3 CAPAS CON FILADA FINAL + APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE POLIURETANO AROMÁTICO	M	538.00	\$	214,385.00	\$	115,339,130.00	422.15	\$	90,502,499.12	-	115.85	MENOR
9.8	SEÑALIZACIÓN PARA DEMARCACIÓN DE ZONAS EN PINTURA EPOXICA A TRES MANOS	M	150.00	\$	30,536.00	\$	4,580,400.00	101.90	\$	3,111,618.40	-	48.10	MENOR
10	ACABADOS DE MUROS Y PINTURA			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
10.1	ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATAACIONES)	M ²	362.40	\$	32,988.00	\$	12,614,743.15	549.36	\$	16,122,304.19	-	166.96	MAYOR
10.2	ESTUCO Y VINILO TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATAACIONES)	M ²	607.73	\$	19,984.00	\$	12,150,970.37	782.05	\$	15,636,367.68	-	174.32	MAYOR
10.3	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATAACIONES)	M ²	907.20	\$	54,043.00	\$	49,027,809.80	989.34	\$	53,466,733.01	-	82.14	MAYOR
10.4	PINTURA EMFUSIA CONTRA INCENDIOS	M ²	86.56	\$	53,286.00	\$	4,717,414.08	81.50	\$	4,341,075.66	-	7.07	MENOR
10.5	CONTROL DE HUMEDAD EN MUROS	M ²	60.62	\$	43,532.00	\$	2,638,909.84	75.94	\$	3,305,620.08	-	15.32	MAYOR
10.6	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLANDEAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATAACIONES)	M ²	1,300.00	\$	42,565.00	\$	55,334,500.00	1,306.10	\$	55,594,112.45	-	6.10	MAYOR
11	CARPINTERIA EN MADERA			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
11.1	PUERTA EN TABLERO MELAMINICO VERTICAL 6 MM CON TRES RANURAS SEGUN DISEÑO, RELLENO CON TABLERO TUBULAR DIMENSIONES (900 - 1000) X 2200 X 38 MM, INCLUYE MARCO, BISAGRAS TIPO PEGADO Y CERRADURA CILINDRICA EN ALUMINIO	Un	2.00	\$	1,273,800.00	\$	2,547,600.00	2.00	\$	2,547,600.00	-	-	IGUAL
11.2	RECONSTRUCCIÓN DE CARPINTERIA EN MADERA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS PRES, MANILAS, BISAGRAS, CERRADURAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA AL ESTADO NATURAL, APLICACIÓN DE SELLADOR CATALIZADO 26% SÓLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO MIPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD	M ²	15.00	\$	191,928.00	\$	2,878,920.00	9.19	\$	1,763,338.50	-	5.81	MENOR
12	CARPINTERIA METALICA			\$	-	\$	-	\$	-	-	-	IGUAL	
12.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG	5,128.25	\$	22,974.00	\$	117,816,415.50	4,187.12	\$	96,194,998.73	-	941.13	MENOR



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA

Código: GA-JELOG-FR-101
Versión: 6
Vigencia: 2012/2024

CONTRATO No: 001-001-CACOM-6-CORRAL 2020
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
CONTRATISTA: INM. LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S
INSTRUMENTO O SUPERVISOR: EST. MAURITZA GARCIA ORDON OTHWARD
FECHA DE CORTE: 21/12/2023
CORTE DE OBRA No: 4

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Ejecutado	% Pagar	Valor Pagar	Valor Retenido	Valor Pendiente
6.4.7	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/200V (EN 4471) LINES NORMALES. INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1 X 1/2" LAMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EM 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	9.00	\$ 207,310.00	\$ 1,865,790.00	100.00	100.00	\$ 2,073,100.00	\$ -	\$ -
6.4.8	TOMACORRIENTE 8W FASICA 240V/220V-PT, INCLUYE CLAVIA, SALEDA EN CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EM 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3.00	\$ 214,960.00	\$ 644,880.00	200.00	100.00	\$ 214,960.00	\$ -	\$ -
6.4.9	TOMACORRIENTE 8W FASICA TRIFILAR 240V/220V-PT, INCLUYE CLAVIA, SALEDA EN CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EM 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	3.00	\$ 242,580.00	\$ 727,740.00	-	3.00	\$ 727,740.00	\$ -	\$ -
6.4.10	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/200V (EN 4471) LINES NORMALES. INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EN PVC 3/4" KRYTAMUNDOS Y EMT EN CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EN PVC 3/4" CAJA TPO RWBELL 1 TORNILLO, LAMBRE, CABLEADO, BLENDA, PUNTEO, REVISION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MONTEAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	42.00	\$ 203,380.00	\$ 8,538,920.00	22.00	20.00	\$ 4,088,720.00	\$ -	\$ -
6.4.11	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/200V	Un	2.00	\$ 18,300.00	\$ 36,600.00	200.00	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.4.12	LUMINARIA LED SYLVANIA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EM 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	68.00	\$ 17,073.00	\$ 1,161,060.00	6.00	63.00	\$ 11,108,260.00	\$ -	\$ -
6.4.13	LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRO 600X90X85 40W (CL. 800K, 100LM, 90/277V, POS. FPH-03, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EM 3/4" CAJA TPO RWBELL 1 TORNILLO, LAMBRE, CABLEADO, INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	38.00	\$ 238,050.00	\$ 9,045,900.00	4.00	34.00	\$ 8,094,240.00	\$ -	\$ -
6.4.14	LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY 800W DL 800W, 1200LM, 100-260V, PFC 90% (PFC), THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EM 3/4" CAJA TPO RWBELL 1 TORNILLO, LAMBRE, CABLEADO, INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	17.00	\$ 354,260.00	\$ 6,022,420.00	200.00	15.00	\$ 5,313,800.00	\$ -	\$ -
6.4.15	SALEDA ELECTRICA CON LUMINARIA LED TORTUGA 24W DL 927751 DE SYLVANIA, 600W, 100LM, 100V, PFC INCLUYE CABLEADO (PE, NF, FR, LS, LMBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BLENDA EMISION DE RAYOS TUBERIA EM 3/4" CAJA TPO RWBELL 1 TORNILLO, LAMBRE, CABLEADO, INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Un	2.00	\$ 158,760.00	\$ 317,520.00	200.00	-	\$ -	\$ -	\$ -
7	MANTOSTERA									
7.1	MURO EN BLOQUE DE ARELLANO S PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS O 300 110X120 MTS INCLUYE MOEDRE DE REFUERZO, MONTAJE DE PEGAMADO ANCLAJE ATUACOS CONTRAYE Y ENTREPISO.	M ²	2934	\$ 136,639.00	\$ 401,620.22	37.98	96.96	\$ 26,518,947.76	\$ 54.89	\$ 7,494,130.21
7.2	MURO SUPERIOR INTERMERE CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E=0.12 MTS	M ²	7330	\$ 118,140.00	\$ 8,757,378.00	-	73.50	\$ 6,797,378.00	\$ -	\$ -
8	CELO RASO									
8.1	CELO RASO PVC 18 MM ANELVIE ESTRUCTURA Y COMPUESTAS PARA INSPECCION Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (PP)	M ²	407.00	\$ 113,300.00	\$ 46,133,400.00	67.37	340.13	\$ 38,523,339.90	\$ 68.24	\$ 19,954,375.38
9	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES									
9.1	PISO PORCELANATO 95 GRS/CM INCLUYE BORDADO	M ²	48.00	\$ 116,678.00	\$ 5,598,048.00	2.30	50.30	\$ 5,688,963.40	\$ -	\$ -
9.2	GRANDE CERAMICA EN PORCELANATO BELLADO DE 30 X 30 CM H+ 8CM INCLUYE BORDADA	m	28.00	\$ 24,473.00	\$ 685,244.00	18.10	44.10	\$ 1,079,293.30	\$ -	\$ -
9.3	CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADHESIVO BEGE C1.03 X 0.85 CM CON UNA O DMBAR RESISTENTE INCLUYE BORDADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M ²	43.00	\$ 79,310.00	\$ 3,401,630.00	12.18	38.82	\$ 2,410,740.54	\$ -	\$ -
9.4	PISO CERAMICA ZONAS HUMEDAS Y EXTERIORES INCLUYE BORDADA	M ²	15.00	\$ 67,254.00	\$ 1,008,810.00	5.95	20.95	\$ 1,488,652.21	\$ 10.43	\$ 791,122.96
9.5	IMPERMEABILIZACION DE PLACAS EN CONCRETO CON BRANFL POWER 12 DOS CAPAS Y REFUERZO DE TELA TIPO DE RWBELL 80F 30, INCLUYE TRAMANTO FISURAS	M ²	4936	\$ 67,360.00	\$ 332,500.80	-	49.96	\$ -	\$ -	\$ -
9.6	MEZCLA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS GRANULOSOS EN PURCEM, COLOR OSCURO CLARO	M	203.50	\$ 28,035.00	\$ 5,704,912.50	79.92	153.43	\$ 4,301,325.95	\$ -	\$ -
9.7	ESCOMIFICACION DE PISO Y REMOCION DE TORNILLOS O ELEMENTOS SOBREPUNTES DEL PISO + LAUNDO PARA REDUCCION DE IMPRESAS Y GRASAS + TRATAMIENTO BIELLO Y PULIDO DE JUNTAS CON LASTIMBERO DE POLIURETANO + IMPERMEABILIZACION EN POLIURETANO DE ALTA ADHERENCIA + CAPA DE MORTERO DE INSTALACION PULIDO DE POLIURETANO + APLICACION DE POLIURETANO A 3 CAPAS CON PULIDA FINAL + APLICACION DE 2 CAPAS DE POLIURETANO ARMADO.	M	580.00	\$ 214,360.00	\$ 124,312,800.00	115.85	422.15	\$ 90,502,462.12	\$ -	\$ -
9.8	REPAVILACION PARA DEMARCACION DE ZONAS EN PINTURA EPOXICA TRES MANOS	M ²	100.00	\$ 30,530.00	\$ 3,053,000.00	48.10	101.90	\$ 3,111,618.40	\$ -	\$ -
10	ACABADOS DE MUROS Y PINTURA									
10.1	ESTUDIO Y PINTURA HORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATAIONES)	M ²	382.40	\$ 32,080.00	\$ 12,281,744.00	105.96	549.36	\$ 18,122,304.19	\$ -	\$ -
10.2	ESTUDIO Y VIALO TPO-2, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATAIONES)	M ²	607.73	\$ 18,994.00	\$ 11,530,973.37	174.33	762.05	\$ 15,638,367.68	\$ -	\$ -
10.3	ESTUDIO Y PINTURA EPONICA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATAIONES)	M ²	807.20	\$ 54,043.00	\$ 43,637,486.00	82.14	969.34	\$ 55,488,733.01	\$ -	\$ -
10.4	PINTURA EN PUGA CONTRA RENDIDOS	M ²	88.56	\$ 53,300.00	\$ 4,712,418.08	7.67	81.50	\$ 4,341,075.66	\$ -	\$ -



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA

Código: GA-JELOG-FR-101
Versión: 6
Vigencia: 2012/2024

CONTRATO N°:		021-001-CACOM-6-GRUAL-2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6	
CONTRATISTA:		ING. LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S	
INTERVENIENTOS SUPERVISOR:		EST. MAURITZA GARCIA DIONIS OTIWARDO	
FECHA DE CORTE:		25/12/2025	
CORTE DE OBRA N°:		4	
10.5	CONTROL DE HUMEDAD EN MURDOS	M²	80.00 \$ 43.032.00 \$ 2.038.989.84 15.32 75.94 \$ 3.305.600.08 - \$ - 0.00% - \$ - 0.00% - \$ - 0.00% 75.94 \$ 3.305.600.08 - \$ - 0.00%
10.6	ESTUDIO Y PINTURA EXTERIORES DE ENTREPISAS, REFINOS EN PUERTAS, MARCOS INCLuye ESTUCOS, FLECS Y DILATACIONES	M²	1.300.00 \$ 42.560.00 \$ 55.334.500.00 6.10 1.300.00 \$ 55.344.124.45 - \$ - 1.142.35 \$ 48.824.106.47 163.75 \$ 6.970.005.98 - \$ - 0.00
11	CARPINTERIA EN MADERA		\$ - - - - \$ - - - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
11.1	PUERTA EN TABLERO MELAMINADO VERTICAL 4 MM CON TRES BANDEJAS SEGUN DISEÑO, BELLIDO CON UNO (1) TUBO DE DIMENSIONES 1000 x 2200 x 38 MM INCLuye MARCO, BARRAS TIPO PERFORADO Y CERRADURA CILINDRICA EN ALUMINIO	UN	2.00 \$ 1.273.800.00 \$ 2.547.600.00 - - 2.00 \$ 2.547.600.00 - \$ - - \$ - - 2.00 \$ 2.547.600.00
11.2	RECONSTRUCCION DE CARPINTERIA EN MADERA INCLuye CAMBIO DE PIEZAS DE TORNILLOS RELES, BARRAS, BARRAS, CERRADURAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LUCO INSTALADO LA MADERA DE TIPO NATURAL, APLICACION DE SELADOR CATALANADO 20% SOLUCION, APLICACION DE PINTURA TIPO APROXIMADO A DOS MANOS, MANSO CANSO Y TORNILLO	M²	15.00 \$ 191.330.00 \$ 2.878.950.00 - 5.81 9.19 \$ 1.763.338.50 - \$ - 9.19 \$ 1.763.338.50 - \$ - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
12	CARPINTERIA METALICA		\$ - - - - \$ - - - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
12.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS INCLuye TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSION Y BERMATE	KG	5.128.20 \$ 22.974.00 \$ 17.816.415.50 - 941.13 4.187.12 \$ 96.194.684.73 266.58 \$ 6.884.183.05 2.359.04 \$ 54.156.676.86 1.076.01 \$ 24.789.972.82 493.00 \$ 10.545.006.00 0.00
12.2	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLuye MARCO CORROSION RESISTENTE Y/O HEL. VO MONTANTE Y TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18	M²	38.40 \$ 495.180.00 \$ 17.807.168.00 8.05 47.90 \$ 21.620.084.43 - \$ - - \$ - - 34.87 \$ 15.734.483.00 - \$ - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD METALICA HERMETICA, DISPOSITIVO PARA CONTROL DE ACCESO Y EVACUACION HUMIDA, INCLuye BARRA ANTIPIEDRA DE APERTURA DE EMERGENCIA, BRAZO HERMETICO PARA CERRIE AUTOMATICO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO BARRAS REFORZADAS, CERRADURA DE SEGURIDAD DIGITAL, INCLuye Y ACABADO CON PINTURA ANTICORROSION	UN	2.00 \$ 3.110.870.00 \$ 6.247.740.00 - - 2.00 \$ 6.247.740.00 - \$ - - \$ - - 2.00 \$ 6.247.740.00 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
12.4	LAMINA EN ALUMINIO ANTIDESLIZANTE, ESPESOR 3MM INCLuye REFORZOS EN ANCHO DE 10 AGUJEROS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLuye ANTICORROSION Y BERMATE A ZAPAS POR AMBAS CARAS	M²	6.00 \$ 230.970.00 \$ 1.389.630.00 - - 6.00 \$ 1.389.630.00 6.00 \$ 1.389.630.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
12.5	INSTALACION DE BARRA CORRIENTE ANTIPIEDRA HORIZONTAL O VERTICAL, PARA MATONES COMIERTA, BARRAS, MADERA INCLuye BRAZO HERMETICO PARA ACCESO, TORNILLOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	9.00 \$ 1.220.760.00 \$ 11.031.940.00 - 4.00 5.00 \$ 6.128.800.00 - \$ - 5.00 \$ 6.128.800.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PLUMBLEA SEGUN DISEÑO, CONTROLADO EN ESTRUCTURA METALICA CON PUNTES DE ACERO, INCLuye SISTEMA DE RELES PARA DESMONTAJE DE PUERTA, CERRADURAS DE SEGURIDAD, PASADORES, ANTICORROSION Y BERMATE A ZAPAS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	36.00 \$ 47.817.00 \$ 16.884.912.00 - 5.40 30.60 \$ 14.437.600.00 - \$ - - \$ - - 30.60 \$ 14.437.600.00 - \$ - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
12.7	REJILLAS PISO 0.30 INCLuye ANTICORROSION Y BERMATE A DOS CARAS	M	102.00 \$ 88.536.00 \$ 9.132.488.00 - 20.15 81.85 \$ 7.328.350.00 - \$ - - \$ - - 38.65 \$ 3.507.638.00 42.00 \$ 3.761.428.00 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
12.8	CLOSET EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ENTRENOS, CAJONES, PUERTAS DE ACIERO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLuye TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	6.00 \$ 783.944.00 \$ 5.168.064.00 - 4.33 2.27 \$ 1.775.943.79 - \$ - - \$ - - - \$ - - 2.27 \$ 1.775.943.79 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
12.9	ARCHIVADOR REDONTE EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON CAJONES, ENTRENOS, PUERTAS, RELES Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO componen DE ACIERO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLuye TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	27.28 \$ 783.944.00 \$ 21.361.941.32 - 6.48 20.80 \$ 16.287.312.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - 20.80 \$ 16.287.312.00 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
13	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRO		\$ - - - - \$ - - - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
13.1	VENTANERA CORRIENDA EN ALUMINIO REF. SERIE 74 A UNO DE 3MM INCLuye ANCHO MOSQUETERO MARCOS EN ALUMINIO Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (M²)	M²	3.27 \$ 448.189.00 \$ 1.468.848.00 17.69 20.96 \$ 9.413.743.71 - \$ - - \$ - - - \$ - - 20.96 \$ 9.413.743.71 - \$ - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRO LAMINADO PARA 20 INCLuye PELLICULA POLARIZADA OSCIURA DE SEGURIDAD, BARRA ANTIPIEDRA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M²	40.18 \$ 173.901.00 \$ 6.941.861.18 - 31.84 8.38 \$ 1.432.647.23 - \$ - - \$ - - 4.08 \$ 706.043.03 4.20 \$ 759.694.20 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
13.3	VENTANERA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 703	M²	4.00 \$ 327.870.00 \$ 1.311.588.00 - 4.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - - \$ - - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
13.4	PUERTA EN ALUMINIO SEGUN MEDIDAS DE PLANOS CON MARCO EN TUBERIA RECTANGULAR Y BARRA ANTIPIEDRA TIPO CORRIENDA CON PIEL GUA Y PIEL SUPERIOR, TORNILLOS DE PRESION Y RUEDAS DE GUJA	M²	15.00 \$ 647.231.00 \$ 9.708.465.00 1.30 16.30 \$ 10.679.310.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - 16.30 \$ 10.679.310.00 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
13.5	FACHADA CELO RANDO EN ALUMINIO COMPLETO PELLICULO ANTIPIEDRA TIPO METAL CON 2 CAPAS DE ALUMINIO ALICATA SUPERIOR DE 4MM EN ALUMINIO INCLuye ESTRUCTURA DE INSTALACION	M²	30.00 \$ 718.102.00 \$ 21.673.960.00 - 12.00 18.00 \$ 12.943.800.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - 18.00 \$ 12.943.800.00 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
14	CARPINTERIA EN ACERO INMOVILIZABLE		\$ - - - - \$ - - - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
14.1	PLATEO CUADRADO DE 0.3004 41 PROFUNDIDAD DE BADO PONER TIPO SECCION PROFUNDIDAD CON RESULTO GRIFERIA MONOCORRIENTE TIPO GANCHO INDUSTRIAL	UN	1.00 \$ 490.210.00 \$ 490.210.00 1.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - 1.00 \$ 490.210.00 - \$ - - \$ - - - \$ - - 490.210.00
14.2	MESON EN ACERO INMOVILIZABLE, PASADOR DE IN 4 10 METROS Y REBORDE DE 5MM INCLuye REFORZACIONES PARA LAMINADO DE ACIERO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	M²	1.08 \$ 549.798.00 \$ 6.441.581.08 - 1.04 0.94 \$ 568.315.52 - \$ - - \$ - - - \$ - - 2.53 \$ 1.368.117.74 - \$ - 1.58
14.3	DIVISION PARA BADO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INMOVILIZABLE REF. 304 2B CALIBRE 20, TERMINADO INTERNO TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN COPOL PARA FRECCO ANTIADHESIVO, CON DISEÑO MODULAR DE FACIL COLOCACION, CUENTA CON BARRAS, COCLOS BARRAS Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INMOVILIZABLE, BARRAS CON PINTURA MAJORE DE 100, FLUCION ANTIADHESIVO TECNICA SEGUN EL CASO, PARA LOS BATERIAS, BATERIAS Y CERRADURAS BATERIAS DE BADO EN PANELES EN FABRICACION DE ACERO INMOVILIZABLE TIPO 3000A 304 2B CALIBRE 20.	M²	3.00 \$ 778.120.00 \$ 2.334.360.00 - 0.56 2.44 \$ 1.886.500.32 - \$ - - \$ - - - \$ - - 2.44 \$ 1.886.500.32 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%
14.4	DIVISION CORRIENDA INCLuye PELLICULO ACCESORIOS EN ACERO INMOVILIZABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	3.30 \$ 385.391.00 \$ 1.271.688.30 - 0.45 2.85 \$ 1.088.200.35 - \$ - - \$ - - - \$ - - 2.85 \$ 1.088.200.35 - \$ - - \$ - - 100.00% - \$ - - 0.00%
14.5	MUEBLE EN ACERO INMOVILIZABLE CON ENTRENOS, CAJONES, PUERTAS DE ACIERO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLuye TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	6.84 \$ 941.752.00 \$ 6.441.581.08 - 1.28 5.56 \$ 5.237.177.05 - \$ - - \$ - - - \$ - - 5.56 \$ 5.237.177.05 - \$ - - \$ - - 0.00% - \$ - - 0.00%



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA

Código: GA-JELOG-FR-101
Versión: 6
Vigencia: 2012/2024

CONTRATO No: 001-00-ACCOM-6-GRUAL-2020
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
CONTRATISTA: ING. LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENIENTOS SUPERVISOR: ST. BAUTISTA GARCIA DIGNON STWARD

CORTE DE OBRA No:		4																								
14.6	BLANQUEO E INSTALACION DE LAMPAROS QUIMBORQUEO CON GRIFERIA DE BOMBEO BOMBA GEMINI INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	LN	1.00	\$ 1,673,000.00	\$ 1,673,000.00	-	1.00	\$ 1,673,000.00	-	\$ -	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	\$ 1,673,000.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
15	CUBIERTAS																									
15.1	TEJA EN LAMINA 58x78 TRASLAPO COLOR CORDON VERDE BOMBA BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 7' HASTA 35 CM CAL 24 INCLUYE: STANDEO 6 EN 36 DE 60 CM CLP TEJA ST ANONCO TRAXX 10-16 (24) RELIENO CON PUEDES PINDO COPOLY Y TODOS ACCESORIOS NECESARIOS	MF	103.79	\$ 210,000.00	\$ 40,791,000.47	12.83	206.62	\$ 43,364,765.04	-	\$ -	90.23	\$ 20,208,316.94	110.40	\$ 23,186,458.00	-	0.00%	-	48.37%	\$ 23,186,458.00	-	83.42%	\$ -	0.00%			
15.2	CANALLETE PARA TEJA STANDING SEAM (H)	HN	9.10	\$ 70,416.00	\$ 640,780.00	-	9.10	\$ 640,780.00	-	\$ -	9.10	\$ 640,780.00	-	\$ -	-	0.00%	-	100.00%	\$ 640,780.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
15.3	REPARACION DE CUBIERTA INCLUYE LAVADO CON HERRAJAVADORA, REPARACION DE CORTES EN PRESURTA PARA CUBIERTA COLOR BOMBA AL ESTANTE O MANGOS, Y REEMPLAZO DE PIEZAS AFECTADAS EN EL MISMO TIPO DE MATERIAL.	MF	601.37	\$ 47,897.00	\$ 30,240,824.68	1,684.16	2,110.53	\$ 101,327,723.61	560.34	\$ 26,366,476.16	-	\$ -	1,530.24	\$ 73,077,223.41	27.30	0.00%	-	22.57%	\$ 73,077,223.41	27.30	100.00%	\$ 1,910,024.22	1.28%			
15.4	REPARACION DE CUBIERTA EN LOMA INCLUYE LAVADO CON HERRAJAVADORA, SELADO Y PUESTA EN OPERACION REPARACION DE ZONAS RASGADAS REEMPLAZO DE APAROS EXTENSORES CON MATERIAL DEL MISMO TIPO, AJUSTE DE TORNILLERIA, TRAXXO, ANONCO Y GUAYATE ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA GARANTAR SU CORRECTA SUJECION.	MF	880.00	\$ 49,852.00	\$ 42,374,280.00	130.40	990.40	\$ 48,874,900.00	-	\$ 990.40	\$ 48,874,900.00	-	\$ -	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	0.00%		
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																									
16.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORDON VERDE BOMBA	LN	1.00	\$ 420,287.00	\$ 420,287.00	-	1.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	1.00	\$ 420,287.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
16.2	LAMPAROS CON GRIFERIA TIPO 3	LN	1.00	\$ 607,872.00	\$ 607,872.00	-	1.00	\$ 607,872.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	1.00	\$ 607,872.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
16.3	LAMPAROS EN GRANITO PULIDO 80x140x20 CM	LN	1.00	\$ 363,123.00	\$ 363,123.00	-	1.00	\$ 363,123.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	1.00	\$ 363,123.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
16.4	ACCESORIOS CROMADOS PARA BARRO (BUN)	LN	1.00	\$ 257,744.00	\$ 257,744.00	-	1.00	\$ 257,744.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	1.00	\$ 257,744.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
16.5	DUCHA CON GRIFERIA TIPO 1 INCLUYE MUESTA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	LN	1.00	\$ 122,959.00	\$ 122,959.00	-	1.00	\$ 122,959.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	1.00	\$ 122,959.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
16.6	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORDON VERDE BOMBA INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.	LN	1.00	\$ 748,460.00	\$ 748,460.00	-	1.00	\$ 748,460.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	1.00	\$ 748,460.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
16.7	DISPENSADOR DE PAPEL	LN	1.00	\$ 232,080.00	\$ 232,080.00	-	1.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	-	\$ -	-	0.00%	\$ -	0.00%			
16.8	DISPENSADOR DE JABON	LN	1.00	\$ 242,311.00	\$ 242,311.00	-	1.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	-	\$ -	-	0.00%	\$ -	0.00%			
16.9	ESPEJOS BISELADES 4MM	MF	1.00	\$ 186,435.00	\$ 270,652.50	-	1.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0.00%	-	-	\$ -	-	0.00%	\$ -	0.00%			
17	URBANISMO																									
17.1	MAYO ACRILOICO IMPRESION DIGITAL 20X30 30X3	LN	15.00	\$ 127,160.00	\$ 1,907,400.00	-	14.00	\$ 1,780,240.00	-	\$ -	-	\$ -	14.00	\$ 1,780,240.00	100.00%	-	-	14.00	\$ 1,780,240.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
17.2	PERFORO FAC CLINADO DE 600MM ESPESOR 10MM	LN	2.00	\$ 856,114.00	\$ 1,712,228.00	-	2.00	\$ 1,712,228.00	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 1,712,228.00	100.00%	-	-	2.00	\$ 1,712,228.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
17.3	LETRA EN ACRILOCO DE SOVAR ESPESORES DE 5MM CAPAS DE 3MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA DE ACRILICO SILVER DE 3MM	LN	20.00	\$ 70,700.00	\$ 1,050,576.00	18.00	40.00	\$ 2,820,300.00	-	\$ -	-	\$ -	40.00	\$ 2,820,300.00	-	0.00%	-	-	40.00	\$ 2,820,300.00	-	100.00%	\$ -	0.00%		
18	ADOS Y REVEST. DE ESCOMBROS																									
18.1	ADOSO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR. FRONTE DE OBRA	MF	1,932.00	\$ 7,788.00	\$ 10,346,976.00	10.49	1,362.49	\$ 10,438,466.00	-	\$ 48.00	\$ 372,884.00	3.00%	478.40	\$ 3,716,814.88	35.64%	916.00	\$ 6,269,686.00	80.78%	1,932.00	\$ 7,788.00	-	100.00%	\$ -	0.00%		
18.2	RETRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD CM	MF	12.00	\$ 277,737.00	\$ 3,471,712.00	5.42	17.92	\$ 4,879,256.01	-	\$ 0.00	\$ 138,868.01	1.00%	7.00	\$ 1,944,159.00	39.12%	10.42	\$ 2,863,208.01	68.12%	12.00	\$ 277,737.00	-	100.00%	\$ 0.00	0.00%		
ITEMS NO PREVISTOS																										
AL GASTO																										
MPI	DESCARTE 14-30 MTS. INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	MF	123.00	\$ 37,891.07	\$ 4,852,522.48	13.89	110.16	\$ 4,174,179.42	-	\$ -	110.16	\$ 4,174,179.42	100.00%	-	-	0.00%	-	110.16	\$ 4,174,179.42	-	100.00%	\$ -	0.00%			
MPI	LOCACION TRACTADO Y REPLANTERO SOBRE TORRENDO	MF	180.00	\$ 2,397.74	\$ 230,960.40	23.09	160.40	\$ 540,692.00	-	\$ -	160.40	\$ 540,692.00	100.00%	-	-	0.00%	-	160.40	\$ 540,692.00	-	100.00%	\$ -	0.00%			
ADIENTE VALOR DEL BIEN																										
MPI	SUBMUESTRO E INSTALACION DE BOMBA EN ALUMINO 100 CM LABRANDO 3" INCLUYE PELICULA POLIURETANICA DE SEGURIDAD, SELADURA ANTIHONGOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	MF	22.47	\$ 388,017.38	\$ 15,269,723.21	1.92	23.35	\$ 14,117,469.03	-	\$ -	-	\$ -	23.35	\$ 14,117,469.03	-	0.00%	-	-	23.35	\$ 14,117,469.03	-	100.00%	\$ -	0.00%		
TOTAL CORTE DIRECTO OBRA																										
			\$ 1,088,724.09.19	\$ 1,088,724.108.19	\$ 147,188.720.30	\$ 289,247.882.85	\$ 174,891.689.39	\$ 439,843,113.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
DOMINACION																										
			\$ 238,741.886.44	\$ 238,741.886.44	\$ 24,324,419.30	\$ 67,860.817.75	\$ 24,487.621.08	\$ 188,882,914.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
IMPUESTOS																										
			\$ 18,897,241.28	\$ 18,897,241.28	\$ 1,471,887.26	\$ 3,888,479.43	\$ 1,748,716.48	\$ 4,888,485.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
UTILIDADES																										
			\$ 20,480,829.93	\$ 20,480,829.93	\$ 4,618,616.18	\$ 9,274,646.89	\$ 3,246,589.69	\$ 13,739,714.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
IVA SOBRE UTILIDAD																										
			\$ 6,211,484.54	\$ 6,211,484.54	\$ 838,779.82	\$ 1,753,573.39	\$ 586,664.38	\$ 2,414,391.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL			\$ 1,376,276,488.57	\$ 1,376,276,488.57	\$ 182,994,765.06	\$ 391,162,068.53	\$ 221,208,726.97	\$ 986,968,696.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
EQUIPOS																										
EQUIPOS ENTREGADOS																										
EQUIPOS POR ENTREGAR																										
No.	DESCRIPCION EQUIPO	LIND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				CORTE No.1 del 1 al 31 DE AGOSTO				CORTE No.2 del 1 al 30 DE SEPTIEMBRE				CORTE No.3 del 1 al 31 DE OCTUBRE				PRESENTE CORTE				SALDO			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR			
TOTAL CORTE DIRECTO EQUIPOS																										
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
IVA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SUBTOTALS EQUIPOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTALES OBRA + EQUIPOS CONTRACTUAL			\$ 1,376,276,488.57	\$ 1,376,276,488.57	\$ 182,994,765.06	\$ 391,162,068.53	\$ 221,208,726.97	\$ 986,968,696.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO																										
% ANTICIPO																										
VALOR ANTICIPO																										
% AMORTIZACION CORTE 1																										
VALOR AMORTIZADO CORTE 1																										
% AMORTIZACION PRESENTE CORTE																										
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE																										
% AMORTIZACION PRESENTE CORTE																										
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE																										
% AMORTIZACION PRESENTE CORTE																										
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE																										
VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACION PRESENTE CORTE																										

Elaborado por: LEYDIAN DE LEON ALEMAN
Representante Legal Controlista
Firma: [Firma]

Autorizado por: ST. BAUTISTA GARCIA DIGNON STWARD
Supervisor
Firma: [Firma]



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
 OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
 CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S
 INTERVENTOR O SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD


ITEM N° 1.4 UNID. ML
 DESCRIPCIÓN ÍTEM MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERÍA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud				
	HORNO INCINERADOR NUEVO						
	PERFILES DE CERCHAS						
	Inferiores		8.38		8.38	6	50.28
			4.16		4.16	12	49.92
			1.51		1.51	12	18.12
	Longitudinales		0.59		0.59	6	3.54
			0.33		0.33	12	3.96
			1.14		1.14	12	13.68
	PERFILES DE CORREAS						
	Perfil en C		6		6.00	8.00	48.00
	Perfil en C		2		2.00	20.00	40.00
						SUBTOTAL	227.50
						TOTAL	227.50

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:
 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:
 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:


5

Vigencia:

20/12/2024


CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	1.5	UND:	M2


DESCRIPCIÓN ÍTEM: MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS POR AMBAS CARAS, DEL COLOR A CONVENIR

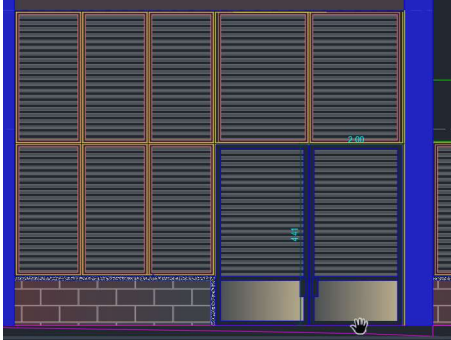
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR NUEVO						
	Puerta acceso principal del horno	2.00		4.41	8.82	1.00	8.82
TOTAL							8.82

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

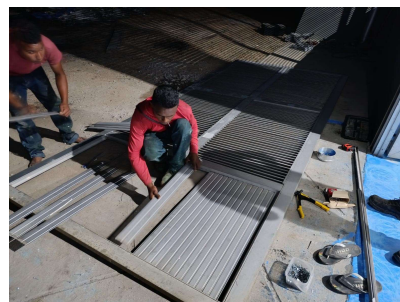

Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON-STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:


5

Vigencia:

20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
ÍTEM N°	1.7
UND:	M2


DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS Y RETIRO DE SOBANTES
CORTE N°:	4
FECHA:	21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TORRE VIEJA CACOM 6							
	Entrada	0.80	0.22	0.18	1.00	1.00	0.18
		0.93	0.46	0.43	1.00	1.00	0.43
		1.60	0.46	0.74	1.00	1.00	0.74
		1.09	0.46	0.50	1.00	1.00	0.50
		1.30	0.46	0.60	1.00	1.00	0.60
		1.09	0.46	0.50	1.00	1.00	0.50
		0.87	0.46	0.40	1.00	1.00	0.40
		1.74	0.46	0.80	1.00	1.00	0.80
		0.93	1.30	1.21	4.00	4.00	4.84
		1.58	1.30	2.05	1.00	1.00	2.05
2do piso	0.95	1.30	1.24	2.00	2.00	2.47	
	1.56	1.30	2.03	1.00	1.00	2.03	
	1.66	1.30	2.16	1.00	1.00	2.16	
	V1 T	1.25	1.46	1.83	1.00	1.00	1.83
	V1 T	1.25	1.44	1.80	1.00	1.00	1.80
	V1	0.85	1.46	1.24	2.00	2.00	2.48
V2 T	1.30	1.44	1.87	1.00	1.00	1.87	
V2 T	1.30	1.46	1.90	1.00	1.00	1.90	
V2	0.85	1.46	1.24	2.00	2.00	2.48	
V3 T	1.30	1.43	1.86	2.00	2.00	3.72	
V3	1.40	0.90	1.26	2.00	2.00	2.52	
V4 T	1.30	1.44	1.87	2.00	2.00	3.74	
V4	0.85	1.42	1.21	1.00	1.00	1.21	
TOTAL						41.24	

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:


5

Vigencia:

20/12/2024


CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	1.12	UND:	M2

DESCRIPCIÓN ÍTEM: DESMONTE DE ARCHIVO RODANTE O SIMILAR INCLUYE DIVISIONES, RIELES Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN

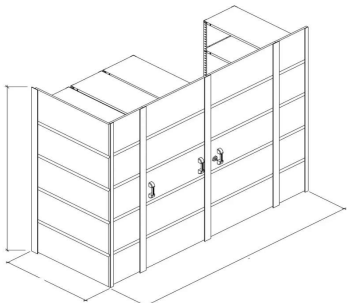CORTE N°:	4			FECHA:			21/12/2025		
	PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN			DIMENSIONES		
				Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6						
			Oficina de inteligencia	5.30		2.20	11.66	1.00	11.66
	Oficina comando 24/7	5.30		2.20	11.66	1.00	11.66		
							TOTAL	23.32	


OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

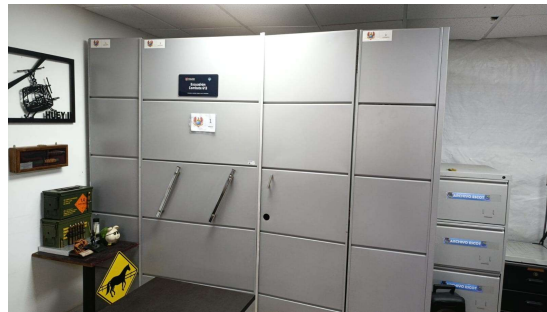

Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:


5

Vigencia:

20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	1.13	UND:	M2


DESCRIPCIÓN ÍTEM REINSTALACION DE ARCHIVO RODANTE O SIMILAR INCLUYE DIVISIONES, RIELES Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN

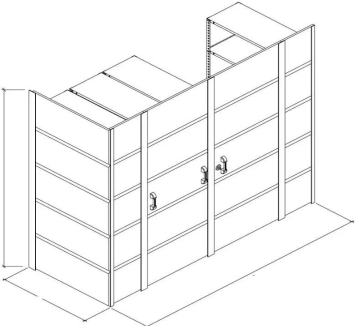
CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo operacional	5.30	2.20	11.66	1.00	11.66	
		5.30		2.20	11.66	1.00	11.66
TOTAL						23.32	

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	3.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO 4CM		

CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Taller	8.16	9.00		73.44		73.44
	Descuento columnas	0.30	0.30		0.09	-6.00	-0.54
SUBTOTAL							72.90
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
	Bodega de cilindros	6.20	8.20		50.84	1	50.84
	Descuento de columnas	0.30	0.30		0.09	-6.00	-0.54
SUBTOTAL							50.30
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Bodega de cilindros	3.80	3.80		14.44	1	14.44
	Descuento de columnas	0.30	0.30		0.09	-4.00	-0.36
SUBTOTAL							14.08
TOTAL							137.28

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	3.2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"		

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Taller	0.50	9.00		4.50		4.50
SUBTOTAL							4.50
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Interior	3.80		3.10	11.78	4.00	47.12
	Columnas	4.05		3.10	12.56	4.00	50.22
	PUERTA	1.00		2.18	2.18	-2.00	-4.36
SUBTOTAL							92.98
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUPO ARCHIVO CACOM6							
	MURO POSTERIOR Y FACHADA	6.20		0.82	5.08	2.00	10.17
SUBTOTAL							10.17
TOTAL							107.65

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 3.3 UND: M2

DESCRIPCIÓN ÍTEM SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Zapata C1	1.10	1.10		1.21		1.21
	Zapata C2	1.10	1.10		1.21		1.21
	Zapata C3	1.10	1.10		1.21		1.21
	Zapata C4	1.10	1.10		1.21		1.21
	VIGA A-B 30X30	0.35	3.05		1.07		1.07
	VIGA B-C 30X30	0.35	3.05		1.07		1.07
	VIGA C-D 30X30	0.35	3.05		1.07		1.07
	VIGA D-A 30X30	0.35	3.05		1.07		1.07
TOTAL							9.11

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 3.5 UND: M3

DESCRIPCIÓN ÍTEM ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	ZAPATA A	1.00	1.00	0.35	0.35	1.00	0.35
	ZAPATA B	1.00	1.00	0.35	0.35	1.00	0.35
	ZAPATA C	1.00	1.00	0.35	0.35	1.00	0.35
	ZAPATA D	1.00	1.00	0.35	0.35	1.00	0.35
TOTAL							1.40







OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma

VoBo: ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6					
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	3.8	UND:	M3				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS					
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6						
	VIGA A-B 30X30	0.30	3.40	0.30	0.31		0.31
	VIGA B-C 30X30	0.30	3.40	0.30	0.31		0.31
	VIGA C-D 30X30	0.30	3.40	0.30	0.31		0.31
	VIGA D-A 30X30	0.30	3.40	0.30	0.31		0.31
TOTAL							1.22
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:				VoBo:			
 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma			



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:

5

Vigencia:

20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 3.10 UNID: M

DESCRIPCIÓN ÍTEM VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.15*0.30 EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	VIGA CONFINAMIENT A-B 30X30		3.40		3.40	1.00	3.40
	VIGA CONFINAMIENTO B-C 30X30		3.40		3.40	1.00	3.40
	VIGA CONFINAMIENTO C-D 30X30		3.40		3.40	1.00	3.40
	VIGA CONFINAMIENTO D-A 30X30		3.40		3.40	1.00	3.40
TOTAL							13.60

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

[Signature]

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

[Signature]

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 3.16 UND: M2

DESCRIPCIÓN ÍTEM ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E= 0,13M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Andenes acceso	1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	Andenes perimetrales Frontal	0.80	4.05		3.24	1.00	3.24
	Andenes perimetrales Posterior	0.80	4.05		3.24	1.00	3.24
	Andenes perimetrales Laterales	0.80	4.82		3.86	2.00	7.71
SUBTOTAL							34.19
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
	Andenes acceso	1.00	6.50		6.50	1.00	6.50
	Andenes perimetrales Frontal	0.80	8.60		6.88	1.00	6.88
	Andenes perimetrales Posterior	0.80	6.50		5.20	1.00	5.20
	Andenes perimetrales Laterales	0.80	9.30		7.44	2.00	14.88
SUBTOTAL							33.46
TOTAL							67.65

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	3.17	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR		


CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025
-----------	---	---------	------------


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Bodega de cilindros	3.80	3.80		14.44	1.00	14.44
	Descuento de columnas	0.30	0.30		0.09	-4.00	-0.36
					TOTAL		14.08

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 3.18 UNID: M

DESCRIPCIÓN ÍTEM CONSTRUCCION DE CUNETA - BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI SEGUN PLANOS INCLUYE FORMALETAS

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Union taller de soldadura y automotores		1.00		1.00		1.00
TOTAL							1.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.			021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	4.1.1		UND:	KG					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO (kg)								
CORTE N°:	4		FECHA :	21/12/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6						
			Placa contrapiso	14.44	2.08	30.04	1.00	30.04	
									
			TOTAL						
OBSERVACIONES:									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró:				VoBo:					
									
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma					



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098



FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	4.1.2	UND:	KG

DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE EPOXICO, ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO		
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025

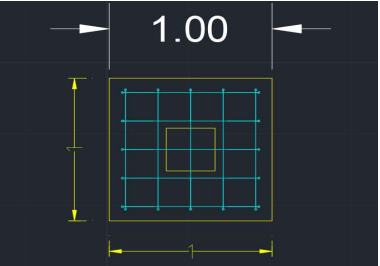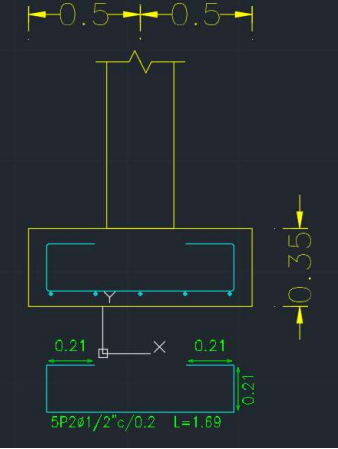PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
 	Columnas A Refuerzo longitudinal	4.05	0.994	4.03	6.00	24.15	
	Columnas A Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Columnas B Refuerzo longitudinal	4.05	0.994	4.03	6.00	24.15	
	Columnas B Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Columnas C Refuerzo longitudinal	4.05	0.994	4.03	6.00	24.15	
	Columnas C Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Columnas D Refuerzo longitudinal	4.05	0.994	4.03	6.00	24.15	
	Columnas D Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Viga de cimentación EJE A-B	4.55	0.994	4.52	6.00	27.14	
	Viga de cimentación EJE A-B Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Viga de cimentación EJE B-C	4.55	0.994	4.52	6.00	27.14	
	Viga de cimentación EJE B-C Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Viga de cimentación EJE C-D	4.55	0.994	4.52	6.00	27.14	
	Viga de cimentación EJE C-D Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Viga de cimentación EJE D-A	4.55	0.994	4.52	6.00	27.14	
	Viga de cimentación EJE D-A Estribos	1.20	0.550	0.66	53.00	34.98	
	Viga de áerea EJE A-B	4.13	0.994	4.10	4.00	16.40	
	Viga de áerea EJE A-B Estribos	0.64	0.550	0.35	38.00	13.38	
	Viga de áerea EJE B-C	4.13	0.994	4.10	4.00	16.40	
	Viga de áerea EJE B-C Estribos	0.64	0.550	0.35	38.00	13.38	
	Viga de áerea EJE C-D	4.13	0.994	4.10	4.00	16.40	
	Viga de áerea EJE C-D Estribos	0.64	0.550	0.35	38.00	13.38	
	Viga de áerea EJE D-A	4.13	0.994	4.10	4.00	16.40	
	Viga de áerea EJE D-A Estribos	0.64	0.550	0.35	38.00	13.38	
Zapata A1 Longitudinal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
Zapata A1 Transversal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
Zapata B2 Longitudinal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
Zapata B2 Transversal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
Zapata C3 Longitudinal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
Zapata C3 Transversal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
Zapata D4 Longitudinal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
Zapata D4 Transversal	1.69	0.994	1.68	5.00	8.40		
TOTAL						671.30	

OBSERVACIONES:	
REGISTRO FOTOGRAFICO:	



Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	5.1.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		



CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller					1	1.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6


CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 5.1.2 UND: ML

DESCRIPCIÓN ÍTEM TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Taller		25.50				25.50
TOTAL							25.50

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	5.1.3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PRUEBA HIDRÁULICA		


CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller					1	1.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	5.1.4	UND:	M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DRENAJE AIRE ACONDICIONADO TUBERIA PVC RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		



CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6						
	Archivo operacional		3		3	1	3.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	5.1.6	UND:	UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA		
------------------	-------------------------------------------	--	--

CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller					1	1.00
	SUBTOTAL						1.00
	HORNO INCINERADOR						
						1	1.00
	SUBTOTAL						1.00
	TOTAL						2.00

OBSERVACIONES:


REGISTRO FOTOGRAFICO:




Taller de soldadura



Horno incinerador

Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		


ÍTEM N°	5.2.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 2" . INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		


CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller					1	1.00
							TOTAL

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	5.2.2	UND:	ML

DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--



CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller		10.50				10.50
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	5.2.3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PRUEBA SANITARIA		



CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller					1	1.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6


CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 6.2.1 UND: UND


DESCRIPCIÓN ÍTEM TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (un)

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Taller de soldadura					1	1.00
SUBTOTAL							1.00
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
	Archivo operacional					1	1.00
SUBTOTAL							1.00
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Bodega de cilindros					1	1.00
SUBTOTAL							1.00
TOTAL							3.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

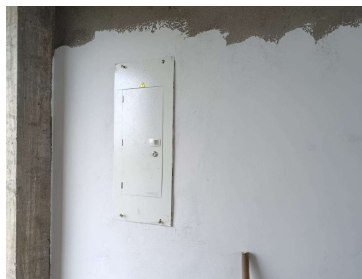

Archivo Operacional



Bodega de cilindros



Taller de soldadura

Elaboró:

Diego Armando Lopez Sanchez

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

St. Bautista Garcia Didson Steward

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	6.2.2	UND:	UND


DESCRIPCIÓN ÍTEM: MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES, INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, ASÍ MISMO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Horno					2	2.00
TOTAL							2.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

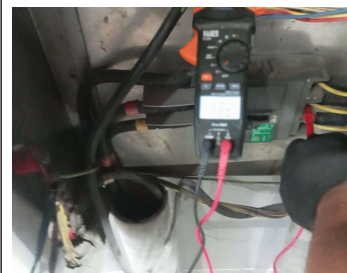

Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA


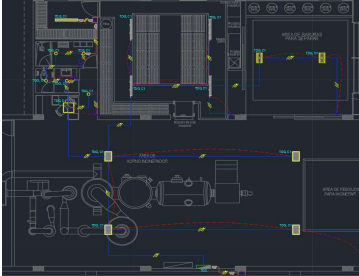
Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	6.3.1	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACOMETIDA EN CABLE 1 X (NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 12 CUXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE DUCTERIA, CURVAS, UNIONES, Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.		

CORTE N°:	4			FECHA :	21/12/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Acometida interna		35.00				35.00	
	SUBTOTAL							35.00
	IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
	Salida tomacorriente 220v		4.30				4.30	
	Salida tomacorriente 110v		1.50				1.50	
	Salida tomacorriente 110v		3.40				3.40	
	Salida tomacorriente 110v		4.90				4.90	
	Salida Interruptor Sencillo		2.00				2.00	
	SUBTOTAL							16.10
	HORNO INCINERADOR							
	Área de reciclaje		21.00				21.00	
Zona de trabajo y baños		19.00				19.00		
Área de almacenaje y bodega		21.00				21.00		
SUBTOTAL							61.00	
TOTAL							112.10	

OBSERVACIONES:


REGISTRO FOTOGRAFICO:



Horno Incinerador



Archivo Operacional

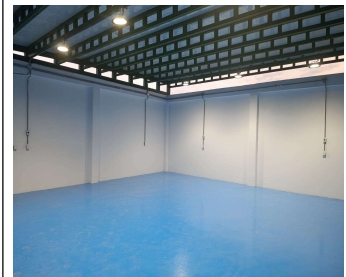

Taller de soldadura

Elaboró::

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 6.4.1 UNID: UND


DESCRIPCIÓN ÍTEM INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.



CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller de soldadura					1	1.00
TOTAL							1.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

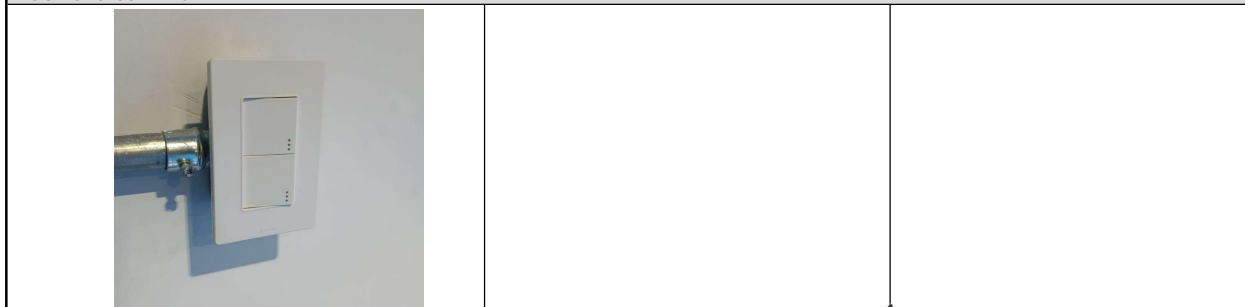

Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6


CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 6.4.2 UND: UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.


CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6						
	Bodega de cilindros					1	1.00
SUBTOTAL							1.00
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
Archivo Operacional						1	1.00
SUBTOTAL							1.00
TOTAL							2.00







OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: 
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: 
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6					
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	6.4.3	UND:	UND				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V						
CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6						
	Radiología					4	4.00
TOTAL						4.00	
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma			VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma				



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 6.4.5 UNID: UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM INTERRUPTOR SENCILLO, EN SALIDA DE TUBERIA EMT, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.


CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR						
	Vestier operarios					1	1.00
	Baño mixto					1	1.00
	Área de reciclaje					1	1.00
	Bodega de productos especiales					1	1.00
TOTAL							4.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: 
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: 
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 6 4 6 UND: UND


DESCRIPCIÓN ÍTEM INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6						
	Radiología					2	2.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: 
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: 
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	6.4.7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1 X 10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1 X 10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1 X 10 CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Archivo Operacional					4	4.00
SUBTOTAL							4.00
HORNO INCINERADOR							
	Baño mixto					1	1.00
	Vestier Operarios					1	1.00
	Área de reciclaje					1	1.00
	Bodega de productos especiales					1	1.00
	Área de almacenaje					1	1.00
SUBTOTAL							5.00
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Bodega de cilindros					1	1.00
SUBTOTAL							1.00
TOTAL							10.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Taller de soldadura



Horno incinerador



Bodega de cilindros

Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:


5

Vigencia:

20/12/2024


CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	6.4.8	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TOMACORRIENTE BIFÁSICA TRIFILAR 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		



CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUPO ARCHIVO CACOM6							
	Archivo Operacional					1	1.00
						TOTAL	1.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N°	6.4.9	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TOMACORRIENTE BIFÁSICA TRIFILAR 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4". Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		


CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Archivo Operacional					3	3.00
TOTAL							3.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 6.4.10 UND: UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PAÑETE, ESTUCCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Bodega de cilindros	IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6				1	1.00
		SUBTOTAL				1.00	
		IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6				4	4.00
		Archivo Operacional				4	4.00
		SUBTOTAL				4.00	
		TOTAL				5.00	

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6


CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ITEM N° 6.4.13 UND: UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL. 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.


CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6						
	Archivo Operacional					6	6.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: 
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: 
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ITEM N° 6.4.14 UND: UND

DESCRIPCIÓN ITEM LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY 100W DL, 6000K, 12500LM, 100-240V, IP65, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Taller de soldadura					6	6.00
SUBTOTAL							6.00
HORNO INCINERADOR							
	Área de horno incinerador					6	6.00
	Área de reciclaje					1	1.00
	Área de almacenaje					1	1.00
	Bodega de productos especiales					1	1.00
SUBTOTAL							9.00
TOTAL							15.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Horno incinerador



Taller de soldadura

Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
 OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
 CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S
 INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 7.1 UND: M2

DESCRIPCIÓN ÍTEM MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	Bodega de cilindros	IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6						
		3.80		3.10	11.78	4.00	47.12	
SUBTOTAL						47.12		
Fachada y posterior	IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
	6.20		0.82	5.08	2.00	10.17		
SUBTOTAL						10.17		
TOTAL						57.29		

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:










Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5
				Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6				
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD				
ÍTEM N°	7.2			UND:	M2	
DESCRIPCIÓN ÍTEM		MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARA E= 0,12 MTS				
CORTE N°:	4			FECHA :	21/12/2025	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN		DIMENSIONES		
		Miscelaneos		Ancho	Longitud	Altura
				MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6		
				5.5	3.00	16.50
				9.5	3.00	28.50
						1.00
						2.00
						TOTAL
						73.50
OBSERVACIONES:						
REGISTRO FOTOGRAFICO:						
						
Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma		

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
				Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6					
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	8.1	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (m²)						
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA	N° DE	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura	PARCIAL	ELEMENTOS	
	Bodega de cilindros	IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6					
		3.80	3.80		14.44	1.00	14.44
							SUBTOTAL
	Archivo operacional	IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6					
		6.20	8.20		50.84		50.84
		0.30	0.30		0.09	-6.00	-0.54
							SUBTOTAL
Archivo historico	BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6						
	2.80	1.40		3.92	1.00	3.92	
						SUBTOTAL	3.92
TOTAL						68.66	
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							









Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON-STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6							
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	9.1	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM INCLUYE BOQUILLA								
CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
		Archivo Operacional		IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6					
				6.20	8.20		50.84		50.84
				0.30	0.30		0.09	-6.00	-0.54
				TOTAL					50.30
OBSERVACIONES:									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró:			VoBo:						
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma									
			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
				Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	9.2	UND:	ML				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM INCLUYE BOQUILLA						
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
	EJE B2-F2	6.20			6.20	2.00	12.40
	EJE A3-F3	8.15			8.15	2.00	16.30
	SUBTOTAL						28.70
	B101 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6						
Radiología		3.00			3.00	1.00	3.00
Archivo historico		6.80			6.80	1.00	6.80
Archivo clinico		5.60			5.60	1.00	5.60
SUBTOTAL						15.40	
TOTAL						44.10	
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>							
Elaboró:				VoBo:			
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6					
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	9.4	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PISO CERÁMICA ZONAS HUMEDAS Y EXTERIORES INCLUYE BOQUILLA					
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6							
	Radiología	1.17	2.85		3.33	1.00	3.33
	Archivo historico	1.87	2.84		5.31	1.00	5.31
	Archivo clinico	2.50	0.75		1.88	1.00	1.88
						TOTAL	10.52
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:				VoBo:			
							
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma			



Taller de soldadura



Horno incinerador



Bodega de cilindros





Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
			Vigencia: 20/12/2024				
CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	9.8	UND:	ML				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SEÑALIZACIÓN PARA DEMARCACIÓN DE ZONAS EN PINTURA EPOXICA A TRES MANOS						
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR						
	Área de horno incinerador		42.00		42.00		42.00
	Tableros electricos		2.80		2.80	2.00	5.60
	Compactadora		2.50		2.50		2.50
	Área de separación de basuras		15.00		15.00		15.00
	Área de almacenaje perimetral		19.40		19.40		19.40
	Área de almacenaje central		17.40		17.40		17.40
TOTAL							101.90
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:				VoBo:			
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5				
					Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025								
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6								
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD								
ÍTEM N°	10.1	UND:	M2							
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)									
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
		TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)								
			Ancho	Longitud	Altura					
Paredes exteriores			8.30	3.60		29.88	1.00	29.88		
			9.30	3.60		33.48	1.00	33.48		
		SUBTOTAL						63.36		
		OP11 GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA CACOM-6								
			8.39	3.80		31.88	1.00	31.88		
		Fachada principal		0.95	3.80		3.61	1.00	3.61	
				1.30	3.80		4.94	2.00	9.88	
				3.15	3.80		11.97	1.00	11.97	
				11.29	3.80		42.90	1.00	42.90	
		Ventanas Oficinas		2.15	2.05		4.41	-3.00	-13.22	
		Ventana baño		1.05	2.05		2.15	-1.00	-2.15	
		Puerta		2.00	2.20		4.40	-1.00	-4.40	
		Fachada posterior		8.39	3.80		31.88	1.00	31.88	
				0.95	3.80		3.61	1.00	3.61	
				1.30	3.80		4.94	2.00	9.88	
				3.15	3.80		11.97	1.00	11.97	
			11.29	4.00		45.16	1.00	45.16		
		Ventanas Oficinas		2.15	2.05		4.41	-3.00	-13.22	
		Ventana baño		1.05	2.05		2.15	-1.00	-2.15	
		Puerta		1.80	2.52		4.54	-1.00	-4.54	
		Fachada lateral izquierda		14.50	3.80		55.10	1.00	55.10	
				1.80	3.80		6.84	2.00	13.68	
		Ventanas Oficinas		2.15	2.05		4.41	-2.00	-8.82	
Puerta		2.00	2.20		4.40	-1.00	-4.40			
Fachada lateral derecha		14.50	3.80		55.10	1.00	55.10			
		1.80	3.80		6.84	2.00	13.68			
Ventanas Oficinas		2.15	2.05		4.41	-3.00	-13.22			
		SUBTOTAL						274.18		
		BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6								
		Paredes extremo izquierdo		6.20	3.50		21.70	1.00	21.70	
		Almacen 1		2.70	1.90		5.13	1.00	5.13	
		Almacen 2		2.70	2.30		6.21	1.00	6.21	
		Archivo historico		2.70	1.60		4.32	1.00	4.32	
		Habitación hospitalización 1		2.70	1.90		5.13	1.00	5.13	
		Habitación hospitalización 2		2.70	1.90		5.13	1.00	5.13	
		Fisioterapia		2.70	1.90		5.13	1.00	5.13	
		Baño		2.70	2.40		6.48	1.00	6.48	
		Archivo clinico		2.70	1.60		4.32	1.00	4.32	
		Archivo historico		2.70	2.30		6.21	1.00	6.21	
		Traslado aeromedico		4.40	2.60		11.44	1.00	11.44	
		Puerta tipo A		1.00	2.40		2.40	-6.00	-14.40	
		Puerta tipo B		1.20	2.40		2.88	-3.00	-8.64	
				SUBTOTAL						58.16




Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCÍA DIDSON STEWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6							
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	10.5	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONTROL DE HUMEDAD EN MUROS								
CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
		Paredes interiores		17.00	0.50	8.50	1.00	8.50	
		Paredes exteriores		17.00	3.40	57.80	1.00	57.80	
								TOTAL	66.30
BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6									
Paredes interiores		4.40	0.50	2.20	1.00	2.20			
Paredes exteriores		6.20	1.20	7.44	1.00	7.44			
						SUBTOTAL	9.64		
						TOTAL	75.94		
OBSERVACIONES:									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: 					VoBo: 				
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma				



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6


CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ITEM N° 11.1 UND: UND


DESCRIPCIÓN ITEM PUERTA EN TABLERO MELAMINICO VERTICAL 6 MM CON TRES RANURAS SEGÚN DISEÑO, RELLENO CON TABLERO TUBULAR DIMENSIONES (800 - 1000) X 2200 X 38 MM. INCLUYE MARCO, BISAGRAS TIPO PESADO Y CERRADURA CILINDRICA EN ALUMINIO


CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR						
	Vestier operarios				1.00	1	1.00
	Baño mixto				1.00	1	1.00
TOTAL							2.00

OBSERVACIONES:


REGISTRO FOTOGRAFICO:

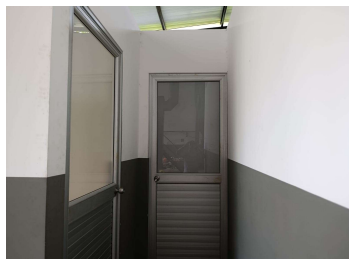

Elaboró: 
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma


VoBo: 
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

Elaboró:



DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:



ST. BAUTISTA GARCÍA DIDSON STWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



Elaboró:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego A. Lopez'.

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'St. Bautista Garcia'.

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON-STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 12.7 UND: ML


DESCRIPCIÓN ÍTEM REJILLAS PISO 0.30, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS


CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
SUBESTACION ELECTRICA							
	Fachada		42.00		42.00		42.00
TOTAL							42.00






OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	12.8	UND:	M2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CLOSET EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ENTREPAÑOS, CAJONES, PUERTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO							
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		HORNO INCINERADOR						
		Vestier Operarios	0.63		1.8	1.13	2.0	2.27
TOTAL						2.27		
OBSERVACIONES:								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma				

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	12.9	UND:	M2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ARCHIVADOR RODANTE EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS, PERFILES, RIELES Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO							
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6						
		Archivo Operacional	5,20		2,0	10,40	2,0	20,80
		TOTAL						20,80
OBSERVACIONES:								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró:			VoBo:					
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6					
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	13.1	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE ANGELO MOSQUITERO MARCOS EN ALUMINIO Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (m²)						
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA	N° DE	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura	PARCIAL	ELEMENTOS	
	IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6						
	Ventanas baño	0.40		0.60	0.24	4.00	0.96
	Ventana carpa	2.10		1.10	2.31	1.00	2.31
	SUBTOTAL						3.27
TORRE VIEJA CACOM6							
Entrada	0.80		0.22	0.18	1.00	0.18	
	0.93		0.46	0.43	1.00	0.43	
1er piso	1.60		0.46	0.74	1.00	0.74	
	1.09		0.46	0.50	1.00	0.50	
	1.30		0.46	0.60	1.00	0.60	
	1.09		0.46	0.50	1.00	0.50	
	0.87		0.46	0.40	1.00	0.40	
	1.74		0.46	0.80	1.00	0.80	
	0.93		1.30	1.21	4.00	4.84	
	1.58		1.30	2.05	1.00	2.05	
2do piso	0.95		1.30	1.24	2.00	2.47	
	1.56		1.30	2.03	1.00	2.03	
	1.66		1.30	2.16	1.00	2.16	
SUBTOTAL						17.69	
TOTAL						20.96	
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							


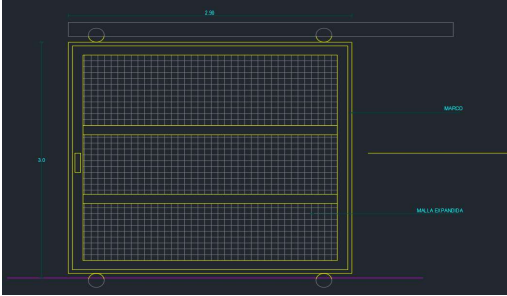







Elaboró:






DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma






VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STEWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	13.4	UND:	M2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN MEDIDAS DE PLANOS CON MARCO EN TUBERIA RECTANGULAR Y MALLA EXTENDIDA TIPO CORREDIZA CON RIEL GUIA Y RIEL SUPERIOR, TOPES RUEDAS DE PRESION Y RUEDAS DE GUIA							
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		HORNO INCINERADOR						
		Entrada zona reciclaje	2.90		3.0	8.70	1.0	8.70
		Entrada zona almacenaje	2.60		3.0	7.80	1.0	7.80
TOTAL						16.50		
OBSERVACIONES:								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró:				VoBo:				
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma				

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5		
					Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	13.5	UND:	M2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	FACHADAS/ CIELO RASO EN ALUMINIO COMPUESTO (RELLENO EN POLIETILENO O MINERAL CON 2 CAPAS DE ALUMINIO) ALPOLIC ESPESOR DE 4MM COLOR ALUMINIO INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACIÓN							
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Entrada taller	9.00	2.0	18.00	1.0	18.00	
TOTAL						18.00		
OBSERVACIONES:								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró:			VoBo:					
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5					
				Vigencia:	20/12/2024					
CONTRATO No.			021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	14.2		UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
CORTE N°:	4		FECHA :	21/12/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6							
			Vacunación			1.2	0.8	0.94	1.0	0.94
TOTAL						0.94				
OBSERVACIONES:										
REGISTRO FOTOGRAFICO:										
										
Elaboró:			VoBo:							
 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma			 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5			
					Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6							
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	14.3	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.								
CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 		UBICACIÓN Baño GRUCO		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6									
TOTAL									
2.44									
OBSERVACIONES:									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma					VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma				

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5					
					Vigencia:	20/12/2024					
CONTRATO No.			021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025								
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6								
CONTRATISTA			JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD								
ÍTEM N°	14.4			UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DIVISIÓN CORREDIZA DE BAÑO EN ACRÍLICO ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.										
CORTE N°:	4			FECHA :	21/12/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				HORNO INCINERADOR							
				Vestier operarios	1.50		1.9	2.85	1.0	2.85	
TOTAL								2.85			
OBSERVACIONES:											
REGISTRO FOTOGRAFICO:											
											
Elaboró:					VoBo:						
											
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6							
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	14.5	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑOS, CAJONES, PUERTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO								
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
		BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6							
		Laboratorio		2.5	0.6	1.63	1.0		1.63
		Zona de desinfeccion		4.8	0.6	2.99	1.0		2.99
		Vacunación		1.2	0.8	0.94	1.0		0.94
TOTAL							5.56		
OBSERVACIONES:									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
 <p style="text-align: center;">Zona de desinfección</p>		 <p style="text-align: center;">Laboratorio</p>			 <p style="text-align: center;">Vacunación</p>				
Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma		VoBo:  ST. BAUTISTA GARCÍA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma							



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	14.6	UND:	UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO CON GRIFERIA DE SENSOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	B101 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6						
	Vacunación						1.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: 
 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo: 
 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5			
			Vigencia:		20/12/2024			
CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025							
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6							
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	15.1	UND:	M2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS							
CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
		Fachada	10.50	8.80		92.40	1.0	92.40
		SUBTOTAL						92.40
		IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6						
		Bodega de cilindros	4.50	4.00		18.00	1.0	18.00
SUBTOTAL						18.00		
TOTAL						110.40		
OBSERVACIONES:								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
Elaboró:				VoBo:				
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma				



Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON-STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:

5

Vigencia:

20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	16.6	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.		



CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025
-----------	---	--------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
HORNO INCINERADOR							
	Baño mixto						1.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:

5

Vigencia:

20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6


CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 16.2 UNID: UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR						
	Baño mixto						1.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6


CONTRATISTA JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD

ÍTEM N° 16.3 UND: UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM LAVADERO EN GRANITO PULIDO 80 x 60 x 25 cm

CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Taller de soldadura						1.00
	TOTAL						1.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: *[Signature]*
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: *[Signature]*
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°:

5


Vigencia:

20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	16.4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)		


CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025
-----------	---	---------	------------


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)						
	Jabonera (2)						1.00
	Toallera (2)						
	Colgante (1)						
	Porta papel (1)						
TOTAL							1.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró: 
 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo: 
 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	16.5	UND:	UND

DESCRIPCIÓN ÍTEM	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


CORTE N°:	4	FECHA :	
-----------	---	---------	--


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR						
	Vestier operarios						1.00
	TOTAL						







OBSERVACIONES:


REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025						
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6						
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	17.1	UND:	UND				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	AVISOS ACRILICOS IMPRESIÓN DIGITAL 25X9 18X13						
CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR						
	Prohíbo "Solo personal autorizado"				1.00	1	1.00
	Botiquín				1.00	1.00	1.00
	Superficie caliente				1.00	1.00	1.00
	Aplastamiento				1.00	1.00	1.00
	Riesgo de atrapamiento				1.00	1.00	1.00
	Salida de emergencia				1.00	3.00	3.00
	Ruta de evacuación IZD				1.00	3.00	3.00
	Ruta de evacuación DER				1.00	2.00	2.00
	Camilla de emergencia				1.00	1.00	1.00
TOTAL						14.00	
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:				VoBo:			
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
			Vigencia:		20/12/2024		
CONTRATO No.		021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6					
CONTRATISTA		JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	17.2	UND:	UND				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ESCUDO FAC O UNIDAD DE 080X080 ESPESOR 15MM					
CORTE N°:	4	FECHA:	21/12/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HORNO INCINERADOR						
	Escudo FAC				1.00	1.00	1.00
	Escudo CACOM 6				1.00	1.00	1.00
TOTAL						2.00	
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:				VoBo:			
DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma				



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		

ÍTEM N°	17.3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LETRA EN ACRÍLICO DE 60X40 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRÍLICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA DE ACRÍLICO SILVER DE 3MM		


CORTE N°: 4 FECHA: 21/12/2025


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
HORNO INCINERADOR							
CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Nombre de la edificación				1.00	40	40.00
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

 DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
 Residente de Obra
 Firma y Posfirma

VoBo:

 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
 Supervisor
 Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA


Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	18.1	UND:	M2


DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
------------------	-------------------------------------------------	--	--

CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025
-----------	---	---------	------------

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Taller de soldadura	8.00	9.00		72.00	1.00	72.00
SUBTOTAL							72.00
HORNO INCINERADOR							
	Área horno incinerador	9.00	22.00		198.00	1.00	198.00
	Área de reciclaje	7.00	18.00		126.00	1.00	126.00
	Área de almacenaje	8.00	5.80		46.40	1.00	46.40
	Área bodega de productos	3.50	2.40		8.40	1.00	8.40
	Acceso horno	15.60	2.00		31.20	1.00	31.20
	Zona de combustible	5.00	10.00		50.00	1.00	50.00
SUBTOTAL							460.00
BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6							
	Prioritaria	10.00	7.00		70.00		70.00
	Archivo historico	8.00	2.85		22.80		22.80
	Archivo clinico	8.00	2.90		23.20		23.20
	Habitación 1	4.00	5.00		20.00		20.00
	Habitación 2	4.00	5.00		20.00		20.00
	Habitación 3	4.00	5.00		20.00		20.00
	Laboratorio	6.00	4.00		24.00		24.00
SUBTOTAL							200.00
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Bodega de cilindros	4.00	4.00		16.00		16.00
SUBTOTAL							16.00
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACOM6							
	Archivo operacional	6.00	8.00		48.00		48.00
SUBTOTAL							48.00
TORRE VIEJA CACOM6							
	1er nivel	5.00	4.00		20.00		20.00
SUBTOTAL							20.00
TOTAL							816.00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Sanidad militar



Archivo operacional



Torre de control

Elaboró:

[Handwritten signature]

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

[Handwritten signature]

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA



Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No.	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6		
CONTRATISTA	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD		
ÍTEM N°	18.2	UND:	M3

DESCRIPCIÓN ÍTEM	RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA UNIDAD (m³)		
------------------	-----------------------------------------------	--	--


CORTE N°:	4	FECHA :	21/12/2025
-----------	---	---------	------------


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
TALLERES GRUAL CACOM-6 (TALLER DE SOLDADURA)							
	Taller de soldadura	1.00	2.00	0.10	0.20	5.00	1.00
SUBTOTAL							1.00
HORNO INCINERADOR							
	Área horno incinerador	1.75	4.00	0.10	0.70	1.00	0.70
	Área de reciclaje	2.00	2.50	0.20	1.00	2.00	2.00
	Área de almacenaje	1.00	1.00	0.30	0.30	1.00	0.30
SUBTOTAL							3.00
BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6							
	Prioritaria	1.50	1.00	0.50	0.75		0.75
	Archivo historico	0.50	1.00	0.50	0.25		0.25
	Archivo clinico	0.70	1.00	0.50	0.35		0.35
	Habitación 1	1.30	1.00	0.50	0.65		0.65
SUBTOTAL							2.00
IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUBOD MISC CACOM6							
	Bodega de cilindros	3.50	0.81	0.50	1.42		1.42
SUBTOTAL							1.42
IN32 BUNKER EEUU LADO GRUPO ARCHIVO CACOM6							
	Archivo operacional	4.00	1.00	0.50	2.00		2.00
SUBTOTAL							2.00
TORRE VIEJA CACOM6							
	Área intervenida	2.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00
SUBTOTAL							1.00
TOTAL							10.42



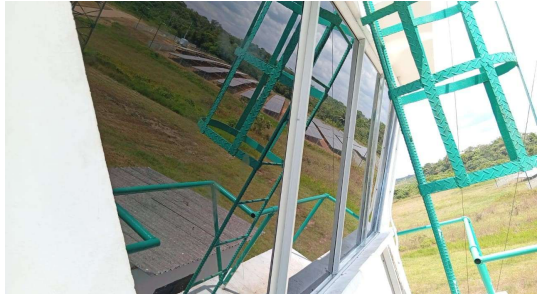



OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
Residente de Obra
Firma y Posfirma


VoBo:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024					
CONTRATO No.			021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	NP3		UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 INCLUYE PELÍCULA POLARIZADA OSCURA DE SEGURIDAD, SILICONA ANTIHONGOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN									
CORTE N°:	4		FECHA:	21/12/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN			DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura	PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
TORRE VIEJA CACOM6										
			V1 T	1.25		1.46	1.83	1.00	1.83	
			V1 T	1.25		1.44	1.80	1.00	1.80	
			V1	0.85		1.46	1.24	2.00	2.48	
			V2 T	1.30		1.44	1.87	1.00	1.87	
			V2 T	1.30		1.46	1.90	1.00	1.90	
			V2	0.85		1.46	1.24	2.00	2.48	
			V3 T	1.30		1.43	1.86	2.00	3.72	
			V3	1.40		0.90	1.26	2.00	2.52	
			V4 T	1.30		1.44	1.87	2.00	3.74	
			V4	0.85		1.42	1.21	1.00	1.21	
									TOTAL	23.55
OBSERVACIONES:										
REGISTRO FOTOGRAFICO:										
										
Elaboró:  DIEGO ARMANDO LOPEZ SANCHEZ Residente de Obra Firma y Posfirma					VoBo:  ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y Posfirma					

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141155164401



(415)7707212489984(8020) 000014115516440 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 8 8 5 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CR 39 10 A 12

42. Correo electrónico

jmlomaximo2540@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 4 0 4 6 5 5 1

45. Teléfono 2

3 0 4 5 7 7 8 8 3 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 2 1 0 3 0 4

4 3 3 0

2 0 2 1 0 3 0 4

4 3 9 0

4 3 2 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre DE LEON ALEMAN LEVISDAN

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155164401



(415)7707212489984(8020) 000014115516440 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 8 8 5 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 3		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 5 1 9		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 5 5 4 6			
78. Departamento	7 0			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 3			
81. Hasta	2 0 3 0 0 5 1 3			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155164401



(415)7707212489984(8020) 000014115516440 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 8 8 5 0	6	Impuestos y Aduanas de Sincelajo	2 3


Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 5 1 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	9 2 5 4 0 2 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
DE LEON	ALEMAN	LEVISDAN		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 5 1 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	6 4 7 0 4 5 8 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CUELLO	CHAVEZ	MATY	LUZ	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155164401



(415)7707212489984(8020) 000014115516440 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 8 8 5 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	
163. Departamento Sucre 7 0	164. Ciudad/Municipio Sincelejo 0 0 1
165. Dirección CRA 29 10A - 12	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 6 5 5 6 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 5 2 0
168. Teléfono 3 1 0 7 2 0 0 0 7 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548238

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548238, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548238	00070	1002366701	OP05 TORRE DE CONTROL VIEJA CACOM6				29.189.652,26
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	29.189.652,26

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548238

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548238, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548238	00010	1002366685	TALLERES GRUAL CACOM-6				72.129.841,47
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	72.129.841,47

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548238

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548238, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548238	00020	1002366690	IN25 SUBESTACION ELECTRICA CACOM6				4.759.573,72
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.759.573,72

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548240

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548240, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548240	00010	1002366681	MTTO NO RESIDENCIAL				41.982.252,11
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	41.982.252,11

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548238

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548238, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548238	00040	1002366696	BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6				91.980.721,80
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	91.980.721,80

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548238

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548238, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548238	00030	1002366694	HORNO INCINERADOR NUEVO				175618.940,18
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	175618.940,18

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548238

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548238, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548238	00060	1002366700	IN32 BUNKER EEUU LADO GRUCO ARCHIVO CACO				58.102.247,72
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	58.102.247,72

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548238

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548238, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548238	00050	1002366698	IN30 BLOQUE GRUPO COMBATEDMUB OD MISC CAC				90.371.121,49
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	90.371.121,49

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548241

CONTRATO: 4600254386



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.	021GRUAL25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548241, contrato interno 4600254386 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548241	00010	1002366672	AIU MTTO NO RESIDENCIAL				16.373.655,56
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.373.655,56

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEVT8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Asistente Gestión Contable

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtique Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-6:48 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	207425	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	87225	Nro. Cdp:	6525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	55.741.626,53	Valor Iva:	2.614.281,14	Valor Total:	58.355.907,67	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900358850	Razón Social:	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVT 8	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtique Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-6:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	207325	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	87225	Nro. Cdp:	6525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	522.152.098,64	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	522.152.098,64	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900358850	Razón Social:	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVT 8	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.: 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM 6

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
