




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



NIT: 901.531.888-1
CONTRATO MC 26 DE 2025

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025

**Interventoría al contrato de adecuaciones locativas en el piso 3 de la torre ab
del palacio de justicia de Sincelejo para el acondicionamiento y
funcionamiento integral de todas las áreas de la dirección seccional y el
mejoramiento de la cubierta del cctv**

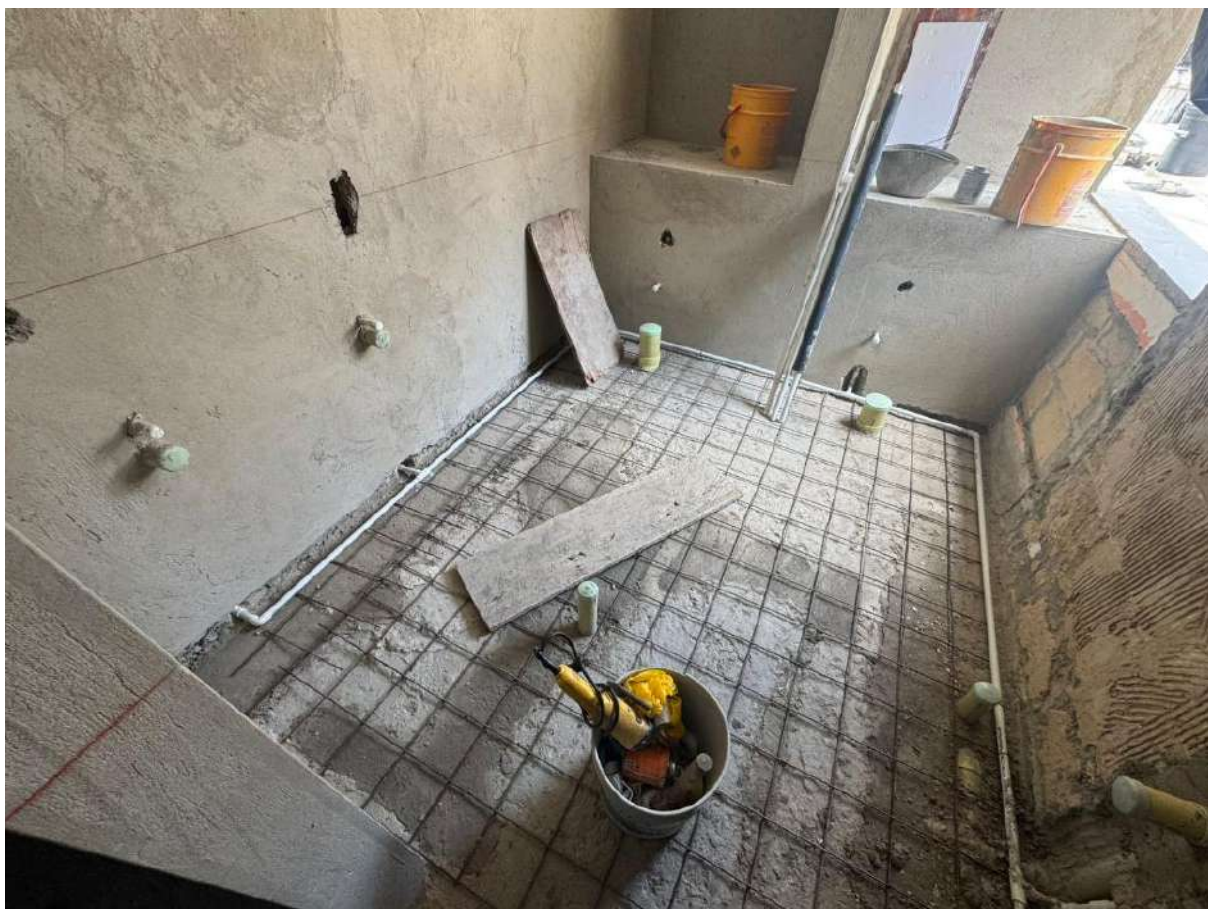


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.003
SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S
Periodo: 1 al 30 de abril de 2026

Dirección: Calle 24B No 9B Bis - 67 Urb. La Bucaramanga
Ciudad: Sincelejo (Sucre)
Tel: 3014784498
Email: simulsas2021@gmail.com

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025		
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026		

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

	VERSION No 001 – 5/5/2026 – INFORME ABRIL 2026		
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	ANUAR TUFIC OVEID TOVAR	DANCY EDILIA TOVAR DE OVEID	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL SIMUL SAS	SUPERVISOR
FECHA	5/5/2026	5/5/2026	5/2/2026
FIRMA			

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

1 INTRODUCCIÓN

El Consejo Superior de la Judicatura en Colombia tiene funciones administrativas clave que incluyen la planificación, administración de recursos y supervisión de la Rama Judicial, dentro de estas se destacan las presentadas en el actual informe que se desarrollan a continuación.

En concordancia con lo anterior se ha desarrollado el contrato MC 26 de 2025 suscrito entre el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO y SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S, el cual tiene la obligación de ejercer la **“INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV”** y por lo tanto cumplir con todas las responsabilidades que de ello se derivan, con base a eso se presenta el informe mensual de interventoría No 3 que comprende el periodo del 1 al 30 de abril de 2026.

El contrato de obra al cual se le realiza el seguimiento tiene como objeto el **“ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV”**, fue adjudicado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO mediante selección abreviada de menor cuantía al CONSORCIO PISO 3 CCTV. El contrato de obra bajo el número SAMC 10 DE 2025.

El contrato de obra tiene fecha de inicio el 3 de diciembre de 2025 con un plazo de inicial de ejecución hasta 31 de diciembre de 2025, posteriormente se tramito prorrogas No 1 hasta el 26 enero de 2026, luego de un periodo de suspensión desde el día 23 de enero de 2026 hasta el 26 de marzo de 2026 se tramito prorrogas No 3 por 4 meses para tener un nuevo plazo de finalización y terminación hasta el 31 de julio de 2026.

Lo que se proyecta ejecutar bajo los alcances del contrato de obra es la intervención integral del piso No 3 de las torres A y B en edificio del palacio de justicia ubicado en la ciudad de Sincelejo, con renovación total de pisos, cielo Razo, construcción de nuevas áreas de oficinas para las dirección y dependencia de las mismas y renovaciones de espacios y paredes para el disfrute de los funcionarios judiciales que laboran en el edificio.

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El objeto del contrato se desarrolla en el edificio del palacio de justicia de Sincelejo Torre A y B en el piso No 3 en la dirección calle 22 No 162 barrio centro Sincelejo - Sucre.

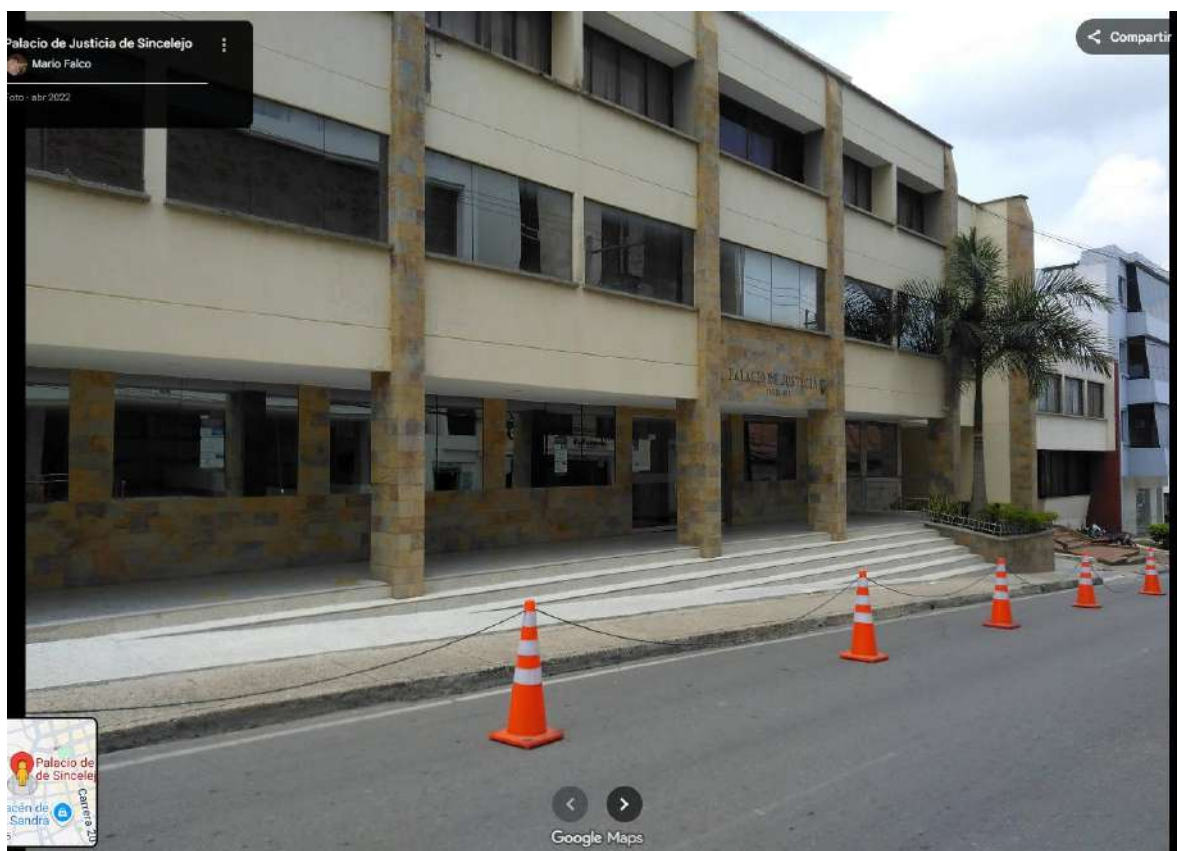


Figura 1. Localización del edificio del palacio de justicia en Sincelejo FUENTE: Google Maps.

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	
--	--	---

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Lo que se proyecta ejecutar bajo los alcances del contrato de obra es la intervención total con renovación de pisos en áreas comunes y oficinas, restructuración arquitectónica completa de las áreas del piso 3 del palacio de justicia en aras de adecuarlas para el funcionamiento de las oficinas directivas y sus dependencias en la seccional Sincelejo, de igual manera cambio y renovación de baños, sistema eléctrico, sistemas de datos, sistema sanitarios y cambio de cubierta en la oficina denominada CCTV.

ESTADO INICIAL DE LAS INSTALACIONES DEL PISO 3 TORRE AB.

	
Foto inicial. Pasillo oficina dirección 3-12-2025	Foto inicial. Pasillo oficina área financiera 3-12-2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026



Foto inicial. Pasillo oficina área financiera 3-12-2025



Foto inicial. Pasillo oficina dirección 3-12-2025



Foto inicial. oficina área cobro coactivo 3-12-2025



Foto inicial. Pasillo oficina dirección 3-12-2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026



Foto inicial. oficina área SST 23-12-2025



Foto inicial. oficina área sistemas 23-12-2025



Foto inicial. oficina área sistemas 23-12-2025



Foto inicial. oficina área nomina 23-12-2025



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026



Architectural floor plan of the 'Edificio de la Secretaría de Educación'. The plan includes the following rooms and areas:

- SALA DE JUNTAS** (Meeting Room): Large room with a long table and chairs, dimensions 10.00 x 10.00.
- OFICINA DIRECTORA** (Director's Office): Room with a desk and chair, dimensions 6.00 x 6.00.
- APOYO DIRECCION** (Support Office): Room with a desk and chair, dimensions 5.00 x 5.00.
- AREA ADMINISTRATIVA** (Administrative Area): Room with a desk and chair, dimensions 5.00 x 5.00.
- RESTAURANTE** (Restaurant): Room with a table and chairs, dimensions 10.00 x 10.00.
- KITCHEN**: Room with a sink and stove, dimensions 1.00 x 1.00.
- TOILETS**: Restroom facilities.
- STORAGE**: Room for storage, dimensions 1.00 x 1.00.
- Corridors and Entrances**: Various walkways and entry points throughout the building.

The plan also shows external dimensions and a green area surrounding the building.


Proyección a ejecutar. Area de oficina de mantenimiento y zonas comunes.




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

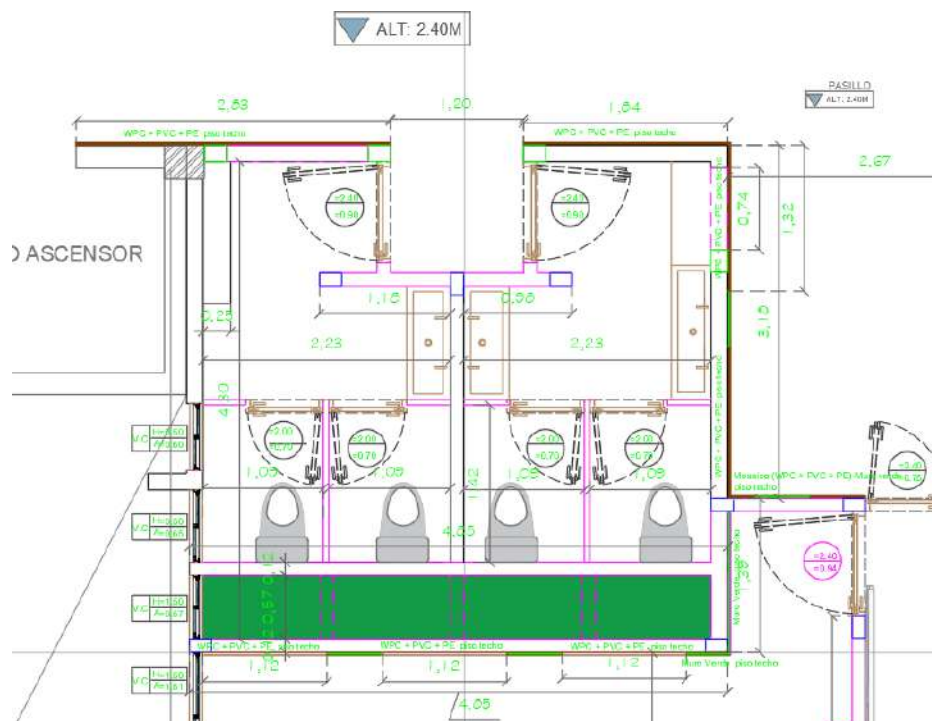

Proyección a ejecutar. Area de Baños.

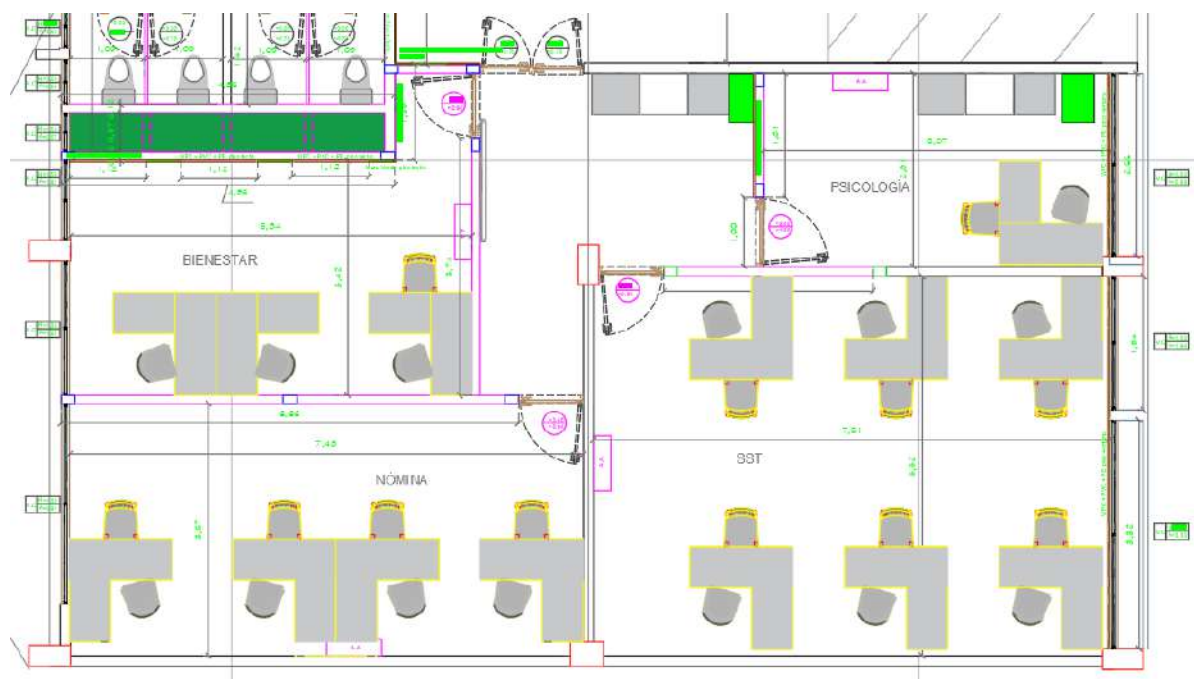

Proyección a ejecutar. Area de oficinas SST, Nomina y Psicologia.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026



Proyección a ejecutar. Area de oficina de contratación, cobro coactivo y cubierta CCTV.



Proyección a ejecutar. Area de oficinas de sistemas.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA	
Contratista	CONSORCIO PISO 3 CCTV NIT. 902.012.110-6
	INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S. NIT. 901542070-1 (20%)
	TAYMO CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901669165-7 (80%)
Representante legal	MARIA XIMENA ZAPATEIRO BUELVAS CC No 1.104.017.231
Contrato No.	SAMC 10 DE 2025
Objeto	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV
Valor del Contrato:	\$1.375.100.226 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE
Valor adicional No 1	\$ 491.901.236,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE).
Valor del total del contrato:	
Fecha de Iniciación	3 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo Inicial	29 DIAS
Fecha terminación inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga No.1	26 DIAS
Fecha de terminación	HASTA EL 26 DE ENERO DE 2026

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	 SIMUL SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROTECTOS S.A.S. NIT. 901.531.800-1
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

INFORMACION CONTRATO DE OBRA	
Fecha de suspensión No 1	23 DE ENERO DE 2026
Fecha de reanudación No 1:	8 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de suspension No 2:	8 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de reanudacion No 2:	27 DE MARZO DE 2026
Prorroga No.1	4 MESES
Fecha de finalización Actual:	31 DE JULIO DE 2026
Supervisor del contrato	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Entidad contratante	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

Tabla 1. Información general del contrato – **Fuente:** Propia – Simul – 2025.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES:

3.2.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS CONTRATISTA DE OBRA:

Las actividades técnicas realizadas por el contratista de obra durante el presente periodo principalmente son las que se describen a continuación:

- Se realiza obras estructurales de instalación de vigas de amarres y machones para confinamiento de muros de contención en todas la áreas de la torre AB piso 3.
- Acabados en estuco plástico en las áreas de las oficinas y pasillos de la torre AB piso 3.
- Extracción de materiales de escombro sobrante a botadero autorizado.
- Disposición y acarreo de material del piso 1 a piso 3 torre AB, a través de winche eléctrico instalado por el contratista.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

- Instalación de mampostería en bloque 0.09 en los baños de la dirección y baño de hombre y mujeres.
- Se realiza actividades de instalación de tubería eléctrica por piso y tubería eléctrica EMT por placa superior.
- Se realizan actividades de instalación de tubería hidráulica y sanitaria para los baños de la torre AB piso 3
- En el presente periodo se realizan visitas y recorridos de definición de áreas, puertas y ventanearías para la correcta distribución de las oficinas planeadas.
- Se realizan pruebas de estanquidad en cada una de las tuberías dispuestas para uso e instaladas en los baños y desagües de aires acondicionados.
- Se realiza instalación de la cubierta de CCTV en lamina arquitectónica contratada.
- Se realizan comités de obra y reuniones de definición de nuevos alcances puntuales en las áreas del piso 3 torre AB.

3.2.2 ACTIVIDADES GESTIÓN SST CONTRATISTA DE OBRA.

Las actividades realizadas en el mes de abril de 2026 en el área SST fueron las siguientes:

- Cerramiento de obra temporal para delimitar los espacios intervenidos en piso 3 y evitar el ingreso de personal no autorizado en zonas de trabajo
- Instalación de avisos de seguridad.
- Cerramientos y señalizaciones durante el trasiego de material.
- Cerramientos y señalizaciones durante el trasiego de residuos de reciclaje
- El presente periodo se realizaron charlas de inducción SST y capacitaciones en esta materia para el cumplimiento de la normatividad de la rama judicial.
- Se realizaron exámenes de ingreso para el personal ingresado en el último periodo de abril de 2026.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

REGISTRO DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA.

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
JUAN CARLOS GARCES DAJUD	92.540.859	DIRECTOR DE OBRA
JOSE DAVID RODRIGUEZ CASTRO	71.726.866	INGENIERO ELECTRICISTA
NEZA YAMILE DAJUD PEREZ	22.516.763	RESIDENTE
INES MARIA FLOREZ CAMARGO	43.640.716	AUXILIAR RESIDENTE
GENNY LUZ SALGADO MONTOYA	1.102.875.308	SST
TULIO MANUEL ZABALETA RAMIREZ	92.098.232	OFICIAL
EDUT ANTONIO BELTRAN MARTINEZ	92.530.749	OFICIAL
JAIRO ANDRES TAMARA HERNANDEZ	1.005.605.323	AYUDANTE
RIBALDO JOSE ALVAREZ MARQUEZ	1.005.568.360	AYUDANTE
LUIS ALBERTO BERTEL CHARRASQUIEL	1.102.815.673	AYUDANTE
NILSON JAVIER ALFARO CAUSADO	1.005.570.944	AYUDANTE
JOSE ANDRES ALVAREZ OSORIO	1.103.738.966	AYUDANTE
JUAN RAMOS RICO	6.809.830	PLOMERO
EVER JOSE PORTILLO PATERNINA	1.102.798.078	PINTOR
JHAN CARLOS TOVAR MERCADO	1.103.116.667	PINTOR
WILSON JAVIER RODELO CORTES	92.535.372	ELECTRICO
OSCAR DOMINGO RAMOS CAUSIL	92.640.604	ELECTRICO

Tabla 2. Registro de personal - **Fuente:** Propia – Simul – 2025.

PLANILAS DE SEGURIDAD SOCIAL

En el presente periodo el consorcio dispuso de entregar la planilla de seguridad social correspondiente al mes de abril de 2026, se verificó que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión,

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

ARL) y aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la obra, conforme a la Ley 789 de 2002.

REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Con respecto al reporte de investigación y seguimiento de incidentes y accidentes, en este mes no se presentaron accidentes de trabajo en ninguno de los frentes de trabajo.

En el presente informe se anexa el informe realizado por el contratista respecto a el seguimiento SST.

3.2.3 ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA DE OBRA.

- En el presente periodo se realizaron evacuación controlada de material reciclaje producto de desmonte canaletas, tomacorrientes eléctricos y cables en desuso.
- Se realiza el respectivo aseo durante la ejecución de las actividades de demoliciones y desmonte garantizando un sitio de acopio temporal hasta su disposición final. Se programan espacios para la recolección de RCD y disposición final con la empresa gestora INTERASEO.
- Dentro de las actividades asociadas a la guía ambiental y la gestión del mismo de acuerdo al anexo técnico y pliego de condiciones, estas se orientan a través PGIRS del SIGMA de la Rama Judicial.
- Durante este periodo, se implementó la debida señalización y seguridad en la obra para prevenir accidentes, especialmente en la demarcación de espacios de trabajo teniendo en las actividades ejecutadas durante la intervención para contribuir a la condición segura del área de trabajo.
- Se realizan actividades de limpiezas de áreas asociadas a las oficinas en construcción del piso 3 torre AB y disposición de basura de acuerdo a los códigos de reciclaje.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

En el presente informe se anexa el informe realizado por el contratista respecto a el seguimiento ambiental.

-

3.2.4 ACTIVIDADES DOCUMENTALES:

En el presente periodo se tramito la modificatoria No 1 el 27 de marzo de 2026 con un adicional de \$ 491.901.236,00 para un valor total de \$ 1.867.001.462,00 y prorroga No 3 por 4 meses para un fecha de finalización a 31 de julio de 2026.

3.3 CONTROL DE VALORES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

VALORES GENERALES EJECUTADOS A ABRIL DE 2026					
CAPITULO	VALOR TOTAL MODIFICATORIA No 1 27-3-2026	VALOR EJECUTADO ENERO 2026	VALOR EJECUTADO ABRIL 2026	VALOR ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
Obras preliminares, provisionales y demoliciones	\$ 33.430.541	\$24.004.334	\$ 23.130.244	\$ 20.680.551	\$ 2.116.581
Estructura			\$ 8.129.119		\$ 16.655.655
Mampostería	\$ 31.664.507	\$6.417.682	\$ 2.683.122	\$ 29.547.926	\$ 1.465.390
Acabados Oficina de Dirección	\$ 24.784.774		\$ 2.024.199	\$ 8.129.119	\$ 2.247.978
Acabados Oficina de Financiera	\$ 4.148.512		\$ 2.365.800	\$ 2.683.122	\$ 1.900.688
Acabados Oficina de Administrativa	\$ 4.272.177		\$ 6.734.907	\$ 2.024.199	\$ 4.478.968
Acabados Oficina de Asistencia Legal y Cobro Coactivo	\$ 4.266.488		\$ 12.132.769	\$ 2.365.800	\$ 9.270.969
Acabados Oficina de Contratación	\$ 11.213.875		\$ 4.756.443	\$ 6.734.907	\$ 4.848.266
Acabados Oficina de Talento Humano	\$ 21.403.738			\$ 12.132.769	\$ 9.656.464



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

VALORES GENERALES EJECUTADOS A ABRIL DE 2026					
CAPITULO	VALOR TOTAL MODIFICATORIA No 1 27-3-2026	VALOR EJECUTADO ENERO 2026	VALOR EJECUTADO ABRIL 2026	VALOR ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
Acabados Oficina de Sistemas	\$ 9.604.709			\$ 4.756.443	\$ 24.217.686
Acabados Espacio Multifuncional	\$ 9.656.464		\$ 677.556		\$ 3.934.898
Acabados Bateria de Baños	\$ 24.217.686				\$ 5.396.216
Acabados Pasillos	\$ 4.612.454			\$ 677.556	\$ 0
Acabados Terrazas verdes	\$ 5.396.216				\$ 47.562.279
Instalaciones hidrosanitarias y accesorios			\$ 2.019.499		\$ 45.542.780
Puertas y ventanas	\$ 47.562.279				\$ 6.492.155
Suministro e instalación de eléctricos	\$ 47.562.279		\$ 20.689.513	\$ 20.689.513	\$ 26.872.766
Suministro e instalación de datos	\$ 6.492.155		\$ 69.718.508		\$ 77.873.203
ITEM NO PREVISTOS PRELIMINARES	\$ 54.297.042		\$ 2.005.532	\$ 47.090.053	\$ 0
ITEMS NO PREVISTOS ESTRUCTURA	\$ 147.591.711		\$ 1.240.000	\$ 69.718.508	\$ 10.147.477
ITEMS NO PREVISTOS MAMPOSTERIA	\$ 2.005.532			\$ 2.005.532	\$ 41.099.223
ITEMS NO PREVISTO ACABADO	\$ 11.387.477			\$ 1.240.000	\$ 238.359.000
ITEMS NO PREVISTO BATERIA DE BAÑOS	\$ 41.099.223		\$ 29.215.181		\$ 289.760.554
ITEMS NO PREVISTOS CARPINTERIA EN ALUMINIO	\$ 238.359.000				\$ 73.760.943
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	\$ 318.975.735		\$ 3.975.458	\$ 29.215.181	\$ 298.575.676

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

VALORES GENERALES EJECUTADOS A ABRIL DE 2026					
CAPITULO	VALOR TOTAL MODIFICATORIA No 1 27-3-2026	VALOR EJECUTADO ENERO 2026	VALOR EJECUTADO ABRIL 2026	VALOR ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
ITEMS NO PREVISTOS DATOS	\$ 73.760.943		\$ 3.332.143		\$ 5.106.274
ITEMS NO PREVISTOS ACABADO CIELO Y PISOS	\$ 302.551.134		\$ 6.321.216	\$ 3.975.458	\$ 5.066.297
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	\$ 8.438.417		\$ 23.130.244	\$ 3.332.143	\$ 2.116.581
INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 11.387.513		\$ 8.129.119	\$ 6.321.216	\$ 16.655.655
VALOR TOTAL + AIU	\$ 1.867.001.462	\$ 41.631.757	\$ 304.339.878	\$ 345.971.635	\$ 1.521.029.827

Tabla 3. Valores en la ejecución del contrato - **Fuente:** Propia – Simul – 2026.

En el presente periodo el contratista de obra realiza tramite de acta parcial No 1 mes de abril de 2026 la cual tiene la siguiente información financiera y de avance.

Contrato No.	SAMC 10 DE 2025
Contratista	CONSORCIO PISO 3 CCTV
Nit / CC	Nit .901.531.888-1
Objeto	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV
Acta a Certificar	Acta Parcial No. 01
Periodo	Abril de 2026
Valor de la Presente Acta	\$ 327.301.620 (Trescientos veintisiete millones trescientos un mil seiscientos veinte pesos M/CTE)
Porcentaje de Avance cobrado	17.53 %
Porcentaje de Avance ejecutado	18.53 %
Valor Total del Contrato	\$ 1.867.001.462,00
Valor Ejecutado en Acta No. 01	\$ 327.301.620,00
Saldo por Ejecutar	\$ 1.539.699.842,00

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

Tabla 3.1. Valores a cobrar acta parcial No 1 abril 2026 - **Fuente:** Propia – Simul – 2026.

3.4 ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

A la fecha de corte del presente informe (Semana No.14) el contratista tiene un avance general ejecutado del **18.53 %**, el cual equivale a un valor de **\$ 345.971.635** contra un avance programado del **39,49 %**, correspondiente a **\$ 736.080.191** presentando una desviación de 18.53 %, con base a la reprogramación a No 3 a 31 de julio de 2026, respecto a la prórroga No 2 realizada.

Lo anteriormente descrito se muestra a continuación en la siguiente tabla realizada de acuerdo al avance semanal reportado por la reprogramación No 3 y en la cual la interventoría realiza seguimiento semanal durante el presente periodo.

	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	22,75%	23,67%	32,50%	38,59%	39,43%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	0,12%	0,92%	8,83%	6,09%	0,84%
AVANCE EJECUTADO	2,59%	3,69%	5,30%	2,35%	2,37%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	4,82%	8,51%	13,81%	16,16%	18,53%
ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE.	\$ 48.355.337,87	\$ 117.247.691,81	\$ 216.198.769,30	\$ 260.073.303,66	\$ 304.321.238,31

	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
INCLUYE CUBIERTA CCTV P					
VALOR TOTAL PROGRAMADO + AIU	\$ 2.330.547,95	\$ 17.176.413,45	\$ 164.856.229,09	\$ 113.700.389,04	\$ 15.682.812,28
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 48.355.337,87	\$ 68.892.353,95	\$ 98.951.077,49	\$ 43.874.534,36	\$ 44.247.934,65

Tabla 4. Seguimiento semanal contrato de obra - **Fuente:** Propia – Simul – 2025

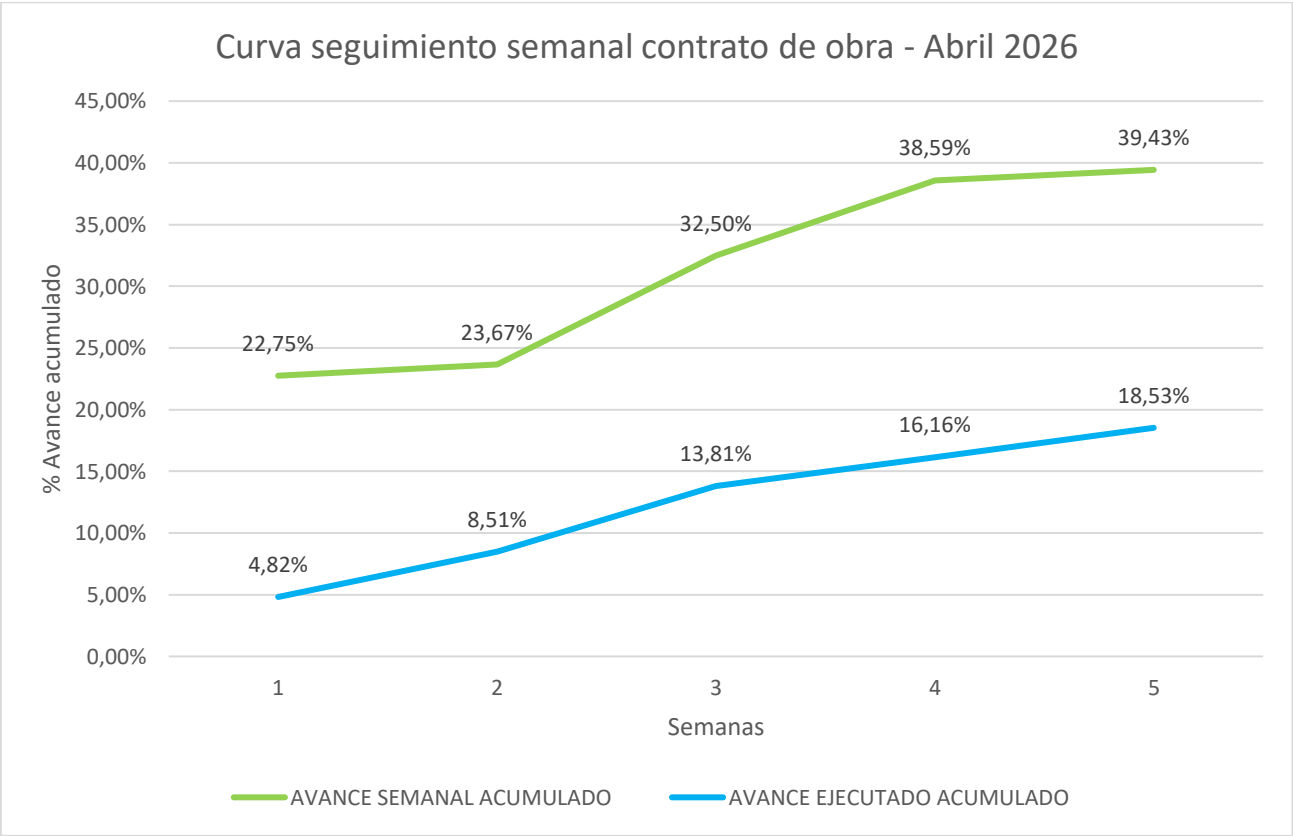


Grafico 1. Curva seguimiento semanal contrato de obra - **Fuente:** Propia – Simul – 2026.

De igual manera se reporta ante la entidad se presentan los gráficos del estado de avance actual del contrato.

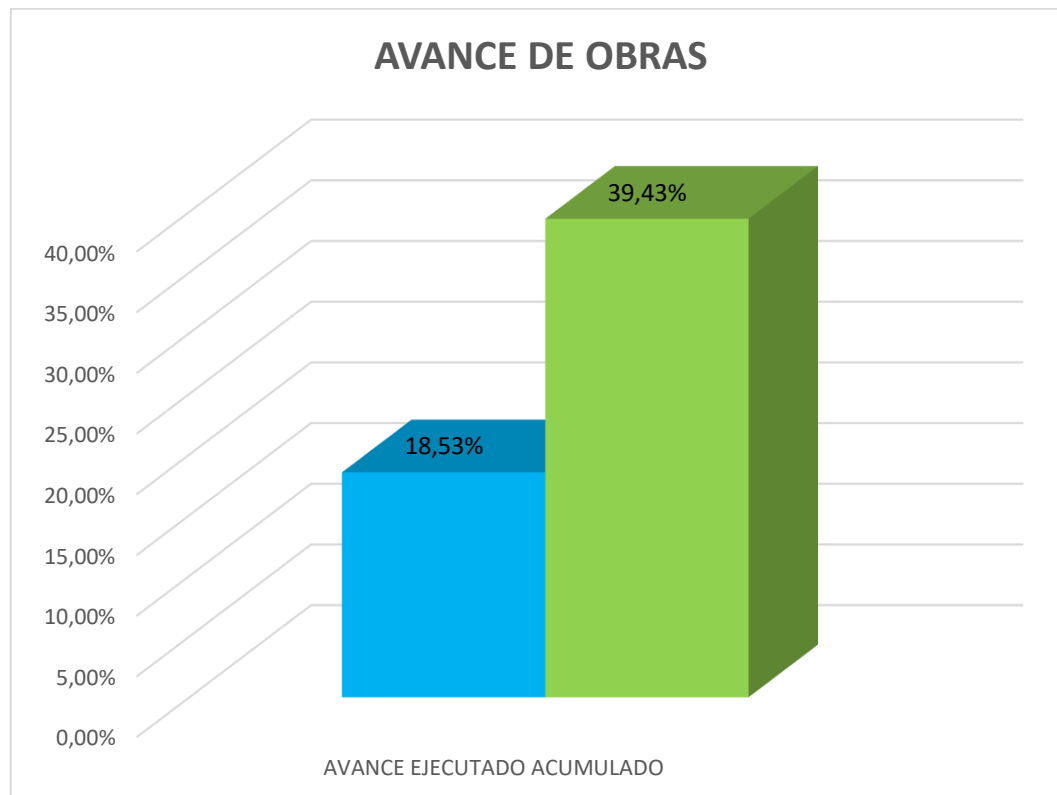


Grafico 2. Barras de seguimiento contrato de obra - **Fuente:** Propia – Simul – 2026.

3.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRATO DE OBRA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
Cumplimiento	10%	\$ 275.020.045,20	3	12	2025	08	6	2026	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 206.265.033,90	3	12	2025	4	2	2029	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 412.530.067,80	9	1	2026	9	1	2031	



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

**GARANTÍA
ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO
No.**

75-44-101149606

**Certificado de
modificación o
anexo No.:**

5

**Razón Social
Compañía
Aseguradora:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la
garantía en la plataforma del
SECOP:**

3/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 284.700.000,00
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	12	2025	8	6	2026

**PÓLIZA DE SEGURO RCE
No.**

75-40-
101056756

**OTRAS PÓLIZAS
No.**

N/A

**Certificado de
modificación o
anexo No.:**

5

**Razón Social
Compañía
Aseguradora:**

SEGUROS DEL ESTADO S. A

**Fecha de aprobación del
seguro en la plataforma del
SECOP:**

3/12/2025

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	
--	--	---

Tabla 4-1. Seguimiento semanal contrato de obra - **Fuente:** Propia – SIMUL – 2025.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S NIT. 901.531.888-1
Contrato No.	MC 26 DE 2025
Objeto	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV
Valor del Contrato	\$ 25.429.987,00 (VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE).
Adición No. 01	\$7.110.856,00 (SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE).
Adición No. 02	\$ 56.030.040,00 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES TREINTA MIL CUARENTA PESOS M/TE).
Valor total contrato	\$ 88.570.883,00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/TE).
Fecha de Iniciación	3 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo Inicial	29 DIAS
Fecha terminación inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga No.1	26 DIAS
Fecha de terminación	HASTA EL 26 DE ENERO DE 2026
Fecha de suspensión No 1	23 DE ENERO DE 2026
Fecha de reanudación No 1:	8 DE FEBRERO DE 2026

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Fecha de suspensión No 2:	8 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de reanudación No 2:	27 DE MARZO DE 2026
Prorroga No.2	4 MESES
Fecha de finalización Actual:	31 DE JULIO DE 2026
Supervisor del contrato	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Entidad contratante	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

Tabla 5. Información general del contrato.

La sede principal de la interventoría está calle 24B No 9B bis – 67 Urbanización la Bucaramanga – Sincelejo – Sucre.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2026 la Interventoría llevó a cabo principalmente las siguientes actividades:

4.2.1 ACTIVIDADES TECNICAS:

Las actividades técnicas realizadas por el contratista de obra durante el presente periodo principalmente son las que se describen a continuación:

- Supervisión y seguimiento a obras estructurales de instalación de vigas de amarres y machones para confinamiento de muros de contención en todas la áreas de la torre AB piso 3.
- Supervisión y seguimiento de acabados en estuco plástico en las áreas de las oficinas y pasillos de la torre AB piso 3.

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

- Supervisión y seguimiento de extracción de materiales de escombro sobrante a botadero autorizado.
- Supervisión y seguimiento de disposición y acarreo de material del piso 1 a piso 3 torre AB, a través de winche eléctrico instalado por el contratista.
- Supervisión y seguimiento de instalación de mampostería en bloque 0.09 en los baños de la dirección y baño de hombre y mujeres.
- Supervisión y seguimiento de actividades de instalación de tubería eléctrica por piso y tubería eléctrica EMT por placa superior.
- Supervisión y seguimiento de actividades de instalación de tubería hidráulica y sanitaria para los baños de la torre AB piso 3
- Visitas y recorridos de definición de áreas, puertas y ventanearías para la correcta distribución de las oficinas planeadas.
- Verificación y seguimiento a pruebas de estanquidad en cada una de las tuberías dispuestas para uso e instaladas en los baños y desagües de aires acondicionados.
- Supervisión y seguimiento de la cubierta de CCTV en lamina arquitectónica contratada.
- Verificación y realización de comités de obra y reuniones de definición de nuevos alcances puntuales en las áreas del piso 3 torre AB.

4.2.2 ACTIVIDADES DOCUMENTALES:

En el presente periodo se tramito la modificatoria No 1 el 27 de marzo de 2026 con un adicional de \$ 56.030.040 para un valor total de \$ 88.570.883,00 y prorroga No 3 por 4 meses para un fecha de finalización a 31 de julio de 2026.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

RELACIÓN COMITES DE OBRA Y REUNIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026 A ABRIL 2026	
CONTRATO DE OBRA No:	SAMC 10 DE 2025
OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV
CONTRATISTA	CONSORCIO PISO 3 CCTV NIT. 902.012.110-6
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	MC 26 DE 2025
OBJETO	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV
INTERVENTOR	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S NIT. 901.531.888-1

No DE ACTA Y FECHA	REFERENCIA	PARTICIPANTES
ACTA DE COMITE N°005.1 – 06/02/2026	Revisión y evaluación de avance en el balance y solicitud de ampliación de suspensión para terminación del mismo, SAMC 10 DE 2025	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR Y PROFESIONALES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
ACTA DE COMITE N°005.2 – 13/02/2026	Revisión y evaluación de avance en el balance, diseños definitivos eléctricos y de datos y ajustes arquitectónicos en puertas y ventanas a implementar SAMC 10 DE 2025	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR Y PROFESIONALES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

No DE ACTA Y FECHA	REFERENCIA	PARTICIPANTES
ACTA DE COMITE N°006 – 16/02/2026	Revisión y evaluación de avance en el balance, diseños definitivos eléctricos y de datos y ajustes arquitectónicos en puertas y ventanas a implementar SAMC 10 DE 2025	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR Y PROFESIONALES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
ACTA DE COMITE N°007 – 10/03/2026	Revisión y evaluación de avance en el balance, diseños definitivos eléctricos y de datos y ajustes arquitectónicos en puertas y ventanas a implementar SAMC 10 DE 2025	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR
ACTA DE COMITE N°009 – 16/04/2026	Realizar el recorrido técnico en campo para la definición de alcances adicionales y ajustes técnicos en la ejecución del contrato de adecuaciones locativas del piso 3. El objetivo principal es garantizar que las modificaciones en las áreas de Sistemas, SST y Bienestar cumplan con los requerimientos operativos de la entidad. Contrato SAMC 10 DE 2025	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR
ACTA DE COMITE N°010 – 28/04/2026	Realizar el recorrido técnico en campo para la definición de alcances adicionales y ajustes técnicos en la ejecución del contrato de adecuaciones locativas del piso 3. El objetivo principal es garantizar que las modificaciones en las áreas de Sistemas, SST y Bienestar cumplan con los requerimientos operativos de la entidad. Contrato SAMC 10 DE 2025	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR

Tabla 6. Información de actas de comités y reuniones realizadas. **Fuente:** Elaboración propia – SIMUL – 2025. **Fuente:** Elaboración propia – Consorcio Terciarias 196 – 2025.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

4.2.3 ACTIVIDADES GESTIÓN SST:

Las actividades realizadas en el mes de abril de 2026 fueron las siguientes:

- Verificación de la señalización instalada en los diferentes frentes de trabajo de la torre A y B.
- Revisión del cumplimiento de las medidas de orden y aseo en las zonas de trabajo intervenidas, adicional higiene y orden locativo de la obra.
- Revisión de prevención al riesgo eléctrico en la obra.
- Revisión y seguimiento a los soportes e informes presentados desde el área SST para su evaluación y trámite ante la entidad.
- Revisión de las planillas de aportes de Seguridad Social Integral y verificación que dichos aportes estén acorde con la asistencia diaria y permanencia del personal en obra.
- Actividades de prevención e información a los peatones de la rama judicial que utilizan las instalación y pasillos del piso 3 torre AB.
- Seguimiento al uso adecuado de elementos de protección personal necesarios en el desarrollo de las labores. De este modo y cuando se presente alguna irregularidad, realizar observaciones verbales y escritas al contratista con la intención de conseguir eliminar la no Conformidad.
- Solicitud de jornadas de capacitación y/o formación del personal en todo lo que respecta a SST.

REGISTRO DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
ANUAR TUFIC OBEID TOVAR	92.536.821	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDUARDO RAFAEL ANGULO FERNANDEZ	7.601.562	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MILENA ROSA MARTINEZ VERGARA	49.595.084	SST

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	
--	--	---

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
JUAN FERNANDO VERGARA MONTES	91.492.766	INGENIERO ELECTRICISTA
ANDREA PAOLA PEREZ GONZALEZ	1.102.850.369	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Tabla 7. Registro de personal interventoría - **Fuente:** Propia – SIMUL– 2025.

4.3 CONTROL DE VALORES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El contrato de interventoría dispone de los siguientes recursos para el desarrollo contractual, teniendo en cuenta la prórroga No 2 al contrato y adicional No 2 por el valor de \$ 56.030.040,00, hasta el mes el 31 de julio de 2026

MINIMA CUANTIA No. MC 26 DE 2025 CONDICIONES DEL CONTRATO CON ADICIONAL No 1 A 26 DE ENERO 2026						
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente. Con especialización en gerencia de proyectos de construcción.	\$ 1.623.500	50%	179,50%	\$ 1.457.091	1,84	\$ 2.676.677
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1): Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente.	\$ 1.623.500	100%	179,50%	\$ 2.914.183	1,84	\$ 5.353.354
INGENIERO ELECTRICISTA (1): Poseer título profesional como Ingeniero Electricista.	\$ 1.623.500	50%	179,50%	\$ 1.457.091	1,84	\$ 2.676.677
SUBTOTAL COSTO EQUIPO DE TRABAJO MINIMO (1)						\$ 10.706.707

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	
---	--	---

MINIMA CUANTIA No. MC 26 DE 2025 CONDICIONES DEL CONTRATO CON ADICIONAL No 1 A 26 DE ENERO 2026						
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
PERSONAL TECNICO						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL TECNICO	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
SISO (1): Tecnólogo o Técnico en Áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO), con licencia en SST vigente	\$ 1.623.500	100%	179,50%	\$ 2.914.183	1,84	\$ 5.353.354
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)						\$ 5.353.354
PERSONAL DE APOYO						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL DE APOYO	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
Secretaria administrativa	\$ 1.623.500	50%	179,50%	\$ 1.457.091	1,84	\$ 2.676.677
SUBTOTAL COSTO PERSONAL APOYO (3)						2.676.677
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO		TOTAL	
ELABORACION DE INFORMES Y PAPELERIA (FOTOCOPIAS E INFORMES)	GLB	2	\$ 50.000		\$ 100.000	
ARRIENDO DE OFICINA + SERVICIOS	MES	1,84	\$ 50.000		\$ 92.000	



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

MINIMA CUANTIA No. MC 26 DE 2025 CONDICIONES DEL CONTRATO CON ADICIONAL No 1 A 26 DE ENERO 2026

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO NO FACTURABLE / ASESORIAS (En caso de no utilizarse durante la ejecución este valor se deducirá al finalizar del valor total a pagar) valor fijo Inmodificable.		GLB	0	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
(RETEFUENTE, RETE-ICA, ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES, CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA)		BASE GRAVABLE (Total Interventoria menos IVA)	12,50%	\$ 27.345.246		\$ 3.418.156
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (4)						\$ 8.610.156
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3+4)						\$ 27.346.894
IVA (Sobre costo básico 19%)						\$ 5.195.910
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA						\$ 32.542.804

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

MINIMA CUANTIA No. MC 26 DE 2025 CONDICIONES DEL ADICIONAL No 2 A 31 DE JULIO 2026						
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente. Con especialización en gerencia de proyectos de construcción.	\$ 1.623.500	50%	179,50%	\$ 1.457.091	4,00	\$ 5.828.365
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1): Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente.	\$ 1.623.500	100%	179,50%	\$ 2.914.183	4,00	\$ 11.656.732
INGENIERO ELECTRICISTA (1): Poseer título profesional como Ingeniero Electricista.	\$ 1.623.500	50%	179,50%	\$ 1.457.091	4,00	\$ 5.828.365
SUBTOTAL COSTO EQUIPO DE TRABAJO MINIMO (1)						\$ 23.313.462
PERSONAL TECNICO						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL TECNICO	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
SISO (1): Tecnólogo o Técnico en Áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO), con licencia en SST vigente	\$ 1.623.500	100%	179,50%	\$ 2.914.183	4,00	\$ 11.656.732
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)						\$ 11.656.732
PERSONAL DE APOYO						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL DE APOYO	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	TOTAL
Secretaria administrativa	\$ 1.623.500	50%	179,50%	\$ 1.457.091	4,00	\$ 5.828.365
SUBTOTAL COSTO PERSONAL APOYO (3)						5.828.365
OTROS COSTOS DIRECTOS						

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
ELABORACION DE INFORMES Y PAPELERIA (FOTOCOPIAS E INFORMES)	GLB	4	\$ 50.000	\$ 200.000
ARRIENDO DE OFICINA + SERVICIOS	MES	4,00	\$ 50.000	\$ 200.000
PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO NO FACTURABLE / ASESORIAS (En caso de no utilizarse durante la ejecución este valor se deducirá al finalizar del valor total a pagar) valor fijo Inmodificable.	GLB	0		\$ -
(RETEFUENTE, RETE-ICA, ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES, CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA)	BASE GRAVABLE (Total Interventoria menos IVA)	12,50%	\$ 47.084.065	\$ 5.885.508
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (4)				\$ 6.285.508
RESUMEN GENERAL				
COSTO TOTAL (1+2+3+4)				\$ 47.084.067
IVA (Sobre costo básico 19%)				\$ 8.945.973
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA				\$ 56.030.040

En presente periodo la interventoría presenta acta de costos No 1 con base a la siguiente información:

Contrato No.	MC 26 DE 2026
Contratista	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S
Nit / CC	Nit .901.531.888-1
Objeto	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV
Acta a Certificar	Acta de costos No. 01
Periodo	Abril de 2026
Valor de la Presente Acta	\$ 32.542.804 (Trescientos veintisiete millones trescientos unos mil seiscientos veinte pesos M/CTE)
Porcentaje de Avance cobrado	36.74 %
Porcentaje de Avance ejecutado	56.95 %
Valor Total del Contrato	\$ 88.570.883,00
Valor Ejecutado en Acta No. 01	\$ 32.542.804
Saldo por Ejecutar	\$ 1.539.699.842.

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

4.4 ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha de corte del presente informe (Semana No.14) la interventoría tiene un avance general ejecutado del **56.95 %**, el cual equivale a un valor de **\$ 50.438.307,00** contra un avance programado del **56.95 %**, correspondiente a **\$ 50.438.307,00** concluyendo que se está cumpliendo con lo programado en cuanto a los costos de interventoría, con base a la reprogramación a No 3 a 31 de julio de 2026, respecto a la prórroga No 2 realizada con base al adicional de recursos realizado por \$ 56.030.040, por parte de la entidad contratante.

Lo anteriormente descrito se muestra a continuación en la siguiente tabla realizada de acuerdo al avance semanal reportado por la reprogramación No 3 y en la cual la interventoría realiza seguimiento semanal durante el presente periodo.

Se aclara que a partir del 23 de enero de 2026, se realiza suspensión temporal por 15 días hasta el día 9 de febrero de 2026, para los requerimientos documentales descritos en los anteriores capítulos.

SEMANAS	REPROGRAMACION	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
INICIO		5/04/2026	11/04/2026	17/04/2026	23/04/2026
		AL	AL	AL	AL
FINAL		11/04/2026	17/04/2026	23/04/2026	29/04/2026
VALOR ACUMULADO		\$ 34.167.885,15	\$ 39.591.358,98	\$ 45.014.832,82	\$ 50.438.306,65
VALOR SEMANAL		\$ 5.423.473,83	\$ 5.423.473,83	\$ 5.423.473,83	\$ 5.423.473,83
PORCENTAJE ACUMULADO		38,58%	44,70%	50,82%	56,95%
PORCENTAJE SEMANAL		38,58%	44,70%	50,82%	56,95%

Tabla 8. Registro de inversión semanal interventoría - **Fuente:** Propia – SIMUL– 2025.

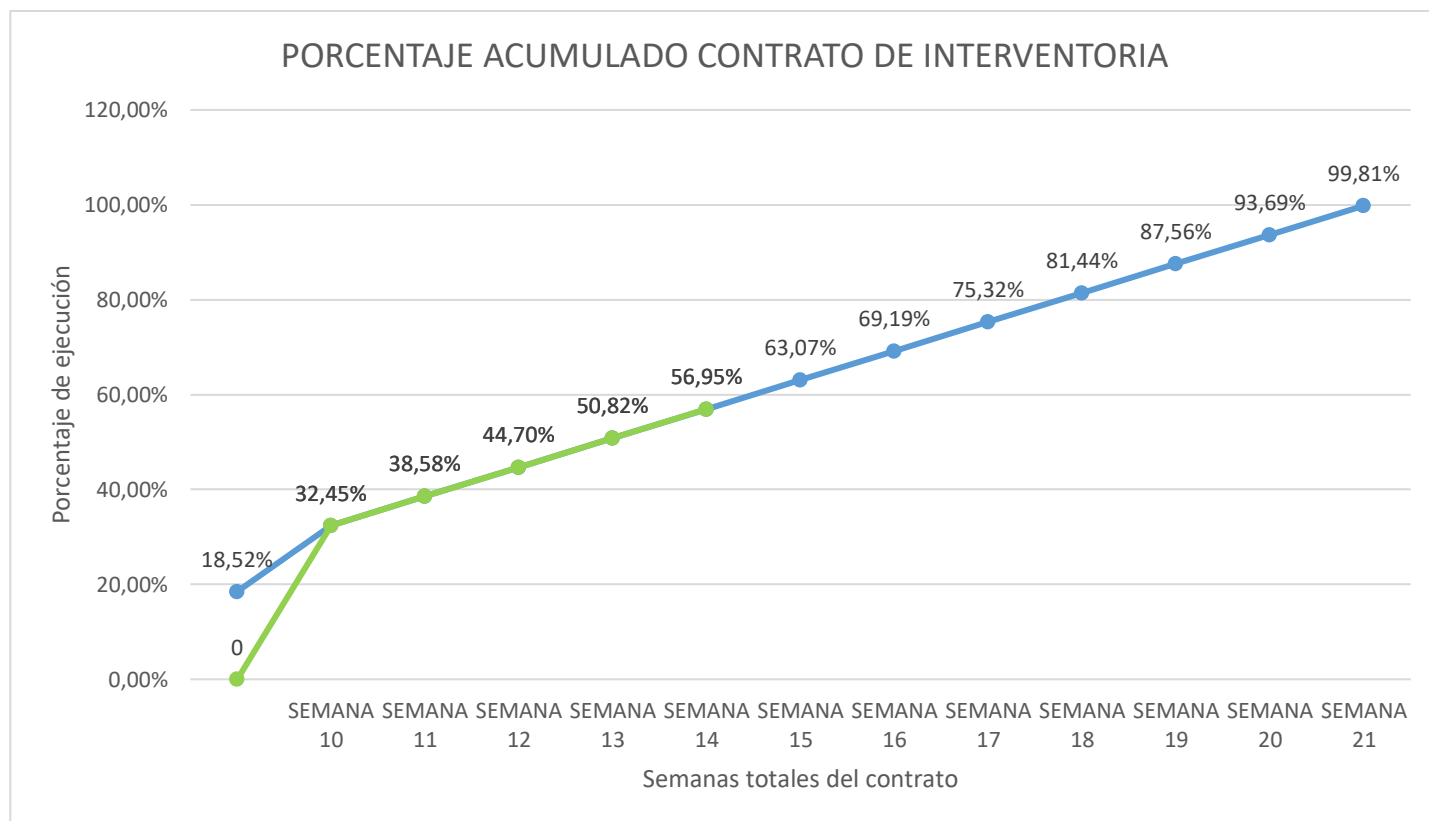


Grafico 3. seguimiento contrato de interventoría - **Fuente:** Propia – Simul – 2025.

4.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde			Hasta
Cumplimiento	10%	\$ 5.085.997,40	27	03	2026	31 1 2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 2.542.998,70	21	03	2026	31 07 2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 5.085.997,40	31	07	2026	31 07 2029



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO No.

CRC-100029116

Certificado de modificación o
anexo No.:

5

Razón Social Compañía
Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la
plataforma del SECOP:

3/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros	N/A	N/A						

5.REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Levante de muro torre B y vaciado de machones



Levante de muro torre B y vaciado de machones



Levante de muro torre B y vaciado de machones




Levante de muro torre B y vaciado de machones

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026



Pañete allanado en mortero area administrativa.

Pañete allanado en mortero area contratación

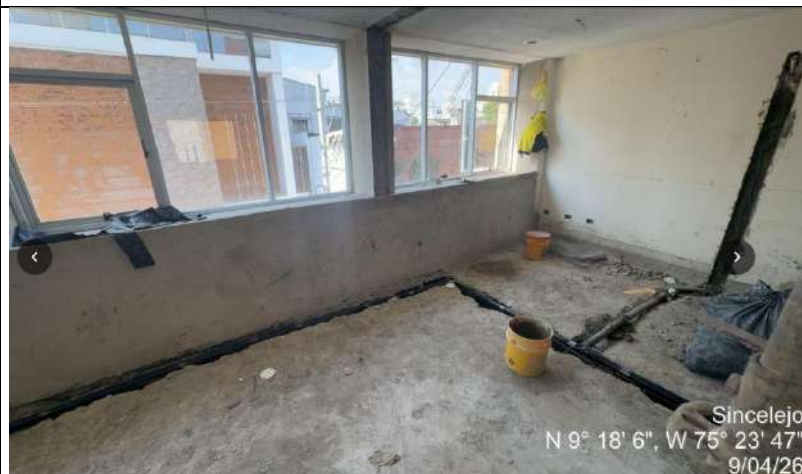

Pañete allanado en mortero oficina dirección


Pañete allanado en mortero oficina dirección



Instalacion de tuberia electrica por piso



Instalacion de bandeja electrica por piso

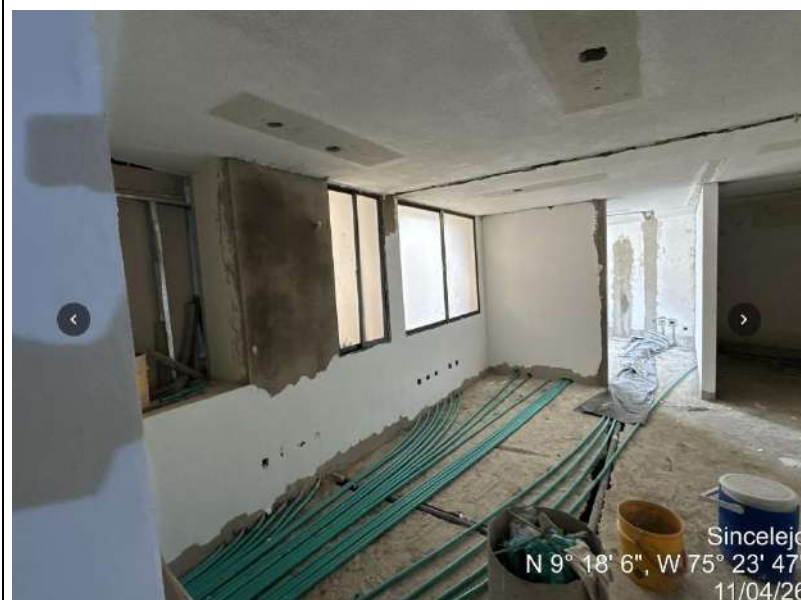


Pañete allanado en mortero oficina dirección



Pañete allanado en mortero oficina dirección

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

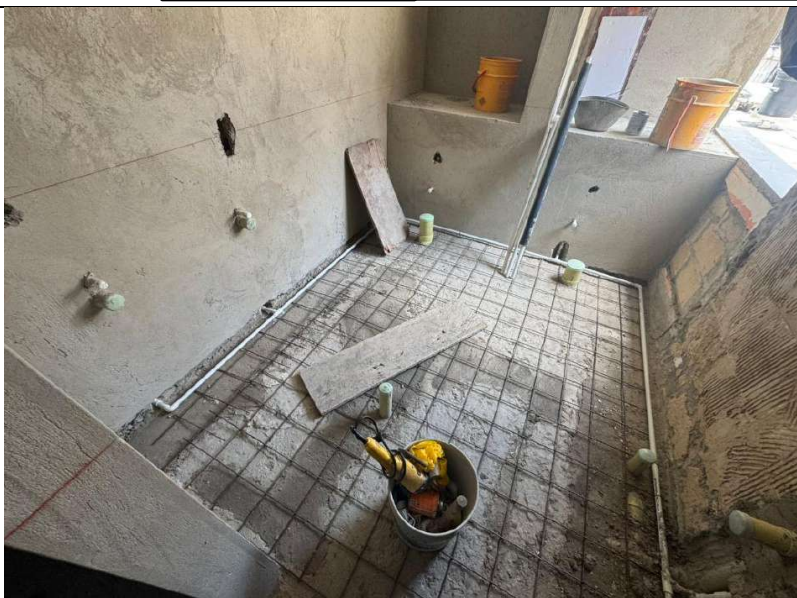

Instalacion de tuberia hidraulica y malla electrosoldada baños



Instalacion de malla electrosoldada area bienestar



Instalacion de canal metalica por techo para cableado electrico del pasillo



Repello pared oficina dirección



Instalacion de cubierta CCTV



Instalacion de tuberia de cobre para aires acondicionados



Instalacion de tuberia EMT para intalacion de luminarias



Instalacion de tuberia de cobre para aires acondicionados

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

AREA TECNICA.

- El contrato presenta un déficit del – **20,90 %**, cifra que la interventoría evalúa con respecto a la reprogramación No 3 de la prórroga a 31 de julio de 2026, dicho déficit este asociado a la programación actual la cual no se ha definido de manera clara por la realización de manera efectiva y asertiva del balance de obra, es por esto que de manera preventiva se ha realizado en el presente periodo una suspensión temporal.
- En el presente periodo se tramito ante la entidad solicitud balance de obras y modificadorio No 1, con el cual se adiciono al contrato de obra un monto por \$ 491.901.236,00, correspondiente a actividades no previstas necesarias para cumplir con el objeto contractual que derivaron en la prórroga No 3 a 31 de julio de 2026.
- En resumen, el presente periodo se realizaron actividades de vaciado de plantillas e instalación eléctricas por piso y placa, al igual de instalación hidrosanitarias en balos y terminación de muros, repellos y estuco.
- Se recomienda al contratista de obra y a la entidad contratante Anuar esfuerzos para realizar un balance de obra ajustado de acuerdo a las necesidades reales vistas en los recorridos preliminares realizados.

AREA SST Y AMBIENTAL.

- Recomendar realizar capacitación y charlas de seguridad a los trabajadores del buen uso de
- los EPP, equipos de trabajo en altura, riesgos de Tsa y excavaciones.

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO CONTRATO MC 26 DE 2025	 SIMUL SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROECTOS S.A.S. NIT. 901.531.800-1
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

- Mantener las medidas de orden, aseo y uso de EPP, orientando esfuerzos a la consecución de espacios limpios y libres de desechos, lo anterior propendiendo por la instauración de medidas tendientes a la creación de buenos hábitos de higiene en los espacios de trabajo, mantenimiento del medio ambiente, y cultura del autocuidado.
- Realizar a tiempo y debidamente el diligenciamiento y pago de las planillas de aportes de Seguridad Social Integral, así mismo, que dichos aportes estén acordes con la asistencia diaria y permanencia del personal en obra.
- Entregar a los operarios de maquinaria menor dispuesta en la obra como vibro-compactador, rotomartillos, pulidoras y cortadoras, así mismo, brindar capacitación constante a este personal en SST



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026**



ANEXOS



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026**



SEGUIMIENTO A LA GESTION SST.



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PERIODO: 27 DE MARZO 2026 AL 27 DE ABRIL 2026

CONTRATO DE OBRA: SAMC 10 DE 2025

LUGAR: SINCELEJO SUCRE

PERSONAL EN OBRA



LISTADO DE PERSONAL EN OBRA

ITEM	NOMBRES	Nº IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE AFILIADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	ARL
1	NEZA YAMILE DAJUD PEREZ	22.516.763	RESIDENTE	DEPENDIENTE	12/12/2026		SURA
2	INES MARIA FLOREZ CARMONA	43.640.716	AUX. RESIDENTE	DEPENDIENTE	12/12/2026		SURA
3	GENNY LUZ SALGADO MONTOYA	1.102.875.308	SISO	DEPENDIENTE	2/1/2026		SURA
4	JAIRO ANDRES TAMARA HERNANDEZ	1.005.605.323	OFICIOS VARIOS	DEPENDIENTE	12/12/2025		SURA
5	RIBALDO JOSE ALVAREZ MARQUEZ	1.005.568.360	OFICIOS VARIOS	DEPENDIENTE	12/12/2025		SURA
6	NILSON JAVIER ALFARO CAUSADO	1.005.570.944	OFICIOS VARIOS	DEPENDIENTE	1/3/2026		SURA
7	LUIS ALBERTO BERTEL CHARRASQUIEL	1.102.815.673	OFICIOS VARIOS	DEPENDIENTE	1/3/2026		SURA
8	JOSE ANDRES ALVAREZ OSORIO	1.103.738.966	OFICIOS VARIOS	DEPENDIENTE	1/1/2026		SURA
9	TULIO MANUEL ZABALETA RAMIREZ	92.098.232	OFICIAL	DEPENDIENTE	1/21/2026		SURA
10	EDUT ANTONIO BELTRAN MARTINEZ	92.530.749	OFICIAL	DEPENDIENTE	2/17/2026		SURA
11	JULIAN RAMOS RICO	6.809.830	PLOMERO	DEPENDIENTE	3/3/2026		SURA
12	EVER JOSE PORTILLO PATERMINA	1.102.798.078	PINTOR	DEPENDIENTE	8/4/2026		SURA
13	JHAN CARLOS TOVAR MERCADO	1.103.116.687	PINTOR	DEPENDIENTE	8/4/2026		SURA
14	WILSON JAVIER RODELO CORTES	92.535.372	ELECTRICO	DEPENDIENTE	8/4/2026		SURA
15	OSCAR DOMINGO RAMOS CAUSIL	92.640.604	ELECTRICO	DEPENDIENTE	8/4/2026		SURA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES

Adjunto a este informe, se relacionan los certificados de afiliación del personal relacionado y la planilla de seguridad social.

Se reporta la desvinculación del trabajador Ribaldo José Álvarez Marquez, identificado con C.C 1.005.568.360 quien ejercía funciones como oficios varios.

Se reporta el ingreso de los siguientes trabajadores:

- Julián Ramos Rico, identificado con C.C 6.809.830 quien se desempeñará en el cargo de plomero.
- Ever José Portillo Paternina, identificado con C.C 1.102.798.078 quien se desempeñará en el cargo de pintor.
- Jhan Carlos Tovar Mercado, identificado con C.C 1.103.116.687 quien se desempeñará en el cargo de pintor.
- Wilson Javier Rodelo Cortes, identificado con C.C 92.535.372 quien se desempeñará en el cargo de eléctrico.
- Oscar Domingo Ramos Causil, identificado con C.C 92.640.604 quien se desempeñará en el cargo de eléctrico.

ESTADISTICAS SST

ESTADISTICAS

PERIODO

ACUMULADO

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA

NUMERO DE INCIDENTES DE TRABAJO	MARZO -ABRIL	0
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	MARZO -ABRIL	0
NUMERO DE DIAS PERDIDO POR ACCIDENTE DE TRABAJO	MARZO -ABRIL	0
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR INCAPACIDAD	MARZO -ABRIL	0
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	MARZO -ABRIL	0
NUMERO DE TRABAJDORES AUSENTES POR CAUSAS MEDICAS	MARZO -ABRIL	0
NUMERO DE DIAS DE AUSENCIA POR CAUSAS MEDICAS	MARZO -ABRIL	0
NUMERO DE TRABAJADORES CON DIAGNOSTICO	MARZO -ABRIL	0
ESPECIFIQUE EL DIAGNOSTICO:	MARZO -ABRIL	0
TOTAL, DE EMPLEADOS DIRECTOS	MARZO -ABRIL	14
TOTAL, INGRESOS	MARZO -ABRIL	5
TOTAL, RETIROS	MARZO -ABRIL	1
TOTAL, SUBCONTRATISTA	MARZO -ABRIL	0
TOTAL, INGRESADOS	MARZO -ABRIL	0
TOTAL, RETIRADOS	MARZO -ABRIL	0
REPORTE DE ACCIDENTES – INCIDENTES		
En el presente mes, no se reportan accidentes y/o incidentes durante el desarrollo de las actividades programadas		
CAPACITACIONES		
TEMA	FECHA	
PAUSAS ACTIVAS	27-03-2026	
MANEJO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	14-04-2026	
ERGONOMIA Y PREVENCION DE LESIONES	25-04-2026	
IMPORTANCIA DE REALIZAR REPORTES DE INCIDENTES	27-04-2026	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
NOVEDADES		
NUMERO	N/A	



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6

DESCRIPCION

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo - abril 2026 no se reportan novedades ni incidentes relacionados con el personal presente en obra.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ENTREGA DE DOTACION
– FORMATOS /
EVIDENCIA
FOTOGRAFICA (VER
ANEXOS)



SEÑALIZACIÓN

Durante este periodo, se realizan las siguientes actividades:

- Se da continuidad con el cerramiento temporal de obra para delimitar de forma segura las áreas intervenidas en piso 3 y restringir el acceso del personal no autorizado, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y orden.
- Se instalan cerramientos y señalización preventiva durante el traslado de material para garantizar la seguridad.

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6



ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL

TRABAJADOR No DE IDENTIFICACION			
CAUSA PRICIPAL Y SECUNDARIA DEL ACCIDENTE			
BREVE DESCRIPCION DEL ACCIDENTE			
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCION/PLAZO			
ESTADO DEL PLAN DE ACCION ABIERTO O CERRADO			

NOTA: SE REALIZA TABLA DE ACUERDO CON LO QUE SE PRESENTE EN EL AREA DE TRABAJO DEL PERIODO INFORMADO

Genny Salgado

GENNY LUZ SALGADO MONTOYA

SISO DE OBRA:

Cédula de Ciudadanía No: 1.102.875.308

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 001 – SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902012110	NÚMERO PLANILLA:	6010704561	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO PISO 3 CCTV		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE	DÍAS DE MORA:	2		abril AÑO
DIRECCIÓN:	CALLE 24 #31 29	TELÉFONO:	2788237	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	210347990
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	\$ 1.961.400	\$	\$	\$	\$	\$ 2.700	\$	\$ 1.961.400	\$ 2.700	\$ 1.964.100
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 411.000	\$	\$	\$	\$	\$ 600	\$	\$ 411.000	\$ 600	\$ 411.600
SUBTOTALES:										\$ 2.372.400	\$ 3.300	\$ 2.375.700

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 70.10	\$	\$ 100	\$	\$ 70.10	\$ 100	\$	\$	\$ 70.20
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 238.30	\$	\$ 400	\$	\$ 238.30	\$ 400	\$	\$	\$ 238.70
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 70.10	\$	\$ 100	\$	\$ 70.10	\$ 100	\$	\$	\$ 70.20
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	2	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 140.20	\$	\$ 200	\$	\$ 140.20	\$ 200	\$	\$	\$ 140.40
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	2	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 140.20	\$	\$ 200	\$	\$ 140.20	\$ 200	\$	\$	\$ 140.40
SUBTOTALES:												\$ 658.90	\$ 1.000	\$		\$ 659.90

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10						\$ 1.145.900	\$ 1.145.900	\$ 1.600		\$ 1.147.500
SUBTOTALES:									\$ 1.145.900	\$ 1.600		\$ 1.147.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR						
		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO		NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE		10	\$ 658.900	\$ 900	\$ 659.800
SUBTOTALES:				\$ 658.900	\$ 900	\$ 659.800

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				IBC	CCF		SEN	ICBF	ESA	MINE						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIO	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
1	CC 1005568360	ALVAREZ MARQUEZ RIBALDO JOSE	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI		14																	230201-PROTECCION	1	\$ 817.08	\$ 130.80	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 130.80	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 817.08	\$ 32.7	\$	\$ 32.7	14-11 - ARL SUR	\$ 817.08	00001	\$ 56.9	\$ 817.0	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 32.7					
2	CC 1005570944	ALFARO CAUSADO NILSON JAVIER	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230301-PORVENIR	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	ESSC24-COOSALUD ESS	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90		121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					
3	CC 1005605323	TAMARA HERNANDEZ JAIRO ANDRES	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230301-PORVENIR	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	EPS002-SALUD TOTAL	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90	00001	121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					
4	CC 1102815673	BERTEL CHARRASQUEL LUIS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230301-PORVENIR	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90		121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					
5	CC 1102875308	SALGADO MONTOYA GENNY LUZ	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230301-PORVENIR	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	EPS002-SALUD TOTAL	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90		121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					
6	CC 1103738966	ALVAREZ OSORIO JOSE ANDRES	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230301-PORVENIR	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90		121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					
7	CC 43640716	FLOREZ CARMONA INES MARIA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230301-PORVENIR	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	EPS037-NUEVA EPS	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90		121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					
8	CC 6809830	RAMOS RICO JULIAN	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	\$ 1.750.905	FUJO		SI	03																				\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EPS002-SALUD TOTAL	2	1.634.17	\$ 65.4	\$	\$ 65.4	14-11 - ARL SUR	1.634.17		113.80	1.634.1	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 65.4						
9	CC 92098232	ZABALETA RAMIREZ TULIO MANUEL	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230301-PORVENIR	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	EPS037-NUEVA EPS	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90		121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					
10	CC 92530749	BELTRAN MARTINEZ EDUT ANTONIO	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																			230201-PROTECCION	3	1.750.90	\$ 280.20	\$	\$	\$	\$	Norm	\$ 280.20	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	3	1.750.90	\$ 70.1	\$	\$ 70.1	14-11 - ARL SUR	1.750.90	0000001	121.90	1.750.9	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.1					

TOTAL PAGADO:	\$ 4.842.900
----------------------	---------------------

Medellín, 02 de March de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C6809830	RAMOS RICO JULIAN	03/03/2026		29203N17	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/03/2026 15:30:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.65.60, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1102798078	PORTILLO PATERNINA EVER JOSE	08/04/2026		h2351682	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 11:55:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1103116687	TOVAR MERCADO JHAN CARLOS	08/04/2026		44'20013	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 12:04:25 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C92640604	RAMOS CAUSIL OSCAR DOMINGO	08/04/2026		EeoTn155	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 14:42:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C92535372	RODELO CORTES WILSON JAVIER	08/04/2026		G232K201	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 12:07:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57



**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 002 – EXAMENES DE INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 03/03/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: JULIAN RAMOS RICO

Cedula: 6.809.830

Cargo u Ocupación: PLOMERO

Edad: 75 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charlas Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:


VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR


CEDULA 6809830

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 

3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: JHAN CARLOS TOVAR MERCADO

Cargo u Ocupación: PINTOR

Cedula: 1.103.116.687

Edad: 30 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charlas Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐

Auditivo ☐

DME ☐

Cardiovascular ☐

Psicosocial ☐

Químico ☐


Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR



CEDULA 1103116687

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

 3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: EVER JOSE PORTILLO PATERNINA

Cargo u Ocupación: PINTOR

Cedula: 1.102.798.078

Edad: 22 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charles Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR



CEDULA 1102798078

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 

3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: OSCAR DOMINGO RAMOS CAUSIL

Cedula: 92.640.604

Cargo u Ocupación: ELECTRICO

Edad: 41 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charlas Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐

Auditivo ☐

DME ☐

Cardiovascular ☐

Psicosocial ☐

Químico ☐


Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR



CEDULA 92640604

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

 3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: WILSON JAVIER RODELO CORTES

Cedula: 92.535.372

Cargo u Ocupación: ELECTRICO

Edad: 48 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charlas Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR Wilson Rodelo Cortes

CEDULA 92535372

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

 3145401155

formato 2025





**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 003 – REGISTRO ENTREGA DE EPP



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Tulio Zabaleta Ramirez	CEDULA	92098-232
CARGO	Oficial	CIUDAD	Sinalya
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICION	
guantes	1	27/03/2026		x	Tulio Zabaleta
tapabocas	1	01/04/2026		x	Tulio Zabaleta
gafas	1	06/04/2026		x	Tulio Zabaleta
Tapabocas	1	06/04/2026		x	Tulio Zabaleta
Tapabocas	1	07/04/2026		x	Tulio Zabaleta
botas	1	20/04/26	x		Tulio Zabaleta

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Geney	CEDULA No.	1-102-875 508
CARGO	Sio	FIRMA	Geney

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 68; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Tulio Zabaleta

CEDULA No: 92098232



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jairo Andrés Tamara Hernández	CEDULA	1005605323
CARGO	Oficio Varico	CIUDAD	Sanceleso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	X

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco -batajeo	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Gafas de protección	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Mascarilla	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Gafas de protección	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Prot. Auditiva	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Botas	2	12-12-25	X		Jairo Tamara
Prot. Lumbal	1	24-12-25	X		Jairo Tamara
Gaunters	1	06-01-26	X		Jairo Tamara
Casaca de U.	1	10-01-26	X		Jairo Tamara
Tapaboca	1	28/03/26		X	Jairo Tamara
guantes	1	30/03/26		X	Jairo Tamara
tapabocas	1	13/04/26		X	Jairo Tamara
gafas	1	13/04/26		X	Jairo Tamara

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Cenny Selgado	CEDULA No.	1.102875308
CARGO	Sio	FIRMA	Cenny

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEY EL COMPROMISO:

Jairo Andrés Tamara Hernández

CEDULA No: 1005. 605. 323



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jose Andres Alvarez Ochoa	CEDULA	x110373 89 86
CARGO	ayudante	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICION	
2 busos	1	06-01-26	x		Jose
cascos	1	06-01-26	x		Jose
Guanteras	1	06-01-26	x		Jose
Prot. auditiva	1	06-01-26	x		Jose
Gafas claras	1	06-01-26	x		Jose
Pantalón	2	06/01/26	x		Jose
Tapaboca	1	09/01/26	x		Jose
Guanter. de v.	1	10/01/26	x		Jose
tapabocas	1	13/04/26	x		Jose
Botas	1	20/04/26	x		Jose

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Genaro Selgado	CEDULA No.	1-102875308
CARGO	Siso	FIRMA	Genaro

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

x Jose

CEDULA No: x770373082

		ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION		REGISTRO	
				VERSION 1 15/06/2025	
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION					
NOMBRE	* Nilson Alfaro Causado		CEDULA	* 1005570944	
CARGO	ayudante.		CIUDAD	Sincelajó	
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		
ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL					
DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casaca	1	03/01/2026	X		✓ Javier
Gafas	1	03/01/2026	X		✓ Javier
Tapaoídos	1	03/01/2026	X		✓ Javier
guntas.	1	03/01/2026	X		✓ Javier
Pantalón	2	06/01/2026	X		✓ Javier
Mascarilla	1	11/01/2026	X		✓ Javier
guantes	1	12/01/2026		X	✓ Javier
Tapabocas	1	12/01/2026		X	Javier
guantes	1	02/04/2026		X	Javier
tapabocas	1	13/04/2026		X	Javier
tapabocas	1	16/04/2026		X	JAVIER
Botas	1	20/04/26	X		✓ Javier
guantes	1	24/04/26		X	✓ Javier
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION					
NOMBRE	Cecilia Selgado		CEDULA No.	1.102875308	
CARGO	SISO		FIRMA	Cecilia	
COMPROMISO					
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.					
Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa					
El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.					
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:					
* Nilson Javier Alfaro Causado					
CEDULA No: * 1005570944					



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Luis Alberto Bantel C.	CEDULA	1102815673
CARGO	ayudante.	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco Barbo	1	03/01/2026	✓		
guantes de vaqueta	1	03/01/2026	✓		
Mascarilla	1	03/01/2026	✓		
gafas clavo	1	03/01/2026	✓		
protector auditivo	1	03/01/2026	✓		
bustos	2	03/01/2026	✓		
pantalón	2	06/01/2026	✓		
tapabocas	1	14/04/2026		✓	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Clemmy Selgado	CEDULA No.	1102815308
CARGO	SISD	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1102815673



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jhan Carlos Tovar	CEDULA	1103116687
CARGO	Ayudante	CIUDAD	Sinicelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Gafas	1	14/04/26	y		Jhan T.
Tapaboca	1	14/04/26	y		Jhan T.
Gafas	1	21/04/26		x	Jhan T.
Tapaboca	1	23/04/26		x	Jhan T.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Cecily Selgado	CEDULA No.	1102875308
CARGO	SISO	FIRMA	Cecily

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

X Jhan T.

CEDULA No: 1103116687



**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**


NIT. 902.012.110 - 6


ANEXO 004 – CAPACITACIONES




Pausas Activas

Official





[Handwritten signature]



oficios vanu, Jose Andres Alvarez



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026**



SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL



**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

INFORME 003 GESTION AMBIENTAL PMA

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como finalidad “ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE. INCLUYE CUBIERTA CCTV PISO 2 Y CAMBIO DE VENTANAS DE PISO 3 DE LA TORRE AB.”.

LOCALIZACIÓN DE SINCELEJO


El municipio de Sincelejo, lugar en el que se desarrollan las “ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE. INCLUYE CUBIERTA CCTV PISO 2 Y CAMBIO DE VENTANAS DE PISO 3 DE LA TORRE AB.”, La ciudad de Sincelejo, se encuentra ubicada al noroeste del país de 9° 18' 17" latitud norte, 75° 23" latitud oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una extensión total de 28.134 a, con una altura sobre el nivel del mar de 213 msnm y limita al sur con el municipio de Sampedra y con el departamento de Córdoba; por el oeste con los municipios de Palmito y Tolú; por el norte con los municipios de Tolú y Toluvié y por el este con los municipios de Corozal y Morroa, a unos 360km de Medellín, 286km de Barranquilla, 180 km de Cartagena y 550 km de Bogotá la capital de la república de Colombia

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6

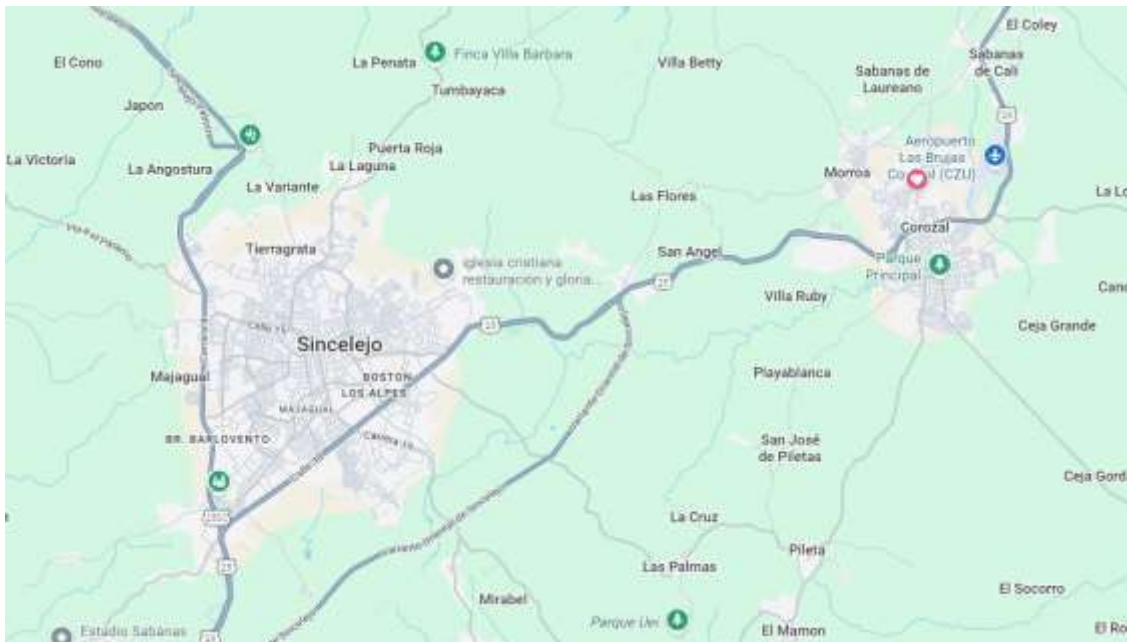

ILUSTRACION DE LA LOCALIZACION DE SINCELEJO

FUENTE: https://www.google.com/maps/@9.3086508,-75.3565072,13z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOC4wIjKXMDSOASAFQAw%3D%3D

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El complejo judicial del municipio de Sincelejo se encuentra en la ilustración 2, en el centro de la ciudad, exactamente sobre la calle 22 con carrera 16 y 17


DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6

Ilustración 1 Localización Complejo Judicial Sincelejo

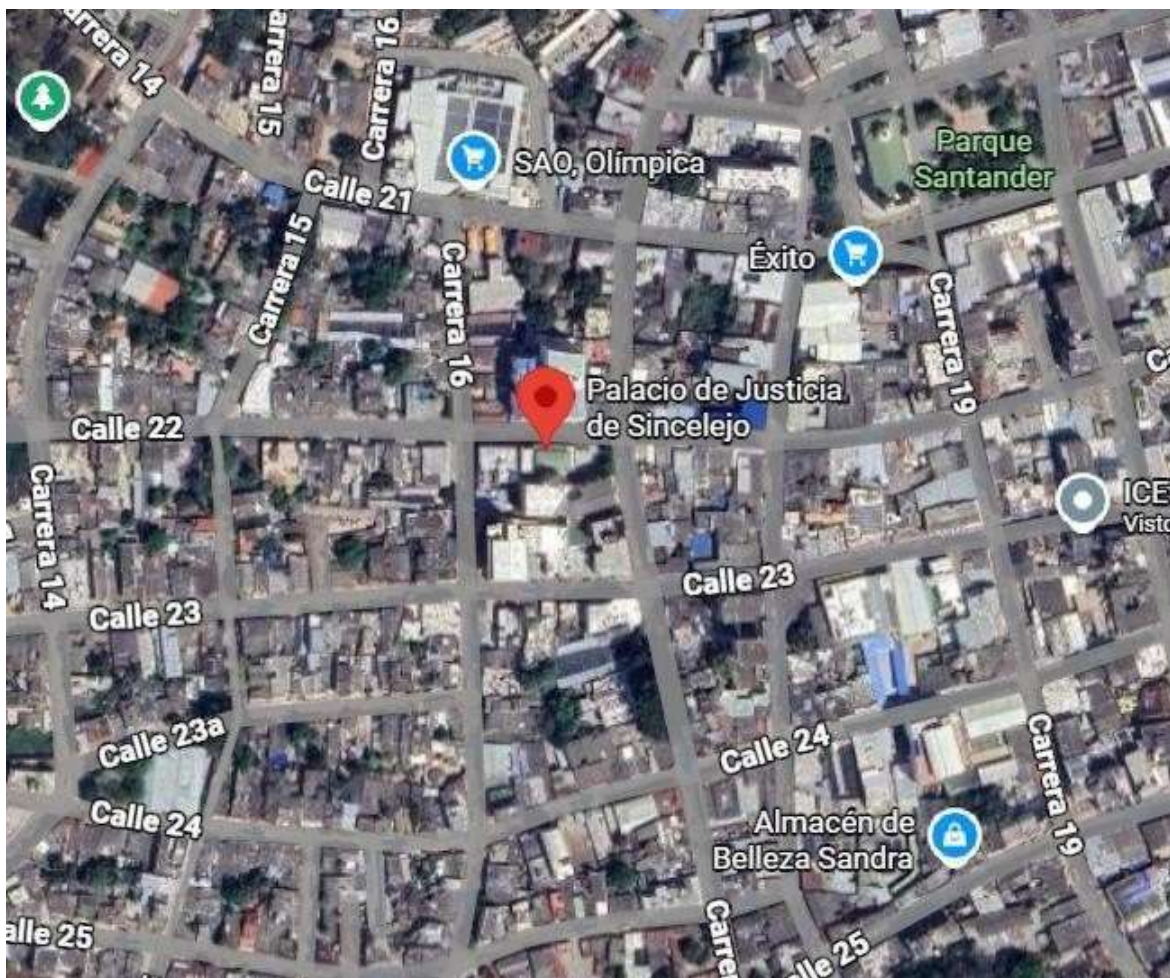

ILUSTRACION DE LA LOZALIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

FUENTE:

https://www.google.com/maps/place/Palacio+de+Justicia+de+Sincelejo/@9.301571,-75.3991355,859m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e59144ed5662205:0xd0efe8929a208f38!8m2!3d9.301571!4d-75.3965606!16s%2Fg%2F11cs24q6gm?entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MTIwOC4wKXMDSo

Ilustración 3 Localización Complejo Judicial Corozal

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6

IMPLEMENTACION DEL PMA

ACTIVIDADES EJECUTAS

CAPACITACION Y CONCIENCIACION AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DE LA OBRA DAGA

Se da cumplimiento a los lineamientos de SST, asegurando que todo el personal, en el desarrollo de sus labores, haga uso adecuado de los elementos de protección personal. Asimismo, se anexa la documentación correspondiente que evidencia la afiliación al sistema de seguridad social.



MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PAC 2.1 - 04

Se realiza el respectivo aseo durante la ejecución de las actividades de demoliciones y desmonte garantizando un sitio de acopio temporal hasta su disposición final. Se programan espacios para la recolección de RCD y disposición final con la empresa gestora INTERASEO.

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6



SEÑALETICA FRENTE DE OBRA Y ALMACENAMIENTOS TEMPORALES PAC 2.2 - 05

Durante este periodo, se implementó la debida señalización y seguridad en la obra para prevenir accidentes, especialmente en la demarcación de espacios de trabajo teniendo en las actividades ejecutadas durante la intervención para contribuir a la condición segura del área de trabajo.

- Demarcación de zonas de acopio de escombros para posterior disposición final.

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



CONSORCIO PISO 3 CCTV

NIT. 902.012.110 - 6



Harán Zapatero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PISO 3 CCTV

DIRECCIÓN: CALLE 24 # 31 – 29 B. FLORENCIA



**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 001 – SEGURIDAD SOCIAL



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					902012110				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					CONSORCIO PISO 3 CCTV					SUCRE					2788237				
CIUDAD/MUNICIPIO:					SINCELEJO					DEPARTAMENTO:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
DIRECCIÓN:					CALLE 24 #31 29					TELÉFONO:					Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:									
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:									
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI									

NÚMERO PLANILLA:										6010704561									
PERIODO COTIZACIÓN OTROS										MES									
DÍAS DE MORA:										marzo AÑO									
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):										2026									
										2									
										2026/04/09									
										NÚMERO AUTORIZACIÓN:									
										210347990									

E-EMPLEADOS										2026									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR	7	\$ 1.961.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 0	\$ 1.961.400	\$ 2.700		\$ 1.964.100	
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 411.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 411.000	\$ 600		\$ 411.600	
SUBTOTALES:										\$ 2.372.400	\$ 3.300		\$ 2.375.700	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 70.100	\$ 100	\$ 0	\$ 70.200	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.300	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 238.300	\$ 400	\$ 0	\$ 238.700	
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 70.100	\$ 100	\$ 0	\$ 70.200	
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 140.200	\$ 200	\$ 0	\$ 140.400	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 140.200	\$ 200	\$ 0	\$ 140.400	
SUBTOTALES:												\$ 658.900	\$ 1.000	\$ 0	\$ 659.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA			10		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.145.900	\$ 1.145.900	\$ 1.600	\$ 0	\$ 1.147.500
SUBTOTALES:											\$ 1.145.900	\$ 1.600	\$ 0	\$ 1.147.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	10	\$ 658.900	\$ 900	\$ 659.800	
SUBTOTALES:			\$ 658.900	\$ 900	\$ 659.800	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINED
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 1005568360	ALVAREZ MARQUEZ RIBALDO JOSE	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI		14																230201-PROTECCION	14	\$ 817.080	\$ 130.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 130.800	EPS002-SALUD TOTAL	14	\$ 817.080	\$ 32.700	\$ 0	\$ 32.700	14-11 - ARL SURA	14	\$ 817.080	00001	\$ 56.900	14	\$ 817.080	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 32.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1005570944	ALFARO CAUSADO NILSON JAVIER	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1005605323	TAMARA HERNANDEZ JAIRO ANDRES	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	00001	121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1102815673	BERTEL CHARRASQUEL LUIS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1102875308	SALGADO MONTOYA GENNY LUZ	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1103738966	ALVAREZ OSORIO JOSE ANDRES	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 43640716	FLOREZ CARMONA JINES MARIA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 6809830	RAMOS RICO JULIAN	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	\$ 1.750.905	FUJO			SI	03																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	20	\$ 1.634.170	\$ 65.400	\$ 0	\$ 65.400	14-11 - ARL SURA	20	\$ 1.634.170		113.800	20	\$ 1.634.170	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC 92098232	ZABALETA RAMIREZ TULIO MANUEL	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 92530749	BELTRAN MARTINEZ EDUT ANTONIO	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Norma	\$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	0000001	121.900	30	\$ 1.750.905	CCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Medellín, 02 de March de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C6809830	RAMOS RICO JULIAN	03/03/2026		29203N17	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/03/2026 15:30:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.65.60, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C92535372	RODELO CORTES WILSON JAVIER	08/04/2026		G232K201	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 12:07:58 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1103116687	TOVAR MERCADO JHAN CARLOS	08/04/2026		44*20013	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 12:04:25 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1102798078	PORTILLO PATERNINA EVER JOSE	08/04/2026		h2351682	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 11:55:07 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57

Medellín, 07 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PISO 3 CCTV.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C92640604	RAMOS CAUSIL OSCAR DOMINGO	08/04/2026		EeoTn155	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2026 14:42:59 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.114.246, 192.230.104.13, 172.16.42.57



**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 002 – EXAMENES DE INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 03/03/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: JULIAN RAMOS RICO

Cedula: 6.809.830

Cargo u Ocupación: PLOMERO

Edad: 75 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charles Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐

Auditivo ☐

DME ☐

Cardiovascular ☐


Psicosocial ☐

Químico ☐


Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR


CEDULA 6809830

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

 3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: JHAN CARLOS TOVAR MERCADO

Cargo u Ocupación: PINTOR

Cedula: 1.103.116.687

Edad: 30 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charles Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐


Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:


VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
Médico Especialista Salud Ocupacional
Lic. 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR



CEDULA 1103116687

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

 3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: OSCAR DOMINGO RAMOS CAUSIL

Cedula: 92.640.604

Cargo u Ocupación: ELECTRICO

Edad: 41 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charlas Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐

Auditivo ☐

DME ☐

Cardiovascular ☐


Psicosocial ☐

Químico ☐


Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
Especialista en Medicina Ocupacional
Lic. 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR



CEDULA 92640604

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

 3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: EVER JOSE PORTILLO PATERNINA

Cargo u Ocupación: PINTOR

Cedula: 1.102.798.078

Edad: 22 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charlas Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐

Auditivo ☐

DME ☐

Cardiovascular ☐


Psicosocial ☐

Químico ☐


Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control


Arnoldo Cerra Barreto
Especialista en Medicina Ocupacional
Lic. 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR



CEDULA 1102798078

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

 arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

 3145401155

formato 2025



CONCEPTO MEDICO LABORAL



CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400

Fecha: 08/04/2026 Elaborado: Sincelejo

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: ☒ Post Incapacidad: ☐

Periódico: ☐

Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: ☒

Empresa Solicitante: CONSORCIO PISO 3 CCTV

Nombres: WILSON JAVIER RODELO CORTES

Cedula: 92.535.372

Cargo u Ocupación: ELECTRICO

Edad: 48 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: ☒

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: ☒

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐

Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐

SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☒ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐

NO Aplica: ☒

Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

Control periódico PYP por EPS: ☐

Remisión EPS por patología: ☐

Remisión a ARL para manejo de caso: ☐

Continuar tratamiento médico: ☐

Control médico Prioritarios EPS: ☐

Seguimiento caso ARL: ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

Control periódico ocupacional: ☐

Higiene Postural: ☒

Utilización de EPP: ☒

Utilización de ayudas ergonómicas: ☐

Charles Manejo de cargas: X

Calificación de origen de patología: ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

Alimentación saludable: ☒

Ejercicios 3 veces/ semana: ☒

Dejar de fumar: ☐

Pausas activas: ☒

Reducir consumo de alcohol: ☐

Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐

Auditivo ☐

DME ☐

Cardiovascular ☐

Psicosocial ☐

Químico ☐

Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico, control

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Exámenes Salud Ocupacional
LICENCIADO EN SALUD
A.S. 7070801400

Arnoldo Cerra Barreto
ELECTRONICA
253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR

Wilson Rodelo Cortes

CEDULA 92535372

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para los fines legales pertinentes. Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

✉ arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com;

3145401155

formato 2025





**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 003 – REGISTRO ENTREGA EPP



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Tulio Zabaleta Ramirez	CEDULA	92098-232
CARGO	Oficial	CIUDAD	Sinaloa
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICION	
guantes	1	27/03/2026		x	Tulio Zabaleta
tapabocas	1	01/04/2026		x	Tulio Zabaleta
gafas	1	06/04/2026		x	Tulio Zabaleta
Tapabocas	1	06/04/2026		x	Tulio Zabaleta
Tapabocas	1	07/04/2026		x	Tulio Zabaleta
botas	1	20/04/26	x		Tulio Zabaleta

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Genef	CEDULA No.	1-02-875 508
CARGO	Sio	FIRMA	Genef

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 55 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 68; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Tulio Zabaleta

CEDULA No: 92098232

CONSORCIO GESTIONAR							
ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION							
REGISTRO VERSION 1 01/09/2025							
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION							
NOMBRE	Edut Beltran Martinez				CEDULA	92530749	
CARGO	oficial				CIUDAD	Sincelayo	
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA			PLANTA			
ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL							
DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR		
			ENTREGA	REPOSICIÓN			
casco	1	27/03/26	x		Edu B.		
bucantes	1	29/03/26	y		-Edu B		
gafas	L	07/04/26	x		Edu B.		
gafas	L	17/04/26		x	Edu		
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION							
NOMBRE	Penny Salgado				CEDULA No.	1-102875-308	
CARGO	Sigro				FIRMA	Penny.	
COMPROMISO							
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos.							
Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. E presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa							
El presente compromiso aplica para la Dotación personal entregada.							
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:							
x Edu Beltran							
CEDULA No: 92530749.							



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jairo Andrés Tamara Hernández	CEDULA	1005605323
CARGO	Oficio Varico	CIUDAD	Sancelego
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	X

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco -buzayo	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Gorros -buzo	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Mascarilla	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Gafas Clares	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Prot. Auditivo	1	12-12-25	X		Jairo Tamara
Botas	2	12-12-25	X		Jairo Tamara
Prot. Lumbas	1	24-12-25	X		Jairo Tamara
Guantas	1	06-01-26	X		Jairo Tamara
Cascos de U.	1	10-01-26	X		Jairo Tamara
Tapaboca	1	28/03/26		X	Jairo Tamara
guantes	1	30/03/26		X	Jairo Tamara
tapabocas	1	13/04/26		X	Jairo Tamara
gafas	1	13/04/26		X	Jairo Tamara

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Geny Selgado	CEDULA No.	1.102875308
CARGO	Sio	FIRMA	Geny

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEY EL COMPROMISO:

Jairo Andrés Tamara Hernández

CEDULA No: 1005. 605. 323



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jose Andres Alvarez Ochoa	CEDULA	x110373 89 86
CARGO	ayudante	CIUDAD	Sincalejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICION	
2 busos	1	06-01-26	x		Jose
cascos	1	06-01-26	x		Jose
Guantitas	1	06-01-26	x		Jose
Prot. auditiva	1	06-01-26	x		Jose
Gafas claras	1	06-01-26	x		Jose
Pantalón	2	06/01/26	x		Jose
Tapaboca	1	09/01/26	x		Jose
Guantes de v.	1	10/01/26	x		Jose
Tapabocas	1	13/04/26	x		Jose
Botas	1	20/04/26	x		Jose

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Genaro Selgado	CEDULA No.	1-102875308
CARGO	Siso	FIRMA	Genaro

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

x Jose

CEDULA No: 770373082

		ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION		REGISTRO	
				VERSION 1 15/06/2025	
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION					
NOMBRE	* Nilson Alfaro Causado		CEDULA	* 1005570944	
CARGO	ayudante.		CIUDAD	Sincelajó	
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		
ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL					
DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICION	
Casaca	1	03/01/2026	X		✓ Javier
Gafas	1	03/01/2026	X		✓ Javier
Tapaoídos	1	03/01/2026	X		* Javier
guntas.	1	03/01/2026	X		✓ Javier
Pantalón	2	06/01/2026	X		✓ Javier
Mascarilla	1	11/01/2026	X		✓ Javier
guantes	1	12/01/2026		X	✓ Javier
Tapabocas	1	12/01/2026		X	Javier
guantes	1	02/04/2026		X	Javier
tapabocas	1	13/04/2026		X	Javier
tapabocas	1	16/04/2026		X	JAVIER
Botas	1	20/04/26	X		* Javier
guantes	1	24/04/26		X	✓ Javier
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION					
NOMBRE	Cecilia Selgado		CEDULA No.	1.102875308	
CARGO	SISO		FIRMA	Cecilia	
COMPROMISO					
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.					
Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa					
El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.					
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:					
* Nilson Javier Alfaro Causado					
CEDULA No: * 1005570944					



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Luis Alberto Bantel C.	CEDULA	1102815673
CARGO	ayudante.	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco Carb.	1	03/01/2026	✓		
guantes de vaqueta	1	03/01/2026	✓		
Mosconilla	1	03/01/2026	✓		
gafas clares	1	03/01/2026	✓		
protector auditivo	1	03/01/2026	✓		
bustos	2	03/01/2026	✓		
pantalón	2	06/01/2026	✓		
tapabocas	1	14/04/2026		✓	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Clemmy Selgado	CEDULA No.	1102825308
CARGO	Siso	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1102815673



ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO

VERSION 1
15/06/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jhan Carlos tovar	CEDULA	1103116687
CARGO	Ayudante	CIUDAD	Sinicelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
gafas	1	14/04/26	y		Jhan T.
Tapaboca	1	14/04/26	y		Jhan T.
gafas	1	21/04/26		x	Jhan T.
Tapaboca	1	23/04/26		x	Jhan T.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Cecily Selgado	CEDULA No.	1102875308
CARGO	SISO	FIRMA	Cecily

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

X Jhan T.

CEDULA No: 1103116687




**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 004


CAPACITACIONES



Pausas Activas

Julio 2



[illegible]





**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 005 CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL

INTERASEO S.A.S E.S.P



CERTIFICA

Que a la empresa **CONSORCIO PISO 3 CCTV** con Nit 902.012.110-6, se le presento el servicio especial de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos RCD del Proyecto u Obra **“Adecuaciones locativas en el piso 3 de la torre AB del palacio de Justicia de Sincelejo para el acondicionamiento y funcionamiento integral de todas las áreas de la Dirección Seccional y Administración Judicial de Sincelejo Sucre. Incluye Cubierta CCTV piso 2 y cambio de ventanas de piso 3 de la torre AB.”** Ubicados en el municipio de Sincelejo como se relaciona a continuación:


FECHA	M3
28/03/2026	14

Los residuos recogidos por nuestra empresa son dispuestos en el Relleno Sanitario “El Oasis” de la ciudad de Sincelejo, el cual cuenta con licencia ambiental No 0444 de 2001, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE.



Este certificado se expide a solicitud del usuario.

Para Constancia se firma en Sincelejo el día 31 de Marzo de 2026.

Atentamente,


ANNY GÓMEZ ARAUJO
Directora Regional Mercado Regulado
INTERASEO S.A.S E.S.P

📍 Carrera 38 No. 10-36 oficina 907 Edificio Milenio
☎ Teléfono: (574) 325 99 70 Medellín, Colombia
🌐 www.interaseo.com.co



INTERASEO S.A.S E.S.P



CERTIFICA

Que a la empresa **CONSORCIO PISO 3 CCTV** con Nit 902.012.110-6, se le presento el servicio especial de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos RCD del Proyecto u Obra **“Adecuaciones locativas en el piso 3 de la torre AB del palacio de Justicia de Sincelejo para el acondicionamiento y funcionamiento integral de todas las áreas de la Dirección Seccional y Administración Judicial de Sincelejo Sucre. Incluye Cubierta CCTV piso 2 y cambio de ventanas de piso 3 de la torre AB.”** Ubicados en el municipio de Sincelejo como se relaciona a continuación:


FECHA	M3
11/04/2026	7
23/04/2026	7

Los residuos recogidos por nuestra empresa son dispuestos en el Relleno Sanitario “El Oasis” de la ciudad de Sincelejo, el cual cuenta con licencia ambiental No 0444 de 2001, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE.


Este certificado se expide a solicitud del usuario.

Para Constancia se firma en Sincelejo el día 24 de Abril de 2026.


Atentamente,


ANNY GOMEZ ARAUJO
Directora Regional Mercado Regulado
INTERASEO S.A.S E.S.P

📍 Carrera 38 No. 10-35 oficina 907 Edificio Milenio
☎ Teléfono: (574) 325 99 70 Medellín, Colombia
🌐 www.interaseo.com.co



Empresa
comprometida
Latinoamérica





**CONSORCIO
PISO 3 CCTV**

NIT. 902.012.110 - 6

ANEXO 006

CERTIFICADOS DE

FICHAS TECNICAS



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

1. Identificación del Producto

1.1. Identificador SGA del producto:

Limpia Max PAVCO

1.2. Otros medios de identificación:

Referencia: 300154

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones:

Limpiador para superficies de PVC
Limpiador para superficies de tubos y accesorios que requieran de soldadura líquida Pavco.

1.4. Datos sobre el proveedor:

Mexichem Colombia S.A.S
(Pavco Wavin)
Dirección: Autopista sur # 71 - 75. Bogotá D.C.
(Colombia)
Teléfono: +(57-1) 782 5000
Telefax: +(57-1) 7825020

1.5. Números de teléfono para emergencias:

CISPROQUIM:
018000916012/2886012
CISTEMA:
018000511414

2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación SGA de la sustancia/mezcla:

De acuerdo con el Decreto 1496 del 2018, y Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos - sexta versión revisada (2015)

- **Peligros Físicos:** Líquido inflamable, categoría 2
- **Peligros para la Salud:** Toxicidad aguda oral, categoría 4
Lesiones oculares graves/ irritación ocular, categoría 2A
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única), categoría 3 - sistema respiratorio
Carcinogenicidad, categoría 2
- **Peligros para el Ambiente:** No clasificado

	Ficha de Datos de Seguridad	Código FDS-02
	Limpia Max PAVCO	Versión 3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

2.2. Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia



- Palabra de Advertencia:**

PELIGRO

- Indicaciones de Peligro:**

H225 Líquidos y vapores muy inflamables
H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
H351 Susceptible de provocar cáncer

- Consejos de Prudencia:**

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer la etiqueta antes del uso
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P223 Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor
P241 Utilizar material (Eléctrico/ de ventilación/iluminación) antideflagrante.
P261 Evitar respirar polvos / humos/ gases/ nieblas/ aerosoles
P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado
P280 Usar equipo de protección para los ojos/ la cara
P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

P337+P313 Si la irritación persiste, consultar a un médico.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.

P330 Enjuagarse la boca

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse)

P370+P378 En caso de incendio: utilizar químico seco, espuma, CO2 para la extinción.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave

P501 Eliminar el contenido/ recipiente con un gestor autorizado.

2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificación:

Ninguno reportado

3. Composición / información sobre los componentes

Mezclas

Nombre sustancia	Número CAS	% composición
Acetato de Etilo	141-78-6	85 - 95%
THF _ Tetrahidrofurano	109-99-9	5 - 15%

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Inhalación:

Remover la persona expuesta hacia el aire libre y si es necesario aplicar inmediatamente respiración artificial. Llamar inmediatamente al médico

- Contacto cutáneo

Rápidamente quitar la ropa contaminada. Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón.

- Contacto ocular

No permitir que la víctima cierre o se restrigie los ojos, levantar suavemente los párpados y enjuagar con abundante cantidad de agua. Consultar inmediatamente al médico.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

- **Ingestión**

Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones, si se ingirió y la persona esta consiente hacer ingerir uno o dos vasos de agua o leche, no inducir al vomito. Brindar atención médica.

4.2. Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados:

Efectos irritantes, parálisis respiratoria, somnolencia, narcosis, náusea, vómitos, dolor de cabeza, sueño, salivación, vértigo.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento

Tras ingestión de grandes cantidades: lavado de estómago.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados (o no apropiados):

Usar agentes químicos secos, espuma de alcohol, anhídrido carbónico y niebla de agua. No usar chorro de agua ya que el mismo puede dispersar y extender el incendio. El uso de agua no es efectivo ya que no enfría el producto por debajo del punto de inflamación. Para incendios chicos usar agentes químicos secos y anhídrido carbónico, para incendios grandes usar espuma De alcohol y niebla de agua

5.2. Peligros específicos del producto químico:

Tiene riesgo alto de incendio y moderado riesgo de explosión, los vapores forman mezclas explosivas o inflamables con aire a Temperatura ambiente. Los vapores son más pesados que el aire y pueden movilizarse hacia la fuente de ignición y luego retroceder. Mantenerse alejado de las zonas bajas. Controlar el líquido proveniente de la lucha contra el fuego, impidiendo que Vaya a desagües o cursos de agua.

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio:

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia:

Usar protección respiratoria, guantes. Evitar contacto directo con la piel. Eliminar toda fuente de ignición, ventilar el área con la máxima protección contra explosión

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga al ambiente debe ser evitada.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Absorber pequeños derrames con papel o vermiculita. Contener los derrames grandes y si es posible absorberlos con arena o vermiculita. Colocar el residuo en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas. Impedir que el derrame llegue a drenajes y fuentes de agua. El residuo puede ser incinerado de acuerdo con la reglamentación local

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

No fumar en el área cuando se está manipulando el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

Los recipientes deben estar conectados a tierra cuando se hace el llenado para evitar el riesgo de chispas por estática. Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de áreas de peligro agudo de incendio. Es preferible el almacenamiento exterior o separado. Mantener los niveles de concentración en áreas confinadas por debajo del 25% del LFL. El producto debe estar envasado en recipientes herméticos. Evitar contacto con fuentes de ignición y materiales incompatibles como los agentes oxidantes fuertes (ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, etc.)



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

8. Controles de exposición / protección personal

8.1. Parámetros de control:

TLV ACGIH - 2022

TWA 400 ppm (Acetato de etilo)

TWA 50 ppm (THF)

STEL 100 ppm (THF)

8.2. Controles técnicos apropiados:

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP):

- **Inhalación:**

Necesaria en presencia de vapores/ aerosoles de acuerdo con la evaluación de exposición. Tipo de filtro recomendado: Vapores orgánicos

- **Protección manos / piel**

Guantes de seguridad

Material del guante: goma butílica

Espesor del guante: 0,7 mm

Tiempo de penetración: >120 min

- **Protección ojos:**

Gafas de seguridad

- **Otros:**

Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama.

9. Propiedades físico químicas

Estado físico:

Líquido

Color:

Claro

Olor:

Olor característico a fruta

Punto de fusión/ punto de congelación:

-83°C

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:

65°C - 66°C a 1-013 hPa

Inflamabilidad:

Líquido inflamable

Límites inferior y superior de explosión /límites de inflamabilidad:

1,5 % (v/v) - 12,4% (v/v)

Punto de inflamación:

-4°C



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Temperatura de ignición espontánea:	460 °C
Temperatura de descomposición:	No disponible
PH:	No disponible
Viscosidad cinemática:	0,44 mPa.s a 20 °C
Solubilidad:	En agua 85,3 g/l a 20 °C
Coeficiente de reparto n-octanol / agua (valor logarítmico):	Log Pow: 0,73 (experimentalmente). No es de esperar una bioacumulación
Presión de vapor:	97 hPa a 20 °C
Densidad y/o densidad relativa:	0,90 a 20 °C
Densidad relativa de vapor:	3,04
Características de las partículas:	No disponible

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad:	No es reactivo fuerte. En presencia de agua puede hidrolizar lentamente a etanol y ácido acético. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
10.2. Estabilidad química:	Estable a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de manipuleo y almacenamiento
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:	Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con: Reacciona exotérmica con: Flúor, ácido clorosulfónico, agentes oxidantes fuertes, óleum / ácido sulfúrico. Riesgo de explosión con: Hidruro de aluminio y litio, metales alcalinos, hidruros, metales alcalinotérreos. Posibles reacciones violentas con: Ácidos y bases fuertes
10.4. Condiciones que deben evitarse:	Evitar la exposición directa de fuentes de calor y agentes incompatibles.
10.5. Materiales incompatibles:	Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes. Plásticos diversos
10.6. Productos de descomposición peligrosos:	Por descomposición térmica: Óxidos de carbono



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

11. Información toxicológica

11.1. Toxicidad aguda:

DL50 rata, oral: 5.620 mg/kg (acetato de etilo)
DL50 rata, oral: 1.650 mg/kg (THF)
DL50 conejo >18.000 mg/kg (acetato de etilo)
CL50 rata, inhalación: 53,9 mg/l; 4 h (IUCLID) (THF)

11.2. Corrosión / irritación cutánea:

Conejo: no irrita la piel (acetato de etilo)
Conejo: irritaciones (THF)
Una exposición repetida y prolongada puede causar irritación de la piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto.

11.3. Lesiones oculares graves/ irritación ocular:

Provoca irritación ocular grave

11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea:

Prueba de Maximización (GPMT) conejillo de india.
Resultado: negativo.
Método: Directrices de ensayo 406 del OECD
En caso de efecto prolongado del producto químico:
Posible sensibilización en personas predispuestas.

11.5. Mutagenicidad en células germinales:

Genotoxicidad in vitro
Prueba de Ames
Salmonella typhimurium
Resultado: negativo
Método: OECD TG 471
Mutagenicidad (ensayo de células de mamífero):
ensayo de aberración cromosómica.
Resultado: negativo

11.6. Carcinogenicidad:

Tetrahidrofurano: Grupo 2B según la IARC
(publicación 132 del 2022)

11.7. Toxicidad para la reproducción:

Esta información no está disponible.

11.8. Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única:

Órgano diana: sistema nervioso central.
Puede provocar somnolencia o vértigo

11.9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas:

No disponible

11.10. Peligro por aspiración:

Esta información no está disponible



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

11.11 Información sobre posibles vías de exposición:

Piel, inhalación e ingestión

11.12. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

Efectos sistémicos:

Falta de apetito, dolor de cabeza, somnolencia, vértigo.

A concentraciones altas:

Salivación, náuseas, vómitos, narcosis, parálisis respiratoria. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad

Efecto inmediato:

Oral: Existe el riesgo de aspiración al vomitar.

Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía, irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago - intestinal

Inhalación: Irritación de las mucosas

11.13. Otra información:

No disponible

12. Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Acetato de etilo:

Toxicidad para los peces

CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 230 mg/l; 96h (IUCLID)

Toxicidad para las daftnias y otros invertebrados acuáticos

CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 717 mg/l; 48 h (IUCLID)

Toxicidad para las algas

IC50 Desmodemus subspicatus (alga verde): 3.300 mg/l; 48 h (IUCLID)

Toxicidad para las bacterias

EC10 Pseudomonas putida: 2.900 mg/l; 16 h (IUCLID)

THF

Toxicidad para los peces

CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 2.160 mg/l; 96 h (en agua blanda) (IUCLID)



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

	Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 382 mg/l; 24 h (IUCLID) Toxicidad para las algas IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 3.700 mg/l; 8 d (concentración tóxica límite) (IUCLID) Toxicidad para las bacterias EC5 Pseudomonas putida: 580 mg/l; 16 h (concentración tóxica límite) (IUCLID) <u>Acetato de etilo</u> Biodegradabilidad 100%; 28 d OECD TG 301D Fácilmente biodegradable Demanda teórica de oxígeno (DTO) 1.820 mg/g (literatura) <u>THF</u> Biodegradabilidad 39 %; 28 d OECD TG 301D No es fácilmente biodegradable. Coefficiente de reparto n-octanol/agua Log Pow: 0,73 (experimentalmente) (literatura) No es de esperar una bioacumulación.
12.2. Persistencia y degradabilidad:	
12.3. Potencial de bioacumulación:	
12.4. movilidad en el suelo:	No hay información disponible
12.5. Otros efectos adversos:	La descarga en el ambiente debe ser evitada

13. Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación:

Producto

- Su eliminación se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

- Le rogamos contacte con la entidad adecuada en cada caso (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Empresa de acueducto y alcantarillado o bien empresas especializadas en la eliminación de residuos debidamente avaladas por las entidades gubernamentales que las regulan), para recibir la información en cada caso particular.

Envase:

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU	1173
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ACETATO DE ETILO
14.3. Clase(s) relativas al transporte:	3
14.4. Grupo de embalaje / envase, si se aplica:	II
14.5. Riesgos ambientales:	No
14.6. Precauciones especiales para el usuario:	No transportar con alimentos y empaques de alimentos
14.7. Transporte a granel (con arreglo al Anexo II de la convención MARPOL 73/78 y al Código IBC):	No disponible

15. Información sobre la reglamentación

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

nacional.

- Decreto 1079 del 2015, Decreto único del sector transporte el cual ha compilado el Decreto 1609 del 2002 sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
- Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos.
- Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
- Los residuos Peligrosos están considerados en el Decreto 1076 del 2015.
- Decreto 1072 del 2015 Decreto único del sector laboral el cual incluye entre otros el Decreto 1443 del 2014 por el cual se establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Resolución 312 del 2019 por el cual se establecen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de seguridad Salud en el Trabajo

16. Otras informaciones

Glosario:

- ADR:** Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas
- ACGIH:** American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
- IARC:** Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Es una de las tres fuentes que la OSHA refiere para datos de carcinogenicidad de materiales.
- CAS:** Chemical Abstracts Service
- IMDG:** Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
- LEL (lower explosive limit):** Límite inferior de inflamabilidad o explosividad. Concentración mínima del vapor dada en porcentaje, que forma mezcla explosiva con aire.
- MARPOL:** Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques.
- NIOSH:** National Institute for Occupational Safety and Health.
- NTP:** (National Toxicology Program), Programa Nacional de Toxicología. Su actividad es supervisada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos con el recurso del Instituto Nacional de Salud, de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sus siglas en inglés) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC sus siglas en inglés). Su meta es desarrollar pruebas para la regulación de la salud pública para químicos tóxicos, desarrollar los perfiles toxicológicos de los materiales y comunicar estos resultados para que sean usados por otros.
- UEL (upper explosive limit):** Límite superior de inflamabilidad.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-02

Limpia Max PAVCO

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada - 2015 - Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

- **ONU - UN:** Organización de las Naciones Unidas
- **OCDE:** Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
- **OIT:** Organización Internacional del Trabajo
- **OMI:** Organización Marítima Internacional
- **TLV (threshold limit value):** Valor umbral límite. Concentración máxima permitida para exposición de trabajadores. Generalmente se da en partes por millón (ppm) o en mg/m³. Según la ACGIH (organismo norteamericano de Higiene Industrial), existen los siguientes TLVs: TWA, STEL y CEILING. Estos son los adoptados por la legislación colombiana.
- **UNITAR:** Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional e investigaciones

Bases de datos aprobadas por el Ministerio de Trabajo
(Resolución 0773 del 2021)

Bibliografía:

- <https://gestis-database.dguv.de/>
- <https://www.echemportal.org/echemportal/>
- <https://monographs.iarc.who.int/> (Vol 132)
- TLV - BEI de la ACGIH del 2022.

Fecha de elaboración: 22/08/2016

Fecha de revisión: 28/12/2022

Versión: 3

Fecha de impresión: 18/04/2024

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan

— FIN DEL DOCUMENTO —

SECCIÓN 1. Identificación del producto

1.1. Identificador SGA del producto

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

1.2. Otros medios de identificación

Soldadura de PVC / CPVC

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Solución de resina de PVC o CPVC, especialmente formulado para realizar las uniones entre tuberías y accesorios de Policloruro de Vinilo, debe fluir libremente y no contener partículas no disueltas o cualquier materia extraña, que afecte la resistencia final de la unión, o la resistencia química del cemento, no debe mostrar gelificación o separación

Mexichem Colombia S.A.S (Pavco Wavin)

1.4. Datos sobre el proveedor

Bogotá D.C. (Colombia)
Teléfono: +(57-1) 782 5000
Telefax: +(57-1) 7825020
CISPROQUIM:

1.5. Número de teléfono para emergencias

018000916012/2886012
CISTEMA:
018000511414
BRENTAG: +(57-1) 2940420



SECCIÓN 2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Físicos

Líquido inflamable Cat 2

Salud Humana

Toxicidad aguda por ingestión Cat 4

Toxicidad aguda por inhalación Cat 5

Corrosión/ irritación cutáneas Cat 2

Lesiones oculares graves/irritación ocular Cat 2B

Carcinogenicidad Cat 2

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Cat 1 (sistema nervioso central)

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Cat 2 (riñón)

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) ; irritación de las vías respiratorias Cat 3



Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

Toxicidad específica de órganos diana

(exposiciones repetidas) cat 1

Peligro por aspiración Cat 2

Peligro Ambiental

-

2.2. Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

- Palabra de Advertencia**

PELIGRO

H225 Líquidos y vapores muy inflamables

H302 Nocivo en caso de ingestión

H333 Puede ser nocivo si se inhala

H315 Provoca irritación cutánea

H320 Provoca irritación ocular

H370 Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central)

- Indicación de Peligro**

H371 Toxicidad específica de órganos diana (exposición única - riñón)

H335 Puede irritar las vías respiratorias

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

H351 Susceptible de provocar cáncer

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor

P241 Utilizar material (Eléctrico/ de ventilación/iluminación) antideflagrante.

P261 Evitar respirar polvos / humos/ gases/ nieblas/ aerosoles

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P280 Usar equipo de protección para los ojos/ la cara

- Consejos de Prudencia**

P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si la irritación persiste, consultar a un médico.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.

P330 Enjuagarse la boca

P331 NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL(o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse)

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

P370+P378 En caso de incendio: utilizar químico seco, espuma, CO2 para la extinción.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave

P501 Eliminar el contenido/ recipiente con un gestor autorizado.

2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificación

Clasificación y Etiquetado de la sustancia/ mezcla de acuerdo con el Decreto 1496 del 2018, por el cual se adopta el Sistema de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - sexta versión (2015)

SECCIÓN 3. Composición/ información sobre los componentes

Nombre producto	CAS	Composición
Acetona	67-64-1	20% a 40%
THF _ Tetrahidrofurano	109-99-9	60% a 80%

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

- **Inhalación**
- **Contacto con la piel**
- **Contacto con los ojos**
- **Ingestión**

Remover la persona expuesta hacia el aire libre y si es necesario aplicar inmediatamente respiración artificial. Llamar inmediatamente al médico

Rápidamente quitar la ropa contaminada.

Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón.

No permitir que la víctima cierre o se restriegue los ojos, levantar suavemente los párpados y enjuagar con abundante cantidad de agua. Consultar inmediatamente al médico.

Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones, si se ingirió y la persona esta consiente hacer ingerir uno o dos vasos de agua o leche, no inducir al vomito. Brindar atención médica.

Efectos irritantes, parálisis respiratoria, somnolencia, narcosis, náusea, vómitos, dolor de cabeza, sueño, salivación, vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

4.2. Síntomas/ efectos más importantes, agudos o retardados

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento

Tras ingestión de grandes cantidades: lavado de estómago.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

5.1. Medios de extinción apropiados

5.2. Peligros específicos del producto químico

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios.

Usar agentes químicos secos, espuma de alcohol, anhídrido carbónico y niebla de agua. No usar chorro de agua ya que el mismo puede dispersar y extender el incendio. El uso de agua no es efectivo ya que no enfría el producto por debajo del punto de inflamación. Para incendios chicos usar agentes químicos secos y anhídrido carbónico, para incendios grandes usar espuma De alcohol y niebla de agua. Tiene riesgo alto de incendio y moderado riesgo de explosión, los vapores forman mezclas explosivas o inflamables con aire a Temperatura ambiente. Los vapores son más pesados que el aire y pueden moverse hacia la fuente de ignición y luego retroceder. Mantenerse alejado de las zonas bajas. Controlar el líquido proveniente de la lucha contra el fuego, impidiendo que Vaya a desagües o cursos de agua.

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Usar protección respiratoria, guantes. Evitar contacto directo con la piel. Eliminar toda fuente de ignición, ventilar el área con la máxima protección contra explosión. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga al ambiente debe ser evitada.

Absorber pequeños derrames con papel o vermiculita. Contener los derrames grandes y si es posible absorberlos con arena o vermiculita. Colocar el residuo en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas. Impedir que el derrame llegue a drenajes y fuentes de agua.

El residuo puede ser incinerado de acuerdo con la reglamentación local

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

No fumar en el área cuando se está manipulando el producto.

Agítese antes de usar. Use el cemento solvente PVC ó CPVC después de haber utilizado el acondicionador para PVC. Únicamente haga la unión cuando el tubo y el accesorio estén secos. No permita que el agua entre en contacto con la soldadura. En ningún momento use solventes para bajar la viscosidad de la soldadura. Mantenga el recipiente bien tapado para evitar evaporaciones. Uso de elementos de protección personal adecuados.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.

Inflamable, combustible. En las áreas de almacenamiento y manejo del producto, NO fumar ni utilizar ningún tipo de aparato de telecomunicación que puede generar alguna chispa ó ignición. Proteja los recipientes de todo daño físico. Almacenar siempre en un lugar fresco, seco y ventilado lejos de áreas con peligro de incendio. Almacenar en lugares donde las instalaciones eléctricas (iluminación) sean a prueba de explosión. Manténgase lejos de oxidantes, calor y llamas. Guárdese en el recipiente original bien sellado y marcado. Proveer el recipiente de toma de tierra y trasladar el equipo para eliminar las chispas electroestáticas. El contacto prolongado con el aire puede ocasionar formación de peróxidos explosivos. Evitar el almacenaje por periodos prolongados. Para su movilización dentro y fuera de bodega evite utilizar montacargas de combustión. Usar este producto en un lugar ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. No inhalar sus vapores. En caso de ingestión, contacto con la piel o mucosas, tome abundante agua o lave y consulte al médico. No incinere. No vierta residuos en cuerpos de agua ni en alcantarillados. Para la disposición adecuada de los residuos, consulte nuestro manual de productos de construcción

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

8.1. Parámetros de control

TWA 200 ppm (MEK)

TWA 50 ppm (THF)

STEL 100 ppm (THF)

8.2. Controles técnicos apropiados

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

- Protección respiratoria
- Protección de las manos
- Protección de los ojos/ cara
- Protección del cuerpo y la piel

Necesaria en presencia de vapores/ aerosoles. Tipo de filtro recomendado :
Vapores orgánicos
Guantes de seguridad
Material del guante: goma butílica
Espesor del guante: 0,7 mm
Tiempo de penetración: >120 min
Gafas de seguridad
Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

- Estado físico: Líquido
- Color: claro
- Olor: Olor característico
- Punto de fusión/punto de congelación: -108,5°C

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

- **Punto de ebullición o punto inicial e intervalo de ebullición** 65°C – 66°C a 1-013 hPa
- **Inflamabilidad** Información no disponible
- **Límite inferior y superior de explosión/inflamabilidad** 1,5 % (v) – 12,4% (v)
- **Punto de inflamación** -21,5°C
- **Temperatura de ignición espontánea** 215 °C
- **Temperatura de descomposición** No hay información disponible
- **pH** No hay información disponible
- **Viscosidad dinámica** 0,48 mPa.s a 20°C
- **Solubilidad** En agua 85,3 g/l a 20°C
- **Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)** Log Pow: 0,45 (25°C)
- **Presión de vapor** 97 hPa a 20°C
- **Densidad relativa (Agua =1)** 0,89 a 20°C
- **Densidad del vapor relativa (Aire = 1)** 2,5
- **Características de las partículas** Información no disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.2. Estabilidad química

Formación posible de peróxidos

Sensibilidad a la luz

Sensible al aire.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Con las siguientes sustancias existe peligro de explosión y/o de formación de gases tóxicos:

hidróxidos alcalinos, hidruros, Oxidantes, Bromo, Oxígeno

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calentamiento

10.5. Materiales incompatibles

goma, plásticos diversos, Estaño

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Peróxidos. Por descomposición térmica – óxidos de carbono

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre la posibles vías de exposición

Piel, inhalación e ingestión

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Tras absorción de grandes cantidades: efectos sobre el sistema nervioso central, Vértigo, borrachera, descenso de la tensión sanguínea, narcosis

Conduce a trastornos funcionales en: vías respiratorias, Cardíaco

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

11.3. Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo.

11.4. Medidas numéricas de toxicidad

- **Toxicidad aguda**
- **Corrosión/ irritación cutánea**
- **Lesiones oculares graves/ irritación ocular**
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**

Para cetonas en general: tras inhalación de vapores/aerosoles, irritaciones de las mucosas, tos y dificultades respiratorias. Tras absorción de grandes cantidades: depresiones del sistema nervioso central (narcosis). Tras contacto repetido con la piel, efectos desengrasantes con posibles infecciones secundarias. No pueden excluirse efectos tóxicos sobre los riñones y el hígado a dosis elevadas. Por inhalación de gotitas existe riesgo de edema respiratorio.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

Oral: Existe el riesgo de aspiración al vomitar. Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía, irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago – intestinal

Inhalación: Irritación de las mucosas

DL50 rata, oral: 1.650 mg/kg (THF)
CL50 rata, inhalación: 53,9 mg/l; 4 h (IUCID) (THF)

Toxicidad oral aguda

DL50 Rata: 3.400 mg/kg (MEK)

Directrices de ensayo 401 del OECD

Síntomas: Náusea, Vómitos, Existe riesgo de aspiración al vomitar., Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía.

Toxicidad aguda por inhalación

Síntomas: Consecuencias posibles:, irritación de las mucosas

Toxicidad cutánea aguda

DL50 Conejo: > 8.000 mg/kg (MEK) conejo

Resultado: Irritaciones

(IUCID) (Reglamento (CE) No 1272/2008, Anexo VI)

Una exposición repetida o prolongada puede causar irritación de la piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto.

conejo

Resultado: Irritación ocular

(IUCID)

Provoca irritación ocular grave.

Test de sensibilización: conejillo de indias

Resultado: negativo

(IUCID)

Experiencia humana

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

- **Mutagenicidad en células germinales**
- **Teratogenicidad**
- **Carcinogenicidad**
- **Toxicidad para la reproducción**
- **Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposición única**
- **Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposiciones repetidas**
- **Peligros por aspiración**

11.5. Efectos interactivos

11.6. Otra información

Resultado: negativo
(IUCLID)

Prueba de Ames

Resultado: negativo
(IUCLID)

Esta información no está disponible.

Esta información no está disponible.

Esta información no está disponible.

Órgano diana: sistema nervioso central.
Puede provocar somnolencia o vértigo

Esta información no está disponible

Esta información no está disponible

Esta información no está disponible

A dosis elevadas:

sueño, narcosis

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

THE

Toxicidad para los peces

CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 2.160 mg/l; 96 h (en agua blanda) (IUCLID)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 382 mg/l; 24 h (IUCLID)

Toxicidad para las algas

IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 3.700 mg/l; 8 d (concentración tóxica límite) (IUCLID)

Toxicidad para las bacterias

EC5 Pseudomonas putida: 580 mg/l; 16 h (concentración tóxica límite) (IUCLID)

MEK

Toxicidad para los peces

CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 3.220 mg/l; 96 h (IUCLID)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 5.091 mg/l; 48 h (IUCLID)

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

12.2. Persistencia y degradabilidad

Toxicidad para las algas
IC50 Scenedesmus quadricauda (alga verde): ≥ 4.300 mg/l; 7 d (IUCLID)
Toxicidad para las bacterias
EC50 Pseudomonas putida: 1.150 mg/l; 16 h (IUCLID)

THF
Biodegradabilidad
39 %; 28 d
OECD TG 301D
No es fácilmente biodegradable.

MEK
Fácilmente biodegradable.
Demanda teórica de oxígeno (DTO)
2.440 mg/g
Ratio BOD/ThBOD
DBO5 76 %
(IUCLID)
Ratio COD/ThBOD
95 %

12.3. Potencial de bioacumulación

THF
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
log Pow: 0,45 (25 °C)
Directrices de ensayo 107 del OECD
No es de esperar una bioacumulación.
MEK

Coeficiente de reparto n-octanol/agua
log Pow: 0,29
(experimentalmente)
(Literatura) No es de esperar una bioacumulación

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible

12.5. Otros efectos adversos

La descarga en el ambiente debe ser evitada

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de productos

13.1. Métodos de eliminación

Producto

- Su eliminación se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales.
- Le rogamos contacte con la entidad adecuada en cada caso (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Empresa de acueducto y alcantarillado o bien empresas especializadas en la eliminación de residuos debidamente avaladas por las entidades gubernamentales que las regulan), para recibir la información en cada caso particular.

Envase:

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1.	Número UN	2056
14.2.	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	TETRAHIDROFURANO
14.3.	Clase(s) relativas al transporte	3
14.4.	Grupo de embalaje/ envasado	II
14.5.	Riesgos ambientales	-
14.6.	Precauciones especiales para el usuario	No transportar con alimentos y empaques de alimentos

SECCIÓN 15. Información sobre la reglamentación

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Decreto 1079 del 2015, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.
4. Decreto 1076 del 2015 Decreto único del sector ambiental y desarrollo sostenible
5. Decreto 1072 de 2015 Decreto único del sector laboral.
6. Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
7. Resolución 0773 de 2021 por el cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

SECCIÓN 16. Otras informaciones

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S, proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud o su minuciosidad tampoco se hacen responsables por el mal uso o interpretación dada a la información aquí contenida. Este documento está destinado sólo a ser una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Las personas que reciban la información deben ejercer su juicio independiente para determinar la conveniencia del uso de este producto para un propósito específico.

Clasificación NFPA704

Salud 2 Inflamabilidad 3 Inestabilidad 1 Peligros especiales

Información suministrada por:

- Sigma-Aldrich
- Merck
- OECD – www.echemportal.org The Global Portal to Information on Chemical Substances

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

FDS-03

Página 11 de 11

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021



CEMENTO GRIS

USO GENERAL TIPO UG

El cemento Ecocem Gris Tipo GU de Uso General, es un cemento recomendado para todo tipo de morteros y concretos que no requieran características especiales. Útil para reparaciones básicas y trabajos de remodelación

Normas aplicables: NTG 41095 TIPO UG | ASTM C1157 Tipo GU

PRESENTACIONES: Saco 42.5 kg | Big bag | A granel

Aplicaciones y usos

- Unión de bloques de concreto y ladrillos.
- Elaboración de morteros y concretos de uso general
- Reparaciones y aplicaciones domésticas.

Beneficios

- Tiempo de fraguado controlados que facilitan la manejabilidad de las mezclas producidas.
- Regularidad en sus propiedades y desempeño.

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO			ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTG 41003 h3	ASTM C185	Máx. 12.0	Menor que 12,0
Expansión en autoclave %	NTG 41014 h1	ASTM C151	Máx. 0.80	Menor que 0,80
Expansión barras de Mortero (14 días), %	NTG 41014 h3	ASTM C1038	Máx. 0.020	Menor que 0,020
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Límite NTG 41095	
1 Día, MPa (PSI)	NTG 41003 h4	ASTM C109	-	Mayor a 8.3 (1200)
3 Días, MPa (PSI)	NTG 41003 h4	ASTM C109	Mín. 13.0 (1890)	Mayor a 13.0 (1890)
7 Días, MPa (PSI)	NTG 41003 h4	ASTM C109	Mín. 20.0 (2900)	Mayor a 20.0 (2900)
28 Días, MPa (PSI)	NTG 41003 h4	ASTM C109	Mín. 28.0 (4060)	Mayor a 28.0 (4060)
TIEMPO DE FRAGUADO (VICAT)				
Tiempo de fraguado inicial, min	NTG 41003 h10	ASTM C191	Mín. 45 - Max. 420	Mayor a 45 - Menor que 420

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- 

Transporte en vehículos adecuados que eviten roturas de los sacos, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad y el agua.
- 

Almacenar en columnas menores de ocho (8) sacos de altura, dejando un espacio de 30cm, contra la pared y las pilas laterales.
- 

Apilar sobre estibas en buenas condiciones.
- 

Almacene bajo techo en un lugar seco, libre de humedad y de objetos cortopunzantes.
- 

Utilizar los sacos de cemento en el mismo orden en que fueron recibidos.
- 

Preferiblemente cubra los sacos de cemento con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico. Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada. Se recomienda el uso de guantes, traje de protección y protección visual.

ACLARACIONES

Los atributos del cemento hidráulico relacionados al desempeño del cemento, incluyendo el desarrollo de resistencia mecánica, permeabilidad, resistencia a los sulfatos, calor de hidratación y resistencia a la reactividad álcali-sílices, dependen de muchos factores tales como las características de otros materiales del cemento, diseño de mezcla, producción, manejo y condiciones ambientales. Se puede obtener información respecto a través de ensayos comparativos de concretos. Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.



Servicio al cliente:
3215-4650



Correo electrónico:
servicioalcliente@ultracem.gt



Página web
www.ultracem.gt



Redes Sociales
Ultracem Guatemala

Emergencias: tel 018000 51 1414 (todo el país). Servicio 24 horas		ARP SURQ
Centro de Informacion de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio Ambiente		Cistema
HOJA DE SEGURIDAD		
ACPM		
SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO		 
Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel. Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo. Puede estar coloreado para identificación.		
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		
Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.		
SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES		
Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos. CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]		
SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS		
Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato. Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación. Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato. Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.		
SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión. Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores. Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales. Medios de extinción apropiados: <u>Fuegos pequeños:</u> dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular. <u>Fuegos grandes:</u> espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro. NFPA: Salud 1 ; Inflamabilidad 2 ; Inestabilidad 0 (clasificación oficial según la NFPA).		
SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL		
Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas. Derrames Pequeños: Evacúe y aíse de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita. NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón. Derrames Grandes: Evacúe y aíse el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias. Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento. Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.		
SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO		
Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa. Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 °C). El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.		

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL			
TWA: 100 mg/m³, fracción inhalable y vapor (ACGIH).		IDLH: 1300 ppm	
Elementos de protección personal sugeridos:			
	>8hr: Caucho de nitrilo, viton.		>8hr: Caucho de nitrilo
	De 50 a 1000 mg/m³: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.		Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas
	1000 mg/m³: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.		
	Mayores que 1000 mg/m³ o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.		
	Para evitar contacto prolongado o repetido: >8hr: Viton.		Ducha
	Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;		Lavaojos
	Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.		
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 °C dependiendo del fabricante.			
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15°C (agua=1) Menos pesado que el agua .		Temperatura de autoignición: 230 °C.	
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1)		Valor de pH: Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.	
Temperatura de inflamación: 54 °C.		Densidad del vapor: 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire	
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6%		Umbral de olor: 0,1 ppm.	
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.			
SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD			
Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.			
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.			
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.			
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.			
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA			
Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38°C). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.			
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.			
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.			
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.			
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria.			
Reacciones alérgicas en algunos individuos. Carcinogenicidad: Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (clase A1) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.			
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA			
Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.			
SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO			
Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.			
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE			
La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.			
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.			
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)			
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA			
Etiquetado según directivas de la UE:		Sistema Globalmente Armonizado:	
F - Inflamable			
Xn - Nocivo			
			Atención Líquido y vapor inflamables
			Atención Nocivo por ingestión, contacto e inhalación
Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión			
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.			
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.			
SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL			
BIBLIOGRAFIA:			
1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.			
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67			
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.			
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.			
5. ACGIH. Threshold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.			
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.			
FECHA DE EMISION: Enero de 2009			ACPM
Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.			



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika®-1

Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros con mayor concentración y más rendimiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika®-1 es un aditivo líquido mejorado con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros, bloquea el agua e impermeabiliza hasta un 20% más.

USOS

- Para preparar morteros de baja permeabilidad (pañetes o revoques) en: cimentaciones, sótanos, tanques para agua, albercas y muros.
- Para la elaboración de todo tipo de pegas impermeables en mampostería.
- Para la elaboración de morteros de baja permeabilidad en nivelación y pendiente de pisos y cubiertas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Mejorado con polímeros sintéticos, tecnología que le da mayor poder de impermeabilización, disminuye la contracción, las fisuras y la porosidad del mortero.
- Morteros más resistentes y durables.
- No contiene cloruros.
- Permite que los muros pañetados con **Sika®-1** respiren.
- Permite preparar morteros fluidos para facilitar la aplicación en pisos y cubiertas.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Clasificación USGBC LEED. El **Sika®-1** se ajusta a los requisitos de LEED EQ. crédito 4.2: Materiales de baja emisión Pinturas & recubrimientos: VOC<100g/l

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	1/2 de galón	2 kg
	1 galón	4 kg
	5 galones	20 kg
	Plástico	60 kg
	Tambor	220 kg
Apariencia / Color	Líquido amarillo	
Vida útil en el recipiente	Un (1) año a partir de la fecha de fabricación.	
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sitio fresco y bajo techo en su envase original y bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.	
Densidad	1,02 kg/l $\pm$ 0.05 kg/l	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada

Agite el producto antes de usar. Mezcle **Sika®-1** con el agua de amasado de acuerdo con la dilución indicada: Puede ser usado en una dosis del 2% del peso del cemento, es decir, aproximadamente 1 Kg de **Sika®-1** para un bulto de cemento de 50 Kg.

Esta estimación está basada en nuestros conocimientos actuales de **Sika®-1**, en condiciones adecuadas de aplicación. Sin embargo, debido a que las condiciones reales y su empleo pueden variar considerablemente, esta estimación es sólo indicativa y la dosificación real podría ser menor o mayor de lo enunciado anteriormente, depende del diseño de mortero, las condiciones de los materiales a utilizar, entre otros.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Utilice siempre cemento fresco, arena bien gradada, con tamaño máximo de 3 mm. Arenas blandas o con arcilla se deben descartar.
- El curado se debe prolongar por (7) siete días como mínimo.
- En los sitios donde no sea posible terminar el mismo día, deberán traslaparse las diferentes capas de mortero aproximadamente 10 cm.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la base:

La superficie debe estar rugosa y limpia (libre de grasas, polvo, lechada de cemento u otros materiales extraños). Si hay presencia de fisuras estáticas u hormigueros, deberán ser reparados con morteros impermeables de la línea **SikaTop®**. Las juntas entre los muros o entre pisos y muros, deben ser tratadas con un poliuretano flexible **Sikaflex®** y recubiertas con una media caña cóncava de mortero impermeable. En reparaciones si se presentan chorros o filtraciones por porosidad, se deben taponar previamente con pasta preparada con **Sika®-2** o **Sika-Top®-108 waterplug**.

MEZCLADO

Dosificación del producto:

Agite el producto antes de usar.

Mezcle **Sika®-1** con el agua de amasado de acuerdo con la dilución indicada. Hasta 2% peso del cemento ≈ 1 kg de **Sika®-1** por bulto de cemento de 50 kg.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Se deben aplicar 3 capas de mortero con un espesor total de aproximadamente 2.5 cm, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Previa saturación de la superficie se aplica una primera capa consistente en una lechada de cemento preparada con la dilución de **Sika®-1** hasta obtener una consistencia cremosa.
- Antes que la primera capa haya secado, se aplica una segunda capa de mortero preparado con una parte de cemento por una parte de arena en volumen, mojado con la dilución de **Sika®-1**. Esta segunda capa se lanza sobre la anterior hasta obtener un espesor de aproximadamente 10 mm (1cm) y dejando un acabado rugoso.
- Cuando la capa anterior haya fraguado y todavía este húmeda, se aplica una tercera capa de mortero preparado con una parte de cemento por tres partes de arena en volumen, mojado con la dilución de **Sika®-1**, en un espesor de 10mm (1 cm) a 15 mm (1.5cm).

El acabado se efectúa con llana de madera hasta obtener una superficie lo más lisa posible. Si desea un acabado esmaltado se debe hacer aplicando sobre la superficie en la ultima capa, una mezcla de una parte de cemento por dos de arena cernida en volumen. Nunca utilice sólo cemento para hacer el acabado esmaltado, ya que frecuentemente se cuartea. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL. Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos. Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso. Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DE UN TERCERO. La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto

Sika®-1
Octubre 2025, Versión 01.07
020705040010000001

Sika-1-es-CO-(10-2025)-1-7.pdf





HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur® AnchorFix-4

SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikadur® AnchorFix-4 es un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (no escurre). Una vez mezclados los componentes se obtiene una pasta suave de gran adherencia y resistencia mecánica para anclajes de pernos y barras, cumple norma ASTM C-881-02 tipo IV, grado 3.

USOS

Sikadur® AnchorFix-4 puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Pasta para anclaje de pernos, varillas y fijaciones especiales en concreto.
- Anclajes en mampostería
- Pega de enchapes.
- Como sello en mantenimiento preventivo para rellenar fisuras de gran dimensión (menores de 6 mm), en estructuras nuevas o existentes para proteger el acero de refuerzo de la corrosión.
- Para fijar elementos como: prefabricados, vigas, escaleras, barandas, etc.
- Para la pega de elementos endurecidos como: madera, concreto, metal, vidrio, acero, etc

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para usar y de fácil aplicación con Pistola AnchorFix-4/3001.
- Insensible a la humedad antes, durante y después de curado.
- Alta resistencia y alto módulo de elasticidad.
- Excelente adherencia a mampostería, concreto, madera, acero y a la mayoría de materiales estructurales.
- Su consistencia pastosa es ideal para aplicaciones en vertical y sobre cabeza.
- Relación de mezcla A:B = 1:1 en volumen.

CERTIFICADOS / NORMAS

ASTM C-881-02, Tipo IV, Grado 3

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Cartuchos gemelos Und. de 900 gr. – 600 cc. Cartuchos gemelos Und. de 450 gr. - 300 cc.
Color	Gris
Vida útil en el recipiente	Un (1) año a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en su empaque original, bien cerrado y bajo techo. Transpórtese con las precauciones normales para productos químicos.

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Compresión	73°F (23°C)			(ASTM D-695)
	4 horas	-		
	8 horas	300 psi, (2.1 MPa)		
	16 horas	8.209 psi, (56.6 MPa)		
	3 días	9.960 psi, (68.7 MPa)		
	7 días	10.380 psi, (71.6 MPa)		
Resistencia a Flexión	6.700 psi,(46.2 MPa)(14 días)			(ASTM D-790)
Módulo de Elasticidad a Flexión	7,5*105 psi, (5.175 MPa) (14 días)			(ASTM D-790)
Resistencia a tensión	4.300 psi,(29.7 MPa) (14 días)			(ASTM D-638)
Módulo de Elasticidad a Tensión	4.1*105 psi, (2.829 MPa) (14 días)			(ASTM D-638)
Elongación a Rotura	1.3%			
Resistencia a Cortante	3.700 psi (25.5 MPa)(14 días)			(ASTM D-732)
Resistencia al Arrancamiento	Diámetro de acero de refuerzo	Diámetro de perforación (in)	Espaciamiento entre barras S _{cr} (cm)	Distancia al borde C _{cr} (cm)
	No. 3	1/2	17	11.5
	No. 4	5/8	23	15
	No. 5	3/4	29	19
	No. 6	7/8	34	23
	No. 7	1	40	27
	No. 8	1-1/8	46	30.5
	No. 9	1-3/8	52	33
	No. 10	1-1/2	58	38
	Profundidad de anclaje (cm) Mínimo	Capacidad de carga permisible con base en la resistencia de adherencia o capacidad del concreto (kg) f' C=140 kg/cm²	Capacidad de carga permisible con base en la resistencia del acero (kg) fy = 2.800 kg/cm²	Capacidad de carga permisible con base en la resistencia del acero (kg) fy = 4.200 kg/cm²
	9	1.260	1.000	1.200
	12	1.630	1.815	2.180
	15	2.280	2.800	3.375
	18	2.980	4.000	4.790
	20	3.370	5.450	6.530
	23	5.460	7.170	8.600
	26	6.310	8.980	10.780
	29	8.390	11.100	13.360

Valores de carga son válidos para las profundidades, diámetros, espaciamientos y distancias al borde indicados, para la temperatura de servicio admisible del Sikadur® AnchorFix-4, para cargas estáticas y concreto sin fisuras. La carga admisible de diseño debe ser la menor entre la resistencia de adherencia y la del acero.



Temperatura de Servicio

Reducción de la carga de servicio admisible por resistencia de adherencia con base en la temperatura de servicio.

Temperatura de servicio	% de carga admisible
Hasta 49°C	100%
65°C	62%
82°C	52%

Contacto con agua	Absorción de agua (24 horas)	0.11%	(ASTM D-570)
-------------------	------------------------------	-------	--------------

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	1: 1 en volumen.		
Consumo	1,5 kilos por litro de relleno.		
Tiempo de Curado	Temperatura(°C) de aplicación	Tiempo Gel (min)	Tiempo de curado (horas)
	4	60	48
	15	45	36
	23	35	24
	32	20	24

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Utilice preferiblemente todo el contenido del cartucho gemelo de forma continua.
- Las características del sistema de anclaje (profundidad, diámetro, distancias entre anclajes, y al borde) deben ser definidas por el diseñador.
- Precalentar el producto hasta máximo 35°C cuando la temperatura sea inferior a 6°C.
- No se debe aplicar soldadura a elementos metálicos pegados con el adhesivo epóxico ya que seguramente se sobrepasará la temperatura máxima admisible de servicio del adhesivo, con ablandamiento o daño del mismo y falla en la pega.
- La temperatura ambiente durante la aplicación debe estar por lo menos 3°C sobre el punto de rocío.
- La temperatura de servicio del sistema de pega debe estar por debajo de la temperatura de deflexión (HDT) del adhesivo.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

En caso de presentarse contacto con la piel, lávese de inmediato con agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese de inmediato con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Acuda al médico de inmediato. En caso de manifestarse problemas respiratorios, lleve a la persona afectada a un sitio ventilado. Quítese la

ropa contaminada y lávela antes de volverla a utilizar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consulte la hoja de seguridad para obtener información más detallada.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficie

La superficie debe estar sana y limpia puede estar seca o húmeda pero libre de empozamientos. Remover polvo, lechada, grasa, curadores, impregnaciones, ceras y cualquier otro contaminante.

Método de limpieza

Anclaje de pernos, varillas y fijaciones especiales:

El diámetro del hueco del perno o varilla a anclar debe ser desde 1/8 a 1/4 de pulgada (3,2 a 6,4 mm) mayor que el diámetro del perno o varilla a anclar, realizar la perforación con un taladro rotopercutor y la broca adecuada (1). Limpie el hueco con aire a presión, introduzca un cepillo de cerdas de alambre (churrusco) y coloque nuevamente aire a presión para eliminar los residuos de la perforación, repetir esta operación tres veces. Proteja el hueco contra la penetración de agua u otras partículas contaminantes (2,3). Limpie la barra a anclar por medios mecánicos hasta que esté totalmente libre de óxido, grasa o cualquier partícula o material contaminante (previo a su colocación).

La barra debe estar completamente recta para que el epóxico quede en todo su contorno.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sikadur® AnchorFix-4 viene envasado en dos cartuchos plásticos gemelos, listo para ser usado. Retire los tapones de salida del producto de los cartuchos y ajuste la boquilla de mezclado y salida del producto. Instale luego los cartuchos gemelos en la pistola AnchorFix-4/3001 (de doble embolo) de Sika.

Presione el gatillo aprox. 2 veces (no en la perforación) hasta que por la punta de la boquilla salga el adhesivo con un color y consistencia uniforme. No utilice este material (4). Introduzca la boquilla hasta el fondo de la perforación, inyecte el adhesivo y llene hasta 3/4 de la perforación (aprox.), retire suavemente la boquilla a medida que se llene el hueco. En huecos profundos usar extensión.

Evitar la inclusión de aire (5). Después de limpiar la barra a anclar introdúzcala girándola lentamente hasta que esta toque el fondo de la perforación de tal forma que el Sikadur AnchorFix-4 se desplace a la superficie para garantizar que este ocupe la totalidad de la longitud del anclaje (6). Limpie el sobrante si es necesario y garantice que el elemento no se mueva durante las próximas 4 horas.


1




2




3

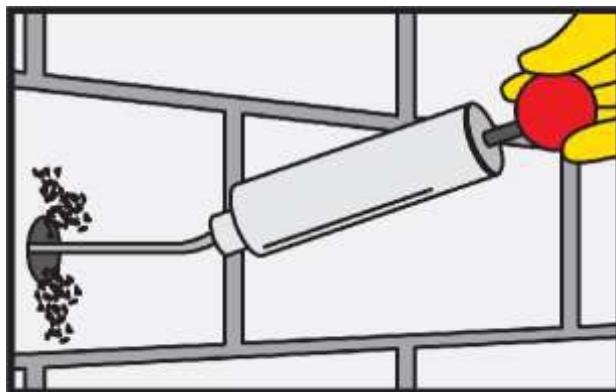


4

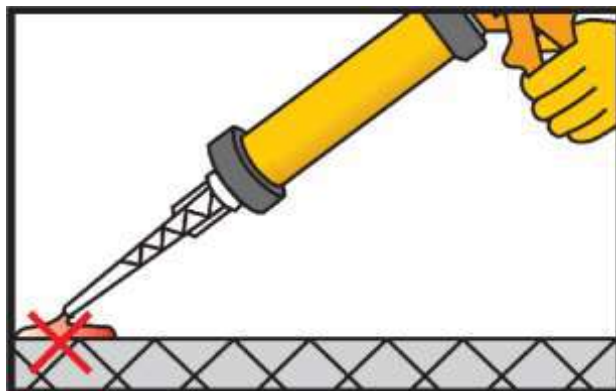

5

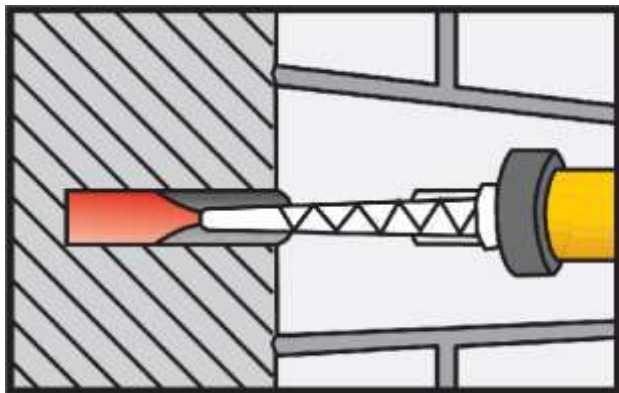

6

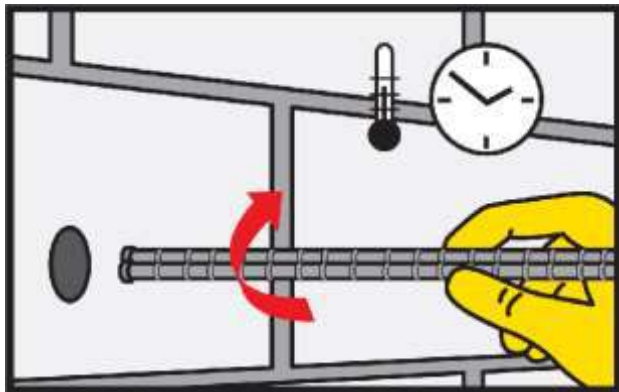

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad.

dad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones ge-

nerales de venta publicadas en la página web:
col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto

Sikadur® AnchorFix-4
Marzo 2025, Versión 01.03
020205010030000001

SikadurAnchorFix-4-es-CO-(03-2025)-1-3.pdf



INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ SINCELEJO USD** Fecha Impresión: **24/04/26** Informe N°: **50116**
 Dirección: **CL 38 # 6 - 186 SINCELEJO** No. Remisión: **82749582** Informe Ant N°:
 Teléfono: **3311 573 2787** Página: **1 de 4**

DATOS GENERALES PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Nb
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084204	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.09	0.19	0.006	0.006	0.01	0.00	0.01	0.004	0.002
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084205	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.09	0.19	0.006	0.006	0.01	0.00	0.01	0.004	0.002
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084206	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.09	0.19	0.006	0.006	0.01	0.00	0.01	0.004	0.002

DATOS GENERALES PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% CE	% Mo
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084204	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46	0.000
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084205	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46	0.000
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084206	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46	0.000

DATOS GENERALES PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Angulo de resalte °	Carga Tracción lbf
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084204	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71369	93017	17	Aceptado	1.30	0.11	54	10232
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084205	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71369	93017	17	Aceptado	1.30	0.11	54	10232
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084206	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71369	93017	17	Aceptado	1.30	0.11	54	10232

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:

Ternium del Atlantico S.A.S.

Página Web:

www.ternium.com.co

NIT:

901131909-1

Teléfono:

01 8000 423 724

Dirección:

Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente:	GYJ SINCELEJO USD	Fecha Impresión	24/04/26	Informe N°:	50116
Dirección:	CL 38 # 6 - 186 SINCELEJO	No. Remisión:	82749582	Informe Ant N°:	
Teléfono:	3311 573 2787	Página:	2 de 4		

DATOS GENERALES

PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084204	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240423
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084205	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240423
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084206	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240423

DATOS GENERALES

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación entre Ext	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Carga Fluencia
					mm	mm	Kg/m	lbf
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084204	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.1	0.558	7851
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084205	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.1	0.558	7851
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084206	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.1	0.558	7851

DATOS GENERALES

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte
					mm
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084204	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.49

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:

Ternium del Atlantico S.A.S.

Página Web:

www.ternium.com.co

NIT:

901131909-1

Teléfono:

01 8000 423 724

Dirección:

Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente:	GYJ SINCELEJO USD	Fecha Impresión	24/04/26	Informe N°:	50116
Dirección:	CL 38 # 6 - 186 SINCELEJO	No. Remisión:	82749582	Informe Ant N°:	
Teléfono:	3311 573 2787	Página:	3 de 4		

DATOS GENERALES

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte
					mm
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084205	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.49
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BTY0084206	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.49

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2021 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022

* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	$\pm 477.4\text{psi} / \pm 3.292\text{ Mpa}$
Resistencia a la Tracción	$\pm 477.4\text{psi} / \pm 3.292\text{ Mpa}$
Alargamiento	$\pm 0.486651\%$
Altura Resalte	$\pm 0.014965\text{ mm}$
Separación entre extremos	$\pm 0.028704\text{ mm}$

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:

Ternium del Atlantico S.A.S.

Página Web:

www.ternium.com.co

NIT:

901131909-1

Teléfono:

01 8000 423 724

Dirección:

Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente:	GYJ SINCELEJO USD	Fecha Impresión	24/04/26	Informe N°:	50116
Dirección:	CL 38 # 6 - 186 SINCELEJO	No. Remisión:	82749582	Informe Ant N°:	
Teléfono:	3311 573 2787	Página:	4 de 4		

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Espaciamiento	± 0.020434 mm
Angulo de Resalte	± 0.285355 °
Peso metro (masa)	± 0.011 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance del laboratorio



ALAMBRES CON TRATAMIENTO TERMICO

CÓDIGO

FT-PL-10

VERSION

16

NUMERO DE INFORME

DCE-244-2022

FECHA DE ELABORACION

08/09/2022

CONSECUTIVO

244

CLIENTE

CIUDAD

G y J FERRETERIAS S.A

TIBASOSA

PRODUCTO : ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg

CODIGO DEL PRODUCTO:

270095

LOTES DE PRODUCCION:

FABQ006233

DESARROLLO:

NA

FICHA TÉCNICA :

FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	PROMEDIO (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	38	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,02

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO

NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
80	25	2.000

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad.

PROALCO

BEKAERT

better together



**CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S**

F.V: 01-03-2017

CEMENTO ECOCEM GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

VERSIÓN 3.

Código 230

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	16/02/2026 — 28/02/2026
PRESENTACIÓN:	ENSACADO
CLIENTE:	

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ULTRACEM
Contenido de aire en volumen, %	NTC 224	7,30	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm ² /g	NTC 33	5456	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	95,19	—	—
Expansión barras de Mortero (14 días), %	NTC 4927	0,000	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión				
1 Día, MPa (psi)	NTC 220	5,7 (820)	—	—
3 Días, MPa (psi)	NTC 220	11,2 (1620)	Min. 8,0 (1160)	Min. 8,0 (1160)
7 Días, MPa (psi)	NTC 220	16,8 (2440)	Min. 15,0 (2176)	Min. 15,0 (2176)
28 Días, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 24,0 (3481)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A				
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	170	Min. 45	Min. 45
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	270	Max. 420	Max. 420

Certificamos que el cemento hidráulico ECOCEM Gris Tipo Uso General cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 121 para CEMENTO TIPO UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA:

Cargo: Gerente de Calidad Cementos



Cemento Gris Tipo UG Uso General

El cemento ECOCEMENTO Gris Tipo UG de uso general es un cemento recomendado para todo tipo de morteros y concretos que no requieran características especiales.

Útil para reparaciones básicas y trabajos de remodelación.

Cumple con la Norma NTC 121 Tipo UG.

APLICACIONES Y USOS



- Elaboración de morteros y concretos de uso general.
- Morteros para pega, pisos y pañete.
- Concretos de comportamiento normal en fraguados y resistencias.

PARÁMETRO DE CONTROL	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN NTC 121
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	Máx. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm ² / g	NTC 33	-----
Finura en tamiz NP 325 (45 m), %	NTC 294	-----
Expansión en autoclave, %	NTC 107	Máx. 0,8
Expansión barra de mortero, 14 días, %	NTC 4927	Máx. 0,020
TIEMPO DE FRAGUADO (Met. Vicat A)		
Tiempo inicial de fraguado, minutos	NTC 118	Mín. 45
Tiempo final de fraguado, minutos	NTC 118	Máx. 420
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		
1 Día MPa (psi)	NTC 220	-----
3 Días MPa (psi)	NTC 220	Mín. 8,0 (1160)
7 Días MPa (psi)	NTC 220	Mín. 15,0 (2176)
28 Días MPa (psi)	NTC 220	Mín. 24,0 (3481)



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026**



SEGUIMIENTOS SEMANALES

INFORME DE SEGUIMIENTO					
DATOS DEL PROYECTO					
CONTRATO DE OBRA:		ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV			
SUPERVISOR:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA		CONTRATISTA:	CONSORCIO PISO 3 CCTV	
FRENTE DE OBRA:	PISO 3 PALACIO DE JUSTICIA TORRE A Y B				
SEMANA NUMERO:	10	DEL:	29-mar.-2026	AL:	5-abr.-2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato de obra:			60	días	
Tiempo de paralización del contrato de obra:			65	días	
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO DE OBRA:					
Contratista:	CONSORCIO PISO 3 CCTV Nit.901.531.888-1				
Contrato No.:	SAMC 10 DE 2025				
Valor Inicial:	\$				1.375.100.226,00
Valor Actualizado:	\$				1.375.100.226,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses				
Plazo Adicional	5 Meses				
Fecha de Iniciación	2025-12-03				
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31				
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26				
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23				
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08				
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08				
Fecha de reanudacion No 2:	2026-03-27				
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S. Nit.901.531.888-1				
Contrato No.:	MC 26 DE 2025				
Valor Inicial:	\$				25.429.987,00
Valor Actualizado:	\$				88.570.883,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses				
Plazo Adicional	5 Meses				
Fecha de Iniciación	2025-12-03				
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31				
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26				
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23				
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08				
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08				
Fecha de reanudacion No 2:	2026-03-27				
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31				
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA:					
CONTRATO DE OBRA:					
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 1.867.001.462,0			
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%):	0,12%	22,23%	Obra Física Ejecutada:	2,59%	6,98%
Valor de la Obra:	\$ 2.240.402	\$ 415.034.425	Valor de la Obra:	\$ 48.355.338	\$ 130.319.975
CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 88.570.883,0			
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria Programada (%):	6,12%	38,58%	Interventoria Ejecutada:	6,12%	38,58%
Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474	\$ 34.167.885	Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474	\$ 34.167.885


INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO GRAFICO

PORCENTAJE DE EJECUCION



AVANCE DE OBRAS

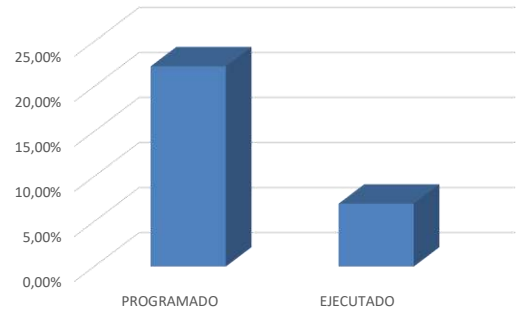

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades de obra: instalacion de bloque de concreto de 0,09 m en areas de torre A y B, contrucciones de columnetas en los muros. Esta semana se retoman actividades posterior a la primera semana de la reanudacion del contrato el dia 27 de marzo de 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se estaran realizando instalacion de tuberia electrica sobre piso, instalacion de bloque 0,09 y repello.

OBSERVACIONES

Para el presente informe, el porcentaje programado de avance corresponde al 22,23 %. Sin embargo, la ejecucion real de la obra alcanza el 6,98 %, evidenciando un deficit en la programación del - 15,25 % .

REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTE DE OBRA



Levante de muro torre B y vaciado de machones



Levante de muro torre B y vaciado de machones



Levante de muro torre B y vaciado de machones




Levante de muro torre B y vaciado de machones

Dancy Tovar de Obeid

DANCY TOVAR DE OBEID

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S.
INTERVENTORIA DE OBRA

INFORME DE SEGUIMIENTO				
DATOS DEL PROYECTO				
CONTRATO DE OBRA:		ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV		
SUPERVISOR:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA		CONTRATISTA:	CONSORCIO PISO 3 CCTV
FRENTE DE OBRA:	PISO 3 PALACIO DE JUSTICIA TORRE A Y B			
SEMANA NUMERO:	11	DEL:	6-abr.-2026	AL: 12-abr.-2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato de obra:			67	días
Tiempo de paralización del contrato de obra:			65	días
Nombre del Supervisor:				
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO DE OBRA:				
Contratista:	CONSORCIO PISO 3 CCTV Nit. 901.531.888-1			
Contrato No.:	SAMC 10 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			1.375.100.226,00
Valor Actualizado:	\$			1.867.001.462,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S. Nit.901.531.888-1			
Contrato No.:	MC 26 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			25.429.987,00
Valor Actualizado:	\$			88.570.883,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA:				
CONTRATO DE OBRA:				
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 1.867.001.462,0		
	SEMANAL	ACUMULADO		
Obra Programada (%):	0,92%	23,67%	Obra Física Ejecutada:	3,69%
Valor de la Obra:	\$ 17.176.413	\$ 441.919.246	Valor de la Obra:	\$ 68.892.354
				\$ 158.885.097
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 88.570.883,0		
	SEMANAL	ACUMULADO		
Interventoria Programada (%):	6,12%	44,70%	Interventoria Ejecutada:	6,12%
Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474	\$ 39.591.359	Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474
				\$ 39.591.359

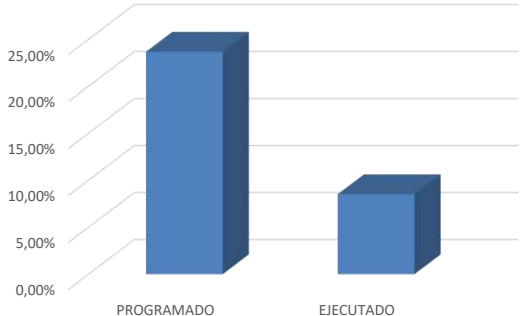INFORME DE SEGUIMIENTO	
SEGUIMIENTO GRAFICO	
PORCENTAJE DE EJECUCION  ■ EJECTADO ■ SIN EJECUTAR	AVANCE DE OBRAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades de obra: Pañete allanado en mortero 1:4 1 cara, Levante de muro en bloque de concreto 5 Mpa 9 * 19 * 39, así como también corte para regata de muros para instalaciones eléctricas.	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
Se estarán realizando instalación de tubería eléctrica sobre piso, instalación de bloque 0,09 y Pañete allanado en mortero.	
OBSERVACIONES	
Para el presente informe, el porcentaje programado de avance corresponde al 23,67 %. Sin embargo, la ejecución real de la obra alcanza el 8,51%, evidenciando un déficit en la programación del - 15,16 % .	
REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTE DE OBRA	
	
Pañete allanado en mortero area administrativa.	Pañete allanado en mortero area contratación

INFORME DE SEGUIMIENTO



Pañete allanado en mortero oficina dirección





Pañete allanado en mortero oficina dirección

Dancy Tovar de Obeid

DANCY TOVAR DE OBEID

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S.
INTERVENTORIA DE OBRA

INFORME DE SEGUIMIENTO				
DATOS DEL PROYECTO				
CONTRATO DE OBRA:		ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV		
SUPERVISOR:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA		CONTRATISTA:	CONSORCIO PISO 3 CCTV
FRENTE DE OBRA:	PISO 3 PALACIO DE JUSTICIA TORRE A Y B			
SEMANA NUMERO:	12	DEL:	13-abr.-2026	AL: 19-abr.-2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato de obra:			73	días
Tiempo de paralización del contrato de obra:			65	días
Nombre del Supervisor:				
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO DE OBRA:				
Contratista:	CONSORCIO PISO 3 CCTV Nit. 901.531.888-1			
Contrato No.:	SAMC 10 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			1.375.100.226,00
Valor Actualizado:	\$			1.867.001.462,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S. Nit.901.531.888-1			
Contrato No.:	IMC 26 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			25.429.987,00
Valor Actualizado:	\$			88.570.883,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA:				
CONTRATO DE OBRA:				
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 1.867.001.462,0		
	SEMANAL	ACUMULADO		
Obra Programada (%):	8,83%	32,50%	Obra Física Ejecutada:	5,30%
Valor de la Obra:	\$ 164.856.229	\$ 606.775.475	Valor de la Obra:	\$ 98.951.077
				\$ 257.836.175
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 88.570.883,0		
	SEMANAL	ACUMULADO		
Interventoria Programada (%):	6,12%	50,82%	Interventoria Ejecutada:	6,12%
Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474	\$ 45.014.833	Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474
				\$ 45.014.833

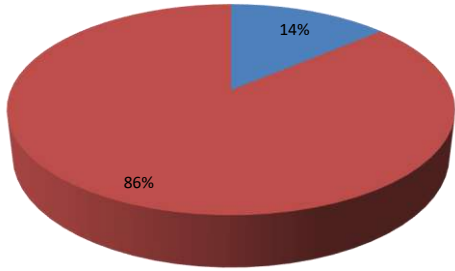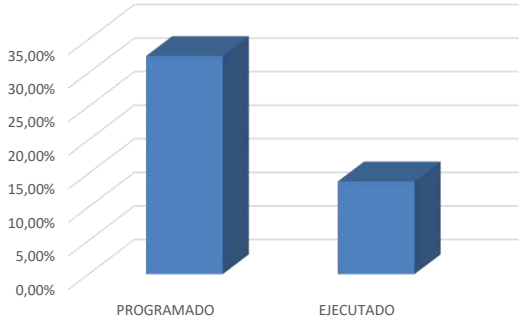INFORME DE SEGUIMIENTO													
SEGUIMIENTO GRAFICO													
PORCENTAJE DE EJECUCION  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>SIN EJECUTAR</td> <td>14%</td> </tr> </tbody> </table>	Estado	Porcentaje	EJECUTADO	86%	SIN EJECUTAR	14%	AVANCE DE OBRAS  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>32,50%</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>13,81%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	PROGRAMADO	32,50%	EJECUTADO	13,81%
Estado	Porcentaje												
EJECUTADO	86%												
SIN EJECUTAR	14%												
Categoría	Porcentaje												
PROGRAMADO	32,50%												
EJECUTADO	13,81%												
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA													
Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades de obra: Pañete allanado en mortero 1:4 1 cara, Instalacion de tubería por piso eléctrica, así como también corte para regata de muros para instalaciones eléctricas.													
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA													
Se estarán realizando instalación de tubería eléctrica sobre piso, Estuco plástico para muros, tubería de aire acondicionado por piso e instalación de bandeja para cables eléctricos del													
OBSERVACIONES													
Para el presente informe, el porcentaje programado de avance corresponde al 32,50 %. Sin embargo, la ejecución real de la obra alcanza el 13,81%, evidenciando un déficit en la programación del - 18,69 % .													
REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTE DE OBRA													
													
Instalacion de tubería eléctrica por piso	Instalacion de bandeja eléctrica por piso												

INFORME DE SEGUIMIENTO



Pañete allanado en mortero oficina dirección





Pañete allanado en mortero oficina dirección

Dancy Tovar de Obeid

DANCY TOVAR DE OBEID

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S.
INTERVENTORIA DE OBRA

INFORME DE SEGUIMIENTO				
DATOS DEL PROYECTO				
CONTRATO DE OBRA:		ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV		
SUPERVISOR:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA		CONTRATISTA:	CONSORCIO PISO 3 CCTV
FRENTE DE OBRA:	PISO 3 PALACIO DE JUSTICIA TORRE A Y B			
SEMANA NUMERO:	13	DEL:	20-abr.-2026	AL: 26-abr.-2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato de obra:			79	días
Tiempo de paralización del contrato de obra:			65	días
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO DE OBRA:				
Contratista:	CONSORCIO PISO 3 CCTV Nit. 901.531.888-1			
Contrato No.:	SAMC 10 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			1.375.100.226,00
Valor Actualizado:	\$			1.867.001.462,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S. Nit.901.531.888-1			
Contrato No.:	MC 26 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			25.429.987,00
Valor Actualizado:	\$			88.570.883,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA:				
CONTRATO DE OBRA:				
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.867.001.462,0			
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%):	6,09%	38,59%	Obra Física Ejecutada:	2,35%
Valor de la Obra:	\$ 113.640.943	\$ 720.416.418	Valor de la Obra:	\$ 43.874.534
				\$ 301.710.709
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 88.570.883,0			
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria Programada (%):	6,12%	56,95%	Interventoria Ejecutada:	6,12%
Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474	\$ 50.438.307	Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474
				\$ 50.438.307

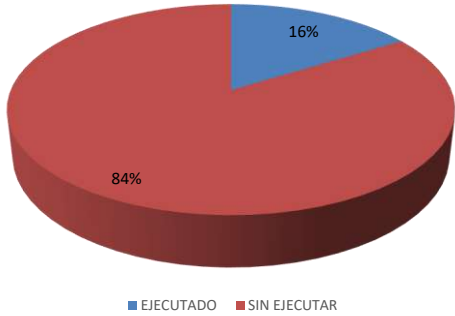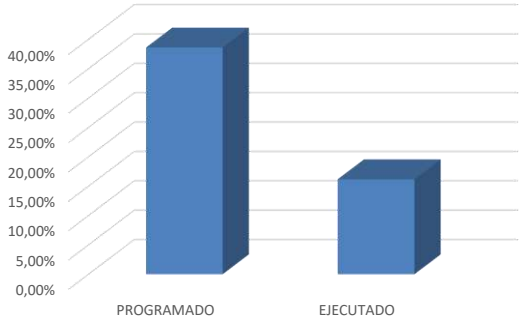INFORME DE SEGUIMIENTO	
SEGUIMIENTO GRAFICO	
PORCENTAJE DE EJECUCION  ■ EJEUTADO ■ SIN EJEUTAR	AVANCE DE OBRAS  PROGRAMADO EJEUTADO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades de obra: instalacion de estuco en las areas principales de la torra B y colocacion de tuberia para sistema electrico y de datos por piso, Adicionalmente actividades de colocacion de tuberia hidraulica de agua potable para cada unos de los puntos de lavamanos y sanitarios en los baños.	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
Se estaran realizando instalacion de tuberia electrica EMT por techo, Estuco plastico para muros, tuberia de aire acondicionado en cobre y contruccion de plantillas.	
OBSERVACIONES	
Para el presente informe, el porcentaje programado de avance corresponde al 38,59 %. Sin embargo, la ejecución real de la obra alcanza el 16,16%, evidenciando un deficit en la programación del - 22,43 % .	
REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTE DE OBRA	
	
Instalacion de tuberia hidraulica y malla electrosoldada baños	Instalacion de malla electrosoldada area bienestar

INFORME DE SEGUIMIENTO



Instalacion de canal metalica por techo para cableado electrico del pasillo





Repello pared oficina dirección

Dancy Tovar de Obeid

DANCY TOVAR DE OBEID

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S.
INTERVENTORIA DE OBRA

INFORME DE SEGUIMIENTO				
DATOS DEL PROYECTO				
CONTRATO DE OBRA:		ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO 3 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION SECCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CCTV		
SUPERVISOR:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	CONTRATISTA:	CONSORCIO PISO 3 CCTV	
FRENTE DE OBRA:	PISO 3 PALACIO DE JUSTICIA TORRE A Y B			
SEMANA NUMERO:	14	DEL:	27-abr.-2026	AL: 3-may.-2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato de obra:			85	días
Tiempo de paralización del contrato de obra:			65	días
DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO DE OBRA:				
Contratista:	CONSORCIO PISO 3 CCTV Nit. 901.531.888-1			
Contrato No.:	SAMC 10 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			1.375.100.226,00
Valor Actualizado:	\$			1.867.001.462,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S. Nit.901.531.888-1			
Contrato No.:	IMC 26 DE 2025			
Valor Inicial:	\$			25.429.987,00
Valor Actualizado:	\$			88.570.883,00
Plazo Inicial:	0,9 Meses			
Plazo Adicional:	5 Meses			
Fecha de Iniciación:	2025-12-03			
Fecha de Vencimiento inicial:	2026-12-31			
Fecha de Vencimiento Prorroga No1:	2026-01-26			
Fecha de suspensión No 1:	2026-01-23			
Fecha de reanudación No 1:	2026-02-08			
Fecha de suspensión No 2:	2026-02-08			
Fecha de reanudación No 2:	2026-03-27			
Fecha de finalización Actual:	2026-07-31			
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA:				
CONTRATO DE OBRA:				
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 1.867.001.462,0		
	SEMANAL	ACUMULADO		
Obra Programada (%):	0,84%	39,43%	Obra Física Ejecutada:	2,37%
Valor de la Obra:	\$ 15.619.054	\$ 736.080.191	Valor de la Obra:	\$ 44.247.935
				ACUMULADO
				18,53%
				\$ 345.958.644
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
VALOR DEL PROYECTO:		\$ 88.570.883,0		
	SEMANAL	ACUMULADO		
Interventoria Programada (%):	6,12%	56,95%	Interventoria Ejecutada:	6,12%
Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474	\$ 50.438.307	Valor de la Interventoria:	\$ 5.423.474
				ACUMULADO
				56,95%
				\$ 50.438.307

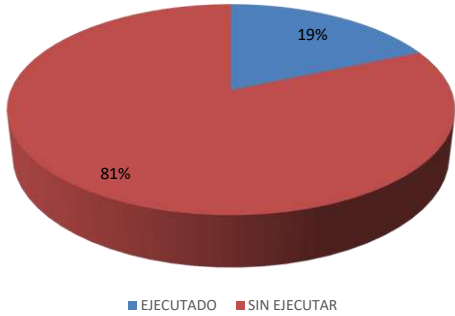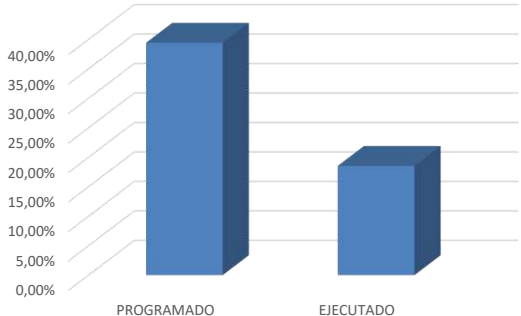INFORME DE SEGUIMIENTO	
SEGUIMIENTO GRAFICO	
PORCENTAJE DE EJECUCION  ■ EJEUTADO ■ SIN EJECUTAR	AVANCE DE OBRAS  PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades de obra: instalación de cubierta CCTV, instalación plantilla en las áreas de la torre A, instalación de tubería EMT eléctrica por la parte superior para iluminación.	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
Se estarán realizando instalación de tubería eléctrica EMT por techo, tubería de aire acondicionado en cobre y construcción de plantillas. Además se estará tramitando el acta parcial de	
OBSERVACIONES	
Para el presente informe, el porcentaje programado de avance corresponde al 38,59 %. Sin embargo, la ejecución real de la obra alcanza el 16,16%, evidenciando un déficit en la programación del - 22,43 % .	
REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTE DE OBRA	
	
Instalación de tubería de cobre para aires acondicionados	Instalación de cubierta CCTV

INFORME DE SEGUIMIENTO



Instalacion de tuberia EMT para intalacion de luminarias



Instalacion de tuberia de cobre para aires acondicionados

Dancy Tovar de Obeid.

DANCY TOVAR DE OBEID

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S.
INTERVENTORIA DE OBRA

Viernes, 12 de diciembre de 2025

Torne AB - Piso 3

Hora inicio: 9:00 am.

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Siso

3 Oficiales varios

2 Electricistas

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores.

Actividades realizadas:

- Se realiza cerramiento y delimitación de área entregada por el supervisor de obra, con lona verde.
- Se realiza señalización de seguridad, para garantizar que en el área de trabajo no ingrese personal ajeno y dar a conocer que se están llevando a cabo actividades que generen un potencial de accidentalidad.
- Se realiza el desmonte de puertas metálicas de la siguiente manera: 1 unidad en juzgado 1° laboral del circuito, 1 unidad en sala de audiencias #8, 1 Unidad en sala de audiencias #7, 1 Unidad en área de contratación, 1 Unidad en área financiera, 4 Unidad en el área de sistemas; para un total de 9 puertas.
- Se realiza el desmonte de 2 puertas de madera en el juzgado 1° laboral del circuito.
- Se realiza el desmonte de 2 ventanas en el área financiera y 2 ventanas en el área de sistemas; para un total de 4 unidades de ventanas desinstaladas.
- Se realiza la desenergización de toda el área para garantizar la seguridad de personal obrero que realiza las actividades de desmonte y posteriormente se realizaron demo-

laciones de muros en mampostería y desinstalación de muros en drywall.

- Se inicia el desmantelamiento del cableado eléctrico y de datos.
- Se inicia la desinstalación de muros en drywall en el Juzgado 1° laboral del Circuito, en la sala de audiencias #8, Sala de audiencias #7, área de Sistemas, retirando el retiro de láminas.

Fin de actividades 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado, 13 de diciembre de 2025

Torre AB - Piso 3

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra

Residente de obra

Siso

3 Oficiales Varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores.

Actividades realizadas:

- Se continúa con el desmonte de muros en drywall en las áreas del juzgado 1° laboral de circuito, en la sala de audiencias #8, en la sala de audiencias #7 y en el área de Sistemas retirando la estructura metálica.
- Se realiza desmonte del cielo raso en el Juzgado 1° laboral del Circuito con la respectiva estructura y luminarias.
- Se inicia la demolición de piso en Sala

de audiencias # 7 y # 8.

Fin de actividades: 5:30 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo, 14 de diciembre de 2025

Torre AB - Piso 3

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Sis O

3 Oficios Varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores y Martillo demoledor.

Actividades realizadas:

Se continúa con la demolición de piso en Juzgado 1º Laboral del circuito y en el área de contratación.

Fin de actividades: 5:30 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes, 15 de diciembre de 2025

Torre AB - Piso 3

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Sis O

3 Oficios Varios

2 electricistas.

Herramientas y Equipos: Herramientas Menores y Martillo Demoleedor

Actividades realizadas:

- Se realiza el desmonte de luminarias en la Sala de audiencias #7 y #8 y en el área de contratación.
- Se continúa con la demolición de pisos en el área de sistemas; actividad fue suspendida por el supervisor de obra debido al ruido generado por las demoliciones que afectan a los funcionarios, quienes se quejaron.
- Se continúa con el desmonte de muros en drywall del Juzgado 1º laboral del circuito.
- Se realiza el desmonte y retiro de persianas en el Juzgado 1º Laboral del circuito, en las salas de audiencias #7, Sala de audiencias #8, en el área de contratación, en el área financiera y en el área de sistemas.
- Se realiza el desmantelamiento del cableado eléctrico y canaletas metálicas en el área de financiera.

Fin de actividades: 4:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría.

Mañías, 16 de diciembre de 2025.

Torre AB - Piso 3

Horario Inicio: 5:00pm

⇒ Personal en obra:

Resistente de obra

SISO

3 oficios varros

2 electricistas.

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores y martillo demolidor

Actividades realizadas:

- Se continúa con la demolición de pisos en el área de contratación, en el área de financiera y en los pasillos.
 - Se realiza el desmonte de los tomacorrientes que se encontraban instalados en el área de financiera.
 - Se realiza el desmonte de luminarias y cableado eléctrico en las áreas de contratación, en el área de financiera y en el área de sistemas.
 - Se realiza la desconexión y retiro de cableado eléctrico de los tomacorrientes; cableado que va entre muros para garantizar la seguridad de los trabajadores al momento de demoler muros en mampostería y el desmonte de muros en drywall.
 - Se realiza el retiro de tablero eléctrico.
 - Se realiza el demonte de luminarias y el retiro de cableado eléctrico en el área de contratación, área financiera y área de sistemas. Se realiza recolección de escombros.
- Fin de actividades: 12:00 am

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Torre AB - Piso 3

Hora Inicio: 5:00 pm

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Siso

3 Oficiales varos

2 Electricistas

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores
Pulidora, Martillo demecedor.

Actividades realizadas: Se continúa demolición pisos.

• Se realiza trazado de muros que se van a demoler

• Se realiza el corte y demolición de muros en mampostería, quedando unida el área de financiera con el área de Sistemas.

• Se realiza la recolección de escombros en sacos.

Fin de actividades: 12:00 am.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves, 18 de diciembre de 2025

Torre AB - Piso 3

Hora Inicio: 5:00 pm

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Siso

3 oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores y Martillo Demoleedor.

Actividades realizadas:

- Se continúa con la demolición piso en pasillo.
- Se realiza la recolección de escombros en sacos.
- Se continúa con la demolición de muros.

Fin de actividades: 12:00 am

Residente de obra

Residente de Interventoria,

Viernes 18 de diciembre de 2025

Torre AB Piso 3

Hora Inicio: 5:00 pm

⇒ Personal en obra
Residente de obra

Siso

3 oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, Pulidora

Actividades realizadas:

- Se realiza identificación de muros a demoler.
- Se realiza corte y demolición de muros en área financiera.
- Se realiza recolección de escombros en sacos.

Fin de actividades: 10:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado, 20 de diciembre de 2025

Torre AB Piso 3

Hora Inicio: 7:00 am.

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Siso

3 Oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades realizadas

Se realiza recolección de escombros en sacos de las demoliciones realizadas. Se realiza carga en Volco.

Fin actividades: 6:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo, 21 de diciembre de 2025.

Torre AB Piso 3

Hora Inicio: 7:30 am.

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Siso

3 Oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades Realizadas:

- Se continúa con la recolección de escombros en sacos, generados por las demoliciones realizadas.
 - Se realiza trasiego de escombros en sacos, desde piso 3 hasta piso 1.
 - Se realiza carga en volquetas de los escombros hasta punto autorizado.
- Fin actividades 12:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Junes, 22 de diciembre de 2025

⇒ Personal en obra:

Hora Inicio 7:00am

Residente de obra

Sis o

3 oficios varios

2 Electricistas.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores.

Actividades realizadas:

• Se realiza desmonte de puertas en oficina de asistencia legal, baños piso 3 Juzgado primero civil del Circuito.

• Se realiza el desmantelamiento del cableado eléctrico y datos en oficina de asistencia legal juzgado primero civil del Circuito y en el juzgado segundo civil del circuito.

• Se realiza orden y aseo en área Interventoría.

Fin actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes, 23 de diciembre de 2025

Palacio de Justicia Torre AB piso 3 Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Siso

3 oficios varios

4 electricistas.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, polidora.

Actividades realizadas:

- Se realiza el Comité Neos de obra.
- Se continúa con el desmantelamiento de accesorios eléctricos, cableado eléctrico, cableado de datos y desmonte de luminarias en Juzgado 1° y 2° de circuito, en área administrativa y en oficina de asistencia legal.
- Se realiza la demolición de muros en mampostera y el desmonte de muros en drywall en oficina de asistencia legal.
- Se realiza la demolición de enchape muros en baño damas y se inicia la demolición en baño caballeros del enchape muros.
- Se realiza el cierre de pasos peatonales por escaleras y de las Torres Gentium - Las Marías.
- Se realiza el desmonte de puertas en vidrio y recibidores en vidrio en juzgado 1° y 2° Civil del circuito y en juzgado 1° laboral del circuito.
- Se realiza el desmonte de puertas de acceso principal a los juzgados 1° y 2° Civil de circuito.

Fin de actividades : 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoria

Miércoles, 24 de diciembre de 2025.

Palacio de Justicia Torre AB Piso 3 Hora Inicio: 7:00am

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Siso

3 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Actividades realizadas

- Se continúa con la demolición de muros en manposteria marcados por la Ing estructural entidad contratante en juzgado 1º civil Circuito
- Se finaliza la demolición de encharpe muros en baño caballeros
- Se hace recorrido de obra con interventoria, supervisión entidad contratante, residente obra y la Ing estructural entidad contratante, recorrido en donde se definen los vanos de puertas y muros pendientes por demoler.

Fin de actividades: 12:00 m

Residente de obra

Residente de Interventoria.

Viernes, 26 de diciembre de 2025

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3 Hora Inicio: 7:00am

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Siso

3 Oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividades realizadas:

- Se realiza recogida y llenado de sacos con escombros, producto de las demoliciones realizadas.
- A solicitud de la residente de obra, el supervisor de obra autoriza descargue de escombros en dos (2) puntos ubicados en la parte externa del edificio Torre AB.
- Se realiza traslado de los escombros en sacos a punto autorizado en la parte externa de la Torre AB.

Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado, 27 de diciembre de 2025

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3 Hora Inicio: 7:00am

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Siso

3 Oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividades realizadas:

- Se continúa con la actividad de recogida de escombros producto de las demoliciones realizadas en sacos.
 - Se realiza trasiego de los escombros recogidos en sacos a punto autorizado por la entidad a punto autorizado en la parte externa de la Torre AB.
 - Se realiza el cargue de escombros en Volqueta.
- Fin actividades 4:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo, 28 de diciembre de 2025.

Palacio de Justicia Amalejo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:30 am

8:50

3 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Manuales

Act

Actividades realizadas:

- Se continúa con el llenado de sacos de los escombros producto de las demoliciones realizadas.
- Se realiza traslado del piso 3 al sitio autorizado por el Supervisor en el 1er piso parte externa de la Torre AB.
- Se realiza el cargue en Volqueta hacia sitio autorizado.

- Se realiza aseo
 - Se solicita a la entidad contratante aclarar la ubicación de las tuberías de presión hidráulica, las cuales según diseño van por techo junto con la red eléctrica y de datos, en un espacio de 10 cm.
 - Se continúa a la espera de los planos de datos y eléctricos
- Fin de actividades 2:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves, 29 de diciembre de 2025.

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3.

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora inicio: 7:00 am.

350

3 oficios varios.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores y Pulidora

Actividades realizadas

- Se continúa con el llenado de sacos con los escombros producto de las demoliciones realizadas
- Se continúa con la demolición de muros factantes y marcados con la ing. estructural de la entidad en juzgado 1º y 2º de circuito.
- Se realiza la instalación de ducto externo en la parte externa fachada Torre AB para poder sacar escombros del piso 3 al piso 1 en área lateral entrada Solano.

- Se realiza retiro de vidrios ventana fachada.
- Se realiza recorrido de obra con la Ing estructural entidad, Supervisor entidad, interventoria; se define entre contratista e Interventoria ubicación del muro baño.

Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Mañitas, 30 de diciembre de 2025

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Siso

3 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores y Pulidora

Actividades realizadas

- Se continúa con la demolición de muros faltantes y marcados en juzgados 1º y 2º de circuito
- Se saca caja fuerte ubicada en juzgado 2º civil del circuito y se entrega al supervisor entidad
- Se realiza recorrido con la Ing estructural, Supervisor entidad, interventoria; se define por parte de los funcionarios entidad contratante realizar el retiro de capones incrustados en las paredes de Juzgado 1º y 2º de circuito, debajo de los muros de mármol y en oficina asistencia legal. Debido a la antigüedad de los capones

con sus respectivas puertas refirados, el supervisor entrolad autoriza realizar disposición final de parte del contratista.
Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miércoles, 31 de diciembre de 2025

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de Obra

Hora Inicio: 7:00 am

Siso

3 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividades realizadas:

- Se realiza el retiro de cegones incrustados en las paredes de los juzgados 1º y 2º de circuito, debajo de los mesones de mármol.
- Se realiza limpieza de área baños para poder posteriormente realizar el trazado de tuberías sanitarias.
- Se realiza reunión en piso 3 con supervisor obra, Ing estructural entidad, Ing hidrosanitario entidad, Interventoría; la Ing estructural define vano de ventanas las cuales van desde placa de Techo con una $h = 2m$. Referente a la instalación tuberías sanitarias el supervisor entidad da la directriz de tener cuidado en no cortar varillas de refuerzo nuevos solo demoler concreto y meter tuberías entre

los nervios sin corte de varillas de refuerzo.

- Se realiza el sellado de vacío donde se retiraron vidrios, Sector donde se instaló ducto de escombros.
- Supervisor de obra solicita retiro de escombros ya acumulados productos de demoliciones realizadas. Contratista comenta que el viernes 2 de enero 2026, se terminará con los detalles faltantes del ducto para escombros para proceder con la evacuación de escombros usando el ducto.
- Ing estructural autoriza demoler vanos pequeños que quedan en baños y oficina asistencia legal.

Fin actividades: 1:00 pm.

Residente de obra

Residente Interventista

Supervisor obra

Ing Estructural entidad.

02 de enero 2026, viernes

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3.

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am.

8:50

3 oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores.

Actividades realizadas:

- Se realiza demolición de vano puerta en baños
- Se realiza instalación de tableros en parte

externa Torre AB, en rampa garage, en lugar donde van a caer los escombros, utilizando ducto de escombros,

- Se realiza instalación de laminas Drywall y su respectiva estructura para aislar pisos del acceso desde las otras torres, se deja instalada puerta la cual será utilizada por el supervisor entidad contratante para inspeccionar obra.

Fin actividades: 6:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado, 03 de enero de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Siso

4 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggy

Actividades realizadas

- Se realiza acarreo en buggy desde las diferentes áreas donde están acopiados los escombros hacia punto de descarga ducto escombros.
- Se realiza descarga de escombros usando ducto desde Piso 3 a punto externo de acopio.
- Se realiza carga en volqueta de escombros acopiados en parte externa Torre AB.

Fin actividades: 5:00pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo, 04 de enero de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

→ Personal de Obra:

Residente de obra

Inicio: 7:30 am.

Siso

4 Oficios Varios

→ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys.

Actividades realizadas

- Se continúa acarreo en buggys desde las diferentes áreas donde están acopiados los escombros hacia punto de descarga ducto escombros.
 - Se realiza descarga por medio del ducto de escombros desde Piso 3 a punto externo de acopio.
 - Se realiza instalación de laminas para protección Ventanas piso 2, evitando quiebre de Vidrios mientras se realiza descarga de escombros o subida de material usando malocate.
 - Se realiza aseo área, se tapan escombros externos con lona verde.
- fin actividades 2:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Junes, 05 enero 2026.

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

500

5 Oficinas Varios

Hora Inicio: 7:00 am.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys, Martillo demolidor, pulidora.

Actividades realizadas:

- Se realiza demolición muros faltantes en área baños
 - Se realiza demolición capa pega en piso oficina sistemas y área financiera.
 - Se realiza acarreo en buggys del material producto de las demoliciones a punto acopro cerca del ducto de escombros
 - Se realiza recorrido con directora rama judicial, Ingenieros entidad Contratante, Residente obra, personal del Contratista para mirar avance de demoliciones y definir temas técnicos y de acabados.
 - Supervisor entidad contratante envía plano actualizado con ubicación de machones faltantes y detalles constructivos
- Fin actividades 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Supervisor obra

Martes, 06 de enero 2025

Palacio de Justicia Sincelajo Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Inicio obra: 7:00am

Siso

5 Oficiales varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys, 2 martillos demoleedor

Actividades realizadas:

- Se inicia demolición de plantilla en área de oficina sistemas y financiera, llegando a la placa; la altura libre una vez realizada la demolición de la plantilla es de 2.52m.
 - Se realiza el acarreo de la plantilla demolida hacia punto de acopio al lado del ducto.
 - Se recibe en obra 2do martillo demoleedor para poder avanzar más en el tema de la demolición de piso en área juzgado 1º y 2do civil del circuito.
 - Se realiza desmonte de los muros en mármol, solo se puede salvar parte de la placa superior debido a que estaban bastante pegados.
 - Debido a la gran cantidad de escombros acopiados en el punto de descarga cerca al ducto instalado, se organiza jornada de evacuación de escombros mañana miércoles 07 de enero/2025 de 4pm - 10:30pm.
- Fin actividades: 5pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles, 07 de enero 2026

Palacio de justicia Sincerejo Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 4:00pm

Siso

7 Oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza demolición de la estructura (muro-placa) donde estaban instalados los masones de mármol.

- Se realiza acarreo en buggys de la plantilla de molida hacia punto acopio cerca al ducto de descarga.

- Se demarca y señaliza en parte externa el área de descarga de escombros.

- Se realiza carga volcos con escombros.

- Una vez eliminada jornada laboral se realiza aseo y se señaliza con cintas peligro, se tapa con lona verde el escombros que queda.

Fin de actividades: 10:30pm

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves, 08 de enero 2026

Palacio de justicia Sincerejo Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 8:30am.

Siso

5 oficinas varios

⇒ Alenamientos y equipos: Alenamientos ylenores buggys, demolidores (2)

Actividades realizadas:

- Se continúa con el cargue de plantilla domo- lida en área de oficina de sistemas y finan- ciera, con buggys hacia el punto de acopi- al lado del ducto de descarga.
- Se realiza demolición de placa lateral al muro fachada, detrás de los baños para despejar área donde se realizará levante de muro posterior baño.
- Se refuerza estructura de ducto de descarga.
- Se continúa con la demolición baldosas de piso en área juzgado 1° y 2° civil del circuito.
- Debido a la gran cantidad de escombros acopiados en el punto de descarga cerca al ducto instalado, se organiza jornadas de evacuación de escombros mañana Vie- nes 09 de enero 2025 de 4pm - 10:30pm. Fin actividades 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoria,

Viernes, 09 de enero 2025.

Palacio de justicia Dincelgo Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra
Dijo

Hora Inicio 4:00pm

5 oficinas varios.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza acarreo en buggys de parte de las bardas demolidas en piso juzgado 1º y 2º civil de circuito hacia punto de acopio.
 - Se demarca y señaliza en parte externa Torre AB el área de descarga de escombros.
 - Se realiza carga de escombros en volquete.
 - Una vez culminada la jornada laboral se realiza aseo, se señaliza con cinta peligro y se tapa con tela verde el escombro que queda.
 - Se realiza reunión de obra con personal labor y administrativo, en donde se informa retorno de funcionarios de la Rama Judicial el día 13 de enero/2026, se informan medidas a tomar en cuanto aseo y respeto a los funcionarios.
 - Se solicita por oficio al supervisor de obra espacio para descarga de bloques 0.09 y 0.15 en área asociada al parque bandera.
- Fin de actividades: 10:30 pm.
- El supervisor de obra solicita despejar área en donde está punto de descarga parte externa entrada a bodega torre AB, debido a que realizarán actividad de evacuación equipos guardados en bodega, por tal motivo la jornada a día de mañana se realizará de 1pm - 9pm.

Residente de obra

Residente de Intervención.

Sábado, 10 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincelajo Tona AB. Piso 3.

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 1:00 pm

Siso

7 Oficios Varios

↳ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se recibe respuesta a solicitud de espacio en parqueaderos enajenado a la entidad Contratante Para acopiar bloques 0.09 y 0.15, la respuesta es positiva en donde podemos hacer uso del espacio teniendo medidas de seguridad y logística adecuada como el uso de estibas y cubrimiento de los bloques con plástico; el área asignada debe ser entregada el día lunes 02 de marzo /2026 en las mismas condiciones en que se recibe.

- Se continúa con el acarreo de escombros en buggys del área juzgado 1º y 2º Civil de circuito hacia punto acopio cerca al ducto de descarga.

- Se demarca y señala en parte externa Tona AB el área de descarga de escombros.

- Se realiza cargue de escombros en volqueta

- Una vez culminada la jornada laboral se realiza aseo, se señala con cinta peligro y se tapa con frasco verde el escombros que quede.

Fin de actividades: 9:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo, 11 de enero de 2016

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Inicio obra: 7:30 am

Siso

5 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, boggys

Actividades realizadas

- Se realiza demolición en bardosas faltantes en Juzgado 2do civil del circuito y en Sala de audiencias #8.
- Se realiza acarreo de los escombros producto de bardosas demolidas y muros en área oficina asst legal y Juzgado 2do civil del circuito, hacia punto de descarga ducto escombros.
- Se encuentra cascada de cableado datos y eléctrico en oficina área de contratación, parte posterior de baños y oficina de asistencia legal. El Supervisor obra junto con Ing Sistema entidad hacer recorrido en informan que se puede cortar el ramal de cables de datos que está en área de contratación, en parte posterior de baños el ramal está activo y es el que brinda internet a los pisos 2-4 por tal motivo no se puede cortar, queda pendiente por definir el ramal encontrado en área asistencia legal.
- Se demarca y señaliza en parte externa Torre AB el área de descarga de escombros.
- Se realiza cargue de escombros en volquete.
- Una vez finalizada la jornada laboral se realiza aseo, se señaliza con cinta peligro y se tapa con tela verde el escombro que queda.

Fin de actividades 2:30 pm.

Supervisor obra

Res. obra

Residente Interventoría

Lunes festivo, 12 de enero 2023

Palacio de Justicia Sincerejo Tona AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio 7:00 am

Siso

4 Oficios Varios

1 Oficial

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggies

Actividades Realizadas:

- Se realiza demolición de muro faltante pa tumbas en área oficina asistencia legal
 - Se realiza demolición de bardas en área de oficina asistencia legal
 - Se realiza demolición de plantilla en área posterior baño llegando a nivel de placa.
 - Se realiza acarreo de material producto de la demolición plantilla hacia punto de descarga ducto.
 - Se aprecia muro divisorio baño que queda sin soporte una vez empezamos a demoler la plantilla baño, se expone situación al Supervisor e Interventores quienes autorizan realizar demolición
- Fin de actividades. 1:00 pm
- Se realiza trazado muros baño oficina dirección

Residente de obra

Residente de Interventoría

Supervisor obra.

Martes, 13 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincerejo Torre AB Piso 3

⇒ Personal obra:

Residente de obra

Inicio obra: 4:00 pm

Siso

5 Oficios Varios

1 Oficial.

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas menores, buggys.

Actividades realizadas

- Se realiza demolición de baldosas en oficina asistencia legal y en pasillos

- Se realiza acarreo de escombros producto de las demoliciones realizadas hacia punto de descarga ducto

- Se coloca iluminación (reflectores) en punto de descarga ducto

- Se realiza trazado de muros para oficina dirección, baño dirección, apoyo dirección

- Se realiza aseo area escaleras.

Fin actividades 10:30 pm

Residente obra

Residente Interventoría

Miércoles, 14 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincerejo Torre AB Piso 3

⇒ Personal obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00am

Siso

5 oficias varios

1 Oficial

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys

Actividades realizadas:

- Llegada de bloques para mampostería
- Se realiza trazo de muros en Sala de juntas y área administrativa.
- Acarreo de bloques de parque banderas hacia piso 3
- Se realiza demolición plantilla parte forjado primero Civil circuito y pasillo
- Se realiza acarreo de escombros producto de las demoliciones realizadas
- Se realiza cargue volco con escombros
- Se demarca y señaliza en parte externa Torre AB en el área de descarga de escombros
- Una vez finalizada la jornada laboral se realiza aseo, se señaliza con cinta peligro y se tapa con tela verde el escombros que queda.

Fin de actividades 11:00 pm.

Residente obra

Residente de Interventoría

Jueves 15 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincero Torre AB Piso 3

⇒ Personal Obra:

Residente de obra

Hora Inicio 7:00 am

Siso

1 oficial.

5 oficiales varros

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza limpieza de vacíos de la placa entre piso área baños
 - Se inicia levante de muros en oficinas nuevas de dirección, sala de juntas y área administrativa
 - Se continúa recibiendo bloques para mampostería
 - Se realiza acarreo de bloques de parques banderados a piso 3
 - Se continúa con demolición de plantilla juzgado 12 avil circuito
 - Se realiza acarreo de demoliciones realizados hacia punto de acopio piso 3
 - Se realiza descarga de escombros a través de ducto
 - Se verifica con interventoría los muros y vacíos ventanas - puertas, encontrando diferencia en algunos espacios, se aprueba que las diferencias presentadas serán absorbidas por los muros, se respetarán diseños de espacio de ventanas y puertas.
 - Se realiza cargue de volco con escombros
 - Se demarcó y señalizó parte externa TONEAB en el área de descarga de escombros.
 - Una vez finalizada la jornada laboral se realiza aseo se señaliza con cinta peligro y se tapa con tela verde escombros acopiado.
- Fin de actividades 10:45 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 16 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincelaju Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra

Siso

5 Oficios Varios

1 Oficial

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys
mastillo demoleedor.

Actividades realizadas:

- Se continúa con el levante de muros en nueva oficina Sala juntas y baño directora.
- Se continúa con la demolición de plantillas piso en antigua oficina juzgado 1º civil circuito
- Se realiza acarreo de demoliciones realizadas hacia punto de acopio piso 3.
- Se realiza descarga a través de ducto de los escombros acopiados.
- Se realiza cargue de volco con escombros.
- Se demarca y señaliza parte externa Torre AB en el área de descarga de escombros.
- Supervisión de obra solicitó dejar libre la entrada a la bodega, por tal motivo se retiraron tableros y se realiza aseo dejando libre el área solicitada, parte externa Torre AB.
- Una vez finalizada la jornada laboral se realiza aseo, se tapa con tela verde una pequeña cantidad de escombros que se deja para la mañana nuevamente cuando se retorne la

descarga de escombros.

Fin de actividades 10:30 PM.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado, 17 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora inicio: 7:00 am.

Piso

5 oficios varios

1 oficio de obra.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys
Demoledor

Actividades realizadas:

- Se realiza trazado de muros en baños
- Se inicia levante de los muros baños parte posterior
- Se continúa con la demolición de baldosas en pasillos aledaños a antigua área administrativa y oficina de asistencia legal.
- Se realiza acarreo escombros producto de las demoliciones hacia punto acopio piso 3 cerca a ducto de descarga.
- Se realiza acarreo de bloques de parque banderas hacia punto de subida con polea parte externa Torre AB
- Se suben bloques por fachada Torre AB usando polea, hasta Piso 3
- Se realiza jornada de aseo
- Se finaliza demolición de baldosas en pasillos

- Se continúa con demolición de plantilla en pasillos

- Para poder demoler baldosas se realizó desmonte de gatos y plástico negro que demarcan y aislaban piso 3 por las escaleras luego de finalizada jornada de demolición piso se vuelven a colocar para independizar área intervenida piso 3 y aislar y acceso de los funcionarios y personal externo a la obra.

- En conjunto con interventoría se verifican los trazados del baño Damas/caballeros.

Fin de actividades 2:00 pm

- Al finalizar jornada se realiza aseo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes, 19 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincerejo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio 7:00 am

Siso

5 Oficiales varios

1 Oficial de obra

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggy
taladro demolidor, pulidora

Actividades realizadas:

- Se continúa con el levante de muros en baño directora entidad

- Se realiza acanreo de bloques parque bandera

hasta punto de subida con polea parte externa Torre AB.

- Se suben bloques por fachada Torre AB usando polea hasta piso 3
- Se vuelven a organizar tableros en punto de descarga de escombros parte externa Torre AB, se coloca cama de escombros para evitar deterioro del piso
- Se realiza acarreo de escombros hasta punto al lado del ducto en piso 3
- Se realiza descarga de escombros por medio del ducto desde piso 3 a punto de descarga parte externa fachada Torre AB
- Se tapan con lona verde los escombros, se señalizan.
- Se realiza jornada de caso finalizadas las labores.

Fin de actividades 10:40 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes, 20 de enero de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personas de obra:

Residente de obra

Hora de Inicio: 7:00 am,

Siso

Oficios varios

Oficial de obra

⇒ Herramientas y equipos: herramientas menores, buggys
Taladro demoldor

Actividades realizadas

- Se continúa con el levante de muros en oficina dirección
- Se realiza acarreo de bloques de punto externo Tono AB por medio de polea a piso 3.
- Se recibe material tipo cemento y agregados para avance actividades
- Se realiza cargue de escombros en volqueta
- Se realiza acarreo de escombros producto de las demoliciones realizados a punto de descarga en piso 3 al lado ducto.
- Se realiza descarga de escombros por medio de ducto desde pisos 3 hasta punto de descarga parte externa fachada Tono AB
- El escombro acopiado en parte externa Tono AB, se tapa con tela verde, se señaliz
- Se realiza cese al finalizar jornada.

Fin actividades : 10:30 pm.

Se realizó recorrido de obra junto con interventor y supervisión de obra, se revisan muros levantados y se informa por parte del Supervisor la altura de viga amare muros, autorizado por interventoría.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles, 21 de enero 2026

Palacio de justicia Sincelajo Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Siso

5 Oficios Varios

2 oficiales.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys
-jalado demolidor, posidora.

Actividades realizadas:

- Se realiza cargue de volqueta de los escombros acopiados en parte externa Torre AB.
- Se recibe viaje de bloques, los cuales son acopiados en parque banderas.
- Se inicia el armado de machones.
- Se continúa con el levante de muros en baño damas / caballeros.
- Se realiza acarreo de escombros en piso 3 de las demoliciones realizadas hasta punto de acopio cerca al ducto de descarga.
- Se continúa con demolición de plantilla en pasillos.
- Se realiza la demolición de varios puertos falsos en antigua oficina área de contratación.
- Se realiza orden y aseo al finalizar jornada.
- Se finaliza jornada a las 9:30 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 21 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Horario Inicio: 7:00 am

Siso

5 Oficiales Varios

2 oficiales de obra.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggy pulidora

Actividades realizadas:

- Se continúa con el figurado de estribos y armado de canchales para machones.
 - Se recibe viaje de bloques, los cuales son acopiados en parque banderas.
 - Se realiza acarreo de bloques de parque banderas hasta punto de subida.
 - Se suben bloques por fachada Torre AB usando polea hasta piso 3, igualmente se sube arena.
 - Se realiza retiro de material reciclado hacia Corcinante.
 - Se recibe viaje (Volco $7m^3$) de arena.
 - Se realiza aseo una vez finalizada jornada.
- Fin actividades : 7:00pm.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Jueves 22 de enero de 2026.

Parque de justicia Sincero Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora inicio: 7:00 am.

Siso

5 Oficiales varios

2 oficiales de obra

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggy

Actividades realizadas:

- Se realiza anclado de machones, se formalete y se funden machones, en baños y oficina brenero.
 - El día jueves 22 de enero 2020 se realizó recorrido de obra con Ing eléctrico ramo judicial, Ing supervisor obra, Ing eléctrico Contratista, Ing residente obra aux, Arg Residente, Interventor. Se apreciaron paredes debilitadas por las mangueras y acometidas de aires acondicionados, queda pendiente de definir alternativa para arreglar las paredes; pendiente por parte de la entidad envío de planos aires acondicionados y luces; se definen machones adicionales para reforzar puntos donde había traba de bloques en Paredes sin demoler.
 - Se realiza acarreo de bloques del parque banderas hasta punto de subida por polea.
 - Se suben bloques por Fachada Torre AB usando polea hasta piso 3.
 - Se realiza aseo rejilla rampa sótano y se realiza aseo en área donde se ejecutaban actividades parte externa piso 3, escaleras y área frente a sótano.
 - El anclado de machones se realiza tanto en placa piso como placa techo con epóxico anelge.
 - La entidad contratante realiza actividad evacuación de material reciclado por correimiento.
- Fin actividad 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 22 de enero 2026

⇒ Personal de obra:

Residente de obra Hora Inicio 7:00 am
Siso.

5 Oficiales varios

2 Oficiales de obra.

Aux Residente de obra.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, buggys, Taladro demolitor.

Actividades realizadas:

- Se desformatlean machonas fundidos la día de ayer
 - Se continúa formatleando machones en área administrativa y oficina apoyo dirección.
 - Debido a la actividad realizada por la entrada del cargue material reciclado para Coreanorte, se para actividad de subida de material usando la polea en horas de la mañana, se pospone para la tarde.
 - Se realiza demolición de plantilla en antigua área de construcción y antigua área sala de audiencias #7 y #8
 - Llegada material gravilla para avance de fundida de machones
 - Se realiza traslado y acopio de material demolido en punto cerca a ducto de descarga
 - Se realiza aseo por escaleras y parte ext Torre AB
- Se finalizan actividades a los 5:30 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 23 de enero 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio:

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficiales Varios

2 Oficiales

Observación: Se suspende contrato de obra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 27 de Marzo de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3.

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am.

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficiales Varios

2 Oficiales.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividades Realizadas:

- Se renuncia contrato de obra.
- Se realiza embudo de muros en oficina nueva de Sistemas.
- Se continúa con la formateo de machones factantes en oficina área administrativa, y en baños damas/laboreros; se fondean machones.
- Se realiza demolición de plantilla para instala-

ción de tuberías hidrosanitarias área baños
Damas/caballeros.

- Se continúa con la demolición de plantilla (autante por demoler en sala de audiencias #7 y #8).
 - Se realiza acarreo de los escombros producto de las demoliciones hacia punto de descarga de escombros.
 - Se realiza la descarga de escombros a través del ducto.
 - Se realiza cargue de escombros en Volvo.
 - Se realiza recorrido de obra con Interventoría y supervisión de obra, en donde se informa la eliminación de puerta de acceso principal en pasillo y de indicaciones de muros nuevos con sus respectivos machones y puerta de acceso en área de contratación.
 - Se reciben bloques 0.09 para continuar con actividad de levante de muros.
 - Se realiza aseo en parte externa fachado donde estaban escombros acopiados, se señaliza lo que queda.
- Fin actividades. 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría.

- Viernes 27 de Mayo de 2026
Palacio de Justicia Sincelgo Torre AB Piso 3
- ⇒ Personal de obra:
- Residente de obra
 - Aux Residente de obra
 - Siso
 - 5 Oficiales varios
 - 2 Oficiales

Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys Demoledor.

Actividades realizadas:

- Se realiza carga de escombros acopiados en parte externa fachada Torre AB.
 - Se continúa con la demolición de plantilla en área baños Damas/caballeros.
 - Se continúa con el armado de refuerzo de machones.
 - Se anda refuerzo en machones baño dirección y se funden.
 - Se realiza reciclaje material tipo tuberías, canaletas metálicas, aluminio que se encuentran en paredes y pisos demolidos.
 - Se realiza instalación de polipasto eléctrico para cambiar el izado manual de materiales obra para piso 3 por el dispositivo eléctrico instalado para mejorar el rendimiento.
 - Se continúa con la demolición de plantillas en antigua oficina sala de audiencias #7 y #8, se realiza acarreo de escombros a pto descarga.
 - Se realiza descarga de escombros por ducto.
 - Se tapa escombros acopiados en parte externa fachada Torre AB con tela verde, se señaliza.
- Fin actividades 5:00 pm

Residente de obra

Presidente de Interventoría

• Sábado 28 de Mayo de 2026

Palacio de Justicia Sincelajo Torre AB Piso 3

⇒ Personal en obra: Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra

Residente de obra Auxiliar

Siso

5 Oficios Varios

Actividades realizadas:

• Se continúa con levante muros en baños Damas/Caballeros

• Se arma acero para machón, se anclan y se fondo machón en pared posterior baños Damas/Caballeros

• Se realizan pruebas del polipasto.

• Se realiza levante de muros en oficina nuevos Sistemas

• Se continúa con demolición de plantilla en antiguas oficinas Sala de audiencias A-7 y #8

• Se realiza acarreo y descarga por ducto

• Se cargan escombros en volco

• Realizando la actividad de demolición Plantilla se daña (parte) tubo 1/2" presión en uso, no existe plano ni información de ese red, la fuga se controla

• Se realiza regata por paredes de red presión que va por paredes baños Damas/Caballeros

Fin actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

• Lunes 30 de marzo de 2026

Palacio de Justicia Sincelgo Torre AB Piso 3.

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux residente de obra

SISO

5 Oficios varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys, martillo demolidor

Actividades realizadas:

• Se realiza instalación polisombra en parte externa de oficinas que quedan al frente del punto de descarga de escombros

• Se realiza recorrido de obra con Supervisión de obra, Interventoría de obra, Ing eléctrico entidad, Ing eléctrico contratista, contratista (Residente y auxiliar obra), Ing aires acond entidad

Se inicia 8:30 pm, temas tratados: Paredes afectadas por mangueras aa se realizarán rescates y machos en borde interno pared, pendiente por definir si el baño dirección se le instalará ventana o extractor, las Ventanas en perfil no se realizará corte o demolición de muro, se respetarán los vanos y se instalarán ventanas alternas fija-proyectante-fija-proyectante, en la parte superior de las Ventanas se instalará perfil para instalación cielo raso.

En baño Damas/Caballeros en placa piso se fundirá viga para darle soporte al muro en T.

En la zona jardinera baños se realizarán nichos las puertas Ventanas grandes ubicadas en dirección y contratación se cambiará por puerta corrediza de

- 1.5m, el restante se levantará muro con machones.
 - Se continúa con la demolición plantilla en antigua oficina pagado primero laboral del Circuito.
 - Se realiza descarga de escombros por ducto.
 - Se realiza cargue de escombros en Volco.
 - Se define en comité levante de los vanos que quedan después de desmontar cajones y tapas de drywall debajo de ventanas, levante en bloque 0.09.
 - Se realiza desmonte de ventana y marcos asociados a la ventana desmontada; actividad realizada en ventana por donde se subirán los materiales para Piso 3.
 - Se continúa con el reciclaje de material tipo tuberías, canaletas, aluminio restante de las demoliciones y desmontes de drywall.
 - Una vez finalizada la jornada laboral, se realiza ASEO; se señaliza con cinta peligro y se tapa con tela verde el acopio restante luego del cargue.
- Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 30 de mayo de 2026

Palacio de Justicia Binclejo Torre AB Piso 3

⇒ personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux residente de obra

5:50

5 oficios varios

2 oficiales

⇒ Herramientas y equipos. Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza entrega material para reciclaje y Correcinarte.
- Se continúa con armado de vigas amarré y machones (cancastos)
- Se instala acero sobre muros para Vigas de amarré
- Se continúa con instalación de refuerzo para machones
- Se funden machones en muros levantados área oficina de sistemas.
- Se continúa con la demolición de plantillas faltantes área de contratación
- Una vez realizado el cargue del material para reciclaje, se realiza acoso y queda sacateado y tapado escombro en parte externa Torre AB

Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Hoyes 31 de marzo de 2026

⇒ Palacio de Justicia Sincaligo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

5:00

5 Oficiales Varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y equipos Herramientas Manuales, buggys.

Actividades realizadas:

- Se realiza cargue de volco de escombros acopiados en parte externa Torre AB.
 - Se soben materiales a traves de la fachada usando polipasto.
 - Se realiza traslado de bloques de parque banderas a punto sobre materiales, parte externa Torre AB.
 - Se continúa con levante de muros bloques 0.09 en oficina asistencia legal cabro coactivo.
 - Se continúa con demolición de plantilla faltante por demolir de antigua oficina Juzgado primero laboral de circuito.
 - Se realiza descarga de escombros a travez de ducto y se dejan acopiados en parte externa Torre AB.
 - El escombro acopiado se tapa con tela verde y se señala con cinta peligro.
- Fin de actividades. 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Notas 31 de marzo de 2026

Palacio de justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

5:50

5 oficinas varios

2 oficiales

= Herramientas y equipos: Herramientas Manuales, buggys

Actividades realizadas:

- Se continúa con anclado del refuerzo de machones en área Sala de juntas y dirección y se mantienen vigas de anclaje (refuerzo)
- Se realiza aso en obra
- Se finalizó la descarga de escombros de las demoliciones realizadas, queda pendiente por intervenir con demolición la antigua oficina área administrativa, zona que se está utilizando como bodega. Queda pendiente demolición de vanos en donde se encuentran los 2 tableros de distribución eléctrica y ventana pendiente en nueva oficina de Contratación dado que los escombros caen en el techo de oficina CCTV.
- Se continúa subiendo material hasta piso 3 utilizando sistema eléctrico instalado (por parte)
- Se continúa con levante de muros en nueva oficina asistencia legal cobro coactivo.
- Se realiza trazado de muro 0.09 fachada por levantar en nueva oficina sistemas, en donde se había realizado demolición de muro drywall (diagonal).
- Se realiza traslado de bloques desde parque banderas hacia punto de subida materiales.
- Por parte personal mantenimiento entrada realizan el sellado de puerta acceso a torre en drywall.
- Se realiza armado de acero, anclado y fundida de machones en nueva oficina asistencia legal cobro coactivo.
- Se continúa con la instalación de refuerzo

Vigas de cimbra en muros baños damas/caballeros
Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra Residente de Interventoría

Miércoles, 24 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar Residente de obra

Siso

5 Oficiales varos

2 Oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Manuales, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza cargue del escombros aceptado en punto optima Torre AB
- Se realiza subida de material utilizando equipo eléctrico (polipasto)
- Se continúa con la fundida de machón en pared a resaca en donde se sacaron tuberías aires acondicionados; se realiza llenado de las zunchas en paredes con mezcla concreto.
- Se realiza traslado de bloques de pasapanderos hacia punto subida de materiales
- Por lluvia se para actividad de subida de materiales.

Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente Interventoría

Miércoles, 01 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00am

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficios Varios

2 Oficiales.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades Realizadas:

- Se continúa resanando con relleno mezcla las Zanja dejadas por los autos acondicionados (Guberna).
- Se inicia levante de muro en pared adicional en oficina dirección y en oficina psicología.
- Se continúa con amarrado de refuerzo para machones.
- Se realiza demolición de plantilla en baño en donde va pared divisoria interna baños damas / caballeros para poder fundir viga de soporte muro.
- Se continúa con subida de materiales desde parte externa Torre AB hacia piso 3 usando polipasto.
- Se inicia pared levante en pasillo interno área financiera.
- Se realiza traslado de bloques de parque banderas hacia punto de subida de materiales.

• Llegada de cemento a obra.

Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Intervención

Sábado 04 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelero Torre AB Piso 3

⇒ Personal de Obra:

Residente de obra

Hora Inicio 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficiales varones

2 Oficiales

→ Herramientas y equipos Herramientas Menores, buggys

Actividades Realizadas:

- Se realiza traslado de bloques de parque ben-derus hacia punto subida de materiales.
 - Se continúa con subida de materiales desde parte externa Torre AB hacia piso 3.
 - Se realiza anclado de machones en pared levantada de pasillo interno área financiera.
 - Llegada de tubera para pozantes muros parte eléctrica y aires acondicionados.
 - Se realiza amarré refuerzo para viga de soporte muro divisorio pared central baño Damas / cabederos.
 - Se actualizan planos de obra, se imprimen y se pegan en paredes obra Piso 3.
- Fin de actividades: 5:00 pm.
- Se realizó ubicación de ductos eléctricos - Datos en obra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 04 de abril de 2026

Palacio de justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra Hora Inicio: 7:00am

Aux Residente de obra

Siso

5 oficios viejos

2 oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys

Actividades Realizadas:

- Llegada de material (gravela) a obra.
- Se realiza instalación de refuerzo para machones de muros bloque 0.15
- Se realiza subida de material hacia piso 3 desde punto externo acopio Torre AB.
- Se realiza trazado de muros en área bienestar y nómina (oficinas nuevas)
- Se realiza desformateado de machones fundidos

Fin de actividades a 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo 05 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelgo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 oficios varios

2 oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza instalación de refuerzo vigas de amarre en paredes baños, se formaleceron vigas armadas y se funden.
- Se realiza subida de material desde punto acopio externo hasta piso 3
- Llegada de material a obra: Varillas, tuberías, hidrosanitarios

Fin de actividades 2:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría.

Junes 06 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelgo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 oficios varios

2 oficiales

Plomero

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Manuales, Buggys

Actividades Realizadas:

- Se continúa con el anclado de refuerzo de machos en área psicología.
 - Se realiza instalación tuberías Sanitarias en baños Damas/Caballeros.
 - Se realiza elevación de material desde punto acopio externo Torre AB hasta Piso 3.
 - Se realiza formateado de vigas amarré en área oficina nueva de sistemas.
 - Se realiza descarga de escombros por ducto hasta punto externo Torre AB.
 - Se funden vigas formateadas de área Oficina nueva de sistemas.
 - Se realiza limpieza de Zangas realizadas en plantilla baños Damas/Caballeros, retirando escombros producto de la demolición plantillas.
- Fin de actividades: 5:00pm.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves 06 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de Obra:

Residente de Obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de Obra

Siso

5 Oficios varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza recorrido de obra para verificar avances de obra, temas tratados: disposición de puertas batientes o conedizas, ubicación de ductos de datos y eléctrico, acabados tipo cielo raso, ubicación de Ventanas y tipos de ventanas.
- Se realiza recorrido de obra con interventoría en donde se definen todos de desagues arriba acondicionados, definiendo red principal en tubería Sanitaria pesada de 2", ramales por piso hasta paredes en 1" presión y tuberías por paredes en 3/4" presión; la entrega final se realizará en la red sanitaria de los baños ubicando sifón de 4"; recorrido realizado con Ing. Lidia Sanitana entidad, Supervisión de obra y aux. residente de obra.
- Se continúa con levanto sobre los vigas de amarr.
- Se realiza subida de material utilizando dispositivo eléctrico, desde punto externo torre AB hasta piso 3.
- Se realiza levante muro 0.09 en oficina Contratación
- Se realiza jornada de aspo en áreas intervenidas

Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente Interventoría

Ing. Hidro-sanitario Entidad.

Martes 07 de abril de 2026

Relatorio de Justicia Sincelago Torro AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

5150

50 ficos varios

2 oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza el des-formatado de vigas de cemento fundidas.
- Se realiza levante muro o.c. en oficina de asistencia legal sobre coactiva
- Se continúa con levante en bloque o.c. en oficina contratación.
- Se realiza levante bloque sobre vigas de cemento en baños Damas/Caballeros
- Se realiza recomezo de obra con Interventoría y supervisión de obra: se avala rescene de filos de muros demolidos, con mezcla; se realizan machones donde van puertas. En una puerta que estaba en antigua oficina asistencia social se hará levante en bloque o.c. Queda pendiente por definir si la red desagüe será acondicionada va por burlón o red Sanitaria, las juntas de expansión en bajantes baño de dirección. Si se puede cambiar la tubería 2" pesada por tubería 2" Ventilación, se cita al Ing Hidrosanitario de la entidad a reunión el día de mañana para definir estos temas.

Fin de actividades: 5:00 pm.

Nota: Se paran actividades por actividades de 2:40 - 4:10 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Supervisores de obra.

Martes 07 de abril de 2020

Palacio de Justicia Sincerojo Torre AB Piso 3

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficios varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades Realizadas:

- Se realiza caigüe de volteo con escombros acapados en parte externa Torre AB
- Se realiza levante mamposteria en vano puerta antigua oficina asistencia legal.
- Se inicia con el levante de muros en vanos donde se retiraron cajones debajo de ventanas en nueva oficina Sistemas.
- Se realiza recorrido de obra con Ing. Hidroscantano entidad en donde se define: la tubería principal de la red de desagüe aguas acondicionadas va en tubería sanitaria pesada de 2" La entrega de aguas artes acondicionadas se realizará en la red sanitaria por medio

- de sifón de 4"; los bajantes del baño directos llevan juntas de expansión de 4" en cada piso tanto en los bajantes de aguas sanitarias como en el bajante Ventilación de 4". El Ing. Hidro Sanitario solicita reazar apique en placa techo al lado de las 4 buitriones por donde bajan aguas lluvias y las aguas sanitarias del gimnasio. Solicita que las tuberías de presión que se van a usar para la red de desagüe son PDE 26 para 3/4" y 1", además toda la red debe estar forrada con Puda-tex 1", 3/4", 2" y el Sifón de 4" que entrega las aguas de los aires acondicionados forrado con cinta Puda-tex.
- Se continúa con levante mampostería bloqueado en Oficina Contratación y asistencia legal como coactivo.
 - Se reaza subida de materiales utilizando polipasto desde punto acopio externo Torre AB hasta piso 3
 - Se reaza orden y aseo en áreas Interventadas
Fin de actividades 5:00 pm.

Residente de Obra

Res de Interventores.

Ing. Hidro Sanitario

Supervisor Entidad

Miércoles 08 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Tome AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficiales varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys.

Actividades Realizadas:

• Se realiza instalación refuerzo para pared 0.15

• Se continúa con el armado de canasta de refuerzo para machones

• Se realiza anclado de machones con su respectivo epóxico

• Se realiza formateado de machone y se funden.

Fin de actividades: 5:00 pm.

Nota: Se paran actividades por mediodías de 10:00-11:00 am

Residente de obra

Residente de Interventoria

Miércoles 08 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Tome AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar Residente de obra

Siso

5 Oficiales varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza desformateado de machones fundidos
- Se realiza cimbrado de muro en área oficina sistemas
- Se realiza regata en muro para bebedero e pasillo
- Se realiza anclado de machones en nueva oficina asistencia legal cobro coactivo, se funde
- Se inicia con regata en plantilla para red desagüe aires acondicionados
- Se continúa con amarrado de acero para machos
- Se sacan escombros de zanjas realizadas para red desagües aires acondicionados.
- Llegada de bloques que permiten avance en actividad de levante.

Fin de actividades: 5:00 pm.

Nota: Se paran actividades de ruido por audiencia de 3:00-4:30

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 09 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de Obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

SISO

5 Oficios Varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Manuales, buggys

Actividades Realizadas:

- Se realiza desencofrado de machones fundidos
 - Se realiza trazado de muros y levante en oficina nueva bienestar
 - Se continúa con la subida de materiales de punto acopio externo hasta Piso 3
 - Se instala icopor como aislante entre muro y columnas para fundir machones
 - Se continúa con anclado de canastas de refuerzo para machones
 - Se continúa con demolición lineal de plantilla para red de agua caires acondicionados
 - Se realiza instalación de pasantes en vigas de amarré para poder fundir
 - Se realiza subida de materiales utilizando polipasto desde punto acopio externo Torre AB hacia Piso 3
 - Se inicia levante muro 0.15 en oficinas nuevos de bienestar
 - Se realiza formateado y fundida de machones en área oficina contratación
- fin de actividades 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 09 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincero Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar Residente de obra

8 o 0

5 o focos nuevos

2 oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, boga

Actividades realizadas:

- Se continúa con levante muro en oficina nueva de bienestar
- Se realiza demolición de pañetes desprendidos
- Se realiza limpieza de Zangas demolidas para red de desagüe aires acondicionado
- Se realiza levante en oficina de reunión en área contralación.
- Se realiza la instalación de formaleta para machones, se fonde.
- Se continúa con regata en muros para tuberías aires acondicionado.
- Se realiza aseo en áreas intervenidas.
- Se realiza recorrido en obra con el Supervisor de obra y el Ing. Hidrosanitario de la entidad quien da las siguientes directrices en cuanto a la red de desagües aires acondicionado: Se debe garantizar pendientes mayores o iguales al 1%, todos los tramos correspondientes a ramales y red principal se instalarán en tubería presión de 1", a excepción de la entrega en red Sanitaria que es de 1 1/4" a cada aire acondicionado se le hará señal en piso.

Fin de actividades: 5:00pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Inj. Hidrosanitario

Viernes 10 de abril de 2016

Palacio de Justicia Sincalago Tomo AB Piso 3

→ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00am.

Aux Residente de obra

Siso

5 oficios varios

2 Oficiales

→ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys

Actividades realizadas:

- Se continúa con la demolición lineal de Plantilla para red de desagüe aires acondicionados
- Se realiza des-formateo de machones fundidos
- Se realiza limpieza de zanjas realizadas en plantilla del escombros que cae producto de las demoliciones realizadas para red de desagüe aires acondicionados
- Se realiza formateo de machones y se funden.
- Se realiza anclado de machones
- Se reciben tuberías hidrosanitarias para avance baños y red desagüe aires acondicionados.
- Se realiza levante de muro sobre vigas de amarre fundidas.
- Se realiza amarre de canastas de refuerzo para vigas de amarre

- Se paran actividades por audiencias de 9:00-10:30am
 - Se realiza limpieza y retiro de tableros que se encontraban en parque banderas para entrega de espacio prestado para acopio de bloques.
 - Se continúa con armado de refuerzo para vigas de amarre.
- Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 10 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

→ Personal de obra:

Residente de obra

Inicio obra: 7:00 am

Auxiliar residente de obra

Siso

5 oficios varios

2 oficiales

→ Herramientas y equipos: Herramientas llenares, buggy

Actividades realizadas:

- Se continúa con demarcación lineal de plantilla para red desague arcos acondicionados
- Se realiza des-formateado de machones fundidos
- Se realiza anclado de canchales de refuerzo para machones, se formatean y se funden.
- Se reporta daño en la red eléctrica correspondiente a luces piso 2, debido a la demolición del lineal plantilla para red de arcos acondicionados, se arregla daño.
- Se continúa con la instalación de pasantes

en vigas de amarre, se formalizan y se funden en oficina psicología y contabilidad.

• Se continúa con armado de cercos de refuerzo para vigas de amarre.

• Se realiza aseo en áreas intervenidas.

Fin de actividad: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 11 de abril de 2025

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 03

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am,

Aux residente de obra

Siso

5 oficios varios

2 oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza desformateado de vigas de amarre fundidas
- Se realiza armado de refuerzo de vigas en oficina nueva bienestar, se formalizan y se funden.
- Se continúa con regata en paredes para red de desagüe aros acondicionados
- Se instalan pasantes en vigas amarre
- Se realiza instalación de tuberías de ventilación fachantes en baños Damas / Caballeros para realizar prueba de estanqueidad

- Se realiza subida de materiales desde punto acopio externo Torre AB hasta Piso 3.
 - Se realiza levante en vacíos debajo de las ventanas en áreas SST y bienestar.
 - Se realiza aseo en áreas intervenidas.
- Fin de actividades.

Sábado 11 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincero Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Auxiliar Residente de obra Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra

Siso

5 Oficiales varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Ylenas, buggy

Actividades realizadas:

- Se realiza desformateado de vigas amarradas fundidas.
- Se realiza levante sobre vigas de amarre.
- Se realiza demolición de pañete suelto sobre paredes antiguas.
- Se continúa con el levante de muros para tapar los vacíos debajo de ventanas en oficina nueva psicología y nómina.
- Se inicia actividades de pañete en pared lateral ventanas en oficina nueva de bienestar.
- Llegada de material (bloques) a obra, llegada de varillas y cemento para continuar con avance de obra.
- Se continúa con la subida de material desde punto acopio externo hasta piso 3.
- Se realiza aseo en áreas intervenidas.

Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Junes 13 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux residente de obra

Siso

5 Oficiales varos

2 oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza Formateo de piso y se funden vigas de cemento en área oficina administrativa
- Se realiza levante de muro sobre vigas fundidas
- Se coloca acopio externo con tableros y cama de materiales para la descarga de escombros
- Se realiza descarga de escombros utilizando ducto, para evacuación de escombros Piso 3 hasta punto acopio externo de escombros
- Se continúa con levante muros en oficina Sistemas
- Se termina actividad de descargue de escombros
- Se señala y se tapa con tela verde
- Se realiza jornada de aseo en obra una vez finalizadas las actividades.

Fin actividades: 5:00 pm

Nota: Parar actividades por audiencias de 9:45 am a 11:00 am

Residente de obra

Residente de Interventoría

Junes 13 de abril de 2026

Palacio de Justicia Simón Bolívar Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obras

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficiales

2 Oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herrerías, Herrerías, buggys

Actividades realizadas

- Se realiza desformateado de vigas fundidas
- Se continúa con levante muros oficina nueva Sistemas
- Se realiza formateado de vigas de amarre muros en oficina nueva asistencia logotipo como coactivo y se funden.
- Se realiza armado de canchales de refuerzo para machones en muros levantados
- Se realiza subida de material desde punto acopio externo hasta piso 3
- Se realiza fundida de machones en oficina nueva contratación
- Se realiza demolición de panelo viejo en paredes donde se realizó relleno paredes por sacada de tuberías sobre áreas acondicionadas
- Se realiza levante sobre viga amarre muro en oficina nueva a dirección

Alota: Se paran actividades por audiencias de 3:15 - 4:30 pm
 Fin de actividades: 5:00 pm

Presidente de Obra

Presidente de Interventoría

Martes 14 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Presidente de obra

Inicio Obra: 7:00 am

Aux residente de obra

Siso

5 oficios varios

2 oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza desformateado de vigas fundidas
- Se realiza levante de muro sobre vigas de amarré muros fundidos
- Se realiza desformateado de machones fundidos
- Se arman canastas de refuerzo para machones y vigas amarré muros.
- Se realiza instalación de formaleteros y se funden vigas de amarré muros en área Oficina administrativa.
- Se realiza picado de pañete (demolición) en parte inferior de ventanas fachada para unificar línea pañete.
- Se realiza recorrido de obra con Supervisión Contratista e Ing Hidrosanitario entidad.
- Se realiza fundida de machones

- Se realiza regata en paredes para arcos acondicionados
 - Se realiza instalación de tuberías de presión en paredes baños damas/caballeros.
 - Se realiza aseo en áreas intervenidas.
- Fin de actividades 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 14 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar residente de obra

350

5 Oficios varios

2 Oficiales

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Manuales, buggys

Actividades Realizadas:

- Se realiza armado de canchales de acero para refuerzo vigas de amarré.
- Se realiza encofrado y fundida de machón.
- Se realiza encofrado y fundida de vigas de amarré vigas.
- Se continúa con la demolición de pañete
- Llegada de material a obra (cemento)
- Se realiza demolición baño directora a solicitud de supervisión y avalado por interventoría para reubicarlo ampliando más la oficina de dirección y el baño de dirección

- Se realiza instalación tubo para prueba estanqueidad.
 - Se realiza levante sobre vigas de acero y muro ya fundidos.
- Fin de actividades. 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 15 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sinceltajo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra.

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar Residente de obra

350

5 oficiales

2 oficiales

1 electricista

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales y Buggys.

⇒ Actividades realizadas:

- Se realiza -formateado de machones y se funden.
- Se realiza subida de material de parte externa Torre AB hasta piso 3
- Llegada de material obra para ved desagues aires acondicionados
- Se realiza nuevo trazado baño dirección y se inicia levante de muros
- Se inicia actividad de regatas pared para tubos y cajas parte eléctrica.
- Se realiza -fundida de machón Percol fachada.
- Se realiza el armado de acero para viga

central que sostenía muro divisorio bajo Damas Caballeros. Recibida prueba estanqueidad por Intervent. Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 15 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelgo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am.

Auxiliar Residente de obra

5:00

5 obreros Varios

2 Oficiales

1 electricista

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, bug gys

Actividades realizadas:

- Se continúa con regata en paredes para cajas y tuberías eléctricas
 - Se instalan cajas y tuberías eléctricas en muros
 - Se realiza descarga de escombros acopiados en Piso 3 por medio del ducto hasta Puerto externa Torre AB
 - Se realiza fundida de viga central que sostenía muro divisorio bajo Damas/Caballeros.
 - Se realiza tapado de escombros, se señaliza.
 - Se realiza aseo en áreas intervenidas piso 3
 - Se realiza aseo escaleras
- Fin de actividades 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 16 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB piso 3

→ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 1:00pm

Asistir residente de obra

SISO

50 fierros Varios

20 fierros

1 electricista

→ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, boga

Actividades realizadas

- Llegada de material eléctrico, curvas, tubos, cajas.

- Se realiza subida de material por medio del polipasto, para elevar material de parte externa Torre AB hacia piso 3

- Se continúa con levante muros baño dirección.

- Se inicia levante muro central baño damas / Caballeros

- Se realiza fundida de machones en baño dirección.

- Se realiza descarga de escombros de Piso 3 hacia parte externa Torre AB por medio del duto

- Una vez finalizada jornada Se tapan escombros con tela verde, Se señalizan.

- Se realiza jornada de aseo.

Fin de actividades: 8:00 pm

Nota: Debido a evento realizado en el Palacio de Justicia

- el horario se modifico de 5:00 pm - 8:00 pm
- Se realiza comité de obra N° 10.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Jueves 16 de abril de 2026

Palacio de justicia Torre AB Piso 3 - Sincelejo

⇒ Personas de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar residente de obra

Siso

5 Oficios varios

2 Oficiales

1 electricista

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys

Actividades realizadas:

- Se realiza subida de materiales por medio de polipasto, desde parte externa Torre AB piso 1 hasta piso 3.
- Se continúa con levante muro central baño Damas/Caballeros.
- Se realiza anclaje de machones en baño dirección.
- Se realiza instalación de tuberías y cajas eléctricas en muros o fachada bienestar, SST.
- Se inicia actividad de picada de paredes.
- Se realiza instalación de refuerzo, encofrado y fundida de machones en baño damas/caballeros.
- Se realiza fundida de viga amarrando muros baño dirección.
- Se realiza aseo en áreas intervenidas.

Fin de actividades: 5 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 17 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincrolego - Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Aux residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Siso

5 oficios varios

2 electricos

1 Plomero 1 electricista

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Manuales, buggys
Palpastor

Actividades realizadas:

- Se realiza cargo de escombros acopiados en parte externa Tono AB.
- Finicizado cargo se realiza acopio de punta, acopio externo, se tapa escombro sobrante y se señaliza.
- Se continua con demolición de plantilla para red de agua antes acondicionados
- Se realiza desformateado de machones fundidos en baños damas/caballeros
- Se realiza desformateado de vigas de amarramos baño dirección.
- Se continúa con la sculptada de paredes antiguas en área SST.
- Se paran actividades que generan ruido por audiencias 8:40 - 10:30 am.
- Se inicia instalación de tuberías 1" forradas con robalex para red de agua antes acondicionados

- Se realiza levante muro sobre viga amarré muros en baño dirección
 - Se continúa con la instalación de tuberías y cajas para red eléctrica por muros.
 - Se realiza instalación refuerzo en vigas amarré muros baños damas/caballeros, se instalan pasantes eléctricos para interruptores.
 - Se realiza subida de materiales utilizando polipasto para elevar materiales desde parte externa Torre AB hasta Piso 3.
 - Se realiza coseo en áreas intervenidas.
- Fin de actividades 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 17 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincorpo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficiales

2 Oficiales

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys Polipasto.

Actividades realizadas

- Se realiza elevación de material usando polipasto para subir materiales obra desde parte externa Torre AB hasta Piso 3
- Se realiza levante de muros sobre vigas amarré fundidos en baños Damas/caballeros.

y en buena dirección.

- Recomido de obra con supervisión de obra e interventoría, se definen los muros para nichos en barras Damas/caballeros, se autoriza levantar muros en vanos debajo de Ventanas fachada
- Se hace recomido de obra con personal instalador aires acondicionados, en donde se define capacidad de aires acondicionados diámetros de cobre, recomidos de tuberías de cobre e identificación de buitonos q utilizar.
- Se realiza jornada de aseo
- Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 18 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincatejo Torre AB Piso 3

→ Persona de obra:

Residente de obra

Hora Inicio 7:00 am

Aux residente de obra

Sis o

5 Oficios Varios

2 Oficiales

→ Herramientas y Equipos: Alomamientos Menores, buggys Polipasto.

Actividades realizadas:

- Se realiza elevación de material usando polipasto, para subir materiales obra desde parte externa Torre AB hasta Piso 3

- Se realiza levante de muros para nichos en baños damas/caballeros.
 - Se realiza levante muros sobre vigas amane baño directora.
 - Se realiza instalación de refuerzo para machón fachada para soporte puerta pasillo área financiera.
 - Se realiza aseó áreas intervenidas.
- Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente Intervención

Sábado 18 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Auxiliar residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Sso

5 Oficiales Varios

2 Oficiales

1 Plomero

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, bugars Polipasto.

Actividades realizadas

- Se continúan regatas para red desagües áreas acondicionadas.
- Se continúa demolición plantilla para instalación de red desagüe áreas acondicionadas.
- Se realiza descarga de escombros acopiados en Piso 3, utilizando ducto de descarga para acopio escombros en parte externa Torre AB.

- Se acopian, -lapan escombros con tela verde y se señalizan.
 - Se realiza levante muros en Vanos debajo de Ventanas fachada principal, por oficina Dirección y sala de juntas.
 - Por parte personal mantenimiento realizan corte de cables datos y eléctricos que se encontraban en baño damas/ caballeros y oficina sistemas.
 - Se continúa con sacapicado de muros en área SST y Psicología.
 - Se realiza caso en áreas intervenidas.
- Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 20 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincalco Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficios Varios

2 Oficiales

1 Plomero

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys.
Polipasto.

Actividades realizadas:

- Se continúa realizando demolición plantillo para red desagüe aires acondicionados
- Una vez realizada zanjas para red desagües

aires acondicionados se realiza limpieza de escombros

- Se inicia actividad de pañete en oficina bienestar.
 - Se continúa levante de muros en vanos del jo de Ventanas Fachada principal.
 - Se realiza recobrimiento de tuberías 1" con tubutex para red desagüe aires acondicionados.
 - Se realiza recibo de obra con Supervisión interventoria, Ing Hidrosanitaria, se define cerrar todos los vacíos debajo de ventanas fachada principal a excepción del que tiene pasante red aires acondicionados que van de piso 2 a piso 4; Se define en baño dirección la distribución de Sanitario y lavamanos; se define luces de emergencia var por techo.
 - Se realiza elevación de materiales utilizando polipasto para subir materiales de parte externa Torre AB hasta Piso 3.
 - Llegada de materiales a obra.
 - Terminada jornada Se realiza aso de áreas intervenidas.
- Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra Residente de Interventoria.

Jones 20 de abril de 2016

Proyecto de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3.

⇒ Personal de obra.

Residente de obra

Aux Residente de obra.

Suso

Hora Inicio 7:00 am.

50-fierros varios

2 Oficiales

1 Plomero

1 electricista.

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores, buggys
Polipasto

Actividades Realizadas:

- Se continúa con la demolición de plantilla para red desagüe aires acondicionados
 - Realizadas las demoliciones para red desagüe aires acondicionados se realiza limpieza de escombros
 - Se continúa con actividad de peñete en oficina bienestar.
 - Se realiza elevación de materiales utilizando polipasto para subir materiales desde patio exterior Tono AB hasta Piso 3
 - Se continúa con levante muros en vanos debajo de ventanas Fachada Principal.
 - Se realiza regatas en muros e instalación de aguas y tuberías para red eléctrica.
 - Una vez terminada jornada laboral se realiza aseo de áreas intervenidas.
- Fin de actividades: 5:00pm.

Residente de obra Residente de Interventoria.

Martes 21 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar residente de obra,

8:50

5 Oficiales uenos

2 Oficiales

4 electricistas

1 Plomero

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys
Polipasto

Actividades realizadas:

- Se continúa con la demolición plantilla para red de agua y aire acondicionado
 - Se continúa con rogatas en muros para red eléctrica, se instalan cajas y tuberías.
 - Se continúa con pañete en oficina psicología
 - Llegada material a obra (arroz) se realiza traslado del material descargado hacia sótano
 - Se realiza subida de material desde parte externa Torre AB hasta Piso 3 utilizando polipasto.
 - Se continúa con pañete de muros levantados debajo de ventanas fachada principal
 - Una vez concluida actividad de acopio de arena, se realiza aseo y se taparientan escombros acopiados en parte externa.
 - Se realiza aseo en áreas intervenidas
 - Se desmantelan redes eléctricas por piso
- Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 21 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelgo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

500.

5 oficinas varios

2 oficiales

1 electricista

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys
Polipasto.

Actividades realizadas:

- Se continúa con regata en paredes para red de desagüe aires acondicionados
 - Se continúa con pañete muros en oficina nueva bienestar y en pared muro bajo fachada principal.
 - Llegada material a obra (tuberías y accesorios eléctricos)
 - Se realiza saucificado de paredes oficina psicología en muros antiguos
 - Se realiza línea de muros pañete en vanos puertas área bienestar y nómina.
 - Se continúa con regates para red eléctrica en muros, se instalan tubos y cajas.
 - Se realiza subida de material desde pastre externa Torre AB hacia Piso 3 utilizando Polipasto.
 - Se realiza aseo y señalización escombros externos
- Fin de actividades: 5:00pm

Residente de obra

Residente de Intervención

Miércoles 22 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar residente de obra

SISO

5 obreros varos

2 oficiales

1 electricista

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggie Polipasto.

Actividades realizadas:

- Se continúa con regatas en muros para red de desagüe para acondicionales
- Se continúa con pañete en muros pasillo
- Se continúa con regatas en muros para red eléctrica, se instalan tubos eléctricos conduit y cajas 4x4
- Se continúa con filo de pañete para puerta y se pañeta columna en área SST
- Se realiza subida de material desde planta externa Torre AB hasta piso 3 Utilizando polipasto.

Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría.

Miércoles 22 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelago Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar residente de obra

5150

50 horas uenos

2 oficiales

1 electricista

→ Planamientos y equipos Herramientas Menores, Buggys, Polipastos

Actividades realizadas:

- Se continúa con demolición de plantilla para red de agua, aires acondicionados
 - Se continúa con regata en paredes para red eléctrica, se instalan tubos conduit y cajas 4x4
 - Se realiza descarga de escombros acopiados en piso 3 hacia punto acopio externo Torre AB
 - Se realiza cargue de escombros en Volco
 - Una vez terminado cargue de escombros se realiza aseo, se tapa escombro sobrante y se señaliza.
 - Se realiza parilla de refuerzo para placa nicho en baños, se funden 2 placas
 - Se continúa con pañete muros en c/c Bntkaterón
 - Llegada de cemento a obra.
 - Se realiza elevación de material desde punto externo Fachada Torre AB hasta Piso 3
 - Se realiza instalación tuberas 1" recubiertas con subalox para red de agua aires acondicionados en zanjas hechas en plantilla
- Fin actividades - 3:00 PM

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 23 de abril de 2026

Palacio de Justicia Torre AB Piso 3 Sincelago

⇒ Personas de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar Residente de obra

Siso

5 Oficiales varios

2 oficiales

1 Plomero

1 electricista

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys, polipasto

Actividades realizadas:

- Se continúa con la demolición de plantillas para red desagüe aires acondicionados
- Se continúa con pañeto en paredes en área oficinas de sistema y en área Contratación
- Se realiza elevación de material desde punto externo Fachada Torre AB hasta Piso 3 utilizando polipasto
- Se realiza demolición de pañeto Suerte en pasillo
- Se realiza instalación de regas y tuberías en paredes para red eléctrica
- Se continúa con regata en paredes para red eléctrica
- Culminada actividades se realiza aspo en áreas intervenidas
- Se señalizan y tapan escombros externos

Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 23 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincorajó Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar residente de obra

Siso

5 Oficiales Varios

2 Oficiales

1 Plomero

5 Electricistas

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, bugsys, Polipasto

Actividades realizadas:

- Se continúa con regatas en muros para instalación de cajas y tuberías red eléctrica
- Se continúa saqueado de paredes para generar rugosidad en la aplicación de estuco
- Se realiza tendido red eléctrica por piso en área nueva SST.
- Se continúa con la aplicación de paneles en área nueva sistemas y asistencia legal cobro coactivo.
- Se señala área acceso al polipasto
- Se realiza elevación de material desde punto externo Fachada Torre AB hasta Piso 3 Utilizando Polipasto
- Se realiza aseo en áreas intervenidas

Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente Obra

Residente Interventoría

Viernes 24 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincerego Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar residente de obra

Siso

5 Oficios varios

1 Plomero

2 Oficiales

3 Electricistas

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Ylenares, bugars Polipasto.

• Actividades realizadas

- Se señaliza acceso de ingreso a Piso 4 para realizar actividad de elevación materiales
 - Se realiza elevación de material desde punto externo Fachada Torre AB hasta Piso 3.
 - Se realiza picado de pañete suelto.
 - Se continúa aplicando pañete en muros área Obra Coactivo
 - Se continúa con el corte en muro para cables y tuberías red eléctrica
 - Se continúa con la actividad de picado pañete y respado de pintura antigua.
 - Se realiza aseo en áreas intervenidas.
- Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 24 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincere, 0 Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Aux Residente de obra

SISO

5 Oficiales varios

1 Plomero

2 Oficiales

2 Electricistas

⇒ Herramientas y Equipos Herramientas Menores, buggys
Polipasto.

Actividades realizadas:

- Llegada de materiales a la obra y acarreo
- Se continúa realizando demolición de plantilla para red desagüe aires acondicionados
- Se continúa con segata de muros para instalación de cajas y tubos red electricas
- Se recibe y señaliza acceso a gimnasio Piso 4 para subida de material a Piso 3 desde parte externa Torre AB
- Se continúa con la aplicación pañete en muros previo acceso a Contratación y a dirección.
- Se formatean, se re-fuerzan placas para nicho en baños Dames / Caballeros y se funden 2 placas / nichos
- Se continúa con picada de paredes y ras-

Pado de muros.

- Se realizan filos de pañetes acceso a nomina, psicología y sistemas.
- Se continúa con pañete en muros drenaje Sistema
- Se realiza demolición plantilla en baño dirección para red Sanitaria.
- Realizadas actividades se hace aseo, se señaliza y se tapan excombrus
fin actividades: 5:00 pm

Residente obra

Residente Interventoría

Sábado 25 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincorpo TonoAB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Aux Residente de obra

Siso

2 Oficiales

5 Oficios varios

1 Plomero

4 Electricistas

Inicio de obra: 7:00 am.

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys
Polipasto.

Actividades Realizadas:

- Se continúa con demolición de plantilla para instalación red Sanitaria baño dirección.
- Se realiza elevación de materiales desde

parte externa Torre AB hasta Piso 3 utilizando polipasto.

- Se continúa con regata paredes para instalación de aguas y tuberías para red eléctrica.
 - Se continúa con pañete en muros área apoyo a dirección
 - Se realiza instalación red sanitaria baño dirección
 - Se recibe material en obra para avance actividades.
 - Se realiza recomido en las diferentes áreas a intervenir con pasantes placas entre piso de tuberías sanitaria y ventilación de 4"
 - Se realiza demolición plantilla e instalación tuberías para TV en área Sistema
 - Terminados las actividades se realiza aseo.
- Fin actividades: 5:00 pm.

Residente obra

Residente Interventor

Sábado 25 de abril de 2022

Procuraduría de Justicia Sincargos Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Aux Residente de obra

Inicio de obra: 7:00 am

Sis 0

5 oficios varios

2 oficiales

1 Plomero

4 electricistas

→ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys
Polipasto.

Actividades Realizadas.

- Se señaliza y recibe área gimnasio para subir material utilizado polipasto desde parte externa Torre AB hasta Piso 3
- Se reciben áreas a intervenir para actividad pesantes tuberías sanitarias y ventilación para baño directora, se tapan escritorios con plástico negro para protegerlos y se cubren los muebles cercanos protegiéndolos con plástico negro; se realiza actividad de demolición de placas; se instalan tuberías pesantes tanto de ventilación como sanitaria 4" en placas piso 3-2, piso 2-1, piso 1-sótano; una vez realizada la actividad se arroja y se entregan espacios en las mismas condiciones en que se recibieron.
- Se realiza elevación de materiales desde parte externa Torre AB hasta Piso 3 usando polipasto
- Se realiza demolición de las 3 ventanas, pendientes por demoler en área contralación utilizando personal alpinista; una vez realizada actividad se realiza aseo de áreas recogiendo escombros; se tapan ventanas con plástico negro. Pevio a esta actividad se solicitó y por parte de la entidad movieron plantas ornamentales del patio colindante con las 3 ventanas para evitar daños con la caída de escombros y se señalizó con cinta peligro.
- Para la realización de los pesantes en la esfera de dirección se realizó corte de motorazo.

- Se realiza orden y aseo en toda la obra.
 - Se continúa con aplicación de pañete en muros baño Damas/caballeros y pasillos hacia dirección
- Término de actividades 5:00 pm

Residente de obra

Presidente de Interventoría

Junes 27 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincerejo Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Aux Residente de obra

Inicio de obra 7:00 am

Siso

5 Oficiales varios

2 Oficiales

1 Plomero

1 electricista

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys Polipasto.

Actividades Realizadas:

- Se continúa con la elevación de material desde parte externa Fachada Tono AB hasta Piso 3 utilizando Polipasto.
- Se realiza Filos con alfaja en ventanas demolidas
- Se realiza desmantelamiento de redes cámaras y datos en pasillos piso 3 y se desmantelan Acabados eléctricos.
- Se inicia Pintura negra en techo pasillo para el contraste del cielo raso en

- Se realiza acortamiento provisional con instalación puerta de madera, en escaleras.
- Se recibe materiales en obra para avanzar actividades
- Se hace recorrido de obra con Ing eléctrico Supervisión, Supervisión obra, Residente contratista Interventoría, en donde se avala retiro de cables cámaras, cables de datos y desmantelamiento de los dos tableros, desmante de luminarias
- Se realiza raspado de paredes de pintura la cual en la mayoría de área presenta desprendimientos y está suelta.
- Se realiza picado de paredes (pañete)
- Se realiza desmante de luminarias en pasillos
- Se realiza resane de los huecos en techo de donde se retiraron las luminarias
- Se realiza jornada de aso en áreas intervenidas
Fin de actividades, 5:00 pm.

Residente Obra

Residente Interventoría

Junes 27 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincero Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Aux Residente de obra

Siso

Inicio de obra, 7:00 am

2 oficiales

5 Oficiales varios

5 Electricistas

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys polipasto

Actividades realizadas:

- Se continúa con el raspado de pintura de paredes
 - Se continúa con el picado de pañete de paredes
 - Se continúa con pintura negra en techo pasillos
 - Se reciben materiales para continuar actividades de obra
 - Se recibe área piso 4 para acceder a pasillo y realizar izado de materiales desde parte externa Torre AB Piso 1 hasta Piso 3
 - Se continúa con aplicación de pañete oficina Psicología; se instalan mallas tipo vena en regates realizadas en paredes para red de agua aire acondicionado y redes eléctricas.
 - Se continúa con la instalación de tuberías eléctricas por piso en área común y bienestar.
 - Se continúa con aplicación de pañete en fillos puertas pasillo hacia contraloría
 - Finalizada jornada se realiza aseo.
- Fin de actividades: 5:00 pm

Residente Obra: Coordinador Interventor:

Martes 28 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincero Torre AB Piso 3

→ Personal de obra:

Residente de obra

Inicio obra: 7:00 am

Aux Residente de obra

Sis v

2 oficiales

5 Oficios varios

3 electricistas

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys Polipasto.

Actividades Realizadas.

- Se reciben materiales para continuar con actividades Programadas
 - Se accede a Piso 4 para utilización de Polipasto. Se realiza subida de materiales desde Pante externa Torre AB hasta Piso 3.
 - Se continúa con el raspado de pintura en paredes.
 - Se continúa con la aplicación de pintura en Techo pasillo color negro.
 - Se instalan mallas tipo vena en paredes donde se han realizado regatos.
 - Se continúa con la aplicación de panela en paredes nuevas oficina número y bienestar.
 - Se realizan cesanos en techo pasillo para emparejar Superficie y poder aplicar pintura negra.
 - Se inicia aplicación de estuco en paredes pasillo.
 - Se realiza con la instalación de tuberías eléctricas por piso en área oficinas nuevas de Sistema.
- Fin de actividades 5:00 pm.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Martes 28 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincolejo Tona AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Aux Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Siso

2 oficiales

5 oficios varios

5 electricistas

1 plomero

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, boqas
Barrido.

Actividades Realizadas:

- Se realiza instalación de mallas tipo vena en paredes donde se han realizado regatas.
- Se continúa con la aplicación de estuco en paredes oficina psicología y SST primera mano.
- Se continúa con el raspado de pintura en Paredes
- Se continúa picando pañete paredes para posterior aplicación de estuco.
- Se realiza instalación de cajas y tuberías para red eléctrica en paredes.
- Se realiza la instalación de bandejas tipo malla para red eléctrica principal por pasillos en techo.
- Se realiza instalación de tuberías de ventilación 4" y Sanitona 4" en techo sótano para baño Dirección Piso 3. Para realizar la actividad se despeja área y se protegen con plástico negro muebles de oficina almacen sótano.

- Se reciben materiales que garantizan continuidad de avance actividades
 - Se continúa instalación de bandejas tipo malla para red eléctrica principal que van por techo en presillos
 - Se aplica pintura en paredes oficina Sistema
 - Se realiza aseo en áreas intervenidas.
- Fin de actividades: 5:00 pm

Residente Obra

Residente Inventoria

Miércoles 29 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincerejo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

(Hora Inicio: 7:00 am.

Aux Residente de obra

Siso

2 Oficiales

5 Oficios varios

1 Plomero

2 electricista

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, buggys
Polipasta

Actividades Realizadas

- Se realiza subida de materiales por medio de polipasta, para elevar materiales de parte externa Torre AB hasta Piso 3
- Se reciben materiales para continuar con avance actividades
- Se continúa con la instalación de bandejas tipo

malla para red eléctrica y de datos principal que va por techo en pasillos.

- Se continúa con la aplicación de pañete en baños damas/caballeros y área contigüa.
 - Se continúa con la instalación de cajas y tuberías para red eléctrica en muros.
 - Se realiza descarga de escombros acumulados en Piso 3 a través de ducto instalado en fachada AB.
 - Se realiza cargue de escombros acumulados en parte externa a través de volco para disposición final.
 - Se continúa con demolición plantilla baño dirección y se instalan tuberías sanitarias.
 - Una vez realizadas las actividades se asean áreas intermedias, se señalizan y tapen escombros con tela verde acopiados en el exterior Torre AB.
 - Se realiza recorrido de obra con supervisión obra residente obra, Ing Sistemas entidad, interventoría en afuera sistemas; en donde se solicita por la entidad controlante la instalación de nuevos puntos de datos, 4 por cancheta y 2 por paredes, instalación pte TV en pasillo.
- Fin de actividades: 5:00 pm

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 29 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincelajo Torre AB Piso 3

→ Personal de obra:

Residente de obra

Aux Residente de obra

Siso

Hora Inicio 7:00 am

2 oficiales

5 oficiales varios

1 técnico refrigeración

Plomero

3 electricistas

2 estucadores

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys, Polipastos

Actividades realizadas:

- Se hace recorrido de obra con supervisión obra Ing encargado cámaras de seguridad, personal cámaras, Ing residente; se define ruta del cableado cámaras por bandejas instaladas.
- Se hace recorrido de obra Ing residente obra y técnico refrigeración; se cablearon regatos de aros acondicionados para cobre y cantidades de tuberías de cobre.
- Se continúa con aplicación de pañete para fisuras puertas
- Se realiza regato en paredes para aros acondicionados, para instalación tubería cobre definidos por técnico refrigeración.
- Se instalan mallas vena en paredes donde se hizo regatas
- Se continúa con la instalación de tuberías sanitarias para el baño directora.
- Se continúa con el tendido eléctrico por piso de tuberías eléctricas
- Se continúa con el picado y raspado de paredes donde se aplicará estuco.
- Se continúa con la aplicación de estuco

en paredes

- Terminadas las actividades, se realiza aseo en áreas intervenidas.
- Fin de actividades.

Residente de obra

Residente de Intervención

Jueves 30 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincergo Torre AB Piso 3

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Aux Residente de obra

Siso

5 Oficios varios

2 Oficiales

3 electricistas

1 Plomero

2 Estucadores

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Manuales, bugsys
Polipasto.

Actividades en obra:

- Se realiza elevación de materiales utilizando polipasto para subir materiales de parte externa Torre AB. Pisos hasta Piso 3.
- Se continúa con actividad de estuco en paredes pasillo hacia Contratación
- Se instalan mallas vera en regatas de paredes
- Se continúa con la realización de regatas en paredes para redes eléctricas
- Se continúa con la instalación de bandejas tipo malla en techo para red principal por pasillos

Norma

- Se hace instalación de alero raso para muestra de dilataciones
 - Se continúa con la aplicación de panele en muros oficina Sala de junta dirección y dirección.
 - Se continúa con el picado de paredes y respaldo de pintura para poder aplicar estuco
 - Se continúa con la instalación de tuberías para red eléctrica por piso en oficina financiera.
 - Se realiza recorrido de obra con Supervisor de obra, interventoría, director de obra; en recorrido se determina cambiar punto que acondicionado de oficina dirección y se solicita punto Tu en pasillo lateral baños damas/caballeros; Se solicita instalación de bandeja (canaleta) en oficina Sistema para adicionar 4 puntos por canaleta y 1 punto mas en paredes para un total de 5 puntos adicionales para datos; se solicita adicional de 4 puestos más de trabajo en oficina SST y 2 puestos más de trabajo en oficina admn.
 - Se realiza demolición parte superior en muros por donde pasaban bandejas tipo malla para red eléctrica.
 - Se reciben materiales en obra para continuar actividades programadas.
- Fin de actividades.

Residente de obra

Presidente de Interventoría

Jueves 30 de abril de 2026

Palacio de Justicia Sincergo Tono AB Piso 3

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Aux Residente de obra

Hora Inicio: 7:00 am

Siso

2 oficiales

5 oficiales varios

1 plomero

2 electricistas

2 Estucadores

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores, buggys
Polipasto

Actividades realizadas

- Se realiza elevación de materiales utilizando polipasto para subir materiales desde patio externa Fachada Tono AB hasta Piso 3
 - Se continúa con aplicación de estuco en paredes
 - Se continúa con la instalación de mallas tipo bandera para red eléctrica principal por pasillos.
 - Se recibe material en obra para continuidad de actividades en avance de obra.
 - Se realiza desmonte de luminaria en oficina CCTV, se realiza corte en cielo raso para verificar inspección de estructura techo CCTV actividad realizada con previa solicitud y autorización por parte de la entidad para ingreso al espacio citado.
 - Se continúa con la instalación de malla tipo Vena en regatas realizadas en paredes
 - Se realiza descarga de escombros acumulados en Piso 3 utilizando ducto de descarga, finalizada la descarga se tapan escombros y se señalizan
 - Se refuerzan columnas bajantes tuberías sanitaria y de ventilación con anclajes en paredes y riel; tuberías bajo dirección
- Fin actividades: 5:00pm
- Se inicia actividad de fundido de Plantillas con malla electrosoldadas.

Norma

Residente de obra

Residente de Interventoría.



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATO MC 26 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 003
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026**



BITACORA DE OBRA
