



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META
EDESA S.A E.S.P

LISTA DE CHEQUEO DE SUSPENSIÓN
/AMPLIACION DE SUSPENSION



IN - FT - 16

Versión: 03

Mayo 19 de 2020

CONTRATO No. 120 DE 2023

FECHA DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$11.652.556.357,00) MCTE

OBJETO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATISTA: CONSORCIO PTAP VISTA HERMOSA // RL LUIS ARIEL ARIAS OTERO

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL VISTA-PTAP-2023 // RL RAFAEL SANDOVAL GONZALEZ

CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 124 DE 2023

	DESCRIPCION	SI	N/A
1	INTERVENTOR/SUPERVISOR		
a	Viabilidad solicitud de suspensión por parte del interventor/supervisor	X	
b	Acta de suspensión CL-FT-15 o Acta de ampliación a la suspensión CL-FT-20	X	
c	Informe ejecutivo IN-FT-12 actualizado a la fecha de suspensión del contrato	X	
2	CONTRATISTA:		
a	Solicitud de suspensión debidamente justificada	X	

Firma Responsable:

Rafael Sandoval Gonzalez
Director de Interventoria

Contrato de Interventoria 124 de 2023

(FIRMA INTERVENTORIA ESPECIALIZADA / EDESA S.A E.S.P)



U.T. VISTA-PTAP-2023.

NIT.901.761.840-3

Villavicencio-Meta, 16 de junio de 2026

No. 19-2026

Ingeniero:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EDESA S.A. E.S.P.

WILLIAM ROJAS CARREÑO

DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO

YENNY ANDREA CRISTANCHO FRANCO

COORDINADORA DE INTERVENTORÍAS EDESA S.A. E.S.P.

Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 120 DE 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

ASUNTO: Viabilidad ampliación No. 3 a la Suspensión No.1- Contrato de Obra No. 120 de 2023

En cumplimiento de las funciones designadas en el contrato de interventoría No. 124-2023 y atendiendo la solicitud de **AMPLIAR LA SUSPENSIÓN No.3**, de la firma contratista CONSORCIO PTAP VISTAHERMOSA al contrato de obra No. 120 de 2023, mediante comunicación formal No. PTAPVH_0266-2026 de fecha 11 de junio de 2026, solicitó la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 por el término de dos (02) meses, argumentando la persistencia de las condiciones técnicas y administrativas que impiden la reanudación de la etapa final del proyecto, correspondiente al arranque y puesta en marcha de la PTAP, se describen las razones técnicas que persisten:

Se evidencia que los aspectos relacionados con la definición del punto de conexión y la legalización de la acometida eléctrica ante la EMSA, requerimientos indispensables para la energización y operación inicial de la planta, continúan en trámite sin que a la fecha exista confirmación oficial sobre la factibilidad del servicio. En consecuencia, se mantienen las restricciones técnicas previamente advertidas para la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

Lo concerniente a la disponibilidad del caudal requerido para las pruebas operativas, se verificó la comunicación remitida el 04 de junio de 2026 por esta Interventoría a la Interventoría CONSORCIO INTERJERICO-73, correspondiente al Contrato de Obra No. 069 de 2023, mediante la cual se solicita si están dadas las condiciones necesarias para el suministro de agua hacia la PTAP.

En respuesta, mediante oficio INTERJER73_404-2026 del 05 de junio de 2026, la interventoría del proyecto de la línea del acueducto informa que, aún persisten las condiciones que no permiten llevar agua cruda al desarenador y la operación y puesta en marcha de la PTAP.

Se encuentran pendientes la ejecución y/o culminación de obras relacionadas con los componentes de: captación, aducción y desarenador; sin las cuales no se puede generar el caudal requerido y así realizar las pruebas necesarias para la operación de dichos componentes.

En virtud de lo anterior, esta Interventoría concluye que subsisten causas técnicas, operativas y externas, las cuales imposibilitan la reanudación normal del Contrato de Obra No. 120 de 2023. En consecuencia, se considera procedente y justificada la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 por el término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento de la

Correo Electrónico: utvistaptap2023@yahoo.com

 edesa - E.S.P. -	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.		 GOBIERNO DEL META	CL - FT - 20
	ACTA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN			Versión: 06
				Enero 20 de 2025
				Página 1 de 5

**ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN No 1
CONTRATO DE OBRA No 120 DE 2023**

FECHA DEL CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2023
BPIN:	2022005500290
CONTRATISTA:	CONSORCIO PTAP VISTAHERMOSA
NIT.	901.759.377-8
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARIEL ARIAS OTERO
C.C.	86.053.072 DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL VISTA-PTAP-2023
NIT.	901.761.840-3
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ÁNGEL SANDOVAL GONZÁLEZ
C.C.	79.339.280 DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO:	VISTAHERMOSA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$11.652.556.357,00 MCTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA PAGO DE ANTICIPO:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ANTICIPO:	\$5.826.278.178,50
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	50%
FECHA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE PRORROGA No. 1:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE PRORROGA No. 1:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 1:	08 DE ENERO DE 2025
ACTA DE PRORROGA No. 2:	08 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE PRORROGA No. 2:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 2:	23 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS:	27 DE ENERO DE 2025
ACTA DE PRORROGA No. 3:	23 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE PRORROGA No. 3:	CUATRO (04) MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 3:	23 DE AGOSTO DE 2025

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.			CL – FT – 20
	ACTA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN			Versión: 06
				Enero 20 de 2025
				Página 2 de 5

ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN No 1 CONTRATO DE OBRA No 120 DE 2023

ACTA PARCIAL No. 1:	03 DE JUNIO DE 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 1:	\$ 5.992.366.257,00
ACTA DE PRORROGA No. 4:	22 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE PRORROGA No. 4:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 4:	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS:	31 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA PARCIAL No. 2:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 2:	\$ 3.965.392.630,19
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1:	23 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	17 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	23 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1	20 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	23 DE JUNIO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:	89,62%
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$11.652.556.357,00
FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN ACTUALIZADA:	23 AGOSTO DE 2026

Nota: Este cuadro relaciona la información en orden cronológico de cada contrato

En Villavicencio, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año 2026, se reunieron el ingeniero LUIS ARIEL ARIAS OTERO Representante Legal del CONSORCIO PTAP VISTAHERMOSA y el ingeniero RAFAEL SANDOVAL GONZÁLEZ Representante Legal del UNIÓN TEMPORAL VISTA-PTAP-2023, con el objeto de ampliar la suspensión N° 1 del contrato de obra

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.		CL – FT – 20
	ACTA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN		Versión: 06 Enero 20 de 2025 Página 3 de 5

ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN No 1 **CONTRATO DE OBRA No 120 DE 2023**

No. 120 de 2023, durante un periodo comprendido entre el día 21 del mes junio del año 2026 hasta el día 20 del mes agosto del año 2026, para un total de sesenta (61) días. En consecuencia, la fecha de reinicio de las actividades será del 21 de agosto de 2026 para una terminación actual del 23 de agosto de 2026.

Teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

La presente ampliación de la Suspensión No. 1 se fundamenta en la persistencia de las condiciones técnicas, operativas y administrativas que dieron origen a dicha medida, las cuales continúan afectando la ruta crítica del proyecto e impiden objetivamente la reanudación de las actividades correspondientes al arranque y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

En primer lugar, es preciso señalar que los trámites relacionados con la definición del punto de conexión, la legalización de la acometida eléctrica y la obtención de las autorizaciones requeridas para la energización de la PTAP continúan en gestión ante la Empresa de Energía del Meta – EMSA, sin que a la fecha se cuente con una respuesta definitiva que permita habilitar el suministro de energía eléctrica indispensable para la operación de la infraestructura.

La ausencia de dicha disponibilidad eléctrica imposibilita la puesta en funcionamiento de los equipos electromecánicos, sistemas de automatización, instrumentación, control y dosificación, así como la ejecución de las pruebas funcionales, operativas y de desempeño necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la planta previo a su entrada en operación.

De otra parte, en lo relacionado con la disponibilidad del caudal de diseño requerido para el arranque y puesta en marcha de la PTAP, la Interventoría del Contrato de Obra No. 120 de 2023 solicitó a la Interventoría del Contrato de Obra No. 069 de 2023 información respecto de las condiciones técnicas necesarias para programar dichas actividades.

En respuesta a dicha solicitud, mediante oficio No. INTERJER73_404-2026 del 05 de junio de 2026, la Interventoría del Contrato de Obra No. 069 de 2023 informó que dicho contrato se encuentra actualmente suspendido y que aún existen actividades pendientes de ejecución asociadas a los componentes de captación y aducción, las cuales resultan indispensables para garantizar el funcionamiento integral del sistema de abastecimiento.

Igualmente, se indicó que, previo a cualquier actividad de puesta en marcha, deberán ejecutarse y aprobarse satisfactoriamente las pruebas hidrostáticas de la tubería instalada, con el fin de verificar la hermeticidad, estabilidad estructural y adecuado comportamiento hidráulico de la infraestructura, condiciones técnicas indispensables para autorizar su entrada en operación.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.			CL – FT – 20
	ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION			Versión: 06
				Enero 20 de 2025
				Página 4 de 5

ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN No 1 CONTRATO DE OBRA No 120 DE 2023

En consecuencia, conforme a la información suministrada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 069 de 2023, actualmente no es posible programar ni ejecutar las actividades de arranque y puesta en marcha de la PTAP, toda vez que persisten condiciones técnicas y operativas ajenas al alcance del presente contrato que impiden garantizar la funcionalidad integral del sistema y la adecuada ejecución de las pruebas requeridas.


La presente ampliación de la suspensión se sustenta en circunstancias técnicas y operativas ajenas a la voluntad de las partes, que actualmente impiden la ejecución normal de las actividades contractuales. Así mismo, se formula en observancia de los principios que rigen la contratación estatal, consagrados en la Ley 80 de 1993, especialmente los principios de planeación, coordinación, responsabilidad, economía y eficiencia, orientados a garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la adecuada utilización de los recursos públicos y la mitigación de riesgos que puedan afectar la funcionalidad y puesta en operación de la infraestructura objeto del proyecto.

En este sentido, la presente ampliación no implica modificación del alcance contractual ni genera reconocimiento económico adicional alguno a favor del contratista o de la interventoría, manteniéndose inalteradas las condiciones económicas inicialmente pactadas y, por consiguiente, el equilibrio económico del contrato.

Por lo anterior, mientras subsistan las circunstancias descritas y no se cuente con las condiciones técnicas necesarias para la ejecución de las actividades suspendidas, se mantiene la imposibilidad material y operativa de reanudar la ejecución del contrato, razón por la cual resulta procedente y técnicamente justificada la ampliación de la suspensión por el término establecido en la presente acta.

Las partes acuerdan que la ejecución contractual podrá reanudarse una vez desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión y se encuentren garantizadas las condiciones técnicas, operativas y administrativas requeridas para el normal desarrollo del objeto contractual, circunstancia que deberá constar mediante la correspondiente Acta de Reinicio.

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.



CONSORCIO PTAP VISTA HERMOSA

Nit. 901.759.377-8

R/L LUIS ARIEL ARIAS OTERO

C.C. 86.053.072 de Villavicencio

Contratista - Rep. Legal



UNIÓN TEMPORAL VISTA-PTAP-2023

Nit. 901.761.840-3

R/L RAFAEL ÁNGEL SANDOVAL GONZÁLEZ

C.C. 79.339.280 de Bogotá D.C.

Supervisor o Interventoría - Rep. legal

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.		CL – FT – 20
	ACTA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN		Versión: 08
			Enero 20 de 2025
			Página 5 de 5

ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN No 1
CONTRATO DE OBRA No 120 DE 2023

N.A.	
Firma	
Nombre:	
Cargo:	Coordinador de interventoría (si aplica)
Vo.Bo	

Firma	
Nombre:	JULIAN RICARDO LUNA PINZON
Cargo:	Apoyo a la gestión (Donde aplique)
Vo.Bo	

Firma	
Nombre:	WILLIAM ALEXIS ROJAS CARREÑO
Cargo:	Director Técnico Operativo (si aplica)
Vo.Bo	

Villavicencio (Meta), Junio 5 de 2026

INTERJER73_404-2026

Señores:

UNIÓN TEMPORAL VISTA-PTAP-2023**RAFAEL SANDOVAL GONZÁLEZ****REPRESENTANTE LEGAL**

Ciudad

REF.1: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068 DE 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD (NO INCLUYE PTAP) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL CASCO URBANO Y LAS VEREDAS GUADUALITO, PUERTO LUCAS, PUERTO ESPERANZA Y JERICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA"

REF.2.: CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD (NO INCLUYE PTAP) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL CASCO URBANO Y LAS VEREDAS GUADUALITO, PUERTO LUCAS, PUERTO ESPERANZA Y JERICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA"

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información sobre arranque y puesta en marcha de la PTAP

Cordial saludo,

En atención a su comunicación de fecha 04 de junio de 2026, mediante la cual solicita información respecto a la programación para el arranque y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), nos permitimos informar lo siguiente:


Actualmente, el Contrato de Obra No. 069 de 2023 se encuentra suspendido, situación que impide el desarrollo de actividades pendientes necesarias para garantizar las condiciones técnicas requeridas para el inicio de operación y puesta en marcha de los sistemas proyectados. En este sentido, a la fecha no es posible programar el llenado del desarenador ni la puesta en marcha de la PTAP, toda vez que aún se encuentran pendientes de ejecución y culminación obras complementarias asociadas a los componentes del sistema de captación, aducción y desarenador, las cuales son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento integral del sistema. De igual manera, previo a cualquier actividad de puesta en operación, resulta necesario realizar y aprobar satisfactoriamente las pruebas hidrostáticas de la tubería instalada, actividad fundamental para verificar la hermeticidad, estabilidad y correcto comportamiento de la infraestructura hidráulica, así como para garantizar la seguridad operacional del sistema antes de su entrada en funcionamiento.

Por lo anterior, mientras persistan las condiciones que dieron lugar a la suspensión contractual y no se ejecuten las actividades pendientes anteriormente descritas, no es técnicamente viable establecer una fecha para el arranque y puesta en marcha de la PTAP.

Una vez se reactive el contrato y se culminen las obras faltantes, incluyendo la ejecución satisfactoria de las pruebas hidrostáticas y demás actividades de verificación técnica requeridas, se informará oportunamente la programación correspondiente para el inicio de las actividades de puesta en operación del sistema.

Sin otro particular, estaremos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

**JHOAN SEBASTIAN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ****R/L CONSORCIO INTERJERICO-73**

Contrato 068 de 2023

Villavicencio (Meta), Junio 5 de 2026

INTERJER73_404-2026

Señores:

UNIÓN TEMPORAL VISTA-PTAP-2023

RAFAEL SANDOVAL GONZÁLEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad

REF.1: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068 DE 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD (NO INCLUYE PTAP) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL CASCO URBANO Y LAS VEREDAS GUADUALITO, PUERTO LUCAS, PUERTO ESPERANZA Y JERICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA"

REF.2.: CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD (NO INCLUYE PTAP) PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL CASCO URBANO Y LAS VEREDAS GUADUALITO, PUERTO LUCAS, PUERTO ESPERANZA Y JERICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA"

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información sobre arranque y puesta en marcha de la PTAP

Cordial saludo,

En atención a su comunicación de fecha 04 de junio de 2026, mediante la cual solicita información respecto a la programación para el arranque y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), nos permitimos informar lo siguiente:


Actualmente, el Contrato de Obra No. 069 de 2023 se encuentra suspendido, situación que impide el desarrollo de actividades pendientes necesarias para garantizar las condiciones técnicas requeridas para el inicio de operación y puesta en marcha de los sistemas proyectados. En este sentido, a la fecha no es posible programar el llenado del desarenador ni la puesta en marcha de la PTAP, toda vez que aún se encuentran pendientes de ejecución y culminación obras complementarias asociadas a los componentes del sistema de captación, aducción y desarenador, las cuales son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento integral del sistema. De igual manera, previo a cualquier actividad de puesta en operación, resulta necesario realizar y aprobar satisfactoriamente las pruebas hidrostáticas de la tubería instalada, actividad fundamental para verificar la hermeticidad, estabilidad y correcto comportamiento de la infraestructura hidráulica, así como para garantizar la seguridad operacional del sistema antes de su entrada en funcionamiento.

Por lo anterior, mientras persistan las condiciones que dieron lugar a la suspensión contractual y no se ejecuten las actividades pendientes anteriormente descritas, no es técnicamente viable establecer una fecha para el arranque y puesta en marcha de la PTAP.

Una vez se reactive el contrato y se culminen las obras faltantes, incluyendo la ejecución satisfactoria de las pruebas hidrostáticas y demás actividades de verificación técnica requeridas, se informará oportunamente la programación correspondiente para el inicio de las actividades de puesta en operación del sistema.

Sin otro particular, estaremos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,



JHOAN SEBASTIAN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

R/L CONSORCIO INTERJERICO-73

Contrato 068 de 2023

THESE RESULTS ARE

EMPRESA	CI	SECTOR	ACTIVIDAD	ASO	UBICACION	PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
CONSTRUCION DE CANAL	131-3018	AGRICULTURA	CONSTRUCCION DE FUENTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE SANTA HERMOGENA DEL DEPARTAMENTO DEL META				15/01/2019	30/01/2019
CONSTRUCCION DE FUENTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE SANTA HERMOGENA DEL DEPARTAMENTO DEL META	131-3018	AGRICULTURA	CONSTRUCCION DE FUENTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE SANTA HERMOGENA DEL DEPARTAMENTO DEL META				15/01/2019	30/01/2019

LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO




EL CASINO ALBERT ROSS DEL CONTINENTE DEL SUR

FECHA DEL CONTRATO	10 DE OCTUBRE DE 2023	VALOR REAL DEL CONTRATO	\$11,600,000.00
PLAZO REAL DEL CONTRATO	30/05/2024	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	000
FORMA DE PAGOS	40 DE PAGAMENTOS PER MENS	FECHA DE TERMINACIÓN	21/05/2024
PROVEEDOR A	40 DÍAS	FECHA DE FORMACIÓN	10 DE JUNIO DE 2023
PROVEEDOR B	TERCEROS MESES O MENOS (TODAS)	FECHA DE FORMACIÓN	21/05/2023
ACTU. MODIF. A/C. CANCELADO DE OBRA		DE FORMA	21 DE JUNIO DE 2023
PROVEEDOR C	24/05/2023	FECHA DE FORMACIÓN	21/05/2023
PROVEEDOR D	21/05/2023	FECHA DE FORMACIÓN	21/05/2023
ACTU. MODIF. A/C. CANCELADO DE OBRA		FECHA DE FORMACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$11,600,000.00	DE FORMA	21 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA	CONSEJO DE MINISTROS	VALOR DEL CONTRATO	\$11,600,000.00
PLAZO TRANSACCION	1/05/2023	REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANGEL MORA OTENO
SUBSCRIPCION DEL CONTRATO	\$11,600,000.00	PLAZO ADJUNTOS	2 DÍAS
PLAZO TRANSACCION	\$11,600,000.00	ADJUNTO FINANCIERO	00000
		ADJUNTO FINANCIERO	00000

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

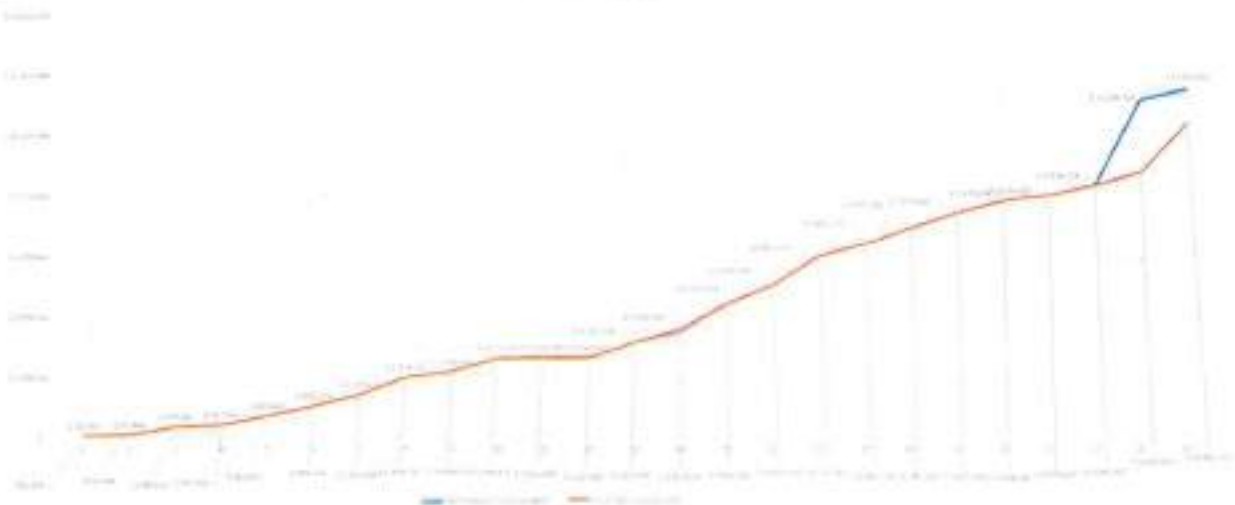

Nota: Al course programado ha precedido alguna programación aprobada en Prácticas.

doi:10.1017/S0022292412001907

el presente mes de Noviembre se continuaron con las actividades de manera normal por parte del contratista.

Se comienza con el avance en: Tratamiento preliminar, floculación, sedimentación, caseta de administración y control, filtro, pasarela PTAP, área de parques, alcantarillas, obras de urbanismo, componente eléctrico e instalación accesorios PTAP.

8. RETURN TO THE FAMILY AFTER THE TRIAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Villavicencio, 11 de junio de 2026

PTAPVH_0266-2026

Señores

U.T. VISTA-PTAP-2023

RL. ING. Rafael Sandoval González

Contrato de Interventoría No. 124-2023

Referencia: Contrato de obra 120 de 2023 *"CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"*

Asunto: Solicitud de Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 1

En atención a la ejecución del Contrato de Obra No. 120 de 2023, el cual se encuentra suspendido mediante Acta de Suspensión No. 1 y sus posteriores ampliaciones, con vigencia hasta el día 20 de junio de 2026, y considerando que a la fecha persisten condiciones que afectan la ruta crítica del proyecto e impiden la reanudación de las actividades de arranque y puesta en marcha de la PTAP, nos permitimos solicitar formalmente la Ampliación No. 3 de la suspensión No. 1 por un término adicional de dos (2) meses, con el fin de garantizar la ejecución del contrato bajo condiciones técnicas adecuadas.

En primer lugar, se precisa que persiste la causal relacionada con la energización de la PTAP. Tal como se ha informado en las solicitudes anteriores, la operación de la planta depende de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica y del cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos para su conexión al sistema eléctrico. En este sentido, los aspectos relacionados con la definición del punto de conexión, la legalización de la acometida eléctrica y la obtención de las autorizaciones y aprobaciones requeridas continúan en trámite ante la Empresa de Energía del Meta – EMSA.

Si bien se han adelantado las gestiones correspondientes y se ha realizado el seguimiento permanente al estado del proceso, a la fecha no se cuenta con una respuesta definitiva que permita confirmar la disponibilidad del suministro eléctrico



para la PTAP ni establecer una fecha cierta para su energización. En consecuencia, continúan vigentes las restricciones que dieron origen a esta causal de suspensión.


Por otra parte, en lo relacionado con la disponibilidad del caudal requerido para la operación del sistema, el día 04 de junio de 2026 la Interventoría del presente contrato de obra solicitó información a la Interventoría CONSORCIO INTERJERICO-73 respecto a la programación para el arranque y puesta en marcha del sistema. En respuesta, mediante oficio INTERJER73_404-2026 del 05 de junio de 2026, la Interventoría del proyecto de acueducto informó que actualmente el Contrato de Obra No. 069 de 2023 se encuentra suspendido, situación que impide el desarrollo de actividades pendientes necesarias para garantizar las condiciones técnicas requeridas para el inicio de operación del sistema.

Así mismo, se indicó que a la fecha no es posible programar el llenado del desarenador ni la puesta en marcha de la PTAP, toda vez que se encuentran pendientes de ejecución y culminación obras complementarias asociadas a los componentes de captación, aducción y desarenador, indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento integral del sistema. De igual manera, se informó que previamente deberán ejecutarse y aprobarse satisfactoriamente las pruebas hidrostáticas de la tubería instalada, actividad fundamental para verificar la hermeticidad, estabilidad y correcto comportamiento de la infraestructura hidráulica antes de su entrada en operación.

En consecuencia, la Interventoría del proyecto de acueducto manifestó que mientras persistan las condiciones que dieron origen a la suspensión de dicho contrato y no se culminen las actividades pendientes anteriormente descritas, no es técnicamente viable programar el arranque y puesta en marcha de la PTAP.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente la aprobación de la Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 1 por un término adicional de dos (2) meses, con el fin de garantizar que se cuente con la totalidad de las condiciones requeridas para adelantar la puesta en marcha de la PTAP y verificar integralmente su funcionamiento.

Atentamente,



Luis Ariel Arias Otero
Representante Legal

CONSORCIO PTAP VISTAHERMOSA
