



ACTA N° 11

FECHA: 04 de marzo 2026

**REUNIÓN:** Seguimiento proyecto 092-2025 Fondo Mixto Sierra Nevada – Comunidad La Playa

**OBJETIVO:** Realizar el seguimiento al proyecto

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:**  
Interventoría CIVIL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING SAS

**LUGAR:** TEAM

**RESPONSABLES:** Supervisor Convenio

**HORA PROGRAMADA:** 11:00 am

**HORA DE INICIO:** 11:10 am

**HORA DE TERMINACIÓN:** 12:00 am

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

El día 04 de marzo de 2026, se realizó el seguimiento semanal del contrato:

### SEGUIMIENTO A COMPROMISOS:

- Entrega informe noviembre 2025. No se cumplió, informa que se entregara el 26 de febrero de 2026.
- Entrega pólizas supervisión, se encuentran en trámite por la aseguradora.
- Entrega y firma de acta de inicio por parte de la supervisión, se cumplió

### SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A CORTE DE OCTUBRE:

- *A corte de 2/03/26 se registra una correccion en los avances*  
Programado acumulado: 71.80%  
Ejecutado acumulado: 57.05%  
Atraso acumulado: 14.75%
- Avances de obra: Se realizó la instalación de los pendolones en cada uno de los costados, se tiene finalizó la instalación de los tableros y de igual manera continua el montaje de la estructura metálica para la instalación de la madera plástica. El contratista reitera que el río se encuentra en su nivel más alto, lo que impide iniciar el armado de los aproches. Esta actividad se ejecutará una vez que el nivel del río descienda. Teniendo en cuenta que el atraso evidenciado corresponde a esta actividad.
- Se revisan los informes de obra pendientes por radicar.
- Se encuentra en revisión el acta N°1, el contratista informa que la factura esta generada con fecha 31/12/2025; el contratista radicara las correcciones el 04/03/2025. La interventoría informa que tarda un día en la revisión de las subsanaciones.
- El contratista radicara el corte el Acta N°02 el 13 de marzo de 2026.
- El contratista informa que se suspendería aproximadamente el 20 de marzo 2026, a fin de que no se pueden ejecutar las actividades de los accesos. Esta suspensión se realizaría hasta el mes de marzo.
- De igual manera, se verifican los informes de supervisión que aún no han sido remitidos a la Gobernación.
- Se informa por parte de la gobernación que durante las visitas al proyecto no se ha evidenciado la presencia de los supervisores, así como el personal insuficiente por parte de la interventoría.




ACTA N° 11

FECHA:04 de marzo 2026

**COMPROMISOS:**

N°	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1	Remitir informes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para revisión.	Supervisión Fondo Mixto
2	Interventoría remita ajustado el informe de octubre y noviembre	Interventoría
3	Revisar y conceptuar sobre el Plan de Contingencia ajustado; coordinar con Supervisión la viabilidad de la reprogramación.	Interventoría
4	Revisión Corte N°01	Interventoría
5	Radicar Corte N°02 Obra	Contratista

Asistentes Comité seguimiento - Proyecto 092 Fondo Mixto Sierra Nevada – Comunidad La Playa

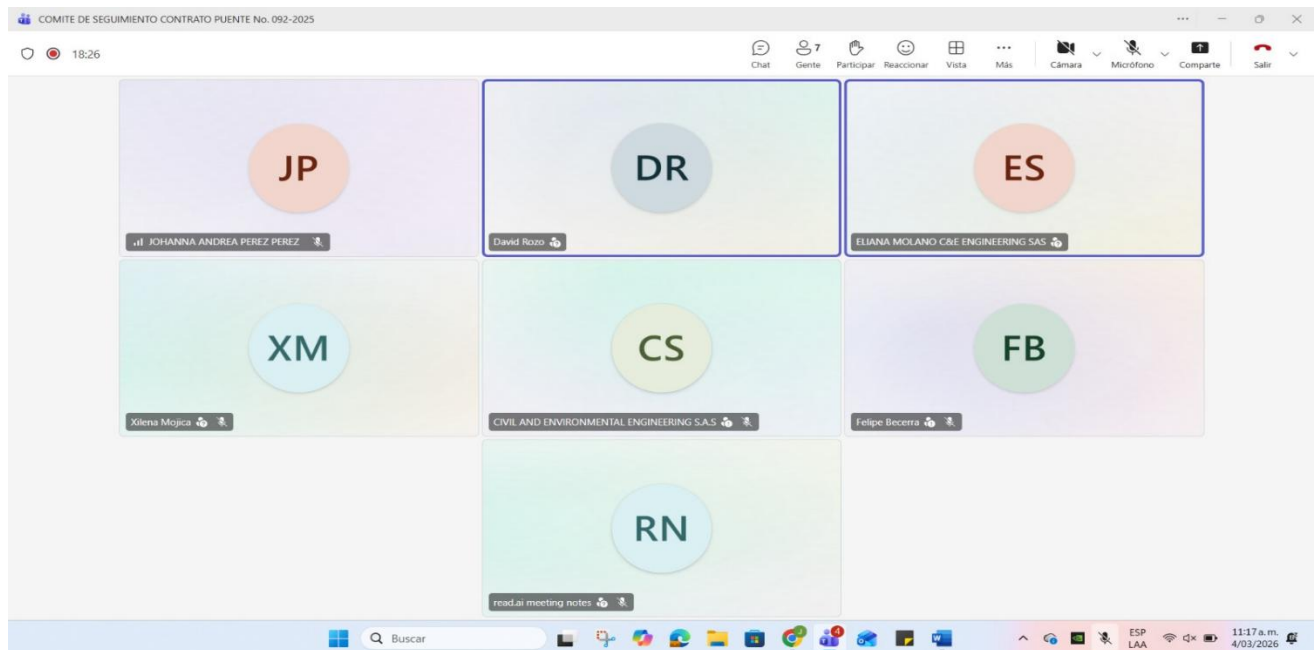

**ASISTENTES POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN:**

N°	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Miguel Córdoba Burgos – PE – DI	
2	Johanna Andrea Perez – PU – DI	
