


Remisión de comunicado OFIC-016-LMC - Solicitud de Prorroga contendedores

Desde Julieth Bernal <jbernal@limacormy.co>

Fecha Lun 22/06/2026 4:45 PM

Para Yoly Dayana Moreno Ortega <ydmoreno@sena.edu.co>

CC Marcela Coronado <mcoronado@limacormy.co>; Yanira Chala <gerencia@limacormy.co>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

OFIC-016-LMC - Prorroga.pdf; Programacion de obra contendedores V. 4.pdf;

Buen día,

Envió para su conocimiento y fines pertinentes.



Julieth Bernal
Coordinadora de Proyecto

 (1) 805 14 24

 jbernal@limacormy.co

 Cra 29B No. 71 - 43
Bogotá, Colombia

Bogotá D.C. 22 de junio de 2026

Señores:

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA

Ciudad

Yoly Dayana Moreno Ortega

Instructora Sennova G10- Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"

Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.8708316, cuyo objeto es: "Suministro, dotación e instalación de tienda de carretera tipo containers, en el marco de la estrategia Zajuna Campo, para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del sistema de investigación, desarrollo tecnológico relacionada con proyectos de innovación del sistema de investigación y Competitividad nacional para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila"

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE obra CO1.PCCNTR.8708316

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar respetuosamente a la entidad la concesión de una prórroga al contrato de obra por un término de diecisiete (17) días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento actualmente establecida, fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de julio de 2026.

La presente solicitud se justifica en circunstancias de carácter climático y operativo que han afectado de manera significativa el normal desarrollo de las actividades programadas y que se encuentran fuera del control y capacidad de maniobra del contratista.

Durante las últimas semanas se ha presentado un incremento considerable en las precipitaciones en la zona de ejecución del proyecto, situación que ha impactado directamente el avance de las actividades constructivas. Particularmente, las labores actualmente en ejecución comprenden trabajos en caliente mediante equipos de soldadura, actividades en altura con utilización de andamios y trabajos sobre cubiertas, los cuales se desarrollan en condiciones de intemperie y, por tanto, están altamente condicionados por los factores climáticos.


En este sentido, el inicio de lluvias obliga a la suspensión inmediata de las actividades mencionadas, debido al incremento de los riesgos asociados para el personal de obra, tales como caídas a diferente nivel, descargas eléctricas, pérdida de estabilidad




de equipos y afectaciones derivadas de superficies húmedas o resbaladizas. De igual manera, una vez cesan las precipitaciones, no es posible reanudar de forma inmediata las labores, toda vez que se requiere un tiempo prudencial para garantizar que las superficies, estructuras y equipos se encuentren en condiciones seguras para la ejecución de los trabajos.

Estas circunstancias han generado retrasos en la programación inicialmente prevista, afectando el rendimiento y la continuidad de las actividades críticas del proyecto. Se trata de situaciones ajenas a la voluntad del contratista, y frente a las cuales prevalece el deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así como el cumplimiento de las normas aplicables en materia de prevención de riesgos laborales.

Se anexan los soportes correspondientes que evidencian las condiciones climáticas presentadas durante el período referido y su incidencia en el desarrollo de las actividades programadas.

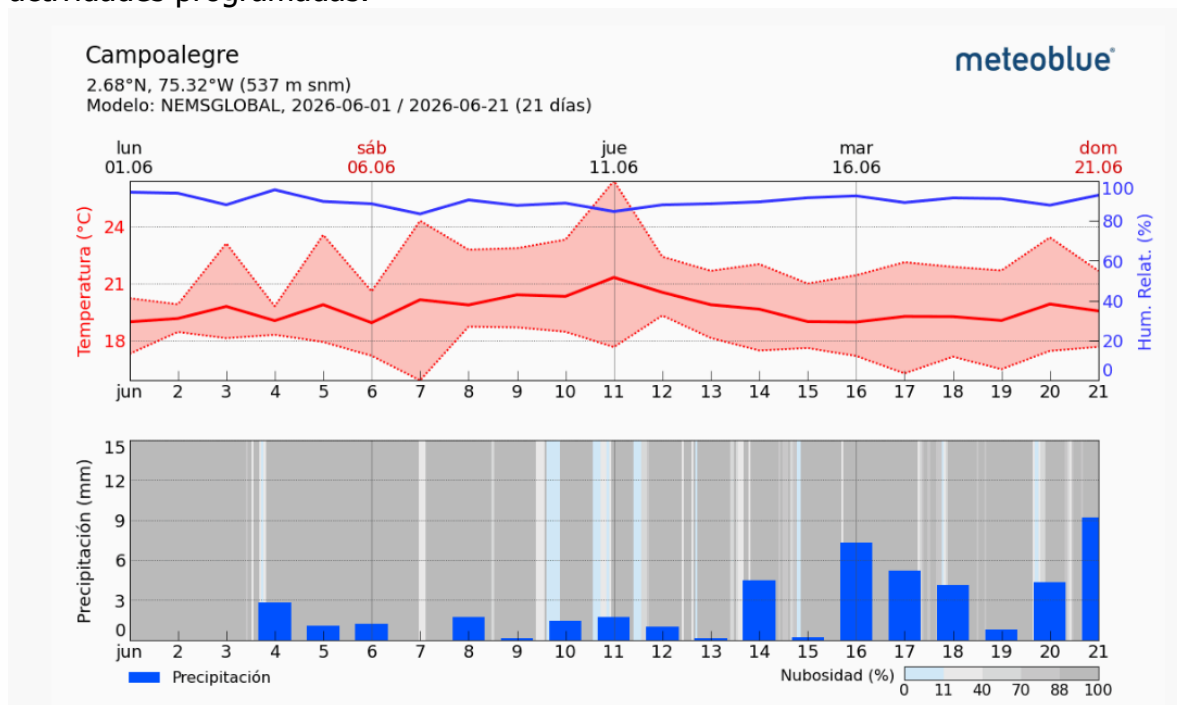

Registro de lluvias mes de junio de 2026

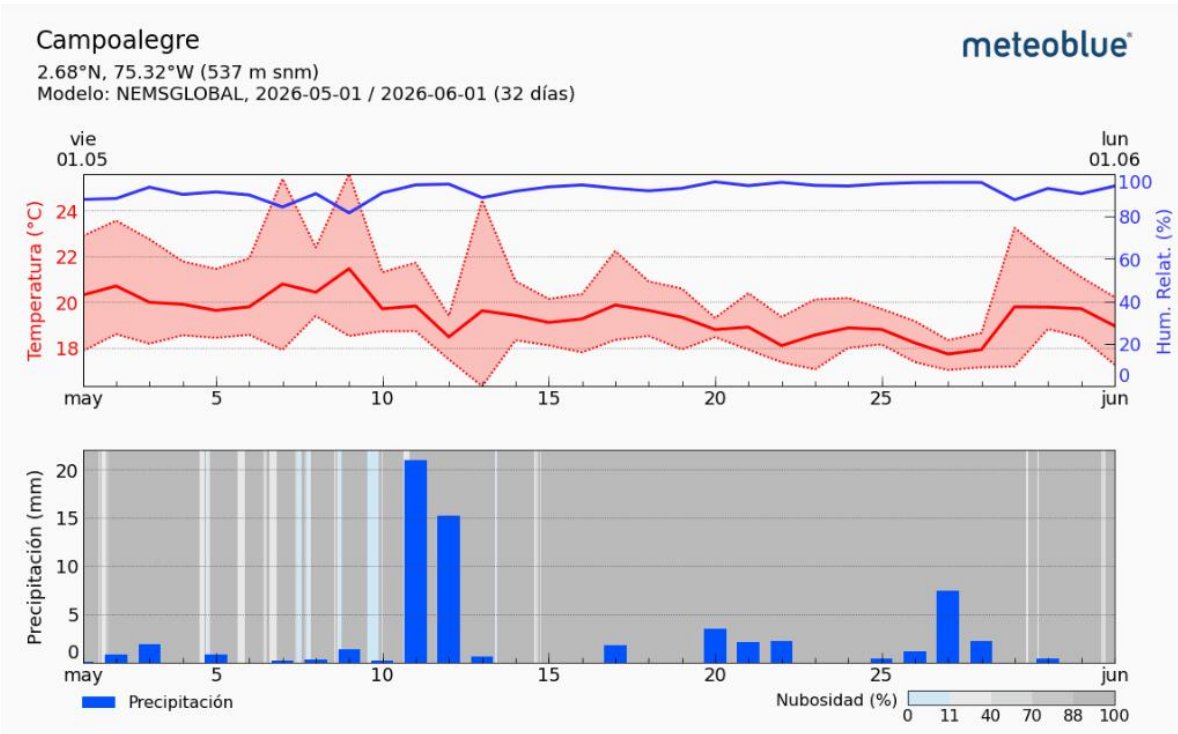

Registro de lluvias mes de mayo de 2026






Por lo anterior, y con el propósito de culminar adecuadamente las actividades pendientes, garantizando la calidad de las obras ejecutadas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la seguridad del personal vinculado al proyecto, solicitamos a la entidad autorizar la prórroga en mención.

Agradecemos su atención prestada y pronta respuesta.

Cordialmente,

Mónica Marcela Coronado Rodríguez
Representante Legal

Proyecto: Arq. Julieth Bernal
Coordinación de proyectos

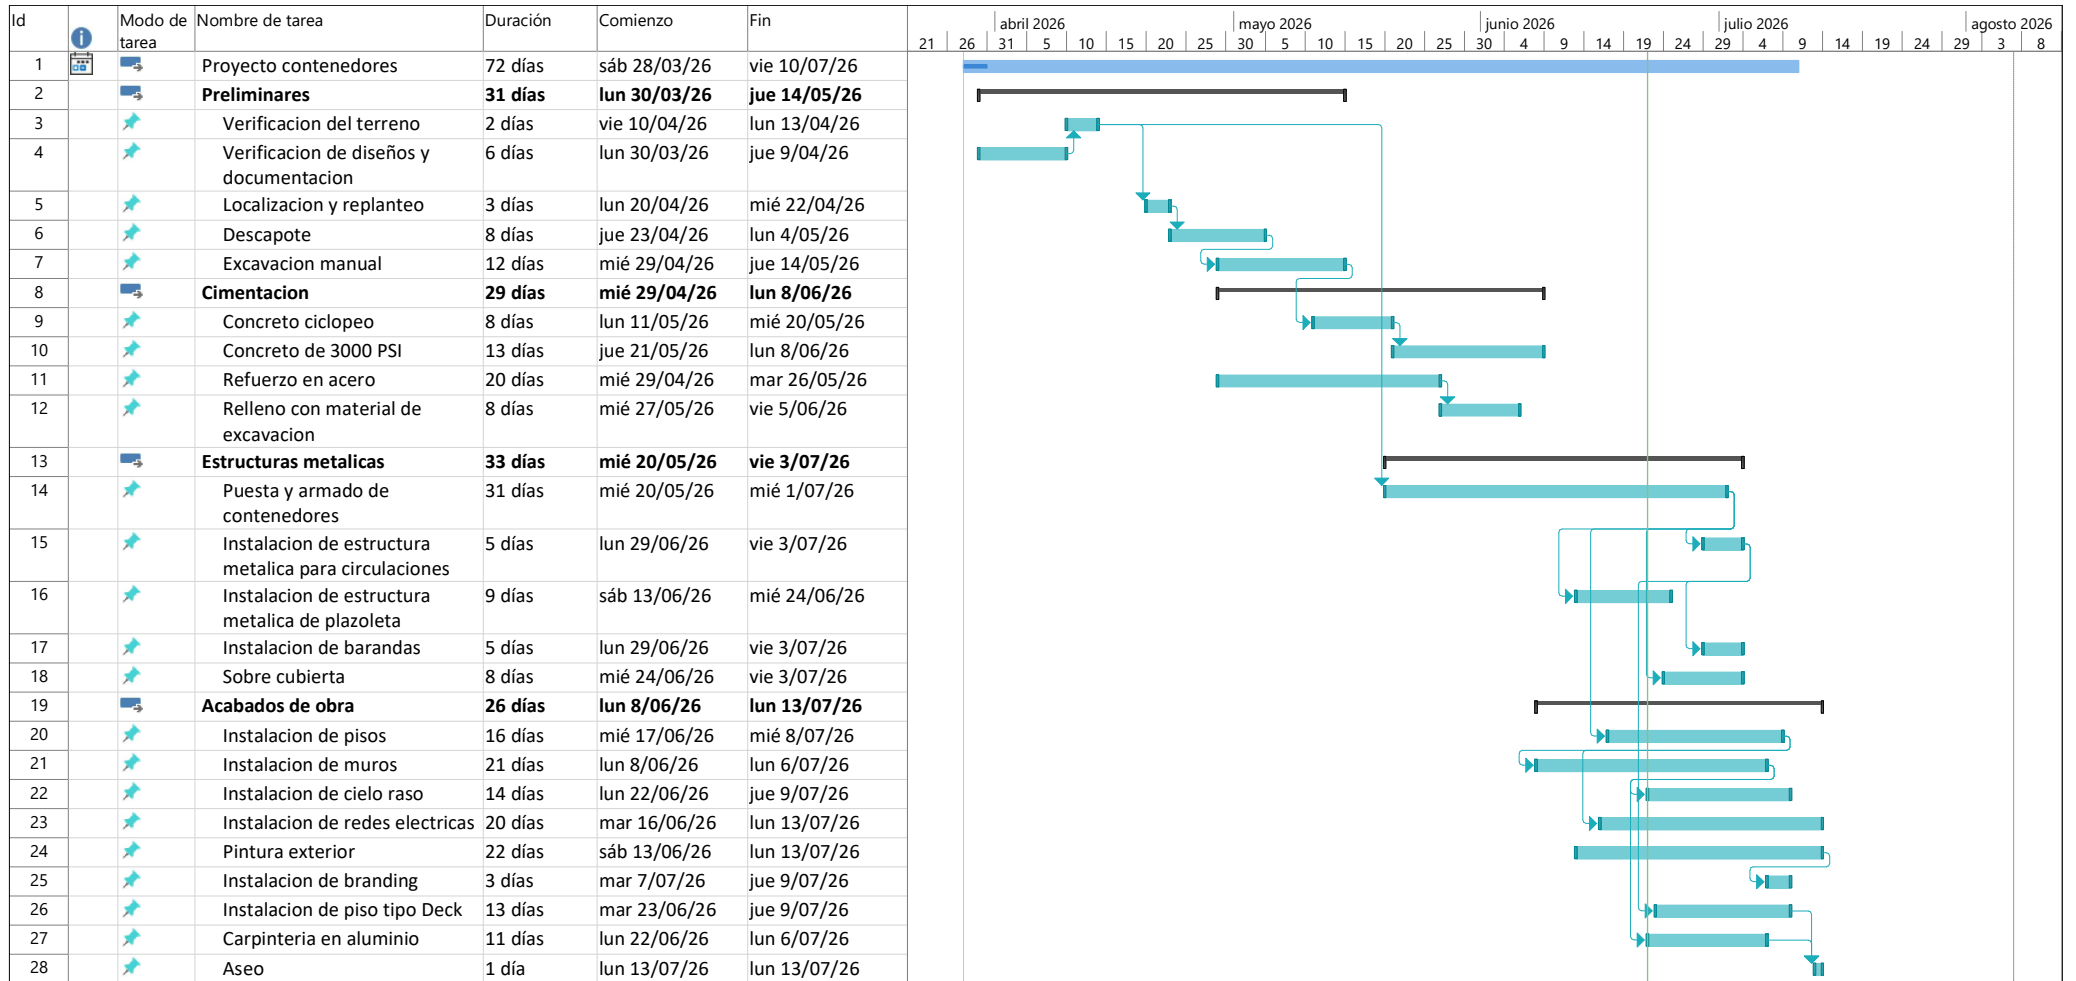

Proyecto: Programación de obr
Fecha: lun 22/06/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
