

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2320 DE 2025, SAMPUES - SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	SAMPUES - SUCRE		
BENEFICIARIO:	SAMPUES - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 2.700.009.887	
	APORTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	\$ 300.001.098	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 3.000.010.985	
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MARLENY RIVERA GALEANO	13/11/2025	A LA FECHA
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	07/11/2025	12/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	EVERT DOMINGO SANCHEZ PUERTA	0502/2026	A LA FECHA
	EVERT DOMINGO SANCHEZ PUERTA	14/11/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 57225	07/11/2025	\$ 1.350.004.944
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 7625	07/11/2025	\$ 1.350.004.943
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	D/MM/AAA	\$ 300.001.098
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 96-44-101200651 ANEXO: 0	13/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	D/MM/AAAA: N/A		FECHA:DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	D/MM/AAAA: N/A		FECHA:DD/MM/AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/01/2027		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 90.172.223		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 77.243.232		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	\$ 2.498.824.826		
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 333.770.704		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del Ministerio.	NO APLICA	24/12/2025	\$1.350.004.944
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70%	DD/MM/AAA	\$ 0
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70 %	DD/MM/AAA	\$ 0
UN ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento lista de entregables Anexo 24d y Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente diligenciado.	100 %	DD/MM/AAA	\$ 0
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 1.350.004.944
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA ENERO 2025	
Saldo Inicial	\$ 1.350.123.009,00
Egresos	\$ 0,00
Rendimientos Financieros	\$ 457.600,12
Saldo Final	\$ 1.350.580.609,30

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101200651 ANEXO: 0	Cumplimiento	\$ 600.002.197	07/11/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios & Diseños E Implementación

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No.			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPañÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios & Diseños E Implementación

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
			\$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$ 1.350.580.609,30	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

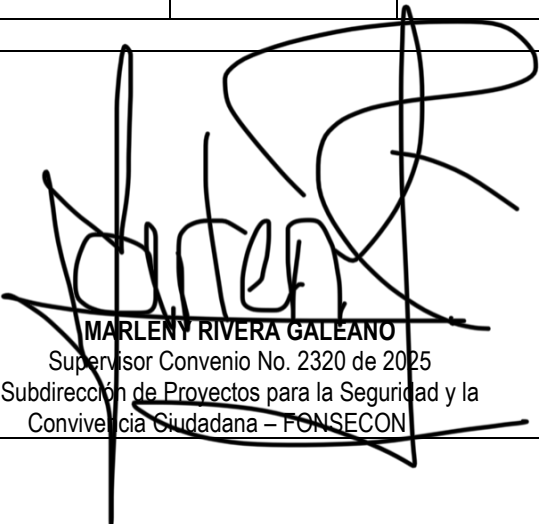
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA PRORRGA	0,00%
% EJECUTADO	0,00%
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MAYO 2026	
El día 26 de mayo de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior realizó reunión de seguimiento con la supervisión del municipio de Sampedes.	
El convenio de acuerdo con el último informe de la supervisión del municipio presenta un avance de 0,0% Porcentaje verificado por el Ministerio se pudo evidenciar que el avance está en un 0,00% El porcentaje programado de acuerdo con el cronograma del mes de MAYO de 2026 es del 0,00%	
Estado financiero del convenio:	
Desembolso No. 1 \$ 1.350.004.944	
Total Desembolsado \$ 1.350.004.944	
Saldo Pendiente \$ 1.650.006.041	
Anexos	
• Soportes de email.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

 MARLENY RIVERA GALEANO Supervisor Convenio No. 2320 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON	 EVERT DOMINGO SANCHEZ PUERTA Apoyo a la supervisión Convenio No. 2320 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON
---	--

 Interior	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	26/05/2026
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2320 de 2026
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0,0 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento en la realización de los estudios y diseños del convenio 2320 de 2026..

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 07/11/2025 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2320 de 2025
EL DIA 14/11/2025 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONVENIO \$ 3.000.010.985

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2320 de 2025

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, por parte del Ministerio del Interior; la supervisión y el apoyo a la supervisión y por parte del municipio la supervisión y apoyo jurídico del municipio.
2. Se realiza seguimiento a los procesos de contratación de los contratos derivados de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Marleny Rivera Galeano – Supervisor
- Evert D Sánchez Puerta - Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE SAMPUES

- Carlos Geney – Apoyo Jurídico - Supervisor del Convenio 2320 de 2025.

IMPLEMENTACION

- Eduardo Pérez– Representante Legal del CONSORCIO CCTV SAMPUES
- Domingo Garavito- Ingeniero CONSORCIO CCTV SAMPUES

INTERVENTORIA

- Ubaldo Pombo – Ing Interventoría.

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2320 de 2025: 31/07/2026

1. El municipio presenta estado de la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños.

- En proceso de contratación de los contratos derivados.

2. A la fecha 26 de mayo de 2026, se tiene un avance del 0,0% de acuerdo con el cronograma del convenio.

3. Resumen de la reunión:

 Interior	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

1. Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, el contratista presentó los avances de la Etapa de Estudios y Diseños, exponiendo el estado de cumplimiento de los productos y entregables exigidos por el Ministerio del Interior. Se revisaron principalmente:

- Acta de visita técnica y soportes fotográficos de los 11 puntos de instalación.
- Levantamientos arquitectónicos, eléctricos y estructurales.
- Planos del Centro de Monitoreo (CCM).
- Diseño de áreas técnicas, cuarto eléctrico, ubicación de UPS y planta eléctrica.
- Revisión preliminar de presupuestos y optimización de cantidades de obra.
- Validación de criterios técnicos de fibra óptica, anillos de respaldo y seguridad operativa.

Se confirmó que:

- Los 11 puntos de cámara aprobados inicialmente se mantienen sin modificaciones.
- El sitio destinado para el Centro de Monitoreo conserva la ubicación inicialmente viabilizada.
- Los estudios y diseños continúan en elaboración y deberán ser ajustados conforme a las observaciones realizadas por el Ministerio y la Interventoría.

2. Principales observaciones técnicas

• Centro de Monitoreo (CCM)

El Ministerio y la Interventoría manifestaron que la distribución propuesta presenta limitaciones de espacio y no garantiza adecuadamente:

- Áreas de trabajo alrededor de la planta eléctrica.
- Distancias mínimas para ergonomía de los operadores.
- Separación física entre equipos eléctricos y de monitoreo.
- Condiciones de seguridad para UPS, tableros y equipos críticos.

Se recomendó:

- Reubicar la planta eléctrica.
- Independizar el cuarto eléctrico del Centro de Monitoreo.
- Redistribuir los puestos de trabajo y video wall.
- Ajustar la distribución arquitectónica para cumplir condiciones de seguridad y ergonomía.

• Presupuesto

Se indicó que:

- Los estudios y diseños pueden generar modificaciones al presupuesto inicialmente viabilizado.
- No se puede disminuir el número de cámaras aprobadas (11 puntos).
- Deben revisarse algunos elementos que podrían no ser necesarios, como puntos asociados a impresoras y ciertos puntos de cableado estructurado.
- Las cantidades finales deberán reflejar las necesidades reales identificadas en los estudios y diseños.

• Fibra óptica y redundancia

Se revisó la propuesta de anillo de fibra óptica, recomendándose:

- Analizar técnicamente la conveniencia de implementar un anillo físico que garantice redundancia real.
- Revisar el impacto presupuestal de las alternativas propuestas.

Estado general del proyecto:

El convenio se encuentra en la fase de estudios y diseños, con avances en levantamientos técnicos y documentación preliminar, pendiente de ajustes derivados de las observaciones formuladas por la supervisión y la interventoría.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
-------------	----------	---------------------------

 Interior	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

MUNICIPIO DE SAMPUES	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar el acta de visita incorporando el logo de la Alcaldía y la firma de la Interventoría. 	Antes de la entrega formal del producto.
MUNICIPIO DE SAMPUES	<ul style="list-style-type: none"> Remitir a la Interventoría el enlace (Drive) y la documentación de soporte para revisión de entregables. 	Inmediatamente después de la reunión.
MUNICIPIO DE SAMPUES	<ul style="list-style-type: none"> Revisar y ajustar la distribución del Centro de Monitoreo, separando el cuarto eléctrico, UPS y planta eléctrica. 	Durante la actualización de los estudios y diseños.
MUNICIPIO DE SAMPUES	<ul style="list-style-type: none"> Verificar las dimensiones y áreas de trabajo requeridas para la planta eléctrica y cumplimiento normativo. 	En la siguiente versión de los diseños.
MUNICIPIO DE SAMPUES	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar y optimizar las cantidades y costos del presupuesto con base en los estudios y diseños definitivos. 	Antes de la aprobación final de diseños.
MUNICIPIO DE SAMPUES	<ul style="list-style-type: none"> Revisar técnicamente la solución de fibra óptica y la implementación de redundancia mediante anillo. 	Antes de la entrega definitiva de diseños.
MINISTERIO DEL INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Continuar revisando y validando los estudios y diseños presentados por el contratista una vez sean revisados por la Interventoría. 	Permanente durante la etapa de estudios y diseños.
MINISTERIO DEL INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Validar la propuesta final de distribución del Centro de Monitoreo y las adecuaciones planteadas. 	Una vez el contratista presente los ajustes.
MINISTERIO DEL INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Continuar acompañando técnicamente la definición de soluciones de redundancia y arquitectura de fibra óptica. 	Durante la revisión de diseño

 Interior	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7						Código: GC-P3-F7
							Versión: 2
							Vigente desde: 17/12/2018

1. Resumen									
Título de la reunión	REUNION SEGUIMIENTO CONVENIO 2320-25 SAMPUES - SUCRE								
Participantes que asistieron	5								
Hora de inicio	5/26/26, 10:58:48 AM								
Hora de finalización	5/26/26, 11:59:58 AM								
Duración de la reunión	1 h 1 min 10s								
Tiempo medio de asistencia	46 min 45s								
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de l	Correo electr	Id. de partici	Rol	Interacción: (	Interacción: I	Interacción: Audio activado
Evert Domingo Sanchez Puerta	5/26/26, 10:59:18 AM	5/26/26, 11:59:39 AM	1 h 21s	evert.sanche	evert.sanche	Organizador			4
Eduardo perez (No comprobado)	5/26/26, 10:59:19 AM	5/26/26, 11:59:44 AM	1 h 24s			Asistente			5
Eduardo perez (No comprobado)	5/26/26, 11:02:10 AM	5/26/26, 11:03:04 AM	54s			Asistente			1
Domingo Garavito (No comprobado)	5/26/26, 11:03:14 AM	5/26/26, 11:59:58 AM	56 min 44s			Moderador			3
UBALDO M POMBO	5/26/26, 11:04:19 AM	5/26/26, 11:59:41 AM	55 min 21s			Asistente	1		5
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electr	Rol				
Evert Domingo Sanchez Puerta	5/26/26, 10:59:18 AM	5/26/26, 11:59:39 AM	1 h 21s	evert.sanche	Organizador				
Eduardo perez (No comprobado)	5/26/26, 10:59:19 AM	5/26/26, 11:59:44 AM	1 h 24s		Asistente				
Eduardo perez (No comprobado)	5/26/26, 11:02:10 AM	5/26/26, 11:03:04 AM	54s		Asistente				
Domingo Garavito (No comprobado)	5/26/26, 11:03:14 AM	5/26/26, 11:59:58 AM	56 min 44s		Moderador				
UBALDO M POMBO	5/26/26, 11:04:19 AM	5/26/26, 11:59:41 AM	55 min 21s		Asistente				
4. Interacción en la reunión									
Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo							
Evert Domingo Sanchez Puerta	Audio activado	5/26/26, 11:03:03 AM							
Evert Domingo Sanchez Puerta	Audio activado	5/26/26, 11:06:00 AM							
Evert Domingo Sanchez Puerta	Audio activado	5/26/26, 11:13:19 AM							
Evert Domingo Sanchez Puerta	Audio activado	5/26/26, 11:56:41 AM							
Eduardo perez (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:03:14 AM							
Eduardo perez (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:03:39 AM							
Eduardo perez (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:04:38 AM							
Eduardo perez (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:04:53 AM							
Eduardo perez (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:05:24 AM							
Eduardo perez (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:02:50 AM							
Domingo Garavito (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:03:44 AM							
Domingo Garavito (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:04:46 AM							
Domingo Garavito (No comprobado)	Audio activado	5/26/26, 11:06:10 AM							
UBALDO M POMBO	Audio activado	5/26/26, 11:04:31 AM							
UBALDO M POMBO	Audio activado	5/26/26, 11:04:42 AM							
UBALDO M POMBO	Audio activado	5/26/26, 11:06:45 AM							
UBALDO M POMBO	Audio activado	5/26/26, 11:07:50 AM							
UBALDO M POMBO	Audio activado	5/26/26, 11:09:22 AM							
UBALDO M POMBO	Manos levantadas	5/26/26, 11:12:31 AM							
