
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código:	A-BS-FO-009
		Fecha de aprobación:	23/09/2024
	Informe del Administrador de oferta o contrato.	Versión:	8.0
		Página:	1 de 7

Informe del Administrador de Oferta Nro. 218 - 2026							
FECHA	22 de junio de 2026		Código UNSPSC		26111711		
OBJETIVO	Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar a la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare "ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.", acerca del desarrollo de este verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución.						
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		N°	218	AÑO	2026	
PAGO	N°	1	Comprendido de 01 de junio al 19 de junio de 2026				
PROVEEDOR	CARLOS ANDRES RAMIREZ CASTRO Rep. Legal AR INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO						
OBJETO	CONTRATAR CON UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LOS SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS SISFV DERIVADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.						
ALCANCE	EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DERIVADA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI), ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS CUANDO SEA NECESARIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS.						
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$447.600.000). IVA INCLUIDO.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES						
No. Y FECHA DEL CDP	879 de 13 de mayo de 2026						
No. Y FECHA DEL RP	953 de 29 de mayo de 2026						
FECHA DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR	01 de junio de 2026						
FECHA DE INICIO	01 de junio de 2026						
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de agosto de 2026						
MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
(Se agregarán la cantidad de casillas conforme al número de modificaciones del contrato)							
Elija un elemento.	N/A			FECHA	DD	MM	AA
No. DEL CDP	N/A			FECHA	DD	MM	AA
No. DEL RP	N/A			FECHA	DD	MM	AA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A						
ADICIÓN Y PRORROGA	N/A			FECHA	DD	MM	AA

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código:	A-BS-FO-009
		Fecha de aprobación:	23/09/2024
	Informe del Administrador de oferta o contrato.	Versión:	8.0
		Página:	2 de 7

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
-----------------------------------	-----

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 01 de junio de 2026, expedido por la Secretaria General y Jurídica de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare “ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.” se me designó como ADMINISTRADOR de la aceptación de oferta N° 218 de 2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO No. 01, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación Vigente y lo establecido en el Manual de Administradores de Contratos, apoyos de la administración de contratos e interventores Vigente.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el proveedor en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100% a la fecha

En cumplimiento del objeto y alcance del contrato, el proveedor ha prestado los servicios de suministro correspondientes a los ítems y actividades contempladas dentro de la ejecución contractual, los cuales se relacionan a continuación y se encuentran debidamente soportados con el informe presentado por el proveedor.


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SUMINISTRO

Durante el periodo de ejecución del 01 de junio de 2026 al 19 de junio de 2026 el proveedor realizó el suministro de los ítems contractuales, tal como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD AVANCE	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE AVANCE
1	Batería de litio- ion 24V/120Ah LiFePO4	UN	60	60	60	100%

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de las baterías suministradas:

Imagen 1 Entrega de baterías de litio



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe del Administrador de oferta o
contrato.

Código:

A-BS-FO-009

Fecha de
aprobación:

23/09/2024


Versión:

8.0

Página:

3 de 7




	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código:	A-BS-FO-009
		Fecha de aprobación:	23/09/2024
	Informe del Administrador de oferta o contrato.	Versión:	8.0
		Página:	4 de 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD AVANCE	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE AVANCE
2	Inversor de Onda Senoidal Pura 24 VOC/120 AC- 1000W	UN	60	60	60	100%

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de los inversores suministrados:

Imagen 2 Entrega de inversores

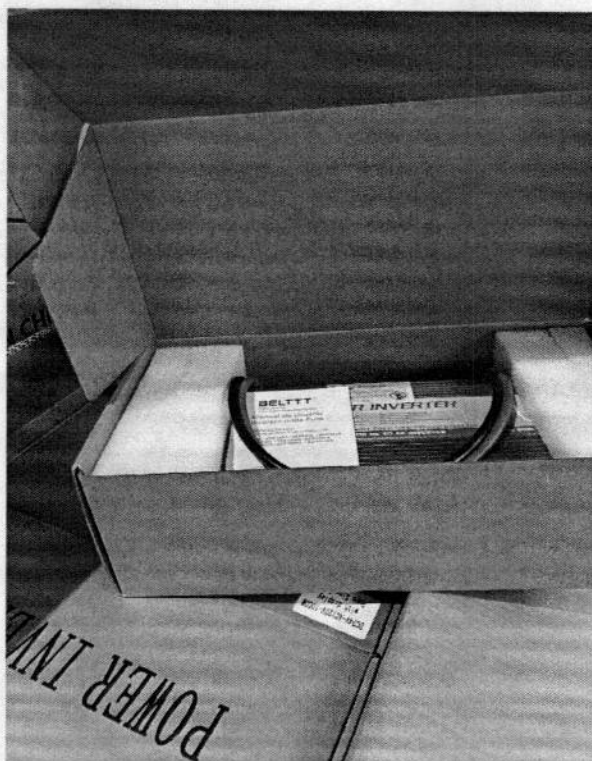


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD AVANCE	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE AVANCE
3	Regulador (Controlador) MPPT 24 VDC/40 Amp	UN	60	60	60	100%

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de los reguladores suministrados:

Imagen 3 Entrega de reguladores



	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código:	A-BS-FO-009
		Fecha de aprobación:	23/09/2024
	Informe del Administrador de oferta o contrato.	Versión:	8.0
		Página:	6 de 7

Conclusiones:

- Que estos equipos fueron entregados por el proveedor en la Subestación de San José del Guaviare, al profesional grado 02, Almacenista Gloria Yuliana Rincón Agudelo, De acuerdo con la entrada a almacén No. 28 de fecha 18 de junio de 2026, la cual hace constar que el proveedor **CARLOS ANDRES RAMIREZ CASTRO** suministro los equipos con sus respectivos protocolos y garantías objeto del presente contrato a el almacén de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., para el respectivo trámite de ingreso a los inventarios y contabilidad de ENERGUAVIARE SA ESP. Que, en consecuencia, alcanza un avance en su ejecución del 100%.
- De acuerdo con el informe presentado por el proveedor, la entrada de almacén y el suministro de los equipos dentro del cronograma de ejecución establecido, el contrato presenta un avance en su ejecución del 100%,
- teniendo en cuenta que el porcentaje de avance del contrato alcanza un 100% en el presente informe, se aprueba el siguiente pago a la compañía **AR INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO.**, conforme lo indica la CLAUSULA TERCERA. Forma de pago del contrato 218 de 2026. En consecuencia, valor a pagar en la presente: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$447.600.000)**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al respectivo periodo así:

Teniendo en cuenta que se trata de una persona jurídica, el cumplimiento correspondiente a seguridad social se soportó mediante certificación de expensas expedida por el representante legal.

Proveedor	CARLOS ANDRES RAMIREZ CASTRO
Razón social	AR INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Fecha de certificación	19 de junio de 2026
Periodo certificado	Seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de certificación.


BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

(Las casillas del balance se generan de acuerdo con las condiciones de la ejecución del contrato)

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:


CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	\$ 179.040.000	-----	40 %
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 447.600.000	01 JUNIO – 19 JUNIO	100%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 179.040.000	01 JUNIO – 19 JUNIO	100%
SALDO A FAVOR DEL PROVEEDOR	\$ 0	18 JUNIO– 30 AGOSTO	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 447.600.000	01 JUNIO – 30 AGOSTO	100%

CONCLUSIÓN


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código:	A-BS-FO-009
		Fecha de aprobación:	23/09/2024
	Informe del Administrador de oferta o contrato.	Versión:	8.0
		Página:	7 de 7

Con base en todo lo expuesto, el suscrito ADMINISTRADOR certifica que durante el **PERIODO 01** comprendido dentro del **01 de junio al 19 de junio de 2026**, el proveedor cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$447.600.000)**

Nota: Debido a que el administrador de esta oferta se encuentra en período de vacaciones, el presente informe será firmado por el Gerente.


ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO
GERENTE
ENERGUAVIARE S.A E.S.P.

Proyecto	WALTER CUESTA MORENO APOYO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN	FIRMA:
Revisó	ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO GERENTE	FIRMA:
Aprobó	ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO GERENTE	FIRMA:



Nit: 822004680

Comprobante
de Entrada No. 28

FECHA: 18 de Jun de 2026	PROVEEDOR: AR INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
------------------------------------	--

NIT/CC: 901398915	REFERENCIA:
----------------------	-------------

CONCEPTO DE LA TRANSACCION:

TIPO DOCUMENTO DE CRUCE:
FACTURA DE VENTA

ENTRADA CONTRATO SUMINISTRO 218-2026 CONTRATAR PERSONA NATURAL/JURIDICA SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GENERACION CONVERSION DE ENERGIA PARA GARANTIZAR OPERACION CONTINUA DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS SISFV DERIVADOS DE PROYEC EJEC POR ENERGUAVIARE

DOCUMENTO CRUCE No.:
0000000002

TOTAL:	\$447,600,000.00
--------	------------------

La suma de:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

RINCON AGUDELO GLORIA YULIANA
Almacenista



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

**CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

El suscrito **CARLOS ANDRES RAMIREZ CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.421.689 expedida en Acacias - Meta, actuando en calidad de representante legal de la empresa **AR INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS** con **NIT: 901398915-0** domiciliada en la Cll 14 B # 9 – 18 Barrio el Recreo Municipio de el Retorno Guaviare y suficientemente autorizado según consta en la Cámara de Comercio, **CERTIFICO** el pago de los aportes realizados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, y parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el ART 50 de la ley 789/2022

Dada en el Retorno Guaviare, a los 19 días del mes de Junio del año 2026.


AR INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
RL. CARLOS ANDRES RAMIREZ CASTRO

C. C. No. 17.421.689 de ACACIAS

Dirección de correo: Calle 14B Numero 9-18 Apto 2 Barrio el Progreso

Correo electrónico: arconstruccionsas@gmail.com

Ciudad: El Reteorno Guaviare



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 218 DE 2026

OBJETO: CONTRATAR CON UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LOS SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS SISFV DERIVADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

CONTRATANTE: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: AR INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS



INFORME DE LIQUIDACIÓN

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

3186149864

arconstruccionsas@gmail.com

Calle 14B No. 9-18 Barrio El Progreso Retorno Guaviare



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	6
1.1. GENERALIDADES	6
1.2. ALCANCE.....	6
1.3. LOCALIZACIÓN	6
1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS TÉCNICAS.....	6
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	7
2.1. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DE SUMINISTRO.....	8
2.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO.....	8
2.3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	9
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SUMINISTRO.....	10
4. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15
5. BALANCE FINANCIERO	16
6. CONCLUSIONES	17



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Especificaciones Técnicas y normas técnicas	6
Tabla 2 Información del Contrato de Suministro	7
Tabla 3 Póliza de Cumplimiento actualizadas al acta de inicio	8
Tabla 4 Póliza de Cumplimiento Contrato No. 218 de 2026	8
Tabla 5 Relación de planillas de Seguridad Social pagadas	9
Tabla 6 Plan de Inversión del Anticipo	15
Tabla 7 Balance Financiero del Contrato No. 218 de 2026	16



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 Entrega de baterías de litio	10
Imagen 2 Entrega de inversores	12
Imagen 3 Entrega de reguladores	13

3186149864

arconstruccionsas@gmail.com

Calle 14B No. 9-18 Barrio El Progreso Retorno Guaviare



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico refleja la ejecución del contrato de suministro No. 218 de 2026, realizado por el AR INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS, con el apoyo del Administrador del contrato ingeniero Hernando Antonio Hincapié Restrepo, designado por la empresa contratante ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

En este **informe final** se contempla información general del contrato de obra, avance del proyecto, actividades ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del mismo, en los aspectos técnicos, administrativos y financieros, además se incluye registro fotográfico detallado con el fin de evidenciar la entrega de los ítems suministrados, en el periodo de tiempo comprendido entre **el 01 de junio de 2026 al 19 de junio de 2026**, en el departamento del Guaviare, municipio de San José del Guaviare.



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

1.1. GENERALIDADES

El Contrato de Suministro No. 218 de 2026, fue firmado el 29 de mayo de 2026, tiene acta de inicio del 01 de junio de 2026, con un valor contratado de \$ 447,600,000 y un plazo inicial de ejecución de tres (03) meses.

1.2. ALCANCE

El proveedor deberá suministrar los equipos necesarios para dar cumplimiento a la obligación de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura derivada de los proyectos ejecutados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en la Zonas No Interconectadas (ZNI), así como la reposición de activos cuando sea necesario con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y operación de los sistemas.

1.3. LOCALIZACIÓN

El contrato se ejecutará en el municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare.

1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS TÉCNICAS

El proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas y normas establecidas:

Tabla 1 Especificaciones Técnicas y normas técnicas

ÍTEM	BREVE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Batería de litio- ion 24V/120Ah LiFePO4	60	Unidad	- Voltaje Nominal: 25.6 V - Capacidad Nominal: 120 Ah - Energía Nominal: 3072 Wh - Corriente de Carga Uso Continuo: 100 A - Corriente Descarga Uso Continuo: 100 A - Voltaje De Carga: 29.2 V - 30V - Descarga Profunda > 80 % - Garantía: 3 a 5 Años
2	Inversor de Onda Senoidal Pura 24 VOC/120 AC- 1000W	60	Unidad	- Potencia: 1000 W - OC Input: 24 VDC - AC Output: 120 VAC / 60 HZ - Ac input: 120 VAC / 60 HZ - TIPO: Off-Grind - Garantía: 3 Años

3186149864

arconstruccionsas@gmail.com

Calle 14B No. 9-18 Barrio El Progreso Retorno Guaviare



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

3	Regulador (Controlador) MPPT 24 VDC/40 Amp	60	Unidad	• Voltaje: 12V/24 V • Corriente Maxima: 40 A • Compatibilidad de Batería Litio (LiFePO4). • Pantalla LCD Integrada: Visualizar voltajes y cargas de batería. • Eficiencia Mínima: 96% • Garantía: 3 Años
---	---	----	--------	---

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Tabla 2 Información del Contrato de Suministro

CONTRATO No.	218 DEL 29 DE MAYO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR CON UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LOS SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS SISFV DERIVADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P."
ENTIDAD CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
ADMINISTRADOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE RESTREPO
CONTRATISTA:	AR INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS NIT 901.398.915-0 R./L. CARLOS ANDRÉS RAMÍREZ CASTRO
CORREO ELECTRÓNICO:	arconstruccionsas@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO	\$ 447,600,000
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE AGOSTO DE 2026



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

2.1. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DE SUMINISTRO

ITEM	INFORMES	FECHE DE ENTREGA
1	INFORME FINAL – 01 JUN 2026 A 19 JUN 2026	19 de junio de 2026

2.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

❖ PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tabla 3 Póliza de Cumplimiento actualizadas al acta de inicio

No. PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADOR A	RIESGO AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA ACTUAL	
				Desde	Hasta
14-44- 101263867	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	44,760,000.00	01/06/2026	03/01/2027
		Calidad y correcto funcionamiento	44,760,000.00	01/06/2026	01/09/2027
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	179,040,000.00	01/06/2026	03/01/2027
ANEXO 2 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03/06/2026					

Tabla 4 Póliza de Cumplimiento Contrato No. 218 de 2026

No. PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADOR A	RIESGO AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA ACTUAL	
				Desde	Hasta
14-44- 101263867	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	44,760,000.00	29/05/2026	31/12/2026
		Calidad y correcto funcionamiento	44,760,000.00	29/05/2026	29/08/2027
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	179,040,000.00	29/05/2026	31/12/2026
ANEXO 0 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 29/05/2026					



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

2.3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 5 Relación de planillas de Seguridad Social pagadas

AR INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS					
PERIODO	No. PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
MAYO-2026	9504242751	70,100	280,200	9,200	70,100

3186149864

arconstruccionsas@gmail.com

Calle 14B No. 9-18 Barrio El Progreso Retorno Guaviare


3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SUMINISTRO

Durante el periodo de ejecución del 01 de junio de 2026 al 19 de junio de 2026 se realizó el suministro de los ítems contractuales, tal como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD AVANCE	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE AVANCE
1	Batería de litio-ion 24V/120Ah LiFePO4	UN	60	60	60	100%

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de las baterías suministradas:

Imagen 1 Entrega de baterías de litio

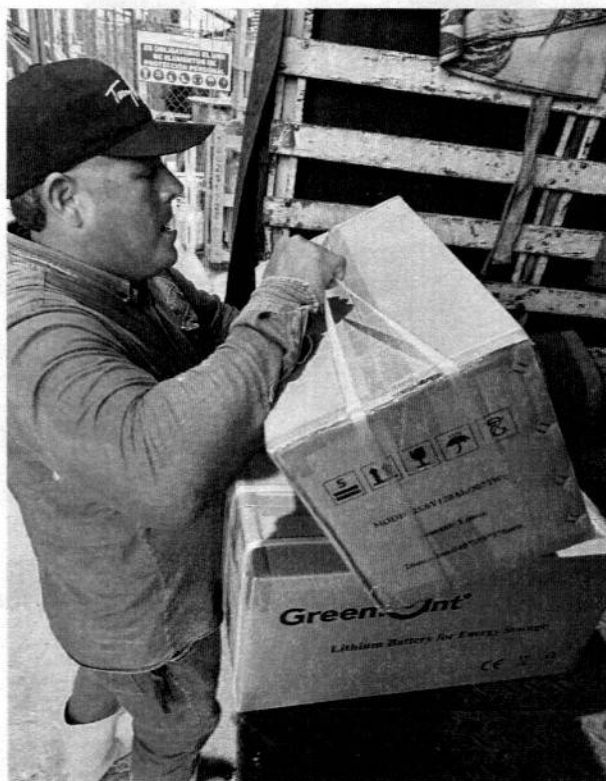



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0



3186149864


arconstruccionsas@gmail.com

Calle 14B No. 9-18 Barrio El Progreso Retorno Guaviare

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD AVANCE	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE AVANCE
2	Inversor de Onda Senoidal Pura 24 VOC/120 AC-1000W	UN	60	60	60	100%

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de los inversores suministrados:

Imagen 2 Entrega de inversores

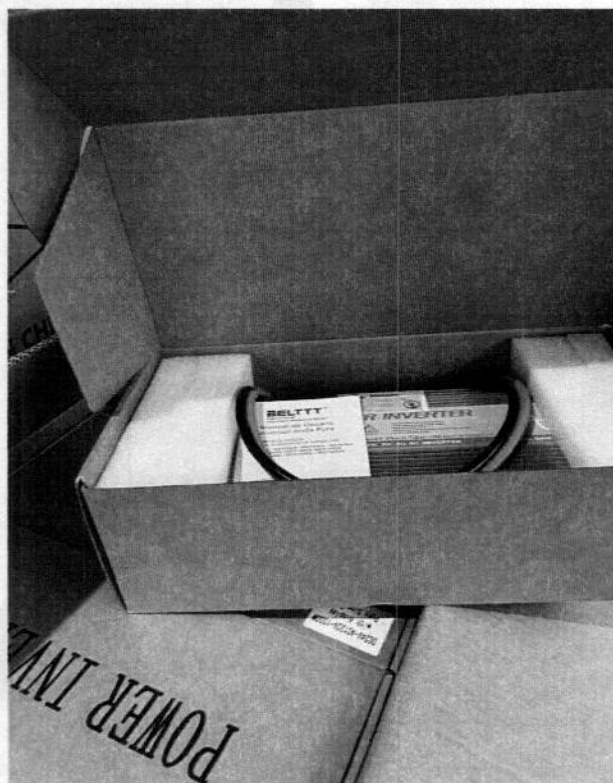

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD AVANCE	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE AVANCE
3	Regulador (Controlador) MPPT 24 VDC/40 Amp	UN	60	60	60	100%

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la entrega de los reguladores suministrados:


Imagen 3 Entrega de reguladores





INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

015-0

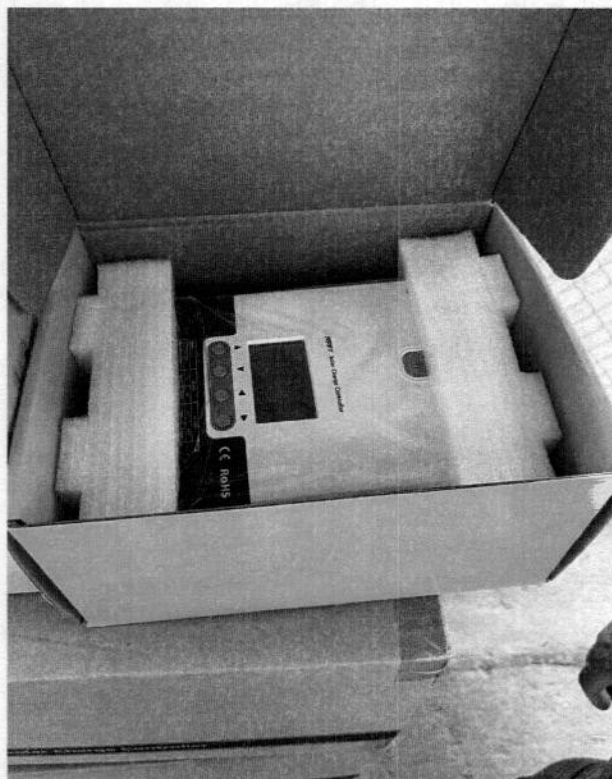

☎ 3186149864

✉ arconstruccionsas@gmail.com

📍 Calle 14B No. 9-18 Barrio El Progreso Retorno Guaviare



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

4. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En el marco de ejecución del Contrato de Suministro No. 218 de 2026, el proveedor presentó al Administrador del contrato solicitud de giro del Anticipo por el 40% del valor total del contrato correspondiente al valor de \$ 179,040,000.00. En la siguiente tabla se relacionan los rubros a los cual se destinarán los recursos del anticipo:

Tabla 6 Plan de Inversión del Anticipo

ÍTEM	DESCRIPCION	% ANTICIPO	VALOR
1.0	TRANSPORTE	7.00%	\$ 12,532,800.00
2.0	COMPRA DE MATERIALES	93.00%	\$ 166,507,200.00
TOTALES		100.00%	\$ 179,040,000.00

Dicho anticipo fue girado al contratista por medio de la Orden de Pago No. 1414 del 09 de junio de 2026.



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

5. BALANCE FINANCIERO

En el presente informe de liquidación se reporta el avance financiero que presenta el Contrato de Suministro No. 218 de 2026, correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el 01 de junio de 2026 al 19 de junio de 2026, el cual tiene un valor de ejecución total de **\$ 477,600,000.00**, equivalente al **100.00%** por ciento del total del contrato.

A continuación se relaciona el balance financiero del Contrato No. 218 de 2026, en donde se incluye el Anticipo girado y el presente informe de liquidación:

Tabla 7 Balance Financiero del Contrato No. 218 de 2026

	BALANCE GENERAL		
	FISICO	FINANCIERO	
		DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 447,600,000.00	\$ 447,600,000.00	
VALOR ANTICIPO	\$ 179,040,000.00		
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 447,600,000.00		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 179,040,000.00		\$ 179,040,000.00
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 268,560,000.00		\$ 268,560,000.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 447,600,000.00	\$ 447,600,000.00



INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S

Nit: 901398915-0

6. CONCLUSIONES

Durante los días de ejecución del Contrato de Suministro No. 218 de 2026, desde el 01 de junio de 2026 al 19 de junio de 2026, se adelantó la logística para el suministro y entrega de los 180 equipos contratados, así: 60 baterías de litio, 60 inversores y 60 reguladores (controladores).

Que estos equipos fueron entregados por el proveedor en la Subestación de San José del Guaviare, al profesional grado 02, Almacenista Gloria Yuliana Rincón Agudelo, para el respectivo trámite de ingreso a los inventarios y contabilidad de Energuaviare SA ESP.

Con esta entrega se da cumplimiento al 100% de los ítems contractuales, dando cumplimiento al objeto del Contrato No. 218 de 2026.

Cordialmente,

AR INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

Nit 901.398.915-0

Representante legal Carlos Andrés Ramírez Castro

C.C. 17.421.689 de Acacias-Meta



3186149864



arconstruccionsas@gmail.com



Calle 14B No. 9-18 Barrio El Progreso Retorno Guaviare
