

285

**INFORME PARCIAL No. 1 DE CONTRATO DE
OBRA No. SPO-CO-005-2025**



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA



INFORME DE AVANCE DE OBRA MES No. 01

CONTRATO DE OBRA No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025.

"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



CONTRATISTA:

CIVILTOP CONSTRUCCIONES SAS ZOMAC

NIT. 901379821-6

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

C.C. No. 1.122.340.473 DE SAN MIGUEL (LA DORADA)

INTERVENTORIA:

C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

NIT. No. 900.860.555-1

RTE. LEGAL: LEYDER CEDIEL CABRERA

**LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO)
05 DE DICIEMBRE DE 2025**



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

287

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.

CAPITULO I.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CAPITULO II.	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.
CAPITULO III.	CANTIDADES DE OBRA INICIALES
CAPITULO IV.	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
CAPITULO V.	AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL
CAPITULO VI.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
CAPITULO VII.	CONTROL DE CALIDAD
CAPITULO VIII.	ASPECTOS LOGISTICOS
CAPITULO IX.	ASPECTOS PRESUPUESTALES Y JURIDICOS DEL CONTRATO



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

288

INTRODUCCION

La empresa de servicios públicos **EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**, a través del contrato de obra No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025, contrató a **CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC**, identificado con NIT. No. 901379821-6, Cuyo Representante Legal es la señora **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.340.473 de San Miguel (La Dorada), para la realizar la obra denominada **"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**.

La obra se encuentra en ejecución de acuerdo al objeto contractual, por lo que se presenta ante la empresa de servicios públicos **EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**, el informe de avance correspondiente al mes No. 01, comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 a 05 de diciembre de 2025, donde se muestra el proceso de la obra y se detalla la ejecución del contrato de obra No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025, suscrito entre el **EMSERPUVAG S.A. E.S.P.** y el **CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC**, identificado con NIT. No. 901379821-6, cuyo Representante Legal es la señora **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.340.473 de San Miguel (La Dorada).



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto se enmarca dentro del plan de manejo y control de los principales sistemas de alcantarillado sanitario del municipio Valle del Guamuez (Putumayo).

El sistema de alcantarillado sanitario es una infraestructura subterránea esencial diseñada para la recolección y el transporte eficiente de aguas residuales (provenientes de viviendas, comercios e industrias) hacia plantas de tratamiento o puntos de disposición final.

Objetivo y Alcance

El objetivo general del proyecto es optimizar el sistema de alcantarillado sanitario existente en el sector, garantizando el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas. Al optimizar el sistema, se busca minimizar y evitar los problemas actuales que afectan a la comunidad.

Trabajos Específicos

La obra se centra en la Carrera 15 entre Calles 5ta y 7ma y consiste en la ejecución de las siguientes actividades:

- Instalación de Tubería: 180,55 metros lineales (m.l.) de tubería PVC con un diámetro de 10 pulgadas.
- Cámaras de Inspección: Construcción de 2 cámaras de inspección, utilizando concreto de 3.000 psi.
- Construcción y Conexiones Domiciliarias: Construcción y conexión de 11 acometidas domiciliarias de 6" al nuevo sistema de alcantarillado.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La comunidad del barrio Los Alpes enfrenta una necesidad crítica e inmediata de mejorar el acceso al servicio de saneamiento básico de alcantarillado sanitario.

- Problema Actual: Las condiciones actuales de acceso al servicio son deficientes, lo que conlleva un manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas y comerciales de la zona.



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



- Impacto: Esta situación está generando graves problemas ambientales y de salud pública entre la población residente, lo que requiere una intervención urgente para mitigar el riesgo de un aumento en las afectaciones.
- Objetivo de la Solución: Para brindar un servicio adecuado y sostenible a la comunidad y evitar la proliferación de riesgos, se ha determinado la necesidad de implementar la optimización del sistema de alcantarillado sanitario.
- Ubicación Específica de la Intervención: La acción prioritaria se centrará en la CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B del barrio Los Alpes.

Por consiguiente, se relacionan los capítulos e ítems presupuestales detallados en el contrato de obra pública No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025:

I INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES.

1.0 REALIZAR EXCAVACIONES :

- Excavación Mecánica en Material Común
- Excavación Manual de Material Común

2.0 REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO:

- Suministro e instalación de tubería sanitaria pvc $\varnothing = 10"$
- Suministro e instalación cama de cimentación con recebo $e=0,20$ más atraque y corona $e=0,45$ compactado mecánicamente
- Entibado de taludes para excavación de zanjas
- Sum. inst. de geotextil nt 1800 o similar

3.0 CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN:

- Construcción cámara de inspección en concreto de 3,000 psi $d=1,20m$ prof: $h \leq 2,00m$, inc. tapa en ferro concreto

4.0 REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES:



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 – 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

- Suministro e instalación de relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecánicamente.
- Suministro, instalación y compactación para relleno final con material de río seleccionado.
- Desalojo de materiales provenientes de la excavación.

5.00 CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO:

- Suministro e instalación de tubería sanitaria pvc $\varnothing = 6"$
- Suministro e instalación de kid silla yee estructurada de 250mm x 160mm
- Cajilla conexión domiciliaria en concreto de 3,000psi de 0,70mx0,70m medidas internas
- Sum. inst. de geotextil nt 1800 o simila

LOCALIZACION DE LAS OBRAS:

Ubicación Específica de la Intervención se centrará en la CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B del barrio Los Alpes, en la ciudad de la hormiga, municipio Valle del Guamuez, departamento del Putumayo.

Coordenadas:

"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



civiltopsas.zomac@gmail.com




311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

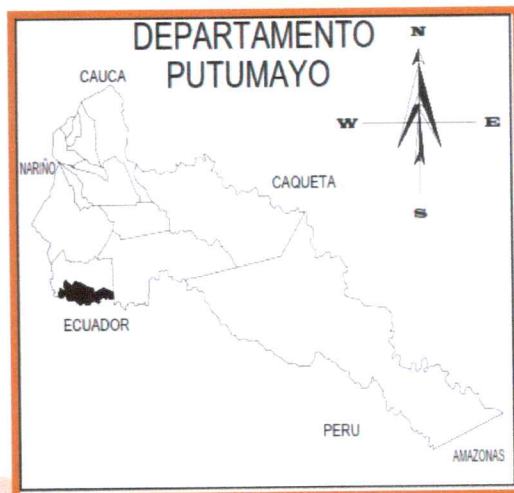

civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 – 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA



No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025.

CONTRATANTE:	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. NIT. 900.304.997-8 RTE. LEGAL: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
OBJETO:	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
CONTRATISTA:	CIVILTOP CONSTRUCCIONES SAS ZOMAC NIT. 901379821-6 RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN C.C. No. 1.122.340.473 DE SAN MIGUEL (LA DORADA)
INTERVENTORIA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS NIT. 900,860,555-1
VALOR INICIAL:	\$ 199.995.892,43 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$ 00,00 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$ 199.995.892,43 M/CTE



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

PLAZO:	UN (01) MESE, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	12 DE DICIEMBRE DE 2025

CANTIDADES INICIALES:

El proyecto que se desarrolla se conoce como "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en el Municipio los indicadores de cobertura de alcantarillado sanitario son ineficientes.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario y urgente realizar la: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", con este proyecto se logrará mejorar el sistema de alcantarillado sanitario del casco urbano de la Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo).

A continuación, se anexa el presupuesto a intervenir.



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CONDICIONES INICIALES					
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,0	REALIZAR EXCAVACIONES				
1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286,78	\$ 29.900,00	\$ 8.574.722,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73,39	\$ 30.319,44	\$ 2.225.143,70
2,0	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180,55	\$ 129.860,31	\$ 23.446.278,97
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45	M3	105,84	\$ 141.748,25	\$ 15.002.280,41
2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671,65	\$ 46.528,13	\$ 31.250.618,51
2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695,12	\$ 19.364,24	\$ 13.460.470,51
3,0	CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN				
3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI	UND	2,00	\$ 4.448.441,35	\$ 8.896.882,70
4,0	REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	193,45	\$ 23.900,00	\$ 4.623.455,00
4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	\$ 142.575,00	\$ 10.832.135,63
4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	\$ 16.500,00	\$ 4.226.681,25
5,0	CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57,25	\$ 98.405,56	\$ 5.633.718,31
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE	UND	11,00	\$ 210.673,25	\$ 2.317.405,75
5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE	UND	11,00	\$ 1.317.509,77	\$ 14.492.607,47
5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA	M2	220,42	\$ 19.364,24	\$ 4.268.265,78
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			%	\$ 149.250.665,99
	COSTOS INDIRECTOS	Administracion		29%	\$ 43.282.693,14
		Utilidad		4%	\$ 5.970.026,64
		Imprevistos		1%	\$ 1.492.506,66
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			34%	\$ 50.745.226,44
	TOTAL COSTO DE OBRA				\$ 199.995.892,43

CANTIDADES EJECUTADAS:

De acuerdo a las actividades desarrolladas durante la ejecución de la obra cuyo objeto es la "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", a continuación, se describen las actividades ejecutadas comprendidas entre el 13 de noviembre de 2025 al 5 de diciembre de 2025:



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDO S	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1.0	REALIZAR EXCAVACIONES										
1.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	288.78	\$ 28.500,00	\$ 8.194.722,00	\$ -		288.78	\$ 8.194.722,00	0,00	\$ -
1.2	EXCAVACION MANUA EN MATERIAL COMUN	M3	75.39	\$ 30.319,44	\$ 2.286.149,70	\$ -		49.49	\$ 1.500.529,29	23,90	\$ 724.634,62
2.0	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø 10"	ML	180,55	\$ 129.880,31	\$ 23.448.278,97	\$ -		180,55	\$ 23.448.278,97	0,00	\$ -
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECIBO E4020 MAS ATRAQUE Y CORONA E4046	M3	105,84	\$ 141.748,25	\$ 15.002.280,41	\$ -		99,11	\$ 14.049.023,43	6,72	\$ 953.256,98
2.3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACION DE ZANJAS	M2	671,65	\$ 46.628,13	\$ 31.260.618,51	\$ -		671,66	\$ 31.260.618,51	0,00	\$ -
2.4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1820 O SIMILAR	M2	655,12	\$ 19.364,24	\$ 13.460.470,51	\$ -		655,12	\$ 13.460.470,51	0,00	\$ -
3.0	CONSTRUCCION CAMARAS DE INSPECCION										
3.1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI	UND.	2,00	\$ 4.448.441,35	\$ 8.896.882,70	\$ -		2,00	\$ 8.896.882,70	0,00	\$ -
4.0	REALIZAR RELLENO Y OTRAS ACTIVIDADES										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	193,45	\$ 23.900,00	\$ 4.623.455,00	\$ -		192,95	\$ 4.370.115,00	10,50	\$ 253.340,00
4.2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	\$ 142.575,00	\$ 10.832.135,83	\$ -		70,39	\$ 10.035.497,81	5,59	\$ 796.637,81
4.3	DESAJOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	\$ 15.500,00	\$ 4.026.881,25	\$ -		110,27	\$ 1.819.475,04	145,89	\$ 2.407.206,20
5.0	CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS										
5.1	ALCANTARILLADO										
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø 6"	ML	57,25	\$ 56.405,56	\$ 3.233.718,31	\$ -		35,99	\$ 3.541.616,10	21,26	\$ 2.092.102,21
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID BILLA YEE	UND.	11,00	\$ 210.673,25	\$ 2.317.406,75	\$ -		7,00	\$ 1.474.712,74	4,00	\$ 842.693,00
5.3	CAJILLA CONEXION DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	UND.	11,00	\$ 1.317.509,77	\$ 14.492.607,47	\$ -		7,00	\$ 9.222.566,39	4,00	\$ 5.270.039,08
5.4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1820 O SIMILAR	M2	223,42	\$ 19.364,24	\$ 4.306.265,78	\$ -		138,26	\$ 2.683.109,05	85,16	\$ 1.624.156,69
TOTAL COSTOS DIRECTOS				5%	\$ 149.250.665,99	\$ -			\$ 134.325.599,39		\$ 14.925.066,59
COSTO S INDIRECTOS				Administracion	25%	\$ 43.262.663,14	\$ -		\$ 38.954.423,83		\$ 4.328.239,32
				Utilidad	4%	\$ 5.970.026,84	\$ -		\$ 5.373.023,96		\$ 597.002,86
				Imprevistos	1%	\$ 1.492.506,86	\$ -		\$ 1.343.255,99		\$ 149.250,87
TOTAL COSTOS INDIRECTO S				34%	\$ 50.745.226,44	\$ -			\$ 45.670.703,80		\$ 5.074.522,85
TOTAL COSTO DE OBRA					\$ 199.995.892,43	\$ -			\$ 179.996.303,19		\$ 19.999.589,24

BALANCE DE EJECUCION A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	199.996.892,43	VALOR DE ANTICIPO CONTRATO INICIAL 30%:	\$	-	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$	-	VALOR DE ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL 30%:	\$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	199.996.892,43	VALOR TOTAL DE ANTICIPOS:	\$	-	
VALOR ACTA PARCIAL No.1:	\$	179.996.303,19	AMORTIZACION DEL 30% SEGUN ACTA PARCIAL No.1:	\$	-	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$	179.996.303,19	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$	19.999.589,24				
			VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO	PORCENTAJE	90,00%	\$ 179.996.303,19
			VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE	10,00%	\$ 19.999.589,24
			TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA			\$ 179.996.303,19
SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL						

Anotación: La anterior tabla financiera de Avance de obra No. 01, se presenta en un anexo firmado por las partes

AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL.

Tomando en cuenta que la obra se desarrolla en el sector urbano, Barrio Los Alpes de la Cabecera municipal La Hormiga del Municipio Valle del Guamuez (Putumayo), y teniendo en cuenta las observaciones y/o solicitudes por parte de la firma interventora, hasta la fecha no se tiene inconvenientes en cuanto al traslado del transporte de material pétreo, el contratista presenta un avance del 90%, como porcentaje de avance de obra, equivalente a CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS(\$ 179.996.303,19 M/CTE), comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 al 5 de diciembre de 2025.



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664




Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

GRAFICA ESTADO DEL TIEMPO

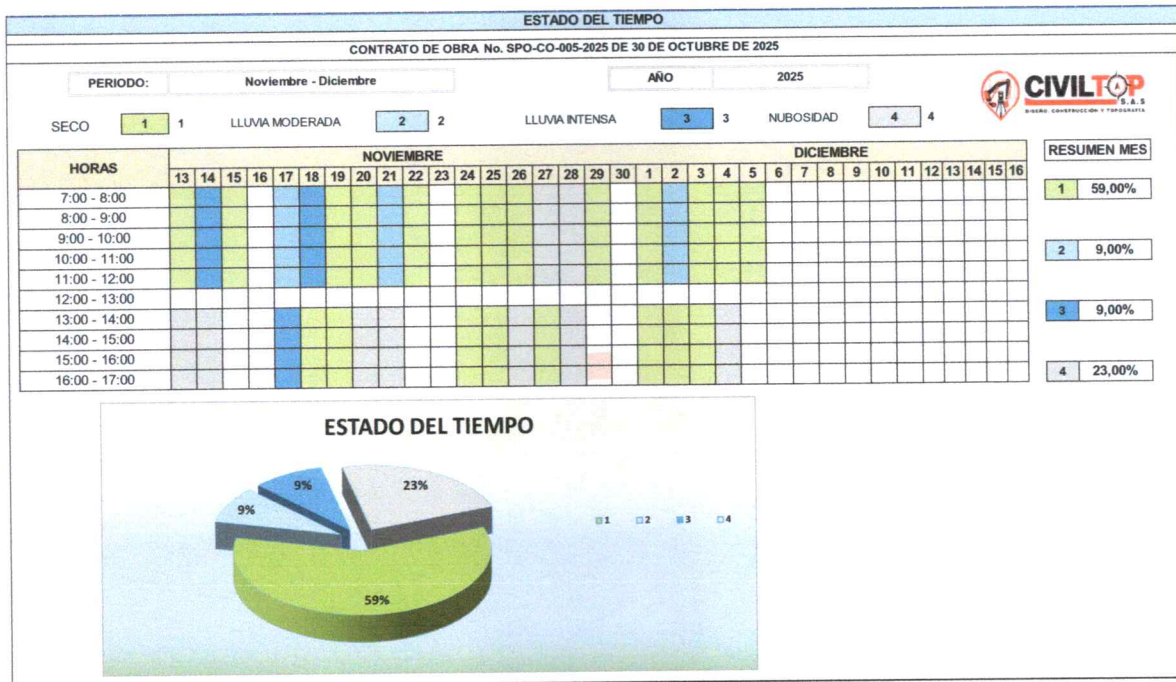

GRAFICA DE TIEMPO DE OBRA



GRAFICA DE EJECUCION FISICA DE OBRA



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA



Ejecucion Fisica de Obra



Avance Fisico de Obra




Obra Por Ejecutar

GRAFICA DE RESUMEN FINANCIERO



Porcentaje Total del Contrato



Porcentaje Total Pagado



Porcentaje por Pagar

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA INICIO DE LAS OBRAS.

Para el inicio de la obra, se tiene todos los documentos en regla, para la planeación previa de la obra se cuenta con un paquete de planos: estructural, cortes, geométricos, localización, topográficos planimétricos y altimétricos con los que se identifican todos los componentes necesarios para dar inicio a las actividades contractuales.



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

ACTA DE INICIO.

El acta de inicio se realizó después de la revisión de documentación inicial por parte de la interventoría externa que para este caso en particular el ING. **LEYDER CEDIEL CBRERA**, en calidad de Interventor Externo, actuando en nombre de C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS, la Señora **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN**, representante legal de la firma **CIVILTOP CONSTRUCCIONES SAS ZOMAC**, y el Supervisor Designado, por parte de **EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**, fechada el día 13 de noviembre de 2025.

ACTAS DE COMITES, OFICIOS Y/O CORRESPONDENCIA REALIZADOS EN EL CORTE DEL MES 01:

Durante la ejecución del contrato, no se han suscrito documentos y/o correspondencias, ni actas de comités en relación con el presente contrato.

CONTROL DE CALIDAD:

La finalidad del control que se realiza, es comprobar que la obra cumpla unas características de calidad que permitan garantizar una determinada probabilidad de aceptación y que la obra en su conjunto y cada uno de los elementos que la componen sean conforme tanto con los criterios generales, como con los particulares que se definan, en su caso, por el proyecto que se encuentra en ejecución.

El control de calidad que se realiza es parte fundamental para una finalización exitosa del proyecto, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en los diferentes planos, el control de calidad en su sentido más amplio y las observaciones visuales y mediciones en obra por parte de la firma interventora y supervisión designada.



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

ASPECTOS LOGISTICOS:

Durante la ejecución de la obra se coloca a disposición el siguiente personal:

Residente de obra
Comisión Topográfica
Maestro de obra
Ayudantes

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA:

Pajarita
Volqueta 7 m³
Mezcladora
Vibrador de concreto
Buggis
Taladro
Pulidora
Herramienta menor



ASPECTOS PRESUPUESTALES Y JURÍDICOS DEL CONTRATO:

La empresa de servicios públicos **EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**, a través del contrato de obra No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025, contrató a **CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC**, identificado con NIT. No. 901379821-6, Cuyo Representante Legal es la señora **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.340.473 de San Miguel (La Dorada), para la realizar la obra denominada "**OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**", por un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVO M/CTE. (\$ 199.995.892,43 M/CTE)

Por otra parte, a la fecha de acuerdo a la CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO, no se ha realizado el desembolso del 30,00%, por concepto de pago anticipado, por un valor equivalente a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 59.998.767,73M/CTE)

CONTROL DE PÓLIZAS Y SERVICIOS PRESUPUESTALES.

Inicialmente, el contratista cuenta con una póliza de **cumplimiento** con SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6, mediante No. AGP-100005519, (Anexo 0), emitida en fecha 31 de octubre de 2025, con los siguientes amparos:

AMPAROS	PORCENTAJE	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	10,00%	\$ 19.999.589,24	31-10-2025	31-05-2026
ANTICIPO	100,00%	\$ 59.998.767,73	31-10-2025	31-05-2026
PRESTACIONES SOCIALES	10,00%	\$ 19.999.589,24	31-10-2025	30-11-2028
CALIDAD DEL SERVICIO	10,00%	\$ 19.999.589,24	31-10-2025	31-05-2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10,00%	\$ 19.999.589,24	30-11-2025	30-11-2030

NOTA: La vigencia del amparo de estabilidad de la obra tiene vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra.

Una póliza de seguro de **responsabilidad civil Extracontractual** que cubre los posibles daños a terceros en razón a actividades de la obra a ser ejecutadas según el contrato en mención con SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6, mediante No. AGP-100000969, (Anexo 0), emitida en fecha 31 de octubre de 2025, con los siguientes amparos:



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 – 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



AMPAROS	PORCENTAJE	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV, en predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025
PATRONAL	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025

MODIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

Mediante el presente **anexo No. 01** de la póliza de **cumplimiento** con la aseguradora SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6, No. AGP-100005519, (Anexo 1), emitida en fecha 19 de noviembre de 2025,

AMPAROS	PORCENTAJE	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	10,00%	-\$ 19.999.589,24	31-10-2025	31-05-2026
ANTICIPO	100,00%	-\$ 59.998.767,73	31-10-2025	31-05-2026
PRESTACIONES SOCIALES	10,00%	-\$ 19.999.589,24	31-10-2025	30-11-2028
CALIDAD DEL SERVICIO	10,00%	-\$ 19.999.589,24	31-10-2025	31-05-2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10,00%	-\$ 19.999.589,24	30-11-2025	30-11-2030

Mediante el presente **anexo No. 01** de la póliza de seguro de **responsabilidad civil Extracontractual** con la aseguradora SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6, No. AGP-100000969, (Anexo 1), emitida en fecha 19 de noviembre de 2025,

AMPAROS	PORCENTAJE	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV, en predios, labores y operaciones	-\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025
PATRONAL	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	-\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	-\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	-\$ 284.700.000,00	31-10-2025	30-11-2025

Mediante el presente **anexo No. 02** de la póliza de **cumplimiento** con la aseguradora SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6, No. AGP-100005519, (Anexo 2), emitida en fecha 19 de noviembre de 2025, **mediante el presente anexo se aplica el acta de inicio a la póliza arriba citada**, conforme al acta de inicio del 13 de noviembre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

AMPAROS	PORCENTAJE	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	10,00%	\$ 19.999.589,24	13-11-2025	13-06-2026
ANTICIPO	100,00%	\$ 59.998.767,73	13-11-2025	13-06-2026
PRESTACIONES SOCIALES	10,00%	\$ 19.999.589,24	13-11-2025	13-12-2028
CALIDAD DEL SERVICIO	10,00%	\$ 19.999.589,24	13-11-2025	13-06-2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10,00%	\$ 19.999.589,24	13-12-2025	13-12-2030

Mediante el presente **anexo No. 02** de la póliza de seguro de **responsabilidad civil Extracontractual** con la aseguradora SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6, No. AGP-100000969, (Anexo 2), emitida en fecha 19 de noviembre de 2025, **Mediante el presente anexo se aplica el acta de inicio a la póliza arriba citada**, conforme acta de inicio del 13 de noviembre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

AMPAROS	PORCENTAJE	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV, en predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000,00	13-11-2025	13-12-2025
PATRONAL	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	\$ 284.700.000,00	13-11-2025	13-12-2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	\$ 284.700.000,00	13-11-2025	13-12-2025



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 - 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Deducible 10,00% el valor de la Perdida – Mínimo 1,00 SMMLV	\$ 284.700.000,00	13-11-2025	13-12-2025
--------------------------------	---	-------------------	------------	------------

PAGOS:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pagos realizados 00,00%	\$ 0.00

ESTADO FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 199.995.892,43
VALOR ADICIONAL	\$ 00,00 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIONALES	\$ 199.995.892,43
VALOR ACTA PARCIAL N°1	\$ 179.996.303,19
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 179.996.303,19
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 19.999.589,24

Para constancia, se firma el presente **INFORME DE AVANCE MENSUAL DE OBRA No. 01**, el día cinco (05) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Marcela Diaz

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
C.C. N°. 1.122.340.473 de San Miguel (La Dorada)
CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
NIT. 901379821-6
Contratista de Obra

Anexos:



Registro Fotográfico



Registro de Lluvia



Certificado de Parafiscales



Acta de Avance de Obra No. 01.



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 – 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

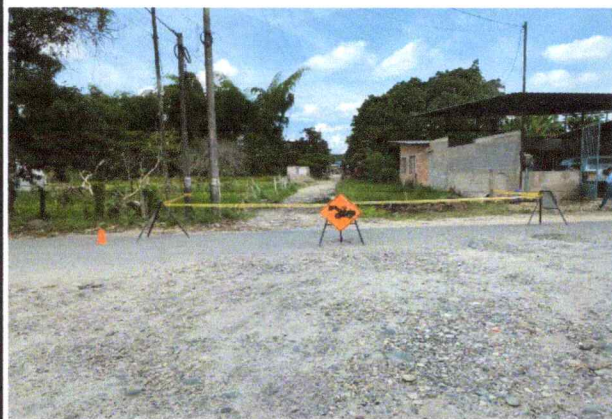


Foto No: 1

COMISION TOPOGRAFICA PARA LA LOCALIZACION Y REPLANTEO



Foto No: 2

COMISION TOPOGRAFICA PARA LA LOCALIZACION Y REPLANTEO



Foto No: 3

COMISION TOPOGRAFICA PARA LA LOCALIZACION Y REPLANTEO



Foto No: 4

COMISION TOPOGRAFICA PARA LA LOCALIZACION Y REPLANTEO

Firma:

Marcela Diaz

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 5

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN

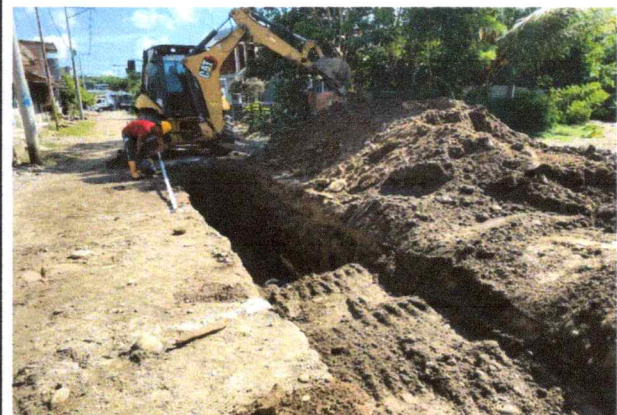


Foto No: 6

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN



Foto No: 7

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN



Foto No: 8

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN

Firma: Marcela Diaz
Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 9

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN



Foto No: 10

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN



Foto No: 11

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN



Foto No: 12

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

Firma:

Marcela DIAZ

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.

SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO

"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"



Foto No: 14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"



Foto No: 15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"



Foto No: 16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"

Firma:

Marcela Díaz

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 17

SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON
RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO
MECANICAMENTE



Foto No: 18

SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON
RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO
MECANICAMENTE



Foto No: 19

SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON
RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO
MECANICAMENTE



Foto No: 20

SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON
RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO
MECANICAMENTE

Firma: MARCELA DIAZ
Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 21

ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS



Foto No: 22

ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS

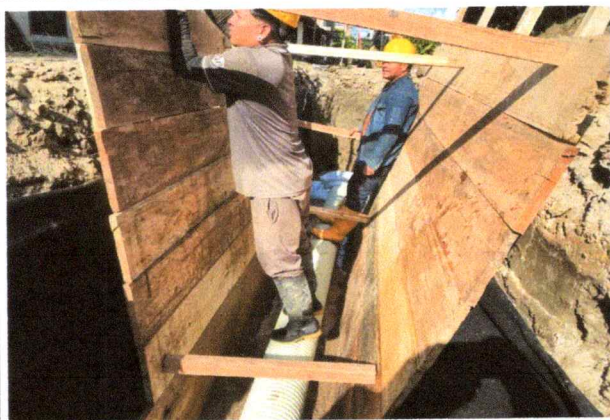


Foto No: 23

ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS

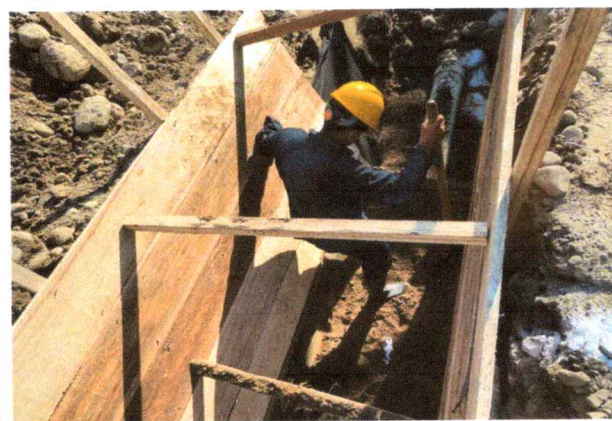


Foto No: 24

ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Firma:

MARCELA DIAZ

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.

SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO

"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 25

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR



Foto No: 26

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR

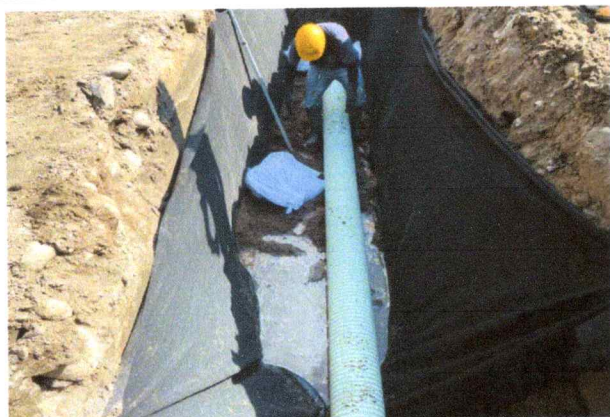


Foto No: 27

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR



Foto No: 28

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR

Firma:

Marcela Díaz

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 29

CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO



Foto No: 30

CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO



Foto No: 31

CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO



Foto No: 32

CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO

Firma:

Marcela Diaz

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 33

SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO
MECANICAMENTE



Foto No: 34

SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO
MECANICAMENTE



Foto No: 35

SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO
MECANICAMENTE



Foto No: 36

SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO
MECANICAMENTE

Firma:

MARCELA DIAZ

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 37

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO
FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO



Foto No: 38

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO
FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO



Foto No: 39

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO
FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO



Foto No: 40

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO
FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO

Firma:

Marcela Díaz

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 41

DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION



Foto No: 42

DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION



Foto No: 43

DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION

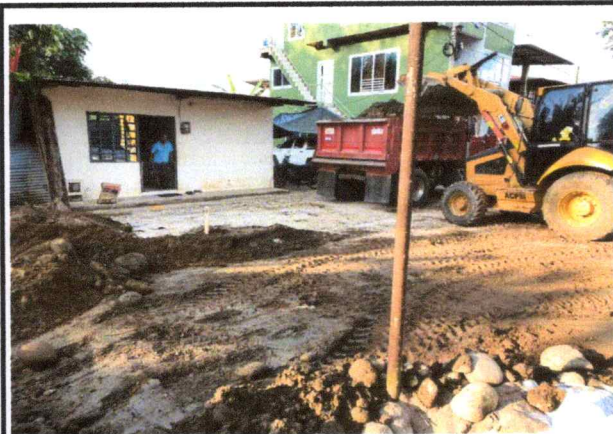


Foto No: 44

DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION

Firma:

Marcela Olaz

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 45

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"



Foto No: 46

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"



Foto No: 47

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"



Foto No: 48

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"

Firma:

MARCELA DIAZ

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 49

SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA
DE 250mm x 160mm



Foto No: 50

SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA
DE 250mm x 160mm



Foto No: 51

SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA
DE 250mm x 160mm



Foto No: 52

SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA
DE 250mm x 160mm

Firma:

MARCELA DIAZ

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 53

CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS



Foto No: 54

CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS



Foto No: 55

CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS

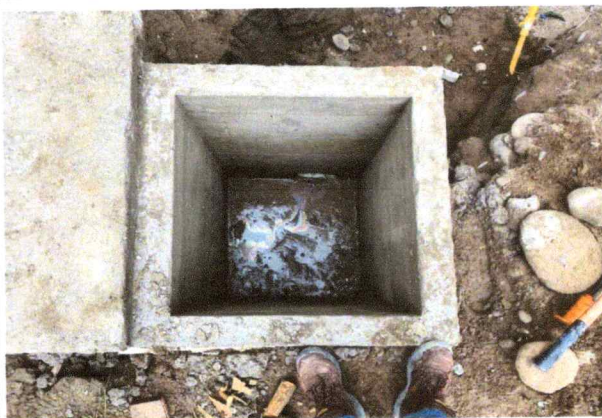


Foto No: 56

CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS

Firma:

MARCELA DIAZ

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No.	SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".



Foto No: 57

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR



Foto No: 58

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR



Foto No: 59

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR



Foto No: 60

SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR

Firma:

MARCELA DIAZ

Nombre: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Contratista de Obra

Noviembre - Diciembre

2025

LLUVIA MODERADA

2	2
---	---

LLUVIA INTENSA

33

NUBOSIDAD

4	4
---	---




CIVILTOP S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

RESUMEN MES	
1	59,00%
2	9,00%
3	9,00%
4	23,00%

[illegible]

ESTADO DEL TIEMPO

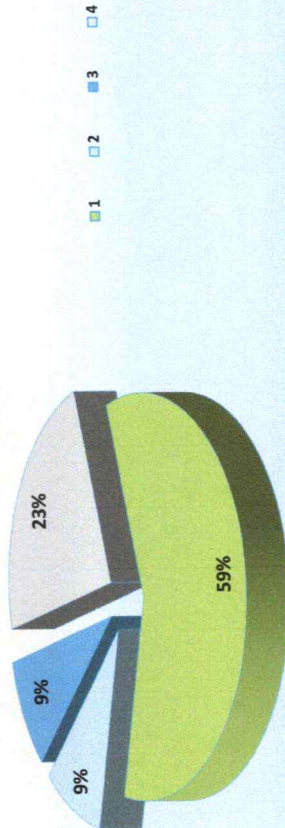**REALIZÓ**

APROBÓ

Vo.Bo.



CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
Supervision - EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

Marcela Diaz

CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
Contratista de Obra

C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
Contratista de Interventoría



EMSERPUVAG S.A. E.S.P.		EMSERPUVAG S.A. E.S.P.							
NIT. 900.304.997-8		NIT. 900.304.997-8							
PREACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		PREACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1							
DESCRIPCION CONTRATO		DESCRIPCION CONTRATO							
OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		SUPERVISOR: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA							
CONTRATISTA: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S.		UN (01) MES							
NIT: 901379821-6		VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 199.995.892,43							
R.L: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: \$ -							
IDENTIFICACION: C.C. N° 1122340473		VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 199.995.892,43							
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y		FECHA DE SUSCRIPCION: 30/10/2025							
IDENTIFICACION: Nit. 900.860.555-1		FECHA DE INICIO: 13/11/2025							
SUPERVISOR: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ C.		FECHA DE TERMINACION: 12/12/2025							
jueves, 13 de noviembre de 2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 5/12/2025							
PERIODO EJECUTADO DEL ACTA DESDE: HASTA:		viernes, 5 de diciembre de 2025							
En el Municipio Valle del Guamuez, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año 2025, Se reunieron en las instalaciones de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Valle Del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P., CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA, Gerente EMSERPUVAG S.A. E.S.P., en calidad de SUPERVISOR del Contrato de Obra No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025, el ingeniero LEYDER CEDIEL CABRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.131.085.107 de Nariño (N), en calidad de INTERVENTOR según Contrato de Consultoría No. SUO-CD-018-2025 DE 31 DE OCTUBRE DE 2025 y la señora DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN identificada con cedula de ciudadanía N° 1.122.340.473 de San Miguel (P), en calidad de Representante Legal de la empresa CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC, con Nit. No. 901379821-6 CONTRATISTA DE OBRA, mediante el presente documento se deja constancia Acta De Recibo Parcial No. 1, teniendo en cuenta las actividades contractuales detalladas a continuación:									
CONDICIONES INICIALES									
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1.0	REALIZAR EXCAVACIONES								
1.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286,78	\$ 29.900,00	\$ 8.574.722,00		\$ -	286,78	\$ 8.574.722,00
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73,39	\$ 30.319,44	\$ 2.225.143,70		\$ -	49,49	\$ 1.500.509,09
2.0	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA								
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180,55	\$ 129.860,31	\$ 23.446.278,97		\$ -	180,55	\$ 23.446.278,97
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45	M3	105,84	\$ 141.748,25	\$ 15.002.280,41		\$ -	99,11	\$ 14.049.023,43
2.3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACION DE ZANJAS	M2	671,65	\$ 46.528,13	\$ 31.250.618,51		\$ -	671,65	\$ 31.250.618,51
2.4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695,12	\$ 19.364,24	\$ 13.460.470,51		\$ -	695,12	\$ 13.460.470,51
3.0	CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCION								
3.1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI	UND	2,00	\$ 4.448.441,35	\$ 8.896.882,70		\$ -	2,00	\$ 8.896.882,70
4.0	REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES								
4.1	SELECCIONADO	M3	193,45	\$ 23.900,00	\$ 4.623.455,00		\$ -	182,85	\$ 4.370.115,00
4.2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	\$ 142.575,00	\$ 10.832.135,63		\$ -	70,39	\$ 10.035.497,81
4.3	DESALJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	\$ 16.500,00	\$ 4.226.681,25		\$ -	110,27	\$ 1.819.475,04
5.0	CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS								
5.1	ALCANTARILLADO								
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57,25	\$ 98.405,56	\$ 5.633.718,31		\$ -	35,99	\$ 3.541.616,10
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 8"	UND	11,00	\$ 210.673,25	\$ 2.317.405,75		\$ -	7,00	\$ 1.474.712,75
5.3	CARRELA CURBADA DE 60CM ANCHURA EN CONCRETO DE 3.000PSI DE	UND	11,00	\$ 1.317.509,77	\$ 14.492.607,47		\$ -	7,00	\$ 9.222.588,39
5.4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA	M2	220,42	\$ 19.364,24	\$ 4.268.265,78		\$ -	138,56	\$ 2.683.109,09
TOTAL COSTOS DIRECTOS				%	\$ 149.250.665,99		\$ -		\$ 134.325.599,39
COSTOS INDIRECTOS				29%	\$ 43.282.693,14		\$ -		\$ 38.954.423,83
				4%	\$ 5.970.026,64		\$ -		\$ 5.373.023,98
				1%	\$ 1.492.506,66		\$ -		\$ 1.343.255,99
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				34%	\$ 50.745.226,44		\$ -		\$ 45.670.703,80
TOTAL COSTO DE OBRA					\$ 199.995.892,43		\$ -		\$ 179.996.303,19
									\$ 19.999.589,24



NIT. 900.304.997-8

PREACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

[illegible]

PREACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

FECHA:

viernes, 5 de diciembre de 2025

PERIODO EJECUTADO DEL ACTA DESDE:

HASTA:	jueves. 13 de noviembre de 2025
--------	---------------------------------

En el Municipio Valle del Guamuez, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año 2025, Se reunieron en las instalaciones de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Valle Del Guamuez - EMERPUVAG S.A. E.S.P., **CARLOS CESNEHEDER QUIROZ CAMPAÑA**, Gerente **EMERPUVAG S.A. E.S.P.**, en calidad de **SUPERVISOR** del Contrato de Obra No. SPO-CO-005-2025 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025, el ingeniero **LEYDER CEDIEL CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.131.085.107 de Nariño (N), en calidad de **INTERVENTOR** según Contrato de Consultoría No. SUO-CO-018-2025 DE 31 DE OCTUBRE DE 2025 y la señora **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN** identificada con cedula de ciudadanía N°. 1.122.340.473 de San Miguel (P), en calidad de Representante Legal de la empresa **CIVIL TOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC**, con Nit. No. 901379821-6 **CONTRATISTA DE OBRA**, mediante el presente documento se deja constancia **Acta De Recibo Parcial No. 1**, teniendo en cuenta las actividades contractuales detalladas a continuación:

CONDICIONES INICIALES													
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID.			CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDOS	
		BALANCE DE EJECUCION A LA FECHA						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
BALANCE DEL ANTICIPO:													
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$			199.995.892,43		VALOR DE ANTICIPO CONTRATO INICIAL 30%:		\$		-	
	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		\$		-			VALOR DE ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL 30%:		\$		-	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$			199.995.892,43		VALOR TOTAL DE ANTICIPOS:		\$		-	
	VALOR ACTA PARCIAL No.1:		\$			179.996.303,19		AMORTIZACIÓN DEL 30% SEGUN ACTA PARCIAL No.1:		\$		-	
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:		\$			179.996.303,19		SALDO POR AMORTIZAR:		\$		-	
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:		\$			19.999.589,24							
								VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO		90,00%		\$	179.996.303,19
								VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		10,00%		\$	19.999.589,24
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA											\$		179.996.303,19
SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL													

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA O EL PERÍODO FACTURADO:

viernes, 5 de diciembre de 2025

viernes, 5 de diciembre de 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: viernes, 5 de diciembre de 2025

POR EL CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA

POR LA SUPERVISIÓN

CIVIL TOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

Interventor Según

100

901379821-6

Contrato de Consultoría No. SUO-CD-018-2025

Proyecto y Aprobó P.T.: LEYDER CEDIEL CABRERA

Reviso P.T.: EDELBERTO JEREZ NOVOA.

Reviso P.T.: EDELBERTO JEREZ NOVOA.

Contractor's Name:

Apoyo Profesional Emserpuvaq S.A. E.S.P.

Apoyo Profesional Emserpuvaq S.A. E.S.P.

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA												
CAPITULO 1		INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES							UNIDAD		CANTIDAD	
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."												
ITEM: 1,1		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL MIXTO							M3		286,78	
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCH	LARGO	V		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	63,60	0,90	1,82		1,00				104,18	104,18		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	58,40	0,90	1,87		1,00				98,29	98,29		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	58,55	0,90	1,60		1,00				84,31	84,31	286,78	0,00
TOTAL PARCIAL									286,78			
Pag. 1 de 14												
<div>Marcela Diaz</div> <div>DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN</div> <div>R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC</div> <div>CONTRATISTA DE OBRA</div>				<div></div> <div>LEYDER CEPEDA CABRERA</div> <div>R/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S</div> <div>CONTRATISTA DE INTERVENTORIA</div>				<div></div> <div>CARLOS CESAR QUIROZ CAMPAÑA</div> <div>GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P</div> <div>SUPERVISOR</div>				

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA															
CAPITULO 1	INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS								UNIDAD	CANTIDAD					
“ OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”															
ITEM: 1.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO										M3	73,39				
AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS			CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR			
H	ANCH	LARGO	AREA	A		L	H								
Excavacion Tubería de 6" - Domiciliaria (1)	1,40	0,70	4,57		1,00				4,48	4,48					
Excavacion Tubería de 6" - Domiciliaria (2)	1,35	0,70	4,68		1,00				4,42	4,42					
Excavacion Tubería de 6" - Domiciliaria (3)	1,35	0,70	4,72		1,00				4,46	4,46					
Excavacion Tubería de 6" - Domiciliaria (4)	1,35	0,70	4,74		1,00				4,48	4,48					
Excavacion Tubería de 6" - Domiciliaria (5)	1,40	0,70	6,54		1,00				6,41	6,41					
Excavacion Tubería de 6" - Domiciliaria (6)	1,35	0,70	5,38		1,00				5,08	5,08					
Excavacion Tubería de 6" - Domiciliaria (7)	1,35	0,70	5,36		1,00				5,07	5,07					
Excavacion Camaras (2)	1,86			2,27	2,00				4,22	8,44		23,90			
Excavacion Cajillas (11)	0,95	1,00	1,00		7,00				0,95	6,65					
										-					
TOTAL PARCIAL											49,49				

Pag. 2 de 14

Marcela DIAZ
DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
R/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCOTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

GERENTE ENSERPIVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

LEYDER CEDIEL CABRERA
R/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


CARLOS ROBERTO DÍAZ
GERENTE EMERPUVAG S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

	Pag. 3 de 14
--	--------------

SUPERVISOR

326

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA											
CAPITULO 2		REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO						UNIDAD	CANTIDAD		
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."											
ITEM: 2.2		SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE						M3	105,84		
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS			CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO		MEÑOS AREA TUBO	A	L				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,65	0,90	63,60		1,00			37,21	37,21		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,65	0,90	58,40		1,00			34,16	34,16		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,65	0,90	58,55		1,00			34,25	34,25		
Domiciliaria (1)	0,53	0,70	4,57		1,00			1,70	1,70		
Domiciliaria (2)	0,53	0,70	4,68		1,00			1,74	1,74		
Domiciliaria (3)	0,53	0,70	4,72		1,00			1,75	1,75		
Domiciliaria (4)	0,53	0,70	4,74		1,00			1,76	1,76		
Domiciliaria (5)	0,53	0,70	6,54		1,00			2,43	2,43		
Domiciliaria (6)	0,53	0,70	5,38		1,00			2,00	2,00		
Domiciliaria (7)	0,53	0,70	5,36		1,00			1,99	1,99		
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos			63,60	(0,20)	1,00			(12,49)	- 12,49		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos			58,40	(0,20)	1,00			(11,47)	- 11,47		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos			58,55	(0,20)	1,00			(11,50)	- 11,50		
Domiciliaria (1)			4,57	(0,12)	1,00			(0,54)	- 0,54		
Domiciliaria (2)			4,68	(0,12)	1,00			(0,55)	- 0,55		
Domiciliaria (3)			4,72	(0,12)	1,00			(0,56)	- 0,56		
Domiciliaria (4)			4,74	(0,12)	1,00			(0,56)	- 0,56		
Domiciliaria (5)			6,54	(0,12)	1,00			(0,77)	- 0,77		
Domiciliaria (6)			5,38	(0,12)	1,00			(0,63)	- 0,63		
Domiciliaria (7)			5,36	(0,12)	1,00			(0,63)	- 0,63		
SUBTOTAL									79,29		
COMPACTACION (1,25%)									19,82		
TOTAL PARCIAL										99,11	
									99,11	6,72	

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER PEDIEL CABRERA

U/L: CBC INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.!

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS CAMERON QUIROZ CAMPAÑA

GERENTE EMERPIVAG S.A. E.S.P

SUPERVISOR

Pag. 4 de 14

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA												
CAPITULO 2		REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO							UNIDAD	CANTIDAD		
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."												
ITEM: 2.3		ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS							M2	671,65		
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
		1.86		63.60		2,00				118.30	236.59	
		1.86		58.40		2,00				108.62	217.25	
		1.86		58.55		2,00				108.90	217.81	
										-	-	
TOTAL PARCIAL											671,65	
Pag. 5 de 14												
MARCELA DIAZ												
DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC CONTRATISTA DE OBRA				LEYDI CIBIEL CABRERA U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				CARLOS ESCOBAR GONZALEZ CAMPAÑA GERENTE EMSEPUVAG S.A. E.S.P SUPERVISOR				

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA															
CAPITULO 2		REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO						UNIDAD		CANTIDAD					
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."															
ITEM: 2,4		SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR						M2		695,12					
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR			
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H							
	Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos		3,85	63,60		1,00				244,86			244,86	695,12	0,00
	Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos		3,85	58,40		1,00				224,84			224,84		
	Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos		3,85	58,55		1,00				225,42			225,42		
									-	-					
TOTAL PARCIAL										695,12					
Pag. 6 de 14															
MANCELA DIAZ											CARLOS EMERPUVAG S.A. E.S.P GERENTE EMERPUVAG S.A. E.S.P SUPERVISOR				
DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN						LEYDEN CEBEL CABRERA					UL: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.				
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC						CONTRATISTA DE INTERVENTORIA									
CONTRATISTA DE OBRA															

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA												
CAPITULO 3		CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD		
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."												
ITEM: 3.1		CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO							UND	2,00		
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Camara de Inspeccion Reforzada					2,00				2,00	2,00		
									-	-		
									-	-		
									-	-		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										2,00		
												2,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
</												

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA												
CAPITULO 4		REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES					UNIDAD	CANTIDAD				
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."												
ITEM: 4.2		SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO					M3	75,98				
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,30	0,90	63,60		1,00				17,17	17,17		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,30	0,90	58,40		1,00				15,77	15,77		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,30	0,90	58,55		1,00				15,81	15,81		
Domiciliaria (1)	0,30	0,70	4,57		1,00				0,96	0,96		
Domiciliaria (2)	0,30	0,70	4,68		1,00				0,98	0,98		
Domiciliaria (3)	0,30	0,70	4,72		1,00				0,99	0,99		
Domiciliaria (4)	0,30	0,70	4,74		1,00				1,00	1,00		
Domiciliaria (5)	0,30	0,70	6,54		1,00				1,37	1,37		
Domiciliaria (6)	0,30	0,70	5,38		1,00				1,13	1,13		
Domiciliaria (7)	0,30	0,70	5,36		1,00				1,13	1,13		
SUBTOTAL										56,31		
COMPACTACION (1,25%)										14,08		
TOTAL PARCIAL										70,39		
Pag. 9 de 14												

MANUELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC

CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDEI CABRERA

R/L: CBC INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.:

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS PINEDA


GERENTE ENSERPUVAG S.A. E.S.P

SUPERVISOR

MARCELA DIAZ
 DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
 R/L CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
 CONTRATISTA DE OBRA


 LEYDER CEDELL CABRERA
 U/L CRC INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


 CARLOS ENRIQUE TURROZ CAMPAÑA
 GERENTE EMSEPVIVAG S.A. E.S.P
 SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA														
CAPITULO 5			CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO							UNIDAD	CANTIDAD			
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."														
ITEM: 5.2			SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm										UND	11,00
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR		
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H						
	Kit Silla Yee Estructurada 250mm*160mm				7,00				7,00	7,00				
									-	-				
									-	-	7,00	4,00		
TOTAL PARCIAL										7,00				
Pag. 12 de 14														
<div>MARCELA DIAZ</div> <div>DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN</div> <div>R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC</div> <div>CONTRATISTA DE OBRA</div>														
<div>LEYDEN CIDUELA CABRERA</div> <div>U/L: CBC INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.</div> <div>CONTRATISTA DE INTERVENTORIA</div>														
<div>CARLOS ESTEBAN GUEROZ CAMPAÑA</div> <div>GERENTE EMERPUVAG S.A. E.S.P</div> <div>SUPERVISOR</div>														



CIVILTOP
S.A.S
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Señor(es):

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

La Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo

Asunto: *Certificación De Paz y Salvo por concepto del Pago de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.*

Yo, OFELIA ORTIZ PINTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 69.020.290 de Puerto Asís (Putumayo) y Tarjeta Profesional No. 157115-T, en mi condición de Contador Público de la empresa CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT. 901.379.821-6, cuyo representante legal es la señora DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.122.340.473 de San Miguel (La Dorada):


CERTIFICO:

Que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que se encuentra laborando dentro de la misma. Lo anterior corresponde al periodo del mes de noviembre de 2025.

Esta certificación se expide para cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dado a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.


OFELIA ORTIZ PINTO
CONTADOR TP 157115-T


CIVILTOP construcciones S.A.S. ZOMAC
NIT. 901379821-6
RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ
C.C. N°. 1.122.340.473 de San Miguel

Anexo: Tarjeta Profesional
Antecedentes



civiltopsas.zomac@gmail.com



311 5519484 – 321 3877664



Cra. 4. # 7-17, La Dorada
Municipio de San Miguel Putumayo

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


157115-T

OFELIA
ORTIZ PINO
C.C. 69020290

RESOLUCION INSCRIPCION 058 **FECHA 10/02/2011**
UNIVERSIDAD COPE UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON **167715**

FIRMA DEL TITULAR **82869**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

80C0C1CCB28706A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OFELIA ORTIZ PINTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 69020290 de PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 157115-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901379821	6	CIVILTOP CONSTRUCCIONES SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOPOGRAFIA	BARRIO CENTRAL	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	99999999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2025-11	2025-12	1971040386	9495005512	E	2025/12/04	2025/12/01	\$1,672,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Cuentas de Aporte	Depósitos	Vencimientos	Sin Intereses	Impuestos	Asignaciones	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SEMA e ICBF	Total Aportes									
SUCURSAL: TOPOGRAFIA (4 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																																					
Ciudad: SAN MIGUEL Depto.: PUTUMAYO (2 Afiliados)																																					
1	CC	1122140473									23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	\$0	\$0	\$1,672,500
DÍAZ DIANA																																					
2	CC	1006788002									23030	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF63	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	\$0	\$0	\$349,100
VALLEJO LUIS																																					
Centro de Trabajo: OBREROS (2 Afiliados)																																					
Ciudad: SAN MIGUEL Depto.: PUTUMAYO (2 Afiliados)																																					
3	CC	1122337598									23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5ICS	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0	\$881,800
PAÑOTUA DIEGO																																					
4	CC	97445432									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0	\$440,900
SUANDO JOSE																																					
Total Afiliados(4)															\$6,070,500		\$243,000		\$6,070,500		\$215,100		\$0		\$0		\$1,672,500										

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$971,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$743,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$215,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$215,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF63	891,200,337	8	4	\$243,000
CONFAMILIAR PUTUMAYO				4	\$243,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$243,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$57,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$129,000
TOTAL				4	\$1,672,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022413755		MORA ALDANA ELEAZAR MASAH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	K 47 - 29	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	4681323	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud										
2025-11	2025-11	1959184115	9493838961		I	2025/12/12	2025/11/27	BANCOLOMBIA		0	\$418.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	ima	vac	avo	vct	vt	vtp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF						
1	CC	1022413755																		230001	30	EP5037	30	0	14-23	30	0	No		
Total		Afiliados(1)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022413755		MORA ALDANA ELEAZAR MASAH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	K 4 7 - 29	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	4681323	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1959184115	9493838961	1	2025/12/12	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	\$418,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$230,400	\$0	\$230,400	\$230,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,600	\$0	\$7,600	\$7,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$180,000	\$0	\$180,000	\$180,000	
TOTAL				1	\$418,000	\$0	\$0	\$418,000	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141196348769			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 7 9 8 2 1 6		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	
				14. Buzón electrónico 4 6	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Putumayo 8 6		40. Ciudad/Municipio San Miguel 7 5 7	
41. Dirección principal CR 4 7 17 BRR CENTRAL					
42. Correo electrónico facturacionciviltopsas@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 1 5 5 1 9 4 8 4		45. Teléfono 2 3 2 1 3 8 7 7 6 6 4	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 4 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 0 0 3 0 6		48. Código 4 2 9 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 0 0 3 0 6		50. Código 4 9 2 3		51. Código	
52. Número establecimientos 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			Servicio 1 2 3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada: MARCELA DIAZ		
			984. Nombre DIAZ GUALMATAN DIANA MARCELA		
			985. Cargo Representante legal Certificado		


347

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001		
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2			
4. Número de formulario			141196348769			
			 (415)7707212489984(8020) 000014119634876 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 7 9 8 2 1		6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6	
Características y formas de las organizaciones						
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos			66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas			
			70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma						
Documento	1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase	0 4				82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 1				83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 0 2 1 3				84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría					85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3				86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 2 5				87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 0 7 5 0 9 2					
78. Departamento	8 6					
79. Ciudad/Municipio	7 5 7					
Vigencia						
80. Desde	2 0 2 0 0 3 2 5					
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control						
88. Entidad de vigilancia y control						
Estado y Beneficio						
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV		
1	8 0	2 0 2 0 0 2 1 3				
2						
3						
4						
5						
Vinculación económica						
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		
				96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante						
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 3 de 4 Hoja 3 141196348769	
		 (415)7707212489984(8020) 000014119634876 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 8 2 1		6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8 2 0 2 0 0 3 2 5			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3		1 1 2 2 3 4 0 4 7 3			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
DIAZ		GUALMATAN		DIANA MARCELA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

346

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141196348769			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119634876 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 7 9 8 2 1		6		Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Construcción de otras obras de ingeniería civil		4 2 9 0			
162. Nombre del establecimiento CIVILTOP CONSTRUCCIONES							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Putumayo		San Miguel		7 5 7			
165. Dirección CR 4 7 17 BRR CENTRAL							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
7 5 0 9 3				2 0 2 0 0 3 2 5			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
3 1 1 5 5 1 9 4 8 4							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764086611501  (415)7707212489984(8020) 001876408661150 1			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 3 7 9 8 2 1		6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC						
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Asís					Cód. 4 6	
24. Dirección CR 4 7 17 BRR CENTRAL						
25. País Colombia		26. Departamento Putumayo		27. Municipio San Miguel		
<p>La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.</p> <p>Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.</p> <p>El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.</p>						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T			Firma del funcionario autorizado			
Firma del solicitante						
1001. Apellidos y nombres DIAZ GUALMATAN DIANA MARCELA			984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			985. Cargo			
1003. No. Identificación 1 1 2 2 3 4 0 4 7 3			989. Dependencia			
1004. DV 2			990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1006. Organización CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC			992. Área			
			993. Establecimiento			
			997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 2 - 3 1 / 1 5 : 5 4 : 0 7			

300



CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S.ZOMAC

Nit: 901379821-6



CRA 4 7 17

Tel: - Cels.: 3213877664 - San Miguel - Putumayo - Colombia

E-mail: facturacionciviltopsas@gmail.com

PERSONA JURIDICA RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CT69

Autorización Dian No. Nro.18764086611501 de 31.Dic.2024 hasta 31.Dic.2025 Rango del CT58 al CT150

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/12/2025 16:15:50.838

CUFE: 2dbd54c34f07330f670463183f95b779676c11275a4f5c70c752c0f387b37fab9f4fb8dd641e7cab6fe260ea42d38b1f

Cliente: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 20 / 2025
09:47:06 p. m.

NIT: 900304997

DV: 8

Cel. 3123214143

Tel.

Razón Ccial: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO

Dirección: CR 6 5 131 LA AMISTAD

Efectivo

Ciudad: Valle Del Guamuez - Putumayo

Email: contabilidad@emserpuvag.gov.co

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) SI_41301001	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMA	1	UND	134,325,599.39		0%	0	134,325,599.39
2) SI_ADMINISTRAC	29%	1	UND	38,954,423.83		0%	0	38,954,423.83
3) SI_IMPREVISTO	1%	1	UND	1,343,255.99		0%	0	1,343,255.99
4) SI_UTILIDAD_0	4%	1	UND	5,373,023.98		0%	0	5,373,023.98

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Bruto:	179,996,303.19
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	179,996,303.19
+Impuestos:	0.00
Subtotal:	179,996,303.19
-Retenciones:	0.00
TOTAL	\$179,996,303.19
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0%	5,373,024	0

NOTA	
NA	

Firma Digital :
SJoJoueuQgKfuZk5YUJ3J3WwqAWZTtp8885te
Gpgn2wT0N0R8b4YhrrYD15JD5169XneAS6SA
ZTfyngRFDLuo7HCCJuaq2ZwFfL2T6k3d7Cr
skc+6Chw1z20XneDM7duwWazY/huabbhtrngPg
3mLL464sJkVWdMoPg45ymJ2Lb7nAUdaaeYK
WGI1mrfx1EadF3fe57BhwP8Pv1Jm4BunY5d
K9ZunYtstW5x8Gfx08WknWFR805imZarric
/BJQf_gbm6eY9R3VulFh+dsd+QDjdHRL0JbwI2
ZyneBLrAS+IvR0dI0H4p0xETW75dTsUAD0Hm
DT4wyCQ==




CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE CUENTAS
BANCOLOMBIA**CERTIFICA:**

Que **CIVILTOP CONSTRUCCIONES SAS ZOMAC**, Identificado con **NIT 901379821** se encuentra vinculado, a través de la **CUENTA HORROS N° 451-9428-9123** denominada: **"SPO – COVN – 005 - 2025"**, La cual Se encuentra en estado **ACTIVA**, y será manejada con firma unica del representante legal.

Se expide en la ciudad Puerto Asís, el 19 de noviembre de 2025, a solicitud del interesado

Atentamente,



Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

***Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.**

La Hormiga, Municipio de Valle del Guamuez - Putumayo, 5 de diciembre de 2025.

Señor(es):

EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALLE DEL
GUAMUEZ S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO:

El suscrito, **LEYDER CEDIEL CABRERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.131.085.107, representante legal de la firma **C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS**, identificada con NIT. 900860555-1, en condición de contratista de consultoría del contrato de obra **No. SPO-CO-005-2025 de 30 de octubre de 2025**, cuyo objeto es: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." ejecutado por el **CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC**, identificado con NIT. No. 901.379.821-6.

CERTIFICO que, la firma contratista de obra ha cumplido con lo exigido en dicho contrato con relación al avance de obra del mes No. 01, comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 a 05 de diciembre de 2025.

Por lo anterior, y habiendo revisado y aceptado las cantidades y la ejecución de las actividades según Acta de Avance Financiero de Obra No. 01, se expide el correspondiente **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO** para el citado contrato de obra en mención.

Cordialmente,



Firma:

C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

RTE. LEGAL: I.C. LEYDER CEDIEL CABRERA

Interventor Externo

Según Contrato de Interventoría No. SUO-CD-018-2025 DE 31 DE OCTUBRE DE 2025

