



INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13

Componente Obras Civiles - Lote 2

Contrato n.º 2025-2781

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.**

Periodo del 01 al 30 de abril de 2026

Bogotá D.C. – mayo de 2026

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 2 de 64	

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Elaboró:	Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa	Revisó:	Andrés García Avendaño	Aprobó:	Valentín Barajas Santos
Fecha:	15/05/2026	Fecha:	15/05/2026	Fecha:	15/05/2026
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Residente Obras Civiles	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS	OBSERVACIONES
1.0	15/05/2026	Versión Inicial	Versión Inicial
2.0	11/06/2026	Versión 2.0	Versión 2.0

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13- Componente Obras Civiles - Lote 2 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 30 de abril de 2026.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	15/05/2026		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n.º 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Versión	Versión 2.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL		
Revisó	Andrés García Avendaño		

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 3 de 64	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	7
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	8
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA	9
3.1. Seguimiento técnico del contrato	9
3.1.1. Componente de obra	9
3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos	11
3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría	23
3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito	32
3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado	33
3.1.6. Controles de calidad	34
3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista	34
3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría Calidad	34
3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo	38
3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista	38
3.1.11. Relación de productos no conformes	40
3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones	40
3.2. Seguimiento administrativo	42
3.2.1. Verificación de requisitos mínimos	42
3.2.2. Informes presentados por el Contratista	42
3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista	43
3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad	44
3.2.5. Seguimiento financiero	46
3.3. Seguimiento jurídico	49
3.3.1. Resumen de garantías del contrato	49
3.3.2. Variaciones en presupuesto proyectado por el Consorcio Movilidad 2025 para obras civiles	50
3.3.3. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal	50
3.4. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría	50
3.5. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el Contratista	51
4. ANEXOS	54
4.1. Anexo n.º 1. Directorio del personal profesional del Contratista	54
4.2. Anexo n.º 2. Directorio del personal profesional de Interventoría	55
4.3. Anexo n.º 3 Directorio del personal profesional de la Entidad	55
4.4. Anexo n.º 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato	55

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 4 de 64	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781.....	7
Tabla 2. Relación de fabricación de elementos	9
Tabla 3. Órdenes de Trabajo.....	10
Tabla 4. Total Órdenes de Trabajo.....	10
Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur - Usme.....	12
Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena	12
Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46A X CL 68 SUR.....	13
Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 61G X CL 67B SUR.....	14
Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 24 X CL 18 SUR.....	15
Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur.....	15
Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur.....	16
Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur.....	17
Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur.....	17
Tabla 14. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur.....	18
Tabla 15. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9.....	19
Actividades pendientes: entrega de Planos Record y ensayos de laboratorio.....	19
Tabla 16. Avance físico de los trabajos – Complemento KR 72J X CL 35 SUR.....	19
Tabla 17. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80G X DG 3.....	20
Tabla 18. Mantenimientos	21
Tabla 19. Seguimiento PMT específicos vigentes abril 2026.....	32
Tabla 20. Registro fotográfico.....	33
Tabla 21. Estatus consolidado de acciones de mejora (correctivas/preventivas) – Contrato 2025-2781.....	35
Tabla 22. Hoja de vida presentadas por el Contratista durante el periodo de abril 2026.....	42
Tabla 23. Informes básicos Contratista	42
Tabla 24. Obra de mano no calificada.....	43
Tabla 25. Personal administrativo y de apoyo abril 2026.....	43
Tabla 26. Transporte	44
Tabla 27. Puntaje de Industria Nacional.....	45
Tabla 28. Vinculación de personas con discapacidad	45
Tabla 29. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781).....	46
Tabla 30. Presupuesto del Contrato 2025-2781	47
Tabla 31. Balance Financiero 2025-2781.....	47
Tabla 32. Programación PAC CTO n.º 2025-2781	48
Tabla 33. Relación de actas suscritas durante el periodo.....	50
Tabla 34. Correspondencia Recibida.....	51
Tabla 35. Correspondencia Enviada.....	52
Tabla 36. Correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico.....	53
Tabla 37. Correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico.....	54
Tabla 38. Relación de personal profesional del Contratista	54

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		Página 5 de 64

<i>Tabla 39. Relación de personal profesional de la Interventoría</i>	<i>55</i>
<i>Tabla 40. Relación de personal profesional de la Entidad</i>	<i>55</i>
<i>Tabla 41. Obligaciones generales del Contratista.....</i>	<i>55</i>
<i>Tabla 42. Obligaciones específicas del Contratista</i>	<i>60</i>

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal	22
Ilustración 2. Estado de eficacia de las acciones correctivas y preventivas _ Contrato 2025 – 2781	37
Ilustración 3. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.º 2025 2781 durante el periodo de abril del 2026.....	39
Ilustración 4. Ejecución presupuestal vs PAC programado Cto. 2025-2781	48

LISTADO DE ANEXOS

- Anexo n.º 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
- Anexo n.º 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
- Anexo n.º 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.
- Anexo n.º 4. Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.
- Anexo n.º 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría.
- Anexo n.º 8. Copia de la bitácora del periodo.
- Anexo n.º 9. Copia de actas desarrolladas en el periodo.
- Anexo n.º 10. Registro fotográfico.
- Anexo n.º 14. Cuadro sobre el estado del tiempo. Registro de condiciones climáticas de lluvia o meteorológicas que impidan la ejecución de los trabajos.
- Anexo n.º 15. Documento que soporta como se llegó a determinar las cantidades por cada ítem, acorde a lo indicado en el numeral 3.1.2 del anexo técnico 1A.
- Anexo n.º 18. Relación personal aprobado al Contratista.
- Anexo n.º 19. Aspectos que otorgan puntaje.
- Anexo n.º 21. Maquinaria, herramientas y equipos.

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	 
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 6 de 64

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante “SDM”) mediante concurso de méritos abierto n.º SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n.º 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la “Interventoría”) con el objeto de “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”, durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 30 de abril 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral 4.1. *INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

“Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada.”

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semafORIZACIÓN de Bogotá D.C.

La Entidad mediante Resolución n.º 357297 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección SDM-LP-001-2025, en el lote 2, al proponente CONSORCIO MOVILIDAD 2025. Resultado de esta adjudicación, se celebró el contrato 2025-2781 cuyo objeto es: “EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”, en el Lote n.º 2 Componente Obras Civiles del Sistema de SemafORIZACIÓN de Bogotá D.C. Zona Sur.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 7 de 64	

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781

Número de contrato	2025-2781
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 2"
Contratista	CONSORCIO MOVILIDAD 2025
Identificación	NIT 901.932.603-9
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril de 2025
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025
Prórroga n.º	Dos (2) meses
Fecha de terminación inicial	28 de febrero de 2026
Fecha de terminación final	30 de abril de 2026
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 5.141.951.324)
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	n.º 106 del 02 de enero del 2025. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$38.800.000.000) M/CTE.
Certificado de Registro Presupuestal	n.º 2417 del 15 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 5.141.951.324).
Rubro:	O23011724092024012708059
n.º Pólizas	Póliza de Cumplimiento: n.º 21-44-101467820 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): n.º 21-40-101253037
Fecha de aprobación Pólizas:	28 de abril de 2025
Fecha de aprobación de pólizas Prórroga	Anexo 8 RCE n.º-40-101253037: Anexo 8 Cumplimiento n.º-44-101467820: Pendiente aprobación
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Proceso de selección N.º	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Se anexan al informe los directorios telefónicos correspondientes al personal profesional del Contratista, la Interventoría y de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM así:

- Anexo n.º 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
- Anexo n.º 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
- Anexo n.º 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 8 de 64	

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

En el presente documento se detallan las actividades desarrolladas por la Interventoría del Contrato de Obra 2025-2781, correspondiente al Contratista Consorcio Movilidad 2025 responsable de las obras civiles del Lote n.º 2 – Zona Sur.

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación n.º **SDM-LP-001-2025**, los cuales hacen parte integral del contrato.

El Contratista de obra se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Dentro del alcance determinado en los documentos contractuales de obra para el contrato 2025-2781 el Contratista contempla realizar actividades para la construcción e implementación nuevas intersecciones, complementar las existentes y mantener elementos del sistema de semafORIZACIÓN de Bogotá D.C., contribuyendo a su expansión. Dentro de las cuales se encuentran:

- Gestionar la licencia de excavación.
- Gestionar Plan de Manejo de Tránsito de obra.
- Realizar localización, verificación y materialización del proyecto, verificar diseños, ejecutar la construcción según especificaciones y cantidades, realizar replanteo con el interventor.
- Verificar redes y servicios, elaborar planos As-Built y tramitar paz y salvos ante el IDU, empresas de servicios y demás entidades.

Dentro de las actividades de construcción se incluyen: demolición, excavación para ductos, construcción de cajas de paso y bases para postes, instalación de ductos PVC, compactación de materiales, perforación neumática, construcción de placas, muros, pañetes, filos, dilataciones, andenes, calzadas, sardineles, bases y pedestales, instalación de bajantes, sardineles prefabricados, marcos, tapas, conexiones, rotura y reconstrucción de andenes, así como la limpieza de residuos generados.

Para el caso de la reconstrucción y mantenimiento del sistema, se contemplan canalizaciones, bases, cajas de paso e infraestructura para acometidas, entre otras labores de obras civiles. El Contratista debe contar con el personal, vehículos y herramientas necesarios según las especificaciones técnicas.

En cumplimiento del Contrato de Interventoría n.º 2025-2769, el Consorcio Movilidad Capital realiza seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental a los contratos, según las especificaciones impartidas por la SDM y las condiciones contractuales para la expansión y mantenimiento del sistema de semafORIZACIÓN de Bogotá.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 9 de 64	

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1. Seguimiento técnico del contrato

3.1.1. Componente de obra

En el presente periodo, con corte al 30 de abril de 2026, no se envió orden de fabricación al Contratista.

La siguiente tabla muestra el resumen de elementos fabricados por el Contratista, relacionándolos con los comprobantes de ingreso, cortes, órdenes de trabajo y facturación.

Tabla 2. Relación de fabricación de elementos

Comprobante de ingreso n.º	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.º	Factura n.º	Fecha de factura	Ubicación
1955	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	25-jul-25	1	1	25-jul-25	Almacén SDM
1955	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	25-jul-25	1	1	25-jul-25	Almacén SDM
2013	Suministro e instalación de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (3)	31-oct-25	2	9	23-oct-25	Bodega Contratista CM25
2020	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (2)	13-nov-25	2	8	21-oct-25	Almacén SDM
1976	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	27-ago-25	3	4	27-ago-25	Almacén SDM
1976	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	27-ago-25	3	4	27-ago-25	Almacén SDM
2148	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	24-abr-26	4	20	14-abr-26	Almacén SDM
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (25)	Cancelada	5	Cancelada	Cancelada	Cancelada
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso (75)	Cancelada	5	Cancelada	Cancelada	Cancelada

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 10 de 64	

Comprobante de ingreso n.º	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.º	Factura n.º	Fecha de factura	Ubicación
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (25)	Cancelada	7	Cancelada	Cancelada	Cancelada
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso (75)	Cancelada	7	Cancelada	Cancelada	Cancelada
2020	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (4)	13-nov-25	6	8	21-oct-25	Almacén SDM

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se relaciona la totalidad de las ordenes de trabajo y ordenes de fabricación del contrato a corte de 30 de abril de 2026:

Tabla 3. Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.º	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitudes de cancelación de complementos	Solicitudes de cancelación de mantenimientos
02	15/07/2025	---	---	---	4	---
06	30/07/2025	--	---	--	4	---
10	16/10/2025	---	---	---	4	---
13	20/11/2025	---	---	---	20	---
16	26/12/2025	---	---	---	---	1
17	28/01/2026	---	---	---	---	2
18	04/02/2026	---	---	2	---	2
19	05/02/2026	---	---	1	---	1
TOTAL		0	0	3	32	6

Fuente: Elaboración propia

A la fecha, se relaciona la totalidad de las órdenes de trabajo y ordenes de fabricación del contrato:

Tabla 4. Total Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.º	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos	Solicitud de cancelación órdenes de trabajo
Órdenes de fabricación						
1	21/05/2025				100	
2	22/05/2025				5	
3	19/06/2025				100	
4	19/08/2025				50	
5	24/09/2025				100	100

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 11 de 64	

Orden de Trabajo n.º	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos	Solicitud de cancelación órdenes de trabajo
Órdenes de fabricación						
6	07/10/2025				4	
7	31/10/2025				100	100
TOTAL		---	---	---	459	200
Ordenes de Trabajo						
1	7/07/2025		5			
2	15/07/2025		5			4
3	15/07/2025	1				
4	30/07/2025			4		
5	27/07/2025	1				
6	10/09/2025		5			4
7	10/09/2025	1				
8	10/09/2025	2				
9	10/09/2025			1		
10	10/10/2025		5			4
11	17/10/2025			1		
12	18/11/2025			1	1	
13	20/11/2025		20			20
14	01/12/2025			1		
15	26/12/2025			1		
16	26/12/2025			1		1
17	28/01/2026			2		2
18	04/02/2026			2		2
19	05/02/2026			1		1
TOTAL		5	40	15	460	38

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos

En los siguientes numerales, se muestra el avance físico de los trabajos de obra realizados con corte al último día del periodo objeto del presente informe.

3.1.2.1. Intersecciones nuevas

Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14l X CL 84 Sur - Usme

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación COI PMT ESPECIFICO	100%	100%	11/07/2025	11/07/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	14/07/2025	4/08/2025
Perforación dirigida	100%	100%	5/08/2025	8/09/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	30/11/2025	3/12/2025
Canalizaciones	100%	100%	30/11/2025	3/12/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	30/11/2025	3/12/2025
Bases para postes	100%	100%	30/11/2025	3/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	10/11/2025	3/12/2025
Instalación AUCE	100%	100%	2/12/2025	2/12/2025
Planos récord	100%	50%	3/11/2025	9/12/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	3/11/2025	9/12/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	24/10/2025	24/11/2025
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma	11/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	09/12/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	293

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de planos récord y recuperación de 112 m² correspondientes al área de acopio de material.

Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación PMT 1	100%	100%	25/07/2025	25/07/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	28/07/2025	18/08/2025
Perforación dirigida	100%	100%	19/08/2025	22/09/2025

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 13 de 64	

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	4/08/2025	22/11/2025
Canalizaciones	100%	100%	4/08/2025	22/11/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	7/08/2025	22/11/2025
Bases para postes	100%	100%	2/10/2025	22/11/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	7/10/2025	22/11/2025
Instalación AUCE	100%	100%	3/11/2025	4/11/2025
Planos récord	100%	50%	26/11/2025	26/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	26/11/2025	26/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/12/2025	22/12/2025
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma	25/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	22/12/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	279

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: Entrega de Planos Record y recuperación de 4.70 m2 correspondientes al área de acopio de RCD y recuperación de 12 m2 correspondientes a la acometida eléctrica.

Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46A X CL 68 SUR

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
INICIO PROYECTADO	100%	100%	8/09/2025	8/09/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	9/09/2025	19/09/2025
Perforación dirigida INT NUEVA 1	100%	100%	22/09/2025	14/10/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	15/10/2025	25/11/2025
Canalizaciones	100%	100%	15/10/2025	25/11/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	90%	27/10/2025	21/11/2025
Bases para postes	100%	95%	24/11/2025	17/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	90%	27/11/2025	23/12/2025
Planos récord	100%	0%	24/12/2025	30/12/2025

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 14 de 64	

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Acta de entrega a satisfacción	100%	50%	24/12/2025	30/12/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	24/12/2025	22/01/2026
Promedio ejecución	100%	92%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		08/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		22/01/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		234

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de planos récord, recuperación de 80 m2 correspondientes al área de acopio de material y recuperación de 12 m2 correspondientes al área intervenida por canalización de caja a caja en el separador oriental, instalación de bolardos sobre el sendero peatonal del separador norte y cambio de las tapas de cajas de paso que presentan un acabado superficial deficiente.

Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 61G X CL 67B SUR

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación	100%	100%	18/09/2025	18/09/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	19/09/2025	26/09/2025
Perforación dirigida	100%	100%	29/09/2025	20/10/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	21/10/2025	13/11/2025
Canalizaciones	100%	100%	21/10/2025	13/11/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	24/10/2025	18/11/2025
Bases para postes	100%	100%	19/11/2025	12/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	24/11/2025	18/12/2025
Instalación AUCE	100%	100%	19/12/2025	22/12/2025
Planos récord	100%	60%	19/12/2025	25/12/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	19/12/2025	22/12/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	19/12/2025	19/01/2026
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 15 de 64	

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Fecha inicio pactada según cronograma		18/09/2025		
Fecha entrega pactada según cronograma		19/01/2026		
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		224		

Fuente: Elaboración Propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record.

Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 24 X CL 18 SUR

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación	100%	100%	29/09/2025	29/09/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	30/09/2025	13/10/2025
Perforación dirigida	100%	100%	14/10/2025	6/11/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	7/11/2025	2/12/2025
Canalizaciones	100%	100%	7/11/2025	2/12/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	12/11/2025	5/12/2025
Bases para postes	100%	100%	8/12/2025	5/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	80%	11/12/2025	31/12/2025
Instalación AUCE	100%	*		
Planos récord	100%	50%	7/01/2026	8/01/2026
Acta de entrega a satisfacción	100%	95%	7/01/2026	13/01/2026
Entrega de laboratorios	100%	100%	7/01/2026	5/02/2026
Promedio ejecución	100%	97%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		29/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		05/02/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		213

Fuente: Elaboración Propia

Actividades pendientes: por parte del Consorcio Movilidad 2025 la entrega de Planos Record.

* Por parte de la SDM, la instalación del GICE.

3.1.2.2. Complementos

Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 16 de 64	

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	25/06/2025	25/06/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	26/06/2025	4/08/2025
Canalizaciones	100%	100%	30/06/2025	29/07/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	26/06/2025	29/07/2025
Bases para postes	100%	100%	10/11/2025	14/11/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	10/11/2025	14/11/2025
Planos récord	100%	50%	19/11/2025	19/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	19/11/2025	19/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	19/11/2025	19/11/2025
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		25/06/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		19/11/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		309

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record.

Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	23/07/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	25/07/2025	21/08/2025
Canalizaciones	100%	100%	25/07/2025	21/08/2025
Cajas, marcos y postes	100%	100%	30/07/2025	26/08/2025
Base para postes	100%	100%	18/08/2025	10/09/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	3/09/2025	29/09/2025
Planos récord	100%	50%	30/09/2025	6/10/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	30/09/2025	6/10/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/09/2025	21/10/2025
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		16/07/2025
---------------------------------------	--	------------

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 17 de 64	

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Fecha entrega pactada según cronograma		21/10/2025		
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		288		

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record.

Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	14/07/2025	14/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	15/07/2025	30/07/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	15/07/2025	14/08/2025
Canalizaciones	100%	100%	29/07/2025	4/08/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	12/08/2025	18/08/2025
Base para postes	100%	100%	12/08/2025	5/09/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	28/08/2025	17/09/2025
Planos récord	100%	50%	18/09/2025	22/09/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	23/09/2025	25/09/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	18/09/2025	27/10/2025
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		14/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		27/10/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		290

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record.

Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	7/09/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	18/07/2025	15/10/2025
Canalizaciones	100%	100%	18/07/2025	15/10/2025

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 18 de 64	

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Cajas, marcos y postes	100%	100%	23/07/2025	15/10/2025
Base para postes	100%	100%	16/07/2025	21/10/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	29/08/2025	21/10/2025
Planos récord	100%	50%	30/09/2025	2/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	30/09/2025	2/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/09/2025	17/11/2025
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma	16/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	17/11/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	288

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record.

Tabla 14. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	29/07/2025	31/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	29/07/2025	12/08/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	29/07/2025	4/09/2025
Canalizaciones	100%	100%	29/07/2025	4/09/2025
Cajas, marcos y postes	100%	100%	30/07/2025	9/09/2025
Base para postes	100%	100%	18/08/2025	24/09/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	3/09/2025	14/11/2025
Planos récord	100%	50%	30/09/2025	19/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	22/09/2025	14/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/09/2025	29/11/2025
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma	29/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	29/11/2025

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 19 de 64	

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		275		

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record y recuperación 9m2 correspondientes al área de acopio de material.

Tabla 15. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	17/07/2025	23/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	24/07/2025	14/08/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	5/08/2025	21/08/2025
Canalizaciones	100%	100%	12/08/2025	21/08/2025
Cajas, marcos y postes	100%	100%	15/08/2025	26/08/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	3/09/2025	29/09/2025
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	6/10/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	7/10/2025	13/10/2025
Entrega de laboratorios	100%	0%	14/10/2025	12/11/2025
Promedio ejecución	100%	96%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		17/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		12/11/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		257

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record y ensayos de laboratorio.

Tabla 16. Avance físico de los trabajos – Complemento KR 72J X CL 35 SUR

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	31/12/2025	31/12/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	31/12/2025	26/01/2026
Canalizaciones	100%	100%	7/01/2026	29/01/2026
Cajas, marcos y postes	100%	100%	31/12/2025	20/01/2026
Base para poste	100%	100%	14/01/2026	2/02/2026

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 20 de 64	

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	6/01/2026	29/01/2026
Planos récord	100%	90%	12/02/2026	28/02/2026
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	12/02/2026	28/02/2026
Entrega de laboratorios	100%	100%	21/01/2026	28/02/2026
Promedio ejecución	100%	99%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		31/12/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		21/01/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		120

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: entrega de Planos Record y recuperación de 165,8 m2 de zonas verdes distribuidos así: 153 m2 correspondientes al área de acopio de RCD y material, 12.8 m2 por construcción de caja en el separador norte.

Tabla 17. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80G X DG 3

Actividad	% Programado al 30/04/2026	% Ejecución al 30/04/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	31/12/2025	1/01/2026
Demoliciones y excavaciones	100%	92%	31/12/2025	3/02/2026
Canalizaciones	100%	30%	5/01/2026	3/02/2026
Cajas, marcos y postes	100%	20%	31/12/2025	27/01/2026
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	30%	11/02/2026	26/02/2026
Planos récord	100%	0%	12/02/2026	28/02/2026
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	12/02/2026	28/02/2026
Entrega de laboratorios	100%	0%	21/01/2026	28/02/2026
Promedio ejecución	100%	42%	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		31/12/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		28/02/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		120

Fuente: Elaboración propia

Actividades pendientes: A la fecha del 30 de abril de 2026 se encuentra sin terminar al 100% todas las actividades en el separador norte y separador sur, esto equivale a que el área de

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 21 de 64	

demolición en ambos separadores se encuentre a un 95%, excavaciones al 95%, canalizaciones al 50%, cajas, marcos y tapas al 30% y recuperación de andenes y acabados de toda el área de intervención a un 20%. De documentación está pendiente entrega de plano récord y ensayos de laboratorios.

Frente a los cronogramas la Interventoría emitió lo siguientes comunicados y requerimientos previos como solicitud al contratista del cumplimiento a los tiempos establecidos mediante los siguientes comunicados:

- SEM-CMC-CM25-235-26 con radicado ORFEO n.º 202600000158442 del 07 de abril de 2026 remitió Solicitud Intersección AK 80G X DG 3.
- SEM-CMC-CM25-249-26 con radicado ORFEO n.º 202661201523922 del 24 de abril de 2026 remitió Pendientes de recuperación de espacio público en la KR 72J con CL 45 Sur – Contrato 2025-2781.

Así mismo se radico concepto integral sobre la viabilidad de reactivación del frente de obra AK 80G x DG 3 Ext. 3477 ID 879 – Américas mediante el comunicado SEM-CMC-SDM-201-26 con radicado ORFEO n.º 202600000177102 el 17 de abril de 2026.

3.1.2.3. *Mantenimientos*

A continuación, se relacionan los mantenimientos realizados a la fecha.

Tabla 18. Mantenimientos

N.º	EXT	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	FECHA DE ATENCIÓN
1	3007	KR 1 X CL 87 C Sur	Se requiere realizar sondeo y de encontrarse taponamiento en ductería y cámara de paso realizar la respectiva limpieza	15/12/2025
2	3008	KR 1 X CL 90 Sur	Instalar tres (3) tapas antivandálicas y un (1) marco	29/09/2025
3	3783	TV 78N X CL 53 Sur	Instalación de una (1) tapa y un (1) marco	20/09/2025
4	3276	TV 85 X CL 57B Sur	Instalación de seis (6) tapas antivandálicas y cuatro (4) marcos	6/08/2025
5	3489	AK 86 X DG 49 S	Construcción de caja de paso GICE	19/11/2025
6	3082	KR 12B X CL 28C SUR	Suministro e instalación de GICE en la intersección	23/10/2025
7	3422	KR 19 X CL 10B Sur	Suministro de una (1) caja de paso de semaforización.	12/12/2025
8	3274	AK 10 X CL 4 S	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	23/12/2025
9	3051	KR 87 X DG 49 SUR	Suministro e instalación marco y tapa para Caja de paso del GICE	17/01/2026


Fuente: Elaboración propia

Los listados de formatos de seguimiento del contrato realizados por la Interventoría para el mes de abril de 2026 se adjuntan en el Anexo n.º 5 formatos de seguimiento.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 22 de 64	

Han transcurrido 367 días desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2026 lo que equivale al 100% del plazo contractual. La siguiente gráfica muestra el avance de los trabajos con relación al avance presupuestal y el plazo de ejecución:

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal

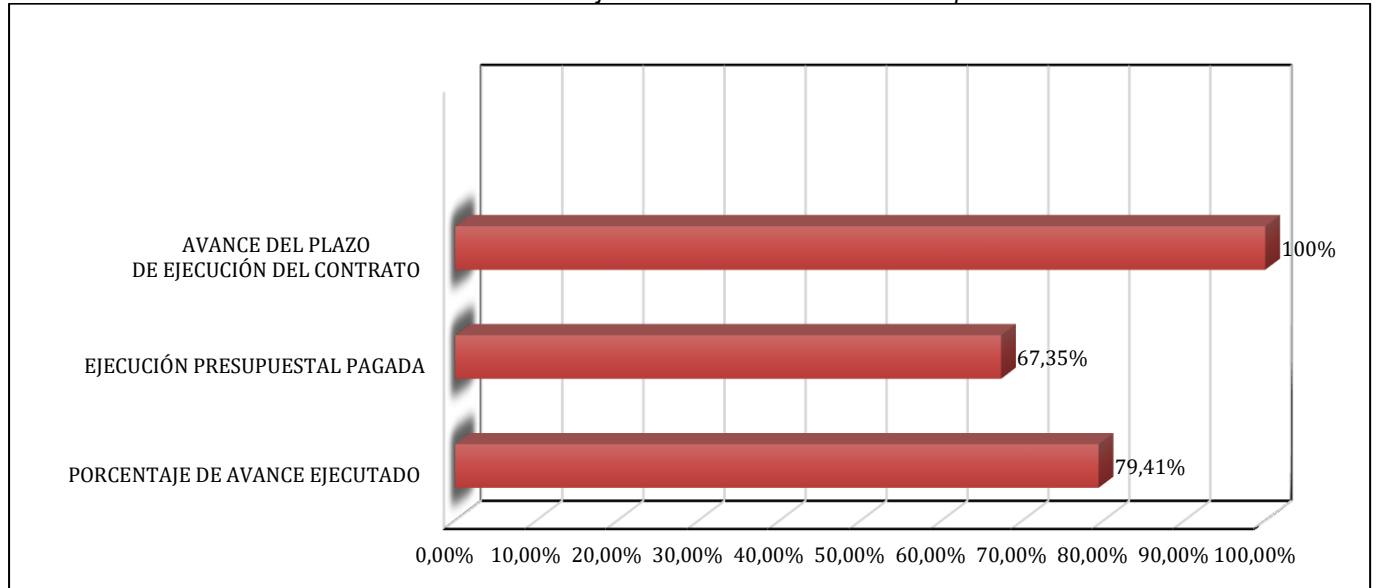

Fuente: Elaboración propia

3.1.2.4. Cronograma

La Interventoría al 30 de abril de 2026 ha aprobado tres (3) cronogramas de obra.

- Cronograma No. 1: Recibido el 31 de julio de 2025 (5 complementos).
- Cronograma No. 2: Recibido el 08 de septiembre de 2025 (5 intersecciones nuevas)
- Cronograma No. 3: Recibido el 26 de diciembre de 2025 (21 complementos)

Las anteriores aceptadas por la Interventoría mediante oficio SEM-CMC-CM25-073-25 con No. de radicado ORFEO 202561203288032 del 08 de septiembre de 2025 y correo electrónico del 23 de septiembre de 2025¹. Así mismo, el cronograma No. 3 se aprobó mediante correo electrónico el 26 de diciembre de 2025².

¹ De: SEM-ING-RES-OBRAVICILES-2@redtic.com.co; Fecha: 23 de septiembre de 2025 12:06; Para: consorciomovilidad2025@gmail.com; Asunto: SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE ID PARA LA INTERSECCIÓN KRA 46A X CL 68 SUR EN PLATAFORMA MANTUM.

² De: SEM-ING-RES-OBRAVICILES-2@redtic.com.co; Fecha: 26 de diciembre de 2025 17:45; Para: consorciomovilidad2025@gmail.com; Asunto: OFICIO_WEXT-2025-2781-184 – cronograma plan de acción.

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual									
1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	\$16.513	\$17.355	176,00	0,32	\$ 2.906.288,00	\$ 5.554,00	\$ 2.911.842,00
2	Localización, verificación y replanteo	UN	\$18.435	\$19.375	0,00	15,00	\$ 0,00	\$ 290.625,00	\$ 290.625,00
3	Limpieza de Caja de Paso	UN	\$122.406	\$128.649	2,00	2,00	\$ 244.812,00	\$ 257.298,00	\$ 502.110,00
4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	\$165.068	\$173.486	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 3.151.100,00	\$ 553.477,00	\$ 3.704.577,00
II. Demoliciones									
5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	\$325.536	\$342.138	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	\$1.531.602	\$1.609.714	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	\$297.609	\$312.787	2,20	4,11	\$ 654.740,00	\$ 1.285.555,00	\$ 1.940.295,00
8	Demolición de Sardinela Existente	ML	\$38.765	\$40.742	0,00	49,00	\$ 0,00	\$ 1.996.358,00	\$ 1.996.358,00
9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	\$44.829	\$47.115	0,08	5,64	\$ 3.586,00	\$ 265.729,00	\$ 269.315,00
10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	\$135.017	\$141.903	0,00	0,04	\$ 0,00	\$ 5.676,00	\$ 5.676,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 658.326,00	\$ 3.553.318,00	\$ 4.211.644,00
III. Excavaciones									

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 24 de 64	

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	\$241.421	\$253.733	0,02	15,79	\$ 4.828,00	\$ 4.006.444,00	\$ 4.011.272,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 4.828,00	\$ 4.006.444,00	\$ 4.011.272,00
IV. Transporte de escombros									
12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	\$103.301	\$108.569	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
V. Suministro para redes									
13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$81.517	\$85.674	0,00	27,40	\$ 0,00	\$ 2.347.468,00	\$ 2.347.468,00
14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$104.671	\$110.009	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$147.938	\$155.483	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	\$32.249	\$33.894	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	\$46.632	\$49.010	0,60	56,00	\$ 27.979,00	\$ 2.744.560,00	\$ 2.772.539,00
18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro	ML	\$51.332	\$53.950	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
	pulgadas (4") de diámetro								
19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	\$15.586	\$16.381	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	\$17.666	\$18.567	4,00	11,00	\$ 70.664,00	\$ 204.237,00	\$ 274.901,00
21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	\$31.239	\$32.832	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 98.643,00	\$ 5.296.265,00	\$ 5.394.908,00
VI. Rellenos									
22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	\$246.896	\$259.488	0,00	3,89	\$ 0,00	\$ 1.009.408,00	\$ 1.009.408,00
23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	\$282.185	\$296.576	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	\$329.308	\$346.103	8,18	93,82	\$ 2.693.739,00	\$ 32.471.383,00	\$ 35.165.122,00
25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	\$1.562.616	\$1.642.309	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	\$1.595.313	\$1.676.674	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	\$104.062	\$109.369	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 2.693.739,00	\$ 33.480.791,00	\$ 36.174.530,00
VII. Construcciones									

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 26 de 64	

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm ² - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	\$145.648	\$153.076	11,00	0,65	\$ 1.602.128,00	\$ 99.499,00	\$ 1.701.627,00
29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm ²)	M3	\$1.147.361	\$1.205.876	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	\$228.584	\$240.242	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	\$206.357	\$216.881	6,00	0,00	\$ 1.238.142,00	\$ 0,00	\$ 1.238.142,00
32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	\$262.765	\$276.166	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	\$268.080	\$281.752	5,00	0,00	\$ 1.340.400,00	\$ 0,00	\$ 1.340.400,00
34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	\$270.428	\$284.220	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en	M2	\$378.174	\$397.461	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 27 de 64	

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
	gravilla No. 2 (Piedra Mona)								
36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	\$383.055	\$402.591	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	\$205.481	\$215.961	22,40	13,84	\$ 4.602.774,00	\$ 2.988.900,00	\$ 7.591.674,00
38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	\$1.106.899	\$1.163.351	30,00	0,00	\$ 33.206.970,00	\$ 0,00	\$ 33.206.970,00
39	Construcción de Caja de Paso Doble, incluye marco y tapa	UN	\$2.288.856	\$2.405.588	4,00	1,00	\$ 9.155.424,00	\$ 2.405.588,00	\$ 11.561.012,00
40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	\$1.730.407	\$1.818.658	2,00	0,00	\$ 3.460.814,00	\$ 0,00	\$ 3.460.814,00
41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	\$246.948	\$259.542	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	\$225.704	\$237.215	0,08	1,70	\$ 18.056,00	\$ 403.266,00	\$ 421.322,00
43	Construcción de Pañetes	M2	\$176.564	\$185.569	0,08	1,50	\$ 14.125,00	\$ 278.354,00	\$ 292.479,00
44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	\$406.909	\$427.661	0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 427.661,00	\$ 427.661,00
45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	\$504.366	\$530.089	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	\$332.952	\$349.933	7,00	1,00	\$ 2.330.664,00	\$ 349.933,00	\$ 2.680.597,00

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 28 de 64	

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	\$199.463	\$209.636	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	\$246.880	\$259.471	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
49	Perforación dirigida	ML	\$722.565	\$759.416	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
50	Perforación neumática	ML	\$566.183	\$595.058	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	\$291.174	\$306.024	16,00	0,00	\$ 4.658.784,00	\$ 0,00	\$ 4.658.784,00
52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	\$126.485	\$132.936	0,00	187,75	\$ 0,00	\$ 24.958.734,00	\$ 24.958.734,00
53	Empradización	M2	\$53.888	\$56.636	112,00	6,20	\$ 6.035.456,00	\$ 351.143,00	\$ 6.386.599,00
54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	\$1.090.309	\$1.145.915	5,00	0,00	\$ 5.451.545,00	\$ 0,00	\$ 5.451.545,00
55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	\$2.390.493	\$2.512.408	0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 2.512.408,00	\$ 2.512.408,00
56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	\$1.106.004	\$1.162.410	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 29 de 64	

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	\$1.224.631	\$1.287.087	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	\$1.270.178	\$1.334.957	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	\$498.254	\$523.665	1,00	0,00	\$ 498.254,00	\$ 0,00	\$ 498.254,00
60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	\$281.207	\$295.549	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	\$318.005	\$334.223	0,00	6,00	\$ 0,00	\$ 2.005.338,00	\$ 2.005.338,00
62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centímetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de fraguado)	M3	\$1.325.730	\$1.393.342	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	\$133.310	\$140.109	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	\$162.452	\$170.737	15,00	0,00	\$ 2.436.780,00	\$ 0,00	\$ 2.436.780,00
65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56	M2	\$123.211	\$129.495	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 30 de 64	

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
	Guía, (04x04x06), con materiales del sitio								
66	Suministro e instalación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	\$38.551.049	\$40.517.152	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	\$37.614.323	\$39.532.653	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	\$565.871	\$594.730	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE	UN	\$524.307	\$551.047	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 31 de 64	

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	\$498.556	\$523.982	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	\$648.920	\$682.015	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	\$470.979	\$494.999	9,00	0,00	\$ 4.238.811,00	\$ 0,00	\$ 4.238.811,00
73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	\$352.607	\$370.590	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	\$410.633	\$431.575	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	\$406.530	\$427.263	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 80.289.127,00	\$ 36.780.824,00	\$ 117.069.951,00
VIII. Ensayos de Laboratorio									
76	Ensayo de compactación	UN	\$213.276	\$224.153	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	\$48.830	\$51.320	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	\$142.744	\$150.024	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
IX. Transportes									
79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	\$14.472.684	\$15.210.791	0,00	0,37	\$ 0,00	\$ 5.627.993,00	\$ 5.627.993,00

N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
80	Camión tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	\$420.776	\$442.236	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 0,00	\$ 5.627.993,00	\$ 5.627.993,00
X. Personal									
81	Personal Profesional y Técnico Administrativo	MES	\$36.666.871	\$38.536.881	0,00	0,37	\$ 0,00	\$ 14.258.646,00	\$ 14.258.646,00
82	Personal Técnico de Obra	MES	\$11.623.094	\$12.215.872	0,00	0,37	\$ 0,00	\$ 4.519.873,00	\$ 4.519.873,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			\$ 0,00	\$ 18.778.519,00	\$ 18.778.519,00
			TOTAL 2025	TOTAL 2026					
SUBTOTAL OBRAS CIVILES							\$ 86.895.763,00	\$ 108.077.631,00	\$ 194.973.394,00

Fuente: Informe mes de abril

*Se adjunta cuadro de cantidades relacionadas por la Interventoría, debido a que, a la fecha del presente informe, el Contratista no subsano, ni emitió las memorias de cálculo en su informe del mes de abril de 2026. Se deja trazabilidad realizada por esta Interventoría en el Anexo No. 15 con correos remitidos al Contratista.

3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito

Tabla 19. Seguimiento PMT específicos vigentes abril 2026

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.º RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Complemento	879	3477	AK 80G X DG 3	KENNEDY	20/02/2026	202661200734282	25/02/2026	Aprobada por SDM PRORROGA N° 1	12	19/03/2026	20-mar-26	30-abr-26
Complemento	867	3816	KR 72J X CL 45 Sur	KENNEDY	4/03/2026	202661200854552	5/03/2026	Aprobado por SDM PRORROGA N° 2	11	12/03/2026	13-mar-26	30-abr-26
Complemento	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	TUNJUELITO	30/12/2025	202661200853702	5/03/2026	Aprobado por SDM PRORROGA N° 2	11	12/03/2026	13-mar-26	30-abr-26
Complemento	1900	3928	KR 46A X CL 68 Sur	CIUDAD BOLIVAR	21/02/2026	202661200734552	25/02/2026	Aprobado por SDM - PRORROGA N° 3	10	5/03/2026	6-mar-26	30-abr-26

Fuente: Elaboración propia

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 33 de 64	

La relación completa y trazabilidad de los PMT se encuentra en el informe de Tránsito del presente mes.

3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado

Durante el mes abril de 2026, se realizaron actividades tales como construcción de cajas de paso sencilla y doble, demoliciones, excavaciones, rellenos, bases para poste, las cuales se presentan en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 20. Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL 2025-2781



1 de abril de 2026 10:23
KR 24 x CL 18 sur
ID: 1920
EXTERNO: 3120
Consortio Movilidad Capital

Visita a intersección nueva EXT 3120



1 de abril de 2026 9:02
KR 46A x AC 68 sur
ID: 1900
EXTERNO: 3928
Consortio Movilidad Capital

Visita a intersección nueva EXT 3928



6 abr 2026 9:47:24 a.m.
721-95 Calle 43 Sur
#Boita Ext 3816 ID 867
Consortio Movilidad Capital

Visita a complementos EXT 3816



21 de abril de 2026 8:17
KR 61 G x CL 67B Sur
ID: 1919
EXTERNO: 3119
Consortio Movilidad Capital

Visita a intersección nueva EXT 3119

	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 34 de 64	



Fuente: Elaboración propia

La relación completa de las fotografías se encuentra en el Anexo n.º 10 Registro fotográfico.

3.1.6. Controles de calidad

Durante el mes correspondiente al presente informe, no se realizaron ensayos de laboratorio.

3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista

A la fecha, el contrato se desarrolló con normalidad, por tanto, no se ha requerido el diseño e implementación de planes de contingencia. No obstante, lo anterior, y dados los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Movilidad a nivel de Distrito, se recomendó al Contratista establecer una ruta crítica para cumplir con las metas establecidas mediante Acta Comité quincenal de Seguimiento n.º 11 al Contrato 2025-2781.

3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría Calidad

Durante el mes de abril de 2026 el contratista Consorcio Movilidad 2025 obtuvo un porcentaje de cumplimiento respecto al factor de mejora continua del noventa y cinco por ciento (95%), presentando un incremento respecto al periodo anterior, situación que obedece a avances en los planes de acción.

A corte de abril de la presente vigencia el Contratista dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el plan de calidad dentro del marco de la mejora continua, el contratista definido diez (10) acciones correctivas, de las cuales ha cerrado eficazmente seis (6), el restante finalizó con la ejecución parcial del plan de acción por parte del Consorcio Movilidad 2025, tal como se indica en la siguiente tabla.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 35 de 64	

Tabla 21. Estatus consolidado de acciones de mejora (correctivas/preventivas) – Contrato 2025-2781

Ítem	Componente	Temática	Tipo	Avance de los planes de acción	Estado
1.	Gestión de Tránsito	Cierre de desviaciones en la implementación de PMT	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró una disminución significativa de hallazgos, por tanto, la acción se considera cerrada y el desarrollo de las mejoras es permanente
2.	Control de la Información Documentada	Control y aseguramiento de la información documentada (uso y aplicación formatos)	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró se logró el uso y aplicación de los formatos establecidos en el plan de calidad del contratista en un 100%
3.	Control de Salidas No Conformes	Liberación de rampas que no corresponden a las especificaciones	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, posterior a la implementación del plan de mejora no se volvió a presentar Salidas No Conformes a las especificaciones (productos de obras civiles)
4.	Cumplimiento de Cronograma	Optimización del cumplimiento del cronogramas y alineación de programación semanal de actividades	Acción Correctiva	100%	El cumplimiento del plan de acción es del 100%, sin embargo, la acción no fue eficaz
5.	Mántum	Aseguramiento de la calidad de los datos a partir del correcto registro de actividades y vinculación efectiva de las órdenes de trabajo de la plataforma MÁNTUM	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró una disminución significativa de hallazgos, por tanto, la acción se considera cerrada y el desarrollo de las mejoras es permanente
6.	SST	Botiquines, elementos de primeros auxilios y atención emergencias	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, a la fecha el Contratista cuenta con los botiquines en cada uno de los puntos de operación


Ítem	Componente	Temática	Tipo	Avance de los planes de acción	Estado
7.	SST y Ambiental	Condiciones de orden y aseo	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró una disminución significativa de hallazgos, por tanto, la acción se considera cerrada y el desarrollo de las mejoras es permanente
8.	SST	EPP y Dotación	Acción Correctiva	80%	La acción contribuyó a mejoras respecto al suministro, uso y cuidado de la dotación por parte del personal en terrero, al cierre de abril aún se presentaban hallazgos al respecto, condición que fue reiterativa durante el desarrollo del Contrato 2025-2781
9.	SST y Ambiental	Diseño, implementación y mantenimiento de cerramientos (Incluye demarcación y señalización)	Acción Correctiva	90%	La acción contribuyó a mejoras respecto a la implementación y mantenimiento de cerramientos, al cierre de abril aún se presentaban hallazgos al respecto, condición que fue reiterativa durante el desarrollo del Contrato 2025-2781.
10.	SST y Ambiental	Recolección y disposición de RCD (Residuos de construcción y demolición)	Acción Correctiva	85%	La acción contribuyó a mejoras respecto a la recolección y disposición de RCD, al cierre de abril aún se presentaban hallazgos al respecto, condición que fue reiterativa durante el desarrollo del Contrato 2025-2781

Fuente: Interventoría

En la siguiente ilustración se presenta el estado de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas establecidas en marco de la ejecución del plan de calidad.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	<div> <div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div> <div>  BOGOTÁ </div> </div>
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 37 de 64

Ilustración 2. Estado de eficacia de las acciones correctivas y preventivas _ Contrato 2025 – 2781

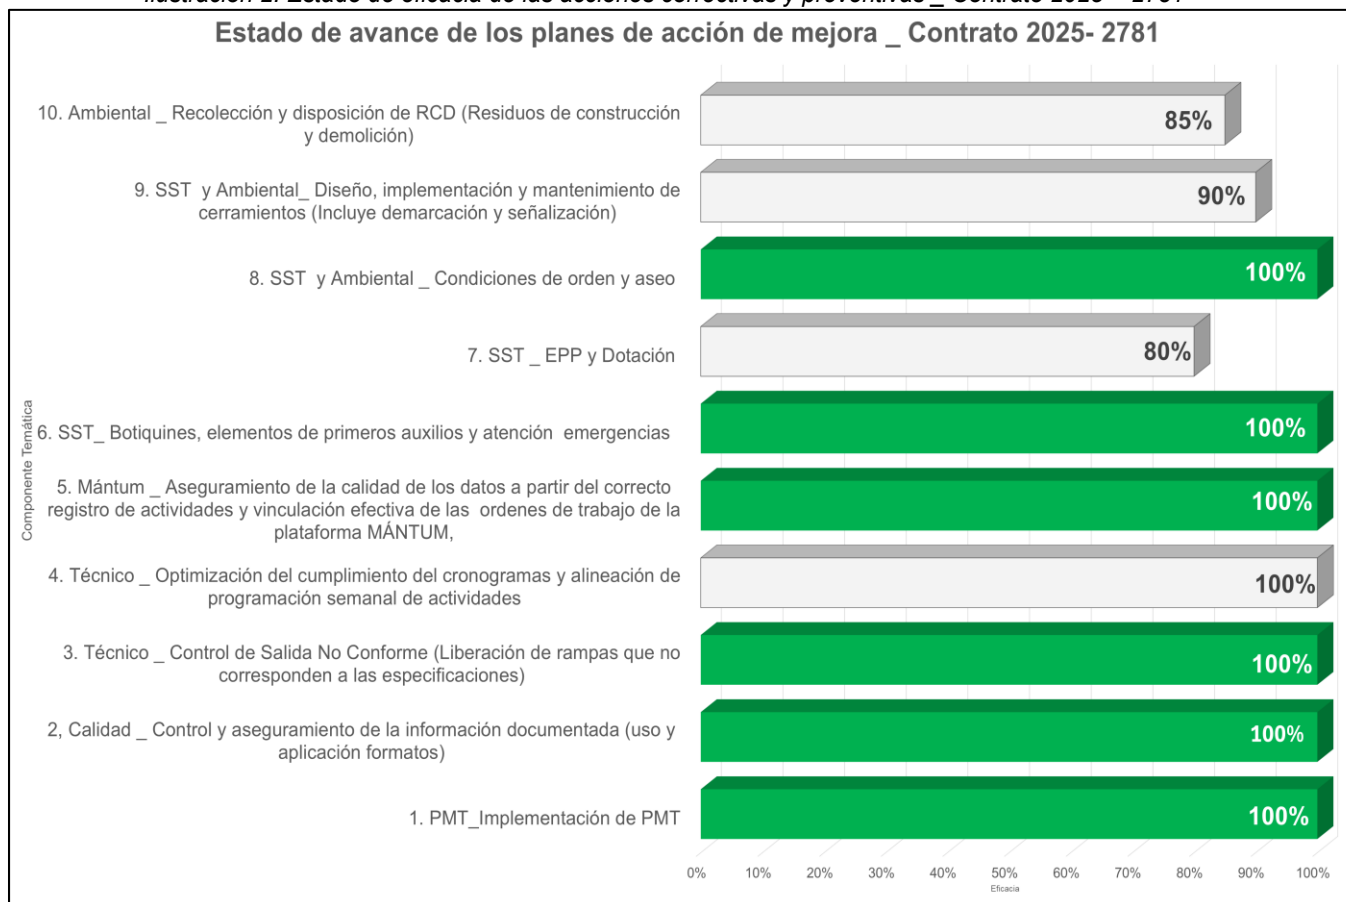

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 1	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 38 de 64	

El detalle de esta información podrá ser consultado en Informe Transversal de Interventoría N° 13. SST, AMBIENTAL, TRÁNSITO Y CALIDAD.

3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo


Para el presente periodo no se presentaron resultados y análisis de laboratorio y de campo, pues no se realizaron ensayos.

3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista

Respecto al plan de calidad del contrato 2025-2781, aprobado mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-071-25, 05 de septiembre del 2025, con radicado en Orfeo con el consecutivo n.º 202561203273912, durante el periodo de abril se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) objetivos de calidad e indicadores, b) control de la información documentada, c) producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, y d) seguimiento y medición y e) mejora continua.

A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo

Ilustración 3. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.º 2025 2781 durante el periodo de abril del 2026

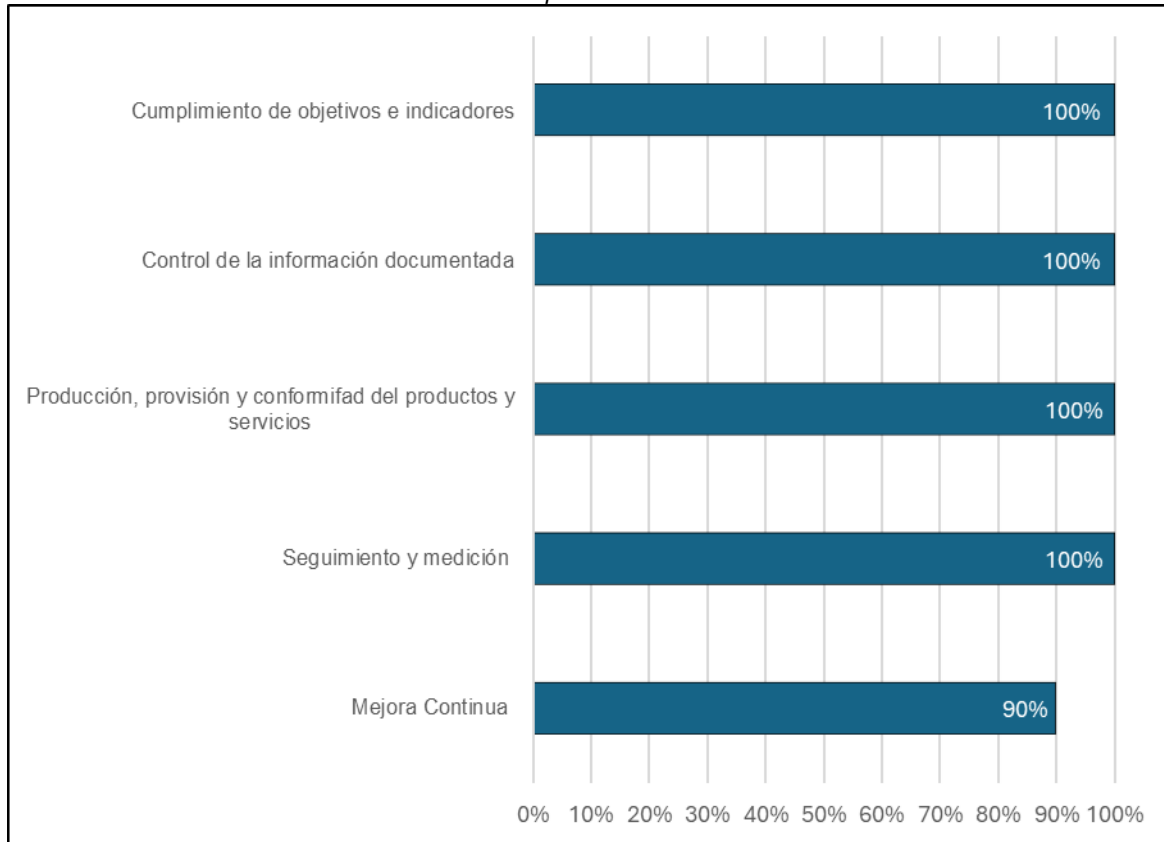

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Dado lo anterior se emiten las siguientes conclusiones:

- El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Consorcio Movilidad 2025 es del noventa y ocho por ciento (98%), nivel de cumplimiento que se mantiene respecto al periodo anterior
- Respecto a la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad a través de indicadores se concluye que el contratista Consorcio Movilidad 2025 cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad.
- Con base en la revisión realizada por la Interventoría al Plan de Calidad del contrato 2025-2781 y al Listado Maestro de Documentos con corte al periodo de abril de la presente vigencia, se evidenció que durante el periodo evaluado no se presentaron cambios ni actualizaciones en los formatos establecidos dentro del sistema de gestión documental del contrato.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 40 de 64	

- Se verificó que el contratista mantiene la correcta aplicación de los controles sobre la información documentada, garantizando el uso de las versiones vigentes de los formatos definidos, así como la adecuada disponibilidad, organización y trazabilidad de los registros asociados a las actividades del proyecto.
- Respecto al factor de producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, se verificó que durante el proyecto el contratista aplicó los controles correspondientes a la verificación del cumplimiento de especificaciones de obras civiles tal como se evidencia mediante la trazabilidad del indicador
- Durante el mes de abril de 2026, respecto al factor de mejora continua, el Consorcio Movilidad 2025 cerró con un nivel cumplimiento del noventa y cinco por ciento (95%). A corte de abril de la presente vigencia el Contratista dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el plan de calidad dentro del marco de la mejora continua, definido diez (10) acciones correctivas, de las cuales ha cerrado eficazmente seis (6), el restante finalizó con la ejecución parcial del plan de acción. Una acción de mejora no fue eficaz.

3.1.11. Relación de productos no conformes

Durante el mes no se presentaron productos no conformes.

3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones

3.1.12.1. Recomendaciones y observaciones

- La interventoría hace revisión permanente de las Obras civiles, e identifica frente a los cronogramas, emitiendo los siguientes comunicados y requerimientos previos como solicitud al Contratista del cumplimiento a los tiempos establecidos mediante los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-235-26 con radicado ORFEO n.º 202600000158442 del 07 de abril de 2026 remitió Solicitud Intersección AK 80G X DG 3; SEM-CMC-CM25-244-26 con radicado ORFEO n.º 202661201445632 del 20 de abril de 2026 remitió Solicitud de Entrega de actas de comités técnicos mensuales; SEM-CMC-CM25-248-26 con radicado ORFEO n.º 202661201512332 del 23 de abril de 2026 remitió Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781-220 – Seguimiento a obligaciones contractuales y requerimientos de Interventoría –Contrato de Obra Pública No. 2025-2781; SEM-CMC-CM25-249-26 con radicado ORFEO n.º 202661201523922 del 24 de abril de 2026 remitió Pendientes de recuperación de espacio público en la KR 72 J con CL 45 Sur – Contrato 2025-2781; SEM-CMC-CM25-250-26 con radicado ORFEO n.º 202661201524542 del 24 de abril de 2026 remitió Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-264– Trámite Grúa – Contrato 2025-2781; SEM-CMC-CM25-253-26 con radicado ORFEO n.º 202661201569322 del 28 de abril de 2026 remitió Requerimiento Previo Cumplimiento de Actualización de Pólizas de contrato 2025-2781.

3.1.12.2. Acciones y/o Conclusiones

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		Página 41 de 64

- La interventoría radicó el informe de presunto incumplimiento mediante el comunicado SEM-CMC-SDM-189-26 con radicado ORFEO n.º 202600000137232 el 26 de marzo de 2026 a la Secretaría De Movilidad, esto efectuando sus obligaciones como lo es la revisión por parte de esta Interventoría ante presuntos incumplimientos por parte del Contratista Consorcio Movilidad 2025. Al anterior comunicado la Secretaría Distrital de Movilidad remitió su respuesta con radicado 202632204715801, la cual está en proceso de gestión de la Interventoría.
- Como respuesta y entrega de comunicados desde la Interventoría hacia la Secretaría De Movilidad se emitieron los siguientes comunicados:
- SEM-CMC-SDM-190-26 con radicado ORFEO n.º 202661201256392 del 07 de abril de 2026 remitió Respuesta a Apremio No. 2 radicado SEMA No. 202632202658751.
- SEM-CMC-SDM-193-26 con radicado ORFEO n.º 202661201324792 del 10 de abril de 2026 remitió Solicitud de devolución de Factura CM No.17 corte enero 2026 del Contratista Consorcio Movilidad 2025 – Contrato 2025-2781.
- SEM-CMC-SDM-196-26 con radicado ORFEO n.º 202661201366892 del 14 de abril de 2026 remitió Respuesta a 202632203977011, referente a Respuesta a la comunicación SEMA No. 202632202658751 del 18 de marzo de 2026, Revisión Factura CM No. 17 del Consorcio Movilidad 2025 y Procedencia de Suspensión del Contrato.
- SEM-CMC-SDM-201-26 con radicado ORFEO n.º 202600000177102 del 17 de abril de 2026 remitió Concepto integral sobre la viabilidad de reactivación del frente de obra AK 80G x DG 3 Ext. 3477 ID 879 – Américas, en el marco del Contrato de Obra Pública No. 2025-2781.

Teniendo en cuenta las comunicaciones atendidas por parte de la Secretaría De Movilidad, esta Interventoría concluye que considera integralmente atendidos los requerimientos formulados en los comunicado de la referencia, incorporando, además de la información complementaria y las precisiones realizadas, todos los soportes documentales correspondientes con el fin de ampliar y sustentar las actuaciones adelantadas por esta Interventoría en el marco de sus funciones contractuales de seguimiento, control y verificación.

Así mismo se radico concepto integral sobre la viabilidad de reactivación del frente de obra AK 80G x DG 3 Ext. 3477 ID 879 – Américas mediante el comunicado SEM-CMC-SDM-201-26 con radicado ORFEO n.º 202600000177102 el 17 de abril de 2026.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 42 de 64	

3.2. Seguimiento administrativo

3.2.1. Verificación de requisitos mínimos

Se realiza revisión de las obligaciones generales y específicas según la cláusula 9 y 10 del anexo 5 de la minuta del contrato. A la fecha de la elaboración del presente informe se verifica el cumplimiento de cada una de estas obligaciones, aclarando que no hay atrasos en la ejecución.

La siguiente es la relación de hojas de vida presentadas por el Contratista durante el mes de abril de 2026.

Tabla 22. Hoja de vida presentadas por el Contratista durante el periodo de abril 2026

n.º	Cargo	Cantidad	Concepto Aprobadas	Concepto No Aprobadas	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Ayudante de obra	Na	Na	00	---	---
Totales		00	00	00		

Fuente: Elaboración propia

En el *Anexo n.º 18. Relación de personal aprobado al Contratista*, se encuentra la relación del personal aprobado desde el mes de mayo de 2025 al mes de abril de 2026.

3.2.2. Informes presentados por el Contratista

Se relacionan los informes presentados por el Contratista hasta el presente mes de abril de 2026.

Tabla 23. Informes básicos Contratista

Informe n.º	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	COMUNICADO INTERVENTORIA	Radicado SDM	Observaciones
1	29 al 30 de abril (v2)	05/06/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-018-25	202561201988022	No Aplica
2	01 al 31 de mayo (v4)	14/07/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-039-25	202561202444742	No Aplica
3	01 al 30 de junio (v3)	01/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-054-25	202561202783672	No aplica
4	01 al 31 de julio	08/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-074-25	202561203288482	No aplica
5	01 al 31 de agosto	05/09/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-109-25	202561203710682	No Aplica
6	01 al 30 de septiembre	07/10/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-139-25	202561204168442	No Aplica
7	01 al 31 de octubre	07/11/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-156-25	202561204365562	No Aplica
8	01 al 30 de noviembre	01/12/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-163-25	202561204507402	No Aplica
9	01 al 31 de diciembre	07/01/2026	Aprobado	SEM-CMC-CM25-197-26	202661200537342	No aplica
10	01 al 31 de enero	07/02/2026	Aprobado	Factura mes de enero	Factura mes de enero	No aplica

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 43 de 64	

Informe n.º	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	COMUNICADO INTERVENTORIA	Radicado SDM	Observaciones
11	01 al 28 de febrero	07/03/2026	Aprobado	Factura mes de febrero	Factura mes de febrero	No aplica
12	01 al 31 de marzo	07/04/2026	En revisión	En revisión	En revisión	En revisión

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista

3.2.3.1. Verificación del cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada

A la fecha de elaboración de este informe, se tienen 47 personas en total del contrato las cuales 31 cuentan como mano de obra no calificada contratada.

Tabla 24. Obra de mano no calificada

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	Cantidad	%
Total	47	100
Activos	13	27.66
Mujeres	01	2.13

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.2. Personal

La siguiente es la relación del personal administrativo y de apoyo contratado y aprobado al Contratista en el mes de abril de 2026.

Tabla 25. Personal administrativo y de apoyo abril 2026

n.º	Cargo	Nombre
1	Na	Na

Fuente: Elaboración propia

- No se presentó nuevo personal en el mes de abril de 2026.

3.2.3.3. Maquinaria, herramientas y equipos

En el anexo 21 se relaciona la maquinaria, herramientas y equipos presentados a la fecha y su estado, para el periodo de abril no se evaluó maquinaria.

3.2.3.4. Transporte

A corte del 30 de abril, el Contratista ha presentado los siguientes medios de transporte, de los cuales no se cuenta con ingresos de vehículos, y sigue pendiente el de Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles:

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		Página 44 de 64

Tabla 26. Transporte

Uso	Placa	Carrocería	Cilindraje	Modelo	Organismos de tránsito	Aprobación	RADICADO SDM
Traslado personal administrativo	JKZ914	Doble cabina	1997 CC	2020	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	KYP683	Furgón	2746 CC	2022	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	JKU690	Furgón	2746 CC	2021	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	JKU049	Plataforma	7790	2020	Cota Cundinamarca	* Cumple con pendientes	-

Fuente: Elaboración propia

* El Contratista mediante comunicado WEXT-2025-2781-264 con radicado ORFEO n.º. 202661201508642 entregó soporte de traslado de la placa a Bogotá, al momento se encuentra pendiente que el trámite se haga efectivo.

3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad.

Dando cumplimiento al CAPÍTULO IV de los pliegos tipos se verifica que se mantenga la condiciones que otorgaron puntaje durante el proceso de selección al Contratista adjudicatario que ejecuta el contrato 2025-2781.

Para el presente periodo del contrato 2025-2781, la Interventoría verificó los aspectos que otorgaron puntaje adicional al Contratista Consorcio Movilidad 2025.

3.2.4.1. Factor de calidad

Según la información publicada en la oferta del Contratista en el marco del Proceso de Contratación SDM-LP-001-2025, se identifica la presentación del formato 7C – Plan de Calidad, mediante el cual el Contratista se compromete a elaborar y presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto.

En cumplimiento de dicho compromiso, el Contratista radicó el Plan de Calidad en el mes de septiembre, al cual se le realiza seguimiento constante por parte de Interventoría.

3.2.4.2. Puntaje de industria nacional

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional. Indicando en el formato 9 de la oferta:

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 45 de 64	

“Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.”

Se ha verificado que se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de menos el ochenta por ciento (80%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente manera:

Tabla 27. Puntaje de Industria Nacional

CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS	CANTIDAD DE COLOMBIANOS	CANTIDAD DE EXTRANJEROS	% CUMPLIMIENTO
47	47	0	100

Fuente: Elaboración propia

El Contratista para el periodo de abril de 2025 presentó la relación del personal contratado, mediante declaración y certificación de cada empleado.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.3. Vinculación de personas en condición de discapacidad

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por vinculación de personas con discapacidad, contando con un número de trabajadores con discapacidad con por lo menos un año de vinculación o desde el momento de la Constitución de la persona jurídica cuando está es inferior a un año acreditados con certificación de aportes a seguridad social, destinando un porcentaje del (2,13%) del total del personal para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente información:

Tabla 28. Vinculación de personas con discapacidad

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	% CUMPLIMIENTO
47	1	2.13

Fuente: Elaboración propia

De conformidad con la vigencia del certificado expedido por el Ministerio de trabajo, de seis (6) meses a partir de la fecha de expedición 13 de abril de 2026.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 46 de 64	

3.2.4.4. *Emprendimientos y empresas de mujeres*

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por emprendimientos y empresas de mujeres, acreditando la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, acogiendo a ***“Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.”*** Por tanto, para el presente periodo, el Contratista cuenta con por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Certificando que son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.5. *MIPYME*

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por MIPYME domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complementa o sustituya, para ello, el Contratista, tratándose de contratistas plurales, el puntaje fue otorgado si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio Movilidad 2025.

La Interventoría verificó el documento RUP con fecha de expedición del 31 de marzo de 2026. La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.5. **Seguimiento financiero**

Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (CRP), del contrato n.º 2025-2781, se muestran a continuación:

Tabla 29. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781)

ÍTEM	n.º	FECHA	VALOR
CDP	106	01/2025	\$38.800.000.000
CRP	2417	21/04/2025	\$ 5.141.951.324
VALOR DEL CONTRATO			\$5.141.951.324
RUBRO CDP	O2301172409202412708059		

ÍTEM	n.º	FECHA	VALOR
RUBRO CRP	O230117240920240127		

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato
Tabla 30. Presupuesto del Contrato 2025-2781

Periodo	Valor Del Corte	Valor Rete garantía	Valor Por Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Crp S	Saldo Crp S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación CMC	n.º De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/05/2025 al 31/05/2025	\$35.153.420	\$1.757.671	\$33.395.749	\$35.153.420	\$ 33.395.749	2417	\$5.108.555.575	\$5.106.797.904	11/08/2025	3000792965	22/08/2025	6/08/2025
1/06/2025 al 30/06/2025	\$47.999.156	\$2.399.958	\$45.599.198	\$83.152.576	\$ 78.994.947	2417	\$5.062.956.377	\$5.058.798.748	11/08/2025	3000822224	14/08/2025	6/08/2025
1/07/2025 al 31/07/2025	\$488.821.931	\$24.441.097	\$464.380.834	\$571.974.507	\$ 543.375.781	2417	\$4.598.575.543	\$4.569.976.817	10/09/2025	3000973224	22/09/2025	4/09/2025
1/08/2025 al 31/08/2025	\$521.542.988	\$26.077.150	\$495.465.838	\$1.093.517.495	\$1.038.841.619	2417	\$4.103.109.705	\$4.048.433.829	8/10/2025	3001100296	22/10/2025	6/10/2025
1/09/2025 al 30/09/2025	\$454.179.498	\$22.708.975	\$431.470.523	\$1.547.696.993	\$1.470.312.142	2417	\$3.671.939.182	\$3.594.254.331	11/11/2025	3001230826	24/11/2025	6/11/2025
1/10/2025 al 31/10/2025	\$566.692.824	\$28.334.641	\$538.358.183	\$2.114.389.817	\$2.008.670.325	2417	\$3.133.280.999	\$3.027.561.507	9/12/2025	3001354718	17/12/2025	2/12/2025
1/11/2025 al 30/11/2025	\$301.453.692	\$15.072.685	\$286.381.007	\$2.415.843.509	\$2.295.051.332	2417	\$2.846.899.992	\$2.726.107.815	11/12/2025	3001369607	19/12/2025	10/12/2025
1/12/2025 al 31/12/2025	\$706.533.679	\$35.326.684	\$671.206.995	\$3.122.377.188	\$2.966.258.327	2417	\$2.175.692.997	\$2.019.574.136	10/02/2026	3000104360	18/02/2026	12/02/2026
1/01/2026 al 31/01/2026	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2417	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
1/02/2026 al 28/02/2026	\$522.843.168	\$26.142.158	\$496.701.010	\$3.645.220.356	\$3.462.959.337	2417	\$1.678.991.987	\$1.496.730.968				
1/03/2026 al 31/03/2026	\$361.012.342	\$18.050.617	\$342.961.725	\$4.006.232.698		2417	\$1.336.030.262	\$1.135.718.626				
1/04/2026 al 30/04/2026	\$194.973.394	\$9.748.670	\$185.224.724	\$4.201.206.092		2417	\$1.150.805.538	\$940.745.232				
TOTALES	\$4.201.206.092	\$210.060.306	\$3.991.145.786									

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

(*) Para la fecha del presente informe, la factura de enero 2026 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, para pago al contratista.

Tabla 31. Balance Financiero 2025-2781

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 5.141.951.324
B	Total, adiciones al contrato	\$ 0
C	Valor total del contrato	\$ 5.141.951.324
D	Valor pagado al Contratista	\$ 3.462.959.337
E	Retención en garantía acumulada, de pagos realizados	\$ 182.261.019
F	Valor total ejecutado	\$ 4.201.206.092
G	Valor por ejecutar del contrato (A- F)	\$ 940.745.232

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

- La Interventoría, verificó los soportes reglamentarios de la factura, la completitud de la información y a través del comunicado n.º SEM-CMC-SDM-214-26 con radicado Orfeo n.º 202661201673632 del 6 de mayo de 2026, gestionó el pago ante la Secretaría de Movilidad – SDM, correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2026 del contratista con monto a pagar por \$496.701.010. Así mismo se informa que la SDM realizó el pago en referencia el 23 de abril de 2026.
- Seguimiento del PAC: Para el Contratista Consorcio Movilidad 2025, el comportamiento del PAC en los períodos analizados evidencia una tendencia fluctuante. En particular, para

las cuentas correspondiente a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, el nivel de cumplimiento fue estable del 95,00%, para las cuentas de febrero 2026, obtuvo un cumplimiento del 70,96, adicionalmente, para la cuenta de marzo de 2026 alcanzó un cumplimiento de más del 100%.

Tabla 32. Programación PAC CTO n.º 2025-2781


Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2025	agosto 2025	\$521.542.988	\$495.465.838	\$26.077.150	95,00%
noviembre 2025	septiembre 2025	\$454.179.498	\$431.470.523	\$22.708.975	95,00%
diciembre 2025	octubre 2025	\$566.692.824	\$538.358.183	\$28.334.641	95,00%
	noviembre 2025	\$301.453.692	\$286.381.007	\$15.072.685	95,00%
febrero 2026	diciembre 2025	\$706.533.679	\$671.206.995	\$35.326.684	95,00%
marzo 2026	enero 2026	\$400.000.000	(*)	(*)	(*)
abril 2026	febrero 2026	\$857.947.146	\$496.701.010	\$361.246.136	57,89%
mayo 2026	marzo 2026	\$204.311.328	\$342.961.725	-\$138.650.397	167,86%
junio 2026	abril 2026	\$863.973.898			
Total		\$4.876.635.053	\$3.262.545.281	\$350.115.874	

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

(*) Para la fecha del presente informe, la factura de enero 2026 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, para pago al contratista.

Así mismo se relaciona el seguimiento de la ejecución presupuestal respecto a la proyección del PAC, así:

Ilustración 4. Ejecución presupuestal vs PAC programado Cto. 2025-2781

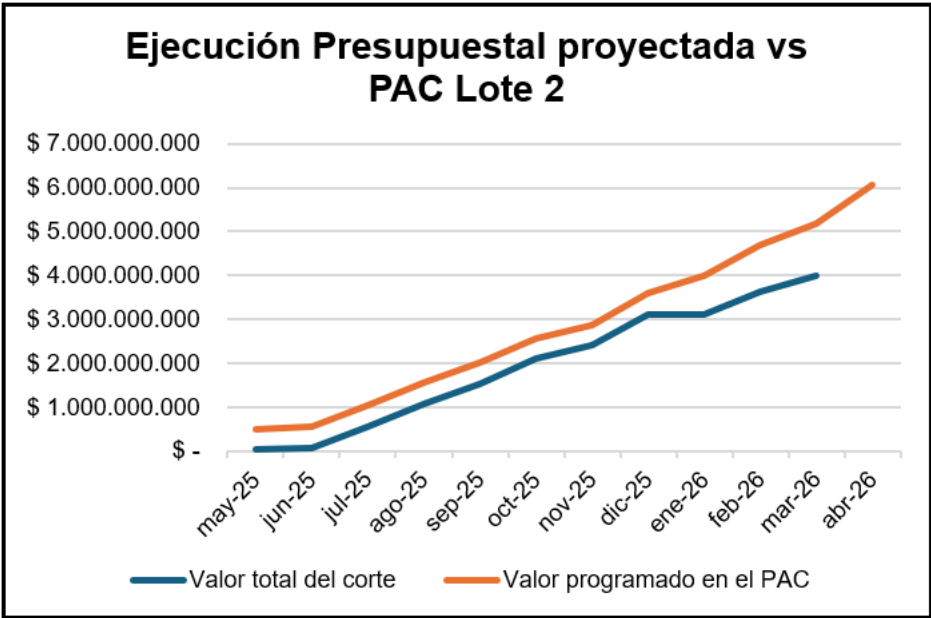

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		Página 49 de 64

- Certificación de Revisor Fiscal o Contador Público: Se evidenció que el contratista remitió la certificación en referencia, para la cuenta del pago del período de febrero 2026.

3.3. Seguimiento jurídico

3.3.1. Resumen de garantías del contrato

Pólizas: Se requirió mediante comunicado No. SEM-CMC-CM25-253-26 radicado ORFEO No. 202661201569322 del 28 de abril de 2026 Requerimiento previo presunto incumplimiento de actualización de pólizas, al contratista a fin de que realice la actualización de las garantías teniendo en cuenta la recomendación de la SDM, respecto a la póliza de RCE.

El contratista da respuesta al requerimiento previo mediante comunicado WEXT-2025-2781-269 del 30 de abril de 2026, donde presento las evidencias del cumplimiento de actualización de garantías contractuales.

Cumplimiento Contractual: Se destacan las siguientes actuaciones:

Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781-220 mediante oficio SEM-CMC-CM25-248-26 (23/04/2026), relacionada con requerimiento previo por presunto incumplimiento Seguimiento contractual y requerimientos de interventoría.

Respuesta WEXT-2025-2781-257 – Requerimiento Previo Obligación Certificación RCD – Contrato n.º 2025-2781 mediante oficio SEM-CMC-CM25-243-26 (20/04/2026).

Alcance a SEM-CMC-CM25-208-26 y SEM-CMC-CM25 219-26 asociado a Requerimiento previo Cumplimiento de compromisos – Contrato 2025-2781, mediante comunicación SEM-CMC-CM25-240-26 (16/04/2025)

Adicionalmente:

Se emitió el oficio SEM-CMC-CM25-252-26 (28/04/2026), Cierre a Requerimiento previo Planillas Seguridad marzo 2026 comunicados SEM-CMC-CM25-225-26 y SEM-CMC-CM25-236-26 – Contrato 2025-2781,

Se generó comunicación Respuesta comunicado WEXT-2781 250-Requerimiento Previo – Cumplimiento Entrega de Soportes de pago de Seguridad Social - Periodo marzo de 2026 mediante oficio SEM-CMC-CM25-236-26 (10/04/2026).

Se genero comunicado SEM-CMC-CM25-232-26 (6/04/2026) Respuesta a comunicación WEXT 2025-2781-246 – Presunto incumplimiento obligación certificación RCD – Contrato No. 2025-2781.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 50 de 64	

Se radico en Informe de Incumplimiento contractual con radicado SEM-CMC-SDM-189-26, el cual se recibió comunicado de la SDM relacionado con Observaciones No. 202632204715801 del 14 de abril de 2026.

3.3.2. Variaciones en presupuesto proyectado por el Consorcio Movilidad 2025 para obras civiles

Posteriormente, y en desarrollo de las actuaciones adelantadas durante el mes de abril de 2026, la Interventoría continuó realizando seguimiento técnico, financiero y contractual al comportamiento presupuestal del contrato, así como a las variaciones reportadas por el Contratista, reiterando mediante las diferentes mesas de trabajo, comunicaciones y revisiones efectuadas, la necesidad de que el Contratista soportara técnicamente las desviaciones presentadas y acreditara la trazabilidad de los recursos ejecutados en cada frente de obra.

3.3.3. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría en el marco del seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, y conforme a lo establecido en el Contrato de Obra n.º 2025-2781, así como en la normativa vigente en materia de riesgos laborales, se informa que durante el periodo reportado se realizaron las verificaciones documentales correspondientes al informe de gestión presentado por el Contratista.

La verificación incluyó los soportes de las personas vinculadas al proyecto, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de vinculación laboral, pagos salariales, afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médica y demás documentos exigidos.

El detalle de la revisión de seguridad social se encuentra en el informe de gestión de abril de 2026 de SST (Transversales).

3.4. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría

A continuación, se presenta el detalle de las sesiones realizadas durante el periodo con su respectivo registro documental. En el *Anexo n.º 9 Copia de actas desarrolladas en el periodo. (Comité y reuniones)*, se relacionan las suscritas por esta Interventoría en el presente periodo.

Tabla 33. Relación de actas suscritas durante el periodo

n.º Acta	Tipo	Fecha	Tema Principal
11	Comité de seguimiento quincenal	16/04/2026	Acta N.º 11 Comité de seguimiento quincenal
13	Comité de seguimiento mensual	29/04/2026	Acta N.º 13 Comité de seguimiento mensual
2	Comité Extraordinario	13/04/2026	Acta n.º. Comité Extraordinario
32	Acta de obra	17/04/2026	Entrega de obra – KR 72J X CL 45 S
33	Acta de obra	17/04/2026	Entrega de obra – KR 24 X CL 18 S

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 51 de 64	

n.º Acta	Tipo	Fecha	Tema Principal
34	Acta de obra	22/04/2026	Preentrega de obra – KR 46A X AK 68 S

Fuente: Elaboración propia

La Interventoría indica que las actas de comité número 11, 13 y comité extraordinario número 2, se encuentran pendientes de firma por parte del Contratista Consorcio movilidad 2025

3.5. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el Contratista

Durante el periodo se tiene registro de la siguiente correspondencia:

Tabla 34. Correspondencia Recibida

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Contratista	Radicado Movilidad
1	1 de abril de 2026	Reiteración Oficio No. WEXT-2025-2781-233 – Solicitud de respuesta de fondo y cumplimiento de obligaciones contractuales y legales frente al reconocimiento y pago del corte enero de 2026.	CM25	WEXT-2025-2781-249	202661201223932
2	7 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-225-26	CM25	WEXT-2025-2781-250	202661201258802
3	7 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-223-26- Modificación de aprobación de vehículo tipo camión para el traslado de materiales y equipos.	CM25	WEXT-2025-2781-251	202661201258952
4	7 de abril de 2026	Informe Mensual No. 12 V1 del Mes de marzo de 2026.	CM25	WEXT-2025-2781-252	202661201260112
5	7 de abril de 2026	Informe Mensual No. 11 V1 del Mes de marzo de 2026 - SSTMA	CM25	WEXT-2025-2781-253	202661201265922
6	7 de abril de 2026	Reiteración oficio WEXT-2025-2781-230	CM25	WEXT-2025-2781-254	202661201267042
7	7 de abril de 2026	Respuesta comunicada SEM-CMCCM25-234-26.pdf	CM25	WEXT-2025-2781-255	202661201289532
8	6 de abril de 2026	Afectaciones económicas, desequilibrio económico y falta de pago al contrato No. 2025-2781.	CM25	WEXT-2025-2781-256	202661201307612
9	9 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-232-26	CM25	WEXT-2025-2781-257	202661201310472
10	15 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-232-26.	CM25	WEXT-2025-2781-259	202661201374052
11	16 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-235-26	CM25	WEXT-2025-2781-260	202661201391902
12	16 de abril de 2026	Alcance al oficio WEXT-2025-2781-257 Radicación certificaciones personal RCD's	CM25	WEXT-2025-2781-261	202661201396732
13	21 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-237-26	CM25	WEXT-2025-2781-262	202661201467362
14	21 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-242-26	CM25	WEXT-2025-2781-263	202661201471652
15	23 de abril de 2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-101-26 y alcance al WEXT-2025-2781-205 vehículo tipo grúa	CM25	WEXT-2025-2781-264	202661201508642
16	23 de abril de 2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-174-26.	CM25	WEXT-2025-2781-265	202600000189492
17	24 de abril de 2026	Respuesta Oficio SEM-CMC-CM25-236-26	CM25	WEXT-2025-2781-266	202661201530392
18	28 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-SDM-201-26.	CM25	WEXT-2025-2781-267	202661201575362
19	24 de abril de 2026	Respuesta Oficio SEM-CMC-CM25-236-26	CM25	WEXT-2025-2781-268	202661201608582
20	30 de abril de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-253-26	CM25	WEXT-2025-2781-269	202600000201572

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 52 de 64	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 35. Correspondencia Enviada

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
1	31 de marzo de 2026	Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-222-26 Solicitud de Entrega de documentación Intersecciones finalizadas – CTO 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-231-26	202661201208752
2	6 de abril de 2026	Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781-246 – Presunto incumplimiento obligación certificación RCD – Contrato No. 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-232-26	202661201229212
3	6 de abril de 2026	Respuesta a comunicado BEL-SDM-ADM-441-26 asociado a Requerimiento Previo Programación de Obras según cronograma - KR 19A x CL 63. – Contrato 2025-2780.	CMC	SEM-CMC-CM25-233-26	202661201229222
4	7 de abril de 2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 30 de marzo al 03 de abril de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-234-26	202661201254472
5	7 de abril de 2026	Solicitud Intersección AK 80G X DG 3.	CMC	SEM-CMC-CM25-235-26	202600000158442
6	10 de abril de 2026	Respuesta comunicado WEXT-2781-250- Requerimiento Previo – Cumplimiento Entrega de Soportes de pago de Seguridad Social - Periodo marzo de 2026.	CMC	SEM-CMC-CM25-236-26	202661201320152
7	17 de abril de 2025	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 06 al 10 de abril de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-237-26	202661201343052
8	15 de abril de 2026	Solicitud entrega copias comunicados respuestas a oficios de SPMT sobre incumplimientos de PMTs.	CMC	SEM-CMC-CM25-238-26	202661201384642
9	15 de abril de 2026	Respuesta a los comunicados WEXT-2025-2781-230 y WEXT-2025-2781-254 – Informe Final CTO 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-239-26	202661201386202
10	16 de abril de 2026	Alcance a SEM-CMC-CM25-208-26 y SEM-CMC-CM25-219-26 asociado a Requerimiento previo Cumplimiento de compromisos– Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-240-26	202661201405932
11	16 de abril de 2026	Solicitud radicado ORFEO – Informes Mensuales– marzo de 2026 – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-241-26	202661201406182
12	20 de abril de 2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 13 al 17 de abril de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-242-26	202661201446822
13	20 de abril de 2026	Respuesta WEXT-2025-2781-257 – Requerimiento Previo Obligación Certificación RCD – Contrato n.º 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-243-26	202661201443732
14	20 de abril de 2026	Solicitud de Entrega de actas de comités técnicos mensuales.	CMC	SEM-CMC-CM25-244-26	202661201445632
15	21 de abril de 2026	Solicitud actas de recibo de espacio público y paz y salvos ante las empresas ESP – CTO 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-245-26	202661201463442
16	21 de abril de 2026	Solicitud respuesta a comunicado IDPC n.º 20253010093331 Radicado IDPC n.º 20255110098792 - Intervención Patrimonial en KR 17 con CL 22 – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-247-26	202600000184692
17	23 de abril de 2026	Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781-220 – Seguimiento a obligaciones contractuales y requerimientos de Interventoría –Contrato de Obra Pública No. 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-248-26	202661201512332
18	24 de abril de 2026	Pendientes de recuperación de espacio público en la KR 72 J con CL 45 Sur – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-249-26	202661201523922
19	24 de abril de 2026	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-264– Trámite Grúa – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-250-26	202661201524542

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 53 de 64	

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
20	24 de abril de 2026	Cierre a Requerimiento previo Entrega de tapas normales y antivandálicas SEM-CMC-CM25-167-25 – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-251-26	202661201529412
21	28 de abril de 2026	Cierre a Requerimiento previo Planillas Seguridad marzo 2026 comunicados SEM-CMC-CM25-225-26 y SEM-CMC-CM25-236-26 – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-252-26	202661201558162
22	28 de abril de 2026	Requerimiento Previo Cumplimiento de Actualización de Pólizas de contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-253-26	202661201569322
23	28 de abril de 2026	Requerimiento Previo – Cumplimiento Entrega de Soportes de pago de Seguridad Social - Periodo abril de 2026.	CMC	SEM-CMC-CM25-254-26	202600000198182
24	30 de abril de 2026	Llamado de atención por maniobras de vehículos de obra no autorizadas por el PMT - EXT_3477 - ID_879 KR 80G con DG 3 (AV. Américas) – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-255-26	202661201608612

Fuente: Elaboración propia

NOTA: Para el presente periodo las comunicaciones enviadas y recibidas fueron notificadas mediante comunicación oficial.

Tabla 36. Correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico

n.º	Fecha enviada	Asunto
1	03/04/2026	revisión cantidades febrero
2	06/04/2026	revisión cantidades febrero
3	06/04/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-249 Reiteración Oficio No. WEXT-2025-2781-233 – Solicitud de respuesta de fondo y cumplimiento de obligaciones contractuales y legales frente al reconocimiento y pago del corte enero de 2026
4	06/04/2026	SEM-CMC-CM25-232-26 Radicación de Correspondencia
5	06/04/2026	SEM-CMC-CM25-233-26 Radicación de Correspondencia
6	07/04/2026	SOLICITUD PRORROGA OFICIO WEXT-2025-2781-2023
7	07/04/2026	Actas marzo
8	07/04/2026	Acta mensual marzo 2026
9	08/04/2026	Revisión memorias de cálculo febrero
10	09/04/2026	OFICIO WEXT-2025-2781-227 – Informe mensual No. 11 V1 del mes de febrero de 2026
11	09/04/2026	Solicitud de prorroga respuesta requerimiento interventoría
12	09/04/2026	Inactividad Intersección KR 46A X AC 68 SUR
13	09/04/2026	Solicitud de visita para entrega de intersección de candelaria
14	10/04/2026	Acta de recibo febrero 2026 – informe de actividades
15	10/04/2026	Plano récord bomberos
16	10/04/2026	Plano récord Sierra Morena TV 60 X DG 70 SUR
17	13/04/2026	Recibo final de obra – Usme 3ra visita
18	14/04/2026	Visita de Sierra Morena – Cto 2781
19	15/04/2026	Acta No. 1 Comité Extraordinario - 03MAR2026
20	16/04/2026	Acta comité quincenal de abril
21	17/04/2026	Revisión candelaria

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 54 de 64	

n.º	Fecha enviada	Asunto
22	17/04/2026	Revisión presupuesto CM25 – Cto 2781
23	22/04/2026	Revisión cantidades – corte de marzo
24	22/04/2026	Entrega tapas antivandálicas
25	23/04/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-259 Respuesta OFICIO SEM-CMC-CM25-232-26
26	23/04/2026	Visita de obra - AK 80G X DG 3
27	27/04/2026	Recibo de obras – CTO 2781
28	27/04/2026	Revisión cantidades totales – Cto 2781
29	30/04/2026	GRABACIONES COMITE

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico

n.º	Fecha envió	Asunto
1	09/04/2026	OFICIO_WEXT-2025-227 – Informe mensual No. 11 V1 del mes de febrero de 2026.
2	09/04/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-255 respuesta comunicado SEM-CMCCM25-234-26
3	09/04/2026	Radicación Movilidad 2025
4	09/04/2026	Inactividad intersección KR 46 X AC 68 SUR – candelaria
5	10/04/2026	OFICIO-WEXT-2025-2781-256. Afectaciones económicas contrato 2025-2781
6	10/04/2026	Acta de recibo febrero 2026 - informe de actividades
7	16/04/2026	Solicitud de visita para entrega de intersecciones
8	22/04/2026	intersección KR 72J X CL 45 SUR – base poste existente separador oriental
9	22/04/2026	Solicitud información estado del pago de las FE. No. 17 y 19 contrato No. 2025-2781
10	22/04/2026	Entrega tapas antivandálicas
11	27/04/2026	Informe semanal 35 – del 24 al 28 de marzo de 2026
12	27/04/2026	Informe semanal 36 – del 06 al 11 de abril de 2026
13	27/04/2026	Grabaciones comité
14	29/04/2026	Observaciones visita realizada el día 28 abril

Fuente: Elaboración propia

4. ANEXOS

4.1. Anexo n.º 1. Directorio del personal profesional del Contratista

Tabla 38. Relación de personal profesional del Contratista

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
William Augusto Acosta López	Director	consorciomovilidad2025@gmail.com
Christian Roqueme Salazar	Ingeniero Especialista Tránsito	consorciotransito2025@gmail.com
Christian Felipe Gutiérrez García	Residente de Obra	williams.areatecnica2@gmail.com
María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	consorciomovilidad2025@gmail.com

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 55 de 64	

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Diana Maritza Ramos Cruz	Profesional SST	williams.arealidersst@gmail.com

Fuente: Elaboración Propia

4.2. Anexo n.º 2. Directorio del personal profesional de Interventoría

Tabla 39. Relación de personal profesional de la Interventoría

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Valentín Eduardo Barajas Santos	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co
Jaime Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co
Luis Carlos Daza Velásquez	Especialista tránsito y transporte	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co
Mayte Dayana Gutierrez Barbosa	Ingeniero Residente obras civiles	Sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co
Edgar Fernando Estupiñán	Ingeniero Residente Manejo Mantum	sem-ing-mantum@redtic.com.co
Gloria Claudia Martin Melo	Profesional calidad	sem-p-calidad@redtic.com.co
Deysi Katalina Moya Jiménez	Profesional en SST	sem-sst-1@redtic.com.co
Andrea Lizeth Vargas Soler	Profesional Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co
Ibeth Palacios Agudelo	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com.co
Laura María Castellanos Guerrero	Profesional Financiero y contable	sem-p-financiero@redtic.com.co
Tania Valentina Lombana Otalora	Auxiliar de ingeniería-Obra civil	sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co

Fuente: Elaboración Propia

4.3. Anexo n.º 3 Directorio del personal profesional de la Entidad

Tabla 40. Relación de personal profesional de la Entidad

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Ronal Dayan Monroy Sandoval	Supervisor Cto de Interventoría	rmonroy@movilidadbogota.gov.co
Yeison Enrique Ibañez Guerrero	Apoyo a la Supervisión	yibanez@movilidadbogota.gov.co

Fuente: Elaboración Propia

4.4. Anexo n.º 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.

Tabla 41. Obligaciones generales del Contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 56 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.				
2. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
4. Para la suscripción del acta de inicio el Contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
5. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Firma acta de inicio	Única	Si	El Contratista durante el periodo inició actividades y presentación de requisitos contractuales.
6. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Firma documentos confidencialidad, compromiso antisoborno y sarlaft	Única	Si	No se han presentado novedades.
9. Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Respuesta comunicaciones Interventoría	mensual	No	La Interventoría evidencia que el Contratista tiene comunicaciones pendientes por respuesta de los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-262-26; SEM-CMC-CM25-261-26, SEM-CMC-CM25-258-26,
10. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 57 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
11. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales revistos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
12. Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Aprobación de equipos y herramientas inicial	inicial y/o reemplazo de equipos	Si	No se han presentado novedades.
13. Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Firma acta de inicio	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Firma acta de inicio	Mensual	No	La Interventoría manifiesta al Contratista hallazgos semanales del componente ambiental y SST.
15. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 58 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
17. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Presentación de informes y firma de actas de reunión	Mensual	No	El Contratista no ha firmado las actas de reunión asistidas.
18. Conocer y acatar las normas contractuales, manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Comunicaciones de incumplimiento por la entidad	Mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
19. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.	Dirección de referencia para comunicaciones Consorcio movilidad 2025	Inicial	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Pendiente	La Interventoría dejó como compromiso de entrega la subsanación de todos los hallazgos pendientes para el 30 de abril de 2026.
21. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Si	El Contratista participó en las reuniones citadas por la SDM y por la Interventoría.
22. Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
23. Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones" sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
24. El Contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Actas de reunión	Mensual	Si	No se han presentado novedades.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 59 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
25. Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Actas de reunión y comités de obra	Mensual	No	Durante el periodo la Interventoría deja radicado el Informe de incumplimiento con el detalle de los requerimientos no atendidos.
26. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisiciones a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)"	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
27. Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del Contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
28. Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las	Lista de chequeo cumplimiento obligaciones contractuales	Mensual	Si	No se han presentado novedades.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 60 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato				

Fuente: Minuta del Contrato n.º 2025 - 2781

Tabla 42. Obligaciones específicas del Contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el Contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Firma de contrato y acta de inicio de contrato de obra	Única	Cumple	No se han presentado novedades.
2. Presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la Interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	Aprobación precios unitarios	Única	No aplica	No aplica durante el periodo.
3. Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La Interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Aprobación de documentación contractual y requerida	Mensual	Cumple	Durante el periodo la Interventoría informó a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.
4. El Contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	Presentación de programa de obra	Inicial y o bajo una modificación contractual, mensual	No aplica	El Contratista ya presenta aprobado el cronograma inicial.
5. Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	Cumple	Durante el periodo se garantizó la disponibilidad en los frentes de trabajo.
6. Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 61 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
7. Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	No aplica	No aplica durante el periodo.
8. Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la Interventoría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
9. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el Contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.	Aprobación de equipos y herramientas Formatos de seguimiento por parte de Interventoría	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
10. En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el Contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.
11. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto.	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.
12. Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
13. En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el Contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los	Actas de reunión y/o comunicaciones	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista no ha remitido la aprobación u observaciones

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 62 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.				a las actas desde el mes de febrero de 2026.
15. El Contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Aprobación COI SDM	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
17. Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Aprobación COI SDM y o atención de observaciones de la entidad	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
18. Garantizar la coordinación con la Interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
19. Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En los sitios donde se adelanten las obras, el Contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
21. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 63 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
22. Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
23. Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
24. En el caso de los bienes suministrados por el Contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01PR12) Y según Lo definido En el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes n.º PA01-PR12-IN01.	Formatos e instructivos del almacén de la SDM	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
25. Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
26. Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	Aprobación hojas de vida	Mensual	No aplica	No se presentó en el periodo.
27. Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	Correspondencia, Informe mensual	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
28. Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
29. Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.º 13	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	 BOGOTÁ
Versión No. 2	Contrato No. 2025-2769 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.	Página 64 de 64	

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
	mensuales, Correspondencia			
30. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Actas, reuniones y/o comunicaciones escritas	Mensual	No aplica	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

Fuente: Minuta del Contrato n.º 2025 - 2781

 MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	<p align="center">ANEXOS</p> <p align="center">INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 13</p> <p align="center">Componente Obras Civiles - Lote 2</p>	<p align="center">SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p> <p align="center">BOGOTÁ</p>
<p align="center">Contrato No. 2025-2769</p> <p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.</p>		

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1TPKtUxD5BOqBuL7Jt6Hscrc5hfz_wn5z?usp=drive_link
