

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 1 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

INFORME ACTA PARCIAL # 01 CONTRATO DE OBRA

SGR-SC-096-2026

MUNICIPIO DE LA MERCED CALDAS

CONTRATISTA:

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

NIT: 901.919.030-5

CUYO OBJETO ES:

“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”

CONTRATO SGR-SC-096-2026	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED".	Hoja: 2 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las viviendas rurales con la implementación de estufas eficientes fijas para que estas familias mejoren la eficiencia de los procesos de cocción sus hogares, evitando fenómenos de riesgos, ambientales y de salud, con base a las normas técnicas regulatorias actuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Adecuar las viviendas con la construcción de fogones fijos.
- Ayudar a proteger los bosques que sirven de fuente de aprovisionamiento.
- Que la población rural pueda cocinar sus alimentos con comodidad e higiene.
- Proteger la salud de las familias de la inundación del humo producto de la combustión de la madera.

ALCANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas mediante el contrato que se está ejecutando, deberán orientarse a garantizar el óptimo servicio para la las viviendas rurales del municipio de La Merced y de las personas de su entorno

OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo.
2. Cumplir con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el proceso, bien sea en las fichas técnicas y/o especificaciones dadas para la realización del objeto contractual.
3. Utilizar el personal calificado requerido con la experiencia comprobada y en la dedicación requerida en la ficha técnica de la obra.
4. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Entregar copia del contrato al supervisor y/o interventor asignado.

CONTRATO SGR-SC-096-2026	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED".	Hoja: 3 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

6. Presentar los soportes requeridos por la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato.
7. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social.
8. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.
9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual.
10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución.
11. Realizar todos los pagos relacionados con la administración y valores en favor de Impulsa, de igual manera se compromete a sumir los costos de administración del contrato
12. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.
13. Instalar una valla en el sitio de ejecución de proyectos de inversión relacionada con las obras públicas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo con los requisitos que el DNP exija para tal el efecto.
14. En lo que respecta a la captura, consolidación, organización, análisis, verificación de avances y resultados, socialización y retroalimentación. El DNP de forma periódica solicitará efectuar la captura, consolidación, organización, análisis, verificación de avances y resultados, socialización y retroalimentación es por tanto que el contratista se obliga a suministrará la información necesaria para que sea reportada por los actores del Sistema en los aplicativos y herramientas dispuestas por el DNP para este fin, así como su verificación por el SSEC, cuando haya lugar.
15. PARA LOS PAGOS PARCIALES Y PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S, LOS CORRESPONDIENTES INFORMES EN LOS FORMATOS SUMINISTRADOS POR IMPULSA MAS S.A.S, DE MANERA FÍSICA Y EN MEDIO MAGNÉTICO REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR- Y

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 4 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

EXIGIDOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMAS CORRESPONDIENTES.

16. Las demás actividades que le sean asignadas por la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S y/o interventor, que guarden relación con el objeto contractual.
17. Leer de manera atenta y acatar los términos de referencia o pliego de condiciones.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente Contrato y en los documentos del mismo, de conformidad con la forma de remuneración por la ejecución del proyecto.
2. Los demás estipulados en la ley, en los presentes pliegos y normatividades vigentes.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA + S.A.S.:

La Entidad está obligada a:

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
3. Realizar la supervisión del contrato.
4. Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo a la ley.
5. Los demás estipulados en la ley, en los presentes pliegos y normatividades vigentes..

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE OBRA:

El valor estimado del contrato de obra es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$ 249.367.852,26) M/CTE**, incluido todos los impuestos

CONTRATO SGR-SC-096-2026	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED".	Hoja: 5 de 19
	INFORME ACTA PARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

FORMA DE PAGO CLAUSULA 6

Un pago Anticipado del 50% con la suscripción del acta de inicio del contrato de obra por cada una de las partes un 40% pagaderos mediante la presentación de las actas parciales por parte del contratista y verificadas por parte de la interventoría técnica, además de la verificación de la supervisión de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción que deberán ser soportadas en actas de obra. El anticipo deberá ser amortizado en las actas de pagos parciales.

La entidad realizara al contratista el ULTIMO PAGO, cuyo valor por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual será a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la interventoría y/o la supervisión de la entidad UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. y los siguientes requisitos:

1) Presentar el correspondiente informe de interventoría y/o la supervisión el cual deberá ser soportado con registro fotográfico del avance, y demás formatos físicos y en medio magnético exigidos para la ejecución de recursos de SGR. 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación de cumplimiento de las obras ejecutadas C. Entrega de acta de recibo parcial o final según el caso. D. Para los pagos el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus empleados conforme a la normatividad vigente aportando las planillas pagadas, cuando sea una persona natural o jurídica obligada a tener revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal y soportada con las correspondientes planillas de pago de los empleados. E. El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente. El pago será cancelado en pesos colombianos a través transacción en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. IMPULSA MAS S.A.S sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 6 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se realizará una vez se expida el certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato y de acuerdo con los procedimientos establecidos por el SPGR

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe parcial de obra, se resumen los trabajos realizados por el CONTRATISTA, en desarrollo del Contrato de obra SGR-SC-096-2026, referente al proceso firmado con La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S. Cuyo objeto es ejecutar “IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”

El plazo para la ejecución del contrato – etapa construcción inicial es de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.

A la fecha de cierre del presente informe se han realizado diferentes actividades, concernientes a los requisitos previos al inicio de la ejecución de la etapa de obra, las cuales se resumen a continuación:

- Visita técnica en coordinación de la interventoría, supervisión y contratista de la obra a realizar.
- Se realizó inspección ocular del sitio de acopio de los materiales, se conversó con la comunidad para tenerlos en cuenta en los diferentes tipos de trabajo en los cuales ellos pueden ser contratados tales como el transporte del material de construcción, transporte de la madera, así como también trabajadores para el inicio de obra.

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 7 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

- Socialización al inicio del contrato en el municipio de La Merced para dar inicio a la ejecución del contrato.

En la Socialización se Expusieron los diseños, con las características Técnicas de la Obra, se recibieron y respondieron las dudas de la comunidad sobre el proyecto.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto básicamente consiste en la “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN EL MARCO DEL POMCA DEL RIO AURRA - NSS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MERCED”

3.1.1 Localización del Proyecto

Zona Rural del Municipio de La Merced Caldas.



CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 8 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

3.1.2 ALCANCE DEL OBJETO.

Con la presente contratación se tiene como actividades necesarias, además de las consignadas en el cuadro de PRESUPUESTO OFICIAL y en las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES del contrato a ejecutar entre otras las siguientes:

Garantizar el óptimo servicio y excelentes condiciones de las estufas ecoeficientes para la comunidad del sector Rural del municipio, sin consecuentes fenómenos que pongan en riesgo los bienes y la integridad física de las personas y su entorno.

3 INFORME ADMINISTRATIVO

3.1 Información general del contrato

A continuación, se relaciona la información de los datos contractuales de Obra e Interventoría suscritos para la ejecución del proyecto:

Tabla 1 Datos generales contrato de obra

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	SGR-SC-096-2026
OBJETO:	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LAMERCED”
LOCALIZACIÓN:	Zona rural del Municipio de La Merced Caldas
CONTRATISTA:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
FECHA DE INICIO:	MAYO 26 DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 9 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	JULIO 26 DE 2026
PRÓRROGA:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$ 249.367.852,26) M/CTE,
VALOR ACTA PARCIAL #01:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$165.953.555,68) M.L.
CONTROL DE PÓLIZAS	
ASEGURADORA:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES No.	EC - 100014620
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y PAGO ANTICIPADO No.	EC - 100043893

Avance de la ejecución:

En relación al control sobre la ejecución del contrato de obra, y de acuerdo al corte del presente periodo la obra presenta un avance del **90,12%** en relación al 62,13% programado, lo que significa que la obra se encuentra parcialmente ejecutada cumpliendo a cabalidad con el cronograma.

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-096-2026	ACTA PARCIAL No. 01	
CONTRATISTA: FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S. NIT. # 901.919.030-5	OBJETO: “IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED ”	
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR FABIO CARDONA DAVILA C.C. # 10.013.928 de Pereira		
INTERVENTOR: GERMAN GARCIA RODRIGUEZ C.C. 7.541.570		
SUPERVISOR: SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL C.C. # 1.010.149.673 de Manizales	VALOR CONTRATO INICIAL \$ 249.367.852,26	Acta de Inicio 26/05/2026
CONTRATANTE: IMPULSA MAS SAS NIT: 901.700.548-6 R. Legal: JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ	VALOR PAGO ANTICIPADO 50% \$ 124.683.926,13	Plazo Inicial Dos (02) meses
	VALOR ADICIONAL N/A	Suspensión N/A
	VALOR PRESENTE ACTA #01 \$ 224.727.612,50	Prorroga N/A
	AMORTIZACION ANTICIPO \$ 124.683.926,13	Fecha de Terminación 26/07/2026
	VALOR A PAGAR ACTA #01 \$ 100.043.686,37	Fecha Acta #01 30/06/2026

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 10 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	AVANCE DE OBRA	VALOR PARCIAL
1.0	PELIMINARES				\$522.748,80		\$485.409,60
1.1	Localización y replanteo	M2	67,20	\$ 7.779,00	\$522.748,80	62 ,40	\$485.409,60
2.0	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m				\$137.565.887,51		\$127.739.752,04
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	84,56	\$264.149,25	\$22.336.460,71	78 ,52	\$20.740.999,11
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38	M2	44,80	\$162.668,09	\$7.287.530,58	41 ,60	\$6.766.992,54
2.3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	88,48	\$72.137,92	\$6.382.763,46	82 ,16	\$5.926.851,51
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	28,00	\$84.306,58	\$2.360.584,18	26 ,00	\$2.191.971,08
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	UND	56,00	\$1.771.402,65	\$99.198.548,59	52 ,00	\$92.112.937,80
3.0	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO				\$9.751.905,76		\$9.055.340,84
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	UND	56,00	\$ 174.141,17	\$9.751.905,76	52,00	\$9.055.340,84
4.0	TRANSPORTE				\$29.456.731,61		\$27.352.677,56
4.1	Transporte agregados y otros a cabecera municipal	UND	56,00	\$37.810,00	\$2.117.360,00	52 ,00	\$1.966.120,00
4.2	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso	UND	56,00	\$335.878,20	\$18.809.179,20	52 ,00	\$17.465.666,40
4.3	Sobre acarreo a hombro Vía veredal a sitio de obras	Carga-23Kg	392,00	\$21.760,69	\$8.530.192,41	364,00	\$7.920.891,16
5.0	IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO				\$7.446.506,67		\$6.914.615,76
5.1	Material Vegetal - Plantulas	UND	1.120,00	\$4.796,67	\$5.372.266,67	1.040,00	\$4.988.536,80
5.2	Elementos Mayores	KG	336,00	\$3.096,00	\$1.040.256,00	312,00	\$965.952,00
5.3	Elementos Menores	KG	336,00	\$3.077,33	\$1.033.984,00	312,00	\$960.126,96
	COSTO DIRECTO				\$184.743.780,35	184.743.780,35	\$171.547.795,80
	Administración	25%			46.185.945,09		\$42.886.948,95
	Imprevistos	1%			1.847.437,80		\$1.715.477,96
	Utilidad	5%			9.237.189,02		\$8.577.389,79
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA	31%			57.270.571,91		\$53.179.816,70
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				\$ 242.014.352,26	VR. ACTA # 01	\$ 224.727.612,50
	COSTOS DE IMPLEMENTACION PGIO				7.353.500,00		
	TOTAL COSTOS DE OBRA				\$ 249.367.852,26		
	ANTICIPO 50%				\$ 124.683.926,13		
	VALOR ACTA #01						\$ 224.727.612,50
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO						\$ 124.683.926,13
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						\$ 100.043.686,37
	PORCENTAJE %						90,12%

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 11 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIA #01

1.0 PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo

2.0 CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m

2.1 Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm

2.2 Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38

2.3 Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm

2.4 Suministro e Instalación de STC Vitrificado

2.5 Suministro e Instalación KIT de Herrajes

3.0 TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

3.1 Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).

4.0 TRANSPORTE

4.1 Transporte agregados y otros a cabecera municipal

4.2 Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso.

4.2 Sobre acarreo a hombro Vía veredal a sitio de obras

5.0 TRANSPORTE

5.1 Material Vegetal – Plántulas

5.2 Elementos Mayores

5.2 Elementos Menores

4.3.1 Control de personal

por parte del contratista y revisada por la Interventoría se adelantó verificación del personal del Contratista, así como la presentación de la documentación correspondiente a pagos de seguridades sociales y parafiscales. (Ver en los Anexos).

NOMBRE	CEDULA
HECTOR FABIO CARDONA DAVILA	10.013.928
HERNAN ALVARAN TOVAR	10.170.883
MIGUEL ANGEL LOPEZ MARULANDA	1.034.293.521

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 12 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

4.4 Registro Fotográfico.

Tipo de Contrato: Contrato de Obra Número: SGR-SC-096-2026 Contratista: FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.			
 			
Descripcion:	Localización y replanteo		
Item	1.1	Fecha Acta:	30-jun.-26
 			
Descripcion:	Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm		
Item	2.1	Fecha Acta:	

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 13 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	



Descripción:	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38		
Item	2.2	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripción:	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm		
Item	2.3	Fecha Acta:	30-jun.-26

CONTRATO SGR-SC-096-2026	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED".	Hoja: 14 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	



Descripción:	Suministro e Instalación de STC Vitrificado		
Item	2.4	Fecha Acta:	30-jun.-26




Descripción:	Suministro e Instalación KIT de Herrajes		
Item	2.5	Fecha Acta:	30-jun.-26

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 15 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	



Descripcion:	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).		
Item	3.1	Fecha Acta:	30-jun.-26

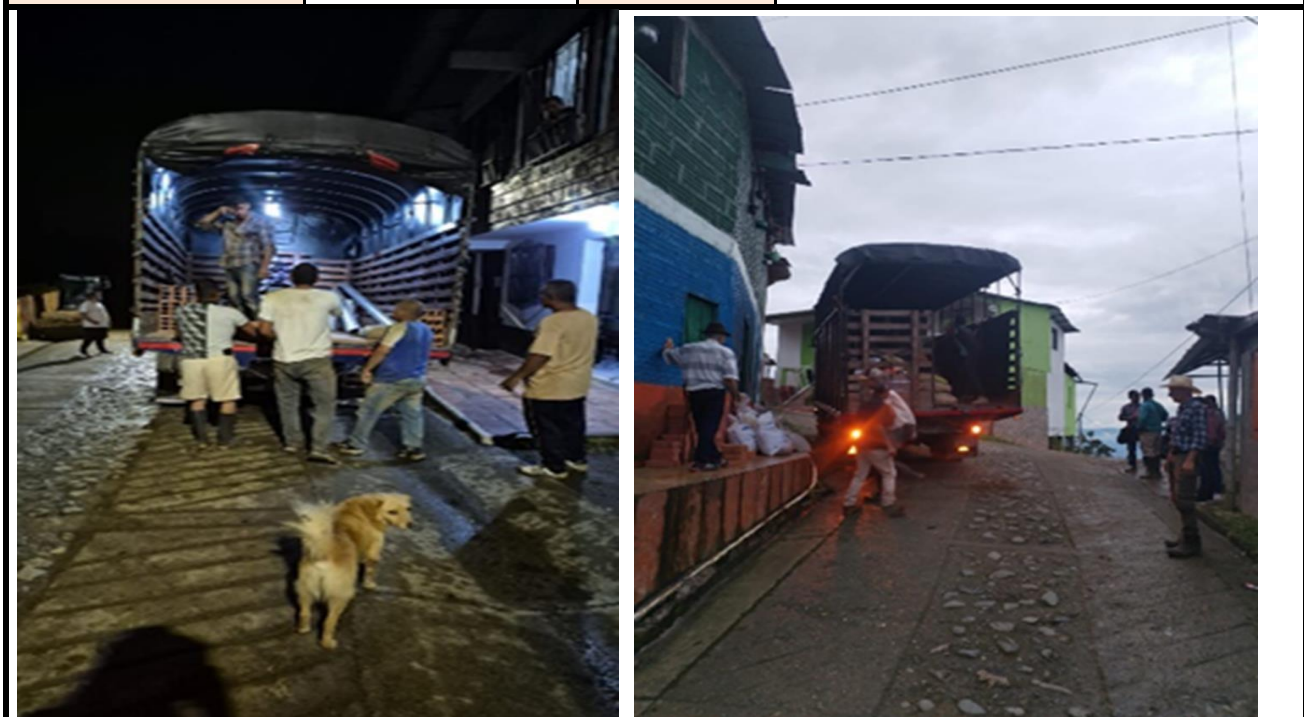


Descripcion:	Transporte agregados y otros a cabecera municipal		
Item	4.1	Fecha:	30-jun.-26

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 16 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	



Descripcion:	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difcil acceso		
Item	4.2	Fecha:	30-jun.-26

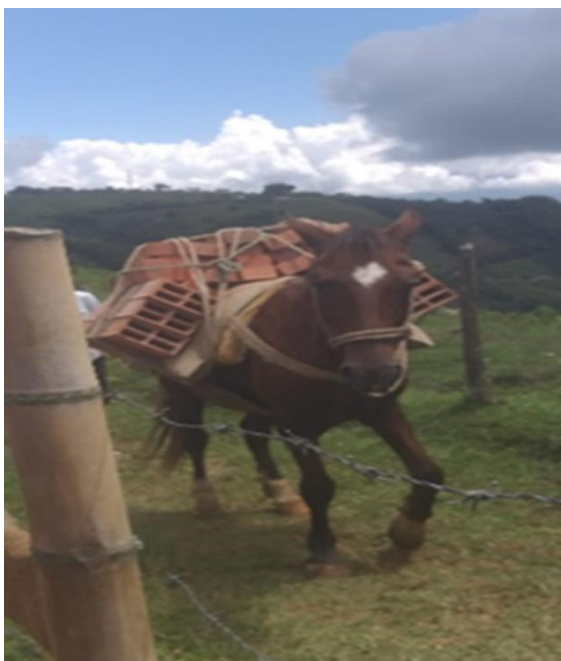

Descripcion:	Sobre acarreo a hombro Via veredal a sitio de obras		
Item	4.3	Fecha:	30-jun.-26

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 17 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	



Descripcion:	Material Vegetal - Plantulas		
Item	5.1	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Elementos Mayores		
Item	5.2	Fecha:	30-jun.-26

CONTRATO SGR-SC-096-2026	“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.	Hoja: 18 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

 			
Descripción:	Elementos Menores		
Item	5.3	Fecha:	30-jun.-26

5 INFORME FINANCIERO

5.1 BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 249.367.852,26	
VALOR ACTA N°1		\$ 224.727.612,50
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 24.640.2239,76
SUMAS IGUALES:	\$ 249.367.852,26	\$ 249.367.852,26

CONTRATO SGR-SC-096-2026	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED".	Hoja: 19 de 19
	INFORME ACTAPARCIAL # 001 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Junio 30 de 2026	

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO:	\$ 124.683.926,13	
AMORTIZACION ACTA Nº1		\$ 124.683.926,13
SALDO DEL ANTICIPO:		\$ 0,00
SUMAS IGUALES:	\$ 124.683.926,13	\$ 124.683.926,13

6 CONCLUSIONES

A la fecha de corte del presente informe al Acta Parcial # 01 ha transcurrido 5 semanas correspondientes al 62,5 % del plazo inicial.

- En la presente Acta Parcial #01 se ha desarrollado el 90,12 % de las actividades contractuales.
- La obra se encuentra en perfecto estado y cumpliendo con las funciones requeridas por objeto del contrato de obra.
- Se logra la meta física propuesta tanto por el contratante como por el contratista.
- Los materiales cumplen con la normatividad para este tipo de obras y con materiales de buena calidad.



FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
Contratista

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-096-2026		ACTA PARCIAL No. 01					
CONTRATISTA: FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S. NIT. # 901.919.030-5		OBJETO: “IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED ”					
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR FABIO CARDONA DAVILA C.C. # 10.013.928 de Pereira							
INTERVENTOR: GERMAN GARCIA RODRIGUEZ C.C. 7.541.570							
SUPERVISOR: SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL C.C. # 1.010.149.673 de Manizales		VALOR CONTRATO INICIAL	\$	249.367.852,26	Acta de Inicio	26/05/2026	
		VALOR PAGO ANTICIPADO 50%	\$	124.683.926,13	Plazo Inicial	Dos (02) meses	
CONTRATANTE: IMPULSA MAS SAS NIT: 901.700.548-6 R. Legal: JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ		VALOR ADICIONAL		N/A	Suspensión	N/A	
		VALOR PRESENTE ACTA #01	\$	224.727.612,50	Prorroga	N/A	
		AMORTIZACION ANTICIPO	\$	124.683.926,13	Fecha de Terminación	26/07/2026	
		VALOR A PAGAR ACTA #01	\$	100.043.686,37	Fecha Acta #01	30/06/2026	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	AVANCE DE OBRA	VALOR PARCIAL
1.0	PELIMINARES				\$522.748,80		\$485.409,60
1.1	Localización y replanteo	M2	67,20	\$7.779,00	\$522.748,80	62,40	\$485.409,60
2.0	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m				\$137.565.887,51		\$127.739.752,04
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	84,56	\$264.149,25	\$22.336.460,71	78,52	\$20.740.999,11
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38	M2	44,80	\$162.668,09	\$7.287.530,58	41,60	\$6.766.992,54
2.3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	88,48	\$72.137,92	\$6.382.763,46	82,16	\$5.926.851,51
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	28,00	\$84.306,58	\$2.360.584,18	26,00	\$2.191.971,08
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	UND	56,00	\$1.771.402,65	\$99.198.548,59	52,00	\$92.112.937,80
3.0	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO				\$9.751.905,76		\$9.055.340,84
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	UND	56,00	\$ 174.141,17	\$9.751.905,76	52,00	\$9.055.340,84
4.0	TRANSPORTE				\$29.456.731,61		\$27.352.677,56
4.1	Transporte agregados y otros a cabecera municipal	UND	56,00	\$37.810,00	\$2.117.360,00	52,00	\$1.966.120,00
4.2	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso	UND	56,00	\$335.878,20	\$18.809.179,20	52,00	\$17.465.666,40
4.3	Sobre acarreo a hombro Vía veredal a sitio de obras	Carga- 23Kg	392,00	\$21.760,69	\$8.530.192,41	364,00	\$7.920.891,16
5.0	IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO				\$7.446.506,67		\$6.914.615,76
5.1	Material Vegetal - Plantulas	UND	1.120,00	\$4.796,67	\$5.372.266,67	1.040,00	\$4.988.536,80
5.2	Elementos Mayores	KG	336,00	\$3.096,00	\$1.040.256,00	312,00	\$965.952,00
5.3	Elementos Menores	KG	336,00	\$3.077,33	\$1.033.984,00	312,00	\$960.126,96
	COSTO DIRECTO				\$184.743.780,35		\$171.547.795,80
	Administración	25%			46.185.945,09		\$42.886.948,95
	Imprevistos	1%			1.847.437,80		\$1.715.477,96
	Utilidad	5%			9.237.189,02		\$8.577.389,79
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA	31%			57.270.571,91		\$53.179.816,70
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				\$ 242.014.352,26	VR. ACTA # 01	\$ 224.727.612,50
	COSTOS DE IMPLEMENTACION PGIO				7.353.500,00		
	TOTAL COSTOS DE OBRA				\$ 249.367.852,26		
	ANTICIPO 50%				\$ 124.683.926,13		
	VALOR ACTA #01						\$ 224.727.612,50
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO						\$ 124.683.926,13
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						\$ 100.043.686,37
	PORCENTAJE %						90,12%

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL
SUPERVISOR



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
096-2026

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA

3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N°

1

ELABORÓ

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA

1

DE

13

OBJETO DEL CONTRATO

"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO	1. PELIMINARES	ITEM	1.1	DESCRIPCION	Localización y replanteo	UNID.	M2	UBICACIÓN	ZONA RURAL LA MERCED		
 5 jun 2026 1:31:53 p. m. 5°22'10.398"N 75°33'12.792"W La Merced Maria Daneila Leiva cc25108067 v San José  6 jun 2026 3:21:55 p. m. 5°25'38.247"N 75°41'26.901"W María Lilia Murillo cc 25095116 v San José						Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
							Ancho	Alto	Longitud		
						zona rural La Merced	1,00		1,20	52	62,40

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

German Garcia Rodriguez



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
096-2026

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA 3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N°

1

ELABORÓ

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA

2

DE

13

OBJETO DEL CONTRATO

“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO

2. CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO
(0,73m x 1,05m) h: 0,83m

ITEM

2.1

DESCRIPCION

Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano
de 6x12x24 cm

UNID.

M2

UBICACIÓN

ZONA RURAL LA MERCED



Localización

M2

Dimensiones

Ancho

Alto

Longitud

No Elem.

Medida Total

zona rural La Merced

1,51

52

78,52

Observaciones:

TOTAL PRESENTE PAGINA

78,52

ACUMULADO PAGINA ANTERIOR

TOTAL

78,52

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

German Garcia Rodriguez



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
096-2026

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA 3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N°

1

ELABORÓ

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA

3

DE

13

OBJETO DEL CONTRATO

**"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA
HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"**

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO

**2. CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO
(0,73m x 1,05m) h: 0,83m**

ITEM

2.2

DESCRIPCION

Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38

UNID.

M2

UBICACIÓN

ZONA RURAL LA MERCED



Localización

M2

Dimensiones

Ancho

Alto

Longitud

No Elem.

Medida Total

zona rural La Merced

0,80

52

41,60

Observaciones:

TOTAL PRESENTE PAGINA

41,60

ACUMULADO PAGINA ANTERIOR

TOTAL

41,60

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

German Garcia Rodriguez



Contratista



Contratista



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
096-2026

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA

3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N°

1

ELABORÓ

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA

6

DE

13

OBJETO DEL CONTRATO

“IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO

2. CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO
(0,73m x 1,05m) h: 0,83m

ITEM

2.5

DESCRIPCION

Suministro e Instalación KIT de Herrajes

UNID.

UND

UBICACIÓN

ZONA RURAL LA MERCED



5 jun 2026 10:42:26 a. m.
5°22'19.198" N 75°32'38.278" W
La Merced
flor emilia Giraldo
cc25109370
v. llanadas



8 jun 2026 3:52:35 p. m.
amparo de Jesús Escobar
cc25094205
v la quiebra
estufa #11

Localización

Dimensiones

Ancho

Alto

Longitud

No Elem.

Medida Total

zona rural La Merced

52

52,00

Observaciones:

TOTAL PRESENTE PAGINA

52,00

ACUMULADO PAGINA ANTERIOR

TOTAL

52,00

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

German Garcia Rodriguez



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
096-2026

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA 3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N° 1

ELABORÓ HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA 8 DE 13

OBJETO DEL CONTRATO

"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO

4. TRANSPORTE

ITEM

4.1

DESCRIPCION

Transporte agregados y otros a cabecera municipal

UNID.

UND

UBICACIÓN

ZONA RURAL LA MERCED



Localización

TRANPORTE (HR)

No Elem.

Medida Total

zona rural La Merced

1,00

52

52,00

Observaciones:

TOTAL PRESENTE PAGINA

52,00

ACUMULADO PAGINA ANTERIOR

TOTAL

52,00

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

German Garcia Rodriguez



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
096-2026

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA

3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N°

1

ELABORÓ

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA

9

DE

13

OBJETO DEL CONTRATO

"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO

4. TRANSPORTE

ITEM

4.2

DESCRIPCION

Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso

UNID.

UND

UBICACIÓN

ZONA RURAL LA MERCED



Localización

TRANPORTE (HR)

No Elem.

Medida Total

zona rural La Merced

1,00

52

52,00

Observaciones:

TOTAL PRESENTE PAGINA

52,00

ACUMULADO PAGINA ANTERIOR

TOTAL

52,00

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

German Garcia Rodriguez



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
096-2026

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA

3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N°

1

ELABORÓ

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA

10

DE

13

OBJETO DEL CONTRATO

**"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA
HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"**

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

ZONA RURAL EBEJICO

CAPÍTULO

4. TRANSPORTE

ITEM

4.3

DESCRIPCION

Sobre acarreo a hombro Via veredal a sitio
de obras

UNID.

Carga-
23Kg

UBICACIÓN

ZONA RURAL LA MERCED

Localización

Carga- 23Kg

No Elem.

Medida Total

zona rural La Merced

7,00

52

364,00

Observaciones:

TOTAL PRESENTE PAGINA

364,00

ACUMULADO PAGINA ANTERIOR

TOTAL

364,00

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

[Firma]



Contratista



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
026-2025

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA

3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N°

1

ELABORÓ

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA

12

DE

13

OBJETO DEL CONTRATO

"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO

5. TRANSPORTE.

ITEM

5.2

DESCRIPCION

Elementos Mayores

UNID.

KG

UBICACIÓN

ZONA RURAL LA MERCED



Localización

Elementos mayores

No Elem.

Medida Total

zona rural La Merced

6,00

52

312,00

Observaciones:

TOTAL PRESENTE PAGINA

312,00

ACUMULADO PAGINA ANTERIOR

TOTAL

312,00

Contratista

Hector J. Cardona

Interventoria:

German Garcia Rodriguez



IMPULSA+
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-
026-2025

FORMATO DE PREACTA

FORMATO: FT-TE-04

VERSION: 0

FECHA:

Página 1 de 1

FECHA 3 0 0 6 2 0 2 6

PREACTA N° 1

ELABORÓ HECTOR FABIO CARDONA DAVILA

PAGINA 13 DE 13

OBJETO DEL CONTRATO

"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"

CONTRATISTA

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

INTERVENTOR

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

CAPÍTULO	5. TRANSPORTE.	ITEM	5.3	DESCRIPCION	Elementos Menores	UNID.	KG	UBICACIÓN	ZONA RURAL LA MERCED
					Localización	Elementos menores		No Elem.	Medida Total
					zona rural La Merced		6,00	52	312,00
Observaciones:					TOTAL PRESENTE PAGINA				312,00
					ACUMULADO PAGINA ANTERIOR				
					TOTAL				312,00
Contratista					Interventoria:				


INFORME 1 ESTUFAS LA MERCED

OBRA		No. 5		PERIODO	
		26 de mayo de 2026		a	
				30 de junio de 2026	

INTERVENTOR:	GERMAN GARCIA RODRIGUEZ	CONTRATO:	N/A
SUPERVISOR:	Ing. SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL		
CONTRATISTA:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.	CONTRATO:	SGR-SC-096-2026
OBJETO:	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"		


CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio:	19 de mayo de 2026	Plazo:	2 MESES	Fecha de Terminación inicial:	20 de julio de 2026
Fecha de suspensión No 1:	N/A	Plazo:	N/A	Fecha de reiniciación No 1:	N/A
Fecha de suspensión No 2:	N/A	Plazo:	N/A	Fecha de reiniciación No 2:	N/A
Prorrogas en plazo No. 1:	N/A	(XX Días)		Prorrogas en plazo No. 1:	N/A (XX Días)
Prorrogas en plazo No. 2:	N/A	(XX Días)		Prorrogas en plazo No. 2:	N/A (XX Días)
Fecha de vencimiento final:	20 de julio de 2026				

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Valor inicial:	\$	249.367.852	Valor Anticipo	\$	124.683.926,13
Adicion en valor No. 1:	\$	-	Valor acta No.1	\$	223.012.134,54
Adicion en valor No. 2:	\$	-	Valor acta No.2		
			Valor acta No.3		
			Valor acta No.4		
			Valor acta No.5		
Valor Final:	\$	249.367.852			



10%
90%

ACTA 1 \$ 224.727.612 (90,1%)
Saldo \$24.640.239,76 (9,9%)



Vr. Contrato
Saldo
Vr. Pagado

\$- \$500.000.000

Vr. Contrato \$ 249.367.852
Saldo \$ 24.640.240
Vr. Pagado \$ 224.727.612

PROGRAMADO	Valor
SEMANA No. 5	154.935.720,53
Acumulado	224.727.614,07

EJECUTADO	Valor
SEMANA No. 5	224.727.612,50
Acumulado	224.727.612,50

	%Programado	%Ejecutado
Acumulado Anterior	0,0%	0,0%
Durante el Periodo	62,1%	90,1%
Acumulado Actual	90,1%	90,1%

Plazo transcurrido: 1,40 Meses

% retraso: 0,0%

Retraso (días): 0,00 días

REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PROXIMO MES
Durante el presente mes, se completaron en su totalidad las actividades relacionadas con la totalidad de la entrega de materiales a todos los usuarios, y se repartieron las cuadrillas para la construcción de las estufas, conforme al cronograma establecido.	Para el próximo mes, se tiene programada la terminación de las estufas pendientes por ser las mas retiradas y se necesito contratar mulas para la distribución de los materiales.

PÓLIZAS					
INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA					
Compañía de Seguros:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
NIT:	860.037.013-6				
Tomador:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.				
Identificación:	NIT: 901.919.030-5				
Dirección:	CALLE 34 #7 B-19 LOC. 2				
Ciudad:	PEREIRA RISARALDA				
Teléfono:	311-7774948				
Asegurado/Beneficiario:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS SAS				
NIT:	901.700.548-6				
Dirección:	CR 6A NRO. 12 - 0 ED MUNICIPAL ALCALDIA. QUIMBAYA, QUINDIO				

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
No. Poliza	EC - 100043893	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Cumplimiento Del Contrato	\$ 24.936.785,20	14-mayo-26	15-noviembre-26	26/05/2026	27/11/2026
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 124.683.926,00	14-mayo-26	15-julio-26	26/05/2026	27/07/2026
Pago Salarios y prestaciones sociales	\$ 12.468.396,60	14-mayo-26	15-julio-29	26/05/2026	27/07/2029
Estabilidad de la Obra	\$ 24.936.785,20	15-julio-26	15-julio-31	27/07/2026	27/07/2031

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
No. Poliza	EC - 100014620	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Predios Labores y operaciones	\$ 350.181.000	14-mayo-26	15-agosto-26	26/05/2026	27/08/2026

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
REP LEGAL. CORPORACION CREAR UNIDOS

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL
SUPERVISOR

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												SEMANA No. 5					
CONTRATO No. SGR-SC-096-2026		CONTRATISTA: CORPORACION CREAR UNIDOS		OBJETO:		PERIODO:		26 de mayo de 2026		Hasta		30 de junio de 2026					
"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"																	
						EJECUTADO/ACUMULADO						PROGRAMADO					
NOTA: INCLUIR EL AVANCE DE CADA ITEM, Y EL % DE AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO EJECUTADO DE CADA CAPITULO Y CADA ITEM		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		% AVANCE EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	ACUMULADA		% POR ITEM Y CAPITULO DEL EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO MENSUAL		ACUMULADO			
CAP/ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant.	Valor Total.	%	Cant	Valor Total	%2	Cant	Valor. Total	Cant..	Valor Total..		
1.0	PELIMINARES				\$ 522.748,80		\$ 485.409,60			\$ 485.409,60	93%						
1.1	Localización y replanteo	M2	67,20	\$ 7.779,00	\$ 522.748,80	62,40	\$ 485.409,60	93%	62,40	\$ 485.409,60	93%	42,00	\$ 326.718,00	62,40	\$ 485.410,00		
2.0	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m				\$ 137.565.887,51		\$ 127.739.752,04			\$ 127.739.752,04	93%						
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	84,56	\$264.149,25	\$22.336.460,71	78,52	\$20.740.999,11	93%	78,52	\$ 20.740.999,11	93%	52,85	\$ 13.960.288,00	78,52	\$ 20.740.999,00		
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38	M2	44,80	\$162.668,09	\$7.287.530,58	41,60	\$6.766.992,54	93%	41,60	\$ 6.766.992,54	93%	28,00	\$ 4.554.707,00	41,60	\$ 6.766.993,00		
2.3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	88,48	\$72.137,92	\$6.382.763,46	82,16	\$5.926.851,51	93%	82,16	\$ 5.926.851,51	93%	55,30	\$ 3.989.227,00	82,16	\$ 5.926.852,00		
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	28,00	\$84.306,58	\$2.360.584,18	26,00	\$2.191.971,08	93%	26,00	\$ 2.191.971,08	93%	17,50	\$ 1.475.365,00	26,00	\$ 2.191.971,00		
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	UND	56,00	\$1.771.402,65	\$99.198.548,59	52,00	\$92.112.937,80	93%	52,00	\$ 92.112.937,80	93%	35,00	\$ 61.999.093,00	52,00	\$ 92.112.938,00		
3.0	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				\$ 9.751.905,76		\$ 9.055.340,84			\$ 9.055.340,84	93%						
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	UND	56,00	\$ 174.141,17	\$ 9.751.905,76	52,00	\$ 9.055.340,84	93%	52,00	\$ 9.055.340,84	93%	35,00	\$ 6.094.941,00	52,00	\$ 9.055.341,00		
4.0	TRANSPORTE				\$ 29.456.731,61		\$ 27.352.677,56			\$ 27.352.677,56	93%			-			
4.1	Transporte agregados y otros a cabecera municipal	UND	56,00	\$37.810,00	\$2.117.360,00	52,00	\$1.966.120,00	93%	52,00	\$ 1.966.120,00	93%	35,00	\$ 1.323.350,00	52,00	\$ 1.966.120,00		
4.2	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso	UND	56,00	\$335.878,20	\$18.809.179,20	52,00	\$17.465.666,40	93%	52,00	\$ 17.465.666,40	93%	35,00	\$ 11.755.737,00	52,00	\$ 17.465.666,00		
4.3	Sobre acarreo a hombro Vía veredal a sitio de obras	Carga-23Kg	392,00	\$21.760,69	\$8.530.192,41	364,00	\$7.920.891,16	93%	364,00	\$ 7.920.891,16	93%	245,00	\$ 5.331.369,00	364,00	\$ 7.920.891,00		
5.0	IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO				\$ 7.446.506,67		\$ 6.914.615,76			\$ 6.914.615,76	93%						
5.1	Material Vegetal - Plantulas	UND	1.120,00	\$4.796,67	\$5.372.266,67	1.040,00	\$4.988.536,80	93%	1.040,00	\$ 4.988.536,80	93%	700,00	\$ 3.357.669,00	1.040,00	\$ 4.988.537,00		
5.2	Elementos Mayores	KG	336,00	\$3.096,00	\$1.040.256,00	312,00	\$965.952,00	93%	312,00	\$ 965.952,00	93%	210,00	\$ 650.160,00	312,00	\$ 965.952,00		
5.3	Elementos Menores	KG	336,00	\$3.077,33	\$1.033.984,00	312,00	\$960.126,96	93%	312,00	\$ 960.126,96	93%	210,00	\$ 646.239,00	312,00	\$ 960.127,00		
COSTO DIRECTO					TOTAL	\$	184.743.780,35		\$	171.547.795,80	TOTAL	\$	171.547.795,80		\$	115.464.863,00	
ADMINISTRACIÓN 25%					25,00%	\$	46.185.945,09		\$	42.886.948,95		\$	42.886.948,95		\$	28.866.215,75	
IMPREVISTOS 1%					0,00%	\$	1.847.437,80		\$	1.715.477,96		\$	1.715.477,96		\$	1.154.648,63	
UTILIDADES 5%					5,00%	\$	9.237.189,02		\$	8.577.389,79		\$	8.577.389,79		\$	5.773.243,15	
PGIO						\$	7.353.500,00		\$	-		\$	-		\$	3.676.750,00	
TOTAL =						\$	249.367.852		\$	224.727.612,50		\$	224.727.612,50		\$	154.935.720,53	
PORCENTAJES						90,12%			90,12%			62,13%		90,12%			

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

Decimales Subtotal: 0
Decimales AUJ: 0

PROGRAMADO								
TOTAL	Sem No. 1	Sem No. 2	Sem No. 3	Sem No. 4	Sem No. 5	Sem No. 6	Sem No. 7	Sem No. 8
CAP. 1								
67,20	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
CAP. 2								
84,56	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
44,80	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
88,48	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
28,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
CAP. 3								
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
CAP. 4								
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
392,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
CAP. 5								
1.120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
336,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
336,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

EJECUTADO					
TOTAL	Sem No. 1	Sem No. 2	Sem No. 3	Sem No. 4	Sem No. 5
CAP. 1					
62,40	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
CAP. 2					
78,52	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
41,60	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
82,16	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
26,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
CAP. 3					
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
CAP. 4					
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
364,00	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80
CAP. 5					
1.040,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
312,00	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40
312,00	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40


FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA


GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

INFORME FOTOGRAFICO MENSUAL I **No. 1**

Tipo de Contrato: Contrato de Obra
 Número: SGR-SC-096-2026
 Contratista: FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.



Descripción:	Localización y replanteo		
Item	1.1	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripción:	Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm		
Item	2.1	Fecha Acta:	



Descripcion:	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38		
Item	2.2	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm		
Item	2.3	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Suministro e Instalación de STC Vitricado		
Item	2.4	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Suministro e Instalación KIT de Herrajes		
Item	2.5	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripción:

Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).

Item

3.1

Fecha Acta:

30-jun.-26



Descripción:

Transporte agregados y otros a cabecera municipal

Item

4.1

Fecha:

30-jun.-26



Descripcion:	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso		
Item	4.2	Fecha:	30-jun.-26



Descripcion:	Sobre acarreo a hombro Via veredal a sitio de obras		
Item	4.3	Fecha:	30-jun.-26



12 jun 2026 1:55:20 p. m.
5°24'39.462"N 75°33'47.688"W
La Merced
Osvaldo Quintero
cc 75 060 028
v el tambor
estufa #21



12 jun 2026 4:07:33 p. m.
5°24'10.548"N 75°33'41.448"W
La Merced
Julia rosa Zapata
cc 25 109.580
v el tambor
estufa #22

Descripcion:	Material Vegetal - Plantulas		
Item	5.1	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Elementos Mayores		
Item	5.2	Fecha:	30-jun.-26



Descripción:	Elementos Menores		
Item	5.3	Fecha:	30-jun.-26

Hector J. Pineda

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA


INFORME 1 ESTUFAS LA MERCED

OBRA	No. 5	PERIODO
		26 de mayo de 2026 a 30 de junio de 2026

INTERVENTOR:	GERMAN GARCIA RODRIGUEZ	CONTRATO:	N/A
SUPERVISOR:	Ing. SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL		
CONTRATISTA:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.	CONTRATO:	SGR-SC-096-2026
OBJETO:	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"		


CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio:	19 de mayo de 2026	Plazo:	2 MESES	Fecha de Terminación inicial:	20 de julio de 2026
Fecha de suspensión No 1:	N/A	Plazo:	N/A	Fecha de reiniciación No 1:	N/A
Fecha de suspensión No 2:	N/A	Plazo:	N/A	Fecha de reiniciación No 2:	N/A
Prorrogas en plazo No. 1:	N/A	(XX Días)		Prorrogas en plazo No. 1:	N/A (XX Días)
Prorrogas en plazo No. 2:	N/A	(XX Días)		Prorrogas en plazo No. 2:	N/A (XX Días)
Fecha de vencimiento final:	20 de julio de 2026				

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Valor inicial:	\$ 249.367.852	Valor Anticipo	\$ 124.683.926,13		
Adicion en valor No. 1:	\$ -	Valor acta No.1	\$ 223.012.134,54		
Adicion en valor No. 2:	\$ -	Valor acta No.2			
		Valor acta No.3			
		Valor acta No.4			
		Valor acta No.5			
Valor Final:	\$ 249.367.852				



10%
90%

ACTA 1 \$ 224.727.612 (90,1%)
Saldo \$24.640.239,76 (9,9%)




Vr. Contrato
Saldo
Vr. Pagado
\$- \$500.000.000

Vr. Contrato \$ 249.367.852
Saldo \$ 24.640.240
Vr. Pagado \$ 224.727.612

AVANCE DE LA OBRA					
PROGRAMADO	Valor	%Programado	%Ejecutado		
SEMANA No. 5	154.935.720,53	0,0%	0,0%		
Acumulado	224.727.614,07	62,1%	90,1%		
		90,1%	90,1%		
EJECUTADO	Valor				
SEMANA No. 5	224.727.612,50				
Acumulado	224.727.612,50				

Plazo transcurrido: 1,40 Meses
% retraso: 0,0%
Retraso (días): 0,00 días



Acumulado Anterior
Durante el Periodo
Acumulado Actual
0% 20% 40% 60% 80% 100%
%Programado %Ejecutado

REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PROXIMO MES
Durante el presente mes, se completaron en su totalidad las actividades relacionadas con la totalidad de la entrega de materiales a todos los usuarios, y se repartieron las cuadrillas para la construcción de las estufas, conforme al cronograma establecido.	Para el próximo mes, se tiene programada la terminación de las estufas pendientes por ser las mas retiradas y se necesito contratar mulas para la distribución de los materiales.

PÓLIZAS					
INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA					
Compañía de Seguros:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
NIT:	860.037.013-6				
Tomador:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.				
Identificación:	NIT: 901.919.030-5				
Dirección:	CALLE 34 #7 B-19 LOC. 2				
Ciudad:	PEREIRA RISARALDA				
Teléfono:	311-7774948				
Asegurado/Beneficiario:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS SAS				
NIT:	901.700.548-6				
Dirección:	CR 6A NRO. 12 - 0 ED MUNICIPAL ALCALDIA. QUIMBAYA, QUINDIO				

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
No. Poliza	EC - 100043893	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Cumplimiento Del Contrato	\$ 24.936.785,20	14-mayo-26	15-noviembre-26	26/05/2026	27/11/2026
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 124.683.926,00	14-mayo-26	15-julio-26	26/05/2026	27/07/2026
Pago Salarios y prestaciones sociales	\$ 12.468.396,60	14-mayo-26	15-julio-29	26/05/2026	27/07/2029
Estabilidad de la Obra	\$ 24.936.785,20	15-julio-26	15-julio-31	27/07/2026	27/07/2031

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
No. Poliza	EC - 100014620	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Predios Labores y operaciones	\$ 350.181.000	14-mayo-26	15-agosto-26	26/05/2026	27/08/2026

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
REP LEGAL. CORPORACION CREAR UNIDOS

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL
SUPERVISOR

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											SEMANA No. 5					
CONTRATO No. SGR-SC-096-2026		CONTRATISTA: CORPORACION CREAR UNIDOS		PERIODO: 26 de mayo de 2026		Hasta		30 de junio de 2026								
"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"																
						EJECUTADO/ACUMULADO						PROGRAMADO				
NOTA: INCLUIR EL AVANCE DE CADA ITEM, Y EL % DE AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO EJECUTADO DE CADA CAPITULO Y CADA ITEM		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		% AVANCE EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	ACUMULADA		% POR ITEM Y CAPITULO DEL EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO MENSUAL		ACUMULADO		
CAP/ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant.	Valor Total.	%	Cant	Valor Total	%2	Cant	Valor. Total	Cant..	Valor Total..	
1.0	PELIMINARES				\$ 522.748,80		\$ 485.409,60			\$ 485.409,60	93%					
1.1	Localización y replanteo	M2	67,20	\$ 7.779,00	\$ 522.748,80	62,40	\$ 485.409,60	93%	62,40	\$ 485.409,60	93%	42,00	\$ 326.718,00	62,40	\$ 485.410,00	
2.0	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m				\$ 137.565.887,51		\$ 127.739.752,04			\$ 127.739.752,04	93%					
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	84,56	\$264.149,25	\$22.336.460,71	78,52	\$20.740.999,11	93%	78,52	\$ 20.740.999,11	93%	52,85	\$ 13.960.288,00	78,52	\$ 20.740.999,00	
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38	M2	44,80	\$162.668,09	\$7.287.530,58	41,60	\$6.766.992,54	93%	41,60	\$ 6.766.992,54	93%	28,00	\$ 4.554.707,00	41,60	\$ 6.766.993,00	
2.3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	88,48	\$72.137,92	\$6.382.763,46	82,16	\$5.926.851,51	93%	82,16	\$ 5.926.851,51	93%	55,30	\$ 3.989.227,00	82,16	\$ 5.926.852,00	
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	28,00	\$84.306,58	\$2.360.584,18	26,00	\$2.191.971,08	93%	26,00	\$ 2.191.971,08	93%	17,50	\$ 1.475.365,00	26,00	\$ 2.191.971,00	
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	UND	56,00	\$1.771.402,65	\$99.198.548,59	52,00	\$92.112.937,80	93%	52,00	\$ 92.112.937,80	93%	35,00	\$ 61.999.093,00	52,00	\$ 92.112.938,00	
3.0	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				\$ 9.751.905,76		\$ 9.055.340,84			\$ 9.055.340,84	93%					
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	UND	56,00	\$ 174.141,17	\$ 9.751.905,76	52,00	\$ 9.055.340,84	93%	52,00	\$ 9.055.340,84	93%	35,00	\$ 6.094.941,00	52,00	\$ 9.055.341,00	
4.0	TRANSPORTE				\$ 29.456.731,61		\$ 27.352.677,56			\$ 27.352.677,56	93%			-		
4.1	Transporte agregados y otros a cabecera municipal	UND	56,00	\$37.810,00	\$2.117.360,00	52,00	\$1.966.120,00	93%	52,00	\$ 1.966.120,00	93%	35,00	\$ 1.323.350,00	52,00	\$ 1.966.120,00	
4.2	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso	UND	56,00	\$335.878,20	\$18.809.179,20	52,00	\$17.465.666,40	93%	52,00	\$ 17.465.666,40	93%	35,00	\$ 11.755.737,00	52,00	\$ 17.465.666,00	
4.3	Sobre acarreo a hombro Vía veredal a sitio de obras	Carga-23Kg	392,00	\$21.760,69	\$8.530.192,41	364,00	\$7.920.891,16	93%	364,00	\$ 7.920.891,16	93%	245,00	\$ 5.331.369,00	364,00	\$ 7.920.891,00	
5.0	IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO				\$ 7.446.506,67		\$ 6.914.615,76			\$ 6.914.615,76	93%					
5.1	Material Vegetal - Plantulas	UND	1.120,00	\$4.796,67	\$5.372.266,67	1.040,00	\$4.988.536,80	93%	1.040,00	\$ 4.988.536,80	93%	700,00	\$ 3.357.669,00	1.040,00	\$ 4.988.537,00	
5.2	Elementos Mayores	KG	336,00	\$3.096,00	\$1.040.256,00	312,00	\$965.952,00	93%	312,00	\$ 965.952,00	93%	210,00	\$ 650.160,00	312,00	\$ 965.952,00	
5.3	Elementos Menores	KG	336,00	\$3.077,33	\$1.033.984,00	312,00	\$960.126,96	93%	312,00	\$ 960.126,96	93%	210,00	\$ 646.239,00	312,00	\$ 960.127,00	
COSTO DIRECTO		TOTAL		\$ 184.743.780,35		\$ 171.547.795,80		TOTAL		\$ 171.547.795,80		\$ 115.464.863,00		\$ 171.547.797,00		
ADMINISTRACIÓN 25%		25,00%		\$ 46.185.945,09		\$ 42.886.948,95				\$ 42.886.948,95		\$ 28.866.215,75		\$ 42.886.949,25		
IMPREVISTOS 1%		0,00%		\$ 1.847.437,80		\$ 1.715.477,96				\$ 1.715.477,96		\$ 1.154.648,63		\$ 1.715.477,97		
UTILIDADES 5%		5,00%		\$ 9.237.189,02		\$ 8.577.389,79				\$ 8.577.389,79		\$ 5.773.243,15		\$ 8.577.389,85		
PGIO				\$ 7.353.500,00		\$ -				\$ -		\$ 3.676.750,00		\$ -		
TOTAL =				\$ 249.367.852		\$ 224.727.612,50				\$ 224.727.612,50		\$ 154.935.720,53		\$ 224.727.614,07		
PORCENTAJES						90,12%				90,12%		62,13%		90,12%		


FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA


GERMAN GARCÍA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

Decimales Subtotal: 0
Decimales AUJ: 0

PROGRAMADO								
TOTAL	Sem No. 1	Sem No. 2	Sem No. 3	Sem No. 4	Sem No. 5	Sem No. 6	Sem No. 7	Sem No. 8
CAP. 1								
67,20	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
CAP. 2								
84,56	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
44,80	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
88,48	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
28,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
CAP. 3								
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
CAP. 4								
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
392,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
CAP. 5								
1.120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
336,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
336,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

EJECUTADO					
TOTAL	Sem No. 1	Sem No. 2	Sem No. 3	Sem No. 4	Sem No. 5
CAP. 1					
62,40	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
CAP. 2					
78,52	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
41,60	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
82,16	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
26,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
CAP. 3					
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
CAP. 4					
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
364,00	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80
CAP. 5					
1.040,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
312,00	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40
312,00	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40


FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA


GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

INFORME FOTOGRAFICO MENSUAL I **No. 1**

Tipo de Contrato: Contrato de Obra
 Número: SGR-SC-096-2026
 Contratista: FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.



Descripción:	Localización y replanteo		
Item	1.1	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripción:	Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm		
Item	2.1	Fecha Acta:	



Descripción:

Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38

Item

2.2

Fecha Acta:

30-jun.-26



Descripción:

Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm

Item

2.3

Fecha Acta:

30-jun.-26



Descripcion:	Suministro e Instalación de STC Vitricado		
Item	2.4	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Suministro e Instalación KIT de Herrajes		
Item	2.5	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion: Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).

Item	3.1	Fecha Acta:	30-jun.-26
------	-----	-------------	------------



Descripcion: Transporte agregados y otros a cabecera municipal

Item	4.1	Fecha:	30-jun.-26
------	-----	--------	------------



Descripcion:	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso		
Item	4.2	Fecha:	30-jun.-26



Descripcion:	Sobre acarreo a hombro Via veredal a sitio de obras		
Item	4.3	Fecha:	30-jun.-26



Descripcion:	Material Vegetal - Plantulas		
Item	5.1	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Elementos Mayores		
Item	5.2	Fecha:	30-jun.-26



Descripción:	Elementos Menores		
Item	5.3	Fecha:	30-jun.-26

Hector J. P. Dm

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

ACTA DE APROBACIÓN INTERVENTORIA ACTA #01

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"
FECHA INICIO DEL PROYECTO	26 DE MAYO DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN PROYECTO	26 DE JULIO DE 2026
VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBRA	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$ 249.367.852,26) M/CTE
INTERVENTORIA	GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
PERIODO DE SEGUIMIENTO	26 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DEL INFORME	30 DE JUNIO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DE OBRA	
No. CONTRATO	SGR-SD-096-2026
NOMBRE CONTRATISTA	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
DATOS DE CONTACTO CONTRATISTA (TELEFONO Y E-MAIL)	Cel. 311-7724976 Email: fullrecargasytecnologia@gmail.com
FECHA INICIO	26 DE MAYO DE 2026
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26 DE JULIO DE 2026
SUSPENSION	N/A
REINICIO	N/A
ADICION EN TIEMPO	N/A
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	26 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	\$ 249.367.852,26
ADICIONES	N/A
VALOR FINAL	\$ 249.367.852,26

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA	
ANTICIPO (50%)	\$ 124.683.926,13
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 224.727.612,50
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 124.683.926,13
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$ 100.043.686,37
AVANCE	90,12 %



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA	
No. PÓLIZA (S)	EC – 100014620 - EC - 100043893
ULTIMA FECHA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS	26/05/2026
APROBACIÓN PÓLIZAS VIGENTES	14/05/2026
INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORIA	
No. CONTRATO	SGR-SD-097-2026
NOMBRE CONTRATISTA INTERVENTORIA	GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"
DATOS DE CONTACTO CONTRATISTA (TELEFONO Y E-MAIL)	CEL. 3166170518 gegar1@hotmail.com
FECHA INICIO	26 DE MAYO DE 2026
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26 DE JULIO DE 2026
SUSPENSION	N/A
REINICIO	N/A
ADICION EN TIEMPO	N/A
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	26 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$18.920.288,00), M/CTE.
ADICIONES	N/A
VALOR FINAL	(\$18.920.288,00

OBSERVACIONES
A la fecha, el proyecto registra un avance físico del 90,12%, mientras que el avance financiero corresponde al 62,13%, Basado en la revisión de los productos aportados por el contratista bajo el criterio de la Interventoría se procede a dar viabilidad al pago del Acta 01.

Elaborado en La Merced, Caldas a los 30 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,


GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
Interventor

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10013928	HECTOR FABIO CARDONA DAVILA		CLL 21 No 3-76	3359908	fulrecargaspereira@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85166243	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$959.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	387.500	0		0		0	0	0	0	387.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	496.000	0	0	0	0	0	0		496.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	75.600				75.600	0	0	75.600			756	75.600	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	387.500	387.500
Pensión	1	496.000	496.000
Riesgos Laborales	1	75.600	75.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	959.100	959.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10013928	HECTOR FABIO CARDONA DAVILA		CLL 21 No 3-76	3359908	fullrecargaspereira@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85166243	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$959.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																		
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TUE	TAF	TAP	UPP	VST	SEN	AGE	LAA	SG	ANC	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 10013928	CARDONA DAVILA HECTOR FABIO			59	0		N																	230201	3.100.000	30	496.000	0	0	0	0	EPS010	3.100.000	30	387.500	14-11	3.100.000	30	3	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10013928	HECTOR FABIO CARDONA DAVILA		CLL 21 No 3-76	3359908	fullrecargaspereira@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85166243	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$959.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	387.500	0		0		0	0	0	0	387.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	496.000	0	0	0	0	0	0		496.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	75.600				75.600	0	0	75.600			756	75.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	387.500	387.500
Pensión	1	496.000	496.000
Riesgos Laborales	1	75.600	75.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	959.100	959.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10013928	HECTOR FABIO CARDONA DAVILA		CLL 21 No 3-76	3359908	fullrecargaspereira@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85166243	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$959.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	TUE	TAF	TAP	UPP	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 10013928	CARDONA DAVILA HECTOR FABIO	59	0			N																230201	3.100.000	30	496.000	0	0	0	0	EPS010	3.100.000	30	387.500	14-11	3.100.000	30	3	75.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACHENAO-024612.61410D4-1460513-002596381A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1034293521	0	MIGUEL ANGEL LOPEZ MARULANDA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	MANZANA H CASA 2 HAMBURGO		3126451523		MIGUELANGELOPEZMARULANDA4@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37437773	I	2026-06-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.100	5.800	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37437773	2026-07-28	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 1034293521	LOPEZ MARULANDA MIGUEL ANGEL	1.750.905																	0			30	30	0	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1034293521	0	MIGUEL ANGEL LOPEZ MARULANDA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	MANZANA H CASA 2 HAMBURGO		3126451523		MIGUELANGELOPEZMARULANDA4@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37437773	I	2026-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.100	5.800	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37437773	2026-06-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	3.100	0	283.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	3.100	0	283.300
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	2.500	0	221.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	218.900	0	2.500	0	221.400
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	200	0	9.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	200	0	9.400
Gran Total					508.300	0	5.800	0	514.100



DIANA MILENA TREJOS GALLEGO CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

**CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

La contadora Diana Milena Trejos Gallego TP 100.298-T certifica que el señor Héctor Fabio Cardona Dávila identificado con cc 10.013.928, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones del mes de junio de 2026.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los un (1) días del mes de julio del 2026, en Dosquebradas.

HECTOR FABIO CARDONA DAVILA
Gerente

C.P DIANA MILENA TREJOS GALLEGO
T.P 100.298-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **42.018.252**

TREJOS GALLEGO

APELLIDOS

DIANA MILENA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **27-FEB-1980**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.52
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

06-MAR-1998 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2402500-00975269-F-0042018252-20180205

0059391816A 1

9903186458




C.P DIANA MILENA TREJOS GALLEGO
TP 100.298-T
C.C 42.018.252 DE Dosquebradas

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

20FFA1FF76A5247C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MILENA TREJOS GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42018252 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 100298-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Jueves, 09 de junio de 2026

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FULL RECARGAS CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NIT 901919030, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	721-000053-13	2025/03/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Entidad adherida al Banco de la República



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

FULLRECARGAS, CONSTRUCCIONES Y

Actividad Económica Principal 4651
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de VentaFEFT - 525

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764089852634 de 03/03/2025 - 03/03/2027 autoriza FEFT - 1 a FEFT - 100,000

Tipo de OperaciónEstandar
Fecha de Generación03/07/2026 15:55
Fecha de Vencimiento03/07/2026 15:55
Forma de PagoContado
Medio de PagoConsignación bancaria
MonedaCOP

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	FULLRECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA SAS	Razón Social	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S.
NIT	901919030	NIT	901700548
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	FULLRECARGASYTECNOLOGIA@GMAIL.COM	Email	gerencia@impulsamas.com.co
Teléfono	3117724976	Teléfono	
Dirección Fiscal	CL 34 7 B 19 LC 2, PEREIRA, (RISARALDA, CO)	Dirección	
		Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	LMER	COSTO DIRECTO	1	EA	\$171,547,796.00		\$171,547,796.00	\$171,547,796.00
2	LMER	ADMON 25%	1	EA	\$42,886,949.00		\$42,886,949.00	\$42,886,949.00
3	LMER	IMPREVISTOS 1%	1	EA	\$1,715,478.00		\$1,715,478.00	\$1,715,478.00
4	LMER	UTILIDAD 5%	1	EA	\$8,577,390.00		\$8,577,390.00	\$8,577,390.00
					Subtotal		\$224,727,613.00	
					Total a Pagar		\$224,727,613.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE
