

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION		Código:	FT-GJC-GCT-023
			Versión:	01
			Fecha de aprobación:	20-06-2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P. NIT: 900.304.997-8

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.762.436 de Popayán (C), Secretario De Planeación Y Obras Publicas Municipal, en calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo SPOPM-CONV-047-2025, suscrito con **LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**, identificado con **900.304.997-8** por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

I. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO		
1.- Número del Convenio:	SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 ✓	
2.- Modalidad Selección:	CONTRATACION DIRECTA.	
3.- Clase de Convenio:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
4.- Partes:	MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ Nit: 800.102.912-2 R.L. JEURIN ZAN MENESES GOMEZ Alcalde Municipal	
	ASOCIADO: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Nit: 900.304.997-8 R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA Identificado con C.C. No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P) ✓	
5.- Supervisor del Convenio	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán (C) Secretario de Planeación Y Obras Publicas Dependencia: Secretaría de Planeación Y Obras Publicas Municipal	
6.- Objeto del Convenio:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ" ✓	
7.- Valor del Convenio	Valor Inicial del Convenio	\$ 261.000.000,00 ✓
	Adición	\$ 0,00
	Valor final Convenio	\$ 261.000.000,00 ✓
8.- Certificado(S) de	Disponibilidad presupuestal: No.	Registro presupuestal: No.

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

disponibilidad presupuestal y Registro(S) presupuestal (es)	2025000876 Fecha: 28/10/2025 Valor: \$ 260.000.000,00	2025000975 Fecha: 31/10/2025 Valor: \$ 260.000.000,00
	Disponibilidad presupuestal: No. 2025000393 Fecha: 22/10/2025 Valor: \$ 1.000.000,00	Registro presupuestal: No. 2025000463 Fecha: 31/10/2025 Valor: \$ 1.000.000,00
9.- Estampillas	Recibo N° N/A	Fecha:
10.- Duración y Ejecución del Contrato o Convenio:	Plazo inicial:	Dos (2) meses
	F. de Suscripción:	31 de octubre de 2025
	F. de Acta de inicio	31 de octubre de 2025
	Fecha de Terminación inicial:	30 de diciembre de 2025
	Fecha de Terminación Anticipada:	N/A
	Fecha de Prórroga:	N/A
11.- Suspensión y reinicio Contrato o Convenio:	Fecha de terminación final:	30 de diciembre de 2025
	Acta de Suspensión	Acta de Reinicio
	N/A	N/A

2. DATOS DEL SUPERVISOR

La supervisión del presente *Convenio Interadministrativo* No. SPOPM-CONV-047-2025 fue ejercida por el (los) siguiente(s) funcionario(s):

NOMBRE DEL SUPERVISOR	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán (C)
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación Y Obras Publicas Municipal
CARGO	Secretario de Planeación Y Obras Publicas
PERIODO DE SUPERVISIÓN	31 de octubre de 2025 hasta 30 de diciembre de 2025

3. MODIFICACIONES

A. PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	Ninguna
----------	---------

B. ADICIONES:

ADICIONAL	Ninguna
-----------	---------

4. RELACIÓN DE PÓLIZAS

Tipo de póliza: Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

Tipo de movimiento: Expedición

Entidad aseguradora: Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6

Tomador: Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez
"EMSERPUVAG S.A. E.S.P."

Póliza No.: AGP-100005542 (Anexo 0)

Fecha de expedición: 31/10/2025

RESOLUCION No. OJMVG-280-2025 del 31 DE OCTUBRE DE 2025 ✓

Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento General Del Convenio	31/10/2025	30/06/2026	\$ 26.100.000,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	31/10/2025	30/06/2026	\$ 78.000.000,00

Tipo de póliza: Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales

Tipo de movimiento: Anexo de Modificación de Poliza

Entidad aseguradora: Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6

Tomador: Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez
"EMSERPUVAG S.A. E.S.P."

Póliza No.: AGP-100005542 (Anexo 1)

Fecha de expedición: 10/11/2026

RESOLUCION No. OJMVG-355-2025 del 17 de diciembre de 2025 ✓

Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento General Del Convenio	31/10/2025	30/06/2026	\$ 26.100.000,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	31/10/2025	30/06/2026	\$ 78.000.000,00

Tipo de póliza: Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales

Tipo de movimiento: Anexo de Modificación

Entidad aseguradora: Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6

Tomador: Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez
"EMSERPUVAG S.A. E.S.P."

Póliza No.: AGP-100005542 (Anexo 2)

Fecha de expedición: 09/03/2026

RESOLUCION No. OJMVG-156-2026 del 2 de junio de 2026 ✓

Estado de póliza: Aprobado

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento General Del Convenio	31/10/2025	30/06/2026	\$ 26.100.000,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	31/10/2025	30/06/2026	\$ 78.000.000,00

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante toda la vigencia del convenio.	X		Cumple
Ejecutar el objeto del convenio con idoneidad, oportunidad y eficiencia, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el presente instrumento, el presupuesto, el cronograma de ejecución y demás documentos que hacen parte integral del convenio.	X		Cumple
Adelantar el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar.	X		Cumple

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

Ejecutar el objeto del convenio conforme al proyecto aprobado, atendiendo las especificaciones técnicas, estudios, diseños, cronograma, presupuesto y demás documentos contractuales.	X	En el informe presentado realizado por EMSERPUVAG S.A. E.S.P. muestra específicamente el cumplimiento según el Acta De Recibo Final en un 100% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo
Acreditar y mantener al día el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a la Ley 1150 de 2007, Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes.	X	La empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha cumplido con el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social, se anexo la certificación de cumplimiento de los aportes a parafiscales establecidos y copias de las planillas de seguridad social y parafiscales de los meses cobrados
Ejecutar el objeto del convenio con idoneidad, eficiencia y oportunidad, en concordancia con los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad y eficacia que orientan la contratación estatal.	X	El informe presentado por EMSERPUVAG S.A. E.S.P., muestra específicamente la Ejecución y cumplimiento del objeto del convenio con idoneidad, eficiencia y oportunidad, en concordancia con los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad y eficacia que orientan la contratación estatal. A través el Acta De Recibo Final ejecutada en un 100% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre del 2025.
Cumplir con la normatividad técnica aplicable a los servicios de saneamiento básico, incluyendo el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, la Norma Sismo Resistente – NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas – NTC, y demás regulaciones ambientales, sanitarias y de calidad vigentes.	X	El informe presentado por EMSERPUVAG S.A. E.S.P., muestra específicamente el cumplimiento según el Acta De Recibo Final en un 100%, el cual se ejecuta de acuerdo con los estudios y diseños entregados por parte de la Alcaldía Del Municipio De Valle Del Guamuez a EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Para el seguimiento se tuvo en cuenta adicionalmente a los estudios y diseños las siguientes normas y códigos:

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

			<p>La calidad de los materiales que se utilizan en las obras, los trabajos de ejecución de las obras civiles y complementarias, la instalación de materiales y accesorios, se realizan cumpliendo con los requisitos y procedimientos exigidos en los pliegos o los establecidos en las normas que les sean aplicables, de las cuales se citan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma RAS 2000 • Resolución No. 330 DE 2017 • Resolución No.799 de 2021 • Resolución No.908 de 2021 • NSR 2010 • Decreto No. 1711 de 2021 • Decreto No. 1401 de 2023 • Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC • American Concrete Instituto ACI • American National Standards Institute Inc. ANSI
Administrar los recursos del convenio con destinación exclusiva al objeto contractual, asegurando un manejo responsable y permitiendo el control fiscal, administrativo y ciudadano.	X		<p>Una vez firmado el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025, y haber tenido en cuenta el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000876 y Registro presupuestal No. 2025000975 por un valor de \$ 260.000.000,00 por parte de la Alcaldía Municipal De Valle Del Guamuez. Así mismo el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000393 y Registro Presupuestal No. 2025000463 por un valor de \$1.000.000,00 por parte EMSEPUVAG S.A. E.S.P.</p>
Adelantar el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio,	X		<p>Se adelanto por parte de EMSEPUVAG S.A. E.S.P. el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para</p>

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar, incluyendo las garantías contractuales según los estudios previos.			la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar. De los cual dio origen al Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025
Abrir una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la administración de los recursos transferidos por el Municipio, destinando los mismos únicamente al cumplimiento del objeto del convenio y reintegrando al Municipio los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen.	X		Se apertura cuenta de ahorros No. 45100004879 por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la administración de los recursos transferidos por el Municipio del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025, los mismos se destinan únicamente al cumplimiento del objeto del convenio y los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen se reintegran al Municipio.
Aportar al convenio la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000 MDA/CTE) , destinados a cofinanciar las actividades necesarias para el mejoramiento y adecuación de la celda no. 01 del sitio de disposición final de residuos sólidos, localizado en la vereda la primavera, y complementación de acciones de fortalecimiento al proceso de aprovechamiento para garantizar la buena prestación del servicio público de aseo objeto del convenio. Estos recursos se ejecutarán de manera complementaria a los aportes del Municipio y deberán ser invertidos exclusivamente en los fines del convenio, conforme al presupuesto	X		EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Aporto al convenio la suma de \$1.000.000,00 destinados a cofinanciar las actividades necesarias para la ampliación del alcantarillado sanitario objeto del convenio, de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000393 y Registro Presupuestal No. 2025000463 por un valor de \$1.000.000,00

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION		Código:	FT-GJC-GCT-023
			Versión:	01
			Fecha de aprobación:	20-06-2025

aprobado y bajo supervisión del Municipio.			
Aportar los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos que se requieran para la adecuada ejecución del convenio. Cualquier modificación o sustitución de personal clave deberá contar con la aprobación previa y escrita de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio.	X		EMSERPUVAG S.A. E.S.P. aporó todo los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos que se requieran para la adecuada ejecución del convenio, y adelanto el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar. De los cual dio origen al Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025
Cumplir con las obligaciones de visibilidad y socialización del proyecto, incluyendo la instalación de vallas informativas, piezas de divulgación y demás mecanismos de información exigidos por el Municipio o por la normatividad aplicable.	X		La Alcaldía Municipal De Valle Del Guamuez y EMSERPUVAG S.A E.S.P. llevaron a cabo la socialización donde se hicieron las recomendaciones y sugerencias necesarias para el desarrollo normal en la ejecución del Convenio Interadministrativo que derivo en el Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, Cuyo Objeto Es: Mejoramiento y adecuación de la celda no. 01 del sitio de disposición final de residuos sólidos, localizado en la vereda la primavera, y complementación de acciones de fortalecimiento al proceso de aprovechamiento para garantizar la buena prestación del servicio público de aseo en el municipio Valle del Guamuez
Ejecutar los recursos de acuerdo con el presupuesto oficial; cualquier modificación de diseños, rediseños o ajustes técnicos deberá contar con la	X		El informe muestra específicamente el cumplimiento según el Acta De Recibo Final en un 100% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

autorización previa del Municipio y los costos adicionales serán asumidos por la Empresa.			Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre del 2025.
Gestionar y obtener, en coordinación con las autoridades competentes, los permisos, licencias o autorizaciones ambientales, sanitarias o de otra índole que sean necesarias para la ejecución de las obras.	X		Por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. no se tiene que Gestionar u obtener, en coordinación con las autoridades competentes, ningún permisos, licencias o autorizaciones ambientales, sanitarias o de otra índole para la ejecución de las obras teniendo en cuenta que emitieron un concepto de viabilidad técnica, financiera, económica y ambiental con fecha del 15/08/2025, donde su código BPIN No. 202500000038487 firmado por el Secretario De Planeación y Obras Públicas, Jefe Banco De Proyectos, por un valor de \$ 261.000.000,00. Así mismo también emitieron un concepto de viabilidad técnica por parte de la Secretaría De Planeación De Obras Públicas por un valor de \$ 261.000.000,00.
Coordinar con la Secretaría de Planeación y Obras la revisión técnica antes, durante y después de la ejecución de la obra, atendiendo las observaciones o requerimientos de la supervisión.	X		EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha coordinado junto a la secretaria De Planeación y Obras Públicas Municipal, la socialización del proyecto y también en varias oportunidades visitas técnicas de inspección de la obra para ver el desarrollo de la ejecución del contrato de obra acompañado por la interventoría y supervisor de los contratos y del convenio y revisar el cumplimiento satisfactorio al Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025.
Presentar al Municipio informes de avance periódicos y un informe final de ejecución, acompañados de soportes técnicos, administrativos y financieros	X		El presente informe, muestra específicamente el cumplimiento según el Acta De Recibo Final en un 100% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No.

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

que acrediten la correcta aplicación de los recursos.			SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre del 2025.
Facilitar el ejercicio de la supervisión municipal, así como el control fiscal y disciplinario por parte de los órganos competentes, suministrando oportunamente toda la documentación, archivos y demás información que se requiera.	X		Se tiene a disposición de la supervisión municipal, así como el control fiscal y disciplinario por parte de los órganos competentes, un archivo físico detallado y con toda la información necesaria de los procesos de contratación ejercida por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. del Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, Cuyo Objeto Es: Mejoramiento y adecuación de la celda no. 01 del sitio de disposición final de residuos sólidos, localizado en la vereda la primavera, y complementación de acciones de fortalecimiento al proceso de aprovechamiento para garantizar la buena prestación del servicio público de aseo en el municipio Valle del Guamuez
Consultar con la Secretaría de Planeación y Obras cualquier modificación sustancial al convenio, adjuntando los soportes que justifiquen la solicitud.	X		No se consultó de ninguna manera a la Secretaría de Planeación y Obras Municipal para ningún tipo de modificación sustancial al convenio, ningún cambio alguno ni cambio de especificaciones técnicas o ningún cambio de materiales en las actividades contractuales ejecutadas.
Conservar los archivos técnicos, financieros y contractuales relacionados con el convenio durante el término legal correspondiente y ponerlos a disposición de las autoridades cuando sean requeridos.	X		Contiene archivo físico detallado y con toda la información necesaria de los procesos de contratación ejercida por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. del Contrato de obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, Cuyo Objeto Es: Mejoramiento y adecuación de la celda no. 01 del sitio de disposición final de residuos sólidos, localizado en la vereda la primavera, y complementación de acciones de fortalecimiento al proceso de aprovechamiento para garantizar la buena prestación del servicio público de aseo en el municipio Valle del Guamuez

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

Asumir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente convenio, de su condición como ejecutor de recursos públicos y aquellas establecidas en la normatividad vigente, especialmente en materia de transparencia, eficiencia, control fiscal y responsabilidad en el manejo de recursos	X		Cumple
--	---	--	--------

6. CANTIDADES Y VALORES EJECUTADAS PRESENTE INFORME

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,0	MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS				
1,01	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Tn	2.470,00	\$44.898,00	\$110.898.060,00
1,02	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Kg	2.470,00	\$3.600,00	\$ 8.892.000,00
1,03	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos.	M3	370,50	\$51.076,00	\$18.923.658,00
1,04	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	ML	15,00	\$442.243,00	\$ 6.633.645,00
	Subtotal				\$145.347.363,00
2,0	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OPERACIÓN				
2,01	Limpieza de dispositivos de entrada y salida del humedal artificial (cajillas del S.T.L.)	UND	4,00	\$ 271.950,00	\$ 1.087.800,00
2,02	Limpieza y lavado de lecho filtrante (Grava) del humedal artificial en áreas obstruidas por sedimentos (Incluye extracción y resiembra de plántulas en el área de lavado)	M3	164,00	\$ 92.447,00	\$ 15.161.308,00
2,03	Extracción de lodos en los tanques sedimentadores y filtro fafa.	M3	65,80	\$ 271.950,00	\$ 17.894.310,00
2,04	Extracción de lodos en laguna de oxidación	M3	23,34	\$ 271.950,00	\$ 6.347.313,00
	Subtotal				\$ 40.490.731,00

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

(A)	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$185.838.094,00
(1)	ADMINISTRACIÓN	(A)*29%		29%	\$ 53.893.047,00
(2)	UTILIDAD	(U)*4%		4%	\$ 7.433.524,00
(3)	IMPREVISTOS	(I)*1%		1%	\$ 1.858.381,00
(B)	TOTAL COSTO INDIRECTOS	(1)+(2)+(3)		34%	\$ 63.184.952,00
(C)	COSTO TOTAL OBRA	(A)+(B)			\$249.023.046,00
(D)	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLOBAL		PMA	\$ 11.976.954,00
(E)	TOTAL PROYECTO	(C)+(D)			\$261.000.000,00

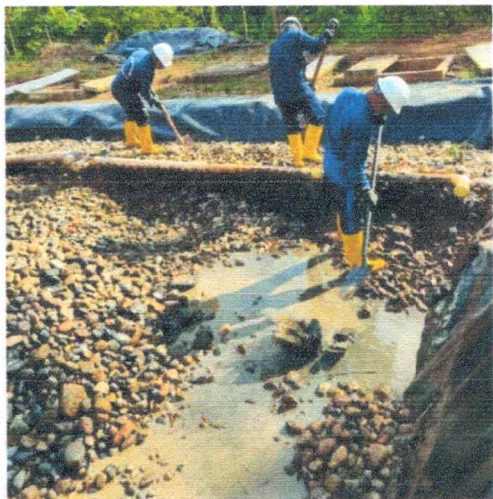
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD Y UNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,01	<p>Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.</p> <p>Actividad operativa que consiste en el extendido y acomodación de los residuos en capas delgadas, seguido de su compactación mecánica mediante maquinaria pesada.</p>	2.470,00 Tn	

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD Y UNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,02	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda. Esta actividad consiste en la aplicación técnica de cal viva o hidratada sobre los residuos dispuestos en la celda No. 01.	2.470,00 Kg	
1,03	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos. Consiste en la provisión y extendido de una capa de material arcilloso sobre los residuos compactados al finalizar la jornada.	370,50 M3	
1,04	Ampliación de chimeneas existentes en la celda. Consiste en la adecuación y prolongación vertical de los ductos de venteo (chimeneas) actuales, conforme al avance en la altura de la celda de disposición.	15,00 ML	

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ MIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD Y UNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,01	Limpieza de dispositivos de entrada y salida del humedal artificial (cajillas del S.T.L.) Comprende la remoción manual y/o mecánica de sedimentos, lodos, residuos sólidos y material vegetal acumulado en las estructuras de entrada y salida del Sistema de Tratamiento de Lixiviados (S.T.L.)	4,00 UND	
2,02	Limpieza y lavado de lecho filtrante (Grava) del humedal artificial en áreas obstruidas por sedimentos (Incluye extracción y resiembra de plántulas en el área de lavado) Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo que consiste en la remoción, lavado y reinstalación del material filtrante (grava) para eliminar la colmatación por sedimentos.	164,00 M3	
2,03	Extracción de lodos en los tanques sedimentadores y filtro fafa. Consiste en el retiro y disposición final de los lodos acumulados en el fondo de los tanques de sedimentación y el filtro de flujo ascendente (FAFA), mediante técnicas de succión o extracción manual.	65,80 M3	

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD Y UNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,04	Extracción de lodos en laguna de oxidación Consiste en la remoción, deshidratación y retiro de los lodos acumulados en el fondo de la laguna de oxidación, producto del proceso de sedimentación biológica.	23,34 M3	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	
	



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Código:	FT-GJC-GCT-023
Versión:	01
Fecha de aprobación:	20-06-2025

Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.



Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos.



Ampliación de chimeneas existentes en la celda.





MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Código:	FT-GJC-GCT-023
Versión:	01
Fecha de aprobación:	20-06-2025

Limpieza de dispositivos de entrada y salida del humedal artificial (cajillas del S.T.L.)



Limpieza y lavado de lecho filtrante (Grava) del humedal artificial en áreas obstruidas por sedimentos (Incluye extracción y resiembra de plántulas en el área de lavado)



Extracción de lodos en los tanques sedimentadores y filtro fafa.



 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

Extracción de lodos en laguna de oxidación.



7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

ASOCIADO:

EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
"EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

ÍTEM 1	PERIODO DE PAGO 2025 - OCTUBRE	ENTREGA DE PLANILLA
CARLOS QUIROZ		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	No. 35442274 de 26/11/2025	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	Entidad: Porvenir Fecha: 26/11/2025 Valor: \$ 779.900	CUMPLE
SALUD	Entidad: EMSSANAR Fecha: 26/11/2025 Valor: \$ 609.300	CUMPLE
RIESGOS PROFESIONALES	Entidad: Positiva compañía de seguros Fecha: 26/11/2025 Valor: \$ 25.500	CUMPLE
CCF	Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 26/11/2025 Valor: \$ 195.000	CUMPLE

ÍTEM 2	PERIODO DE PAGO 2025 - NOVIEMBRE	ENTREGA DE PLANILLA
CARLOS QUIROZ		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	No. 35670246 de 17/12/2025	APORTES EN LINEA

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

PENSIÓN	Entidad: Porvenir Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 779.900	CUMPLE
SALUD	Entidad: EMSSANAR Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 609.300	CUMPLE
RIESGOS PROFESIONALES	Entidad: Positiva compañía de seguros Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 25.500	CUMPLE
CCF	Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 195.000	CUMPLE

ÍTEM 3	PERIODO DE PAGO 2025 - DICIEMBRE	ENTREGA DE PLANILLA
CARLOS QUIROZ		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	No. 35724585 de 17/12/2025 /	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	Entidad: Porvenir Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 779.900	CUMPLE
SALUD	Entidad: EMSSANAR Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 609.300	CUMPLE
RIESGOS PROFESIONALES	Entidad: Positiva compañía de seguros Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 25.500	CUMPLE
CCF	Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 17/12/2025 Valor: \$ 195.000	CUMPLE

8. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

1. El suscrito supervisor, en cumplimiento de las funciones asignadas y con fundamento en la verificación de la ejecución contractual, certifica que La EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.", identificada con NIT 900.304.997-8, dio cumplimiento al 100% de las obligaciones pactadas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 DE OCTUBRE DE 2025, desde el 31 de octubre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025.
2. En el presente informe se presenta una ejecución en el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2025 al 30 de diciembre 2025, alcanzando el 100% de cumplimiento a satisfacción de su objeto, metas, actividades y compromisos establecidos en los estudios y documentos contractuales.

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	 INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

3. El supervisor en relación con el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 DE OCTUBRE DE 2025, suscrito entre la Administración Municipal del Valle del Guamuez y la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.", identificada con NIT 900.304.997-8, se verificó que: ✓

Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2025 al 22 de diciembre del 2025, fecha en la cual se dio inicio y fecha de presentación del Acta de Recibo Parcial No. 1 al 60,40%, la entidad ejecutora cumplió de manera satisfactoria con el pago y la oportuna consignación de los aportes parafiscales correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2025 al 30 de diciembre 2025, fecha en la cual se dio inicio y fecha de Acta de Recibo final del 100%, la entidad ejecutora cumplió de manera satisfactoria con el pago y la oportuna consignación de los aportes parafiscales correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

En tal sentido, la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales generados durante la ejecución del mencionado convenio interadministrativo.

Certificación de Cumplimiento de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social durante el periodo de ejecución, suscrita por la revisora fiscal LEYVY PATRICIA LASSO ARMERO, TP 173333-T, con fecha de expedición de certificación: 29/04/2026. ✓

Finalmente, el día 12 de mayo de 2026, la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. hace entrega de todos los documentos soportes del acta de recibo final. con el fin de continuar con la correspondiente etapa de liquidación del convenio SPOPM-CONV-047-2025 del 31 DE OCTUBRE DE 2025. ✓

9. SOPORTES DOCUMENTALES

1. Póliza de garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. AGP-100005542 anexo 0, 1 y 2 expedida por la Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6 ✓
2. Informe final del Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025 por parte del contratista de obra, de fecha 20/04/2025.
3. Registro fotográfico.
4. Planillas de seguridad social del representante legal de la empresa de servicios públicos EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
5. Certificado de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales suscrita por los contadores.
6. Bitácoras de obra. ✓
7. Factura electrónica presentada por el contratista de obra No. FE 21, de fecha 31/12/2025.
8. Factura electrónica por la empresa de servicios públicos EMSERPUVAG S.A. E.S.P No. FEEM-56 de fecha 30/12/2025.
9. Certificación bancaria.
10. Rut.

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

11. Certificado de pago FIC SENA de fecha 06/04/2025.
12. Rendimientos financieros de fecha 23/04/2026. ✓
13. Informe final de supervisión al contrato de obra No. SPO-CO-007-2025, por parte de la empresa de servicios públicos EMSERPUVAG S.A. E.S.P de fecha 29/04/2026.
14. Certificado de cumplimiento emitido por el supervisor, de fecha 2/06/2026. ✓

INFORME PERIODO	CUMPLE
El contratista presentó informe del periodo: DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 1. Informe del beneficiario 2. Planillas de seguridad social de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. 3. Factura 4. Y demás anexos soportes al proceso de ejecución	SI

10. RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos, para el caso de los convenios:

BALANCE DEL CONVENIO	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 261.000.000,00
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	\$ 0,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO O CONVENIO	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 261.000.000,00
VALOR DISMINUIDO DEL CONTRATO	N/A
<i>La siguiente casilla aplica solo para convenios</i>	
VALOR APORTADO POR EL MUNICIPIO	\$ 260.000.000,00
VALOR APORTADO POR EL BENEFICIARIO	\$ 1.000.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0.00
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00
INFORMACION PAGOS REALIZADOS AL CONVENIO.	
VALOR EJECUTADO ANTICIPO 30% MUNICIPIO	\$ 78.000.000,00
VALOR EJECUTADO ANTICIPO 30% EMSERPUVAG S.A.	\$ 300.000,00
TOTAL VALOR EJECUTADO ANTICIPO 30%	\$ 78.300.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 MUNICIPIO	\$ 157.047.124,60
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 EMSERPUVAG	\$ 604.027,40

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

TOTAL VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01	\$ 157.651.152,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONVENIO ACTA PARCIAL No. 01	60,40%
VALORES A PAGAR PRESENTE INFORME FINAL DE SUPERVISION:	
VALOR EJECUTADO INFORME FINAL DE CONVENIO	\$ 103.348.848,00
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME FINAL POR MUNICIPIO	\$ 102.952.875,40
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME FINAL POR EMSERPUVAG	\$ 395.972,60
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO INFORME FINAL DE CONVENIO	100%
VALORES ACUMULADOS DEL CONVENIO	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0.00
VALORES POR EJECUTAR DEL CONVENIO	
VALOR POR EJECUTAR:	\$ 0.00
VALOR POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	0%

CONSTANCIA DE REFRENDACIÓN:

Obrando en mi condición de supervisor del convenio, dejo constancia de que la refrendación realizada a los documentos del expediente contractual objeto de vigilancia, da cuenta de la verificación de la existencia de los originales dentro de la carpeta contentiva de los mismos; sin embargo la veracidad de la información allí contenida es de exclusiva responsabilidad del emisor o de quien haga su aporte, teniendo en cuenta lo invocado en el principio de buena fe contenido en el Art. 83 de la C.P., el que obliga a que las autoridades públicas presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares y obliga a que tanto autoridades públicas como particulares actúen de buena fe.

“C.P. 1991. ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Para constancia, se firma a los dos (2) días del mes de junio del año 2026.

SUPERVISOR:

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

Elaboró Parte técnica	Mario Leandro Ojeda	Apoyo Profesional SPOPM	Firma 
-----------------------	---------------------	-------------------------	---
