



RESPONSABLES			
Elaborado por		Responsable del área u oficina productora	
Nombres y apellidos:	Natalia Martínez Arévalo	Nombres y apellidos:	
Cargo:	Coordinadora Administrativa	Cargo:	
Firma:		Firma:	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



ROMVAL

Medellín, 2 de abril de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.


HACE CONSTAR

Que la empresa ROMVAL INGENIERIA SAS, NIT N900805727, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,





INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



3088A

CL CASETONES

Medellín, 31 de marzo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.


HACE CONSTAR

Que la empresa CL CASETONES SAS, NIT N901764570, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,





INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30886

GESIIC

Medellín, 8 de abril de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa GESIIC COLOMBIA SAS, NIT N901426724, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,





INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30888

POWER INGENIERIA

Medellín, 31 de marzo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS, NIT N900276725, ha reportado 2 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 15.38%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,



30890



**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**




ANEXO 21. INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS



INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

FECHA: DIA 13 MES 03 AÑO 2016 HORA:				
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA				
Nombre del contratista: PRAGMA				
Frente de obra: Reconstrucción de la Institución Educativa Alfonso Lopez				
Ubicación de la Inspección: Obra Colegio Alfonso Lopez				
Responsable HSE del contratista: Nicolas Valderama				
Nº de Trabajadores en Obra total: 23. Hombres: 23. Mujeres: 0				
ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA				
1.1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1.2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1.3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1.4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1.5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
2. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS				
2.1	Cuenta con dique de contención de derrames			✓
2.2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2.3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2.4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
3. FRENTE DE OBRA				
3.1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3.2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3.3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3.4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3.5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3.6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3.7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
3. CORTADORA DE LADRILLO				
4.1	Cuenta con sistema de recirculación de agua	✓		✓
4.2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte	✓		✓
RESPONSABLE DE LA INSPECCION				
NOMBRE: ASTRO Ruiz Gonzalez				
C.C. 40.341812.				
FIRMA: [Firma]				
CARGO: Ing Ambiental				
RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA				
NOMBRE: Nicolas Valderama S.				
C.C. 1.12.957.876				
FIRMA: [Firma]				
CARGO: SST				

		INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS		
FECHA: DIA 13 MES 03 AÑO 2016 HORA:				
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA				
Nombre del contratista: Alhara				
Frente de obra: Reconstrucción Institución Educativa Alfonso Lopez				
Ubicación de la Inspección: Obra Colegio Alfonso Lopez				
Responsable HSE del contratista: Freddy Hincapié				
N° de Trabajadores en Obra total: 4 Hombres: 4 Mujeres:				
ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA				
1.1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1.2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1.3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1.4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1.5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
2. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS				
2.1	Cuenta con dique de contención de derrames			✓
2.2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2.3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2.4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
3. FRENTE DE OBRA				
3.1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3.2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3.3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3.4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3.5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3.6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3.7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
3. CORTADORA DE LADRILLO				
4.1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			✓
4.2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			✓
RESPONSABLE DE LA INSPECCION				
NOMBRE: Astrid Ruiz Gonzalez				
C.C. 40.341.812				
FIRMA: 				
CARGO: Ing Ambiental				
RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA				
NOMBRE: Freddy Hincapié Perdomo				
C.C. 110337664				
FIRMA: 				
CARGO: Operador Planta de concreto				

30893

		INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS			
FECHA: DIA 13 MES 03 AÑO 2016 HORA:					
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA					
Nombre del contratista: RomVal					
Frente de obra: Reconstrucción Institución Educativa Alfonso Lopez					
Ubicación de la Inspección: Obra Colegio Alfonso Lopez					
Responsable HSE del contratista:					
N° de Trabajadores en Obra total: 14 Hombres: 13 Mujeres: 1					
ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA	
1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA					
1.1	El contenedor se encuentra ordenado	✓			
1.2	Se realiza jornada de aseo	✓			
1.3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓			
1.4	Se cuenta con punto ecológico	✓			
1.5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓			
2. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS					
2.1	Cuenta con dique de contención de derrames				✓
2.2	Se cuenta con kit de derrames	✓			
2.3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓			
2.4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓			
3. FRENTE DE OBRA					
3.1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓			
3.2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓			
3.3	No se evidencian residuos en el suelo	✓			
3.4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓			
3.5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓			
3.6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓			
3.7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓			
3. CORTADORA DE LADRILLO					
4.1	Cuenta con sistema de recirculación de agua				✓
4.2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte				✓
RESPONSABLE DE LA INSPECCION					
NOMBRE: Rostand Ruiz Contales					
C.C. 40.341912					
FIRMA: Rostand Ruiz Contales					
CARGO: INIA Ambiental					
RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE: Juleidy M					
C.C. 1005723891					
FIRMA: Juleidy M					
CARGO: SST					

30894



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



ANEXO. 22 INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN MITE: 901.657.301	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR
---	--

PROYECTO: Reconstrucción Institución educativa Alfonso Lopez.

FECHA: 13-03-26 LUGAR DE LA INSPECCION: Obra colegio Alfonso Lopez.

NOMBRE DEL EQUIPO: Bomba Concreto CODIGO O REFERENCIA: Concreto Pml DABT50 10-K2

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	☒
HIDRAULICA	☒
NEUMATICA	☒
MECANICA	☒
A COMBUSTIBLE	☒
OTRO ()	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	☒
OTRO ()	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	☒
PARTES ROTATORIAS	☒
ENGRANAJES	☒
ALTAS TEMPERATURAS	☒
GENERACION DE GASES	☒
RUIDO	☒
RIESGO ELECTRICO	
PROYECCION DE PARTICULAS	☒
GENERACION DE POLVO	

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	☒
ENCLAVAMIENTO	☒
PUESTA A TIERRA	☒
BARRERAS PERIMETRALES	☒
ALARMA	☒
CARCAZA	☒
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	☒			
CONEXIONES ELECTRICAS	☒			
CABLEADO	☒			
MANQUERAS	☒			
JUNTAS	☒			
FUGAS DE ACEITE	☒			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	☒			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	☒			
DESgaste DE PIEZAS	☒			
LLANTAS	☒			
BASES	☒			
PUNTOS DE SUJECION	☒			
LUBRICACION	☒			
Estado General	☒			
Sistema Bombas	☒			
Sistema Mecanico	☒			
Seguridad Operativa	☒			

ACCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION
Mantenimiento		

FIRMA RESPONSABLE: [Firma]
16189945

FIRMA CONTRATISTA: [Firma]
16189945

 NIT: 901.657.301	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR
---	---

PROYECTO: Reconstrucción Institución Educativa Alfonso Lopez

FECHA: 13-03-26 LUGAR DE LA INSPECCION: Olimpo Colegio Alfonso Lopez.

NOMBRE DEL EQUIPO: Bobcat (Minicargador). CODIGO O REFERENCIA: 518EARTH FORCE.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	☒
HIdraulICA	☒
NEUMATICA	☐
MECANICA	☒
A COMBUSTIBLE	☒
OTRO ()	☐

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	☐
ACPM	☒
OTRO ()	☐
N/A	☐

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	☒
PARTES ROTATORIAS	☒
ENGRANAJES	☒
ALTAS TEMPERATURAS	☒
GENERACION DE GASES	☒
RUIDO	☒
RIESGO ELECTRICO	☒
PROYECCION DE PARTICULAS	☒
GENERACION DE POLVO	☒

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	☐
ENCUAVAMIENTO	☐
PUESTA A TIERRA	☒
BARREAS PERIMETRALES	☐
ALARMA	☐
CARCAZA	☐
OTRO:	☐
OTRO:	☐
OTRO:	☐

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	☒	☐	☐	
CONEXIONES ELECTRICAS	☒	☐	☐	
CABLEADO	☒	☐	☐	
MANGUERAS	☒	☐	☐	
JUNTAS	☒	☐	☐	
FUGAS DE ACEITE	☒	☐	☐	
FUGAS DE COMBUSTIBLE	☒	☐	☐	
SISTEMAS DE SEGURIDAD	☒	☐	☐	
DESGASTE DE PIEZAS	☒	☐	☐	
LLANTAS	☒	☐	☐	
BASES	☒	☐	☐	
PUNTOS DE SUJECION	☒	☐	☐	
LUBRICACION	☒	☐	☐	
Estado General	☒	☐	☐	
Sistema Mecanico	☒	☐	☐	
Sistema Hidraulico	☒	☐	☐	
Sistema Electrico	☒	☐	☐	

ACCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION
Mando Avance para	26/03/26	OK
Cambio Aceite	26/03/26	OK
Filtración combustible	26/03/26	OK
Inyección Aceite	26/03/26	OK

FIRMA RESPONSABLE:



FIRMA CONTRATISTA:



NIT: 901.687.301	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR
------------------	--

PROYECTO: Reconstrucción Colegio Alfonso Lopez

FECHA: 13-03-26 LUGAR DE LA INSPECCION: Obra Colegio Alfonso Lopez.

NOMBRE DEL EQUIPO: Planta Cemento Donat CODIGO O REFERENCIA:

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	☒
HIDRAULICA	☐
NEUMATICA	☐
MECANICA	☐
A COMBUSTIBLE	☐
OTRO ()	☐

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	☐
ACPM	☐
OTRO ()	☐
N/A	☒

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	☒
PARTES ROTATORIAS	☒
ENGRANAJES	☐
ALTAS TEMPERATURAS	☒
GENERACION DE GASES	☒
RUIDO	☒
RIESGO ELECTRICO	☒
PROYECCION DE PARTICULAS	☒
GENERACION DE POLVO	☒

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	☒
ENCLAVAMIENTO	☐
PUESTA A TIERRA	☒
BARRERAS PERIMETRALES	☒
ALARMA	☒
CARCAZA	☒
OTRO:	☐
OTRO:	☐
OTRO:	☐

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA				
CONEXIONES ELECTRICAS	☒			
CABLEADO	☒			
MANGUERAS	☒			
JUNTAS	☒			
FUGAS DE ACEITE				
FUGAS DE COMBUSTIBLE				
SISTEMAS DE SEGURIDAD	☒			
DESGASTE DE PIEZAS	☒			
LLANTAS	☒			
BASES	☒			
PUNTOS DE SUJECION	☒			
LUBRICACION	☒			
Almacenamiento	☒			
Extintor	☒			
Manejo Residuos	☒			
Sistema Ventilación	☒			

ACCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE: [Firma]
CC 40 B11 R12.

FIRMA CONTRATISTA: [Firma]
CC 10107364.

Hahh



NIT: 901.687.301

INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Reconstrucción Institución educativa Alfonso Lopez.FECHA: 13-03-26LUGAR DE LA INSPECCION: Obra Colegio Alfonso Lopez.NOMBRE DEL EQUIPO: Retexcavadora papanitaCODIGO O REFERENCIA: A.630

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	☒
HIDRAULICA	☒
NEUMATICA	☒
MECANICA	☒
A COMBUSTIBLE	☒
OTRO ()	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	☒
ACPM	☒
OTRO ()	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	☒
PARTES ROTATORIAS	☒
ENGRANAJES	☒
ALTAS TEMPERATURAS	☒
GENERACION DE GASES	☒
RUIDO	☒
RIESGO ELECTRICO	☒
PROYECCION DE PARTICULAS	☒
GENERACION DE POLVO	☒

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	☒
ENCLAVAMIENTO	☒
PUESTA A TIERRA	☒
BARRERAS PERIMETRALES	☒
ALARMA	☒
CARCAZA	☒
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	☒			
CONEXIONES ELECTRICAS	☒			
CABLEADO	☒			
MANGUERAS	☒			
JUNTAS	☒			
FUGAS DE ACEITE	☒			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	☒			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	☒			
DESGASTE DE PIEZAS	☒			
LLANTAS	☒			
BASES	☒			
PUNTOS DE SUJECION	☒			
LUBRICACION	☒			
Estado General	☒			
Sistema Hidraulico	☒			
Sistema Mecanico	☒			
Implemento Trabajo	☒			
Seguridad Operativa	☒			

ACCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE:

FIRMA CONTRATISTA:

30899



**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**



ANEXO 23. : VALES INGRESO DE MATERIAL

30900



GRAVITAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuruba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 6500 - 320 273 8530
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
25/08/26	10:45	Nº 1906

CLIENTE	NIT. O C.C.
FINCA LA LINDA	1827000000
DIRECCIÓN	TELÉFONO
FINCA LA LINDA	310 236 6500
CONDUCTOR	PLACA NO.
TRILLO KAMAR	200101

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy H. no tiene



GRAVITAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuruba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 6500 - 320 273 8530
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
25/08/26	7:30	Nº 1903

CLIENTE	NIT. O C.C.
FINCA LA LINDA	1827000000
DIRECCIÓN	TELÉFONO
FINCA LA LINDA	310 236 6500
CONDUCTOR	PLACA NO.
TRILLO KAMAR	200101

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Se realiza cambio de conductor se cancela con placas 454771 se cancela con placas 454771



Planta / Km 16 Vía Pro. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastrumaz@gmail.com

**GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S**
Nit 901884681-7

NIT SU 10040017		HORA DE SALIDA		REMISIÓN	
FECHA		9:25		Nº 1897	

CLIENTE:	ALCANTARA	MIT. O.C.C.:	100000
DIRECCIÓN:	CHICLA	TELÉFONO:	18720
CONDUCTOR:	CRUZADO	PLACA NO.:	2674

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECEBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

322

OBSERVACIONES:

100

Татьяна Николаевна

Process



Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastrutimaz@gmail.com

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
24/08/26	11:30.	Nº 1899

CUENTE	DIRECCION	CONDUCTOR	NIT. O.C.C.	TELÉFONO	PLACA NO.
11-11-11-11-11	11-11-11-11-11	11-11-11-11-11	11-11-11-11-11	11-11-11-11-11	11-11-11-11-11

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	10
3	GRAVILLA DE 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		10

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

100

—

—



Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuríba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastrilumaz@gmail.com

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
20326	4:15	Nº 1894

CLIENTE:	Alfonso - Inye	NIT. O C.C.:	10000000000000000000
DIRECCIÓN:	Calle 100	TELÉFONO:	252310
CONDUCTOR:	Guillermo	PLACA NO.:	EX-3622

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	1
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		1

NOTA:

DESPACHO:

NOMBR:
FIRMA:

RECIDIVO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

८८

OBSERVACIONES:

Ans 10/15/01



Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastruturas@gmail.com

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

FECHA	HORA DE SALIDA
20/03/26	9:20

CLIENTE:	INT. O.C.:
DIRECCIÓN:	TÉLEFONO:
CONDUCTOR:	PLACA NO.:

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	12
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	1
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		12

NOTA:

DESPACHO:**NOMBRE:****FIRMA:**

RECIDADO CONDUCTOR:

NOMBRE:**FIRMA:**

செய்து

OBSERVACIONES:[illegible]

Planta / Km 15 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Ita
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 539 8242 - 310 235 0000 - 320 273 8530
gravastitumax@gmail.com

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

REMISIÓN No 1885

FECHA 19/03/26 HORA DE SALIDA 8:05

CLIENTE: DIRECCIÓN: NIT. O C.C.:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
CONDUCTOR: PLACA NO.:

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

Planta / Km 15 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Ita
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 539 8242 - 310 235 0000 - 320 273 8530
gravastitumax@gmail.com

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

REMISIÓN No 1886

FECHA 10/03/26 HORA DE SALIDA 9:57

CLIENTE: DIRECCIÓN: NIT. O C.C.:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
CONDUCTOR: PLACA NO.:

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 6530
gravas@tritungmax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
12/3/26	10:30	Nº 1873

CLIENTE: Alfonso J. Jarama NIT. O C.C.: 91002104
DIRECCIÓN: Pompeya TELÉFONO: 31827104
CONDUCTOR: Freddy Jarama PLACA NO.: EEH 42

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE: Freddy Jarama

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE: Freddy Jarama

FIRMA:

C.C.: 91002104

OBSERVACIONES:

Freddy Jarama
CC 91002104



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 6530
gravas@tritungmax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
12/3/26	9:50	Nº 1879

CLIENTE: Alfonso J. Jarama NIT. O C.C.: 91002104
DIRECCIÓN: Pompeya TELÉFONO: 31827104
CONDUCTOR: Freddy Jarama PLACA NO.: EEH 42

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	10
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		10

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE: Freddy Jarama

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE: Freddy Jarama

FIRMA:

C.C.: 91002104

OBSERVACIONES:

Freddy Jarama
CC 91002104



GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S.
 NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pro. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guaymba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8530
 gravas@tritungas.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
27/06/2010	9:10	Nº 1872

CLIENTE: Industria de la Construcción
 DIRECCIÓN: Carretera a la Zona Industrial
 CONDUCTOR: LUIS RODRIGUEZ

NIT. O C.C.: 90000000000000000000000000000000
 TELÉFONO: 310 236 0600
 PLACA NO.: BEH 472

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	10
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		10

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Trinidad Hincapié

CC 11000000000000000000000000000000



GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S.
 NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pro. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guaymba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8530
 gravas@tritungas.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
16/06/2010	2:30	Nº 1866

CLIENTE: Industria de la Construcción
 DIRECCIÓN: Carretera a la Zona Industrial
 CONDUCTOR: LUIS RODRIGUEZ

NIT. O C.C.: 90000000000000000000000000000000
 TELÉFONO: 310 236 0600
 PLACA NO.: BEH 472

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		10

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Trinidad Hincapié

CC 11000000000000000000000000000000



**GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S**
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 559 8242 - 310 235 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
16/3/26	10:42	Nº 1864

CLIENTE: Alfonso Lopez NIT. O.C.C.: 9000073
DIRECCIÓN: Villavicencio TELÉFONO: 310 235 0600
CONDUCTOR: Alfonso Lopez PLACA NO.: 5V-144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: C. Alfonso Lopez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Tránsito Villavicencio
30/03/2026



**GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S**
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 559 8242 - 310 235 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
16/3/26	12:53	Nº 1865

CLIENTE: Alfonso Lopez NIT. O.C.C.: 9000073
DIRECCIÓN: Villavicencio TELÉFONO: 310 235 0600
CONDUCTOR: Alfonso Lopez PLACA NO.: 5V-144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Alfonso Lopez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Tránsito Villavicencio
30/03/2026

300603



Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 339 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastrumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISION
19/03/2017	7:00	Nº 1884

CLIENTE: Alfonso Rodríguez NIT. O.C.C.: 9005474
DIRECCIÓN: Finca Villa Isa TELÉFONO: 310 236 0600
CONDUCTOR: Alfonso Rodríguez PLACA NO.: FEH 477

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO: Alfonso Rodríguez
NOMBRE: Alfonso Rodríguez
FIRMA: Alfonso Rodríguez

RECIBIDO CONDUCTOR: Alfonso Rodríguez
NOMBRE: Alfonso Rodríguez
FIRMA: Alfonso Rodríguez
C.C.: 840241100

OBSERVACIONES:
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
CC 103057864



Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 339 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastrumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISION
18/03/2017	11:20	Nº 1880

CLIENTE: Alfonso Rodríguez NIT. O.C.C.: 9005474
DIRECCIÓN: Finca Villa Isa TELÉFONO: 310 236 0600
CONDUCTOR: Alfonso Rodríguez PLACA NO.: FEH 477

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO: Alfonso Rodríguez
NOMBRE: Alfonso Rodríguez
FIRMA: Alfonso Rodríguez

RECIBIDO CONDUCTOR: Alfonso Rodríguez
NOMBRE: Alfonso Rodríguez
FIRMA: Alfonso Rodríguez
C.C.: 840241100

OBSERVACIONES:
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
CC 103057864

30907

30908



Planta / Km 15 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8530
gravastriumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
16/3/26	9:18.	Nº 1862

CLIENTE: Alfonso Gaitan NIT. O C.C. 90184681-7
DIRECCIÓN: Finca Santa Rosa TELÉFONO: 310 236 0600
CONDUCTOR: Silvano Ramos PLACA NO: SND 141

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Alfonso Gaitan
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:

C.C.:
OBSERVACIONES:
Freddy Hincapié
CC 110501864



Planta / Km 15 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8530
gravastriumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
16/3/26	7:30	Nº 1858

CLIENTE: Alfonso Gaitan NIT. O C.C. 90184681-7
DIRECCIÓN: Finca Santa Rosa TELÉFONO: 310 236 0600
CONDUCTOR: Silvano Ramos PLACA NO: SND 141

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Alfonso Gaitan
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:

C.C.:
OBSERVACIONES:
Freddy Hincapié
CC 110501864

30909



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuruba - Villavicencio/Colombia
CEL. 305 359 8242 - 310 235 6600 - 320 273 8630
gravas@tritumax.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
14/3/26		Nº 1854

CLIENTE:	MT. O C.C.:
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:
CONDUCTOR:	PLACA NO.:

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	15
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuruba - Villavicencio/Colombia
CEL. 305 359 8242 - 310 235 6600 - 320 273 8630
gravas@tritumax.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
14/3/26	2:04	Nº 1851

CLIENTE:	MT. O C.C.:
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:
CONDUCTOR:	PLACA NO.:

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	12
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		12

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

30910



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pro. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 238 0600 - 320 273 8630
gravas@tritumax@gmail.com

FECHA: 13/03/26

HORA DE SALIDA: 12:42

REMISIÓN: No 1850

CLIENTE: Albornoz, Amparito

DIRECCIÓN: Pampalé

CONDUCTOR: Albornoz, Amparito

NIT. O.C.C.: 1000000000000

TELÉFONO: 3100000000

PLACA NO.: SVB 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	15
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPECHO:

NOMBRE: Albornoz, Amparito

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Freddy Hincapié
CC 1000000000



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pro. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 238 0600 - 320 273 8630
gravas@tritumax@gmail.com

FECHA: 13/03/26

HORA DE SALIDA: 11:20

REMISIÓN: No 1848

CLIENTE: Albornoz, Amparito

DIRECCIÓN: Pampalé

CONDUCTOR: Albornoz, Amparito

NIT. O.C.C.: 1000000000000

TELÉFONO: 3100000000

PLACA NO.: SVB 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPECHO:

NOMBRE: Albornoz, Amparito

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Freddy Hincapié
CC 1000000000

30911



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
 Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8530
 gravas@tritungas.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
13/03/26	8:28	Nº 1844

CLIENTE: Altamira NIT. O.C.C.: 310231047
 DIRECCIÓN: Pto. López TELÉFONO: 310231047
 CONDUCTOR: Freddy Hincapié PLACA NO.: NV 147

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE: Freddy Hincapié

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Freddy Hincapié
cc 105051664



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
 Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8530
 gravas@tritungas.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
13/03/26	9:54	Nº 1846

CLIENTE: Altamira NIT. O.C.C.: 310231047
 DIRECCIÓN: Pto. López TELÉFONO: 310231047
 CONDUCTOR: Freddy Hincapié PLACA NO.: NV 147

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE: Freddy Hincapié

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Freddy Hincapié
cc 105051664

30912

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 159 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravasthumax@gmail.com

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 159 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravasthumax@gmail.com

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
NIT 901884681-7

FECHA

13/03/26

HORA DE SALIDA

7 AM.

REMISIÓN

Nº 1841

CLIENTE: Alfonso... NIT. O.C.C. 218231014

DIRECCIÓN: ... TELÉFONO: ...

CONDUCTOR: ... PLACA NO.: ...

FECHA

12/03/26

HORA DE SALIDA

2:30

REMISIÓN

Nº 1839

CLIENTE: Alfonso... NIT. O.C.C. 218231014

DIRECCIÓN: ... TELÉFONO: ...

CONDUCTOR: ... PLACA NO.: ...

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPECHO:

NOMBRE: Edith Jarama

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE: Luis Rodríguez

FIRMA:

C.C.: 5656100

OBSERVACIONES:

Freddy Vinasota
CC 115511664

30913

Planta / Km 15 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Ica
Vegas del Guaymba - Villavieja/Maldonado
CEL. 305 359 8242 - 310 236 8600 - 320 273 8630
gravis@triturumax.com

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
NIT 901884681-7

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
10/02/25	10:45	Nº 1809

CLIENTE: ALVARO MENEZES NIT. O.C.C.: 1000000000000
DIRECCIÓN: Camino a Santa Rosa TELÉFONO: 310 236 8600
CONDUCTOR: Freddy Hincshelg PLACA NO.: 2011414

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		13

NOTA:

DESPACHO: 1
NOMBRE: Freddy
FIRMA: [Signature]

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincshelg
cc: 1000000000000

Planta / Km 15 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Ica
Vegas del Guaymba - Villavieja/Maldonado
CEL. 305 359 8242 - 310 236 8600 - 320 273 8630
gravis@triturumax.com

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
NIT 901884681-7

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
10/02/26	9:00	Nº 1807

CLIENTE: ALVARO MENEZES NIT. O.C.C.: 1000000000000
DIRECCIÓN: Camino a Santa Rosa TELÉFONO: 310 236 8600
CONDUCTOR: Freddy Hincshelg PLACA NO.: 2011414

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		13

NOTA:

DESPACHO: 1
NOMBRE: Freddy
FIRMA: [Signature]

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincshelg
cc: 1000000000000

30914

Planta / Km 15 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 559 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastihumaz@gmail.com



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
Nit 901884681-7

UNO
12081

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
7/3/26	10:25	Nº 1788

CLIENTE: Alfama Importadora NIT. O.C.C.: 3000000000
DIRECCIÓN: Barrio de la Cruz TELÉFONO: 3000000000
CONDUCTOR: Alfonso Torres PLACA NO.: SV 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	1.274 m³
2	ARENA PLANTA	1.274 m³
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	1.274 m³
4	GRAVILLA DE 1"	1.274 m³
5	GRAVILLA DE 3/4"	1.274 m³
6	GRAVILLA DE 1/2"	1.274 m³
7	SUB-BASE	1.274 m³
8	BASE	1.274 m³
9	MATERIAL CRUDO	1.274 m³
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Alfonso Torres
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

Planta / Km 15 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 559 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastihumaz@gmail.com



GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
Nit 901884681-7

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
10/3/26	7:35	Nº 1806

CLIENTE: Alfama Importadora NIT. O.C.C.: 3000000000
DIRECCIÓN: Barrio de la Cruz TELÉFONO: 3000000000
CONDUCTOR: Alfonso Torres PLACA NO.: SV 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	1.274 m³
2	ARENA PLANTA	1.274 m³
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	1.274 m³
4	GRAVILLA DE 1"	1.274 m³
5	GRAVILLA DE 3/4"	1.274 m³
6	GRAVILLA DE 1/2"	1.274 m³
7	SUB-BASE	1.274 m³
8	BASE	1.274 m³
9	MATERIAL CRUDO	1.274 m³
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Alfonso Torres
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

30915



GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Va Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 238 6600 - 320 273 8630
gravas@tritungas.com

12080

4/26

8:50

REMISIÓN No 1786

CLIENTE: Alfonso Pineda NIT. O.C.C.: 1000000000000

DIRECCIÓN: Pto. Guayurba TELÉFONO: 310 238 6600

CONDUCTOR: SW 674000 PLACA NO.: SW 674000

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO: Alfonso Pineda

NOMBRE: Alfonso Pineda

FIRMA: Alfonso Pineda

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE: Alfonso Pineda

FIRMA: Alfonso Pineda

C.C.: Alfonso Pineda

OBSERVACIONES:



GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Va Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 238 6600 - 320 273 8630
gravas@tritungas.com

7226

7:20

REMISIÓN No 1782

CLIENTE: Alfonso Pineda NIT. O.C.C.: 1000000000000

DIRECCIÓN: Pto. Guayurba TELÉFONO: 310 238 6600

CONDUCTOR: SW 674000 PLACA NO.: SW 674000

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO: Alfonso Pineda

NOMBRE: Alfonso Pineda

FIRMA: Alfonso Pineda

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE: Alfonso Pineda

FIRMA: Alfonso Pineda

C.C.: Alfonso Pineda

OBSERVACIONES:

30916


GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7
Planta / Km 16 Va. Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurabo - Villavicencio/Meta
CEL. 305 339 8242 - 319 236 0000 - 320 273 9030
gravas@tritungas.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
6/3/20	9:20	Nº 1777

CLIENTE: Alfonso Angón NIT. O C.C.: 31922410
DIRECCIÓN: Carretera 19 TELÉFONO: 31922410
CONDUCTOR: Alfonso Ramos PLACA NO.: SV 1044

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	10
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		10

NOTA:

DESPECHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:


GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7
Planta / Km 16 Va. Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurabo - Villavicencio/Meta
CEL. 305 339 8242 - 319 236 0000 - 320 273 9030
gravas@tritungas.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
6/3/20	11:10	Nº 1778

CLIENTE: Alfonso Angón NIT. O C.C.: 31922410
DIRECCIÓN: Carretera 19 TELÉFONO: 31922410
CONDUCTOR: Alfonso Ramos PLACA NO.: SV 1044

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		10

NOTA:

DESPECHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

30917-

GRUPOS Y ARENAS
TRITONMAX S.A.S
 NIT 901884681-7
 Planta / Km 15 Vía Pta. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa las
 Vegas del Guapirito - Villavicencio Meta
 CEL 305 359 8242 - 310 235 0600 - 320 273 8630
 gravastibumas@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
30/06/2020	9:30	Nº 1772
CLIENTE: _____ NIT O C.C.: _____ DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____ CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____		

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA: _____

DESPACHO: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

RECIBIDO CONDUCTOR: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.C.: _____

OBSERVACIONES: _____

GRUPOS Y ARENAS
TRITONMAX S.A.S
 NIT 901884681-7
 Planta / Km 15 Vía Pta. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa las
 Vegas del Guapirito - Villavicencio Meta
 CEL 305 359 8242 - 310 235 0600 - 320 273 8630
 gravastibumas@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
30/06/2020	7:00	Nº 1770
CLIENTE: _____ NIT O C.C.: _____ DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____ CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____		

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA: _____

DESPACHO: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

RECIBIDO CONDUCTOR: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.C.: _____

OBSERVACIONES: _____

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa la
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 238 0600 - 320 273 8530
gravas@tritumax.com

REMISIÓN
No 1762

FECHA: 4/3/26 HORA DE SALIDA: 9:00

CLIENTE: Alfonso Lopez NIT. O C.C.: 1000000000000
DIRECCIÓN: 1000000000000 TELÉFONO: 1000000000000
CONDUCTOR: Alfonso Lopez PLACA NO.: 1000000000000

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO: Alfonso Lopez

NOMBRE: Alfonso Lopez
FIRMA: Alfonso Lopez

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE: Alfonso Lopez
FIRMA: Alfonso Lopez
C.C.: 1000000000000

OBSERVACIONES: Freddy Hincapié CC 110537861

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa la
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 238 0600 - 320 273 8530
gravas@tritumax.com

REMISIÓN
No 1764

FECHA: 4/3/26 HORA DE SALIDA: 10:40

CLIENTE: Alfonso Lopez NIT. O C.C.: 1000000000000
DIRECCIÓN: 1000000000000 TELÉFONO: 1000000000000
CONDUCTOR: Alfonso Lopez PLACA NO.: 1000000000000

30918

30919

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
 NIT 901884681-7
 Planta / Km 16 Vía Pto. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guayuruba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
 gravas@tritumax@gmail.com

FECHA: 4/3/26 HORA DE SALIDA: 7:30
 REMISIÓN No 1760

CLIENTE: Atun...
 DIRECCIÓN: P...
 CONDUCTOR: ...
 NIT. O C.C.: ...
 TELÉFONO: ...
 PLACA NO.: ...

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
 NOMBRE:
 FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
 NOMBRE:
 FIRMA:
 C.C.:

OBSERVACIONES:
 Freddy Hincapié
 CC 105637864

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
 NIT 901884681-7
 Planta / Km 16 Vía Pto. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guayuruba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
 gravas@tritumax@gmail.com

FECHA: 2/3/26 HORA DE SALIDA:
 REMISIÓN No 1747

CLIENTE: Atun...
 DIRECCIÓN: P...
 CONDUCTOR: ...
 NIT. O C.C.: ...
 TELÉFONO: ...
 PLACA NO.: ...

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:
 NOMBRE:
 FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
 NOMBRE:
 FIRMA:
 C.C.:

OBSERVACIONES:
 Freddy Hincapié
 CC 105637864

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
grastritumax@gmail.com



FECHA: 23/06/2020 HORA DE SALIDA: 1:15

REMISIÓN No 1743

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapié
cc 1100031861

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
grastritumax@gmail.com



FECHA: 23/06/2020 HORA DE SALIDA: 11:15

REMISIÓN No 1744

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapié
cc 1100031861

12608

Freddy Hincapié
cc 1155537864

OBSERVACIONES:

C.C.:
FIRMA:
NOMBRE:

RECIBIDO CONDUCTOR:

FIRMA:
NOMBRE:

DESPACHO:

NOTA:

No.		PRODUCTOS		CANTIDAD
1		ARENA LAVADA		
2		ARENA PLANTA		
3		GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4		GRAVILLA DE 1"		
5		GRAVILLA DE 3/4"		15
6		GRAVILLA DE 1/2"		
7		SUB-BASE		
8		BASE		
9		MATERIAL CRUDO		
OTROS				
TOTAL		1		

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.829-5 CEL: 318.2629117

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.829-5 CEL. 318 2629117

CLIENTE: Alcar Ingeniería
DIRECCIÓN: Monteros
CONDUCTOR: Silvio Ramos
NIT. O.C.C.: 318270449
TELÉFONO: 318270449
PLACA NO.: 318270449

REMISIÓN
Nº 1907

FECHA: 25/03/2011
HORA DE SALIDA: 1:00

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S.
NIT 901884681-7



Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravas@tritumax@gmail.com

30922

GRAN Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
 NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 319 236 6600 - 320 273 8630
 granasthumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
03/06/2024	7:50	Nº 1776

CLIENTE: GRAN Y ARENAS TRITUMAX S.A.S NIT. O C.C.: 901884681-7

DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO META TELÉFONO: 319 236 6600

CONDUCTOR: FRANCISCO GARCIA PLACA NO.: 57N142

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Francisco Garcia

GRAN Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
 NIT 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
 Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
 Vegas del Guayurba - Villavicencio/Meta
 CEL. 305 359 8242 - 319 236 6600 - 320 273 8630
 granasthumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
03/06/2024	11:10	Nº 1773

CLIENTE: GRAN Y ARENAS TRITUMAX S.A.S NIT. O C.C.: 901884681-7

DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO META TELÉFONO: 319 236 6600

CONDUCTOR: FRANCISCO GARCIA PLACA NO.: 57N142

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2"	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
TOTAL		15

NOTA:

DESPACHO:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:

NOMBRE:

FIRMA:

C.C.:

OBSERVACIONES:

Francisco Garcia



**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**



30923

ANEXO 24. : ACTA AMBIENTAL

 Cormacarena	Código: F-GA-43
	Versión: 03
ACTA DE VISITA PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL Y/O CARBÓN VEGETAL	Fecha: 28/Jul/2023

3. OBSERVACIONES	
<p>Se hizo recorrido se evidencian el aprovechamiento de los individuos atorgados</p> <p>Se socializa sobre el cumplimiento del Acuerdo y se dan soluciones oportunamente</p> <p>Con respecto a la medida compensatoria ante CORMACARENA con radicado E-007679 del 24 marzo de 2023 se recibió amparo.</p>	
FIRMAS DE QUIEN(ES) PARTICIPA(N) EN LA VISITA CORMACARENA	
Nombre: <u>Luis Felipe Llanos Mayor</u> Cargo: <u>EPS Ingeniero Forestal</u> Firma: <u>[Firma]</u>	Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
Nombre: <u>Luis (ARIK) GUTIERREZ B.</u> Cédula: <u>3321412647</u> Dirección: <u>Alcaldía UCCO</u> Teléfono: <u>3102254283</u>	Nombre: <u>Andrés Ruiz González</u> Cédula: <u>40-241812</u> Dirección: <u>Colegio Alfonso López</u> Teléfono: <u>3213836736</u>
Autorizo en los términos del artículo 56 del C.P.A.C.A a ser notificado en el correo electrónico. SI (X) NO () Correo: <u>inf@estructura@uillb.com.co</u> Firma: <u>[Firma]</u>	Autorizo en los términos del artículo 56 del C.P.A.C.A a ser notificado en el correo electrónico. SI (X) NO () Correo: <u>consu@uillb.com.co</u> Firma: <u>[Firma]</u>
NO HUBO PRESENCIA () EL USUARIO SE REHÚSA A FIRMAR ()	
Indique si durante la diligencia se presentaron situaciones que obstaculizaron la acción de la Autoridad Ambiental. SI _____ NO _____ En caso afirmativo, señale ¿cuál?:	
La presente visita se termina siendo las _____ del día _____ del mes _____ del año 202____.	
LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SE BASA SOBRE EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y EL DEBIDO PROCESO	

ormacarena	Versión: 03
ACTA DE VISITA PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL Y/O CARBÓN VEGETAL	Fecha: 28/Jul/2023

1. DATOS GENERALES		
FECHA: 25-Mar-2024	HORA: 9:00 a.m	EXPEDIENTE No: PNA 3.349.023.16
AUTO No. 1561.12.61.26.0431	RADICADO:	
VISITA DE INICIO: _____	PRÓRROGA: _____	VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: ☒
ÁRBOLES AISLADOS EN RIESGO: _____		
NOMBRE DEL TITULAR O PETICIONARIO: _____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:		
AISLADO ☒ PERSISTENTE _____ ÚNICO _____ DOMÉSTICO _____ RIESGO _____		
SOLICITUD CARBÓN VEGETAL: _____		
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: Alto Pomposo	
NOMBRE DEL PREDIO: Tablón Eduativo Lopez Pumarejo		
NOMBRE DE PREDIOS CON QUE LIMITA: _____		
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO		
G.P.S	X	Y
Adriano Concha Cárdenas	73°23'48.69" Oes.	4°3'53.44" N

2. REVISIÓN DE INVENTARIO					
No. Árbol	Especie (Nombre común)	DAP (Centímetros)	Altura (Metros)	Coordenadas	Observaciones
1.		λ			
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					





**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**



30926

ANEXO 25. CORRESPONDENCIA AMBIENTAL

30927

		ACTA DE REUNIÓN PROYECTOS	
COMITÉ/REUNIÓN:	Visita Control y seguimiento Aprovechamiento Acad.	ACTA N°:	05.
LUGAR/ PROYECTO:	Reconstrucción Institución Educativa Alf López	FECHA:	25 03 26
ASISTENTES			
Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Hector Vilam Vargas	Ing Residente Intv	Intendencia	
Wladimir Gutierrez	Alcalde	Alcaldia	
Wladimir Gutierrez	Ing Ambiental	Corporación	
ASTIN Ruiz	Comité	Consorcio Edu	
TEMAS A TRATAR / ORDEN DEL DÍA			
- Permiso de Aprovechamiento Acad. - Medida de Compensación			
- Visita Seguimiento y Control Resolución PS-61 1.2.6-24 0118			
Expediente N° PM-6A 3.37.9.023.16			
- AUTO N° PS-61 1.2.64.26 0431 notificado 10 Marzo 2018			
- AUTO N° PS-61 1.2.64.25 2673 expediente 3.37.9.023 016			
Radicado 07629 (Solicitud cambio compensación) 24/03/26			
DESARROLLO			
Atención: Nota: Oportunidad: Metodología: ahuyentamiento			
No se realizaron trabajos de fondo.			
COMPROMISOS			
Descripción	Responsable	Fecha	

Villavicencio, 17 de marzo de 2026
CE-201-126-541

Señores
CL CASETONES S.A.S
Orinson López Fuentes
Rep legal

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1279 de 2023 "Reconstrucción Total De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio Meta".

ASUNTO: Solicitud de disposición final adecuada de material casetón

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del proyecto denominado "Reconstrucción Total De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio Meta". Identificado con Nit: 901687301-9 nos permitimos solicitar de manera formal su colaboración en la adecuada gestión de los residuos generados durante las actividades constructivas.

Específicamente se requiere la disposición final del material tipo casetón (icopor/poliestireno expandido -EPS) provenientes de la actividad de construcción de placas de entepiso. En este sentido, solicitamos que dicho material sea gestionado mediante una empresa ambiental certificada, garantizando:

- Recolección y transporte por gestor autorizado
- Manejo adecuado del residuo (aprovechamiento o disposición final)
- Disposición en sitio autorizado
- Emisión de certificado de disposición a nombre del proyecto


Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

Carrera 35 # 34A - 46 Barrio Barzal - Piso 2
Consortiomh@cvg.com.co

Gregorio Doris
10738/18074
17-03-26

Agradecemos su atención solicitamos amablemente el envío de los respectivos soportes y certificados una vez realizada la gestión

Atentamente,



ASTRID RUIZ GÓNZALEZ

Ing. Ambiental

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30930

ANEXO 26. LISTADO DE ASISTENCIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO BIOPSICOSOCIAL EN OBRA.

30931

C&G		LISTADO DE ASISTENCIA			
CIUDAD Y FECHA:		LUGAR:			
TEMAS TRATADOS:		DURACIÓN:			
INDUCCIÓN	☐	CHARLA/DIVULGACIÓN	☐		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☒	REUNIÓN	☐	OTRO CUAL? _____	
N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA	
1	Maria del Pilar Sepulveda	Consorcio C4G	Residente Social		
2					
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALEIFICACION *
1	Orlando Moreno	PRAGMA	Asistente		
2	Rafael Perez	PRAGMA	Ofi		
3	Verson Cardenas A	PRAGMA	Of		
4	Jose Fernando Gula	PRAGMA	Asistente		
5	Alfred Andres	PRAGMA	Herrero		
6	Vincent Ulla	PRAGMA	Herrero		
7	José Bayte	PRAGMA	Herrero		
8	Carlos Estenro	PRAGMA	Asistente		
9	Ther Lucarini	PRAGMA	Asistente		
10	Alfredo Rincón	PRAGMA	Ofi		
11	Herando Sando	PRAGMA	Ofi		
12	Amilth pedroza	PRAGMA	Ofi		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTAL PARTICIPANTES: _____					
OBSERVACIONES: _____					
* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento					



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30932

**ANEXO 27: RESPUESTA EMSA DE PODA JUNTA ACCIÓN
COMUNAL ALTOS DE POMPEYA**

GC-OSCV - 20263510075371



Villavicencio, 06-03-2026

Al contestar por favor cite estos datos:
GC-OSCV - 20263510075371

Señor (a):
JULIANA JONES ORDOÑES
CR 35 34 A 46 BRR BARZAL PISO 2
consorciomh@cyg.com.co
Villavicencio, Meta

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Conforme a autorización radicada bajo el No. 20263500025057 del 23-02-2026 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), me permito notificarlo personalmente por medio electrónico de la decisión GC-OSCV - 20263510075371, Por la cual se decide y/o da respuesta a su petición, queja, reclamo y/o recurso, remitiendo copia íntegra del acto administrativo.

Se advierte que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

La presente notificación se entenderá surtida el día de recibo del presente oficio.

ALICIA GAONA
Analista Coordinador Servicio al Cliente
Notificador designado y/o responsable

Proyectó: Camilo Pedroza - Asistente Administrativo Contratista
Revisó: Sofia Rodríguez Leal - Abogada Contratista
Cristian Camilo Pedroza

Calle 37 A No. 45-53 Barzal alto, PBX 6614000
Línea Gratuita Nacional - 018000918615
email: pqr@emsa-esp.com.co
Villavicencio - Meta - Colombia
Nit: 892.002.210-6

www.electrificadoradelmeta.com.co



AM-2000931



GC-OSCV - 20263510075371



Villavicencio, 06-03-2026

Al contestar por favor cite estos datos:
GC-OSCV - 20263510075371

Señor (a):
JULIANA JONES ORDOÑES
CR 35 34 A 46 BRR BARZAL PISO 2
consorciohm@cyg.com.co
Villavicencio, Meta

Referencia: Radicado 20263500025057 del 23-02-2026
Asunto: Citación para notificación personal

Respetado(a) señor(a):

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001, y en concordancia con los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA (Ley 1437 de 2011), la notificación de las decisiones administrativas debe realizarse en la forma allí prevista.

En consecuencia, me permito citarlo(a) para que se notifique personalmente del contenido de la Decisión Administrativa No. GC-OSCV - 20263510075371 del 06-03-2026 para lo cual podrá:

Remitir diligenciado el formato de notificación personal que aparece al reverso de la presente citación al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co, o Presentarlo personalmente en cualquiera de las siguientes oficinas de atención:

Oficinas de atención al usuario:

- ✓ Villavicencio – C.C. Llanocentro: Calle 15 No. 38-40 Local 1-07. Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).
- ✓ Acacías: Calle 14 No. 22-11, Barrio Cooperativo. Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).
- ✓ San Martín: Carrera 6 No. 9-09, Centro. Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).
- ✓ Granada: Carrera 13 No. 25-62, Locales 104-105. Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).
- ✓ San Juan de Arama: Calle 11 No. 08-77, Barrio Centro, lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).
- ✓ Puerto López: Carrera 4 No. 3-26, Barrio Abel Rey. Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).
- ✓ Puerto Gaitán: Carrera 5 con Calle 8ª, Edificio Luxor Plaza. Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).
- ✓ Restrepo: Calle 8 Carrera 1, Local 215, Centro Comercial Sunrise. Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Jornada continua).

En caso de no surtir la notificación personal o por correo electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la presente citación, la notificación se realizará por aviso, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del CPACA (Ley 1437 de 2011), entendiéndose surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cordialmente,

ALICIA GAONA
Analista Coordinador Servicio al Cliente
Proyectó: Camilo Pedroza - Asistente Administrativo Contratista
Revisó: Sofía Rodríguez Leal - Abogada Contratista
Cristian Camilo Pedroza

Calle 37 A No. 45-53 Barzal alto, PBX 6614000
Línea Gratuita Nacional - 018000918615
email: pqr@emsa-esp.com.co
Villavicencio - Meta - Colombia
Nit: 892.002.210-6

www.electrificadoradelmeta.com.co



AM-2000831





**DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DECISION GC-OSCV -
20263510075371**

En _____, a los ____ días del mes de _____ del año _____, siendo las _____, compareció el/la señor(a) _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, actuando en calidad de _____, con el fin de notificarse personalmente del oficio o decisión No. GC-OSCV - 20263510075371 del 06-03-2026, mediante el cual la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.** hace entrega de copia íntegra de la decisión administrativa.

Se le informa que contra este acto administrativo no proceden recursos, de conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), toda vez que la respuesta no constituye una negativa del servicio, suspensión, terminación o facturación que lo amerite.

Firma del Notificado

Firma del Notificador (emsa)

Nombre:
C.C.

Nombre:
C.C.

Calle 37 A No. 45-53 Berzel alto, PBX 6614000
Línea Gratuita Nacional - 018000918615
email: pqr@emsa-esp.com.co
Villavicencio - Meta - Colombia
Nit: 892.002.210-6

www.electrificadoradelmeta.com.co



AM-2000931



GC-OSCV - 20263510075371



Al contestar por favor cite estos datos:
GC-OSCV - 20263510075371

Villavicencio, 06-03-2026

Señor (a):
JULIANA JONES ORDOÑES
CR 35 34 A 46 BRR BARZAL PISO 2
consorciomh@cyg.com.co
Villavicencio, Meta

Referencia: Radicado emsa: 20263500025057 del 23-02-2026
Código: 214852686
Solicitud. 63011 – 247543

Asunto: Respuesta a su solicitud de poda de árboles.

Respetado(a) Usuario(a):

Reciba un cordial saludo en nombre de la Electrificadora del Meta S.A. ESP. En atención a la solicitud mediante la cual requiere la poda de un árbol ubicado el Km 27 de la vía Puerto López.

Al respecto es necesario precisar los siguientes aspectos:

En atención a su reclamación, la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. procedió a crear en el Sistema de Información Eléctrica Comercial (SIEC), la solicitud No. 247543, se remitió el caso al área de Mantenimiento Líneas y Redes, quienes informaron lo siguiente:

LUEGO DE REALIZAR LA VISITA AL SITIO SE CONFIRMA LA NECESIDAD DE PODAS EN MEDIA TENSIÓN, SE COORDINA LA PODA DE LA VEGETACIÓN QUE INTERFIERE CON LAS REDES SOLO EN LA DIRECCIÓN INSTITUCION ALFONSO LOPEZ PUMAREJO VDA ALTO POMPEYA, ESTO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA CORPORACIÓN CORMACARENA QUE OTORGA LA EMSA ESP EL PERMISO PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ÁRBOLES EN LOS CORREDORES DE LÍNEA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Calle 37 A No. 45-53 Barzal alto, PBX 6614000
Línea Gratuita Nacional - 018000918615
email: pqr@emsa-esp.com.co
Villavicencio - Meta - Colombia
Nit: 892.002.210-6

www.electrificadoradelmeta.com.co



AM-2000031



De acuerdo con lo anterior y en atención a su petición, le informamos que:

1. Respecto a la poda técnica solicitada, una vez realizada la visita técnica al sitio, se confirmó la necesidad de efectuar labores de poda en redes de media tensión, debido a la interferencia de la vegetación con la infraestructura eléctrica. En consecuencia, la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. coordinó la programación de la poda de árboles ubicados en la Institución Alfonso López Pumarejo Vereda Alto Pompeya para el segundo trimestre del año 2026, con el fin de mitigar el riesgo eléctrico identificado.

De esta forma esperamos haber dado respuesta a su inquietud y le reiteramos nuestra mejor disposición en brindar una atención óptima a nuestros clientes quedando atentos a cualquier sugerencia que mejore el desarrollo de nuestras actividades en la zona.

Es muy importante para la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., estar en contacto con usted y a la vez ofrecerle un servicio con calidad y oportunidad, por eso siempre estaremos prestos a cualquier inquietud o trámite que sea solicitado en cualquiera de nuestros Centros de Servicio al Cliente, también puede llamar a línea 018000918615, Marcación abreviada 115, sólo desde líneas Movistar, línea móvil 3160278035 y WhatsApp 3185557464.

Obrando dentro de los términos establecidos en el Artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y habiendo procedido de conformidad a las normas vigentes, la Electrificadora del Meta S.A. ESP le notifica la presente información.

Contra la presente información no proceden Recursos, según lo establecido en el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).


Cordialmente,

ALICIA GAONA
Analista Coordinador Servicio al Cliente

Proyectó: Camilo Pedroza - Asistente Administrativo Contratista
Revisó: Sofía Rodríguez Leal - Abogada Contratista
Cristian Camilo Pedroza



Ilustración 26 Personal Vinculado por Empresas marzo 2026

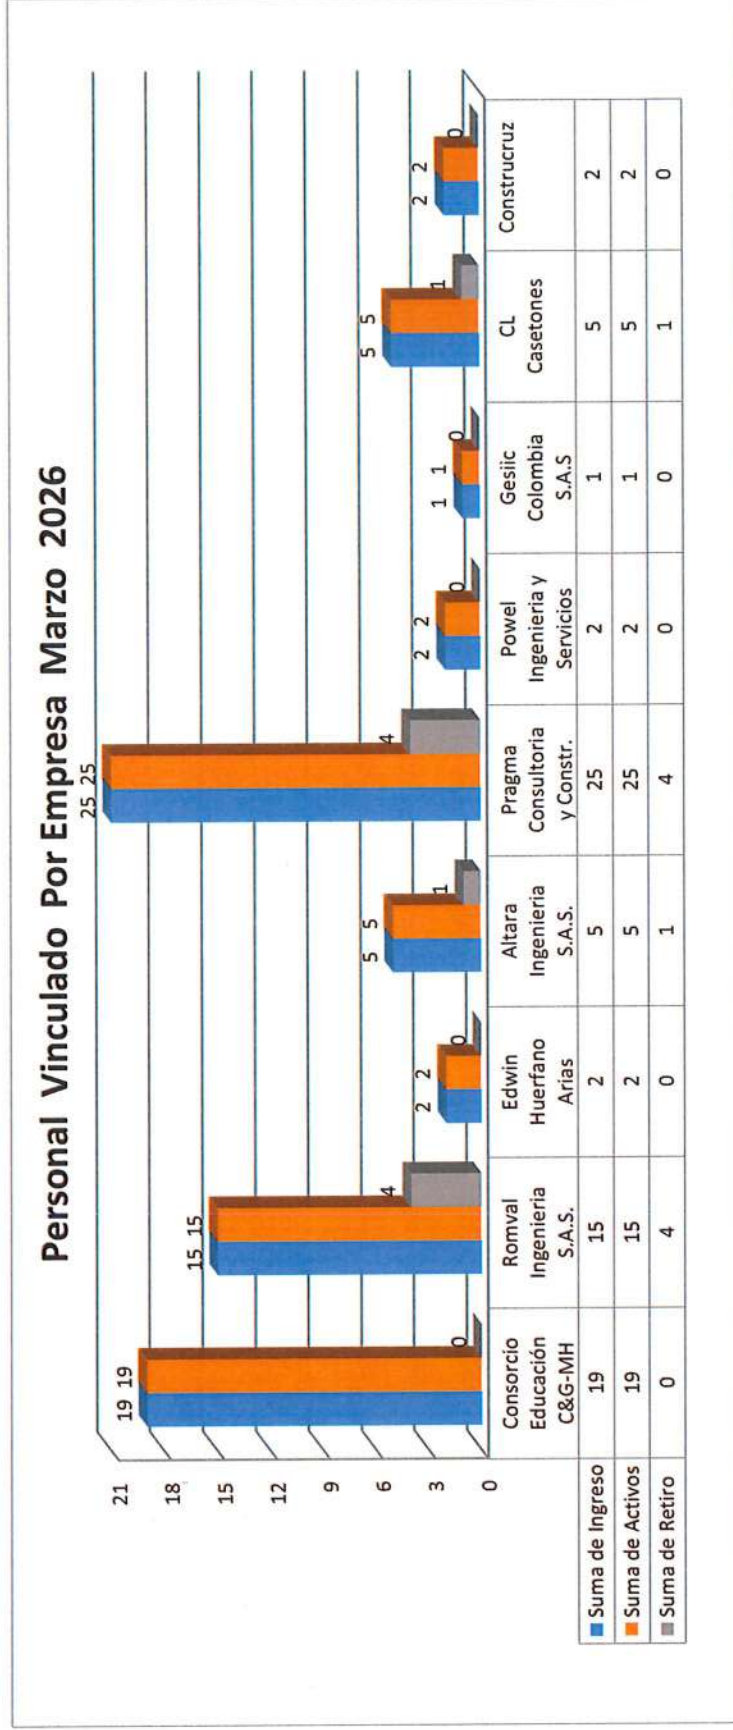

Además, se lleva una matriz de control del personal directo e indirecto de obra por trabajador y por empresa las que continúan y/o terminen sus labores con el objeto de controlar la autoliquidación de la seguridad social.




INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30939

71

Ilustración 27 Personal Vinculado por Profesión marzo 2026

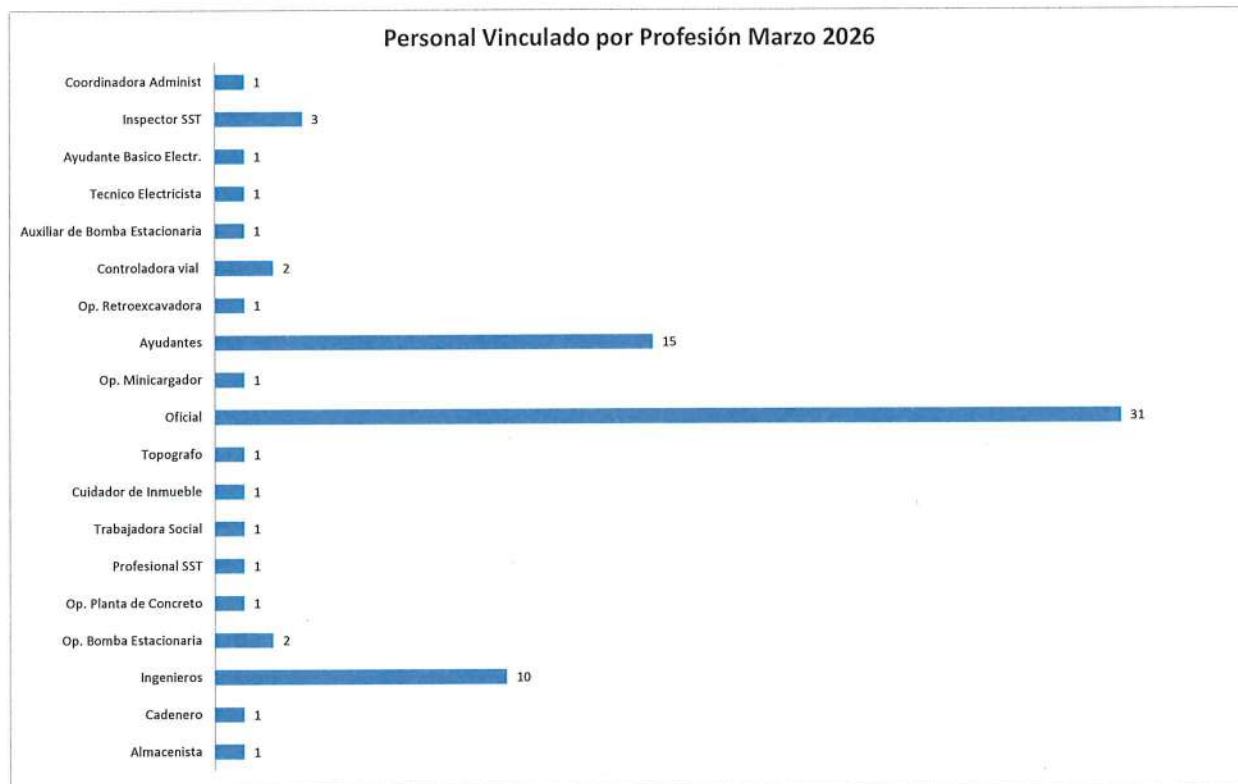

Durante el mes de marzo de 2026, el personal vinculado por profesiones, se mantuvieron activos todos los cargos hubo una variación en los cargos de operador de bomba, ayudante y oficial por el ingreso y retiro del personal.



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30940

77

José Ernesto Cetina	4.102.432	Ayudante de Obra	Romval Ingeniería	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
Fernando Berrio	1.003.931.983	Ayudante de Obra	Romval Ingeniería	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
Rufino Mercado Castro	9.251.604	Ayudante de Obra	Romval Ingeniería	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	13/11/2025	
Over Manuel Ríos Gutiérrez	1.067.852.238	Ayudante de Obra	Romval Ingeniería	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	COMPENSAR	13/11/2025	28/03/2026
Teobaldo Martínez R.	11.798.455	Oficial	Romval Ingeniería	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	1/12/2025	-
Jonathan Enrique Gutiérrez	1.221.973.762	Ayudante de Obra	Romval Ingeniería	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	3/12/2025	
Jhon J. Terán R.	1.053.122.484	Oficial	Romval Ingeniería	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/12/2025	28/03/2026
Ángela P. García	1.108.928.812	Inspector	Romval	SALUD	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	29/12/2025	07/03/2026

Carrera 35 # 34A - 46 Barrio Barzal - Piso 2

Consortiomh@cyg.com.co

77



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30941

78

Morales		SST	Ingeniería	TOTAL				
Néstor Rodríguez R.	9.154.867	Oficial	Romval Ingeniería	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/01/2026
Diego Fernando Rodríguez M.	1.121.906.899	Ingeniero Residente	Romval Ingeniería	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	23/01/2026
Francisco José Vásquez	1.065.841.379	Oficial	Romval Ingeniería	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	13/02/2026
Jheisson Stick Pérez	84.459.874	Oficial	Romval Ingeniería	MUTUALSER	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/02/2026
Yuleidi Maria Córdoba	1.003.787.891	Inspector SST	Romval Ingeniería	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	12/03/2026

Carrera 35 # 34A - 46 Barrio Barzal - Piso 2

Consorciomh@cyg.com.co


78



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



90

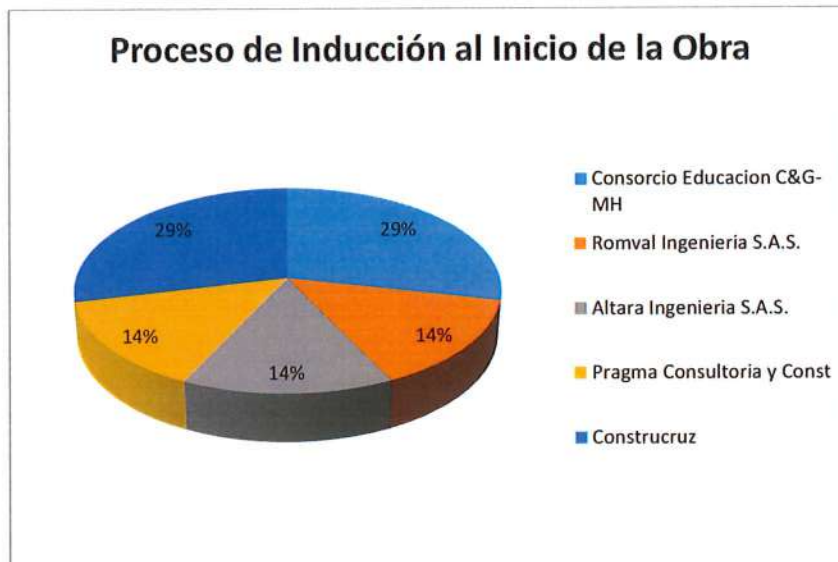

5.4 Retiros de Personal

En el mes de marzo de 2026 se generaron diez (10) retiros de colaboradores de los contratistas activos en el proyecto. Para tal fin se solicita la entrega de la documentación que garantice que las empresas contratistas realizaron los respectivos procesos de liquidación, notificación de examen de egreso y/o realización por parte del ex colaborador en tiempo establecido, paz y salvo, documentos firmados por el personal saliente. Ver anexo 15. Documentos de Retiro de Personal. Nota: En caso que los documentos del personal no se entreguen oportunamente por parte de los contratistas se generan oficio y/o correspondencia por correo para solicitar la documentación.

5.5 Charlas de Seguridad y Capacitaciones.

Nuestros colaboradores en el periodo actual reciben información teórica y práctica, adecuada y en forma periódica para las funciones inherentes a su actividad en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ver Anexo 16. Cronograma de Capacitaciones. Ver Anexo 17. Listado de Asistencia.



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30943

ANEXO 12. SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO Y CONTRATISTAS



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30944

JAIME BUITRAGO

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													LIQUIDACION DE APORTES												
DATOS DEL AFILIADO													VALOR IBC												
NOVEDADES													FONDO SOLIDAR PENSION												
APORTES													APORTE VOLUNT PENSION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZACION												
COTIZACION													COTIZ												



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30947

DIEGO PEREZ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
01000276725	0	POWER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 36 A 58 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7684555
							Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
026-03	2026-04	198440828	9502633248	E		2026/04/09	2026/04/06	BANCO DE BOGOTA	0
									\$161,971,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombre	Ingre te	Ida da	de pa go	va co los si ge im va ac vici li ci p t o	Codig o	IBC	Aporte	Codig o	IBC	Aporte	Codig o	IBC	Aporte	Codig o	IBC	Tarifa	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Total Aportes SENA e ICBF			
SUCURSAL: PRINCIPAL (233 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO o (233 Afiliados)																											
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (155 Afiliados)																											
1	CC	1004037930				X			\$85,576,100			\$535,915,225	\$21,051,700			\$540,801,409	\$21,242,800		\$535,915,225		\$0		\$0	\$161,971,800			
2	PT	6221776							\$85,576,100			\$535,915,225	\$21,051,700			\$540,801,409	\$21,242,800		\$535,915,225		\$0		\$0	\$161,971,800			
3	CC	11318999							\$60,279,900			\$377,808,579	\$14,845,300			\$381,645,866	\$14,999,900		\$377,808,579		\$0		\$0	\$113,724,400			
4	CC	8800429							\$321,200			\$2,332,000	\$93,300			\$1,755,878	\$70,300		\$1,755,878	30	\$0		\$0	\$543,900			
5	CC	77157610							\$352,800			\$2,205,000	\$88,200			\$1,755,878	\$70,300		\$1,755,878	30	\$0		\$0	\$543,900			
6	CC	77157610				X			\$39,200			\$245,000	\$9,800			\$245,000	\$9,800	14-11	3	\$245,000	\$0	3	\$0	\$58,800			
7	CC	2164413							\$392,000			\$2,450,000	\$98,000			\$2,450,000	\$98,000	14-11	30	\$2,450,000	\$0	30	\$0	\$758,400			
8	CC	7334484							\$373,200			\$2,332,000	\$93,300			\$2,332,000	\$93,300	14-11	30	\$2,332,000	\$0	30	\$0	\$722,200			
9	CC	30581771							\$373,200			\$2,332,000	\$93,300			\$2,332,000	\$93,300	14-11	30	\$2,332,000	\$0	30	\$0	\$722,200			
10	CC	1043130652				X			\$352,800			\$2,205,000	\$88,200			\$2,205,000	\$88,200	14-11	27	\$2,205,000	\$0	27	\$0	\$682,700			
11	CC	1235239682				X			\$284,600			\$1,778,560	\$71,200			\$1,778,560	\$71,200	14-11	30	\$1,778,560	\$0	30	\$0	\$550,800			
12	CC	1045180478							\$149,500			\$933,816	\$37,400			\$1,018,791	\$40,800	14-11	16	\$933,816	\$0	16	\$0	\$292,700			
13	CC	1193515574							\$129,700			\$810,334	\$32,500			\$748,000	\$30,000	14-11	13	\$810,334	\$0	13	\$0	\$248,400			
14	CC	8410-8809							\$452,800			\$2,830,000	\$113,200			\$2,830,000	\$113,200	14-11	30	\$2,830,000	\$0	30	\$0	\$876,200			
15	CC	8410-8809							\$300,100			\$1,875,312	\$75,100			\$1,875,312	\$75,100	14-11	30	\$1,875,312	\$0	30	\$0	\$580,900			
16	CC	86993369							\$279,300			\$1,745,334	\$69,900			\$1,683,000	\$67,400	14-11	28	\$1,745,334	\$0	28	\$0	\$538,100			
17	CC	1023773946				X			\$18,700			\$116,727	\$4,700			\$116,727	\$4,700	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$28,100			
18	CC	79577602							\$337,000			\$2,105,878	\$84,300			\$2,105,878	\$84,300	14-11	30	\$2,105,878	\$0	30	\$0	\$657,200			
19	CC	79891309							\$392,000			\$2,450,000	\$98,000			\$2,450,000	\$98,000	14-11	30	\$2,450,000	\$0	30	\$0	\$758,400			
20	CC	74451815							\$392,000			\$2,450,000	\$98,000			\$2,450,000	\$98,000	14-11	30	\$2,450,000	\$0	30	\$0	\$758,400			
21	CC	80050434							\$299,200			\$1,870,000	\$74,800			\$1,870,000	\$74,800	14-11	30	\$1,870,000	\$0	30	\$0	\$579,000			
22	CC	1003826221							\$384,600			\$2,260,000	\$90,400			\$2,260,000	\$90,400	14-11	30	\$2,260,000	\$0	30	\$0	\$699,700			
23	CC	100382708				X			\$352,100			\$2,200,546	\$88,100			\$2,200,546	\$88,100	14-11	30	\$2,200,546	\$0	30	\$0	\$681,600			
24	CC	2855686				X			\$338,500			\$2,115,583	\$84,700			\$2,115,583	\$84,700	14-11	25	\$2,115,583	\$0	25	\$0	\$655,200			
25	CC	2955586							\$62,200			\$388,667	\$15,600			\$388,667	\$15,600	14-11	5	\$388,667	\$0	5	\$0	\$93,400			
26	CC	79221837							\$373,200			\$2,332,000	\$93,300			\$2,332,000	\$93,300	14-11	30	\$2,332,000	\$0	30	\$0	\$722,200			

[illegible]

[illegible]

30951

[illegible]

Национальный

Désigné 7 de 0

30985

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	232	\$85,576,100	\$0	\$0	\$85,576,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	47	\$21,379,800	\$0	\$0	\$21,379,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	131	\$45,953,900	\$0	\$0	\$45,953,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	\$14,859,400	\$0	\$0	\$14,859,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	233	\$34,101,200	\$0	\$0	\$34,101,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)								
COFREM	CCF34	892,000,146	3	18	\$1,618,000	\$0	\$0	\$1,618,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	\$716,900	\$0	\$0	\$716,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	40	\$3,065,100	\$0	\$0	\$3,065,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	\$513,900	\$0	\$0	\$513,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	\$135,800	\$0	\$0	\$135,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$98,000	\$0	\$0	\$98,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	155	\$14,999,900	\$0	\$0	\$14,999,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$95,200	\$0	\$0	\$95,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)								
ALIANSA SUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	233	\$21,051,700	\$0	\$0	\$21,051,700
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	2	\$598,000	\$0	\$0	\$598,000
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$1,390,500	\$0	\$0	\$1,390,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$116,900	\$0	\$0	\$116,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,774,500	\$0	\$0	\$1,774,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	34	\$3,019,900	\$0	\$0	\$3,019,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$175,700	\$0	\$0	\$175,700
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	35	\$2,979,000	\$0	\$0	\$2,979,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	12	\$810,400	\$0	\$0	\$810,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	62	\$5,031,800	\$0	\$0	\$5,031,800
TOTAL								
				233	\$161,971,800	\$0	\$0	\$161,971,800



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30957

ALTARA INGENIERIA SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900803958	1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	EQUIPOS	cr7 No. 51-75	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6401500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2026-04	2300566590	9502714782	E	2026/04/16	2026/04/16	BANCO DE BOGOTA	0	\$3.594.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES									
	25-14	900,336,004	7	1	\$1,852,900	\$0	\$0	\$1,852,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,181,200	\$0	\$0	\$1,181,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$472,000	\$0	\$0	\$472,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	\$806,100	\$0	\$0	\$806,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$472,100	\$0	\$0	\$472,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$84,900	\$0	\$0	\$84,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$210,500	\$0	\$0	\$210,500	
TOTAL				5	\$3,594,500	\$0	\$0	\$3,594,500	



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30960

ROMVAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90805727	6	ROMVAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	COMPENSAR	CR 6B # 7 55	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7746206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora		
2026-03	2026-04	212923321	9502921540	E	2026/04/09	2026/04/10	BANCO DANVIVIENDA	1	\$7,793,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes			
No.	Identificación	Nombre	Integración	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta
1	CC 1003931983	BERRIO FERNANDO																													
2	CC 4104432	CETINA JOSE																													
3	CC 1003287891	CORDOBA YULEDI																													
4	CC 1108928812	GARCIA ANGELA																													
5	CC 122173782	GUTIERREZ JONATHAN																													
6	CC 12831049	LANDAZURI AGUSTIN																													
7	CC 78675460	MARTINEZ AREL																													
8	CC 11795455	MARTINEZ FREDALDO																													
9	CC 92512604	MERCADO RUFINO																													
10	CC 84459875	PEREZ JHEISSON																													
11	CC 1067852238	RIOS OVER																													
12	CC 1121906899	RODRIGUEZ DIEGO																													
13	CC 9154867	RODRIGUEZ NESTOR																													
14	CC 1053122484	TERAN JHON																													
15	CC 1065841379	VASQUEZ FRANCISCO																													
Total		Afilados (15)																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$4,023,900	\$2,800	\$0	\$4,026,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$261,500	\$200	\$0	\$261,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$280,200	\$200	\$0	\$280,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,727,900	\$1,200	\$0	\$1,729,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,754,300	\$1,200	\$0	\$1,755,500
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	15	\$1,750,700	\$1,200	\$0	\$1,751,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,006,600	\$700	\$0	\$1,007,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$1,006,600	\$700	\$0	\$1,007,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					\$1,006,600	\$1,000	\$0	\$1,007,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$210,300	\$200	\$0	\$210,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$65,400	\$100	\$0	\$65,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$133,200	\$100	\$0	\$133,300
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$457,500	\$400	\$0	\$457,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
TOTAL				15	\$7,787,800	\$5,700	\$0	\$7,793,500



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30963

CL CASETONES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901764570-3	CL CASSETONES SAS	CARRERA 93 132 31	3213348271	clcasetones@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - MIPYME			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPS	
		76410383	21/04/2026	6	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-04	2026-03	E	\$10.505.430	\$3.143.600		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
				Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0	0	0	0	0	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0	0	0	0	0	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	70.100	0	0	0	0	0	1
ESSC18	EPS-S Emsanar	901021565-8	70.100	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	1	400	0	140.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	940.600	0	0	0	0	1	600	0	140.300	2
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	1	200	0	70.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	800803790-5	618.700				618.700	1	500	618.200		618.200	6.187	619.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	1	100	70.200	1
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	350.500	1	300	350.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora
Salud		4	420.800
Pensión		3	1.681.200
Riesgos Laborales		1	618.700
CCF		2	420.800
ESAP		0	0
ICBF		0	0
MEN		0	0
SENA		0	0
TOTALES		10	3.141.100
			3.143.600

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901764570-3	CL CASETONES SAS	CARRERA 93 132 31
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	C - MIFEME		
		CIUDAD / ORIGEN	DEPARTAMENTO
		CALI	VALLE DEL CAUCA
		CORREO	
		dcase@clasetones.com	
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANES/AA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANES/AA)	CANTIDAD EMPLEADOS
		76410393	21/04/2026	6
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2026-03	E	\$10,505,430	\$3,143,600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										PENSION										RIESGOS LABORALES										CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Categoría	Estrato	Código de Estrato	INFORMACIÓN NOVEDADES										SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					CONTRIBUCIÓN	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP	Cal. APP



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30962

CONSTRUCRUZ

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



30970

ANEXO 13. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.




INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



147603

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

30972



CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 24-03-2026 PROYECTO: CE-201 Col Alfonso Lopez
EMPLEADO: Javier Irujo Bedoya
CARGO: Asistente de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

ELEMENTO	CANT	ELEMENTO	CANT
☒ Casco de Seguridad	<u>1</u>	☒ Protectores auditivos	<u>1</u>
☒ Botas de Seguridad de material	<u>1</u>	☒ Guantes de carmaza	<u>1</u>
☒ Botas de caucho	<u>1</u>	☒ Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	<u>01</u>
☒ Traje Impermeable	<u>1</u>	☒ Tapabocas	<u>1</u>
☒ Monogafas	<u>01</u>	☒ Guantes de Caucho	<u>01</u>
☒ Pantalón	<u>02</u>	☒ Máscara de doble filtro	<u>1</u>
☒ Camisa	<u>02</u>	☒ Delantal de caucho	<u>1</u>
☐ Guantes de Punto de PVC, una cara	<u>1</u>	☒ Overol de dos piezas	<u>1</u>
☒ Otros, Cuales?: <u>(01) Guantes de Nitrilo</u>			


Certifico que:

1. Recibi la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Javier Bedoya
Firma del trabajador
N° CC. 80386966

[Firma]
Firma quien entrega: Yana Urza
Cargo: Profesional SST

30973



CONTROL ENTREGA DOTACIÓN


FECHA: 24-03-2026 PROYECTO: CE-201 Col Alfonso Lopez
EMPLEADO: Edwin Stiven Toranzo
CARGO: Ayudante de Obra


Marque con una X los elementos de dotación entregados:

ELEMENTO	CANT	ELEMENTO	CANT
☒ Casco de Seguridad	<u> </u>	☒ Protectores auditivos	<u> </u>
☒ Botas de Seguridad de material	<u> </u>	☒ Guantes de carnaza	<u> </u>
☒ Botas de caucho	<u> </u>	☒ Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	<u>01</u>
☒ Traje impermeable	<u> </u>	☒ Tapabocas	<u> </u>
☒ Monogafas	<u>01</u>	☒ Guantes de Caucho	<u> </u>
☒ Pantalón	<u>02</u>	☒ Máscara de doble filtro	<u> </u>
☒ Camisa	<u>02</u>	☒ Delantal de caucho	<u> </u>
☒ Guantes de Punto de PVC, una cara	<u> </u>	☒ Overol de dos piezas	<u> </u>
☒ Otros, Cuales?: <u>01 Buzos de Nitrilo</u>	<u> </u>		


Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.


Firma del trabajador
N° CC. 1006689217


Firma quien entrega: Diana Vega
Cargo: Profesional SST

30974



CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 27-Marzo-2026 PROYECTO: CG-201 Colegio Alfonso López
EMPLEADO: Edwin Steven Forero
CARGO: Apudante de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

ELEMENTO	CANT	ELEMENTO	CANT
☐ Casco de Seguridad		☒ Protectores auditivos	
☒ Botas de Seguridad de material	<u>01</u>	☒ Guantes de carnaza	
☒ Botas de caucho		☐ Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☒ Traje impermeable		☐ Tapabocas	
☒ Monogafas		☒ Guantes de Caucho	
☒ Pantalón		☒ Máscara de doble filtro	
☒ Camisa		☒ Delantal de caucho	
☐ Guantes de Punto de PVC, una cara		☐ Overol de dos piezas	
☐ Otros, Cuales?: <u>(01) Guantes de Nitrilo</u>			

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.


Firma del trabajador
N° CC. 1006689277


Firma quien entrega: Diana Vaz
Cargo: Profesional SST



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30975

PRAGMA

30976

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA:

12-03-26

PROYECTO:

Alfonso Lopez

EMPLEADO:

Sigfredo Renteria

CARGO:

Oficial

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

ELEMENTO	CANT	ELEMENTO	CANT
☒ Casco de Seguridad	1	☒ Protectores auditivos	1
☐ Botas de Seguridad de material		☒ Guantes de camaza	1
☐ Botas de caucho		☒ Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero	1
☐ Traje impermeable		☒ Tapabocas	1
☐ Monogafas		☐ Guantes de Caucho	
☒ Pantalón	1	☐ Máscara de doble filtro	
☒ Camisa	1	☐ Delantal de caucho	
☐ Guantes de Punto de PVC, una cara		☐ Overol de dos piezas	
☐ Otros, Cuales?:			


Certifico que:

1. Recibi la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.



Firma del trabajador

N° CC. 8601978



Firma quien entrega:

Cargo: Sst



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30992

ROMVAL

30978



CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 12/03/2026 PROYECTO: CALP CELO1
EMPLEADO: Yulendi Cordoba
CARGO: SST

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

ELEMENTO	CANT	ELEMENTO	CANT
☒ Casco de Seguridad	<u>1</u>	☒ Protectores auditivos	<u>1</u>
☒ Botas de Seguridad de material	<u>1 Par</u>	☐ Guantes de camaza	<u> </u>
☐ Botas de caucho	<u> </u>	☐ Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero	<u> </u>
☐ Traje Impermeable	<u> </u>	☒ Tapabocas	<u>1</u>
☒ Monogatas	<u>1</u>	☐ Guantes de Caucho	<u> </u>
☐ Pantalón	<u> </u>	☐ Máscara de doble filtro	<u> </u>
☒ Camisa	<u> </u>	☐ Delantal de caucho	<u> </u>
☐ Guantes de Punto de PVC, una cara	<u> </u>	☐ Overol de dos piezas	<u> </u>
☐ Círcos, Cuales?:	<u> </u>		
<u> </u>			
<u> </u>			

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Yulendi m. C.
Firma del trabajador
N° CC. 1003787871

B. M.
Firma quién entrega:
Cargo:



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30979

CONSTRUCRUZ

30980



C&G

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA:

27-03-2026

PROYECTO:

CE-201 Col. Alfonso López P.

EMPLEADO:

Jose Henry Rodriguez

CARGO:

Oficial de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

ELEMENTO	CANT	ELEMENTO	CANT
☒ Casco de Seguridad	01	☒ Protectores auditivos	01
☒ Botas de Seguridad de material	01	☐ Guantes de carmaza	
☐ Botas de caucho		☐ Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☐ Traje Impermeable		☐ Tapabocas	
☐ Monogafas		☒ Guantes de Caucho	01
☒ Pantalón	01	☐ Máscara de doble filtro	
☒ Camisa	01	☒ Delantal de caucho	01
☐ Guantes de Punto de PVC, una cara		☐ Overol de dos piezas	
☐ Otros, Cuales?:			

1- Careta Facial

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

 Firma del trabajador
 N° CC 79351020

 Firma quién entrega: Diana Vega
 Cargo:

30987



C&G

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA:

27 - 03 - 2026

PROYECTO:

CE-201 Col. Alfonso López P

EMPLEADO:

Javier Duarte Romero

CARGO:

Oficial de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

ELEMENTO	CANT	ELEMENTO	CANT
☒ Casco de Seguridad	01	☒ Protectores auditivos	01
☒ Botas de Seguridad de material	01	☒ Guantes de carmaza	01
☐ Botas de caucho		☐ Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☐ Traje Impermeable		☐ Tapabocas	
☐ Monogafas		☒ Guantes de Caucho	01
☒ Pantalón	01	☐ Máscara de doble filtro	
☒ Camisa	01	☐ Delantal de caucho	
☐ Guantes de Punto de PVC, una cara		☐ Overol de dos piezas	
☐ Otros, Cuales?:			

Certifico que:

1. Recibi la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador
N° CC. 79810487

Firma quién entrega: Diana Vega.
Cargo:



**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**



20982

ANEXO 14. HOJAS DE VIDA PERSONAL



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30083

CONSTRUCRUZ

DOCUMENTOS DE RETIRO
JHEISSON STICK PEREZ B.
OFICIAL DE OBRA

30985

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: JHEISSON STICK PEREZ BARRANCO
C.C.: 84.459.875
CARGO: obrero

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	28-mar-26
FECHA DE INICIO CONTRATO	11-feb-26
TIEMPO TOTAL LABORADO	48
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	11-feb-26

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
SUELDO BASICO:	\$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	\$ 2.000.000
SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	11-feb-26
FECHA DE CORTE PRIMA	28-mar-26
DIAS PRIMA	48,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	11-feb-26
FECHA DE CORTE CESANTIAS	28-mar-26
DIAS CESANTIAS	48,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	11-feb-26
FECHA DE CORTE VACACIONES	28-mar-26
TOTAL DIAS DE VACIONES	48,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0,00
DIAS PENDIENTES	48,00

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	11-feb-26
FECHA DE CORTE INTERESES	28-mar-26
DIAS INTERESES	48,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:									
SALARIO	1.750.905	/	30	x				\$	-
AUX TRANSPORTE	249.095	/	30	x				\$	-
VACACIONES	1.750.905	/	720	x	48			\$	116.727
CESANTIAS:	2.000.000	/	360	x	48			\$	266.667
INTERESES DE CESANTIAS	266.667	/	360	x	48	X	12%	\$	4.267
PRIMA SERVICIOS	2.000.000	/	360	x	48			\$	266.667
TOTAL DEVENGOS								\$	654.327

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%	0		\$ -
PENSION:	4%	0		\$ -
OTROS				
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				

TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
VALOR LIQUIDACION	\$ 654.327

OBSERVACIONES: SE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre ROMVAL con NIT No. 900,805727-6 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto durante el año 2026.

JHEISSON STICK PEREZ BARRANCO
84459875

REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN ROMERO VALENCIA
CC 1.101.754.071

**ROMVAL
INGENIERIA SAS
NIT.90080572-6**



ROMVAL

30986

PAZ Y SALVO

Jheison Stick Pérez Barranco, identificado con la cedula de ciudadanía N°, 84.459.875 declara que la empresa ROMVAL INGENIERIA S.A.S identificado con el NIT 9008055727 con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio, representado legalmente por el ingeniero Edwin Ferney Romero Valencia con cedula de ciudadanía N° 1.101.754.071 de Vélez Santander se encuentra a Paz y salvo por todo concepto emanado de relación laboral que fue liquidada, se firma el día 28 de marzo del 2026.

Firma


Jheison Stick Pérez Barranco
CC. 84.459.875

30987

Villavicencio 28 de marzo de 2026

Señores

Romval Ingeniería S.A.S

Asunto: Renuncia voluntaria a exámenes médicos

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo **Jheisson Stick Pérez Barranco** identificado con número de cédula de ciudadanía No 84.459.875 manifiesto que me encuentro en un buen estado de salud al terminar mi contrato laboral con ROMVAL INGENIERIA S.A.S, contrato finalizado el día 28 de marzo de 2026 por lo tanto, manifiesto de manera voluntaria que renuncio a la realización de los exámenes médicos de egreso.

Declaro que tomé la decisión libremente y que eximo de responsabilidad a la empresa ROMVAL INGENIERIA S.A.S y a sus representantes frente a cualquier situación de salud que pudiera haberse identificado mediante este examen.

Agradezco de antemano su comprensión.

Atentamente,



Jheisson Stick Pérez Barranco

cc °84.459.875

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$2,800	\$0	\$4,026,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$200	\$0	\$261,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$200	\$0	\$280,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,200	\$0	\$1,779,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$1,200	\$0	\$1,751,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF24	860,066,942	7	15	\$700	\$0	\$1,007,300
COMPENSAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$1,000	\$0	\$1,007,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)	ESSC07	806,008,394	7	1	\$200	\$0	\$210,500
FAMISANAR	EPS037	900,156,264	2	2	\$100	\$0	\$65,500
MUTUAL SER	EPS041	900,156,264	2	1	\$100	\$0	\$133,300
NUEVA E.P.S.	EPS002	800,130,907	4	7	\$100	\$0	\$70,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS005	800,251,440	6	1	\$400	\$0	\$457,900
SALUD TOTAL					\$100	\$0	\$70,200
SANITAS							
TOTAL				15	\$7,787,800	\$5,700	\$7,793,500

Carta de terminación de contrato

NOMBRE: Jheison Stick
Pérez Barranco
Cedula 84.459.875

Por medio de la presente nos permitimos informarle que su contrato de trabajo, suscrito el día 11-02-26, finaliza a partir del día 28-02-26, debido a la culminación de la labor específica para la cual fue contratado(a).

La terminación del contrato se realiza conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente y en las condiciones pactadas inicialmente, dado que se ha cumplido en su totalidad el objeto del contrato.

Agradecemos el compromiso, dedicación y servicios prestados durante el tiempo que laboró con nosotros. En los próximos días se realizará la liquidación correspondiente a salarios, prestaciones sociales y demás conceptos a que haya lugar.

Cualquier inquietud adicional podrá ser atendida en el área de recursos humanos.

Por último, le recordamos que este documento es una carta de terminación de contrato laboral y debe ser tratado con la confidencialidad y seriedad que corresponde.

Le Saluda atentamente.



Edwin Ferney
Romero Valencia
Representante Legal
C.C. 1.101.754.071 de Vélez
Tel.3184560412
Romvalingenieriasas@gmail.com


Firma
Jheison Stick Pérez Barranco

309197

DOCUMENTOS DE RETIRO
JHON JAIRO TERAN R.
OFICIAL DE OBRA

30992

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: JHON JAIRO TERAN RODRIGUEZ
C.C.: 1.053.122.484
CARGO: Obrero

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	28-mar-26	SUELDO BASICO:	\$ 1.750.905
FECHA DE INICIO CONTRATO	04-dic-25	AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 249.095
TIEMPO TOTAL LABORADO	115	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	04-dic-25	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	\$ 2.000.000
		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	04-dic-25
FECHA DE CORTE PRIMA	28-mar-26
DIAS PRIMA	115,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	04-dic-25
FECHA DE CORTE CESANTIAS	28-mar-26
DIAS CESANTIAS	115,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	04-dic-25
FECHA DE CORTE VACACIONES	28-mar-26
TOTAL DIAS DE VACIONES	115,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	115,00

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	04-dic-25
FECHA DE CORTE INTERESES	28-mar-26
DIAS INTERESES	115,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
SALARIO	1.750.905	/	30	x	6		\$ 350.181
AUX TRANSPORTE	249.095	/	30	x	6		\$ 49.819
VACACIONES	1.750.905	/	720	x	0		\$ -
CESANTIAS:	2.000.000	/	360	x	115		\$ 638.889
INTERESES DE CESANTIAS	638.889	/	360	x	115	X 12%	\$ 24.491
PRIMA SERVICIOS	2.000.000	/	360	x	115		\$ 638.889
TOTAL DEVENGOS							\$ 1.702.269

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		MENSUAL	QUINC.
SALUD:	4%	14.007	\$ 14.007
PENSION:	4%	14.007	\$ 14.007
OTROS			
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			

TOTAL DEDUCCIONES \$ 28.014

VALOR LIQUIDACION \$ 1.674.254


0

OBSERVACIONES: SE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre ROMVAL con NIT No. 900,805727-6 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto durante el año 2026.

Jhon Teran Rodriguez

JHON JAIRO TERAN RODRIGUEZ
1053122484


REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN ROMERO VALENCIA
CC 1.101.754.071

PAZ Y SALVO

Jhon Jairo Terán Rodríguez, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.053.122.484 que la empresa ROMVAL INGENIERIA S.A.S identificado con el NIT 9008055727 con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio, representado legalmente por el ingeniero Edwin Ferney Romero Valencia con cedula de ciudadanía N° 1.101.754.071 de Vélez Santander se encuentra a Paz y salvo por todo concepto emanado de relación laboral que fue liquidada, se firma el día 28 de marzo del 2026.

Firma

Jhon Jairo Terán Rodríguez

Jhon Jairo
Terán Rodríguez
CC. 1053122484

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS
----------	-----------	---------	-------	-----	---------

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$4,023,900	\$2,800	\$4,026,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$261,500	\$200	\$261,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$280,200	\$200	\$280,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,727,900	\$1,200	\$1,729,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,754,300	\$1,200	\$1,755,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$1,750,700	\$1,200	\$1,751,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,006,600	\$700	\$1,007,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$1,006,600	\$700	\$1,007,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					\$1,006,600	\$1,000	\$1,007,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$210,300	\$200	\$210,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$65,400	\$100	\$65,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$133,200	\$100	\$133,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$100	\$70,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$457,500	\$400	\$457,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$100	\$70,200
TOTAL			15	\$7,787,800	\$5,700	\$0	\$7,793,500

30996

Villavicencio 28 de marzo de 2026

Señores

Romval Ingeniería S.A.S

Asunto: Renuncia voluntaria a exámenes médicos

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo Jhon Jairo Terán Rodríguez identificado con el número de cedula de ciudadanía N° 1.053.122.484 manifiesto que me encuentro en un buen estado de salud al terminar mi contrato laboral con ROMVAL INGENIERIA S.A.S, por lo tanto, manifiesto de manera voluntaria que renuncio a la realización de los exámenes médicos de egreso.

Declaro que tomo la decisión libremente y que eximo de responsabilidad a la empresa ROMVAL INGENIERIA S.A.S y a sus representantes frente a cualquier situación de salud que pudiera haberse identificado mediante este examen.

Agradezco de antemano su comprensión.

Atentamente,

Jhon Terán Rodríguez

Jhon Jairo Terán Rodríguez

CC. 1.053.122.484

Carta de terminación de contrato

NOMBRE: Jhon Jairo
Terán Rodríguez

Cedula 1053122484

Por medio de la presente nos permitimos informarle que su contrato de trabajo, suscrito el día 04-12-25, finaliza a partir del día 28-03-26, debido a la culminación de la labor específica para la cual fue contratado(a).

La terminación del contrato se realiza conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente y en las condiciones pactadas inicialmente, dado que se ha cumplido en su totalidad el objeto del contrato.

Agradecemos el compromiso, dedicación y servicios prestados durante el tiempo que laboró con nosotros. En los próximos días se realizará la liquidación correspondiente a salarios, prestaciones sociales y demás conceptos a que haya lugar.

Cualquier inquietud adicional podrá ser atendida en el área de recursos humanos.

*Por último, le recordamos que este documento es una **carta de terminación de contrato laboral** y debe ser tratado con la confidencialidad y seriedad que corresponde.*

Le Saluda atentamente.



**Edwin Ferney
Romero Valencia**

Representante Legal
C.C. 1.101.754.071 de Vélez
Tel.3184560412
Romvalingenieriasas@gmail.com

Jhon Terán Rodríguez

Firma

Jhon Terán



**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**



30498

ANEXO 15. DOCUMENTOS DE RETIRO DE PERSONAL.



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



30999

CL CASETONES

Villavicencio, 15 de mayo de 2026
CE-201-126-564

Señores
CL CASETONES S.A.S.
Ing. ORINSON LOPEZ FUENTES
Representante Legal
Cra 93 # 132-31 Barrio Villa Eliza
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato CE-201-144-012 de alquiler, suministro y mano obra con instalación y retiro de casetones de icopor densidad 14 kg recuperable h:0.63mt modulación. incluye cartoplast, equipo menor y mayor, mano de obra según planos del modulo b. administrativo y modulo c. educativo. en el proyecto de reconstrucción total de la institución educativa alfonso lopez pumarejo, sede principal del municipio de villavicencio. esto incluye todo lo necesario para llevar a cabo la actividad, así como todas las condiciones adicionales requeridas por el cliente de acuerdo a los planos y especificaciones tanto particulares como generales. el presente contrato se establece bajo la modalidad de precios fijos, sin una fórmula de reajuste.

ASUNTO: Solicitud de documentos de retiro del señor Leonel López Fuentes.

Cordial saludo,

De manera atenta, se solicita remitir los documentos de retiro o, en su defecto, carta de continuidad del señor Leonel López Fuentes, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.063.106.310, quien estuvo vinculado en el cargo de Oficial de Obra, realizando labores para el proyecto correspondiente al Contrato en referencia durante el periodo comprendido entre el 02 de febrero y el 06 de marzo de 2026.

Los documentos a remitir en caso de retiro son:


- Liquidación de prestaciones sociales firmadas por el trabajador.

- Paz y salvo de todo concepto debidamente firmado por el trabajador
- Planilla de pago de seguridad social, donde se evidencie la novedad de retiro del trabajador.
- Examen de egreso u orden de toma de examen médico de retiro con firma de recibido dejando anotación de la IPS asignada y de los 5 días hábiles con los que cuenta el trabajador para realizarlo.
- Carta de retiro o renuncia del trabajador

En el caso que el señor Leonel López siga activo realizando actividades con la empresa no relacionadas con el proyecto descrito, adjuntar la carta de continuidad en la cual describa que actualmente no se encuentra realizando labor alguna o vinculación vigente.

Se requiere realizar la subsanación y envío de la documentación mencionada a la mayor prontitud posible, con el fin de proceder con el cierre del proceso y cumplimiento de los requerimientos contractuales. En caso de que no sea subsanado en un termino de 2 días hábiles no se tramitarán cortes de obra.

Atentamente,



YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH
E/R/A: DCV/NMA/YGG



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



31002

ANEXO 20 CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD EMITIDO POR ARL



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



37003

ALTARA INGENIERIA SAS

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. – ARL

CERTIFICA

Que la empresa ALTARA INGENIERIA S.A.S NIT. 900.803.958 – 1 registra en nuestro sistema la siguiente información de accidentalidad reportada por la empresa para el periodo desde 01-01-2026 hasta 15-04-2026, la empresa se encuentra afiliada a esta ARL que con el contrato de afiliación No 9.019.309 desde el 2023/10/01.

	AÑO 2026
Número de Trabajadores*	37
Horas hombre trabajadas teóricas	28,160
Número de Accidentes Laborales*	1
Número de Accidentes Fatales*	0
Enfermedad Laboral*	0
Incapacidad permanente parcial (IPP)*	0
Número de casos de invalidez*	0
Número de casos fatales*	0
Total días perdidos y cargados*	0
Total días por incapacidad temporal*	0
Días cargados por IPP*	0
Días cargados por invalidez*	0
Días cargados por fatales*	0

La presente solicitud se expide a los 15-04-2026
Cordialmente,



Área técnica de Prevención
Oficina principal: Carrera 9 # 24 - 38 (Local 202 - Mezanine) • Bogotá D.C.-Colombia
AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.

Línea Integral de Atención al Cliente:

Teléfonos: (57) 601 423 57 57 en Bogotá, 01 8000 512 620 para el resto del país y desde celular #247 • www.axacolpatria.co botón **Contáctanos**

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero:**

Teléfono móvil: 313 499 80 23 • detensoria@consuelorodriguezvalero.com



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



31005

CONSTRUCRUZ



CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Nos permitimos certificar que la empresa WILLIAM ANDRES CRUZ CORONEL identificada con NIT 1026558140 y número de afiliación 9002731 no reportó ningún accidente de trabajo durante el periodo de radicación comprendido entre 01/03/2026 y 31/03/2026 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.

Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 08 días del mes de mayo del 2026 a las 08:14:23.

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

37007



CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026



31008

INFORMES CONTRATISTAS



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



31009

PRAGMA



**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

31070

INFORME MENSUAL No 04

CONTRATISTA: PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

CONTRATO 1279 de 2023



**“RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ
PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META”.**

01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

31077

Introducción

El presente informe describe el desarrollo de las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo (SST) realizadas durante el mes de marzo de 2026 por parte del contratista PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, en la ejecución de labores de construcción de estructuras en concreto del módulo educativo en el marco del proyecto **“Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta”**.

La salud abarca el cuidado en sus dimensiones física, mental y social siendo el eje central de preservar y minimizar los efectos negativos en la población trabajadora en la ejecución de las actividades en obra, para lograrlo es primordial establecer y disponer de múltiples mecanismos que involucren a todos los niveles organizacionales para que se pueda mantener un equilibrio entre la productividad y el cuidado de la integridad de todos los colaboradores.

1. Datos Generales

DATOS GENERALES	
Contratista	PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
Objeto del Contrato	Contrato de obra para mano de obra construcción de estructuras en concreto de elementos con resistencias que varían entre 2000 y 4000 PSI, incluyendo solados fundidos en sitio, limpieza, caisson, zapatas, dados, vigas de cimentación, muros pantalla, vigas aéreas, columnas, losas aligeradas, placas, placas de contrapiso y escaleras del edificio educativo, en el proyecto de reconstrucción total de la institución educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio, esto incluye trazados y replanteos arquitectónicos, excavaciones, rellenos, manejo acero de refuerzo, formaleta,



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

31012

	suministro e instalación de malla electrosoldada, mano de obra integral y calificada, herramienta y equipo menor y mayor, dotaciones, consumibles, maderas, aditivos necesarios para llevar a cabo la actividad, así como todas las condiciones adicionales requeridas por el cliente de acuerdo a los planos y especificaciones, tanto particulares como generales, el presente contrato se establece bajo la modalidad de precios fijos, sin una fórmula de reajuste, el consorcio solo suministra acero, alambre, concreto y bomba estacionaria.
Representante Legal	JUAN DAVID RODRIGUEZ
Contrato N°	CE-201-144-010
NIT	901443621-3
Fecha de Inicio	20 de noviembre 2025

2. Personal y Equipos en Obra

PERSONAL EN OBRA Y EQUIPOS			
Personal Durante el mes:	25	Personal activo al finalizar el mes	21
Personal Administrativos:	2	Personal Retirado	4
Personal Operativo:	23	Equipos en obra	6



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

31013

3. 3. Actividades Realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo

3.1 Actividades de preingreso

El personal que ingreso durante el mes de marzo de 2026 fue un total de 1 colaborador, se realizaron los exámenes médicos ocupacionales para constatar las condiciones de salud del personal (Anexo 1).

Antes del inicio de actividades se hace el envío de la documentación del personal para revisión esta documentación incluye:

- Hoja de Vida
- Afiliaciones a Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar).
- Examen de Ingreso y Contrato Laboral
- Certificado (Trabajo en Alturas).

3.2 Actividades de Ingreso a obra

- Inducción HSE y de aspectos en obra: La cual fue realizada con acompañamiento del el personal de SST del Constructor en el cual explicaron los siguientes temas:

Temario de la Inducción	
1	Información General del Proyecto y presentación de la empresa.
2	Horarios de Trabajos
3	Política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST)
4	Política de prevención de consumo de alcohol y drogas, no acoso
5	Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF
5	Notificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales para Trabajadores
6	Reportes de Actos y Condiciones Inseguras
7	Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo
8	Normas de Seguridad, Uso de EPPS y Convivencia en Obra
9	Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo

3.3 Actividades Realizadas Durante la Ejecución de Actividades en Obra

➤ Charlas y Capacitaciones al personal.

Se realizaron charlas al personal sobre diversos temas concernientes a seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los requerimientos generados en obra.

Foto No 1 Charlas y Capacitación al Personal (Anexo 1).



➤ Inspección de Herramientas y Equipos

Ver anexo 2 (Inspección de Equipos y Herramientas)



Previo al uso de equipos, herramientas y equipos se realizó la revisión de los mismos para garantizar las condiciones apropiadas de uso, manipulación y aseguramiento para el personal. Se plasmó la información en los respectivos preoperacionales en conjunto con el trabajador.

➤ Entrega e Inspección de elementos de protección personal

Durante el mes de marzo del 2026 se realizaron las entregas de elementos de protección personal en obra, teniendo en cuenta el desgaste y/o deterioro de los mismos, de igual modo se hizo entrega de dotación inicial al personal. Se recibieron en obra elementos de protección personal contra caídas (EPCC) como arneses y eslinga los cuales se inspeccionaron todos los componentes estuvieran en óptimas condiciones y con su re certificación vigente y se utilizaran por el personal autorizado.

Foto No 3 Inspección de elementos de protección personal (Anexo 3).





➤ **Aseguramiento y acompañamiento en las actividades de obra**

Las siguientes actividades de aseguramiento en el desarrollo de la cimentación en el módulo educativo se ejecutaron en el mes de enero del 2026:

- Inspecciones de área (Condiciones Locativas).
- Diligenciamiento de documentación como Análisis de trabajo seguro (ATS) Permisos de trabajo en Alturas, que se divulgaron y firmaron por parte del personal. Estos documentos se aplicaron en actividades tales como:
 - o Armado, encofrado y desencofrado de columnas, en el módulo administrativo

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

31078

- o Colocación de mesa para el armado de vigas aéreas y losa de entre piso, en el módulo administrativo
- o Fundida con concreto de vigas, viguetas, columnas, placas y otros elementos con planta de concreto y bomba estacionaria de concreto, en el polideportivo
- Acompañamiento en actividades y realizar recomendaciones al personal en material de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- Inspección de Elementos de emergencia (botiquín, camilla y extintor).
- Orden y Aseo en áreas de trabajo

Foto No 5 Aseguramiento y acompañamiento en las actividades en obra (Anexo 4).



**INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

31079

Foto No 6 Inspección Botiquín (Anexo 5).





INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

37020

Accidentalidad

En el mes de marzo del 2026 no se registraron accidentes laborales o algún evento que afectara la salud e integridad de los colaboradores del contratista.

No se generó ausentismo por enfermedad de origen común.

Tabla 3 Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MARZO 2026			
Total, de HHT Mes:	5530	Total HHT Acumuladas	15894
Número de Accidentes:	0	Días de Ausentismo por Incapacidad	0
Porcentaje de Ausentismo Mes:	0	Días Programados en el mes:	24



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 18
MARZO 2026



37027

ROMVAL

31022


INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



INFORME MENSUAL No 04

CONTRATISTA: ROMVAL INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO 1279 de 2023

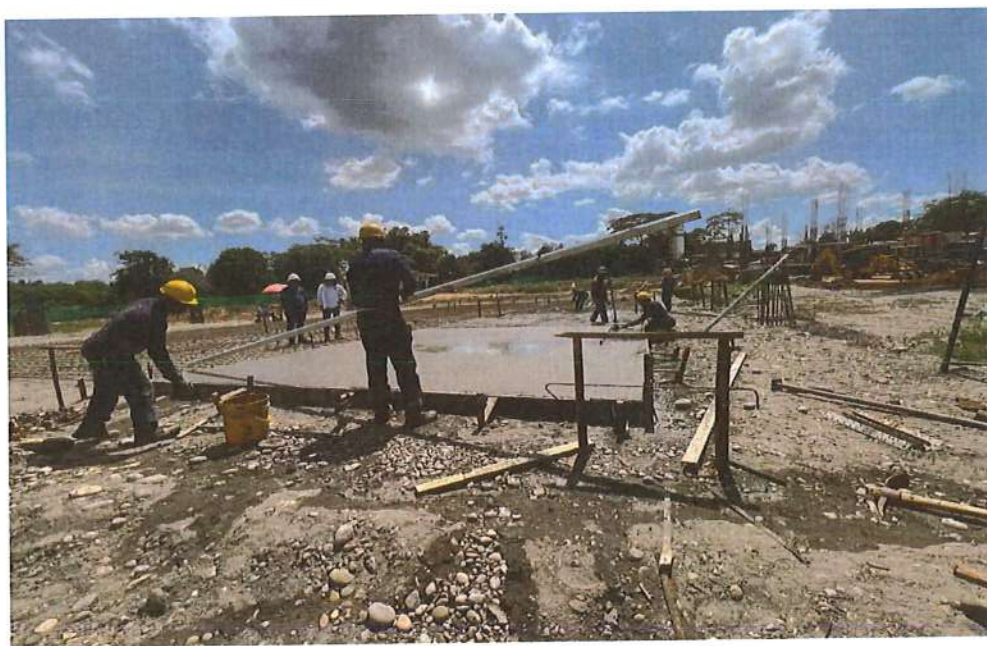

**“RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ
PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META”.**

01 DE MARZO HASTA EL 31 DE 2026

31023

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



Introducción

El presente informe describe el desarrollo de las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo (SST) realizadas durante el mes de marzo de 2026 por parte del contratista Romval Ingeniería S.A.S en la ejecución de labores de construcción de estructuras en concreto de los módulos educativo y polideportivo en el marco del proyecto **“Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta”**.

La salud abarca el cuidado en sus dimensiones física, mental y social siendo el eje central de preservar y minimizar los efectos negativos en la población trabajadora en la ejecución de las actividades en obra, para lograrlo es primordial establecer y disponer de múltiples mecanismos que involucren a todos los niveles organizacionales para que se pueda mantener un equilibrio entre la productividad y el cuidado de la integridad de todos los colaboradores.

1. Datos Generales

DATOS GENERALES	
Contratista	Romval Ingeniería S.A.S.
Objeto del Contrato	Contrato de obra para mano de obra construcción de estructuras en concreto de elementos con resistencias que varían entre 2000 y 4000 psi, incluyendo solados, limpieza, caisson, zapatas, dados, vigas de cimentación, muros pantalla, vigas aéreas, columnas, losas aligeradas, placas, placas de contrapiso y escaleras del edificio administrativo en el

31024

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



DATOS GENERALES	
	proyecto de RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
Representante Legal	Edwin Ferney Romero Valencia
Contrato N°	CE-201-144-009
NIT	900805727-6
Fecha de Inicio	04 de noviembre 2025

2. Personal y Equipos en Obra

PERSONAL EN OBRA Y EQUIPOS			
Personal Durante el mes:	15	Personal activo al finalizar el mes	10
Personal Administrativos:	2	Personal Retirado	4
Personal Operativo:	13	Equipos en obra	01

3. 3. Actividades Realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo

3.1 Actividades de preingreso

El personal que ingreso durante el mes de marzo de 2026 fue un total de 1 colaboradora para el cargo de Inspectora SST, quien realizo los exámenes médicos ocupacionales para constatar las condiciones de salud del personal.

Antes del inicio de actividades se hace el envío de la documentación del personal para revisión esta documentación incluye:

- Hoja de Vida

31025

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



- Afiliaciones a Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar).
- Examen de Ingreso y Contrato Laboral
- Certificado (Trabajo en Alturas).

3.2 Actividades de Ingreso a obra

- Inducción HSE y de aspectos en obra: La cual fue realizada por el personal de SST del Constructor en el cual explicaron los siguientes temas:

	Temario de la Inducción
1	Información General del Proyecto y presentación de la empresa.
2	Horarios de Trabajos
3	Política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST)
4	Política de prevención de consumo de alcohol y drogas, no acoso
5	Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF
5	Notificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales para Trabajadores
6	Reportes de Actos y Condiciones Inseguras
7	Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo
8	Normas de Seguridad, Uso de EPPS y Convivencia en Obra
9	Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo

3.3 Actividades Realizadas Durante la Ejecución de Actividades en Obra

- Charlas y Capacitaciones al personal.

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



Se realizaron charlas al personal sobre diversos temas concernientes a seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los requerimientos generados en obra.

Foto No 1 Charlas y Capacitación al Personal (Anexo 1).



➤ Inspección de Herramientas y Equipos

Previo al uso de equipos, herramientas y equipos se realizó la revisión de los mismos para garantizar las condiciones apropiadas de uso, manipulación y aseguramiento para el personal. Se plasmó la información en los respectivos preoperacionales en conjunto con el trabajador.

Foto No 2 Inspección de equipos y herramientas (Anexo 2).

31027

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



➤ Entrega de elementos de protección personal y dotación.

Durante el mes de Marzo del 2026 se realizaron las entregas de elementos de protección personal en obra, teniendo en cuenta el desgaste y/o deterioro de los mismos, de igual modo se hizo entrega de dotación inicial al personal.

Foto entrega de elementos de protección personal y dotación. (Anexo 3).

37028

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



➤ **Aseguramiento y acompañamiento en las actividades de obra**

Las siguientes actividades de aseguramiento en el desarrollo de la cimentación en los módulos administrativo y polideportivo se ejecutaron en el mes de marzo del 2026:

- Inspecciones de área (Condiciones Locativas).
- Diligenciamiento de documentación como Análisis de trabajo seguro (ATS) Permisos de trabajo en Alturas, que se divulgaron y firmaron por parte del personal. Estos documentos se aplicaron en actividades tales como:
 - Armado, encofrado y desencofrado de columnas, en el módulo administrativo
 - Colocación de mesa para el armado de vigas aéreas y losa de entre piso, en el módulo administrativo

31029

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



- Fundida con concreto de vigas, viguetas, columnas, placas y otros elementos con planta de concreto y bomba estacionaria de concreto, en el polideportivo
- Acompañamiento en actividades y realizar recomendaciones al personal en material de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- Inspección de Elementos de emergencia (Botiquín, camilla y extintor)
- Orden y Aseo en áreas de trabajo

Foto No 5 Aseguramiento y acompañamiento en las actividades en obra (Anexo 4).



➤ Jornada de Orden y Aseo

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



Se realizó una jornada de aseo con el fin de mejorar las áreas de trabajo para así evitar accidentes e incidentes además se instaló señalización en las áreas de trabajo para optimizar el tránsito alrededor de la obra.

Foto No 5 Jornada de Orden y Aseo (Anexo 4).



Foto No 6 Inspección Botiquín (Anexo 5 Inspección Elementos de Emergencia).

31037

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026



Accidentalidad

En el mes de marzo del 2026 no se registraron accidentes laborales o algún evento que afectara a los trabajadores del contratista.

No se generó ausentismo por enfermedad laboral o de origen común.

Tabla 3 Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MARZO 2026			
Total de HHTT Mes:	375 2	Total HHT Acumuladas	1584 5
Número de Accidentes:	0	Días de Ausentismo por Incapacidad	0
Porcentaje de Ausentismo Mes:	0	Días Programados en el mes:	24

37032

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4
01 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

