



ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del (la) Contratista: JMV INGENIERIA SAS
Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA
Contrato N°: 872 DE 23-sep-25
Documento de Identidad: NIT. N° 900296629-7
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL
POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO EL DIAMANTE DE LA CIUDAD DE
GIRARDOT - CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Número cuenta del (a) Contratista: 65900015447 Entidad: BANCO BANCOLOMBIA Tipo cuenta: CUENTA CORRIENTE
Fecha de inicio (Según Acta): 30-sep-2025 Plazo de Ejecución: 8 meses, y 0 días
Fecha de terminación (Incluye prórrogas): 30-jun-2026

Valor inicial del contrato: S. 1,313,380,898.00
Adición 1: 500,139,739.00
Reducción 1:
Valor total del contrato: S. 1,813,520,637.00

Prórrogas	Días
Prórroga 1	90
Prórroga 2	60
Prórroga 3	30

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal	No. Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Código Rubro Presupuestal	Valor a pagar por Rubro Presupuestal en el presente pago
2025001466	2025002687	23/09/2025	2.4.43.4302064.2024253070012.MT090.124303	
2025001466	2025002687	23/09/2025	2.4.43.4302064.2024253070012.MT090.900113	\$ 140,726,856.50
2026001338	2026001297	31/03/2026	2.4.43.4302064.2024253070012.MT090.1210002	\$ 318,229,280.15

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Salud	Certificado contador	EPS	Certificado contador	Número de planilla	Certificado contador
Pensión	Certificado contador	FONDO DE PENSIONES	Certificado contador	Número de planilla	Certificado contador
Riesgos Laborales	Certificado contador	ARL	SURA	Número de planilla	Certificado contador
FSP ***		Fondo pensiones		Número de planilla	Certificado contador

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor o 4 SMMLV.

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO

No. PAGO	PERIODO DE PAGO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	MODO POR PAGAR
	DESDE	HASTA						
3	11-abr-26	16-jun-26	89.97%	1,172,654,041.56	\$ 458,956,136.63	\$	\$ 458,956,136.63	181,970,458.81

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN

El/la suscrito(a) supervisor(a) / interventor(a) certifica:
Que, JMV INGENIERIA SAS, identificado(a) con NIT. N° 900296629-7, cumplió a satisfacción con el objeto del (la) CONTRATO DE OBRA N° 872 de 2025, de acuerdo con el informe presentado.

Que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1813/2002, y demás Decretos Reglamentarios.

Que, con base en lo anterior se avala el pago por un valor de:

\$ 458,956,136.63 incluido IVA.

Fecha de expedición:

30 JUNIO 2026
Día Mes Año

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



INFORME DE SUPERVISION No.3

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 872 - 2025
CELEBRADO ENTRE:

JMV INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.296.629-7

Y

"LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CND"

EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CONTRATO DE OBRA No. 872 DE 2025 CUYO OBJETO ES: **"CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA"**.

Que el día diecinueve 18 de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025), se firma el CONTRATO No.868 de 2025, por parte del Municipio de Girardot y el JMV INGENIERIA S.A.S.

El presente informe se presenta en el periodo del 11 de Abril de 2026 al 16 de Junio de 2026.





INTRODUCCIÓN

Dentro del presente informe se describirá el estado contractual, financiero y avance del contrato de obra No. 872 de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA". El contrato de obra se desarrolla dentro de los plazos establecidos y vigentes contractualmente, el cual tiene un avance de ejecución del 89,97%. Este espacio contará con cubierta, graderías, malla contra impacto, iluminación, senderos peatonales de ingreso y salida, y estará dotada con dos canchas mixtas con tablero, portería de baloncesto y fútbol de salón con sus mallas; una malla de voleibol con sus elementos de anclaje y antenas de soporte. Adicionalmente se aplicará recubrimiento sintético para cancha de colores.

El Contrato de obra No. 872 de 2025, por solicitud del CONSORCIO JER 333 mediante Oficio No. OFI-CG-015 del 29 de Octubre de 2025, remitió la solicitud de Autorización Expresa para Firmar la Cesión Total del Contrato de Obra, para lo cual remitió como anexo el Documento de Mutuo Acuerdo para la Cesión Total del Contrato de Obra entre CONSORCIO JER333 (CEDENTE) y JMV INGENIERIA S.A.S. (CESIONARIO) y a su vez a el CONSORCIO INTERPOLI como interventor. Por consiguiente, la Oficina de Contratación emitió la Resolución No. 2900 del 04 de Noviembre de 2025, Por la cual autorizo la cesión del contrato de Obra No. 872 de 2025 del CONSORCIO JER333 a JMV INGENIERIA S.A.S.

El mejoramiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos y recreativos del país, mejorando las condiciones para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física, el entrenamiento de alto rendimiento y la realización de eventos locales y regionales, garantizando la cobertura de los escenarios a toda la población, en pro de la inclusión étnica, cultural y social de los colombianos, es la apuesta del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

El presente proyecto contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de la comunidad, mejorando el entorno del espacio físico donde se realizará la obra, segundo facilitando el acceso a la recreación de la comunidad de Girardot, dando un lugar para la integración familiar, reduciendo los índices de sedentarismos, promoviendo la práctica del deporte.



ESTADO CONTRACTUAL

CONTRATO:	878 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	JMV INGENIERIA S.A.S., representado legalmente por JHONNY FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ
NIT/C.C.:	NIT 900.296.629-7 / C.C. 93.412.960 DE IBAGUE
CDP:	DIS-2025001466 DEL 02 DE MAYO DE 2025
RP:	RES-2025002687 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL:	MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 1.313.380.898,00)
VALOR ADICION:	QUINIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$500.139.739)
VALOR TOTAL:	MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$1.813.520.637,00)
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES Y/O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
FECHA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE PRORROGA No.01	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE PRORROGA No.01	TRES (03) MESES
FECHA DE ACTA DE OTRO SI No.01	30 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA No.02	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION	30 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA No.03	UN (01) MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA	868 DE 2025





OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPOLI, representado legalmente por CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
NIT/C.C.:	901.986.651-4 / C.C. 93.123.908 DEL ESPINAL
VALOR TOTAL:	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 76.171.900,00)

ANTECEDENTES CONTRACTUALES

Se hace una claridad para el Contrato de Obra Pública No. 872 de 2025, teniendo en cuenta que el CONSORCIO JER 333 mediante Oficio No. OFI-CG-015 del 29 de Octubre de 2025, remitió la solicitud de Autorización Expresa para Firmar la Cesión Total del Contrato de Obra, para lo cual anexa Documento de Mutuo Acuerdo para la Cesión Total del Contrato de Obra entre CONSORCIO JER333 (CEDENTE) y JMV INGENIERIA S.A.S. (CESIONARIO) y a su vez el CONSORCIO INTERPOLI

Teniendo en cuenta lo anterior la Secretaria de Infraestructura remitió el oficio donde autoriza la cesión del contrato, toda vez, que el postulado cesionario JMV INGENIERIA S.A.S. Representada Legalmente por JHONNY FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ, cumple con los requisitos exigidos en el proceso de la Licitación de Obra Pública No. LP-004-2025 en cuanto a los aspectos Técnicos, Financieros y Jurídicos para la ejecución del contrato de obra. Por consiguiente, la Oficina de Contratación emitió la Resolución No. 2900 del 04 de Noviembre de 2025, Por la cual autorizo la cesión del contrato de Obra No. 872 de 2025 del CONSORCIO JER333 a JMV INGENIERIA S.A.S.

EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato de Obra No. 872 de 2025, para la Construcción del Polideportivo El Diamante, se desarrolla con un avance consolidado del 89.97%, el cual se ejecuta dentro de los plazos establecidos y vigentes contractualmente.

Avance del Contrato del Informe No.01:

- Periodo del 14 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025.





ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor contrato	\$1.313.380.898,00	8 MESES
		100%	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		14,36%	7,08%
	Avance Total	\$ 188.549.821,29	17 días
		14,36%	7,08%

Avance del Contrato del Informe No.02:

- Periodo del 01 de Diciembre al 10 de Diciembre de 2025.

ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor contrato	\$1.313.380.898,00	8 MESES
		100%	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		14,36%	7,08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		19,16%	4,16%
	Avance Total	\$ 440.153.066,59	27 días
		33,51%	11,24%

Avance del Contrato del Informe No.03:

- Periodo del 11 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025.

ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor Contrato	\$ 1.313.380.898,00	8 meses
		100 %	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		14.36%	7.08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		19,16%	4,16%
	Avance Informe 3	\$ 74.106.818.94	21 días
		5,64%	8,75%





	Avance Total	\$ 514.259.627,36	48 días
		39,16%	20,00%

Avance del Contrato del Informe No.04:

- Periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2026.

ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor Contrato	\$ 1.313.380.898,00	8 meses
		100 %	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		14,36%	7,08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		19,16%	4,16%
	Avance Informe 3	\$ 74.106.818,94	21 días
		5,64%	8,75%
	Avance Informe 4	\$ 126.102.034,40	31 días
		9,60%	12,91%
	Avance Total	\$ 640.361.661,76	79 días
		48,76%	32,91%

Avance del Contrato del Informe No.05:

- Periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026.

ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor Contrato	\$ 1.313.380.898,00	8 meses
		100 %	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		14,36%	7,08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		19,16%	4,16%
	Avance Informe 3	\$ 74.106.818,94	21 días
		5,64%	8,75%
	Avance Informe 4	\$ 126.102.034,40	31 días
		9,60%	12,91%
	Avance Informe 5	\$ 314.754.896,26	28 días
		17,36%	11,66%
	Avance Total	\$ 955.116.558,01	107 días
		52,67%	44,58%

Avance del Contrato del Informe No.06:

- Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2026.





ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor Contrato	\$ 1.313.380.898,00	8 meses
		100 %	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		14,36%	7,08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		19,16%	4,16%
	Avance Informe 3	\$ 74.106.818,94	21 días
		5,64%	8,75%
	Avance Informe 4	\$ 126.102.034,40	31 días
		9,60%	12,91%
	Avance Informe 5	\$ 314.754.896,26	28 días
		17,36%	11,66%
	Avance Informe 6	\$ 194.090.275,14	31 días
		10,70%	12,91%
	Avance Total	\$ 1.149.206.833,16	138 días
		63,37%	57,49%

Avance del Contrato del Informe No.07:

- Periodo del 01 de Abril al 10 de Abril de 2026.

ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor Contrato	\$ 1.313.380.898,00	8 meses
		100 %	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		14,36%	7,08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		19,16%	4,16%
	Avance Informe 3	\$ 74.106.818,94	21 días
		5,64%	8,75%
	Avance Informe 4	\$ 126.102.034,40	31 días
		9,60%	12,91%
	Avance Informe 5	\$ 314.754.896,26	28 días
		17,36%	11,66%
	Avance Informe 6	\$ 194.090.275,14	31 días
		10,70%	12,91%
	Avance Informe 7	\$ 23.447.208,40	10 días
		1,29%	4,16%
	Avance Total	\$ 1.172.654.041,56	148 días
		64,66%	61,65%

Avance del Contrato del Informe No.08:

- Periodo del 11 de Abril al 30 de Abril de 2026.





ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del contrato ejecutado	Valor inicial contrato	\$1.313.380.898,00	8 MESES
	Adicional	\$500.139.739,00	
		\$1.813.520.637,00	
	Valor total del contrato	100%	
		\$ 188.549.821,29	17 días
	Avance Informe 1	10,40%	7,08%
		\$ 251.603.245,30	10 días
	Avance Informe 2	13,87%	4,16%
		\$74.106.818,94	21 días
	Avance Informe 3	4,09%	8,75%
		\$126.102.034,40	31 días
	Avance Informe 4	6,95%	12,91%
		\$314.754.896,26	28 días
	Avance Informe 5	17,36%	11,66%
		\$194.090.275,14	31 días
	Avance Informe 6	10,70%	12,91%
		\$23.447.208,40	10 días
	Avance Informe 7	1,29%	4,16%
		\$80.617.872,46	20 días
	Avance Informe 8	4,45%	8,33%
		\$ 1.253.271.914,02	168 días
	Avance Total	69,11%	70,00%

Avance del Contrato del Informe No.09:

- Periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2026.

ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
	Valor inicial contrato	\$1.313.380.898,00	





Avance del contrato ejecutado	Adicional	\$500.139.739,00	8 MESES
	Valor total del contrato	\$1.813.520.637,00	
		100%	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		10,40%	7,08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		13,87%	4,16%
	Avance Informe 3	\$74.106.818,94	21 días
		4,09%	8,75%
	Avance Informe 4	\$126.102.034,40	31 días
		6,95%	12,91%
	Avance Informe 5	\$314.754.896,26	28 días
		17,36%	11,66%
	Avance Informe 6	\$194.090.275,14	31 días
		10,70%	12,91%
	Avance Informe 7	\$23.447.208,40	10 días
		1,29%	4,16%
	Avance Informe 8	\$80.617.872,46	20 días
		4,45%	8,33%
	Avance Informe 9	\$81.276.369,52	31 días
		4,48%	12,91%
	Avance Total	\$ 1.334.548.283,54	199 días
		73,59%	82,91%

Avance del Contrato del Informe No.10:

- Periodo del 01 de Junio al 16 de Junio de 2026.

ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN TIEMPO
	Valor inicial contrato	\$1.313.380.898,00	
	Adicional	\$500.139.739,00	





Avance del contrato ejecutado	Valor total del contrato	\$1.813.520.637,00	8 MESES
		100%	
	Avance Informe 1	\$ 188.549.821,29	17 días
		10,40%	7,08%
	Avance Informe 2	\$ 251.603.245,30	10 días
		13,87%	4,16%
	Avance Informe 3	\$74.106.818,94	21 días
		4,09%	8,75%
	Avance Informe 4	\$126.102.034,40	31 días
		6,95%	12,91%
	Avance Informe 5	\$314.754.896,26	28 días
		17,36%	11,66%
	Avance Informe 6	\$194.090.275,14	31 días
		10,70%	12,91%
	Avance Informe 7	\$23.447.208,40	10 días
		1,29%	4,16%
	Avance Informe 8	\$80.617.872,46	20 días
		4,45%	8,33%
	Avance Informe 9	\$81.276.369,52	31 días
		4,48%	12,91%
	Avance Informe 10	\$297.061.894,66	16 días
		16,38%	6,66%
	Avance Total	\$ 1.631.610.178,20	215 días
		89,97%	89,58%

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCION CONTRACTUAL	VALOR	VALOR ANTICIPO	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR
Valor inicial	\$1.313.380.898,00			
Valor Adición	\$ 500.139.739,00			





Valor Total	\$1.813.520.637,00			
Valor Acta No. 1	\$ 440.153.066,59	N/A	-	-
Valor Acta No. 2	\$732.500.974,91	N/A		
Acumulado pagado	\$1.172.654.041,56			
Saldo por pagar	\$640.866.595,50			
Porcentaje ejecutado	64,65%			
Porcentaje por ejecutar	35,34%			

CUADRO DE GARANTIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 39-44-101177198				
AMPAROS	VIGENCIA (FECHAS)		VALOR	No. Anexo
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	04/11/2025	08/12/2026	\$181.352.063,70	2
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/11/2025	08/06/2029	\$181.352.063,70	2
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		\$181.352.063,70	2
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 39-40-101046565				
AMPAROS	VIGENCIA (FECHAS)		VALOR	No. Anexo
	DESDE	HASTA		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/11/2025	08/06/2026	\$284,700,000,00	1
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	04/11/2025	08/06/2026	\$284,700,000,00	1
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	04/11/2025	08/06/2026	\$284,700,000,00	1
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/11/2025	08/06/2026	\$284,700,000,00	1
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	04/11/2025	08/06/2026	\$284,700,000,00	1
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04/11/2025	08/06/2026	\$284,700,000,00	1

ESTADO JURIDICO

TIPO DE ACTO	SI/NO	ACTO REALIZADO
SUSPENSIONES	NO	NO APLICA
PRORROGAS	SI	✓ PRORROGA No. 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 POR TRES (03) MESES. ✓ OTROSI No. 001 DEL 30 DE MARZO DE 2026 POR DOS (02) MESES. ✓ PRORROGA No. 03 DEL 28 DE MAYO DE 2026 POR UN (01) MES.
ADICIONES	SI	OTROSI No. 001 DEL 30 DE MARZO DE 2026 POR \$ 500.139.739,00
MULTAS	NO	NO APLICA
INCUMPLIMIENTO	NO	NO APLICA
CADUCIDAD	NO	NO APLICA





REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro Fotográfico Informe No. 08:

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)



EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)





RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE



RED SANITARIA PVC-S 6"





REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA



ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M





REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME No.09:

BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"



TEJA SIN TRASLAPO





BORDILLO PREFABRICADO A-80



CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90





SARDINEL PREFABRICADO A-10



REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME No. 10

CONCRETO 3500 PSI





TEJA SIN TRASLAPO



CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00X1.00






VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS



BARANDA GRADERIA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJES, PLATINAS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE

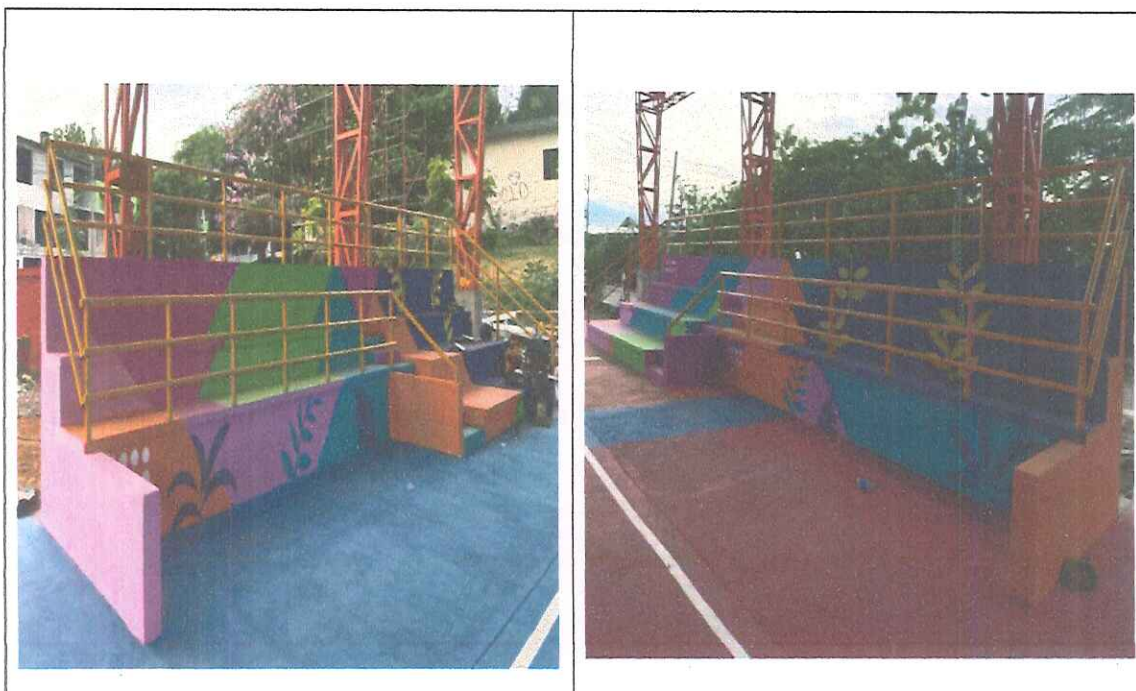



PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5CM



PINTURA EPOXICA



Atentamente,

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
Secretaria de Infraestructura

Elaboro:

ING. Sebastian Gonzalez Jimenez
Profesional Contratista – SIG

