


PREACTA DE OBRA No. 45											nov-25		
CONTRATO No. 2257 DE 2021													
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YAÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.													
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC						INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE							
FECHA DE INICIO: 22/03/2022						PERIODO: noviembre-2025							
FECHA DE TERMINACION: HASTA JULIO 31 DE 2030						CARRETERA: TRANSVERSAL MOMPOSINA RUTA: 78							
No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		TOTAL PREACTA		
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANEACIONES													
1	200.2	200-13	0	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814.00	\$ 54,723,886.00	49.00	\$ 54,723,886.00	0.00	\$ 0.00	
2	201.7	201-13	0	Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698.00	\$ 179,109,364.00	1,618.00	\$ 179,109,364.00	0.00	\$ 0.00	
3	201.15	201-13	0	Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815.00	\$ 117,594,400.00	1,760.00	\$ 117,594,400.00	0.00	\$ 0.00	
4	210.1.1	210-13	0	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000.00	\$ 1,860,920,000.00	186,092.00	\$ 1,860,920,000.00	0.00	\$ 0.00	
5	210.1.2	210-13	0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000.00	\$ 9,834,048,000.00	683,650.46	\$ 8,203,805,528.00	0.00	\$ 0.00	
6	211.1	211-13	0	Remoción de Detrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747.00	\$ 14,620,500.00	1,500.00	\$ 14,620,500.00	0.00	\$ 0.00	
7	220.1	220-1	0	Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000.00	\$ 10,104,016,000.00	777,232.00	\$ 10,104,016,000.00	0.00	\$ 0.00	
8	230.1P	0	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393.00	\$ 439,332,896.00	42,272.00	\$ 439,332,896.00	0.00	\$ 0.00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS													
9	311.1	311-13	0	Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000.00	\$ 7,352,280,000.00	94,260.00	\$ 7,352,280,000.00	0.00	\$ 0.00	
10	320.1	320-13	0	Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000.00	\$ 7,700,000,000.00	35,000.00	\$ 7,700,000,000.00	0.00	\$ 0.00	
11	330.1	330-13	0	Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000.00	\$ 20,200,560,000.00	84,169.00	\$ 20,200,560,000.00	0.00	\$ 0.00	
12	330.4	330-13	0	Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000.00	\$ 8,032,500,000.00	31,500.00	\$ 8,032,500,000.00	0.00	\$ 0.00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
13	420.2	420-13	0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600.00	\$ 1,130,438,400.00	434,784.00	\$ 1,130,438,400.00	0.00	\$ 0.00	
14	421.1	421-13	0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500.00	\$ 652,176,000.00	434,784.00	\$ 652,176,000.00	12946.40	\$ 19,419,600.00	
15	450.1P	0	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000.00	\$ 25,557,702,000.00	29,109.00	\$ 25,557,702,000.00	0.00	\$ 0.00	
16	450.2P	0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000.00	\$ 16,980,395,000.00	19,015.00	\$ 16,980,395,000.00	1324.60	\$ 1,182,867,800.00	
17	450.9P	0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000.00	\$ 6,356,000,000.00	7,000.00	\$ 6,356,000,000.00	0.00	\$ 0.00	
18	460.1P	0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7,000.00	\$ 69,000.00	\$ 483,000,000.00	20,000.00	\$ 1,380,000,000.00	1424.80	\$ 98,311,200.00	
19	465.1	465-13	0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000.00	\$ 588,000,000.00	8,400.00	\$ 588,000,000.00	0.00	\$ 0.00	
20	466.1	466-13	0	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000.00	\$ 22,400,000.00	40,000.00	\$ 160,000,000.00	0.00	\$ 0.00	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
21	600.1.1	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888.00	\$ 890,645,928.00	30,831.00	\$ 890,645,928.00	0.00	\$ 0.00	
22	600.2.1	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076.00	\$ 15,092,100.00	225.00	\$ 15,092,100.00	0.00	\$ 0.00	
23	600.2.4	600-13	0	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192.00	\$ 7,463,040.00	120.00	\$ 7,463,040.00	0.00	\$ 0.00	
24	610.1	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503.00	\$ 91,721,630.00	2,210.00	\$ 91,721,630.00	0.00	\$ 0.00	
25	610.2	610-13	0	Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914.00	\$ 38,664,470.00	355.00	\$ 38,664,470.00	0.00	\$ 0.00	
26	630.3	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000.00	\$ 6,216,900,000.00	7,314.00	\$ 6,216,900,000.00	0.00	\$ 0.00	
27	630.4	630-13	0	Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000.00	\$ 4,921,500,000.00	6,562.00	\$ 4,921,500,000.00	0.00	\$ 0.00	
28	630.6	630-13	0	Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000.00	\$ 825,360,000.00	1,448.00	\$ 825,360,000.00	0.00	\$ 0.00	
29	640.1	640-13	0	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321.00	\$ 9,648,121,560.00	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560.00	0.00	\$ 0.00	
30	661.1	661-13	0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000.00	\$ 3,301,930,000.00	5,413.00	\$ 3,301,930,000.00	0.00	\$ 0.00	
31	671.3	671-13	0	Cunetas de concreto "vacuadas in situ", incluye la conformación de la superficie de aguas.	m3	8,533.00	\$ 704,000.00	\$ 6,007,232,000.00	8,533.00	\$ 6,007,232,000.00	0.00	\$ 0.00	
32	673.1	673-13	0	Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500.00	\$ 133,871,250.00	17,849.50	\$ 133,871,250.00	0.00	\$ 0.00	
33	673.2	673-13	0	Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000.00	\$ 896,168,000.00	4,924.00	\$ 896,168,000.00	0.00	\$ 0.00	
34	673.3	673-13	0	Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000.00	\$ 137,900,000.00	985.00	\$ 137,900,000.00	0.00	\$ 0.00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
35	1P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795.00	\$ 344,640,000.00	319,184.00	\$ 572,935,280.00	39642.00	\$ 71,157,390.00
36	2P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076.00	\$ 211,929,600.00	3,900.00	\$ 86,096,400.00	124.80	\$ 2,755,085.00
37	4P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de tachos reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346.00	\$ 215,276,724.00	54,206.00	\$ 452,403,276.00	0.00	\$ 0.00
38	5P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	131.00	\$ 401,294.00	\$ 52,569,514.00	555.00	\$ 222,718,170.00	0.00	\$ 0.00
39	6P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319.00	\$ 16,465,950.00	490.00	\$ 161,366,310.00	0.00	\$ 0.00
40	7P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	20.00	\$ 508,285.00	\$ 10,165,700.00	4.00	\$ 2,033,140.00	0.00	\$ 0.00
41	8P	Manual de Señalización Vial 2015			Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retrorreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	\$ 561,506.00	\$ 68,503,732.00	122.00	\$ 68,503,732.00	0.00	\$ 0.00
42	720.1	720-13	0	Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754.00	\$ 8,831,636.00	34.00	\$ 8,831,636.00	0.00	\$ 0.00	
43	730.1	730-13	0	Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280,000.00	\$ 834,400,000.00	2,767.12	\$ 774,794,800.00	0.00	\$ 0.00	
44	730.2	730-13	0	Sección final	u	10.00	\$ 103,189.00	\$ 1,031,890.00	10.00	\$ 1,031,890.00	0.00	\$ 0.00	
45	740.1	740-13	0	Captafaros	u	596.00	\$ 9,671.00	\$ 5,763,916.00	1,500.00	\$ 14,506,500.00	0.00	\$ 0.00	

1/11

OBRAS VARIAS												
46	800.1	800-13	0	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	\$ 16,000.00	\$ 1,097,920,000.00	68,620.00	\$ 1,097,920,000.00	0.00	\$ 0.00
47	810.1	810-13	0	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	\$ 19,000.00	\$ 3,206,782,000.00	168,778.00	\$ 3,206,782,000.00	0.00	\$ 0.00
TRANSPORTES												
48	900.1	900-13	0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	\$ 1,057.00	\$ 1,689,120,881.00	1,598,033.00	\$ 1,689,120,881.00	0.00	\$ 0.00
49	900.2	900-13	0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	\$ 1,175.00	\$ 18,776,885,400.00	15,980,328.00	\$ 18,776,885,400.00	0.00	\$ 0.00
50	900.3	900-13	0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	\$ 1,175.00	\$ 22,912,500.00	19,500.00	\$ 22,912,500.00	0.00	\$ 0.00
Ajuste al Peso												
								\$ 177,355,585,867.00		\$ 177,355,585,867.00		\$ 1,374,511,075.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 25,530,593,934.00		\$ 25,530,593,934.00	0.00%	\$ 0.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA								\$ 350,000,000.00		\$ 350,000,000.00	0.00%	
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 1,485,187,468.00		\$ 1,485,187,468.00	0.00%	\$ 10,044,504.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.								\$ 2,891,000,000.00		\$ 2,891,000,000.00	0.00%	\$ 0.00
VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.								\$ 549,290,000.00		\$ 549,290,000.00		\$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA, PAGA								\$ 2,245,267,864.00		\$ 2,245,267,864.00	0.00%	\$ 0.00
VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD								\$ 426,600,894.00		\$ 426,600,894.00		\$ 0.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								\$ 168,067,227.00		\$ 168,067,227.00	0.00%	\$ 0.00
VALOR IVA - PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								\$ 31,932,773.00		\$ 31,932,773.00		\$ 0.00
VALOR TOTAL								\$ 211,033,526,027.00		\$ 211,033,526,027.00		\$ 1,384,555,579.00
Firma:  Nombre: Adulino José Pérez Vergara Ingeniero Residente de Obra Matrícula No.: 22202-210255COR							Firma:  Nombre: Iván Darío Montes Otero Ingeniero Residente de Interventoría Matrícula No. 25202-186068 CND					

SOPORTE DE ACTA		MEMORIA CANTIDADES DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1						
TRAMO: RUTA 7802, 7803 y 7804		HORARIO:		7:00 a. m. 5:00 a. m.				
FECHA: Noviembre-2025		LLUVIAS:		INICIO:		3+900		FIN: 79+842

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA								
N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]		ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 45							
2	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	77+998.0	78+000.0	2.0	4.95		9.9	Parqueo de pavimento
3	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+000.0	78+071.0	71.0	4.95		351.5	Parqueo de pavimento
4	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+071.0	78+073.0	2	4.95		9.9	Parqueo de pavimento
5	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	77+967.4	77+969.4	2	4.58		9.2	Parqueo de pavimento, se finaliza transicion
6	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	77+969.4	78+071.0	101.6	4.58		465.3	Parqueo de pavimento
7	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+071.0	78+073.0	2	4.58		9.2	Parqueo de pavimento, transicion final
8	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+073.0	78+146.0	73	3.9		284.7	Parqueo de pavimento
9	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+151.0	78+166.0	15	3.9		58.5	Parqueo de pavimento
10	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+166.0	78+203.0	37	3.9		144.3	Parqueo de pavimento
11	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+212.0	78+250.0	38	3.79		144.0	Parqueo de pavimento
12	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+271.0	78+279.0	8	3.9		421.2	Parqueo de pavimento
13	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+073.0	78+179.0	106	3.6		381.6	Parqueo de pavimento
14	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+179.0	78+203.0	24	1.02		24.5	Parqueo de pavimento
15	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+179.0	78+203.0	24	2.65		63.6	Parqueo de pavimento
16	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+203.0	78+321.0	118	3.65		430.7	Parqueo de pavimento
17	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+321.0	78+454.0	133	3.6		478.8	Parqueo de pavimento
18	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+462.0	78+483.0	21	3.6		75.6	Parqueo de pavimento
19	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+521.0	78+558.5	37.5	3.6		135.0	Parqueo de pavimento
20	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+587.5	78+606.0	18.5	3.4		62.9	Parqueo de pavimento
21	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+829.5	78+845.8	16.3	3.60		58.7	Parqueo de pavimento
22	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	78+874.0	78+904.0	30.0	3.72		111.6	Parqueo de pavimento
23	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	79+833.5	79+841.5	8.0	3.54		28.3	Parqueo de pavimento
24	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+426.5	78+462.7	36.2	3.7		133.9	Parqueo de pavimento
25	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+473.0	78+489.0	16.0	3.71		59.4	Parqueo de pavimento
26	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+499.4	78+506.2	6.8	3.74		25.4	Parqueo de pavimento
27	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+514.3	78+521.6	7.3	3.73		27.2	Parqueo de pavimento
28	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+541.0	78+572.7	31.7	3.73		118.2	Parqueo de pavimento
29	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+730.0	78+735.0	5.0	3.92		19.6	Parqueo de pavimento
30	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	78+831.8	78+845.8	14.0	3.65		51.1	Parqueo de pavimento
31	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	79+112.0	79+117.4	5.4	3.93		21.2	Parqueo de pavimento
32	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	79+162.0	79+167.3	5.3	3.89		20.6	Parqueo de pavimento
33	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	79+175.5	79+180.0	4.5	3.81		17.1	Parqueo de pavimento
34	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	79+194.8	79+198.2	3.4	3.76		12.8	Parqueo de pavimento
35	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7802	79+398.0	79+406.0	8.0	3.74		29.9	Parqueo de pavimento
36	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	79+072.0	79+081.0	9.0	3.89		35.0	Parqueo de pavimento
37	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	79+150.0	79+154.3	4.3	3.88		16.7	Parqueo de pavimento
38	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	79+167.0	79+170.6	3.6	3.83		13.8	Parqueo de pavimento
39	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	79+175.5	79+179.9	4.4	3.90		17.2	Parqueo de pavimento
40	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	79+378.0	79+385.4	7.4	3.90		28.9	Parqueo de pavimento
41	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7802	79+398.0	79+406.0	8.0	3.62		29.0	Parqueo de pavimento
42								
43	Imprimación CRR-1 eje ruta 7803	5+985.6	5+993.9	8.3	1.97		16.4	Parqueo de pavimento
44	Imprimación CRR-1 eje ruta 7803	6+007.0	6+014.8	7.8	2.92		22.8	Parqueo de pavimento
45	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	14+697.0	14+700.5	3.5	3.40		11.9	Parqueo de pavimento
46	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	14+729.5	14+733.0	3.5	3.70		13.0	Parqueo de pavimento
47	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7803	14+744.0	14+754.0	10.0	7.30		73.0	Parqueo de pavimento
48	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7803	14+754.0	14+773.0	19	7.3		138.7	Parqueo de pavimento
49	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7803	14+773.0	14+783.0	10	7.3		73.0	Parqueo de pavimento
50	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	14+878.0	14+885.5	7.5	3.7		27.8	Parqueo de pavimento
51	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7803	15+222.0	15+232.0	10	7.4		74.0	Parqueo de pavimento
52	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7803	15+232.0	15+256.0	24	7.4		177.6	Parqueo de pavimento
53	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7803	15+256.0	15+266.0	10	7.4		74.0	Parqueo de pavimento
54								
55	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+210.0	9+234.6	24.6	3.64		89.5	Parqueo de pavimento
56	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+268.2	9+372.7	104.5	3.67		383.5	Parqueo de pavimento
57	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+372.7	9+527.4	154.7	3.69		570.8	Parqueo de pavimento, parcial falta 11.3m
58	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+499.1	9+511.7	12	2.4		2.4	Parqueo de pavimento, empalme acceso
59	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	9+388.0	9+454.8	66.8	3.8		253.8	Parqueo de pavimento
60	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+527.4	9+661.9	134.5	3.8		511.1	Se finaliza parqueo de pavimento
61	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+677.1	9+708.1	31	3.8		117.8	Parqueo de pavimento
62	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7804	10+000.0	10+001.6				0.0	Tapa huecos Ruta 7804
63	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	9+457.8	9+539.3	81.5	3.73		304.0	Parqueo de pavimento
64	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	9+631.4	9+661.9	30.5	3.73		113.8	Parqueo de pavimento
65	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	9+697.8	9+729.3	31.5	3.73		117.5	Parqueo de pavimento
66	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	10+142.6	10+209.1	66.5	3.9		259.4	Parqueo de pavimento
67	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	10+230.0	10+265.0	35	3.9		136.5	Parqueo de pavimento
68	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	10+317.0	10+338.0	21	3.9		81.9	Parqueo de pavimento
69	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	10+248.7	10+251.2	2.5	0.7		1.8	Parqueo de pavimento
70	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	3+900.0	3+901.5				0.0	Tapa huecos Ruta 7804
71	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	10+331.0	10+524.0	193	3.85		743.1	Parqueo de pavimento
72	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	10+531.0	10+558.0	27	3.85		104.0	Parqueo de pavimento
73	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+880.0	9+952.4	72.4	4.1		296.8	Parqueo de pavimento
74	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+150.1	10+209.1	59	3.9		230.1	Parqueo de pavimento, parcial primera capa
75	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+952.4	10+060.4	108	4.1		442.8	Parqueo de pavimento, parcial primera capa
76	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+150.1	10+209.1	59	3.9		230.1	Parqueo de pavimento, segunda capa
77	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	9+952.4	10+060.4	108	4.1		442.8	Parqueo de pavimento, segunda capa
78	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	9+880.0	9+998.0	118	4		472.0	Parqueo de pavimento
79	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	9+998.0	10+080.0	82	4		328.0	Parqueo de pavimento
80	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+080.0	10+124.0	44	3.9		171.6	Parqueo de pavimento
81	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+143.0	10+158.0	15	3.9		58.5	Parqueo de pavimento
82	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	10+060.0	10+083.0	23	4		92.0	Parqueo de pavimento
83	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+504.0	10+520.0	16	3.98		63.7	Parqueo de pavimento
84	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+535.7	10+555.7	20	3.95		79.0	Parqueo de pavimento
85	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+685.0	10+693.0	8	3.98		31.8	Parqueo de pavimento
86	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	10+715.0	10+750.0	35	3.45		120.8	Parqueo de pavimento
87	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	21+296.5	21+301.7	5.2	4.43		23.0	Parqueo de pavimento
88	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	21+312.6	21+321.2	8.6	4.43		38.1	Parqueo de pavimento
89	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	21+346.0	21+355.8	9.8	3.4		33.3	Parqueo de pavimento
90	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	21+360.9	21+372.2	11.3	4.25		48.0	Parqueo de pavimento
91	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	21+365.0	21+372.0	7	3.7		25.9	Parqueo de pavimento
92	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	21+418.9	21+425.5	6.6	4.33		28.6	Parqueo de pavimento
93	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	21+473.5	21+484.0	10.5	4.55		47.8	Parqueo de pavimento
94	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	21+623.0	21+647.5	24.5	4.02		98.5	Parqueo de pavimento
95	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	21+720.5	21+734.0	13.5	3.8		51.3	Parqueo de pavimento
96	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	21+805.7	21+812.1	6.4	2.9		18.6	Parqueo de pavimento
97	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	21+640.0	21+644.0	4	4		16.0	Parqueo de pavimento
98	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	22+550.0	22+556.0	6	3.8		22.8	Parqueo de pavimento, transicion inicial
99	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	22+556.0	22+683.0	127	3.8		482.6	Parqueo de pavimento
100	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	22+683.0	22+689.0	6	3.8		22.8	Parqueo de pavimento, transicion final
						TOTAL EJECUTADO	12,946.4	
						Acumulado Acta parcial de obra 44	333,338.2	
						Facturado Actas Anteriores	333,338.2	
						Valor Presente Acta	12,946.4	
						Valor Acumulado Presente Acta	346,284.6	

Firma: 
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matriculá No.: 22202-210255COR

Firma: 
Nombre: Ivan Denis Montiel Otero
Ingeniero Residente de Interventoría
Matriculá No.: 25202-186068 CND

FORMATO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS
F08-T V:0



FECHA: Noviembre-2025	
TRAMO: RUTA 7802, 7803 y 7804	
MEMORIA CANTIDADES DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	
INICIO	3+900.0
FIN	79+841.5

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO



27 oct 2025 12:41:09 p. m.
San Fernando
Bolívar
u



28 oct 2025 11:38:55 a. m.
San Fernando-Mompox
San Fernando
Bolívar
u
Número de índice: 20

Imagen 1: Parqueo de pavimento ruta 7804 Margen Izquierda PR09+210 - PR09+234.6

Imagen 2: Parqueo de pavimento ruta 7804 Margen Izquierda PR09+372.1 - PR09+527.4



5/11/2025 3:19:57 p. m.
9.28960648N 74.67187008W
78
Bolívar
Consortio BMC
Transversal Momposina
RN 7802



13/11/2025 5:43:17 p. m.
9.279685533333332N 74.67544153333333W ±3,69m
78
Bolívar
Consortio BMC
transversal Momposina
tramo 7802

Imagen 3: Parqueo de pavimento ruta 7802 Margen Izquierda PR78+073 - PR78+179

Imagen 4: Parqueo de pavimento Ruta 7802 margen Derecha PR79+167 - PR79+170.6



20/11/2025 4:45:50 p. m.
9.3010628N 74.565988W ±911,44m
11A-9 Carrera 7
Talaigua Nuevo
Bolívar
Consortio BMC
transversal Momposina
tramo 7803



20 nov 2025 1:13:48 p. m.
Altitud:29.4msnm
Velocidad:1.7km/h
tu
Número de índice: 417

Imagen 5: Parqueo de pavimento Ruta 7803 margen Derecha PR14+697 - PR14+700.5

Imagen 6: Parqueo de pavimento Ruta 7804 margen Derecha PR10+080 - PR10+124

Firma:
Nombre: Aquilino José Pérez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR

Firma:
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de interventoría
Matrícula No. 25202-186068 CND

SOPORTE DE ACTA

HORARIO: 7:00 a. m. 5:00 a. m.

79+842

N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]	Espesor [m]		VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 45								
2	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	77+998.0	78+000.0	2.0	4.95	0.050		0.5	Parcheo de pavimento
3	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+000.0	78+071.0	71.0	4.95	0.100		35.1	Parcheo de pavimento
4	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+071.0	78+073.0	2	4.95	0.050		0.5	Parcheo de pavimento
5	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	77+967.4	77+969.4	2	4.58	0.050		0.5	Parcheo de pavimento, se finaliza transicion
6	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	77+969.4	78+073.0	104.6	4.58	0.100		46.0	Parcheo de pavimento
7	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+073.0	78+073.0	2	4.58	0.050		0.5	Parcheo de pavimento, transicion final
8	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+073.0	78+146.0	73	3.9	0.100		28.5	Parcheo de pavimento
9	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+151.0	78+166.0	15	3.9	0.100		5.9	Parcheo de pavimento
10	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+166.0	78+203.0	37	3.9	0.100		14.4	Parcheo de pavimento
11	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+212.0	78+250.0	38	3.79	0.100		14.4	Parcheo de pavimento
12	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+271.0	78+379.0	108	3.9	0.100		42.1	Parcheo de pavimento
13	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+073.0	78+179.0	106	3.6	0.120		45.8	Parcheo de pavimento
14	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+179.0	78+203.0	24	1.02	0.120		2.9	Parcheo de pavimento
15	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+179.0	78+203.0	24	2.65	0.120		7.6	Parcheo de pavimento
16	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+203.0	78+221.0	18	3.65	0.120		51.7	Parcheo de pavimento
17	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+321.0	78+454.0	133	3.6	0.124		59.4	Parcheo de pavimento
18	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+462.0	78+483.0	21	3.6	0.100		7.6	Parcheo de pavimento
19	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+521.0	78+558.5	37.5	3.6	0.115		15.5	Parcheo de pavimento
20	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+587.5	78+606.0	18.5	3.4	0.120		7.5	Parcheo de pavimento
21	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+829.5	78+845.8	16.3	3.60	0.120		7.0	Parcheo de pavimento
22	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	78+874.0	78+904.0	30.0	3.72	0.080		8.9	Parcheo de pavimento
23	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	79+833.5	79+841.5	8.0	3.54	0.085		2.4	Parcheo de pavimento
24	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+426.5	78+462.7	36.2	3.7	0.123		16.5	Parcheo de pavimento
25	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+473.0	78+489.0	16.0	3.71	0.125		7.4	Parcheo de pavimento
26	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+499.4	78+506.2	6.8	3.74	0.080		2.0	Parcheo de pavimento
27	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+514.3	78+521.6	7.3	3.73	0.080		2.2	Parcheo de pavimento
28	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+541.0	78+572.7	31.7	3.73	0.104		12.3	Parcheo de pavimento
29	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+730.0	78+735.0	5.0	3.92	0.081		1.6	Parcheo de pavimento
30	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	78+831.8	78+845.8	14.0	3.65	0.080		4.1	Parcheo de pavimento
31	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	79+112.0	79+117.4	5.4	3.93	0.100		2.1	Parcheo de pavimento
32	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	79+162.0	79+167.3	5.3	3.89	0.092		2.1	Parcheo de pavimento
33	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	79+175.5	79+180.0	4.5	3.81	0.100		1.7	Parcheo de pavimento
34	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	79+194.8	79+198.2	3.4	3.76	0.100		1.3	Parcheo de pavimento
35	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7802	79+398.0	79+406.0	8.0	3.74	0.100		3.0	Parcheo de pavimento
36	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	79+072.0	79+081.0	9.0	3.89	0.115		4.0	Parcheo de pavimento
37	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	79+150.0	79+154.3	4.3	3.88	0.100		1.7	Parcheo de pavimento
38	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802	79+167.0	79+170.6	3.6	3.83	0.100		1.4	Parcheo de pavimento
39	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7802								

28 981 4

38.081.4

1 324 6

Valor acumulado presente acta	30 306 0
-------------------------------	----------

Firma 
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de interveni...
Matrícula No. 25202-186068 CND

FORMATO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS
F08-T V:0



FECHA: Noviembre-2025	
TRAMO: RUTA 7802, 7803 y 7804	
MEMORIA CANTIDADES DE MEZCLA MDC-19	
INICIO	3+900.0
FIN	79+841.5

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO



Imagen 1: Parqueo de pavimento ruta 7802 Margen Derecha PR78+000 - PR78+071



Imagen 2: Parqueo de pavimento ruta 7804 Margen Izquierda PR09+372.7 - PR09+527.4



Imagen 3: Parqueo de pavimento ruta 7802 Margen Izquierda PR78+073 - PR78+179



Imagen 4: Parqueo de pavimento Ruta 7802 margen Izquierda PR78+203 - PR78+321



Imagen 5: Parqueo de pavimento Ruta 7802 margen Derecha PR78+426.5 - PR78+462.7



Imagen 6: Parqueo de pavimento Ruta 7804 margen Derecha PR10+715 - PR10+750

Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR

Firma:
Nombre: Ivan Darjo Montes Otero
Ingeniero Residente de interventoría
Matrícula No. 25202-186068 CND

SOPORTE DE ACTA		MEMORIA CANTIDADES DE FRESADO							
TRAMO: RUTA 7802, 7803 y 7804		HORARIO:		7:00 a. m.		5:00 a. m.			
FECHA: Noviembre-2025		LLUVIAS:		INICIO:		5+986		FIN:	79+842
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]	Espesor [m]		VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 45								
2	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+002.0	78+071.0	69.0	4.1	0.15		42.4	Parcheo de pavimento
3	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	77+971.4	78+071.0	99.6	3.2	0.15		47.8	Parcheo de pavimento
4	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+073.0	78+146.0	73.0	3.9	0.10		28.5	Parcheo de pavimento
5	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+151.0	78+203.0	52	3.9	0.10		20.3	Parcheo de pavimento
6	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+212.0	78+250.0	38	3.79	0.10		14.4	Parcheo de pavimento
7	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+271.0	78+379.0	108	3.9	0.10		42.1	Parcheo de pavimento
8	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+073.0	78+179.0	106	3.6	0.12		45.8	Parcheo de pavimento
9	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+179.0	78+203.0	24	1.02	0.12		2.9	Parcheo de pavimento
10	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+179.0	78+203.0	24	2.65	0.12		7.6	Parcheo de pavimento
11	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+203.0	78+321.0	118	3.65	0.12		51.7	Parcheo de pavimento
12	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+321.0	78+454.0	133	3.6	0.124		59.4	Parcheo de pavimento
13	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+462.0	78+483.0	21	3.6	0.1		7.6	Parcheo de pavimento
14	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+521.0	78+558.5	37.5	3.6	0.115		15.5	Parcheo de pavimento
15	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+587.5	78+606.0	18.5	3.4	0.12		7.5	Parcheo de pavimento
16	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+829.5	78+845.8	16.3	3.6	0.12		7.0	Parcheo de pavimento
17	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	78+874.0	78+904.0	30	3.72	0.08		8.9	Parcheo de pavimento
18	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	79+833.5	79+841.5	8	3.54	0.085		2.4	Parcheo de pavimento
19	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+426.5	78+462.7	36.2	3.7	0.123		16.5	Parcheo de pavimento
20	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+473.0	78+489.0	16	3.71	0.125		7.4	Parcheo de pavimento
21	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+499.4	78+506.2	6.8	3.74	0.08		2.0	Parcheo de pavimento
22	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+514.3	78+521.6	7.3	3.73	0.08		2.2	Parcheo de pavimento
23	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+541.0	78+572.7	31.7	3.73	0.104		12.3	Parcheo de pavimento
24	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+730.0	78+735.0	5	3.92	0.081		1.6	Parcheo de pavimento
25	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	78+831.8	78+845.8	14	3.65	0.08		4.1	Parcheo de pavimento
26	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	79+112.0	79+117.4	5.4	3.93	0.1		2.1	Parcheo de pavimento
27	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	79+162.0	79+167.3	5.3	3.89	0.1		2.1	Parcheo de pavimento
28	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	79+175.5	79+180.0	4.5	3.81	0.1		1.7	Parcheo de pavimento
29	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	79+194.8	79+198.2	3.4	3.76	0.1		1.3	Parcheo de pavimento
30	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7802	79+398	79+406.0	8	3.74	0.1		3.0	Parcheo de pavimento
31	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	79+072.0	79+081.0	9.0	3.89	0.115		4.0	Parcheo de pavimento
32	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	79+150.0	79+154.3	4.3	3.88	0.1		1.7	Parcheo de pavimento
33	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	79+167.0	79+170.6	3.6	3.83	0.1		1.4	Parcheo de pavimento
34	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	79+175.5	79+179.9	4.4	3.90	0.1		1.7	Parcheo de pavimento
35	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	79+378.0	79+385.4	7.4	3.90	0.11		3.2	Parcheo de pavimento
36	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7802	79+398.0	79+406.0	8.0	3.62	0.11		3.2	Parcheo de pavimento
37									
38	Fresado de pavimento Margen eje Ruta 7803	5+985.6	5+993.9	8.3	1.97	0.155		2.5	Parcheo de pavimento
39	Fresado de pavimento Margen eje Ruta 7803	6+007.0	6+014.8	7.8	2.92	0.16		3.6	Parcheo de pavimento
40	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	14+697.0	14+700.5	3.5	3.4	0.15		1.8	Parcheo de pavimento
41	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	14+729.5	14+733.0	3.5	3.7	0.15		1.9	Parcheo de pavimento
42	Fresado de pavimento Margen calzada Ruta 7803	14+754.0	14+773.0	19	7.3	0.15		20.8	Parcheo de pavimento
43	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	14+878.0	14+885.5	7.5	3.6	0.14		3.8	Parcheo de pavimento
44	Fresado de pavimento Margen calzada Ruta 7803	15+232.0	15+256.0	24.0	7.40	0.15		26.6	Parcheo de pavimento
45									
46	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	9+120.0	9+144.6	24.6	3.64	0.105		9.4	Parcheo de pavimento
47	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	9+268.2	9+394.7	126.5	3.67	0.1		46.4	Parcheo de pavimento
48	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	9+372.7	9+538.7	166.0	3.69	0.11		67.4	Parcheo de pavimento
49	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	9+391.0	9+454.8	63.8	3.80	0.11		26.7	Parcheo de pavimento
50	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	9+538.7	9+661.9	123.2	3.80	0.11		51.5	Parcheo de pavimento
51	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	9+677.1	9+708.1	31.0	3.80	0.1		11.8	Parcheo de pavimento
52	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	9+457.8	9+539.3	81.5	3.73	0.1		30.4	Parcheo de pavimento
53	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	9+631.4	9+661.9	30.5	3.73	0.11		12.5	Parcheo de pavimento
54	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	9+697.8	9+729.3	31.5	3.73	0.1		11.7	Parcheo de pavimento
55	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+142.6	10+209.1	66.5	3.9	0.11		28.5	Parcheo de pavimento
56	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+230.0	10+265.0	35	3.9	0.12		16.4	Parcheo de pavimento
57	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+317.0	10+338.0	21.0	3.90	0.12		9.8	Parcheo de pavimento
58	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+338.0	10+531.0	193.0	3.85	0.115		85.5	Parcheo de pavimento
59	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+531.0	10+558.0	27.0	3.85	0.115		12.0	Parcheo de pavimento
60	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	9+880.0	10+060.0	180.0	4.00	0.15		108.0	Parcheo de pavimento
61	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+150.1	10+209.1	59	3.9	0.12		27.6	Parcheo de pavimento
62	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	9+880.0	10+060.0	180	4	0.15		108.0	Parcheo de pavimento
63	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+060.0	10+080.0	20	4	0.15		12.0	Parcheo de pavimento
64	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+080.0	10+124.0	44	3.9	0.115		19.7	Parcheo de pavimento
65	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+143.0	10+158.0	15	3.9	0.06		3.5	Parcheo de pavimento
66	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	10+060.0	10+083.0	23	4	0.166		15.3	Parcheo de pavimento
67	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	10+504.0	10+520.0	16	3.98	0.153		9.7	Parcheo de pavimento
68	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	10+535.7	10+555.7	20	3.95	0.155		12.2	Parcheo de pavimento
69	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	10+685.0	10+703.0	18	3.98	0.155		11.1	Parcheo de pavimento
70	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	10+715.0	10+750.0	35	3.45	0.115		13.9	Parcheo de pavimento
71	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	21+296.5	21+301.7	5.2	4.43	0.118		2.7	Parcheo de pavimento
72	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	21+312.6	21+321.2	8.6	4.43	0.11		4.2	Parcheo de pavimento
73	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	21+346.0	21+355.8	9.8	3.4	0.12		4.0	Parcheo de pavimento
74	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	21+360.9	21+372.2	11.3	4.25	0.12		5.8	Parcheo de pavimento
75	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	21+365.0	21+372.0	7	3.7	0.123		3.2	Parcheo de pavimento
76	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	21+418.9	21+425.5	6.6	4.33	0.11		3.1	Parcheo de pavimento
77	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	21+473.5	21+484.0	10.5	4.55	0.114		5.4	Parcheo de pavimento
78	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	21+623.0	21+647.5	24.5	4.02	0.11		10.8	Parcheo de pavimento
79	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7804	21+720.5	21+734.0	13.5	3.8	0.115		5.9	Parcheo de pavimento
80	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	21+805.7	21+812.1	6.4	2.9	0.11		2.0	Parcheo de pavimento
81	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7804	22+556.0	22+683.0	127	3.8	0.15		72.4	Parcheo de pavimento
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
							TOTAL EJECUTADO	1,424.8	
							Viene de Acumulados acta parcial de obra 44	24,181.4	
							Facturado Actas Anteriores	24,181.4	
							Valor Presente Acta	1,424.8	
							Acumulado presente acta	25,606.2	



Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matricula No. 22002-210255COR



Firma:
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de intervientoría
Matricula No. 22002-186068 CND

Firma: 
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matricula No.: 2202-210255COR

Firma: 
Nombre: Ivan Dario Montes Otero
Ingeniero Residente de Interventoria
Matricula No. 25202-186068 CND

FORMATO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS
F08-T V:0



FECHA: Noviembre-2025	
TRAMO: RUTA 7802, 7803 y 7804	
MEMORIA CANTIDADES DE FRESADO	
INICIO	5+985.6
FIN	79+841.5

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO



Imagen 1: Fresado de pavimento ruta 7804 margen Izquierda PR09+268.2 - PR09+394.7



Imagen 2: Fresado de pavimento ruta 7804 margen Izquierda PR09+372.7 - PR09+538.7



Imagen 3: Fresado de pavimento ruta 7802 margen Derecha PR78+073 - PR78+146



Imagen 4: Fresado de pavimento ruta 7802 margen Izquierda PR78+203 - PR78+321



Imagen 5: Fresado de pavimento ruta 7802 margen Izquierda PR78+587.5 - PR77+606



Imagen 6: Fresado de pavimento ruta 7804 margen Izquierda PR10+060 - PR10+083

Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR

Firma:
Nombre: Ivan Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de interventoría
Matrícula No. 25202-186068 CND

SOPORTE DE ACTA

MEMORIA CANTIDADES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA LINEAS DEMARCAACION DE PAVIMENTOS

TRAMO: RUTA 7802 y 7803

HORARIO: 7:00 a. m. 5:00 a. m.

FECHA: Octubre-2025


LLUVIAS:

INICIO: 1+000


FIN: 78+068

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	longitud [m]	Long pintada Blanc D	Long pintada Blanc I	Long pintada Eje	longitud [m]	OBSERVACIONES
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 45								
2	Líneas demarca. margen Derecha Ruta 7802	47+000	56+000	8960.0	8960	0	0	8960.0	Linea blanca derecha
3	Líneas demarca. margen Izquierda Ruta 7802	47+000	56+000	8960.0	0	8960	0	8960.0	Linea blanca izquierda
4	Líneas demarca. margen Eje Ruta 7802	54+617	56+000	1433.0	0	0	1433	1433.0	Linea amarilla
5	Líneas demarca. margen Derecha Ruta 7802	37+000	40+093	3093.0	3093	0	0	3093.0	Linea blanca derecha
6	Líneas demarca. margen Izquierda Ruta 7802	37+000	40+093	3093.0	0	3093	0	3093.0	Linea blanca izquierda
7	Líneas demarca. margen Eje Ruta 7802	37+000	40+093	6186.0	0	0	6186	6186.0	Linea amarilla
8	Líneas demarca. margen Derecha Ruta 7802	77+400	78+068	668.0	668	0	0	668.0	Linea blanca derecha
9	Líneas demarca. margen Izquierda Ruta 7802	77+400	78+068	668.0	0	668	0	668.0	Linea blanca izquierda
10	Líneas demarca. margen Eje Ruta 7802	77+400	78+068	854.0	0	0	854	854.0	Linea amarilla
11									
12	Líneas demarca. margen Derecha Ruta 7803	1+000	3+000	2000.0	2000	0	0	2000.0	Linea blanca derecha
13	Líneas demarca. margen Izquierda Ruta 7803	1+000	3+000	2000.0	0	2000	0	2000.0	Linea blanca izquierda
14	Líneas demarca. margen Eje Ruta 7803	1+000	3+000	1727.0	0	0	1727	1727.0	Linea amarilla
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
							TOTAL EJECUTADO	39,642.0	

Acumulado Acta 44	1,029,421.1
Facturado Actas Anteriores	1,029,421.1
Total Presente Acta	39,642.0
Total acumulado presente acta	1,069,063.1

Firma: 

Nombre: Aquilino José Pérez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 2202-210255COR

Firma: 

Nombre: Iván Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de Interventoría
Matrícula No. 25202-186068 CND

FORMATO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS
F08-T V:0



FECHA: Octubre-2025

TRAMO: RUTA 7802 y 7803

MEMORIA CANTIDADES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA LINEAS DEMARCAACION DE PAVIMENTOS

INICIO	1+000.0	FIN	78+068.0
--------	---------	-----	----------

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO



Imagen 1: Instalacion Pintura Linea Blanca ruta 7802 PR47+000 - PR56+000



Imagen 2: Instalacion Pintura Linea amarilla ruta 7803 PR01+000 - PR03+000



Imagen 3: Instalacion Pintura Linea Blanca ruta 7802 PR77+400 - PR78+068



Imagen 4: Instalacion Pintura Linea Blanca ruta 7803 PR01+000 - PR03+000

Firma:

Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara

Ingeniero Residente de Obra

Matricula No.: 22202-210255COR

Firma

Nombre: Iván Darío Montes Otero

Ingeniero Residente de intervenotira

Matricula No. 25202-186068 CND

SOPORTE DE ACTA

MEMORIA CANTIDADES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL POR M2

TRAMO: RUTA 7805

HORARIO: 7:00 a. m. 5:00 a. m.

FECHA: Noviembre-2025

LLUVIAS:

INICIO: 35+575


FIN: 35+715

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]	Cantidad [und]	ÁREA [m2]	ÁREA TOTAL [m2]	OBSERVACIONES
1	Acta parcial de obra 45								
2	ZONA ESCOLAR Calzada Ruta 7805	35+625	35+625			2	6.06	12.12	ZONA ESCOLAR
3	LINEA DE DETENCION Calzada Ruta 7805	35+635	35+635	5.27	0.60	2	3.16	6.32	LINEA DE DETENCION
4	SP-47A Calzada Ruta 7805	35+575	35+575	2.87	1.00	2	2.87	5.74	SP-47A
5	PASO DE CEBRA Calzada Ruta 7805	35+640	35+640	18.67	0.6	2	11.20	22.40	PASO DE CEBRA
6	ZONA ESCOLAR Calzada Ruta 7805	35+655	35+655	17.75	1.00	2	17.75	35.50	ZONA ESCOLAR
7	LINEA DE DETENCION Calzada Ruta 7805	35+645	35+645	6.26	0.6	2	3.76	7.52	LINEA DE DETENCION
8	SP-47A Calzada Ruta 7805	35+715	35+715	3.25		1	3.25	6.50	SP-47A
9	PASO DE CEBRA Calzada Ruta 7805	35+640	35+640	23.92	0.6	2	14.35	28.70	PASO DE CEBRA
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
							TOTAL EJECUTADO	124.80	

Acumulado Acta 44	4539.72
Facturado Actas Anteriores	4539.72
Total Presente Acta	124.80
Total acumulado presente acta	4664.52



Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matricula No: 22202-210255COR



Firma
Nombre: Iván Dario Montes Otero
Ingeniero Residente de intervenotira
Matricula No. 25202-186068 CND

FORMATO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS

F08-T V:0




FECHA: Noviembre-2025			
TRAMO: RUTA 7805			
MEMORIA CANTIDADES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA LINEAS DEMARCAACION DE PAVIMENTO:			
	INICIO	35+575.0	FIN
			35+715.0

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO





Imagen 1: Instalacion PictogramasPASO CEBRADO ruta 7805 PR34+640

Firma: 

Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara

Ingeniero Residente de Obra

Matricula No.: 22202-210255COR



Imagen 2: Instalacion Pictogramas ZONA ESCOLAR ruta 7805 PR35+625

Firma: 


Nombre: Iván Darío Montes Otero

Ingeniero Residente de intervenotira

Matricula No. 25202-186068 CND

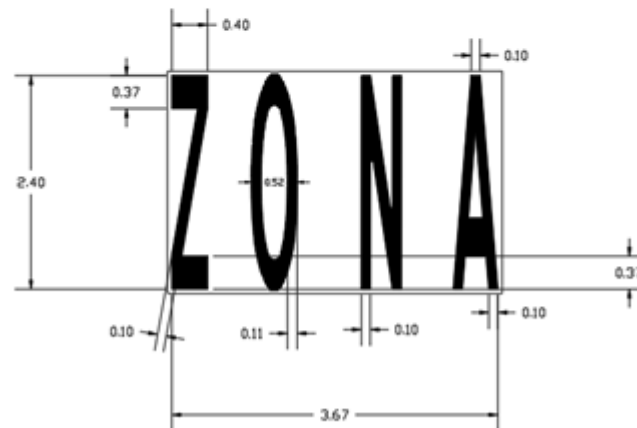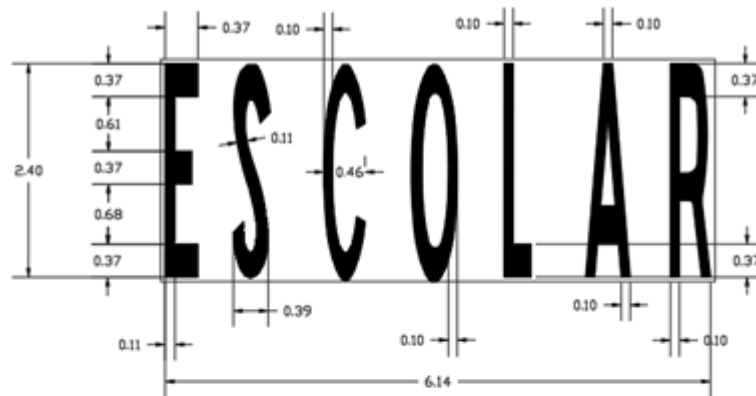

AREA PINTURA: 6.1 m²

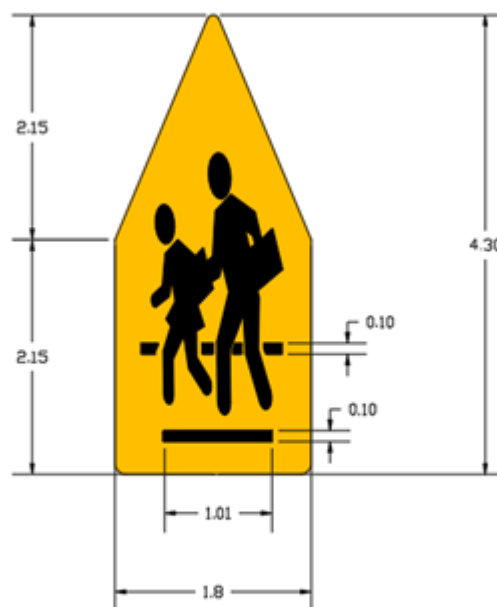

AREA PINTURA: 5.7 m²
