

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CAR-CM-1439-2025

OBJETO:

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

CONTRATANTE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

INTERVENTOR

TECHNE S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN					
VERSIÓN	FECHA	OBJETO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
01	01-11-2025 AL 30-11-2025	INFORME MENSUAL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
3.	DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS	6
3.1	CONTRATO DE OBRA.....	6
3.2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8
4.	ASPECTOS TÉCNICOS.....	10
4.1	RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO	10
☐	Programación de obra.....	10
4.2	VISITAS REALIZADAS EN ENTORNOS	12
☐	Municipio de Machetá.....	12
☐	Municipio de Manta.....	15
☐	Municipio de Guayabal de Siquima.....	19
☐	Municipio de Beltrán.....	23
☐	Municipio de Chaguaní.....	28
☐	Municipio de Anolaima.....	36
☐	Municipio de Machetá.....	42
☐	Municipio de La Mesa.....	42
4.3	SEGUIMIENTO A ENTORNOS.....	43
4.4	SEGUIMIENTO TÉCNICO INTERVENTORÍA	43
5.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	51
5.1	ACTAS DE COMITÉ	51
5.2	CONTROL DE CORRESPONDENCIA.....	54
5.3	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA.....	73
6.	SEGUIMIENTO AL PLAN HSEQ DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	78
6.1	SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ.....	78
6.2	CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA	78
6.3	GESTIÓN AMBIENTAL.....	78
6.4	ACCIDENTES E INCIDENTE.....	78
6.5	CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.....	78
6.6	PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA.....	78
6.7	PERSONAL DE INTERVENTORÍA.....	79
7.	ASPECTOS FINANCIEROS	80
7.1	CONTRATO DE OBRA.....	80
7.2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	80
7.3	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	81
7.4	ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	81
7.5	SEGUIMIENTO FINANCIERO INTERVENTORÍA.....	82
8.	ASPECTOS JURÍDICOS	85
8.1	ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	85
☐	Pólizas contrato de obra.....	85
8.2	ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	86
☐	Pólizas contrato de interventoría	86
10	CONCLUSIONES.....	87

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos del Contrato de Obra	6
Tabla 2 Profesionales contrato de obra	7
Tabla 3 Datos del contrato de interventoría	8
Tabla 4 Profesionales del contrato de interventoría	9
Tabla 5 Cuadro de Avance Ejecutado	10
Tabla 6 Programado vs Ejecutado	10
Tabla 7. Municipio de Machetá. I.E.D Juan José Neira	13
Tabla 8. Municipio de Machetá. HCB Patios Con Suerte	14
Tabla 9. Municipio de Manta. – I.E.D Manta Sede Fátima.	15
Tabla 10. Municipio de Manta – Alcaldía	17
Tabla 11. Municipio de Guayabal de Siquima. – I.E.D Marco Fidel Suarez	19
Tabla 12. Municipio de Guayabal de Siquima. – Casa de la Cultura.	21
Tabla 13. Municipio de Guayabal de Siquima. –Plaza de Mercado.....	21
Tabla 14. Municipio de Guayabal de Siquima. – Alcaldía Municipal.	22
Tabla 15. Municipio de Beltrán – I.E.D Técnico Agrícola Narváez Sede Manuela Beltrán.....	23
Tabla 16. Municipio de Beltrán – Estación de Policía.....	25
Tabla 17. Municipio de Beltrán – Alcaldía.....	26
Tabla 18. Municipio de Beltrán – Biblioteca.	27
Tabla 19. Municipio de Chaguaní – I.E.D Fray José Ledo Sede Helechal.	29
Tabla 20. Municipio de Chaguaní – I.E.D Fray José Ledo Sede El Rincón.	31
Tabla 21. Municipio de Chaguaní – I.E.D Fray José Ledo Sede Montefrio.	33
Tabla 22. Municipio de Chaguaní – Salón Comunal Vereda Llanadas.....	35
Tabla 23. Municipio de Anolaima – I.E.D José Hugo Enciso.	36
Tabla 24. Municipio de Anolaima – I.E.D José Hugo Enciso, Sede Primaria	39
Tabla 25. Municipio de Anolaima – Salón Comunal Reventones.....	40
Tabla 26. Municipio de Anolaima – Iglesia Reventones.....	41
Tabla 27. Verificación de herramientas – Municipio de Machetá.	42
Tabla 28. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de La Mesa.....	42
Tabla 29 Actas de comité.....	51
Tabla 30 Correspondencia Enviada	54
Tabla 31 Correspondencia Recibida.....	65
Tabla 32 Personal Profesional de Obra	78
Tabla 33 Personal profesional de interventoría	79
Tabla 34 Forma de Pago Contrato de Obra	80
Tabla 35 Forma de Pago Contrato de Interventoría	80
Tabla 36 Estado Financiero del Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025	81
Tabla 37 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025	81
Tabla 38 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025	81
Tabla 39 Estado legal del contrato de obra	85
Tabla 40 Pólizas iniciales contrato de obra	85
Tabla 41 Pólizas Acta de inicio	85
Tabla 42 Estado legal del contrato de interventoría	86
Tabla 43 Pólizas iniciales contrato de interventoría	86
Tabla 44 Pólizas acta de inicio	86

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en su calidad de entidad contratante y en cumplimiento de los principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública, elaboró y publicó el pliego de condiciones para adelantar el proceso de selección del contratista encargado de ejecutar las obras previstas de adecuaciones menores. Como resultado de este proceso, se adjudicó al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 el Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025, cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en los entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano.”

Con el fin de garantizar el cumplimiento integral del contrato de obra, la CAR también llevó a cabo el proceso de selección para contratar la interventoría correspondiente, en el cual fue seleccionada la firma Techne S.A.S., mediante el Contrato No. CAR-CM-1439-2025. El objeto de este contrato es: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato cuyo objeto corresponde a: realizar las adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en los entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano.”

En cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en la cláusula novena del contrato de interventoría, específicamente el numeral 5, que establece la responsabilidad del interventor de presentar informes mensuales pormenorizados, se presenta a continuación el Informe Mensual No. 8, correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.

Este informe incluye, las actividades de seguimiento y control realizadas por la interventoría al Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025, en los componentes técnico, administrativo y financiero, conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

El documento detalla las principales acciones ejecutadas por Techne S.A.S. durante el período de referencia, así como los procedimientos implementados y los avances más significativos en los aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable, dando cumplimiento a las responsabilidades contractuales asignadas en el marco de la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Buscando desarrollar de manera articulada los proyectos 13 - Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular y 17- Entornos sostenibles para la Cultura Ambiental, Educación, Participación y Servicio al Ciudadano, se determinó la necesidad de desarrollar distintas estrategias enfocadas en diversas temáticas y actividades que permitirán una participación, cultura y educación ambiental fortalecida con herramientas educativas que potencien su impacto y mejoren la calidad de vida y el ambiente de los beneficiarios.

El desarrollo de estas estrategias se realizará a través de la organización de componentes temáticos que contengan las herramientas pedagógicas, que permiten desagregar las categorías de los elementos a utilizar, así:

- Componente sistema de recolección de agua lluvia
- Componente uso eficiente y ahorro de agua
- Componente Residuos sólidos
- Componente Biodiversidad
- Componente uso eficiente y ahorro de la energía
- Componente Movilidad sostenible
- Componente Consumo responsable
- Componente planes comunitarios de gestión del riesgo
- Componente de horticultura
- Componente aulas ambientales.

Estos componentes comprenden las herramientas pedagógicas necesarias para la ejecución de proyectos, que incluyen: los insumos para la ejecución de actividades de educación ambiental, y las adecuaciones menores e instalaciones.

A través del presente proceso, se realizará la contratación de las adecuaciones menores e instalaciones a realizar en lo relacionado exclusivamente con la mano de obra requerida, toda vez que los insumos necesarios para cada adecuación menor e instalación, serán suministrados mediante un contrato de suministro separado. Las adecuaciones menores e instalaciones corresponden a las siguientes:

- ADECUACIONES HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS (Componente uso eficiente y ahorro de agua)
- ADECUACIONES HIDROSANITARIAS: SANITARIOS Y ORINALES (uso eficiente y ahorro de agua)
- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS (Componente sistema de recolección de agua lluvia)
- ADECUACIÓN SISTEMA CAPTADOR DE AGUA DE NIEBLA (Componente uso eficiente y ahorro de agua)
- ADECUACIÓN INVERNADERO GERMINADERO (Componente de horticultura)
- ADECUACIÓN HUERTA (Componente de horticultura)
- ENCERRAMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO (Componente sistema de recolección de agua lluvia)
- ENCERRAMIENTO Y TECHADO COMPOSTERAS (Componente Residuos sólidos)
- ADECUACIÓN CENTROS DE ACOPIO (Componente Residuos sólidos)
- ADECUACIÓN AULAS AMBIENTALES (Componente aulas ambientales)

3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de obra e interventoría del proyecto:

3.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos del contrato de obra se describen a continuación, se menciona que se presentara actualización de información una vez se realice alguna modificación o acto legal jurídico por parte de la entidad contratante.

Tabla 1 Datos del Contrato de Obra

CTO DE OBRA - NO. CAR-LP-1259-2025	
Contratista	Consortio Adecuaciones CAR REP. LEG./Yulian Aldemar Beltrán Melo
No. Identificación	Nit. C.C. 79.691.092
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano
Objeto	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	25601182
Valor del contrato	\$ COP 3.059.701.535.00 Tres Mil Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Un Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos M/Cte.
Fecha suscripción contrato	29 de enero de 2025
Fecha de inicio	01 de abril de 2025
Fecha de terminación	01 de mayo de 2026
Plazo del contrato	Trece (13) meses
Forma de pago	Pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con las actividades desarrolladas, cantidades ejecutadas y plasmadas por el contratista en el informe de actividades, durante el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. 10% restante, contra acta de terminación, acta de recibo y de liquidación.
Supervisor(es)	Nidia Clemencia Riaño Rincón Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Fuente: Techne S.A.S.

El personal ofertado por el contratista de obra durante el para la correcta ejecución del contrato No. CAR-LP-1259-2025 es el siguiente:

Tabla 2 Profesionales contrato de obra

CARGO	DEDICACION	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de obra	30%	José Luis Lamus Rodríguez
Residente de obra	100%	Luis Alfonso Riveira Pinto
Profesional técnico 1	100%	Juan Manuel Franco Guzmán
Profesional técnico 2	100%	Kewin Manfred Castañeda
Profesional técnico 3	100%	Jonatan Alexander Feo González
Profesional técnico 4	100%	Yeison Alonso Cárdenas Acosta
Profesional técnico 5	100%	Dayana Robayo Lancheros



3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presentan los datos generales del Contrato de Interventoría, los cuales recogen la información vigente al momento de elaboración del presente informe. Cabe señalar que esta información será actualizada oportunamente en caso de presentarse alguna modificación contractual o la expedición de actos jurídicos que afecten su contenido.

Para el período comprendido se realizó el cambio del representante legal de la interventoría tal como se menciona en la tabla No.3

Tabla 3 Datos del contrato de interventoría

INTERVENTORIA CTO CAR-CM-1439-2025	
Contratista	Techne S.A.S. REP. LEG. /Laura Roció Galindo Castro
No. Identificación	Nit.900.282.761-0 C.C. 1.053.615.046
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano
Objeto	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	25601201
Valor del contrato	\$ COP 306.544.238.00
Valor del contrato	Trescientos Seis Millones Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Ocho pesos M/Cte.
Fecha suscripción contrato	24 de febrero de 2025
Fecha de inicio	01 de abril de 2025
Fecha de terminación	01 de mayo de 2026
Plazo del contrato	Trece (13) meses
Forma de pago	Pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con las actividades desarrolladas, cantidades ejecutadas y plasmadas por el contratista en el informe de actividades, durante el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.
Supervisor(es)	Nidia Clemencia Riaño Rincón Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Fuente: Techne S.A.S.

A continuación, se presenta el listado del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría, en cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito. Este personal fue formalmente presentado ante la entidad contratante con el fin de dar inicio al proceso de revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Esta relación incluye los perfiles profesionales comprometidos por el interventor, conforme a la propuesta técnica presentada y aprobada durante el proceso de selección, y constituye un componente esencial para el adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento, control y verificación del contrato de obra.

Tabla 4 Profesionales del contrato de interventoría

CARGO	DEDICACION	PROFESIONAL INTERVENTORIA
Director de interventoría	30%	Juan Carlos Aragón Pinzón
Residente de interventoría	100%	Fredy Leonel Gómez Rincón
Inspector 1	50%	Erica Andrea Ramírez González
Inspector 2	50%	David Santiago Guamán Panche

Fuente: Techne S.A.S.



4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO

A continuación, se presenta un resumen detallado del avance de la obra en ejecución, correspondiente a las actividades desarrolladas hasta la fecha por parte del Consorcio Adecuaciones CAR 2025, El avance de ejecución de las actividades se ha medido conforme a los hitos establecidos en el contrato de obra, y en la programación general presentada y avalada por la interventoría.

Es fundamental señalar que, como parte del seguimiento a la ejecución de la obra, la interventoría ha solicitado al contratista la presentación de plan de contingencia y su implementación de acuerdo con el retraso que se lleva a la fecha, el cual es del **57,21%** por tanto, se pone en conocimiento de la entidad el atraso que se lleva a la fecha del presente informe.


Tabla 5 Cuadro de Avance Ejecutado

MES	FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO
8	01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025	68,18%	10,98%

Fuente: Techne S.A.S

• Programación de obra

Tabla 6 Programado vs Ejecutado

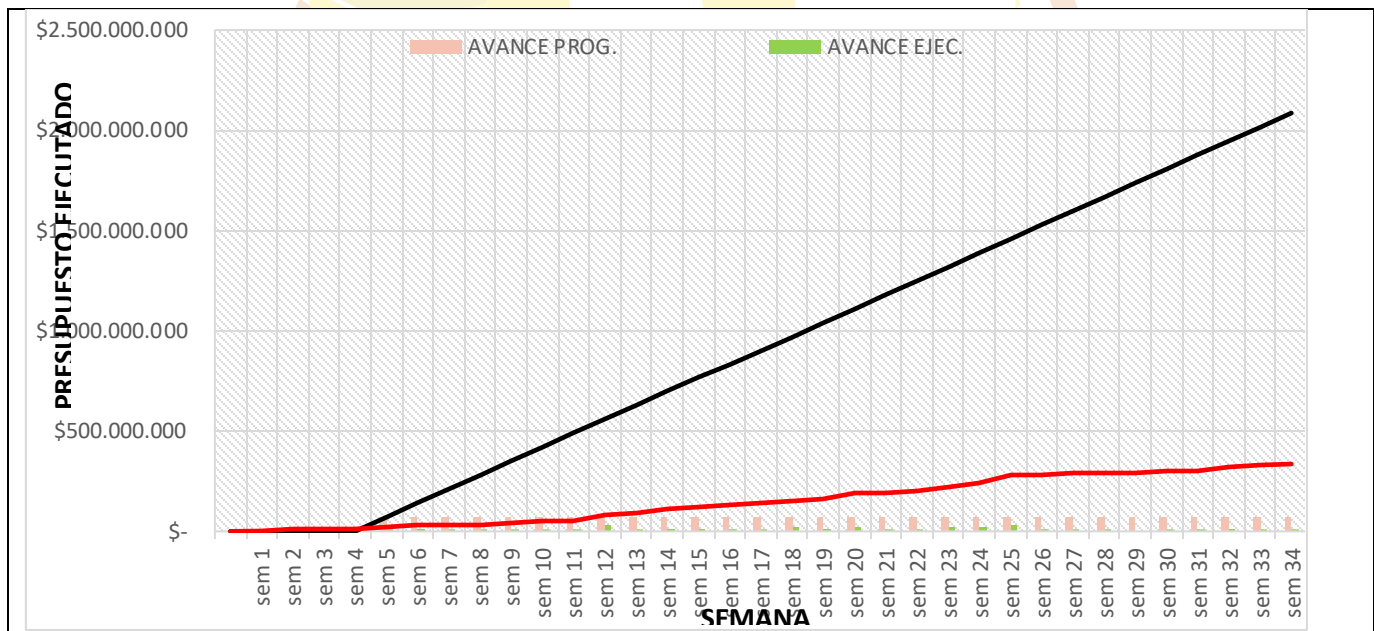

Fuente: Techne S.A.S.

En el marco del presente contrato, la Corporación Autónoma Regional (CAR) a la fecha ha asignado los siguientes municipios:

GRUPO 1
COGUA
SUSA
CHOCONTÁ
SUPATÁ
BUENAVISTA
SAN MIGUEL DE SEMA
EL COLEGIO
NOCAIMA
NIMAIMA
CALDAS
NEMOCÓN

GRUPO 2
PASUNCHA
VERGARA
LA PEÑA
CAPARRAPÍ
PARQUE NEUSA
QUEBRADANEGRA
TAUSA
YACOPÍ

GRUPO 3
SABOYA
SOACHA
SIBATÉ
SAN BERNARDO
TIBACUY
TENA
TIBIRITA

GRUPO 4
SABOYA I.E CARRIZAL
CAJICA
MACHETA
AGUA DE DIOS
SUTATAUSA

GRUPO 4
UTICA
MANTA
PUERTO SALGAR
SESQUILÉ
ANOLAIMA

GRUPO 5
RICAURTE
LA VEGA
CUCUNUBA
CHAGUANÍ
GUAYABAL DE SIQUIMA
TOPAIPI
BELTRÁN

GRUPO 6
APULO
GUADUAS
GIRARDOT
LA MESA
SAN JUAN DE RIOSECO
SAN FRANCISCO
SUESCA
QUIPILE
LA PALMA
ARBELÁEZ
PUERTO SALGAR 2
CALDAS 2


4.2 VISITAS REALIZADAS EN ENTORNOS

- **Municipio de Machetá.**

El día **07 de noviembre de 2025**, se realizó la visita de verificación de herramientas de entornos Sostenibles en el municipio de **Machetá**, donde se verificaron las intervenciones en los entornos de la **I.E.D. Juan José Neira**, el **H.C.B. Agrupado Paticos con Suerte** y la **Biblioteca Municipal**.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.


Tabla 7. Municipio de Machetá. I.E.D Juan José Neira

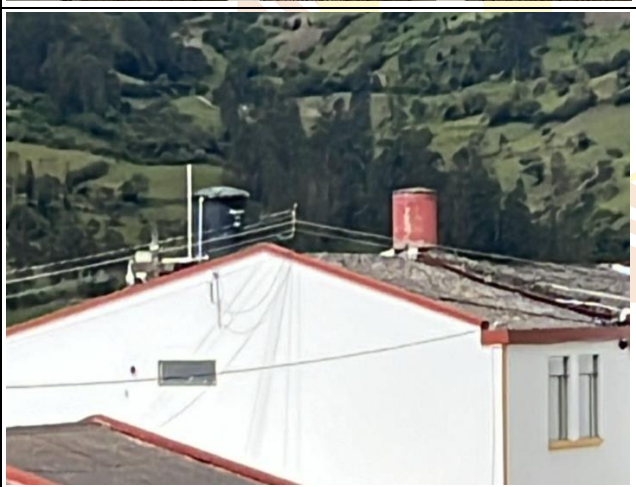ANTES	DESPUÉS
	
	
	



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 8. Municipio de Machetá. HCB Patios Con Suerte

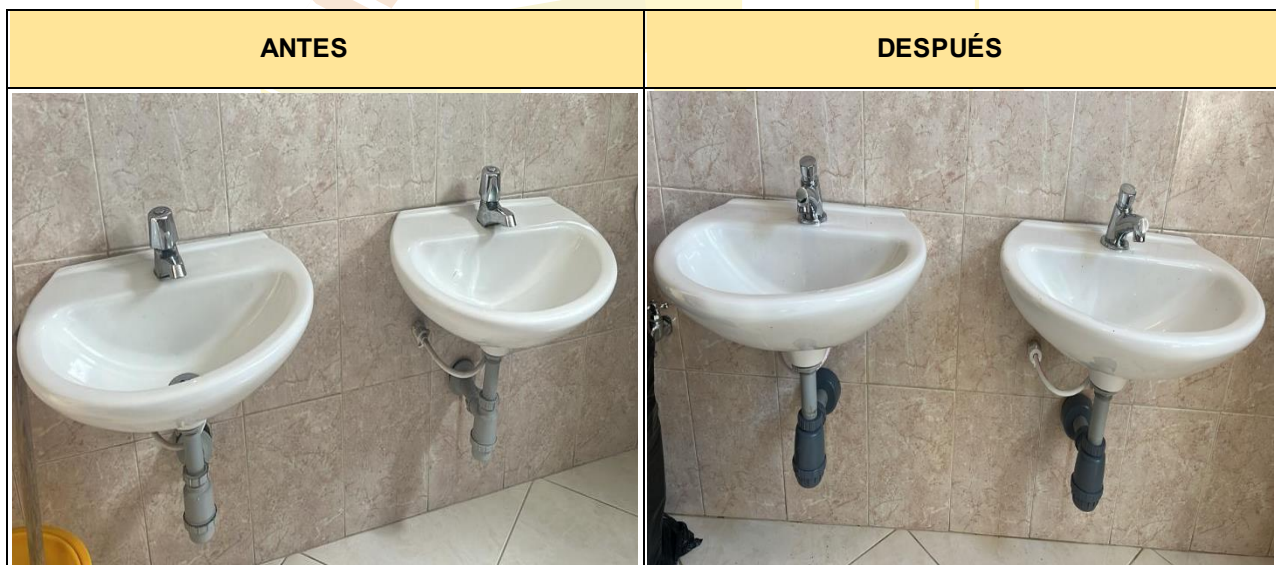



Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de Manta.**

El **12 de noviembre de 2025** se llevó a cabo la visita técnica de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Manta**. Durante la inspección, se revisaron y constataron las adecuaciones ejecutadas en cada uno de los entornos intervenidos, correspondientes a la **I.E.D. Manta – Sede Fátima**, la **Estación de Policía**, la **Alcaldía Municipal** y la **Biblioteca**.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 9. Municipio de Manta. – I.E.D Manta Sede Fátima.








Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 10. Municipio de Manta – Alcaldía

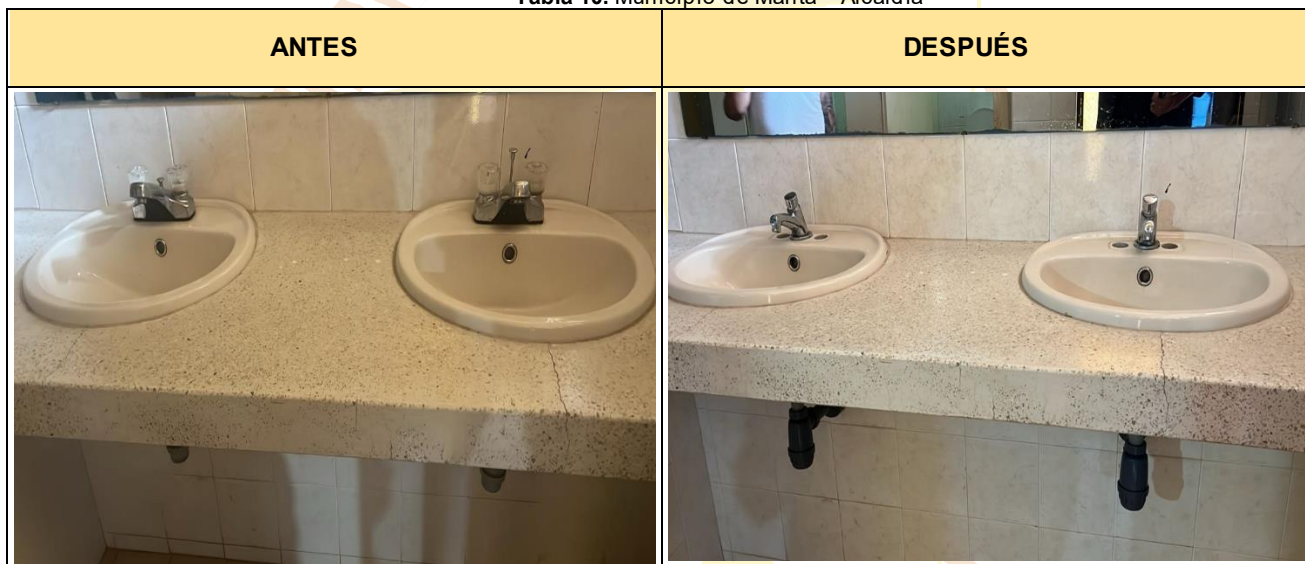




Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de Guayabal de Siquima.**

El **14 de noviembre de 2025** se llevó a cabo la visita técnica de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Manta**. Durante la inspección, se revisaron y constataron las adecuaciones ejecutadas en cada uno de los entornos intervenidos, correspondientes a la **I.E.D. Marco Fidel Suarez, Casa de la Cultura, Plaza de Mercado, Alcaldía Municipal y Centro de Vida Sensorial**.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 11. Municipio de Guayabal de Siquima. – I.E.D Marco Fidel Suarez

ANTES	DESPUÉS
	
	



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 12. Municipio de Guayabal de Siquima. – Casa de la Cultura.



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 13. Municipio de Guayabal de Siquima. –Plaza de Mercado.



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 14. Municipio de Guayabal de Siquima. – Alcaldía Municipal.

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de Beltrán.**

El **14 de noviembre de 2025** se llevó a cabo la visita técnica de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Beltrán**. Durante la inspección, se revisaron y constataron las adecuaciones ejecutadas en cada uno de los entornos intervenidos, correspondientes a la **I.E.D Técnico Agrícola Narváez Sede Manuela Beltrán Estación de Policía, Alcaldía Municipal, Biblioteca.**

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 15. Municipio de Beltrán – I.E.D Técnico Agrícola Narváez Sede Manuela Beltrán

ANTES	DESPUÉS
	
	





Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 16. Municipio de Beltrán – Estación de Policía.





Fuente: Techne S.A.S.


Tabla 17. Municipio de Beltrán – Alcaldía.





Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 18. Municipio de Beltrán – Biblioteca.

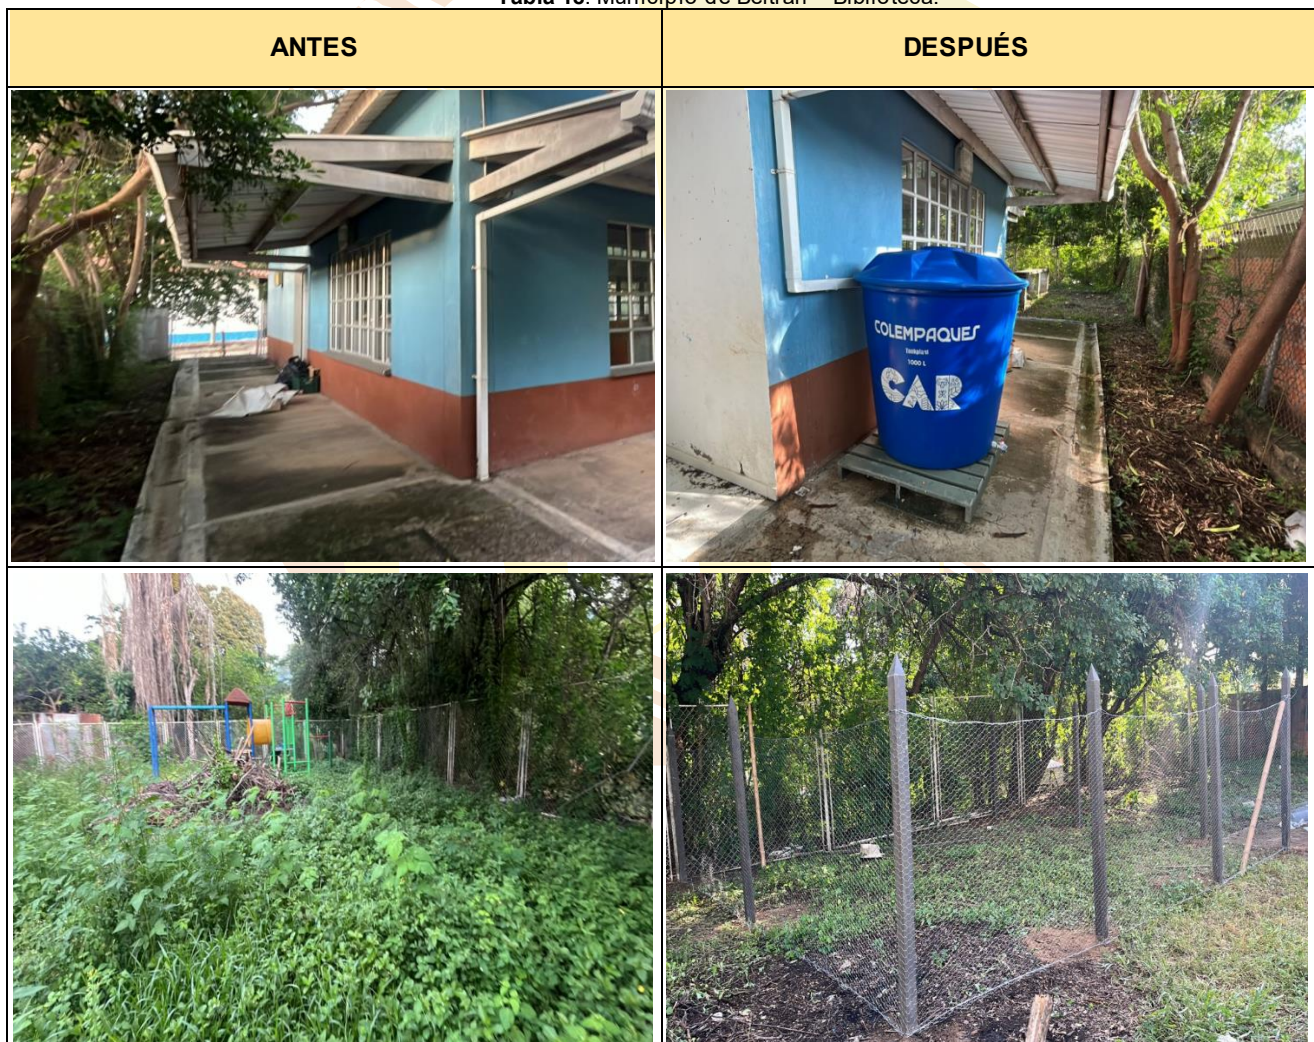



Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de Chaguaní.**

El 20 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Chaguaní** entre interventoría y Supervisión. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de las instituciones intervenidas, que corresponden a: **I.E.D Fray José Ledo – Sede Helechal, I.E.D Fray José Ledo – Sede El Rincón, I.E.D Fray José Ledo – Sede Montefrío, Salón Comunal Vereda Llanadas.**

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 19. Municipio de Chaguaní – I.E.D Fray José Ledo Sede Helechal.

ANTES	DESPUÉS
	
	
	



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 20. Municipio de Chaguaní – I.E.D Fray José Ledo Sede El Rincón.

ANTES	DESPUÉS
	
	
	



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 21. Municipio de Chaguaní – I.E.D Fray José Ledo Sede Montefrio.

ANTES	DESPUÉS
	
	
	



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 22. Municipio de Chaguaní – Salón Comunal Vereda Llanadas.





Fuente: Techne S.A.S.


- **Municipio de Anolaima**

El **21 de noviembre de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Anolaima**. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de las instituciones intervenidas, que corresponden a: **I.E.D José Hugo Enciso**, la **I.E.D José Hugo Enciso, Sede Primaria** el **Salón Comunal** y la **Iglesia**.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 23. Municipio de Anolaima – I.E.D José Hugo Enciso.



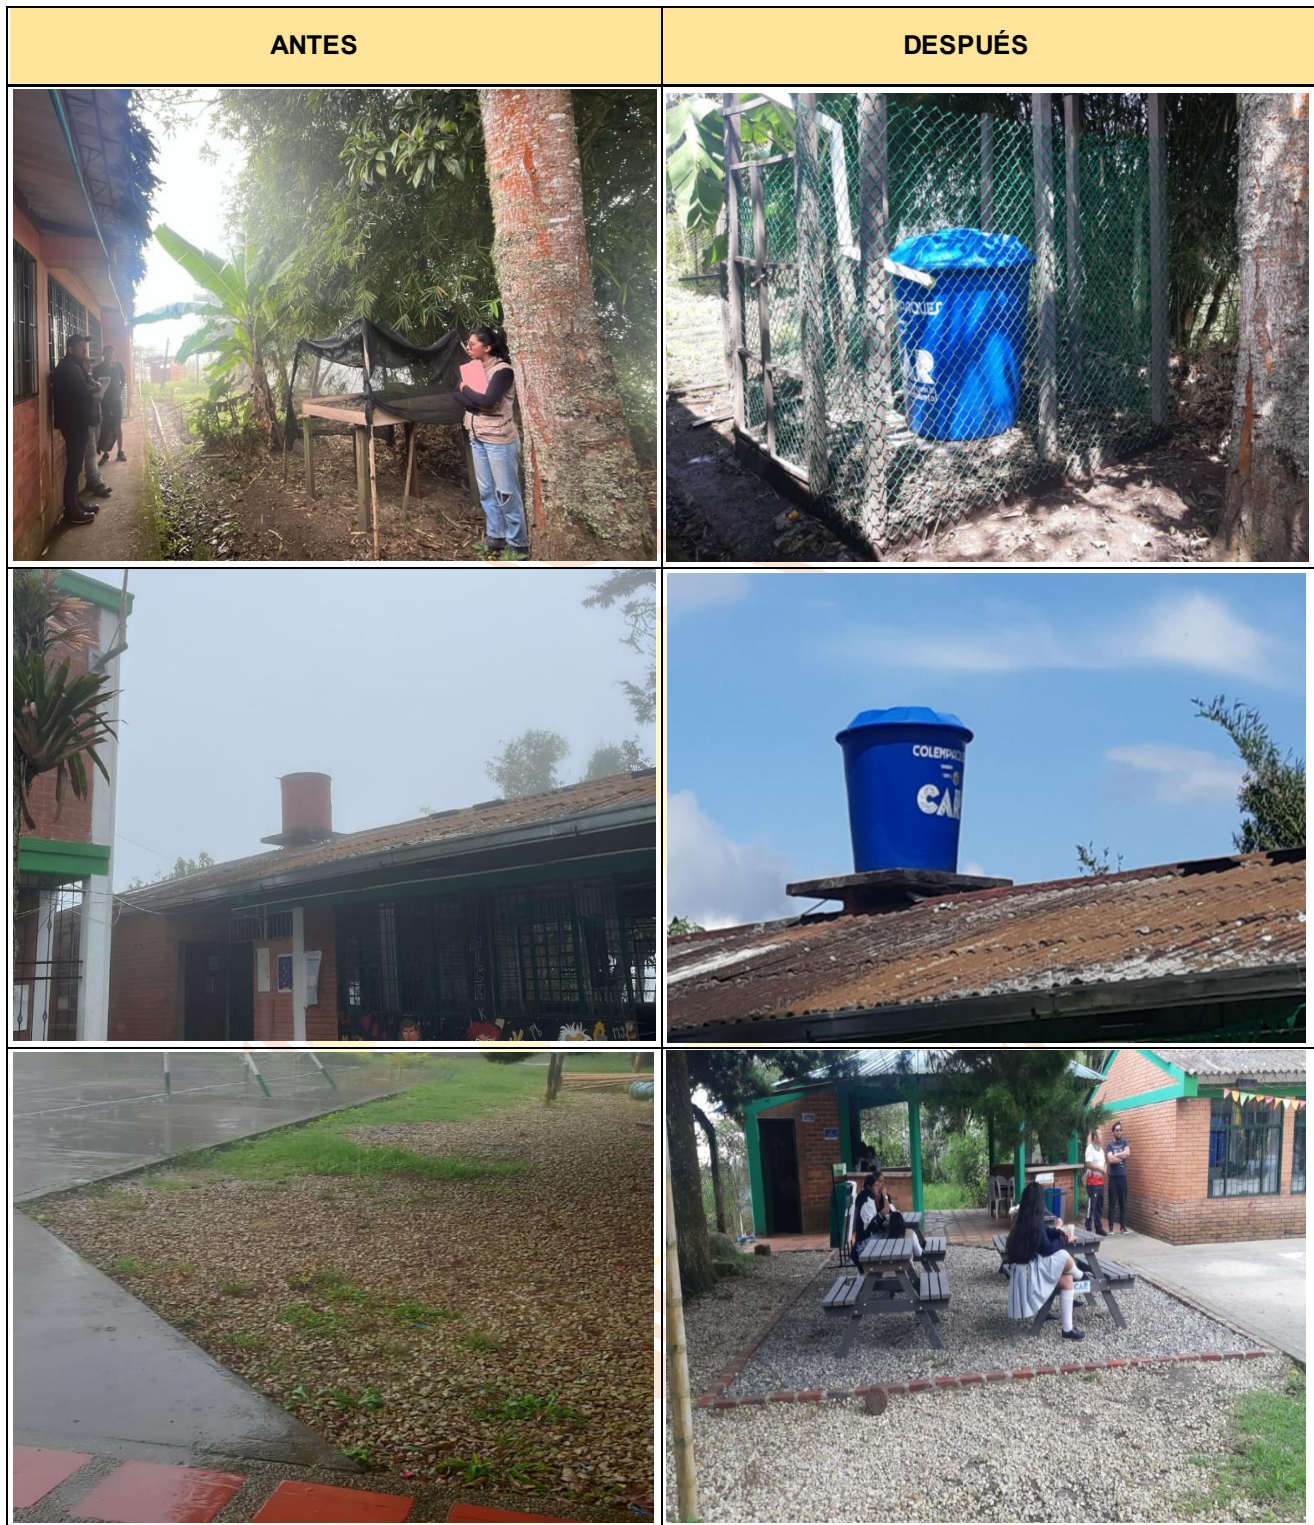



Fuente: Techne S.A.S.


Tabla 24. Municipio de Anolaima – I.E.D José Hugo Enciso, Sede Primaria

ANTES	DESPUÉS
	
	
	



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 25. Municipio de Anolaima – Salón Comunal Reventones.

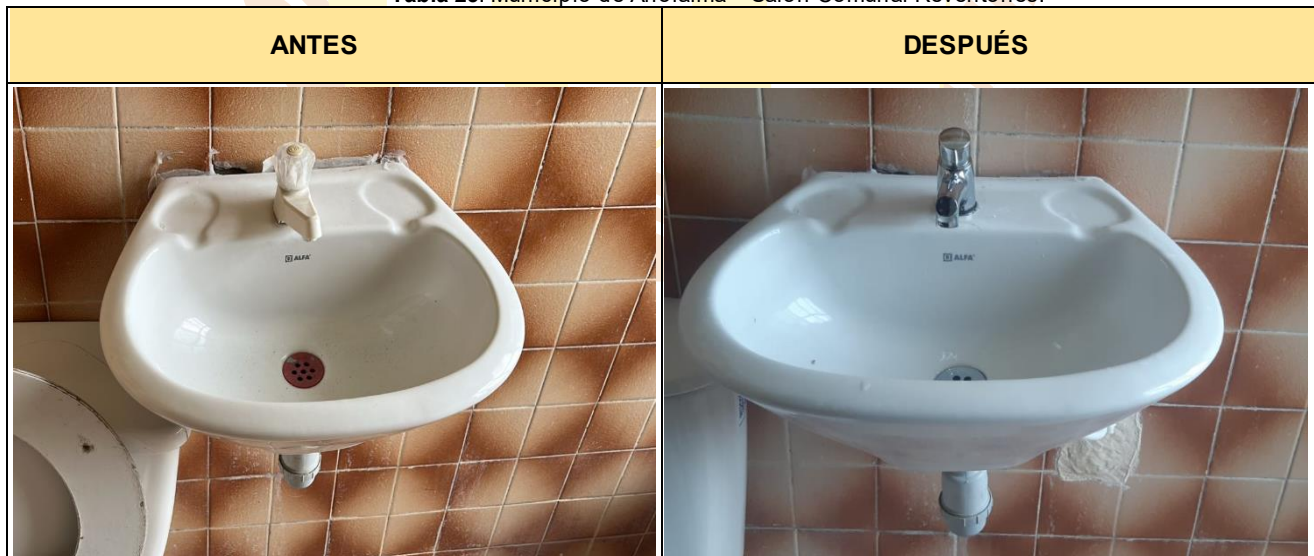



Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 26. Municipio de Anolaima – Iglesia Reventones.



Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de Machetá.**

El **24 de noviembre de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Machetá**. Durante la inspección, entre contratista de obra, interventoría y supervisión se verificó junto todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de las instituciones intervenidas, que corresponden a: **I.E.D José Hugo Enciso**, la **I.E.D José Hugo Enciso, Sede Primaria el Salón Comunal** y la **Iglesia**.

Tabla 27. Verificación de herramientas – Municipio de Machetá.



Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de La Mesa.**

El **27 de noviembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **La Mesa**. en el cual se identificaron los tres (3) entornos a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en cada una de ellas, que corresponden a: **I.E.D San Javier**, el **Centro de Vida Abuelos** y el **Jardín Infantil Grandes Sueños**.

Tabla 28. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de La Mesa.



4.3 SEGUIMIENTO A ENTORNOS

Dentro del seguimiento realizado por la interventoría se presenta el anexo No.6, donde se realiza un control a las fechas de llegada de insumos y a la priorización de los entornos asignados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el fin de verificar el cumplimiento del cronograma y garantizar una adecuada planificación de las actividades en campo.

Anexo No 6 Seguimiento a fechas entornos

4.4 SEGUIMIENTO TÉCNICO INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

Actividad	Soporte / Justificación
1. Coordinar y realizar con el Supervisor designado por la Corporación y el contratista de obra las visitas preliminares a los predios proyectados para las adecuaciones e instalaciones de las diferentes herramientas con el fin de realizar el reconocimiento del terreno verificando el estado, posibles antecedentes, coordenadas, área de intervención y los demás necesarios para la correcta ejecución de las obras.	<p>En conjunto con la supervisión, contratista e interventoría se realizaron las visitas preliminares a los entornos asignados por la Corporación CAR para las adecuaciones con objeto de identificar sus características, y actividades a ejecutar, como se puede evidenciar en las actas de seguimiento.</p> <p>Anexo 2. Actas de comité</p>
2. Revisar todos y cada uno de los documentos del proceso contractual de la obra, con el fin de tener el conocimiento completo y detallado de los aspectos técnicos del desarrollo del proyecto, alcance del objeto contractual, especificaciones técnicas, entre otros.	<p>Durante el periodo reportado, la interventoría ha cumplido con las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables establecidas en el contrato, realizando seguimiento permanente a la ejecución de las obras, lo cual se puede evidenciar en los comunicados</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-278. Donde se dieron las observaciones al Acta Parcial de obra No.1 • CAR-CM-1439-2025-282. Donde se dieron las observaciones a los planos del municipio de Cagua. • CAR-CM-1439-2025-295. Donde se hace la solicitud al contratista de obra de actualizar la bitácora de obra a la fecha. • CAR-CM-1439-2025-301. Donde se dieron las observaciones al Informe Mensual de Obra No.3 V4

Actividad	Soporte / Justificación
<p>3. Participar en los comités de obra y suscribir las correspondientes actas. Este comité se reunirá una vez al mes, cuantas veces se requiera fin de coordinar y controlar la ejecución y entrega de los productos y obras tendientes a cumplir con estándares de calidad, costos eficientes y tiempos de entrega de acuerdo con lo planeado y los diseños elaborados; así como de resolver situaciones que se tengan en el desarrollo del contrato, la función general de este comité será la de realizar seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato en cada uno de sus componentes.</p>	<p>Se ha participado activamente en cada uno de los comités de obra programados para llevar el seguimiento y control del proyecto, diligenciando sus actas correspondientes donde se especificaron los temas tratados respectivamente, como se puede evidenciar en los 10 comités realizados en el periodo y .122 comités realizados a la fecha</p> <p>Ver anexo 2. Actas de comité.</p>
<p>4. Verificar el cumplimiento del objeto contratado, especificaciones técnicas, propuesta técnica y económica, cronograma propuesto por el contratista de obra y solicitar los ajustes a que haya lugar.</p>	<p>Durante el periodo evaluado, la interventoría ha efectuado el seguimiento técnico y administrativo al cumplimiento del objeto contractual, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista se ajusten a las especificaciones técnicas, la propuesta aprobada y el cronograma de ejecución.</p> <p>Se han emitido observaciones y requerimientos formales al contratista de obra cuando se ha evidenciado la necesidad de fortalecer la calidad en la ejecución de determinadas actividades, conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-292: Donde se envían al contratista de obra las observaciones realizadas en campo correspondientes a las obras ejecutadas en el municipio de obra. <p>Asimismo, mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-295, se solicitó al contratista mantener la bitácora de obra debidamente actualizada.</p> <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p> <p>Para garantizar el cumplimiento de los tiempos y condiciones contractuales, en el siguiente comunicado se solicitó iniciar actividades de obra toda vez que ya se cuenta con insumos completos en sitio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-279, Solicitud inicio actividades Saboyá y Puerto Salgar • CAR-CM-1439-2025-293, Solicitud inicio actividades La Vega, Sesquilé, Cucunubá.

Actividad	Soporte / Justificación
<p>5. Autorizar el inicio de los trabajos de obra exigiendo lo especificado en las obligaciones del contrato y verificar y exigir la disponibilidad del personal ofrecido en la propuesta técnica.</p>	<p>Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos.</p> <p>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295, Solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
<p>6. Verificar durante el desarrollo del proyecto la permanencia de los profesionales exigidos en el proceso contractual.</p>	<p>Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos.</p> <p>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
<p>7. Realizar seguimiento al programa de trabajo, frentes de trabajo y equipo propuesto para la ejecución de las obras, y en caso de establecer posibles incumplimientos tomar las medidas correctivas.</p>	<p>Mediante los informes semanales se efectuó el seguimiento al avance de las actividades desarrolladas por el contratista, registrando las recomendaciones y observaciones correspondientes, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los componentes contractuales establecidos.</p> <p><i>Ver Anexo 5. Informes Semanales.</i></p>
<p>8. Realizar seguimiento acucioso al cumplimiento de la ejecución del cronograma de obra y en caso de establecer posibles incumplimientos tomar las medidas correctivas.</p>	<p>La interventoría ha realizado un seguimiento constante al avance físico del proyecto, contrastando el desarrollo de las actividades con el cronograma avalado</p> <p>Se ha solicitado al contratista de obra el inicio de actividades en aquellos municipios que cuentan con</p>

Actividad	Soporte / Justificación
	<p>la totalidad de los insumos y con las condiciones habilitantes para la ejecución de la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-279, Solicitud inicio actividades Saboyá y Puerto Salgar • CAR-CM-1439-2025-293, Solicitud inicio actividades La Vega, Sesquilé, Cucunubá.
<p>9. Rechazar los informes presentados por el contratista de obra que no cumplan con las especificaciones técnicas y cada uno de los componentes exigidos dentro de los productos del contrato.</p>	<p>La interventoría ha efectuado la revisión detallada de los informes mensuales y demás productos entregados por el contratista de obra, verificando su correspondencia con las especificaciones técnicas, los componentes contractuales y los requisitos formales establecidos.</p> <p>En los casos en que se han identificado inconsistencias o no conformidades frente a lo exigido, los informes han sido rechazados y devueltos para su respectiva corrección, notificando formalmente al contratista las observaciones pertinentes y los ajustes requeridos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-278. Observaciones Acta Parcial de Obra No.1 • CAR-CM-1439-2025-301. Observaciones Informe Mensual 3 V4
<p>10. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes técnicas del contratista de obra, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas que sean de su competencia.</p>	<p>La interventoría esta presta y con los canales de comunicación abiertos para atender cualquier tipo de sugerencias, reclamaciones y solicitudes que el contratista requiera.</p> <p>Las determinaciones adoptadas frente a dichas solicitudes han sido informadas oportunamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante comunicaciones oficiales, garantizando la trazabilidad y transparencia en las decisiones dentro del ámbito de competencia de la interventoría.</p> <p>Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes por parte del contratista de obra que fueran de competencia de la Supervisión.</p>
<p>11. Verificar y aprobar al contratista de obra los análisis de precios unitarios de la propuesta presentada y el Análisis de AIU, así como durante la ejecución de las obras los nuevos que se</p>	<p>Se verificarán y aprobarán las actividades propuestas por el contratista con el propósito de garantizar la correcta ejecución del contrato.</p> <p>Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-230, la interventoría otorgó aval a los ítems no previstos presentados por el contratista de obra y solicitó a la supervisión su inclusión dentro del alcance contractual.</p>

Actividad	Soporte / Justificación
requieran, y las modificaciones de cantidades a que haya lugar.	En el periodo reportado no se han presentado actualizaciones.
12. Realizar la aprobación de los procedimientos constructivos con base en las recomendaciones impartidas por los profesionales de su propuesta.	La interventoría ha revisado y evaluado los procedimientos constructivos presentados por el contratista de obra, verificando su conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, las normas aplicables y las buenas prácticas de ingeniería.
13. Verificar la permanencia y funciones de los profesionales en obra para la cual dejará constancia diaria en la bitácora de obra.	<p>La interventoría ha efectuado el seguimiento de los profesionales designados por el contratista en el frente de obra.</p> <p>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
14. Mantener en los sitios de trabajo los frentes de trabajo con los profesionales y personal de apoyo propuestos para las actividades de seguimiento de interventoría de acuerdo con la propuesta económica.	<p>La interventoría ha dispuesto el personal técnico y de apoyo requerido para el seguimiento y control de las actividades de obra, garantizando su presencia y cumplimiento de funciones conforme a lo establecido en la propuesta económica y en las obligaciones contractuales.</p> <p>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
15. Exigir que la maquinaria, herramienta y equipo del contratista de obra se encuentren en condiciones de servicio y solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o subutilizados. Se dejará constancia diaria en la bitácora.	<p>Se realiza el seguimiento e inspección adecuado a las condiciones de servicio de maquinaria, herramienta y equipo del contratista, en caso de algún daño se solicitará inmediatamente su retiro y reemplazo.</p> <p>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de las condiciones de la maquinaria, herramienta y equipo. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora</p>

Actividad	Soporte / Justificación
	<p>debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
<p>16. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones inferiores a las contratadas.</p>	<p>Dentro de las funciones de seguimiento y control técnico, la interventoría ha realizado observaciones a las actividades ejecutadas por el contratista de obra, con el propósito de asegurar que se ajusten a las especificaciones y condiciones contractuales.</p> <p>Las observaciones formuladas han sido registradas en las actas correspondientes y en el comunicado CAR-CM-1439-2025-292, en el cual se detallan los aspectos técnicos que requieren ajuste por parte del contratista en el municipio de Beltrán.</p>
<p>17. Registrar en la bitácora en conjunto con el contratista de obra los aspectos más relevantes de las obras objeto de la presente interventoría.</p>	<p>La interventoría ha venido diligenciando la bitácora de obra en conjunto con el contratista, registrando de manera permanente los aspectos más relevantes del desarrollo de las actividades en campo, incluyendo avances, observaciones y condiciones de ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
<p>18. Mensualmente presentar informe de interventoría con las especificaciones requeridas y ejecutadas.</p>	<p>Se presentarán los informes mensuales con las especificaciones requeridas y ejecutadas respectivamente.</p> <p>Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-274 se presenta el informe mensual de interventoría No. 7</p>
<p>19. En coordinación con el contratista de obra se adelantarán los planos récord a las obras y exigirá la presentación definitiva a la firma contratista de los mismos con el último corte de obra, los cuales deberá estar firmados por los profesionales competentes de acuerdo con la propuesta.</p>	<p>Durante el periodo reportado se recibieron los planos correspondientes a los entornos finalizados, los cuales fueron allegados junto con la documentación asociada al Acta de Cobro No. 1 de Obra. A través del comunicado CAR-CM-1439-2025-278 se remitieron al contratista las observaciones técnicas relacionadas con dichos planos. Asimismo, mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-282 se presentaron las observaciones sobre los planos radicados para las obras en los entornos del municipio de Cagua.</p>
<p>20. Verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental, seguridad industrial establecidos por parte de la CORPORACIÓN durante la ejecución de los trabajos.</p>	<p>Durante las labores de seguimiento, se ha exigido al contratista la implementación de las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental y del SG-SST.</p> <p>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control del cumplimiento de la</p>

Actividad	Soporte / Justificación
	<p>normatividad ambiental y seguridad industrial. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
<p>21. Suspender los trabajos de obra en caso de presentarse afectación al medio ambiente y solicitar las acciones correctivas.</p>	<p>A la fecha, no se han presentado afectaciones al medio ambiente derivadas de la ejecución de las actividades de obra.</p> <p>La interventoría mantiene seguimiento permanente a las condiciones ambientales del proyecto y, en caso de identificarse alguna situación que pueda generar impacto, se procederá conforme a lo establecido en el contrato y en la normatividad ambiental vigente.</p>
<p>22. Aprobar el Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de Obra.</p>	<p>Para el periodo de referencia no aplica.</p>
<p>23. Coordinar con el contratista de obra las reuniones de socialización y asesorías técnicas, así como suscribir las respectivas actas para cada beneficiario, así como suscribir conjuntamente las actas de vecindad y verificar en todo momento que no se presenten afectaciones a los predios donde se realizan los trabajos con la maquinaria y equipo.</p>	<p>En cada reunión realizada con el contratista y supervisión se ha suscrito la respectiva acta, donde se resaltan los aspectos más importantes y novedades en cuanto a las ejecuciones de obra.</p> <p><i>Ver Anexo 2 Actas de Comité</i></p>
<p>24. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas Ambientales, de Gestión de Riesgo, y de todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).</p>	<p>Se realizará un seguimiento riguroso al cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normativas ambientales, la gestión de riesgos y todos los requisitos establecidos en el sistema HSEQ</p>

Actividad	Soporte / Justificación
<p>25. Aprobar y dar seguimiento de las medidas de control, dotación del personal y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar los contagios y la propagación de diferentes virus que se puedan presentar, así como demás normas y recomendaciones relacionadas con esta materia, que sean expedidas por el Gobierno Nacional o por los Gobiernos Departamentales y Locales donde se ejecute el objeto contractual.</p>	<p>Se garantizará que el contratista implemente de manera adecuada tanto los protocolos generales como los específicos establecidos, asegurando su cumplimiento en todas las fases del proyecto.</p>

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El presente capitulo detalla las actividades de carácter administrativo que se han desarrollado durante el periodo del presente informe, con el ánimo de mantener a la Corporación informada sobre los pormenores del proyecto en el aspecto administrativo.

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Las actas de comité que se relacionan a continuación han sido producto del seguimiento y control que la interventoría ha llevado a cabo con el contratista de obra y que, como parte de sus obligaciones contractuales, ha manifestado su interés y ha puesto en conocimiento a la entidad contratante las novedades surgidas durante el periodo contractual. Las actas de los comités llevados a cabo hasta la fecha entre las partes (Obra, Interventoría y Supervisión), se relacionan a continuación.

Tabla 29 Actas de comité

ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL NO. 01		
Nº	FECHA	OBJETO
1	28 – MAR - 2025	Acta de comité de seguimiento y control
2	16 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control
3	24 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control
4	28 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control
5	29 – ABR – 2025	Visita puntos de intervencion municipio de Susa
6	30 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control.No.6
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 02		
7	05- MAY -2025	Recorrido avance de obra-comité No.7
8	13- MAY -2025	Recorrido avance de obra- No.8
9	16- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Buenavista - comité No.9
10	19- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio del Colegio - comité No.10
11	19- MAY -2025	Entrega Escuela la Glorieta Susa y Recorrido sa Miguel de Sema- comité No.11
12	19- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Ninaima- comité No.12
13	20- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos comité No.13
14	20- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Supata- comité No.14
15	21- MAY -2025	Comité de segumiento y control No.15
16	26- MAY -2025	Comité de segumiento y control No.16
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 03		
17	03 – JUN – 2025	Seguimiento al contrato de Obra
18	04 – JUN – 2025	Revisión de APU de items no previstos – Lectura de oficio de observaciones de interventoría.
19	04 – JUN - 2025	Verificación de items no previstos.
20	05 – JUN - 2025	Recorrido de entrega y verificación de herramientas entornos sostenibles – Susa.
21	06 – JUN - 2025	Informe de avance grupo I y coordinación de visitas entornos Grupo II
22	09 – JUN - 2025	Recorrido puntos a intervenir Municipio de Caldas
23	09 – JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles Pasuncha y Yacopí
24	10 – JUN – 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosostenibles – Buenavista.
25	10 – JUN – 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Tausa

26	12 – JUN – 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Quebradanegra
27	12 – JUN - 2025	Verificación en la implementación de herramientas sostenibles – Nocaima
28	12 – JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – La Peña y Vergara.
29	13 – JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles - Caparrapí
30	19 - JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Nemocón.
31	19 - JUN - 2025	Avances municipio Mesitas del Colegio.
32	20 – JUN – 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosostenibles – Nimaima
33	20 – JUN - 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosostenibles – Nocaima
34	20 – JUN – 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosostenibles – Supatá
35	20 – JUN – 2025	Verificación observaciones dadas por interventoría a informes mensuales de obra No. 1 y No. 2
36	24 – JUN – 2025	Verificación atención observaciones dadas por interventoría a informes mensuales de obra No. 1 y No. 2
37	27 – JUN – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Saboyá
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 04		
38	01 – JUL – 2025	Revisión Informe Mensual de Obra No. 1 y revisión plan de contingencia.
39	04 – JUL – 2025	Entrega de insumos entornos sostenibles – La Peña.
40	08 – JUL – 2025	Verificación de Alcances Entorno Parque Embalse de Neusa.
41	09 – JUL – 2025	Seguimiento y verificación Acta Parcial de Obra No. 1.
42	10 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Saboyá.
43	10 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Buenavista.
44	11 – JUL – 2025	Entrega de insumos y herramientas – Caparrapí.
45	12 – JUL – 2025	Verificación Memoria de Cantidades
46	14 – JUL – 2025	Avance entornos y dificultades presentadas.
47	14 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Supatá
48	14 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Pasuncha
49	15 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nocaima
50	15 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nimaima
51	22– JUL – 2025	Socialización de ítem no previstos.
52	22 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – El Colegio.
53	25 – JUL – 2025	Reconocimiento alcances entornos sostenibles – Parque Embalse de Neusa
54	29 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – San Miguel de Sema – Buenavista.
55	31 – JUL – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Chocontá
56	31 – JUL – 2025	Revisión plan de contingencia.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 05		
57	05 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tena
58	05 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles - Yacopí
59	06 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles - Caparrapí
60	12 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Sibate
61	13 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Soacha
62	15 – AGO – 2025	Seguimiento y control
63	15 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tibacuy
64	19 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tena
65	20 – AGO – 2025	Seguimiento y control

66	20 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tausa
67	20 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Parque Neusa, Sector Chapinero
68	20 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles - Yacopí
69	21 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – San Bernardo
70	22 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tibirita
71	25 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles - Quebradanegra
72	27 – AGO – 2025	Reconocimiento municipio de la Mesa
73	28 – AGO - 2025	Reconocimiento Municipio Cajica
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 06		
74	01 – SEP – 2025	Socialización programa cosecha de Agua Comunitaria
75	02 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Saboyá
76	02 – SEP – 2025	Revisión avance contrato – Cuenta parcial de cobro No. 1
77	03 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Miguel de Sema.
78	03 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Caldas
79	04 – SEP – 2025	Seguimiento y control
80	05 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Agua de Dios
80.1	05 – SEP – 2025	Revisión Observaciones Ítems No Previstos
81	08 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Bernardo
82	09 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Manta
83	10 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sutatausa
84	11 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Útica
85	12 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sibaté.
86	12 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Soacha.
87	12 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sesquilé
88	17 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Puerto Salgar
89	18 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – La Peña.
90	19 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Tibirita.
91	22 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sutatausa.
92	23 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa.
93	24 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Agua de Dios.
94	25 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa.
95	26 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Saboyá
96	29 – SEP – 2025	Revision informes de interventoría y obra.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 07		
97	01 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Machetá.
98	01 – OCT – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Manta
99	03 – OCT – 2025	Revisión observaciones informes mensuales de obra e interventoría
100	07 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Anolaima.
101	08 – OCT – 2025	Verificación de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvia – La Mesa
102	09 – OCT – 2025	Verificación de herramientas – La Peña.
103	10 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Cucunuba.
104	16 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Chaguani.

105	17 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Guayabal de Siquima.
106	22 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Manta
107	24 – OCT – 2025	Seguimiento y control al contrato de obra.
108	28 – OCT – 2025	Revisión Acta Parcial de Obra #1
109	29 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Ricaurte.
110	29 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Beltrán.
111	31 – OCT – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cogua.
112	31 – OCT – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cajicá.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 08		
113	07 –NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Macheta (Contratista – Interventoría)
114	12 – NOV – 2025	Revisión de acta parcial No.1
115	12 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Manta (Contratista – Interventoría – CAR)
116	14 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Guayabal de Siquima (Contratista – Interventoría – CAR)
117	14 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Beltrán (Contratista – Interventoría)
118	20 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Chaguaní (Contratista – Interventoría)
119	21 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Anolaima (Contratista – Interventoría – CAR)
120	24 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Machetá (Contratista – Interventoría – CAR)
121	26 – NOV – 2025	Revisión Acta Parcial No. 2 de Obra.
122	27 – NOV – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – La Mesa.

Fuente: Techne S.A.S.

Anexo 2 Actas de comité

5.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

La correspondencia que a continuación se relaciona se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia enviada y recibida de la interventoría u otra entidad.

Tabla 30 Correspondencia Enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
No.	Fecha	Asunto	Destinatario
1	19-FEB-2025	Solicitud información inicial para desarrollo de los contratos de obra e interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
2	19-FEB-2025	Solicitud información inicial para el desarrollo del proyecto	Consorcio Adecuaciones CAR
3	25-FEB-2025	Entrega de pólizas iniciales	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
4	13-MAR-2025	Solicitud información adicional por cambio de representante legal	Consorcio Adecuaciones CAR
5	13-MAR-2025	Presentación designación como interventor contrato de obra No. 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
6	17-MAR-2025	Alcance a presentación designación como interventor contrato de obra NO. 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
7	18-MAR-2025	Notificación cambio de representante legal contratista de obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
8	20-MAR-2025	Observaciones a entrega de documentación inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
9	2-ABR-2025	Entrega listado de insumos priorizados por el ordenador del gasto para el desarrollo del contrato No. 1259-2025.	Consorcio Adecuaciones CAR

10	3-ABR-2025	Observaciones a entrega documentación inicial respuesta comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-003	Consorcio Adecuaciones CAR
11	4-ABR-2025	Solicitud entrega pólizas actualizadas de acuerdo al acta de inicio.	Consorcio Adecuaciones CAR
12	4-ABR-2025	Alcance a radicado No. 20252011808 designación de interventoría del contrato No. 1259-2025.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
13	7-ABR-2025	Entrega cronograma de trabajo y plan de trabajo de la interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
14	7-ABR-2025	Entrega informe semanal No. 1 de interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
15	8-ABR-2025	Aval y entrega parcial – documentación inicial contratista de obra.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
16	8-ABR-2025	Solicitud entrega de soporte de afiliaciones al sistema de salud, pensión, ARL, y aportes parafiscales del personal.	Consorcio Adecuaciones CAR
17	8-ABR-2025	Entrega de pólizas actualizadas al acta de inicio – interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
18	9-ABR-2025	Solicitud de entrega listado sitios priorizados por la entidad para ejecución del contrato de obra 1259-2025.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
19	10-ABR-2025	Aval parcial – documentación inicial contratista de obra.	Consorcio Adecuaciones CAR
20	12-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-007 información sobre seguridad social	Consorcio Adecuaciones CAR
21	12-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-005. Observaciones a entrega de documentación inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
22	14-ABR-2025	Entrega informe semanal No. 2 de interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
23	21-ABR-2025	Entrega informe semanal No. 3 de interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
24	22-ABR-2025	Entrega hojas de vida personal profesional de interventora y solicitud de cambio de profesional residente de interventora.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
25	23-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-008 información sobre seguridad social – primer llamado de atención.	Consorcio Adecuaciones CAR
26	23-ABR-2025	Citación comité de seguimiento y control No. 3.	Consorcio Adecuaciones CAR
27	26-ABR-2025	Citación comité técnico.	Consorcio Adecuaciones CAR
28	28-ABR-2025	Solicitud entrega de listado de personal por frentes de obra.	Consorcio Adecuaciones CAR
29	29-ABR-2025	Entrega de acta y compromisos del comité de seguimiento y control del 28 de abril de 2025 y citación a próximo comité de seguimiento.	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
30	29-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-010 seguridad social.	Consorcio Adecuaciones CAR
31	30-ABR-2025	Entrega de acta y compromisos del comité de seguimiento y control del 30 de abril de 2025, y citación a próximo comité de seguimiento.	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.2			
32	3-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-011 aclaración soportes de seguridad social.	Consorcio Adecuaciones CAR
33	3-MAY-2025	Solicitud de entrega de cronograma por entorno priorizado por la entidad contratante car	Consorcio Adecuaciones CAR
34	4-MAY-2025	Entrega informe mensual de interventoría no.1	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
35	5-MAY-2025	Solicitud cumplimiento compromisos adquiridos en comité de seguimiento y control de fecha 28 de abril de 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
36	6-MAY-2025	Remisión de cronograma de entrega de insumos y listado de entornos priorizados – municipios asignados	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

37	7-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-009 documentación inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
38	7-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0013 informe mensual de obra no.1	Consorcio Adecuaciones CAR
39	9-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0017 aval programación detallada municipio de Susa	Consorcio Adecuaciones CAR
40	9-MAY-2025	Remisión programación de obra detallada municipio de Susa	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
41	9-MAY-2025	Remisión comunicada CAC-CAR-LP-1259-2025-0018 solicitud de certificados de calidad y caracterización de materiales	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
42	9-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0019 notificación sobre condicionantes del avance físico por dependencia de suministros.	Consorcio Adecuaciones CAR
43	10-MAY-2025	Remisión comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0019 condicionantes avances físico	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
44	10-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0015 solicitud de aprobación de cambio personal mínimo requerido – contrato de obra no. 1259 de 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
45	12-MAY-2025	Aval y solicitud de aprobación de cambio de personal profesional	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
46	14-MAY-2025	Aval y solicitud de aprobación cambio de personal profesional	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
47	14-MAY-2025	Solicitud de entrega de cronograma detallado de intervención en los entornos del municipio de Chocontá	Consorcio Adecuaciones CAR
48	15-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0014 entrega de ítem no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
49	16-MAY-2025	Solicitud de entrega informe mensual de obra no.1	Consorcio Adecuaciones CAR
50	17-MAY-2025	Observaciones apu contractuales contrato de obra 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
51	19-MAY-2025	Entrega informe quincenal no.1 de interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
52	20-MAY-2025	Citación mesa de trabajo	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
53	22-MAY-2025	Observaciones apu contractuales contrato de obra 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
54	22-MAY-2025	Respuesta a comunicado 0026 ítems no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
55	23-MAY-2025	respuesta a comunicado 0024 respuesta a observaciones informe mensual no.1	Consorcio Adecuaciones CAR
56	23-MAY-2025	constancia de inasistencia a mesa de trabajo	Consorcio Adecuaciones CAR
57	24-MAY-2025	Citación mesa de trabajo día lunes 26 de mayo de 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
58	27-MAY-2025	Entrega de acta y compromisos de mesa de trabajo 21 de mayo, 26 de mayo de 2025, y citación a próximo comité de seguimiento.	Consorcio Adecuaciones CAR
59	29-MAY-2025	Primer llamado de atención solicitud de inicio de actividades en entornos asignados por la entidad contratante car	Consorcio Adecuaciones CAR
60	29-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0030 cronograma de actividades y flujo de inversión	Consorcio Adecuaciones CAR
61	30-MAY-2025	Aval cambio de personal técnico – consorcio adecuaciones car 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
62	30-MAY-2025	Alcance a comunicado no. CAR-CM-1439-2025-17 – entrega de pólizas actualizadas a acta de inicio	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
INFORME MENSUAL No.3			
63	4-JUN-2025	Entrega de acta, compromisos comité No.17 y citación comité	Consorcio Adecuaciones CAR
64	5-JUN-2025	Respuesta comunicado 034 actas de comité	Consorcio Adecuaciones CAR

65	6-JUN-2025	Respuesta comunicada 0036 modificación cronograma inicial	Consortio Adecuaciones CAR
66	6-JUN-2025	Respuesta solicitud información frentes de ejecución	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
67	7-JUN-2025	Entrega de actas y compromisos comité de seguimiento No.18 y No.19	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
68	7-JUN-2025	Solicitud corrección y presentación ítems no previstos	Consortio Adecuaciones CAR
69	9-JUN-2025	Entrega acta de comité No.20, compromisos y citación comité	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
70	10-JUN-2025	Respuesta comunicado 0040 relación personal por entorno	Consortio Adecuaciones CAR
71	11-JUN-2025	Entrega informe mensual No.2 interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
72	11-JUN-2025	Respuesta comunicado 0051 Ajuste AIU	Consortio Adecuaciones CAR
73	12-JUN-2025	Remisión competencia materiales faltantes	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
74	13-JUN-2025	Aval y solicitud inclusión ítems no previstos	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
75	13-JUN-2025	Traslado comunicado 0045 atraso cronograma	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
76	14-JUN-2025	Respuesta ofi 045 reprogramación	Consortio Adecuaciones CAR
77	16-JUN-2025	Respuesta comunicado 003 informe mensual No.1 de obra	Consortio Adecuaciones CAR
78	16-JUN-2025	Traslado OF 0055 cronograma insumos grupo II y visitas grupo III	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
79	16-JUN-2025	Traslado comunicado 0056 alcances entornos grupo II y III	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
80	17-JUN-2025	Traslado comunicado 0057 solicitud cambio accesorios hidráulico	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
81	19-JUN-2025	Citación comité de seguimiento - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
82	19-JUN-2025	Solicitud entregabalance de obra - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
83	19-JUN-2025	Entrega acta comité No 22 al No 30 - Contratista - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
84	20-JUN-2025	Citación verificación de observaciones inf obra - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
85	20-JUN-2025	Respuesta comunicado 042 Informe mensual No.22 de obra - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
86	21-JUN-2025	Aclaración y entrega de soportes planillas parafiscales abril y mayo - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
87	21-JUN-2025	Reiteración solicitud entrega plan de contingencia - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
88	21-JUN-2025	Solicitud presentación ensayos laboratorio concreto - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
89	21-JUN-2025	Entrega acta comité No 32-33-34 - Contratista - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
90	24-JUN-2025	Entrega de actas y compromisos comité de seguimiento No.21 y No.31 - Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
91	24-JUN-2025	Entrega de acta y compromiso comité de seguimiento No.35 - Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
92	24-JUN-2025	Observaciones a actividades Municipio de Caldas – Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
93	25-JUN-2025	Entrega acta comité No 36 24-06-25 - Contratista - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR

94	27-JUN-2025	Presunto incumplimiento obligaciones contractuales adquiridas en comité No.36 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
95	27-JUN-2025	Citación comite No.37 - Contratista, Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
96	28-JUN-2025	Entrega Acta Comite No. 37 - Supervisión - Contratista.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
97	28-JUN-2025	Respuesta comunicado CAC-CAR-0064 y 0065 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.4			
98	1-JUL-2025	Observaciones Informe Mensual 1 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
99	2-JUL-2025	Respuesta OF 068 Firma apoyo SST - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
100	2-JUL-2025	Entrega informe mensual No. 3 interventoría - Supervisión.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
101	2-JUL-2025	Entrega Acta de Comite No. 38 del 01-07-25 - Supervisión - Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
102	3-JUL-2025	102. Citación comite No.39 - Contratista.	Consortio Adecuaciones CAR
103	4-JUL-2025	103. Entrega actas comite originales - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
104	4-JUL-2025	Traslado OF 074 cumplimiento entrega insumos - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
105	4-JUL-2025	Respuesta OF 060 Plan de contingencia - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
106	4-JUL-2025	Alcance OF 074 aval y solicitud inclusión NP - supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
107	5-JUL-2025	Reiteración Observaciones Informe Mensual 1 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
108	5-JUL-2025	Observaciones informe No.2 obra - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
108.1	7-JUL-2025	108.1 Respuesta OF 0062 y 0073 APU contractuales - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
109	7-JUL-2025	Traslado OF 073 materiales faltantes Vergara, Peña - supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
110	7-JUL-2025	Respuesta OF 74 y 076 faltante insumos - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
111	7-JUL-2025	Solicitud citación contratista insumos comite - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
112	8-JUL-2025	Solicitud entregado c personal M.O -Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
113	8-JUL-2025	Entrega acta comité No 40 08-07-25 - Contratista - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
114	10-JUL-2025	Entrega acta comite No.41 y compromisos - Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
115	11-JUL-2025	Solicitud cambio inspector 2 intervenoria - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
116	11-JUL-2025	Citación revisión Memorias - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
117	12-JUL-2025	Entrega acta comité y compromisos No 42 - 43 - 44 - Contratista - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consortio Adecuaciones CAR
118	12-JUL-2025	Entrega Actas 7-14 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
119	12-JUL-2025	Entrega informe Quincenal No.5 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

120	15-JUL-2025	Entrega de acta No.45 y compromisos - Contratista, supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
121	15-JUL-2025	Entrega acta No.46 y compromisos - Contratista, supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
122	15-JUL-2025	Respuesta OF 084 observaciones plan contingencia - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
123	16-JUL-2025	Observaciones informe mensual No.3 obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
124	16-JUL-2025	Respuesta comunicado CAC 0081 anexo ambiental - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
125	16-JUL-2025	Solicitud entrega de balance de obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
126	16-JUL-2025	Aval y entrega plan SG-SST y Ambiental obra - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
127	18-JUL-2025	Entrega acta comité No 47-48-49-50 - Contratista - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
128	19-JUL-2025	Reiteración entrega actas de vecindad - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
129	19-JUL-2025	Solicitud asistencia profesional obra a comités de seguimiento - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
130	21-JUL-2025	Citación comité de seguimiento No.51 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
131	21-JUL-2025	Entrega plan SG-SST interventoría - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
132	21-JUL-2025	Respuesta OF 94 informe mensual No.2 obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
133	22-JUL-2025	Solicitud entrega planos récord entornos finalizados - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
134	22-JUL-2025	Entrega acta comité No.51 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
135	24-JUL-2025	Entrega acta comité No 52- Contratista - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
136	26-JUL-2025	Entrega informe Quincenal No.6 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
137	30-JUL-2025	Respuesta OF 101 Plan contingencia - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
138	30-JUL-2025	Respuesta OF 104 personal Caparrapi - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
139	31-JUL-2025	Reiteración entrega planos record - contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
140	31-JUL-2025	Respuesta OF 096 publicación C. ambiental - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
141	31-JUL-2025	Respuesta OF 98 acta parcial No.1 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
142	31-JUL-2025	Entrega acta comité y compromisos No 54-55 - Contratista - Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
143	31-JUL-2025	Entrega acta y compromisos No.56 - Contratista, supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.5			
144	1-AGO-2025	Notificación cambio R.L inter - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
145	1-AGO-2025	Notificación cambio de R.L inter - Contratista.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
146	2-AGO-2025	Observaciones informe mensual No.3 V02 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
147	4-AGO-2025	Observaciones inf mensual No.2 V03 OF 105 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
148	8-AGO-2025	Entrega informe mensual No.4 interventoría - Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR

149	8-AGO-2025	Entrega acta comité y compromisos No 53 y 57 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
150	8-AGO-2025	Solicitud entrega informe mensual No.4 obra - Contratista.pdf	Consortio Adecuaciones CAR
151	8-AGO-2025	Respuesta OF 109 plan contingencia V04 - Contratista.pdf	Consortio Adecuaciones CAR
152	11-AGO-2025	Entrega informe Quincenal No.7 - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
153	12-AGO-2025	Alcance OF 144 y respuesta rad 20252075228 - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
154	13-AGO-2025	Citación comité de seguimiento y control - Contratista.pdf	Consortio Adecuaciones CAR
155	16-AGO-2025	Entrega acta y compromisos comité No.62 - Contratista.pdf	Consortio Adecuaciones CAR
156	16-AGO-2025	Entrega acta comité y compromisos No 60-61 y 63 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
157	19-AGO-2025	Entrega actas comité No.58 y 59 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
158	19-AGO-2025	Respuesta OF 0112 y 0126 Informe mensual No.4 obra - Contratista.pdf	Consortio Adecuaciones CAR
159	19-AGO-2025	Entrega acta comité No 64 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
160	20-AGO-2025	Entrega acta comité No 65 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
161	20-AGO-2025	Entrega acta comité No 66 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
162	20-AGO-2025	Entrega acta comité No 67 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
163	21-AGO-2025	Entrega acta comité No 68 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
164	22-AGO-2025	Respuesta OF 125 ensayos laboratorio - Contratista.pdf	Consortio Adecuaciones CAR
165	22-AGO-2025	Respuesta OF 118 obs inf 3 V03 - Contratista.pdf	Consortio Adecuaciones CAR
166	22-AGO-2025	Entrega acta comité No 69 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
167	22-AGO-2025	Entrega acta comité No 70 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
168	23-AGO-2025	Entrega informe Quincenal No.8 - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
169	25-AGO-2025	Entrega Acta 39 - Contratista - Supervisión.pdf	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
170	26-AGO-2025	Entrega de acta y compromisos comité No.71	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

171	27-AGO-2025	Respuesta rad 20252054161 Atención a observaciones inf No.1 interventoría V02	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
172	28-AGO-2025	Observaciones documentación SST y Ambiental inicial	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
173	28-AGO-2025	Entrega acta comité No 72 y compromisos	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
174	28-AGO-2025	Entrega acta comite No 73	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
INFORME MENSUAL No.6			
175	4-SEP-2025	Entrega acta comité No 75	Consortio Adecuaciones CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
176	4-SEP-2025	Citación mesa de trabajo revisión cuenta e informes	Consortio Adecuaciones CAR
177	5-SEP-2025	Entrega actas comité No.76 y 79	Consortio Adecuaciones CAR
178	5-SEP-2025	Entrega informe mensual No.5 inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
179	6-SEP-2025	Entrega informe quincenal No.9	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
180	8-SEP-2025	No aval intercambio Resi - Tec	Consortio Adecuaciones CAR
182	9-SEP-2025	Respuesta rad 20252055693 obs inf No.2 inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
183	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 77	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
184	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 78	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
185	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 80	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
186	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 81	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
187	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 82	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
188	10-SEP-2025	Aval y entrega plan de contingencia	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
189	11-SEP-2025	Solicitud entrega NP	Consortio Adecuaciones CAR
190	11-SEP-2025	Reiteración a observaciones doc SST	Consortio Adecuaciones CAR
191	11-SEP-2025	Entrega acta comité 80.1 NP	Consortio Adecuaciones CAR
192	12-SEP-2025	Observaciones NP	Consortio Adecuaciones CAR
193	13-SEP-2025	Solicitud gestión entrega entornos	Consortio Adecuaciones CAR
194	13-SEP-2025	Respuesta entrega Neusa	Consortio Adecuaciones CAR
195	13-SEP-2025	Respuesta OF 195 Obser inf No.5	Consortio Adecuaciones CAR
196	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 83	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
197	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 84	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
198	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 85	Consortio Adecuaciones CAR

			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
199	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 86	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
200	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 87	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
201	15-SEP-2025	Observaciones cuenta parcial No.1 obra	Consortio Adecuaciones CAR
203	18-SEP-2025	Respuesta OF 150 doc inicial SST	Consortio Adecuaciones CAR
204	18-SEP-2025	Observaciones actividades IED Korea Peña	Consortio Adecuaciones CAR
205	20-SEP-2025	Entrega informe quincenal No.10	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
207	22-SEP-2025	Respuesta OF 151 Inf No.2 V06	Consortio Adecuaciones CAR
208	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 88	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
209	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 89	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
210	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 90	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
211	22-SEP-2025	Llamado de atención inicio Manta, Cajicá	Consortio Adecuaciones CAR
212	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 91 y solicitud entrega insumos pendientes	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
213	23-SEP-2025	Entrega acta comité No 92	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
214	25-SEP-2025	Observaciones act Agua de Dios	Consortio Adecuaciones CAR
215	25-SEP-2025	No cumplimiento plan de contingencia	Consortio Adecuaciones CAR
216	25-SEP-2025	Entrega acta comité No 93	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
217	25-SEP-2025	Entrega acta comité No 94	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
218	26-SEP-2025	Entrega acta comité No 95	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
219	30-SEP-2025	Reiteración inicio de actividades Cajicá	Consortio Adecuaciones CAR
220	30-SEP-2025	Entrega acta comité No 96 y compromisos	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
221	30-SEP-2025	Reiteración atención OSB doc SST y Ambiental	Consortio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No. 7			
222	1-OCT-2025	Respuesta OF 163 Alcance NP	Consortio Adecuaciones CAR
223	1-OCT-2025	Solicitud entrega cantidad reservorios	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
224	1-OCT-2025	Observaciones actividades Manta	Consortio Adecuaciones CAR
225	2-OCT-2025	Entrega acta comite No 97	Consortio Adecuaciones CAR

			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
226	3-OCT-2025	Entrega acta comite No 99	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
227	4-OCT-2025	Entrega informe Quincenal No.11	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
228	6-OCT-2025	Observaciones Actividades Obra	Consortio Adecuaciones CAR
229	6-OCT-2025	Reiteración observaciones La Peña	Consortio Adecuaciones CAR
230	7-OCT-2025	Aval item no previstos	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
231	9-OCT-2025	Solicitud entrega apr poliza acta inicio	Consortio Adecuaciones CAR
232	9-OCT-2025	Entrega informe mensual No.6 inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
233	10-OCT-2025	Traslado OF 171 definición diseños nuevos compostera	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
234	10-OCT-2025	Traslado OF 169 Situación tecnica Cajica	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
235	10-OCT-2025	Presunto incumplimiento atraso obra	Consortio Adecuaciones CAR
236	10-OCT-2025	Solicitud entrega planilla salarios personal	Consortio Adecuaciones CAR
237	10-OCT-2025	Solicitud entrega relacion personal obra	Consortio Adecuaciones CAR
238	11-OCT-2025	Observaciones La Peña	Consortio Adecuaciones CAR
239	11-OCT-2025	Entrega acta comite No 100	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
240	11-OCT-2025	Entrega acta comite No 101	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
241	11-OCT-2025	Entrega acta comite No 102	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
242	11-OCT-2025	Entrega acta comite No 103	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
243	11-OCT-2025	Entrega informe Semanal No.28	Corporación Autónoma Regional - CAR
244	15-OCT-2025	Entrega acta comite No 98	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
245	15-OCT-2025	Llamado de atención obs doc inicial SST	Consortio Adecuaciones CAR
246	16-OCT-2025	Solicitud entrega actualizada bitacora	Consortio Adecuaciones CAR
247	16-OCT-2025	Solicitud inicio actividades Sesquile	Consortio Adecuaciones CAR
248	17-OCT-2025	Entrega acta comite No 104	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
249	17-OCT-2025	Entrega acta comite No 105	Consortio Adecuaciones CAR
			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
250	18-OCT-2025	Solicitud entrega informe No.4 y no.5 subsanados	Consortio Adecuaciones CAR
251	18-OCT-2025	Entrega informe Semanal No.29	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

252	20-OCT-2025	Citacion comite seguimiento	Consortio Adecuaciones CAR
253	20-OCT-2025	Respuesta rad 20252098498 definicion entornos	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
254	22-OCT-2025	Solicitud soporte aprobacion poliza	Consortio Adecuaciones CAR
255	22-OCT-2025	Observaciones informe mensual No.6	Consortio Adecuaciones CAR
256	22-OCT-2025	Respuesta remision acta No.1 comite	Consortio Adecuaciones CAR
257	24-OCT-2025	Entrega acta comite No 106	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
258	24-OCT-2025	Entrega acta comite No. 107	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
259	24-OCT-2025	Respuesta OF 168 Y 172 obs inf 1 y 2	Consortio Adecuaciones CAR
260	24-OCT-2025	Traslado OF 184 entrega insumos faltantes	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
261	25-OCT-2025	Llamado de atencion Inf 4 y 5	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - Consortio Adecuaciones CAR
262	25-OCT-2025	Solicitud entrega doc perosnla grupo VI	Consortio Adecuaciones CAR
263	27-OCT-2025	Entrega informe semanal No.30	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
264	29-OCT-2025	Respuesta OF 192 bitacora	Consortio Adecuaciones CAR
265	30-OCT-2025	Entrega acta comite No 108	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
266	30-OCT-2025	Entrega acta comite No 109	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
267	30-OCT-2025	Entrega acta comite No 110	Consortio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
268	30-OCT-2025	Solicitud modificacion forma pago inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
INFORME MENSUAL No. 8			
269	01-NOV-2025	Entrega acta comité No 111 - Contratista - Supervisión	Consortio Adecuaciones CAR
270	01-NOV-2025	Entrega acta comite No 112 - Contratista - Supervisión	Consortio Adecuaciones CAR
272	01-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.31 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
274	05-NOV-2025	Entrega de informe mensual No.7 interventoria - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
275	06-NOV-2025	Presunto incumplimiento no entrega inf 7 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
276	06-NOV-2025	Reiteración firma bitacora - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
277	06-NOV-2025	Presunto incumplimiento aten obs inf No.6 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
278	06-NOV-2025	Observaciones Cuenta Parcial No.1 V02 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
279	07-NOV-2025	Solicitud inicio actividades saboya y Pto Salgar - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
280	07-NOV-2025	Entrega acta comite No 113 - Contratista - Supervisión	Consortio Adecuaciones CAR
281	08-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.32 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
282	10-NOV-2025	Observaciones Planos Cogua - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR

283	11-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Cajicá - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
284	11-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Machetá - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
285	12-NOV-2025	Citación comité CAR - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
286	13-NOV-2025	Entrega acta comité No 114 - Contratista - Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
288	13-NOV-2025	Entrega y aval acta parcial No.1 obra - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
289	15-NOV-2025	Entrega acta comité No 115 - Contratista - Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
290	15-NOV-2025	Entrega acta comité No 116 - Contratista - Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
291	15-NOV-2025	Entrega acta comité No 117 - Contratista - Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
292	15-NOV-2025	Observaciones Municipio Beltrán - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
293	15-NOV-2025	Solicitud Inicio Actividades La Vega, Sesquile y Cucunuba - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
294	15-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.33 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
295	18-NOV-2025	Solicitud Actualización Bitácora - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
296	19-NOV-2025	Solicitud Prorroga y Modificación Forma Pago CTO Interventoría - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
297	22-NOV-2025	Traslado Respuesta Solicitud Insumos - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
298	22-NOV-2025	Entrega acta comité No 118 - Contratista - Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
299	22-NOV-2025	Entrega acta comité No 119 - Contratista - Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
300	22-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.34 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
301	24-NOV-2025	Observaciones Informe Mensual 3 V4 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
302	24-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Chaguani - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
303	24-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Beltrán - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
304	28-NOV-2025	Respuesta Radicado 2025110508	Corporación Autónoma Regional - CAR
305	28-NOV-2025	Entrega acta comité No 120	Consorcio Adecuaciones CAR
306	28-NOV-2025	Entrega acta comité No 121- Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
307	28-NOV-2025	Entrega acta comité No 122	Consorcio Adecuaciones CAR
308	29-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.35	Corporación Autónoma Regional - CAR

Fuente: Techne S.A.S.

Anexo 3. Correspondencia enviada

Tabla 31 Correspondencia Recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
No.	Fecha	Asunto	Emisor
1	8-MAR-2025	Respuesta al radicado 20251016023 CAR-CM-1439-2025-1. Solicitud Documentación Inicial – Supervisión.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
2	10-MAR-2025	Designación de interventoría del contrato No. 1259 de 2024 Consorcio Adecuaciones CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
3	13-MAR-2025	Notificación cambio de representante legal y representante legal suplente del Consorcio Adecuaciones CAR 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
4	17-MAR-2025	Alcance al radicado CAR No. 20252011808 del 10 de Marzo de 2025- Designación de Interventoría del Contrato No. 1259 de 2025 – CONSORCIO ADECUACIONES CAR.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
5	18-MAR-2025	Respuesta al oficio CAR-CM-1439-2025-2 con asunto "SOLICITUD INFORMACIÓN INICIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO".	Consorcio Adecuaciones CAR

6	31-MAR-2025	Respuesta al oficio CAR-CM-1439-2025-8 con asunto "OBSERVACIONES A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INICIAL".	Consortio Adecuaciones CAR
7	4-ABR-2025	Respuesta al oficio AC-CAR-LP-1259-2025-011 con asunto "Solicitud de entrega de pólizas actualizadas"	Consortio Adecuaciones CAR
8	4-ABR-2025	Respuesta parcial al oficio No. CAR-CM-1439-2025-10 "Observaciones a entrega de documentación inicial"	Consortio Adecuaciones CAR
9	7-ABR-2025	Remisión de pólizas actualizadas	Consortio Adecuaciones CAR
10	10-ABR-2025	Respuesta a solicitud de información sobre Seguridad Social	Consortio Adecuaciones CAR
11	10-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-20 información sobre seguridad social	Consortio Adecuaciones CAR
12	23-ABR-2025	Respuesta al radicado 20251032512: SOLICITUD INFORMACION INICIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN INTERVENTORIA	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
13	23-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-21 observaciones a entrega de documentación inicial	Consortio Adecuaciones CAR
14	25-ABR-2025	Citación comité técnico	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
15	28-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-25 información sobre seguridad social	Consortio Adecuaciones CAR
16	28-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-28 información personal.	Consortio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.2			
17	2-MAY-2025	Respuesta radicado 20251042710 Solicitud entrega de listado priorizados	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
18	5-MAY-2025	Respuesta a radicado 20251034752 Notificación cambio representante legal contrato de obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
19	7-MAY-2025	Entrega Informe mensual No.1	Consortio Adecuaciones CAR
20	7-MAY-2025	Entrega ítems no previstos	Consortio Adecuaciones CAR
21	7-MAY-2025	Solicitud cambio de personal Mínimo requerido CTO 1259-2025	Consortio Adecuaciones CAR
22	8-MAY-2025	Remisión cronograma detallado intervención Susa	Consortio Adecuaciones CAR
23	9-MAY-2025	Solicitud certificados de calidad y caracterización material	Consortio Adecuaciones CAR
24	9-MAY-2025	Notificación sobre condiciones avance físico por dependencia de suministro de insumos	Consortio Adecuaciones CAR
25	9-MAY-2025	Solicitud de aclaración sobre impuestos tasas y contribuciones aplicables CTO 1259-2025	Consortio Adecuaciones CAR
26	12-MAY-2025	Remisión de información faltante del personal profesional	Consortio Adecuaciones CAR
27	13-MAY-2025	Solicitud de aprobación de nuevo personal	Consortio Adecuaciones CAR
28	19-MAY-2025	Respuesta a observaciones sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y gestión Ambiental	Consortio Adecuaciones CAR
29	19-MAY-2025	Respuesta a observaciones informe mensual No.1	Consortio Adecuaciones CAR
30	19-MAY-2025	Remisión Cronograma	Consortio Adecuaciones CAR
31	21-MAY-2025	Respuesta entrega hojas de vida interventoría - Aprobación	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
32	21-MAY-2025	Complementación justificaciones	Consortio Adecuaciones CAR
33	22-MAY-2025	Remisión física de precios unitarios - contractuales	Consortio Adecuaciones CAR
34	22-MAY-2025	Respuesta radicado 20251041748 entrega informe semanal No.1 interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

35	24-MAY-2025	Respuesta radicado 20251041320 entrega plan de trabajo y cronograma interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
36	27-MAY-2025	Envío Cronograma de actividades de inversión actualizado del proyecto	Consortio Adecuaciones CAR
37	27-MAY-2025	Envío actualización ítems no previstos	Consortio Adecuaciones CAR
38	30-MAY-2025	Solicitud modificación y complementación actas de comité	Consortio Adecuaciones CAR
39	30-MAY-2025	Informe frentes de ejecución	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
40	30-MAY-2025	Entrega de documentación subsanada AIU	Consortio Adecuaciones CAR
41	30-MAY-2025	Respuesta a observaciones informe mensual No.1	Consortio Adecuaciones CAR
42	30-MAY-2025	Envío de cronograma entornos asignados	Consortio Adecuaciones CAR
43	30-MAY-2025	Respuesta a solicitud sobre modificación cronograma	Consortio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.3			
44	5-JUN-2025	Solicitud de remisión alcances entornos grupo II	Consortio Adecuaciones CAR
45	5-JUN-2025	Solicitud ítems no previstos 0039	Consortio Adecuaciones CAR
46	5-JUN-2025	Remisión personal por entorno 0040	Consortio Adecuaciones CAR
47	5-JUN-2025	Remisión informe No.2 0042	Consortio Adecuaciones CAR
48	9-JUN-2025	Remisión ítems no previstos 0043	Consortio Adecuaciones CAR
49	10-JUN-2025	Notificación personal técnico visita 0044	Consortio Adecuaciones CAR
50	10-JUN-2025	Solicitud aval cronograma actualizado 0045	Consortio Adecuaciones CAR
51	10-JUN-2025	Notificación material faltante 0049	Consortio Adecuaciones CAR
52	11-JUN-2025	Desglose AIU 0051	Consortio Adecuaciones CAR
53	12-JUN-2025	Acta parcial No.1 obra 0053	Consortio Adecuaciones CAR
54	12-JUN-2025	Personal de obra Pacho 0054	Consortio Adecuaciones CAR
55	16-JUN-2025	Solicitud cronograma materiales grupo II 0055	Consortio Adecuaciones CAR
56	16-JUN-2025	Solicitud envío alcances grupo II y III 0056	Consortio Adecuaciones CAR
57	16-JUN-2025	Solicitud cambio accesorios hidráulicos Chocontá 0057	Consortio Adecuaciones CAR
58	18-JUN-2025	Respuesta observaciones mensual No.1 obra 0058 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
59	21-JUN-2025	Solicitud envío actas No. 21 y 31 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
60	24-JUN-2025	Remisión NPs - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
61	24-JUN-2025	Cronograma entrega de insumos y recorrido entornos - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
62	24-JUN-2025	Remisión de ítems no previstos - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
63	24-JUN-2025	Remisión corrección APU contractuales - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
64	26-JUN-2025	Entrega Plan Contingencia - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR

65	25-JUN-2025	Entrega Acta Mayores y Menores - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
66	25-JUN-2025	Alcance Entrega Balance - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
67	27-JUN-2025	Respuesta alcances OF 079 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
68	27-JUN-2025	Respuesta cambio tecnicos obra OF 045 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
69	27-JUN-2025	Respuesta materiales faltantes OF 73 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
70	27-JUN-2025	Respuesta certificados calidad insumos OF 41 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
71	27-JUN-2025	Entrega informes mensuales No.1 y No.2 obra - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
72	27-JUN-2025	Respuesta Comunicado 094 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
73	27-JUN-2025	Respuesta a requerimiento 094 parafiscales - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.4			
74	1-JUL-2025	Aclaración Ubicación Documentos Seguridad Social - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
75	1-JUL-2025	Solicitud Firma Apoyo SST - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
76	1-JUL-2025	Entrega NP 10 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
77	1-JUL-2025	Solicitud Inclusión NPs - Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Consortio Adecuaciones CAR
78	2-JUL-2025	OF 071 Balance de obra - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
79	2-JUL-2025	Respuesta parafiscales - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
80	2-JUL-2025	Apu contractuales - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
81	3-JUL-2025	OF.74 Solicitud cumplimiento materiales - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
82	7-JUL-2025	Entrega informe mensual No.3 obra - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
83	7-JUL-2025	OF 76 Solicitud entrega de materiales peña - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
84	7-JUL-2025	Respuesta OF 111 inter - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
85	7-JUL-2025	Respuesta insumos - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
86	8-JUL-2025	OF 078 personal Saboya y la peña - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
87	8-JUL-2025	OF 077 Respuesta AIU - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR
88	10-JUL-2025	Citación comité - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
89	10-JUL-2025	Respuesta 0057 Insumos Chocontá - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
90	9-JUL-2025	Citación entrega saboya -OF 79 - Contratista	Consortio Adecuaciones CAR

91	9-JUL-2025	Citación entrega paso ancho Supatá OF 80 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
92	10-JUL-2025	Envío anexo ambiental informe No.3 OF 81- Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
93	11-JUL-2025	Alcance cronograma plan contingencia OF 84 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
94	10-JUL-2025	Balance de obra OF 083 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
95	11-JUL-2025	Cierre pasuncha y Supatá OF 85 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
96	12-JUL-2025	Respuesta radicado 20251058402 mensual No.1 inter - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
97	15-JUL-2025	OF 088 valor kit sistema recolección - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
98	16-JUL-2025	OF.089 items no previstos - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
99	16-JUL-2025	OF 090 Balance de obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
100	17-JUL-2025	OF 091 Notificación física NP - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
101	17-JUL-2025	OF 092 Memorias ajustadas obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
102	17-JUL-2025	Observaciones inf No.2 interventoría - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
103	18-JUL-2025	OF 93 Subsanación informe mensual No.1 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
104	18-JUL-2025	OF 94 Notificación subsanación informe mensual No.2 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
105	21-JUL-2025	OF 95 Entrega mesitas del colegio - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
106	21-JUL-2025	OF 96 Respuesta anexo ambiental - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
107	21-JUL-2025	OF 97 Solicitud de alcance entorno Neusa - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
108	21-JUL-2025	OF 98 Memorias acta parcial No.1 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
109	22-JUL-2025	OF 99 Atención observaciones inf mensual No.3 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
110	22-JUL-2025	OF 100 Aclaración actas vecindad - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
111	24-JUL-2025	OF 101 Plan contingencia ajustado - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
112	28-JUL-2025	Respuesta OF 74 cumplimiento insumos - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
113	28-JUL-2025	Respuesta OF 76 Cumplimiento insumos - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
114	28-JUL-2025	Respuesta OF 74 ítem no previstos - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
115	29-JUL-2025	Alcances grupo III - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
116	31-JUL-2025	Respuesta OF 78 Cronograma insumos – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
INFORME MENSUAL No.5			
117	4-AGO-2025	Aprobación cambio inspector II inter - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
118	5-AGO-2025	OF 109 Entrega plan de contingencia V04 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR

119	8-AGO-2025	OF 110 Respuesta entrega planos record - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
120	8-AGO-2025	OF 111 Solicitud provisión llave Vergara - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
121	8-AGO-2025	OF 112 Entrega inf mensual No.4 obra - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
122	11-AGO-2025	OF 113 Resp obs infor No.2 obra - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
123	11-AGO-2025	Res obs inf No.3 obra OF 105 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
124	12-AGO-2025	Res obs inf No.3 obra OF 105 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
125	14-AGO-2025	OF 117 Alcance plan contingencia - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
126	15-AGO-2025	Rad 20252076746 pólizas acta inicio inter - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
127	15-AGO-2025	Rad 20252076747 obs inf No.3 inter - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
128	15-AGO-2025	OF 116 Remisión plan de contingencia - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
129	15-AGO-2025	OF 118 Alcance informe No.3 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
130	15-AGO-2025	OF 119 Ejecución Tibacuy - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
131	15-AGO-2025	OF 120 Cierre Tena - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
132	15-AGO-2025	OF 121 Cierre Tausa - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
133	15-AGO-2025	OF 122 Cierre Neusa Chapinerito - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
134	15-AGO-2025	OF 123 Cierre Vergara - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
135	15-AGO-2025	OF 124 Entrega DWG planos record - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
136	15-AGO-2025	OF 125 Ensayos laboratorio - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
137	15-AGO-2025	OF 126 Alcance informe No.4 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
138	19-AGO-2025	OF 127 Citación revisión informes - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
139	19-AGO-2025	OF 128 Remisión acta 58 y 59 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
140	20-AGO-2025	OF 129 Solicitud aval cambio residente - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
141	20-AGO-2025	OF 130 Remisión acta 39 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
142	21-AGO-2025	Remisión informe No.1 V04 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
143	22-AGO-2025	OF 132 Cierre San Miguel Caldas - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
144	22-AGO-2025	OF 133 Respuesta OF 164 ensayos laboratorio - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
145	23-AGO-2025	OF 134 Cierre Quebrada Negra - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
146	26-AGO-2025	OF 135- Cierre Nemocón	Consorcio Adecuaciones CAR
147	26-AGO-2025	OF-136 Remisión informe No.2 – Subsanación observaciones	Consorcio Adecuaciones CAR
148	27-AGO-2025	OF-137 Remisión y respuesta plan de contingencia	Consorcio Adecuaciones CAR
149	27-AGO-2025	Observaciones SST y ambiental obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

150	28-AGO-2025	OF 139 Cierre San Miguel	Consortio Adecuaciones CAR
151	28-AGO-2025	OF 138 Remisión informe No.3 – Subsanación observaciones	Consortio Adecuaciones CAR
152	29-AGO-2025	Remisión observaciones presentadas items no previstos	Consortio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.6			
153	2-SEP-2025	Convocatoria mesa de trabajo	Consortio Adecuaciones CAR
154	5-SEP-2025	OF 142. Cierre San Bernardo	Consortio Adecuaciones CAR
155	8-SEP-2025	OF 143 Radicación acta No.1 obra	Consortio Adecuaciones CAR
156	8-SEP-2025	OF 144 Cierre Sibate y Soacha	Consortio Adecuaciones CAR
157	12-SEP-2025	OF 145 Entrega inf mensual No.5	Consortio Adecuaciones CAR
158	12-SEP-2025	OF 146 Subsanación obs NP	Consortio Adecuaciones CAR
159	12-SEP-2025	OF 147 Cierre Neusa	Consortio Adecuaciones CAR
160	12-SEP-2025	OF 148 Cierre la peña	Consortio Adecuaciones CAR
161	12-SEP-2025	OF 149 Cierre Tibirita	Consortio Adecuaciones CAR
162	16-SEP-2025	OF 150 entrega atención obs SST	Consortio Adecuaciones CAR
163	16-SEP-2025	OF 151 Remisión inf informe No.2	Consortio Adecuaciones CAR
164	16-SEP-2025	OF 152 Remisión inf informe No.3	Consortio Adecuaciones CAR
165	18-SEP-2025	OF 153 Cierre Sutatausa	Consortio Adecuaciones CAR
166	18-SEP-2025	OF 154 Cierre Agua de Dios	Consortio Adecuaciones CAR
167	20-SEP-2025	OF 155 Cierre Neusa	Consortio Adecuaciones CAR
168	20-SEP-2025	OF 156 Remision NP	Consortio Adecuaciones CAR
169	24-SEP-2025	OF 157 Cierre la Mesa	Consortio Adecuaciones CAR
170	24-SEP-2025	OF 158 Cierre Pelusa	Consortio Adecuaciones CAR
171	25-SEP-2025	OF 160 Entrega y Cierre Saboya	Consortio Adecuaciones CAR
172	25-SEP-2025	Respuesta OF 211 llamado de atención	Consortio Adecuaciones CAR
173	26-SEP-2025	Respuesta radicado 153 y 144 cambio representante legal interventoría	Consortio Adecuaciones CAR
174	26-SEP-2025	Respuesta radicado 153 y 144 cambio representante legal interventoría	Consortio Adecuaciones CAR
175	28-SEP-2025	Respuesta radicado 148 informe mensual No.4 interventoría	Consortio Adecuaciones CAR
176	28-SEP-2025	Observaciones agua de Dios	Consortio Adecuaciones CAR
177	29-SEP-2025	Solicitud Inclusión Np ajustados	Consortio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.7			
178	1-OCT-2025	OF 163 inclusion NP	Consortio Adecuaciones CAR
179	1-OCT-2025	OF 164 Solicitud remisión acta No.1	Consortio Adecuaciones CAR
180	1-OCT-2025	OF 165 Inclusión NP	Consortio Adecuaciones CAR
181	1-OCT-2025	OF 166 Inicio actividades Cajicá	Consortio Adecuaciones CAR

182	2-OCT-2025	OF 167 Doc inicial SST	Consortio Adecuaciones CAR
183	2-OCT-2025	OF 168 Solicitud aval NP	Consortio Adecuaciones CAR
184	6-OCT-2025	OF 168 Ajuste informe SST No.1	Consortio Adecuaciones CAR
185	2-OCT-2025	OF 169 Situación municipio Cajicá llaves	Consortio Adecuaciones CAR
186	6-OCT-2025	OF 170 Solicitud inclusión de NP	Consortio Adecuaciones CAR
187	8-OCT-2025	OF 171 Respuesta actividades Peña	Consortio Adecuaciones CAR
188	8-OCT-2025	OF 172 Remisión informe 2	Consortio Adecuaciones CAR
189	9-OCT-2025	OF 173 Observaciones Fátima	Consortio Adecuaciones CAR
190	10-OCT-2025	OF 175 Respuesta póliza acta inicio	Consortio Adecuaciones CAR
191	11-OCT-2025	OF 176 Entrega informe No.6	Consortio Adecuaciones CAR
192	15-OCT-2025	Rad 8498 informe quincenal	Corporación Autónoma Regional - CAR
193	23-OCT-2025	OF 174 Respuesta llamado de atención doc SST	Consortio Adecuaciones CAR
194	23-OCT-2025	OF 182 Respuesta aprobación pólizas obra	Consortio Adecuaciones CAR
195	24-OCT-2025	OF 183 Entrega planillas de pago	Consortio Adecuaciones CAR
196	24-OCT-2025	OF 184 Solicitud entrega doc faltantes	Corporación Autónoma Regional - CAR
197	25-OCT-2025	Rad 1607 ítem no previstos	Corporación Autónoma Regional - CAR
198	25-OCT-2025	OF 185 Citación cierre Cajicá	Consortio Adecuaciones CAR
199	25-OCT-2025	OF 186 Citación cierre Machetá	Consortio Adecuaciones CAR
200	27-OCT-2025	OF 131 Atención Obs inf 1 V07	Consortio Adecuaciones CAR
201	27-OCT-2025	OF 187 Respuesta OF 261 Inf 4 y Inf 5	Consortio Adecuaciones CAR
202	27-OCT-2025	OF 188 Reprogramación Cajicá	Consortio Adecuaciones CAR
203	27-OCT-2025	OF 189 Respuesta ejecución Sesquile	Consortio Adecuaciones CAR
204	27-OCT-2025	OF 190 Respuesta inf 4 y 5	Consortio Adecuaciones CAR
205	27-OCT-2025	OF 191. Respuesta a coordinación entornos	Consortio Adecuaciones CAR
206	27-OCT-2025	OF 192 Respuesta actualización Bitacora	Consortio Adecuaciones CAR
207	28-OCT-2025	OF 194 Entrega municipio Macheta	Consortio Adecuaciones CAR
208	29-OCT-2025	Respuesta rad 1114366 presunto incumplimiento	Corporación Autónoma Regional - CAR
INFORME MENSUAL No.8			
209		OF 196 Alcance OF 195 Planos Cogua	Consortio Adecuaciones CAR
210		OF 197 Entrega informes No.1V07 y No.2 V06	Consortio Adecuaciones CAR
211		Respuesta OF 295 RAD 1530 compostera	Consortio Adecuaciones CAR

212		Respuesta OF 53 Rad 5378 alcance entornos	Consortio Adecuaciones CAR
213		OF 201. Entrega Informe Mensual 6 V02	Consortio Adecuaciones CAR
214		Entrega Informe Mensual 7	Consortio Adecuaciones CAR
215		Respuesta radicado 1108754 comité presunto incumplimiento	Corporación Autónoma Regional - CAR
216		Respuesta radicado 1109890 inicio actividades Cajica	Corporación Autónoma Regional - CAR
217		OF 202 Respuesta inicio actividades Pto Salgar y Saboya	Consortio Adecuaciones CAR
218		OF 193 Respuesta presunto incumplimiento	Consortio Adecuaciones CAR
219		OF 204 Entrega Anolaima	Consortio Adecuaciones CAR
220		OF 205 Entrega Guayabal y Beltrán	Consortio Adecuaciones CAR
221		Respuesta Aval Macheta	Corporación Autónoma Regional - CAR
222		Solicitud Accesorios Faltantes Chaguani	Consortio Adecuaciones CAR
223		Citación Entrega Chaguani	Consortio Adecuaciones CAR
224		Citación Entrega Anolaima	Consortio Adecuaciones CAR
225		Respuesta Observaciones Beltrán	Consortio Adecuaciones CAR
226		Respuesta Actualización Bitácora	Consortio Adecuaciones CAR
227		Respuesta Observaciones Soacha	Consortio Adecuaciones CAR
228		Respuesta Traslado Entrega Insumos	Corporación Autónoma Regional - CAR
229		Respuesta Radicado 1121610 Modificación Forma de Pago	Corporación Autónoma Regional - CAR
230		Entrega Acta Parcial 2	Consortio Adecuaciones CAR
231		Respuesta Radicado 1122167 Entrega Informe Semanal 31	Corporación Autónoma Regional - CAR

Fuente: Techne S.A.S.

Anexo 4. Correspondencia recibida

5.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades administrativas encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
1. Verificar que el contratista de obra mantenga durante la	S	La interventoría ha estado presta a revisar el personal profesional

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
ejecución del contrato el personal ofrecido en la propuesta para cada una de las Etapas del contrato.		<p>ofertado por el contratista de obra se ha observado cuando se considere necesario.</p> <p>Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos.</p> <p>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <p><i>Ver Anexo 10 Bitácora</i></p>
2. Exigir al contratista los informes, documentos y demás detalles para asegurar la correcta ejecución del contrato.	S	<p>Durante el presente periodo, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la entrega de los informes, documentos y soportes técnicos requeridos para garantizar el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual.</p> <p>Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-275, se hace la solicitud de la entrega del informe de obra No.7</p>
3. Realizar seguimiento al programa de trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos en el programa de trabajo del contratista, así como la ejecución de los frentes de trabajo necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual en el plazo establecido.	S	<p>A través de los informes semanales, se ha realizado un seguimiento sistemático al progreso de las actividades ejecutadas por el contratista, formulando las recomendaciones y observaciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de los componentes establecidos en el contrato.</p> <p><i>Ver anexo 5. Informes Semanales.</i></p>
4. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral y de seguridad social	S	<p>La interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad industrial por parte del</p>

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
vigente y verificar que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.		contratista de obra, conforme a la normatividad vigente. Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-301 , se solicita al contratista de obra complementar el cuadro de planillas adjunto con la información faltante.
5. Solicitar a la Corporación a través de la Dirección de Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud así lo ameriten.	S	Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes que fueran competencia de la Supervisión.
6. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes de tipo administrativo que realice el contratista de obra, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas que sean de su competencia.	S	La interventoría esta presta y con los canales de comunicación abiertos para atender cualquier tipo de sugerencias, reclamaciones y solicitudes que el contratista requiera. Las determinaciones adoptadas frente a dichas solicitudes han sido informadas oportunamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante comunicaciones oficiales, garantizando la trazabilidad y transparencia en las decisiones dentro del ámbito de competencia de la interventoría. Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes por parte del contratista de obra que fueran de competencia de la Supervisión.
7. Verificar que el contratista cumpla con la constitución de garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su renovación o modificación. En el caso que la Corporación autorice prorrogas, la interventoría exigirá la ampliación de las garantías, y la responsabilidad de la interventoría en la ejecución del proyecto, continuará hasta que la obra haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el	S	Para el periodo no se ha realizado alguna modificación a los contratos.

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
valor del contrato de interventoría.		
8. Emitir concepto sobre las modificaciones que resulten durante la ejecución del contrato y someterlas a consideración de la Corporación con la respectiva justificación técnica y el análisis de beneficio en caso de requerirse cambios o modificaciones en las condiciones iniciales del proyecto, solicitudes de prórroga, reprogramaciones.	S	Mediante el comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-230 , la interventoría da aval y traslada a la supervisión la solicitud de la inclusión de ítems no previstos, necesarios para la ejecución del contrato de obra. Durante el periodo evaluado no se registraron actualizaciones, manteniéndose la información y condiciones previamente reportadas.
9. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto por el contratista y solicitar los cambios a que haya lugar.	S	La interventoría ha realizado el seguimiento y control al personal técnico vinculado por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de los perfiles, funciones y soportes exigidos conforme a la propuesta aprobada. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados: <ul style="list-style-type: none"> • CAR-CM-1439-2025-295 solicitud actualización de bitácora de obra. <i>Ver Anexo 10 Bitácora.</i>
10. Suscribir las actas de iniciación, suspensión, reinicio, recibo final, liquidación, actas de comité, actas con la comunidad y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.	S	Al momento del presente informe no se han realizado modificaciones a los contratos.
11. Colaborar con la Corporación en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato.	S	En caso de que se presente algún tipo de perjuicio a terceros, se informara inmediatamente a la corporación con el fin de evaluar y ejecutar las soluciones pertinentes.

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
12. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a la Corporación en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos.	S	La interventoría ha informado de manera oportuna a la Entidad Contratante sobre los hechos imputables al contratista que pueden afectar el normal desarrollo del contrato. Durante el periodo evaluado no se presentaron hechos imputables al contratista que representaran riesgo o perjuicio para la Corporación; en consecuencia, no fue necesario adelantar gestiones de reporte o colaboración para su solución.
13. Presentar solicitud, debidamente motivada y sustentada técnica, económica y legal con recomendación a la Corporación de las adiciones, prórrogas, suspensiones y reiniciación.	S	Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-296 , la interventoría solicita a la entidad contratante, la prórroga y modificación de la forma de pago del contrato de interventoría
14. Elaborar en conjunto con el Contratista de Obra las actas y listados de asistencia de todas las reuniones que se realicen para validación del proyecto con los actores locales y regionales involucrados en el tema.	S	En cada reunión realizada con el contratista y supervisión se ha suscrito la respectiva acta, donde se resaltan los aspectos más importantes y novedades en cuanto a las ejecuciones de obra. <i>Ver Anexo 10 Bitácora.</i>
15. Elaborar y presentar a la supervisión un informe semanal, en el que se refleje para cada periodo de tiempo reportado, el avance del proyecto, información de los costos, registro fotográfico, descripción de las actividades realizadas y cumplimiento del componente HSEQ, de acuerdo al formato establecido en la Corporación para tal fin.	S	Se han elaborado y presentado los informes semanales correspondientes, en los cuales se detallan de manera específica todos los aspectos requeridos según lo establecido y solicitado por la entidad contratante <i>Ver Anexo 5. Informes Semanales.</i>
16. Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificación y cargo de los trabajadores.	S	Se ha realizado la solicitud de planillas de pago de salarios cada vez que ha sido necesario. Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-278 , dentro de las observaciones presentadas, se solicitó la inclusión completa de las planillas de pago de salarios y paz y salvos correspondientes al personal de obra.

6. SEGUIMIENTO AL PLAN HSEQ DE OBRA E INTERVENTORÍA

La interventoría Techne S.A.S. en el periodo de la referencia ha realizado seguimiento al área de HSQE, en el cual se permite informar las actividades realizadas por el contratista de obra Consorcio Adecuaciones CAR 2025.

6.1 SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ

Evidencia de la socialización del plan HSEQ al personal involucrado en obra e interventoría. Se socializan los, protocolos, procedimientos y formatos de reporte, al personal de obra.

6.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA

Uso de elementos de protección personal (EPP).
Señalización de áreas de trabajo.
Reporte y seguimiento de condiciones subestándar o actos inseguros.

6.3 GESTIÓN AMBIENTAL

Control de emisiones, vertimientos y generación de ruido.
Protección de recursos naturales en el área de intervención.
Manejo adecuado de residuos

6.4 ACCIDENTES E INCIDENTE

A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado accidentes ni incidentes laborales durante la ejecución de las actividades de obra, lo cual indica un cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad establecidas en el Plan HSEQ.

6.5 CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Capacitaciones en seguridad laboral, uso de EPP, manejo ambiental, entre otros.
Número de personas capacitadas y temáticas abordadas.

6.6 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal del contratista de obra avalado a la fecha por la interventoría.

Tabla 32 Personal Profesional de Obra

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	José Luis Lamus Rodríguez
RESIDENTE DE OBRA	Luis Alfonso Riveira Pinto
PROFESIONAL TÉCNICO 1	Juan Manuel Franco Guzmán
PROFESIONAL TÉCNICO 2	Kewin Manfred Castañeda
PROFESIONAL TÉCNICO 3	Jonatan Alexander Feo González
PROFESIONAL TÉCNICO 4	Yeison Alonso Cárdenas Acosta
PROFESIONAL TÉCNICO 5	Dayana Robayo Lancheros

Fuente: Techne S.A.S.

6.7 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con las condiciones contractuales y a la dedicación del personal profesional por parte de la interventoría, se relaciona el personal ofertado.

Tabla 33 Personal profesional de interventoría

CARGO	DEDICACIÓN	PROFESIONAL INTERVENTORÍA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	30%	Juan Carlos Aragón Pinzón
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%	Fredy Leonel Gómez Rincón
INSPECTOR 1	50%	Erica Andrea Ramírez González
INSPECTOR 2	50%	David Santiago Guamán Panche

Fuente: Techne S.A.S.



7. ASPECTOS FINANCIEROS

En este capítulo se realiza el seguimiento al ámbito financiero del contrato de obra, con el fin de velar por el bienestar económico del contrato y que no se presente un desequilibrio económico que ponga en riesgo el alcance contractual.

Adicionalmente, se presentan de manera detallada los aspectos financieros y contables referentes a las formas de pago, pagos de cuentas de cobro de los contratos de obra e interventoría, junto con el seguimiento al flujo de caja, cronograma y balance del contratista de obra.

7.1 CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de obra No CAR-LP-1259 de 2025, en la cláusula decima se pacta la siguiente forma de pago:

Tabla 34 Forma de Pago Contrato de Obra

Pago	Porcentaje a Pagar	Requisitos
1	Hasta el 90%	Informe de actividades ejecutadas durante el periodo a cobrar Previa aprobación de la interventoría Certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores Certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.
2	10%	Acta de terminación Acta de recibo a satisfacción Acta de liquidación del contrato Certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores Certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.

Fuente: Techne S.A.S.

7.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de interventoría No. CAR-CM-1439 de 2025, la forma de pago establecida en la cláusula cuarta es la siguiente:

Tabla 35 Forma de Pago Contrato de Interventoría

Pago	Porcentaje a Pagar	Requisitos
1	Hasta el 90%	Informe pormenorizado de las actividades desarrolladas por la interventoría. Informe administrativo y financiero tanto de obra como de interventoría. Informe ejecutivo de interventoría avalando las actividades contractuales del contrato al cual le ejerce la interventoría. Memorias de cálculo de cantidades de obra, avance programado vs avance real de ejecución. Relación de personal tanto de obra como de interventoría que participa en la ejecución del proyecto, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones.

		Certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal de interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al sistema general de seguridad social y ARL. Factura Constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales Certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda.
2	10%	Acta de terminación Acta de liquidación del contrato Recibo a satisfacción del informe final entregado donde se especifique el recibo a satisfacción de los productos finales del contrato de obra y la liquidación del mismo

Fuente: Contrato de obra CAR-LP-1259-2025

7.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se presentan los datos relevantes sobre el estado financiero de los contratos de obra y de interventoría a la fecha:

Tabla 36 Estado Financiero del Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025

Descripción	Valor	Porcentaje	Saldo por ejecutar
Valor Inicial del Contrato	\$ 3.059.701.535	100%	-
Cuenta No. 1	\$145.986.376	4,77%	\$ 2.913.712.159

Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 37 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025

Descripción	Valor	Porcentaje	Saldo por ejecutar
Valor Inicial del Contrato	\$ 306.544.238.00	100%	-
Cuenta No. 1	\$14.622.782.00	4,77%	\$ 291.921.456

Fuente: Techne S.A.S.

7.4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta por parte de la interventoría el informe y solicitud de pago No. 1 correspondiente al periodo del 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, lo anterior, conforme con la cláusula cuarta del contrato de interventoría No. 1439-2025, se establece que: "La Corporación cancelará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de selección en moneda legal colombiana, de la siguiente manera: • El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato será pagado de acuerdo al porcentaje de avance de obra objeto de Interventoría. El pago se hará previa aprobación de la supervisión del informe de interventoría..."

A la fecha la interventoría ha generado el trámite respectivo de las cuentas de cobro de cada uno de los periodos, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 38 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025

Cuenta	Periodo		Porcentaje	Valor	Observaciones
	Desde	Hasta			
1	1 de abril de 2025	30 de junio de 2025	4,77%	\$14.622.782.00	En trámite
Total, acumulado			4,77%	\$ \$14.622.782.00	

Fuente: Techne S.A.S.

De acuerdo con lo expuesto en la solicitud radicada mediante el oficio **CAR-CM-1439-2025-268**, y radicado CAR No **20251121610** presentada por la interventoría, y tras el análisis técnico, jurídico y financiero del contenido del documento, se considera procedente la modificación de la Cláusula Cuarta "Forma de pago" del Contrato de Interventoría No. 1439-2025, con el fin de garantizar el equilibrio económico del contrato de interventoría.

Esta recomendación se sustenta en los siguientes aspectos:

- El contrato de interventoría constituye un contrato estatal de carácter autónomo e independiente del contrato de obra, tal como lo establece la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En tal sentido, sus obligaciones son de cumplimiento permanente y continuo, y su remuneración no debe estar condicionada al avance físico o financiero del contratista de obra.
- La interventoría ha evidenciado que, durante los siete (7) meses de ejecución, los costos reales asumidos ascienden a **\$165.062.282**, mientras que el valor proporcional reconocido bajo la forma de pago actual equivale a **\$14.337.218**, según acta parcial No.1 V01, entregada por el contratista de obra Consorcio Adecuaciones CAR, la cual no se ha realizado su aval por parte de la interventoría al presentar observaciones las cuales a la fecha no han sido atendidas por el Consorcio Adecuaciones CAR 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior en el contrato de interventoría 1439-2025 se está presentando un **desequilibrio económico** tal como se menciona en el comunicado **CAR-CM-1439-2025-268** de fecha 30 de octubre de 2025.

La interventoría ha mantenido presencia constante del equipo técnico y administrativo, elaborando informes, actas, comunicaciones, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, pese a la baja ejecución del contrato de obra.

7.5 SEGUIMIENTO FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades financieras encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
1. Realizar el control de las inversiones del contrato de obra, velando porque el contratista destine los recursos necesarios para el buen desarrollo del mismo.	S	Se ha venido llevando el control presupuestal y se ha reportado en los informes semanales de interventoría. <i>Ver anexo 5. Informes Semanales.</i>
2. Tramitar los pagos del contrato de obra de acuerdo con lo pactado en la minuta y velar porque todos los desembolsos entregados al contratista se utilicen única y exclusivamente en los gastos	S	Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-288 , se entrega a la supervisión el acta parcial de obra No.1

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
en que el contratista deba incurrir con ocasión de la ejecución del mismo.		
3. Verificar y exigir mensualmente los pagos del personal vinculado al contrato de obra y los pagos de seguridad social y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente.	S	La interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad industrial por parte del contratista de obra, conforme a la normatividad vigente. Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-278 , dentro de las observaciones presentadas se solicita incluir en su totalidad las planillas completas del personal.
4. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizará un balance financiero y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendará la posible suscripción de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto del proyecto.	S	Mediante el comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-230 , la interventoría da aval y traslada a la supervisión la solicitud de la inclusión de ítems no previstos, necesarios para la ejecución del contrato de obra. En el periodo reportado no se han presentado actualizaciones.
5. Llevar actualizado el control presupuesto y de ejecución de las obras mediante memorias de cálculo de cantidades de obra para cada uno de los informes mensuales presentados a la Supervisión del contrato de interventoría.	S	El control de presupuesto y ejecución de obra se mantienen actualizados y reportados en cada informe semanal de interventoría presentado. <i>Ver anexo 5. Informes Semanales.</i>
6. Verificar y autorizar todos los informes y demás soportes necesarios para el trámite de las órdenes de pago del Contratista de Obra, teniendo en cuenta que las mismas deben contar con todos los entregables establecidos en las actividades de asesoría técnica, y serán un documento adjunto y requerido para la entrega y recibo de cada reservorio.	S	Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-278 , se presentan las observaciones correspondientes al Acta Parcial de Cobro No. 1 de obra. Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-288 , se entrega a la supervisión el acta parcial de obra No.1
7. Verificar y dar visto a todas las actividades, actas, informes y demás	S	Se ha realizado la respectiva verificación y observaciones a

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
soportes requeridos durante las actividades de asesoría técnica del proyecto.		<p>cada uno de los soportes requeridos durante las actividades de la asesoría técnica del proyecto.</p> <p>Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-288, se da aval y se entrega a la supervisión el acta parcial de obra No.1</p>



8. ASPECTOS JURÍDICOS

En este capítulo se realiza seguimiento jurídico y legal al contrato de obra e interventoría, en el cual se observa las fechas de iniciación de los contratos, actos jurídicos y se verifica las vigencias de las pólizas.

8.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra:

Tabla 39 Estado legal del contrato de obra

NO.	OBJETO	FECHA DE FIRMA
1	Suscripción de Contrato	29 de enero de 2025
2	Acta de Inicio	01 de abril de 2025

Fuente: Techne S.A.S.

• Pólizas contrato de obra

A continuación, se relaciona la trazabilidad de las pólizas expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, entregadas por el contratista de obra, para las cuales se verifican los amparos y vigencias correspondientes.

Tabla 40 Pólizas iniciales contrato de obra

No. DE POLIZA	NOMBRE DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
33-44-101259500	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	30/04/2026	\$611.940.307.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/02/2025	31/12/2028	\$305.970.153.50
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12/02/2025	12/02/2030	\$611.940.307.00
33-40101083955	RCE	12/02/2025	31/12/2025	\$711.750.000.00

Fuente: Pólizas contrato de obra CAR-LP-1259-2025

Tabla 41 Pólizas Acta de inicio

No. DE POLIZA	NOMBRE DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
33-44-101259500	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2025	17/06/2026	\$611.940.307.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2025	17/02/2029	\$305.970.153.50
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/04/2025	01/04/2030	\$611.940.307.00
33-40-101083955	RCE	01/04/2025	17/02/2026	\$711.750.000.00

Fuente: Pólizas contrato de obra CAR-LP-1259-2025

8.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de interventoría:

Tabla 42 Estado legal del contrato de interventoría

NO.	OBJETO	FECHA DE FIRMA
1	Suscripción de Contrato	24 de febrero de 2025
2	Acta de inicio	01 de abril de 2025

Fuente: Techne S.A.S.

- Pólizas contrato de interventoría**

Las pólizas fueron expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, para lo cual a la fecha se han presentado las expedidas para los actos de firma de contrato y acta de inicio; pólizas expedidas de la siguiente manera:

Tabla 43 Pólizas iniciales contrato de interventoría

PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
NO. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
11-44-101249337	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2025	24/07/2026	\$61.308.847.60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES	24/02/2025	24/03/2029	\$30.654.423.80
	CALIDAD DEL SERVICIO	24/03/2026	24/03/2031	\$61.308.847.60
11-40-101074844	RCE	24/02/2025	24/03/2026	\$284.700.000.00

Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 44 Pólizas acta de inicio

PÓLIZAS ACTA DE INICIO				
NO. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
11-44-101249337	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2025	29/08/2026	\$61.308.847.60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/04/2025	29/04/2029	\$30.654.423.80
	CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2026	29/04/2031	\$61.308.84
11-40-101074844	RCE	01/04/2025	29/04/2026	\$284.700.000.00

Fuente: Techne S.A.S.

10 CONCLUSIONES

- Se informa a la entidad contratante CAR que la obra presenta un atraso del 57,21 % con respecto a la programación inicialmente aprobada por la interventoría. Ante esta situación, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la elaboración, entrega e implementación de un plan de contingencia detallado, con el propósito de nivelar el avance de las actividades y mitigar el impacto del retraso.
- A la fecha, la Corporación ha entregado 55 municipios para intervención; de estos, 10 se encuentran actualmente en ejecución y pendientes de finalización.
- Durante el periodo se realizaron visitas técnicas en los municipios de Machetá, Manta, Anolaima, Guayabal de Siquima, Beltrán y Chaguaní donde se verificaron las herramientas instaladas en los diferentes entornos intervenidos en cada uno de estos municipios.
- A la fecha, se ha iniciado por parte de la CAR la entrega de insumos en los municipios correspondientes al Grupo VI, para que el contratista de obra continúe ejecutando las obras en los entornos priorizados.
- A la fecha, se radicaron el Acta Parcial No. 1 de Obra y el Acta Parcial No. 1 de Interventoría, las cuales se encuentran en trámite.
- Tras el análisis de la solicitud presentada por la interventoría, se concluye que la forma de pago actual del Contrato de Interventoría No. 1439-2025 no refleja la naturaleza autónoma y continua de las obligaciones propias de la interventoría, generando un desequilibrio económico evidente frente a los costos reales asumidos por la misma.
