



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR EN ORDEN

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

20200268753




ESTAMPILLAS CONTRATOS

CONTRIBUYENTE	CONSTRUCCIONES SINAI	FECHA EMISION	29/12/2020 - 10:56:29 AM
IDENTIFICACIÓN	901036485	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2020
DIRECCIÓN	C	TELEFONO	5

TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS	Base Gravable	15.667.940
ASOCIADA	NÚMERO CONTRATO	SOPORTE ASOCIADA	29/12/2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TOTAL
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	\$626.718
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$313.359
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	\$78.340



	TOTAL RECIBO	\$1.018.417
	INTERÉS POR MORA	\$0
	DESCUENTO	\$0
	VALOR A PAGAR	\$1.018.417

(415)7709998015524(8020)020200268753(3900)00000001018417(96)20201231

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE

PORTAL - 29/12/2020 - 10:56:29 AM

CONTRIBUYENTE

CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S.

NIT 901.036.465-

CR 48 100 78

Tel: (035) 3106117531

Barranquilla - Colombia

principal@sinaisat@gmail.com



**Factura electronica de venta
No. FE-3**

Elaborado y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S N.º 830.048.145-8

Fecha y hora Factura

Generación 29/12/2020, 17:56
Expedición 29/12/2020, 17:56
Vencimiento 28/01/2021

(035) 842444
Valledupar - Colombia

Señores
NIT MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Dirección 800.098.911-8
CRA 5 N° 15 89
Teléfono
Ciudad

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO OBRA CIVIL COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL #1 DE CONTRATO 958 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PREMEZCLADO MR = 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 2. REPARACIONES DE ANDENES Y BORDILLOS EN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.00	67,703,180.84

Valor en Letras: Cuarenta y siete millones trescientos noventa y dos mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con 0.38	Total Bruto	56,893,437.43
Condiciones de Pago:	IVA 19%	10,809,753.11
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-28 por	Copago / Anticipo	20,310,957.16
	Total a Pagar	47,392,233.38

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta título - Valor. Número Autorización 1878400912375 aprobado en 20201222 perfilo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 7

CUFE: a8bc835cc3d8750af6571870d9cd80b05c34b68bc597271f574cf128c031a9981281c360896291c8c76437472a0df



VALLEDUPAR

ALCALDIA DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2020		CONTRATO DE OBRAS N° 283 DE 2020	
OBJETO:		REHABILITACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO RÍGIDO PREMEZCLADO MR = 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MOD - 2, REPARACIONES DE ANCHOS Y BORDILLOS EN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S	CONTRATISTA:	CONSORCIO REHABILITACIÓN VALLEDUPAR HS
NIT:	800.098.811-8	NIT:	901.427.543-1
SUPERVISOR:	ING. MAYTORENA BAUTE CASTILLA- ARQ. ZENITH FERNANDEZ MOLINA	INTERVENIOR:	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S
VALOR INICIAL CONTRATO INCLUYE IVA:	\$ 98.130.811.00	VALOR INICIAL CONTRATO INCLUYE IVA:	\$ 1.303.829.091.00
ANTICIPO:	30%	ANTICIPO:	30%
PLAZO:	45 DIAS	PLAZO:	45 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PERIODO FACTURADO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	PERIODO FACTURADO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 21 DE DICIEMBRE DE 2020

DATOS ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 1											
ACTA N° DE OBRAS	VALOR TOTAL ACTA DE OBRAS	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADA	ACTA DE INTERVENTORIA N°	% CONTRA INTERVENTORIA INCLUYE IVA	VALOR ACTA DE INTERVENTORIA INCLUYE IVA	VALOR IVA		VALOR TOTAL ACTA ANTES DE IVA	VALOR NETO ACTA	VALOR ACUMULADO	BALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR
						19%	30%				
1	\$ 899.340.895.54	88.99%	1	7.53%	\$ 87.703.190.54	\$ 10.809.753.11	\$ 58.893.437.43	\$ 20.310.957.16	\$ 47.392.233.38	\$ 47.392.233.38	\$ 9.128.295.14
VALOR ANTES DE IVA: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 43/100 CTVS VALOR PRESENTE ACTA: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 54/100 CTVS VALOR A PAGAR: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 38/100 CTVS											

Para constancia de lo anterior se firma en Valledupar a los 21 días del mes de Diciembre de 2020

NOTA:

- El recibo por parte del supervisor, no exime al intervenor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
- Para la aprobación de la presente acta se requiere anexar copia del pago de seguridad social integral y parafiscales del personal relacionado a la propuesta.

Ing. Víctor José López Guirán
REP. LEGAL
CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S


Mayra Pineda Lacouture
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Mayra Pineda Lacouture
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Maytorena Baute Castilla
SUPERVISOR CONTRATO
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Ing. Maytorena Baute Castilla
SUPERVISOR CONTRATO
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Ing. Zenith Fernandez Molina
SUPERVISOR CONTRATO
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISION 01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 956 de 2020

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SINAI SAS. REP.LEGAL VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN. C.C. No 73.137.195

SUPERVISOR: MARIA RAIZA FUENTES LACOUTURE
Secretaria de Obras Públicas Municipal

APOYO SUPERVISIÓN: ING. MAYTTORENA BAUTE CASTILLA

CONTRATISTA: VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN, Representante Legal del Interventor "CONSTRUCCIONES SINAI" (C.C. No. 73.137.195 – NIT. No. 901.036.485-2)

SUPERVISOR: MARIA RAIZA FUENTES LACOUTURE-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SUPERVISOR DE APOYO: ING. MAYTTORENA BAUTE CASTILLA - ZENITH FERNANDEZ MOLINA

VALOR INICIAL: NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$98.130.841,00) M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS.

FECHA ACTA DE INICIACIÓN: Diecisiete (17) del mes de noviembre del año Dos Mil Veinte (2020).

FECHA TERMINACIÓN:


Treinta y un (31) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte.(2020).

De acuerdo con lo contemplado en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato de Interventoría No. 956 de 2020, las actividades relacionadas en el acta se ejecutan bajo las especificaciones técnicas contractuales. los documentos que se exigen para realizar el cobro del acta parcial No 01 de acuerdo a lo estipulado en el contrato y a las actividades contractuales ejecutadas a la fecha, fue entregada a satisfacción de la Interventoría externa contratada por parte del contratista de obras y remitida a la Secretaría de Obras públicas, con su informe mensual para revisión y tramite pertinente.

De acuerdo al informe mensual el cobro del acta parcial, se encuentra por un porcentaje del 68.99%, según el corte a fecha de 21 de Diciembre, y con fecha de informe del 21 de diciembre de la presente anualidad, en el cual se encuentran descritas el desarrollo de actividades, con su respectiva pre acta, con sus documentos anexos memorias, registro fotográfico, revisión de los planes, cronograma de obras del tramo en ejecución, y así mismo certifican el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato, tales como Pago de impuesto departamental, acta de compromiso para descuento de los impuestos municipales, y según planillas anexas y certificado se encuentra a paz y salvo con seguridad social y parafiscales

Tal como lo contempla el Contrato en mención se deja constancia que hizo entrega en medio físico de dichos documentos con su respectiva factura de cobro, cuyos originales reposan en la Secretaria General y hacienda municipal respectivamente, por lo que se puede proceder al pago del Acta parcial 01 del periodo comprendido entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre de 2020, según lo consignado en el acta y factura, o sea la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 38/100 M/CTE (\$47.392.233,38).

Valledupar, 24 de diciembre de 2020


MARIA RAZA FUENTES LACOUTURE
 Secretaria de Obras Publicas Municipal


 P/Ing. MAYTORENA BAUTE CASTILLA
 Supervisora de Apoyo de Obras e Interventoría
 Sec. de Obras Públicas Municipales

P/ZENITH FERNANDEZ MOLINA
 Contratista Supervisora de Apoyo de Obras e Interventoría
 Sec. de Obras Públicas Municipales

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES SINAÍ SAS

INFORME DE INTERVENTORÍA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 956 DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO RÍGIDO PREMEZCLADO MR = 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 2, REPARACIONES DE ANDENES Y BORDILLOS EN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITACIÓN VALLEDUPAR HS

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES SINAÍ S.A.S

SUPERVISOR: ING. MARIA RAIZA FUENTES

VALOR INICIAL: \$ 98.130.841

VALOR ANTICIPO 1: \$ 29.439.252.30

TIEMPO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.

FECHA DE INICIACIÓN: DIESICETE (17) DE NOVIEMBRE DE 2020.

FECHA DE TERMINACION 1: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020

De acuerdo con lo contemplado en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del Contrato de Obras No. 959 de 2020, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (constitución y aprobación de la garantía única del contrato y registro presupuestal), presentación de la cuenta bancaria y constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social, impuesto departamental, impuesto a la sobretasa deportiva para el fomento del deporte y la recreación INDUPAL y parafiscales, documentos que se

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES SINAÍ SAS

exigen para proceder al pago parcial No. 01 del Contrato de Obras 959 de 2020, los cuales fueron entregados en medio físico a satisfacción de la Interventoría; y teniendo en cuenta los controles realizados al contratista por parte de la interventoría se puede afirmar lo siguiente:

1. CONTROL TÉCNICO.

La interventoría hace constar que el contratista ha cumplido a satisfacción la ejecución del contrato teniendo en cuenta las actividades de seguimiento, evaluación, rechazo o aceptación de los procesos constructivos, calidad de los materiales y equipos, cumplimiento de las normas de calidad, ensayos y especificaciones técnicas, programación de obra y ejecución del presupuesto correspondiente al periodo de cobro del acta en trámite.

2. CONTROL ADMINISTRATIVO.

CONTRATO No 959 de 2020				
OBJETO	REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO REGIDO PREMEZCLADO MR=4.2 Mpa Y/O MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPARACIONES EN ANDENES Y BORDILLOS EN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.303.529.091,00			
VALOR ANTICIPO 30%	\$ 391.058.727			
DESCRIPCION	VALOR	AMORTIZACION	NETO A PAGAR	% AVANCE
ANTICIPO	391.058.727,30			
ACTA N° 1	\$ 899.340.895,54	\$ 269.802.268,66	\$ 629.538.626,88	68,99%
TOTALES	\$ 899.340.895,54	\$ 269.802.268,66	\$ 629.538.626,88	68,99%
VALOR A COMPLETAR CONTRATO	\$ 404.188.195,46			
% A COMPLETAR	31,01%			
% AMORTIZACION ANTICIPO	31,01%			
VALOR PENDIENTE ANTICIPO	\$ 121.256.458,64			
VALOR A COMPLETAR CONTRATO MENOS ANTICIPO	\$ 282.931.736,82			

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES SINAÍ SAS

El contratista a la fecha del periodo de cobro de la presente acta ha realizado las afiliaciones del personal a ARL, EPS, AFP, caja de compensación y parafiscales, así como también ha presentado las planillas de pago del personal que laboró en la ejecución de las obras.

Las pólizas de cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, salario y prestaciones sociales, estabilidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual se encuentran vigentes.

El contratista presenta acta parcial de obra No.01, correspondiente al periodo del 17 de noviembre al 21 de diciembre de 2020, con un avance específico del 68,99 % y un avance acumulado del 68,99 %, faltando por ejecutar el 31,01 % del contrato.

El día 24 de noviembre del 2020 se presentó acta modificatoria No.01 al contrato de obra, balanceada con mayores y menores cantidades. Dicha acta no modifica el valor del contrato inicial.

3. CONTROL FINANCIERO.

Que presentado el plan de inversión del anticipo y comparado con el flujo de inversión se constata que existe coherencia con lo programado por el contratista. De otro lado, el contratista ha cumplido con el programa de inversión programado versus lo ejecutado según la programación de obra aprobada por la interventoría y la entidad contratante.

4. CONTROL AMBIENTAL.

Durante las visitas de inspección de obra realizadas por la interventoría en todos los frentes de obra se evidenció que el contratista ha cumplido con el plan de manejo ambiental cubriendo los siguientes aspectos: Manejo de material sobrante y escombros, manejo del suelo, manejo del aire, manejo del agua, manejo de maquinaria y equipos en obra, elementos de protección personal, accidentes de trabajo, señalización y demarcación temporal en obra, manejo de vegetación en obra, manejo de residuos líquidos, combustibles y sustancias líquidas en obra.

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIONES SINAÍ SAS

5. CONTROL LEGAL.

El contratista ha cumplido con las condiciones, procesos y procedimientos contractuales y legales de la obra las cuales son de obligatorio cumplimiento y amparadas dentro del clausulado del contrato.


Teniendo en cuenta todos los controles realizados por la interventoría, esta hace constar que El contratista ha cumplido con la ejecución a satisfacción y con las demás obligaciones derivadas del objeto contractual en el periodo comprendido del 17 de noviembre al 21 de diciembre de 2020.

Por consiguiente, se puede proceder al pago del Acta de Cobro Parcial de Obra No. 01, cuyo valor neto a pagar es la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 88/100 M.N (\$ \$ 629.538.626,88) M/L.

Las ejecuciones de dichas labores se realizaron en el periodo comprendido entre el diecisiete (17) de noviembre al día (21) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).

Para constancia, se firma en Valledupar, Cesar, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre del año Dos Mil veinte (2020).

Cordialmente



VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN

Representante Legal

Construcciones Sinaí s.a.s

ELABORO: EG
C.C. Archivo

0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900366485	2	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CA 48 # 100 - 78	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5841239	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	837092489	9412142671	E		2020/11/23	2020/12/21	BANCO DAVIVIENDA	\$350,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre		Insg	ret	tode	bac	tadp	vap	cor	vet	sin	lgs	una	vac	vctt	lt	vp	Código	Días	Aporte	IBC	Disas	Código	Aporte	IBC	Disas	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes								
1	CC	1065622094	SANCHEZ YESICA																230201	4	\$226,667		4		EP\$016	4	\$226,667		4	CF07	4	\$9,100	\$226,667	\$1,200	4	\$0	\$55,700						
2	CC	1065622094	SANCHEZ YESICA										X						230301	26	\$1,473,333		26		EP\$016	26	\$1,473,333		0	CF07	0	\$0	\$0	\$1,473,333	\$0	0	\$0	\$294,800					
		total																																	\$1,700,000	\$272,100	\$226,667	\$9,100	\$1,700,000	\$1,200	\$0	\$0	\$350,500

OK

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBP	
NIT 9010316485	2	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 48 # 100 - 78	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5841239	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión 2020-10	837092489	9412142671	E	2020/11/23	2020/12/21	BANCO DAVIVIENDA	28		\$350,500

RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	DEBITADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$272,100	\$0	\$272,100		\$272,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$1,200	\$0	\$1,200		\$1,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$9,100	\$0	\$9,100		\$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$68,100	\$0	\$68,100		\$68,100
TOTAL			0		\$350,500	\$0	\$350,500		\$350,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

FACTORS GENERALES DE LA LECTURE

[illegible]

1. CONTRAINDICACION DETALLADA DE ABORTOS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARATISCALES

[illegible][illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 77095071		HERRON MARTINEZ ANIBAL ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 53 No 82	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3106966404	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-11	823793646	941308748	I	2020/12/17	2020/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$872,300	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$423,700	\$0	\$423,700	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$423,700	\$0	\$423,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$64,600	\$0	\$64,600	
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$64,600	\$0	\$64,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$53,000	\$0	\$53,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	1	\$53,000	\$0	\$53,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$331,000	\$0	\$331,000	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$331,000	\$0	\$331,000	
TOTAL					1	\$872,300	\$0	\$872,300	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	Exonerado ICBF
CC 73137195		LOPEZ GALVANI VICTOR JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 6 no 62 50	MONTERIA-CORDOBA	1234567	No	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2020-12	834570085	I	2021/05/16	2020/12/21	5507,400				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
BANCOS DE LA LIQUIDACION (04 APORTES)																		
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400
1	CC 73137195	LOPEZ VICTOR	231001	30	\$1,640,000	\$262,400	EP5003	30	\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400
Total Afiliados(1)					\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400			\$1,640,000	\$262,400

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 73137193		LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 No 62 30	MONTERIA-CORDOBA	122/667		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Pago	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	836570685	9414086875		2021/01/16	2020/12/21	BANCOLOMBIA	0	\$507,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$762,400	\$0	\$0	\$0	\$762,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$762,400	\$0	\$0	\$0	\$762,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$205,000	\$0	\$0	\$0	\$205,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$205,000	\$0	\$0	\$0	\$205,000
TOTAL				1	\$507,400	\$0	\$0	\$0	\$507,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA o ICBF	
CC 73137195		LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 no 62 50	MONTERIA-CORDOBA	1224537	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2020-11	83509897	Planilla	2020/12/23	2020/12/18	BANCOLOMBIA	0	\$507,400		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBIC	Codigo	Dias	Aporte	IBIC	Codigo	Dias	Aporte	IBIC	Codigo	Dias	Aporte	IBIC	Codigo	Dias	Aporte	IBIC	Aporte				
SUCURSAL DE MONTERIA (C. CORDOBA)				\$8,640,000				\$1,640,000				\$0				\$0				\$0				\$0			
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$1,640,000				\$1,640,000				\$0				\$40,000				\$0				\$0			
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)				\$1,640,000				\$1,640,000				\$0				\$40,000				\$0				\$0			
1	CC 73137195	LOPEZ VICTOR	21001	30	\$1,640,000	\$1,640,000	EPS003	30	\$262,400	\$262,400	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$40,000	\$40,000	0	0	\$0	\$0	\$0				
Total Afiliados(1)				\$1,640,000				\$1,640,000				\$0				\$40,000				\$0				\$0			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 73137195		LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cta 6 no 62 50	MONTERIA-CORDOBA	1234567	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor				
2020-11	835509877	9413633993	2020/12/23	2020/12/18	BANCOLOMBIA				
					0				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIV	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,400	\$0	\$0	\$262,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$262,400	\$0	\$0	\$262,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
TOTAL				1	\$507,400	\$0	\$0	\$507,400	

Pustaka Kesenian

0

PROPERTY	12401
ADDRESS	
CITY	
STATE	
ZIP	
OWNER	
DATE	
TIME	
REMARKS	



RAZON SOCIAL :	PEDRO MANUEL SEVERICHE VERGARA
IDENTIFICACION:	CC-92559872
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-20
FECHA DE PAGO:	2020-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2020-12
NUMERO PLANILLA:	8610834046
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8610834046
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 3.740.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 467.500	\$ 467.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 3.740.000	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 635.800	\$ 635.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.740.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.600	\$ 19.600
Total a pagar					\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 1.122.900	\$ 1.122.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2021
----------------------------------	------------



SOAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.039.284-2
Calle 3 No. 8-07 Pto 2
Valledupar - Cesar
Tel: +57 (5) 5836275 Cel: +57 318 828 0075
gerencia@soalingenieria.com

PESO UNITARIO EN EL TERRENO
METODO DEL CONO DE ARENA
NOTAS DE ENSAYO
RMV 5-363
EQUIVALENTES: ASTM D 1556, AASHTO T191

Versión 1

Vigencia

16-ene-17

Pag 1 de 1

NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S.	DESCRIPCIÓN DE MUESTRA:	SUBBASE GRANULAR
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	CRA SC #39-92 PARAMO	COLOR:	HABANO OSCURO
PROYECTO:	REPARCHEO AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR DE CALLE 21 A GLORIETA HERNANDO DE SANTANA	LOCALIZACIÓN:	AGREGADOS DEL CESAR
TOMA DE MUESTRA:	RESP: SOAL INGENIERIA S.A.S FECHA: 16/12/2020		
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	16/12/2020	APIQUE:	PROF (m):
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO:	16/12/2020	ID MUESTRA:	CSSAS_2020.01

ABSCISADO		CALLE 21 ENTRE 7A-15	CRA 19 CON CALLE 10 - 18			
Capa		1	1	1		
Ubicación	Puntos	CENTRO	CENTRO	CENTRO		
Peso frasco +cono+arena inicial	g	6850	6845	6835		
Peso frasco +cono+arena final	g	3372	3761	3350		
Peso total arena usada	g	3478	3084	3485		
Constante del cono	g	1554.1	1554.1	1554.1		
Peso arena en el hueco	g	1923.9	1529.9	1930.9		
Densidad de la arena	g/cm ³	1.4	1.4	1.4		
Volumen del hueco	cm ³	1374.2	1092.8	1379.2		
Peso del material extraído húmedo	g	3012	2468	2999		
Humedad	%	7.90%	5.80%	5.90%		
Peso material extraído seco	g	2791.5	2332.7	2823.4		
Densidad seca	g/cm ³	2.03	2.13	2.05		
Densidad seca	lb/ft ³	126.8	133.2	127.7		
Densidad máxima en el laboratorio	lb/ft ³	134.10	134.10	134.10		
Compactación terreno	%	94.5	99.3	95.3		

Promedio de Compactación del Tramo

96.37

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE UN TRAMO

CAPA		ESPECIFICACION	% De
TERRAPLEN	CIMENTO	Dm $\geq$ 0,98 De	90
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
	NUCLEO	Dm $\geq$ 0,98 De	90
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
	CORONA	Dm $\geq$ 0,95 De	90
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
SUB RASANTE		Dm $\geq$ 0,95 De	95
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
AFIRMADO		Dm $\geq$ 0,95 De	95
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
SUB BASE GRANULAR		Dm $\geq$ 0,95 De	95
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
BASE GRANULAR		Dm $\geq$ De	100
		Di $\geq$ 0,98 Dm	

Dm = Densidad Media, De = Densidad de Referencia, Di = Densidad Individual.

- Los Informes de Laboratorio sin firma original del Director Técnico y sello del Laboratorio ("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen validez.
- Los Resultados contenidos en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos.
- Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
- El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso incorrecto de los Resultados.

OBSERVACIONES

Elaborado y aprobado por:

Nombre: Ing. Jeffrey Caseres Varela

Carga: Ing. Civil supervisor laboratorio

FIN DEL INFORME



SOAL INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901.039.254-2
CALLE 3 No. 8-07 Int 2
Valledupar - Cesar
Tel: +57 (5) 5322775 Cel: +57 318 828 0075
genindia@soalingenieria.com

PESO UNITARIO EN EL TERRENO
MÉTODO DEL CONO DE ARENA
NORMAS DE ENSAYO
INSTR-163
EQUIVALENTES: ASTM D 1556, AASHTO T191

Versión 1

Vigencia

16-ene-17

Pag 1 de 1

NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S.	DESCRIPCIÓN DE MUESTRA:	SUBBASE GRANULAR
DIRECCIÓN DEL CUENTE:	CRA 5C #39-92 PARAMO	COLOR:	HABANO OSCURO
PROYECTO:	REPARCHEO AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR DE CALLE 21 A GLORIETA HERNANDO DE SANTANA	LOCALIZACIÓN:	AGREGADOS DEL CESAR
TOMA DE MUESTRA:	RESP: SOAL INGENIERIA S.A.S. FECHA: 16/12/2020		
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	16/12/2020	APIQUE:	PROF (m):
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO:	16/12/2020	ID MUESTRA:	CSSAS_2020.01

ABSCISADO		CALLE 21 ENTRE 7A-15	CRA 19 CON CALLE 10 - 18			
Capa		1	1	1		
Ubicación	Punto	CENTRO	CENTRO	CENTRO		
Peso frasco +cono+arena inicial	g	6850	6845	6835		
Peso frasco +cono+arena final	g	3372	3761	3350		
Peso total arena usada	g	3478	3084	3485		
Constante del cono	g	1554.1	1554.1	1554.1		
Peso arena en el hueco	g	1923.9	1529.9	1930.9		
Densidad de la arena	g/cm ³	1.4	1.4	1.4		
Volumen del hueco	cm ³	1374.2	1092.8	1379.2		
Peso del material extraído húmedo	g	3012	2468	3990		
Humedad	%	7.90%	5.80%	5.90%		
Peso material extraído seco	g	2791.5	2332.7	2823.4		
Densidad seca	g/cm ³	2.02	2.13	2.05		
Densidad seca	lb/ft ³	126.8	133.2	127.7		
Densidad máxima en el laboratorio	lb/ft ³	134.10	134.10	134.10		
Compactación terreno	%	94.5	99.3	95.3		

Promedio de Compactación del Tramo

96.37

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE UN TRAMO

CAPA		ESPECIFICACION	% De
TERRAPLEN	CIMIENTO	Dm $\geq$ 0,89 De	60
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
	NUCLEO	Dm $\geq$ 0,80 De	80
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
	CORONA	Dm $\geq$ 0,65 De	90
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
SUB RASANTE		Dm $\geq$ 0,85 Dg	85
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
AFIRMADO		Dm $\geq$ 0,95 Dc	95
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
SUB BASE GRANULAR		Dm $\geq$ 0,95 Dc	95
		Di $\geq$ 0,98 Dm	
BASE GRANULAR		Dm $\geq$ Dc	100
		Di $\geq$ 0,98 Dm	

Dm = Densidad Media, De = Densidad de Referencia, Di = Densidad Individual

- Los Informes de Laboratorio sin firmas originales del Director Técnico y sello del Laboratorio ("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen Validez.
- Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos.
- Este Informe expresa fidedignamente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
- El Laboratorio que lo emite no es responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso incorrecto de los Resultados.

OBSERVACIONES

Elaborado y aprobado por:

Nombre: Ing. Jeffrey Casares Varela

Cargo: Ing. Civil supervisor laboratorio

FIN DEL INFORME

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 73137195		LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 no 62 50	MONTERIA-CORDOBA	1234567	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-11	2020-11	835809897	9413633993	1	2020/12/23	2020/12/18	BANCOLOMBIA	0	\$507,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$262,400	\$0	\$0	\$262,400
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$262,400	\$0	\$0	\$262,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000
SANTITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000
TOTAL					1	\$507,400	\$0	\$0	\$507,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 73137195		LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 no 62 50	MONTERIA-CORDOBA	1234567	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2020-12	2020-12	836570685	1	2021/01/16	2020/12/21	BANCOLOMBIA	0	\$507,400	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,400	\$0	\$0	\$262,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$262,400	\$0	\$0	\$262,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
TOTAL				1	\$507,400	\$0	\$0	\$507,400	


 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 1 de 41

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 956 de 2020

PERIODO: Del 17 de noviembre al 30 de noviembre de 2020



CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO REHABILITACION VALLEDUPAR HS

INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI

construsinainterventoria@gmail.com
construsinainterventoria@gmail.com
 Barranquilla-Atlántico

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 2 de 41

1. OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Interventor:	CONSTRUCCIONES SINA S.A.S
Supervisión:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Contrato interventoría No:	956 DE 2020
Representante Legal interventoría:	VICTOR LOPEZ GALVAN
Contratista de obra:	CONSORCIO REHABITACION VALLEDUPAR HS
Valor del Contrato:	\$ 98.130.841.00
Valor del Anticipo 30%:	\$ 29.439.252,30
Fecha de terminación inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	No aplica
Valor del Contrato + Adicional:	No aplica

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 3 de 41

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Adición valor del anticipo:	No aplica
Plazo de ejecución inicial:	45 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de suspensión:	No aplica
Fecha de reinicio:	No aplica
Total, días transcurridos de suspensión	No aplica
Fecha de Prorroga:	No aplica
Adición plazo:	No aplica
Plazo de ejecución modificado:	No aplica
Fecha de terminación actualizada:	No aplica
Fecha de Corte del Informe:	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Días Transcurridos:	13 DIAS
INFORMACION FINANCIERA CONTRATO OBRA	
Acta parcial 1	
Acta parcial 2	
Acumulado	No aplica
Anticipo	
Anticipo desembolsado:	
Fecha de desembolso	
Amortización Acta parcial 1	
Amortización Acta parcial 2	
Pendiente por amortizar	

construsinainterventoria@gmail.com
construsinainterventoria@gmail.com
 Barranquilla-Atlántico

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 4 de 41

1.1.1.1 GARANTIA UNICA

POLIZAS DE GARANTIA DE INTERVENTORIA

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	COMPAÑIA CONFIANZA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$9.813.084,10
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$29.439.252,30
PAGO DE SALARIOS		M-100126939	04/11/2020	19/12/2023	\$ 4.906.542,05
PRESTACIONES SOCIALES					
CALIDAD DE SERVICIO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$9.813.084,10

1.1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO

Este es un proyecto que busca mejorar la movilidad en varios puntos neurálgicos de la ciudad para el desarrollo socioeconómico y que desde mucho tiempo habían sido olvidados pero que son de vital importancia y oxigenan el tráfico de manera considerable.


Los puntos a intervenir serán clasificados según el grado de afectación que tenga cada uno y el nivel del flujo del tráfico de dichas zonas, con el fin de abarcar la mayoría de los puntos que impiden una movilidad en la ciudad de manera más fluida y con el mínimo riesgo para los habitantes de Valledupar.

1.1.2 ALCANCE

1.1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Geográficamente el Municipio de Valledupar Está ubicado al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guarapera, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente y la serranía del Perijá al oriente. Más exactamente a **10° 29' de latitud Norte y 73° 15' de longitud Oeste**. Limitada al **Norte** con los departamentos de Magdalena y la Guajira; al **Este** con la Guajira y los municipios de San Diego y la Paz; al **Sur** con los municipios de San Diego, La Paz y el Paso y por el **Oeste** con el Magdalena y los municipios de Buscanea y el Copey.

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 5 de 41

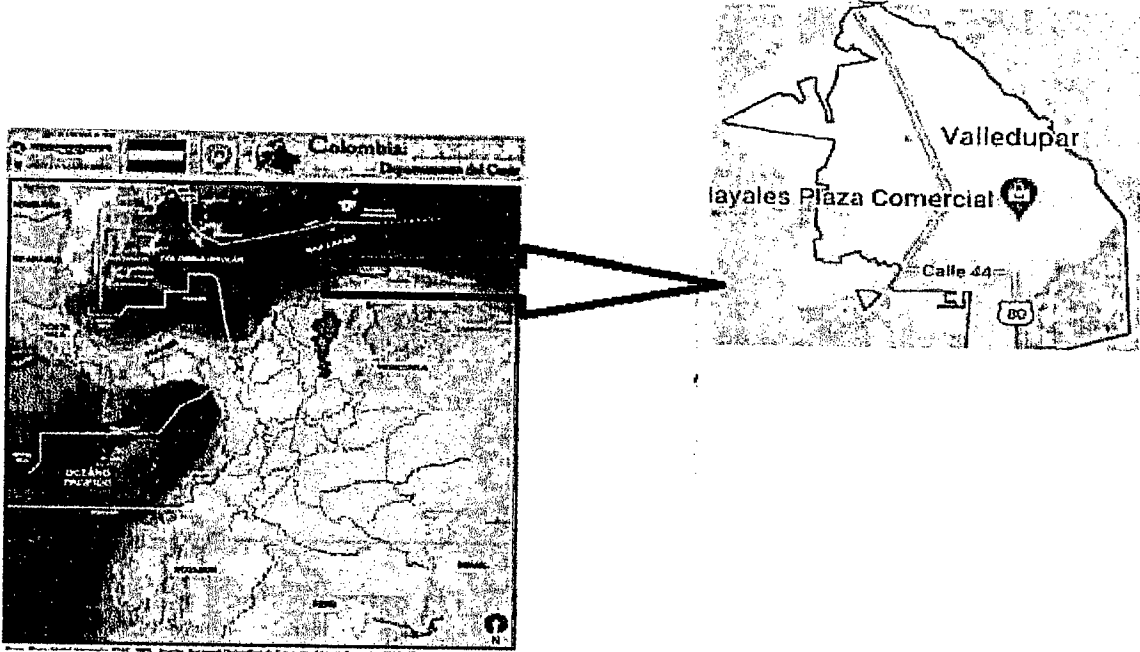

Fuente: google mapas

1.2 INFORME TECNICO

AVANCE DE OBRA

PERIODO DE CORTE; 17 de noviembre al 30 de noviembre de 2020.

FECHA DE CORTE: 30 NOV 2020

SEMANAS	Programado	Ejecutado	% PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	(Miles de pesos)	(Miles de pesos)		
	\$ 0,00	\$ 0,00		
1 SEMANA	\$ 82.123.623,5	\$ 47.469.258,22	6,30%	3,64%
2 SEMANA	\$ 185.801.564,7	\$ 118.673.145,54	14,25%	9,10%
3 SEMANA	\$ 308.427.340,6		23,66%	0,00%
4 SEMANA	\$ 595.901.375,7		45,71%	0,00%
5 SEMANA	\$ 882.676.319,1		67,71%	0,00%
6 SEMANA	\$ 1.186.430.283,2		91,02%	0,00%


7 SEMANA	\$ 1.303.529.091,0		100,00%	0,00%
TOTAL	\$ 1.303.529.091,0			0,00%
AVANCE:			9,10%	

MEDICION DE AVANCE:

De acuerdo a la programación presentada por el contratista se presenta un retraso de 5,15 %, para lo cual se le exige que pueda busque las estrategias y recursos humanos y económicos para mejorar el rendimiento y subsanar dicho retraso.

Por otra parte, la interventoría le ha exigido las dos cuadrillas restantes como compromiso realizado por el contratista en el momento de su propuesta.

Se exige la apertura de los frentes para la construcción de los demás componentes del proyecto, como es la construcción de pavimentos rígido con las dos o más cuadrillas faltantes.

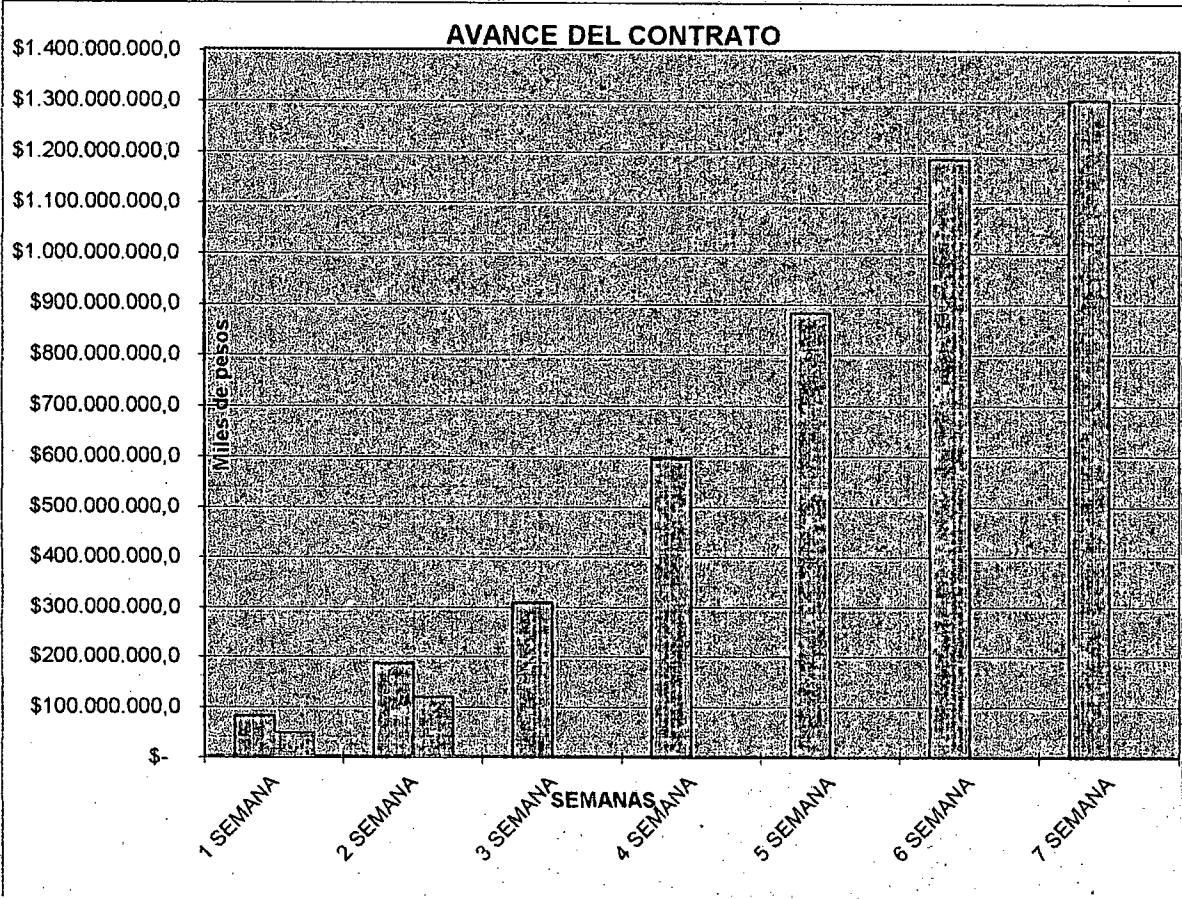

1.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este periodo del informe se realizaron varias actividades, las cuales se realizaron de manera similar en cada punto intervenido, tales como:

1. Se realizó inicialmente la señalización de los frentes a intervenir en la avenida simón bolívar.
2. Se realizó localización y replanteo en cada punto de afectación critica entre todas las partes en el frente de pavimento en asfalto en la avenida simón bolívar
3. Se realizaron las demarcaciones con pintura de los puntos escogidos.
4. Se inició con la demolición con minicaragador los puntos a intervenir, y posteriormente retirar de la zona el material demolido.
5. Se hizo la conformación de las cajas o puntos intervenidos, para la limpieza de material.
6. Se realizó la colocación y extendida de material de súbbase en las cajas.
7. Se realizó la compactación con equipo Benito en la súbbase extendida.
8. Se realizó trabajos de limpieza de material fino de súbbase con bomba de aire para retirarlos y así realizar la imprimación con la emulsión asfáltica.
9. Se realizó la imprimación con emulsión asfáltica CL-0
10. Se realizó la extendida de asfalto MDC-2 en las cajas a intervenir y su respectiva compactación con equipo de Benito mecánico, para el sello y compactación hasta el punto de dar los acabados finales

CANTIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO:

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	9,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	18,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	12,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	4,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	28,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	15,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	7,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	14,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	1,50

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 8 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	6,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	4,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	5,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	24,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	20,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	43,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	10,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	29,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	42,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	21,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	37,47
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	20,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	18,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	3,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	4,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	21,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	8,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	2,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	1,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	27,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	25,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	4,81
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	2,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	50,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	13,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	8,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	5,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	5,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	2,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	5,78

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	23,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	4,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	38,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	14,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	6,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	1,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	3,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	23,99

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 9 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	25,29
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	4,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	9,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	13,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	44,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	4,24
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	18,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	2,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	18,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	12,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	4,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	4,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	10,54
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	2,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	7,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	5,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	9,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	2,13
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	20,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	3,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	12,99
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	5,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	3,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	17,01
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	12,13
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	3,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	3,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	2,86
TOTAL				1005,69

En total fueron 1005,69 m2 ejecutados por el contratista.

DEMARCAACION EN PINTURA AREA A INTERVENIR						
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO					
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	2	2	12,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	2	2	18,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	2	2	15,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	2	2	8,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	2	2	21,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2	2	6,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	2	2	18,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	2	2	4,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	2	2	11,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	2	2	6,40

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	2	2	16,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	2	2	5,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	2	2	10,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	2	2	8,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	2	2	10,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	2	2	34,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	2	2	20,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	2	2	30,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	2	2	13,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	2	2	27,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	2	2	27,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	2	2	19,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	2	2	24,66
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	2	2	20,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	2	2	18,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	2	2	7,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	2	2	11,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	2	2	19,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	2	2	15,54
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	2	2	6,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	2	2	5,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	2	2	29,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	2	2	20,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	2	2	10,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	2	2	8,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	2	2	36,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	2	2	22,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	2	2	12,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	2	2	3,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	2	2	9,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	2	2	11,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	2	2	4,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	2	2	6,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	2	2	10,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	2	2	20,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	2	2	8,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	2	2	28,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	2	2	16,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	2	2	11,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	2	2	6,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	2	2	4,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	2	2	7,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	2	2	20,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	2	2	22,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	2	2	8,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	2	2	16,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	2	2	14,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	2	2	32,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	2	2	9,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	2	2	27,80

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		Página 11 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	2	2	7,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	2	2	17,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	2	2	16,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	2	2	8,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	2	2	4,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	2	2	8,08
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	2	2	17,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	2	2	6,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	2	2	11,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	2	2	9,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	2	2	12,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	2	2	5,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	2	2	18,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	2	2	7,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	2	2	14,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	2	2	10,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	2	2	8,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	2	2	21,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	2	2	14,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	2	2	8,08
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	2	2	7,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	2	2	7,00
TOTAL						1162,26

En total fueron 1162,26 m2 ejecutados por el contratista.

CORTE CALZADA EN CONCRETO						
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO					
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	1	1	6,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	1	1	9,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	1	2	13,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	1	2	6,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	1	2	15,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	1	2	4,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	1	2	11,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1	2	3,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	1	2	7,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	1	2	4,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	1	2	10,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	1	2	3,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	1	2	7,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	1	2	6,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	1	2	6,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	1	2	18,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	1	2	13,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	1	2	19,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	1	2	10,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	1	2	25,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	1	2	18,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	1	2	13,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	1	2	17,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	1	2	13,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	1	2	12,10

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES Sinaí	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
		 VALLEDUPAR EN ORDEN Página 12 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	1	2	5,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	1	2	6,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	1	2	13,09
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	1	2	9,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	1	2	5,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	1	2	4,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	1	2	27,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	1	2	14,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	1	2	6,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	1	2	7,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	1	2	33,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	1	2	21,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	1	2	8,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	1	2	3,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	1	2	6,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	1	2	6,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1	2	3,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	1	2	5,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	1	2	8,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	1	2	13,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	1	2	6,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	1	2	17,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	1	2	10,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	1	2	7,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	1	2	5,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	1	2	3,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	1	2	5,78
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	1	2	13,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	1	2	14,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	1	2	6,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	1	2	14,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	1	2	10,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	1	2	29,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	1	2	6,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	1	2	15,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	1	2	4,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	1	2	12,49
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	1	2	10,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	1	2	6,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1	2	3,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	1	2	5,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	1	2	10,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	1	2	4,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	1	2	9,22
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	1	2	6,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	1	2	9,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	1	2	4,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	1	2	14,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	1	2	5,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	1	2	10,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	1	2	8,66
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	1	2	7,00

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		
			Página 13 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	1	2	19,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	1	2	12,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	1	2	6,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	1	2	5,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	1	2	4,80
TOTAL						839,51

En total fueron 839,51 ml ejecutados por el contratista.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO MANUAL						
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO					
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	0,1		0,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	0,1		1,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	0,1		1,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	0,1		0,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	0,1		2,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1		0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	0,1		1,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1		0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	0,1		0,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	0,1		0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	0,1		1,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	0,1		0,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	0,1		0,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	0,1		0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	0,1		0,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	0,1		2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,1		2,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	0,1		4,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	0,1		1,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	0,1		2,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	0,1		4,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	0,1		2,11
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	0,1		3,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,1		2,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	0,1		1,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	0,1		0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	0,1		0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	0,1		2,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	0,1		0,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	0,1		0,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	0,1		0,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	0,1		2,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	0,1		2,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	0,1		0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	0,1		0,22
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	0,1		5,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	0,1		1,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	0,1		0,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,1		0,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	0,1		0,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	0,1		0,57

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
		 VALLEDUPAR EN ORDEN
		Página 14 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	0,1	0,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	0,1	2,39
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	0,1	0,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	0,1	3,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	0,1	1,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	0,1	0,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	0,1	0,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	0,1	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	0,1	2,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	0,1	0,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	0,1	0,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	0,1	1,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	0,1	4,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	0,1	0,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	0,1	1,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	0,1	0,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	0,1	1,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	0,1	1,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	0,1	0,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	0,1	0,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	0,1	0,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	0,1	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	0,1	0,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	0,1	2,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	0,1	1,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	0,1	0,59
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	0,1	0,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	0,1	1,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	0,1	0,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	0,1	0,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	0,1	0,29
TOTAL					100,57

En total fueron 100,57 m3 ejecutados por el contratista.

SEÑALES DE TRANSITO MOVIL			
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO		
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO		
TERMINAL A ENTRDA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2	2,00
TOTAL		2	2,00
			4,00

En total fueron 4 unds ejecutados por el contratista.

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
		 VALLEDUPAR EN ORDEN
		Página 15 de 41

VALLAS MÓVILES DE INFORMACIÓN COMUNIDAD			
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO		
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2	2,00
TOTAL			4,00

En total fueron 4 unds ejecutados por el contratista.

RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	0,15	1,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	0,15	2,77
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	0,15	1,93
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	0,15	0,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	0,15	4,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,15	0,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	0,15	2,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,15	0,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	0,15	1,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	0,15	0,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	0,15	2,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	0,15	0,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	0,15	0,96
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	0,15	0,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	0,15	0,78
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	0,15	3,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,15	3,08
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	0,15	6,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	0,15	1,54
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	0,15	4,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	0,15	6,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	0,15	3,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	0,15	5,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,15	3,08
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	0,15	2,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	0,15	0,54
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	0,15	0,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	0,15	3,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	0,15	1,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	0,15	0,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	0,15	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	0,15	4,13
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	0,15	3,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	0,15	0,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	0,15	0,32
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	0,15	7,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	0,15	1,99

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		
			Página 16 de 41

AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	0,15	1,33
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,15	0,08
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	0,15	0,79
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	0,15	0,86
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,15	0,15
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	0,15	0,39
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	0,15	0,87
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	0,15	3,59
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	0,15	0,66
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	0,15	5,77
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	0,15	2,16
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	0,15	0,92
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	0,15	0,36
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	0,15	0,22
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	0,15	0,54
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	0,15	3,60
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	0,15	3,79
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	0,15	0,62
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	0,15	1,46
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	0,15	2,08
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	0,15	6,66
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	0,15	0,64
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	0,15	2,79
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	0,15	0,41
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	0,15	2,79
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	0,15	1,89
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	0,15	0,60
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,15	0,15
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	0,15	0,61
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	0,15	1,58
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	0,15	0,41
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	0,15	1,13
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	0,15	0,85
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	0,15	1,50
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	0,15	0,32
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	0,15	3,10
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	0,15	0,54
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	0,15	1,95
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	0,15	0,89
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	0,15	0,56
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	0,15	2,55
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	0,15	1,82
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	0,15	0,51
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	0,15	0,55
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	0,15	0,43
TOTAL					150,85

En total fueron 150,85 m3 ejecutados por el contratista.

construsinainterventoria@gmail.com
construsinainterventoria@gmail.com
 Barranquilla-Atlantico

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 17 de 41

EXCAVACION MANUAL					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	0,05	0,45
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	0,1	1,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	0,1	1,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	0,1	0,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	0,1	2,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	0,1	1,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	0,1	0,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	0,1	1,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	0,08	0,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	0,1	0,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	0,1	0,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	0,1	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,1	2,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	0,1	4,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	0,1	1,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	0,1	2,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	0,1	4,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	0,1	2,11
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	0,1	3,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,08	1,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	0,1	1,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	0,1	2,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	0,08	0,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	0,1	0,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	0,1	0,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	0,1	2,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	0,1	2,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	0,1	0,22
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	0,1	5,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	0,1	1,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	0,1	0,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,08	0,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	0,1	0,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	0,1	0,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	0,1	0,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	0,08	1,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	0,1	0,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	0,1	3,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	0,05	0,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	0,1	0,62

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	0,1	0,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	0,08	0,29
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	0,08	1,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	0,1	2,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	0,1	0,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	0,1	0,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	0,1	1,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	0,08	3,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	0,08	0,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	0,1	1,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	0,1	0,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	0,1	1,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	0,08	0,32
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	0,1	1,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	0,1	0,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	0,1	0,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	0,05	0,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	0,1	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	0,1	0,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	0,1	2,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	0,05	0,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	0,1	0,59
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	0,1	0,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	0,1	1,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	0,05	0,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	0,05	0,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	0,05	0,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	0,1	0,29
TOTAL					94,80

En total fueron 94,80 m3 ejecutados por el contratista.

CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA CALZADA EXISTENTE CARRETERAS				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	9,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	18,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	12,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	4,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	28,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	15,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	7,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	14,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	1,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	6,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	4,75

 CONSTRUCCIONES Sinaí	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 19 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	5,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	24,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	20,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	43,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	10,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	29,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	42,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	21,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	37,47
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	20,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	18,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	3,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	4,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	21,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	8,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	2,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	1,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	27,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	25,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	4,81
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	2,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	50,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	13,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	8,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	5,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	5,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	2,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	5,78
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	23,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	4,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	38,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	14,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	6,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	1,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	3,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	23,99
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	25,29
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	4,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	9,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	13,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	44,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	4,24
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	18,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	2,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	18,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	12,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	4,00

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		
			Página 20 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	4,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	10,54
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	2,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	7,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	5,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	9,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	2,13
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	20,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	3,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	12,99
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	5,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	3,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	17,01
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	12,13
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	3,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	3,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	2,86
TOTAL				1005,69

En total fueron 1005,69 m2 ejecutados por el contratista.

RELLENO GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	0,05	0,45
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	0,1	1,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	0,1	1,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	0,1	0,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	0,1	2,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	0,1	1,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	0,1	0,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	0,1	1,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	0,08	0,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	0,1	0,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	0,1	0,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	0,1	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,1	2,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	0,1	4,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	0,1	1,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	0,1	2,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	0,1	4,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	0,1	2,11
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	0,1	3,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,08	1,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	0,1	1,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	0,1	2,14

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		
			Página 21 de 41

AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	0,08	0,69
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	0,1	0,28
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	0,1	0,17
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	0,1	2,75
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	0,1	2,57
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	0,1	0,48
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	0,1	0,22
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	0,1	5,07
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	0,1	1,33
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	0,1	0,88
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,08	0,04
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	0,1	0,53
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	0,1	0,57
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	0,1	0,26
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	0,1	0,58
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	0,08	1,92
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	0,1	0,44
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	0,1	3,85
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	0,05	0,72
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	0,1	0,62
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	0,1	0,14
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	0,08	0,29
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	0,08	1,92
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	0,1	2,53
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	0,1	0,41
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	0,1	0,98
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	0,1	1,38
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	0,08	3,55
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	0,08	0,34
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	0,1	1,86
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	0,1	0,28
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	0,1	1,86
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	0,1	1,26
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	0,1	0,40
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	0,08	0,32
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	0,1	1,05
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	0,1	0,27
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	0,1	0,75
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	0,05	0,28
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	0,1	1,00
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	0,1	0,21
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	0,1	2,07
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	0,1	0,36
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	0,05	0,65
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	0,1	0,59
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	0,1	0,37
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	0,1	1,70
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	0,05	0,61
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	0,05	0,17
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	0,05	0,18
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	0,1	0,29
TOTAL					94,80

En total fueron 94,82 m3 ejecutados por el contratista.

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	 Valledupar EN ORDEN
		Página 22 de 41

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO Y RIEGO)				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	9,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	18,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	12,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	4,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	28,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	15,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	7,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	14,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	1,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	6,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	4,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	5,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	24,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	20,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	43,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	10,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	29,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	42,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	21,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	37,47
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	20,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	18,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	3,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	4,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	21,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	8,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	2,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	1,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	27,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	25,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	4,81
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	2,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	50,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	13,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	8,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,56

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 23 de 41

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	5,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	5,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	2,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	5,78
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	23,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	4,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	38,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	14,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	6,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	1,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	3,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	23,99
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	25,29
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	4,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	9,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	13,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	44,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	4,24
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	18,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	2,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	18,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	12,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	4,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	4,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	10,54
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	2,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	7,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	5,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	9,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	2,13
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	20,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	3,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	12,99
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	5,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	3,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	17,01
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	12,13
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	3,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	3,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	2,86
TOTAL				1005,69

En total fueron 1005,69 m2 ejecutados por el contratista.

construsinainterventoria@gmail.com

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	 Página 24 de 41

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	3,6	0,1	0,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,93	6,3	0,1	1,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	5,35	0,1	1,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,40	0,1	0,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,16	4,65	0,1	2,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,3	2,15	0,1	1,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,10	0,1	0,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,70	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,23	2,80	0,1	1,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,5	1,00	0,1	0,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,9	2,20	0,1	0,64
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	2,50	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,40	0,1	0,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	15,5	1,55	0,1	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,1	2,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,5	3,80	0,1	4,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,10	0,1	1,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	11,30	0,1	2,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,8	4,85	0,1	4,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,4	3,30	0,1	2,11
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,9	5,43	0,1	3,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	2,70	0,1	2,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,90	0,1	1,83
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,88	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,05	0,80	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,75	3,17	0,1	2,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,44	1,33	0,1	0,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,95	0,1	0,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,94	1,85	0,1	0,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	12,50	0,1	2,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,50	3,95	0,1	2,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	1,30	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,6	3,60	0,1	0,22
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,38	15,00	0,1	5,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	10,05	0,1	1,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	2,01	0,1	0,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,43	1,30	0,1	0,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,40	2,20	0,1	0,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,2	1,36	0,1	0,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,45	1,79	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,40	0,1	0,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	3,80	0,1	2,39
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,1	2,10	0,1	0,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	10,4	3,70	0,1	3,85

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,4	2,67	0,1	1,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,4	1,40	0,1	0,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,20	1,20	0,1	0,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,84	1,97	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,70	3,58	0,1	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,03	3,15	0,1	2,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,06	2,00	0,1	0,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,50	6,50	0,1	0,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,07	3,40	0,1	1,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,4	13,05	0,1	4,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,85	1,10	0,1	0,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,4	1,50	0,1	1,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	1,10	0,1	0,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,89	3,80	0,1	1,86
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,3	2,00	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	2,00	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1	1,00	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,84	0,1	0,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,53	1,40	0,1	1,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	1,50	0,1	0,27
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,12	3,55	0,1	0,75
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	2,10	0,1	0,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,2	3,12	0,1	1,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,48	1,44	0,1	0,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,9	5,30	0,1	2,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	1,57	0,1	0,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,82	3,40	0,1	1,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	3,48	0,1	0,59
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,3	2,85	0,1	0,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,9	8,95	0,1	1,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,5	4,85	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,2	2,84	0,1	0,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,8	2,05	0,1	0,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,2	1,30	0,1	0,29
TOTAL					100,57

En total fueron 100,57 m3 ejecutados por el contratista.

1.2.2 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

La calidad de los materiales que se han usado son de buena calidad y el contratista ha presentado las diferentes fichas técnicas en informes anteriores.

1.2.2.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo el contratista presento los ensayos realizados a los materiales de súbase y asfalto utilizados en las obras.

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	 Página 26 de 41

De acuerdo a lo presentado se evaluó y se concluyó que los materiales utilizados cumplen con la norma y son aptos para la construcción de pavimentos flexible y rígidos.
Se anexa copia de resultados de ensayos.

1.2.3 CLIMATOLOGIA

 CONSTRUCCIONES SINAI	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S																								 VALLEDUPAR EN ORDEN							
	PROYECTO:REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE																															
	TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR																															
CONTRATO N°	956 DE 2020				CONTRATANTE				MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				SECTOR	VALLEDUPAR				MES	30/ 11/ 20													
CLIMA																																
DIA	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO		S																S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S	
LLUVIAS																																
LLUVIAS MODERADAS																										LL	M					
S: SECO LL:LLUVIAS M: LLUVIAS MODERADAS																																

1.3 INFORME ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	SEMANA 5		
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable 	X		
El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		
El contratista presenta oportunamente	X		

las planillas de pago de salarios de todo el personal.			
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		

1.3.1.1 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

RELACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL, CONFORMACION DE BRIGADA Y SEÑALIZACION EN OBRA:

No.	ELEMENTO	TIPO	UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION
1	EXTINGUIDO R	SI	SI	NO	NO
2	CARTELERA INFORMATIVA	SI	SI	SI	NO
3	BRIGADAS TELEFONOS	NO	NO	NO	NO
3	PORTA CARNETS	NO	NO	NO	NO

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
<i>Dotación completa</i>	X			
<i>Buen estado</i>	X			
<i>Uso según zona de trabajo</i>	X			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
<i>Dotación completa</i>	X			
<i>Buen estado</i>	X			
<i>Fácil acceso y operación</i>	X			
<i>Uso según zona de trabajo</i>	X			
<i>Existencia de elementos primero auxilios</i>	X			
MAQUINARIA - EQUIPO				
<i>Estado del equipo</i>	X			

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 28 de 41

Regularidad del mantenimiento		X		
Vibraciones /Ruidos	x			
Protecciones / Guardas / Frenos	x			
Idoneidad operarios	x			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN				
Uso permanente	x			
Uso según zona de trabajo	x			
elementos de bioseguridad	X			
VIGILANCIA				
Personal suficiente	X			
Diurna	N.A			
Nocturna	N.A			
CENTRO DE ATENCION INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia	x			
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	x			

GESTION HSE

INDICADORES HSE			
Total, de HHTT PERIODO:	0	Total, HHTT acumuladas:	0
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el periodo:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo del periodo:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
NO SE PRESENTO ACCIDENTE DURANTE ESTE PERIODO			

1.1.1.1 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		Página 29 de 41

SEÑALIZACIÓN									
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	1	Capacitación Personal	X			X			
	2	Demarcación del perímetro	X			X			
	3	Zonificación de la obra	X						
	4	Lona de Cerramiento	X		X		X		
	5	Cinta de Reflectaba	X			X			
	6	Señales Informativas y preventivas	X			X			
	7	Uso de Paleteros	X				X		
	8	Iluminación Nocturna	X				X		

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	Capacitación del Personal	X			X			
	2	Mantenimiento Preventivo	X				X		
	3	Definición de Horarios de trabajo	X			X			
	4	Ficha de control de actividades	X			X			
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X				X		
	6	Elementos de protección personal	X			X			
	7	Extintores	X			X			
	8	Medidas de Contingencia	X			X			

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS									
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	1	Capacitación del Personal	X			X			
	2	Mantenimiento Preventivo	X			X			
	3	Definición de Horarios de trabajo	X			X			
	4	Ficha de control de actividades	X			X			
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X			X			
	6	Elementos de protección personal	X			X			
	7	Extintores	X			X			
	8	Medidas de Contingencia	X						
	12	Volumen de tierra (m3)				NP			

1.4 ADMINISTRACION

construsinainterventoria@gmail.com

CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

1.4.1.1 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN ESTE PERIODO SEMANAL

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos que se utilizaron:

 CONSTRUCCIONES SINAI	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S.															 VALLEDUPAR EN ORDEN
	PROYECTO: REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR															
CONTRATO No:	956 DE 2020		CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				SECTOR:	VALLEDUPAR		FECHA:	30	11	20	
												MES:	NOVIEMBRE			
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA																
DIA	CANTIDAD	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
minicargador	1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
vibrocompactor		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
cortadora		A	A	A	A	R	A	A	A	A	R	A	A	A		
		A: ACTIVO		I: INACTIVO		R: REPARACION										

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Página 31 de 41

1.4.2.1 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

RELACION DE ACTAS Y COMITES			
1	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
1	ACTA MODIFICATORIA No 1	24 DE NOVIEMBRE DE 2020	SE REALIZO MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES EN EL PRESUPUESTO INICIAL POR EL AUMENTO DE CANTIDADES DE ASFALTO EN LAS ZONAS A INTERVENIR. SE HIZO LA MODIFICACION PARA TENER UN BALANCE CON EL MISMO VALOR DEL PRESUPUESTO INICIAL.
2	COMITÉ DE OBRA No 1	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	<ul style="list-style-type: none"> - SE EXIGIO AL CONTRATISTA PROGRAMACION DE OBRA, PMT, LAS 4 CUADRILLAS EN OBRA - REVISION DE LAS ZONAS A INTERVENIR -

1.4.2.2 COPIA DE LA BITACORA

Se coloca a disposición copia de la bitácora de obras de este periodo laboral, se anexan las respectivas copias a continuación:

construsinainterventoria@gmail.com
construsinainterventoria@gmail.com
 Barranquilla - Atlántico


 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR <small>EN ORDEN</small>
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 17 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
		Página 32 de 41

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Después de la información contenida anteriormente en el informe se puede decir:

1. Existe un retraso de un 5,15%, se puede observar que en este periodo el avance está por debajo de las programaciones de ejecución de obras propuesto por el contratista en su reprogramación.
2. El contratista no cuenta con el total de las cuadrillas propuestas en el proyecto, por lo cual se exige que se ponga al día con las mismas y aumentar así el rendimiento
3. Se le recomienda al contratista un buen mantenimiento de los equipos en obras, puesto que algunas veces se han retrasados las actividades por daños en los mismo.
4. El contratista debe iniciar lo más pronto posible en la construcción de pavimento rígido para acarrear atrasos en su programación.
5. Mejorar el sistema de señalización en los frentes que se intervengan.

Aprobación del Informe:

Elaboró:		Aprobó:	
 EDWIN GARRIDO LUNA INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA		 VICTOR LOPEZ DIRECTOR DE OBRA	
DE			


 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 1 de 64

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 956 de 2020

PERIODO: Del 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020



CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO REHABILITACION VALLEDUPAR HS

INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI

construsinaainterventoria@gmail.com
construsinaainterventoria@gmail.com
Barranquilla Atlántico

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 2 de 64

1. OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Interventor:	CONSTRUCCIONES SINA S.A.S
Supervisión:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Contrato interventoría No:	956 DE 2020
Representante Legal interventoría:	VICTOR LOPEZ GALVAN
Contratista de obra:	CONSORCIO REHABIITACION VALLEDUPAR HS
Valor del Contrato:	\$ 98.130.841.00
Valor del Anticipo 30%:	\$ 29.439.252,30
Fecha de terminación inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	No aplica
Valor del Contrato + Adicional:	No aplica

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 3 de 64

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Adición valor del anticipo:	No aplica
Plazo de ejecución inicial:	45 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de suspensión:	No aplica
Fecha de reinicio:	No aplica
Total, días transcurridos de suspensión	No aplica
Fecha de Prorroga:	No aplica
Adición plazo:	No aplica
Plazo de ejecución modificado:	No aplica
Fecha de terminación actualizada:	No aplica
Fecha de Corte del Informe:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Días Transcurridos:	13 DIAS
INFORMACION FINANCIERA CONTRATO OBRA	
Acta parcial 1	
Acta parcial 2	
Acumulado	No aplica
Anticipo	
Anticipo desembolsado:	
Fecha de desembolso	
Amortización Acta parcial 1	
Amortización Acta parcial 2	
Pendiente por amortizar	

1.1.1.1 GARANTIA UNICA

POLIZAS DE GARANTIA DE INTERVENTORIA

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	COMPAÑIA CONFIANZA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$9.813.084,10
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$29.439.252,30
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		M-100126939	04/11/2020	19/12/2023	\$ 4.906.542,05
CALIDAD DE SERVICIO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$9.813.084,10

construsinaiinterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 4 de 64

1.1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO


Este es un proyecto que busca mejorar la movilidad en varios puntos neurálgicos de la ciudad para el desarrollo socioeconómico y que desde mucho tiempo habían sido olvidados pero que son de vital importancia y oxigenan el tráfico de manera considerable.

Los puntos a intervenir serán clasificados según el grado de afectación que tenga cada uno y el nivel del flujo del tráfico de dichas zonas, con el fin de abarcar la mayoría de los puntos que impiden una movilidad en la ciudad de manera más fluida y con el mínimo riesgo para los habitantes de Valledupar.


1.1.2 ALCANCE

1.1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Geográficamente el Municipio de Valledupar Está ubicado al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guarapera, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente y la serranía del Perijá al oriente. Más exactamente a **10° 29' de latitud Norte y 73° 15' de longitud Oeste**. Limitada al **Norte** con los departamentos de Magdalena y la Guajira; al **Este** con la Guajira y los municipios de San Diego y la Paz; al **Sur** con los municipios de San Diego, La Paz y el Paso y por el **Oeste** con el Magdalena y los municipios de Buscanea y el Copey.

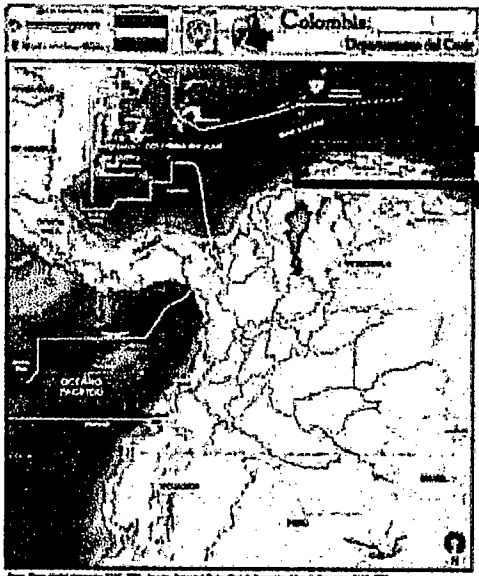

Fuente: google mapas

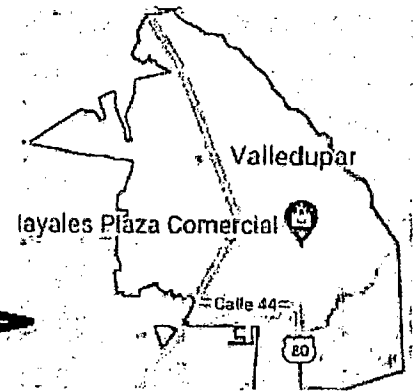

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 5 de 64

1.2 INFORME TECNICO

AVANCE DE OBRA

PERIODO DE CORTE: 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE CORTE: 15 DIC 2020


SEMANAS	Acumulado	Acumulado	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	(Miles de pesos)	(Miles de pesos)		
	\$ 0,00	\$ 0,00		
1 SEMANA	\$ 82.123.623,5	\$ 47.469.258,22	6,30%	3,64%
2 SEMANA	\$ 185.801.564,7	\$ 118.673.145,54	14,25%	9,10%
3 SEMANA	\$ 308.427.340,6	\$ 234.566.920,68	23,66%	17,99%
4 SEMANA	\$ 595.901.375,7	\$ 781.889.735,60	45,71%	59,98%
5 SEMANA	\$ 882.676.319,1		67,71%	0,00%
6 SEMANA	\$ 1.186.430.283,2		91,02%	0,00%
7 SEMANA	\$ 1.303.529.091,0		100,00%	0,00%
TOTAL	\$ 1.303.529.091,0			0,00%
AVANCE:			59,98%	

MEDICION DE AVANCE:

De acuerdo a la programación presentada por el contratista se presenta un adelanto de 14,27%, por lo cual se recomienda que se continúe con dicho ritmo para terminar con las obras en el plazo estipulado.

Es importante anotar que no se debe reducir el número de cuadrillas de trabajos en los diferentes frentes, con el fin de continuar con el buen desarrollo que se tiene hasta el este periodo.

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	 VALLEDUPAR EN ORDEN Página 6 de 64

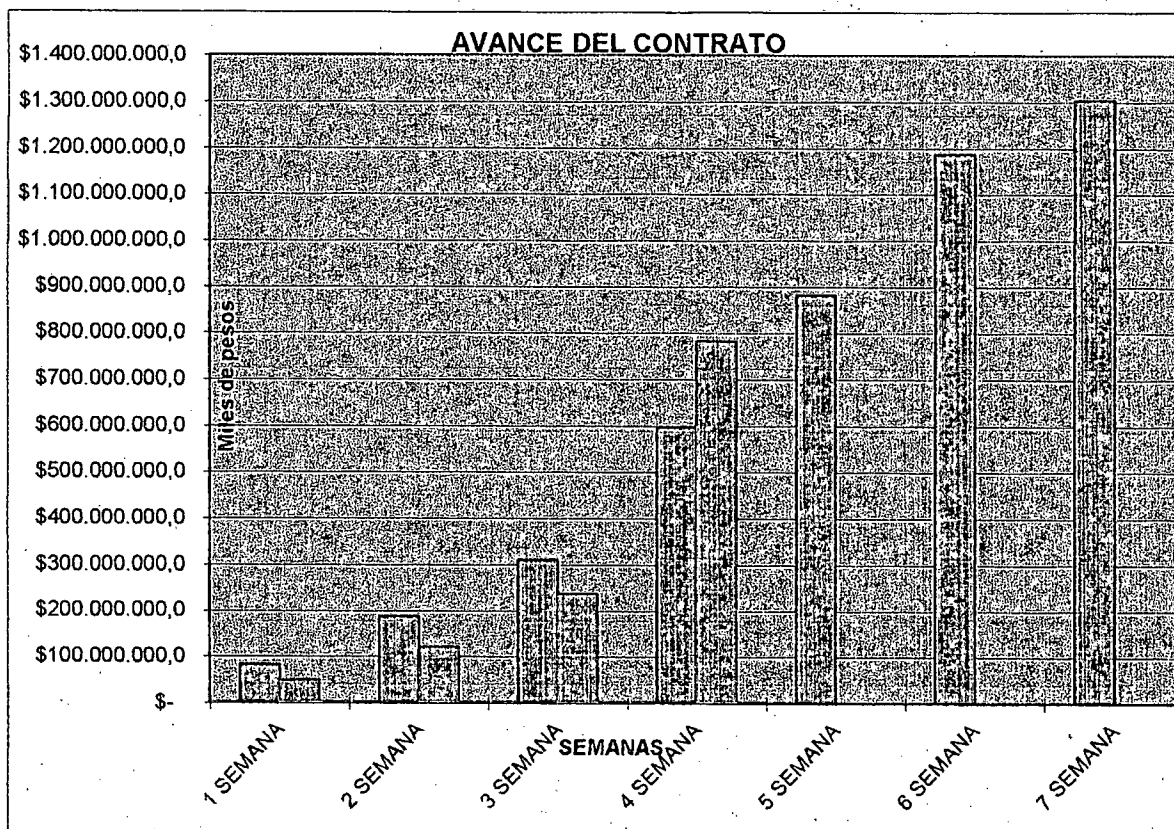

1.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este periodo del informe se realizaron varias actividades, las cuales se realizaron de manera similar en cada punto intervenido, tales como:

1. Se realizó inicialmente la señalización de los frentes a intervenir en la avenida simón bolívar.
2. Se realizó localización y replanteo en cada punto de afectación critica entre todas las partes en el frente de pavimento en asfalto en la avenida simón bolívar
3. Se realizaron las demarcaciones con pintura de los puntos escogidos.
4. Se inició con la demolición con minicaragador los puntos a intervenir, y posteriormente retirar de la zona el material demolido.
5. Se hizo la conformación de las cajas o puntos intervenidos, para la limpieza de material.
6. Se realizó la colocación y extendida de material de subbase en las cajas.

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 7 de 64

7. Se realizó la compactación con equipo Benitin en la súbbase extendida.
8. Se realizó trabajos de limpieza de material fino de súbbase con bomba de aire para retirarlos y así realizar la imprimación con la emulsión asfáltica.
9. Se realizó la imprimación con emulsión asfáltica CL-0
10. Se realizó la extendida de asfalto MDC-2 en las cajas a intervenir y su respectiva compactación con equipo de Benito mecánico, para el sello y compactación hasta el punto de dar los acabados finales
11. Se realizaron obras de construcción de pavimento rígido en los frentes de la carrera 4, avenida salguero con calle 39.
12. Se realizaron conformación y relleno con subbase en la construcción de pavimento rígido.

CANTIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO:

UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	88,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	4,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	4,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	15,03
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	1,49
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	18,62
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	4,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	2,40
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	39,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	6,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	59,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	8,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	7,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	2,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	5,06
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	6,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	39,55
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	39,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	4,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	26,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	17,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	8,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	21,19
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	13,02

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 8 de 64

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	36,75
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	3,84
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	24,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	6,93
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	37,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,97
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	27,37
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	25,25
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	34,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	27,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	3,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	6,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	11,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	92,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	12,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	10,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	10,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	35,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	14,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	3,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	1,77
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	53,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	2,51
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	34,30
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	30,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	28,50
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	13,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	28,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	17,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	23,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	53,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	4,59
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	21,74
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	53,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	4,59
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	10,50
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	41,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	19,36
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	23,02
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	11,20

construsinainterventoria@gmail.com

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 9 de 64

CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	6,99
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	17,72
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	20,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	28,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	12,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	4,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	21,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	12,63
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	8,45
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	11,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	21,32
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	7,84
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	7,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	2,95
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	0,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	100,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56	71,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	28,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	12,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	4,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	21,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	12,63
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	10,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	24,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	33,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	33,73
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	21,12
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	46,61
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	1,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	6,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	27,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	11,78
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	24,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	7,02
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	54,49
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	5,56
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	12,08
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	14,00
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	20,70
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	29,94

construsinainterventoria@gmail.com

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 10 de 64

CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3,52	3,00	10,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	8,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	35,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	18,71
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	9,15
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	9,70
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	2,06
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	11,77
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	5,50
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	44,53
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	7,77
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	27,50
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	14,41
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	4,60	46,46
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	17,65
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	1,46	5,00	7,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	8,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	35,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	18,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	26,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	12,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	24,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	11,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	17,19
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	23,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	49,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	26,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	4,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	2,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	39,27
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	23,36
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	10,56
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	33,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	12,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	3,84
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	20,91
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	19,78

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 11 de 64

AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	2,88
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	20,46
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	37,62
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	24,89
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	6,03
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	20,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	40,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	32,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	18,06
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	0,78
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	1,42	5,68
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	16,60
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	9,24
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	15,15
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	5,22
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	16,03
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	16,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	3,04
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	16,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	5,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	8,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	15,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	4,06
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	1,28
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	2,41
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	12,03
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,20	10,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	49,26
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	6,14
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	55,18
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	7,94
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	15,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	20,54
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	27,69
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	14,54
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	18,30
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	25,76
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	13,13
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	16,14

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	 Página 12 de 64

CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	9,60
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRETERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	7,94
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	20,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	40,60
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	16,24
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	11,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	35,20
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	6,50
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	9,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	7,65
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	8,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	10,01
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,8	3,20	21,76
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	3,84
TOTAL				3842,37

En total fueron 3842,37 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

DEMARCAACION EN PINTURA AREA A INTERVENIR						
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO					
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	2	2	58,32
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	2	2	8,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	2	2	9,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	2	2	21,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	2	2	4,92
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	2	2	17,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	2	2	9,60
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	2	2	6,40
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	2	2	30,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	2	2	11,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	2	2	30,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	2	2	12,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	2	2	11,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	2	2	6,84
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	2	2	9,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	2	2	11,28
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	2	2	31,06
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	2	2	30,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2	2	6,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	2	2	9,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	2	2	22,20

construsinaainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	2	2	16,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	2	2	12,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	2	2	22,46
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	2	2	25,30
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	2	2	28,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	2	2	8,80
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	2	2	21,38
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	2	2	14,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	2	2	26,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	2	2	5,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	2	2	27,84
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	2	2	21,10
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	2	2	25,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	2	2	27,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	2	2	7,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	2	2	11,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	2	2	14,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	2	2	46,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	2	2	13,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	2	2	14,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	2	2	13,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	2	2	24,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	2	2	15,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	2	2	7,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	2	2	5,32
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	2	2	36,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	2	2	6,46
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	2	2	26,60
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	2	2	26,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	2	2	22,70
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	2	2	14,64
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	2	2	23,14
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	2	2	16,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	2	2	23,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	2	2	36,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	2	2	8,94
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	1,00	1	11,75
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	1,00	1	18,18
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	1,00	1	4,47
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	1,00	1	6,50
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	1,00	1	15,38
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	1,00	1	9,01
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	1,00	1	10,06
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	1,00	1	6,71
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	1,00	1	5,36

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
			Página 14 de 64

CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	2,00	2	17,10
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	1,00	1	9,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	1,00	1	11,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	1,00	1	8,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	1,00	1	4,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	1,00	1	10,43
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	1,00	1	9,74
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	1,00	1	6,08
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	1,00	1	7,66
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	1,00	1	10,80
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	1,00	1	5,96
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	1,00	1	5,91
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	1,00	1	3,45
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	1,00	1	1,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	1,00	1	29,01
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56	1,00	1	23,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	1,00	1	11,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	1,00	1	8,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	1,00	1	4,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	1,00	1	10,43
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	1,00	1	9,74
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	1,00	1	6,50
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	1,00	1	11,13
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	1,00	1	12,40
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	1,00	1	12,40
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	1,00	1	9,27
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	1,00	1	15,75
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	2,00	2	7,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	2,00	2	10,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	2,00	2	21,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	2,00	2	14,08
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	2,00	2	21,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	2,00	2	10,70
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	2,00	2	38,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	2,00	2	10,20
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	2,00	2	14,02
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	2,00	2	15,60
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	2,00	2	19,80
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	2,00	2	25,96
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3,52	3,00	2,00	2	13,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	2,00	2	12,32
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	2,00	2	34,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00	2	6,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	2,00	2	21,30
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	2,00	2	12,10
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	2,00	2	12,46
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	2,00	2	9,56
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	2,00	2	15,10

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
			Página 15 de 64

CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	2,00	2	12,20
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	2,00	2	26,80
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	2,00	2	11,60
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	2,00	2	21,00
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	2,00	2	15,30
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	4,60	2,00	2	29,40
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	2,00	2	17,06
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	1,46	5,00	2,00	2	12,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	1,00	1	6,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	1,00	1	17,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	1,00	1	3,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	1,00	1	10,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	1,00	1	10,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	1,00	1	7,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	1,00	1	10,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	2,00	2	16,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	2,00	2	17,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	2,00	2	20,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	2,00	2	36,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	2,00	2	20,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	2,00	2	8,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	2,00	2	6,80
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	2,00	2	30,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	2,00	2	21,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	2,00	2	16,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	2,00	2	27,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	2,00	2	26,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	2,00	2	15,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	2,00	2	8,80
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	2,00	2	19,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	2,00	2	17,84
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	2,00	2	6,80
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	2,00	2	29,50
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	2,00	2	27,40
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	2,00	2	20,70
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	1,00	1	5,37
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	1,00	1	9,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	1,00	1	14,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	1,00	1	12,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	1,00	1	8,50
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	1,00	1	1,96
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	1,42	1,00	1	5,42
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	1,00	1	8,33
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	1,00	1	6,08
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	1,00	1	8,03
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	1,00	1	5,01
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	4,78	3,06	1,00	1	7,84
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	1,00	1	8,21
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	1,00	1	8,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	1,00	1	4,20

CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	2,00	2	16,56
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	2,00	2	15,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	2,00	2	13,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	2,00	2	16,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	2,00	2	9,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	2,00	2	4,70
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	2,00	2	8,62
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	2,00	2	13,90
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,20	2,00	2	12,90
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	2,00	2	36,96
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	2,00	2	10,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	2,00	2	52,96
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	2,00	2	11,38
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	2,00	2	18,10
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	1,00	1	9,62
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	1,00	1	11,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	1,00	1	7,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	1,00	1	8,92
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	1,00	1	12,65
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	1,00	1	7,28
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	1,00	1	8,04
CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	1,00	1	7,60
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRETERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	1,00	1	5,65
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	1,00	1	9,02
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	2	2	28,12
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	2	2	16,12
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	2	2	13,40
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	2	2	28,40
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	2	2	11,32
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	2	2	15,68
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	2	2	12,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	2	2	11,20
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	2	2	11,40
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	1,00	1	6,73
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	1,00	1	7,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	1,00	1	7,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	1,00	1	7,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	1,00	1	9,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	1,00	1	13,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	1,00	1	4,50
TOTAL						3018,45

En total fueron 3018,45 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

CORTE CALZADA EN CONCRETO						
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO					
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	1	2	32,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	1	2	7,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	1	2	6,00

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI					
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020					Página 17 de 64

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	2,00	2	21,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	2,00	2	4,92
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	2,00	2	17,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	2,00	2	9,60
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	2,00	2	6,40
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	2,00	2	30,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	1	2	10,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	2,00	1	23,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	1	2	8,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	2,00	1	9,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	2,00	1	5,67
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	2,00	2	9,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	2,00	2	11,28
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	2,00	1	18,74
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	2,00	1	27,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2,00	1	4,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	2,00	1	7,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	2,00	1	18,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	2,00	1	12,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	2,00	1	8,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	2,00	1	13,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	2,00	1	24,17
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	2,00	2	28,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	2,00	2	8,80
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	2,00	2	21,38
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	2,00	2	14,62
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	2,00	2	26,98
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	2,00	2	5,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	2,00	2	27,84
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67		1	3,67
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	1,00		3,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	2,00	2	27,84
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	2,00	2	7,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	2,00	2	11,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	2,00	2	14,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	2,00	2	46,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	2,00	2	13,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	2,00	2	14,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	2,00	2	13,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	2,00	2	24,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	2,00	2	15,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	2,00	2	7,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	2,00	2	5,32
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	2,00	2	36,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	2,00	2	6,46
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	1,00	1	13,30
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	1,00	1	13,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	1,00	1	11,35
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	1,00	1	7,32
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	1,00	1	11,57

construsinaainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI					
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020					Página 18 de 64

CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	1,00	1	8,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	1,00	1	11,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	1,00	1	18,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	1,00	1	4,47
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	1,00	1	11,75
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	1,00	1	18,18
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	1,00	1	4,47
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	1,00	1	6,50
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	1,00	1	15,38
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	1,00		3,54
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	1,00		3,52
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	1,00		3,60
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	1,00		2,24
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	2,00		10,04
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	1,00		4,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	1,00	1	11,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	1,00	1	8,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	1,00	1	4,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	1,00	1	10,43
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	1,00	1	9,74
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	1,00	1	6,08
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	1,00	1	7,66
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60		1	2,60
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00		1	4,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91		1	3,91
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90		1	1,90
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72		1	0,72
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01		1	4,01
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56		1	3,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54		1	3,54
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80		1	6,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	1,00	1	4,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	1,00	1	10,43
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	1,00		8,20
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	1,00		2,97
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	1,00		3,03
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	1,00		8,35
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	1,00		8,37
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	1,00		5,24
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	1,00		11,80
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	1,00	1,00	3,85
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	1,00	1,00	5,47
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	1,00	1,00	10,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	1,00	1,00	7,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	1,00	1,00	10,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	1,00	1,00	5,35
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	1,00	1,00	19,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	1,00	1,00	5,10
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	1,00	1,00	7,01
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	1,00	1,00	7,80

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI				
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020				
					 Página 19 de 64

CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	1,00	1,00	9,90
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	1,00	1,00	12,98
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3,52	3,00	1,00	1,00	6,52
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	2,00	1,00	10,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	1,00	2,00	31,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00	1,00	5,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	1,00	2,00	12,87
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	1,00	1,00	6,05
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	1,00	1,00	6,23
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	1,00	1,00	4,78
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	1,00	1,00	7,55
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	1,00	1,00	6,10
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	1,00	1,00	13,40
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	1,00	1,00	5,80
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	1,00	1,00	10,50
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	1,00	1,00	7,65
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	4,60	1,00	1,00	14,70
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	1,00	1,00	8,53
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	1,46	5,00	1,00	1,00	6,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	1,00	1,00	6,16
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	1,00	1,00	17,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	1,00	1,00	3,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	1,00	1,00	10,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	1,00	1,00	10,35
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	1,00	1,00	7,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	1,00	1,00	10,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	1,00	1,00	8,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	1,00	1,00	8,75
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	1,00	1,00	10,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	1,00	1,00	18,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	1,00	1,00	10,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	1,00	1,00	4,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	1,00	1,00	3,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	1,00	1,00	15,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	1,00	1,00	10,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	1,00	1,00	8,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	1,00	1,00	13,65
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	1,00	1,00	13,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	1,00	1,00	7,65
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	1,00	1,00	4,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	1,00	1,00	9,55
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	1,00	1,00	8,92
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	1,00	1,00	3,40
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	1,00	1,00	14,75
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	1,00	1,00	13,70
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	1,00	1,00	10,35
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	1,00	1,00	5,37
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	1,00	1,00	9,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	1,00	1,00	14,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	1,00	1,00	12,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	1,00	1,00	8,50
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	1,00	1,00	1,96
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	1,42	1,00	1,00	5,42

CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	1,00	1,00	8,33
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	1,00	1,00	6,08
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	1,00	1,00	8,03
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	1,00	1,00	5,01
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	4,78	3,06	1,00	1,00	7,84
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	1,00	1,00	8,21
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	1,00	1,00	8,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	1,00	1,00	4,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	1,00	1,00	8,28
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	1,00	1,00	7,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	1,00	1,00	6,80
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	1,00	1,00	8,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	1,00	1,00	4,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	1,00	1,00	2,35
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	1,00	1,00	4,31
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	1,00	1,00	6,95
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,25	3,20	1,00	1,00	6,45
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	1,00	1,00	18,48
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	1,00	1,00	5,16
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	1,00	1,00	26,48
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	1,00	1,00	5,69
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	1,00	1,00	9,05
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	1,00	1,00	9,62
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	1,00	1,00	11,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	1,00	1,00	7,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	1,00	1,00	8,92
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	1,00	1,00	12,65
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	1,00	1,00	7,28
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	1,00	1,00	8,04
CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	1,00	1,00	7,60
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	1,00	1,00	5,65
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	1,00	1,00	9,02
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	1,00	1,00	14,06
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	1,00	1,00	8,06
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	1,00	1,00	6,70
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	1,00	1,00	14,20
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	1,00	1,00	5,66
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	1,00	1,00	7,84
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	1,00	1,00	6,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	1,00	1,00	5,60
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	1,00	1,00	5,70
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	1,00	1,00	6,73
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	1,00	1,00	7,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	1,00	1,00	7,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	1,00	1,00	7,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	1,00	1,00	9,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	1,00	1,00	13,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	1,00	1,00	4,50
TOTAL						2049,36

En total fueron 2049,38 ml ejecutados por el contratista en este periodo.

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 21 de 64

DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO $e=0,15$ y $0,20$ m.				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	25,25
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	34,57
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	34,30
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	30,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	28,50
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	13,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	28,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	17,15
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	21,74
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	53,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	4,59
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	10,50
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	41,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	19,36
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	23,02
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	11,20
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	6,99
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	17,72
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	20,72
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	8,45
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	11,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	21,32
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	7,84
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	7,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	2,95
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	0,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	100,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56	71,20
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	10,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	24,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	33,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	33,73
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	21,12
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	46,61
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	1,23
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	54,49
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	5,56
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	12,08
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	14,00
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	20,70

construsinaointerventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 22 de 64

CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	9,15
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	9,70
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	2,06
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	11,77
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	5,50
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	44,53
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	7,77
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	27,50
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	14,41
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	4,60	46,46
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	17,65
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	1,46	5,00	7,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	23,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	49,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	26,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	4,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	2,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	39,27
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	23,36
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	10,56
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	33,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	12,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	3,84
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	20,91
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	19,78
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	2,88
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	20,46
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	37,62
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	24,89
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	6,03
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	20,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	40,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	32,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	18,06
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	0,78
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	1,42	5,68
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	16,60
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	9,24
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	15,15
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	5,22
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	16,03
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	16,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	3,04
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	16,40

construsinaainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 23 de 64

CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	5,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	8,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	15,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	4,06
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	1,28
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	2,41
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	12,03
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,20	10,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	49,26
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	6,14
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	55,18
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	7,94
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	25,76
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	13,13
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	16,14
CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	9,60
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRETERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	7,94
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	20,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	40,60
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	16,24
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	11,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	35,20
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	6,50
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	9,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	7,65
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	8,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	10,01
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	19,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	4,16
TOTAL				2334,07

En total fueron 2334,07 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO MANUAL					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	0,1	8,89
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	0,1	0,45
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	0,1	0,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	0,1	1,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	0,1	0,15
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	0,1	1,86

construsinaointerventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
			Página 24 de 64

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	0,1	0,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	0,1	0,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	0,1	5,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	0,1	0,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	0,1	0,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	0,1	0,26
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	0,1	0,51
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	0,1	0,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	0,1	3,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	0,1	0,49
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	0,1	2,66
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	0,1	1,73
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	0,1	0,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	0,1	2,12
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	0,1	1,30
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	0,1	3,68
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	0,1	0,38
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	0,1	2,46
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	0,1	0,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	0,1	3,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	0,1	0,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	0,1	0,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	0,1	1,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	0,1	9,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	0,1	1,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	0,1	1,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	0,1	3,59
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	0,1	1,43
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	0,1	0,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	0,1	0,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	0,1	0,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	0,1	2,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	0,1	0,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
			Página 25 de 64

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	0,1	0,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	0,1	2,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	0,1	1,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	0,1	2,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	0,1	0,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,1	0,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,1	3,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,1	0,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,1	3,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	0,1	2,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	0,1	2,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	0,1	1,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	0,1	1,72
TOTAL					140,98

En total fueron 140,98 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

SEÑALES DE TRANSITO MOVIL			
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO		
FRENTE RIGIDO	ASFALTO	2	2,00
FRENTE RIGIDO	ASFALTO	2	2,00
TOTAL			4,00

En total fueron 4 unds ejecutados por el contratista en este periodo.

VALLAS MOVILES DE INFORMACION COMUNIDAD			
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO		
FRENTE RIGIDO	RIGIDO	2	2,00
FRENTE RIGIDO	RIGIDO	2	2,00
TOTAL			4,00

En total fueron 4 unds ejecutados por el contratista en este periodo.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	0,15	13,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	0,15	0,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	0,15	0,68
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	0,15	2,25
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	0,15	0,22
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	0,15	2,79

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI			
				
CONSTRUCCIONES SINAI	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020			
	Página 26 de 64			

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	0,15	0,74
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	0,15	0,36
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,15	5,86
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	0,15	1,00
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	0,15	8,88
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	0,15	1,32
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	0,15	1,05
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	0,15	0,39
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	0,15	0,76
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	0,15	1,04
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	0,15	5,93
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,15	5,86
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,15	0,38
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	0,15	0,74
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	0,15	3,99
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	0,15	2,59
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	0,15	1,20
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	0,15	3,18
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	0,15	1,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	0,15	5,51
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	0,15	0,58
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	0,15	3,69
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	0,15	1,04
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	0,15	5,64
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,15	0,14
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,15	4,11
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	0,20	5,05
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	0,20	6,91
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,15	4,11
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	0,15	0,50
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	0,15	0,94
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	0,15	1,68
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	0,15	13,80
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	0,15	1,81
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	0,15	1,54
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	0,15	1,61
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	0,15	5,38
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	0,15	2,15
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	0,15	0,50
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	0,15	0,27
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,15	8,04
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	0,15	0,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	0,20	6,86
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	0,20	6,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	0,20	5,70
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	0,20	2,68
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	0,20	5,65
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	0,20	3,43
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	0,15	3,56
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,15	8,04
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	0,15	0,69

construsinaointerventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
		Página 27 de 64	

CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	0,15	3,26
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	0,15	8,04
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	0,15	0,69
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	0,15	1,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	0,15	6,24
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	0,15	2,90
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	0,15	3,45
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	0,15	1,68
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	0,15	1,05
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	0,15	2,66
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	0,15	3,11
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,15	4,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,15	1,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,15	0,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,15	3,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,15	1,89
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	0,15	1,27
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	0,15	1,73
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	0,15	3,20
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	0,15	1,18
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	0,15	1,17
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	0,15	0,44
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	0,15	0,07
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	0,15	15,04
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56	0,15	10,68
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,15	4,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,15	1,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,15	0,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,15	3,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,15	1,89
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	0,15	1,57
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	0,15	3,68
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	0,15	5,07
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	0,15	5,06
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	0,15	3,17
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	0,15	6,99
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	0,15	0,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	0,15	0,91
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	0,15	4,14
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	0,15	1,77
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	0,15	3,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	0,15	1,05
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	0,15	8,17
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	0,15	0,83
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	0,15	1,81
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	0,15	2,10
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	0,15	3,11
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	0,15	4,49
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3,52	3,00	0,15	1,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,15	1,31

construsinaainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 28 de 64

AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,15	5,29
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,15	0,30
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,15	2,81
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	0,15	1,37
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	0,15	1,45
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	0,15	0,31
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	0,15	1,77
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	0,15	0,83
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	0,15	6,68
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	0,15	1,17
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	0,15	4,13
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	0,15	2,16
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	4,60	0,15	6,97
CARRERA 11 CON AVENDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	0,15	2,65
CARRERA 11 CON AVENDA SALGUERO	RIGIDO	1,46	5,00	0,15	1,10
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,1	0,87
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,1	3,53
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	0,1	2,67
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	0,15	1,89
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	0,15	3,62
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	0,15	1,73
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	0,15	2,58
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	0,15	3,47
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	0,15	7,43
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	0,15	3,98
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	0,15	0,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	0,15	0,36
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	0,15	5,89
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	0,15	3,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	0,15	1,58
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	0,15	5,02
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	0,15	4,80
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	0,15	1,89
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	0,15	0,58
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	0,15	3,14
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	0,15	2,97
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	0,15	0,43
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	0,15	3,07
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	0,15	5,64
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	0,15	3,73
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	0,15	0,90
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	0,15	3,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	0,15	6,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	0,15	4,80
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	0,15	2,71
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	0,15	0,12
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	1,42	0,15	0,85
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	0,15	2,49
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	0,15	1,39
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	0,15	2,27

CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	0,15	0,78
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	4,78	3,06	0,15	2,19
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	0,15	2,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	0,15	2,45
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	0,15	0,46
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	0,15	2,46
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	0,15	0,82
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	0,15	1,25
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	0,15	2,33
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	0,15	0,61
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	0,15	0,19
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	0,15	0,36
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	0,15	1,80
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,20	0,15	1,56
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	0,15	7,39
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	0,15	0,92
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	0,15	8,28
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	0,15	1,19
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	0,15	2,27
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	0,15	3,08
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	0,15	4,15
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	0,15	2,18
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	0,15	2,75
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	0,15	3,86
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	0,15	1,97
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	0,15	2,42
CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	0,15	1,44
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	0,15	1,19
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	0,15	3,02
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	0,15	6,09
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	0,15	2,44
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	0,15	1,67
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	0,15	5,28
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	0,15	0,97
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	0,15	2,19
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	0,15	1,35
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	0,15	1,15
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	0,15	1,20
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	0,15	1,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	0,15	1,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	0,15	1,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	0,15	1,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	0,15	2,88
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	0,15	4,80
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	0,15	0,62
TOTAL					582,02

En total fueron 582,02 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

EXCAVACION MANUAL					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	0,1	8,89
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	0,1	0,45
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	0,1	0,45

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
		 VALLEDUPAR EN ORDEN
		Página 30 de 64

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	0,1	1,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	0,1	0,15
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	0,1	1,86
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	0,1	0,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	0,08	0,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	0,1	5,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	0,1	0,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	0,1	0,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	0,08	0,21
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	0,1	0,51
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	0,1	0,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	0,1	3,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	0,1	0,49
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	0,1	2,66
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	0,08	1,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	0,1	0,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	0,1	2,12
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	0,1	1,30
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	0,1	3,68
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	0,1	0,38
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	0,1	2,46
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	0,1	0,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	0,1	3,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	0,08	2,02
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	0,1	3,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	0,1	0,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	0,1	0,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	0,1	1,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	0,1	9,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	0,1	1,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	0,1	1,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	0,1	3,59
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	0,1	1,43
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	0,1	0,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	0,1	0,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	0,1	0,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	0,1	3,43
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	0,1	3,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	0,1	2,85
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	0,1	1,34
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	0,1	2,82

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
		 VALLEDUPAR EN ORDEN Página 31 de 64

CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	0,1	1,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	0,1	2,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	0,1	0,46
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	0,1	2,17
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	0,1	5,36
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	0,1	0,46
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	0,1	1,05
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	0,1	4,16
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	0,1	1,94
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	0,1	2,30
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	0,1	1,12
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	0,1	0,70
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	0,08	1,42
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	0,1	2,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,1	1,26
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	0,1	0,84
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	0,08	0,92
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	0,1	2,13
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	0,1	0,78
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	0,1	0,78
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	0,08	0,24
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	0,1	0,05
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	0,1	10,03
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56	0,1	7,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,1	1,26
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	0,1	1,05
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	0,05	1,23
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	0,1	3,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	0,1	3,37
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	0,1	2,11
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	0,1	4,66
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	0,1	0,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	0,1	0,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	0,05	1,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	0,1	1,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	0,1	2,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	0,1	0,70
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	0,1	5,45
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	0,1	0,56
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	0,1	1,21
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	0,1	1,40

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 32 de 64

CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	0,1	2,07
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	0,1	2,99
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3,52	3,00	0,1	1,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,05	0,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,1	3,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	0,1	0,92
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	0,1	0,97
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	0,1	0,21
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	0,1	1,18
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	0,1	0,55
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	0,1	4,45
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	0,1	0,78
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	0,1	2,75
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	0,1	1,44
CARRERA 11 CON AVENIDA SAL GUERO	RIGIDO	10,1	4,60	0,1	4,65
CARRERA 11 CON AVENIDA SAL GUERO	RIGIDO	3,53	5,00	0,1	1,77
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,46	5,00	0,1	0,73
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,1	0,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,05	1,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	0,1	2,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	0,05	0,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	0,1	2,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	0,05	0,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	0,1	1,72
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	0,1	2,31
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	0,1	4,95
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	0,05	1,33
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	0,1	0,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	0,05	0,12
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	0,1	3,93
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	0,1	2,34
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	0,05	0,53
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	0,1	3,34
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	0,1	3,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	0,1	1,26
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	0,1	0,38
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	0,1	2,09
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	0,1	1,98
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	0,1	0,29
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	0,1	2,05
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	0,1	3,76
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	0,1	2,49
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	0,1	0,60
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	0,1	2,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	0,05	2,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	0,1	3,20
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	0,1	1,81
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	0,1	0,08
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	1,42	0,1	0,57

 CONSTRUCCIONES Sinaí	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
		 Página 33 de 64

CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	0,1	1,66
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	0,1	0,92
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	0,1	1,52
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	0,1	0,52
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	4,78	3,06	0,1	1,46
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	0,1	1,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	0,1	1,63
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	0,1	0,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	0,1	1,64
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	0,05	0,27
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	0,1	0,83
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	0,1	1,55
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	0,1	0,41
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	0,08	0,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	0,08	0,19
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	0,08	0,96
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,20	0,1	1,04
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	0,1	4,93
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	0,1	0,61
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	0,1	5,52
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	0,1	0,79
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	0,1	1,52
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	0,1	2,05
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	0,1	2,77
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	0,1	1,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	0,1	1,83
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	0,1	2,58
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	0,08	1,05
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	0,08	1,29
CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	0,1	0,96
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRETERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	0,1	0,79
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	0,08	1,61
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	0,08	3,25
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	0,08	1,30
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	0,08	0,89
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	0,1	3,52
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	0,1	0,65
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	0,1	1,46
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	0,1	0,90
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	0,1	0,76
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	0,1	0,80
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	0,1	1,92
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	0,1	3,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	0,1	0,42
TOTAL					369,42

En total fueron 369,42 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

construsinaointerventoria@gmail.com
construsinaointerventoria@gmail.com
 Barranquilla - Atlántico

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 34 de 64

CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINA CALZADA EXISTENTE CARRETERAS.				
UBICACION	TIPO DE CONCRETO			
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	88,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	4,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	4,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	15,03
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	1,49
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	18,62
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	4,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	2,40
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,2	3,20	39,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	6,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	59,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	8,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	7,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	2,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	5,06
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	6,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	39,55
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	39,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	4,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	26,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	17,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	8,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	21,19
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	13,02
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	36,75
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	3,84
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	24,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	6,93
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	37,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,97
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	27,37
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	25,25
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	34,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	27,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	3,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	6,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	11,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	92,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	12,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	10,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	10,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	35,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	14,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	3,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	1,77
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	53,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	2,51

construsinaointerventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 35 de 64

CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	34,30
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	30,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	28,50
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	13,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	28,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	17,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	23,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	53,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	4,59
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	21,74
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	53,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	4,59
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	10,50
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	41,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	19,36
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	23,02
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	11,20
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	6,99
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	17,72
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	20,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	28,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	12,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	4,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	21,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	12,63
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	8,45
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	11,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	21,32
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	7,84
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	7,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	2,95
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	0,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	100,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56	71,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	28,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	12,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	4,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	21,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	12,63
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	10,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	24,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	33,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	33,73
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	21,12
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	46,61
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	1,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	6,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	27,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	11,78
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	24,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	7,02

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 36 de 64

CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO			
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	54,49
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	5,56
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	12,08
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	14,00
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	20,70
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	29,94
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3,52	3,00	10,56
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	8,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	35,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	18,71
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	9,15
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	9,70
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	2,06
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	11,77
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	5,50
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	44,53
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	7,77
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	27,50
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	14,41
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	4,60	46,46
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	17,65
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	1,46	5,00	7,30
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	8,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	35,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	18,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	26,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	12,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	24,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	11,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	17,19
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	23,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	49,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	26,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	4,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	2,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	39,27
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	23,36
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	10,56
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	33,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	12,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	3,84
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	20,91
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	19,78
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	2,88
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	20,46
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	37,62

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
		 VALLEDUPAR EN ORDEN Página 37 de 64

CARRERA 18 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	24,89
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	6,03
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	20,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	40,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	32,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	18,06
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	0,78
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	1,42	5,68
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	16,60
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	9,24
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	15,15
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	5,22
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	16,03
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	16,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	3,04
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	16,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	5,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	8,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	15,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	4,06
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	1,28
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	2,41
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	12,03
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,20	10,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	49,26
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	6,14
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	55,18
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	7,94
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	15,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	20,54
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	27,69
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	14,54
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	18,30
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	25,76
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	13,13
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	16,14
CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	9,60
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRETERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	7,94
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	20,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	40,60
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	16,24
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	11,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	35,20
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	6,50
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	9,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	7,65
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	8,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	10,01
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	19,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	4,16
TOTAL				3840,13

En total fueron 3840,13 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

construsinaointerventoria@gmail.com

RELLENO GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	0,1	8,89
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	0,1	0,45
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	0,1	0,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	0,1	1,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	0,1	0,15
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	0,1	1,86
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	0,1	0,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	0,08	0,53
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	0,1	5,92
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	0,1	0,88
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	0,1	0,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	0,08	0,21
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	0,1	0,51
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	0,1	0,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	0,1	3,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1	0,26
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	0,1	0,49
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	0,1	2,66
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	0,08	1,38
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	0,1	0,80
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	0,1	2,12
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	0,1	1,30
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	0,1	3,68
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	0,1	0,38
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	0,1	2,46
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	0,1	0,69
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	0,1	3,76
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,1	0,10
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
CALLE 44. CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	0,08	2,02
CALLE 44. CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	0,1	3,46
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	0,1	0,33
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	0,1	0,63
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	0,1	1,12
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	0,1	9,20
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	0,1	1,21
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	0,1	1,03
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	0,1	1,07
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	0,1	3,59
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	0,1	1,43
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	0,1	0,34
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	0,1	0,18
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
AVENDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	0,1	0,25

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020			
			 VALLEDUPAR EN ORDEN	Página 39 de 64

CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	0,1	3,43
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	0,1	3,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	0,1	2,85
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	0,1	1,34
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	0,1	2,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	0,1	1,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	0,1	2,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	0,1	0,46
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	0,1	2,17
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	0,1	5,36
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	0,1	0,46
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	0,1	1,05
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	0,1	4,16
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	0,1	1,94
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	0,1	2,30
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	0,1	1,12
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	0,1	0,70
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	0,08	1,42
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	5,18	0,1	2,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	1,54	0,1	1,26
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	0,1	0,84
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	0,08	0,92
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	0,1	2,13
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	0,1	0,78
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	0,1	0,78
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	0,08	0,24
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	0,1	0,05
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	0,1	10,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	20	3,56	0,1	7,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,2	1,54	0,1	1,26
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	0,1	1,05
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	0,05	1,23
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	0,1	3,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	0,1	3,37
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	0,1	2,11
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	0,1	4,66
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,35	3,50	0,1	0,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	0,1	0,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	0,05	1,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	0,1	1,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	0,1	2,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	0,1	0,70

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020			
			 VALLEDUPAR EN ORDEN	Página 40 de 64

CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	0,1	5,45
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	0,1	0,56
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	0,1	1,21
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	0,1	1,40
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	0,1	2,07
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	0,1	2,99
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,52	3,00	0,1	1,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,05	0,44
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,1	3,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	8,43	2,22	0,1	1,87
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	0,1	0,92
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	0,1	0,97
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	0,1	0,21
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	0,1	1,18
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	0,1	0,55
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	0,1	4,45
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	0,1	0,78
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	0,1	2,75
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	0,1	1,44
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	10,1	4,60	0,1	4,65
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	0,1	1,77
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,46	5,00	0,1	0,73
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,1	0,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,05	1,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	0,1	2,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	0,05	0,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	0,1	2,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	0,05	0,58
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,77	2,98	0,1	1,72
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	0,1	2,31
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	0,1	4,95
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	0,05	1,33
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	0,1	0,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	0,05	0,12
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	0,1	3,93
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	0,1	2,34
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	0,05	0,53
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	0,1	3,34
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	0,1	3,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	0,1	1,26
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	0,1	0,38
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	0,1	2,09
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	4,12	4,80	0,1	1,98
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	0,1	0,29
CARRERA 18 CON CALLE 33	RIGIDO	13,2	1,55	0,1	2,05
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	0,1	3,76
	RIGIDO	6,55	3,80	0,1	2,49

construsinaainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
		Página 41 de 64	

AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	0,1	0,60
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	0,1	2,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	0,05	2,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	0,1	3,20
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	0,1	1,81
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	0,1	0,08
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	4	1,42	0,1	0,57
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	0,1	1,66
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	0,1	0,92
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	5	3,03	0,1	1,52
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	0,1	0,52
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	4,78	3,06	0,1	1,46
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	0,1	1,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	0,1	1,63
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	0,1	0,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	0,1	1,64
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	0,05	0,27
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	0,1	0,83
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	0,1	1,55
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	0,1	0,41
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	0,08	0,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	0,08	0,19
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	0,08	0,96
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,25	3,20	0,1	1,04
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	0,1	4,93
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	0,1	0,61
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	0,1	5,52
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	0,1	0,79
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	0,1	1,52
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	0,1	2,05
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	0,1	2,77
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	0,1	1,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	0,1	1,83
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	0,1	2,58
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	0,08	1,05
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	0,08	1,29
CARRERA 11 CON CALLE 18	RIGIDO	6	1,60	0,1	0,96
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRETERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	0,1	0,79
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	0,08	1,61
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	0,08	3,25
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	0,08	1,30
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	0,08	0,89
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	0,1	3,52
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	0,1	0,65
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	0,1	1,46
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	0,1	0,90
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	0,1	0,76
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	0,1	0,80
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	0,1	1,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	0,1	1,92
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	0,1	3,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	0,1	0,42
TOTAL					369,42

En total fueron 369,42 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

construsinaointerventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	 Página 42 de 64

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA EN CONCRETO PREHÉZCLADO E-0,17 M; MR =400 PSI - 42 kg./fcm ² A LA FLEXIÓN, ACELERADO A TRES (3) DIAS INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y BARRA DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO A 1.20 METROS DE SEPARACIÓN, (INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y CANASTILLA DE SOPORTE).				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	6,88	3,67	25,25
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3,82	9,05	34,57
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,5	9,80	34,30
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3	10,00	30,00
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,75	7,60	28,50
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	3,8	3,52	13,38
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	8,07	3,50	28,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y PARQUE LA PROVINCIA	RIGIDO	4,9	3,50	17,15
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,3	9,45	21,74
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,7	14,48	53,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	1,6	2,87	4,59
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,5	3,00	10,50
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	11,88	3,50	41,58
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,54	5,47	19,36
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	6,54	23,02
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	3,6	3,11	11,20
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	2,24	3,12	6,99
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	5,02	3,53	17,72
CARRERA 4 ENTRE BALNEARIO HURTADO Y CALLE 12	RIGIDO	4	5,18	20,72
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,15	3,93	8,45
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2,06	5,60	11,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	8,2	2,60	21,32
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,96	4,00	7,84
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	2	3,91	7,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	1,55	1,90	2,95
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	0,66	0,72	0,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	25	4,01	100,25
CARRERA 4 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 13 B	RIGIDO	20	3,56	71,20
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	2,97	3,53	10,48
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	3,03	8,10	24,54
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,35	4,05	33,82
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	8,37	4,03	33,73
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	5,24	4,03	21,12
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	11,8	3,95	46,61
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14	RIGIDO	0,35	3,50	1,23
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,52	15,48	54,49
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	1,58	3,52	5,56
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	3,05	3,96	12,08
CARRERA 4 ENTRE CALLE 9A Y CALLE 12	RIGIDO	2,8	5,00	14,00
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	6,9	3,00	20,70
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3	9,98	29,94
CLUB VALLEDUPAR	RIGIDO	3,52	3,00	10,56
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3	3,05	9,15
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	3,05	3,18	9,70

construsinaointerventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
			Página 43 de 64

CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	4,3	0,48	2,06
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5,35	2,20	11,77
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	5	1,10	5,50
CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20	RIGIDO	7,3	6,10	44,53
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	2,1	3,70	7,77
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	5	5,50	27,50
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,35	4,30	14,41
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	10,1	4,60	46,46
CARRERA 11 CON AVENIDA SALGUERO	RIGIDO	3,53	5,00	17,65
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,46	5,00	7,30
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7	3,30	23,10
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	15	3,30	49,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5,3	5,00	26,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	2,00	4,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	1,00	2,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	11,9	3,30	39,27
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	7,3	3,20	23,36
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,6	6,60	10,56
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10,45	3,20	33,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2,4	5,25	12,60
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,2	3,20	3,84
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6,15	3,40	20,91
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	4,12	4,80	19,78
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	1,8	1,60	2,88
AVENIDA PASTRANA FRENTE GIMNASIO	RIGIDO	13,2	1,55	20,46
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	9,9	3,80	37,62
CARRERA 16 CON CALLE 33	RIGIDO	6,55	3,80	24,89
AV. PASTRANA CON KIOSCO DE LA Y SIMON BOLIVAR	RIGIDO	1,6	3,77	6,03
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,00	20,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,00	40,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	8	4,00	32,00
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,3	4,20	18,06
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	0,56	1,40	0,78
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	4	1,42	5,68
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5,03	3,30	16,60
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	3,02	3,06	9,24
CALLE 19 E CON CARRERA 13	RIGIDO	5	3,03	15,15
CALLE 19 E CON CARRERA 14 ESQUINA	RIGIDO	3,53	1,48	5,22
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,01	3,20	16,03
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,1	3,20	16,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,93	3,27	3,04
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,28	16,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	6,8	0,80	5,44
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5,2	1,60	8,32
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	5	3,10	15,50
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	1,25	4,06
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	0,85	1,50	1,28
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,65	0,66	2,41
CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,70	12,03

CALLE 21 ENTRE CARRERA 17 Y 19 D	RIGIDO	3,25	3,20	10,40
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	15,25	3,23	49,26
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	1,86	3,30	6,14
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	24,2	2,28	55,18
CALLE 21 ENTRE CARRERA 15 Y 17	RIGIDO	3,24	2,45	7,94
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	10,1	2,55	25,76
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,3	3,98	13,13
CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11	RIGIDO	3,89	4,15	16,14
CARRERA 11 CON CALLE 19	RIGIDO	6	1,60	9,60
CARRERA 11 CON CALLE 20 FERRETERIA CESAR	RIGIDO	2,62	3,03	7,94
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	5	4,02	20,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	10	4,06	40,60
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4	4,06	16,24
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,70	11,10
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	11	3,20	35,20
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,06	1,60	6,50
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	4,78	3,06	14,63
CARRERA 15 CON CALLE 20 MERCADO	RIGIDO	3	3,00	9,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,36	3,24	7,65
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	3,2	2,50	8,00
AVENIDA PASTRANA FRENTE EFECTY	RIGIDO	2,225	4,50	10,01
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	5	2,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	2	5,00	10,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	6	3,20	19,20
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	10	3,20	32,00
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	RIGIDO	1,3	3,20	4,16
TOTAL				2334,07

En total fueron 2334,07 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

ACERO DE REFUERZO POR DE 60.000 PSI.					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
CLUB VALLEDUPAR	CAMARA DE INSPECCION (MANHOL)	1,5	1,50	7,50	1
CALLE 21 ENTRE CARRERA 7A Y 12	CAMARA DE INSPECCION (MANHOL)	3	1,50	7,50	1
TOTAL				15,00	50,63

En total fueron 50,63 kg ejecutados por el contratista en este periodo.

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO Y RIEGO)				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	88,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	4,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	4,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	15,03
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	1,49
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	18,62
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	4,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	2,40
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	39,04

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 45 de 64

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	6,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	59,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	8,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	7,00
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	2,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	5,06
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	6,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	39,55
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	39,04
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	2,55
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	4,94
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	26,60
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	17,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	8,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	21,19
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	13,02
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	36,75
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	3,84
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	24,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	6,93
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	37,57
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,97
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	27,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	27,37
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	3,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	6,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	11,23
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	92,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	12,06
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	10,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	10,72
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	35,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	14,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	3,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	1,77
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	53,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	2,51
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	23,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	53,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	4,59
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	28,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	12,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	4,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	21,65

construsinaointerventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
		Página 46 de 64	

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	12,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	28,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	12,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	4,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	21,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	12,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	6,05
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	27,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	11,78
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	24,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	7,02
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	8,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	35,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	18,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	8,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	35,28
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	2,00
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	18,71
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	26,65
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	12,58
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	24,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	11,50
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	17,19
TOTAL				1409,82

En total fueron 1409,82 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 2					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	25,7	3,46	0,1	8,89
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,65	2,70	0,1	0,45
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3	1,50	0,1	0,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	9,22	1,63	0,1	1,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,08	1,38	0,1	0,15
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5,1	3,65	0,1	1,86
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,3	1,50	0,1	0,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	2,00	0,1	0,24
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,55	4,30	0,1	0,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8	7,40	0,1	5,92
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4	2,20	0,1	0,88
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,5	2,00	0,1	0,70

construsinaointerventoria@gmail.com
construsinaointerventoria@gmail.com
 Barranquilla - Atlántico

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 47 de 64

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,25	1,17	0,1	0,26
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,2	2,30	0,1	0,51
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,82	3,82	0,1	0,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,21	12,32	0,1	3,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	12,2	3,20	0,1	3,90
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,7	1,50	0,1	0,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,6	1,90	0,1	0,49
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,6	3,50	0,1	2,66
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	4,80	0,1	1,73
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	4,00	0,1	0,80
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	8,83	0,1	2,12
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO				
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	11,52	1,13	0,1	1,30
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,5	3,50	0,1	3,68
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,2	3,20	0,1	0,38
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,33	3,36	0,1	2,46
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,19	1,12	0,1	0,69
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,93	9,56	0,1	3,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	0,42	2,30	0,1	0,10
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	11,55	2,37	0,1	2,74
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,41	2,37	0,1	0,33
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,53	1,38	0,1	0,63
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,16	5,20	0,1	1,12
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5	18,40	0,1	9,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,6	3,35	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,82	5,65	0,1	1,03
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,66	2,93	0,1	1,07
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,2	6,90	0,1	3,59
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,1	2,81	0,1	1,43
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,94	1,73	0,1	0,34
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,32	1,34	0,1	0,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,93	1,30	0,1	0,25
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,7	8,80	0,1	2,38
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	14,48	0,1	5,36
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,6	2,87	0,1	0,46
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,96	3,54	0,1	2,82
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,78	6,80	0,1	1,21
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,64	2,94	0,1	0,48
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,57	2,86	0,1	2,17
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,2	1,54	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,54	3,93	0,1	0,61
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,68	5,90	0,1	2,76
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	4,3	2,74	0,1	1,18
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	7,68	3,20	0,1	2,46

AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,3	3,05	0,1	0,70
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,1	0,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,1	3,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,96	2,20	0,1	0,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2,4	14,70	0,1	3,53
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	2	1,00	0,1	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	8,43	2,22	0,1	1,87
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,53	4,82	0,1	2,67
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	3,7	3,40	0,1	1,26
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	6,7	3,60	0,1	2,41
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	1,73	6,65	0,1	1,15
AVENIDA SIMON BOLIVAR	ASFALTO	5,77	2,98	0,1	1,72
TOTAL					140,98

En total fueron 140,98 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

1.2.2 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

La calidad de los materiales que se han usado son de buena calidad y el contratista ha presentado las diferentes fichas técnicas en informes anteriores.

1.2.2.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo el contratista presento los ensayos realizados a los materiales de súbbase y asfalto utilizados en las obras.
De acuerdo a lo presentado se evaluó y se concluyó que los materiales utilizados cumplen con la norma y son aptos para la construcción de pavimentos flexible y rígidos.
Se anexa copia de resultados de ensayos.

1.2.3 CLIMATOLOGIA

 <div>CONSTRUCCIONES SINAI</div>	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S																									 <div>VALLEDUPAR EN ORDEN</div>						
	PROYECTO:REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE																									FECHA		15	12	20		
	TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR																									MES		DICIEMBRE				
CONTRATO No	956 DE 2020					CONTRATANTE					MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					SECTOR		VALLEDUPAR		MES		DICIEMBRE										
CLIMA																																
DIA	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																	
LLUVIAS																																
LLUVIAS MODERADAS																																
S: SECO LL: LLUVIAS M: LLUVIAS MODERADAS																																

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 49 de 64

1.3 INFORME ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	SEMANA 5		
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable 	X		
El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		

1.3.1.1 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

RELACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL, CONFORMACION DE BRIGADA Y SEÑALIZACION EN OBRA:

No.	ELEMENTO	TIPO	UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION
1	EXTINGUIDOR	SI	SI	NO	NO
2	CARTELERA INFORMATIVA	SI	SI	SI	NO
3	BRIGADAS TELEFONOS	NO	NO	NO	NO

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
		Página 50 de 64	

3	PORTA CARNETS	NO	NO	NO	NO

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
Dotación completa	x			
Buen estado	x			
Uso según zona de trabajo	x			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
Dotación completa	X			
Buen estado	x			
Fácil acceso y operación	x			
Uso según zona de trabajo	x			
Existencia de elementos primero auxilios	X			
MAQUINARIA - EQUIPO				
Estado del equipo	X			
Regularidad del mantenimiento		X		
Vibraciones /Ruidos	x			
Protecciones / Guardas / Frenos	x			
Idoneidad operarios	x			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN				
Uso permanente	x			
Uso según zona de trabajo	x			
elementos de bioseguridad	X			
VIGILANCIA				
Personal suficiente	X			
Diurna	N. A			
Nocturna	N. A			
CENTRO DE ATENCION INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia	x			
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	x			

GESTION HSE

INDICADORES HSE			
Total, de HHTT PERIODO:	0	Total, HHTT acumuladas:	0

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
		 VALLEDUPAR EN ORDEN Página 51 de 64

Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el periodo:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo del periodo:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
NO SE PRESENTO ACCIDENTE DURANTE ESTE PERIODO			

1.1.1.1 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

SEÑALIZACIÓN								
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION		
	No		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	1	Capacitación Personal	X			X		
	2	Demarcación del perímetro	X			X		
	3	Zonificación de la obra	X				X	
	4	Lona de Cerramiento	X		X			
	5	Cinta de Reflectaba	X			X		
	6	Señales Informativas preventivas y	X			X		
	7	Uso de Paleteros	X				X	
	8	Iluminación Nocturna	X				X	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	Capacitación del Personal	X			X			
	2	Mantenimiento Preventivo	X				X		
	3	Definición de Horarios de trabajo	X			X			
	4	Ficha de control de actividades	X			X			
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X				X		
	6	Elementos de protección personal	X			X			
	7	Extintores	X			X			
	8	Medidas de Contingencia	X			X			

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
			Página 52 de 64

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS									
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION		PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	1	Capacitación del Personal	X			X			
	2	Mantenimiento Preventivo	X			X			
	3	Definición de Horarios de trabajo	X			X			
	4	Ficha de control de actividades	X			X			
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X			X			
	6	Elementos de protección personal	X			X			
	7	Extintores	X			X			
	8	Medidas de Contingencia	X						
	12	Volumen de tierra (m3)				NP			

1.4 ADMINISTRACION

CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

1.4.1.1 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN ESTE PERIODO SEMANAL

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos que se utilizaron:

 CONSTRUCCIONES SINAI	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S														 VALLEDUPAR en orden																	
	PROYECTO:REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE																FECHA															
	TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR																15 12 20															
CONTRATO No	956 DE 2020			CONTRATANTE			MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			SECTOR		VALLEDUPAR		MES		DICIEMBRE																
EQUIPOS Y MAQUINARIA																																
DIA	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MINICARGADOR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
VIBROCOMPACTADOR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
VOLQUETAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
CORTADORA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
A:ACTIVO		I:INACTIVO		R:REPARACION																												

Se puede anotar que durante este periodo se usaron los equipos y maquinarias necesarias para las obras que se tenían programadas.

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 53 de 64

1.4.2 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

1.4.2.1 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

RELACION DE ACTAS Y COMITES			
1	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
1	ACTA MODIFICATORIA No 1	24 DE NOVIEMBRE DE 2020	SE REALIZO MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES EN EL PRESUPUESTO INICIAL POR EL AUMENTO DE CANTIDADES DE ASFALTO EN LAS ZOANS A INTERVENIR. SE HIZO LA MADIFICACION PARA TENER UN BALANCE CON EL MISMO VALOR DEL PRESUPUESTO INICIAL.
2	COMITÉ DE OBRA No 1	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	<ul style="list-style-type: none"> - SE EXIGIO AL CONTRATISTA PROGRAMACION DE OBRA, PMT, LAS 4 CUADRILLAS EN OBRA - REVISION DE LAS ZONAS A INTERVENIR - REVISION DE BALANCE DE OBRA

1.4.2.2 COPIA DE LA BITACORA

Se coloca a disposición copia de la bitácora de obras de este periodo laboral, se anexan las respectivas copias a continuación:


 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 54 de 64

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Después de la información contenida anteriormente en el informe se puede decir:

1. se puede observar un avance del 59,98% de ejecución frente a un 45,71% programado lo que refleja que existe un adelanto de un 14,27%, mostrando un avance por arriba de la programación de ejecución de obras propuesto por el contratista en su reprogramación del balance final.
2. En el frente de la avenida simón bolívar se lleva un avance de 99%, del total de las actividades contempladas en dicho frente de labores.
3. En él los frentes de pavimento rígido se lleva ejecutado en este periodo de 2334,07 m2, para un avance de 66,7% del ítem presupuestal.
4. El contratista cuenta con el total de las cuadrillas propuestas en el proyecto, por lo cual se recomienda que siga con igual o mayor número de cuadrillas y seguir aumentando el rendimiento.
5. Se le recomienda al contratista un buen mantenimiento de los equipos en obras, puesto que algunas veces se han retrasados las actividades por daños en los mismo.
6. Mejorar el sistema de señalización en los frentes que se intervengan.

Aprobación del Informe:

Elaboró:  EDWIN GARRIDO LUNA INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	Aprobó:  VICTOR LOPEZ DIRECTOR DE OBRA
--	---

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 55 de 65

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACION,


REPLANTEO

Y

DEMARCAACION

CON

PINTURA

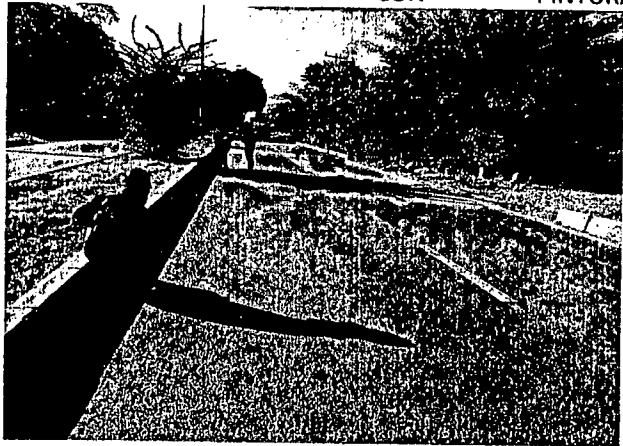


CORTE CALZADA EN CONCRETO.




	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 56 de 64



DEMOLOLICON DE CONCRETO RIGIDO

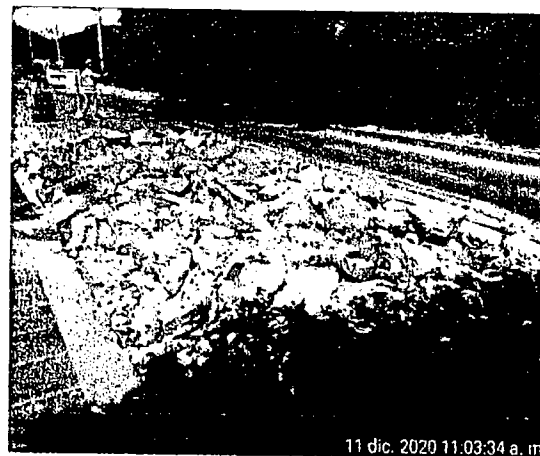



DEMOLOLICON DE CONCRETO ASFALTICO

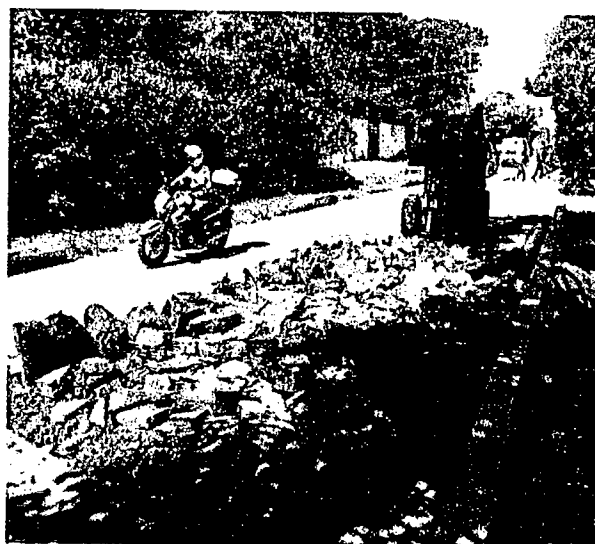

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 57 de 65

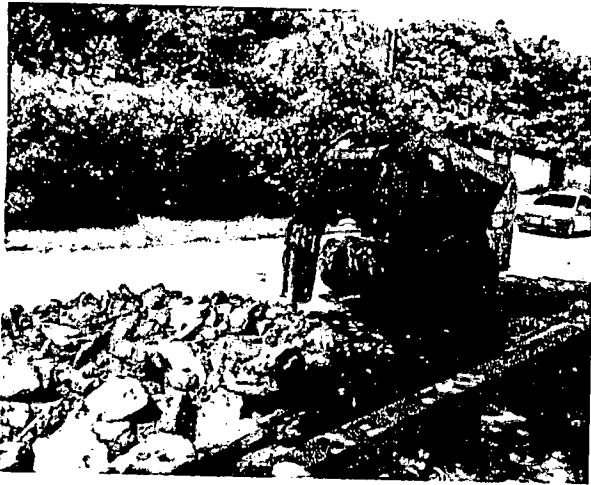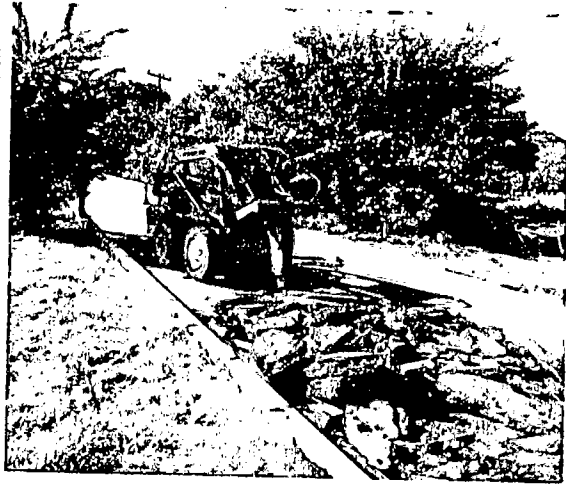


SEÑALES DE TRANSITO

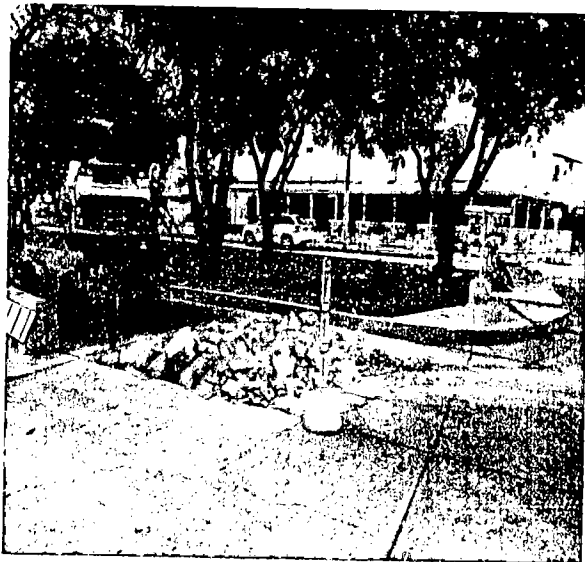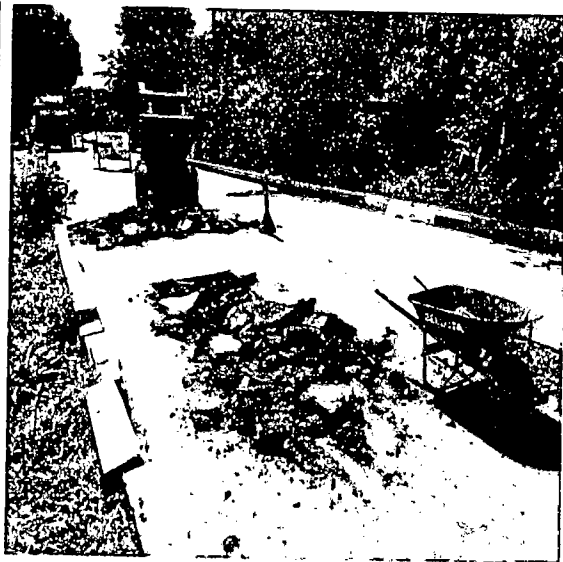


 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 58 de 65

VALLAS INFORMATIVAS

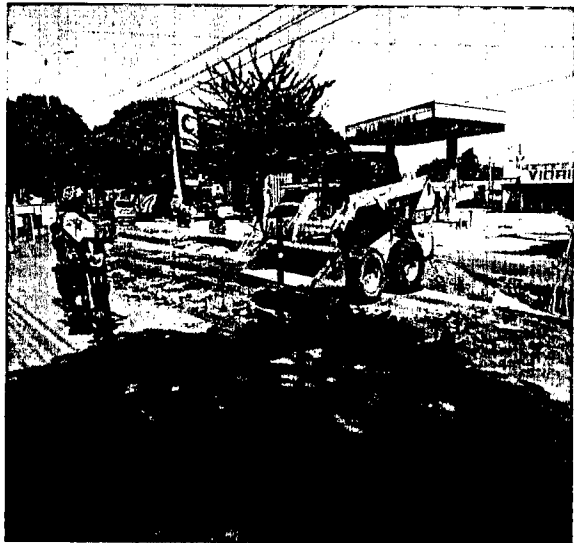

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

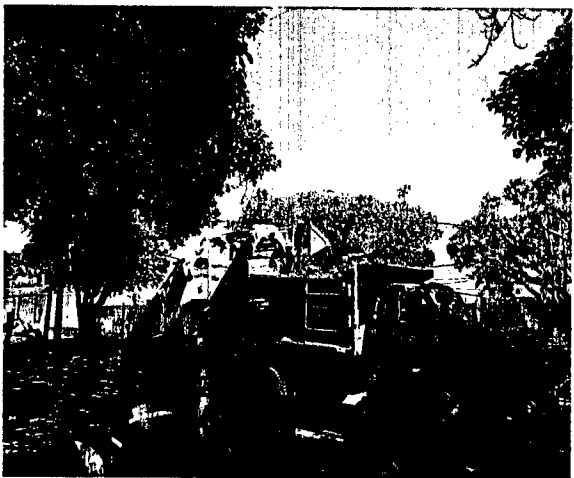


EXCAVACION MANUAL





 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	 Página 59 de 65



CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO

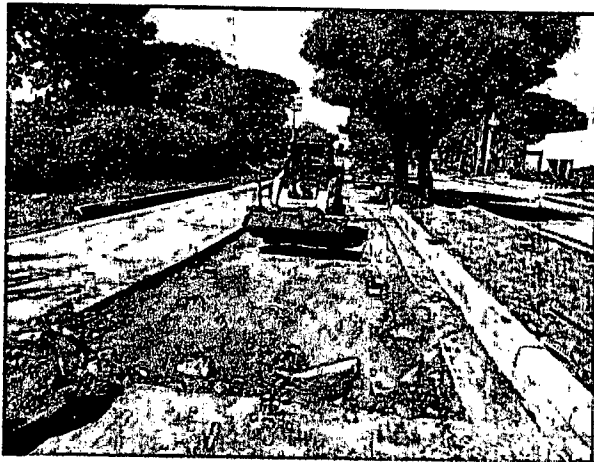


RELLENO GRANULAR EN SUBBASE

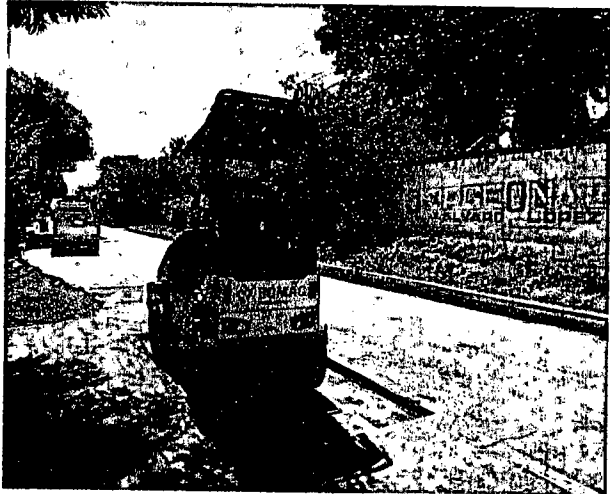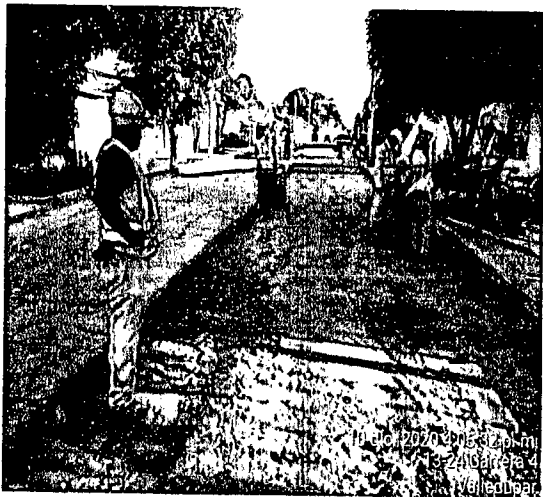





 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 60 de 64

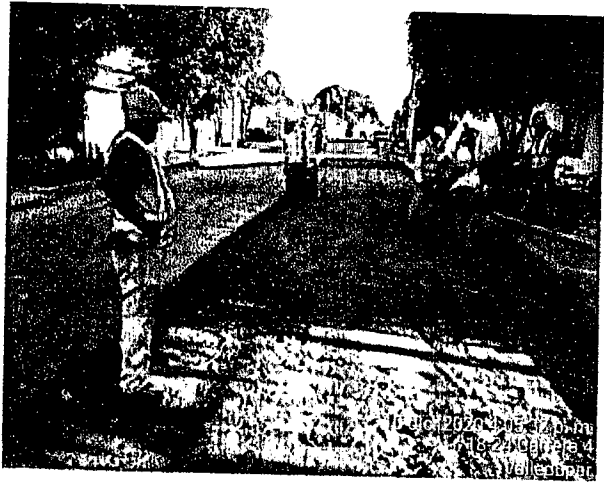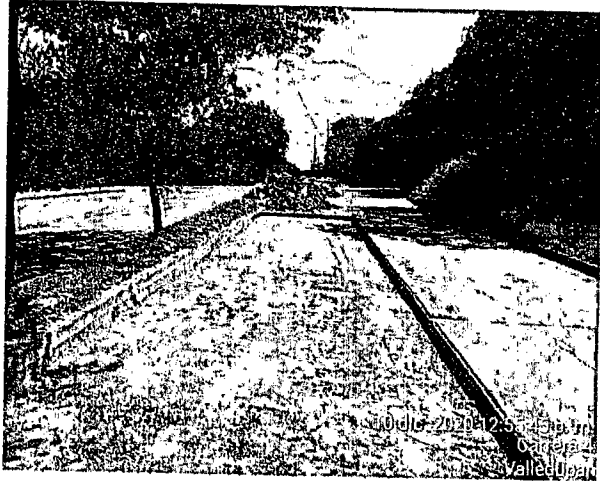


CONCRETO PREMEZCLADO MR= 600 PSI

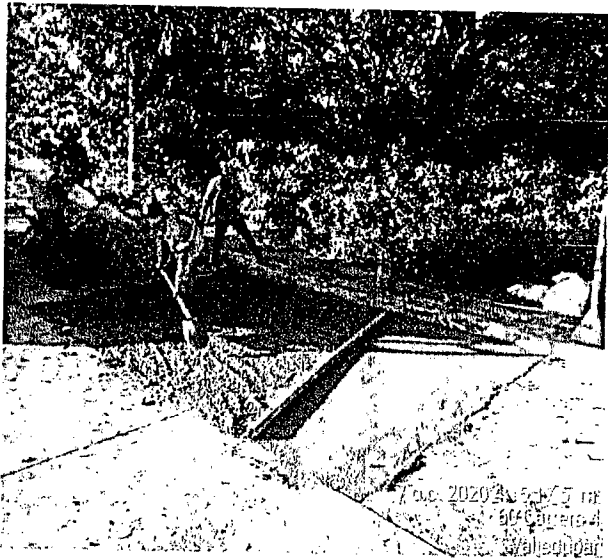



 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	 Página 61 de 64

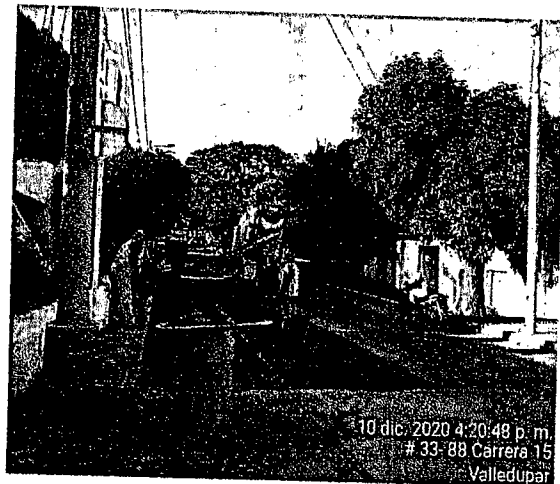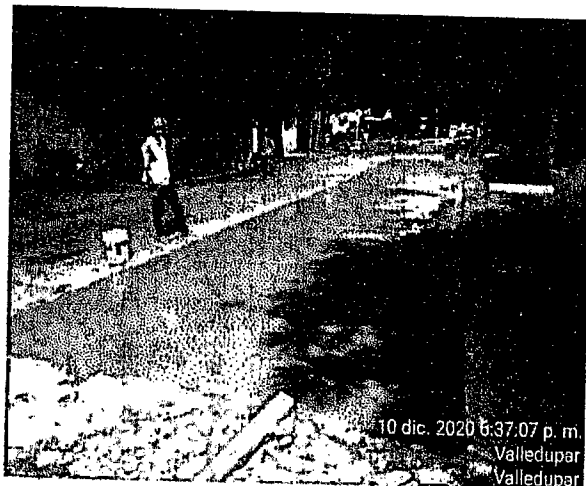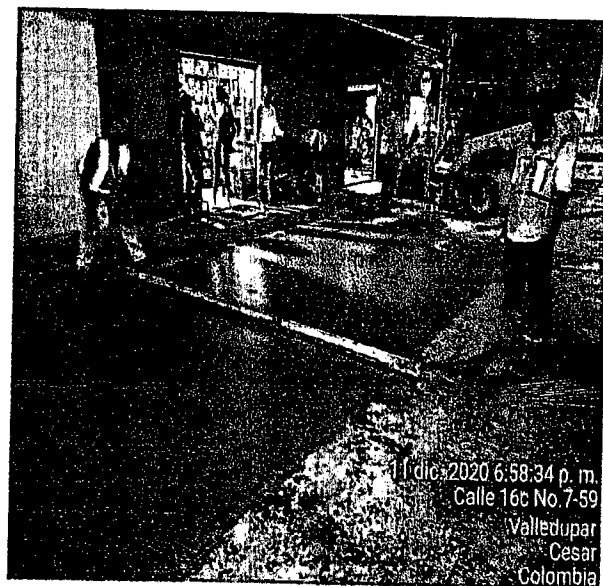


 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	 Página 62 de 64

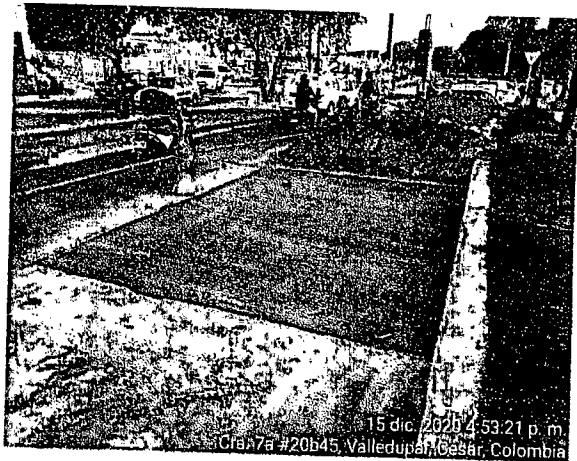


ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI

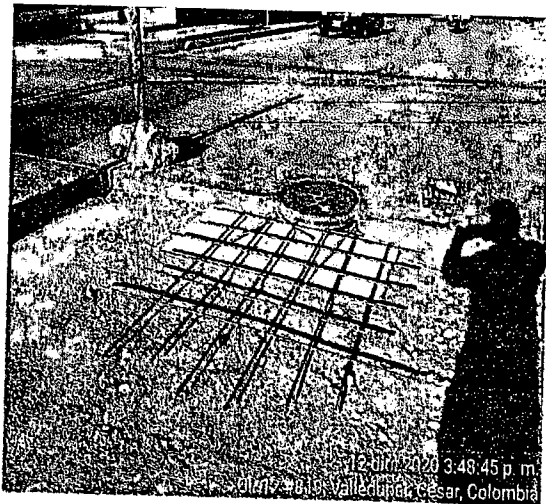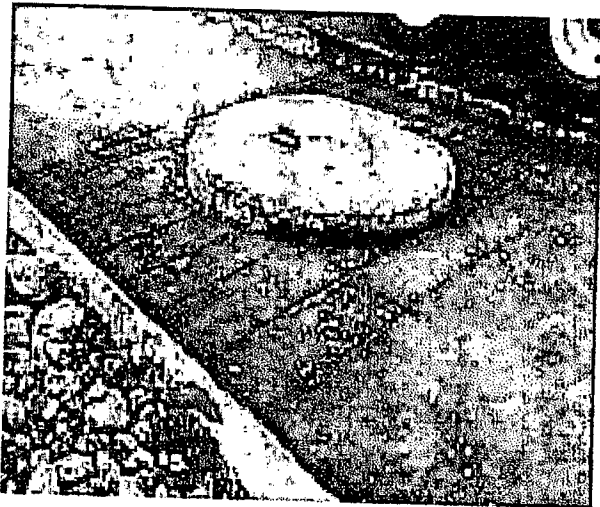

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA

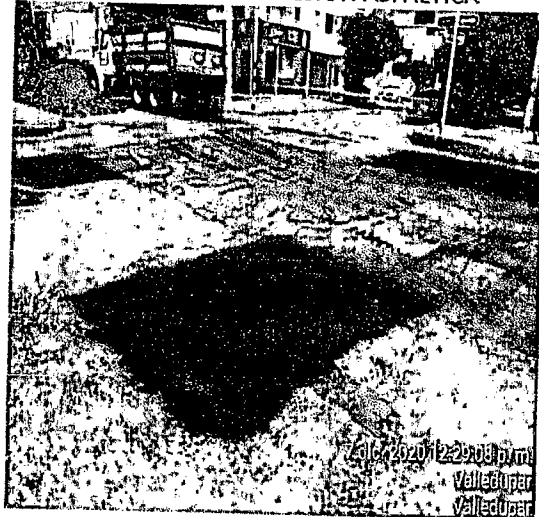



	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 63 de 64

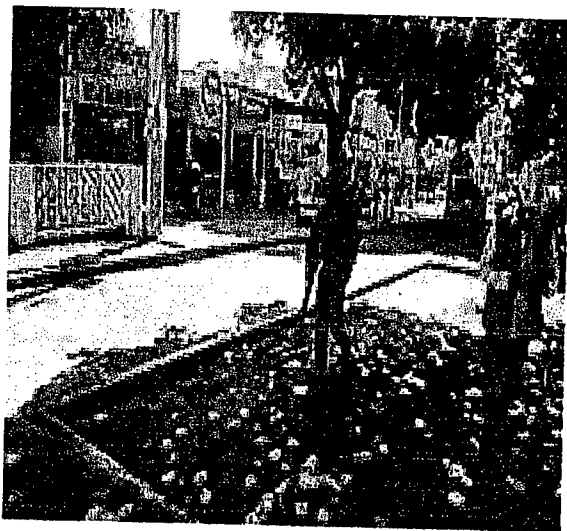

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2



 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 1 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
		 Página 64 de 64

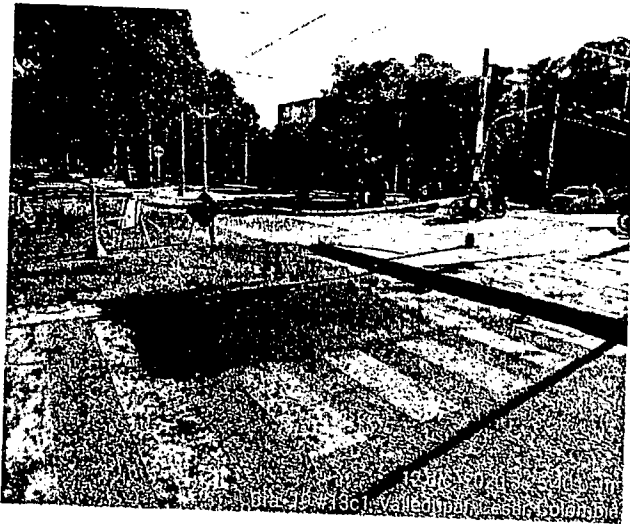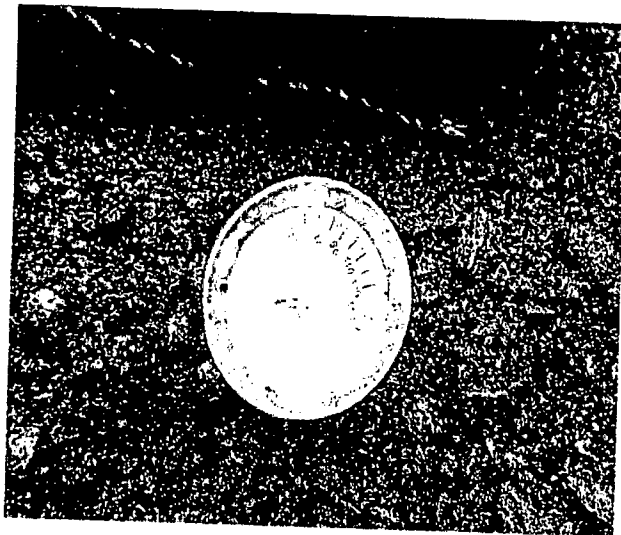

3


 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 1 de 28

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 956 de 2020

PERIODO: Del 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020



CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO REHABILITACION VALLEDUPAR HS

INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI

construsinaointerventoria@gmail.com
construsinaointerventoria@gmail.com
 Barranquilla-Atlántico

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 2 de 28

1. OBRA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Interventor:	CONSTRUCCIONES SINA S.A.S
Supervisión:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Contrato interventoría No:	956 DE 2020
Representante Legal interventoría:	VICTOR LOPEZ GALVAN
Contratista de obra:	CONSORCIO REHABIITACION VALLEDUPAR HS
Valor del Contrato:	\$ 98.130.841.00
Valor del Anticipo 30%:	\$ 29.439.252,30
Fecha de terminación inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	No aplica
Valor del Contrato + Adicional:	No aplica

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Adición valor del anticipo:	No aplica
Plazo de ejecución inicial:	45 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio:	17 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de suspensión:	No aplica
Fecha de reinicio:	No aplica
Total, días transcurridos de suspensión	No aplica
Fecha de Prorroga:	No aplica
Adición plazo:	No aplica
Plazo de ejecución modificado:	No aplica
Fecha de terminación actualizada:	No aplica
Fecha de Corte del Informe:	21 DE DICIEMBRE DE 2020
Días Transcurridos:	34 DIAS
INFORMACION FINANCIERA CONTRATO OBRA	
Acta parcial 1	
Acta parcial 2	
Acumulado	No aplica
Anticipo	
Anticipo desembolsado:	
Fecha de desembolso	
Amortización Acta parcial 1	
Amortización Acta parcial 2	
Pendiente por amortizar	

1.1.1.1 GARANTIA UNICA

POLIZAS DE GARANTIA DE INTERVENTORIA

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	COMPAÑIA CONFIANZA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$9.813.084,10
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$29.439.252,30
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		M-100126939	04/11/2020	19/12/2023	\$ 4.906.542,05
CALIDAD DE SERVICIO		M-100126939	04/11/2020	19/06/2021	\$9.813.084,10

construsinainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 4 de 28

1.1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO


Este es un proyecto que busca mejorar la movilidad en varios puntos neurálgicos de la ciudad para el desarrollo socioeconómico y que desde mucho tiempo habían sido olvidados pero que son de vital importancia y oxigenan el tráfico de manera considerable.

Los puntos a intervenir serán clasificados según el grado de afectación que tenga cada uno y el nivel del flujo del tráfico de dichas zonas, con el fin de abarcar la mayoría de los puntos que impiden una movilidad en la ciudad de manera más fluida y con el mínimo riesgo para los habitantes de Valledupar.


1.1.2 ALCANCE

1.1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Geográficamente el Municipio de Valledupar Está ubicado al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guarapera, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente y la serranía del Perijá al oriente. Más exactamente a **10° 29' de latitud Norte y 73° 15' de longitud Oeste**. Limitada al **Norte** con los departamentos de Magdalena y la Guajira; al **Este** con la Guajira y los municipios de San Diego y la Paz; al **Sur** con los municipios de San Diego, La Paz y el Paso y por el **Oeste** con el Magdalena y los municipios de Buscanea y el Copey.

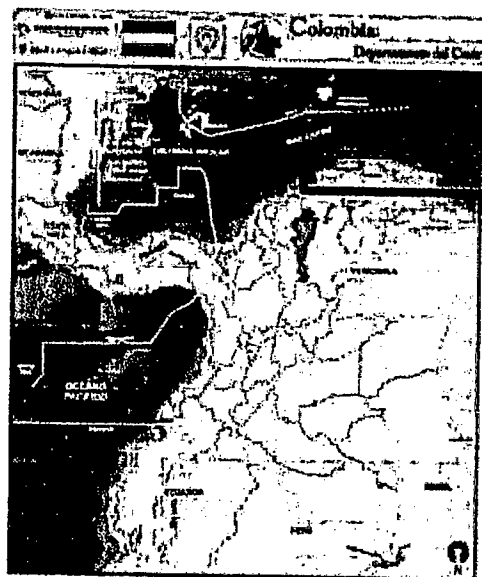

Fuente: google mapas

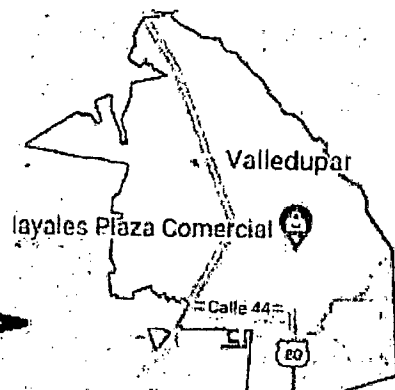

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 5 de 28

1.2 INFORME TECNICO

AVANCE DE OBRA

PERIODO DE CORTE; 16 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE CORTE: 21 DIC 2020

SEMANAS	Programado	Ejecutado	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	(Miles de pesos)	(Miles de pesos)		
	\$ 0,00	\$ 0,00		
1 SEMANA	\$ 82.123.623,5	47.469.258,22	6,30%	3,64%
2 SEMANA	\$ 185.801.564,7	118.673.145,54	14,25%	9,10%
3 SEMANA	\$ 308.427.340,6	234.566.920,68	23,66%	17,99%
4 SEMANA	\$ 595.901.375,7	781.889.735,60	45,71%	59,98%
5 SEMANA	\$ 882.676.319,1	899.340.895,54	67,71%	68,99%
6 SEMANA	\$ 1.186.430.283,2		91,02%	0,00%
7 SEMANA	\$ 1.303.529.091,0		100,00%	0,00%
TOTAL	\$ 1.303.529.091,0			0,00%


AVANCE:	68,99%
---------	--------

MEDICION DE AVANCE:

De acuerdo a la programación presentada por el contratista se presenta un avance de 68,99%, lo cual refleja un adelanto de 1,28% por encima de 67,71% según su reprogramación, pero también representa una disminución con respecto al informe de la semana pasada, por lo cual se recomienda no bajar el ritmo para terminar con las obras en el plazo estipulado.

Es importante anotar que se debería aumentar el número de cuadrillas de trabajos en los diferentes frentes, con el fin de continuar con el buen desarrollo que se tiene hasta el este periodo.

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	 VALLEDUPAR EN ORDEN
		Página 6 de 28

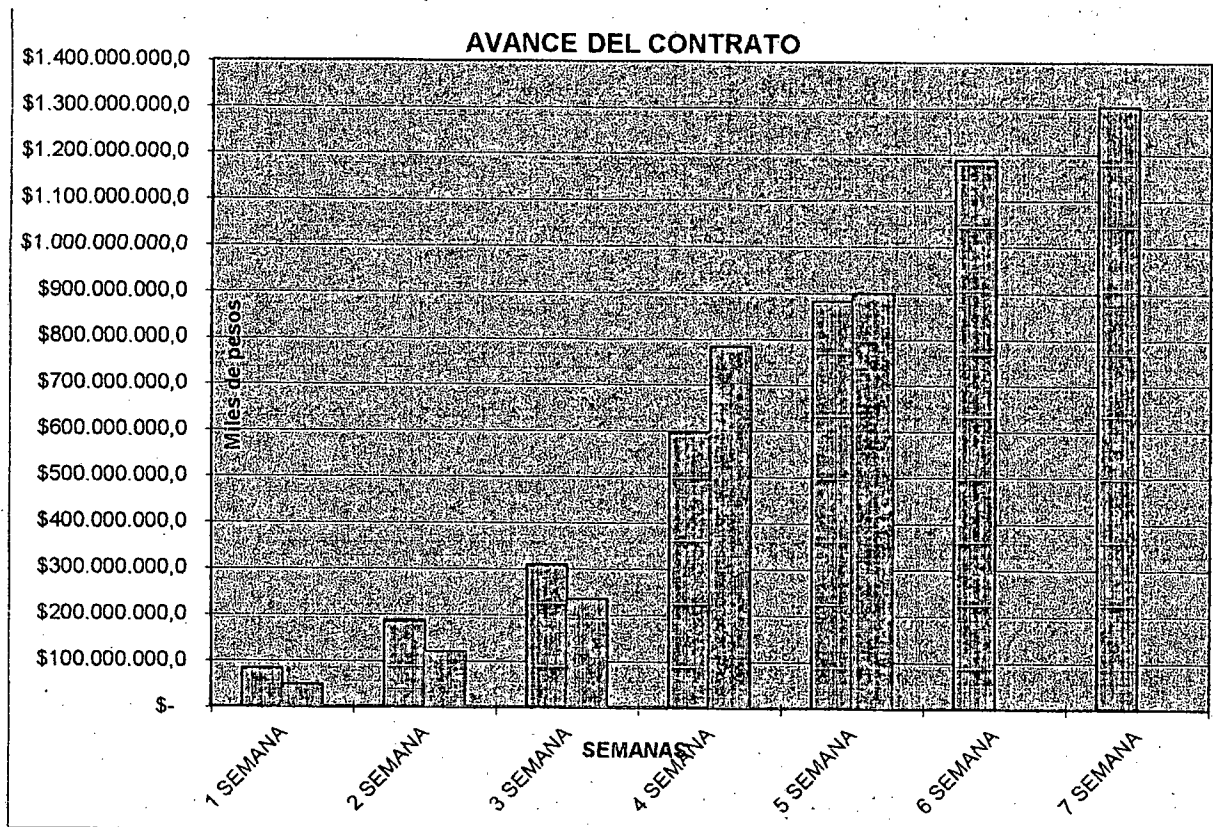

1.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este periodo del informe se realizaron varias actividades, las cuales se realizaron de manera similar en cada punto intervenido, tales como:

1. Se realizó inicialmente la señalización de los frentes a intervenir en la avenida simón bolívar.
2. Se realizó localización y replanteo en cada punto de afectación critica entre todas las partes en el frente de pavimento en asfalto en la avenida simón bolívar
3. Se realizaron las demarcaciones con pintura de los puntos escogidos.
4. Se inició con la demolición con minicaragador los puntos a intervenir, y posteriormente retirar de la zona el material demolido.
5. Se hizo la conformación de las cajas o puntos intervenidos, para la limpieza de material.
6. Se realizó la colocación y extendida de material de súbase en las cajas.

- 7. Se realizó la compactación con equipo Benitin en la subbase extendida.
- 8. Se realizó trabajos de limpieza de material fino de subbase con bomba de aire para retirarlos y así realizar la imprimación con la emulsión asfáltica.
- 9. Se realizó la imprimación con emulsión asfáltica CL-0
- 10. Se realizó la extendida de asfalto MDC-2 en las cajas a intervenir y su respectiva compactación con equipo de Benito mecánico, para el sello y compactación hasta el punto de dar los acabados finales
- 11. Se realizaron obras de construcción de pavimento rígido en los frentes de la carrera 4, avenida salguero con calle 39, calle 21, carrera 16 (avenida pastrana), calle 12 (club Valledupar)
- 12. Se realizaron conformación y relleno con subbase en la construcción de pavimento rígido.

CANTIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO:

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05	89,10
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95	30,00
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00	12,00
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00	30,60
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60	10,58
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00	18,72
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00	20,06
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12	12,32
CRA 4 # 20i-74	RIGIDO	26,36	1,38	36,38
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00	11,10
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52	3,38
CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	16,28
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	19,26
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	18,32
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	33,74
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	3,19
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	3,13
CRA 4 # 21	ASFALTO	6,47	3,45	22,32
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	20,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	71,61
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	8,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	5,99
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	13,50

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	1,04
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	16,25
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	43,23
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	17,20
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	17,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	27,70
TOTAL				633,54

En total fueron 633,54 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

DEMARCACION EN PINTURA AREA A INTERVENIR.					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05	1,00	1
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95	2,00	2
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00	2,00	2
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00	2,00	2
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60	2,00	2
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00	2,00	2
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00	2,00	2
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12	2,00	2
CRA 4 # 20i-74	RIGIDO	26,36	1,38	2,00	2
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00	2,00	2
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52	2,00	2
CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	2,00	2
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	2,00	2
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	2,00	2
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	2,00	2
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	1,00	1
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	1,00	1
CRA 4 # 21	ASFALTO	6,47	3,45	1,00	1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	2,00	2
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	2,00	2
TOTAL					559,58

En total fueron 558,58 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020		Página 9 de 28

DEMOLICIÓN ANDENES EN CONCRETO EXISTENTES				
UBICACIÓN	ANDEN			
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3	1,00	3,00
TOTAL				3,00

En total fueron 3 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

DEMOLICIÓN BORDILLOS EN CONCRETO EXISTENTES				
UBICACIÓN	ANDEN			
CALLE 44 . CANAL DE PANAMA	RIGIDO	3	1,00	3,00
TOTAL				3,00

En total fueron 3 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

CORTE CALZADA EN CONCRETO						
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO					
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05	1,00	1,00	26,05
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95	1,00	1,00	13,12
CRA 4 # 16 A-28	RIGIDO	3	4,00	1,00	1,00	7,00
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00	1,00	1,00	11,65
CRA 4 # 18B-82	RIGIDO	4,07	2,60	1,00	1,00	6,67
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00	1,00	1,00	8,68
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00	1,00	1,00	12,03
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12	1,00	1,00	7,07
CRA 4 # 20-74	RIGIDO	26,36	1,38	1,00	1,00	27,74
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00	1,00	1,00	6,70
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52	1,00	1,00	7,02
CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	1,00	1,00	8,35
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	1,00	1,00	10,52
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	1,00	1,00	8,85
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	1,00	1,00	12,68
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	1,00	1,00	6,76
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	1,00	1,00	6,75
CRA 4 # 21	ASFALTO	6,47	3,45	1,00	1,00	9,92
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	1,00	1,00	9,80
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	1,00	1,00	17,47
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	1,00	1,00	9,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	1,00	1,00	4,93
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	1,00	1,00	7,70
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	1,00	1,00	2,10
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	1,00	1,00	8,25
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	1,00	1,00	16,55
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	1,00	1,00	8,30
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	1,00	1,00	9,65
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	1,00	1,00	12,77
TOTAL						304,53

En total fueron 304,53 ml ejecutados por el contratista en este periodo.

construsinaainterventoria@gmail.com

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	 Valledupar EN ORDEN Página 10 de 28

DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO e= 0,15 y 0,20 m					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05		89,10
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95		30,00
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00		12,00
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00		30,60
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60		10,58
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00		18,72
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00		20,06
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12		12,32
CRA 4 # 20i-74	RIGIDO	26,36	1,38		36,38
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00		11,10
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52		3,38
CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10		16,28
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36		19,26
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30		18,32
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80		33,74
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51		3,19
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50		3,13
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,47	3,45		22,32
TOTAL					390,47

En total fueron 390,47 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO MANUAL					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	0,1	1,52
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	0,1	2,05
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	0,1	2,77
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	0,1	1,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	0,1	1,83
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	0,1	2,09
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	0,1	7,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	0,1	0,85
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	0,1	0,60
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	0,1	1,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	0,1	0,10
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	0,1	1,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	0,1	4,32
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	0,1	2,77
TOTAL					33,93

En total fueron 33,93 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	 Página 11 de 28

RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05	0,15	13,37
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95	0,15	4,50
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00	0,15	1,80
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00	0,15	4,59
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60	0,15	1,59
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00	0,15	2,81
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00	0,15	3,01
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12	0,15	1,85
CRA 4 # 20I-74	RIGIDO	26,36	1,38	0,15	5,46
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00	0,15	1,67
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52	0,15	0,51
CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	0,15	2,44
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	0,15	2,89
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	0,15	2,75
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	0,15	5,06
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	0,15	0,48
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	0,15	0,47
CRA 4 # 21	ASFALTO	6,47	3,45	0,15	3,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	0,1	2,09
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	0,1	7,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	0,1	0,85
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	0,1	0,60
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	0,1	1,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	0,1	0,10
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	0,1	1,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	0,1	4,32
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	0,1	2,77
TOTAL					82,88

En total fueron 82,88 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

EXCAVACION MANUAL					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05	0,1	8,91
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95	0,1	3,00
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00	0,1	1,20
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00	0,1	3,06
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60	0,1	1,06
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00	0,1	1,87
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00	0,1	2,01
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12	0,1	1,23
CRA 4 # 20I-74	RIGIDO	26,36	1,38	0,1	3,64
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00	0,08	0,89
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52	0,1	0,34
CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	0,1	1,63
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	0,1	1,93
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	0,1	1,83

construsinainterventoria@gmail.com
construsinainterventoria@gmail.com
 Barranquilla-Atlántico

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 12 de 28

CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	0,1	3,37
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	0,1	0,32
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	0,1	0,31
CRA 4 # 21	ASFALTO	6,47	3,45	0,1	2,23
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	0,1	2,09
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	0,1	7,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	0,1	0,85
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	0,1	0,60
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	0,1	1,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	0,1	0,10
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	0,1	1,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	0,1	4,32
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	0,1	2,77
TOTAL					63,13

En total fueron 63,13 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA CALZADA EXISTENTE CARRETERAS				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05	89,10
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95	30,00
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00	12,00
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00	30,60
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60	10,58
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00	18,72
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00	20,06
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12	12,32
CRA 4 # 20I-74	RIGIDO	26,36	1,38	36,38
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00	11,10
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52	3,38
CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	16,28
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	19,26
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	18,32
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	33,74
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	3,19
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	3,13
CRA 4 # 21	ASFALTO	6,47	3,45	22,32
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	20,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	71,61
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	8,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	5,99
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	13,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	1,04
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	16,25
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	43,23
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	17,20
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	17,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	27,70
TOTAL				633,54

En total fueron 633,54 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

construsinaointerventoria@gmail.com

RELLENO GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05	0,1	8,91
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95	0,1	3,00
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00	0,1	1,20
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00	0,1	3,06
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60	0,1	1,06
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00	0,1	1,87
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00	0,1	2,01
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12	0,1	1,23
CRA 4 # 20-74	RIGIDO	26,36	1,38	0,1	3,64
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00	0,08	0,89
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52	0,1	0,34
CRA 4 # 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	0,1	1,63
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	0,1	1,93
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	0,1	1,83
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	0,1	3,37
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	0,1	0,32
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	0,1	0,31
CRA 4 # 21	ASFALTO	6,47	3,45	0,1	2,23
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	0,1	2,09
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	0,1	7,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	0,1	0,85
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	0,1	0,60
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	0,1	1,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	0,1	0,10
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	0,1	1,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	0,1	4,32
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	0,1	2,77
TOTAL					63,13

En total fueron 63,13 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO E-0,17 M: MR =600 PSI - 42 kg./ftm ² A LA FLEXIÓN. ACCELERADO A TRES (3) DIAS INCLUYE PASADÓRES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y BARRA DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO A 1.20 METROS DE SEPARACIÓN. (INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y CANASTILLA DE SOPORTE)					
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO				
CRA 4 #183-42	RIGIDO	22	4,05		89,10
CRA 4 ESQUINA CALLE 16 A	RIGIDO	10,17	2,95		30,00
CRA 4 # 16 A-29	RIGIDO	3	4,00		12,00
CRA 4 # 18B-40	RIGIDO	7,65	4,00		30,60
CRA 4 # 18B-62	RIGIDO	4,07	2,60		10,58
CRA 4 18b-4	RIGIDO	4,68	4,00		18,72
CRA 4 # 20-38	RIGIDO	10,03	2,00		20,06
CRA 4 # 20-87	RIGIDO	3,95	3,12		12,32
CRA 4 # 20-74	RIGIDO	26,36	1,38		36,38
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	3,7	3,00		11,10
CRA 4 # 21-16	RIGIDO	6,5	0,52		3,38

CRA 4# 22-15	RIGIDO	5,25	3,10	16,28
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	8,16	2,36	19,26
CRA 4 # 4-05 Asadero	RIGIDO	5,55	3,30	18,32
CRA 4 # 21	RIGIDO	8,88	3,80	33,74
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,51	3,19
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,25	0,50	3,13
CRA 4 # 21	RIGIDO	6,47	3,45	22,32
TOTAL				390,47

En total fueron 390,47 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO Y RIEGO)				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	15,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	20,54
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	27,69
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	14,54
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	18,30
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	20,95
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	71,61
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	8,45
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	5,99
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	13,50
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	1,04
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	16,25
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	43,23
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	17,20
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	17,16
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	27,70
TOTAL				339,31

En total fueron 339,31 m2 ejecutados por el contratista en este periodo.

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 2				
UBICACIÓN	TIPO DE CONCRETO			
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,83	2,22	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,42	3,20	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,55	7,80	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,46	3,26	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	3,2	5,72	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	6,65	3,15	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10,9	6,57	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	8,45	1,00	0,1
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	2,76	2,17	0,1

TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	2,70	0,1	1,35
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	1,3	0,80	0,1	0,10
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	5	3,25	0,1	1,63
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	13,3	3,25	0,1	4,32
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	4,3	4,00	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	7,3	2,35	0,1	1,72
TERMINAL A ENTRADA DE AEROPUERTO	ASFALTO	10	2,77	0,1	2,77
TOTAL					33,93

En total fueron 33,93 m3 ejecutados por el contratista en este periodo.

1.2.2 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

La calidad de los materiales que se han usado son de buena calidad y el contratista ha presentado las diferentes fichas técnicas en informes anteriores.

1.2.2.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo el contratista presento los ensayos realizados a los materiales de sùbase y asfalto utilizados en las obras.

De acuerdo a lo presentado se evaluó y se concluyó que los materiales utilizados cumplen con la norma y son aptos para la construcción de pavimentos flexible y rígidos.

Se anexa copia de resultados de ensayos.

1.2.3 CLIMATOLOGIA

 CONSTRUCCIONES SINAI	CONSTRUCCIONES SINAI S.A.S															 VALLEDUPAR en Orden																
	PROYECTO:REHABILITACION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO PRMEZCLADO MR= 4.2 MPA Y/O MEZCLA DENSA EN CALIENTE																															
	TIPO MDC-2, REPRACIONES DE ANDENES Y BORDILOS EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR																															
CONTRATO No	956 DE 2020		CONTRATANTE		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					SECTOR		VALLEDUPAR		MES		FECHA		15	12	20												
CLIMA																																
DIA	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																	
LLUVIAS																																
LLUVIAS MODERADAS																																
S: SECO LL:LLUVIAS M: LLUVIAS MODERADAS																																

1.3 INFORME ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	SEMANA 5		
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable 	X		
El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		

1.3.1.1 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

RELACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL, CONFORMACION DE BRIGADA Y SEÑALIZACION EN OBRA:

No.	ELEMENTO	TIPO	UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION
1	EXTINGUIDOR	SI	SI	NO	NO
2	CARTELERA INFORMATIVA	SI	SI	SI	NO
3	BRIGADAS TELEFONOS	NO	NO	NO	NO

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	 VALLEDUPAR EN ORDEN Página 17 de 28

3	PORTA CARNETS	NO	NO	NO	NO

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
<i>Dotación completa</i>	x			
<i>Buen estado</i>	x			
<i>Uso según zona de trabajo</i>	x			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
<i>Dotación completa</i>	X			
<i>Buen estado</i>	x			
<i>Fácil acceso y operación</i>	x			
<i>Uso según zona de trabajo</i>	x			
<i>Existencia de elementos primero auxilios</i>	X			
MAQUINARIA - EQUIPO				
<i>Estado del equipo</i>	X			
<i>Regularidad del mantenimiento</i>		X		
<i>Vibraciones /Ruidos</i>	x			
<i>Protecciones / Guardas / Frenos</i>	x			
<i>Idoneidad operarios</i>	x			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN				
<i>Uso permanente</i>	x			
<i>Uso según zona de trabajo</i>	x			
<i>elementos de bioseguridad</i>	X			
VIGILANCIA				
<i>Personal suficiente</i>	X			
<i>Diurna</i>	N. A			
<i>Nocturna</i>	N. A			
CENTRO DE ATENCION INMEDIATA				
<i>Convenio centro de asistencia</i>	x			
<i>Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP</i>	x			

GESTION HSE EN OBRA

INDICADORES HSE			
Total, de HHTT PERIODO:	0	Total, HHTT acumuladas:	0

construsinaointerventoria@gmail.com

Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el periodo:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo del periodo:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
NO SE PRESENTO ACCIDENTE DURANTE ESTE PERIODO			

1.1.1.1 GESTION AMBIENTAL EN OBRA

SEÑALIZACIÓN									
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	1	Capacitación Personal	X			X			
	2	Demarcación del perímetro	X			X			
	3	Zonificación de la obra	X				X		
	4	Lona de Cerramiento	X		X				
	5	Cinta de Reflectaba	X			X			
	6	Señales Informativas preventivas y	X			X			
	7	Uso de Paleteros	X				X		
	8	Iluminación Nocturna	X				X		

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	Capacitación del Personal	X			X			
	2	Mantenimiento Preventivo	X				X		
	3	Definición de Horarios de trabajo	X			X			
	4	Ficha de control de actividades	X			X			
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X				X		
	6	Elementos de protección personal	X			X			
	7	Extintores	X			X			
	8	Medidas de Contingencia	X			X			

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR EN ORDEN
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	
		Página 20 de 28

1.4.2 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

1.4.2.1 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

RELACION DE ACTAS Y COMITES			
1	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
1	ACTA MODIFICATORIA No 1	24 DE NOVIEMBRE DE 2020	SE REALIZO MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES EN EL PRESUPUESTO INICIAL POR EL AUMENTO DE CANTIDADES DE ASFALTO EN LAS ZONAS A INTERVENIR. SE HIZO LA MODIFICACION PARA TENER UN BALANCE CON EL MISMO VALOR DEL PRESUPUESTO INICIAL.
2	COMITÉ DE OBRA No 1	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	<ul style="list-style-type: none"> - SE EXIGIO AL CONTRATISTA PROGRAMACION DE OBRA, PMT, LAS 4 CUADRILLAS EN OBRA - REVISION DE LAS ZONAS A INTERVENIR - REVISION DE BALANCE DE OBRA

1.4.2.2 COPIA DE LA BITACORA

Se coloca a disposición copia de la bitácora de obras de este periodo laboral, se anexan las respectivas copias a continuación:

construsinaointerventoria@gmail.com
construsinaointerventoria@gmail.com
 Barranquilla-Atlántico


 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAÍ	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	 Página 21 de 28

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Después de la información contenida anteriormente en el informe se puede decir:

1. se puede observar un avance del 68,99%, de ejecución frente a un 67,71% programado lo que refleja que existe un adelanto de un 1,28%, mostrando un avance por arriba de la programación de ejecución de obras propuesto por el contratista en su reprogramación del balance final.
2. Se recomienda no bajar el ritmo de trabajo para que se logre desarrollar las obras en el tiempo estipulado, del cual solo quedan 10 días calendarios.
3. En el frente de la avenida simón bolívar se lleva un avance de 100%, del total de las actividades contempladas en dicho frente de labores.
4. En él los frentes de pavimento rígido se lleva ejecutado en este periodo de 2334,07 m2, para un avance de 66,7% del ítem presupuestal.
5. El contratista cuenta con el total de las cuadrillas propuestas en el proyecto, por lo cual se recomienda que siga con igual o mayor número de cuadrillas y seguir aumentando el rendimiento.
6. Se le recomienda al contratista un buen mantenimiento de los equipos en obras, puesto que algunas veces se han retrasados las actividades por daños en los mismo.
7. Mejorar el sistema de señalización en los frentes que se intervengan.
8. Las obras ejecutadas serán recibidas si se encuentran en buenas condiciones y sin ningún tipo de afectación.

Aprobación del Informe:

Elaboró:  EDWIN GARRIDO LUNA INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	Aprobó:  VICTOR LOPEZ DE DIRECTOR DE OBRA
--	--

4

 CONSTRUCCIONES SINAÍ	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR <small>EN ORDEN</small>
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 29 de 29

BITACORA


~~construsinaíinterventoria@gmail.com~~
~~construsinaíinterventoria@gmail.com~~
Barranquilla Atlántico

Martes, 17. de Noviembre de 2020.


Hora: 8:00 am.

Asunto: En el día de hoy se da inicio al proyecto que lleva como objeto la rehabilitación de Placas en concreto rígido premezclado $M_r=4.2 \text{ Mpa}$ y/o Mezcla densa en caliente tipo Hdc-2, reparaciones de cordones y bordillos. En Vía urbana en el municipio de Tlaxiaco.


Se realizó recorrido en uno de los frentes a intervenir sobre la avenida Simón Bolívar, con el fin de plantear desde que punto se van a iniciar las obras, el cual se tomó el punto Svr-norte en el sentido del flujo vehicular, en el punto de Supertrámula Olmeca. Todo esto se llevó a cabo en la presencia de, Director de la obra, Ingeniero Interventor, Ingeniero residente, Inspector de obra, Supervisor(a) Secretario de obras.



Contratista
Ing. Residente.



Interventor



Supervisor Alcaldía.

Miércoles, 18 de Noviembre de 2020.

Hora: 7:00am

Estado del tiempo: Nublado.

Personal de obra: Ingeniero residente, Director de obra, Ingeniero interventor, inspector de obra, Supervisión de alcaldía, Secretaria de obra, Operario de Motonradora; 2 (dos) operadores de Minicargador 1 (uno) operador de Vibrocompactador, 1 (uno) Operador de Volquete.

Equipo de Hoguera: Minicargador Vibrocompactadora, Cortadora. Bomba Emisora, Volquete, herramientas menores, Maestros de obra ayudantes de obra.

Actividades: Se Inician Con actividades de localización y replanteo de áreas a intervenir, se no se realiza de hitos, Vallas informativa y señalización.

• Se hizo demarcación en pintura de áreas replanteadas.

• Se hizo con equipo cortador, corte de áreas intervenidas.

• Demolición en Pavimento en un faltar.

• Retiro de Material sobrante.

• Excavación Manual de Material.

• Conformación y Nivelación de terreno con Motonradora.

• Relleno no necesario, la actividad no lo requiere.


• Impregnación con emulsión asfáltica. CRL-0.

• Fundida de Mezcla densa en caliente compactada.


• Limpieza general de áreas intervenidas.

El volumen de estulto compactado el día de hoy fue de $5,64 \text{ m}^3$ que se difiere en el siguiente cuadro.


x ~~hacer~~ Dibujo



El día de hoy se contr. con la presencia del alcalde del municipio de Valledupar, la secretaria de obras públicas y miembros del consejo municipal.


Contralista
Ing. residente.


Interventor


Supervision Alcaldia

Contratista

Contratista

Jueves, 19 de Noviembre de 2020.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal de obra: Ingeniero residente, Director de obra, Ingeniero Interventor, Inspector de obra, Supervision de alcantarilla, tecnico operativo, operaria de Maquinaria: 1(cno) operador de minicargador 1(cno) operador de vibracompactor, 1(cno) operador de Volquete. Equipo de Maquinaria: Minicargador, Vibracompactor, Cortadora, Bomba fregadora, Volquete, herramientas menores, Muebo obra, Aducatas


Actividades: Se inician con actividades de localización y replanteo de area a intervenir, se usan señales de tránsito, Vallas informativas y señalización

- Se hizo demarcación en pintura de area replanteadas
- Se hizo corte de area demarcadas.
- Remoción de Pavimento a intervenir.
- Retiro de Material Sobrante
- Ex curacion Huel de Material
- Conformacion y nivelación de terreno con Maquinaria.
- Relleno. Gravel de Area Intermedias.
- Impiacion con emulsion asfaltica CEL-O.
- Indidua de Mezcla densa. en Caliente Compactada.

• Limpieza general de una intersección.

• El volumen de asfalto compactado fundido el día de hoy es de 5.72 m^3 que se define en el siguiente dibujo.

Se hizo también un recorrido para verificar las medidas de las tramas siguientes a intervenir el cual fueron ya tratadas.



[Signature]

Contratista
Ing. Residente

[Signature]

Interventoria

Supervisión alcaldía

Contratista

Contratista


Viernes, 20 de Noviembre de 2020.

Estado del tiempo: Despejado.

Personal de obra: Ingeniero residente, Director de obra, Ingeniero Interventor, Inspector de obras, Supervisión de alcaldía, Técnico operativo de alcaldía. Operarios de Maquinaria, 1 (uno) operador de Minicargador, 1 (uno) Vibrocompactador, 1 (uno) operador de Volqueta. Equipo de Maquinaria: Minicargador, Vibrocompactador, Cortadora, Bomba fumigadora, Volqueta, herramientas menores, Muestra de obra, Ayudante de obra. Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo de áreas a intervenir, se usó Señales de tránsito Valla informativa y señalizadores.

• Se hizo demarcaciones en pintura de áreas replanteadas.
• Se hizo corte de áreas demarcadas.

- Demolicion de Pavimento a intervenir.
- Retiro de material existente.
- Excavacion manual de material.
- Conformacion y nivelacion de terreno con Maquinaria.
- Relleno gruelo de area intervenidas.
- Impresion con emulsion asfaltica. CRL-0.
- Aplicacion de Mezcla densa en caliente compactada.
- Limpieza general de area intervenidas.
- El Volumen de asfalto compactado finalizado el dia de hoy es de $6m^3$ que se define en el siguiente dibujo.
- Se hizo recordo para hacer los temas para intervenir el dia de mañana.



[Signature]

Contratista.
Sr. Presidente.

[Signature]

Interventor

Supervision alcaldia

Contratista

Contratista

Sabado, 24 de Noviembre de 2020.

Estado del tiempo: Despejado.

personal de obra: Ingeniero residente, Director de obra, Ingeniero inter-
venor, Inspector de obra, Supervision de alcaldia, tecnico operativo de
alcaldia, operarios de Maquinaria, 2(dos) operador minicargador, 1(unos) ope-
rador de Vibro compactador, 1(unos) operador de Volquete, Maestros de obra y
..... D. los de obra. Grupo de Maquinaria: Minicargador, Vibro compactador.

Cortadora, Bomba fumigadora, Volquete, herramienta menor.

Actividades: Se inició con actividades de localización y replanteo de áreas a intervenir, se usó señales de tránsito,allas informativas y señalizaciones.

• Se hizo demarcación en pintura de áreas replanteadas.

• Se hizo corte de áreas demarcadas.

• Demolición de pavimento a intervenir.

• Retiro de material sobrante.

• Excavación manual de material.

• Conformación y nivelación de terreno con maquinaria.

• Relleno granular de áreas intervenidas.

• Impregnación de emulsión asfáltica CEL-8.


• Fendida de Mezcla densa en caliente compactada.


• Limpieza general de áreas intervenidas.

• El Volumen de asfalto compactado fendido el día de hoy fue de 10,98 m³ que se define en el siguiente dibujo.

Se contó con la presencia de la secretaria de obras del municipio y el Ingeniero civil, donde hicieron la supervisión de los trabajos intervenidos haciendo las respectivas sugerencias sobre el trabajo a realizar.

x hacer dibujo


Intervenor.
Ing. residente.


Supervisor.
Carhuata

Supervisión alcaldía

Carhuata

Carhuata


Lunes, 23 de Noviembre de 2020.


Estado del Tiempo: Soleado. (Precipitación de Nuvia Palaforte).


Personal de obra: Ingeniero residente, Director de obra, Ingeniero Interventor, Inspector de obra, Supervisión de alcaldía, Técnica operativa de alcaldía, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria: Minicargador, Vibrocompactador, Cortadora, Bomba fumigadora, Volquete, herramientas menores, Operarios de Maquinaria: 2 (dos) Operadores Minicargador, 1 (uno) operador de Vibrocompactador, 1 (uno) operador Volquete.

Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo de áreas a intervenir, se usa señales de tránsito, vallas informativas y señalizaciones.

- Se hizo demarcación en pintura de áreas replanteadas.
- Se hizo corte de áreas demarcadas.
- Demolicion de pavimento a intervenir.
- Retiro de Material Sobrante
- Excavacion manual de material.
- Conformacion y nivelacion de terreno con maquinaria.
- Relleno granular de áreas intervenidas.
- Impregnacion de emulsion asfaltica CRL-0.
- Aplicación de Mezcla densa en caliente compactada.
- Limpieza general de áreas intervenidas.
- El Volumen de asfalto compactado aplicado el día de hoy es de 11.73 m^3 que se define en el siguiente dibujo.




Contralista


Interventor

Supervisión alcaldía

Técnico de obra

Contratista

Miércoles, 25 de Noviembre de 2020.

Estado del tiempo: despejado.

Personal de obra: Ingeniero residente, ingeniero Interventor, Inspector de obra, Asesor de alcaldía, Técnico operativo de alcaldía, Maestro de obra, Ayudantes de obra. Equipo de Maquinaria, Minicargador, Vibrocompactador, Compactador, Bomba fregadora, Volquete, herramienta menor, operador de Maquinaria, 2 (dos) operadores de Minicargador, 1 (uno) operador de Vibrocompactador, 1 (uno) operador de Volquete.

Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo de áreas a intervenir, se ma señales de tránsito, Vallas informativas y señalizaciones.

- Se hizo demarcación en pintura de áreas replanteadas
- Se hizo corte de áreas demarcadas.
- Remoción de pavimento a intervenir
- Retiro de Material Sobrante.
- Excavación manual de Material
- Conformación y mezcla de terreno.
- Relleno granular de áreas a intervenir
- Impresión de emulsión asfáltica CBL-0
- Finalización de Mezcla de base en tablero compactador

• Limpieza general de obra Intervenida.

• El volumen de asfalto Comportada desde el día de hoy es de $11.45 m^3$. Representada en el dibujo.

• Se actúa en este hito que en este día se hizo la decisión por parte de la Supervisión de alcaldía No intervenir los siguientes hitos debido a que no eran tramos críticos son los siguientes:

1 hito ($0.187 \times 1.72 \times 0.10$) → Ora 19# 4C Esquina Sentido Sur-norte


2 hito. ($1.27 \times 9.45 \times 0.10$) → Ora 19# 2C-15 Sentido Sur-norte

3 hito ($8.114 \times 1.68 \times 0.10$) → Ora 19# 1C Esquina Sentido Sur-norte

4 hito ($1.65 \times 6.50 \times 0.10$) → Frente Puente pedazo acordeon sentido Sur-norte.

5 hito ($3.04 \times 2.80 \times 0.10$) → Frente Puente pedazo acordeon sentido Sur-norte

6 hito ($1.56 \times 3.60 \times 0.10$) → Pedazo de acordeon Sentido Sur-norte



La interventoría exige al contratista las 4 condiciones. Sebo tienen con


Contratista

Interventoría

Supervisión alcaldía

Técnico de obra
alcaldía

Contratista



Jueves, 26 de Noviembre de 2020.

Estado del tiempo: despejado.

personal de obra: Ingeniero residente, Intendente, Inspector de obra, supervisor alcala, tecnico operador, de alcala, Muestrero de obra, Ayudantes de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador, Vibro Compactador, Cortadora, Bomba fumigadora, Volquete, Herramientas menores; Operarios de Maquinaria. 2(dos) operadores de Minicargador (uno) operador de Vibrocompactador, 2(dos) operadores de Volquete.

Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo de areas a intervenir, se usa señales de tránsito, vallas informativas y señalizaciones.

- Se hizo demarcación de pintura
- Se hizo corte de areas demarcadas.
- Demolicion de pavimento a intervenir
- Retiro de Material Suento
- Excavacion Manual de Material
- Compactacion y nivelacion de terreno
- Relleno gruelo de areas a intervenir.
- Imprimacion con emulsion CEL-O.
- fundida con Mezcla densa en caliente compactada.
- Limpieza General de area a intervenir.

El volumen de asfalto Compactado fundido el día de hoy es de $10.07 m^3$.

x

[Signature]
Centenario

[Signature]
Intendencia

Supersan Alcatraz

Técnico de obra
alcatraz


Centenario

Sábado, 28 de Noviembre de 2020.

Estado del tiempo: Despejado.

Personal de obra: Ingeniero residente, Intendencia, Inspector de obra, Supervisor de alcatraz, técnico operativo, de alcatraz, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria: Minicargador, Vibro compactador, Cortadora, Bomba fumigadora, Volquete, Herramienta menor, operarios de Maquinaria, 2 (dos) operadores de Minicargador, 1 (uno) operador de Vibro compactador, 2 (dos) operadores de Volquete. Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo de áreas a intervenir, se pinta señales de tránsito, Vallas informativas y señalización.

- Se hizo demarcación con pintura
- Se hizo corte de áreas demarcadas
- Demolición de pavimento a intervenir
- Retiro de Material sobrante
- Excavación manual de Material
- Conformación y nivelación de terreno
- Relleno Gravel de área a intervenir
- Imprimación con Emulsion CRL-0
- Fondeada con Mezcla de arena en caliente Compactada
- Limpieza General de áreas
- El volumen de asfalto compactado fondeado es de 7.96 m³.


Contralista


Interventor

Supervisión alcaldía

Técnicos obra
alcaldía

Contralista

Lunes, 30 de Noviembre de 2023.

Estado del tiempo: Despejado

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor, Supervisor de
alcaldía, inspectores de obra, Técnico de obra alcaldía, Muestrero
de Obra, Ayudantes de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador,
Vibrocompactador, Catadora, Bomba fumigadora, Volquete, Herrero
menor, operarios de Maquinaria, 2do operador de Minicor-
gador, (uno) operador de Vibrocompactador, (uno) operador de Vol-
quete, presencia del Director de Interventoría.

Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo
de áreas a intervenir de una Señales de tránsito, Vallas maxima-
rias, Señalizaciones.

- Se hizo demarcación Con pintura
- Se hizo corte de áreas intervenidas
- Perforación de pavimentos
- Retiro de Material sobrante
- Excavación manual de Material
- Conformación y nivelación de terreno
- Relleno granular de area de intervenir
- Impresión con Emulsion Cel-0
- Acabado con mezcla densa compactada

- Impieza general de obra.
- El Volumen de asfalto compactado fndrda es de $5,89 \text{ m}^3$.

[Signature]

Contratista

[Signature]

Interventoria

Supervision alcaldia

Tecnico de obra
alcaldia

Director de Interventoria

Monte, 01 de diciembre de 2020.

Estado del tiempo: Despejado.

Personal de obra: Ingeniero residente, interventoria, supervision de alcaldia, Inspector de obra, Maestro de obra, Ayudantes de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador, Vibro compactador, Lintadora, Bomba fumigadora, Volqueta, herramienta menor, operarios de Maquinaria, 2 (dos) operarios de Minicargador, 1 (uno) operario de Vibro compactador, 1 (uno) operario de Volqueta.

Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo de ang. de intersección, señales de tránsito, valla informativa.

- Se hizo demarcación con pintura.
- Se hizo corte de mesa intersección.
- Demarcación de pavimentos.
- Retiro de material sobrante.
- Excavación manual de material.
- Conformación y nivelación de terreno.
- Rellenos grandes de masa a intervenir.
- Impermeación con emulsión A.L.O.
- Acabado con mezcla densa compactada.

• Limpieza general de obra

• El Volumen de asfalto Compactado fudido es de 8,81 m³

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* Contributo

[Handwritten signature]

Interventoria

Supervision alcaldia

tecnico de
obra

* Contributo

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

Estado del Tiempo: Despejado AV. Simon Bolívar.

Personal de obra: Ingeniero residente, interventor, supervisor de alcaldia, tecnico de obra de alcaldia, inspector de obra, Maestro de obra, Ayudantes de obra, Equipo de Hogar, Montacargas, Vibro compactador, Carretadora, Bomba Amigadora, Volqueta, herramienta menor, Operario de Maquinaria, 2do operario de Maquinaria, 1 (uno) Operario de Vibro compactador 2 cm, Operario de Volqueta.

Actividades: Se inicia con actividades de localización y replanteo de obra de Intervención. Se va señalizando de tránsito

Valles Informáticos,

Se hizo demarcación con pintura

• Remoción de pavimento

• Retiro de material sobrante

• Excavación manual de material

• Conformación y nivelación de terreno.

• Relleno granular de grava a intervenir

• Impregnación con emulsión C.E.L.O.

• Finitado con mezcla densa compactada.

• Limpieza general de áreas

• El Volumen de asfalto compactada finitida es de $5.87m^3$

AY. Terminal - Aeropuerto.

personal de obra: Ingeniero Residente, Intendente, Supervisor de obra, Jefe de obra, de alcaide, Inspector de obra, Maestro de obra, Contador, Bomba fumigadora, Volquete, Remolcador, vibracompactador, de Maquinaria, (uno) operador de minicargador, (uno) operador de Vibro-compactador, (uno) operador de Volquete.

Actividades: Se inicia con la construcción y replanteo de obra a intervenir. Se usa señalización de tránsito valla informativa.

• Se hizo demarcación con pintura.

• Demolición de Pavimento.

• Retiro de Material Sobrante

• Excavación manual de Material

• Conformación y nivelación de terreno.

• Relleno granular de grava a intervenir

• Impregnación con emulsión C.E.L.O.

• Finitado con mezcla densa compactada.

• Limpieza general de áreas.

• El Volumen de asfalto compactada finitida es de $5.87m^3$

Contrator

Intendente

Supervisor alcaide

Jefe obra
alcaide

Contable 1

Jueves, 3 de Diciembre de 2020.

Estado del tiempo: Despejado.

Personal de obra: Ingeniero residente intermedia, Supervisor de obra, Técnico de obra, alcaide, Inspector de obra, Muestra de obra, ayudantes, Equipo de Maguncia, Minicargador, Vibro compactador, Costador, Bomba fumigadora, Volquete remolcado menor, operarios de Maguncia, (4mo) operarios de minicargador 1mo operario de Vibrocompactador, 2 (dos) operarios de Volquete.

Actividades: Se inicia con la actividad de localización y replanteo de áreas a intervenir, se usa señalizaciones de tránsito. Valla informativa.

- Se hizo demarcación con pintura.
- Remoción de pavimento.
- Retiro de Material Suelto.
- Excavación manual de material.
- Conformación y nivelación de terreno.
- Relleno granular de área a intervenir.
- Imprimación con emulsión CRL-O.
- Fijada con mezcla densa compactada.
- Limpieza general de áreas.
- El volumen de asfalto compactado fijado es de 10.55 m^3 .

AV Termina Aeropuerto.

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor, Supervisor de obra, alcaide, Técnico de obra, alcaide, Inspector de obra, Muestra de obra, ayudantes, Equipo de Maguncia, Minicargador, Vibro compactador, 2 (dos) operarios de Volquete.

Actividades: Se inicia con la actividad de localización y replanteo de áreas a intervenir se usa señalizaciones de tránsito. Valla informativa.

- Se hizo demarcación con pintura.
- Remoción de pavimento.
- Retiro de Material Suelto.
- Excavación manual de Material.
- Conformación y nivelación de terreno.
- Relleno granular de área a intervenir.
- Imprimación con emulsión CRL-O.

- Fundida de mezcla densa compactada.
- Impierson general de area.
- El Vdemen de asfalto. Compactado. Fundido es de 11 m³

[Signature]
Contratista

[Signature]
Intendente

Supervisor alcaidia

Tenico obra

Vienes 4 Diciembre de 2020.

Estado del tiempo: Despejado. Avenida Simon Bolivar.

Personal de obra: Ingeniero residente, Intendente, Supervisor alcaidia, Tenico de obra alcaidia, Inspector de obra, Maestro de obra, Ayudantes, Equipo de Maquinaria Minicargador, Vibrocompactador, Cortadora, Bomba fumigadora, Volqueta, Herramienta menor, operarios de Maquinaria, (co)operados de minicargador, uno, operados de Vibrocompactador, (uno) operador de Volqueta.

Actividades: Se inicia con la actividad de localización y prepepar, de area a intervenir, Se usa señalizaciones de tránsito y otros informativos.

- Se hizo demarcacion con pintura
- Remoción de pavimento.
- Retiro de Material sobrante.
- Excavacion manual de Material
- Conformación y nivelación de terreno
- Relleno Granular
- Impiersones con emulsion CRL-0.
- Fundida con mezcla densa.

- Limpieza general del terreno.
- El Volumen de asfalto fundido es de $5,92 \text{ m}^3$.

Av. Terminal - Aeropuerto

Personal de obra: Ingeñer Residente, Interventor, Supervisor de albañilería, Técnico de Obra albañilería, Inspector de obra, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador, Vibracompactador, Cartera de Bomba, Furgueta, Volquete, herramienta menor operarios de maquinaria 1 uno operador de minicargador, uno operador de vibracompactador, 1 uno operador de volquete.

Actividades: Se inicia con la actividad de localización y replanteo de obra a intervenir se usa señalización.

- Se hizo demarcación con pintura.
- Remoción de pavimento.
- Retiro de Material sobrante.
- Excavación manual de material.
- Conformación y nivelación de terreno.
- Relleno granular de obra a intervenir.
- Impugnación en emulsión CRL-0.
- Fundida de Mezcla densa compactada.
- Limpieza general de terreno.

- El Volumen de asfalto fundido es de $2,51 \text{ m}^3$.
- Se hizo demolición de placa en concreto rígido.



Constructor


Interventor

Supervisión albañilería

Técnico de Obra

Subodo 5 de Diciembre de 2020. AV. Simon Bolivar.

Estado del tiempo: Despejado

Personal de obra: Ingeniero Residente, Interventor, Supervisión de Alcalde, Técnico de obra, Alcalde, Inspector de obra, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador, Vibrocompactador, Cariladora, Bomba fumigadora, Volquete, Herramienta menor, Operarios de Maquinaria, (uno) operador de Minicargador, (uno) operador de Vibrocompactador, (uno) operador de Volquete.

Actividades: Se inicia con la actividad de localización y replanteo, de áreas a intervenir, se usa señalización.

- Se hizo demarcación con pintura.
- Remoción de pavimento.
- Retiro de Material Sobrante.
- Excavación Manual de Material.
- Conformación y nivelación de terreno.
- Relleno granular de áreas a intervenir.
- Impregnación con emulsión CRLD.
- Fundida de Mezcla densa Compactada.
- Limpieza general de terreno.
- El Volumen de asfalto fundido es de $8,31 \text{ m}^3$.

AV. Terminal - Aeropuerto.

Personal de obra: Ingeniero Residente, Interventor, Supervisión de Alcalde, Técnico de obra, Inspector de obra, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador, Vibrocompactador, Cariladora, Bomba fumigadora, Volquete, Herramienta menor, Operarios de Maquinaria, (uno) operador de Minicargador, (uno) operador de Vibrocompactador, (uno) operador de Volquete.

Actividades: Se inicia con actividad de localización y replanteo, de áreas a intervenir, se usa señalización.

- Se hizo demarcación con pintura.
- Remoción de pavimentos.
- Retiro de Material Sobrante.
- Excavación manual de material.
- Conformación y nivelación de terreno.
- Relleno granular de áreas a intervenir.

- Impresión con emulsión C.E.L.O.
- Fijación de Mezcla densa Compactada.
- Limpieza general de terreno.
- El Volumen de asfalto fijado es de $8,49 m^3$

Concreto Rígido Panamá.

Personal de obra: Ingeniero Residente, Interventor.


Supervisión de alcalde, técnicos de obra alcalde.

Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de


Hojas, Minicargador, Volquete, Herramienta mena

Actividades: Se inicia con localización y replanteo de obra al terreno.

- Corte de concreto
- Perforación de obra de concreto
- Retiro de Material Suavizado
- Relleno granular
- Nivelación y compactación de terreno.
- Fijación de Concreto rígido de capas intermedias.
- Colocación de hierro de refuerzo.
- Aplicación de Anhidrido.
- Concreto rígido fijado es de $60 m^2$.


Contralista

Supervisión alcalde


Interventor

León de los

Domingo 6 de Diciembre de 2020.


Estado del tiempo: despejado.

Personal de obra: Ingeniero residente, Interentini, Supervisor de alcatilla, Técnico de obra, Alcatilla, Maestro de obra, Ayudantes de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador vibró compactada, Volquete, Carretadora, Bomba Empujadora, Herramienta menores, Operarios de Maquinaria, 2 (dos) operadores de Minicargador, 1 (uno) operador de Volquete, 2 (dos) operadores de Volquete.

Actividades: Se inicia con actividades de nivelación, localización y replanteo.

- Se hizo demarcación con pintura
- Remoción de pavimento.
- Retiro de Material Suelto
- Excavación manual de material.
- Conformación y Nivelación de terreno
- Relleno granular de áreas a intervenir
- Impermeabilización con emulsión (E.L.O.)
- Frío de Mezcla densa.
- Limpieza general de terreno


El volumen de asfalto frío es de 16,20 m³.


Ingeniero Residente.

Supervisor alcatilla


Interentini

Técnico de obra



Lunes, 7 de diciembre de 2020

Estado del tiempo: Despejado

Personal de obra: Ingeniero residente, Intenentaria, Supervisor de alcaldía, técnicos de obra, alcaide, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargadores, Volqueta, Vibrocompactador, Costadora, Bomba centrifuga, Herramienta mano, Operario de Maquinaria, 11mo operario de minicargador, 1mo Operario de Vibrocompactador, 1 Cond. operador de Volqueta

Actividades: Se inicia las actividades con localización y replanteo. Se usa señalización y vallas informativas


- Se hizo demarcación con pintura.
 - Demolicion de pavimento.
 - Retiro de Material Sobrante
 - Excavacion manual de material
 - Conformacion y nivelacion de terreno.
 - Impugnacion con Emulsion asf. 2-0.
 - finchada de Mezcla densa
 - Limpieza general de terreno.
 - 6 Volumen de asfalto finchado es de 12,29 m³.
- Concreto Rígido: Porque proximidad - Av. Salguero y Cra 4ta. con calle 8A.

Personal de obra: Ingeniero residente, Intenentaria, Supervisor de alcaldía, técnicos de obra, alcaide, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargadores, Volquetas, Herramienta mano.

Actividades: Se inicia con localización y replanteo de Área a intervenir.

- Corte de concreto
- Demolicion de area de concreto
- Retiro de Material Sobrante
- Relleno grava
- Nivelacion y Compactacion de terreno
- finchada de Concreto rígido de 15m intermedios
- Colocacion de hierro de Refuerzo
- Ad.

Concreto rígido fundido es de $154.82 m^2$.


Contrata


Intendencia

Separación alcalina

Jefes de obra

Miércoles 9 de Diciembre de 2020.

Al. Simon Bolívar.

Estado del tiempo: Despejado

Personal de obra: Ingeniero residente, Intendencia, Supervisor de
alcalina, Jefe de obra alcalina, Maestro de obra, Ayudante
de obra, Equipo de maquinaria, Minicargadores, Volquete
vibrocompactador, Contralora, Bomba fumigadora, Herramienta
menor, Operarios de Maquinaria y uno operador de minicargador
(uno) operador de Vibrocompactador, 2 Celos operados de
Volquete

Actividades: Se inicia de actividades con localización y replanteo.
Se usa localización y replanteo.

• Se hizo demarcación con pintura.

• Perforación de pavimento

• Retiro de Material Sobrante

• Excavación manual de material


• Construcción y nivelación de terreno.

• Imprimación con emulsión CEB

• Fundida de Mezcla densa

• Limpieza general de terreno

• El Volumen de asfalto fundido es de $8.19 m^3$




Concreto Rígido Cra 4ta, Porque Biodisponible y
Cra 4ta H44-86, Cra 4ta # 7B

Personal de obra: Ingeniero residente, intermunicipal,
Supervisión de alcaldía, Técnico de obra, albañil,
Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de
Maquinaria, Minicargadores Volquete, Vibrador compactador
manual, herramienta menor.

Actividades: Se inicia con localización y replanteo de
ares a intervenir.

- Corte de concreto
- Perforación de ares
- Replanteo de Material Substrato
- Relleno granular.
- Nivelación y compactación de terreno.
- Fundido de concreto rígido con intermedios
- Colocación de hierro de refuerzo
- Aplicación de Anísol.
- Concreto rígido fundido es de 210,4 m².


Contralista


Interveniente

Supervisión alcaldía

Técnico obra
Alcaldía

Jueves, 10 de diciembre de 2020.

AV. Simon Bolivar.

Personal de obra: Ingeniero residente, Intenentaria, Supervisor de alcaldia, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargadores, Volqueta, Vibrocompactadores, herramienta menor. Operarios de Maquina. 1 (uno) operador de minicargador. 2 (dos) operarios de volqueta. 1 (uno) operador de Vibrocompactador.

Actividades: Se inicia con las actividades de localización y replanteo. Se va señalización y valles informativos.

- Demarcación con Pintura
- Demolicion de pavimento
- Retiro de Material Sobrante
- Excavación manual de material
- Conformación y nivelación de terreno.
- Imprimación con emulsion CPL-0.
- fundida de Mezcla densa
- Limpieza general de terreno
- El volumen de asfalto fundido es de $7,94 \text{ m}^3$.

Concreto rígido. Cra 4ta, paquete Biosaludable Cra 4ta # 13B


Personal de obra: Ingeniero residente, Intenentaria, Supervisor de alcaldia, tecnico de obra alcaldia, Maestro de obra, Ayudantes de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador, Volqueta, Vibrocompactador, herramienta menor


Actividades: Se inicia con localización y replanteo

- Corte de concreto
- Demolicion de areas
- Retiro de material Sobrante
- Retiro Gravel
- Nivelación y Compactación de terreno.
- fundida de Concreto rígido
- colocación de hierro de refuerzo
- Aplicación de Ancl.

Concreto Rígido fundido es de $302,76 \text{ m}^3$

Actividades: Se inicia con localización y replanteo. Se
 tra seplas y rulos informativos.
 • Demolición de concreto
 • Retiro de Material Suelto
 • Excavación Manual de Material
 • Conformación y nivelación de terreno
 • Impresión de concreto rígido
 • Colocación de hierro de refuerzo
 • Aplicación de Ancho.
 profundidad de concreto rígido es de $131,56 m^2$.


 Contraloría


 Interventor

Supervisión al cobro

Tarea de obra

Sábado 12 de Diciembre de 2020

AV. Simon Bolívar

Estado del tiempo: Despejado


Personal de obra: Ingeniero Residente, Interventor, Supervisor al cobro,
 jefe técnico de obra albañilería, Maestro de obra, Ayudantes
 de obra, Grupo de maquinaria, Minicargador, Vibracompactador,
 Volquete, herramienta menor, Operador de maquinaria (uno)
 Minicargador, (uno) Operador de Vibracompactador, (uno) Volquete.
 Actividades: Se inicia en la actividad de localización y
 replanteo.

- Remoción con pátula
 - Demolición de pavimento
 - Retiro de Material Suelto
 - Excavación Manual
 - Conformación y nivelación de terreno
 - Impresión con emulsión asfáltica
 - Colocación de mezcla densa
 - Limpieza general
- La actividad es de $18,73 m^3$.

Gras # 12.
 Concreto rígido - para Biosolidable, Gra # 12, Gra # 8A.
 Personal de obra: Ingeniero visitante, Interventor, Supervisor
 de albañilería, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de
 Maquinaria, Plomero. Vibracompactador manual.
 Volquete, herramienta menor.

Acreditados: Se tiene actividad de los recursos y
 repuestos.

- Demolicion de concreto
- Retiro de Material sobrante
- Excavacion Manual de material
- Conformacion y nivelacion de terreno
- Fundido de Concreto
- Colocacion de lechos de refuerzo
- Aplicacion de Antisol
- Fundido Concreto rigido es de $147.23 m^2$.
- Corte de colocacion concreto.


 Contraloría



 Interventor

Supervision albañilería

Termino de
 obra

Domingo 13 de Diciembre de 2020

Se Realizo trabajo de Demolicion y retiro de escombros
 y material sobrante en la Cra 11 de Calle 19 a Calle
 20.


 Contraloría

Interventor

Supervision albañilería

Lunes 24 de diciembre de 2020.

Al señor B.D. por.

Estado del tiempo: Despejado

Personal de obra: Ingeniero Residente, Interventor, Supervisor de obra, Técnico de obra, Ayudante de obra, Maestro de obra, Equipo de Maquinaria Minicargadora, Vibracompaetadora, Volqueta. Operadores de Maquinaria, uno Minicargadora, uno Vibracompaetadora, uno de Volqueta.

Actividades: Se inicia con actividad de localización y replanteo.

- Demolicion con piqueta
- Remoción de pavimento
- Retiro de material suelto
- Excavacion manual
- Conformacion y nivelacion de terreno
- Imprimacion con emulsion CR-0
- Anclaje de Matado densa
- Limpieza General
- Asfalto incluido es de $8106 m^3$

Concreto rigido Cra 11 entre calle 19 a 20 y calle 17 entre Cra 9 y 10.

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor, Supervisor de obra, Técnico de obra, Ayudante de obra, Maestro de obra, Equipo de Maquinaria Minicargadora, Vibracompaetadora, Volqueta.

Actividades: Se inicia con localización y replanteo

- Demolicion de concreto
- Retiro de Material Suelto
- Excavacion Manual
- Conformacion y nivelacion de terreno
- Anclaje de concreto
- Colocacion de nervios de refuerzo
- Aplicacion de Antisol
- Incluido de concreto rigido es de $203,77 m^2$
- Corte de la tarima de concreto

Libro
Contralista

Edwin
Interventor

Supervisión al Alcaldía

Técnico de obra
Alcaldía

Martes 15 de diciembre de 2020

Concreto rígido Club Valledupar. Cra 8 #12, Cra 4 #133
Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor
Supervisión de Alcaldía, Técnico de obra Alcaldía, Mucha
de obra, Ayudante de obra, Equipo Minicargador y
Volqueta, Herramienta menor

Actividades: Se inicia con fido de concreto y se
el día antes se había hecho el material y se había
nivelado y compactado el material.

El concreto fido es de $54,29 m^2$.

Se hizo limpieza de escombros en toda la Cra 4ta.

Libro
Contralista

Edwin
Interventor

Supervisión Alcaldía

Técnico de
obra

Miércoles 16 de Diciembre de 2020

AV. Samon Borrero

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor,
Supervisión de Alcaldía, Técnico de obra Alcaldía, Mucha
de obra, Ayudante de obra, Equipo de Minicargador
Minicargador, Vibro compactador, Camión, Volqueta
herramienta menor

Actividades: Se inicia con la actividad de labores
y replantes

- Demolición de pavimento.
- Retiro de material sobrante.
- Relleno grande
- Nivelación y compactación.

• Cemento Impuración C21-0

• Ancho de Mezcla densa

• Limpieza general

• Ancho húmedo es de $9,21 m^3$

Concreto rígido. Calle 24 entre Cra 14, 15 y 16.

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor, Supervisor

Alcalde, Maestros de obra, Ayudantes, Equipo de Maquinaria

Mixingueda Vibracompactador, Volquetes

Actividades. Se inicia con la actividad de localización y replanteo

• Demolición de concreto

• Retiro de Material Suelto

• Relleno granular

• Conformación y nivelación de terreno


• Ancho de Concreto

• Colocación de hierro distribuido

• Aplicación de Antisol.

• Corte de delimitación

• Concreto rígido fundido es de $251,58 m^2$.


Contralista


Interventora

Supervisor alcalde

Técnico de obra
Alcalde

Jueves, 17 de diciembre de 2020.

Estado del tiempo despejado AV. Pashona Concreto Rígido

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventora,

Supervisor alcalde, Técnico de obra, Maestros de obra,

ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Mixingueda

Vibro manual, Volquetes

Actividades. Se inicia con localización y replanteo

• Demolición de concreto

• Retiro de Material Suelto

• Relleno granular

• Conformación y nivelación de terreno


• Ancho de concreto

• Colocación de hierro

Aplicación de Antisol


• Corte dilatación Ancho

• Concreto rígido incluido es de $318,88 m^2$


Contrata


Interventor

Suprimen alcalia


Interventor

Numeros 18 de diciembre de 2020.

Concreto rígido AV. Pastena, Mercado publico

Estado del tiempo: Despejado

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor, Super-

visor de alcalia, Jefe de obra, Maestro de obra
guayante, Grupo de Maquinaria, Volquete, Muscicador

Actividades: Se inicia actividad de localización y
replanteo

• Demolicion de concreto

• relleno de Material suelto

• Relleno Granular

• Conformacion y purlas de fierro


• Formado de Concreto rigido

• Colocacion de malla de refuerzo

• Aplicacion de Antisol


• Corte dilatacion

• Concreto rigido incluido es de $269,29 m^2$.


Contrata


Interventor

Suprimen alcalia


Interventor

Subido s.a de diciembre de 2020

Av. terminada. Atempa.

Estado del tiempo: despejado

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor, Supervisor de obra, Jefe de obra, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Minicargador, Vibracompactador, Cortadora, Bomba Amigadora, Volquete.

Actividades: Se inicia con localización y replanteo

• Demolición de pavimento

• Remoción de pavimento

• Retiro de Material

• Relleno grande

• Conformación y nivelación

• Imprimación de C.B.T.

• Gravel mezclado

• Limpieza general

• Asfalto acabado a de 9.62 m²

Concepto a glosar: Calle 21 A17 y la intersección de calle 21 y Mercado

Personal de obra: Ingeniero residente, Interventor, Supervisor de obra, Jefe de obra, Maestro de obra, Ayudante de obra, Equipo de Maquinaria, Volquete, Minicargador, Vibracompactador.

Actividades: Se inicia con localización y replanteo

• Demolición de concreto

• Retiro de Material

• Relleno grande

• Conformación y nivelación de terreno


• Gravel mezclado


• Gravel mezclado de 213.29 m²

• Aplicación de Asfalto

• Colocación de huecos de drenaje

• Corte de drenaje


Interventor


Supervisor de obra

Supervisor de obra

Interventor

 CONSTRUCCIONES SINAI	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	
	INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES SINAI	 VALLEDUPAR <small>EN ORDEN</small>
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 16 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Página 30 de 30

ENSAYOS DE MATERIALES



construsinaainterventoria@gmail.com
construsinaainterventoria@gmail.com
 Barranquilla-Atlántico

INV-E-148

MATERIALS

FEGHA

Year	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

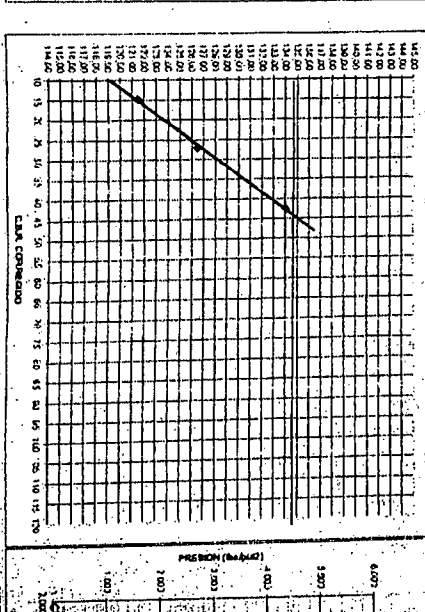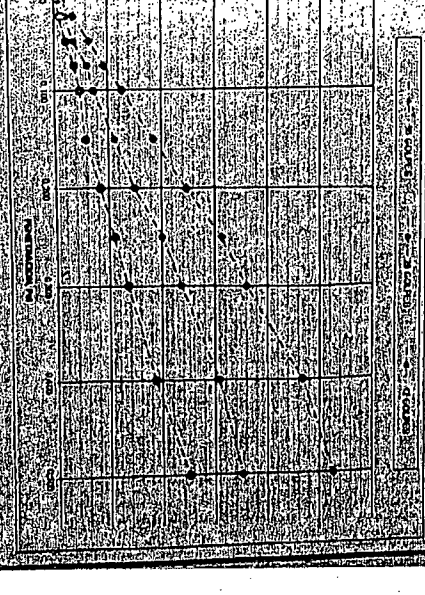[illegible]

CBR (0.100)	18.6%
CBR (0.200)	24.1%

16.8%	9.9%	2.3%	1.0%
16.7%	9.8%	2.3%	1.0%
16.6%	9.7%	2.3%	1.0%
16.5%	9.6%	2.3%	1.0%
16.4%	9.5%	2.3%	1.0%
16.3%	9.4%	2.3%	1.0%
16.2%	9.3%	2.3%	1.0%
16.1%	9.2%	2.3%	1.0%
16.0%	9.1%	2.3%	1.0%
15.9%	9.0%	2.3%	1.0%
15.8%	8.9%	2.3%	1.0%
15.7%	8.8%	2.3%	1.0%
15.6%	8.7%	2.3%	1.0%
15.5%	8.6%	2.3%	1.0%
15.4%	8.5%	2.3%	1.0%
15.3%	8.4%	2.3%	1.0%
15.2%	8.3%	2.3%	1.0%
15.1%	8.2%	2.3%	1.0%
15.0%	8.1%	2.3%	1.0%
14.9%	8.0%	2.3%	1.0%
14.8%	7.9%	2.3%	1.0%
14.7%	7.8%	2.3%	1.0%
14.6%	7.7%	2.3%	1.0%
14.5%	7.6%	2.3%	1.0%
14.4%	7.5%	2.3%	1.0%
14.3%	7.4%	2.3%	1.0%
14.2%	7.3%	2.3%	1.0%
14.1%	7.2%	2.3%	1.0%
14.0%	7.1%	2.3%	1.0%
13.9%	7.0%	2.3%	1.0%
13.8%	6.9%	2.3%	1.0%
13.7%	6.8%	2.3%	1.0%
13.6%	6.7%	2.3%	1.0%
13.5%	6.6%	2.3%	1.0%
13.4%	6.5%	2.3%	1.0%
13.3%	6.4%	2.3%	1.0%
13.2%	6.3%	2.3%	1.0%
13.1%	6.2%	2.3%	1.0%
13.0%	6.1%	2.3%	1.0%
12.9%	6.0%	2.3%	1.0%
12.8%	5.9%	2.3%	1.0%
12.7%	5.8%	2.3%	1.0%
12.6%	5.7%	2.3%	1.0%
12.5%	5.6%	2.3%	1.0%
12.4%	5.5%	2.3%	1.0%
12.3%	5.4%	2.3%	1.0%
12.2%	5.3%	2.3%	1.0%
12.1%	5.2%	2.3%	1.0%
12.0%	5.1%	2.3%	1.0%
11.9%	5.0%	2.3%	1.0%
11.8%	4.9%	2.3%	1.0%
11.7%	4.8%	2.3%	1.0%
11.6%	4.7%	2.3%	1.0%
11.5%	4.6%	2.3%	1.0%
11.4%	4.5%	2.3%	1.0%
11.3%	4.4%	2.3%	1.0%
11.2%	4.3%	2.3%	1.0%
11.1%	4.2%	2.3%	1.0%
11.0%	4.1%	2.3%	1.0%
10.9%	4.0%	2.3%	1.0%
10.8%	3.9%	2.3%	1.0%
10.7%	3.8%	2.3%	1.0%
10.6%	3.7%	2.3%	1.0%
10.5%	3.6%	2.3%	1.0%
10.4%	3.5%	2.3%	1.0%
10.3%	3.4%	2.3%	1.0%
10.2%	3.3%	2.3%	1.0%
10.1%	3.2%	2.3%	1.0%
10.0%	3.1%	2.3%	1.0%
9.9%	3.0%	2.3%	1.0%
9.8%	2.9%	2.3%	1.0%
9.7%	2.8%	2.3%	1.0%
9.6%	2.7%	2.3%	1.0%
9.5%	2.6%	2.3%	1.0%
9.4%	2.5%	2.3%	1.0%
9.3%	2.4%	2.3%	1.0%
9.2%	2.3%	2.3%	1.0%
9.1%	2.2%	2.3%	1.0%
9.0%	2.1%	2.3%	1.0%
8.9%	2.0%	2.3%	1.0%
8.8%	1.9%	2.3%	1.0%
8.7%	1.8%	2.3%	1.0%
8.6%	1.7%	2.3%	1.0%
8.5%	1.6%	2.3%	1.0%
8.4%	1.5%	2.3%	1.0%
8.3%	1.4%	2.3%	1.0%
8.2%	1.3%	2.3%	1.0%
8.1%	1.2%	2.3%	1.0%
8.0%	1.1%	2.3%	1.0%
7.9%	1.0%	2.3%	1.0%
7.8%	0.9%	2.3%	1.0%
7.7%	0.8%	2.3%	1.0%
7.6%	0.7%	2.3%	1.0%
7.5%	0.6%	2.3%	1.0%
7.4%	0.5%	2.3%	1.0%
7.3%	0.4%	2.3%	1.0%
7.2%	0.3%	2.3%	1.0%
7.1%	0.2%	2.3%	1.0%
7.0%	0.1%	2.3%	1.0%
6.9%	0.0%	2.3%	1.0%
6.8%	0.0%	2.3%	1.0%
6.7%	0.0%	2.3%	1.0%
6.6%	0.0%	2.3%	1.0%
6.5%	0.0%	2.3%	1.0%
6.4%	0.0%	2.3%	1.0%
6.3%	0.0%	2.3%	1.0%
6.2%	0.0%	2.3%	1.0%
6.1%	0.0%	2.3%	1.0%
6.0%	0.0%	2.3%	1.0%
5.9%	0.0%	2.3%	1.0%
5.8%	0.0%	2.3%	1.0%
5.7%	0.0%	2.3%	1.0%
5.6%	0.0%	2.3%	1.0%
5.5%	0.0%	2.3%	1.0%
5.4%	0.0%	2.3%	1.0%
5.3%	0.0%	2.3%	1.0%
5.2%	0.0%	2.3%	1.0%
5.1%	0.0%	2.3%	1.0%
5.0%	0.0%	2.3%	1.0%
4.9%	0.0%	2.3%	1.0%
4.8%	0.0%	2.3%	1.0%
4.7%	0.0%	2.3%	1.0%
4.6%	0.0%	2.3%	1.0%
4.5%	0.0%	2.3%	1.0%
4.4%	0.0%	2.3%	1.0%
4.3%	0.0%	2.3%	1.0%
4.2%	0.0%	2.3%	1.0%
4.1%	0.0%	2.3%	1.0%
4.0%	0.0%	2.3%	1.0%
3.9%	0.0%	2.3%	1.0%
3.8%	0.0%	2.3%	1.0%
3.7%	0.0%	2.3%	1.0%
3.6%	0.0%	2.3%	1.0%
3.5%	0.0%	2.3%	1.0%
3.4%	0.0%	2.3%	1.0%
3.3%	0.0%	2.3%	1.0%
3.2%	0.0%	2.3%	1.0%
3.1%	0.0%	2.3%	1.0%
3.0%	0.0%	2.3%	1.0%
2.9%	0.0%	2.3%	1.0%
2.8%	0.0%	2.3%	1.0%
2.7%	0.0%	2.3%	1.0%
2.6%	0.0%	2.3%	1.0%
2.5%	0.0%	2.3%	1.0%
2.4%	0.0%	2.3%	1.0%
2.3%	0.0%	2.3%	1.0%
2.2%	0.0%	2.3%	1.0%
2.1%	0.0%	2.3%	1.0%
2.0%	0.0%	2.3%	1.0%
1.9%	0.0%	2.3%	1.0%
1.8%	0.0%	2.3%	1.0%
1.7%	0.0%	2.3%	1.0%
1.6%	0.0%	2.3%	1.0%
1.5%	0.0%	2.3%	1.0%
1.4%	0.0%	2.3%	1.0%
1.3%	0.0%	2.3%	1.0%
1.2%	0.0%	2.3%	1.0%
1.1%	0.0%	2.3%	1.0%
1.0%	0.0%	2.3%	1.0%
0.9%	0.0%	2.3%	1.0%
0.8%	0.0%	2.3%	1.0%
0.7%	0.0%	2.3%	1.0%
0.6%	0.0%	2.3%	1.0%
0.5%	0.0%	2.3%	1.0%
0.4%	0.0%	2.3%	1.0%
0.3%	0.0%	2.3%	1.0%
0.2%	0.0%	2.3%	1.0%
0.1%	0.0%	2.3%	1.0%
0.0%	0.0%	2.3%	1.0%

Estado	Nº	1	2	3
Número de pólizas	43	26	10	
Días de tramitación	3	3	3	
Actores operativos totales	0	0	0	
Indicador de supervisión de día	0	0	0	
Indicador de supervisión de día	0	0	0	

[illegible]
