



NRO INT: 635313

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21068 De 25/06/2026 Por 5.955.370.401,00
PAGO FV - 12451 (TRANSPORTE) FV - 12449-FV - 12450 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 4347 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 18177 de 25/06/2026 C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 46 de *****CXP: NO
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. **C.C o Nit** 900188750

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 de 26/03/2026 Por 40.000.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Millones Trescientos **5.955.370.401,00**
Setenta Mil Cuatrocientos Un Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	517	4.174.317.589,65	2,50	104.357.940,00	294.897.846,00
RETEIVA	517	793.120.339,00	15,00	118.968.051,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2291	4.174.317.589,65	0,75	31.307.382,00	
RETEFUENTE	524	830.195.342,12	1,00	8.301.953,00	
RETEIVA	524	157.737.115,00	15,00	23.660.567,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	830.195.342,12	1,00	8.301.953,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 5.660.472.555,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 5169 **Fecha. 26/03/2026**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2024660010029	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	5.955.370.401,00

Total obligación 5.955.370.401,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
511114104	Elementos construccion, instalac., c:	4.967.437.943,88	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7739 CONTRATO DE SUMINI	
550705023	Comunicaciones y transporte	987.932.457,12	0,00	Acta de recibo PARCIAL 508674 CONTRATO DE SUMIN	
243605001	Servicios	0,00	8.301.953,00	Acta de recibo PARCIAL 508674 CONTRATO DE SUMIN	
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	8.301.953,00	Acta de recibo PARCIAL 508674 CONTRATO DE SUMIN	
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	23.660.567,00	Acta de recibo PARCIAL 508674 CONTRATO DE SUMIN	
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	31.307.382,00	ENTRADA POR COMPRA 7739 CONTRATO DE SUMINI	
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	104.357.940,00	ENTRADA POR COMPRA 7739 CONTRATO DE SUMINI	
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	118.968.051,00	ENTRADA POR COMPRA 7739 CONTRATO DE SUMINI	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	947.667.984,12	Acta de recibo PARCIAL 508674 CONTRATO DE SUMIN	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.712.804.570,88	ENTRADA POR COMPRA 7739 CONTRATO DE SUMINI	

Sumas Iguales 5.955.370.401,00 5.955.370.401,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	504.201.681,00	504.201.681,00
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CTOOBRA SUP 30 SMLV	672.268.908,00	672.268.908,00



NRO INT: 635313

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21068 De 25/06/2026 Por 5.955.370.401,00

PAGO FV - 12451 (TRANSPORTE) FV - 12449-FV - 12450 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 4347 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 18177 de 25/06/2026 C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 46 de ***** CXP: NO

33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	672.268.908,00	672.268.908,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	336.134.454,00	336.134.454,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	672.268.908,00	672.268.908,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461217193205-5379378-011036759

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18177**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4347

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificación 900188750 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	26/03/2026	Valor orden gasto	40.000.000.000
Fecha iniciación	27/03/2026	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	24.114.639.736
Fecha Terminación	31/12/2026	Valor acta	987.932.457
Duración	Hasta agotar el presupuesto asignado, contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2026, o lo que primero ocurra.		Saldo pendiente 14.897.427.807

OBJETO DEL CONTRATO:**Periodo de pago:**

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FV - 12451 (TRANSPORTE) CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 4347 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SEC	830.195.342	157.737.115
Total:		830.195.342	157.737.115
		Total recibido	987.932.457
		- Amortización de anticipo	
Valor Novecientos Ochenta Y Siete Millones Novecientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Pesos Con Doce Centavos M/Cte.			987.932.457
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 25/06/2026



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :508674

Impreso en: 25-JUN-26 09:31 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18177

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4347

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificación 900188750 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02461217171531-5379346-011036504



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7739

ENTRADA POR COMPRA 46

Fecha 25/06/2026

Proveedor 900188750 4347 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.
 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA,
 MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO
 NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
 PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
 INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Factura Nro. FV12449-12450

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2026
 Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
104011325	SUB BASE GRANULAR	327	MT3	112.562,00		5.876.871,00	0,00	36.807.774,85
104011317	BASE GRANULAR	2236,85	M3	130.929,00		46.760.522,00	0,00	292.868.534,10
104011296	EMULSION	1925	GL	33.113,00		10.177.377,00	0,00	63.742.523,27
104011295	MEZCLA ASFALTICA	3663,42	MT3	1.140.301,99		*****	0,00	4.177.405.131,59
104011326	GEOMALLA	11613,1	MT2	29.557,01		54.804.140,00	0,00	343.246.985,04
104011324	CEMENTO ASFALTICO	3460	MT3	15.423,98		8.520.778,00	0,00	53.366.979,80
104016169	AJUSTE AL CENTAVO	1	UN	15,23		0,00	0,00	15,23

Son :Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Siete Millones Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Cuarenta Y
 Tres Pesos Con Ochenta Y Ocho Centavos M/Cte.

4.967.437.943,88

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	4.967.437.943,88
-----	---	------------------

Observaciones PAGO DE FACTURA FV-12449-FV-12450 SEGUN CONTRATO SUMINISTRO 4347-2026

DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA

02461217165434-5379198-011036370



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 46

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4347

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificación 900188750 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	40.000.000.000
Fecha de firma	26/03/2026	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	19.147.201.792
Fecha iniciación	27/03/2026	Valor Entrada	4.967.437.943,00
Fecha finalización	31/12/2026	(-) Amort.Anticipo	0
Duración	Hasta agotar el presupuesto asignado, c	Saldo Pendiente	15.885.360.265

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 46

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	4.967.437.943,88
-----	---	------------------

Valor a cancelar Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Siete Millones Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte. **4.967.437.943,00**

Para constancia se firma en Pereira el 25/06/2026

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02461217171502-5379183-011036501

DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA

02461217165441-5379183-011036371



AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Nit: 900188750-8

KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA -
SANTUARIO

Teléfono: 606-3450060

Celular: 3128905408

SANTUARIO



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

RUCOM-201707289642

Número **FV - 12451**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764107339122 del 18/03/2026 Hasta el 18/03/2028 del No FV 12.001 al No FV 14.000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nit / C.C.:	891480030	Fecha y hora de expedición	23/06/2026 12:07 p. m.
Dirección:	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	Fecha y hora validación DIAN	23/06/2026 12:10 p. m.
Ciudad:	PEREIRA	Fecha de vencimiento	26/06/2026
Teléfono:	3248230		

Correo electrónico tesoreria@pereira.gov.co; recepcionfacturas@agreoccidente.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
TR47	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL MDC, SUBBASE, BASE,ETC....	1	MKM	830.195.341,70	19%	830.195.341,70

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 DEL 2026 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGR

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S, Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogota cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No.127569997266.

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como aceptada.

Factura electrónica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

VALOR ANTES DE IVA:	830.195.341,70
I.V.A	157.737.114,92
DESCUENTO:	0,00
TOTAL FACTURA:	% 987.932.456,62
RETEFUENTE:	% 0,00
RETEIVA:	% 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	987.932.456,62

Elaborado por:
BELKIS PEÑA

Aceptado por: MUNICIPIO DE PEREIRA
891480030

Código CUF: 3b990f69a363be16b8aa6b1038ecbd11fcf47877037cc23747c7ac537df9a08957c59d9bcc505ccd0cabbfc746fd89b9





AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Nit: 900188750-8

KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA -
SANTUARIO

Teléfono: 606-3450060

Celular: 3128905408

SANTUARIO



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

RUCOM-201707289642

Número **FV - 12450**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764107339122 del 18/03/2026 Hasta el 18/03/2028 del No FV 12.001 al No FV 14.000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nit / C.C.:	891480030	Fecha y hora de expedición	23/06/2026 12:05 p. m.
Dirección:	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	Fecha y hora validación DIAN	23/06/2026 12:10 p. m.
Ciudad:	PEREIRA	Fecha de vencimiento	26/06/2026
Teléfono:	3248230		

Correo electrónico tesoreria@pereira.gov.co; recepcionfacturas@agreoccidente.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
MP03	SUB-BASE GRANULAR	327	M3	94.589,92	19%	30.930.902,52
MP04	BASE GRANULAR	2236,85	M3	110.024,37	19%	246.108.011,47

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 DEL 2026
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES
PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS DIFERENTES PROGR

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S, Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogota cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No.127569997266.

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como aceptada.

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

VALOR ANTES DE IVA:	277.038.913,99
I.V.A	52.637.393,66
DESCUENTO:	0,00
TOTAL FACTURA:	% 329.676.307,65
RETEFUENTE:	% 0,00
RETEIVA:	% 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	329.676.307,65

Elaborado por:
BELKIS PEÑA

Aceptado por: MUNICIPIO DE PEREIRA
891480030

Código CUFE: 0b1cc06456e413a2618bb7b44884cfd3fc455979d6ef7880df2f23444a4659f316d1778f3474b02ec16395d33c8ef3e7





AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Nit: 900188750-8

KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA -
SANTUARIO

Teléfono: 606-3450060

Celular: 3128905408

SANTUARIO



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

RUCOM-201707289642

Número **FV - 12449**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764107339122 del 18/03/2026 Hasta el 18/03/2028 del No FV 12.001 al No FV 14.000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nit / C.C.:	891480030	Fecha y hora de expedición	23/06/2026 11:50 a. m.
Dirección:	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	Fecha y hora validación DIAN	23/06/2026 12:10 p. m.
Ciudad:	PEREIRA	Fecha de vencimiento	26/06/2026
Teléfono:	3248230		

Correo electrónico tesoreria@pereira.gov.co;repcionfacturas@agreoccidente.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
OT02	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO	1925	gl	27.826,05	19%	53.565.147,06
RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3	3663,42	M3	958.236,97	19%	3.510.424.498,18
RI161	GEOMALLA BIAxIAL M2	11613,05	M2	24.837,82	19%	288.442.788,95
RI204	CEMENTO ASFALTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	3460	kg	12.961,34	19%	44.846.252,10

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347 DEL 2026 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMA S Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PERERIA

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S, Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogota cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No.127569997266.

Si dentro de los ocho (8) primeros dias habiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entendera como aceptada.

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

VALOR ANTES DE IVA:	3.897.278.686,29
I.V.A	740.482.950,40
DESCUENTO:	0,00
TOTAL FACTURA:	% 4.637.761.636,69
RETEFUENTE:	% 0,00
RETEIVA:	% 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	4.637.761.636,69

Elaborado por:
BELKIS PEÑA

Aceptado por: MUNICIPIO DE PEREIRA
891480030

Código CUFE: 34d3424fb49c33093e36fb8de8c24b627a857c5de33cfbdac3ee7827534340a7c2cf78cf1df762ce12fddb27eb899102



Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL Y
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS**

Junio de 2026

Doctora
DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

Asunto: Informe de ejecución *TERCER* corte del **contrato No. 4347 de 2026**, “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETOS PREMEZCLADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA DE PEREIRA”, suscrito con AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S Nit. 900.188.750-8, representada legalmente por Juan Sebastián García Henao identificado con cedula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del Contrato No. 4347 de 2026 suscrito con Agregados Del Occidente De Risaralda S.A.S, identificado con Nit 900.188.750-8.

Información general del contrato:

Contrato:	No. 4347 de 2026
Nombre e identificación del Contratista:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S NIT. 900.188.750-8, REPRESENTANTE LEGAL POR JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N°1.088.291.689 DE PEREIRA

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Objeto:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETOS PREMEZCLADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PEREIRA
Valor Inicial:	\$ 40.000.000.000 ,00
Valor total ejecutado:	\$ 25.102.572.193,14
Saldo:	\$ 14.897.427.806,86
Duración:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
Plazo:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
Fecha de Inicio	27 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

Apropiación presupuestal

Compromiso presupuestal N°5169	
Fecha de expedición	26/02/2025
Rubro:	2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinarias y equipos.
Proyecto:	2020660010089 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Centro de costos:	1107Secretaría de Infraestructura
Fondo:	824 Recursos del balance Fondos Comunes 101 Fondos comunes 428 Excedentes Financieros
Valor:	\$ 40.000.000.000 ,00

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Ítems de Suministro de Materiales Contemplados en el contrato, condiciones técnicas y valores individuales:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1	MDC-10 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m³	\$ 1.164.899
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m³	\$ 1.140.302
3	M-GCR-12 vs mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería con grano de caucho reciclado vía seca	m³	\$ 1.157.269
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70Subbase tipo A	Kg	\$ 15.424
5	Sub Base tipo A	m³	\$ 112.562
6	Base tipo A	m³	\$ 130.929
7	Geomalla Biaxial	m2	\$ 29.557
8	Emulsión Asfáltica CRL-1	Galón	\$ 33.113
9	Servicio de transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a diferentes sectores del Municipio	m³xKm	\$ 3.000
10	Pintura base solvente acrílica para demarcación vial	Galón	\$ 443.898
11	Microesferas de vidrio para demarcación vial	Kg	\$ 33.387
12	Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos	Galón	\$ 381.313
13	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m³	\$ 873.535
14	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	m³	\$ 978.504
15	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 días.	m³	\$ 1.068.525
16	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m³	\$ 927.098

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

17	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	m³	\$ 1.037.083
18	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 días	m³	\$ 1.124.172
19	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m³	\$ 976.343
20	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	m³	\$ 1.085.114
21	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 días	m³	\$ 1.173.142
22	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 días	m³	\$ 1.044.715
23	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 días	m³	\$ 1.174.258
24	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 días	m³	\$ 1.281.871
25	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 días	m³	\$ 1.107.332
26	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 días	m³	\$ 1.240.153
27	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 días	m³	\$ 1.350.179

Ejecución del contrato

La Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial, en cumplimiento de sus funciones misionales, ejecuta actividades de mantenimiento correctivo sobre la red vial municipal, abarcando tanto el sistema vial urbano como rural. Dichas intervenciones se realizan en tramos donde la capa de rodadura presenta niveles de deterioro que afectan las condiciones de seguridad, transitabilidad y confort de los usuarios, por lo cual se hace necesaria su rehabilitación con el propósito de restablecer condiciones adecuadas de movilidad.

En este marco, la Administración Municipal ha adoptado un enfoque estratégico para la gestión de las intervenciones viales, orientado a la implementación de soluciones integrales

que generen impactos positivos y sostenibles en la movilidad, optimizando simultáneamente la percepción del servicio por parte de la ciudadanía y beneficiando al mayor número posible de usuarios de la red vial. En consecuencia, las acciones de mantenimiento no se limitan a la reparación puntual de fallas superficiales, tales como baches, sino que contemplan intervenciones de rehabilitación de mayor alcance en los sectores afectados, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional, la integridad estructural y la vida útil del pavimento intervenido.

La priorización y selección de los puntos de intervención se realiza en el marco de comités técnicos de obra, en los cuales participan el Secretario de Infraestructura, el Director Operativo y el Ingeniero Coordinador del área de mantenimiento vial. Estas decisiones se adoptan conforme a las directrices establecidas por el señor Alcalde, y se sustentan en recorridos de inspección técnica efectuados por personal especializado, así como en las solicitudes, reportes y requerimientos presentados por la comunidad, los cuales son canalizados a través de los diferentes medios de atención y comunicación dispuestos por la Administración Municipal.

Las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato, con base en los materiales suministrados, comprendieron la intervención integral de la capa de rodadura en tramos con deterioro avanzado, mediante la aplicación de procedimientos constructivos especializados. Entre estos se incluyen: escarificación y fresado de la superficie existente, demolición de losas de concreto, cajeo de baches, reparación y/o reconstrucción de la estructura del pavimento, sellado y curado de grietas, imprimación con emulsión asfáltica, instalación de geomalla sintética biaxial, así como la colocación y compactación de mezcla asfáltica.

Cada una de estas actividades fue ejecutada conforme a las condiciones técnicas particulares de los sectores intervenidos, atendiendo criterios de diseño, niveles de deterioro, capacidad estructural requerida y especificaciones técnicas aplicables, con el fin de garantizar la adecuada adherencia entre capas, mejorar el desempeño estructural del pavimento y asegurar la durabilidad de las intervenciones realizadas.

Adicionalmente, se ejecutaron actividades de mantenimiento y mejoramiento en vías no pavimentadas, orientadas a optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad para los

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

usuarios. Estas labores comprendieron la conformación y regularización del perfil vial, mediante procesos de nivelación, escarificación y compactación de la superficie existente, con el fin de restablecer la geometría transversal y longitudinal de la vía.

De igual manera, se realizó la colocación, extendido, conformación y compactación de materiales granulares destinados a las capas de subbase y base, los cuales fueron dispuestos conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. Estas intervenciones permitieron mejorar la capacidad portante de la estructura vial, optimizar el drenaje superficial y reducir la presencia de deformaciones, baches y material suelto, contribuyendo así a garantizar condiciones más adecuadas de circulación, especialmente en sectores rurales o de alta sensibilidad a factores climáticos.

Cabe resaltar que, dentro de las actividades de rehabilitación vial ejecutadas, se implementó la técnica de “Black Topping”, la cual consiste en la colocación de una capa de mezcla asfáltica sobre pavimentos rígidos existentes (concreto), con el propósito de mejorar las condiciones de rodadura y recuperar la funcionalidad de la vía.

En el desarrollo del presente proyecto se aplicó una variante reforzada de esta técnica, mediante la incorporación de geomalla sintética biaxial de fibra, instalada entre las capas del sistema de rehabilitación. Este refuerzo tiene como finalidad mejorar la adherencia entre capas, mitigar la propagación de fisuras por reflexión provenientes del pavimento de concreto subyacente y aumentar la capacidad estructural y la vida útil del sistema de pavimento resultante.

La implementación de esta metodología permitió optimizar el desempeño funcional y estructural de los tramos intervenidos, particularmente en sectores sometidos a niveles de tránsito moderados a altos, contribuyendo a mejorar el nivel de servicio y la durabilidad de la solución de rehabilitación adoptada.

Disposición Y Uso De Ítems En La Ejecución Del Contrato

Ítem 2 – Mezcla Asfáltica MDC-19:

Este tipo de mezcla fue empleada en la totalidad de los trabajos ejecutados, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar una capa de rodadura duradera y adecuada al tránsito vehicular previsto.

Ítem 4– Liga asfáltica:

El cemento asfáltico (Liga asfáltica) considerado en este ítem se usó para la impermeabilización de y sello de juntas de dilatación, grietas y fisuras.

Ítems 5 y 6 – Sub-base Tipo A y Base Tipo A:

Estos materiales granulares fueron utilizados para la reparación y reconstrucción de la estructura granular de los pavimentos, en tramos donde se evidenció deterioro estructural que comprometía la capacidad portante del sistema vial.

Ítem 7 – Geomalla Biaxial:

La geomalla biaxial se utilizó para hacer reforzamiento de la estructura y mitigar la propagación de fisuras de las capas inferiores a la capa de asfalto.

Ítem 8 – Emulsión Asfáltica CRL-1:

La emulsión asfáltica fue utilizada principalmente en las actividades de riego de imprimación, paso esencial para preparar la superficie de la vía antes de la aplicación de la mezcla asfáltica. La dosificación de este material se determinó en función del estado de la superficie (rasante) y de las condiciones climáticas al momento de la intervención. Adicionalmente, la emulsión CRL-1 se empleó en la elaboración de mezcla asfáltica en frío, compuesta por material fresado y emulsión, destinada a reparaciones provisionales de carácter urgente.

Nota importante: Por razones logísticas de transporte, la emulsión y el cemento asfálticos, se solicita en volúmenes globales, siendo almacenada en las instalaciones municipales de talleres en el corregimiento de San Joaquín. Su distribución se realiza según las necesidades específicas de cada proyecto.

Ítem 9 – Servicio de Transporte:

Este ítem fue destinado al traslado de materiales como mezcla asfáltica, base y sub-base desde la planta de producción hasta los frentes de obra, asegurando el suministro oportuno y continuo para el desarrollo eficiente de los trabajos.

Ítems no descritos:

Cabe mencionar que los demás ítems del contrato que no se detallan en el presente informe no han sido requeridos hasta el momento para la ejecución de las actividades desarrolladas.

Avance de Ejecución – TERCER Corte del Contrato No. 4347 de 2026

Durante el TERCER corte del contrato No. 4347 de 2026, se alcanzó un avance de ejecución del 62,76% del presupuesto total. En este periodo se realizaron intervenciones en puntos estratégicos de la ciudad con alto impacto en la movilidad, priorizando aquellos que presentaban un deterioro significativo y representaban un riesgo para la seguridad de los usuarios.

En el marco del programa “Cero Huecos”, se ejecutaron intervenciones menores de mantenimiento vial mediante actividades de bacheo, incluyendo demolición, fresado, adecuación de la estructura granular, imprimación y aplicación de carpeta asfáltica. Estas acciones permitieron mitigar puntos críticos de deterioro y mejorar las condiciones de la vía. A continuación, se relacionan los tramos intervenidos.

Adicionalmente, se realizaron obras complementarias consistentes en la construcción de resaltos y la rehabilitación puntual de la carpeta asfáltica en sectores estratégicos del municipio:

- Alcaldía – Programa Cero Huecos: sector Terranova.
- Alcaldía – Programa Cero Huecos: vía Pízamo – Monserrate.
- Alcaldía – Programa Cero Huecos: vía a Altagracia.
- Alcaldía – Resalto en Villa Verde y carpeta asfáltica en el puente El Dorado.

- **Alcaldía – Resaltos en Palo de Agua y en la intersección de la calle 30 con carrera 2.**

Cafelia – Tramo de acceso a la entrada 8, sector Cerritos: Se ejecutaron trabajos de conformación y compactación de la base granular. Posteriormente, se realizaron las actividades de imprimación y, una vez cumplido este proceso, se llevó a cabo la instalación de la carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de la superficie de la vía.

Cancha de la Institución Educativa Kennedy – sector Oriente: Debido a que la institución no contaba con un espacio adecuado para el parqueo de vehículos, se ejecutaron trabajos de excavación y adecuación del terreno. Posteriormente, se realizó la conformación y compactación de la base granular, seguida de la aplicación del riego de imprimación y la instalación de la carpeta asfáltica. Con esta intervención se habilitó un área destinada al estacionamiento, mejorando las condiciones de acceso, funcionamiento y organización de la institución.

Cañarte – Tramos de la carrera 5B y la calle 36: Se realizaron trabajos de excavación en los tramos donde la red de alcantarillado presentaba fallas, con el fin de permitir su reposición por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Una vez finalizadas estas labores, se ejecutó la conformación y compactación de la base granular, seguida de la aplicación del riego de imprimación y la instalación de la carpeta asfáltica, restableciendo las condiciones de la vía y garantizando su adecuada funcionalidad.

Cardal – Girasoles – Carrera 39 entre calles 84 y 86: Debido al deterioro que presentaba la carpeta asfáltica, se desarrollaron trabajos de fresado para retirar el material en mal estado y preparar la superficie para la rehabilitación del pavimento. Posteriormente, se realizaron las actividades de imprimación y la instalación de una nueva carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de la vía, la seguridad de los usuarios y la calidad de la superficie de rodadura.

Centenario – Carrera 14 entre calle 23 y la avenida 30 de agosto: Se realizaron trabajos de fresado debido al deterioro de la carpeta asfáltica existente. Adicionalmente, se ejecutaron labores de excavación en los tramos donde la red de alcantarillado presentaba fallas, con el fin de permitir su reparación y posterior reposición. Una vez finalizadas estas actividades, se

llevó a cabo la aplicación del riego de imprimación y la instalación de la nueva carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de la vía y garantizando una adecuada superficie de rodadura.

Deogracias Cardona – Calle hasta el puente sobre el río Consota, sector Boston: En este tramo vial se intervinieron los sectores con mayor grado de deterioro, realizando la restitución de la estructura mediante la conformación y compactación de la base granular. Posteriormente, se efectuó el sellado de juntas y fisuras. El material retirado fue cargado, transportado y dispuesto en la escombrera municipal Guadalcanal para su adecuada disposición final. Una vez concluida esta etapa, se realizaron labores de limpieza, barrido y sopleteo de la superficie. Finalmente, se aplicó el riego de imprimación, se ejecutó el *black topping* como tratamiento previo de regularización y se culminó con la instalación de la carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de la superficie de rodadura y la transitabilidad de la vía.

El Lago – Carrera 10B entre calles 22 y 23, sector Centro: Como parte de las actividades de mantenimiento vial, se realizaron trabajos de fresado en los tramos que presentaban deterioro en la carpeta asfáltica, con el fin de retirar el material afectado y preparar la superficie para su rehabilitación. El material retirado fue cargado, transportado y dispuesto en la escombrera municipal Guadalcanal, garantizando su adecuada disposición final. Posteriormente, se llevaron a cabo labores de limpieza, barrido y sopleteo de la superficie intervenida para asegurar una correcta adherencia del riego de imprimación, finalizando con la instalación de la nueva carpeta asfáltica y mejorando las condiciones de la vía.

La Villa – Carrera 25 entre calles 85 y 86, sector Olímpica: Como parte de las actividades de mantenimiento vial, se ejecutaron labores de fresado en los sectores que presentaban deterioro de la capa de rodadura. El material resultante fue transportado y dispuesto en la escombrera municipal Guadalcanal, garantizando una adecuada gestión de los residuos generados. Posteriormente, se realizó la limpieza, barrido y sopleteo de la superficie intervenida, asegurando las condiciones técnicas necesarias para la aplicación del riego de imprimación y la posterior instalación de la nueva carpeta asfáltica

Monserate – Carreras 16 y 16 Bis con calle 78B Este, sector Villa Santana: Con el objetivo de recuperar el estado de este tramo vial, se llevaron a cabo labores de rehabilitación de la superficie de rodadura. Inicialmente, se realizó el tratamiento de las juntas y fisuras

existentes para corregir las afectaciones identificadas. Posteriormente, la superficie fue acondicionada mediante actividades de limpieza, barrido y sopleteo, permitiendo la correcta aplicación del riego de imprimación. Como parte de la etapa final de la intervención, se ejecutó el black topping, mejorando el desempeño del pavimento y ofreciendo mejores condiciones para la circulación vehicular.

Parque Industrial, Sector A – Sector Del Café: En este tramo se adelantaron labores de rehabilitación vial orientadas a recuperar las condiciones de la superficie de rodadura. Como parte de la intervención, se realizó el sellado de juntas y fisuras presentes en el pavimento para prevenir su deterioro. Posteriormente, se efectuaron actividades de limpieza, barrido y sopleteo, preparando la superficie para la aplicación del riego de imprimación. Finalmente, se ejecutó el black topping, mejorando el estado del pavimento y brindando mejores condiciones de circulación y seguridad para los usuarios.

Portal de Las Mercedes – Villa Cecilia, calle 70, sector Consota: Como parte de las labores de mantenimiento y rehabilitación del pavimento, se efectuó el sellado de juntas y fisuras con el fin de corregir las afectaciones existentes en la superficie. Posteriormente, se realizaron actividades de barrido, limpieza y sopleteo para acondicionar el área intervenida. Una vez preparada la superficie, se aplicó el riego de imprimación y se ejecutó el black topping, logrando una mejor adherencia del tratamiento y una recuperación de las condiciones de servicio de la vía.

Primero de Mayo – Calle 28 entre carreras 4 y 5, sector Centro: Con el propósito de rehabilitar la superficie de rodadura, se ejecutaron labores de fresado en los sectores donde la carpeta asfáltica presentaba deterioro, retirando el material existente para adecuar la vía para las siguientes actividades. El material producto del fresado fue recolectado, transportado y dispuesto en la escombrera municipal Guadalcanal, cumpliendo con las disposiciones para su manejo y disposición final. Posteriormente, se realizaron actividades de limpieza, barrido y sopleteo de la superficie, preparándola para la aplicación del riego de imprimación y la posterior colocación de la nueva carpeta asfáltica, con lo cual se mejoraron las condiciones de transitabilidad y la calidad de la superficie de rodadura.

Tokio – Manzanas 32, 33, 34 y 35, sector Villa Santana: Debido al deterioro que presentaban las vías de este sector y a las deficientes condiciones de transitabilidad, se llevó a cabo su rehabilitación mediante la ejecución de trabajos de excavación y adecuación de la estructura del pavimento. Posteriormente, se realizó la conformación y compactación de la subbase y la base granular, seguida de la aplicación del riego de imprimación y, como etapa final, la instalación de la carpeta asfáltica. Con esta intervención se mejoraron las condiciones de movilidad, seguridad y funcionamiento de las vías del sector.

Vía de acceso al Parque El Vergel, sector Boston: En la vía de acceso al parque se realizaron trabajos de rehabilitación en los tramos que presentaban mayor deterioro. Como parte de la intervención, se ejecutaron labores de excavación y relleno con piedra filtro en las zonas requeridas, seguidas de la conformación y compactación de la base granular. Posteriormente, se aplicó el riego de imprimación y se realizó la instalación de la carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de la vía y garantizando una adecuada transitabilidad para los usuarios.

Villa del Prado – Carrera 27 entre calles 35 y 37, y carrera 26: En desarrollo de las actividades de rehabilitación vial, se intervinieron los sectores que presentaban mayor afectación en la estructura del pavimento. Para ello, se realizaron trabajos de conformación y compactación de la base granular, complementados con el sellado de juntas y fisuras. El material retirado durante la intervención fue transportado y dispuesto en la escombrera municipal Guadalcanal, garantizando su adecuada disposición final. Posteriormente, se ejecutaron labores de limpieza, barrido y sopleteo de la superficie para su preparación, continuando con la aplicación del riego de imprimación, la ejecución del black topping y la instalación de la carpeta asfáltica. Con estas actividades se mejoraron las condiciones de la vía, proporcionando una superficie de rodadura más uniforme y segura para la circulación vehicular.

Ejecución de trabajos en múltiples frentes de obras simultáneos

En atención a los compromisos adquiridos por el señor Alcalde durante los consejos comunitarios realizados en la vigencia 2025 en las 19 comunas y los 12 corregimientos del municipio de Pereira, se implementó una estrategia operativa intensiva, coordinada y orientada a resultados, con el propósito de dar respuesta efectiva a las necesidades manifestadas por la comunidad en materia de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial.

Dicha estrategia se fundamenta en la articulación de recursos técnicos, operativos y logísticos, así como en la priorización y programación de frentes de intervención, permitiendo ampliar la cobertura de las actividades de mantenimiento vial en el territorio municipal. De esta manera, se busca atender de manera progresiva y sistemática la totalidad de las solicitudes y requerimientos presentados por las comunidades, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad, accesibilidad y calidad del servicio de la red vial urbana y rural.

Las actividades fueron ejecutadas mediante la conformación de múltiples cuadrillas de trabajo especializadas, cada una encargada de desarrollar las distintas operaciones requeridas en el proceso de rehabilitación de los sectores intervenidos. Estas labores comprendieron, entre otras, sellado de juntas y grietas, demoliciones localizadas, fresado de la carpeta existente, cajeo de baches, conformación y mejoramiento de la estructura granular, nivelación de superficies, seriado para control de cotas, aplicación de riego de imprimación, así como el extendido, nivelación y compactación de mezcla asfáltica.

La organización operativa de las cuadrillas permitió optimizar la secuencia constructiva y la ejecución simultánea de diferentes frentes de trabajo, garantizando eficiencia en el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos. Asimismo, con el fin de acelerar el avance de las obras y reducir las afectaciones a la movilidad urbana, las labores se desarrollaron mediante jornadas diurnas y nocturnas, incluyendo trabajos durante fines de semana, lo que permitió mantener la continuidad del proceso constructivo y minimizar el impacto sobre el flujo vehicular en los corredores intervenidos.

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

BALANCE

El contrato No. 4347 de 2026 en su TERCER corte alcanzó una ejecución del 62,76% del presupuesto, restando un saldo del 37,24%.

BALANCE CONTRATO No. 4347 DE 2026		
VALOR CONTRATO	\$ 40.000.000.000,00	100,00%
PRIMER CORTE	\$ 10.222.089.278,52	25,56%
SEGUNDO CORTE	\$ 8.925.112.513,66	22,31%
TERCER CORTE	\$ 5.955.370.400,96	14,89%
TOTAL EJECUTADO	\$ 25.102.572.193,14	62,76%
SALDO	\$ 14.897.427.806,86	37,24%

EJECUCIÓN POR ÍTEM

La siguiente tabla resume la ejecución del contrato por ítem para el TERCER corte:

EJECUCIÓN POR ÍTEM – TERCER CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	MDC-10 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m³	0	\$ 1.164.899,00	\$ -
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	m³	3663,42	\$ 1.140.302,00	\$ 4.177.405.152,84
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	kg	3460	\$ 15.424,00	\$ 53.367.040,00
5	Subbase tipo A	m³	327	\$ 112.562,00	\$ 36.807.774,00
6	Base tipo A	m³	2236,85	\$ 130.929,00	\$ 292.868.533,65
6	EMULSION ASFÁLTICA CRL-1(Asfalto Liquido 70-90 de curación rápida crl-1)	gal	1925	\$ 33.113,00	\$ 63.742.525,00
7	Geomalla Biaxial	m²	11613,05	\$ 29.557,00	\$ 343.246.918,85
8	Servicio de transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a diferentes sectores del departamento	m3*km	Global	\$ 3.000,00	\$ 987.932.456,62
10	Pintura base solvente acrílica para demarcación vial	gal	0,00	\$ 443.898,00	\$ -
11	Microesferas de vidrio para demarcación vial	kg	0,00	\$ 33.387,00	\$ -
12	Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos	gal	0,00	\$ 381.313,00	\$ -
16	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	m³	0,00	\$ 927.098,00	\$ -
				TOTAL	\$ 5.955.370.400,96

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

La siguiente tabla muestra la facturación del contrato para el TERCER corte:

FACTURACIÓN DEL TERCER CORTE - No. 4347 DE 2026		
FACTURA FV - 12449	Material asfáltico	\$ 4.637.761.636,69
FACTURA FV - 12450	Material Granular	\$ 329.676.307,65
FACTURA FV - 12451	Transporte	\$ 987.932.456,62
	Total Facturado	\$ 5.955.370.400,96

La siguiente tabla muestra los frentes de obra intervenidos con material asfáltico para este periodo.

EJECUCIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO POR OBRA – TERCER CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
Alcaldía, cero huecos sector Terranova	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,67	\$ -	\$ 7.349.677,60	\$ 7.349.677,60
Alcaldía, cero huecos Píamo a Monserrate	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,57	\$ -	\$ 7.253.853,90	\$ 7.253.853,90
Alcaldía, cero huecos vía a Altagracia	Mezcla Asfáltica MDC-19	23,41	\$ -	\$ 22.432.327,58	\$ 22.432.327,58
Alcaldía, resalto Villa Verde y Carpeta puente El Dorado	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,45	\$ -	\$ 7.138.865,46	\$ 7.138.865,46
Alcaldía, resaltos Palo de agua y calle 30 con 2	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,57	\$ -	\$ 7.253.853,90	\$ 7.253.853,90
Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	20,26	\$ 2.145.169,32	\$ 19.413.881,11	\$ 21.559.050,43
Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	31,83	\$ 4.493.632,08	\$ 30.500.682,91	\$ 34.994.314,99
Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Mezcla Asfáltica MDC-19	67,64	\$ 8.389.321,56	\$ 64.815.148,97	\$ 73.204.470,53
Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	525,19	\$ 66.200.199,50	\$ 503.256.476,79	\$ 569.456.676,29
Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Mezcla Asfáltica MDC-19	53,73	\$ 6.794.749,53	\$ 51.486.072,66	\$ 58.280.822,19
Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	576,01	\$ 75.510.302,92	\$ 551.954.079,85	\$ 627.464.382,77
El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	75,09	\$ 10.033.000,17	\$ 71.954.014,44	\$ 81.987.014,61
La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	398,14	\$ 50.185.547,00	\$ 381.512.469,14	\$ 431.698.016,14
Monserrate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	297,58	\$ 42.011.154,08	\$ 285.152.158,96	\$ 327.163.313,04
Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	472,94	\$ 61.998.650,48	\$ 453.188.594,86	\$ 515.187.245,34
Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	225,36	\$ 29.542.893,12	\$ 215.948.284,64	\$ 245.491.177,76
Primero de Mayo, calle 28 entre carreras 4 y 5, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	44,57	\$ 5.842.770,44	\$ 42.708.621,97	\$ 48.551.392,41

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	258,62	\$ 37.814.899,16	\$ 247.819.246,42	\$ 285.634.145,58
Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	172,76	\$ 23.518.509,84	\$ 165.545.019,76	\$ 189.063.529,60
Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	75,34	\$ 10.826.131,98	\$ 72.193.573,68	\$ 83.019.705,66
Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	314,69	\$ 42.046.674,97	\$ 301.547.593,60	\$ 343.594.268,57
Emulsión para todas las obras	Emulsión Asfáltica CRL-1	1925	\$ -	\$ 53.565.147,06	\$ 53.565.147,06
Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	11613,05	\$ -	288442788,9	\$ 288.442.789
Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	3460	\$ -	\$ 44.846.252,10	\$ 44.846.252,10
<i>Total asfalto MDC-10 m³</i>	<i>0</i>	<i>Subtotal</i>	\$ 477.353.606	\$ 3.897.278.686	\$ 4.374.632.292
<i>Total asfalto MDC-19 m³</i>	<i>3663,42</i>	<i>I.V.A</i>	\$ 90.697.185	\$ 740.482.950	\$ 831.180.136
<i>Total Emulsión Gal</i>	<i>1925</i>	<i>Total</i>	\$ 568.050.791	\$ 4.637.761.637	\$ 5.205.812.428
<i>Total Cemento Asfáltico Kg</i>	<i>3460</i>				
<i>Total Geomalla Biaxial m²</i>	<i>11613,05</i>				

La siguiente tabla muestra los frentes de obra intervenidos con material subbase granular para este periodo.

EJECUCIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR POR OBRA – TERCER CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Base Granular	30	\$ 3.176.460,00	\$ 3.300.731,09	\$ 6.477.191,09
Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Base Granular	50,5	\$ 7.129.388,00	\$ 5.556.230,67	\$ 12.685.618,67
Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Base Granular	85	\$ 10.724.851,20	\$ 9.352.071,43	\$ 20.076.922,63
Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	112,35	\$ 14.207.893,35	\$ 12.361.237,94	\$ 26.569.131,29
Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	234	\$ 30.675.528,00	\$ 25.745.702,52	\$ 56.421.230,52
Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	138	\$ 18.090.696,00	\$ 15.183.363,03	\$ 33.274.059,03
Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	820	\$ 119.898.760,00	\$ 90.219.983,19	\$ 210.118.743,19
Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	337	\$ 45.877.158,00	\$ 37.078.212,61	\$ 82.955.370,61
Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	189	\$ 27.158.733,00	\$ 20.794.605,88	\$ 47.953.338,88
Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	241	\$ 31.265.442,00	\$ 26.515.873,11	\$ 57.781.315,11
<i>Total Base Granular</i>	<i>2236,85</i>	<i>Subtotal</i>	\$ 308.204.909,55	\$ 246.108.011,47	\$ 554.312.921,02
		<i>I.V.A</i>	\$ 58.558.932,81	\$ 46.760.522,18	\$ 105.319.454,99
		<i>Total</i>	\$ 366.763.842,36	\$ 292.868.533,65	\$ 659.632.376,01

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

La siguiente tabla muestra los frentes de obra intervenidos con material subbase para este periodo.

EJECUCIÓN DE MATERIAL SUB-BASE GRANULAR POR OBRA – TERCER CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026					
FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Sub-Base Granular	30	\$ 3.176.460,00	\$ 2.837.697,48	\$ 6.014.157,48
Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	161	\$ 21.917.574,00	\$ 15.228.976,47	\$ 37.146.550,47
Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	136	\$ 19.542.792,00	\$ 12.864.228,57	\$ 32.407.020,57
<i>Total Sub-Base Granular</i>		<i>327</i>	<i>Subtotal</i>	<i>\$ 44.636.826,00</i>	<i>\$ 30.930.902,52</i>
			<i>I.V.A</i>	<i>\$ 8.480.996,94</i>	<i>\$ 5.876.871,48</i>
			<i>Total</i>	<i>\$ 53.117.822,94</i>	<i>\$ 36.807.774,00</i>
					<i>\$ 89.925.596,94</i>

La siguiente tabla muestra la distribución de material asfáltico por obra:

ÁREA INTERVENIDA - VOLUMENES DE MEZCLA ASFALTICA MDC 19 - VOLUMEN EMULSIÓN - TERCER CORTE					
FRENTE DE OBRA	Área (m ²)	Espesor promedio (cm)	Expansión	Volumen suelto (m ³)	Emulsión (Gal)
Alcaldía, cero huecos sector Terranova	175,4	0,0350	1,25	7,67	10,98
Alcaldía, cero huecos Pízano a Monserrate	151,3	0,0400	1,25	7,57	9,48
Alcaldía, cero huecos vía a Altagracia	374,6	0,0500	1,25	23,41	23,46
Alcaldía, resalto Villa Verde y Carpeta puente El Dorado	59,6	0,1000	1,25	7,45	3,73
Alcaldía, resaltos Palo de Agua y calle 30 con 2	67,3	0,0900	1,25	7,57	4,21
Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	147,3	0,1100	1,25	20,26	9,23
Cancha I.E. Kennedy, Oriente	374,5	0,0680	1,25	31,83	23,45
Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	832,5	0,0650	1,25	67,64	52,14
Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	4201,5	0,1000	1,25	525,19	263,15
Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	573,1	0,0750	1,25	53,73	35,89
Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	3840,1	0,1200	1,25	576,01	240,51
El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	600,7	0,1000	1,25	75,09	37,62
La Villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	3185,2	0,1000	1,25	398,14	199,49
Monserrate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	2800,8	0,0850	1,25	297,58	175,42
Parque Industrial Sector A, Del Café	3783,6	0,1000	1,25	472,94	236,97

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	1918,0	0,0940	1,25	225,36	120,13
Primero de Mayo, calle 28 entre carreras 4 y 5, Centro	356,6	0,1000	1,25	44,57	22,33
Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	2155,2	0,0960	1,25	258,62	134,98
Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	1946,6	0,0710	1,25	172,76	121,92
Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	568,6	0,1060	1,25	75,34	35,61
Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	2622,5	0,0960	1,25	314,69	164,25
Total área	30734,78		Total	3663,42	1925,00

Las siguientes tablas muestran dimensiones por obra y uso de material asfáltico suelto por obra:

1	Alcaldía, cero huecos sector Terranova				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
31	3	93,00	0,035	1,25	4,07
9	4	36,00	0,035	1,25	1,58
15	3,09	46,35	0,035	1,25	2,03
		175,35			7,67

2	Alcaldía, cero huecos Pízano a Monserrate				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
18,5	3	55,50	0,04	1,25	2,78
6,8	2,4	16,32	0,04	1,25	0,82
28	2,7	75,60	0,04	1,25	3,78
1,7	2,3	3,91	0,04	1,25	0,20
		151,33			7,57

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

3	Alcaldía, cero huecos vía a Altagracia				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
global	global	374,56	0,05	1,25	23,41
		374,56			23,41

Nota: La vía Pereira-Altagracia presenta un tramo de 5.5 kilómetros con un elevado deterioro de la superficie de rodadura, su trazado geométrico es sinuoso y con baja visibilidad, debe soportar un alto tráfico vehicular de autos, buses, camiones, motocicletas y bicicletas. El deterioro de su superficie de rodadura es constante y progresivo con la aparición frecuente de baches de dimensiones variadas; por lo cual es necesario realizarle constante mantenimiento para garantizar la seguridad de sus usuarios.

4	Alcaldía, resalto Villa Verde y Carpeta puente El Dorado				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
5,89	3,6	21,20	0,1	1,25	2,65
9,6	4	38,40	0,1	1,25	4,80
		59,60			7,45

5	Alcaldía, resaltos Palo de Agua y calle 30 con 2				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
6,5	3,6	23,40	0,09	1,25	2,63
6,5	3,54	23,01	0,09	1,25	2,59
5,8	3,6	20,88	0,09	1,25	2,35
		67,29			7,57

6	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
26,79	5,5	147,35	0,11	1,25	20,26
		147,35			20,26

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

7	Cancha I.E. Kennedy, Oriente				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
23	14,96	344,08	0,068	1,25	29,25
9,8	3,1	30,38	0,068	1,25	2,58
		374,46			31,83

8	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
24,89	8	199,12	0,065	1,25	16,18
6	3	18,00	0,065	1,25	1,46
70	8,3	581,00	0,065	1,25	47,21
4	7,1	28,40	0,065	1,25	2,31
4	1,5	6,00	0,065	1,25	0,49
		832,52			67,64

9	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
388,9	7	2722,30	0,1	1,25	340,29
171,2	4	684,80	0,1	1,25	85,60
111,9	4,2	469,98	0,1	1,25	58,75
34	7	238,00	0,1	1,25	29,75
2	1,2	2,40	0,1	1,25	0,30
3,8	1,25	4,75	0,1	1,25	0,59
2	1,6	3,20	0,1	1,25	0,40
3,4	2	6,80	0,1	1,25	0,85
4,3	2	8,60	0,1	1,25	1,08
2,4	4	9,60	0,1	1,25	1,20
6,8	3	20,40	0,1	1,25	2,55
7,1	4	28,40	0,1	1,25	3,55
1,3	0,9	1,17	0,1	1,25	0,15
1,4	0,8	1,12	0,1	1,25	0,14
		4201,52			525,19

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

10	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
52	6,3	327,60	0,075	1,25	30,71
18	11,7	210,60	0,075	1,25	19,74
7	4	28,00	0,075	1,25	2,63
4,6	1,5	6,90	0,075	1,25	0,65
		573,10			53,73

11	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
500	7,2	3600,00	0,12	1,25	540,00
6,7	4	26,80	0,12	1,25	4,02
25	6	150,00	0,12	1,25	22,50
3,55	1,2	4,26	0,12	1,25	0,64
29,5	2	59,00	0,12	1,25	8,85
		3840,06			576,01

12	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
92	6,5	598,00	0,1	1,25	74,75
1,7	1,6	2,72	0,1	1,25	0,34
		600,72			75,09

13	La Villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
506,7	6,17	3126,34	0,1	1,25	390,79
6,5	4	26,00	0,1	1,25	3,25
6	4,2	25,20	0,1	1,25	3,15
3	2,54	7,62	0,1	1,25	0,95
		3185,16			398,14

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

14	Monserrate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
324	5,5	1782,00	0,085	1,25	189,34
174	5,5	957,00	0,085	1,25	101,68
4,9	2,6	12,74	0,085	1,25	1,35
6,5	2,5	16,25	0,085	1,25	1,73
7	3	21,00	0,085	1,25	2,23
4	2,95	11,80	0,085	1,25	1,25
		2800,79			297,58

15	Parque Industrial Sector A, Del Café				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
2,9	6,4	18,56	0,1	1,25	2,32
3,5	6,1	21,35	0,1	1,25	2,67
230	6	1380,00	0,1	1,25	172,50
61,3	7,25	444,43	0,1	1,25	55,55
2	2,9	5,80	0,1	1,25	0,73
2,4	2,9	6,96	0,1	1,25	0,87
138	7,2	993,60	0,1	1,25	124,20
2,4	3,8	9,12	0,1	1,25	1,14
3	1,4	4,20	0,1	1,25	0,53
137	6,2	849,40	0,1	1,25	106,18
2,9	2	5,80	0,1	1,25	0,73
2,9	2	5,80	0,1	1,25	0,73
2,8	1,8	5,04	0,1	1,25	0,63
5	2,5	12,50	0,1	1,25	1,56
15	0,7	10,50	0,1	1,25	1,31
15	0,7	10,50	0,1	1,25	1,31
		3783,56			472,94

16	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
55,7	7	389,90	0,094	1,25	45,81

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

134,3	7	940,10	0,094	1,25	110,46
16,8	3,9	65,52	0,094	1,25	7,70
11,43	4,2	48,01	0,094	1,25	5,64
70	4	280,00	0,094	1,25	32,90
36,8	3,9	143,52	0,094	1,25	16,86
3,8	2,5	9,50	0,094	1,25	1,12
6,9	2,8	19,32	0,094	1,25	2,27
6,7	3,3	22,11	0,094	1,25	2,60
		1917,98			225,36

17	Primero de Mayo, calle 28 entre carreras 4 y 5, Centro				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
46	7,2	331,20	0,1	1,25	41,40
7,2	2,2	15,84	0,1	1,25	1,98
4,2	1,1	4,62	0,1	1,25	0,58
3,5	1,4	4,90	0,1	1,25	0,61
		356,56			44,57

18	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
51,4	5	257,00	0,096	1,25	30,84
58,6	6	351,60	0,096	1,25	42,19
86,8	5,1	442,68	0,096	1,25	53,12
101,8	6	610,80	0,096	1,25	73,30
99,1	4,5	445,95	0,096	1,25	53,51
5,3	2,2	11,66	0,096	1,25	1,40
4	1,7	6,80	0,096	1,25	0,82
2,4	2	4,80	0,096	1,25	0,58
7,2	1,43	10,30	0,096	1,25	1,24
8	1,7	13,60	0,096	1,25	1,63
		2155,19			258,62

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

19	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
285,4	3,2	913,28	0,071	1,25	81,05
5,3	2,2	11,66	0,071	1,25	1,03
30,3	24	727,20	0,071	1,25	64,54
6,6	4,45	29,37	0,071	1,25	2,61
12,7	5,2	66,04	0,071	1,25	5,86
9,7	5,1	49,47	0,071	1,25	4,39
4,05	2,4	9,72	0,071	1,25	0,86
1,4	1,17	1,64	0,071	1,25	0,15
1,8	1,7	3,06	0,071	1,25	0,27
1,3	1,15	1,50	0,071	1,25	0,13
10,6	5,8	61,48	0,071	1,25	5,46
6,2	5,8	35,96	0,071	1,25	3,19
6,2	5,85	36,27	0,071	1,25	3,22
		1946,64			172,76

20	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
107	5	535	0,106	1,25	70,8875
9,28	3	27,84	0,106	1,25	3,6888
3,6	1,6	5,76	0,106	1,25	0,7632
		568,60			75,34

21	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51				
Largo	Ancho	Área	Espesor promedio	Expansión	Volumen suelto
86	7,15	614,90	0,096	1,25	73,79
6,6	4,2	27,72	0,096	1,25	3,33
6,6	3,9	25,74	0,096	1,25	3,09
247	7,3	1803,10	0,096	1,25	216,37
9,2	1,5	13,80	0,096	1,25	1,66
21	4,5	94,50	0,096	1,25	11,34
10,8	1,2	12,96	0,096	1,25	1,56
6,7	3,9	26,13	0,096	1,25	3,14

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

2	1,8	3,60	0,096	1,25	0,43
		2622,45			314,69

Las siguientes tablas muestran dimensiones por obra y uso de material Base y Subbase suelto, por obra:

6	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
869,30	0,0276	30,00	0,028	30,00

7	Cancha I.E. Kennedy, Oriente			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
2230,23	0,0181	50,50	0,000	0,00

8	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
1616,60	0,0421	85,00	0,000	0,00

10	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
3763,12	0,0239	112,35	0,000	0,00

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

11	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
998,60	0,1875	234,00	0,000	0,00

15	Parque Industrial Sector A, Del Café			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
3242,55	0,0340	138,00	0,000	0,00

18	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
1713,12	0,3829	820,00	0,000	0,00

19	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
779,97	0,3457	337,00	0,165	161,00

20	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
1616,60	0,0935	189,00	0,067	136,00

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

21	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51			
Ítem	BASE (Fact. Exp 1,25)		SUBBASE (Fact. Exp 1,25)	
Área (m ²)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)	Espesor promedio (m)	Volumen suelto (m ³)
243,20	0,7928	241,00	0,000	0,00

Las siguientes tablas muestran la localización de las obras con coordenadas *Google Maps*

PROYECTOS ASFALTO 2026			
	OBRAS	COORDENADAS	LINK DE ACCESO
1	Alcaldía, cero huecos sector Terranova	4°47'59.18"N 75°43'45.42"W	https://maps.app.goo.gl/vTJuU5ft5P3CkGy77
2	Alcaldía, cero huecos Pízano a Monserrate	4°48'22.71"N 75°40'19.92"W	https://maps.app.goo.gl/jRdFaQntxzn4sHC5A
3	Alcaldía, cero huecos vía a Altagracia	4°46'46.71"N 75°43'11.58"W	https://maps.app.goo.gl/ED16X2bwK2Yo9FyeA
4	Alcaldía, resalto Villa Verde y Carpetas puente El Dorado	4°48'08.15"N 75°43'06.46"W	https://maps.app.goo.gl/VKS8bHRk32NWpgfq5
5	Alcaldía, resaltos Palo de agua y calle 30 con 2	4°47'35.78"N 75°44'57.40"W	https://maps.app.goo.gl/VzedLDxoZzdAX62c8
6	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	4°48'14.42"N 75°49'29.37"W	https://maps.app.goo.gl/Y5srpUJrfRCW67sn6
7	Cancha LE. Kennedy, Oriente	4°48'26.65"N 75°40'18.42"W	https://maps.app.goo.gl/h3fANcSmBpg2p6qi9
8	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	4°49'04.76"N 75°42'26.62"W	https://maps.app.goo.gl/TB5GkXhwPsVeSQ1z8
9	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	4°47'28.95"N 75°44'02.49"W	https://maps.app.goo.gl/gh3TPdGYvnQoCa7s7
10	Centenario. Carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	4°48'32.62"N 75°41'52.29"W	https://maps.app.goo.gl/MZzSrMrSfMwSCiu7
11	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	4°48'17.03"N 75°42'04.07"W	https://maps.app.goo.gl/TDjoXjkgakqLmL98

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

12	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	4°48'43.50"N 75°41'50.72"W	https://maps.app.goo.gl/9uUi5KgKfqkxTo1L6
13	La Villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	4°48'11.36"N 75°45'08.24"W	https://maps.app.goo.gl/ZtjkqaZoerJdpN5Y9
14	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	4°48'09.62"N 75°40'04.78"W	https://maps.app.goo.gl/G2Baf3vm7psqvaau9
15	Parque Industrial Sector A, Del Café	4°49'22.59"N 75°43'42.85"W	https://maps.app.goo.gl/jEQnA2eGVRP3itNd9
16	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	4°48'13.03"N 75°43'51.95"W	https://maps.app.goo.gl/9ge2U6NrogB7ZYFy8
17	Primero de Mayo. calle 28 entre carreras 4 y 5. Centro	4°49'02.81"N 75°42'05.48"W	https://maps.app.goo.gl/T49yFnKe2zYFsKmA9
18	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	4°47'33.47"N 75°40'45.78"W	https://maps.app.goo.gl/ETWL7fYTUNQWp3BU9
19	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	4°48'06.88"N 75°42'09.64"W	https://maps.app.goo.gl/3xn7YSvj7it1YkHYA
20	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	4°47'41.2"N 75°40'29.6"W	https://maps.app.goo.gl/3xn7YSvj7it1YkHYA
21	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26	4°48'04.37"N 75°42'40.33"W	https://maps.app.goo.gl/ETWL7fYTUNQWp3BU9

La siguiente tabla muestra la ejecución del TERCER corte de material asfáltico y geomalla del contrato No. 4347 de 2026

EJECUCIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO POR OBRA – TERCER CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026						
FECHA	FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
11/05/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	610	\$ -	\$ 7.906.420,17	\$ 7.906.420,17
11/05/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	330	\$ -	\$ 4.277.243,70	\$ 4.277.243,70
15/05/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	400	\$ -	\$ 5.184.537,82	\$ 5.184.537,82
15/05/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	330	\$ -	\$ 4.277.243,70	\$ 4.277.243,70
19/05/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	660	\$ -	\$ 8.554.487,39	\$ 8.554.487,39
30/04/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	350	\$ -	\$ 4.536.470,59	\$ 4.536.470,59

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

30/04/2026	Cemento Asfáltico - Sello de juntas para todas las obras	Cemento Asfáltico	780	\$ -	\$ 10.109.848,74	\$ 10.109.848,74
25/05/2025	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Mezcla Asfáltica MDC-19	6,7	\$ 847.288,70	\$ 6.420.187,73	\$ 7.267.476,43
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,12	\$ 2.058.346,08	\$ 14.488.543,06	\$ 16.546.889,14
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,94	\$ 2.033.841,96	\$ 14.316.060,40	\$ 16.349.902,36
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,57	\$ 1.983.472,38	\$ 13.961.512,72	\$ 15.944.985,10
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,1	\$ 2.055.623,40	\$ 14.469.378,32	\$ 16.525.001,72
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 2.054.262,06	\$ 14.459.795,95	\$ 16.514.058,01
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,61	\$ 1.852.783,74	\$ 13.041.605,23	\$ 14.894.388,97
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,19	\$ 1.795.607,46	\$ 12.639.145,70	\$ 14.434.753,16
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 1.905.876,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.321.193,65
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,61	\$ 1.988.917,74	\$ 13.999.842,20	\$ 15.988.759,94
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,94	\$ 2.169.975,96	\$ 15.274.297,38	\$ 17.444.273,34
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,2	\$ 1.660.834,80	\$ 11.690.491,09	\$ 13.351.325,89
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,39	\$ 1.958.968,26	\$ 13.789.030,07	\$ 15.747.998,33
28/04/2026	Primero de Mayo, calle 28 entre carreras 4 y 5, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,51	\$ 1.771.052,92	\$ 12.945.781,53	\$ 14.716.834,45
28/04/2026	Primero de Mayo, calle 28 entre carreras 4 y 5, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,99	\$ 1.702.885,08	\$ 12.447.498,30	\$ 14.150.383,38
28/04/2026	Primero de Mayo, calle 28 entre carreras 4 y 5, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,57	\$ 1.778.918,44	\$ 13.003.275,75	\$ 14.782.194,19
28/04/2026	Primero de Mayo, calle 28 entre carreras 4 y 5, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	4,5	\$ 589.914,00	\$ 4.312.066,39	\$ 4.901.980,39
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 1.999.153,00	\$ 14.613.113,87	\$ 16.612.266,87
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,74	\$ 1.932.296,08	\$ 14.124.413,01	\$ 16.056.709,09
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,55	\$ 2.038.480,60	\$ 14.900.584,96	\$ 16.939.065,56
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.983.421,96	\$ 14.498.125,43	\$ 16.481.547,39
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,14	\$ 1.984.732,88	\$ 14.507.707,80	\$ 16.492.440,68
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,78	\$ 1.937.539,76	\$ 14.162.742,49	\$ 16.100.282,25
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,09	\$ 1.847.086,28	\$ 13.501.558,97	\$ 15.348.645,25
30/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 1.969.001,84	\$ 14.392.719,36	\$ 16.361.721,20
2/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,86	\$ 2.079.119,12	\$ 15.197.638,42	\$ 17.276.757,54
2/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,66	\$ 1.921.808,72	\$ 14.047.754,05	\$ 15.969.562,77

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

2/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,2	\$ 1.915.960,00	\$ 14.565.202,02	\$ 16.481.162,02
2/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,06	\$ 1.974.245,52	\$ 14.431.048,84	\$ 16.405.294,36
2/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,07	\$ 1.899.573,50	\$ 14.440.631,21	\$ 16.340.204,71
2/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,21	\$ 1.993.909,32	\$ 14.574.784,39	\$ 16.568.693,71
2/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.907.136,50	\$ 14.498.125,43	\$ 16.405.261,93
2/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,23	\$ 1.919.741,50	\$ 14.593.949,13	\$ 16.513.690,63
2/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,72	\$ 1.981.506,00	\$ 15.063.485,24	\$ 17.044.991,24
2/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,97	\$ 2.013.018,50	\$ 15.303.044,49	\$ 17.316.062,99
2/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,59	\$ 2.043.724,28	\$ 14.938.914,44	\$ 16.982.638,72
3/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,95	\$ 1.884.447,50	\$ 14.325.642,77	\$ 16.210.090,27
3/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,77	\$ 1.987.808,50	\$ 15.111.397,09	\$ 17.099.205,59
3/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,49	\$ 1.506.247,08	\$ 11.010.142,84	\$ 12.516.389,92
4/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,61	\$ 1.715.540,50	\$ 13.041.605,23	\$ 14.757.145,73
4/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 1.893.271,00	\$ 14.392.719,36	\$ 16.285.990,36
4/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,49	\$ 1.952.514,50	\$ 14.843.090,74	\$ 16.795.605,24
4/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,84	\$ 1.870.582,00	\$ 14.220.236,71	\$ 16.090.818,71
4/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,53	\$ 1.831.506,50	\$ 13.923.183,24	\$ 15.754.689,74
4/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 1.893.271,00	\$ 14.392.719,36	\$ 16.285.990,36
4/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 1.967.690,92	\$ 14.383.136,99	\$ 16.350.827,91
4/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,22	\$ 1.995.220,24	\$ 14.584.366,76	\$ 16.579.587,00
4/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,77	\$ 1.936.228,84	\$ 14.153.160,12	\$ 16.089.388,96
4/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,95	\$ 1.959.825,40	\$ 14.325.642,77	\$ 16.285.468,17
4/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,99	\$ 1.965.069,08	\$ 14.363.972,25	\$ 16.329.041,33
4/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,2	\$ 1.992.598,40	\$ 14.565.202,02	\$ 16.557.800,42
4/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,95	\$ 2.090.917,40	\$ 15.283.879,75	\$ 17.374.797,15
5/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,65	\$ 1.972.682,50	\$ 14.996.408,66	\$ 16.969.091,16
5/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,99	\$ 2.096.161,08	\$ 15.322.209,23	\$ 17.418.370,31
7/05/2026	Alcaldía, cero huecos vía a Altagracia	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,69	\$ -	\$ 7.368.842,34	\$ 7.368.842,34

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,54	\$ 1.832.767,00	\$ 13.932.765,61	\$ 15.765.532,61
7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,95	\$ 1.884.447,50	\$ 14.325.642,77	\$ 16.210.090,27
7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,23	\$ 1.919.741,50	\$ 14.593.949,13	\$ 16.513.690,63
7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,03	\$ 1.894.531,50	\$ 14.402.301,73	\$ 16.296.833,23
7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,41	\$ 1.942.430,50	\$ 14.766.431,78	\$ 16.708.862,28
7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,33	\$ 1.932.346,50	\$ 14.689.772,82	\$ 16.622.119,32
7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.907.136,50	\$ 14.498.125,43	\$ 16.405.261,93
7/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.983.421,96	\$ 14.498.125,43	\$ 16.481.547,39
7/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,81	\$ 2.072.564,52	\$ 15.149.726,57	\$ 17.222.291,09
7/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,18	\$ 1.989.976,56	\$ 14.546.037,28	\$ 16.536.013,84
7/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,99	\$ 1.965.069,08	\$ 14.363.972,25	\$ 16.329.041,33
7/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,57	\$ 1.910.010,44	\$ 13.961.512,72	\$ 15.871.523,16
7/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,57	\$ 2.041.102,44	\$ 14.919.749,70	\$ 16.960.852,14
7/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,76	\$ 1.803.825,92	\$ 13.185.340,77	\$ 14.989.166,69
7/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,08	\$ 1.900.834,00	\$ 14.450.213,58	\$ 16.351.047,58
8/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,39	\$ 2.017.505,88	\$ 14.747.267,04	\$ 16.764.772,92
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,33	\$ 1.932.346,50	\$ 14.689.772,82	\$ 16.622.119,32
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,83	\$ 1.869.321,50	\$ 14.210.654,34	\$ 16.079.975,84
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,29	\$ 1.927.304,50	\$ 14.651.443,34	\$ 16.578.747,84
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,1	\$ 1.903.355,00	\$ 14.469.378,32	\$ 16.372.733,32
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,29	\$ 1.927.304,50	\$ 14.651.443,34	\$ 16.578.747,84
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,93	\$ 1.881.926,50	\$ 14.306.478,03	\$ 16.188.404,53
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,91	\$ 1.753.355,50	\$ 13.329.076,32	\$ 15.082.431,82
8/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,08	\$ 1.900.834,00	\$ 14.450.213,58	\$ 16.351.047,58
9/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,26	\$ 1.797.473,00	\$ 13.664.459,26	\$ 15.461.932,26
9/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 1.893.271,00	\$ 14.392.719,36	\$ 16.285.990,36
9/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,19	\$ 1.914.699,50	\$ 14.555.619,65	\$ 16.470.319,15
9/05/2026	Cardal - Girasoles, carrera 39 entre calle 86 y calle 84	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,06	\$ 1.646.213,00	\$ 12.514.574,89	\$ 14.160.787,89

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

9/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,44	\$ 2.024.060,48	\$ 14.795.178,89	\$ 16.819.239,37
10/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,86	\$ 1.948.027,12	\$ 14.239.401,45	\$ 16.187.428,57
11/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	9,91	\$ 1.324.104,83	\$ 9.496.128,42	\$ 10.820.233,25
11/05/2026	Alcaldía, cero huecos vía a Altagracia	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,74	\$ -	\$ 7.416.754,18	\$ 7.416.754,18
11/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,77	\$ 1.973.464,01	\$ 14.153.160,12	\$ 16.126.624,13
11/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,77	\$ 2.107.077,01	\$ 15.111.397,09	\$ 17.218.474,10
11/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,53	\$ 2.075.009,89	\$ 14.881.420,22	\$ 16.956.430,11
11/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,95	\$ 2.131.127,35	\$ 15.283.879,75	\$ 17.415.007,10
11/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,41	\$ 1.925.363,33	\$ 13.808.194,81	\$ 15.733.558,14
11/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,61	\$ 1.818.472,93	\$ 13.041.605,23	\$ 14.860.078,16
11/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,65	\$ 1.789.405,80	\$ 13.079.934,71	\$ 14.869.340,51
11/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,81	\$ 1.810.380,52	\$ 13.233.252,62	\$ 15.043.633,14
11/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 1.835.288,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.250.605,65
11/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,59	\$ 1.912.632,28	\$ 13.980.677,46	\$ 15.893.309,74
11/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,78	\$ 1.675.355,76	\$ 12.246.268,54	\$ 13.921.624,30
11/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,13	\$ 1.721.237,96	\$ 12.581.651,48	\$ 14.302.889,44
11/05/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,7	\$ 1.795.960,40	\$ 13.127.846,55	\$ 14.923.806,95
12/05/2026	Alcaldía, cero huecos vía a Altagracia	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,98	\$ -	\$ 7.646.731,06	\$ 7.646.731,06
12/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 2.006.867,26	\$ 14.392.719,36	\$ 16.399.586,62
12/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 2.016.220,17	\$ 14.459.795,95	\$ 16.476.016,12
12/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,12	\$ 2.020.228,56	\$ 14.488.543,06	\$ 16.508.771,62
12/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,21	\$ 2.032.253,73	\$ 14.574.784,39	\$ 16.607.038,12

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

12/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 2.037.598,25	\$ 14.613.113,87	\$ 16.650.712,12
12/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,91	\$ 1.858.556,83	\$ 13.329.076,32	\$ 15.187.633,15
12/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,93	\$ 1.957.203,56	\$ 14.306.478,03	\$ 16.263.681,59
12/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,76	\$ 2.066.009,92	\$ 15.101.814,72	\$ 17.167.824,64
12/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,87	\$ 1.949.338,04	\$ 14.248.983,82	\$ 16.198.321,86
12/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,35	\$ 2.012.262,20	\$ 14.708.937,56	\$ 16.721.199,76
12/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,54	\$ 2.037.169,68	\$ 14.891.002,59	\$ 16.928.172,27
12/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,69	\$ 1.794.649,48	\$ 13.118.264,18	\$ 14.912.913,66
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,47	\$ 2.066.993,11	\$ 14.823.926,00	\$ 16.890.919,11
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,46	\$ 2.065.656,98	\$ 14.814.343,63	\$ 16.880.000,61
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,72	\$ 1.966.783,36	\$ 14.105.248,27	\$ 16.072.031,63
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 2.005.531,13	\$ 14.383.136,99	\$ 16.388.668,12
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,65	\$ 1.957.430,45	\$ 14.038.171,68	\$ 15.995.602,13
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	10,18	\$ 1.360.180,34	\$ 9.754.852,40	\$ 11.115.032,74
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,02	\$ 1.472.415,26	\$ 10.559.771,46	\$ 12.032.186,72
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,43	\$ 2.061.648,59	\$ 14.785.596,52	\$ 16.847.245,11
13/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,2	\$ 1.763.691,60	\$ 12.648.728,07	\$ 14.412.419,67
14/05/2026	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	6,28	\$ 664.938,96	\$ 6.017.728,20	\$ 6.682.667,16
14/05/2026	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,98	\$ 1.480.230,36	\$ 13.396.152,91	\$ 14.876.383,27
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,47	\$ 2.027.993,24	\$ 14.823.926,00	\$ 16.851.919,24
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 1.967.690,92	\$ 14.383.136,99	\$ 16.350.827,91
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,24	\$ 1.997.842,08	\$ 14.603.531,50	\$ 16.601.373,58

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,14	\$ 1.984.732,88	\$ 14.507.707,80	\$ 16.492.440,68
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,26	\$ 2.000.463,92	\$ 14.622.696,24	\$ 16.623.160,16
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,99	\$ 1.833.977,08	\$ 13.405.735,28	\$ 15.239.712,36
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,26	\$ 1.738.279,92	\$ 12.706.222,29	\$ 14.444.502,21
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,94	\$ 2.089.606,48	\$ 15.274.297,38	\$ 17.363.903,86
14/05/2026	Portal de Las Mercedes, Villa Cecilia, calle 70, Consota	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,91	\$ 2.085.673,72	\$ 15.245.550,27	\$ 17.331.223,99
15/05/2026	Alcaldía, cero huecos sector Terranova	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,67	\$ -	\$ 7.349.677,60	\$ 7.349.677,60
15/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,24	\$ 2.010.346,24	\$ 13.645.294,52	\$ 15.655.640,76
15/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,19	\$ 2.003.287,44	\$ 13.597.382,67	\$ 15.600.670,11
15/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,95	\$ 1.969.405,20	\$ 13.367.405,80	\$ 15.336.811,00
15/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,85	\$ 1.955.287,60	\$ 13.271.582,10	\$ 15.226.869,70
15/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,08	\$ 1.987.758,08	\$ 13.491.976,61	\$ 15.479.734,69
15/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,81	\$ 1.949.640,56	\$ 13.233.252,62	\$ 15.182.893,18
16/05/2026	Alcaldía, resalto Villa Verde y Carpeta puente El Dorado	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,45	\$ -	\$ 7.138.865,46	\$ 7.138.865,46
16/05/2026	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,02	\$ 1.739.641,26	\$ 12.476.245,41	\$ 14.215.886,67
16/05/2026	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,03	\$ 1.740.977,39	\$ 12.485.827,78	\$ 14.226.805,17
16/05/2026	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,96	\$ 1.865.237,48	\$ 13.376.988,17	\$ 15.242.225,65
16/05/2026	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,02	\$ 1.739.641,26	\$ 12.476.245,41	\$ 14.215.886,67
16/05/2026	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,22	\$ 1.632.750,86	\$ 11.709.655,83	\$ 13.342.406,69
16/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,1	\$ 1.990.581,60	\$ 13.511.141,34	\$ 15.501.722,94
16/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,13	\$ 1.994.816,88	\$ 13.539.888,45	\$ 15.534.705,33
16/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,04	\$ 1.982.111,04	\$ 13.453.647,13	\$ 15.435.758,17
16/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,18	\$ 2.001.875,68	\$ 13.587.800,30	\$ 15.589.675,98
16/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,78	\$ 1.945.405,28	\$ 13.204.505,51	\$ 15.149.910,79
16/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,81	\$ 1.949.640,56	\$ 13.233.252,62	\$ 15.182.893,18
16/05/2026	El Lago, carrera 10b entre calles 22 y 23, Centro	Mezcla Asfáltica MDC-19	9,84	\$ 1.314.751,92	\$ 9.429.051,83	\$ 10.743.803,75
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,05	\$ 1.972.934,60	\$ 14.421.466,47	\$ 16.394.401,07
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,27	\$ 2.001.774,84	\$ 14.632.278,61	\$ 16.634.053,45

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

19/05/2026	Emulsión para todas las obras	Emulsión Asfáltica CRL-1	1650	\$ -	\$ 45.912.983,19	\$ 45.912.983,19
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,38	\$ 2.016.194,96	\$ 14.737.684,67	\$ 16.753.879,63
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,45	\$ 1.894.279,40	\$ 13.846.524,29	\$ 15.740.803,69
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,86	\$ 1.948.027,12	\$ 14.239.401,45	\$ 16.187.428,57
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 1.978.178,28	\$ 14.459.795,95	\$ 16.437.974,23
19/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,22	\$ 2.007.522,72	\$ 13.626.129,78	\$ 15.633.652,50
19/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,93	\$ 1.966.581,68	\$ 13.348.241,06	\$ 15.314.822,74
19/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,14	\$ 1.996.228,64	\$ 13.549.470,82	\$ 15.545.699,46
19/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,38	\$ 2.030.110,88	\$ 13.779.447,70	\$ 15.809.558,58
19/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,48	\$ 1.903.052,48	\$ 12.917.034,42	\$ 14.820.086,90
19/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,79	\$ 1.946.817,04	\$ 13.214.087,88	\$ 15.160.904,92
20/05/2026	Alcaldía, resaltos Palo de agua y calle 30 con 2	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,57	\$ -	\$ 7.253.853,90	\$ 7.253.853,90
20/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,14	\$ 1.984.732,88	\$ 14.507.707,80	\$ 16.492.440,68
20/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,55	\$ 2.038.480,60	\$ 14.900.584,96	\$ 16.939.065,56
20/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,41	\$ 2.020.127,72	\$ 14.766.431,78	\$ 16.786.559,50
20/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,48	\$ 2.029.304,16	\$ 14.833.508,37	\$ 16.862.812,53
20/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,43	\$ 1.760.565,56	\$ 12.869.122,57	\$ 14.629.688,13
20/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,94	\$ 1.826.817,44	\$ 12.399.586,45	\$ 14.226.403,89
20/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,06	\$ 1.702.582,56	\$ 11.556.337,92	\$ 13.258.920,48
20/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	10,72	\$ 1.513.406,72	\$ 10.272.300,37	\$ 11.785.707,09
20/05/2026	Monserate, carrera 16 y 16bis con calle 78b Este, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	9,76	\$ 1.377.877,76	\$ 9.352.392,87	\$ 10.730.270,63
21/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15	\$ 1.966.380,00	\$ 14.373.554,62	\$ 16.339.934,62
21/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,96	\$ 1.961.136,32	\$ 14.335.225,14	\$ 16.296.361,46
21/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,89	\$ 1.951.959,88	\$ 14.268.148,55	\$ 16.220.108,43
21/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,02	\$ 1.969.001,84	\$ 14.392.719,36	\$ 16.361.721,20
21/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,09	\$ 1.978.178,28	\$ 14.459.795,95	\$ 16.437.974,23
21/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,05	\$ 1.972.934,60	\$ 14.421.466,47	\$ 16.394.401,07
22/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,01	\$ 1.892.010,50	\$ 14.383.136,99	\$ 16.275.147,49

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

22/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,3	\$ 1.928.565,00	\$ 14.661.025,71	\$ 16.589.590,71
22/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,37	\$ 1.937.388,50	\$ 14.728.102,30	\$ 16.665.490,80
22/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,26	\$ 1.923.523,00	\$ 14.622.696,24	\$ 16.546.219,24
22/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,73	\$ 1.856.716,50	\$ 14.114.830,64	\$ 15.971.547,14
22/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,59	\$ 1.839.069,50	\$ 13.980.677,46	\$ 15.819.746,96
22/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,46	\$ 1.822.683,00	\$ 13.856.106,66	\$ 15.678.789,66
23/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,23	\$ 1.640.903,67	\$ 12.677.475,18	\$ 14.318.378,85
23/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,1	\$ 1.624.779,90	\$ 12.552.904,37	\$ 14.177.684,27
23/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,43	\$ 1.665.709,47	\$ 12.869.122,57	\$ 14.534.832,04
23/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,35	\$ 1.779.816,15	\$ 13.750.700,59	\$ 15.530.516,74
23/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,97	\$ 2.013.018,50	\$ 15.303.044,49	\$ 17.316.062,99
23/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,93	\$ 2.007.976,50	\$ 15.264.715,01	\$ 17.272.691,51
23/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,53	\$ 1.678.112,37	\$ 12.964.946,27	\$ 14.643.058,64
24/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,68	\$ 1.976.464,00	\$ 15.025.155,76	\$ 17.001.619,76
25/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,9	\$ 1.884.268,90	\$ 14.277.730,92	\$ 16.161.999,82
25/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,93	\$ 1.888.062,73	\$ 14.306.478,03	\$ 16.194.540,76
25/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Mezcla Asfáltica MDC-19	8,6	\$ 1.087.564,60	\$ 8.240.837,98	\$ 9.328.402,58
25/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Mezcla Asfáltica MDC-19	8,6	\$ 1.087.564,60	\$ 8.240.837,98	\$ 9.328.402,58
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,41	\$ 1.942.430,50	\$ 14.766.431,78	\$ 16.708.862,28
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,95	\$ 1.884.447,50	\$ 14.325.642,77	\$ 16.210.090,27
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 1.922.262,50	\$ 14.613.113,87	\$ 16.535.376,37
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,16	\$ 1.910.918,00	\$ 14.526.872,54	\$ 16.437.790,54
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,89	\$ 1.876.884,50	\$ 14.268.148,55	\$ 16.145.033,05
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,33	\$ 1.806.296,50	\$ 13.731.535,85	\$ 15.537.832,35
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,18	\$ 1.913.439,00	\$ 14.546.037,28	\$ 16.459.476,28
26/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,51	\$ 1.955.035,50	\$ 14.862.255,48	\$ 16.817.290,98
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,52	\$ 1.830.246,00	\$ 13.913.600,87	\$ 15.743.846,87
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,14	\$ 1.656.297,00	\$ 12.591.233,85	\$ 14.247.530,85

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,23	\$ 1.667.641,50	\$ 12.677.475,18	\$ 14.345.116,68
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,37	\$ 1.811.338,50	\$ 13.769.865,33	\$ 15.581.203,83
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,11	\$ 1.778.565,50	\$ 13.520.723,71	\$ 15.299.289,21
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,98	\$ 1.762.179,00	\$ 13.396.152,91	\$ 15.158.331,91
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,78	\$ 1.736.969,00	\$ 13.204.505,51	\$ 14.941.474,51
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,05	\$ 1.897.052,50	\$ 14.421.466,47	\$ 16.318.518,97
27/05/2026	La villa, carrera 25 entre calles 85 y 86, Olímpica	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,98	\$ 1.636.129,00	\$ 12.437.915,93	\$ 14.074.044,93
28/05/2026	Emulsión para todas las obras	Emulsión Asfáltica CRL-1	275	\$ -	\$ 7.652.163,87	\$ 7.652.163,87
29/05/2026	Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,3	\$ 1.736.464,80	\$ 11.786.314,79	\$ 13.522.779,59
29/05/2026	Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,79	\$ 1.805.641,04	\$ 12.255.850,91	\$ 14.061.491,95
29/05/2026	Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Mezcla Asfáltica MDC-19	6,74	\$ 951.526,24	\$ 6.458.517,21	\$ 7.410.043,45
1/06/2026	Alcaldía, cero huecos Pízano a Monserrate	Mezcla Asfáltica MDC-19	7,57	\$ -	\$ 7.253.853,90	\$ 7.253.853,90
3/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,4	\$ 1.781.842,80	\$ 11.882.138,49	\$ 13.663.981,29
3/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,34	\$ 1.773.220,98	\$ 11.824.644,27	\$ 13.597.865,25
3/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,51	\$ 1.941.346,47	\$ 12.945.781,53	\$ 14.887.128,00
3/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,74	\$ 1.687.002,78	\$ 11.249.702,08	\$ 12.936.704,86
3/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,03	\$ 1.728.674,91	\$ 11.527.590,81	\$ 13.256.265,72
3/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,32	\$ 1.914.044,04	\$ 12.763.716,50	\$ 14.677.760,54
4/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	9,72	\$ 1.421.238,96	\$ 9.314.063,39	\$ 10.735.302,35
4/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,81	\$ 1.873.052,58	\$ 12.275.015,65	\$ 14.148.068,23
4/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,32	\$ 2.093.841,76	\$ 13.721.953,48	\$ 15.815.795,24
5/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,13	\$ 1.983.421,96	\$ 14.498.125,43	\$ 16.481.547,39
5/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,97	\$ 1.962.447,24	\$ 14.344.807,51	\$ 16.307.254,75
5/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,2	\$ 1.992.598,40	\$ 14.565.202,02	\$ 16.557.800,42
5/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,24	\$ 1.997.842,08	\$ 14.603.531,50	\$ 16.601.373,58
5/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,79	\$ 1.938.850,68	\$ 14.172.324,86	\$ 16.111.175,54
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15	\$ 1.966.380,00	\$ 14.373.554,62	\$ 16.339.934,62
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,71	\$ 1.928.363,32	\$ 14.095.665,90	\$ 16.024.029,22

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,19	\$ 1.991.287,48	\$ 14.555.619,65	\$ 16.546.907,13
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,27	\$ 2.001.774,84	\$ 14.632.278,61	\$ 16.634.053,45
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	11,18	\$ 1.465.608,56	\$ 10.713.089,38	\$ 12.178.697,94
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,84	\$ 1.814.313,28	\$ 13.261.999,73	\$ 15.076.313,01
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,84	\$ 1.814.313,28	\$ 13.261.999,73	\$ 15.076.313,01
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	12,76	\$ 1.672.733,92	\$ 12.227.103,80	\$ 13.899.837,72
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,45	\$ 2.025.371,40	\$ 14.804.761,26	\$ 16.830.132,66
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Mezcla Asfáltica MDC-19	15,25	\$ 1.999.153,00	\$ 14.613.113,87	\$ 16.612.266,87
01/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 2.047.052,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.462.369,65
01/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,29	\$ 2.089.455,22	\$ 13.693.206,37	\$ 15.782.661,59
01/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,83	\$ 2.022.194,94	\$ 13.252.417,36	\$ 15.274.612,30
01/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,03	\$ 2.051.438,54	\$ 13.444.064,76	\$ 15.495.503,30
01/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,01	\$ 2.048.514,18	\$ 13.424.900,02	\$ 15.473.414,20
01/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,97	\$ 2.042.665,46	\$ 13.386.570,54	\$ 15.429.236,00
02/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,03	\$ 2.051.438,54	\$ 13.444.064,76	\$ 15.495.503,30
02/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14,03	\$ 2.051.438,54	\$ 13.444.064,76	\$ 15.495.503,30
02/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 2.047.052,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.462.369,65
04/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 2.047.052,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.462.369,65
04/06/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	14	\$ 2.047.052,00	\$ 13.415.317,65	\$ 15.462.369,65
28/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,47	\$ 1.969.556,46	\$ 12.907.452,05	\$ 14.877.008,51
28/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,61	\$ 1.990.026,98	\$ 13.041.605,23	\$ 15.031.632,21
28/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,49	\$ 1.972.480,82	\$ 12.926.616,79	\$ 14.899.097,61
28/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,52	\$ 1.976.867,36	\$ 12.955.363,90	\$ 14.932.231,26
28/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Mezcla Asfáltica MDC-19	13,49	\$ 1.972.480,82	\$ 12.926.616,79	\$ 14.899.097,61
2/05/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	1300	\$ -	\$ 32.289.159,66	\$ 32.289.159,66
11/05/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	2961,72	\$ -	\$ 73.562.653,82	\$ 73.562.653,82
15/05/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	2861,12	\$ -	\$ 71.063.969,61	\$ 71.063.969,61
16/05/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	706,71	\$ -	\$ 17.553.132,33	\$ 17.553.132,33

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

19/05/2026	Geomalla Biaxial - Obras Black Topping	Geomalla Biaxial	3783,5	\$ -	\$ 93.973.873,53	\$ 93.973.873,53
	Total asfalto MDC-10 m ³	0	Subtotal	\$ 477.353.606,15	\$ 3.897.278.686,29	\$ 4.374.632.292,44
	Total asfalto MDC-19 m ³	3663,42	I.V.A	\$ 90.697.185,17	\$ 740.482.950,40	\$ 831.180.136
	Total Emulsión Gal	1925	Total	\$ 568.050.791,32	\$ 4.637.761.636,69	\$ 5.205.812.428
	Total Cemento Asfáltico Kg	3460				
	Total Geomalla Biaxial m ²	11613,05				

La siguiente tabla muestra la ejecución de material granular por obra – TERCER corte contrato No. 4347 de 2026

EJECUCIÓN DE MATERIAL BASE Y SUB BASE GRANULAR POR OBRA – TERCER CORTE CONTRATO No. 4347 DE 2026						
FECHA	FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	CANT	VALOR TRANSPORTE	VALOR MATERIAL	TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE
15/04/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Base Granular	15	\$ 2.042.821,20	\$ 1.650.365,55	\$ 3.693.186,75
15/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.654.560,55
15/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	14	\$ 1.870.582,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.410.923,18
16/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
17/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	15	\$ 2.042.010,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.460.858,74
17/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	16	\$ 2.178.144,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.691.582,66
18/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$ 1.905.876,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.446.217,18
18/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	14	\$ 1.905.876,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.230.134,82
18/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	15	\$ 2.042.010,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.460.858,74
18/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	14	\$ 1.905.876,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.230.134,82
18/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	14	\$ 1.905.876,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.230.134,82
19/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$ 2.178.144,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.938.533,92
20/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
20/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$ 2.178.144,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.938.533,92
20/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$ 1.905.876,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.446.217,18
20/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	15	\$ 2.042.010,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.460.858,74
20/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	14	\$ 1.905.876,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.230.134,82
20/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	14	\$ 1.905.876,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.230.134,82

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

20/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	15	\$	2.042.010,00	\$	1.418.848,74	\$	3.460.858,74
20/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$	1.905.876,00	\$	1.540.341,18	\$	3.446.217,18
21/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$	2.137.808,00	\$	1.760.389,92	\$	3.898.197,92
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$	2.178.144,00	\$	1.760.389,92	\$	3.938.533,92
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$	2.178.144,00	\$	1.760.389,92	\$	3.938.533,92
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	7	\$	952.938,00	\$	770.170,59	\$	1.723.108,59
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	15	\$	2.042.010,00	\$	1.650.365,55	\$	3.692.375,55
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Sub-Base Granular	15	\$	2.042.010,00	\$	1.418.848,74	\$	3.460.858,74
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$	2.178.144,00	\$	1.760.389,92	\$	3.938.533,92
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$	1.905.876,00	\$	1.540.341,18	\$	3.446.217,18
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	15	\$	2.042.010,00	\$	1.650.365,55	\$	3.692.375,55
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	15	\$	2.042.010,00	\$	1.650.365,55	\$	3.692.375,55
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$	2.178.144,00	\$	1.760.389,92	\$	3.938.533,92
21/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$	2.178.144,00	\$	1.760.389,92	\$	3.938.533,92
22/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$	2.137.808,00	\$	1.760.389,92	\$	3.898.197,92
22/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$	2.137.808,00	\$	1.760.389,92	\$	3.898.197,92
22/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$	2.097.472,00	\$	1.760.389,92	\$	3.857.861,92
22/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$	2.097.472,00	\$	1.760.389,92	\$	3.857.861,92
22/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$	2.097.472,00	\$	1.760.389,92	\$	3.857.861,92
22/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$	1.905.876,00	\$	1.540.341,18	\$	3.446.217,18
22/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	15	\$	2.042.010,00	\$	1.650.365,55	\$	3.692.375,55
22/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$	1.905.876,00	\$	1.540.341,18	\$	3.446.217,18
22/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$	1.905.876,00	\$	1.540.341,18	\$	3.446.217,18
22/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	16	\$	2.178.144,00	\$	1.760.389,92	\$	3.938.533,92
22/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	14	\$	1.905.876,00	\$	1.540.341,18	\$	3.446.217,18
23/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$	2.097.472,00	\$	1.760.389,92	\$	3.857.861,92
23/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$	2.097.472,00	\$	1.760.389,92	\$	3.857.861,92
23/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$	2.097.472,00	\$	1.760.389,92	\$	3.857.861,92

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	15	\$ 2.042.010,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.692.375,55
23/04/2026	Vía de acceso al parque El Vergel, Boston	Base Granular	15	\$ 2.042.010,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.692.375,55
24/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.654.560,55
24/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.654.560,55
24/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
24/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
25/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
25/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	13	\$ 1.704.196,00	\$ 1.430.316,81	\$ 3.134.512,81
26/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
26/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
27/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
27/04/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	16	\$ 2.137.808,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.898.197,92
28/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	14	\$ 1.835.288,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.375.629,18
29/04/2026	Deogracias Cardona, Calle hasta puente sobre río Consota, Boston	Base Granular	15	\$ 1.966.380,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.616.745,55
2/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	15	\$ 2.004.195,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.654.560,55
5/05/2026	Villa del Prado, carrera 27 entre calles 35 y 37, carrera 26 manzana 51	Base Granular	7	\$ -	\$ 770.170,59	\$ 770.170,59
5/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.336.016,82
5/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	15	\$ 2.155.455,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.574.303,74
6/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
6/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.324.258,82	\$ 3.336.016,82
6/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	15	\$ 2.155.455,00	\$ 1.418.848,74	\$ 3.574.303,74
6/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
6/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
6/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

6/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.552.099,18
6/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.552.099,18
7/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.155.455,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.805.820,55
7/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
7/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.155.455,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.805.820,55
7/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	16	\$ 2.299.152,00	\$ 1.760.389,92	\$ 4.059.541,92
7/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
7/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
7/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.155.455,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.805.820,55
7/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
8/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.552.099,18
8/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.552.099,18
8/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
8/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	16	\$ 2.339.488,00	\$ 1.760.389,92	\$ 4.099.877,92
8/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
8/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.552.099,18
8/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
8/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
8/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
9/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.011.758,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.552.099,18
11/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
11/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
11/05/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.155.455,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.805.820,55
11/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
11/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
11/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
11/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
12/05/2026	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Sub-Base Granular	16	\$ 1.694.112,00	\$ 1.513.438,66	\$ 3.207.550,66

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

12/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
12/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
12/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
12/05/2026	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Base Granular	15	\$ 1.588.230,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.238.595,55
12/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
12/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
12/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
12/05/2026	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Base Granular	15	\$ 1.588.230,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.238.595,55
12/05/2026	Cafelia, tramo entrada 8, Cerritos	Sub-Base Granular	14	\$ 1.482.348,00	\$ 1.324.258,82	\$ 2.806.606,82
13/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
13/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
13/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
13/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
13/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
14/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
14/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
14/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
14/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	16	\$ 2.339.488,00	\$ 1.760.389,92	\$ 4.099.877,92
14/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
15/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
15/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
15/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
16/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
16/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
16/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
19/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
19/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.835.288,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.375.629,18

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

19/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
19/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
20/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
20/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
20/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18
21/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Base Granular	15	\$ 1.860.435,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.510.800,55
21/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	2,35	\$ 297.183,35	\$ 258.557,27	\$ 555.740,62
21/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	14	\$ 1.770.454,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.310.795,18
21/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	14	\$ 1.770.454,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.310.795,18
21/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	14	\$ 1.770.454,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.310.795,18
21/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Base Granular	15	\$ 1.860.435,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.510.800,55
21/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Base Granular	14	\$ 1.736.406,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.747,18
21/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Base Granular	14	\$ 1.736.406,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.276.747,18
21/05/2026	Cañarte, tramos carrera 5b y calle 36	Base Granular	12	\$ 1.488.348,00	\$ 1.320.292,44	\$ 2.808.640,44
22/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	14	\$ 1.770.454,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.310.795,18
22/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	14	\$ 1.770.454,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.310.795,18
22/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.835.288,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.375.629,18
22/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	16	\$ 2.023.376,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.783.765,92
22/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	16	\$ 2.023.376,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.783.765,92
22/05/2026	Centenario, carrera 14 entre calle 23 y Av. 30 de Agosto	Base Granular	8	\$ 1.011.688,00	\$ 880.194,96	\$ 1.891.882,96
23/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	16	\$ 2.097.472,00	\$ 1.760.389,92	\$ 3.857.861,92
24/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	5	\$ 655.460,00	\$ 550.121,85	\$ 1.205.581,85
25/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
25/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$ 2.193.270,00	\$ 1.650.365,55	\$ 3.843.635,55
25/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	14	\$ 1.835.288,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.375.629,18
25/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$ 2.047.052,00	\$ 1.540.341,18	\$ 3.587.393,18

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

25/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$	2.047.052,00	\$	1.540.341,18	\$	3.587.393,18
25/05/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	12	\$	1.573.104,00	\$	1.320.292,44	\$	2.893.396,44
26/05/2026	Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Base Granular	15	\$	2.117.640,00	\$	1.650.365,55	\$	3.768.005,55
26/05/2026	Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Base Granular	16	\$	2.258.816,00	\$	1.760.389,92	\$	4.019.205,92
26/05/2026	Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Base Granular	14	\$	1.976.464,00	\$	1.540.341,18	\$	3.516.805,18
26/05/2026	Cancha I.E. Kennedy, Oriente	Base Granular	5,5	\$	776.468,00	\$	605.134,03	\$	1.381.602,03
28/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	16	\$	2.339.488,00	\$	1.760.389,92	\$	4.099.877,92
28/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$	2.047.052,00	\$	1.540.341,18	\$	3.587.393,18
29/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$	2.047.052,00	\$	1.540.341,18	\$	3.587.393,18
30/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	14	\$	2.047.052,00	\$	1.540.341,18	\$	3.587.393,18
30/05/2026	Tokio manzanas 35,34,33,32, Villa Santana	Base Granular	15	\$	2.193.270,00	\$	1.650.365,55	\$	3.843.635,55
2/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	14	\$	2.011.758,00	\$	1.540.341,18	\$	3.552.099,18
2/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Base Granular	15	\$	2.155.455,00	\$	1.650.365,55	\$	3.805.820,55
5/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	16	\$	2.299.152,00	\$	1.513.438,66	\$	3.812.590,66
6/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	16	\$	2.299.152,00	\$	1.513.438,66	\$	3.812.590,66
6/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	16	\$	2.299.152,00	\$	1.513.438,66	\$	3.812.590,66
6/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	16	\$	2.299.152,00	\$	1.513.438,66	\$	3.812.590,66
6/06/2026	Vía tramo La Mina - Canceles, Villa Santana	Sub-Base Granular	14	\$	2.011.758,00	\$	1.324.258,82	\$	3.336.016,82
9/06/2026	Parque Industrial Sector A, Del Café	Base Granular	15	\$	1.966.380,00	\$	1.650.365,55	\$	3.616.745,55
	<i>Total Base Granular</i>	2236,85	<i>Subtotal</i>	\$	352.841.735,55	\$	277.038.913,99	\$	629.880.649,54
	<i>Total Sub Base Granular</i>	327	<i>I.V.A</i>	\$	67.039.929,75	\$	52.637.393,66	\$	119.677.323,41
			<i>Total</i>	\$	419.881.665,30	\$	329.676.307,65	\$	749.557.972,95

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S Nit. 900.188.750-8, representada legalmente por Juan Sebastián García Henao identificado con cedula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira, durante el tiempo de ejecución del contrato conforme lo ordena el Artículo 50 de la Ley 789 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ, identificado con C.C: No. 1.053.829.394 de Pereira y, con Tarjeta Profesional No. 254066-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad HT ASESORES – AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S en mi condición de Revisor Fiscal de AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. identificada con NIT. 900.188.750-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se anexa soportes.

VERIFICACIÓN DE DISEÑOS DE MEZCLA Y CALIDAD DE MATERIALES SUMINISTRADOS.

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S Nit. 900.188.750-8, representada legalmente por Juan Sebastián García Henao identificado con cedula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira, manifiesta que los materiales suministrados son idóneos para construcción de vías y cumplen con estándares de calidad para lo cual suministra diseño de mezcla asfáltica y resultados de ensayos de laboratorio para el control de calidad. Se anexan soportes.

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017


Apoyo a la Supervisión
Juan Carlos Márquez S


JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Supervisor del contrato 4347-2026

Anexos

1. Facturas
2. Informe fotográfico ejecución de material asfáltico, geomalla y granulares
3. Actas y solicitud de materiales
4. Parafiscales y planillas de pago seguridad social
5. Ensayos de laboratorio – Calidad de materiales

Versión: 1

Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

ANEXOS



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9380	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,12	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.488.543,06	PLACA ESU-881 5 MEDIAS CANECAS DE LIGA	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9383	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,94	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.316.060,40	PLACA SXE-416 - 7 MEDIAS CANECAS	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9384	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,57	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.961.512,72	PLACA ESU-881 - 5 MEDIAS CANEAS	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9386	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,10	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.469.378,32	PLACA ESU-881 - 10 MEDIAS CANECAS	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9387	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	CANECAS DE EMULSION (350 KG) + 25 CANECAS	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9388	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.041.605,23	CA ESU-881 - RM 1391 - 12 MEDIAS CANECAS DE L	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9389	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,19	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.639.145,70	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9390	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9391	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.999.842,20	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98257	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,94	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.274.297,38	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98317	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,20	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.690.491,09	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98373	23/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,39	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.789.030,07	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9441	28/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,51	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.945.781,53	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9443	28/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.447.498,30	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9444	28/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,57	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.003.275,75	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98289	28/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	4,50	M3	\$ 958.236,97	\$ 4.312.066,39	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	7753	30/04/2026	RI055	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	350,0	kg	\$ 12.961,34	\$ 4.536.470,59	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	8010	30/04/2026	RI186	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	780,0	kg	\$ 12.961,34	\$ 10.109.848,74	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9468	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9469	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,74	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.124.413,01	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9470	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,55	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.900.584,96	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9471	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9472	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.507.707,80	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9473	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,78	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.162.742,49	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9474	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.501.558,97	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9475	30/04/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9476	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.197.638,42	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9477	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,66	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.047.754,05	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCION
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9479	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,20	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.565.202,02	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9480	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.431.048,84	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9481	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,07	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.440.631,21	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9482	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,21	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.574.784,39	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9483	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9484	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.593.949,13	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98582	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,72	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.063.485,24	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98619	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,97	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.303.044,49	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98341	2/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,59	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.938.914,44	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98286	3/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.325.642,77	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98530	3/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,77	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.111.397,09	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98237	3/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.010.142,84	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9485	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.041.605,23	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9486	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	TEMPERATURA 150°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9487	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.843.090,74	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9488	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,84	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.220.236,71	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9489	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,53	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.923.183,24	TEMPERATURA 150°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9491	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9492	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9493	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.584.366,76	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9494	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,77	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.153.160,12	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9495	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.325.642,77	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9496	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.363.972,25	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9497	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,20	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.565.202,02	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98555	4/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.283.879,75	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98366	5/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.996.408,66	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98489	5/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.322.209,23	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9498	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,69	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.368.842,34	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCION
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9499	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,54	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.932.765,61	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9501	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.325.642,77	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9504	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.593.949,13	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9506	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.402.301,73	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9507	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,41	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.766.431,78	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9508	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,33	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.689.772,82	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9509	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9510	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9511	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,81	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.149.726,57	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9512	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.546.037,28	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9513	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.363.972,25	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9514	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,57	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.961.512,72	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9515	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,57	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.919.749,70	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9516	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,76	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.185.340,77	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98448	7/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,08	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.450.213,58	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9517	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,39	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.747.267,04	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9521	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,33	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.689.772,82	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9522	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,83	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.210.654,34	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9523	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,29	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.651.443,34	TEMPERATURA 150°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9524	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,10	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.469.378,32	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9525	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,29	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.651.443,34	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9526	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,93	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.306.478,03	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9527	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.329.076,32	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98491	8/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,08	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.450.213,58	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9528	9/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,26	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.664.459,26	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9529	9/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9530	9/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,19	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.555.619,65	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9531	9/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.514.574,89	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98405	9/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,44	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.795.178,89	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98253	10/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.239.401,45	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	7525	11/05/2026	RI055	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	610,0	KG	\$ 12.961,34	\$ 7.906.420,17	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	7535	11/05/2026	RI055	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	330,0	KG	\$ 12.961,34	\$ 4.277.243,70	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9490	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	9,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.496.128,42	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9532	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,74	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.416.754,18	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9533	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,77	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.153.160,12	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9536	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,77	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.111.397,09	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9539	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,53	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.881.420,22	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9540	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.283.879,75	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9542	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,41	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.808.194,81	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9543	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.041.605,23	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9544	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.079.934,71	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9545	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,81	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.233.252,62	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9546	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9547	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,59	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.980.677,46	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9548	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,78	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.246.268,54	TEMPERATURA 158 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9549	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.581.651,48	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9550	11/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,70	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.127.846,55	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9551	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.646.731,06	TEMPERATURA 158 ° C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9552	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	TEMPERATURA 158 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9553	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9555	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,12	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.488.543,06	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9556	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,21	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.574.784,39	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9557	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9558	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.329.076,32	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9559	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,93	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.306.478,03	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9560	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,76	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.101.814,72	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9561	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,87	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.248.983,82	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9562	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,35	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.708.937,56	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9563	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,54	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.891.002,59	PLACA OVE-469 TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9564	12/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,69	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.118.264,18	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9565	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,47	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.823.926,00	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9566	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,46	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.814.343,63	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9567	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,72	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.105.248,27	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9568	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9569	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,65	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.038.171,68	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98267	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	10,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.754.852,40	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98334	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.559.771,46	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98428	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,43	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.785.596,52	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98480	13/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,20	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.648.728,07	TEMPERATURA 160 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9572	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	6,28	M3	\$ 958.236,97	\$ 6.017.728,20	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9573	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.396.152,91	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9574	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,47	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.823.926,00	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9575	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	PLACA OVE-469 TEMPERATURA 152 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9576	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,24	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.603.531,50	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9577	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.507.707,80	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9578	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,26	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.622.696,24	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9579	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,99	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.405.735,28	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98258	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,26	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.706.222,29	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98358	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,94	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.274.297,38	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98403	14/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,91	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.245.550,27	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	7570	15/05/2026	RI055	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	400,0	KG	\$ 12.961,34	\$ 5.184.537,82	TEMPERATURA-156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	7655	15/05/2026	RI055	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	330,0	KG	\$ 12.961,34	\$ 4.277.243,70	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9580	15/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,67	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.349.677,60	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9587	15/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,24	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.645.294,52	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9588	15/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,19	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.597.382,67	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9589	15/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.367.405,80	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9590	15/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,85	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.271.582,10	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9591	15/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,08	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.491.976,61	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9592	15/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,81	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.233.252,62	TEMPERATURA 156 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9593	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,45	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.138.865,46	TEMPERATURA 165 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9595	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.476.245,41	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9596	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.485.827,78	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9598	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,96	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.376.988,17	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9599	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.476.245,41	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9600	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.709.655,83	PLACA TAI-810 TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9601	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,10	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.511.141,34	TEMPERATURA 170°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9602	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.539.888,45	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9603	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,04	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.453.647,13	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9604	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.587.800,30	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9605	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,78	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.204.505,51	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9606	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,81	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.233.252,62	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98278	16/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	9,84	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.429.051,83	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	7674	19/05/2026	RI055	CEMENTO ASFÁLTICO PARA SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DE REFINERIA 60/70	660,0	KG	\$ 12.961,34	\$ 8.554.487,39	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9611	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,05	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.421.466,47	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9612	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,27	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.632.278,61	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9613	19/05/2026	OT02	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO-	1650	gl	\$ 27.826,05	\$ 45.912.983,19	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9614	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,38	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.737.684,67	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9615	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,45	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.846.524,29	PLACA OVE-469 TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9616	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,86	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.239.401,45	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9617	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9619	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,22	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.626.129,78	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9620	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,93	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.348.241,06	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCION
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9621	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.549.470,82	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9622	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,38	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.779.447,70	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9623	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,48	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.917.034,42	PLACA OVE-469 - TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9624	19/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,79	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.214.087,88	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9625	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,57	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.253.853,90	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9628	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.507.707,80	TEMPERATURA 155°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9629	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,55	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.900.584,96	TEMPERATURA 155°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9630	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,41	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.766.431,78	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9631	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,48	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.833.508,37	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9632	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,43	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.869.122,57	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9634	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,94	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.399.586,45	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9635	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,06	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.556.337,92	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	96232	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	10,72	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.272.300,37	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	96316	20/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	9,76	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.352.392,87	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9638	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.373.554,62	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9640	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,96	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.335.225,14	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9641	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,89	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.268.148,55	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9642	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,02	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.392.719,36	LIGA + 29 CANECAS DE EMULSION + 55 GL C/U - TA	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9643	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,09	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.459.795,95	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9644	21/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,05	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.421.466,47	RM 0007 - TW 971	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9649	22/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.383.136,99	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9650	22/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,30	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.661.025,71	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9651	22/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,37	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.728.102,30	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9652	22/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,26	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.622.696,24	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9653	22/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,73	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.114.830,64	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9654	22/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,59	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.980.677,46	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	96264	22/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,46	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.856.106,66	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9066	23/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.677.475,18	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCION
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9069	23/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,10	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.552.904,37	PLACA OVE-469 - TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9070	23/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,43	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.869.122,57	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9071	23/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,35	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.750.700,59	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98461	23/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,97	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.303.044,49	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98497	23/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,93	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.264.715,01	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98248	23/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,53	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.964.946,27	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98283	24/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,68	M3	\$ 958.236,97	\$ 15.025.155,76	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9111	25/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	6,70	M3	\$ 958.236,97	\$ 6.420.187,73	PLACA ESU-881 - 10 MEDIAS CANECAS	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9112	25/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,90	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.277.730,92	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9113	25/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,93	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.306.478,03	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98313	25/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	8,60	M3	\$ 958.236,97	\$ 8.240.837,98	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98402	25/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	8,60	M3	\$ 958.236,97	\$ 8.240.837,98	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9656	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,41	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.766.431,78	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9659	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,95	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.325.642,77	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9662	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9663	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,16	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.526.872,54	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9664	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,89	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.268.148,55	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9665	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,33	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.731.535,85	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9666	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.546.037,28	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98380	26/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,51	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.862.255,48	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9673	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,52	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.913.600,87	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9674	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,14	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.591.233,85	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9675	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,23	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.677.475,18	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9676	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,37	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.769.865,33	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9677	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,11	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.520.723,71	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9681	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.396.152,91	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9682	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,78	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.204.505,51	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9683	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,05	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.421.466,47	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9684	27/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,98	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.437.915,93	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9697	28/05/2026	OT02	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO-	275	gl	\$ 27.826,05	\$ 7.652.163,87	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9691	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,47	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.907.452,05	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCIÓN
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9693	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,61	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.041.605,23	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9694	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.926.616,79	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9695	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,52	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.955.363,90	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9696	28/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,49	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.926.616,79	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9704	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,30	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.786.314,79	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9705	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,79	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.255.850,91	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98256	29/05/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	6,74	M3	\$ 958.236,97	\$ 6.458.517,21	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9716	1/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	7,57	M3	\$ 958.236,97	\$ 7.253.853,90	TEMPERATURA 158 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9717	1/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9718	1/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,29	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.693.206,37	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9719	1/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,83	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.252.417,36	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9721	1/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.444.064,76	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9723	1/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,01	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.424.900,02	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9724	1/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,97	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.386.570,54	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9725	2/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.444.064,76	TEMPERATURA 154 °C	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9728	2/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.444.064,76	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9730	2/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 152°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9731	3/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,40	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.882.138,49	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9734	3/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,34	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.824.644,27	TEMPERATURA 158°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9737	3/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,51	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.945.781,53	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9739	3/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,74	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.249.702,08	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9741	3/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,03	M3	\$ 958.236,97	\$ 11.527.590,81	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98226	3/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,32	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.763.716,50	O MARQUEZ / 5 CANENCAS DE EMULSION DE ROM	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98242	4/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	9,72	M3	\$ 958.236,97	\$ 9.314.063,39	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98278	4/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,81	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.275.015,65	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98374	4/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,32	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.721.953,48	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9743	4/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	PLACA OVE-469 - TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9744	4/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.415.317,65	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9746	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,13	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.498.125,43	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9747	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,97	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.344.807,51	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION No 002

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	DIRECCION
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9748	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,20	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.565.202,02	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9751	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,24	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.603.531,50	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9752	5/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,79	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.172.324,86	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9774	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,00	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.373.554,62	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9776	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	14,71	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.095.665,90	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9778	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,19	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.555.619,65	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9780	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,27	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.632.278,61	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98257	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	11,18	M3	\$ 958.236,97	\$ 10.713.089,38	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98275	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,84	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.261.999,73	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98298	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	13,84	M3	\$ 958.236,97	\$ 13.261.999,73	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RDA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98352	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	12,76	M3	\$ 958.236,97	\$ 12.227.103,80	TEMPERATURA 154°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98373	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,45	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.804.761,26	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	98383	9/06/2026	RI151	MEZCLA ASFALTICA NORMALIZADA MDC 19 M3-	15,25	M3	\$ 958.236,97	\$ 14.613.113,87	TEMPERATURA 160°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9018	2/05/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	1300,00	M2	\$ 24.837,82	\$ 32.289.159,66	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9066	11/05/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	2961,72	M2	\$ 24.837,82	\$ 73.562.653,82	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9102	15/05/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	2861,12	M2	\$ 24.837,82	\$ 71.063.969,61	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9105	16/05/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	706,71	M2	\$ 24.837,82	\$ 17.553.132,33	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
GFA	MUNICIPIO DE PEREIRA	9123	19/05/2026	RI161	GEOMALLA BIAIXIAL	3783,50	M2	\$ 24.837,82	\$ 93.973.873,53	TEMPERATURA 156°	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL

SUB-TOTAL \$ 3.897.278.686,29

I.V.A \$ 740.482.950,40

TOTAL \$ 4.637.761.636,69

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE PEREIRA

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
Representante Legal
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA

JUAN CARLOS MARQUEZ
REVISADO



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	140486	15/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	142929	15/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	142956	15/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145016	16/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143009	17/04/2026	MP06	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143012	17/04/2026	MP06	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143048	18/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143052	18/04/2026	MP06	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143057	18/04/2026	MP06	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143059	18/04/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143060	18/04/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144935	19/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144761	20/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144866	20/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143064	20/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143086	20/04/2026	MP06	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143093	20/04/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143097	20/04/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143102	20/04/2026	MP06	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143104	20/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145117	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144749	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144950	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144969	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	7,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 770.170,59	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143110	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143111	21/04/2026	MP06	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143113	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143118	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143120	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143124	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144795	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144846	21/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144837	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144932	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144998	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145044	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145115	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143148	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143149	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143151	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143167	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143170	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143180	22/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144763	23/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144938	23/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145142	23/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143200	23/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143221	23/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143243	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143285	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144853	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144716	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144750	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144853	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144861	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144898	24/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144728	25/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145206	25/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	13,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.430.316,81	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145138	26/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144951	26/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143304	27/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145035	27/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143369	28/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143422	29/04/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143471	2/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143561	5/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	7,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 770.170,59	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143582	5/05/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143584	5/05/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143596	6/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143597	6/05/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143602	6/05/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.418.848,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143613	6/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143616	6/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143617	6/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143619	6/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143620	6/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143631	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143633	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143634	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143648	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143655	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143656	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143658	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143659	7/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143674	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143675	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143676	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143680	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143681	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143701	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143704	8/05/2026	MP05	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143708	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143709	8/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143714	9/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143725	11/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143726	11/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143728	11/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143729	11/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143745	11/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143748	11/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143749	11/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143761	12/05/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143762	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143765	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143780	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143787	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143795	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143796	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143797	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144731	12/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144745	12/05/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143809	13/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143810	13/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143826	13/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143852	13/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143853	13/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143869	14/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143873	14/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143887	14/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143895	14/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143896	14/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143909	15/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143911	15/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143923	15/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143959	16/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143960	16/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143961	16/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143972	19/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143974	19/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143979	19/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	143981	19/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144821	19/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144924	19/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144011	20/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144021	20/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144022	20/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	141841	21/05/2026	MP05	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	139861	21/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	2,4	M3	\$ 110.024,37	\$ 258.557,27	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	139912	21/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	139913	21/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	139920	21/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	141832	21/05/2026	MP05	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	141845	21/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	141878	21/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	98252	21/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	12,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.320.292,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	141822	22/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	141827	22/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144114	22/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144747	22/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144790	22/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144839	22/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	8,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 880.194,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144785	23/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144864	24/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144953	24/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	5,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 550.121,85	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144130	25/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144131	25/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144154	25/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144169	25/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144170	25/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144742	25/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	12,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.320.292,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144179	26/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144180	26/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144185	26/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144808	26/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	5,5	M3	\$ 110.024,37	\$ 605.134,03	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144242	28/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	16,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.760.389,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144251	28/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144286	29/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144330	30/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144332	30/05/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144407	2/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	14,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.540.341,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144409	2/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144909	5/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144783	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144808	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144986	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.513.438,66	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	145002	6/06/2026	MP03	SUB-BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 94.589,92	\$ 1.324.258,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
REM	MUNICIPIO DE PEREIRA	144558	9/06/2026	MP04	BASE GRANULAR-	15,0	M3	\$ 110.024,37	\$ 1.650.365,55	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL

SUB-TOTAL	\$	277.038.913,99
I.V.A	\$	52.637.393,66
TOTAL	\$	329.676.307,65

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE PEREIRA

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
Representante Legal
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA

JUAN CARLOS MARQUEZ
REVISADO



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	106990	15/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 136.188,08	\$ 2.042.821,20	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110659	15/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110682	15/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113811	16/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110735	17/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110741	17/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110796	18/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110802	18/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110815	18/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110817	18/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110819	18/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113886	19/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113658	20/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113847	20/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110835	20/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110863	20/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110872	20/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110873	20/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110877	20/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110880	20/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113896	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113644	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113954	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113972	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	7	M3	\$ 136.134,00	\$ 952.938,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110912	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110914	21/04/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110915	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110916	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110919	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110922	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113730	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113798	21/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113713	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113814	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113962	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114045	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114133	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110982	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110983	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	110990	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111013	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111016	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.178.144,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111027	22/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111088	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,12	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.058.346,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111092	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,94	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.033.841,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111096	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,57	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.983.472,38	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111101	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,1	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.055.623,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111102	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.054.262,06	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111106	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,61	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.852.783,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111107	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,19	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.795.607,46	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111109	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.905.876,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111111	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,61	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.988.917,74	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113656	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,94	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.169.975,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113674	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,2	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.660.834,80	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113761	23/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,39	M3	\$ 136.134,00	\$ 1.958.968,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113723	23/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113858	23/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114203	23/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111073	23/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111098	23/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 136.134,00	\$ 2.042.010,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111140	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111180	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113775	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113607	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113640	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113731	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113803	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113834	24/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113639	25/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114283	25/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	13	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.704.196,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113966	26/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113886	26/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111298	27/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113835	27/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.137.808,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111381	28/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,51	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.771.052,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111393	28/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,99	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.702.885,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111400	28/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,57	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.778.918,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111414	28/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.835.288,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113695	28/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	4,5	M3	\$ 131.092,00	\$ 589.914,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111481	29/04/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.966.380,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111544	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.999.153,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111545	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,74	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.932.296,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111554	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,55	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.038.480,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111558	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.983.421,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111569	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.984.732,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111577	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,78	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.937.539,76	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111578	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,09	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.847.086,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111579	30/04/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.969.001,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111590	2/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.004.195,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111597	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,86	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.079.119,12	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111600	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,66	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.921.808,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111603	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,2	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.915.960,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111604	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,06	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.974.245,52	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111605	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,07	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.899.573,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111606	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,21	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.993.909,32	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111608	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.907.136,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111612	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,23	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.919.741,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114022	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,72	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.981.506,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	114025	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,97	M3	\$ 126.050,00	\$ 2.013.018,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113702	2/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,59	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.043.724,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113646	3/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,95	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.884.447,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113935	3/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,77	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.987.808,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113645	3/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,49	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.506.247,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111632	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,61	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.715.540,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111636	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.893.271,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111642	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,49	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.952.514,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111644	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,84	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.870.582,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111647	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,53	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.831.506,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111650	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.893.271,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111682	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.967.690,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111683	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,22	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.995.220,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111687	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,77	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.936.228,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111692	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,95	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.959.825,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111695	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,99	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.965.069,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111701	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,2	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.992.598,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113947	4/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,95	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.090.917,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111740	5/05/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111743	5/05/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.155.455,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113720	5/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,65	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.972.682,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113863	5/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,99	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.096.161,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111753	6/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111754	6/05/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111758	6/05/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	15	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.155.455,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111768	6/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111772	6/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111773	6/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111779	6/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111783	6/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111802	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.155.455,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111803	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111805	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.155.455,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111815	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,54	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.832.767,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111816	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.299.152,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111818	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,95	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.884.447,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111819	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111820	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111822	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,23	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.919.741,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111823	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.155.455,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111824	7/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111825	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,03	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.894.531,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111830	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,41	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.942.430,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111833	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,33	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.932.346,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111834	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.907.136,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111836	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.983.421,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111837	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,81	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.072.564,52	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111838	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,18	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.989.976,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111839	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,99	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.965.069,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111840	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,57	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.910.010,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111841	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,57	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.041.102,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111842	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,76	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.803.825,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113771	7/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,08	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.900.834,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111843	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,39	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.017.505,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111845	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111846	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111847	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111848	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.339.488,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111850	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111852	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,33	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.932.346,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111853	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,83	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.869.321,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111859	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,29	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.927.304,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111860	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,1	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.903.355,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111862	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,29	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.927.304,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111864	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,93	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.881.926,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111865	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,91	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.753.355,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111874	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111876	8/05/2026	TR7	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111900	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111902	8/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113866	8/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,08	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.900.834,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111916	9/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111920	9/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,26	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.797.473,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111921	9/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.893.271,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111926	9/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,19	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.914.699,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111927	9/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,06	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.646.213,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113799	9/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,44	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.024.060,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113665	10/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,86	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.948.027,12	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111648	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	9,91	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.324.104,83	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111933	11/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111934	11/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111935	11/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.155.455,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111936	11/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111942	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,77	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.973.464,01	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111943	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,77	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.107.077,01	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111946	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,53	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.075.009,89	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111947	11/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111948	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,95	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.131.127,35	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111950	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,41	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.925.363,33	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111951	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,61	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.818.472,93	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111952	11/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111953	11/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111982	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,65	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.789.405,80	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111988	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,81	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.810.380,52	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	111994	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.835.288,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112004	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,59	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.912.632,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112011	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,78	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.675.355,76	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112015	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,13	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.721.237,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112016	11/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,7	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.795.960,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112022	12/05/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 105.882,00	\$ 1.694.112,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112023	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112025	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112030	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.006.867,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112033	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.016.220,17	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112037	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,12	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.020.228,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112041	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112043	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,21	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.032.253,73	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112044	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 105.882,00	\$ 1.588.230,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112045	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.037.598,25	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112047	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,91	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.858.556,83	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112051	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112052	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112053	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112079	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,93	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.957.203,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112084	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,76	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.066.009,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112089	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,87	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.949.338,04	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112093	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,35	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.012.262,20	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112094	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,54	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.037.169,68	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112095	12/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,69	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.794.649,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113614	12/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 105.882,00	\$ 1.588.230,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113646	12/05/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 105.882,00	\$ 1.482.348,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112097	13/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112098	13/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112110	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,47	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.066.993,11	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112111	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,46	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.065.656,98	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112112	13/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112114	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,72	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.966.783,36	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112120	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.005.531,13	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112121	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,65	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.957.430,45	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112125	13/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112126	13/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113627	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	10,18	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.360.180,34	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113709	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,02	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.472.415,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113765	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,43	M3	\$ 133.613,00	\$ 2.061.648,59	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113865	13/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,2	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.763.691,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112143	14/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112147	14/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112163	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	6,28	M3	\$ 105.882,00	\$ 664.938,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112166	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,98	M3	\$ 105.882,00	\$ 1.480.230,36	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112167	14/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112172	14/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.339.488,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112173	14/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112207	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,47	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.027.993,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112214	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.967.690,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112216	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,24	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.997.842,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112220	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.984.732,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112221	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,26	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.000.463,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112222	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,99	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.833.977,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113672	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,26	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.738.279,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113747	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,94	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.089.606,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113818	14/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,91	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.085.673,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112224	15/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112229	15/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112235	15/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112273	15/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,24	M3	\$ 141.176,00	\$ 2.010.346,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112274	15/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,19	M3	\$ 141.176,00	\$ 2.003.287,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112275	15/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,95	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.969.405,20	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112276	15/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,85	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.955.287,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112277	15/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,08	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.987.758,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112278	15/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,81	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.949.640,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112279	16/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112280	16/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112281	16/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112290	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,02	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.739.641,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112291	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,03	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.740.977,39	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112299	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,96	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.865.237,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112301	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,02	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.739.641,26	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112311	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,22	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.632.750,86	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112318	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,1	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.990.581,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112319	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,13	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.994.816,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112320	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,04	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.982.111,04	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112321	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,18	M3	\$ 141.176,00	\$ 2.001.875,68	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112322	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,78	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.945.405,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112323	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,81	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.949.640,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113696	16/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	9,84	M3	\$ 133.613,00	\$ 1.314.751,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112325	19/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112327	19/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112337	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,05	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.972.934,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112339	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,27	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.001.774,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112343	19/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.835.288,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112344	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,38	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.016.194,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112347	19/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112348	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,45	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.894.279,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112354	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,86	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.948.027,12	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112357	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.978.178,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112413	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,22	M3	\$ 141.176,00	\$ 2.007.522,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112414	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,93	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.966.581,68	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112415	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,14	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.996.228,64	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112416	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,38	M3	\$ 141.176,00	\$ 2.030.110,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112417	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,48	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.903.052,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112418	19/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,79	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.946.817,04	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113736	19/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113819	19/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112419	20/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112429	20/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112430	20/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112436	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.984.732,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112439	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,55	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.038.480,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112442	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,41	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.020.127,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112444	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,48	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.029.304,16	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112446	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,43	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.760.565,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112485	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,94	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.826.817,44	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112486	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,06	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.702.582,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113609	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	10,72	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.513.406,72	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113671	20/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	9,76	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.377.877,76	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	105913	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	2,35	M3	\$ 126.461,00	\$ 297.183,35	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	106063	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.770.454,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	106065	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.770.454,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	106075	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.770.454,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109268	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.860.435,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109273	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.860.435,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109277	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.736.406,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109320	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.736.406,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112505	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.966.380,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112508	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,96	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.961.136,32	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112509	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,89	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.951.959,88	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112512	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,02	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.969.001,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112515	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,09	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.978.178,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112521	21/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,05	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.972.934,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113609	21/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	12	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.488.348,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109261	22/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.770.454,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109267	22/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.770.454,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112571	22/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,01	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.892.010,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112576	22/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,3	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.928.565,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112578	22/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,37	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.937.388,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112579	22/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,26	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.923.523,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112582	22/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,73	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.856.716,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112583	22/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,59	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.839.069,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112587	22/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.835.288,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113680	22/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,46	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.822.683,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113615	22/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 126.461,00	\$ 2.023.376,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113669	22/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 126.461,00	\$ 2.023.376,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113750	22/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	8	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.011.688,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109407	23/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,23	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.640.903,67	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109408	23/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,1	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.624.779,90	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109416	23/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,43	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.665.709,47	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109419	23/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,35	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.779.816,15	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113838	23/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,97	M3	\$ 126.050,00	\$ 2.013.018,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113918	23/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,93	M3	\$ 126.050,00	\$ 2.007.976,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113693	23/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,53	M3	\$ 124.029,00	\$ 1.678.112,37	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113682	23/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113695	24/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,68	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.976.464,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113802	24/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.097.472,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113899	24/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	5	M3	\$ 131.092,00	\$ 655.460,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109641	25/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	6,7	M3	\$ 126.461,00	\$ 847.288,70	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109643	25/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,9	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.884.268,90	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	109646	25/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,93	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.888.062,73	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112649	25/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112650	25/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112690	25/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.835.288,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112700	25/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112701	25/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113612	25/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	8,6	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.087.564,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113616	25/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	8,6	M3	\$ 126.461,00	\$ 1.087.564,60	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113693	25/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	12	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.573.104,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112709	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,41	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.942.430,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112710	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,95	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.884.447,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112711	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.922.262,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112712	26/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 141.176,00	\$ 2.117.640,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112713	26/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 141.176,00	\$ 2.258.816,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112715	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,16	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.910.918,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112716	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,89	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.876.884,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112717	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,33	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.806.296,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112720	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,18	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.913.439,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112722	26/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.976.464,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113780	26/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,51	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.955.035,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113629	26/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	5,5	M3	\$ 141.176,00	\$ 776.468,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112771	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,52	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.830.246,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112772	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,14	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.656.297,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112776	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,23	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.667.641,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112780	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,37	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.811.338,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112782	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,11	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.778.565,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112786	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,98	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.762.179,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112792	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,78	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.736.969,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112794	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,05	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.897.052,50	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112795	27/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,98	M3	\$ 126.050,00	\$ 1.636.129,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112836	28/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	16	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.339.488,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112843	28/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112844	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,47	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.969.556,46	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112849	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,61	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.990.026,98	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112851	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,49	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.972.480,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112855	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,52	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.976.867,36	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112856	28/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,49	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.972.480,82	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112903	29/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112930	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,3	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.736.464,80	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112931	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,79	M3	\$ 141.176,00	\$ 1.805.641,04	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113636	29/05/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	6,74	M3	\$ 141.176,00	\$ 951.526,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112963	30/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	112967	30/05/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.193.270,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113007	1/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113010	1/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,29	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.089.455,22	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113013	1/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,83	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.022.194,94	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCIÓN
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113016	1/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,03	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.051.438,54	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113019	1/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,01	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.048.514,18	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113021	1/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,97	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.042.665,46	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113063	2/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,03	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.051.438,54	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113066	2/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,03	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.051.438,54	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113071	2/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113087	2/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113092	2/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.155.455,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113137	3/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,4	M3	\$ 143.697,00	\$ 1.781.842,80	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113145	3/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,34	M3	\$ 143.697,00	\$ 1.773.220,98	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113150	3/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,51	M3	\$ 143.697,00	\$ 1.941.346,47	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113151	3/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,74	M3	\$ 143.697,00	\$ 1.687.002,78	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113158	3/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,03	M3	\$ 143.697,00	\$ 1.728.674,91	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113678	3/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,32	M3	\$ 143.697,00	\$ 1.914.044,04	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113207	4/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113212	4/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.047.052,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113624	4/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	9,72	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.421.238,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113706	4/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,81	M3	\$ 146.218,00	\$ 1.873.052,58	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113709	4/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,32	M3	\$ 146.218,00	\$ 2.093.841,76	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113261	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,13	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.983.421,96	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113262	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,97	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.962.447,24	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113264	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,2	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.992.598,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113269	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,24	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.997.842,08	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113271	5/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,79	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.938.850,68	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113785	5/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.299.152,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113640	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.299.152,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL



CONTROL DE MATERIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONTRATO DE
SUMINISTRO No

4347-2026

RELACION 03

DETALLES DE LOS DESPACHOS

DOC	TERCERO	No DOC	FECHA	PROD	DESCRIPCION	CANT	UD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIRECCION
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113720	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.299.152,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113831	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	16	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.299.152,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113836	6/06/2026	TR5	TRANSPORTE SUB-BASE-	14	M3	\$ 143.697,00	\$ 2.011.758,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113371	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.966.380,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113377	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	14,71	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.928.363,32	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113378	9/06/2026	TR6	TRANSPORTE BASE GRANULAR-	15	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.966.380,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113412	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,19	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.991.287,48	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113414	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,27	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.001.774,84	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113695	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	11,18	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.465.608,56	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113710	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,84	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.814.313,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113778	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	13,84	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.814.313,28	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113798	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	12,76	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.672.733,92	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113829	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,45	M3	\$ 131.092,00	\$ 2.025.371,40	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
RET	MUNICIPIO DE PEREIRA	113832	9/06/2026	TR43	TRANSPORTES MEZCLA ASFALTICA MDC19-	15,25	M3	\$ 131.092,00	\$ 1.999.153,00	- CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL

SUB-TOTAL \$ 830.195.341,70

I.V.A \$ 157.737.114,92

TOTAL \$ 987.932.456,62

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

SUPERVISOR
MUNICIPIO DE PEREIRA

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO

Representante Legal
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA

JUAN CARLOS MARQUEZ

REVISADO



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:001

FECHA:
15/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	44

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:002

FECHA:
16/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	16

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:003

FECHA:
17/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	31

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:004

FECHA:
18/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	57
6	Base tipo A	M3	14

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:005

FECHA:
19/0426

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	16

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:006

FECHA:
20/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	58
6	Base tipo A	M3	60

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:007

FECHA:
21/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	15
6	Base tipo A	M3	162

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:008

FECHA:
22/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	167

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



ORDEN No:009

FECHA:
23/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	78
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	172,76

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



ORDEN No:010

FECHA:
24/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	126

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



ORDEN No:011

FECHA:
25/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	29				

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

SOLICITUD DE MATERIALES A PROVEEDORES

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:012

FECHA:
26/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	32				

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:013

FECHA:
27/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	32				

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:014

FECHA:
28/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	14				
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	44,57				

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:015

FECHA:
29/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	15

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:016

FECHA:
30/04/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	119,7
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	1130

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:017

FECHA:
02/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	168,7
6	Base tipo A	M3	15
7	Geomalla biaxial	M2	1300

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:018

FECHA:
03/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	42,21

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:019

FECHA:
04/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	194,6

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

**Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA
SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:020

FECHA:
05/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	31,64
5	Subbase tipo A	M3	29
6	Base tipo A	M3	7

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:021

FECHA:
06/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	29
6	Base tipo A	M3	85

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:022

FECHA:
07/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	233,4
6	Base tipo A	M3	120

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:023

FECHA:
08/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	135,15
6	Base tipo A	M3	129

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:024

FECHA:
09/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	72,97
6	Base tipo A	M3	14

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:025

FECHA:
10/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	14,86

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Alcaldía de
PEREIRA

SOLICITUD DE MATERIALES A PROVEEDORES

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:026

FECHA:
11/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	203,35
7	Geomalla biaxial	M2	2961,72
6	Base tipo A	M3	102
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	940

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:027

FECHA:
12/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	187,72
5	Subbase tipo A	M3	30
6	Base tipo A	M3	115

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:028

FECHA:
13/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	125,14
6	Base tipo A	M3	70

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:029

FECHA:
14/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	155,48
6	Base tipo A	M3	73

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:030

FECHA:
15/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	91,79
7	Geomalla biaxial	M2	2861,12
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	730
6	Base tipo A	M3	42

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:031

FECHA:
16/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	44
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	166,58
7	Geomalla biaxial	M2	706,71

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:032

FECHA:
19/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	174,04
7	Geomalla biaxial	M2	3783,5
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	KG	660
6	Base tipo A	M3	88
8	Emulsión asfáltica CRL-1	Galón	1650

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:033

FECHA:
20/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	128,06
6	Base tipo A	M3	43

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:034

FECHA:
21/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	90,01
6	Base tipo A	M3	114,35

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:035

FECHA:
22/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	104,72
6	Base tipo A	M3	82

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:036

FECHA:
23/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	99,54
6	Base tipo A	M3	16

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:037

FECHA:
24/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	15,68
6	Base tipo A	M3	21

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:038

FECHA:
25/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	53,73
6	Base tipo A	M3	84

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:039

FECHA:
26/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	120,68
6	Base tipo A	M3	50,5

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:040

FECHA:
27/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	125,16

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:041

FECHA:
28/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	67,58
6	Base tipo A	M3	30
8	Emulsión asfáltica CRL-1	Galón	275

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:042

FECHA:
29/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	31,83
6	Base tipo A	M3	14

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:043

FECHA:
30/05/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
6	Base tipo A	M3	29

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:044

FECHA:
01/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	91,7

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:045

FECHA:
02/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	42,06
6	Base tipo A	M3	29

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:046

FECHA:
03/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	75,34

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:047

FECHA:
04/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	64,85

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:048

FECHA:
05/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	75,33
5	Subbase tipo A	M3	16

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:049

FECHA:
06/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
5	Subbase tipo A	M3	62

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:



Versión: 02

Fecha de Vigencia: Junio 05 de 2017

ORDEN No:050

FECHA:
09/06/26

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M3	142,49
6	Base tipo A	M3	15

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No 4347-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-FOR-002
	FORMATO		Versión:	1
	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADO GRUESO Y FINO - TRITURADO		FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1			

NORMAS INVIAS 213, 214 -2013

N. de Muestra:	21506	Fecha de ensayo:	14/05/2026
Fecha de Toma	14/05/2026		

LOCALIZACION MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA
Localización PLANTA	K15 VIA LA VIGINIA APIA

Tipo de control


☐ Procedencia
 ☐ Producción
 ☐ Producto terminado

Masa seca total de la muestra (g)		7968,1	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		7927,9
Tamiz	Tamiz (mm)		% Retenido	% Acumulado	% Pasa
2"	50,00		0,0	0,0	100,0
1 1/2"	37,50		0,0	0,0	100,0
1"	25,00		0,0	0,0	100,0
3/4"	19,00		0,0	0,0	100,0
1/2"	12,50	4530,1	56,9	56,9	43,1
3/8"	9,50	2613,2	32,8	89,6	10,4
Nº4	4,75	775,7	9,7	99,4	0,6
Nº10	2,00	3,4	0,0	99,4	0,6
Nº40	0,425	1,0	0,0	99,4	0,6
Nº80	0,180	1,2	0,0	99,5	0,5
Nº200	0,075	3,3	0,0	99,5	0,5
FONDO	-	-	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		7927,9			


HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013	
Recipiente Nº	3
M ₁ = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	1157,0
M ₂ = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	1152,3
M ₃ = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	0,4

RESULTADOS	
Humedad Natural (%)	0,4
Gravas (%)	99,4
Arenas (%)	0,1
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	0,5

GRADACIÓN TRITURADO 3/4" PARA MDC-19

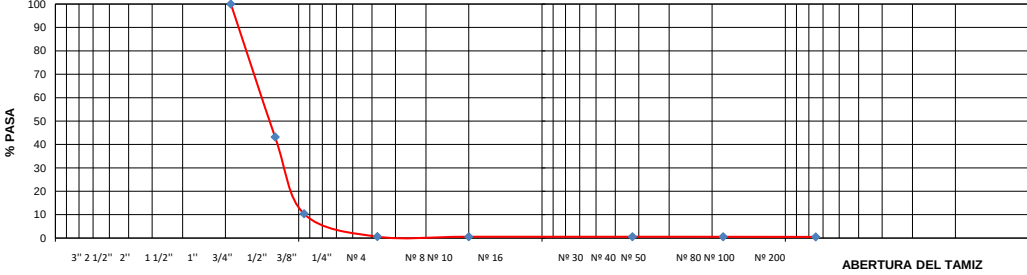

OBSERVACIONES:

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21506	Fecha:	14/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

MÉTODO DE CALCULO						
		CONTEO	MASA			
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No	Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1401,6	1354,7	0,0	46,9	97
1/2"	3/8"	1401,1	1365,4	0,0	35,7	97
3/8"	4	200,0	194,6	0,0	5,4	97
MASA TOTAL USADA (g):		3003	PROMEDIO =			97

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

MÉTODO DE CALCULO						
		CONTEO	MASA			
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1391,5	1494,2	0,0	-103	107
1/2"	3/8"	1375,0	1145,6	0,0	229,4	83
3/8"	4	196,0	191,7	0,0	4,3	98
MASA TOTAL USADA (g):		2963	PROMEDIO =			96

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21509		
Obra:	LAS MERCEDES								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESV-181	Fecha de Ensayo:	14-may-26	Fecha de Toma Muestra:	14-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,44	0,96	531,0	1236,0	707,0	1238,0	2,328				83,3	4,6	12,2	16,7	72,7		1485	1425	3,30
2		0,96	532,0	1237,0	708,0	1240,0	2,325		2000		83,2	4,7	12,1	16,8	72,2		1526	1465	3,32
3		0,96	529,0	1235,0	706,0	1235,0	2,335		7416		83,5	4,3	12,2	16,5	74,0		1506	1446	3,32
4		0,93	537,0	1249,0	712,0	1249,0	2,326		8596		83,2	4,6	12,1	16,8	72,4		1556	1447	3,33
PROMEDIO							2,328	2,433	2,439	0,11	83,3	4,5	12,2	16,7	72,8	5,33		1445,9	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3297,4							
		PESO FINAL:(g)				3086,1							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3487,0
12,7	1/2"	371,5	11,3	11,3	88,7	95	80	94	86	P ₂	3295,7	gr	
9,50	3/8"	286,9	8,7	20,0	80,0	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	688,4	20,9	40,8	59,2	65	49	62	54			P ₁	23,3
2,00	10	789,9	24,0	64,8	35,2	45	29	38	32	P ₂	25,0	gr	
0,43	40	634,2	19,2	84,0	16,0	25	14	22	16			5,44	
0,18	80	195,6	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	119,6	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					435,8					ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,97								

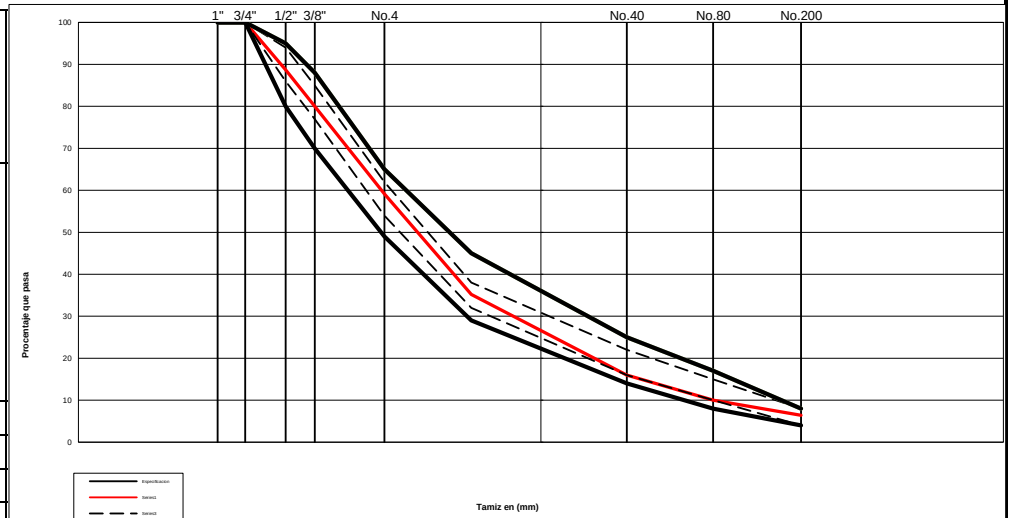

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21510		
Obra:	VILLA OLIMPICA								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	SXE-232	Fecha de Ensayo:	15-may-26	Fecha de Toma Muestra:	15-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,44	0,96	533,0	1240,0	710,0	1243,0	2,326				83,2	4,6	12,1	16,8	72,5		1518	1458	3,35
2		0,93	540,0	1253,0	716,0	1256,0	2,320		2000		83,0	4,9	12,1	17,0	71,4		1519	1413	3,32
3		0,93	537,0	1248,0	713,0	1250,0	2,324		7416		83,1	4,7	12,1	16,9	72,0		1526	1420	3,31
4		0,93	537,0	1245,0	710,0	1247,0	2,318		8596		82,9	4,9	12,1	17,1	71,0		1594	1482	3,34
PROMEDIO							2,322	2,433	2,439	0,11	83,1	4,8	12,1	16,9	71,7	5,33	1443,1	1443,1	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g) 3317,1												
		PESO FINAL:(g) 3107,1												
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra	P ₁	3507,9	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					P ₂
12,7	1/2"	410,4	12,4	12,4	87,6	95	80	94	86		Filtro	P ₁	20,9	
9,50	3/8"	281,2	8,5	20,8	79,2	88	70	85	77	P ₂				23,0
4,75	No 4	700,3	21,1	42,0	58,0	65	49	62	54			5,44		
2,00	10	752,4	22,7	64,6	35,4	45	29	38	32	Estabilidad min	100		918	
0,43	40	639,7	19,3	83,9	16,1	25	14	22	16					Flujo mm
0,18	80	202,8	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10			Vacios con aire %		
0,08	200	120,3	3,6	93,7	6,3	8	4	8	4	Vacios en agreg %	15			
	P200		0,0										ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO	7,5
Relacion Llenante - ligante					1,19									
Relacion Estabilidad -Flujo					433,4									
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,97									

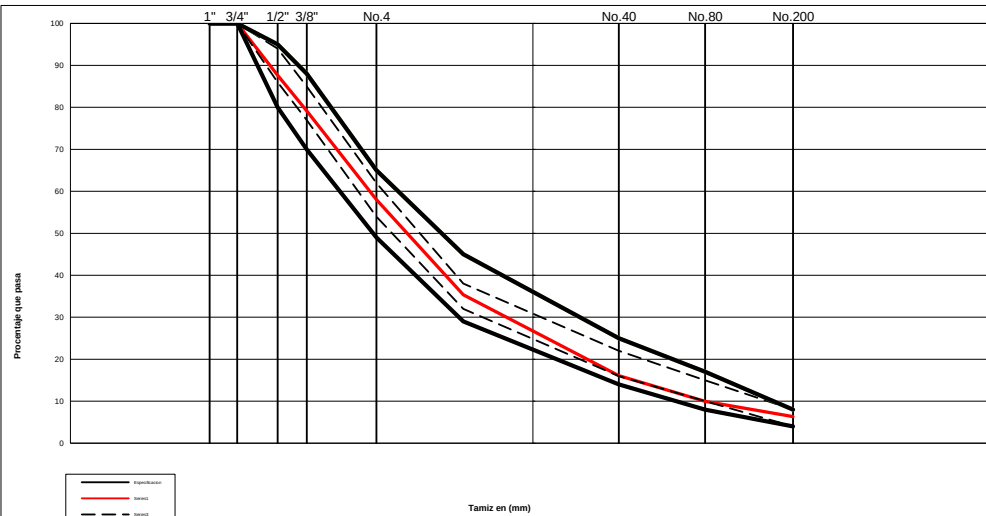

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21512	Fecha:	15/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1601,9	1528,8	0,0	73,1
1/2"	3/8"	1200,7	1090,1	0,0	110,6
3/8"	4	200,1	171,9	0,0	28,2
MASA TOTAL USADA (g):		3003	PROMEDIO =		91

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1391,5	1528,8	0,0	-137
1/2"	3/8"	1375,0	1090,1	0,0	284,9
3/8"	4	196,0	171,9	0,0	24,1
MASA TOTAL USADA (g):		2963	PROMEDIO =		92

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código:	PMA-INF-002
	FORMATO				Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIAS INV E 240-13				FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1					

N° Muestra: 21512 0

Fecha de toma: 15/05/2026 0

Fecha de ensayo: 15/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado

TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	5.311,3	65,9	34,1
3/8"	2.439,4	30,3	69,7
#4	259,2	3,2	96,8
Pasa 1/4"	44,6	0,6	99,4
Peso Seco	8054,5	100,0	


Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	65,9	66,3	100	1391,5	10,0	1381,5	0,7	0,48
1/2"	3/8"	30,3	30,5	100	1375,0	6,3	1368,7	0,5	0,14
3/8"	N° 4	3,2	3,2	100	196,0	8,6	187,4	4,4	0,14
TOTALES		99,4	100,0	400,0	2962,5	4,0	2937,6	5,6	0,8

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES


PREPARADO POR:

Firma 

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma 

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21516		
Obra:	VILLA SANTA ANA								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	SXE-232	Fecha de Ensayo:	15-may-26	Fecha de Toma Muestra:	15-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,35	0,93	541,0	1261,0	722,0	1263,0	2,331				83,5	4,6	12,0	16,5	72,5		1587	1476	3,30
2		0,96	532,0	1236,0	706,0	1238,0	2,323		2000		83,2	4,9	11,9	16,8	71,1		1553	1491	3,32
3		0,89	552,0	1286,0	737,0	1289,0	2,330		7416		83,4	4,6	12,0	16,6	72,2		1577	1404	3,31
4		0,93	536,0	1247,0	714,0	1250,0	2,326		8597		83,3	4,7	12,0	16,7	71,6		1578	1468	3,29
PROMEDIO							2,328	2,434	2,442	0,15	83,4	4,7	12,0	16,6	71,9	5,21		1459,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)						3625,7					
		PESO FINAL:(g)						3394,4					
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3830,6	gr	
12,7	1/2"	375,3	10,4	10,4	89,6	95	80	94	86		P ₂	3625,0	gr
9,50	3/8"	416,5	11,5	21,8	78,2	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	733,4	20,2	42,1	57,9	65	49	62	54		23,8	gr	
2,00	10	755,6	20,8	62,9	37,1	45	29	38	32		P ₂	24,5	gr
0,43	40	766,4	21,1	84,0	16,0	25	14	22	16				5,35
0,18	80	213,6	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	133,6	3,7	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,23		Vacios en agreg %		15				
Relacion Estabilidad -Flujo					441,6		ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5				
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,72								

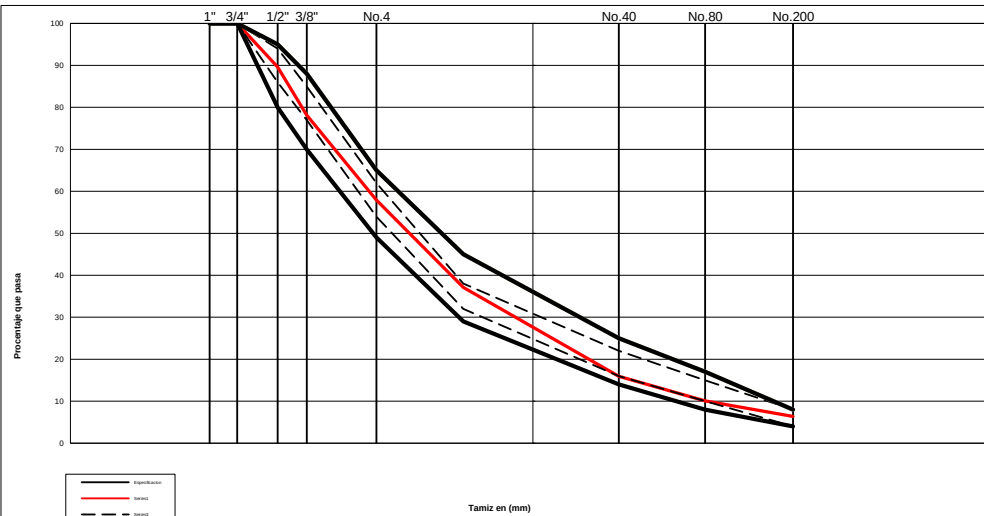

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21518		
Obra:	CRA 10 BIS ENTRE CALLES 22 Y 23								
Material:	MDC-19	Viaje No	6	WEB-	WEB-096	Fecha de Ensayo:	16-may-26	Fecha de Toma Muestra:	16-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,42	0,93	544,0	1264,0	722,0	1266,0	2,324				83,2	4,7	12,1	16,8	71,9		1546	1438	3,30
2		1,00	518,0	1205,0	690,0	1208,0	2,326		2000		83,2	4,6	12,1	16,8	72,4		1451	1451	3,32
3		0,96	534,0	1243,0	712,0	1246,0	2,328		7416		83,3	4,6	12,1	16,7	72,7		1555	1493	3,31
4		1,00	522,0	1212,0	693,0	1215,0	2,322		8596		83,1	4,8	12,1	16,9	71,6		1422	1422	3,29
PROMEDIO							2,325	2,431	2,439	0,14	83,2	4,7	12,1	16,8	72,1	5,28	1451,0	3,3	

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3244,8								
		PESO FINAL:(g)				3042,7								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3430,6	gr
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					
12,7	1/2"	277,9	8,6	8,6	91,4	95	80	94	86	Filtro		P ₁	20,9	gr
9,50	3/8"	332,5	10,2	18,8	81,2	88	70	85	77					
4,75	No 4	712,6	22,0	40,8	59,2	65	49	62	54			P ₁	22,5	gr
2,00	10	792,4	24,4	65,2	34,8	45	29	38	32					
0,43	40	608,5	18,8	83,9	16,1	25	14	22	16			5,42		
0,18	80	195,2	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918	
0,08	200	123,6	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,18					Vacios en agreg %		15		
Relacion Estabilidad -Flujo					439,0					ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5		
ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,87									

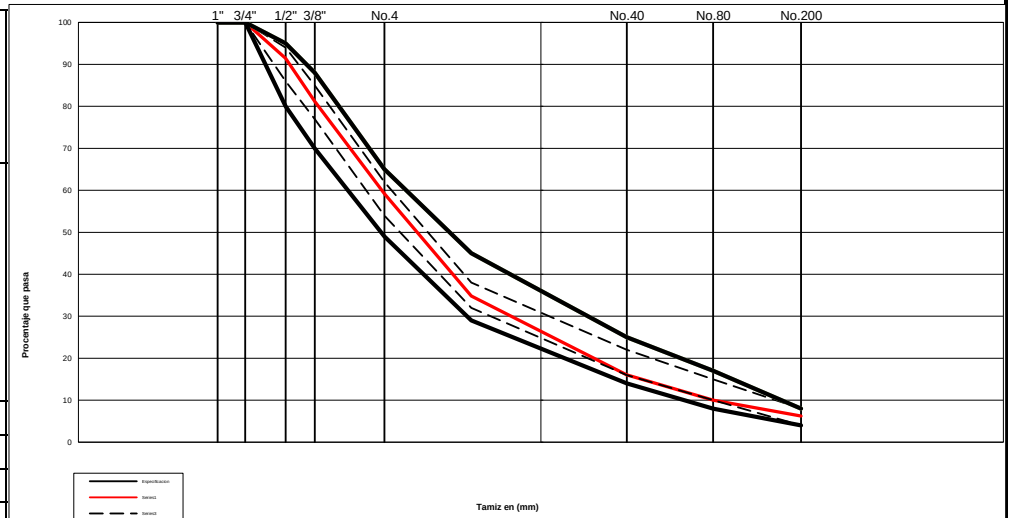

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21520		
Obra:	VILLA SANTA ANA								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	ESU-846	Fecha de Ensayo:	16-may-26	Fecha de Toma Muestra:	16-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34	0,93	536,0	1250,0	717,0	1253,0	2,332				83,5	4,5	12,0	16,5	72,7		1576	1466	3,29
2		0,96	532,0	1240,0	710,0	1242,0	2,331		2000		83,5	4,6	12,0	16,5	72,4		1525	1464	3,26
3		0,93	537,0	1250,0	717,0	1254,0	2,328		7416		83,4	4,7	12,0	16,6	71,9		1572	1462	3,25
4		0,93	536,0	1247,0	714,0	1250,0	2,326		8597		83,3	4,7	11,9	16,7	71,6		1525	1419	3,28
PROMEDIO							2,329	2,434	2,442	0,14	83,4	4,6	12,0	16,6	72,2	5,20		1452,9	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3332,6							
		PESO FINAL:(g)				3123,3							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3520,6	gr
12,7	1/2"	410,2	12,3	12,3	87,7	95	80	94	86		P ₂	3329,7	gr
9,50	3/8"	306,5	9,2	21,5	78,5	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	768,8	23,1	44,6	55,4	65	49	62	54		P ₁	20,7	gr
2,00	10	690,3	20,7	65,3	34,7	45	29	38	32		P ₂	23,6	gr
0,43	40	623,6	18,7	84,0	16,0	25	14	22	16	5,34			
0,18	80	200,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	123,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,21				Vacios en agreg %		15		
Relacion Estabilidad -Flujo					444,3				ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5		
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,71								

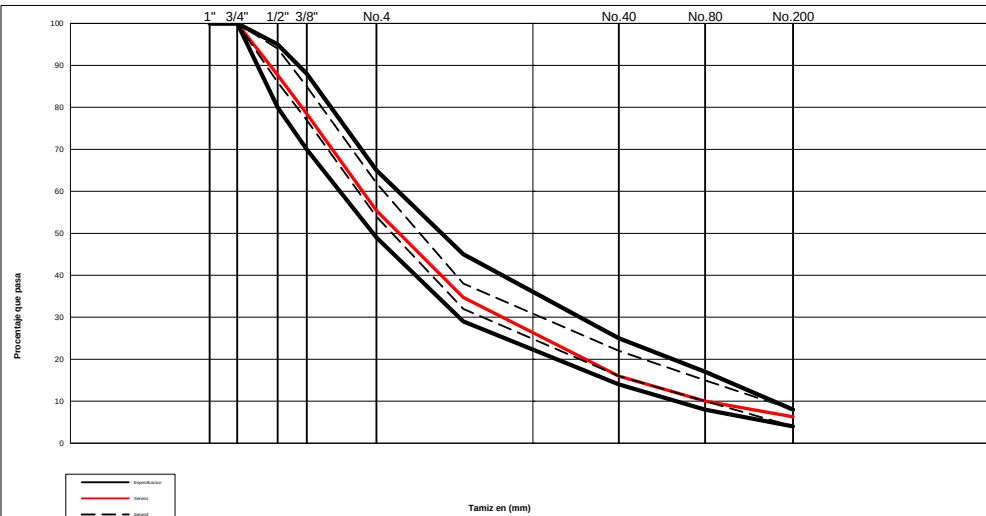

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21521		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESV-250	Fecha de Ensayo:	19-may-26	Fecha de Toma Muestra:	19-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3148,0							
		PESO FINAL:(g)				2953,7							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3325,7 gr P ₂ 3145,8 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	277,4	8,8	8,8	91,2	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,8 gr P ₂ 23,0 gr			
9,50	3/8"	287,6	9,1	17,9	82,1	88	70	85	77				
4,75	No 4	730,2	23,2	41,1	58,9	65	49	62	54	5,34			
2,00	10	720,6	22,9	64,0	36,0	45	29	38	32				
0,43	40	624,5	19,8	83,9	16,1	25	14	22	16	Estabilidad min 100 918 Flujo mm 2-3,5 Vacios con aire % 4-6 Vacios en agreg % 15 ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5			
0,18	80	192,3	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10				
0,08	200	121,1	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4				
P200		0,0											
Relacion Llenante - ligante					1,19								
Relacion Estabilidad -Flujo					#N/D								
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,72								

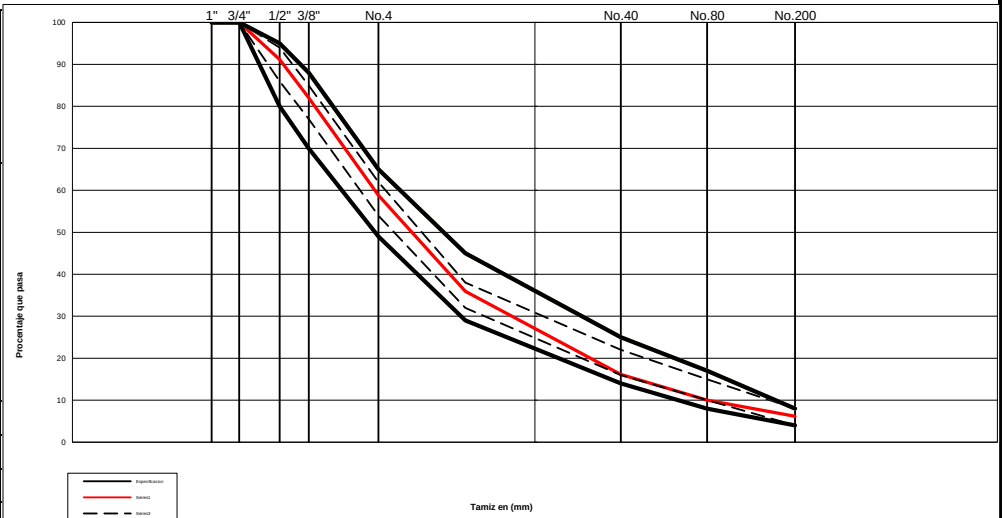

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE						MUESTRA No.	21522	
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	WEB-	SXF-782	Fecha de Ensayo:	19-may-26	Fecha de Toma Muestra:	19-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,43	0,93	540,0	1258,0	723,0	1263,0	2,330				83,4	4,6	12,0	16,6	72,4		1541	1433	3,29
2		0,96	531,0	1237,0	709,0	1240,0	2,330		2000		83,4	4,6	12,0	16,6	72,3		1501	1441	3,32
3		1,00	522,0	1215,0	695,0	1217,0	2,328		7416		83,3	4,7	12,0	16,7	72,0		1484	1484	3,30
4		0,93	546,0	1273,0	729,0	1275,0	2,332		8597		83,4	4,5	12,1	16,6	72,7		1506	1401	3,31
PROMEDIO							2,330	2,430	2,442	0,21	83,4	4,6	12,0	16,6	72,3	5,24		1439,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3116,6								
		PESO FINAL:(g)				2921,0								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3295,7 gr P ₂ 3115,0 gr				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					
12,7	1/2"	262,8	8,4	8,4	91,6	95	80	94	86	Filtro P ₁ 23,0 gr P ₂ 24,6 gr				
9,50	3/8"	341,1	10,9	19,4	80,6	88	70	85	77					
4,75	No 4	715,2	22,9	42,3	57,7	65	49	62	54					
2,00	10	710,6	22,8	65,1	34,9	45	29	38	32					
0,43	40	589,6	18,9	84,0	16,0	25	14	22	16			5,43		
0,18	80	186,0	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918	
0,08	200	115,7	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20				Vacios en agreg %					15
Relacion Estabilidad -Flujo					435,6				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,79									

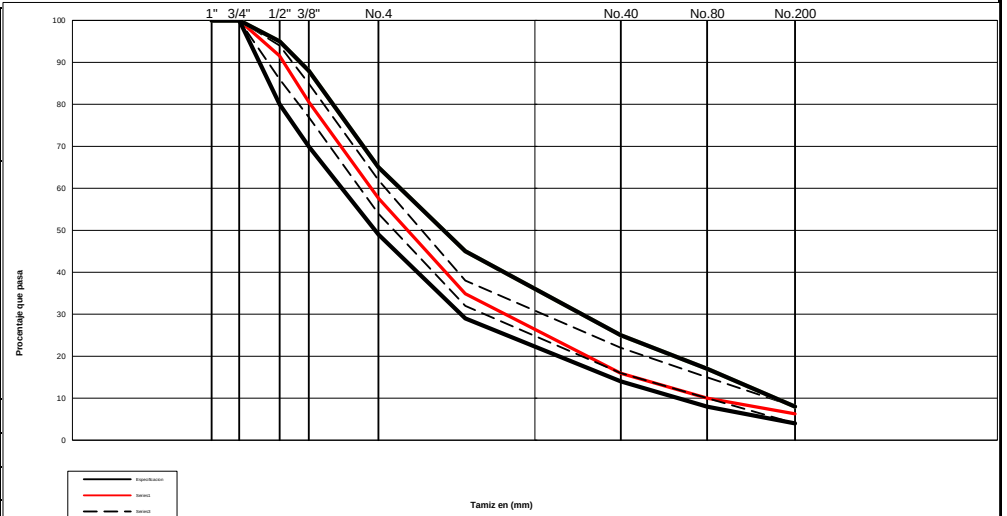

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21525	Fecha:	19/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1600,4	1560,2	0,0	40,2
1/2"	3/8"	1200,2	1023,2	0,0	177,0
3/8"	4	200,3	168,2	0,0	32,1
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =		89

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1391,5	1595,6	0,0	-204
1/2"	3/8"	1375,0	1115,4	0,0	259,6
3/8"	4	196,0	185,9	0,0	10,1
MASA TOTAL USADA (g):		2963	PROMEDIO =		97

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código:	PMA-INF-002
	FORMATO				Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIAS INV E 240-13				FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1					

N° Muestra: 21525 0

Fecha de toma: 19/05/2026 0

Fecha de ensayo: 19/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado



TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	3.895,0	48,9	51,1
3/8"	3.080,2	38,7	61,3
#4	930,1	11,7	88,3
Pasa 1/4"	54,9	0,7	99,3
Peso Seco	7960,2	100,0	

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	48,9	49,3	100	1391,5	11,0	1380,5	0,8	0,39
1/2"	3/8"	38,7	39,0	100	1375,0	9	1366,0	0,7	0,26
3/8"	N° 4	11,7	11,8	100	196,0	1,5	194,5	0,8	0,09
TOTALES		99,3	100,0	400,0	2962,5	4,0	2941,0	2,2	0,7

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:	
Firma 	Firma 	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:	PMA-FOR-010
	FORMATO	Versión:	1
	IMPUREZAS EN AGREGADOS GRUESOS -NORMA INVIAS 237- 2013	FECHA	15/02/2019
Página 1 de 1			

N. de Muestra: 21525

Fecha: 19/05/2026

Fecha: 19/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

Descripción :

Agregado Triturado TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZACION PLANTA

K 15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producción

ENSAYO HUMEDAD		
Masa muestra húmeda (Mh) (g)		3000,0
Masa muestra seca (Ms) (g)		2990,2
Humedad (w)		0,328
ENSAYO LIMPIEZA SUPERFICIAL		
Masa húmeda muestra (Mhe) (g)		3000,0
Masa muestra seca después de lavado sobre tamiz No. 35 (m) (g)		2976,0
Masa seca muestra (Mse) (g)		2990,2
Impurezas (g)		14
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL		0,5
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL PROMEDIO	0,47	
ESPECIFICACION MÁXIMO (%)	0,5	
CUMPLE	SI	

OBSERVACION:

MUESTRA TOMADA EN ACOPIO PLANTA

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21526
Fecha de Toma: 19/05/2026

Fecha de Ensayo: 19/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA bt-11

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia


Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,3	2,3	2,4
Lectura de arcilla (B)	3,1	3,2	3,2
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	74	72	75
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			74

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	8

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:

21526

Fecha:

19/05/2026

Fecha:

19/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producto terminado

Peso del Cilindro (g):	268	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos V: Volumen del Cilindro F: Masa Neta G: Gravedad Específica
Volumen del Cilindro (cm³):	100,3		
Gravedad Específica Bulk:	2,623		

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N°	Masa Neta, g
Pasa N° 8	Reten N° 16	44 ± 0,2 g	44,0	401,2	133,2
Pasa N° 16	Reten N° 30	57 ± 0,2 g	57,0	401,5	133,5
Pasa N° 30	Reten N° 50	72 ± 0,2 g	72,0	401,1	133,1
Pasa N° 50	Reten N° 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	133,266667
Total			190,0	Us	49,3

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba N° 1 Masa Neta, g	Prueba N° 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa N° 8		Reten N° 16	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 16		Reten N° 30	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 30		Reten N° 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual			Masa, g	Prueba N° 1	Prueba N° 2	Promedio	% Vacíos
Pasa N° 4			190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21528		
Obra:	VILLA SANTA ANA								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	ESU-846	Fecha de Ensayo:	19-may-26	Fecha de Toma Muestra:	19-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,44	0,93	545,0	1270,0	728,0	1273,0	2,330				83,4	4,6	12,1	16,6	72,5		1518	1412	3,34
2		0,96	534,0	1243,0	712,0	1246,0	2,328		2000		83,3	4,7	12,0	16,7	72,0		1509	1449	3,32
3		0,93	540,0	1257,0	719,0	1259,0	2,328		7416		83,3	4,7	12,0	16,7	72,0		1528	1421	3,35
4		0,93	538,0	1252,0	717,0	1255,0	2,327		8597		83,3	4,7	12,0	16,7	71,9		1550	1441	3,34
PROMEDIO							2,328	2,430	2,442	0,21	83,3	4,7	12,0	16,7	72,1	5,24		1430,7	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)						3197,0						
		PESO FINAL:(g)						2996,7						
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3380,9	gr		
12,7	1/2"	358,2	11,2	11,2	88,8	95	80	94	86		P ₂	3193,1	gr	
9,50	3/8"	313,0	9,8	21,0	79,0	88	70	85	77	P ₁	Filtro			
4,75	No 4	618,5	19,3	40,3	59,7	65	49	62	54		20,5	gr		
2,00	10	780,3	24,4	64,7	35,3	45	29	38	32		P ₂	24,4	gr	
0,43	40	616,3	19,3	84,0	16,0	25	14	22	16	5,44				
0,18	80	190,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	119,8	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,20				Vacios en agreg %					15
Relacion Estabilidad -Flujo					428,7				ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,80									

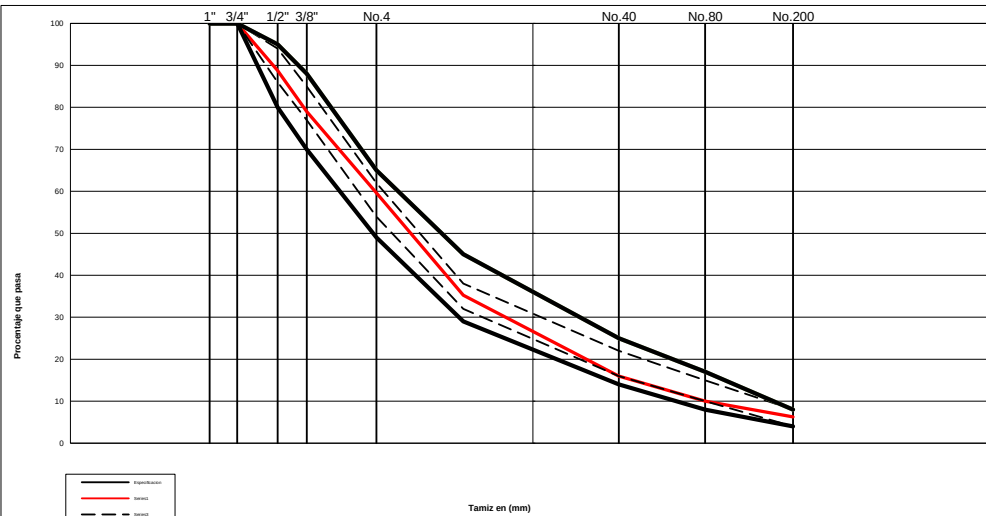

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21529		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WLC-113	Fecha de Ensayo:	20-may-26	Fecha de Toma Muestra:	20-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,38	0,93	546,0	1273,0	729,0	1275,0	2,332				83,5	4,5	12,0	16,5	72,6		1509	1404	3,30
2		0,96	534,0	1241,0	708,0	1242,0	2,324		2000		83,2	4,8	12,0	16,8	71,2		1483	1423	3,32
3		0,93	544,0	1268,0	727,0	1271,0	2,331		7416		83,4	4,6	12,0	16,6	72,5		1508	1403	3,30
4		0,96	528,0	1228,0	702,0	1230,0	2,326		8597		83,3	4,8	12,0	16,7	71,6		1504	1444	3,29
PROMEDIO							2,328	2,434	2,442	0,14	83,3	4,7	12,0	16,7	72,0	5,25		1418,3	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)						3363,7						
		PESO FINAL:(g)						3152,7						
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3555,1	gr	
12,7	1/2"	397,6	11,8	11,8	88,2	95	80	94	86		P ₂	3363,0	gr	
9,50	3/8"	254,0	7,6	19,4	80,6	88	70	85	77	P ₁	Filtro			
4,75	No 4	723,8	21,5	40,9	59,1	65	49	62	54		P ₁	24,5	gr	
2,00	10	789,2	23,5	64,4	35,6	45	29	38	32		P ₂	25,2	gr	
0,43	40	659,8	19,6	84,0	16,0	25	14	22	16	5,38				
0,18	80	202,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	126,0	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,19			Vacios en agreg %					15	
Relacion Estabilidad -Flujo					429,5			ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5	
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,81									

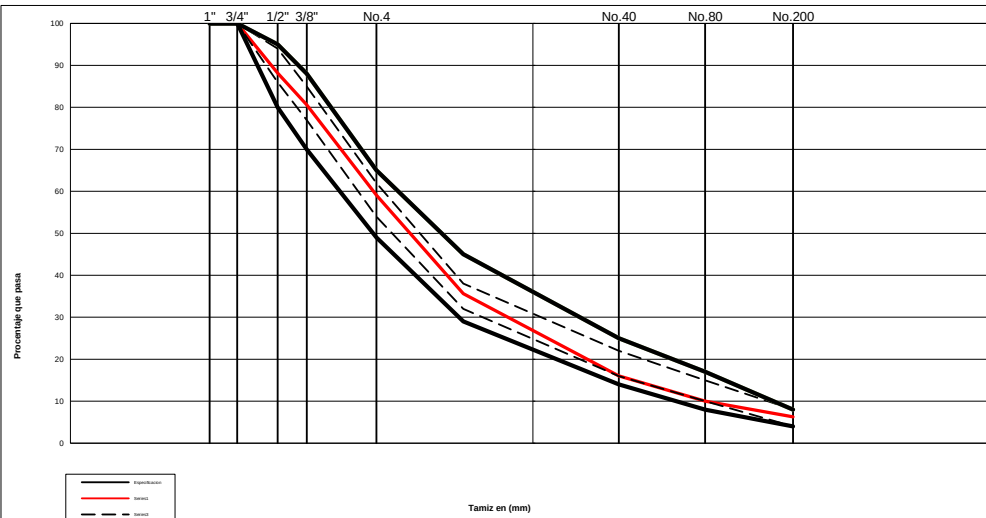

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21531
Fecha de Toma: 20/05/2026

Fecha de Ensayo: 20/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

DESCRIPCION

ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA - BT-9

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZCION PLANTA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia

Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.	1	2	3
Lectura de Arena (A)	2,6	2,6	2,5
Lectura de Arcilla (B)	3,1	3,0	3,0
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	83,9	86,7	83,3
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =		85	

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	8

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:	21531			
Fecha:	20/05/2026	Fecha:	20/05/2026	

LOCALIZACION MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION
DESCRIPCION	ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA COLOR AMAILLO BT-9
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control	☐	Procedencia	☐	Producción	☐	Producto terminado
-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------------

Peso del Cilindro (g):	268		
Volumen del Cilindro (cm ³):	100,3	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos
Gravedad Especifica Bulk:	2,55		V: Volumen del Cilindro
			F: Masa Neta
			G: Gravedad Especifica



METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N°	Masa Neta, g
Pasa N° 8	Reten N° 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,1	132,1
Pasa N° 16	Reten N° 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,2	132,2
Pasa N° 30	Reten N° 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,0	132
Pasa N° 50	Reten N° 100	17 ± 0,2 g	17,0	Promedio	132
Total		190,0		Us	48,4

METODO B								
Fracción Tamaño Individual			Masa, g		Prueba N° 1 Masa Neta, g	Prueba N° 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa N° 8		Reten N° 16	190 ± 1,0 g					
Pasa N° 16		Reten N° 30	190 ± 1,0 g					
Pasa N° 30		Reten N° 50	190 ± 1,0 g					
						Promedio	Um	

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N° 1	Prueba N° 2	Promedio	% Vacíos
Pasa N° 4		190 ± 1,0 g	190,0			U _R	

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES	
---------------	--

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21532		
Obra:	VILLA SANTANA								
Material:	MDC-19	Viaje No	2	WEB-	WLC-113	Fecha de Ensayo:	20-may-26	Fecha de Toma Muestra:	20-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,38	0,96	533,0	1241,0	710,0	1243,0	2,328				83,4	4,5	12,1	16,6	72,7		1472	1414	3,30
2		0,93	538,0	1253,0	720,0	1258,0	2,329		2000		83,4	4,5	12,1	16,6	72,9		1516	1410	3,32
3		0,93	541,0	1260,0	721,0	1262,0	2,329		7416		83,4	4,5	12,1	16,6	72,9		1544	1436	3,30
4		0,93	544,0	1268,0	727,0	1271,0	2,331		8596		83,4	4,4	12,1	16,6	73,2		1550	1441	3,29
PROMEDIO							2,329	2,434	2,439	0,09	83,4	4,5	12,1	16,6	72,9	5,30		1425,2	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3304,0							
		PESO FINAL:(g)				3094,9							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3492,0
12,7	1/2"	355,4	10,8	10,8	89,2	95	80	94	86	P ₂	3302,2	gr	
9,50	3/8"	260,5	7,9	18,6	81,4	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	780,4	23,6	42,3	57,7	65	49	62	54			P ₁	23,4
2,00	10	771,5	23,4	65,6	34,4	45	29	38	32	P ₂	25,2	gr	
0,43	40	608,9	18,4	84,0	16,0	25	14	22	16			5,38	
0,18	80	195,6	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	122,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					431,6					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,90								

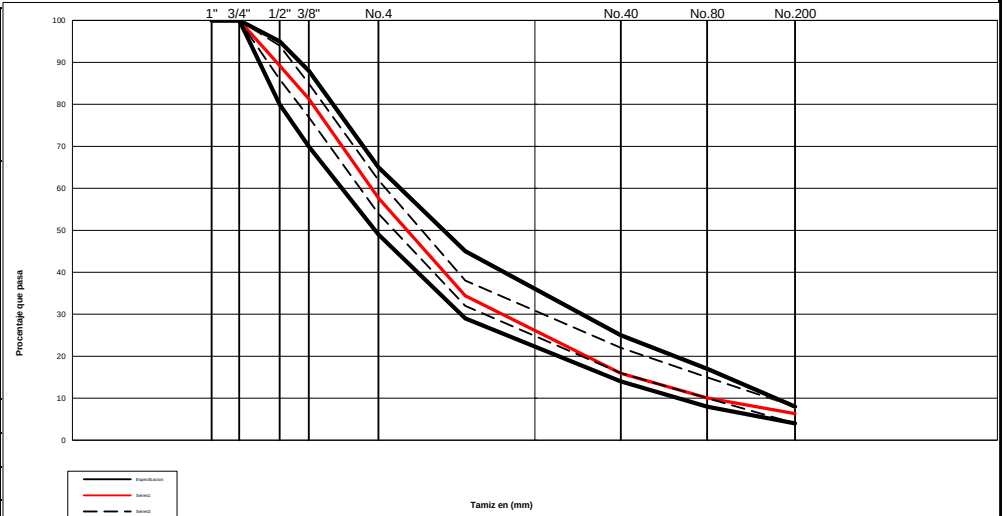

PREPARADO POR:		REVISADO Y APROBO:	
Firma		Firma	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ		Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad		Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21533		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESU-846	Fecha de Ensayo:	21-may-26	Fecha de Toma Muestra:	21-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3345,4											
		PESO FINAL:(g) 3138,1											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra	P ₁	3534,2	gr
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	368,7	11,0	11,0	89,0	95	80	94	86		Filtro	P ₁	21,0
9,50	3/8"	335,8	10,0	21,1	78,9	88	70	85	77	P ₂			
4,75	No 4	747,7	22,4	43,4	56,6	65	49	62	54			5,34	
2,00	10	735,7	22,0	65,4	34,6	45	29	38	32				
0,43	40	622,3	18,6	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	202,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	125,6	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4				Flujo mm
	P200		0,0							Vacios con aire % 4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,18					Vacios en agreg % 15			
Relacion Estabilidad -Flujo					#N/D					ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5			
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,77								

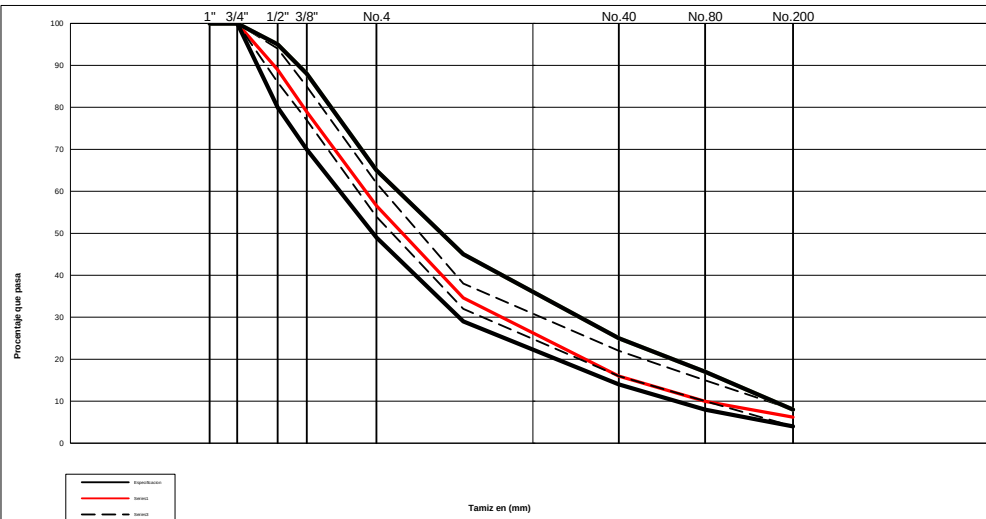

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21534		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	WEB-	SXF-624	Fecha de Ensayo:	21-may-26	Fecha de Toma Muestra:	21-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34	0,96	525,0	1220,0	698,0	1223,0	2,324				83,2	4,8	11,9	16,8	71,1		1495	1435	3,29
2		0,96	530,0	1234,0	707,0	1237,0	2,328		2000		83,4	4,7	12,0	16,6	72,0		1510	1450	3,32
3		0,96	529,0	1233,0	706,0	1235,0	2,331		7416		83,5	4,6	12,0	16,5	72,4		1499	1439	3,30
4		0,96	525,0	1222,0	700,0	1225,0	2,328		8597		83,4	4,7	12,0	16,6	71,8		1525	1464	3,31
PROMEDIO							2,328	2,436	2,442	0,11	83,4	4,7	12,0	16,6	71,8	5,23		1447,1	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)											
		PESO FINAL:(g)											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3357,3	gr	
12,7	1/2"	339,0	10,7	10,7	89,3	95	80	94	86		P ₂	3175,3	gr
9,50	3/8"	303,7	9,6	20,2	79,8	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	724,5	22,8	43,0	57,0	65	49	62	54		23,0	gr	
2,00	10	689,7	21,7	64,7	35,3	45	29	38	32		P ₂	25,7	gr
0,43	40	612,6	19,3	84,0	16,0	25	14	22	16	5,34			
0,18	80	190,2	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	122,6	3,9	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,18					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					437,8					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,77								

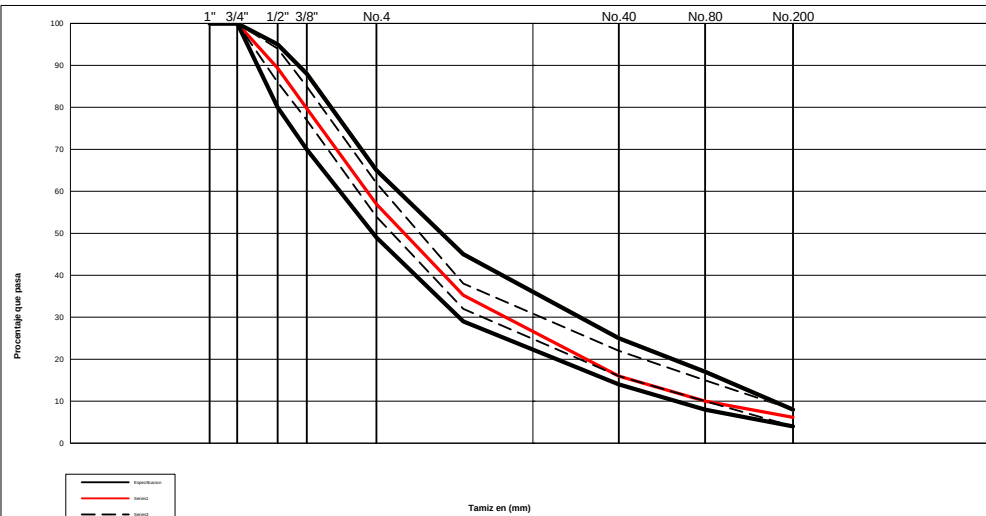

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21536		
Obra:	AVENIDAD 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WLC-252	Fecha de Ensayo:	21-may-26	Fecha de Toma Muestra:	21-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,43	0,96	529,0	1231,0	704,0	1233,0	2,327				83,3	4,6	12,1	16,7	72,6		1481	1421	3,30
2		0,93	539,0	1251,0	714,0	1253,0	2,321		2000		83,1	4,8	12,1	16,9	71,4		1492	1387	3,32
3		0,93	538,0	1249,0	713,0	1251,0	2,322		7416		83,1	4,8	12,1	16,9	71,6		1528	1421	3,30
4		0,93	539,0	1250,0	714,0	1253,0	2,319		8596		83,0	4,9	12,1	17,0	71,1		1553	1444	3,29
PROMEDIO							2,322	2,433	2,439	0,11	83,1	4,8	12,1	16,9	71,7	5,32		1418,4	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g) 3329,0												
		PESO FINAL:(g) 3116,4												
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3520,0	gr		
12,7	1/2"	388,2	11,7	11,7	88,3	95	80	94	86		P ₂	3326,8	gr	
9,50	3/8"	326,9	9,8	21,5	78,5	88	70	85	77	P ₁	Filtro			
4,75	No 4	756,3	22,7	44,2	55,8	65	49	62	54		20,8	gr		
2,00	10	752,4	22,6	66,8	33,2	45	29	38	32		P ₂	23,0	gr	
0,43	40	571,2	17,2	84,0	16,0	25	14	22	16	5,43				
0,18	80	199,9	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	121,5	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20		Vacios en agreg %					15		
Relacion Estabilidad -Flujo					429,5		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5		
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,94									

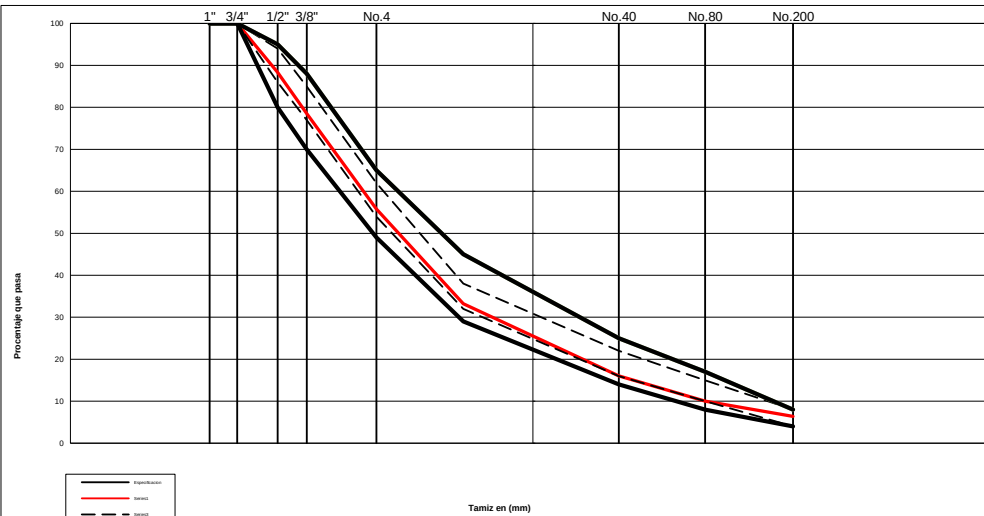

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21533		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESU-846	Fecha de Ensayo:	21-may-26	Fecha de Toma Muestra:	21-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3345,4											
		PESO FINAL:(g) 3138,1											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3534,2	gr	
12,7	1/2"	368,7	11,0	11,0	89,0	95	80	94	86		P ₂	3343,4	gr
9,50	3/8"	335,8	10,0	21,1	78,9	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	747,7	22,4	43,4	56,6	65	49	62	54		21,0	gr	
2,00	10	735,7	22,0	65,4	34,6	45	29	38	32		P ₂	23,0	gr
0,43	40	622,3	18,6	84,0	16,0	25	14	22	16	5,34			
0,18	80	202,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	125,6	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,18		Vacios en agreg %		15				
Relacion Estabilidad -Flujo					#N/D		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5				
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,77								

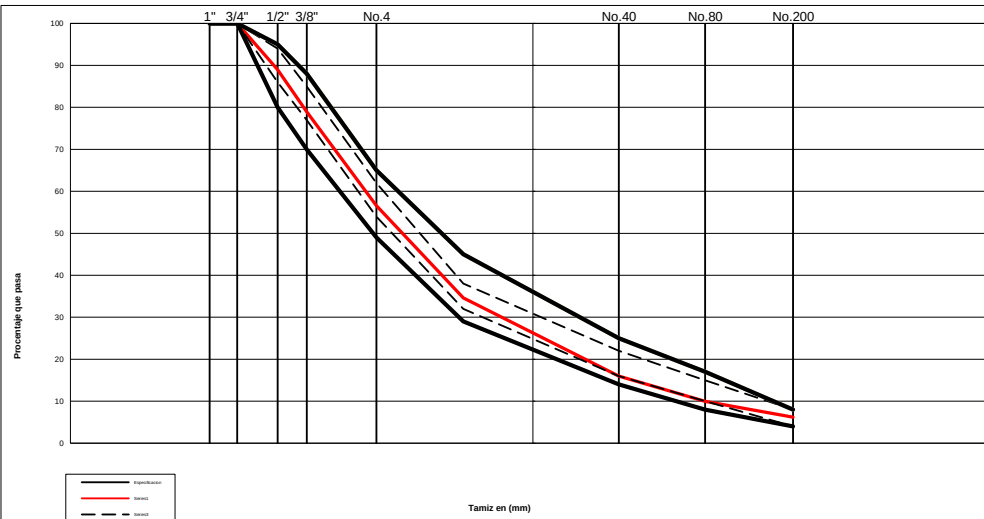

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21534		
Obra:	PARQUE INDUSTRIAL								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	WEB-	SXF-624	Fecha de Ensayo:	21-may-26	Fecha de Toma Muestra:	21-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34	0,96	525,0	1220,0	698,0	1223,0	2,324				83,2	4,8	11,9	16,8	71,1		1495	1435	3,29
2		0,96	530,0	1234,0	707,0	1237,0	2,328		2000		83,4	4,7	12,0	16,6	72,0		1510	1450	3,32
3		0,96	529,0	1233,0	706,0	1235,0	2,331		7416		83,5	4,6	12,0	16,5	72,4		1499	1439	3,30
4		0,96	525,0	1222,0	700,0	1225,0	2,328		8597		83,4	4,7	12,0	16,6	71,8		1525	1464	3,31
PROMEDIO							2,328	2,436	2,442	0,11	83,4	4,7	12,0	16,6	71,8	5,23		1447,1	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)						3178,0						
		PESO FINAL:(g)						2982,3						
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3357,3	gr		
12,7	1/2"	339,0	10,7	10,7	89,3	95	80	94	86		P ₂	3175,3	gr	
9,50	3/8"	303,7	9,6	20,2	79,8	88	70	85	77	P ₁	Filtro			
4,75	No 4	724,5	22,8	43,0	57,0	65	49	62	54		23,0	gr		
2,00	10	689,7	21,7	64,7	35,3	45	29	38	32		P ₂	25,7	gr	
0,43	40	612,6	19,3	84,0	16,0	25	14	22	16	5,34				
0,18	80	190,2	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	122,6	3,9	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,18				Vacios en agreg %					15
Relacion Estabilidad -Flujo					437,8				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,77									

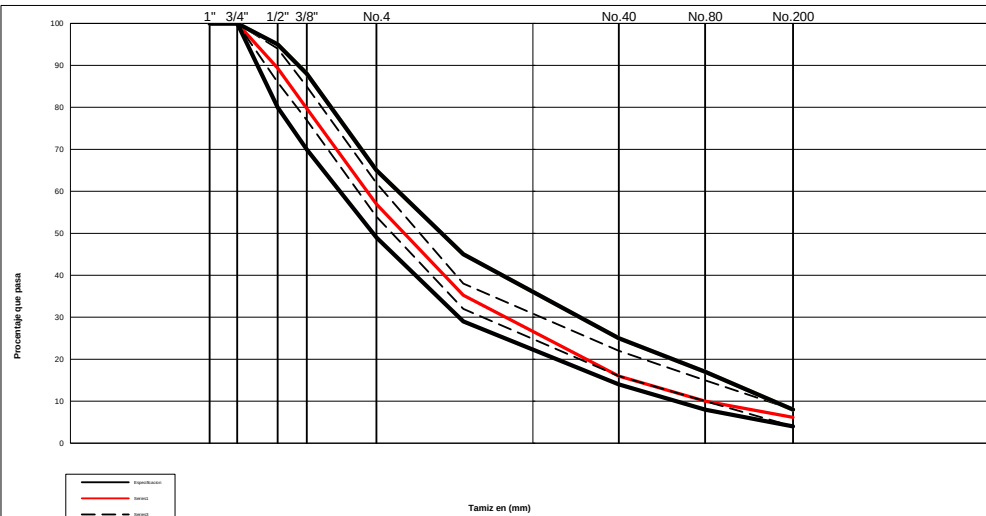

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21536		
Obra:	AVENIDAD 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WLC-252	Fecha de Ensayo:	21-may-26	Fecha de Toma Muestra:	21-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,43	0,96	529,0	1231,0	704,0	1233,0	2,327				83,3	4,6	12,1	16,7	72,6		1481	1421	3,30
2		0,93	539,0	1251,0	714,0	1253,0	2,321		2000		83,1	4,8	12,1	16,9	71,4		1492	1387	3,32
3		0,93	538,0	1249,0	713,0	1251,0	2,322		7416		83,1	4,8	12,1	16,9	71,6		1528	1421	3,30
4		0,93	539,0	1250,0	714,0	1253,0	2,319		8596		83,0	4,9	12,1	17,0	71,1		1553	1444	3,29
PROMEDIO							2,322	2,433	2,439	0,11	83,1	4,8	12,1	16,9	71,7	5,32		1418,4	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3329,0											
		PESO FINAL:(g) 3116,4											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra	P ₁	3520,0	gr
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	388,2	11,7	11,7	88,3	95	80	94	86		Filtro	P ₁	20,8
9,50	3/8"	326,9	9,8	21,5	78,5	88	70	85	77	P ₂			
4,75	No 4	756,3	22,7	44,2	55,8	65	49	62	54			5,43	
2,00	10	752,4	22,6	66,8	33,2	45	29	38	32				
0,43	40	571,2	17,2	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	199,9	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	121,5	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4				Flujo mm
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20		Vacios en agreg %					15	
Relacion Estabilidad -Flujo					429,5		ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,94								

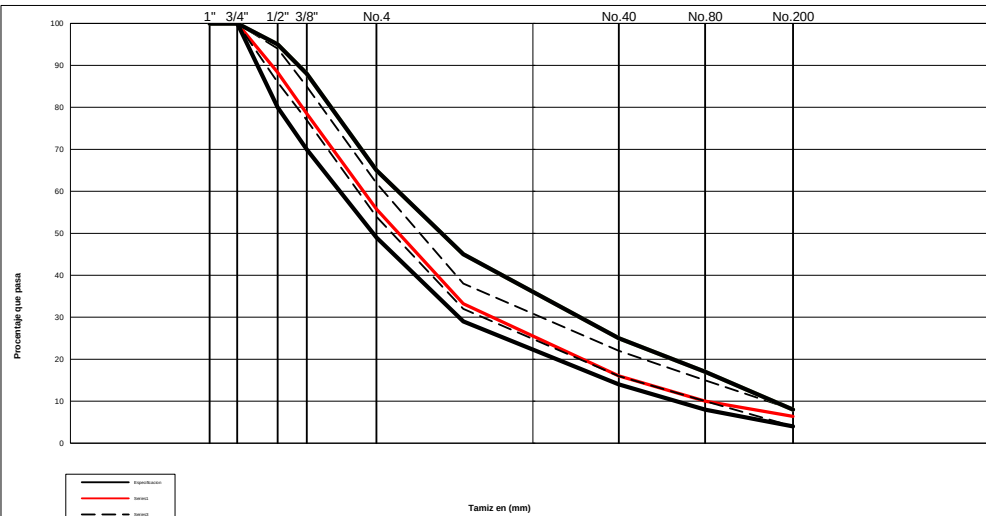

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE						MUESTRA No.	21537	
Obra:	VILLA 86								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESU-970	Fecha de Ensayo:	22-may-26	Fecha de Toma Muestra:	22-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%		%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,46	0,96	535,0	1242,0	710,0	1245,0	2,321				83,0	4,8	12,1	17,0	71,6		1499	1439	3,30
2		0,89	547,0	1271,0	726,0	1273,0	2,324		2000		83,1	4,7	12,2	16,9	72,0		1629	1450	3,32
3		0,96	534,0	1243,0	712,0	1246,0	2,328		7416		83,3	4,6	12,2	16,7	72,7		1526	1465	3,30
4		0,89	547,0	1276,0	732,0	1279,0	2,333		8596		83,4	4,4	12,2	16,6	73,7		1600	1424	3,29
PROMEDIO							2,326	2,432	2,439	0,13	83,2	4,6	12,2	16,8	72,5	5,33		1444,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3086,9							
		PESO FINAL:(g)				2889,9							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P₁3265,1gr P₂3085,6gr Filtro P₁24,7gr P₂26,0gr 5,46 Estabilidad min100918 Flujo mm2-3,5 Vacios con aire %4-6 Vacios en agreg %15 ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO7,5			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	300,3	9,7	9,7	90,3	95	80	94	86				
9,50	3/8"	335,9	10,9	20,6	79,4	88	70	85	77				
4,75	No 4	723,9	23,5	44,1	55,9	65	49	62	54				
2,00	10	621,6	20,1	64,2	35,8	45	29	38	32				
0,43	40	612,3	19,8	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	185,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10				
0,08	200	110,3	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4				
	P200		0,0										
Relacion Llenante - ligante				1,20				Vacios en agreg %15					
Relacion Estabilidad -Flujo				437,4				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO7,5					
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				9,97									

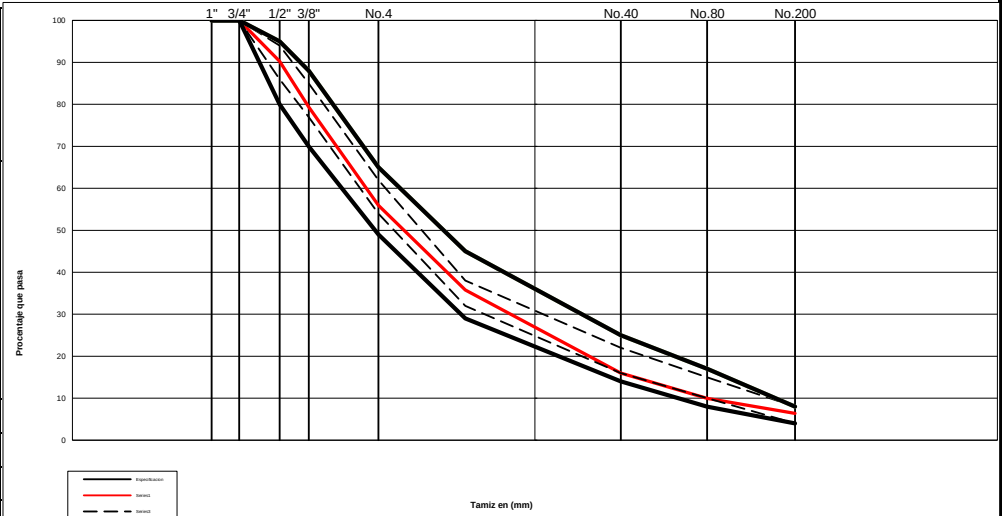

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21546		
Obra:	VILLA 86								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	TMY-872	Fecha de Ensayo:	26-may-26	Fecha de Toma Muestra:	26-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,39																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 2978,0											
		PESO FINAL:(g) 2789,9											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3147,6	gr	
12,7	1/2"	225,5	7,6	7,6	92,4	95	80	94	86		P ₂	2974,8	gr
9,50	3/8"	298,7	10,0	17,6	82,4	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	731,6	24,6	42,2	57,8	65	49	62	54		19,7	gr	
2,00	10	654,0	22,0	64,1	35,9	45	29	38	32		P ₂	22,9	gr
0,43	40	592,3	19,9	84,0	16,0	25	14	22	16	5,39			
0,18	80	178,5	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	109,3	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

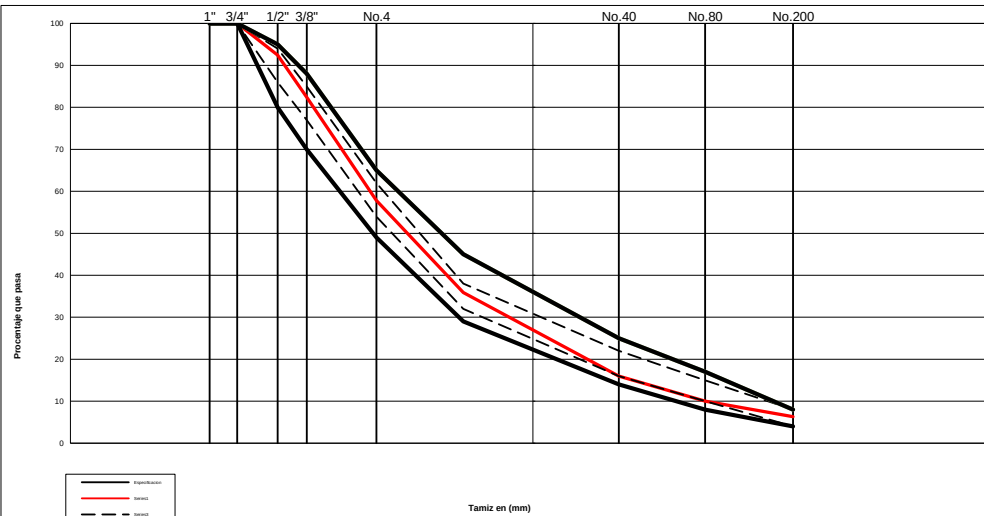

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía: AGREGADOS DEL OCCIDENTE MUESTRA No. 21551
Obra: VILLA 86
Material: MDC-19 Viaje No 9 WEB: ESV-181 Fecha de Ensayo: 26-may-26 Fecha de Toma Muestra: 26-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,39	0,93	543,0	1262,0	722,0	1265,0	2,324				83,2	4,9	11,9	16,8	70,6		1518	1412	3,29
2		0,96	526,0	1223,0	700,0	1226,0	2,325		2000		83,2	4,9	11,9	16,8	70,8		1523	1462	3,32
3		0,93	536,0	1249,0	716,0	1252,0	2,330		7416		83,4	4,7	11,9	16,6	71,7		1550	1441	3,30
4		0,93	539,0	1256,0	720,0	1259,0	2,330		8598		83,4	4,7	11,9	16,6	71,7		1577	1467	3,31
PROMEDIO							2,327	2,434	2,445	0,19	83,3	4,8	11,9	16,7	71,2	5,22	1445,8	3,3	

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3348,1							
		PESO FINAL:(g)				3139,5							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 2396		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P₁3539,0gr P₂3346,4gr Filtro P₁22,9gr P₂24,6gr 5,39 Estabilidad min100918 Flujo mm2-3,5 Vacios con aire %4-6 Vacios en agreg %15 ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO7,5			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	290,4	8,7	8,7	91,3	95	80	94	86				
9,50	3/8"	384,5	11,5	20,2	79,8	88	70	85	77				
4,75	No 4	811,2	24,2	44,4	55,6	65	49	62	54				
2,00	10	718,2	21,5	65,8	34,2	45	29	38	32				
0,43	40	606,6	18,1	84,0	16,0	25	14	22	16				
0,18	80	202,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10				
0,08	200	126,3	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4				
	P200		0,0										
Relacion Llenante - ligante					1,19		Vacios en agreg %					15	
Relacion Estabilidad -Flujo					437,4		ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,74								

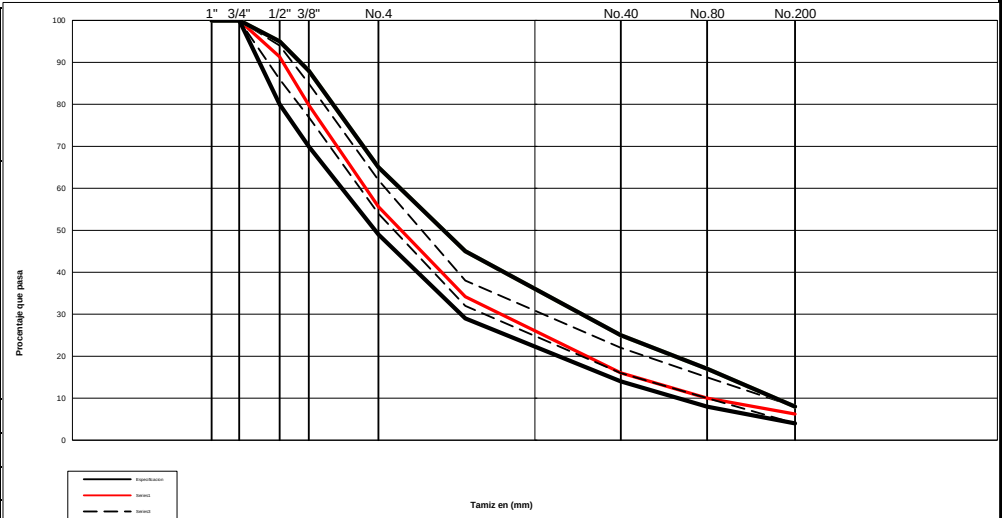

PREPARADO POR:

Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ
Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma
Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE						MUESTRA No.	21552	
Obra:	AV 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	TSY-073	Fecha de Ensayo:	26-may-26	Fecha de Toma Muestra:	26-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,019 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,41	0,96	531,0	1236,0	708,0	1239,0	2,328				83,3	4,4	12,2	16,7	73,4		1503	1443	3,35
2		1,00	518,0	1210,0	695,0	1213,0	2,336		2000		83,6	4,1	12,3	16,4	74,9		1478	1478	3,32
3		0,96	534,0	1243,0	712,0	1246,0	2,328		7416		83,3	4,4	12,2	16,7	73,4		1472	1414	3,32
4		0,96	534,0	1241,0	709,0	1243,0	2,324		8595		83,2	4,6	12,2	16,8	72,7		1501	1441	3,30
PROMEDIO							2,329	2,433	2,436	0,05	83,3	4,4	12,3	16,7	73,6	5,36	1443,7		3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3307,7								
		PESO FINAL:(g)				3101,1								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3497,0 gr P ₂ 3305,0 gr				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					
12,7	1/2"	364,1	11,0	11,0	89,0	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,4 gr P ₂ 23,1 gr				
9,50	3/8"	334,8	10,1	21,1	78,9	88	70	85	77					
4,75	No 4	765,2	23,1	44,3	55,7	65	49	62	54					
2,00	10	664,3	20,1	64,3	35,7	45	29	38	32					
0,43	40	649,0	19,6	84,0	16,0	25	14	22	16			5,41		
0,18	80	198,2	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min		100	918	
0,08	200	125,5	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,16			Vacios en agreg %					15	
Relacion Estabilidad -Flujo					434,5			ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					10,02									

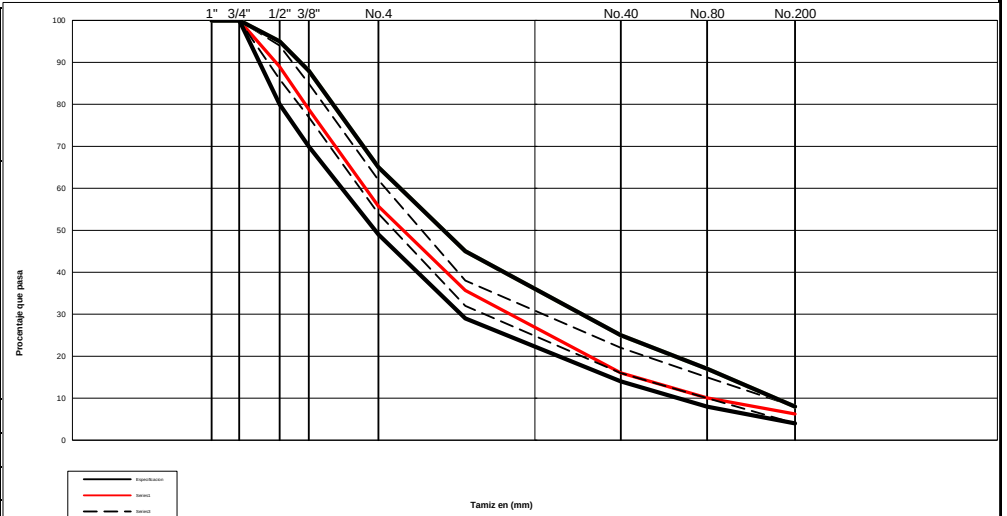

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21554	Fecha:	27/05/2026	Fecha:	27/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS				
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2				
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA				
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA				
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado				


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO			Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No	
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1400,9	1385,2	0,0	15,7	99
1/2"	3/8"	1400,1	1381,5	0,0	18,6	99
3/8"	4	200,0	192,9	0,0	7,1	96
MASA TOTAL USADA (g):		3001	PROMEDIO =			98

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO			Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1391,5	1390,7	0,0	1	100
1/2"	3/8"	1375,0	1388,5	0,0	-13,5	101
3/8"	4	196,0	196,7	0,0	-0,7	100
MASA TOTAL USADA (g):		2963	PROMEDIO =			100

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código:	PMA-INF-002
	FORMATO				Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIAS INV E 240-13				FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1					

N° Muestra: 21554 0

Fecha de toma: 27/05/2026 0

Fecha de ensayo: 27/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado



TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	3.593,6	45,2	54,8
3/8"	3.170,8	39,9	60,1
#4	1.127,4	14,2	85,8
Pasa 1/4"	52,6	0,7	99,3
Peso Seco	7944,4	100,0	

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	45,2	45,5	100	1391,5	10,5	1381,0	0,8	0,34
1/2"	3/8"	39,9	40,2	100	1375,0	9,3	1365,7	0,7	0,27
3/8"	N° 4	14,2	14,3	100	196,0	2,8	193,2	1,4	0,20
TOTALES		99,3	100,0	400,0	2962,5	4,0	2939,9	2,9	0,8

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:	
Firma  Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Firma  Nombre: YAZBLEY PAREDES B. Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-FOR-010
	FORMATO		Versión:	1
	IMPUREZAS EN AGREGADOS GRUESOS -NORMA INVIAS 237- 2013		FECHA	15/02/2019
				Página 1 de 1

N. de Muestra: 21554

Fecha: 27/05/2026

Fecha: 27/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

Descripción :

Agregado Triturado TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZACION PLANTA

K 15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producción

ENSAYO HUMEDAD		
Masa muestra húmeda (Mh) (g)		3000,0
Masa muestra seca (Ms) (g)		2980,1
Humedad (w)		0,668
ENSAYO LIMPIEZA SUPERFICIAL		
Masa húmeda muestra (Mhe) (g)		3000,0
Masa muestra seca después de lavado sobre tamiz No. 35 (m) (g)		2965,3
Masa seca muestra (Mse) (g)		2980,1
Impurezas (g)		15
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL		0,5
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL PROMEDIO	0,5	
ESPECIFICACION MÁXIMO (%)	0,5	
CUMPLE	SI	

OBSERVACION:

MUESTRA TOMADA EN ACOPIO PLANTA

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21556		
Obra:	VILLA 86								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESV-181	Fecha de Ensayo:	27-may-26	Fecha de Toma Muestra:	27-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,37																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3192,0							
		PESO FINAL:(g)				2991,3							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3373,0	gr
12,7	1/2"	390,1	12,2	12,2	87,8	95	80	94	86		P ₂	3190,9	gr
9,50	3/8"	306,4	9,6	21,8	78,2	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	660,5	20,7	42,5	57,5	65	49	62	54		P ₁	23,3	gr
2,00	10	683,9	21,4	63,9	36,1	45	29	38	32		P ₂	24,4	gr
0,43	40	639,8	20,0	84,0	16,0	25	14	22	16	5,37			
0,18	80	190,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	120,0	3,8	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %	15		
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

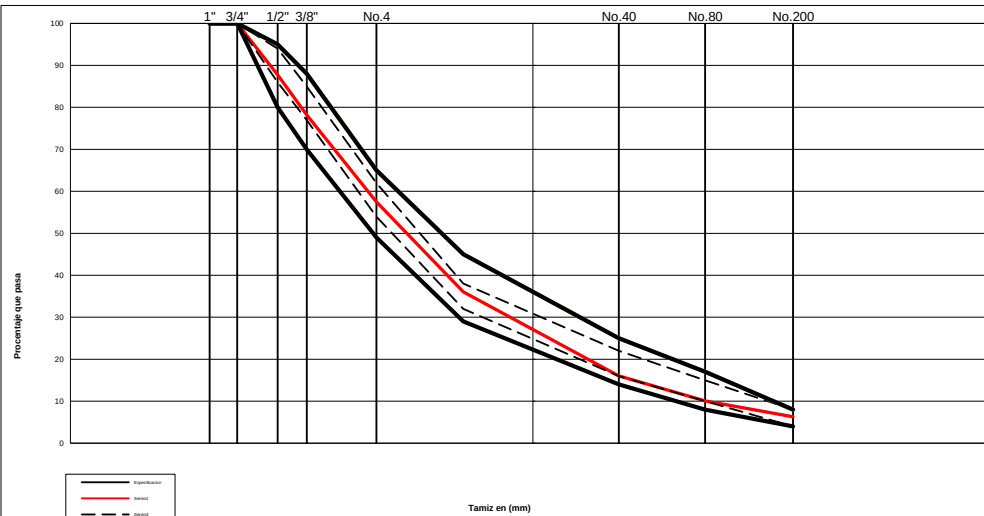

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21559		
Obra:	VILLA 86								
Material:	MDC-19	Viaje No	9	WEB-	ESV-181	Fecha de Ensayo:	26-may-26	Fecha de Toma Muestra:	26-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,41	0,89	554,0	1289,0	738,0	1292,0	2,327				83,3	4,8	11,9	16,7	71,1		1594	1418	3,29
2		0,93	546,0	1273,0	730,0	1276,0	2,332		2000		83,4	4,6	11,9	16,6	72,0		1552	1443	3,32
3		0,93	542,0	1262,0	722,0	1264,0	2,328		7416		83,3	4,8	11,9	16,7	71,4		1591	1479	3,30
4		1,00	517,0	1202,0	688,0	1205,0	2,325		8598		83,2	4,9	11,9	16,8	70,8		1469	1469	3,31
PROMEDIO							2,328	2,434	2,445	0,20	83,3	4,8	11,9	16,7	71,3	5,22		1452,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)						3240,3					
		PESO FINAL:(g)						3036,5					
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	3425,8	gr	
12,7	1/2"	400,7	12,4	12,4	87,6	95	80	94	86	P ₂	3238,2	gr	
9,50	3/8"	308,4	9,5	21,9	78,1	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	636,2	19,6	41,5	58,5	65	49	62	54	P ₁	20,6	gr	
2,00	10	752,3	23,2	64,7	35,3	45	29	38	32	P ₂	22,7	gr	
0,43	40	625,3	19,3	84,0	16,0	25	14	22	16	5,41			
0,18	80	194,2	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	119,4	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20				Vacios en agreg %				15
Relacion Estabilidad -Flujo					439,5				ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,76								

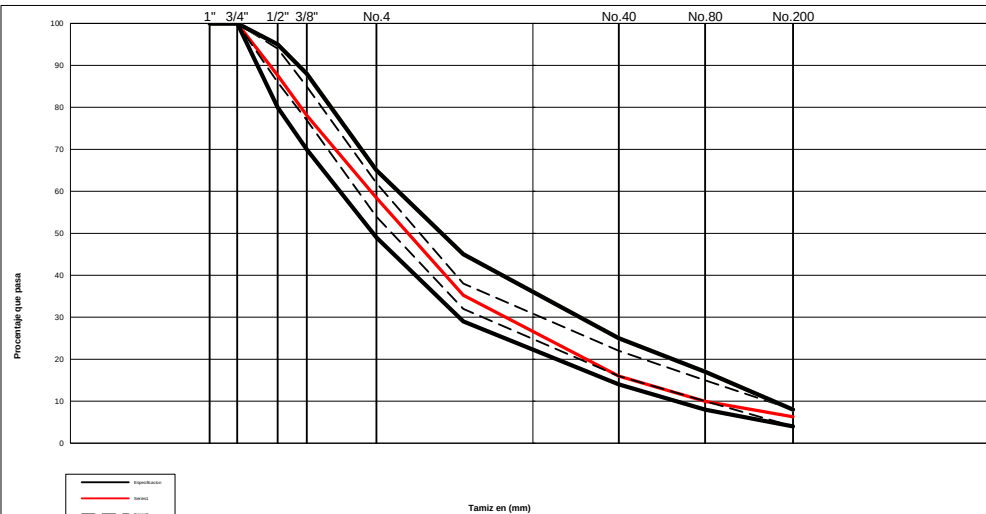

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

CODIGO

PMA-FOR-018

VERSION

0

FECHA

3/09/2019

PÁGINA

1

N° Muestra 21558
Fecha de Toma: 27/05/2026

Fecha de Ensayo: 27/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia

Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,4	2,5	2,5
Lectura de arcilla (B)	3,5	3,5	3,5
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	69	71	71
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			70

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	9

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:

21558

Fecha:

27/05/2026

Fecha:

27/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producto terminado

Peso del Cilindro (g):	268	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos V: Volumen del Cilindro F: Masa Neta G: Gravedad Específica
Volumen del Cilindro (cm³):	100,3		
Gravedad Específica Bulk:	2,623		

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba Nº	Masa Neta, g
Pasa Nº 8	Reten Nº 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,3	132,3
Pasa Nº 16	Reten Nº 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,2	132,2
Pasa Nº 30	Reten Nº 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,3	132,3
Pasa Nº 50	Reten Nº 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	132,266667
Total			190,0	Us	49,7

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1 Masa Neta, g	Prueba Nº 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa Nº 8		Reten Nº 16	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 16		Reten Nº 30	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 30		Reten Nº 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1	Prueba Nº 2	Promedio	% Vacíos
Pasa Nº 4			190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21560		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO					4			
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	ESU-850	Fecha de Ensayo:	27-may-26	Fecha de Toma Muestra:	27-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,44	1,00	518,0	1205,0	690,0	1208,0	2,326				83,2	4,5	12,3	16,8	73,1		1401	1401	3,32
2		0,93	536,0	1242,0	709,0	1245,0	2,317		2000		82,9	4,9	12,2	17,1	71,5		1563	1454	3,33
3		0,96	533,0	1237,0	707,0	1240,0	2,321		7416		83,0	4,7	12,2	17,0	72,1		1518	1458	3,32
4		0,96	533,0	1241,0	710,0	1243,0	2,328		8595		83,3	4,4	12,3	16,7	73,5		1488	1428	3,33
PROMEDIO							2,323	2,433	2,436	0,06	83,1	4,6	12,2	16,9	72,5	5,38		1435,2	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3518,0											
		PESO FINAL:(g) 3287,0											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	3720,3	gr	
12,7	1/2"	322,3	9,2	9,2	90,8	95	80	94	86	P ₂	3516,4	gr	
9,50	3/8"	482,6	13,7	22,9	77,1	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	749,3	21,3	44,2	55,8	65	49	62	54	P ₁	23,3	gr	
2,00	10	678,5	19,3	63,5	36,5	45	29	38	32	P ₂	24,9	gr	
0,43	40	711,8	20,2	83,7	16,3	25	14	22	16	5,44			
0,18	80	220,2	6,3	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	122,3	3,5	93,4	6,6	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,22					Vacios en agreg % 15			
Relacion Estabilidad -Flujo					431,6					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5			
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					10,05								

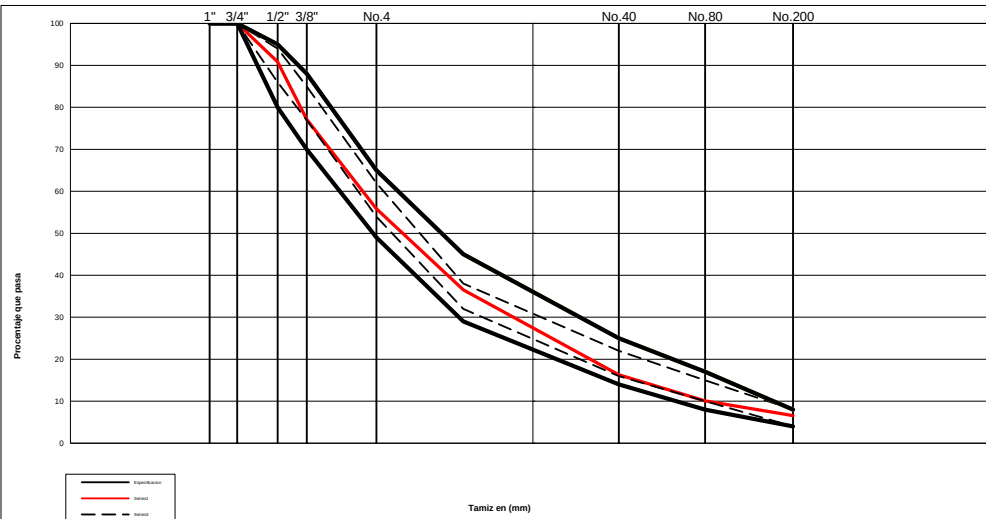

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ


Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21562	Fecha:	28/05/2026	Fecha:	28/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS				
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2				
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA				
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA				
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado				


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 2 o más Caras F	Peso Partículas con Caras Q	Peso Partículas No N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1400,0	1375,4	0,0	24,6
1/2"	3/8"	1400,0	1384,4	0,0	15,6
3/8"	4	200,0	196,3	0,0	3,7
MASA TOTAL USADA (g):		3000	PROMEDIO =		98

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g) F	Peso Partículas con Caras Dudosas (g) Q	Peso Partículas No Fracturadas (g) N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1391,5	1386,3	0,0	5
1/2"	3/8"	1375,0	1393,0	0,0	-18,0
3/8"	4	200,0	198,3	0,0	1,7
MASA TOTAL USADA (g):		2967	PROMEDIO =		100

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21567		
Obra:	TOKIO								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	ESV-252	Fecha de Ensayo:	28-may-26	Fecha de Toma Muestra:	28-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,43																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3345,7							
		PESO FINAL:(g)				3135,9							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3537,7	gr	
12,7	1/2"	309,6	9,3	9,3	90,7	95	80	94	86		P ₂	3343,9	gr
9,50	3/8"	360,7	10,8	20,0	80,0	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	672,4	20,1	40,1	59,9	65	49	62	54		21,0	gr	
2,00	10	719,3	21,5	61,6	38,4	45	29	38	32		P ₂	22,8	gr
0,43	40	746,6	22,3	83,9	16,1	25	14	22	16	5,43			
0,18	80	200,8	6,0	89,9	10,1	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	126,5	3,8	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO													

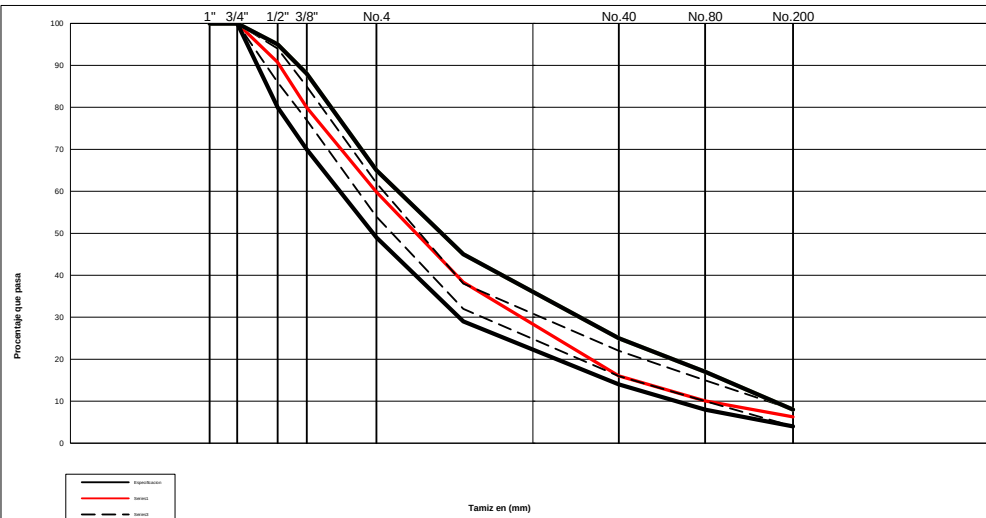

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21568		
Obra:	TOKIO								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	TTP-432	Fecha de Ensayo:	28-may-26	Fecha de Toma Muestra:	28-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,44	0,93	537,0	1251,0	716,0	1253,0	2,330				83,4	4,7	11,9	16,6	71,7		1513	1407	3,29
2		0,93	540,0	1257,0	720,0	1260,0	2,328		2000		83,3	4,8	11,9	16,7	71,3		1528	1421	3,32
3		0,93	538,0	1253,0	718,0	1256,0	2,329		7416		83,3	4,7	11,9	16,7	71,5		1517	1411	3,30
4		0,96	535,0	1244,0	712,0	1247,0	2,325		8598		83,2	4,9	11,9	16,8	70,9		1498	1438	3,31
PROMEDIO							2,328	2,433	2,445	0,22	83,3	4,8	11,9	16,7	71,3	5,23		1419,3	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g) 3331,1											
		PESO FINAL:(g) 3121,4											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3522,6	gr	
12,7	1/2"	407,6	12,2	12,2	87,8	95	80	94	86	P ₂	3329,5	gr	
9,50	3/8"	308,6	9,3	21,5	78,5	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	696,1	20,9	42,4	57,6	65	49	62	54	P ₁	20,7	gr	
2,00	10	756,3	22,7	65,1	34,9	45	29	38	32	P ₂	22,3	gr	
0,43	40	627,9	18,8	84,0	16,0	25	14	22	16	5,44			
0,18	80	202,3	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	122,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %			15
Relacion Estabilidad -Flujo					429,4					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO			7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,78								

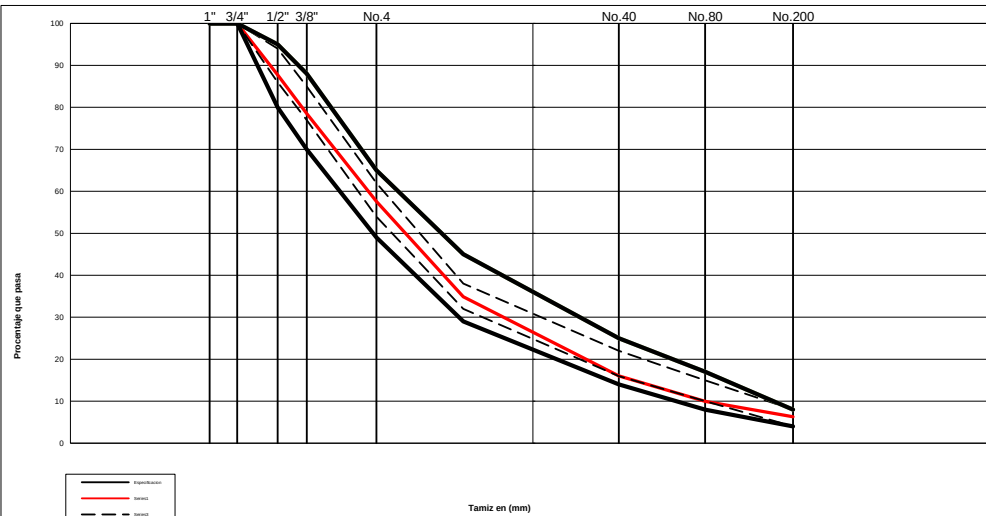

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21569	Fecha:	29/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1400,7	1387,1	0,0	13,6
1/2"	3/8"	1400,9	1380,5	0,0	20,4
3/8"	4	200,0	190,2	0,0	9,8
MASA TOTAL USADA (g):		3002	PROMEDIO =		98

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)
			F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1391,5	1391,2	0,0	0
1/2"	3/8"	1375,0	1362,0	0,0	13,0
3/8"	4	200,0	195,9	0,0	4,1
MASA TOTAL USADA (g):		2967	PROMEDIO =		99

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código:	PMA-INF-002
	FORMATO				Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIA INV E 240-13				FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1					

N° Muestra: 21569 0

Fecha de toma: 29/05/2026 0

Fecha de ensayo: 29/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado



TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	4.383,1	55,3	44,7
3/8"	2.858,1	36,0	64,0
#4	639,3	8,1	91,9
Pasa 1/4"	48,1	0,6	99,4
Peso Seco	7928,6	100,0	

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	55,3	55,6	100	1391,5	12,0	1379,5	0,9	0,48
1/2"	3/8"	36,0	36,3	100	1375,0	6,9	1368,1	0,5	0,18
3/8"	N° 4	8,1	8,1	100	200,0	8,0	192,0	4,0	0,32
TOTALES		99,4	100,0	400,0	2966,5	4,0	2939,6	5,4	1,0

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:	
Firma 	Firma 	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO

Código: PMA-FOR-011
Versión: 1
FECHA: 15/02/2019
PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21576		
Obra:	KENEDY								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WLC-135	Fecha de Ensayo:	29-may-26	Fecha de Toma Muestra:	29-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,43	0,93	536,0	1249,0	717,0	1253,0	2,330				83,4	4,6	12,0	16,6	72,5		1528	1421	3,35
2		0,93	540,0	1257,0	720,0	1260,0	2,328		2000		83,3	4,7	12,0	16,7	72,0		1518	1412	3,32
3		0,96	523,0	1215,0	694,0	1217,0	2,323		7416		83,1	4,9	12,0	16,9	71,1		1500	1440	3,25
4		0,93	538,0	1255,0	720,0	1258,0	2,333		8597		83,5	4,5	12,1	16,5	72,9		1512	1406	3,34
PROMEDIO							2,328	2,433	2,442	0,16	83,3	4,6	12,0	16,7	72,1	5,27		1419,7	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g)				3127,0									
		PESO FINAL:(g)				2932,1									
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3306,4	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100						
12,7	1/2"	382,9	12,2	12,2	87,8	95	80	94	86	Filtro		P ₂	3125,4	gr	
9,50	3/8"	350,2	11,2	23,4	76,6	88	70	85	77						
4,75	No 4	576,4	18,4	41,9	58,1	65	49	62	54			P ₁	24,2	gr	
2,00	10	634,9	20,3	62,2	37,8	45	29	38	32						
0,43	40	683,2	21,8	84,0	16,0	25	14	22	16			P ₂	25,8	gr	
0,18	80	185,7	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10						
0,08	200	118,8	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Estabilidad min		100	918		
										Flujo mm		2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,18			Vacios en agreg %					15		
Relacion Estabilidad -Flujo					428,3			ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5		
ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,86										

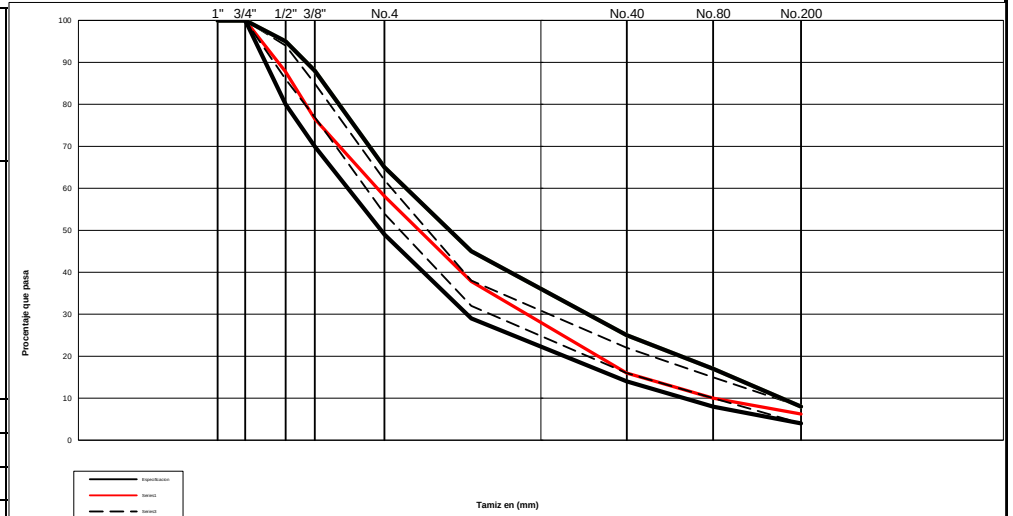

PREPARADO POR:		REVISADO Y APROBO:	
Firma		Firma	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ		Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad		Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21580		
Obra:	AV 30 DE AGOSTO								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	TSY-073	Fecha de Ensayo:	29-may-26	Fecha de Toma Muestra:	29-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,02 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,46	0,96	529,0	1231,0	704,0	1233,0	2,327				83,2	4,6	12,2	16,8	72,6		1507	1447	3,25
2		0,96	526,0	1221,0	697,0	1223,0	2,321		2000		83,0	4,8	12,1	17,0	71,6		1511	1451	3,32
3		0,96	526,0	1224,0	700,0	1226,0	2,327		7416		83,2	4,6	12,2	16,8	72,6		1476	1416	3,35
4		0,93	536,0	1245,0	712,0	1248,0	2,323		8596		83,1	4,8	12,2	16,9	71,8		1547	1439	3,34
PROMEDIO							2,325	2,432	2,439	0,13	83,1	4,7	12,2	16,9	72,1	5,34		1438,2	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)						3270,3					
		PESO FINAL:(g)						3061,5					
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3459,3	gr
12,7	1/2"	286,7	8,8	8,8	91,2	95	80	94	86		P ₂	3268,6	gr
9,50	3/8"	419,0	12,8	21,6	78,4	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	664,2	20,3	41,9	58,1	65	49	62	54	P ₁	24,7	gr	
2,00	10	737,1	22,5	64,4	35,6	45	29	38	32	P ₂	26,4	gr	
0,43	40	635,2	19,4	83,9	16,1	25	14	22	16				5,46
0,18	80	200,3	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	119,0	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					433,8					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,98								

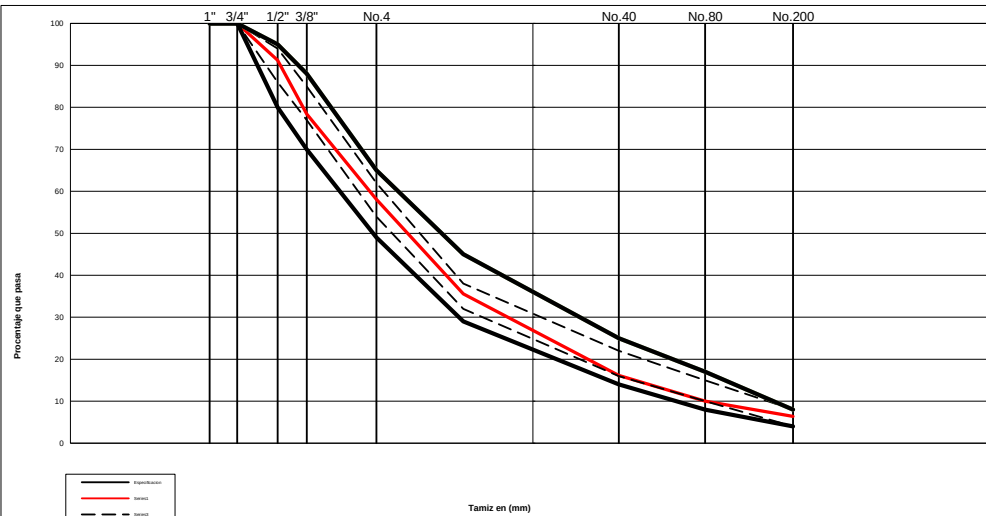

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23235

Remisión: 28863

Fecha de despacho: 28-05-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARLADA S.AS

Pedido: 5300077594

Fecha de lote: 28-05-2026

Lote No: 28863

Placa: XGC-752

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	67	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.5	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	2120	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	50	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	278	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.34	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		65.2	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1020	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.467	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	54	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	9.0	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL



Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

**DIVA
CRISTINA
TORRES**

Firmado digitalmente
por DIVA CRISTINA
TORRES

Fecha: 2026.05.29
10:03:57 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. **MULTINSA S.A.S.** no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO

N°23235

Remisión: 28863

Fecha de despacho: 28-05-2026


Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARLADA S.AS

Pedido: 5300077594

Fecha de lote: 28-05-2026

Lote No: 28863

Placa: XGC-752

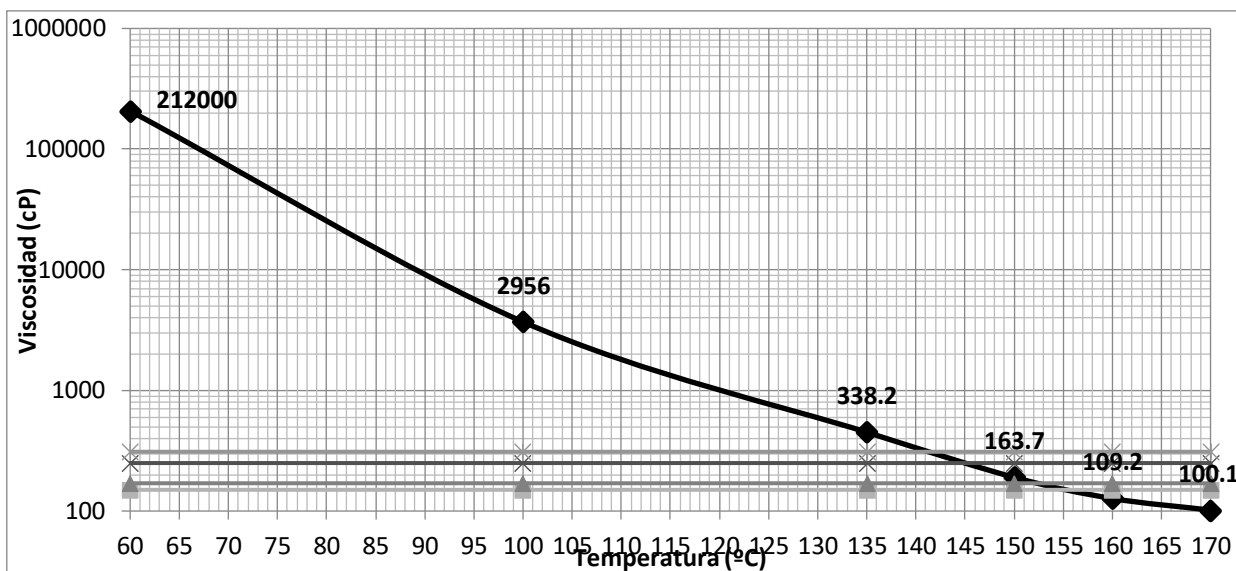

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico



Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°23020

Remisión: 28637

Fecha de despacho: 18-05-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: N/A

Fecha de lote: 18-05-2026

Lote No: 28637

Placa: SZZ-377

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	70	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.9	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	1860	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	48	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	278	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.34	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		64.8	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1019	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.467	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	50	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	9.0	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado digitalmente
por DIVA CRISTINA
TORRES
Fecha: 2026.05.19
08:55:49 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.




CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°23020

Remisión: 28637
Fecha de despacho: 18-05-2026
Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS
Pedido: N/A

Fecha de lote: 18-05-2026
Lote No: 28637
Placa: SZZ-377

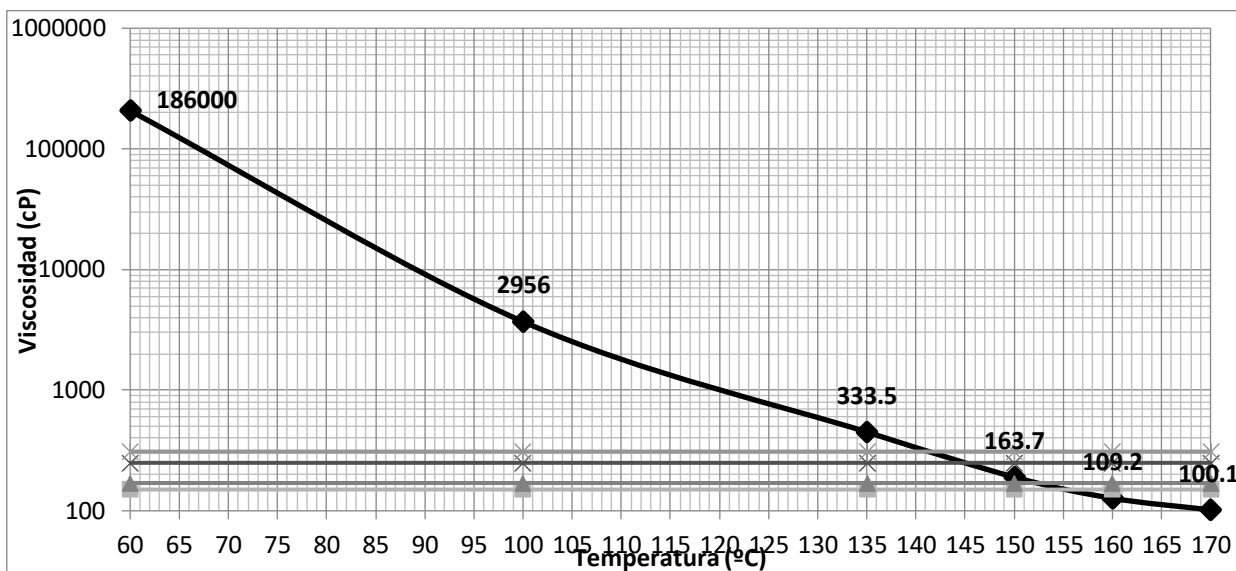

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R: 23

2026-03-30

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

FECHA: 13 DE MAYO DE 2026 LOTE No. 299 26

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS DESPACHO No. 36430


TIPO DE ASFALTO: ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO

PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-708	80	70	83	LOTE
Punto de ablandamiento, (°C)	E-712	48	54	49,4	LOTE
Índice de Penetración (IP)	E-724	-1,2	+0,8	-0,67	LOTE
Viscosidad Absoluta @60°C, (P)	E-716	1500	—	2453	LOTE
Viscosidad @135°C, (P)	E-717	4,0	—	N.A	LOTE
Cudilidad @ 25°C, 5 cm/min. (cm)	E-702	100	—	130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	—	—	1,013	MENSUAL
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	—	300	LOTE
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	E-713	99	—	99,54	SEMESTRAL
Contenido de agua, (%)	E-704	—	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-718	—	3,0	2,296	TRIMESTRAL

ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA RTPO (INV E-720)

Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	—	0,3	-0,309	SEMANTAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original	E-709	80	—	57,8	SEMANTAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	—	9	6,1	SEMANTAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 50°C del asfalto residual y el asfalto original	E-717	—	4	3,9	SEMANTAL
Clado de Desempeño, PG	AAASHO M-320	REPORTAR		64-22	MENSUAL

CURVA REOLOGICA

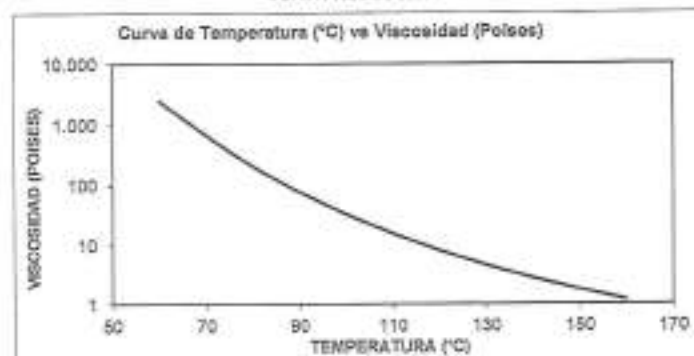

FRECUENCIA ENSAYO: SEMANTAL

NORMA DE ENSAYO: ASTM D-4432

Temperaturas	Rango Viscosidad (Poisos)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en tanque, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de mezclado, °C	1,5 - 1,9	147	156
Temperatura de compactación, °C	2,5 - 3,1	137	146

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO:

ANALISTA LAB:

PAOLA PAYARES

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD C.I. MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL COORDINADOR SGI



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°22804

Remisión: 28406

Fecha de despacho: 08-05-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: 5300076236

Fecha de lote: 08-05-2026

Lote No: 28406

Placa: UZN-315

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	69	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-1.0	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	1860	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	48	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	274	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.34	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		65.1	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1021	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.467	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	50	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	9.0	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado
digitalmente por
DIVA CRISTINA
TORRES
Fecha: 2026.05.09
10:25:11 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°22804

Remisión: 28406
Fecha de despacho: 08-05-2026
Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS
Pedido: 5300076236

Fecha de lote: 08-05-2026
Lote No: 28406
Placa: UZN-315



	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico

Tec. Química DINA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°22804

Remisión: 28406

Fecha de despacho: 08-05-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS

Pedido: 5300076236

Fecha de lote: 08-05-2026

Lote No: 28406

Placa: UZN-315

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	69	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-1.0	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	1860	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	48	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	274	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.34	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		65.1	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1021	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.467	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	50	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	9.0	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL



Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

**DIVA
CRISTINA
TORRES**

Firmado
digitalmente por
DIVA CRISTINA
TORRES
Fecha: 2026.05.09
10:25:11 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. **MULTINSA S.A.S.** no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°22804

Remisión: 28406
Fecha de despacho: 08-05-2026
Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS
Pedido: 5300076236

Fecha de lote: 08-05-2026
Lote No: 28406
Placa: UZN-315



	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico

Tec. Química DINA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°22929

Remisión: 28521
Fecha de despacho: 13-05-2026
Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS
Pedido: 5300076563

Fecha de lote: 13-05-2026
Lote No: 28521
Placa: UZN-371

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	65	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.8	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	2280	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	49	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	276	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.34	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		64.8	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1021	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.467	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	50	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	9.0	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado digitalmente por
DIVA CRISTINA TORRES
Fecha: 2026.05.13
14:57:16 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.




CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°22929


Remisión: 28521
Fecha de despacho: 13-05-2026
Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS
Pedido: 5300076563

Fecha de lote: 13-05-2026
Lote No: 28521
Placa: UZN-371

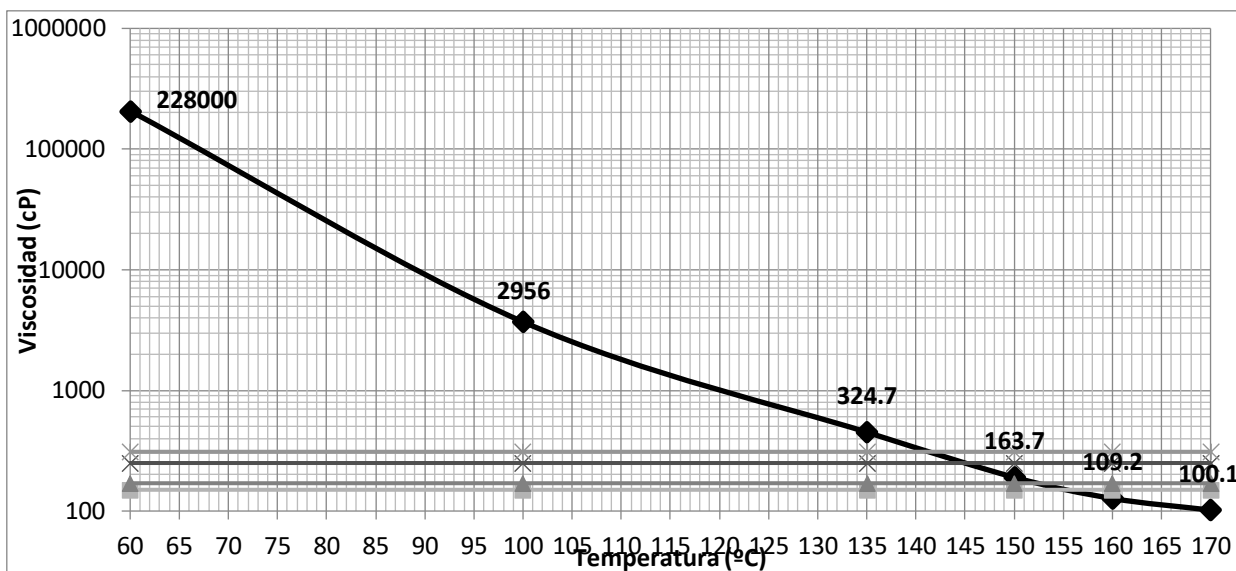

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico



Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°23185

Remisión: 28817

Fecha de despacho: 25-05-2026

Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Pedido: 5300077359

Fecha de lote: 25-05-2026

Lote No: 28817

Placa: SRZ-968

Propiedad	Norma de referencia	Especificación		Resultado	Frecuencia
		MÍN	MÁX		
Penetración (25°C, 100 g,5 s) 0,1mm	INV E-706	60	70	66	LOTE
Índice de Penetración	INV E-724	-1,2	+0,6	-0.8	LOTE
Viscosidad a 60°C, P	INV E-716	1500	-	2360	LOTE
Punto de ablandamiento, °C	INV E-712	48	54	49	LOTE
Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm	INV E-702	100	-	140	MENSUAL
Solubilidad en Tricloroetileno, %	INV E-713	99	-	99,98	MENSUAL
Contenido de agua, %	INV E-704	-	0,2	0,0	MENSUAL
Punto de inflamación copa abierta de Cleveland, °C	INV E-709	230	-	274	MENSUAL
Contenido de parafinas, %	INV E-718	-	3	0.34	MENSUAL
Grado de Desempeño (PG)	ASTM D-6373	Reportar		64	MENSUAL
Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C	ASTM D-6373	Reportar		65.2	MENSUAL
Densidad a 15°C, kg/m³	INV E-707	Reportar		1020	LOTE
ENSAYOS SOBRE RESIDUO LUEGO DE LA PRUEBA DE ACONDICIONAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA ROTATORIA, INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento, %	INV E-720	-	0,8	-0.467	MENSUAL
Penetración del residuo, porcentaje de la penetración original, %	INV E-706	50	-	54	MENSUAL
Incremento en el punto de ablandamiento °C	INV E-712	-	9	9.0	MENSUAL
Índice de envejecido, relación viscosidades a 60°C	INV E-717	-	4	4.0	MENSUAL

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

DIVA
CRISTINA
TORRES

Firmado digitalmente por
DIVA CRISTINA
TORRES
Fecha: 2026.05.26
11:46:46 -05'00'

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO 60-70 NORMALIZADO N°23185

Remisión: 28817

Fecha de despacho: 25-05-2026


Cliente: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

Pedido: 5300077359

Fecha de lote: 25-05-2026

Lote No: 28817

Placa: SRZ-968

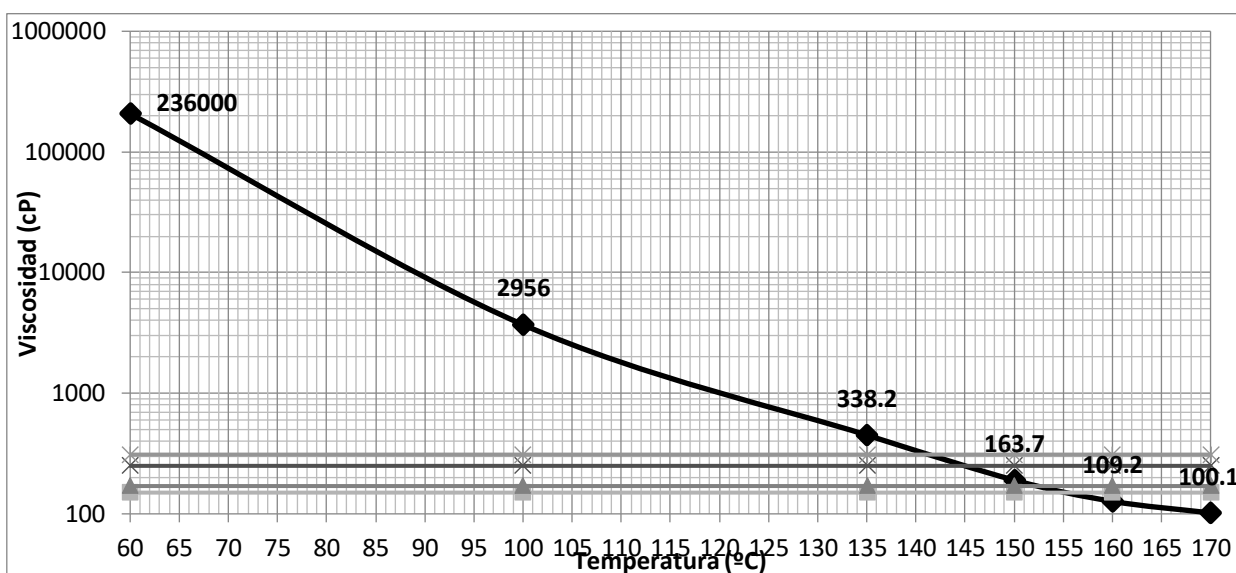

	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de compactación*, °C	140	145
Temperatura de mezclado*, °C	150	155

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Nota: Este certificado es válido únicamente en su versión digital a color con la firma electrónica emitida por la Jefe de Laboratorio de MULTINSA S.A.S. En caso de recibir una copia escaneada o de baja calidad, solicite la versión original al correo laboratorio@multinsa.com. Las observaciones, datos, conclusiones y/o recomendaciones aquí contenidas corresponden exclusivamente a la(s) muestra(s) analizada(s), y no deben reproducirse total ni parcialmente sin autorización. MULTINSA S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información suministrada.



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R: 23

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

2026-03-30

FECHA: ABRIL 29 DE 2026 LOTE No. 263_28

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS DESPACHO No. 38324


TIPO DE ASFALTO: ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO

PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-708	60	70	65	LOTE
Punto de ablandamiento (°C)	E-712	48	54	49,4	LOTE
Índice de Penetración (IP)	E-724	-1,2	+0,6	-0,72	LOTE
Viscosidad Absoluta @ 60°C, (P)	E-716	1500	—	2417	LOTE
Viscosidad @ 135°C, (P)	E-717	4,0	—	N.A	LOTE
Ductilidad @ 25°C, 5 cm/min, (cm)	E-702	100	—	>130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	—	—	1,014	MENSUAL
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	—	295	LOTE
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)	E-713	99	—	99,54	SEMESTRAL
Contenido de agua, (%)	E-704	—	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-715	—	3,0	2,135	TRIMESTRAL

ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA RTFO (INV E-725)

Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	—	0,8	-0,307	SEMESTRAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original.	E-708	60	—	63,5	SEMESTRAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	—	9	6,5	SEMESTRAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 60°C del asfalto residual y el asfalto original.	E-717	—	4	3,9	SEMESTRAL
Grado de Desempeño, PG	AASHTO M-320	REPORTAR		64-22	MENSUAL

CURVA REOLOGICA

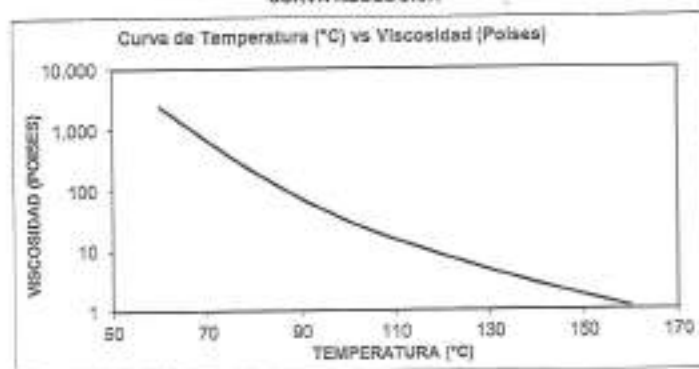

FRECUENCIA ENSAYO:

SEMESTRAL

NORMA DE ENSAYO:

ASTM D-4402

Temperatura	Rango Viscosidad (Póises)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en tanque, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de mezclado, °C	1,5 - 1,8	147	155
Temperatura de compactación, °C	2,5 - 3,1	137	145

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO:

ANALISTA LAB.

ROSARIO CAMPOS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD C.I. MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA. PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL COORDINADOR SGI



R DT 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

N.R: 23

REPORTE DE CALIDAD ASFALTOS PENETRACIÓN
60-70 MPI / SIN O CON MEJORADOR DE ADHERENCIA

2026-03-30

FECHA: MAYO 05 DE 2026 LOTE No. 278 26

CLIENTE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS DESPACHO No. 36381


TIPO DE ASFALTO: ASFALTO MPI 60-70 NORMALIZADO

PROPIEDAD	NORMA DE REFERENCIA INV.	ESPECIFICACIÓN		REPORTE CONTROL DE CALIDAD	FRECUENCIA DE ENSAYO
		MIN	MAX		
Penetración @ 25°C, 100 g, 5 seg. (mm/10)	E-708	60	70	66	LOTE
Punto de ablandamiento, (°C)	E-712	48	54	49,8	LOTE
Índice de Penetración (IP)	E-724	-1,2	+0,8	-0,83	LOTE
Viscosidad Absoluta @60°C, (P)	E-718	1500	----	2479	LOTE
Viscosidad @135°C, (P)	E-717	4,0	----	N.A	LOTE
Ductilidad @ 25°C, 5 cm/min, (cm)	E-702	100	----	130	QUINCENAL
Peso Específico	E-707	----	----	1,013	MENSUAL
Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, (°C)	E-709	230	----	298	LOTE
Solubilidad en Triclorometileno, (%)	E-713	99	----	99,54	SEMESTRAL
Contenido de agua, (%)	E-704	----	0,2	0,00	TRIMESTRAL
Contenido de Parafinas, (%)	E-718	----	3,0	2,286	TRIMESTRAL

ASFALTO RESIDUAL ENSAYO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA RTFO (INV E-720)

Pérdida de masa por calentamiento, (%)	E-720	----	0,8	-0,353	SEMANTAL
Penetración del residuo, en % de la penetración del asfalto original	E-708	50	----	65,1	SEMANTAL
Incremento en el Punto de ablandamiento	E-712	----	9	6,0	SEMANTAL
Índice de envejecimiento relación de viscosidades a 60°C del asfalto residual y el asfalto original	E-717	----	4	3,7	SEMANTAL
Grado de Desempeño, PG	AASHTO M-320	REPORTAR		84-22	MENSUAL

CURVA REOLOGICA

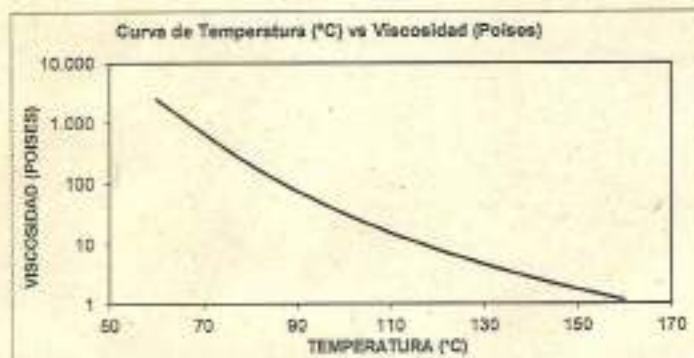

FRECUENCIA ENSAYO: SEMANTAL

NORMA DE ENSAYO: ASTM D4402

Temperaturas	Rango Viscosidad (Poisos)	Mínimo	Máximo
Temperatura del Asfalto en tanque, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura del Agregado, °C	N.A	N.A	N.A
Temperatura de mezclado, °C	1,5 - 1,9	147	155
Temperatura de compactación, °C	2,5 - 3,1	137	145

NOTA: TEMPERATURAS OPTIMAS DE MEZCLADO Y DE COMPACTACION EN LABORATORIO

OBSERVACIONES:

DIR. TÉCNICO:

ANALISTA LAB.

ROSARIO CAMPOS



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21424		
Obra:	DEOGRACIAS CARDONA								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WEB-093	Fecha de Ensayo:	2-may-26	Fecha de Toma Muestra:	2-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,014 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,55																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3182,4								
		PESO FINAL:(g)				2984,9								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3369,5	gr
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					
12,7	1/2"	294,5	9,3	9,3	90,7	95	80	94	86	Filtro	P ₁	21,3	gr	
9,50	3/8"	345,6	10,9	20,1	79,9	88	70	85	77					P ₂
4,75	No 4	767,8	24,1	44,2	55,8	65	49	62	54	5,55				
2,00	10	716,9	22,5	66,8	33,2	45	29	38	32					
0,43	40	545,6	17,1	83,9	16,1	25	14	22	16					
0,18	80	193,9	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918		
0,08	200	120,6	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6			
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %		15		
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5		
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO														

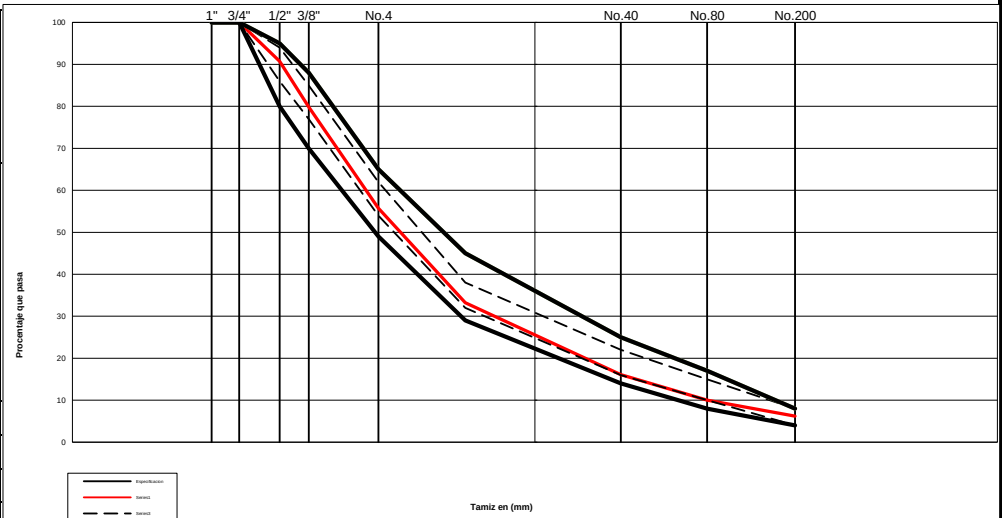

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE						MUESTRA No.	21425	
Obra:	DEOGRACIAS CARDONA								
Material:	MDC-19	Viaje No	9	WEB-	SXF-624	Fecha de Ensayo:	2-may-26	Fecha de Toma Muestra:	2-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,014 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,47	0,89	554,0	1286,0	735,0	1289,0	2,321				83,0	4,8	12,2	17,0	71,6		1583	1408	3,35
2		0,93	543,0	1265,0	725,0	1268,0	2,330		2000		83,3	4,5	12,2	16,7	73,1		1603	1491	3,34
3		0,89	547,0	1275,0	730,0	1277,0	2,331		7416		83,4	4,4	12,2	16,6	73,4		1600	1424	3,33
4		0,93	542,0	1261,0	721,0	1263,0	2,327		8596		83,2	4,6	12,2	16,8	72,5		1577	1467	3,35
PROMEDIO							2,327	2,429	2,439	0,17	83,2	4,6	12,2	16,8	72,6	5,31		1447,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g)				3256,2									
		PESO FINAL:(g)				3051,6									
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3444,8	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100						
12,7	1/2"	294,5	9,0	9,0	91,0	95	80	94	86	Filtro		P ₂	3254,0	gr	
9,50	3/8"	324,3	10,0	19,0	81,0	88	70	85	77						
4,75	No 4	698,2	21,4	40,4	59,6	65	49	62	54			P ₁	23,2	gr	
2,00	10	762,9	23,4	63,9	36,1	45	29	38	32						
0,43	40	655,3	20,1	84,0	16,0	25	14	22	16			P ₂	25,4	gr	
0,18	80	195,6	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10						
0,08	200	120,8	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Estabilidad min		100	918		
										Flujo mm		2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,18			Vacios en agreg %					15		
Relacion Estabilidad -Flujo					433,1			ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					7,5		
ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,93										

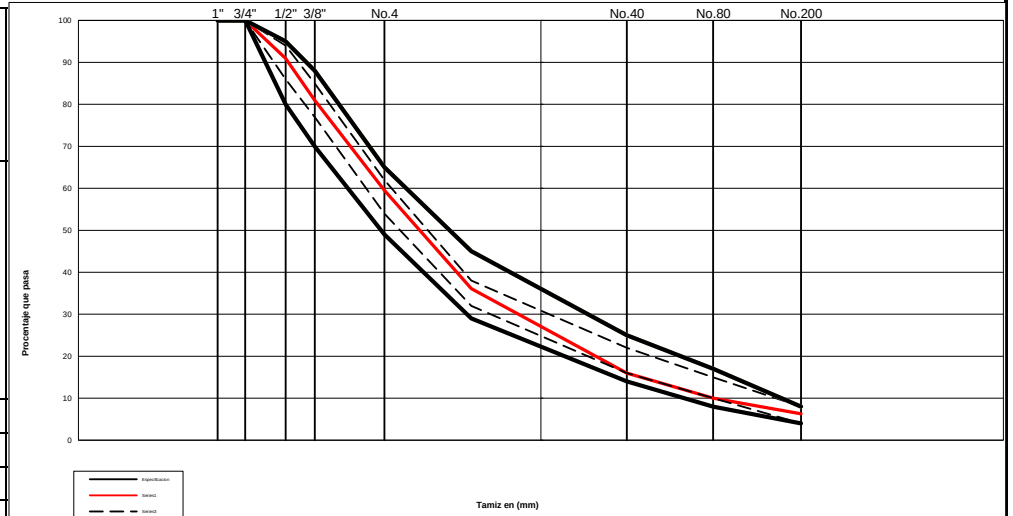

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21426		
Obra:	GIRASOLES, CORALES, VILLA DEL PRADO 2								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	WLC-252	Fecha de Ensayo:	4-may-26	Fecha de Toma Muestra:	4-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,014 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,39																		
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)											
		PESO FINAL:(g)											
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3469,3	gr	
12,7	1/2"	284,5	8,7	8,7	91,3	95	80	94	86		P ₂	3280,1	gr
9,50	3/8"	307,7	9,4	18,0	82,0	88	70	85	77	P ₁	Filtro		
4,75	No 4	751,6	22,9	40,9	59,1	65	49	62	54		21,2	gr	
2,00	10	770,3	23,5	64,4	35,6	45	29	38	32		P ₂	23,4	gr
0,43	40	642,3	19,6	84,0	16,0	25	14	22	16	5,39			
0,18	80	197,8	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	122,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante										Vacios en agreg %			
Relacion Estabilidad -Flujo										ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO			
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO										7,5			

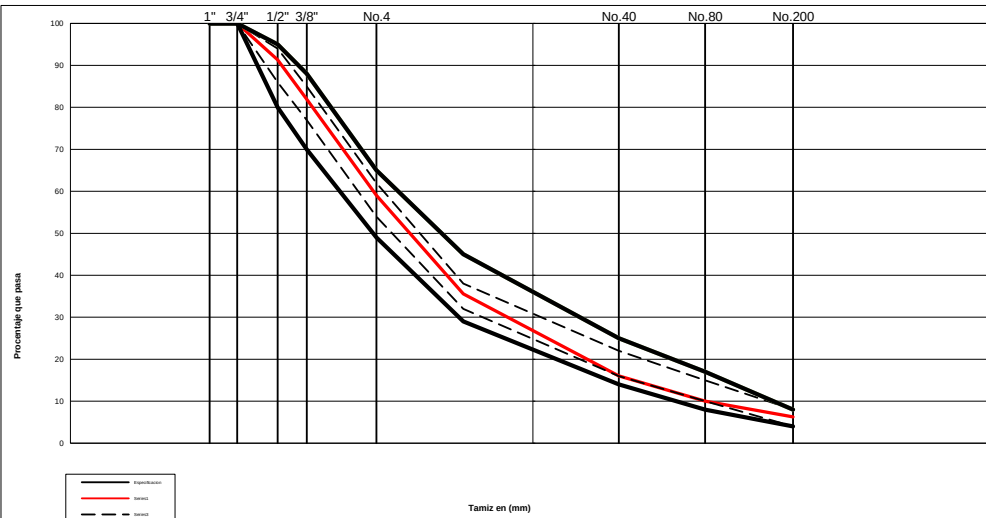

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21427		
Obra:	GIRASOLES, CORALES, VILLA DEL PRADO 2								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	WEB-	ESV-252	Fecha de Ensayo:	4-may-26	Fecha de Toma Muestra:	4-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,014 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,47	0,93	540,0	1256,0	719,0	1259,0	2,326				83,2	4,8	12,1	16,8	71,7		1589	1477	3,32
2		0,96	525,0	1221,0	698,0	1223,0	2,326		2000		83,2	4,8	12,1	16,8	71,7		1547	1485	3,34
3		0,93	536,0	1246,0	712,0	1248,0	2,325		7416		83,1	4,8	12,0	16,9	71,5		1574	1464	3,35
4		1,00	518,0	1205,0	690,0	1208,0	2,326		8597		83,2	4,7	12,1	16,8	71,8		1545	1545	3,31
PROMEDIO							2,326	2,430	2,442	0,22	83,2	4,8	12,1	16,8	71,7	5,26		1492,9	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3191,3							
		PESO FINAL:(g)				2990,8							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	3375,9	gr	
12,7	1/2"	282,6	8,9	8,9	91,1	95	80	94	86	P ₂	3190,0	gr	
9,50	3/8"	310,1	9,7	18,6	81,4	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	731,8	22,9	41,5	58,5	65	49	62	54	P ₁	23,4	gr	
2,00	10	735,1	23,0	64,5	35,5	45	29	38	32	P ₂	24,7	gr	
0,43	40	620,3	19,4	84,0	16,0	25	14	22	16	5,47			
0,18	80	192,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	118,6	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg % 15			
Relacion Estabilidad -Flujo					448,3					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5			
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,83								

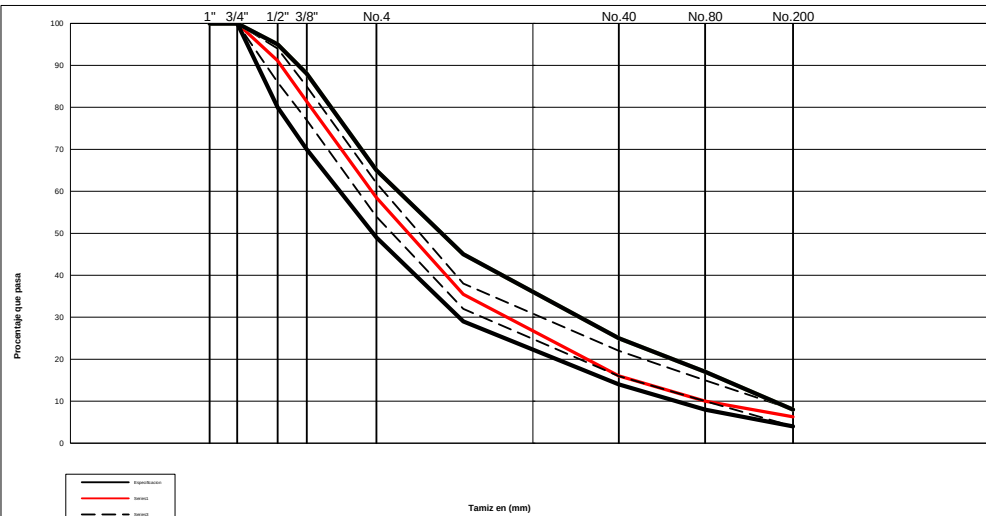

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21428		
Obra:	DEOGRACIAS CARDONA								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	WEB-	ESU-846	Fecha de Ensayo:	4-may-26	Fecha de Toma Muestra:	4-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,014 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,36	0,96	535,0	1244,0	711,0	1246,0	2,325				83,3	4,8	12,0	16,7	71,4		1495	1435	3,30
2		0,93	539,0	1258,0	722,0	1261,0	2,334		2000		83,6	4,4	12,0	16,4	73,1		1520	1414	3,31
3		0,93	536,0	1249,0	717,0	1253,0	2,330		7416		83,4	4,6	12,0	16,6	72,4		1523	1417	3,30
4		0,93	539,0	1256,0	720,0	1259,0	2,330		8597		83,4	4,6	12,0	16,6	72,4		1526	1420	3,29
PROMEDIO							2,330	2,433	2,442	0,15	83,4	4,6	12,0	16,6	72,3	5,22	1421,4	1421,4	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3358,6							
		PESO FINAL:(g)				3150,0							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3548,9
12,7	1/2"	376,2	11,2	11,2	88,8	95	80	94	86	P ₂	3354,1	gr	
9,50	3/8"	337,0	10,0	21,2	78,8	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	765,3	22,8	44,0	56,0	65	49	62	54			P ₁	21,2
2,00	10	728,3	21,7	65,7	34,3	45	29	38	32	P ₂	25,7	gr	
0,43	40	615,3	18,3	84,0	16,0	25	14	22	16			5,36	
0,18	80	202,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	125,6	3,7	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					430,7					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,74								

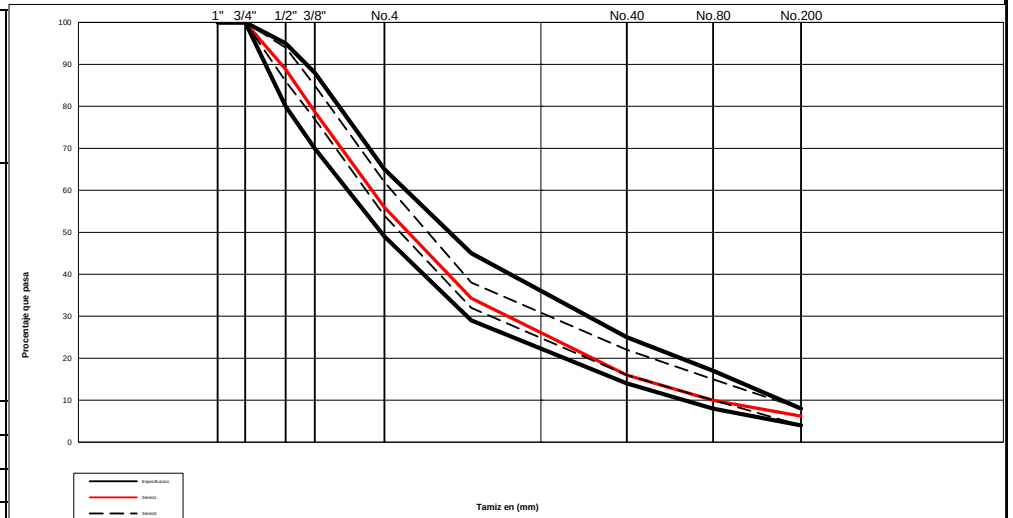

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21445
Fecha de Toma: 5/05/2026

Fecha de Ensayo: 5/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

☐

Procedencia


Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,3	2,4	2,3
Lectura de arcilla (B)	3,8	3,9	3,8
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	61	62	61
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			61

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	8

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:

21445

Fecha:

5/05/2026

Fecha:

5/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producto terminado

Peso del Cilindro (g):	268	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos V: Volumen del Cilindro F: Masa Neta G: Gravedad Específica
Volumen del Cilindro (cm³):	100,3		
Gravedad Específica Bulk:	2,623		

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba Nº	Masa Neta, g
Pasa Nº 8	Reten Nº 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,2	132,2
Pasa Nº 16	Reten Nº 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,1	132,1
Pasa Nº 30	Reten Nº 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,2	132,2
Pasa Nº 50	Reten Nº 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	132,166667
Total			190,0	Us	49,8

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1 Masa Neta, g	Prueba Nº 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa Nº 8		Reten Nº 16	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 16		Reten Nº 30	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 30		Reten Nº 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1	Prueba Nº 2	Promedio	% Vacíos
Pasa Nº 4			190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21446	Fecha:	5/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

MÉTODO DE CALCULO					
		CONTEO	MASA		
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No
Pasa	Retiene		F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1698,9	1632,3	0,0	66,6
1/2"	3/8"	1101,2	998,5	0,0	102,7
3/8"	4	200,1	196,3	0,0	3,8
MASA TOTAL USADA (g):		3000	PROMEDIO =		95

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

MÉTODO DE CALCULO					
		CONTEO	MASA		
TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)
Pasa	Retiene		F	Q	N
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1698,9	1698,6	0,0	0
1/2"	3/8"	1101,2	1099,3	0,0	1,9
3/8"	4	200,1	197,1	0,0	3,0
MASA TOTAL USADA (g):		3000	PROMEDIO =		100

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código:	PMA-INF-002
	FORMATO				Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIAS INV E 240-13				FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1					

N° Muestra: 21446 0

Fecha de toma: 5/05/2026 0

Fecha de ensayo: 5/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado



TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	4.372,2	54,2	45,8
3/8"	2.806,2	34,8	65,2
#4	639,4	7,9	92,1
Pasa 1/4"	241,6	3,0	97,0
Peso Seco	8059,4	100,0	

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	54,2	55,9	100	1698,9	20,0	1678,9	1,2	0,66
1/2"	3/8"	34,8	35,9	100	1101,2	17,2	1084,0	1,6	0,56
3/8"	N° 4	7,9	8,2	100	200,1	13,7	186,4	6,8	0,56
TOTALES		97,0	100,0	400,0	3000,2		2949,3	9,6	1,8

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:	
Firma 	Firma 	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:	PMA-FOR-010
	FORMATO	Versión:	1
	IMPUREZAS EN AGREGADOS GRUESOS -NORMA INVIAS 237- 2013	FECHA	15/02/2019
Página 1 de 1			

N. de Muestra: 21446

Fecha: 5/05/2026

Fecha: 5/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

Descripción :

Agregado Triturado TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZACION PLANTA

K 15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producción

ENSAYO HUMEDAD		
Masa muestra húmeda (Mh) (g)		3000,0
Masa muestra seca (Ms) (g)		2993,3
Humedad (w)		0,224
ENSAYO LIMPIEZA SUPERFICIAL		
Masa húmeda muestra (Mhe) (g)		3000,0
Masa muestra seca después de lavado sobre tamiz No. 35 (m) (g)		2980,3
Masa seca muestra (Mse) (g)		2993,3
Impurezas (g)		13
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL		0,4
COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL PROMEDIO		0,4
ESPECIFICACION MÁXIMO (%)		0,5
CUMPLE		SI

OBSERVACION:

MUESTRA TOMADA EN ACOPIO PLANTA

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

CODIGO

PMA-FOR-018

VERSION

0

FECHA

3/09/2019

PÁGINA

1

N° Muestra 21451
Fecha de Toma: 6/05/2026

Fecha de Ensayo: 6/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICA BT-11

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

☐

Procedencia


Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.			
Lectura de Arena (A)	2,4	2,5	2,4
Lectura de arcilla (B)	3,4	3,5	3,4
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	71	71	71
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			71

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	8

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:

21445

Fecha:

5/05/2026

Fecha:

5/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

PLANTA DE PRODUCCION

ARENON TODO UNO PARA MEZCLA ASFALTICAL LT-2

RIO MAPA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA tomada en vehiculo sxe-949

Tipo de control

☐ Procedencia

☐ Producción

☐ Producto terminado

Peso del Cilindro (g):	268	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos V: Volumen del Cilindro F: Masa Neta G: Gravedad Específica
Volumen del Cilindro (cm³):	100,3		
Gravedad Específica Bulk:	2,623		

METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba Nº	Masa Neta, g
Pasa Nº 8	Reten Nº 16	44 ± 0,2 g	44,0	404,7	136,7
Pasa Nº 16	Reten Nº 30	57 ± 0,2 g	57,0	404,8	136,8
Pasa Nº 30	Reten Nº 50	72 ± 0,2 g	72,0	404,7	136,7
Pasa Nº 50	Reten Nº 100	17 ± 0,2 g	17,0	PROMEDIO	136,733333
Total			190,0	Us	48,0

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1 Masa Neta, g	Prueba Nº 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa Nº 8		Reten Nº 16	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 16		Reten Nº 30	190 ± 1,0 g				
Pasa Nº 30		Reten Nº 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C							
Fraccion Tamaño Individual			Masa, g	Prueba Nº 1	Prueba Nº 2	Promedio	% Vacíos
Pasa Nº 4			190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1			

N. de Muestra:	21454	Fecha:	7/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" BT-12		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO			Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No	
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1453,0	14818,6	0,0	-13365,6	1020
1/2"	3/8"	1101,1	1062,8	0,0	38,3	97
3/8"	4	200,2	194,3	0,0	5,9	97
MASA TOTAL USADA (g):		2754	PROMEDIO =			97

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO			Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1453,0	1356,0	0,0	97	93
1/2"	3/8"	1101,1	996,8	0,0	104,3	91
3/8"	4	200,2	195,6	0,0	4,6	98
MASA TOTAL USADA (g):		2754	PROMEDIO =			94

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código:	PMA-INF-002
	FORMATO				Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIA INV E 240-13				FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1					

N° Muestra: 21454 0

Fecha de toma: 7/05/2026 0

Fecha de ensayo: 7/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado



TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	1.347,4	17,4	82,6
3/8"	2.769,3	35,9	64,1
#4	3.574,6	46,3	53,7
Pasa 1/4"	30,7	0,4	99,6
Peso Seco	7722,0	100,0	

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	17,4	17,5	100	1453,0	15,0	1438,0	1,0	0,18
1/2"	3/8"	35,9	36,0	100	1101,1	20	1081,1	1,8	0,65
3/8"	N° 4	46,3	46,5	100	200,2	16,0	184,2	8,0	3,71
TOTALES		99,6	100,0	400,0	2754,3		2703,3	10,8	4,5

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:	
Firma 	Firma 	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21458		
Obra:	GIRASOLES								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	WEB-	SXE-233	Fecha de Ensayo:	7-may-26	Fecha de Toma Muestra:	7-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1																			
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g)				3225,2								
		PESO FINAL:(g)				3031,8								
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra	P ₁	3409,8	gr	
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					P ₂
12,7	1/2"	321,9	10,0	10,0	90,0	95	80	94	86		Filtro	P ₁	25,1	
9,50	3/8"	341,9	10,6	20,6	79,4	88	70	85	77	P ₂				25,9
4,75	No 4	702,7	21,8	42,4	57,6	65	49	62	54			5,41		
2,00	10	777,6	24,1	66,5	33,5	45	29	38	32	Estabilidad min	100		918	
0,43	40	565,9	17,5	84,0	16,0	25	14	22	16					Flujo mm
0,18	80	190,2	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10			Vacios con aire %		
0,08	200	131,6	4,1	94,0	6,0	8	4	8	4	Vacios en agreg %	15			
	P200		0,0										ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO	7,5
Relacion Llenante - ligante				1,15										
Relacion Estabilidad -Flujo				#N/D										
ESPAESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO						9,78								

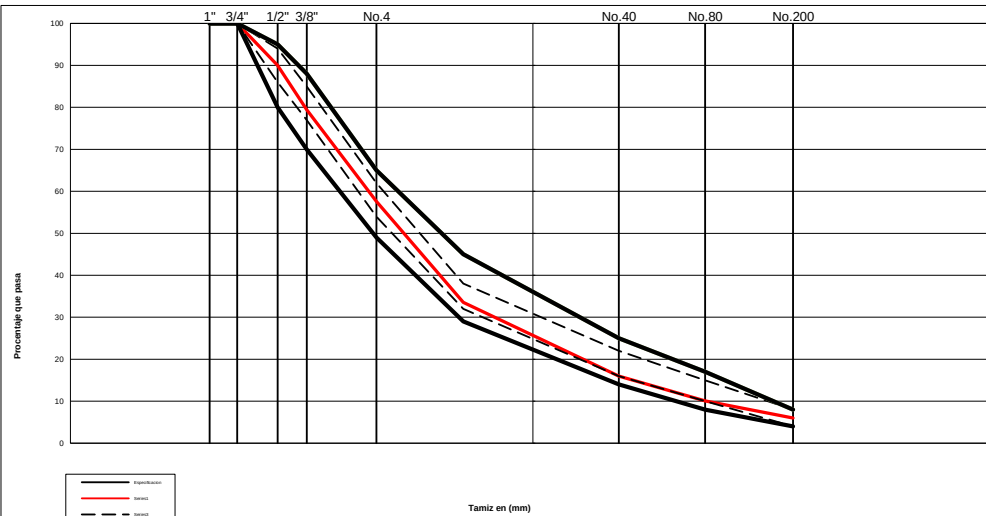

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE						MUESTRA No.	21459	
Obra:	GIRASOLES								
Material:	MDC-19	Viaje No	11	WEB-	SXF-624	Fecha de Ensayo:	7-may-26	Fecha de Toma Muestra:	7-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,38	0,89	549,0	1278,0	732,0	1281,0	2,328				83,3	4,7	12,0	16,7	71,9		1629	1450	3,25
2		0,96	532,0	1244,0	714,0	1246,0	2,338		2000		83,7	4,2	12,0	16,3	73,9		1504	1444	3,20
3		0,93	544,0	1266,0	724,0	1268,0	2,327		7416		83,3	4,7	12,0	16,7	71,8		1605	1493	3,21
4		1,00	516,0	1209,0	695,0	1211,0	2,343		8597		83,9	4,1	12,1	16,1	74,8		1408	1408	3,22
PROMEDIO							2,334	2,433	2,442	0,17	83,6	4,4	12,0	16,4	73,1	5,22		1448,7	3,2

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3240,5							
		PESO FINAL:(g)				3031,0							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3424,6
12,7	1/2"	291,8	9,0	9,0	91,0	95	80	94	86	P ₂	3240,0	gr	
9,50	3/8"	295,8	9,1	18,1	81,9	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	847,6	26,2	44,3	55,7	65	49	62	54			P ₁	23,9
2,00	10	756,3	23,3	67,6	32,4	45	29	38	32	P ₂	24,4	gr	
0,43	40	530,6	16,4	84,0	16,0	25	14	22	16			5,38	
0,18	80	195,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	113,6	3,5	93,5	6,5	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,24					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					449,9					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,74								

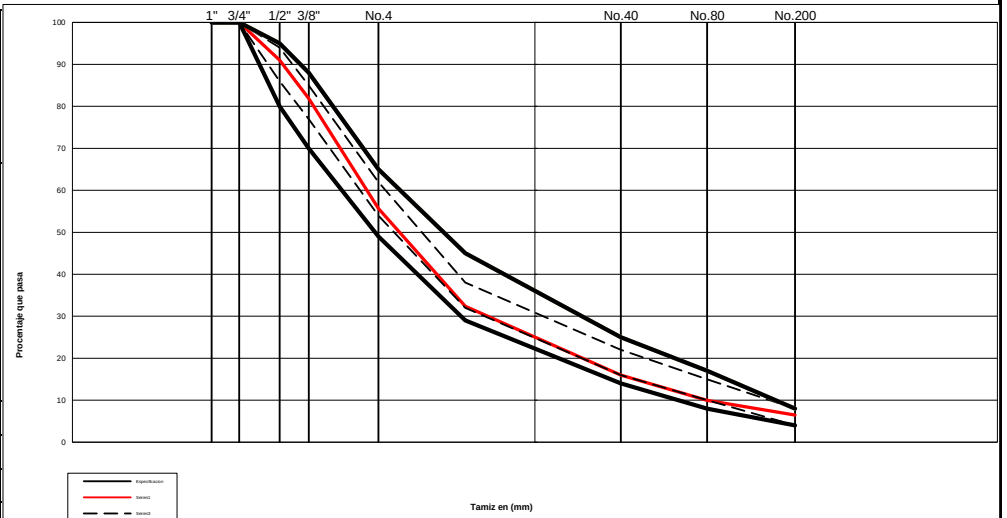

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21428		
Obra:	DEOGRACIAS CARDONA								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	WEB-	ESU-846	Fecha de Ensayo:	7-may-26	Fecha de Toma Muestra:	7-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,014 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,36	0,96	535,0	1244,0	711,0	1246,0	2,325				83,3	4,8	12,0	16,7	71,4		1495	1435	3,30
2		0,93	539,0	1258,0	722,0	1261,0	2,334		2000		83,6	4,4	12,0	16,4	73,1		1520	1414	3,31
3		0,93	536,0	1249,0	717,0	1253,0	2,330		7416		83,4	4,6	12,0	16,6	72,4		1523	1417	3,30
4		0,93	539,0	1256,0	720,0	1259,0	2,330		8597		83,4	4,6	12,0	16,6	72,4		1526	1420	3,29
PROMEDIO							2,330	2,433	2,442	0,15	83,4	4,6	12,0	16,6	72,3	5,22		1421,4	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g)				3358,6									
		PESO FINAL:(g)				3150,0									
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra	gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂			3548,9	gr
12,7	1/2"	376,2	11,2	11,2	88,8	95	80	94	86					3354,1	gr
9,50	3/8"	337,0	10,0	21,2	78,8	88	70	85	77	P ₁	Filtro	gr			
4,75	No 4	765,3	22,8	44,0	56,0	65	49	62	54		P ₂			21,2	gr
2,00	10	728,3	21,7	65,7	34,3	45	29	38	32					25,7	gr
0,43	40	615,3	18,3	84,0	16,0	25	14	22	16	5,36					
0,18	80	202,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918			
0,08	200	125,6	3,7	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5			
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg %		15			
Relacion Estabilidad -Flujo					430,7					ESPOSOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5			
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,74										

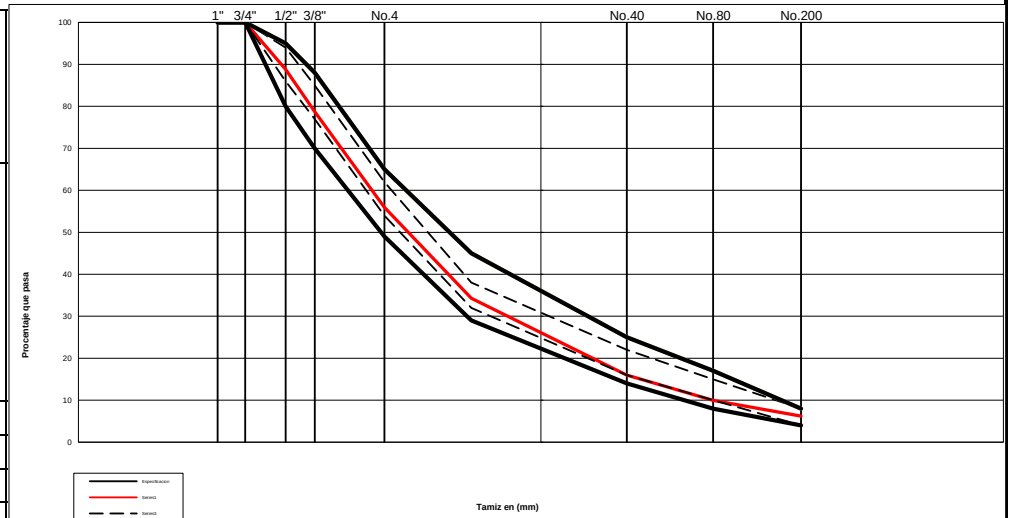

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21464		
Obra:	GIRASOLES								
Material:	MDC-19	Viaje No	6	WEB-	ESV-846	Fecha de Ensayo:	7-may-26	Fecha de Toma Muestra:	7-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,013 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,41	0,96	525,0	1221,0	699,0	1224,0	2,326				83,2	4,8	12,0	16,8	71,6		1503	1443	3,38
2		0,93	536,0	1247,0	714,0	1250,0	2,326		2000		83,3	4,7	12,0	16,7	71,7		1518	1412	3,34
3		0,96	527,0	1225,0	700,0	1227,0	2,324		7416		83,2	4,8	12,0	16,8	71,4		1470	1412	3,29
4		0,96	528,0	1227,0	703,0	1231,0	2,324		8597		83,2	4,8	12,0	16,8	71,3		1526	1465	3,25
PROMEDIO							2,325	2,431	2,442	0,19	83,2	4,8	12,0	16,8	71,5	5,23		1433,0	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3259,9							
		PESO FINAL:(g)				3056,0							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3446,2 gr P ₂ 3258,0 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	340,3	10,4	10,4	89,6	95	80	94	86	Filtro P ₁ 23,2 gr P ₂ 25,1 gr			
9,50	3/8"	250,4	7,7	18,1	81,9	88	70	85	77				
4,75	No 4	825,7	25,3	43,4	56,6	65	49	62	54	5,41			
2,00	10	765,3	23,5	66,9	33,1	45	29	38	32				
0,43	40	554,3	17,0	83,9	16,1	25	14	22	16				
0,18	80	198,6	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	121,4	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,20					Vacios en agreg %			15
Relacion Estabilidad -Flujo					432,3					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO			7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,77								

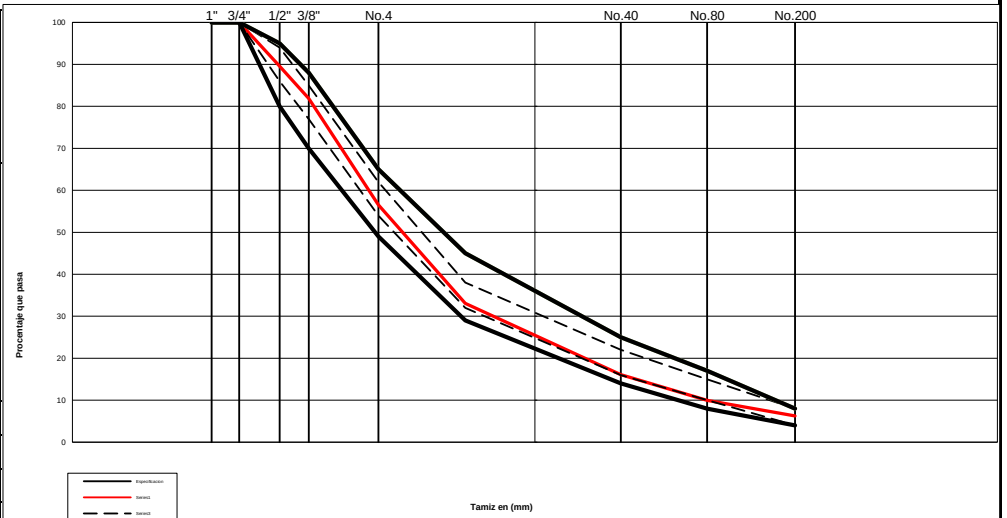

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21468		
Obra:	GIRASOLES								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESV-846	Fecha de Ensayo:	9-may-26	Fecha de Toma Muestra:	9-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,50	0,96	535,0	1244,0	711,0	1246,0	2,325				83,1	4,7	12,2	16,9	72,3		1553	1491	3,22
2		0,93	536,0	1243,0	707,0	1243,0	2,319		2000		82,9	4,9	12,2	17,1	71,2		1540	1432	3,34
3		0,93	542,0	1259,0	720,0	1262,0	2,323		7416		83,1	4,8	12,2	16,9	71,9		1528	1421	3,29
4		0,93	543,0	1263,0	722,0	1265,0	2,326		8596		83,2	4,6	12,2	16,8	72,5		1590	1478	3,25
PROMEDIO							2,323	2,431	2,439	0,15	83,1	4,7	12,2	16,9	72,0	5,36	1455,5	3,3	

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3305,2							
		PESO FINAL:(g)				3100,1							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100			P ₁	3497,4
12,7	1/2"	343,1	10,4	10,4	89,6	95	80	94	86	P ₂	3302,9	gr	
9,50	3/8"	305,6	9,2	19,6	80,4	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	770,6	23,3	42,9	57,1	65	49	62	54			P ₁	20,7
2,00	10	760,1	23,0	65,9	34,1	45	29	38	32	P ₂	23,0	gr	
0,43	40	598,6	18,1	84,0	16,0	25	14	22	16			5,50	
0,18	80	195,6	5,9	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	126,5	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,16					Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo					444,4					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					10,02								

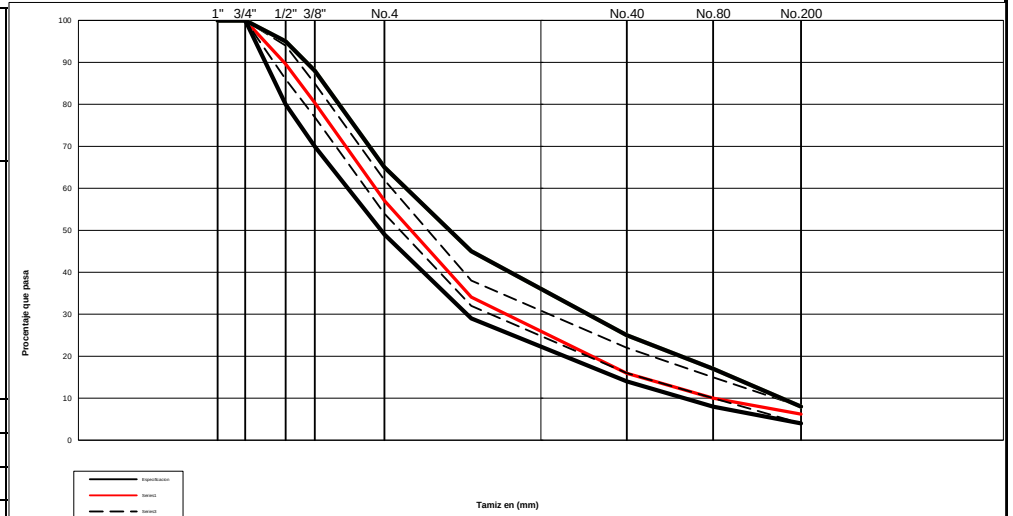

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO

PMA-FOR-018

FORMATO

VERSION

0

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS; VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FECHA

3/09/2019

NORMAS INVIAS 133 ; 235 - 2013

PÁGINA

1

N° Muestra 21475
Fecha de Toma: 11/05/2026

Fecha de Ensayo: 11/05/2026

LOCALIZACION MUESTREO

PLANTA DE PRODUCCION

DESCRIPCION

ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA - BT-9

FUENTE DE MATERIALES

RIO MAPA

LOCALIZCION PLANTA

K15 VIA LA VIRGINIA APIA

☐

Procedencia

Producción

☐☐

Producto terminado

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.	1	2	3
Lectura de Arena (A)	2,6	2,5	2,5
Lectura de Arcilla (B)	3,3	3,3	3,2
E. A. = $100 \times (A) / (B)$	78,8	75,8	78,1
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =		78	

VALOR DEL AZUL DE METILENO INV E- 235	
RESULTADO VALOR AZUL DE METILENO	0,4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO EN g (M1)	200
VOLUMEN TOTAL AÑADIDO DE LA SOLUCIÓN COLORANTE EN ml (V1)	8

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO	PMA-FOR-021
	FORMATO		VERSION	1
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA)		FECHA	3/09/2019
	NORMA INVIAS 239 - 2013		PÁGINA	1 de 1

N. de Recibo:	<u>21475</u>			
Fecha:	<u>11/05/2026</u>	Fecha:	<u>11/05/2026</u>	

LOCALIZACION MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION
DESCRIPCION	ARENA TRITURADA PARA MEZCLA ASFALTICA COLOR AMAILLO BT-9
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA

Tipo de control	☐	Procedencia	☐	Producción	☐	Producto terminado
-----------------	--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------------

Peso del Cilindro (g):	268		
Volumen del Cilindro (cm ³):	100,3	$%U = V - (F/G) / V * 100$	%U: Porcentaje de Vacíos
Gravedad Especifica Bulk:	2,55		V: Volumen del Cilindro
			F: Masa Neta
			G: Gravedad Especifica



METODO A					
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g		Prueba N°	Masa Neta, g
Pasa N° 8	Reten N° 16	44 ± 0,2 g	44,0	400,0	132
Pasa N° 16	Reten N° 30	57 ± 0,2 g	57,0	400,2	132,2
Pasa N° 30	Reten N° 50	72 ± 0,2 g	72,0	400,0	132
Pasa N° 50	Reten N° 100	17 ± 0,2 g	17,0	Promedio	132
Total			190,0	Us	48,4

METODO B							
Fracción Tamaño Individual			Masa, g	Prueba N° 1 Masa Neta, g	Prueba N° 2 Masa Neta, g	Promedio Masa Neta, g	% Vacíos
Pasa N° 8		Reten N° 16	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 16		Reten N° 30	190 ± 1,0 g				
Pasa N° 30		Reten N° 50	190 ± 1,0 g				
						Promedio	Um

METODO C						
Fraccion Tamaño Individual		Masa, g	Prueba N° 1	Prueba N° 2	Promedio	% Vacíos
Pasa N° 4		190 ± 1,0 g	190,0			U _R

CRITERIO DE ACEPTACIÓN INV13	
Método A Mezcla Asfáltica	45% min (Rodadura)
	40% min (Intermedia)
	35% min (Base)
Bases Granulares	35 min

OBSERVACIONES	

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21479		
Obra:	VILLA DEL PRADO 2								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	ESU-846	Fecha de Ensayo:	11-may-26	Fecha de Toma Muestra:	11-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
			Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		gr	grs.	grs.	grs./cm ³	grs./cm ³	grs./cm ³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,31																	
2																		
3																		
4																		
PROMEDIO																		

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO				
		PESO INICIAL:(g) 3375,6												
		PESO FINAL:(g) 3164,1												
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO						
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra		P ₁	3565,0	gr
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100					
12,7	1/2"	425,0	12,6	12,6	87,4	95	80	94	86	Filtro		P ₁	20,7	gr
9,50	3/8"	277,7	8,2	20,8	79,2	88	70	85	77					
4,75	No 4	691,7	20,5	41,3	58,7	65	49	62	54	5,31				
2,00	10	728,6	21,6	62,9	37,1	45	29	38	32					Estabilidad min
0,43	40	710,3	21,0	83,9	16,1	25	14	22	16	Flujo mm	2-3,5			
0,18	80	200,6	5,9	89,9	10,1	17	8	15	10			Vacios con aire %	4-6	
0,08	200	130,2	3,9	93,7	6,3	8	4	8	4	Vacios en agreg %	15			
	P200		0,0									ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		
Relacion Llenante - ligante					1,19					7,5				
Relacion Estabilidad -Flujo					#N/D									
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,86									

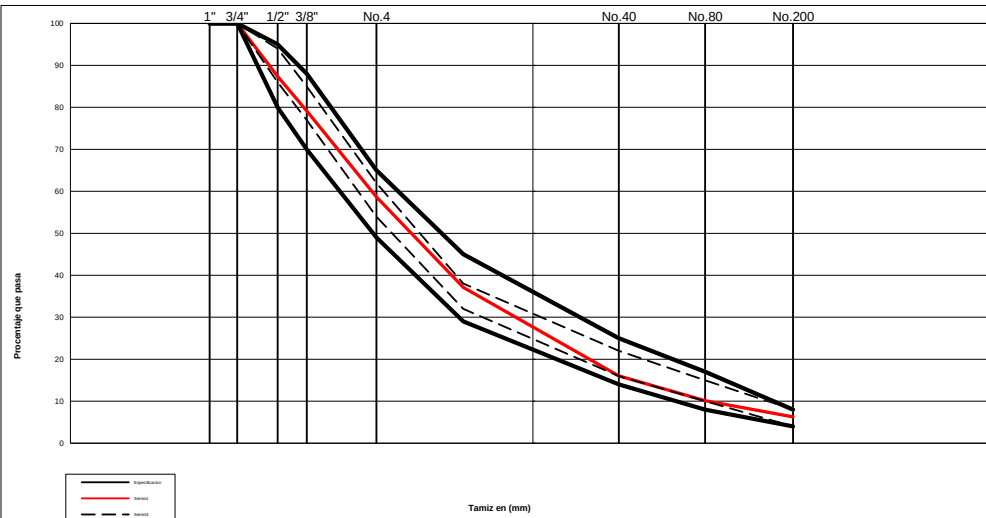

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21480		
Obra:	VILLA DEL PRADO 2								
Material:	MDC-19	Viaje No	6	WEB-	ESU-970	Fecha de Ensayo:	11-may-26	Fecha de Toma Muestra:	11-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,42	0,93	536,0	1245,0	712,0	1248,0	2,323				83,1	4,8	12,1	16,9	71,8		1576	1466	3,30
2		0,93	543,0	1263,0	722,0	1265,0	2,326		2000		83,2	4,6	12,1	16,8	72,4		1526	1420	3,34
3		0,96	525,0	1220,0	698,0	1223,0	2,324		7416		83,2	4,7	12,1	16,8	72,0		1540	1478	3,35
4		0,93	545,0	1267,0	725,0	1270,0	2,325		8596		83,2	4,7	12,1	16,8	72,1		1562	1453	3,32
PROMEDIO							2,324	2,433	2,439	0,10	83,2	4,7	12,1	16,8	72,0	5,33		1454,2	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3312,3							
		PESO FINAL:(g)				3101,2							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	3502,1	gr	
12,7	1/2"	402,5	12,2	12,2	87,8	95	80	94	86	P ₂	3309,9	gr	
9,50	3/8"	328,6	9,9	22,1	77,9	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	718,1	21,7	43,8	56,2	65	49	62	54	P ₁	23,5	gr	
2,00	10	673,3	20,3	64,1	35,9	45	29	38	32	P ₂	25,9	gr	
0,43	40	655,9	19,8	83,9	16,1	25	14	22	16	5,42			
0,18	80	202,3	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	120,5	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante				1,20				Vacios en agreg %				15	
Relacion Estabilidad -Flujo				437,0				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				9,95									

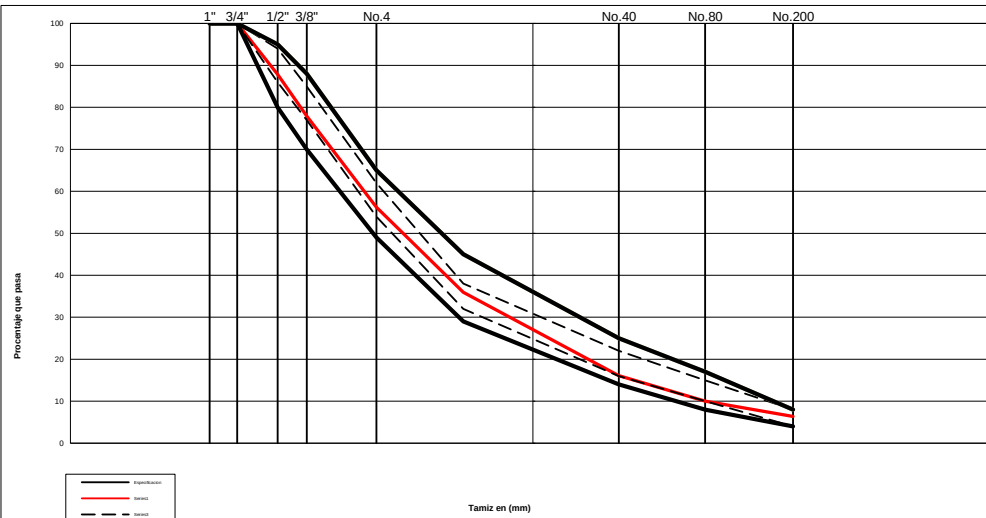

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21481		
Obra:	DEOGRACIAS CARDONA								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	SXF-624	Fecha de Ensayo:	11-may-26	Fecha de Toma Muestra:	11-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,36	0,93	536,0	1246,0	713,0	1249,0	2,325				83,2	4,8	12,0	16,8	71,3		1526	1420	3,30
2		0,93	537,0	1248,0	714,0	1251,0	2,324		2000		83,2	4,8	12,0	16,8	71,2		1528	1421	3,30
3		0,93	541,0	1257,0	719,0	1260,0	2,323		7416		83,2	4,9	11,9	16,8	71,1		1550	1441	3,32
4		0,93	541,0	1256,0	716,0	1257,0	2,322		8597		83,1	4,9	11,9	16,9	70,8		1556	1447	3,29
PROMEDIO							2,323	2,436	2,442	0,11	83,2	4,9	11,9	16,8	71,1	5,25	1432,4		3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3397,0							
		PESO FINAL:(g)				3182,6							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	3589,4	gr	
12,7	1/2"	408,7	12,0	12,0	88,0	95	80	94	86	P ₂	3393,6	gr	
9,50	3/8"	307,4	9,0	21,1	78,9	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	762,2	22,4	43,5	56,5	65	49	62	54	P ₁	21,2	gr	
2,00	10	722,8	21,3	64,8	35,2	45	29	38	32	P ₂	24,6	gr	
0,43	40	652,3	19,2	84,0	16,0	25	14	22	16	5,36			
0,18	80	202,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	126,9	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire %	4-6		
Relacion Llenante - ligante					1,20				Vacios en agreg %				15
Relacion Estabilidad -Flujo					433,7				ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,81								

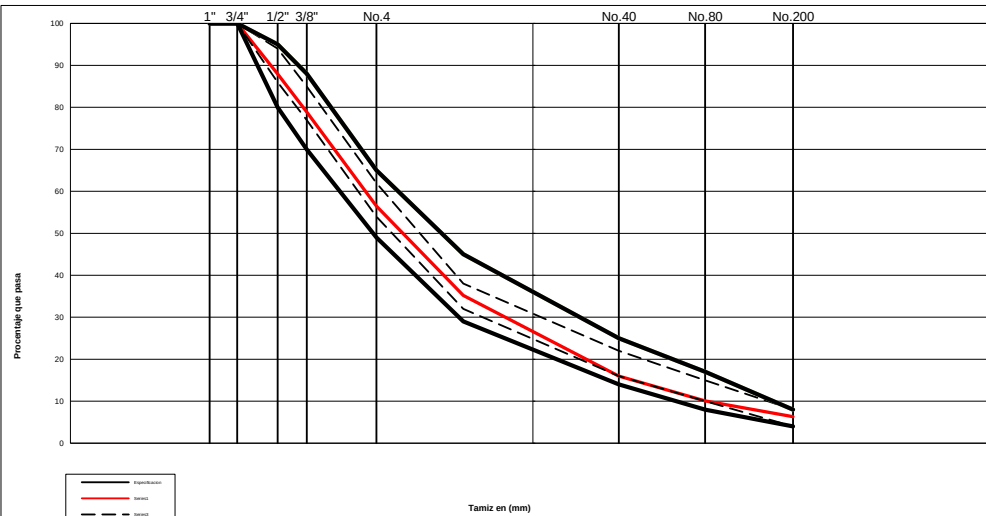

PREPARADO POR:

REVISADO Y APROBO:

Firma

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21484	Fecha:	12/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" BT-12		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
		Peso Partículas con 2 o más Caras	Peso Partículas con Caras	Peso Partículas No	
		F	Q	N	
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1600,6	1456,3	0,0	144,3
1/2"	3/8"	1200,3	1023,0	0,0	177,3
3/8"	4	200,8	194,6	0,0	6,2
MASA TOTAL USADA (g):		3002	PROMEDIO =		91

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA	
		Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	
		F	Q	N	
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"				
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	1600,6	1466,7	0,0	134
1/2"	3/8"	1200,3	1161,1	0,0	39,2
3/8"	4	200,8	198,8	0,0	2,0
MASA TOTAL USADA (g):		3002	PROMEDIO =		96

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-002
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS - NORMA INVIA INV E 240-13		FECHA	15/02/2019
	Página 1 de 1			

N° Muestra: 21484 0

Fecha de toma: 12/05/2026 0

Fecha de ensayo: 12/05/2026

LOCALIZACION DE MUESTREO

DESCRIPCION

FUENTE DE MATERIALES

LOCALIZACION PLANTA

Tipo de control

PLANTA DE PRODUCCION

TRITURADO DE 1/2 BT 12 MESCLA ASFALTICA

RIO MAPA

K 15 VIA LA VIRGINIA PIA

☐ Procedencia
☐ Producción
☐ Producto terminado



TAMIZ	RESULTADO OBTENIDO		
	Peso Retenido g	% Retenido	% Pasa
1"	0,0		
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	3.264,1	41,1	58,9
3/8"	1.926,5	24,3	75,7
#4	2.266,3	28,5	71,5
Pasa 1/4"	481,9	6,1	93,9
Peso Seco	7938,8	100,0	

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

RELACIÓN DE DIMENSIÓN UTILIZADA:				5:1					
TAMICES		% Retenido gradación muestra original	% Retenido gradación corregida	Número de partículas	Peso total (g)	Partículas planas y alargadas (g)	Partículas no planas ni alargadas (g)	% Partículas planas y alargadas	% Partículas planas y alargadas ponderado
Pasa	Retiene								
1 1/2"	1"								
1"	3/4"	0,0	0,0	100	0,0		0,0	0,0	0,00
3/4"	1/2"	41,1	43,8	100	1600,6	4,6	1596,0	0,3	0,13
1/2"	3/8"	24,3	25,8	100	1200,3	3,9	1196,4	0,3	0,08
3/8"	N° 4	28,5	30,4	100	200,8	8,0	192,8	4,0	1,21
TOTALES		93,9	100,0	400,0	3001,7		2985,2	4,6	1,4

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
INV13	≤ 10

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:	
Firma 	Firma 	
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.	
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21488		
Obra:	VILLA DEL PRADO 2								
Material:	MDC-19	Viaje No	4	WEB-	SXE-232	Fecha de Ensayo:	12-may-26	Fecha de Toma Muestra:	12-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%			gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,34	0,96	535,0	1244,0	712,0	1247,0	2,325				83,3	4,7	12,1	16,7	72,1		1496	1436	3,20
2		0,93	536,0	1247,0	714,0	1250,0	2,326		2000		83,3	4,6	12,1	16,7	72,3		1566	1457	3,35
3		0,93	537,0	1250,0	716,0	1253,0	2,328		7416		83,4	4,6	12,1	16,6	72,6		1554	1445	3,34
4		0,96	535,0	1247,0	714,0	1249,0	2,331		8596		83,5	4,4	12,1	16,5	73,2		1543	1481	3,29
PROMEDIO							2,328	2,436	2,439	0,05	83,4	4,6	12,1	16,6	72,5	5,30		1454,8	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g) 3329,6													
		PESO FINAL:(g) 3120,6													
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra				
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		3517,5	gr			
12,7	1/2"	394,4	11,8	11,8	88,2	95	80	94	86		P ₂	3327,4	gr		
9,50	3/8"	296,3	8,9	20,7	79,3	88	70	85	77	P ₁	Filtro				
4,75	No 4	759,6	22,8	43,6	56,4	65	49	62	54		21,1	gr			
2,00	10	744,6	22,4	65,9	34,1	45	29	38	32		P ₂	23,3	gr		
0,43	40	602,3	18,1	84,0	16,0	25	14	22	16				5,34		
0,18	80	200,3	6,0	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918			
0,08	200	123,1	3,7	93,7	6,3	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5				
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6			
Relacion Llenante - ligante												Vacios en agreg %		15	
Relacion Estabilidad -Flujo				441,5								ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO		7,5	
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO				9,89											

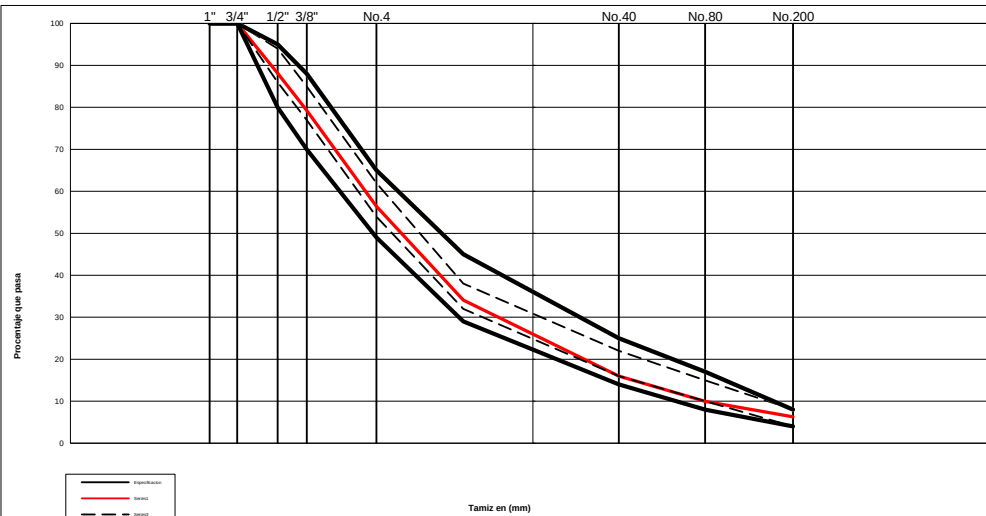

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019


PAGINA 1 DE 1

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21491		
Obra:	VILLA DEL PRADO 2								
Material:	MDC-19	Viaje No	7	WEB-	ESV-250	Fecha de Ensayo:	12-may-26	Fecha de Toma Muestra:	12-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECÍFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teórico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacíos con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1																			
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3350,7							
		PESO FINAL:(g)				3141,4							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	P ₁	Muestra		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100		P ₂	3539,6	gr
12,7	1/2"	386,9	11,5	11,5	88,5	95	80	94	86		P ₂	3348,3	gr
9,50	3/8"	323,2	9,6	21,2	78,8	88	70	85	77	Filtro			
4,75	No 4	618,0	18,4	39,6	60,4	65	49	62	54	P ₁	23,5	gr	
2,00	10	825,6	24,6	64,3	35,7	45	29	38	32	P ₂	25,9	gr	
0,43	40	655,9	19,6	83,9	16,1	25	14	22	16	5,34			
0,18	80	205,5	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10	Estabilidad min	100	918	
0,08	200	126,3	3,8	93,8	6,2	8	4	8	4	Flujo mm	2-3,5		
	P200		0,0							Vacios con aire % 4-6			
Relacion Llenante - ligante					1,18		Vacios en agreg % 15						
Relacion Estabilidad -Flujo					#N/D		ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5						
ESPEJOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					9,88								

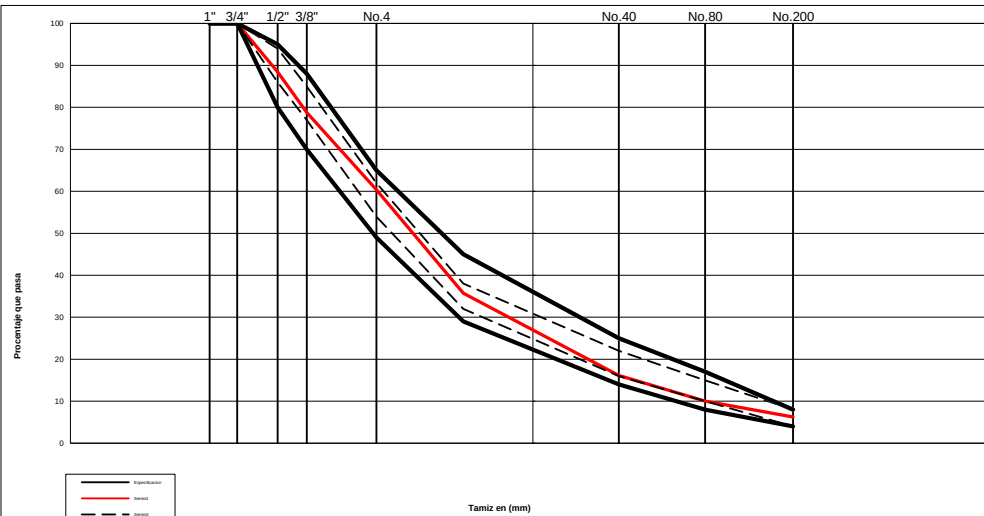

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ


Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

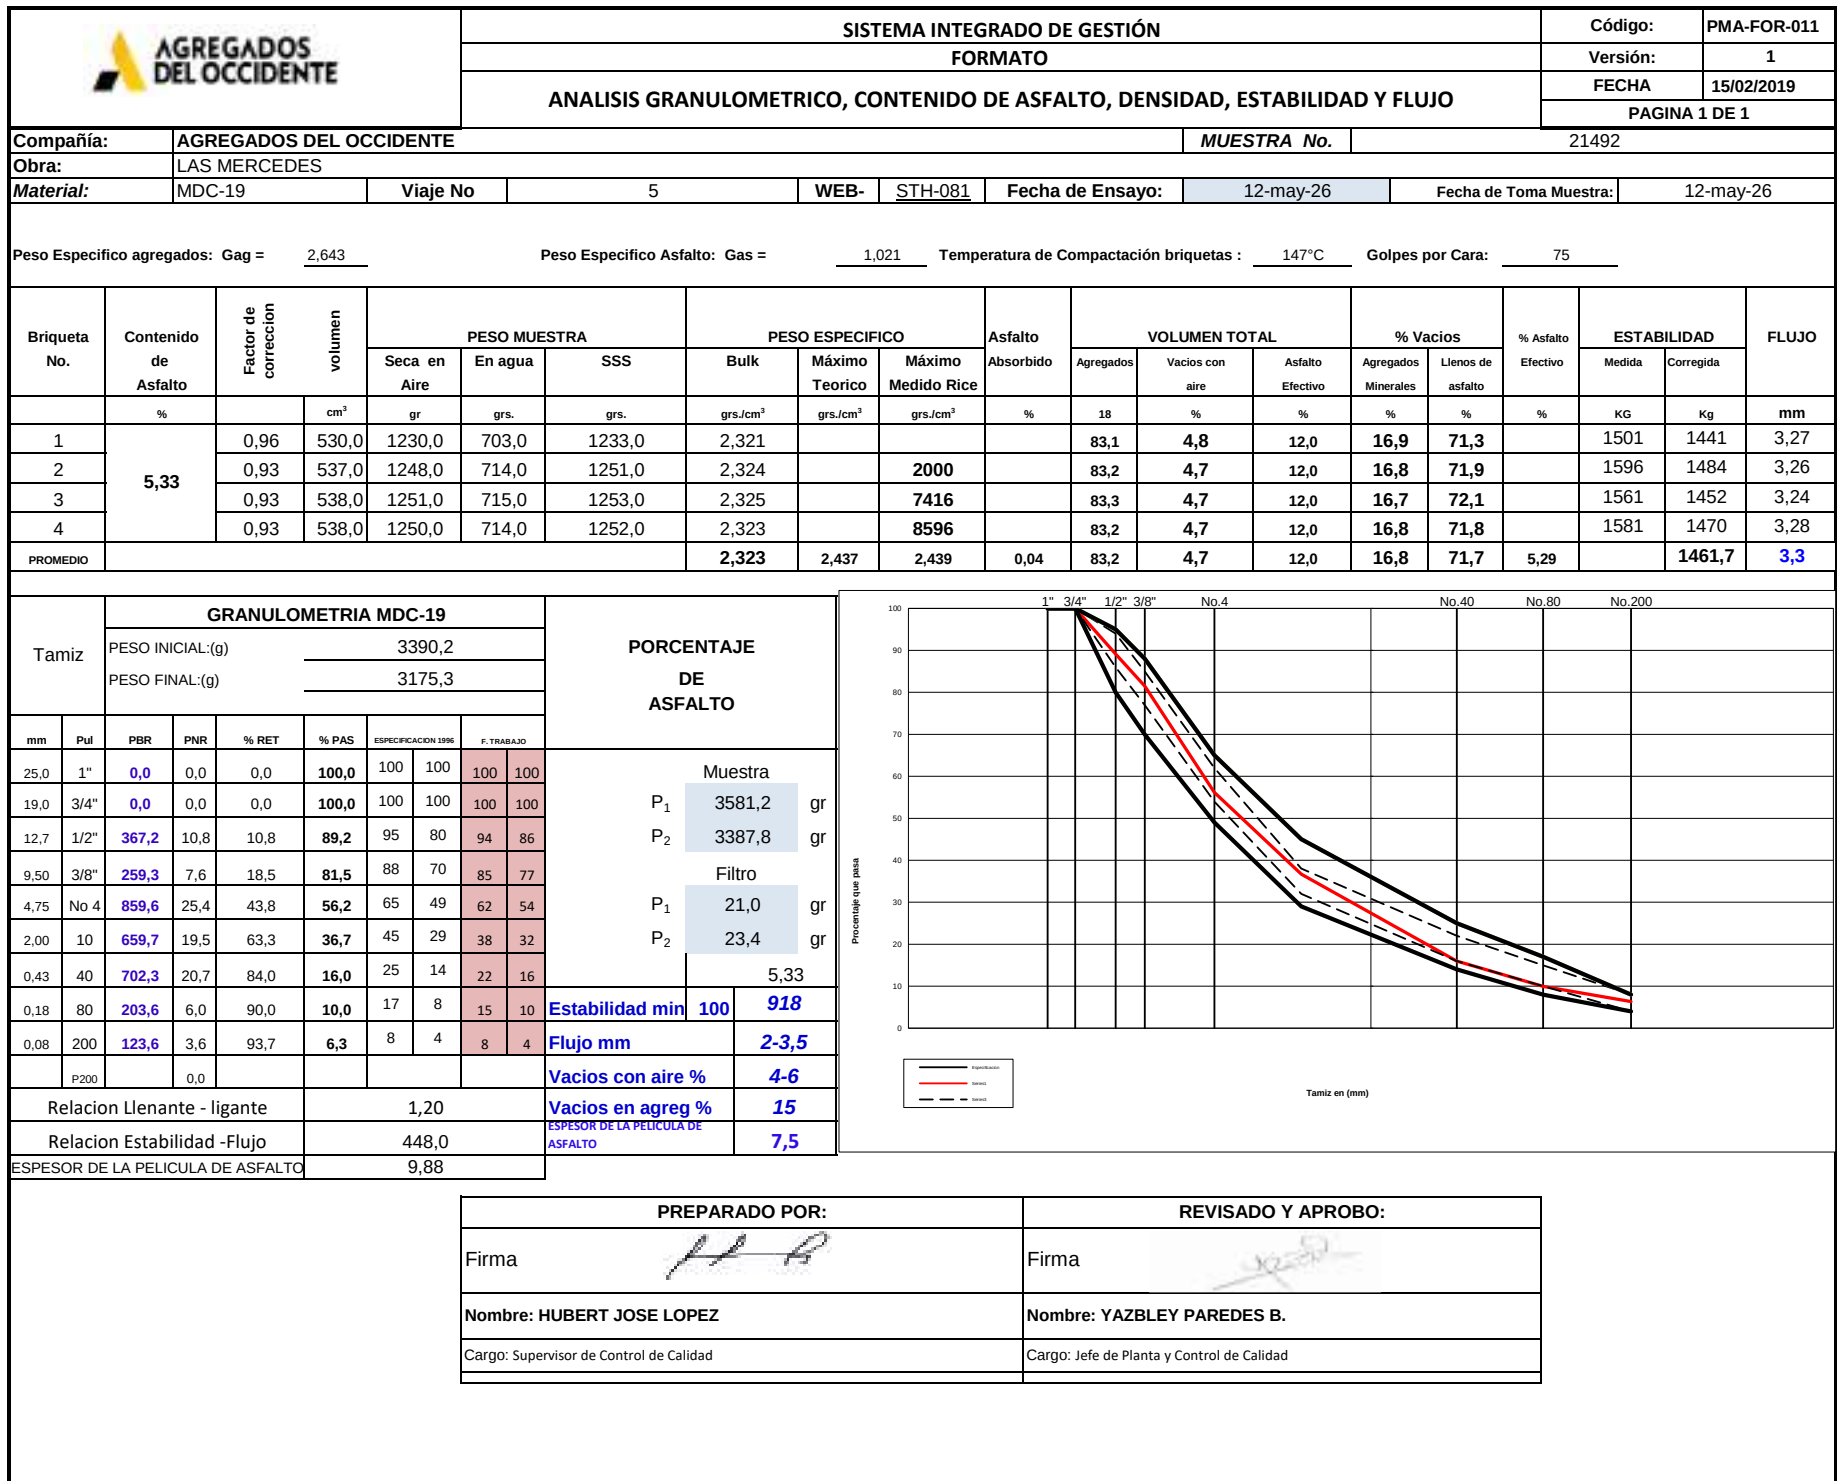



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE					MUESTRA No.	21493		
Obra:	VILLA DEL PRADO -2								
Material:	MDC-19	Viaje No	3	WEB-	ESV-181	Fecha de Ensayo:	13-may-26	Fecha de Toma Muestra:	13-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de correccion	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%		cm³	gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1																			
2																			
3																			
4																			
PROMEDIO																			

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO					
		PESO INICIAL:(g)				3329,7									
		PESO FINAL:(g)				3117,4									
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO							
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3518,6 gr P ₂ 3327,4 gr					
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100						
12,7	1/2"	388,6	11,7	11,7	88,3	95	80	94	86	Filtro P ₁ 23,2 gr P ₂ 25,5 gr					
9,50	3/8"	375,5	11,3	22,9	77,1	88	70	85	77						
4,75	No 4	682,3	20,5	43,4	56,6	65	49	62	54	5,37					
2,00	10	759,4	22,8	66,2	33,8	45	29	38	32						
0,43	40	588,2	17,7	83,9	16,1	25	14	22	16	Estabilidad min 100 918 Flujo mm 2-3,5 Vacios con aire % 4-6 Vacios en agreg % 15 ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO 7,5					
0,18	80	203,7	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10						
0,08	200	119,7	3,6	93,6	6,4	8	4	8	4						
	P200		0,0												
Relacion Llenante - ligante															
Relacion Estabilidad -Flujo															
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO															

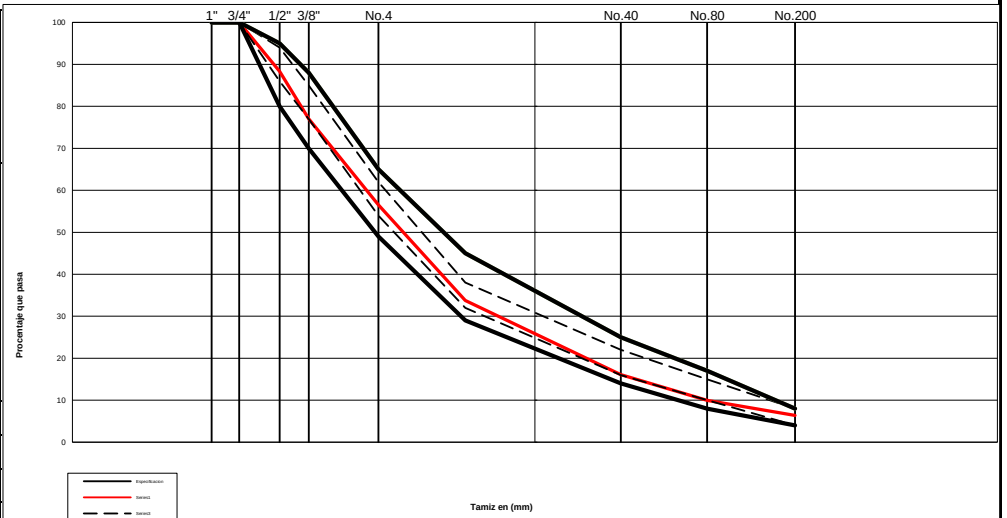

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ

Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: PMA-FOR-011

Versión: 1

FECHA: 15/02/2019

PAGINA 1 DE 1


ANALISIS GRANULOMETRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

Compañía:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE						MUESTRA No.	21494	
Obra:	VILLA DEL PRADO -2								
Material:	MDC-19	Viaje No	5	WEB-	ESU-970	Fecha de Ensayo:	13-may-26	Fecha de Toma Muestra:	13-may-26

Peso Especifico agregados: Gag = 2,643 Peso Especifico Asfalto: Gas = 1,021 Temperatura de Compactación briquetas : 147°C Golpes por Cara: 75

Briqueta No.	Contenido de Asfalto	Factor de corrección	volumen	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asfalto Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		% Asfalto Efectivo	ESTABILIDAD		FLUJO
				Seca en Aire	En agua	SSS	Bulk	Máximo Teorico	Máximo Medido Rice		Agregados	Vacios con aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de asfalto		Medida	Corregida	
	%			gr	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	18	%	%	%	%	%	KG	Kg	mm
1	5,47	0,93	536,0	1246,0	712,0	1248,0	2,325				83,1	4,6	12,3	16,9	72,9		1513	1407	3,30
2		0,93	537,0	1249,0	714,0	1251,0	2,326		2000		83,2	4,5	12,3	16,8	73,1		1525	1419	3,33
3		0,96	531,0	1231,0	702,0	1233,0	2,318		7416		82,9	4,8	12,2	17,1	71,7		1519	1459	3,32
4		0,93	540,0	1251,0	713,0	1253,0	2,317		8595		82,9	4,9	12,2	17,1	71,4		1542	1434	3,29
PROMEDIO							2,321	2,432	2,436	0,07	83,0	4,7	12,3	17,0	72,3	5,39		1429,6	3,3

Tamiz		GRANULOMETRIA MDC-19								PORCENTAJE DE ASFALTO			
		PESO INICIAL:(g)				3324,7							
		PESO FINAL:(g)				3110,7							
mm	Pul	PBR	PNR	% RET	% PAS	ESPECIFICACION 1996		F. TRABAJO					
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100	Muestra P ₁ 3516,9 gr P ₂ 3321,5 gr			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100				
12,7	1/2"	360,6	10,8	10,8	89,2	95	80	94	86	Filtro P ₁ 20,6 gr P ₂ 23,8 gr			
9,50	3/8"	287,9	8,7	19,5	80,5	88	70	85	77				
4,75	No 4	795,3	23,9	43,4	56,6	65	49	62	54	5,47			
2,00	10	746,3	22,4	65,9	34,1	45	29	38	32				
0,43	40	598,4	18,0	83,9	16,1	25	14	22	16	Estabilidad min 100 918			
0,18	80	204,4	6,1	90,0	10,0	17	8	15	10				
0,08	200	117,8	3,5	93,6	6,4	8	4	8	4	Flujo mm		2-3,5	
	P200		0,0							Vacios con aire %		4-6	
Relacion Llenante - ligante					1,19					Vacios en agreg %			15
Relacion Estabilidad -Flujo					431,9					ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO			7,5
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO					10,09								

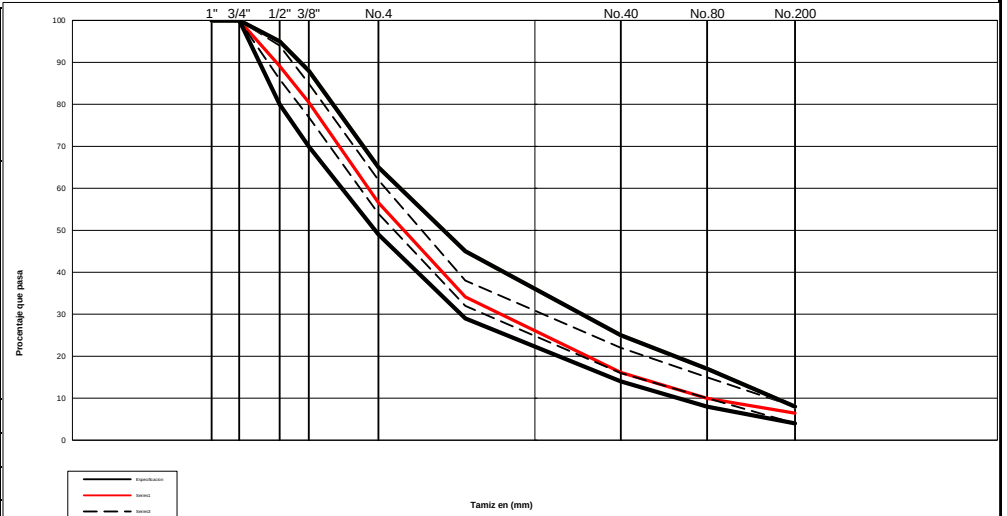

PREPARADO POR:

Firma

Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ


Cargo: Supervisor de Control de Calidad

REVISADO Y APROBO:

Firma

Nombre: YAZBLEY PAREDES B.

Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	PMA-INF-003
	FORMATO		Versión:	1
	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS -NORMA INVIAS 227 - S013		FECHA	15/02/2019
			Página 1 de 1	

N. de Muestra:	21495	Fecha:	13/05/2026
LOCALIZACION DE MUESTREO	PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS		
DESCRIPCION	TRITURADO TM 3/4" PARA MEZCLA ASFALTICA" LT-2		
FUENTE DE MATERIALES	RIO MAPA		
LOCALIZACION PLANTA	K15 VIA LA VIRGINIA APIA		
Tipo de control	☐ Procedencia ☐ Producción ☐ Producto terminado		


PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Peso Partículas con 2 o más Caras	Porcentaje de partículas con 2 o más caras
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1602,2	1594,2	0,0	8,0	100
1/2"	3/8"	1200,4	1176,3	0,0	24,1	98
3/8"	4	200,9	195,3	0,0	5,6	97
MASA TOTAL USADA (g):		3004	PROMEDIO =			98

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

TAMICES		Peso Total (g)	MÉTODO DE CALCULO		Peso Partículas con 1 o más Caras Fracturadas (g)	Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		CONTEO	MASA		
			F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"					
1"	3/4"					
3/4"	1/2"	1602,2	1494,2	0,0	108	93
1/2"	3/8"	1200,4	1145,6	0,0	54,8	95
3/8"	4	200,9	191,7	0,0	9,2	95
MASA TOTAL USADA (g):		3004	PROMEDIO =			94

OBSERVACIONES

PREPARADO POR:	REVISADO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: HUBERT JOSE LOPEZ	Nombre: YAZBLEY PAREDES B.
Cargo: Supervisor de Control de Calidad	Cargo: Jefe de Planta y Control de Calidad



**DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS**

Junio de 2026

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. ALCALDÍA, CERO HUECOS SECTOR TERRANOVA, EL OSO

UBICACIÓN



REGISTRO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

2. ALCALDÍA, CERO HUECOS PÍZAMO A MONSERRATE UBICACIÓN



REGISTRO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ALCALDÍA, CERO HUECOS VÍA A ALTAGRACIA

UBICACIÓN



REGISTRO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ALCALDÍA, RESALTO VILLA VERDE Y CARPETA PUENTE EL DORADO

UBICACIÓN



REGISTRO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

ALCALDÍA, RESALTOS PALO DE AGUA Y CALLE 30 CON 2

UBICACIÓN



REGISTRO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CAFELIA, TRAMO ENTRADA 8, CERRITOS

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CAFELIA, TRAMO ENTRADA 8, CERRITOS

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CANCHA I. E. KENNEDY, ORIENTE

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CAÑARTE, TRAMOS CARRERA 5B Y CALLE 36, CENTRO

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1


Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CARDAL - GIRASOLES, CARRERA 39 ENTRE CALLE 86 Y CALLE 84, SAN

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL

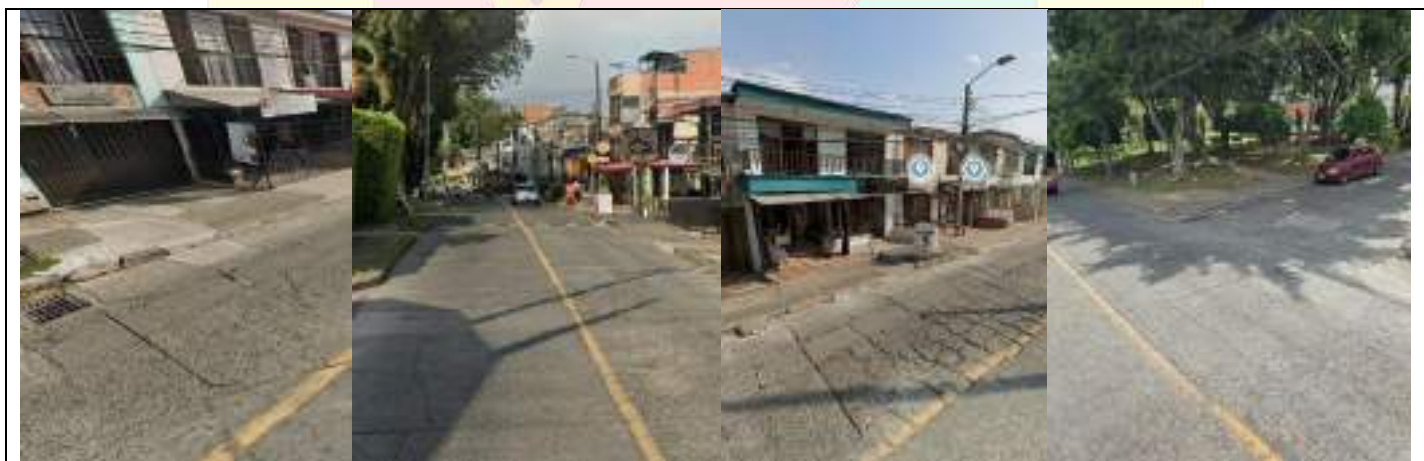

ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

CENTENARIO, CARRERA 14 ENTRE CALLE 23 Y AV. 30 DE AGOSTO

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

DEOGRACIAS CARDONA, CLL HASTA PUENTE SOBRERÍO CONSOTA, BOSTON

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

EL LAGO, CARRERA 10B ENTRE CALLES 22 Y 23, CENTRO

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

LA VILLA, CARRERA 25 ENTRE CALLES 85 Y 86, OLÍMPICA

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

MONSERRATE, CARRERA 16 Y 16BIS CON CALLE 78B ESTE, VILLA SANTANA

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

PARQUE INDUSTRIAL SECTOR A, DEL CAFÉ

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

PRIMERO DE MAYO, CALLE 28 ENTRE CARRERAS 4 Y 5, CENTRO

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO






Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

PORTAL DE LAS MERCEDES, VILLA CECILIA, CALLE 70, CONSOTA

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO




Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

TOKIO MANZANAS 35, 34, 33, 32, VILLA SANTANA

UBICACIÓN

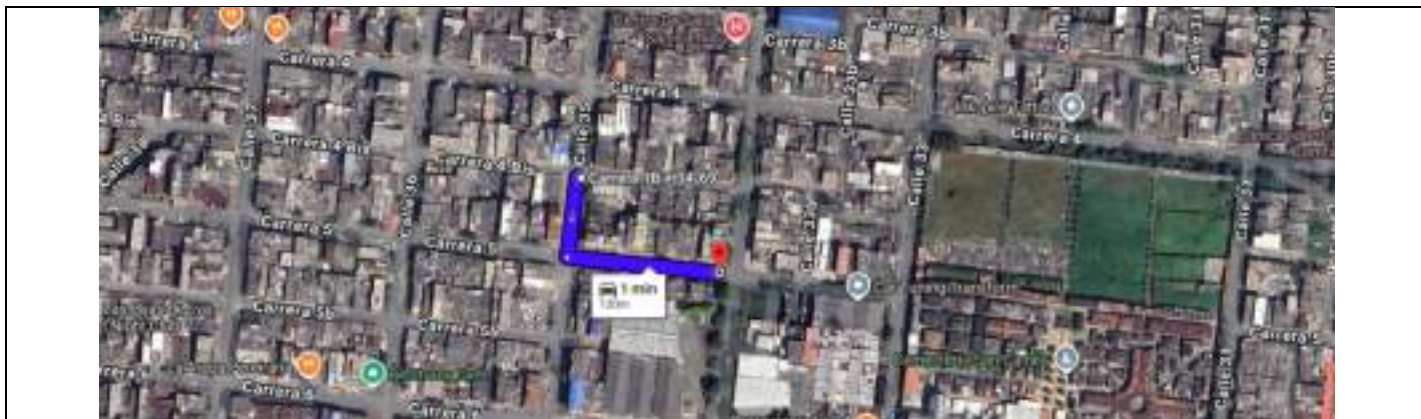

ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

VÍA DE ACCESO AL PARQUE EL VERGEL

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

VIA TRAMO CANCELES - LA MINA, VILLA SANTANA

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO





Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017

VILLA DEL PRADO, CRR 27 ENTRE CLLS 35 Y 37, CRR 26 MZN 51, EL POBLADO

UBICACIÓN



ESTADO INICIAL



ACTIVIDADES PRELIMINARES



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017



APLICACION CARPETA ASFALTICA



FINALIZADO



Versión: 1

Fecha de vigencia: octubre 17 de 2017



Pereira, 24 de junio de 2026

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICAS**

Yo, **JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO** identificado con C.C. No. 1.088.291.689 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.** identificada con NIT. 900.188.750-8, certifico el pago de aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ**, identificado con C.C: No. 1.053.829.394 de Pereira y, con Tarjeta Profesional No. 254066-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad **HT ASESORES – AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S** en mi condición de Revisor Fiscal de **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.** identificada con NIT. 900.188.750-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026.



**JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
REPRESENTANTE LEGAL
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS**



**LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ
REVISOR FISCAL
T.P: 254066-T**



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

043037207CA1A820

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUISA FERNANDA QUINTERO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053829394 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 254066-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



254066-T

**LUISA FERNANDA
QUINTERO RAMIREZ**

C.C. 1053829394

RES. INSCRIPCION 109


DEL 22/02/2019

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262390

282538



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.829.394**
QUINTERO RAMIREZ

APELLIDOS
LUISA FERNANDA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1993**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

27-SEP-2011 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0900100-00350262-F-1053829394-20111214

0028689105A 1

37420697

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.291.689**

GARCIA HENAO REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS

JUAN SEBASTIAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-JUN-1991**


SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-2009 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00384679-M-1088291689-20120628 0030349692A 1 4541903449

Versión: 1

Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018

CONTRATO NO. 4347-2026

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PEREIRA
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S NIT: 900.188.750-8 RL: JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 1.088.291.689 DE PEREIRA.
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MIL MILLONES PESOS M/CTE (\$ 40.000.000.000)
DURACIÓN:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO:	27 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

En la ciudad de Pereira, se reunieron: **Juan Daniel Giraldo Ochoa** (Supervisor) y **Juan Sebastián García Henao** Representante legal de **Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S** (Contratista), con el fin de iniciar con el objeto relacionado en el Contrato de Suministro N° 4347-2026.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron.

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Supervisor

**AGREGADOS DEL OCCIDENTE
DE RISARALDA S.A.S**

RL: Juan Sebastian Garcia Henao
Contratista

Revisó: Daniel Felipe Gutiérrez León
Abogado Externo
Secretaría de Infraestructura
