

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a71b504961d372909fd09cdf2c7314498742e50bceb44d91aa56d8de386875c4a9a07ae96b24db47e466cef3a667ead

Número de Factura: FE-1

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 01/07/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 31/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026

Nombre Comercial: CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026

Nit del Emisor: 902066903

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Tolima

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Carmen De Apicalá

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 5 1 58 BRR LUCITANIA

Actividad Económica: 4290

Teléfono / Móvil: 3228480382

Correo: legionconstrucciones@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890702040

Departamento: Tolima

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Rioblanco

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 5 4 25 BRR CENTRO

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3132201272

Correo: contabilidad@rioblanco-tolima.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 33.475.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 33.475.977,00
2	0002	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 2.575.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.575.075,00
3	0003	UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 5.150.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.150.150,00
4	0004	COSTO DIRECTO FINAL	NIU	1,00	\$ 128.753.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 128.753.756,00

Notas Finales

PAGO DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO DEL OBRA PÚBLICA No. SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026

Linea de negocio:

Datos Totales

422



Documento generado el:
01/07/2026 14:58:38
Documento validado por la
DIAN:
01/07/2026 14:58:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	169954958
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	169954958
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	169954958
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 169954958

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal	169.954.958,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	169.954.958,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	169.954.958,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 169.954.958,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111279206 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-06-16



310

INFORME PARA PAGO DE ACTA FINAL
CONTRATO No. SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA".

CONTRATISTA:
CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026

REPRESENTANTE LEGAL
LUZ PAULA CRUZ LOAIZA

TABLA DE CONTENIDO

311

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	LOCALIZACIÓN	4
3.	INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL.....	5
3.1	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.....	5
4	INFORME TÉCNICO	6
4.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
4.2	LOCALIZACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR.....	6
5	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	7
6	INFORME ADMINISTRATIVO	9
6.1	INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL.....	9
6.2	INFORME DE PERSONAL.....	9
6.3	PERSONAL DEL CONTRATISTA.....	9
7	INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.....	10
7.1	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	10
7.2	VALOR DEL CONTRATO.	10
7.3	ANTICIPO.....	10
7.4	ADICIÓN.....	10
7.5	AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO	10
7.6	FORMA DE PAGO.	12
8.	CONCLUSIONES DEL CONTRATISTA.....	13

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe del Acta Final contiene las actividades desarrolladas en lo relacionado al objeto contractual, el cual tiene por objeto describir las actividades realizadas por el contratista de obra de carácter técnico, administrativo, jurídico y financiero, al **CONTRATO No. SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026** que tiene por objeto dar a conocer el desarrollo del proceso para el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA"**, contrato celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO, quien para los efectos del presente contrato de obra pública se denomina Contratante, por una parte; y por la otra el **CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026** NIT: 902.066.903-1, representado legalmente por **LUZ PAULA CRUZ LOAIZA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.106.309.638 de Carmen De Apicalá, quien para los efectos del presente contrato de obra pública se denominará el Contratista de obra.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 21 DE MAYO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, cumpliendo de esta manera con lo estipulado contractualmente.

Este informe final de intervención presenta el avance detallado de las actividades ejecutadas durante el período correspondiente, evaluando el cumplimiento de los objetivos, la calidad de los trabajos realizados, el uso adecuado de los recursos asignados y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

La intervención se enfoca en garantizar la correcta ejecución de las actividades constructivas, el uso de materiales adecuados y la implementación de buenas prácticas ambientales y sociales.

2. LOCALIZACIÓN

El proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA", se desarrolla en la zona urbana y rural del municipio de Rioblanco, ubicado en el Departamento del Tolima, en la región andina de Colombia.

Ubicación Geográfica:

Rioblanco se encuentra al suroccidente del Tolima, limitando al norte con los municipios de Chaparral y Planadas, al sur con el Departamento del Huila, al oriente con Ataco y al occidente con el Parque Nacional Natural Las Hermosas. Sus coordenadas geográficas aproximadas son 3°32' N y 75°40' O, con una altitud promedio de 1.400 metros sobre el nivel del mar.

Accesibilidad:

El acceso al municipio se realiza principalmente por vía terrestre, partiendo desde la ciudad de Ibagué a través de la carretera que conecta con Chaparral y luego hacia Rioblanco. La vía rural donde se ejecuta el proyecto presenta condiciones variadas, predominando la vía en material en afirmado, mejoradas con placa huella, lo que determina la logística para el transporte de materiales y equipos.

Aspectos Ambientales y Sociales:

La zona cuenta con una riqueza natural significativa, con influencia de ecosistemas de montaña y áreas protegidas cercanas. A nivel social, Rioblanco presenta una población mayoritariamente campesina, con actividades económicas centradas en la agricultura y un tejido comunitario fuerte, lo cual facilita la socialización y apropiación del proyecto.

3. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL.

3.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT:	890702040-7
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT.	902.066.903-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
CEDULA:	No. 1.106.309.638 DE CARMEN DE APICALÁ
CDP:	2026000223 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
RP:	2026000346 DEL 21 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
PRORROGA NO.1:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO:	21 DE MAYO DE 2026


4 INFORME TÉCNICO

4.1 OBJETIVO GENERAL

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA"

4.2 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR

El proyecto se localiza en el Departamento del Tolima, Municipio de Rioblanco, en la zona urbana y rural.

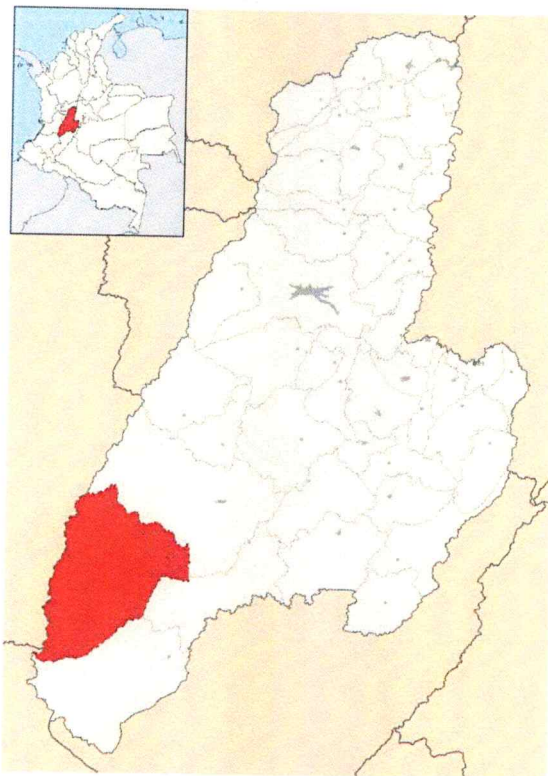

Fuente: Wikipedia

5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A continuación, se describen las actividades de ejecución de obra:

CANTIDADES ORIGINALES						CANTIDADES DE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO ALUMBRADO PÚBLICO LED STREET ZD229 40-60 W, 100/277V 4000K 9300LM (INCLUYE FOTOCELDA).	UND	128,00	\$ 768.504,00	\$ 98.368.512,00	128,00	\$ 98.368.512,00	0,00	\$ 0,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES BIMETÁLICOS	UND	384,00	\$ 6.848,00	\$ 2.629.632,00	384,00	\$ 2.629.632,00	0,00	\$ 0,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	M	256,00	\$ 19.602,00	\$ 5.018.112,00	256,00	\$ 5.018.112,00	0,00	\$ 0,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1,20 MT C/COLLARIN DE 140 MM 5"-6"	UND	44,00	\$ 151.590,00	\$ 6.669.960,00	44,00	\$ 6.669.960,00	0,00	\$ 0,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RED TRENZADA 2X4/0+2/0	M	380,00	\$ 42.283,00	\$ 16.067.540,00	380,00	\$ 16.067.540,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 128.753.756,00		\$ 128.753.756,00		\$ 0,00
ADMINISTRACIÓN				26%	\$ 33.475.977,00		\$ 33.475.977,00		\$ 0,00
IMPREVISTOS				2%	\$ 2.575.075,00		\$ 2.575.075,00		\$ 0,00
UTILIDAD				4%	\$ 5.150.150,00		\$ 5.150.150,00		\$ 0,00
TOTAL AIU				32%	\$ 41.201.202,00		\$ 41.201.202,00		\$ 0,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 169.954.958,00		\$ 169.954.958,00		\$ 0,00

317

BALANCE CONTRATO DE OBRA:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 169.954.958,00	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 169.954.958,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 169.954.958,00	\$ 169.954.958,00

6 INFORME ADMINISTRATIVO

6.1 INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL

Se realiza un informe de avance presupuestal, en donde se cuantifican todas las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista desde el inicio de la obra con corte al día 30 de junio de 2026. El resultado del corte de obra, evidencia el avance real presupuestal del contrato de obra que corresponde aproximadamente a un 100% de avance de obra y un valor de \$169.954.958,00 quedando un porcentaje de avance por ejecutar equivalente al 0% y un valor de \$0.


6.2 INFORME DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades del periodo se ha contado con el siguiente recurso humano

6.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

En el presente contrato de obra se cuenta con los siguientes profesionales:

- DIRECTOR DE OBRA
- RESIDENTE DE OBRA
- ESPECIALISTA AMBIENTAL
- TÉCNICO ELECTRICISTA



319

7 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

7.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

7.2 VALOR DEL CONTRATO.

CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE.

7.3 ANTICIPO.

El presente contrato no presenta anticipo.

7.4 ADICIÓN.

N/A

ESTADO FINANCIERO LP 004 DEL 2025					
AVANCE PERIODO	%	AVANCE ACUMULADO	%	SALDOS	%
\$169.954.958,00	100,00	\$169.954.958,00	100,00	\$0	0

7.5 AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO

A continuación, se presenta en tablas y graficas el avance mensual del proyecto. La información del % y valor programado se proyectó con el flujo de fondos mensual por capítulos presentado por el contratista.

Se representa de manera gráfica los porcentajes del avance del proyecto a corte del informe:

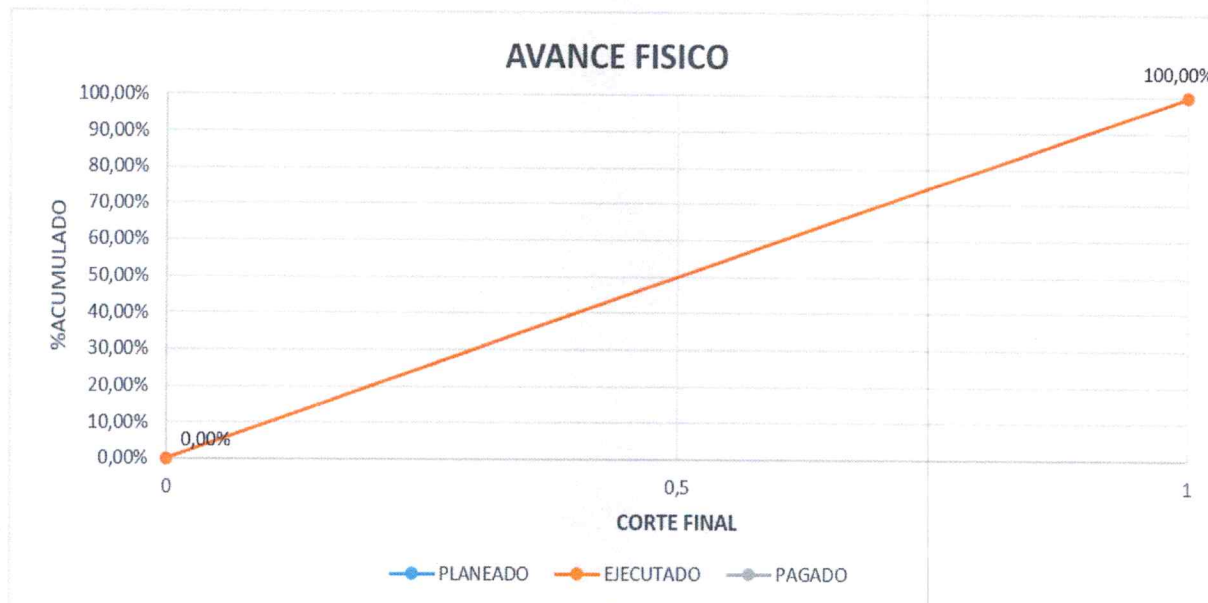


Imagen 1. Grafica Avance físico

Tabla. Avance del proyecto – Curva S

No	CORTE	ACUMULADO					
		PROGRAMADO		EJECTADO		PAGADO	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
0	21/05/2026 (INICIO)	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%		
1	30/06/2026 (PRESENTE ACTA FINAL)	\$ 169.954.958,00	100,00%	\$ 169.954.958,00	100,00%		
	TOTAL	\$ 169.954.958,00	100,00%				

Se presenta de manera gráfica "Curva S" el estado de avance del proyecto

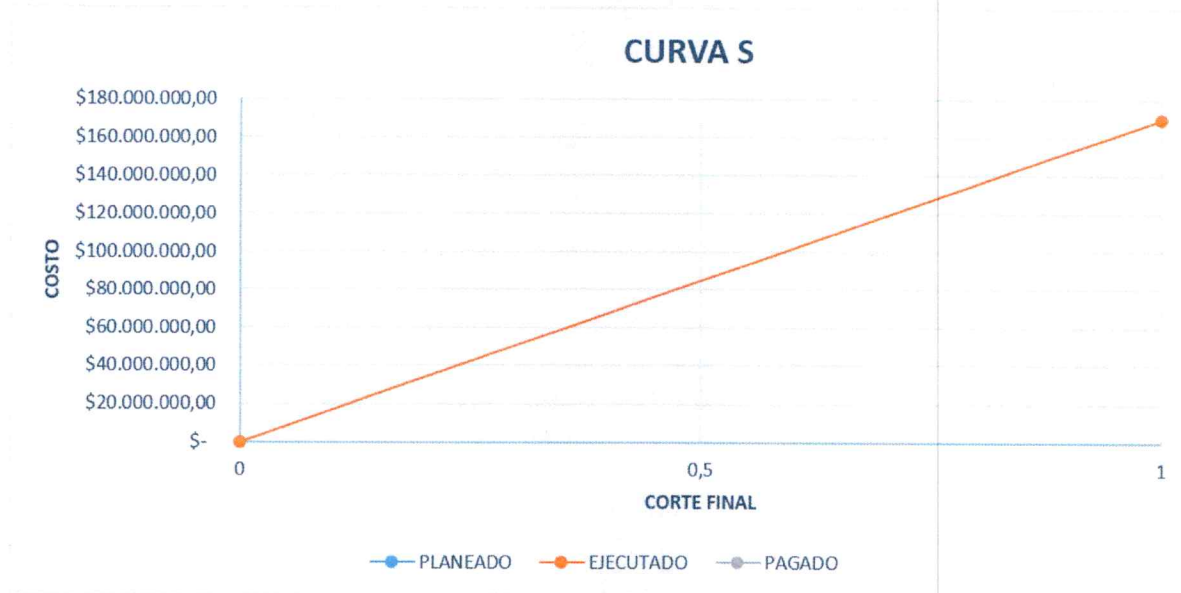


Imagen 2. Grafica Curva S

7.6 FORMA DE PAGO.

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: Un (1) solo pago por el (100%) del valor del contrato previa Acta de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor, presentación de la cuenta de cobro y/o factura, Acreditación del pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y demás impuestos de conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012 y,

El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen.

8. CONCLUSIONES DEL CONTRATISTA


- **Cumplimiento del Objeto Contractual:** Con base en el corte final al 30 de junio de 2026, el contrato de obra **SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026** se ejecutó satisfactoriamente en su totalidad, logrando el suministro e instalación de 128 luminarias LED tipo alumbrado público en las zonas urbanas y rurales estipuladas del municipio de Rioblanco, Tolima.
- **Balance Físico y Presupuestal:** El proyecto alcanzó un avance físico y presupuestal real del **100%**, equivalente a una inversión total de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE**, registrando un saldo por ejecutar del 0% (\$0,00), lo que demuestra una óptima eficiencia en la distribución de los recursos y el cumplimiento riguroso del cronograma con su respectiva prórroga.
- **Coherencia Financiera y Técnica:** El comportamiento financiero guardó estricta coherencia con el avance en campo. Las actividades de suministro de luminarias, conectores bimetálicos, cables y brazos galvanizados se liquidaron conforme a las cantidades originalmente pactadas, sin requerir adiciones presupuestales ni anticipos, consolidando el cierre definitivo de todos los frentes de trabajo.
- **Impacto Social y Operativo:** Las obras civiles y eléctricas ejecutadas quedan completamente operativas, garantizando la modernización del sistema de alumbrado público del municipio. Esto se traduce en una mejora directa de las condiciones de seguridad, visibilidad y bienestar para la comunidad beneficiada, tanto en el sector urbano como rural, promoviendo el uso de tecnologías eficientes y de menor consumo energético.
- **Cierre y Liquidación:** Habiendo cumplido a cabalidad con el alcance técnico, administrativo y financiero planificado, se da por terminado el plan de trabajo en campo, procediendo formalmente a la entrega técnica soportada en el registro fotográfico adjunto, y quedando a disposición de la supervisión para iniciar los trámites pertinentes de liquidación del contrato.


CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT 902.066.903-1
R.L. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá
CONTRATISTA


ANEXO: Registro fotográfico de luminarias instaladas.

• **LUMINARIAS SECTOR DE HERRERA**


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #1

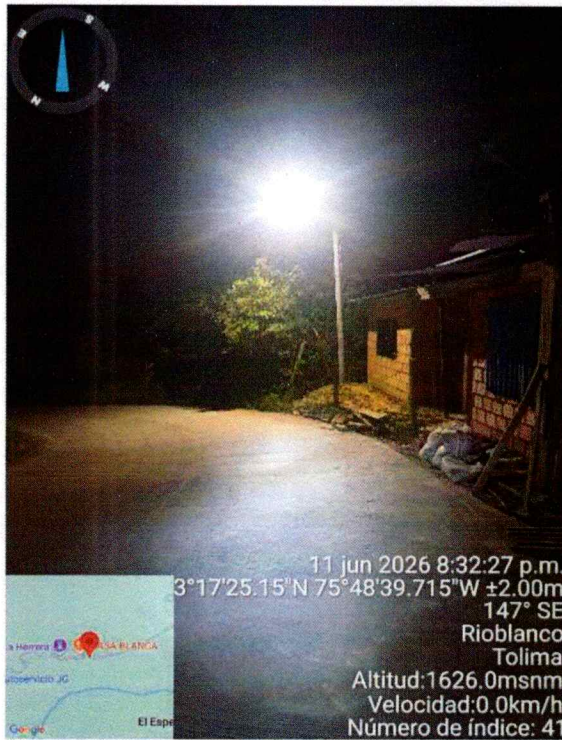


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #2

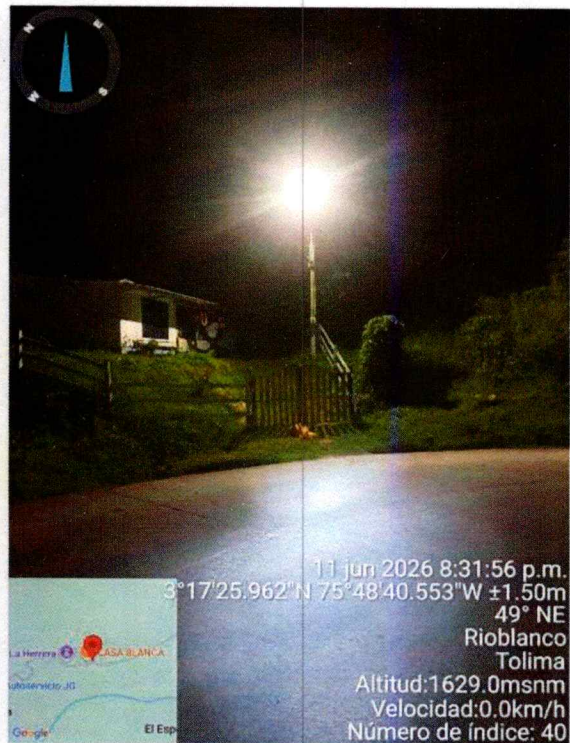

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #3

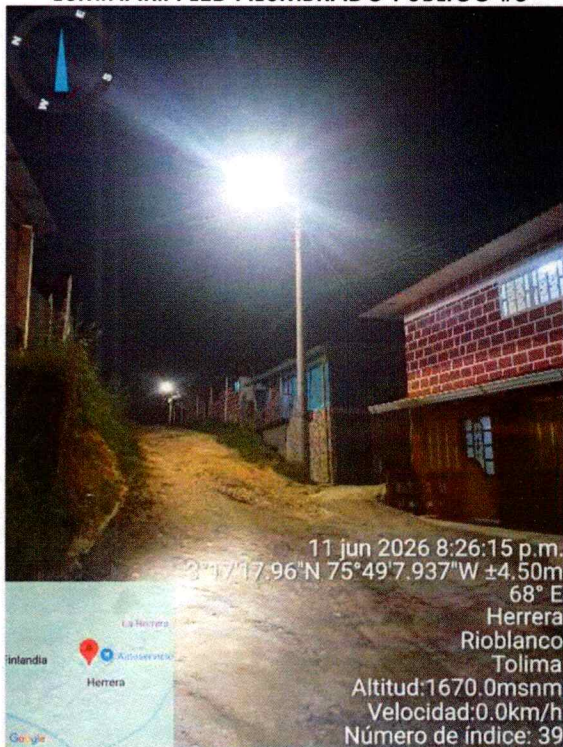


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #4




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #5




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #6

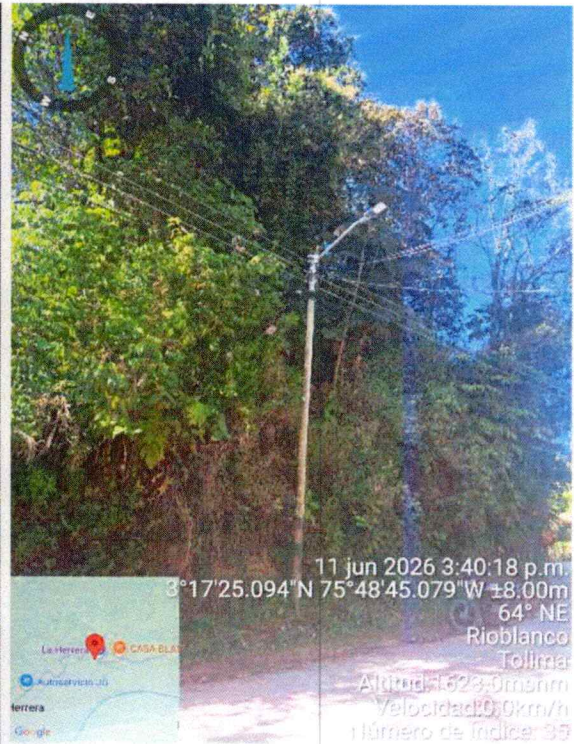


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #7

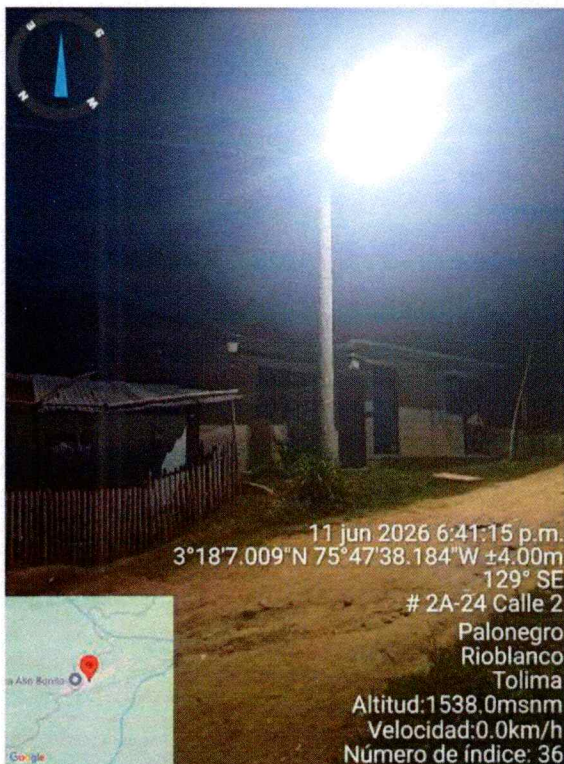


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #8

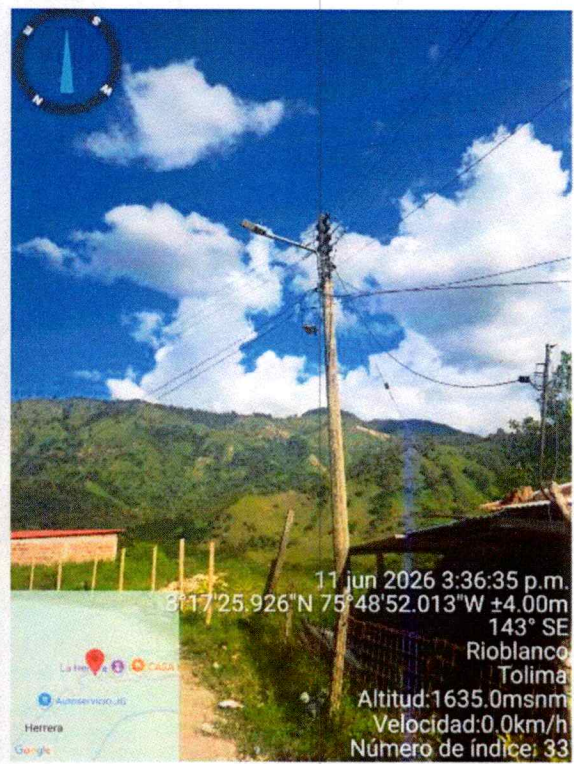

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #9

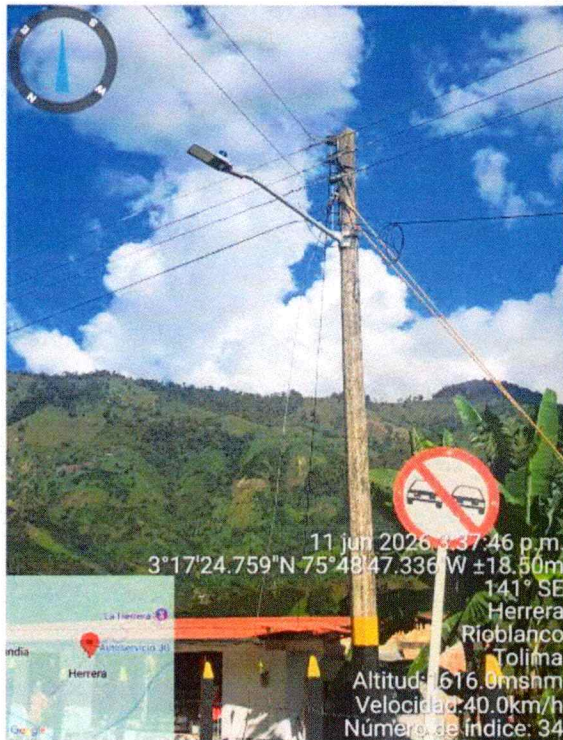

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #10

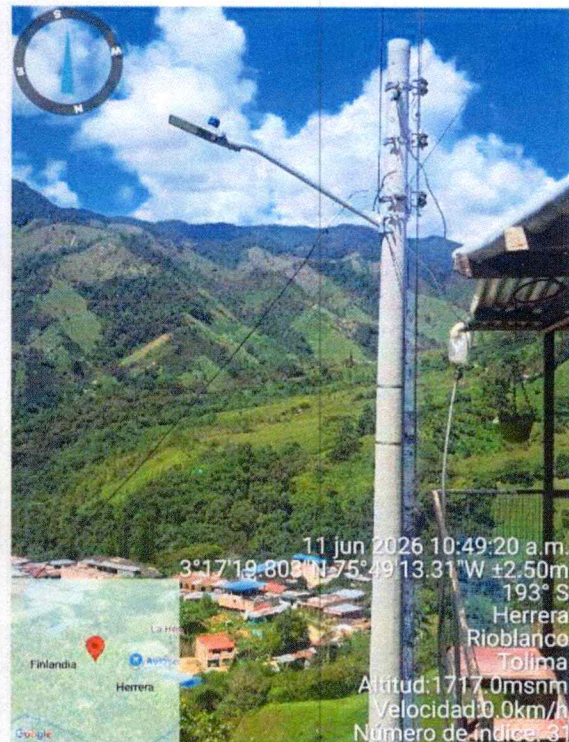

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #11




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #12




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #13




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #14

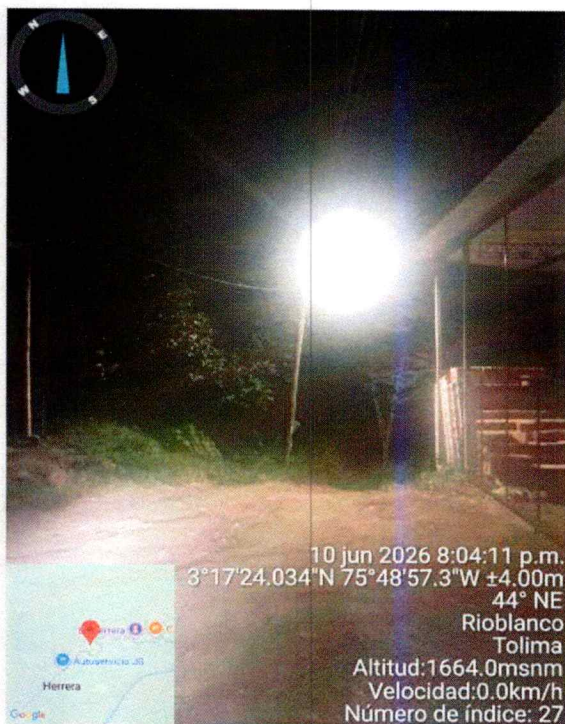


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #15

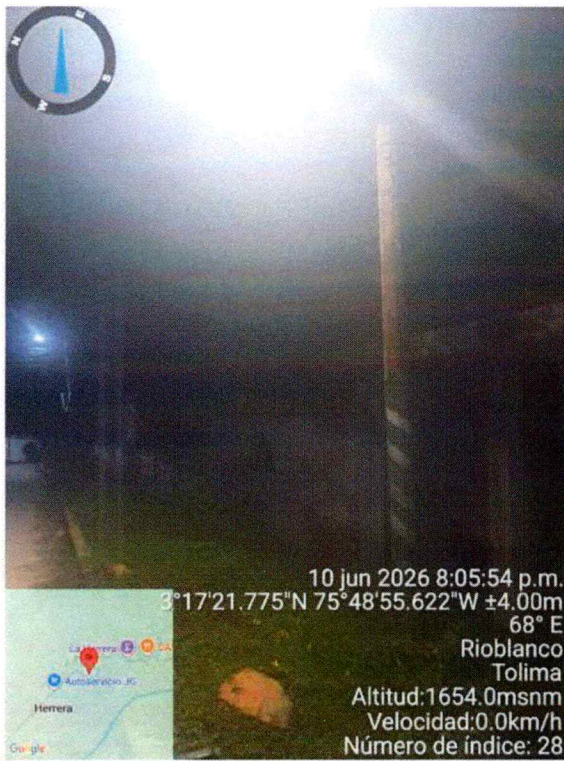


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #16

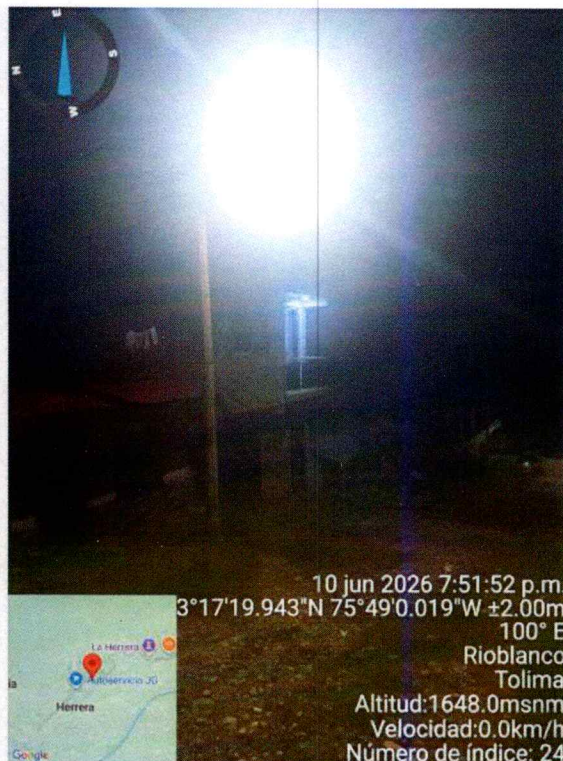


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #17

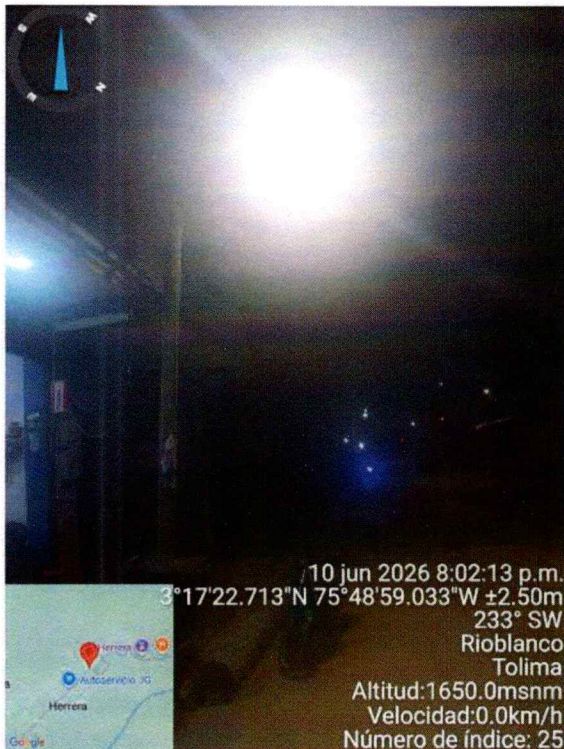

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #18

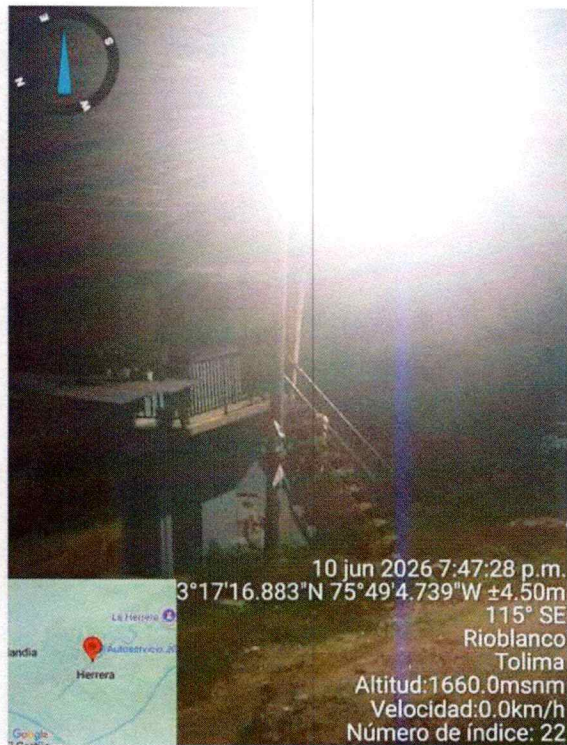


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #19

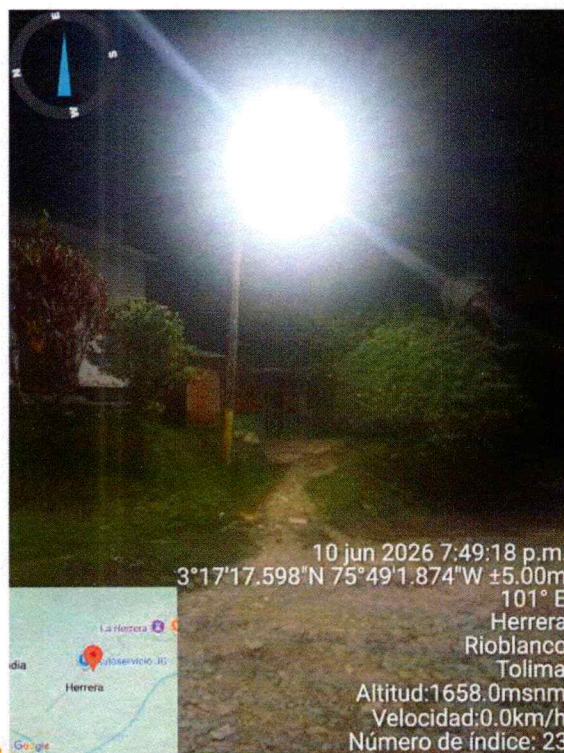


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #20




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #21

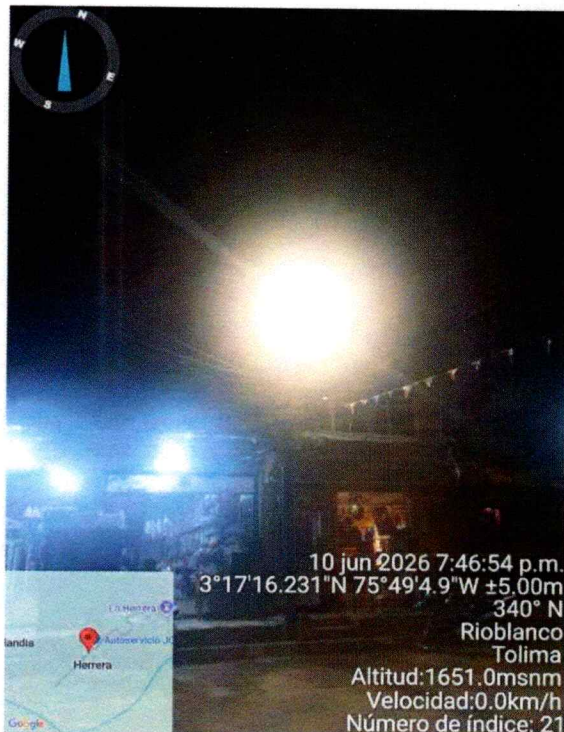


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #22

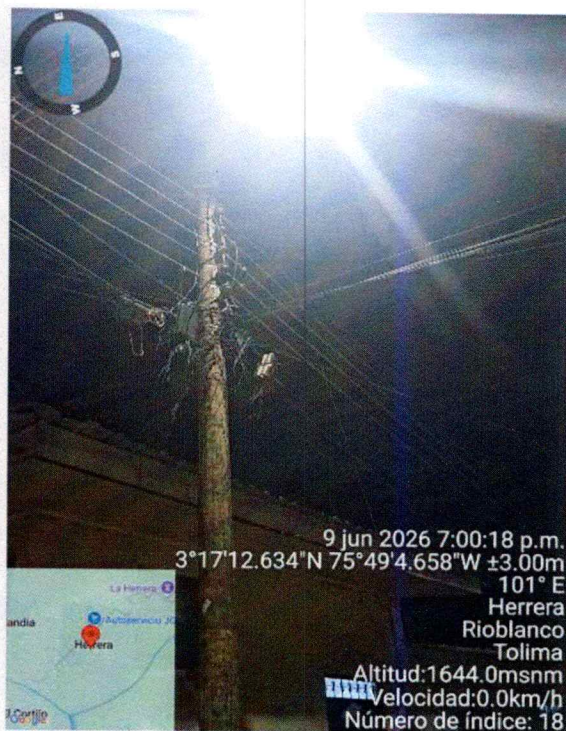


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #23

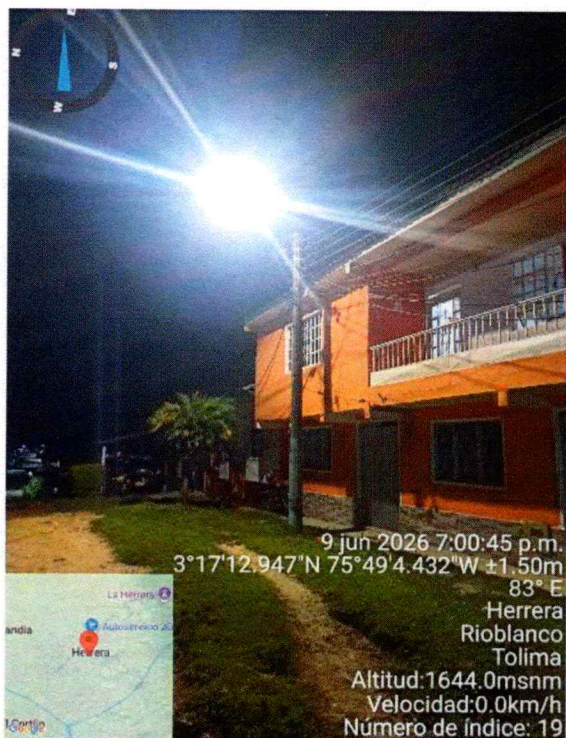


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #24

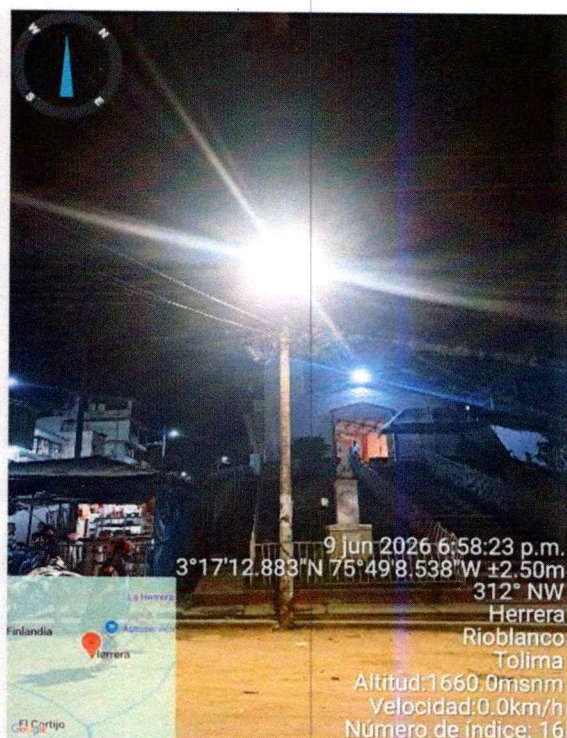


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #25

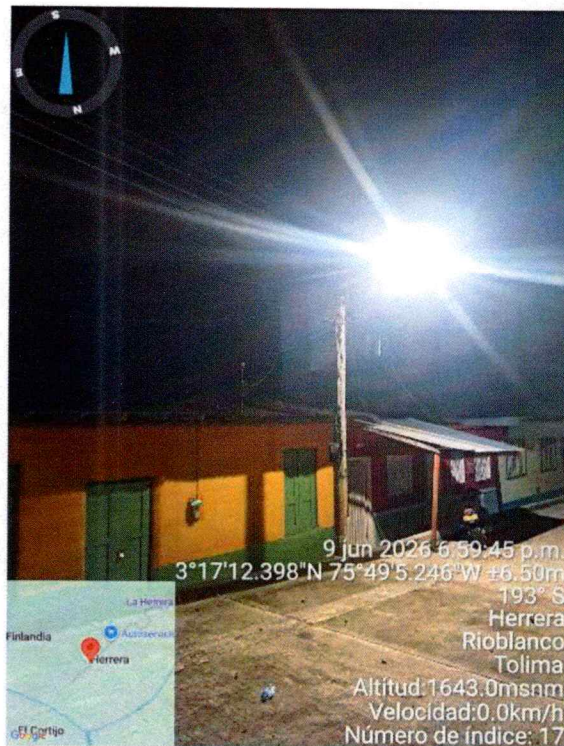


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #26

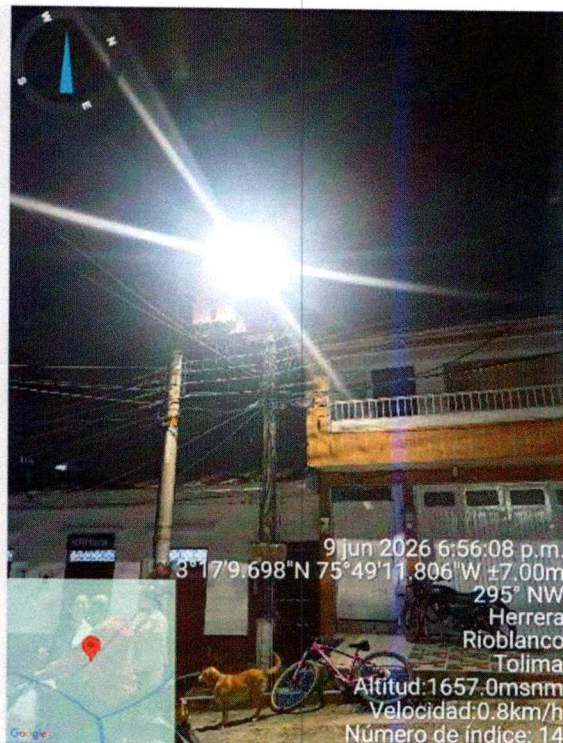


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #27

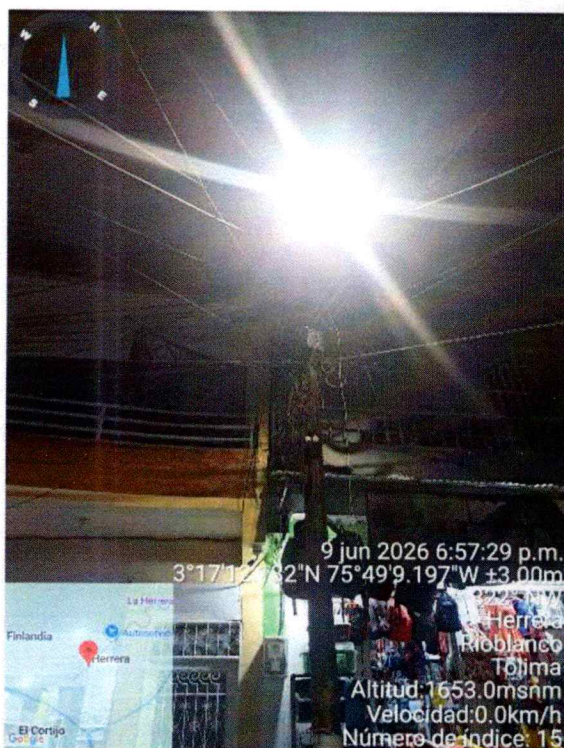


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #28

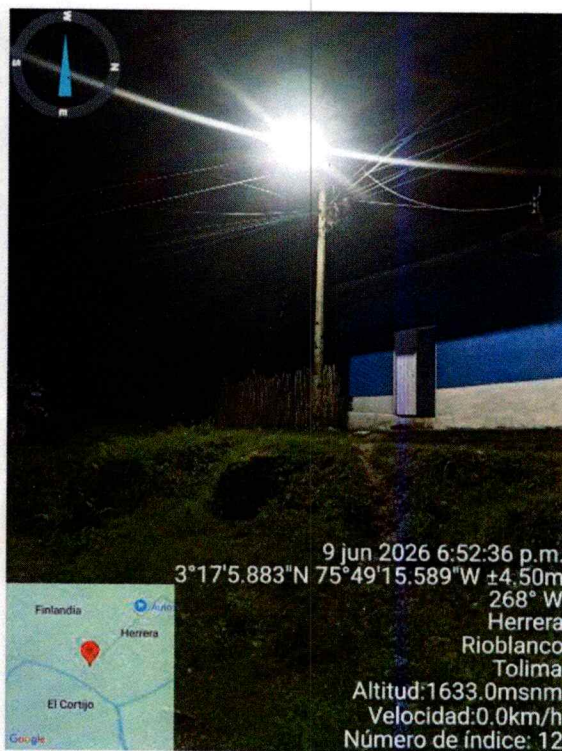

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #29

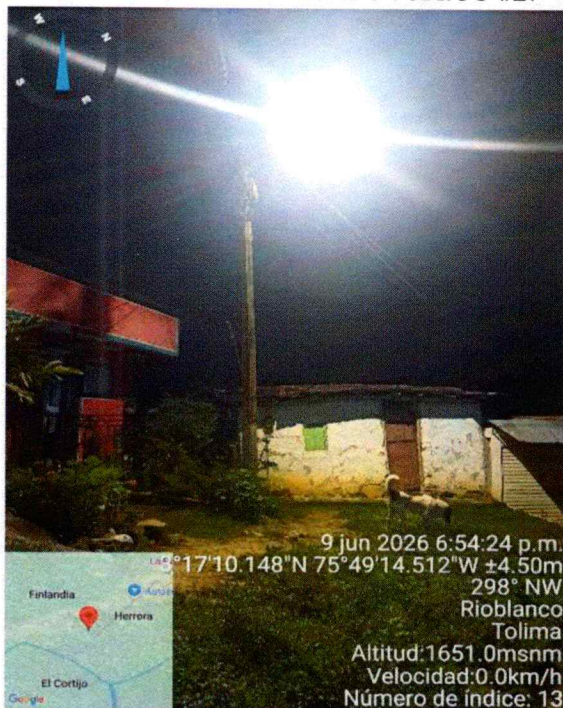


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #30

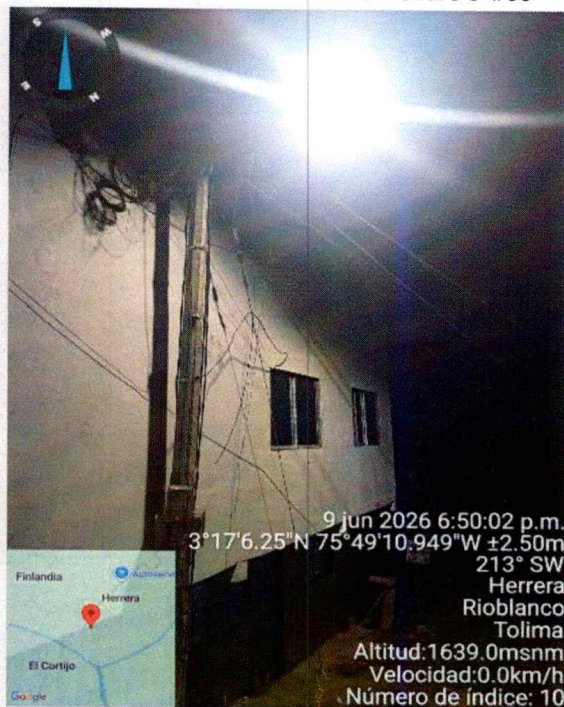


• LUMINARIAS CENTRO POBLADO DE PUERTO SALDAÑA


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #31

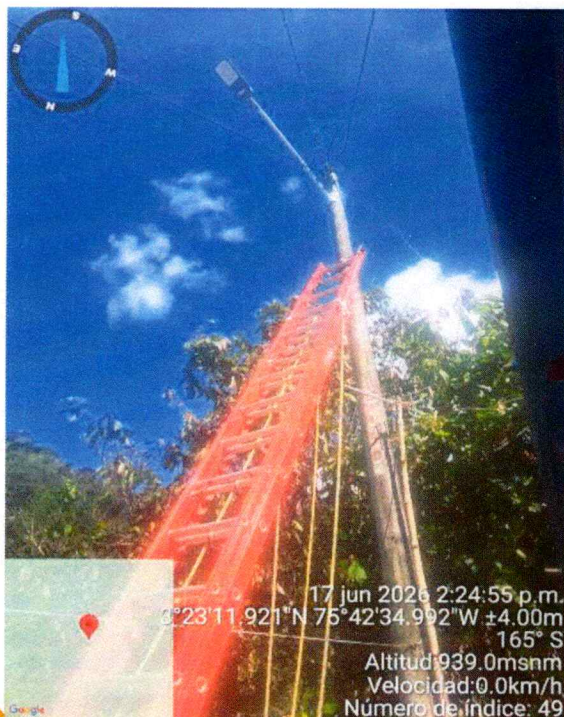

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #32

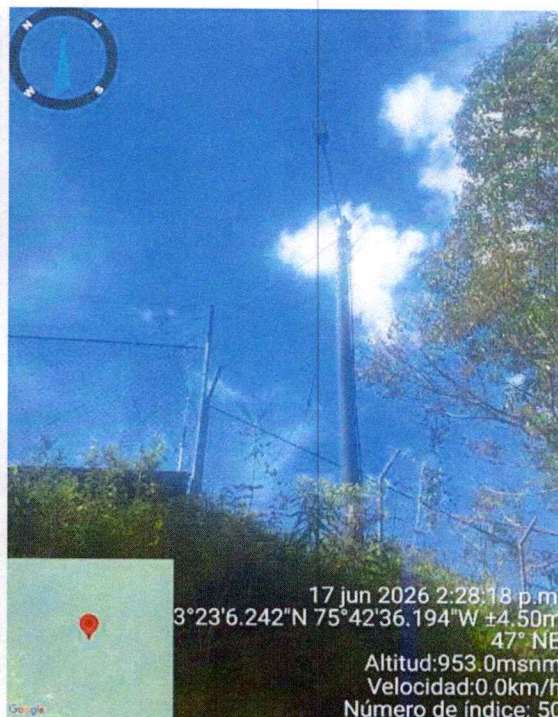


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #33

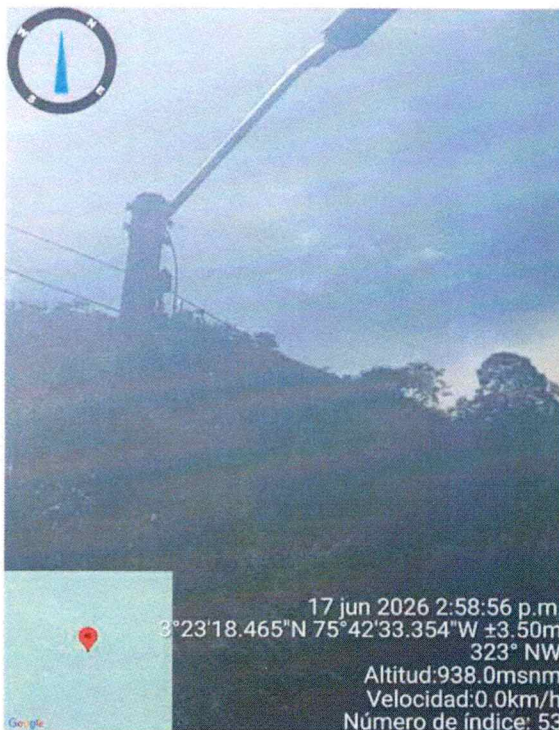

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #34




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #35

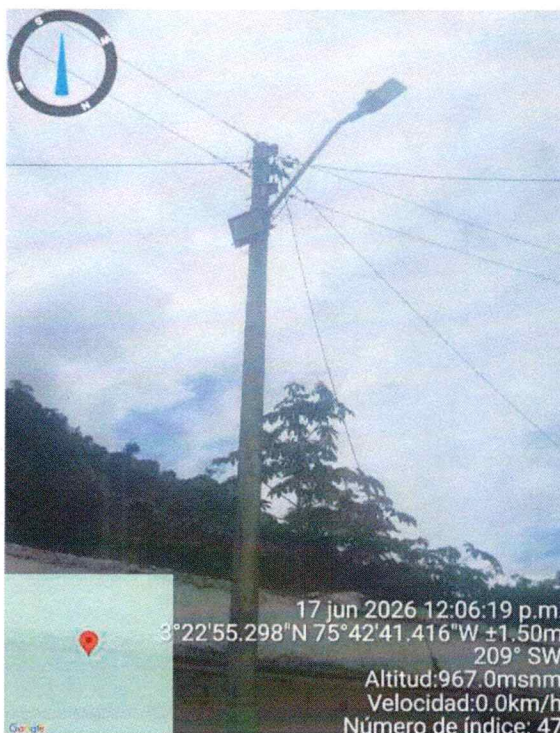


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #36




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #37

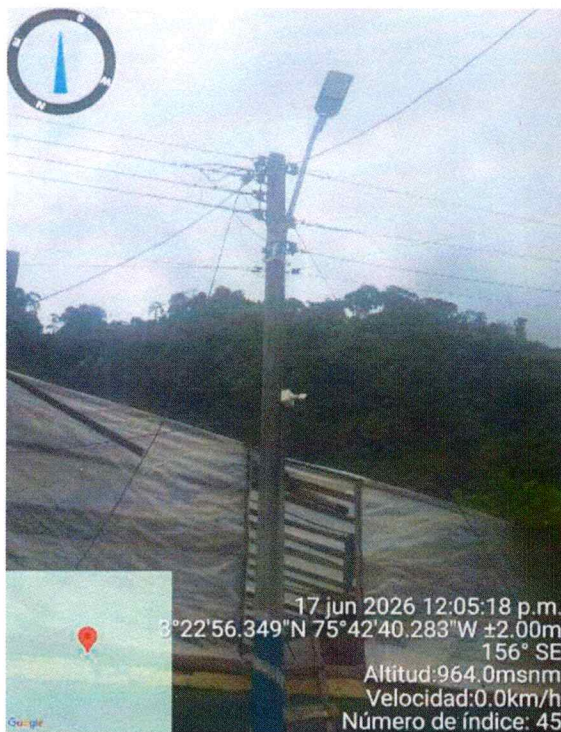


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #38

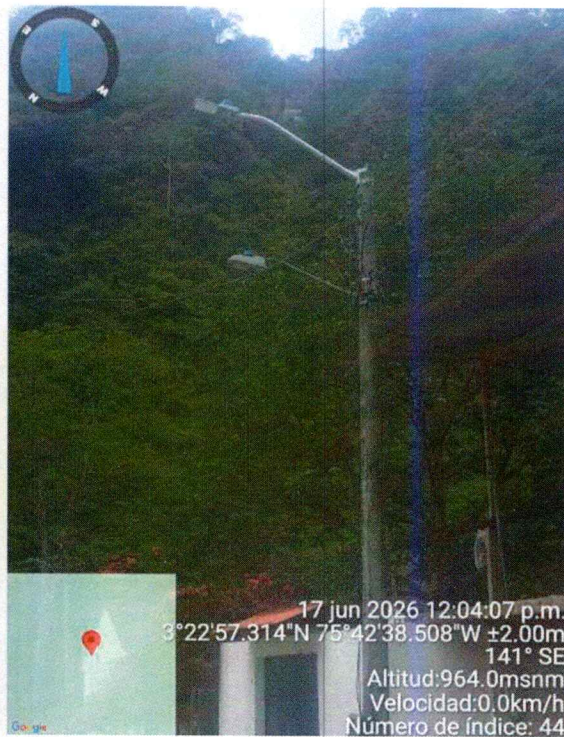

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #39

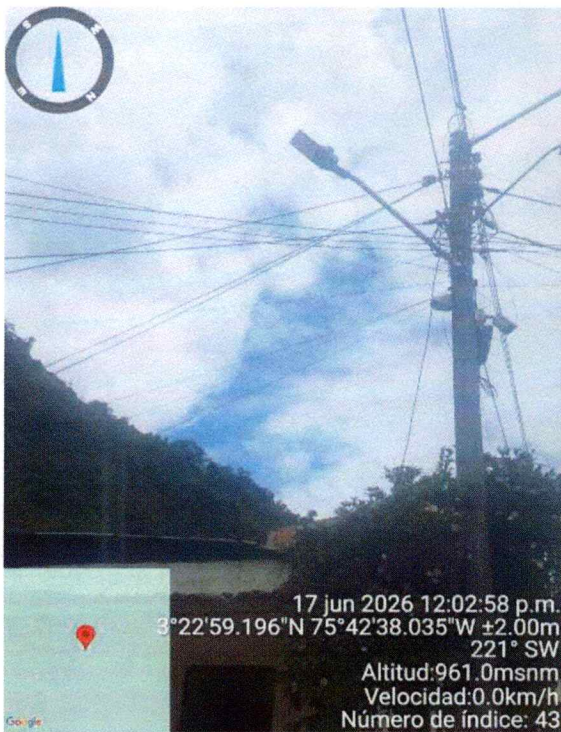

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #40

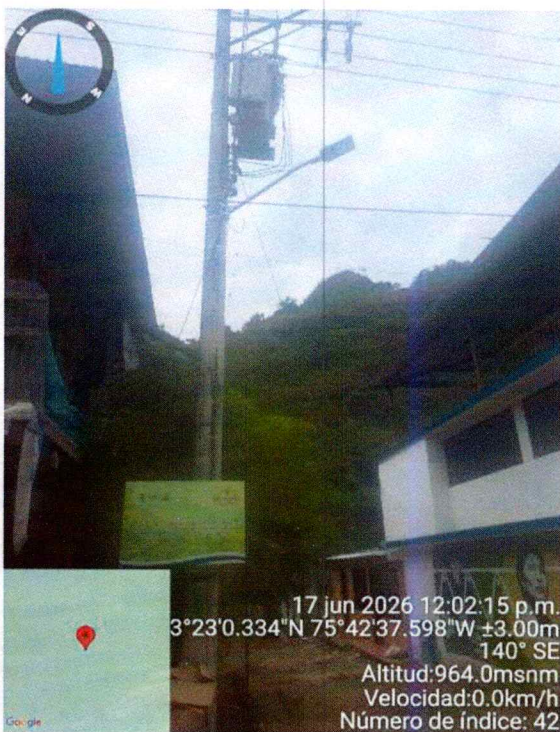


• LUMINARIAS CENTRO POBLADO DE GAITAN

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #41



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #42

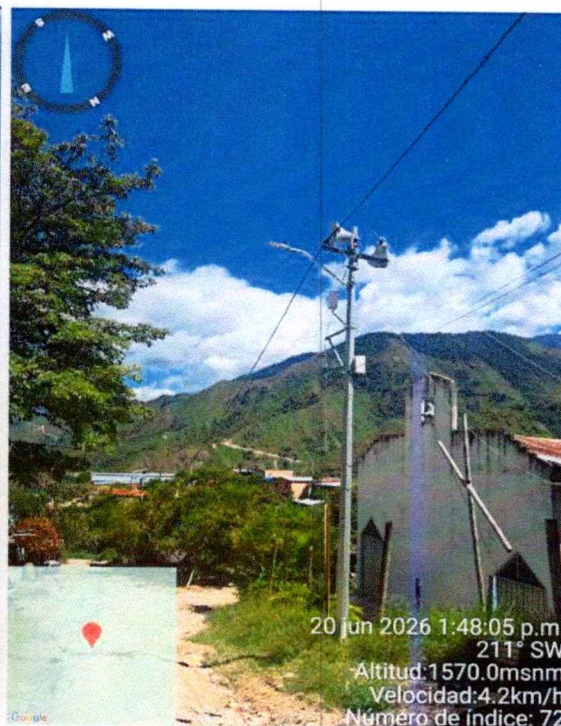

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #43



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #44




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #45




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #46




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #47

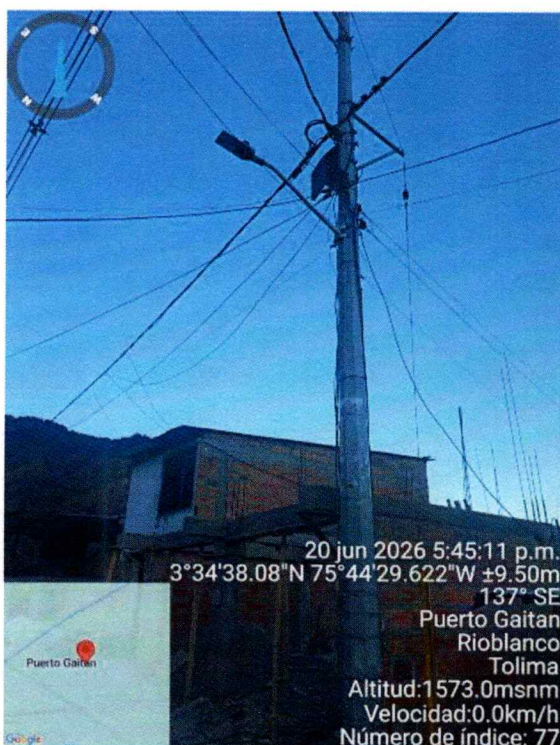

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #48

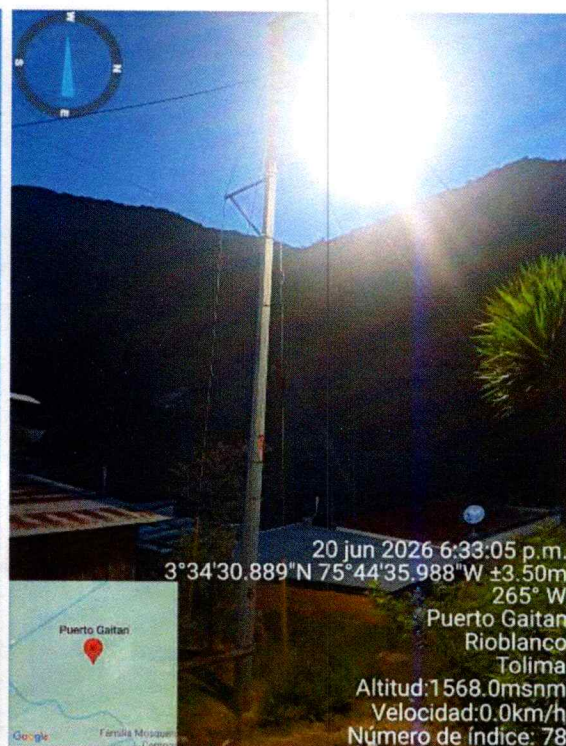

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #49

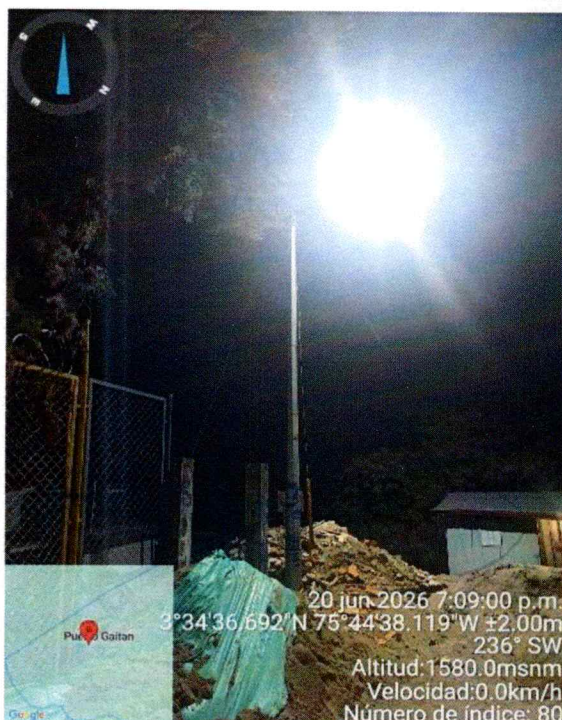


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #50



- LUMINARIAS VEREDA MARACAIBO**

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #51

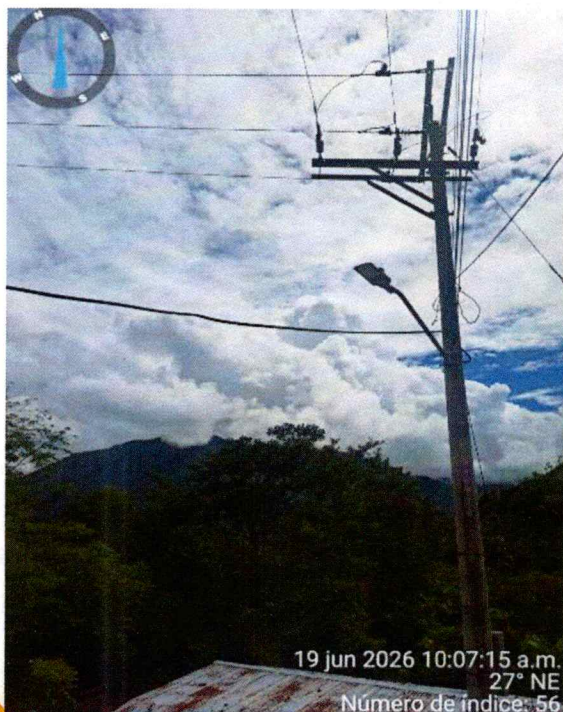


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #52



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #53



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #54

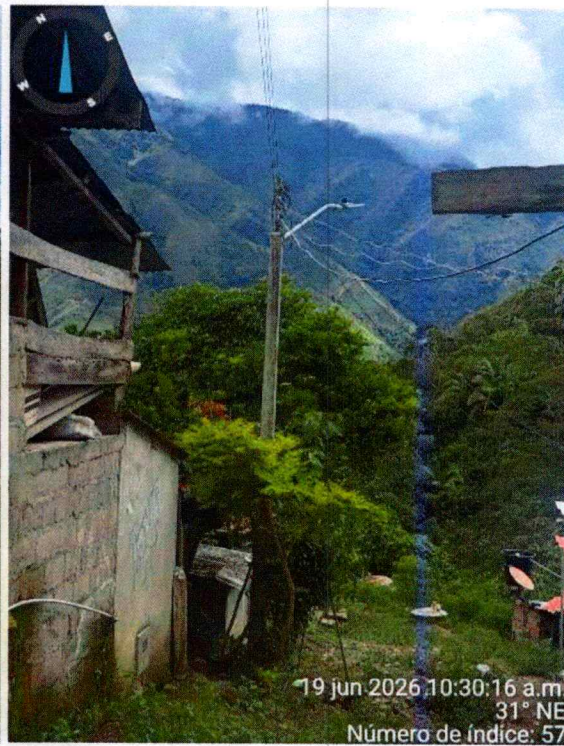

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #55




• **LUMINARIAS VEREDA LA LLANETA**


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #56




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #57

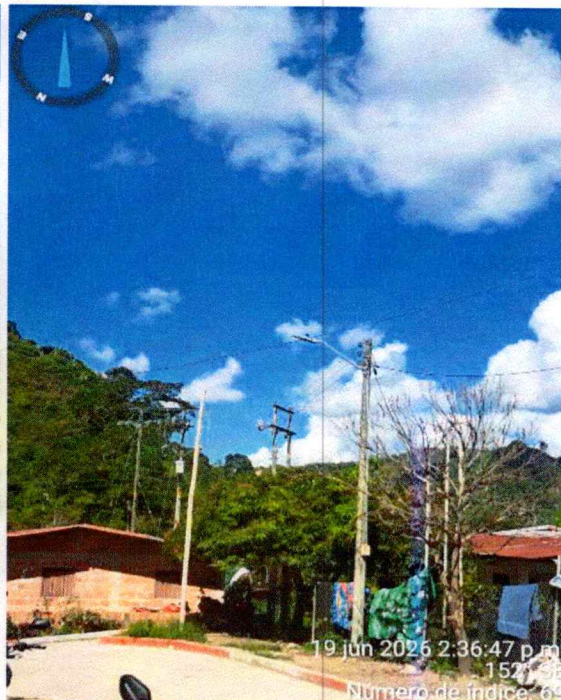


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #58

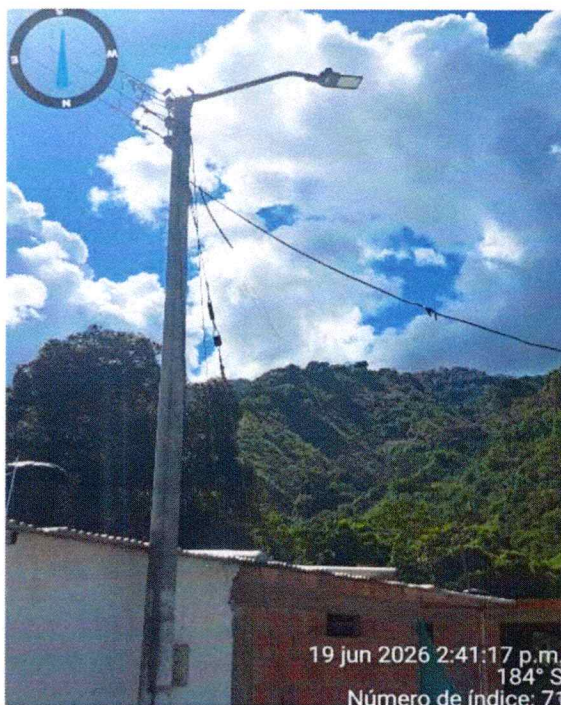

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #59

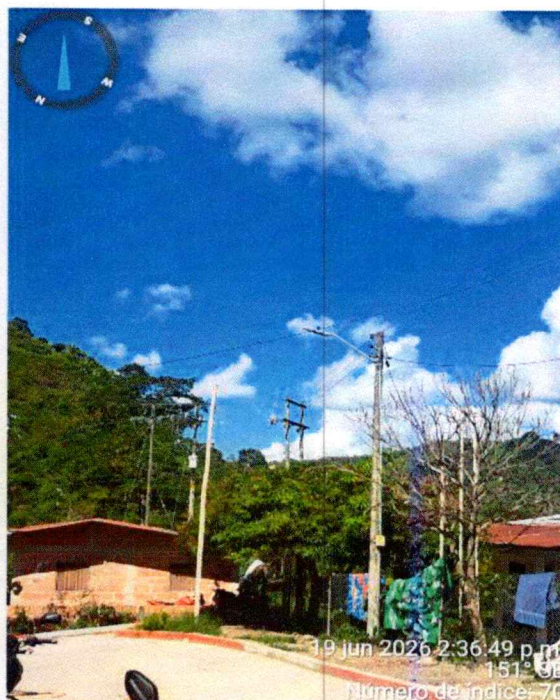

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #60

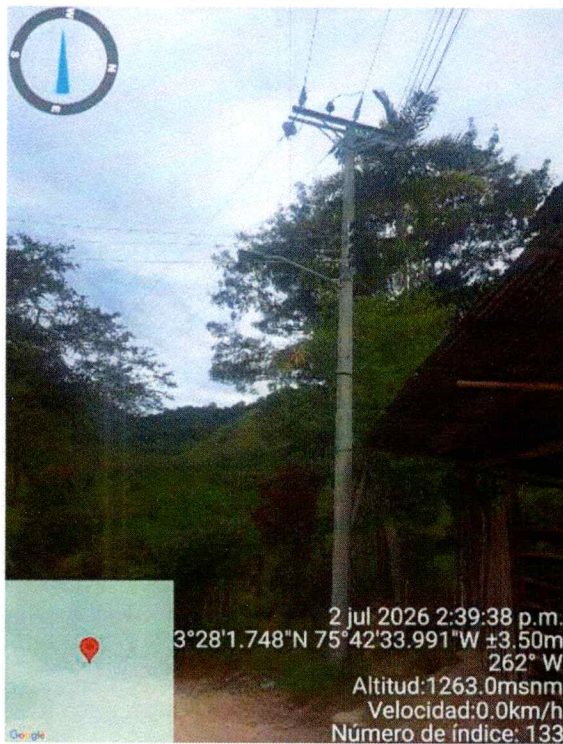

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #61



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #62




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #63



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #64



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #65

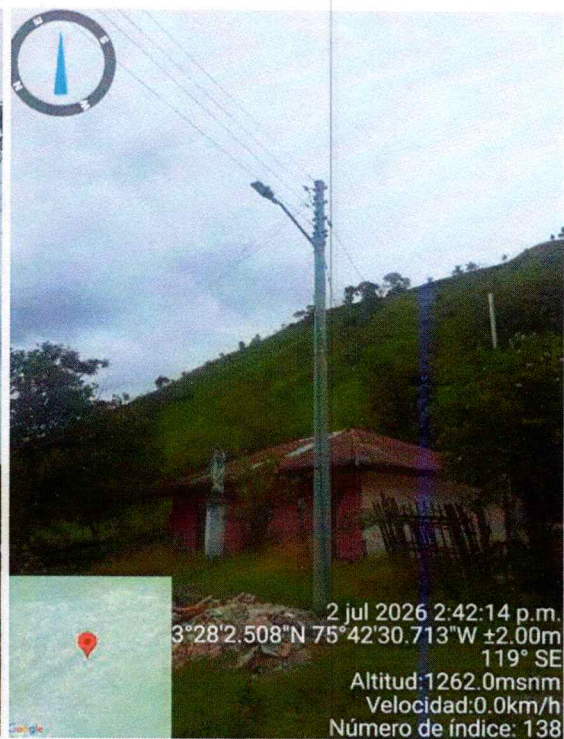


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #66



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #67



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #68 Y 69

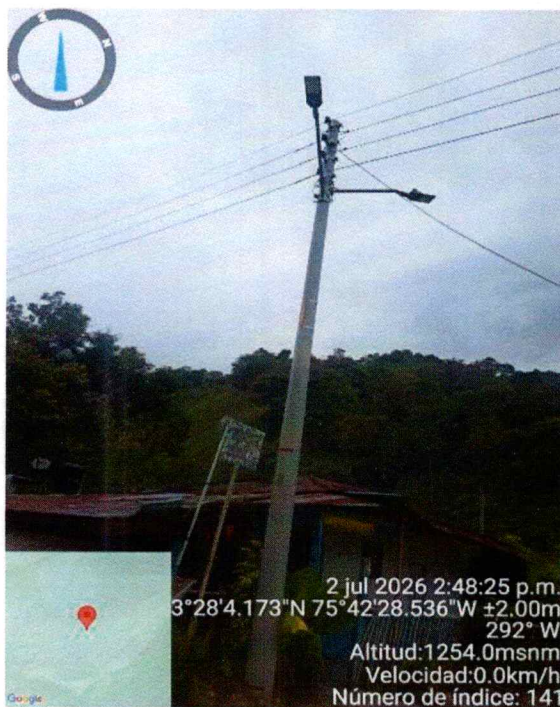


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #70



- LUMINARIAS CASCO URBANO

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #71

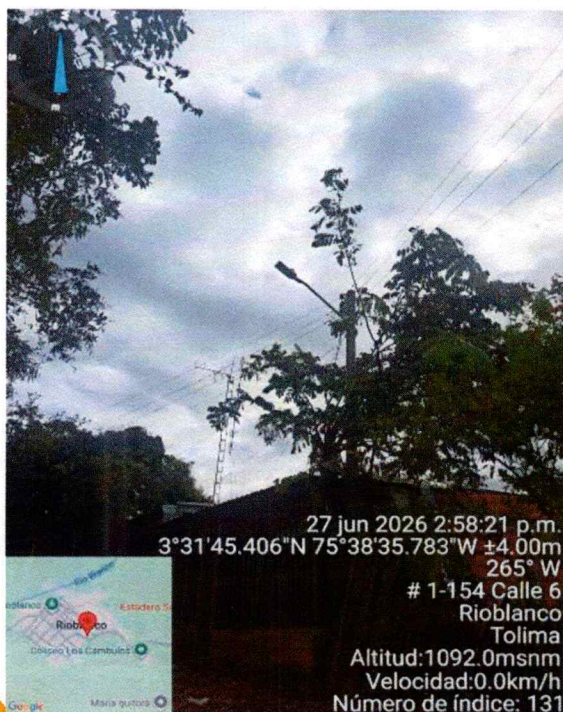

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #72



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #73




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #74




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #75




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #76

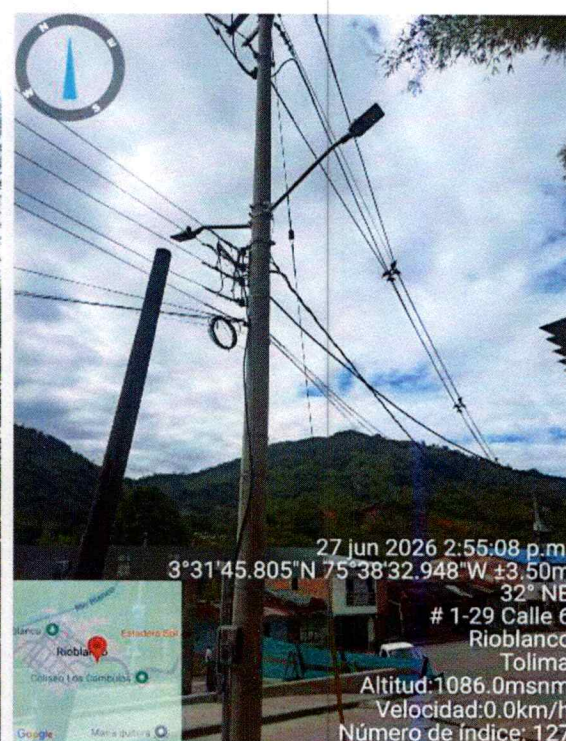

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #77

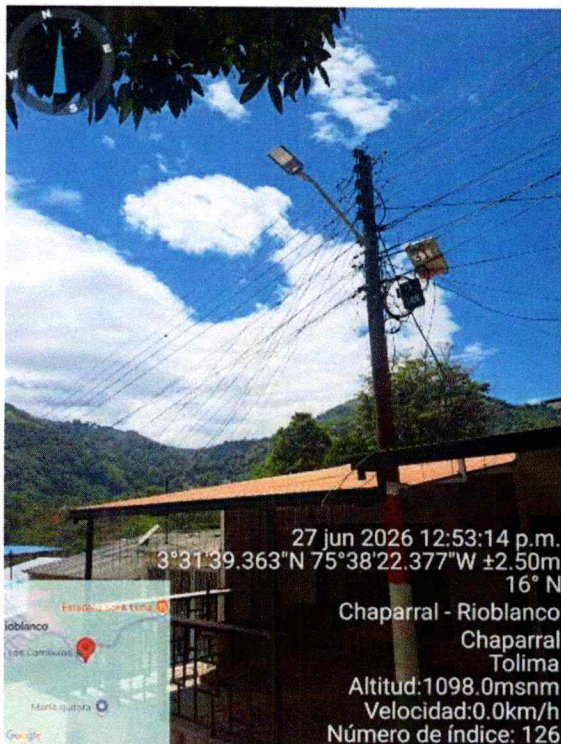


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #78

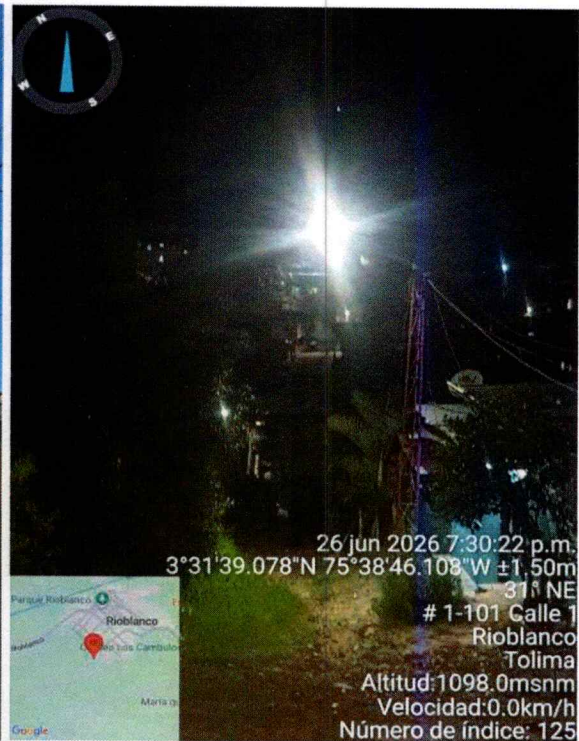


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #79



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #80

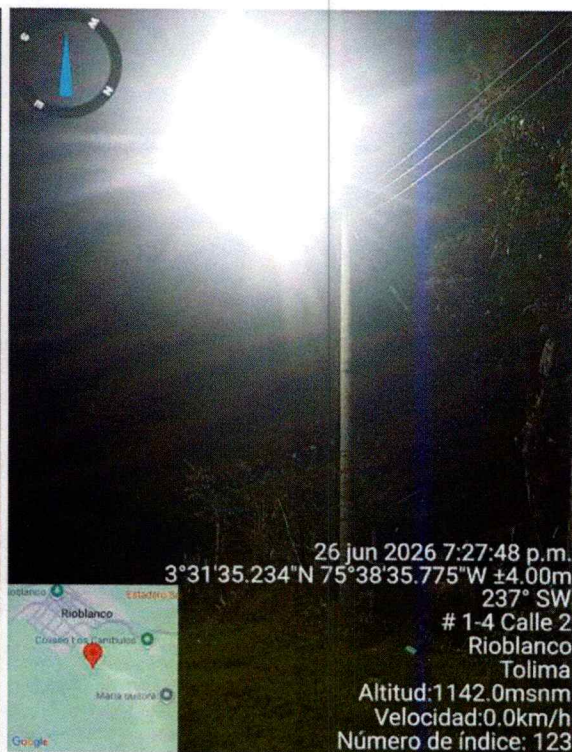


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #81

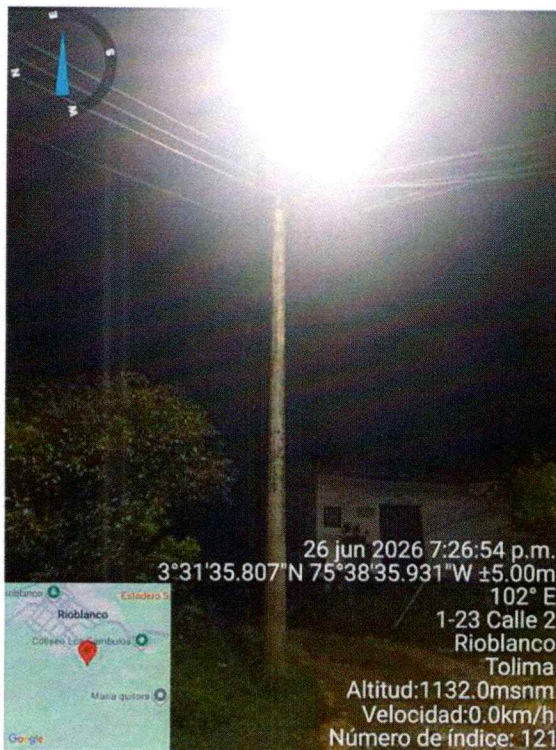


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #82




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #83

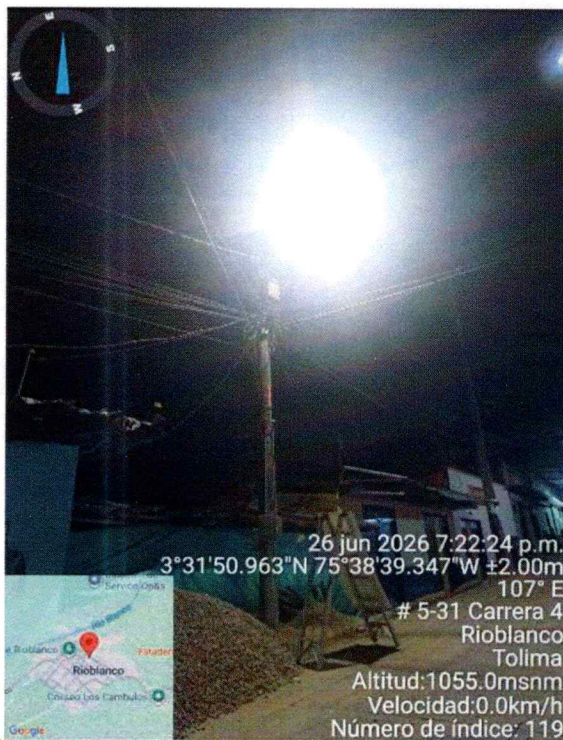


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #84

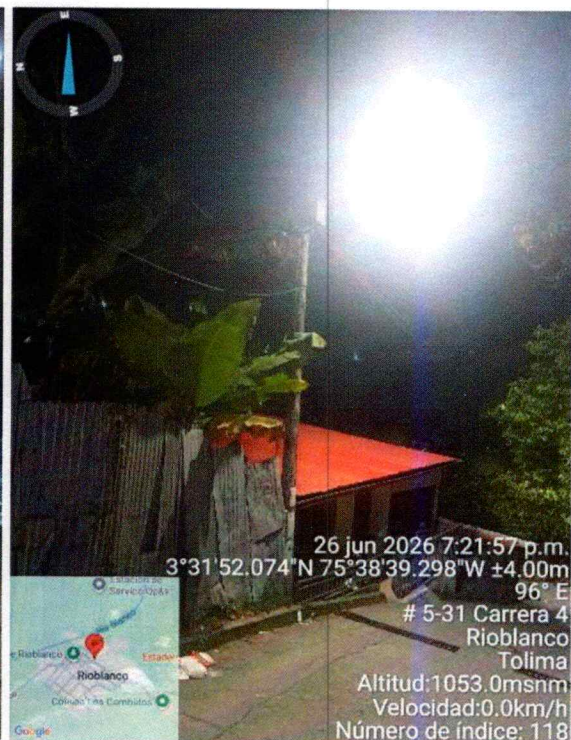


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #85

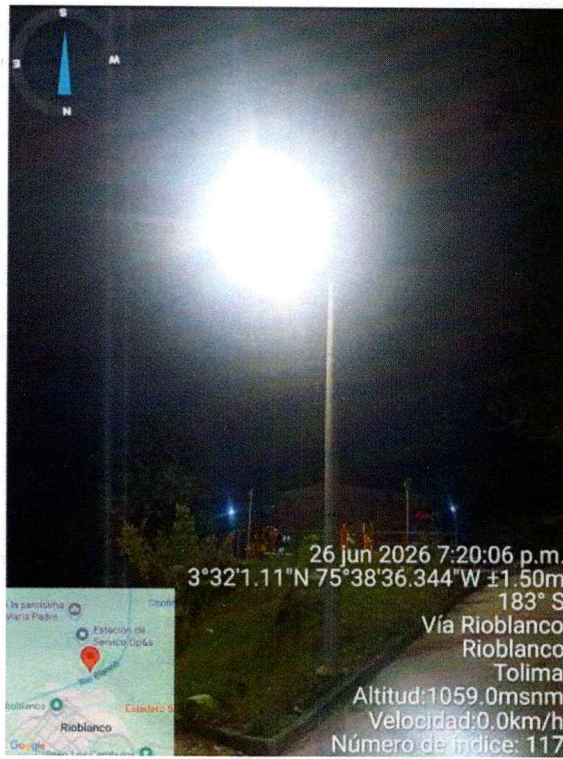


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #86

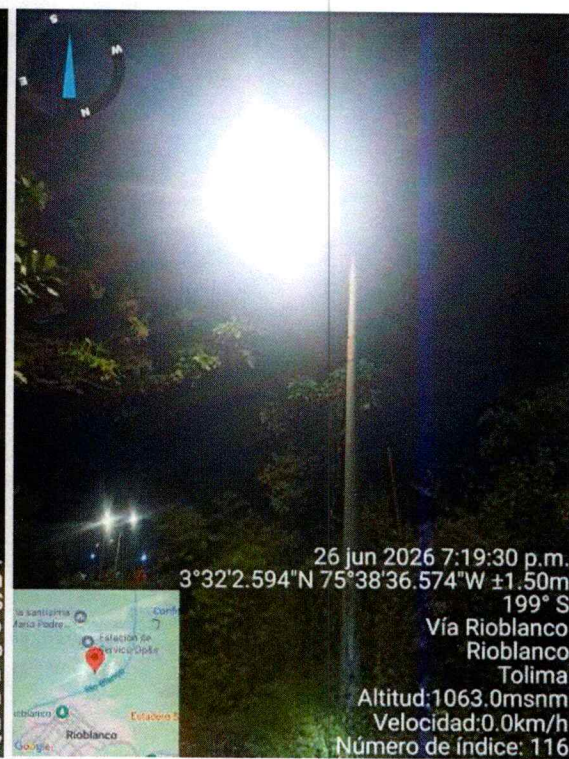

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #87

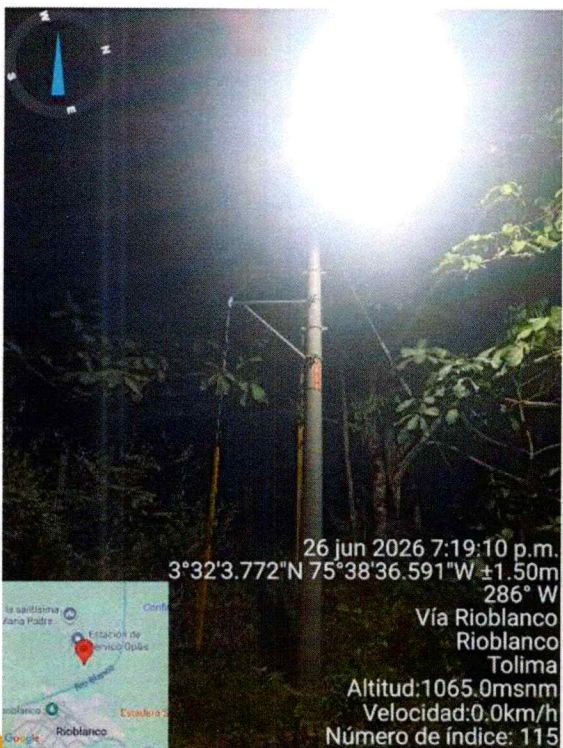

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #88

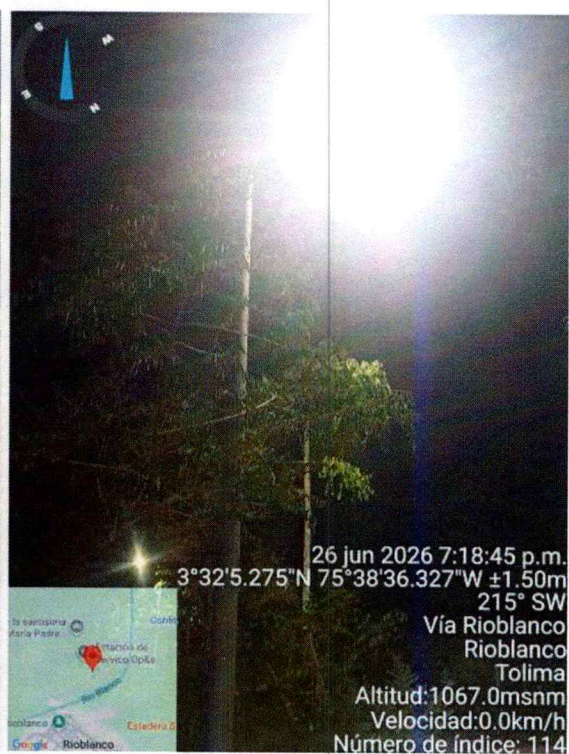


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #89




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #90




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #91

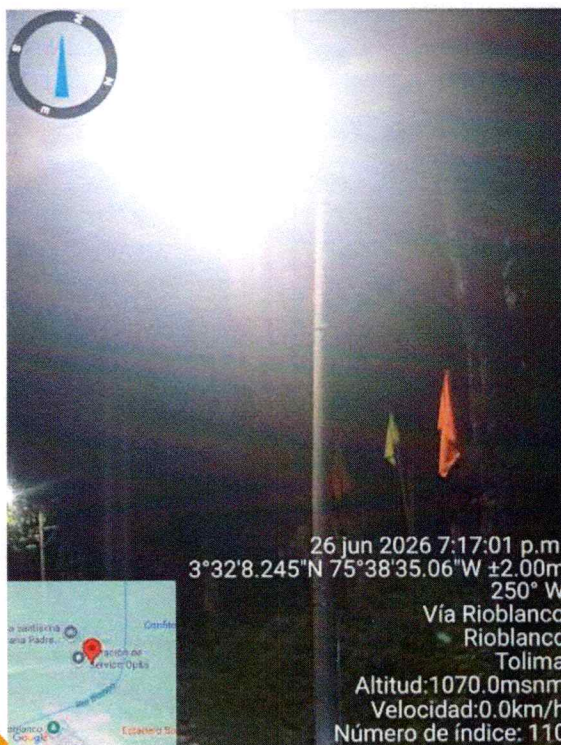


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #92

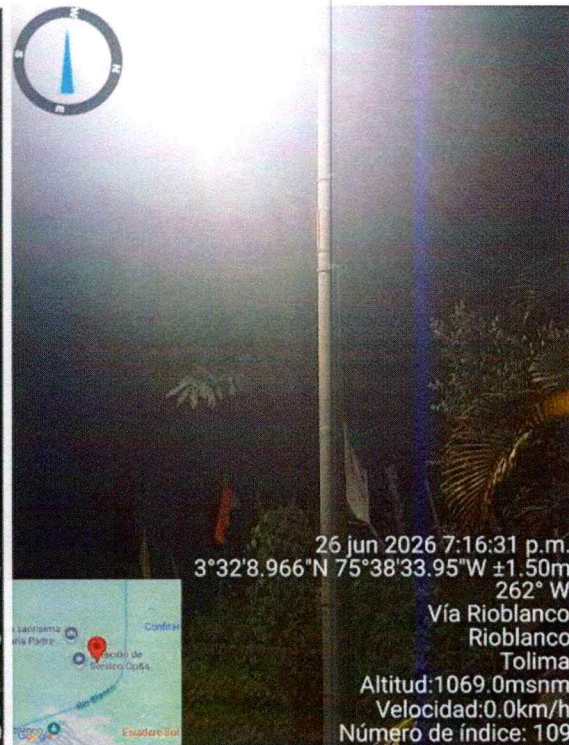


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #93

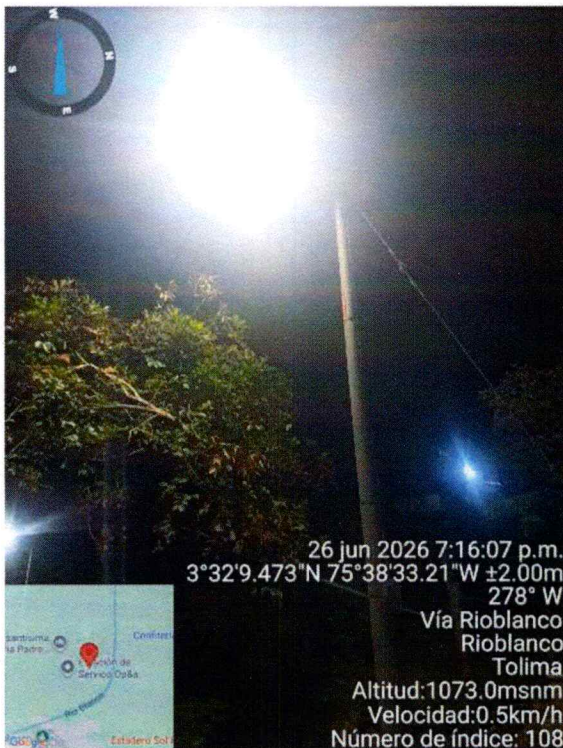


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #94

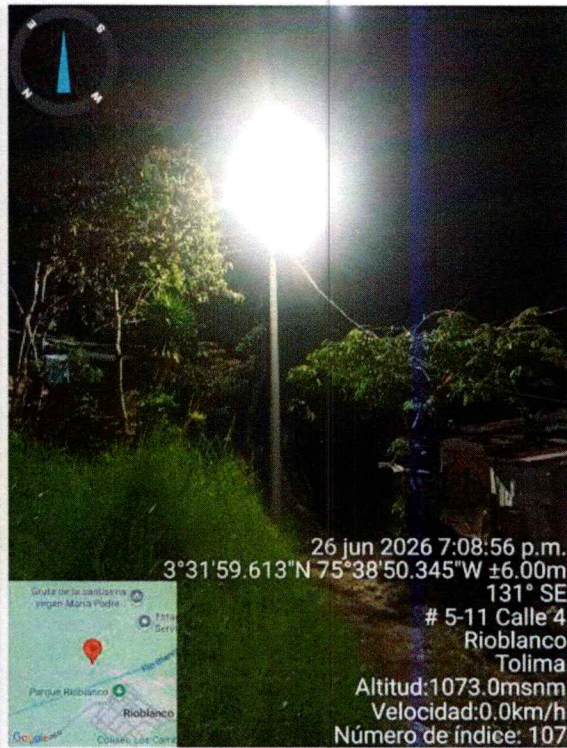


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #95

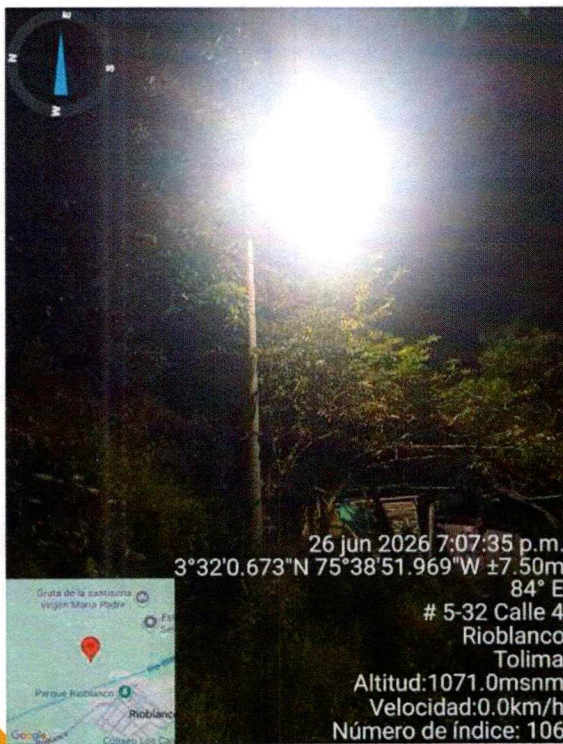

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #96

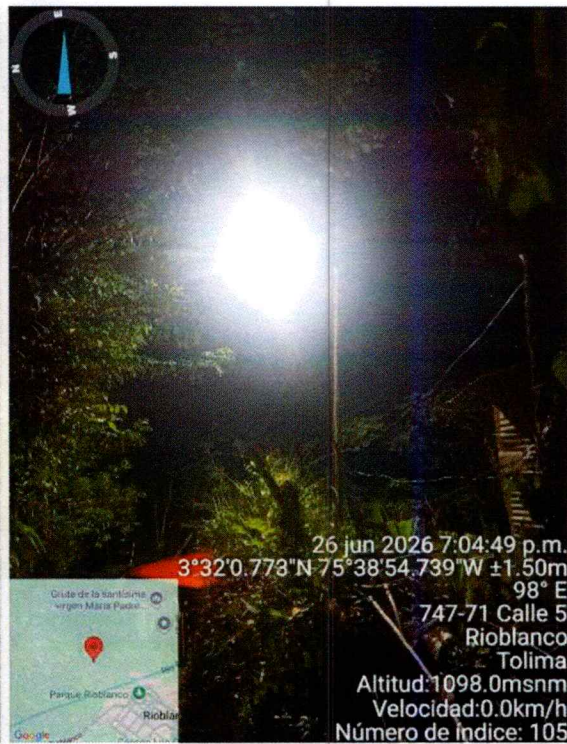


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #97

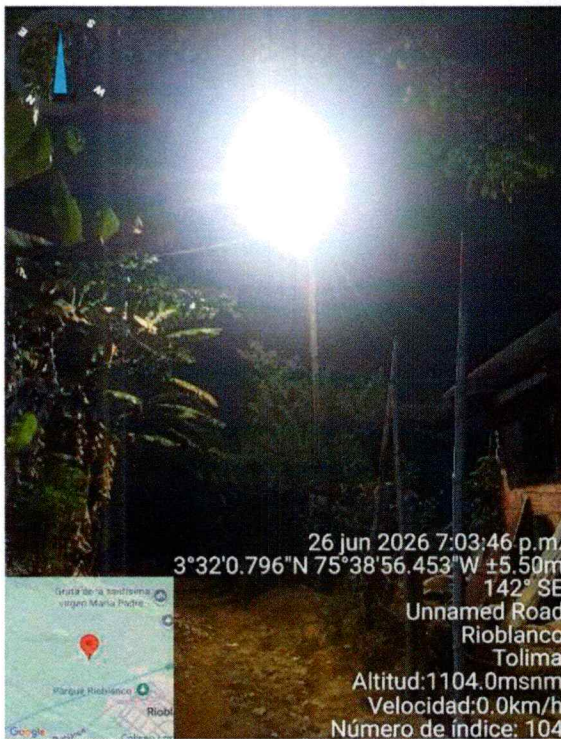


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #98




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #99

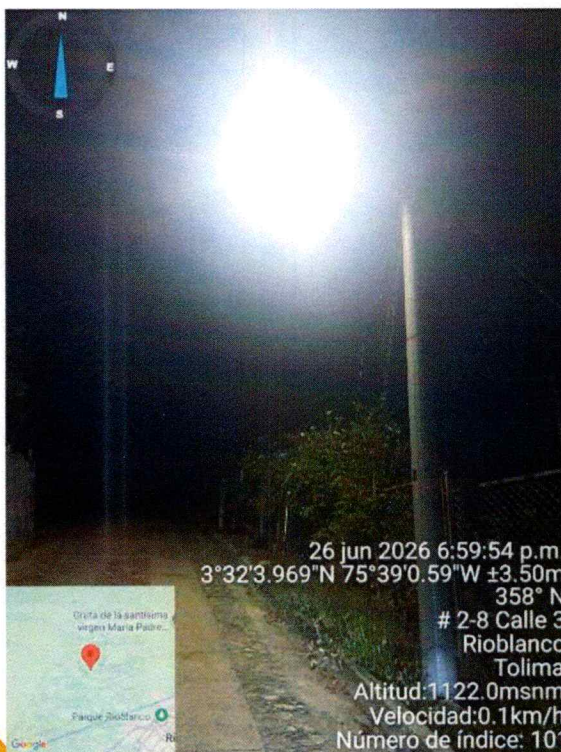

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #100

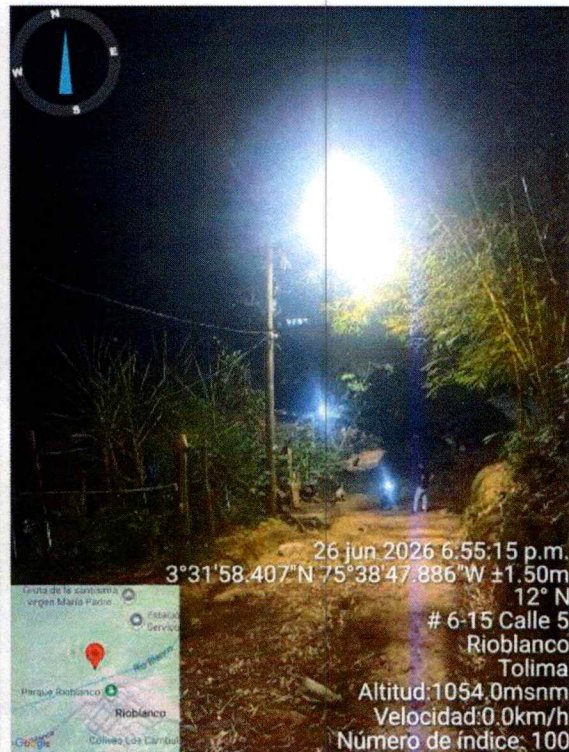


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #101

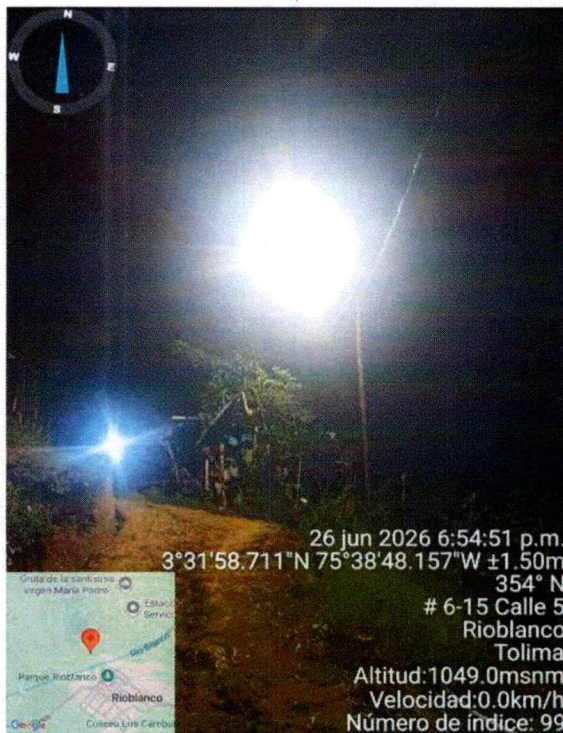


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #102



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #103

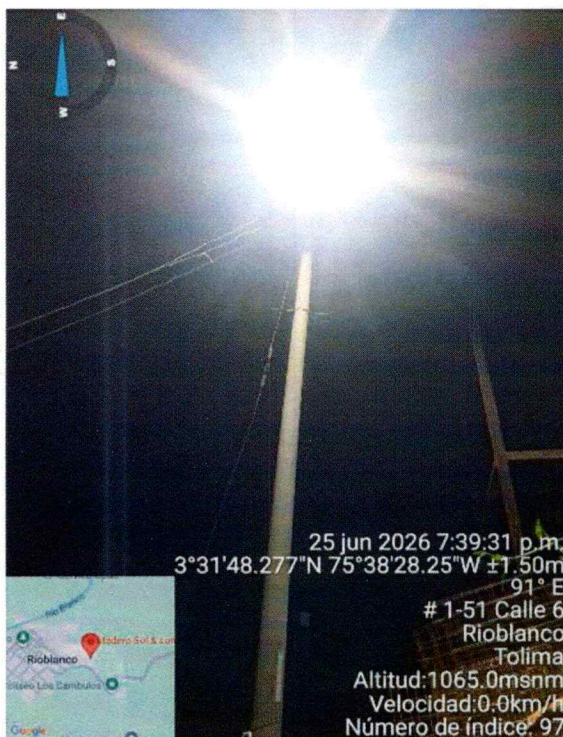


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #104

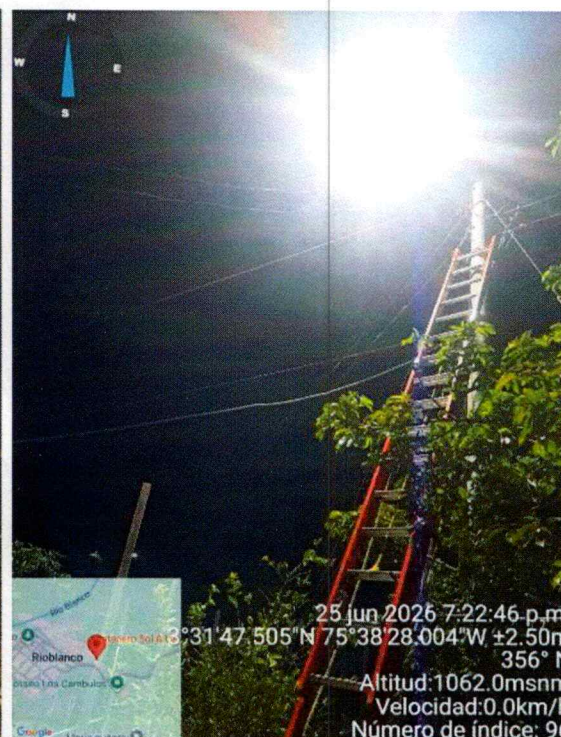

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #105




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #106

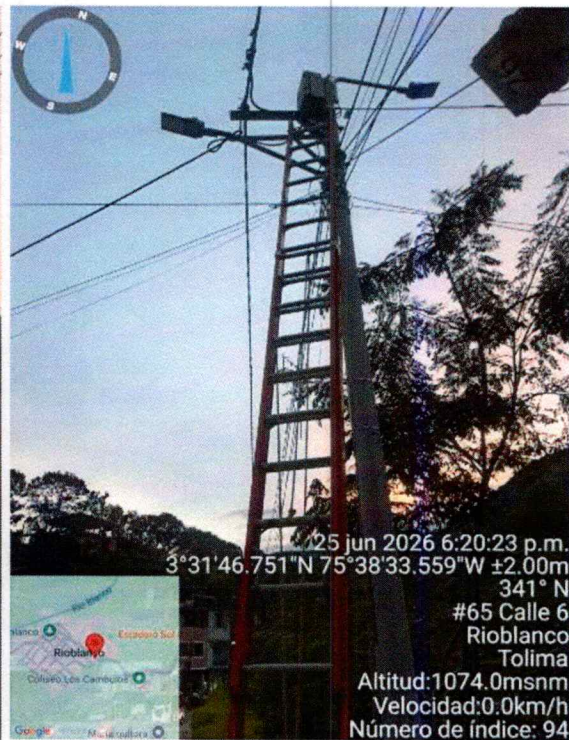

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #107



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #108

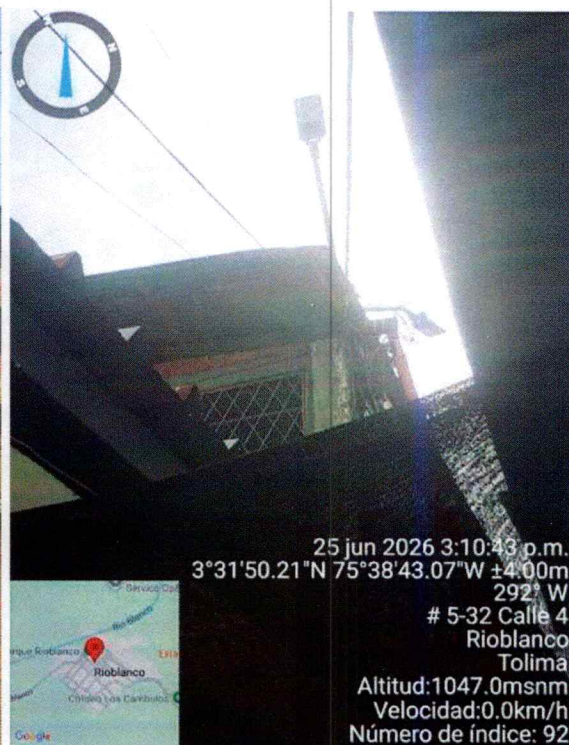

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #109



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #110



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #111



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #112




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #113



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #114



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #115

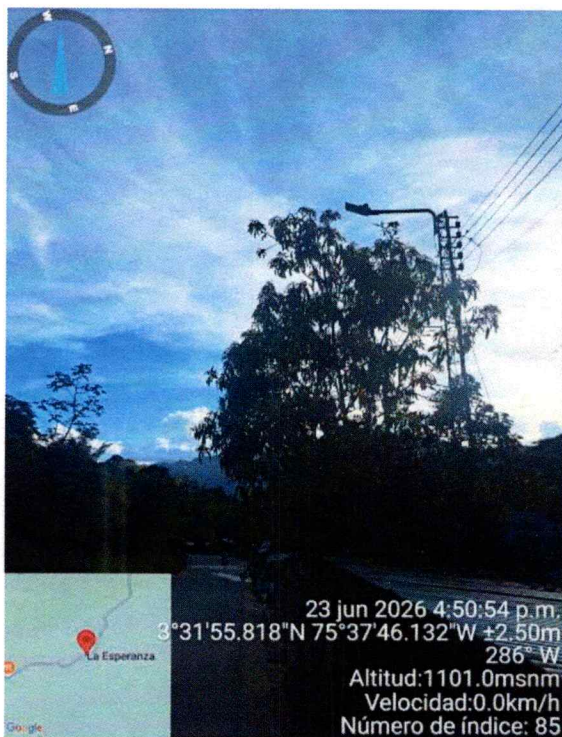


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #116




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #117




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #118

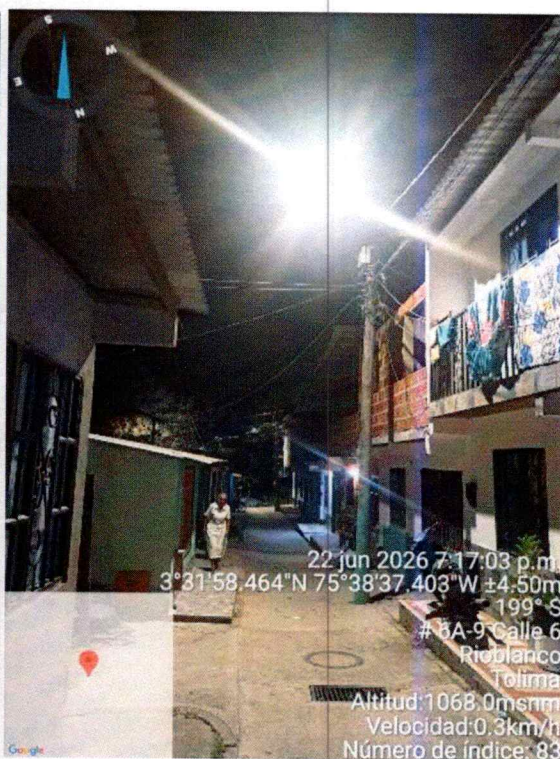


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #119

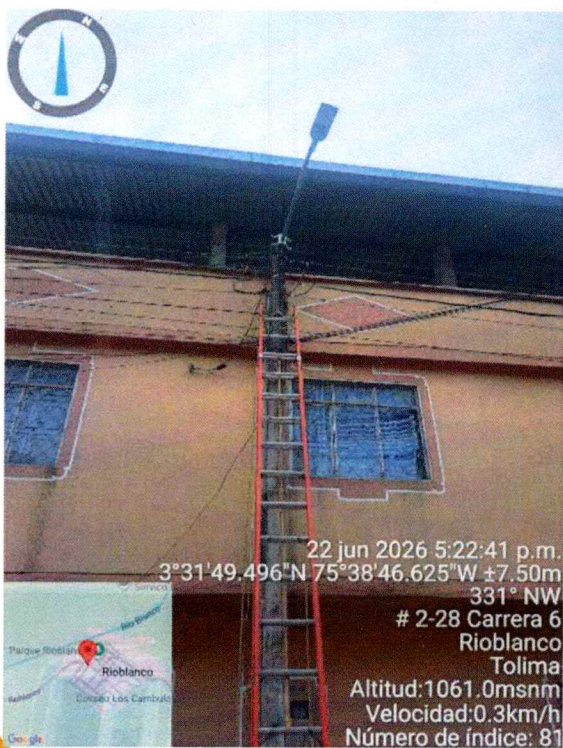


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #120

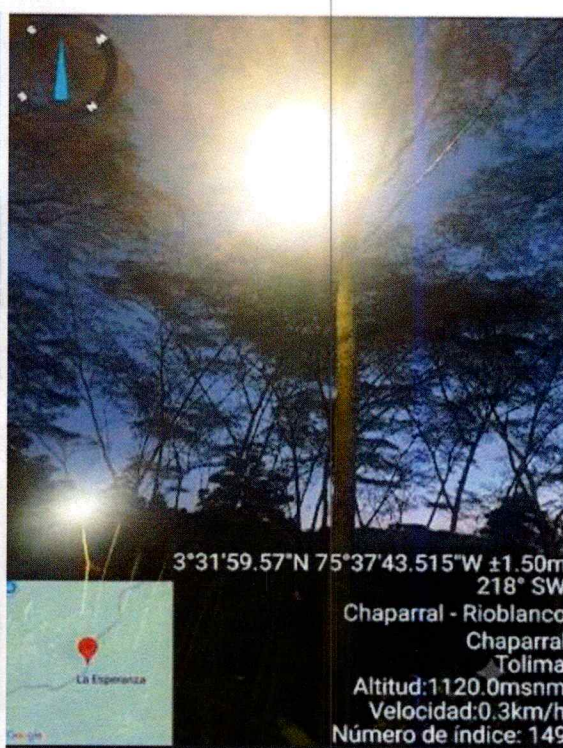

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #121

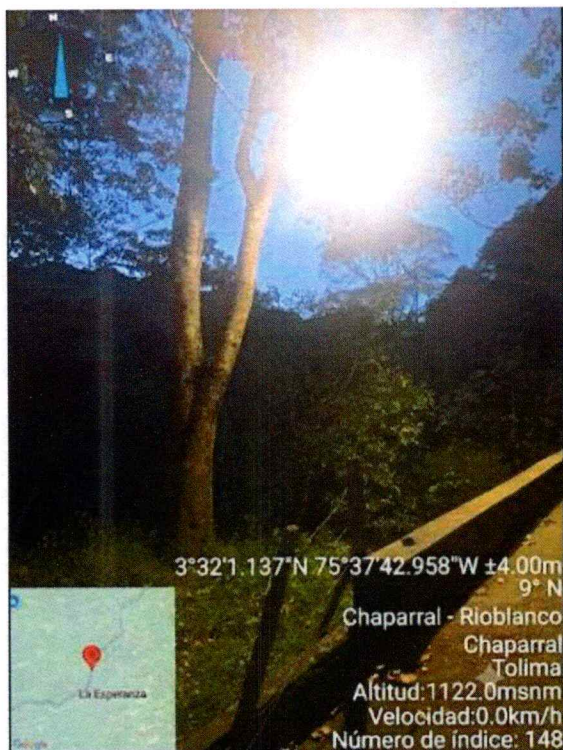

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #122

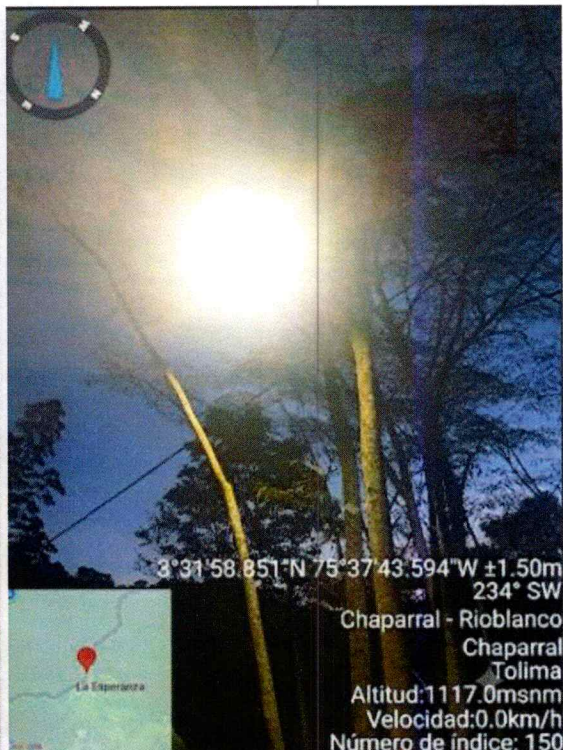


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #123




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #124



LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #125

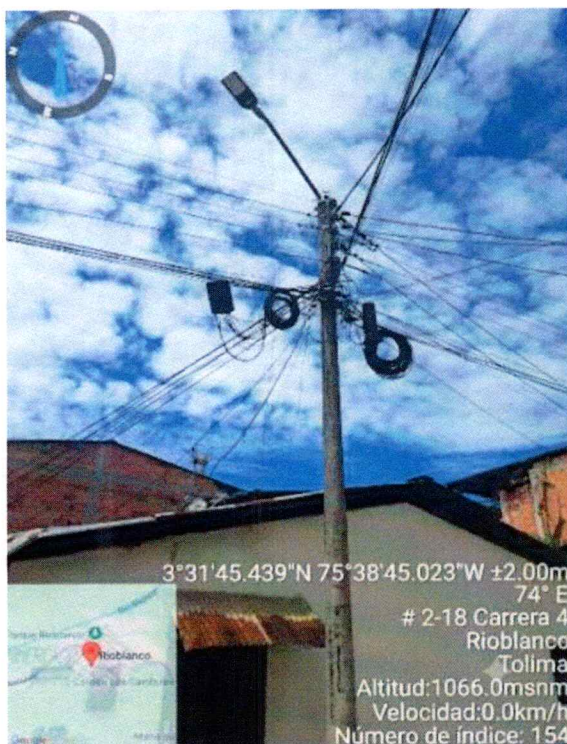

LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #126

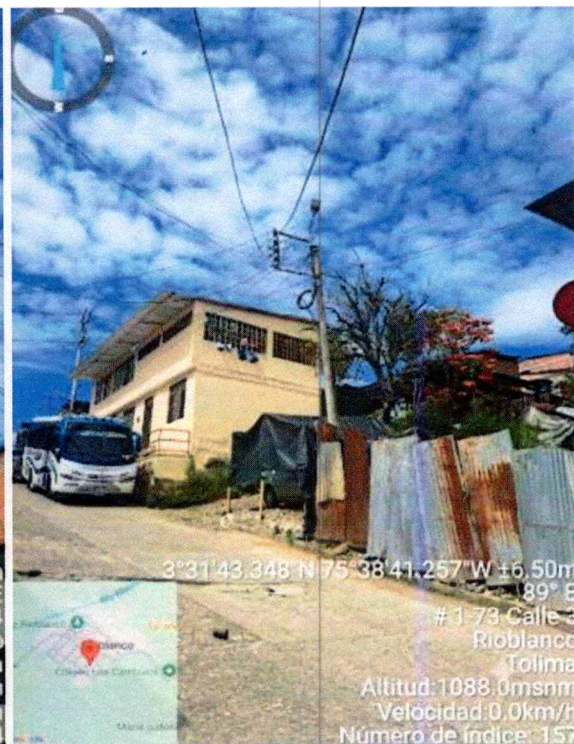


LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #127




LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO #128



BITÁCORA DE OBRA						
CIUDAD:		FECHA:			HORA:	
RIOBLANCO TOLIMA		DÍA 21	MES 5	AÑO 2026	Inicio de labores: 7:00.00 a.m.	Terminación de labores: 5:00 p.m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA:						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se firma el acta de inicio por parte del Contratista, Se da inicio formal a las actividades de modernización del alumbrado público en el sector de Herrera. La jornada comenzó con el replanteo en campo de los puntos a intervenir y el traslado de materiales. Posteriormente, se realizó el inventario del suministro LED y se inició el desmonte de luminarias obsoletas junto con la instalación, conexión y pruebas de los nuevos equipos. Las labores se desarrollaron con normalidad, bajo buen clima y cumpliendo las normas de seguridad.						
FIRMAS:						
NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


357

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD:		FECHA:			HORA:	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		23	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día nublado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización del alumbrado público en el sector de Herrera, mediante la instalación de luminarias tipo LED en los sitios de obra programados.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


358


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		24	5	2026		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA:						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
NO SE LABORA						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL				FIRMA

359


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		25	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se da continuidad a los trabajos en el sector de Herrera, avanzando con el montaje y conexión de luminarias tipo LED en los sitios programados. Las labores se ejecutaron sin contratiempos técnicos, manteniendo el cumplimiento de las normas de seguridad vial y salud en el trabajo.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: RÓMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

360


BITÁCORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		28	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día nublado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización en el sector de Herrera mediante el desmonte de redes antiguas y la instalación, conexión y pruebas de las nuevas luminarias tipo LED en los postes programados. La jornada avanzó con normalidad y bajo estrictas normas de seguridad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		27	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización del alumbrado público en el sector de Herrera, mediante la instalación de luminarias tipo LED en los sitios de obra programados.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


362

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		28	5	2026	7:00.00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES.				
Día nublado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúa la modernización del alumbrado público en el sector de Herrera, ejecutando la instalación, cableado y pruebas de las luminarias tipo LED en los puntos programados. Las actividades avanzaron a buen ritmo, con clima favorable y cumplimiento de las normas de seguridad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

363

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		29	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día nublado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se mantiene el avance en el sector de Herrera con el desmonte de equipos obsoletos y el montaje sucesivo de las nuevas luminarias tipo LED en los sitios de obra asignados. La jornada cerró con normalidad, óptimas condiciones climáticas y total seguridad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


364


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD:		FECHA:			HORA:	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		30	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES.				
Húmedo y con lluvias						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se suspendieron temporalmente las actividades programadas en el sector de Herrera debido a fuertes lluvias en la zona, las cuales impidieron el trabajo seguro en alturas y el manejo de redes eléctricas						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

365


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD	FECHA			HORA		
RIOBLANCO TOLIMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores	
	31	5	2026			
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°	SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026					
Objeto del Proyecto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA					
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA	OBSERVACIONES:					
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
NO SE LABORA						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	


366


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		1	6	2026	7:00.00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
Contrato Obra N°		SANC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES.				
Día nublado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización en el sector de Herrera mediante el desmonte de redes antiguas y la instalación, conexión y pruebas de las nuevas luminarias tipo LED en los postes programados. La jornada avanzó con normalidad y bajo estrictas normas de seguridad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		2	3	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
Contrato Obra N°		SANC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
Se da por terminada la intervención en el sector de Herrera tras completar el suministro e instalación de las luminarias tipo LED asignadas. La jornada cerró con las pruebas finales de encendido y el retiro del personal y equipos del sitio de obra, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


368

CIUDAD						BITACORA DE OBRA					
RIOBLANCO TOLIMA				DIA		MES		AÑO		HORA	
				3		6		2026		Inicio de labores 7:00:00 a. m.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS											
Contrato Obra N°				SANC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026							
Objeto del Proyecto:				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA							
ESTADO DEL CLIMA											
ESTADO DEL CLIMA				OBSERVACIONES:							
Día soleado											
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS											
PERSONAL		CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO		CANT.	OBSERVACIONES			
RESIDENTE DE OBRA		1									
TECNICO ELECTRICISTA		1									
OBSERVACIONES GENERALES											
Se da inicio formal a las actividades de modernización del alumbrado público en el Centro Poblado de Puerto Saldaña. La jornada inició con el traslado de materiales y herramientas, seguido de la verificación del inventario de luminarias tipo LED. Posteriormente inicia el desmonte de las luminarias obsoletas y la instalación, conexión y pruebas de los nuevos equipos LED en los postes programados. Las actividades se desarrollaron con normalidad, bajo condiciones climáticas favorables.											
FIRMAS											
NOMBRE		CARGO		N° MATRICULA PROFESIONAL				FIRMA			
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO		RESIDENTE DE OBRA		N° Mat. Profesional: CN205-32589							

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD	FECHA			HORA		
RIOBLANCO TOLIMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores	
	4	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°	SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026					
Objeto del Proyecto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA					
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA	OBSERVACIONES:					
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	IEPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización del alumbrado público en el Centro Poblado de Puerto Saldaña, mediante la instalación de luminarias tipo LED en los sitios de obra programados.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL		FIRMA		
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589.				

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		5	6	2026	7:00.00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se dio continuidad y cierre definitivo a los trabajos en el Centro Poblado de Puerto Saldaña tras completar el montaje de las luminarias tipo LED asignadas. La jornada finalizó con las pruebas técnicas de encendido y el retiro de equipos del sector.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


371

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		6	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC-005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA:		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se da inicio formal a las actividades de modernización del alumbrado público en el Centro Poblado de Gaitan. La jornada inició con el traslado de materiales y herramientas, seguido de la verificación del inventario de luminarias tipo LED. Posteriormente inicia el desmonte de las luminarias obsoletas y la instalación, conexión y pruebas de los nuevos equipos LED en los postes programados. Las actividades se desarrollaron con normalidad, bajo condiciones climáticas favorables.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


372

BITÁCORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		7	5	2026		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
NO SE LABORA						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	


373


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		8	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización de alumbrado público en el Centro Poblado de Gaitan, mediante la instalación de luminarias tipo LED en los sitios de obra programados.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

374

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA		HORA		
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		9	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2025				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se dio continuidad y cierre definitivo a los trabajos en el Centro Poblado de Gaitán tras completar el montaje de las luminarias tipo LED asignadas. La jornada finalizó con las pruebas técnicas de encendido y el retiro de equipos del sector.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


375


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		10	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	CEP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
Se da inicio formal a las actividades de modernización del alumbrado público en el sector de Maracaibo. La jornada comenzó con la movilización de cuadrillas, herramientas y la verificación en sitio del inventario de luminarias tipo LED. Posteriormente, se procedió con el desmonte de los equipos antiguos y el avance en la instalación, conexión y pruebas de las nuevas luminarias en los postes programados; desarrollándose las labores con normalidad y buen clima.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		11	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 095 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1	1				
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se dio continuidad y cierre definitivo a los trabajos en la vereda Maracaibo tras completar el montaje de las luminarias tipo LED asignadas. La jornada finalizó con las pruebas técnicas de encendido y el retiro de equipos del sector.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA			
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


379


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA		HORA		
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		14	6	2026		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES				
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	IEPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
NO SE LABORA						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA			


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		15	6	2025	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2025				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día nublado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	IEPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
Se da continuidad a los trabajos en la vereda La Lindosa mediante el montaje y cableado de los nuevos equipos LED en los postes asignados, desarrollándose las labores con total normalidad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA			
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		16	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
Se mantiene el desarrollo del cronograma en la vereda La Lindosa, dando continuidad al desmonte de la tecnología antigua y a la fijación de las nuevas luminarias LED. El frente técnico concentró sus labores en el cableado y conexionado eléctrico, garantizando el avance continuo de la obra según las metas establecidas.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

SITACORA DE OBRA						
CIUDAD:		FECHA:		HORA:		
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		17	3	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMIC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
Debido a las condiciones climáticas adversas y las lluvias constantes en la zona, no es posible continuar con las actividades programadas en la vereda La Lindosa hoy, priorizando ante todo la seguridad del personal.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		18	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Finalizan con éxito las actividades de modernización del alumbrado público en la vereda La Lindosa. Se completó el desmonte de los equipos antiguos y la instalación, conexión y pruebas técnicas de las luminarias tipo LED programadas, dejando el sector operando a conformidad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA			
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		19	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT	EPE	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se da inicio formal a las actividades de modernización del alumbrado público en el casco urbano del municipio. La jornada comenzó con la movilización de personal; herramientas y la verificación técnica del inventario de luminarias tipo LED. Posteriormente, se procedió con el desmonte de los equipos obsoletos y las primeras labores de instalación, conexión y pruebas de los nuevos equipos en los postes programados, desarrollándose las actividades con total normalidad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32569				


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MESES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		20	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día nublado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización en el casco urbano. El personal técnico avanzó con el desmonte progresivo de la infraestructura antigua y la instalación, conexión y pruebas de las nuevas luminarias tipo LED en los postes programados para la jornada.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMÉL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional. CN205-32589				

386


BITACORA DE OBRA						
CIUDAD:		FECHA:			HORA:	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		21	5	2028		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
Contrato Obra N°		SANC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2028				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
NO SE LABORA						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		22	5	2020	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC.005 DEL 19 DE MAYO DE 2020				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización del alumbrado público en el casco urbano. Durante la nueva jornada de trabajo, el personal avanzó con el desmonte progresivo de las luminarias obsoletas y la instalación, conexión y pruebas de los nuevos equipos LED en los postes programados para el día, desarrollándose las labores con normalidad.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


388

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		23	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC-005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES.				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades de modernización del alumbrado público en el casco urbano. En este nuevo día de labores, el personal técnico le dio seguimiento al desmonte de luminarias obsoletas, concentrando los esfuerzos en la instalación, conexión y pruebas de los equipos LED asignados para la jornada.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PEREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

390

ETIQUETA DE OBRA					
CIUDAD		FECHA		HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	
		25	5	2025	
		Inicio de labores		Terminación de labores	
		7:00:00 a. m.		5:00 p. m.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS					
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA					
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2025			
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA			
ESTADO DEL CLIMA					
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:			
Día soleado					
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS					
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.
RESIDENTE DE OBRA	1				
TECNICO ELECTRICISTA	1				
OBSERVACIONES GENERALES					
El proyecto de modernización sigue adelante en el casco urbano con un nuevo día de ejecución. Los esfuerzos se focalizaron en la instalación de luminarias LED de forma sucesiva en los postes asignados, garantizando el correcto cableado y la verificación de encendido de la nueva tecnología.					
FIRMAS					
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL		FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional. CN205-32589			


391

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		26	5	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Se da paso a un nuevo día de actividades en el casco urbano, manteniendo el ritmo de ejecución del proyecto. El foco de la jornada estuvo en la instalación de luminarias LED y su respectivo cableado en los puntos asignados, logrando un avance sostenido en la cobertura y cerrando el día con las respectivas pruebas técnicas de iluminación.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				


392

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		27	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
Avanza el proyecto en el casco urbano con un nuevo día de intervenciones en el alumbrado público. Las tareas se enfocaron en la instalación de luminarias LED de manera consecutiva, priorizando la fijación técnica de los equipos y la verificación del cableado para garantizar la estabilidad del servicio en los postes asignados.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERAARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

394

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		29	6	2025	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMG 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1					
TECNICO ELECTRICISTA	1					
OBSERVACIONES GENERALES						
Continúan las actividades en el casco urbano con una nueva jornada de labores. El foco del día estuvo centrado en la instalación de luminarias LED en los sectores programados, ejecutando el acople técnico a la red y el aseguramiento físico de los equipos para sostener el avance previsto en el proyecto.						
FIRMAS:						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA			
Nombre: ROMMEL GERARDO PEREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32583				

395

BITACORA DE OBRA						
CIUDAD		FECHA			HORA	
RIOBLANCO TOLIMA		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		30	6	2025	7:00:00 a. m.	5:00 p. m.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA						
Contrato Obra N°		SAMC.005 DEL 19 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Proyecto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA				
ESTADO DEL CLIMA						
ESTADO DEL CLIMA		OBSERVACIONES:				
Día soleado						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA						
TECNICO ELECTRICISTA						
OBSERVACIONES GENERALES						
Se culminan formalmente los trabajos correspondientes al proyecto de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA. La jornada de cierre contempló las últimas verificaciones eléctricas y ensayos de encendido a conformidad, dando por cumplido el objeto contractual en beneficio de la comunidad tanto del casco urbano como de los sectores rurales intervenidos.						
FIRMAS						
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL			FIRMA	
Nombre: ROMMEL GERARDO PÉREZ ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: CN205-32589				

CONTRATO No. SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026									
OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA".									
ACTA DE RECIBO FINAL									
CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO NIT. 890.702.040 – 7 CONTRATISTA: CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 NIT. 902.066.903-1					VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 169.954.958,00 M/CTE SUPERVISOR: SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			Fecha Presente Acta: JUNIO 30 DEL 2026	
PLAZO DE EJECUCION: Será de UN (01) mes y QUINCE (15) días, contados a partir de la Suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato					ACTA DE INICIO: 21 DE MAYO DE 2026				
En las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco - Tolima, a los TREINTA (30) días del mes de junio de 2026, se reunieron el Ing. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE, Subsecretario de Planeación e Infraestructura, como supervisor del contrato de obra, la Arq. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá como Representante Legal del CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 NIT. 902.066.903-1 en calidad de CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de Obra de la referencia.									
CANTIDADES ORIGINALES						CANTIDADES DE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO ALUMBRADO PÚBLICO LED STREET ZD229 40-60 W, 100/277V 4000K 9300LM (INCLUYE FOTOCELDA).	UND	128,00	\$ 768.504,00	\$ 98.368.512,00	128,00	\$ 98.368.512,00	0,00	\$ 0,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES BIMETALICOS	UND	384,00	\$ 6.848,00	\$ 2.629.632,00	384,00	\$ 2.629.632,00	0,00	\$ 0,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	M	256,00	\$ 19.602,00	\$ 5.018.112,00	256,00	\$ 5.018.112,00	0,00	\$ 0,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1,20 MT C/COLLARIN DE 140 MM 5"-6"	UND	44,00	\$ 151.590,00	\$ 6.669.960,00	44,00	\$ 6.669.960,00	0,00	\$ 0,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RED TRENZADA 2X4/0+2/0	M	380,00	\$ 42.283,00	\$ 16.067.540,00	380,00	\$ 16.067.540,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 128.753.756,00		\$ 128.753.756,00		\$ 0,00
ADMINISTRACION				26%	\$ 33.475.977,00		\$ 33.475.977,00		\$ 0,00
IMPREVISTOS				2%	\$ 2.575.075,00		\$ 2.575.075,00		\$ 0,00
UTILIDAD				4%	\$ 5.150.150,00		\$ 5.150.150,00		\$ 0,00
TOTAL AIU				32%	\$ 41.201.202,00		\$ 41.201.202,00		\$ 0,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 169.954.958,00		\$ 169.954.958,00		\$ 0,00
BALANCE CONTRATO DE OBRA:									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 169.954.958,00				
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL					\$ 169.954.958,00				
SALDO POR EJECUTAR					\$ 0,00				
SUMAS IGUALES					\$ 169.954.958,00			\$ 169.954.958,00	
 ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE Subsecretario de Planeación e Infraestructura Supervisor de la SAMC 005 DEL 2026 CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 NIT. 902.066.903-1 R.L. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá CONTRATISTA									

396



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT. 890.702.040-7
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	30-jun-26
CONTRATISTA	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 NIT. 902.066.903-1 Representante Legal LUZ PAULA CRUZ LOAIZA C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	005 DEL 2026

ITEM	1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES BIMETALICOS	UND	UND	UBICACIÓN	SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	
		Descripción	Dimensiones			Cantidad por Luminaria	Total
			Cantidad	Ancho	Alto		
		LUMINARIAS SECTOR DE HERRERA	30,00			3,00	90,00
		LUMINARIAS CENTRO POBLADO DE PUERTO SALDAÑA	10,00			3,00	30,00
		LUMINARIAS CENTRO POBLADO DE GAITAN	10,00			3,00	30,00
		LUMINARIAS VEREDA MARACAIBO	5,00			3,00	15,00
		LUMINARIAS VEREDA LA LINDOSA	15,00			3,00	45,00
		LUMINARIAS CASCO URBANO	58,00			3,00	174,00
OBSERVACIONES:			TOTAL				384,00

Paula Cruz.
CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT. 902.066.903-1
R.L. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá
CONTRATISTA

Juan Mauricio Penagos A
ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
Subsecretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor de la SAMC 005 DEL 2026



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT. 890.702.040-7
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	30-jun-26
CONTRATISTA	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 NIT. 902.066.903-1 Representante Legal LUZ PAULA CRUZ LOAIZA C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	005 DEL 2026

ITEM	1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	UND	M	UBICACIÓN	SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	
		Descripción	Dimensiones			Longitud por Luminaria	Total
			Cantidad	Ancho	Alto		
		LUMINARIAS SECTOR DE HERRERA	30,00			2,00	60,00
		LUMINARIAS CENTRO POBLADO DE PUERTO SALDAÑA	10,00			2,00	20,00
		LUMINARIAS CENTRO POBLADO DE GAITAN	10,00			2,00	20,00
		LUMINARIAS VEREDA MARACAIBO	5,00			2,00	10,00
		LUMINARIAS VEREDA LA LINDOSA	15,00			2,00	30,00
		LUMINARIAS CASCO URBANO	58,00			2,00	116,00
OBSERVACIONES:							
			TOTAL				256,00

Paula Cruz

CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT. 902.066.903-1
R.L. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá
CONTRATISTA

Ivan Mauricio Penagos A

ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
Subsecretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor de la SAMC 005 DEL 2026



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT. 890.702.040-7
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	30-jun-26
CONTRATISTA	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 NIT. 902.066.903-1 Representante Legal LUZ PAULA CRUZ LOAIZA C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	005 DEL 2026

ITEM	1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1,20 MT C/COLLARIN DE 140 MM 5*-6*	UND	UND	UBICACIÓN	SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	
		Descripción	Dimensiones			Cantidad	Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		SECTOR DE SAN JORGE				10,00	10,00
		CALLE ALTERNA PARA LLEGAR AL HOSPITAL (CASCO URBANO)				6,00	6,00
		BARRIO LAS BRISAS PARTE ALTA (CASCO URBANO)				2,00	2,00
		BARRIO BELLO HORIZONTE (CASCO URBANO)				1,00	1,00
		SECTOR DE HERRERA				16,00	16,00
		CENTRO POBLADO DE PUERTO SALDAÑA				9,00	9,00
OBSERVACIONES:			TOTAL				44,00

Paula Cruz
CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT. 902.066.903-1
R.L. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá
CONTRATISTA

Ing. Ivan Mauricio Penagos Andrade
ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
Subsecretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor de la SAMC 005 DEL 2026



Ministarstvo
Prosvete i
Naučne
Kulture
Republike
Srbije



OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	30-jun-26
CONTRATISTA	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 NIT. 902.066.903-1 Representante Legal LUZ PAULA CRUZ LOAIZA C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	005 DEL 2026

ITEM	1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RED TRENZADA 2X4/0+2/0	UND	M	UBICACIÓN	SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO	
	Descripción		Dimensiones			Cantidad	Total
		Longitud	Ancho	Alto			
	SECTOR DE SAN JORGE		250,00				250,00
	BARRIO SAN JOSE (CASCO URBANO)		60,00				60,00
	SECTOR LOS NARANJOS (CASCO URBANO)		70,00				70,00
OBSERVACIONES:		TOTAL					380,00

Paula Cruz.

CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT. 902.066.903-1
R.L. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá
CONTRATISTA

Isin Maunio Peragos

ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
Subsecretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor de la SAMC 005 DEL 2026

402



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101214214	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
01 07 2026	19 05 2026		00:00	09 07 2029		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026	IDENTIFICACIÓN NIT: 902.066.903-1
DIRECCIÓN: CR 5 1 58 BRR LUCITANIA	CIUDAD: CARMEN APICALA, TOLIMA
	TELÉFONO: 3228480382

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE RIOBLANCO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.040-7
DIRECCIÓN: CRA. 5 NO. 4-25 B CENTRO	CIUDAD: RIOBLANCO, TOLIMA
	TELÉFONO: 098-2256032

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-005 DEL 19 DE MAYO DE 2026, REFERENTE A: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2026	09/11/2026	\$16,995,495.80	\$16,995,495.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/05/2026	09/07/2029	\$3,497,747.90	\$8,497,747.90
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	19/05/2026	09/01/2027	\$16,995,495.80	\$16,995,495.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	*SI AMPARA 2 AÑOS 0 MESES Y 0 DIAS		\$16,995,495.80	

ACLARACIONES

*ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DEL 30 DE JUNIO DE 2026 DONDE SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO DE LA OBRA A SATISFACCION Y SE DA INICIO AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR EL TERMINO DE 2 AÑOS A PARTIR DEL 30/06/2026 HASTA 30/06/2028.

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****59,484,235.30	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101214214

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLP164113A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

403



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101214214		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 01 07 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 05 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 09 07 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026		IDENTIFICACIÓN NIT: 902.066.903-1	
DIRECCIÓN: CR 5 1 58 BRR LUCITANIA		CIUDAD: CARMEN APICALA, TOLIMA	
		TELÉFONO: 3228480382	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE RIOBLANCO		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.040-7	
DIRECCIÓN: CRA. 5 NO. 4-25 B CENTRO		CIUDAD: RIOBLANCO, TOLIMA	
		TELÉFONO: 398-2256032	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

RODRIGUEZ ALMANZA ANDRES FELIPE

LEGION DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

IDENTIFICACION

1106396744

901376179-1

PARTICIPACION

50.00

50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101214214

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164113A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

404



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-40-101056969		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
01 07 2026			19 05 2026			00:00	09 07 2026			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026								IDENTIFICACIÓN NIT: 902.066.903-1			
DIRECCIÓN: CR 5 1 58 BRR LUCITANIA						CIUDAD: CARMEN APICALA, TOLIMA			TELÉFONO: 3228480382		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE RIOBLANCO			IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.040-7	
DIRECCIÓN: CRA. 5 NO. 4-25 B CENTRO		CIUDAD: RIOBLANCO, TOLIMA		TELÉFONO098-2256032
BENEFICIARIO: 890702040 - MUNICIPIO DE RIOBLANCO				

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJAN DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-005 DEL 19 DE MAYO DE 2026, REFERENTE A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES											
AMPAROS		DEDUCIBLE		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG ACTUAL		SUMA ASEG ANTERIOR	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV		19/05/2026		09/07/2026		\$350,181,000.00		\$350,181,000.00	

ACLARACIONES

SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DEL 30 DE JUNIO DE 2026 DONDE SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO DE LA OBRA A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN CORREGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101056969

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF164113A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-40-101056969		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN	DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
01	07	2026	19	05	2026	00:00	09	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026								IDENTIFICACIÓN NIT: 902.066.903-1			
DIRECCIÓN: CR 5 1 58 BRR LUCITANIA						CIUDAD: CARMEN APICALÁ, TOLIMA			TELÉFONO: 3228480382		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE RIOBLANCO										IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.040-7																								
DIRECCIÓN: CRA. 5 NO. 4-25 B CENTRO															CIUDAD: RIOBLANCO, TOLIMA										TELÉFONO: 098-2256032									
BENEFICIARIO:																																		

Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona
el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias


Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****350,181,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

406



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-40-101056969		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 01 07 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 05 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 09 07 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026	IDENTIFICACIÓN NIT: 902.066.903-1
DIRECCIÓN: CR 5 1 58 BRR LUCITANIA	CIUDAD: CARMEN APICALA, TOLIMA
TELÉFONO: 3228480382	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE RIOBLANCO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.040-7
DIRECCIÓN: CRA. 5 NO. 4-25 B CENTRO	CIUDAD: RIOBLANCO, TOLIMA
TELÉFONO: 998-2256032	
BENEFICIARIO: 890702040 - MUNICIPIO DE RIOBLANCO	

TEXTO ACLARATORIO		
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RODRIGUEZ ALMANZA ANDRES FELIPE	1106396744	50.00
LEGION DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	901376179-1	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101056969

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164113A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NIT
8999999034

Medio de Pago
NEQUI

Nro. Transacción
165103397

No. Autorización/CUS
435559424

Fecha y Hora
30/06/2026

492

Número de Identificación

902066903

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

1

Departamento

TOLIMA

Dirección de Domicilio

Cra. 5 No. 1-58 Barrio: Lucitania

Localización

Nacional

Correo electrónico

legionconstrucciones@gmail.com

Regional

Tolima

Número Licencia de Obra

SAMC 005 DEL 19 DE MAYO

Nombre Obra

LUMINARIAS RIOBLANCO

Fecha Terminación Obra

30/06/2026

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total Mano de Obra

15000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

IBAGUE (TOLIMA)

Ciudad de Domicilio

Cra. 5 No. 1-58 Barrio: Lucita

Teléfono de Contacto

+57,3228480382

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-073-000000

Número Contrato de Obra

SAMC 005 DEL 19 DE MAYO

Fecha Inicio Obra

21/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra

RIOBLANCO TOLIMA

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

169954968.00

Número de Trabajadores en el Periodo

1

Aporte FIC

43773.00

Valor del Pago

43773.00

COMPROBANTE

413

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	165103397	435559424	30/06/2026

Razón Social: **SENA**Usuario Pagador: **902066903**Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**Dirección IP: **186.148.182.114****Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**Total Pagado **\$ 43,773.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 43,773.00	COP\$ 43,773.00

RELACIÓN DE PERSONAL
CONTRATO No. SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026

414

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO	PLANILLA MAYO DEL 2026
ELECTRICISTA	MENDEZ URIBE EDWIN ARLES	1111335690	6025934350
RESIDENTE DE OBRA	PEREZ ACEVEDO ROMMEL GERARDO	11188079	6025934350
DIRECTOR DE OBRA	URIBE MARTINEZ DIEGO MARIO	4377272	6025934350
PROFESIONAL AMBIENTAL	GUEVARA GAVIRIA LUIS CARLOS	83180617	6025934350

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO	PLANILLA JUNIO DEL 2026
ELECTRICISTA	MENDEZ URIBE EDWIN ARLES	1111335690	1751393708
RESIDENTE DE OBRA	PEREZ ACEVEDO ROMMEL GERARDO	11188079	1751393708
DIRECTOR DE OBRA	URIBE MARTINEZ DIEGO MARIO	4377272	1751393708
PROFESIONAL AMBIENTAL	GUEVARA GAVIRIA LUIS CARLOS	83180617	1751393708

Por medio del presente documento, el **CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026** adjunta el listado del personal asignado al proyecto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA"**. El Contratista certifica que dicho personal cumple con los requisitos legales y de seguridad social, asumiendo toda responsabilidad laboral sobre el mismo.

El presente documento se suscribe a los (01) días del mes de julio de 2026.


CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT 902.066.903-1
R.L. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
C.C. 1.106.309.638 de Carmen de Apicalá
CONTRATISTA



ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

INFORME DE
SUPERVISIÓN

**INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE OBRA SAMC 005
DEL 19 DE MAYO DEL 2026**

CONTRATO No:	SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT:	890702040-7
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT.	902.066.903-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
CEDULA:	No. 1.106.309.638 DE CARMEN DE APICALÁ
CDP:	2026000223 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
RP:	2026000346 DEL 21 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE PRORROGA N.1:	19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA N.1:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL:	UN (01) MES Y QUINCE DÍAS (15) CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe del acta de recibo final del periodo comprendido entre el 21 de MAYO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 que contiene la ejecución física y financiera de la SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026, la cual tiene por objeto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO**

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2


INFORME DE
SUPERVISIÓN

LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA. desarrollado en el Municipio de Rioblanco – Tolima.


2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

LOCALIZACIÓN:

Este proyecto se ubica en el Municipio de Rioblanco, específicamente en la zona urbana y rural.

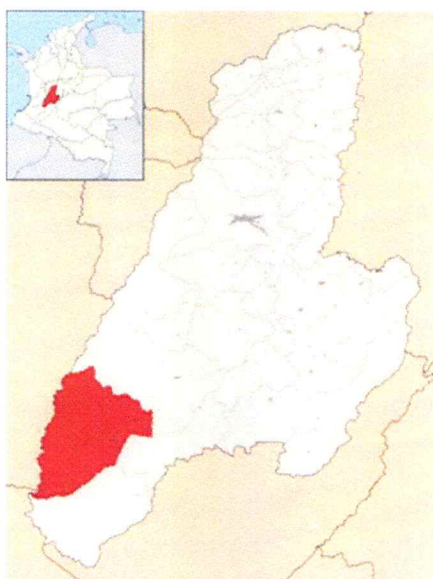

Fuente: Wikipedia.

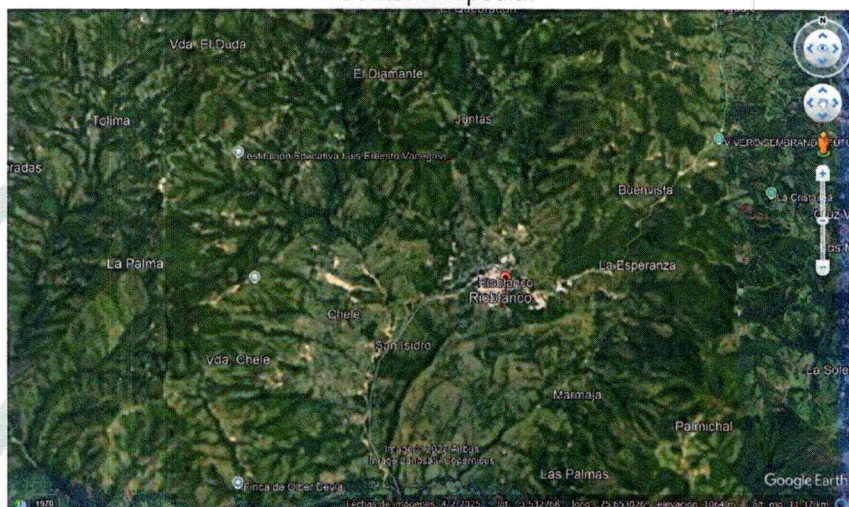

Fuente: Google Earth 2026

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7
Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro
alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co
<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>

425



ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

INFORME DE
SUPERVISIÓN

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Antecedentes:

- Se firma Contrato correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha diecinueve (19) del mes de mayo de 2026.
- Se firma Acta de Inicio correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha veintiuno (21) del mes de mayo de 2026.
- Se firma Acta de Prorroga No.1 correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha diecinueve (19) del mes de junio de 2026. por un término de quince (15) días calendario.
- Se firma Acta de Recibo Final correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha treinta (30) del mes de junio de 2026.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA PRESENTE ACTA.

CANTIDADES ORIGINALES						CANTIDADES DE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO ALUMBRADO PÚBLICO LED STREET ZD229 40-60 W, 100/277V 4000K 9300LM (INCLUYE FOTOCELDA).	UND	128,00	\$ 768.504,00	\$ 98.368.512,00	128,00	\$ 98.368.512,00	0,00	\$ 0,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES BIMETÁLICOS	UND	384,00	\$ 6.848,00	\$ 2.629.632,00	384,00	\$ 2.629.632,00	0,00	\$ 0,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	M	256,00	\$ 19.602,00	\$ 5.018.112,00	256,00	\$ 5.018.112,00	0,00	\$ 0,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1,20 MT C/COLLARIN DE 140 MM 5"-6"	UND	44,00	\$ 151.590,00	\$ 6.669.960,00	44,00	\$ 6.669.960,00	0,00	\$ 0,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RED TRENZADA 2X4/0+2/0	M	380,00	\$ 42.283,00	\$ 16.067.540,00	380,00	\$ 16.067.540,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 128.753.756,00		\$ 128.753.756,00		\$ 0,00
ADMINISTRACIÓN				26%	\$ 33.475.977,00		\$ 33.475.977,00		\$ 0,00
IMPREVISTOS				2%	\$ 2.575.075,00		\$ 2.575.075,00		\$ 0,00
UTILIDAD				4%	\$ 5.150.150,00		\$ 5.150.150,00		\$ 0,00
TOTAL AIU				32%	\$ 41.201.202,00		\$ 41.201.202,00		\$ 0,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 169.954.958,00		\$ 169.954.958,00		\$ 0,00

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

INFORME DE
SUPERVISIÓN

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Para el presente proceso se utilizó la SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026 de acuerdo con lo establecido por la ley de contratación.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Estado financiero y económico del contrato:

BALANCE CONTRATO DE OBRA:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 169.954.958,00	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 169.954.958,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 169.954.958,00	\$ 169.954.958,00

BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del pago anticipado	\$0,00	0.00%	Valor inicial del Contrato	\$ 169.954.958,00	
			Valor presente acta (Acta de Recibo Final)		\$ 169.954.958,00
			Saldo por ejecutar		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$0,00	0.00%	SUMAS IGUALES	\$ 169.954.958,00	\$ 169.954.958,00

4. ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Se anexa el respectivo registro fotográfico de las actividades realizadas por parte del contratista de obra que son avaladas por parte de la supervisión del proyecto:

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



ALCALDÍA DE
RIOBLANCO
TOLIMA




DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2


INFORME DE
SUPERVISIÓN

1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO ALUMBRADO PÚBLICO LED STREET ZD229 40-60 W, 100/277V 4000K 9300LM (INCLUYE FOTOCELDA).

Registro fotográfico 1

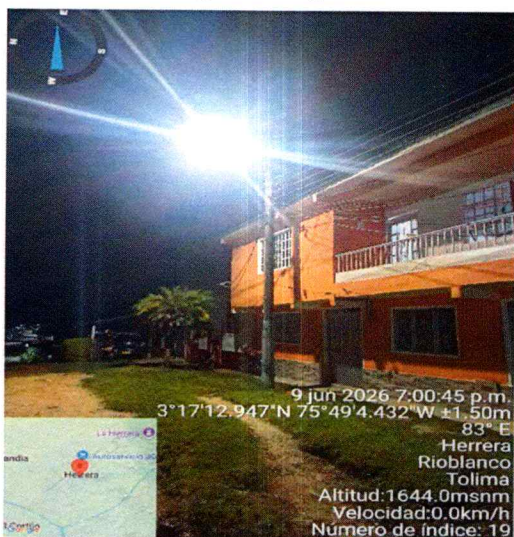


Registro fotográfico 2

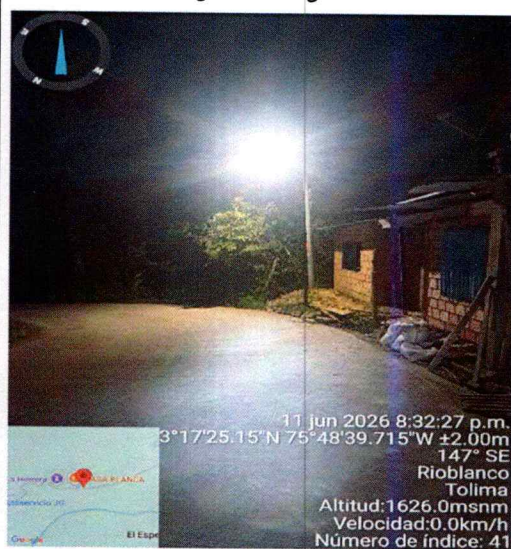


1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES BIMETÁLICOS

Registro fotográfico 3

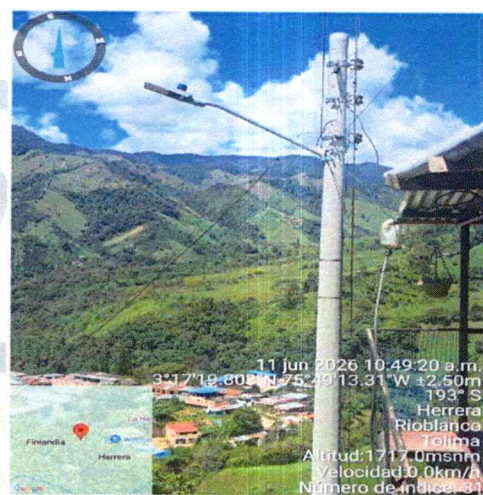

Registro fotográfico 4

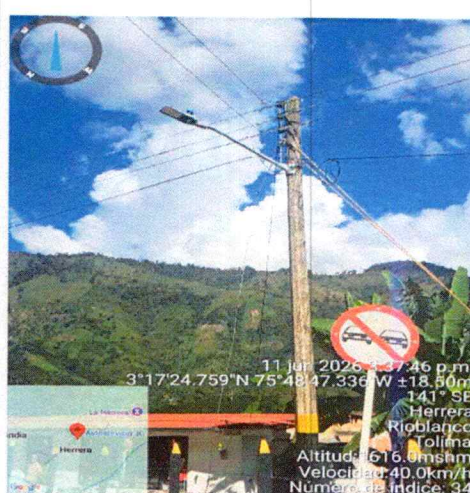

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



ALCALDÍA DE
RIOBLANCO
TOLIMA



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2


INFORME DE
SUPERVISIÓN

1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12

Registro fotográfico 5




Registro fotográfico 6

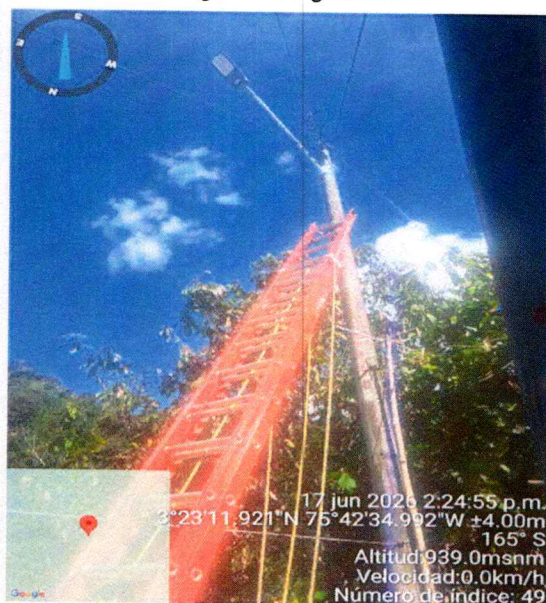

1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1,20 MT C/COLLARIN DE 140 MM 5*-6*

Registro fotográfico 7

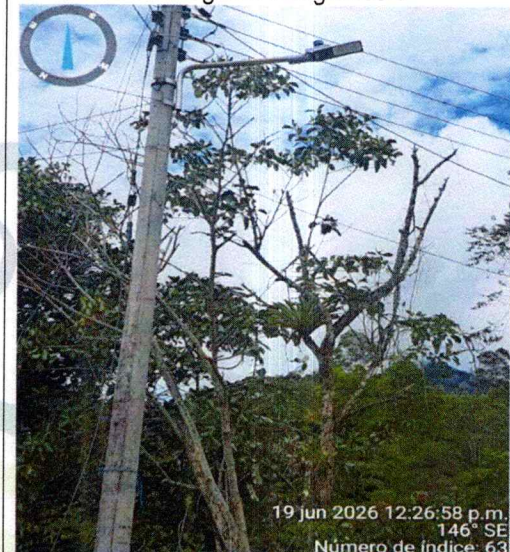

Registro fotográfico 8



Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**




DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

INFORME DE
SUPERVISIÓN

1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RED TRENZADA 2X4/0+2/0

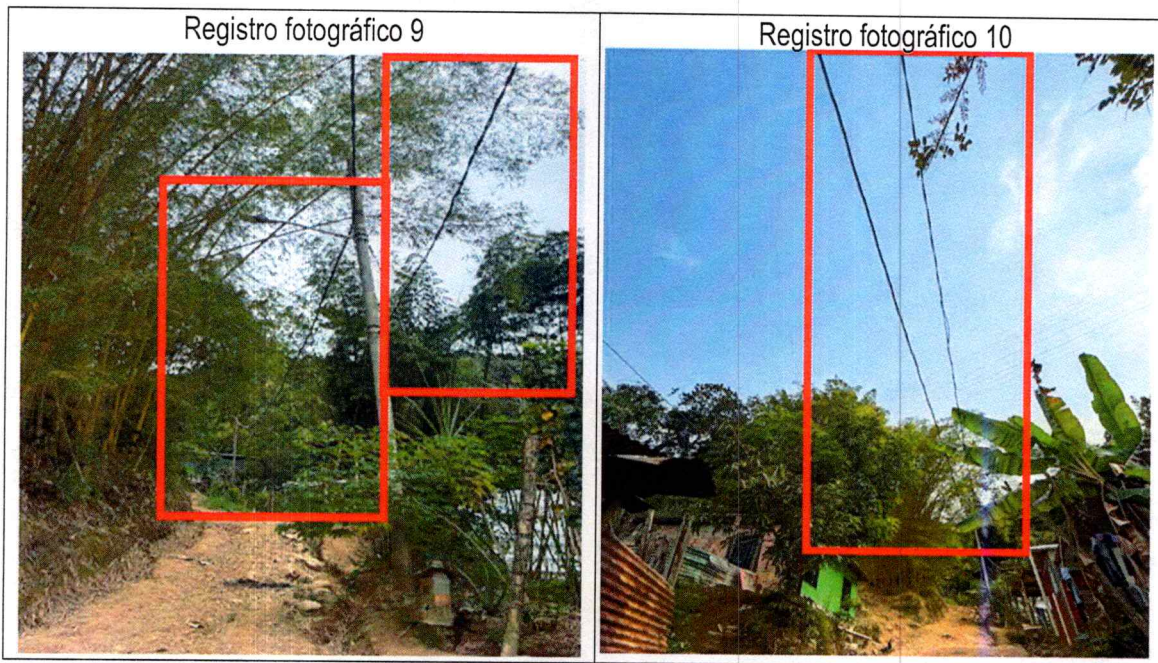

Como se observa en las imágenes, las actividades se ejecutaron con éxito, cumpliendo lo especificado en el contrato de obra SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026.

Iván Mauricio Penagos A

ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE

Subsecretario de Planeación e Infraestructura.

Supervisor del contrato SAMC -005-2026

PROCESO	NOMBRE	CARGO	FECHA
Proyecto y Elaboró	Andrés Camilo Rojas Montoya	Ingeniero Civil de apoyo / Oficina de planeación e infraestructura	30/06/2026
Aprobó	Iván Mauricio Penagos Andrade	Subsecretario de Planeación e Infraestructura	30/06/2026

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

ACTA DE RECIBO
FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE OBRA SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026

CONTRATO No:	SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT:	890702040-7
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT.	902.066.903-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
CEDULA:	No. 1.106.309.638 DE CARMEN DE APICALÁ
CDP:	2026000223 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
RP:	2026000346 DEL 21 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE PRORROGA N.1:	19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA N.1:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL:	UN (01) MES Y QUINCE DIAS (15) CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal De Rioblanco, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, se reunieron el Ingeniero **IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE**, Subsecretario de Planeación e Infraestructura, en calidad de supervisor del contrato de obra, por una parte y por la otra el **CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026** con NIT. 902.066.903-1, Representante legal, **LUZ PAULA CRUZ LOAIZA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.106.309.638 de Carmen de Apicala

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

ACTA DE RECIBO
FINAL

Tolima, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** correspondiente a la **SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026**, en los siguientes términos:

En calidad de supervisor certifico que las actividades realizadas por el **CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026** en el marco del contrato de obra **SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026**, cuyo objeto contractual es "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA**", se ejecutó en conformidad a lo establecido en el contrato y anexos que hacen parte integral del mismo, por esta razón, se procede a autorizar el pago del **ACTA DE RECIBO FINAL** por un valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE.**
BALANCE FINANCIERO.

Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE CONTRATO DE OBRA:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 169.954.958,00	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 169.954.958,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 169.954.958,00	\$ 169.954.958,00

BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del pago anticipado	\$0,00	0.00%	Valor inicial del Contrato	\$ 169.954.958,00	
			Valor presente acta (Acta de Recibo Final)		\$ 169.954.958,00
			Saldo por ejecutar		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$0,00	0.00%	SUMAS IGUALES	\$ 169.954.958,00	\$ 169.954.958,00

El contratista acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. para lo cual anexan planillas y certificado del contador.

BALANCE TÉCNICO

De acuerdo con el informe de ejecución de obra del **CONTRATISTA**, el contratista cumplió con las siguientes obligaciones:

Realizó la ejecución final referente a "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA.**" Correspondiente a la **SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026**; Conforme a

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2
ACTA DE RECIBO
FINAL

las cantidades, precios, condiciones, requisitos, y demás especificaciones que se requieran y que se consignan en la propuesta escogida, la cual se anexa a este contrato y hace parte integral del mismo.

También se deja constancia del cumplimiento de los deberes del contratista de la siguiente manera:

- a. Atendió todos los requerimientos del Municipio respecto al servicio contratado.
- b. Actuó con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo.
- c. Rindió oportunamente los informes sobre la ejecución y el estado del contrato según lo solicitado por el Municipio por conducto del supervisor y acató las instrucciones e indicaciones que le impartieron.
- d. Deja constancia que no sufrió presiones o amenazas de ningún tipo.

Se deja constancia del cumplimiento de los deberes del Municipio de la siguiente manera:

- a. El Municipio controló la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones acordadas.
- La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: Un (1) solo pago por el (100%) del valor del contrato previa Acta de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor, presentación de la cuenta de cobro y/o factura, Acreditación del pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y demás impuestos de conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012 y,
- El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el Supervisor del Contrato, acompañadas de los siguientes documentos:

1. Informe de actividades detallado con registro fotográfico y los anexos respectivos.
2. Factura o su equivalente, según corresponda.
3. Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar.

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



ALCALDÍA DE
RIOBLANCO
TOLIMA



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

ACTA DE RECIBO
FINAL

4. Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos períodos.
5. RUT (primer pago)
6. Certificación Bancaria (primer pago)
7. Copia Contrato (primer pago)
8. Informe de supervisión y/o autorización de pago suscrita por el supervisor.

Que, a la fecha de la presente, considero procedente en calidad de Supervisor del **CONTRATO DE OBRA SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL 2026**, autorizar el **PAGO DEL ACTA DE RECIBO FINAL** por un valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE**, al **CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026** con NIT. 902.066.903-1, Representante legal, **LUZ PAULA CRUZ LOAIZA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.106.309.638 de Carmen de Apicala Tolima, en calidad de **CONTRATISTA**.

La presente acta se suscribe a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.

MUNICIPIO DE RIOBLANCO	CONTRATISTA
<i>Iván Mauricio Penagos Andrade</i>	<i>Paula Cruz</i>
ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE	ARQ. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
Supervisor / Subsecretario de Planeación e Infraestructura	R.L. CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026

PROCESO	NOMBRE	CARGO	FECHA
Proyecto y Elaboró	Andrés Camilo Rojas Montoya	Ingeniero Civil de apoyo / Oficina de planeación e infraestructura	30/06/2026
Aprobó	Iván Mauricio Penagos Andrade	Subsecretario de Planeación e Infraestructura	30/06/2026

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>

434



ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

CERTIFICACIÓN
DE
CUMPLIMIENTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTA DE RECIBO FINAL

AL CONTRATO DE OBRA SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DEL
2026

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO Y CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026 con
NIT. 902.066.903-1, Representante legal, LUZ PAULA CRUZ LOAIZA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.106.309.638 de Carmen de Apicala Tolima, Cuyo Objeto es: "**SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS
ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA**"

Iván Mauricio Penagos A
ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
Subsecretario de Planeación e Infraestructura.
Supervisor del contrato

Paula Cruz
ARQ. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
R.L. CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026

RIOBLANCO, JUNIO 30 DEL 2026

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7
Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro
alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co
<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>

435



ALCALDÍA DE
RIOBLANCO
TOLIMA



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2
CERTIFICACIÓN
DE
CUMPLIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de este marco normativo, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco ha identificado la necesidad de adelantar un proceso contractual cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Esta necesidad surge en el marco de las políticas municipales de modernización y optimización de los servicios públicos esenciales, en especial del servicio de alumbrado público, el cual constituye un componente fundamental para la seguridad ciudadana, la movilidad, la convivencia y el bienestar general.

En el diagnóstico actual se evidencia que en varios sectores del casco urbano y del área rural existen luminarias obsoletas, averiadas o con tecnologías de alto consumo energético, e incluso zonas sin cobertura de iluminación pública. Esta situación afecta negativamente la seguridad vial y peatonal, incrementa la percepción de inseguridad y limita el desarrollo de actividades comerciales, recreativas y sociales durante la noche.

La instalación de luminarias tipo LED permitirá mejorar de manera significativa la cobertura y calidad del alumbrado público, incrementando la eficiencia energética, reduciendo los costos de operación y mantenimiento, y promoviendo la sostenibilidad ambiental mediante la disminución del consumo de energía y de emisiones de CO2. De igual forma, las luminarias LED ofrecen una mayor vida útil, mejor calidad lumínica y menor contaminación lumínica, cumpliendo con los estándares técnicos del RETILAP y con los lineamientos del Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE).

El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "JUNTOS LO HAREMOS REALIDAD", adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 006 del 31 de mayo de 2024, contempla dentro de su eje estratégico JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIAL, el proyecto BPIN 2024736160022 "Fortalecimiento para la eficiencia del sector de energía eléctrica del Municipio de Rioblanco Tolima" del cual se deriva directamente la presente iniciativa al siguiente objetivo: "Realizar el mantenimiento y suministro de luminarias en el municipio de Rioblanco, Tolima".

La ejecución de este proyecto contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo en materia de sostenibilidad, seguridad y calidad de vida, impulsando el progreso social y económico del municipio.

En consecuencia, y atendiendo los principios de eficiencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

CERTIFICACIÓN
DE
CUMPLIMIENTO

2015, el Municipio de Rioblanco considera necesario adelantar el proceso contractual que permita la adquisición, suministro e instalación de luminarias tipo LED, seleccionando un contratista idóneo, con capacidad técnica y experiencia comprobada para la correcta ejecución del proyecto.

La materialización de este contrato permitirá mejorar la cobertura y calidad del alumbrado público, optimizar el uso de la energía, fortalecer la seguridad ciudadana y contribuir al desarrollo sostenible del territorio, generando beneficios directos para toda la comunidad rioblancuna.

En ese sentido, se determina que el municipio de Rioblanco como entidad territorial debe dar cumplimiento a las finalidades del Estado consagradas en el artículo 2º de la Constitución Política de la siguiente manera: "Son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

ANTECEDENTES

- Se firma Contrato correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha diecinueve (19) del mes de mayo de 2026.
- Se firma Acta de Inicio correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha veintiuno (21) del mes de mayo de 2026.
- Se firma Acta de Prorroga No.1 correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha diecinueve (19) del mes de junio de 2026, por un término de quince (15) días calendario.
- Se firma Acta de Recibo Final correspondiente a la Selección Abreviada de Menor Cuantía 005, de fecha treinta (30) del mes de junio de 2026.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

CONTRATO No:	SAMC 005 DEL 19 DE MAYO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT:	890702040-7
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA".

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027


CÓDIGO: 110.2

CERTIFICACIÓN
DE
CUMPLIMIENTO

CONTRATISTA:	CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026
NIT.	902.066.903-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ PAULA CRUZ LOAIZA
CEDULA:	No. 1.106.309.638 DE CARMEN DE APICALÁ
CDP:	2026000223 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
RP:	2026000346 DEL 21 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$169.954.958,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE PRORROGA N.1:	19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA N.1:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL:	UN (01) MES Y QUINCE DIAS (15) CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026

3. LOCALIZACIÓN.

Las actividades objeto del presente contrato se realizaron en la zona urbana y rural del Municipio de Rioblanco - Tolima.

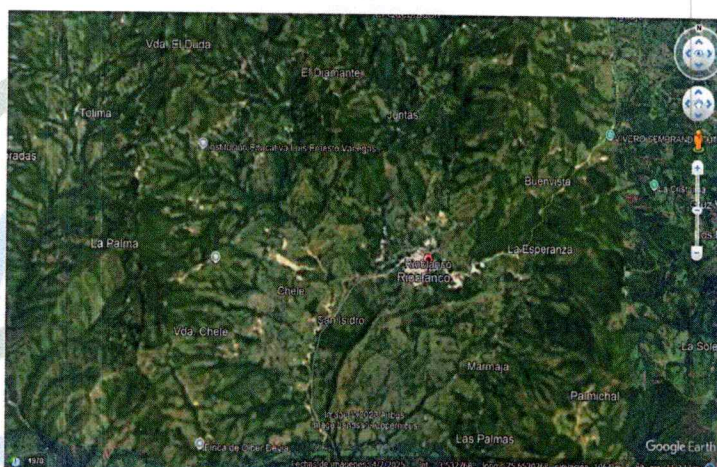

Fuente: Google Earth 2026

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>

438



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

CERTIFICACIÓN
DE
CUMPLIMIENTO

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevó a cabo la ejecución final de las actividades referentes a: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA."

CANTIDADES ORIGINALES						CANTIDADES DE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO ALUMBRADO PÚBLICO LED STREET ZD229 40-60 W, 100/277V 4000K 9300LM (INCLUYE FOTOCELDA).	UND	128,00	\$ 768.504,00	\$ 98.368.512,00	128,00	\$ 98.368.512,00	0,00	\$ 0,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES BIMETÁLICOS	UND	384,00	\$ 6.848,00	\$ 2.629.632,00	384,00	\$ 2.629.632,00	0,00	\$ 0,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	M	256,00	\$ 19.602,00	\$ 5.018.112,00	256,00	\$ 5.018.112,00	0,00	\$ 0,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1,20 MT C/COLLARIN DE 140 MM 5*-6*	UND	44,00	\$ 151.590,00	\$ 6.669.960,00	44,00	\$ 6.669.960,00	0,00	\$ 0,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RED TRENZADA 2X4/0+2/0	M	380,00	\$ 42.283,00	\$ 16.067.540,00	380,00	\$ 16.067.540,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 128.753.756,00		\$ 128.753.756,00		\$ 0,00
ADMINISTRACIÓN				26%	\$ 33.475.977,00		\$ 33.475.977,00		\$ 0,00
IMPREVISTOS				2%	\$ 2.575.075,00		\$ 2.575.075,00		\$ 0,00
UTILIDAD				4%	\$ 5.150.150,00		\$ 5.150.150,00		\$ 0,00
TOTAL AIU				32%	\$ 41.201.202,00		\$ 41.201.202,00		\$ 0,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 169.954.958,00		\$ 169.954.958,00		\$ 0,00

5. ESTADO FINANCIERO Y ECONÓMICO DEL CONTRATO:

Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE CONTRATO DE OBRA:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 169.954.958,00	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 169.954.958,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 169.954.958,00	\$ 169.954.958,00

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

https://www.rioblanco-tolima.gov.co/



ALCALDÍA DE
RIOBLANCO
TOLIMA



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

CERTIFICACIÓN
DE
CUMPLIMIENTO

BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del pago anticipado	\$0,00	0.00%	Valor inicial del Contrato	\$ 169.954.958,00	
			Valor presente acta (Acta de Recibo Final)		\$ 169.954.958,00
			Saldo por ejecutar		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$0,00	0.00%	SUMAS IGUALES	\$ 169.954.958,00	\$ 169.954.958,00


El contratista se encuentra al día en el pago de seguridad social, para lo cual anexan planillas.

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

- De conformidad al objeto y obligaciones contratados fueron realizados y recibidos por la Alcaldía Municipal de Rioblanco - Tolima a entera satisfacción.
- Durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social y lugar de conformidad con el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002, en concordancia con la ley 828 del 10 de Julio del 2003 y demás normas complementarias.

Por lo anterior, se autoriza realizar el pago correspondiente.

Para constancia se firma la presente certificación, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.

MUNICIPIO DE RIOBLANCO	CONTRATISTA
 ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE Supervisor / Subsecretario de Planeación e Infraestructura	 ARQ. LUZ PAULA CRUZ LOAIZA R.L. CONSORCIO RIOBLANCO LED 2026

PROCESO	NOMBRE	CARGO	FECHA
Proyecto y Elaboró	Andrés Camilo Rojas Montoya	Ingeniero Civil de apoyo / Oficina de planeación e infraestructura	30/06/2026
Aprobó	Iván Mauricio Penagos Andrade	Subsecretario de Planeación e Infraestructura	30/06/2026

Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro

alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co

<https://www.rioblanco-tolima.gov.co/>
