

INFORME No. 01

CONTRATO DE OBRA:

AMG-MC-OP-057-2026

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARADEROS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ.

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE GUAYATÁ

SUPERVISIÓN:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATISTA:

PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERÍA S.A.S

RECIBIDO 16 JUL 2026

2026

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque

E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com

Tel. 3102195296

REVISIÓN Y ESTADO DE INFORMES

CLASE DE DOCUMENTO: Informe Técnico	CÓDIGO:	FECHA:
REVISIÓN Y ESTADO DE INFORMES	GESDA-INF-001-2026	02/07/2026

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

DESTINATARIO DEL INFORME	No. DE COPIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE GUAYATÁ	1
Archivo GESDA.2026 – Copia Digital	1

ELABORACIÓN:



Ing. Yesid Camilo Rodríguez Fonseca
Residente de Obra

Proyectos e Inversiones
GESDA
Ingeniería S A S


Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	6
2.	OBJETIVOS	7
	2.1. General	7
	2.2. Específicos	7
3.	GENERALIDADES DEL PROYECTO	8
	3.1. Localización.....	8
	3.3. Plazo de ejecución	10
	3.4. Actividades del proyecto	10
	3.4.1. Condiciones originales del contrato	11
4.	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.....	14
	4.1. Descripción del Contrato de Obra	14
	4.2. Actos administrativos	14
	4.3. Personal del contrato	15
	4.5. Relación de pólizas	15
5.	INFORME GENERAL.....	17
	5.1. Descripción y avance de la obra	17
	5.2. Avance de obra	19
	5.3. Clima	20
6.	CONCLUSIONES	22
7.	ANEXOS	24

LISTA DE TABLAS


Tabla 1 Condiciones originales del contrato	11
Tabla 2 Descripción de contrato y modificaciones	14
Tabla 3. Relación de personal	15



Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización geográfica.....	9
--	---



Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico tiene como finalidad presentar el avance físico del contrato de obra No. AMG-MC-OP-057-2026, cuyo objeto corresponde a la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de paraderos rurales en el municipio de Guayatá, Boyacá.

En este documento se consolida y presenta la información técnica, administrativa y operativa requerida para el inicio del proyecto, incluyendo las condiciones contractuales originales, el análisis de precios unitarios, la caracterización general del proyecto y la documentación del personal profesional y operativo asignado a la obra. Lo anterior permite verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito.

Así mismo, el informe constituye una herramienta fundamental para la planeación, organización y control del proyecto, al establecer las bases técnicas y administrativas necesarias para una ejecución ordenada, eficiente y conforme a la normatividad vigente, garantizando la adecuada coordinación entre el contratista y la entidad contratante desde la etapa inicial del contrato.



2. OBJETIVOS

2.1. General

Presentar un informe detallado sobre el estado de avance en la ejecución de las actividades correspondientes al contrato de obra No. AMG-MC-OP-057-2026, cuyo objeto corresponde a la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de paraderos rurales en el municipio de Guayatá, Boyacá.

2.2. Específicos

- Verificar y documentar el avance físico de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra No. AMG-MC-OP-057-2026, de conformidad con el cronograma y las especificaciones técnicas establecidas.
- Registrar las novedades, dificultades o eventos relevantes presentados durante la ejecución de las actividades, así como las acciones correctivas implementadas.
- Generar insumos técnicos y administrativos que permitan soportar la toma de decisiones, el seguimiento contractual y la elaboración de informes de supervisión.

Proyectos e Inversiones
GESDA
Ingeniería S.A.S

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contratar la ejecución de las obras civiles requeridas para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de la infraestructura de paraderos rurales en el municipio de Guayatá, mediante la intervención integral de quince (15) paraderos existentes, la construcción de un (1) nuevo paradero y la adecuación de un (1) paradero con la instalación de iluminación en la zona rural del municipio, con el fin de fortalecer la infraestructura destinada al transporte público y mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, comodidad y seguridad de los usuarios.

Las actividades correspondientes al mantenimiento y rehabilitación de los paraderos existentes contemplan la ejecución de acciones preventivas y correctivas orientadas a recuperar y conservar las condiciones óptimas de funcionamiento de dichas estructuras. Dentro de estas labores se incluyen actividades de limpieza general, retiro de material deteriorado, aplicación de pintura protectora y de acabado, reparación y/o reposición de cubiertas, ajustes y reforzamiento de elementos estructurales menores, adecuación y mejoramiento del mobiliario existente, así como intervenciones complementarias necesarias para garantizar la estabilidad, seguridad, funcionalidad y adecuada prestación del servicio a los usuarios.

De igual manera, la construcción del nuevo paradero rural comprende la ejecución de todas las actividades técnicas y constructivas requeridas para su correcta implementación, incluyendo replanteo y localización, excavaciones, cimentación, construcción de estructura, instalación de cubierta, ejecución de pisos, suministro e instalación de mobiliario, acabados y demás obras complementarias, de conformidad con las especificaciones técnicas y normatividad vigente aplicable. Estas intervenciones tienen como finalidad proporcionar espacios adecuados, seguros y confortables para la espera de los usuarios del transporte público rural, contribuyendo al mejoramiento de la conectividad y calidad de vida de la población del municipio.

3.1. Localización

El municipio de Guayatá se encuentra ubicado en el oriente del departamento de Boyacá, en la región conocida como la Provincia de Neira, a una distancia aproximada de 125 km de la ciudad de Tunja. Limita con los municipios de Somondoco, Sutatenza, Almeida y Chivor, y presenta una topografía predominantemente montañosa, característica de la cordillera Oriental.

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque

E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com


Tel. 3102195296

Guayatá cuenta con una combinación de área urbana y rural, siendo esta última la de mayor extensión, con población distribuida en veredas que dependen principalmente de actividades agropecuarias, como la agricultura y la ganadería, las cuales constituyen la base de su economía local. El municipio presenta condiciones climáticas templadas a frías, influenciadas por la altitud y la variabilidad topográfica del territorio.

Desde el punto de vista social y de infraestructura, Guayatá enfrenta necesidades en materia de vivienda, especialmente en el sector rural, relacionadas con condiciones de habitabilidad, acceso a servicios básicos y calidad constructiva, lo que justifica la implementación de programas de mejoramiento de vivienda orientados a fortalecer la seguridad, salubridad y bienestar de sus habitantes.

En el ámbito administrativo, el municipio adelanta proyectos en articulación con entidades departamentales y nacionales, con el fin de promover el desarrollo social, la reducción de brechas territoriales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en concordancia con los planes de desarrollo vigentes.

Figura 1. Localización geográfica

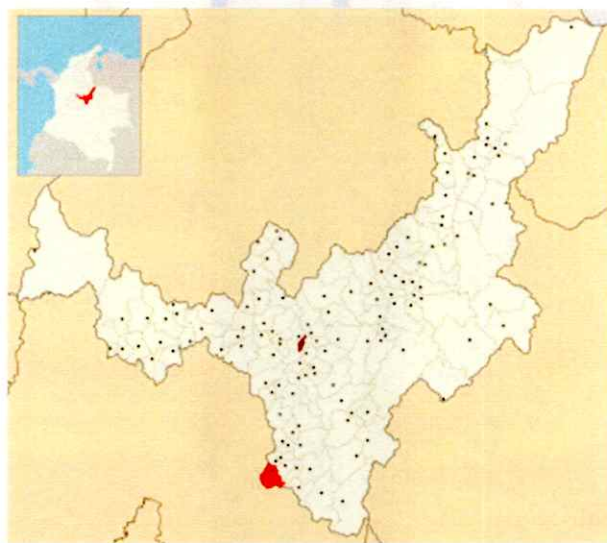

Fuente: Wikipedia, Gobernación De Boyacá

3.3. Plazo de ejecución

De conformidad con lo establecido en el contrato de obra No. AMG-MC-OP-057-2026, el plazo inicial de ejecución fue definido en cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3.4. Actividades del proyecto

El proyecto contempla la ejecución de obras destinadas a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de paraderos rurales en el municipio de Guayatá, Boyacá, mediante la intervención de la infraestructura existente y la construcción de un nuevo paradero, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad, funcionalidad y comodidad para los usuarios del transporte público en las zonas rurales del municipio.

Las actividades comprenden una etapa preliminar orientada a la adecuación de las áreas de intervención, incluyendo el desmonte de cubiertas y estructuras metálicas deterioradas, así como la demolición y retiro de elementos de concreto que hayan cumplido su vida útil o presenten condiciones que afecten el adecuado funcionamiento de las estructuras. Estas labores permiten preparar los sitios de trabajo para la ejecución de las obras proyectadas bajo condiciones técnicas y de seguridad apropiadas.

De igual manera, el proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento y rehabilitación sobre los paraderos existentes, mediante la reparación o construcción de elementos estructurales en concreto, el suministro e instalación de nuevas cubiertas termoacústicas y de tipo UPVC, la fabricación y montaje de estructuras metálicas, la instalación de malla electrosoldada y la construcción de placas base en concreto, intervenciones encaminadas a restablecer la estabilidad estructural, prolongar la vida útil de las edificaciones y garantizar su correcto funcionamiento.

Como parte de las obras de mejoramiento, se desarrollarán actividades de protección y acabados sobre los elementos metálicos mediante la preparación de superficies y la aplicación de sistemas de pintura con esmalte sintético y recubrimientos anticorrosivos, contribuyendo a incrementar la resistencia de las estructuras frente a la acción de los agentes climáticos y a mejorar su apariencia estética.

Así mismo, el proyecto incluye la construcción integral de un nuevo paradero rural, para lo cual se ejecutarán actividades de replanteo, excavaciones, cimentaciones, construcción de zapatas, columnas y pedestales en concreto reforzado, instalación de acero de

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque

E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com

Tel. 3102195296

refuerzo, construcción de bordillos, conformación de pisos en adoquín peatonal, montaje de perfilera metálica para la estructura de cubierta, instalación de cubierta metálica tipo Standing Seam, suministro e instalación de banquetas para los usuarios y colocación de paneles informativos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, criterios de funcionalidad, durabilidad y seguridad establecidos para este tipo de infraestructura.

Finalmente, el proyecto contempla la instalación de reflectores LED de alta eficiencia en los paraderos objeto de intervención, con el fin de mejorar las condiciones de iluminación, visibilidad y seguridad para los usuarios, contribuyendo a ofrecer espacios adecuados para la espera del transporte público y fortaleciendo la prestación del servicio de movilidad en las zonas rurales del municipio.

3.4.1. Condiciones originales del contrato

Tabla 1 Condiciones originales del contrato

Nº	Ítem Gob.	Descripción	Und	Cant.	V. Unif.	V. Total
1	PRELIMINARES					
1,01	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	22,65	\$ 13.533,88	\$ 306.542,38
1,02	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	KG	13,09	\$ 3.926,34	\$ 51.395,79
1,03	3.13.15	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	0,45	\$ 318.213,60	\$ 143.196,12
	Subtotal					\$ 501.134,29
2	PINTURA					
2,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	501,54	\$ 33.414,45	\$ 16.758.683,25
2,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	115,85	\$ 32.374,01	\$ 3.750.529,06
	Subtotal					\$ 20.509.212,31
3	MANTENIMIENTO					
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,19	\$ 1.728.730,23	\$ 328.458,74

3,02	2.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL	M2	18	\$ 134.913,13	\$ 2.428.436,34
3,03	3.13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	37	\$ 36.606,06	\$ 1.354.424,22
3,04	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 300W	UND	16	\$ 656.511,72	\$ 10.504.187,52
3,05	2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	M2	4,65	\$ 161.808,24	\$ 752.408,31
3,06	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	6,03	\$ 11.291,63	\$ 68.088,53
3,07	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	4,50	\$ 133.281,85	\$ 599.768,33
	Subtotal					\$ 16.035.771,99
4	PARADERO NUEVO					
4,01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,09	\$ 91.750,92	\$ 99.568,10
4,02	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,41	\$ 1.396.896,93	\$ 571.610,22
4,03	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,09	\$ 1.728.730,23	\$ 155.585,72
4,04	3.08.08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO).	ML	3,00	\$ 128.446,82	\$ 385.340,46
4,05	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	25,79	\$ 11.673,75	\$ 301.011,66
4,06	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017)	M2	6	\$ 166.052,19	\$ 996.313,14
4,07	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	105,93	\$ 33.510,25	\$ 3.549.724,03
4,08	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	105,93	\$ 6.354,08	\$ 673.084,52
4,09	2.08.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA	M2	4,28	\$ 215.028,03	\$ 921.180,08

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque

E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com

Tel. 3102195296

		GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).				
4,10	APU 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANQUETA	UND	1	\$ 622.798,29	\$ 622.798,29
4,11	APU 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INFORMATIVO DE 1,14 X 1,95 M	UND	1	\$ 1.589.740,68	\$ 1.589.740,68
4,12	APU 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INFORMATIVO DE 1,90 X 1,50 M	UND	1	\$ 1.746.633,85	\$ 1.746.633,85
	Subtotal					\$ 11.612.590,75
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						\$ 48.658.709,34

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye valor de A.I.U y el factor de incremento por distancia. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
	Administración	A=	20%
	Imprevistos	I=	5%
	Utilidad	U=	5%
	TOTAL, A.I.U	A.I.U =	30%

Proyectos e Inversiones

GESDA

Ingeniería S.A.S

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guatemala

E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com

Tel. 3102195296

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

4.1. Descripción del Contrato de Obra

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las condiciones contractuales de las obras:

Tabla 2 Descripción de contrato y modificaciones

CONTRATO	AMG-MC-OP-057-2026
OBJETO	Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de paraderos rurales en el municipio de Guayatá, Boyacá
CONTRATISTA	Proyectos e Inversiones GESDA Ingeniería S.A.S
NIT	901.126.077-7
R/L	Germán Eduardo Sánchez Daza
CONTRATANTE	Municipio De Guayatá
NIT	891.800.896-8
SUPERVISOR	Ing. Leidy Johana Salamanca Chaparro
FECHA DE CONTRATO	21 de mayo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	01 de junio de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Cuarenta y cinco (45) días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	16 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos nueve pesos con treinta y cuatro centavos (\$ 48.658.709,34) m/cte

4.2. Actos administrativos

- Contrato de obra
- Acta de inicio

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

4.3. Personal del contrato

A continuación, se relaciona el personal propuesto para la ejecución de las obras correspondientes al contrato de obra AMG-MC-OP-057-2026:

Tabla 3. Relación de personal

ÍTEM	NOMBRE	CARGO
1	Yesid Camilo Rodríguez Fonseca	Residente de obra
2	Héctor Daniel Sánchez	Maestro de obra

4.5. Relación de pólizas

A continuación, se relaciona las pólizas del contrato a partir de la firma de contrato, acta de inicio y posteriores modificaciones al mismo:

Póliza Cumplimiento Anexo 0: CPL-100001130

DESCRIPCIÓN	AMPARO	DESDE	VENCIMIENTO
CUMPLIMIENTO	\$ 4.865.870,93	21/05/2026	05/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.865.870,93	21/05/2026	05/07/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 4.865.870,93	05/07/2026	05/07/2031

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo 0: CPL-100000257

DESCRIPCIÓN	AMPARO	DESDE	VENCIMIENTO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 350.181.000,00	21/05/2026	05/07/2026
PATRONAL	\$ 350.181.000,00	21/05/2026	05/07/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 350.181.000,00	21/05/2026	05/07/2026
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 350.181.000,00	21/05/2026	05/07/2026

Póliza Cumplimiento Anexo 2: CPL-100001130

DESCRIPCIÓN	AMPARO	DESDE	VENCIMIENTO
CUMPLIMIENTO	\$ 4.865.870,93	01/06/2026	16/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.865.870,93	01/06/2026	16/07/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 4.865.870,93	16/07/2026	16/07/2031

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo 2: CPL-100000257

DESCRIPCIÓN	AMPARO	DESDE	VENCIMIENTO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 350.181.000,00	01/06/2026	16/07/2026
PATRONAL	\$ 350.181.000,00	01/06/2026	16/07/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 350.181.000,00	01/06/2026	16/07/2026
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 350.181.000,00	01/06/2026	16/07/2026

Proyectos e Inversiones
GESDA
Ingeniería S.A.S

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guatemala
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

5. INFORME GENERAL

5.1. Descripción y avance de la obra

A continuación, se hace una descripción del avance en obra en el período comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio del presente año:

2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Cantidad ejecutada a la fecha	240.55 ml
		Cantidad por ejecutar	260.99 ml
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Se realizó el suministro e instalación de esmalte sobre lámina lineal mediante la aplicación de tres manos de pintura, previa limpieza y preparación de la superficie para garantizar una adecuada adherencia del recubrimiento. La actividad incluyó la protección de los elementos metálicos frente a la corrosión y al deterioro ocasionado por las condiciones ambientales, mejorando su durabilidad y acabado estético. Los trabajos se ejecutaron siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto y asegurando una cobertura uniforme y de alta calidad.			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Cantidad ejecutada a la fecha	52.29 ml
		Cantidad por ejecutar	63.56 ml
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Se ejecutó el suministro e instalación de esmalte sobre lámina llena mediante la aplicación de tres manos de pintura, realizando previamente la limpieza, desengrase y preparación de la superficie para garantizar una adecuada adherencia del recubrimiento. Esta actividad permitió proteger los elementos metálicos contra la corrosión, la humedad y el desgaste ocasionado por la exposición a la intemperie, prolongando su vida útil y mejorando su presentación. Los trabajos se desarrollaron de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, obteniendo un acabado uniforme, resistente y de alta calidad.			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			



5.2. Avance de obra

Las actividades relacionadas anteriormente, corresponden a un avance físico del 20%, el cual se relaciona presupuestalmente a continuación:

Proyectos e Inversiones
GESDA
Ingeniería S.A.S

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296



AMG-MC-OP-057-2026

Fecha de inicio 1/06/2026	
Fecha de terminación 16/07/2026	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARADEROS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ.	
CONTRATISTA: PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA S.A.S.	
MUNICIPIO: GUAYATÁ	
Valor inicial \$ 48.658.709,34	Plazo inicial 1,5 meses
Valor ejecutado \$ 9.730.683,96	Adicional
Porcentaje ejecutado 20%	Plazo final 1,5 meses


CONDICIONES ORIGINALES												CANT. EJEC		PORCENTAJE EJEC.	
Nº	Ítem Gob.	Descripción			Und	Cant.	V. Unit.	Ind. Dist.	V. Total	+/-	Cant.	%			
PRELIMINARES															
1.01	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2	22,65	\$ 10.410,68	0%	\$ 235.801,90	0,00	\$ 0,00			0%	
1.02	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES- VIGAS.			KG	13,09	\$ 3.070,26	0%	\$ 39.535,20	0,00	\$ 0,00			0%	
1.03	3.13.15	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).			M3	0,45	\$ 244.779,69	0%	\$ 110.150,86	0,00	\$ 0,00			0%	
		Subtotal							\$ 385.487,96		\$ 0,00			0%	
PINTURA															
2.01	APU 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS			ML	501,54	\$ 21.948,74	17%	\$ 12.891.296,18	240,55	\$ 6.182.959,08			48%	
2.02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS			M2	115,85	\$ 21.284,69	17%	\$ 2.885.022,66	52,29	\$ 1.302.182,43			45%	
		Subtotal							\$ 15.776.318,84		\$ 7.485.141,51			47%	
MANTENIMIENTO															
3.01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)			M3	0,19	\$ 1.136.574,77	17%	\$ 252.660,57	0	\$ 0,00			0%	
3.02	2.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL			M2	18	\$ 88.700,28	17%	\$ 1.868.027,90	0	\$ 0,00			0%	
3.03	3.13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA			KG	37	\$ 24.067,10	17%	\$ 1.041.864,76	0	\$ 0,00			0%	
3.04	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 300W			UND	16	\$ 431.631,64	17%	\$ 6.080.144,21	0	\$ 0,00			0%	
3.05	2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC			M2	4,65	\$ 106.382,80	17%	\$ 578.775,62	0	\$ 0,00			0%	
3.06	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRODOLADA			KG	6,03	\$ 7.423,82	17%	\$ 52.375,79	0	\$ 0,00			0%	
3.07	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10,0 CM. 17,5 MPa (2500 PSI)			M2	4,5	\$ 87.627,78	17%	\$ 461.360,26	0	\$ 0,00			0%	
		Subtotal							\$ 12.335.209,11		\$ 0,00			0%	
PARADERO NUEVO															
4.01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN			M3	1,09	\$ 70.577,63	0%	\$ 76.590,84	0	\$ 0,00			0%	

4.02	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0.41	\$ 918,406.92	17%	\$ 439,700.17	0	\$ 0.00	0%
4.03	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI). H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0.09	\$ 1,136,574.77	17%	\$ 119,681.32	0	\$ 0.00	0%
4.04	3.08.08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (NO INCLUYE REFUERZO).	ML	3.00	\$ 84,448.93	17%	\$ 296,415.74	0	\$ 0.00	0%
4.05	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	25.79	\$ 7,675.05	17%	\$ 231,547.45	0	\$ 0.00	0%
4.06	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017)	M2	6.00	\$ 109,173.04	17%	\$ 766,394.74	0.00	\$ 0.00	0%
4.07	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERILERA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO	KG	105.93	\$ 22,031.72	17%	\$ 2,730,556.63	0.00	\$ 0.00	0%
4.08	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIÓN).	KG	105.93	\$ 4,177.57	17%	\$ 517,757.64	0.00	\$ 0.00	0%
4.09	2.08.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM. EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	M2	4.28	\$ 141,372.80	17%	\$ 708,600.06	0.00	\$ 0.00	0%
4.10	APU 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANQUETA	UND	1.00	\$ 409,466.33	17%	\$ 479,075.61	0.00	\$ 0.00	0%
4.11	APU 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INFORMATIVO DE 1.14 X 1.95 M	UND	1.00	\$ 1,045,194.40	17%	\$ 1,222,877.45	0.00	\$ 0.00	0%
4.12	APU 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL INFORMATIVO DE 1.90 X 1.50 M	UND	1.00	\$ 1,148,345.73	17%	\$ 1,343,564.50	0.00	\$ 0.00	0%
		Subtotal					\$ 8,932,762.15		\$ 0.00	0%
		TOTAL DE COSTOS DIRECTOS					\$ 37,429,778.06		\$ 7,485,141.51	
					Administración	25%	\$ 9,357,444.52		\$ 1,871,285.38	
					Imprevistos	1%	\$ 374,297.78		\$ 74,851.42	
					Utilidad	4%	\$ 1,497,191.12		\$ 299,405.66	
		TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS					\$ 11,228,933.42		\$ 2,245,542.45	
		VALOR TOTAL					\$ 48,658,709.34		\$ 9,730,683.96	

5.3. Clima

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio del presente año, el municipio de Guayatá registró precipitaciones de alta intensidad, las cuales incidieron de manera significativa en las condiciones climáticas de la zona de intervención. La información presentada a continuación corresponde al análisis de los registros de precipitación diaria obtenidos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), cuyos resultados se ilustran en la siguiente gráfica.

Figura 2 Precipitación del mes de junio

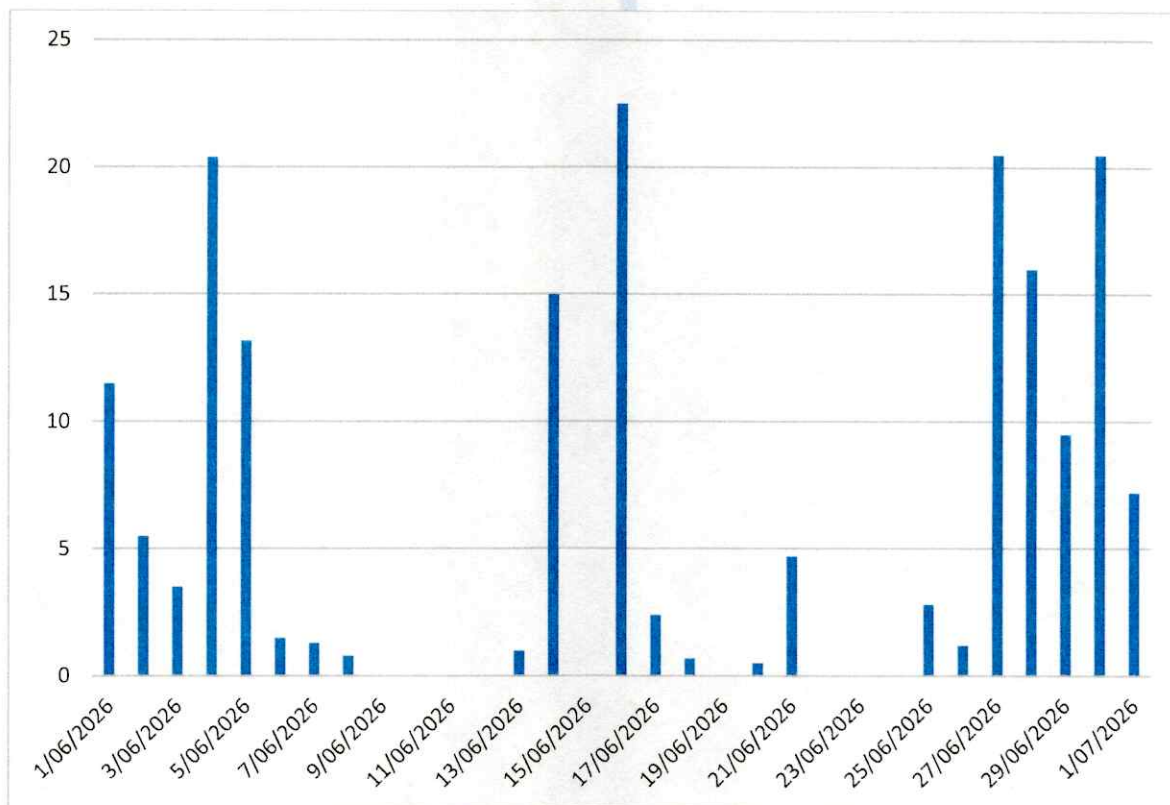

Como se evidencia en la Figura 2, los registros de precipitación diaria, expresados en milímetros (mm), muestran que durante aproximadamente el 50 % del mes de junio se presentaron lluvias de intensidad considerable, generando condiciones climáticas desfavorables para el normal desarrollo de las actividades programadas en obra. Estas precipitaciones ocasionaron afectaciones directas en la ejecución de los trabajos, limitando el acceso a los frentes de intervención, reduciendo los tiempos efectivos de trabajo y dificultando la realización de actividades que requieren condiciones secas para garantizar la calidad de los procesos constructivos.

La información obtenida a partir de los registros del IDEAM constituye un soporte técnico que permite justificar el retraso presentado en el cronograma de ejecución del contrato, toda vez que las condiciones meteorológicas registradas estuvieron fuera del comportamiento habitual y repercutieron de manera significativa sobre el rendimiento de las actividades programadas.

Es importante señalar que el objeto contractual consiste en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de paraderos rurales del municipio de Guayatá, obras que comprenden actividades como desmontes, demoliciones, excavaciones, construcción de elementos en concreto, montaje de estructuras metálicas, instalación de cubiertas, aplicación de sistemas de pintura y ejecución de acabados. Gran parte de estas labores requiere condiciones climáticas favorables para garantizar la correcta ejecución de los procedimientos constructivos, el adecuado fraguado de los materiales, la seguridad del personal y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

En consecuencia, las continuas precipitaciones registradas durante el periodo evaluado incidieron directamente en el avance físico de la obra, disminuyendo la productividad de las cuadrillas y obligando a suspender temporalmente diversas actividades para evitar riesgos a los trabajadores y posibles afectaciones en la calidad de las obras ejecutadas. Por lo anterior, el comportamiento de las lluvias constituye una causa objetiva y debidamente sustentada que explica el desfase presentado en la programación de los trabajos durante el periodo analizado.



6. CONCLUSIONES

El presente informe permitió consolidar el estado de avance correspondiente al primer periodo de ejecución del Contrato de Obra No. AMG-MC-OP-057-2026, verificando el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y contractuales requeridos para el adecuado desarrollo del proyecto de construcción, mantenimiento y rehabilitación de paraderos rurales en el municipio de Guayatá, Boyacá.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes a la aplicación de sistemas de pintura sobre elementos metálicos de los paraderos intervenidos, específicamente mediante el suministro e instalación de esmalte sobre lámina lineal y lámina llena, alcanzando un avance físico acumulado del veinte por ciento (20 %) del contrato. Las actividades desarrolladas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas, empleando los materiales y procedimientos constructivos definidos para garantizar la protección, durabilidad y adecuada presentación de las estructuras intervenidas.

Desde el punto de vista administrativo, se verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos para la ejecución del proyecto, incluyendo la conformación del equipo profesional y operativo, la presentación de la documentación técnica, la vigencia de las pólizas contractuales y la disponibilidad de los documentos que soportan el desarrollo de la obra, permitiendo garantizar un adecuado control y seguimiento por parte de la supervisión.

No obstante, el desarrollo normal de las actividades constructivas se vio afectado por las condiciones climáticas registradas durante el mes de junio. Los registros oficiales de precipitación suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) evidencian la ocurrencia de lluvias de alta intensidad durante aproximadamente la mitad del periodo evaluado, situación que generó limitaciones para el acceso a los diferentes frentes de trabajo, disminución en los rendimientos de ejecución y suspensión temporal de actividades que requerían condiciones ambientales favorables para asegurar la calidad de los procesos constructivos.

Las condiciones meteorológicas anteriormente descritas constituyen un factor externo, imprevisible y ajeno al control del contratista, que incidió directamente en el ritmo de ejecución del contrato, afectando el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido. Sin embargo, durante los periodos en los cuales las condiciones climáticas lo

Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque

E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com

Tel. 3102195296


permitieron, el personal técnico y operativo mantuvo la continuidad de las labores programadas, optimizando los recursos disponibles y priorizando aquellas actividades que podían desarrollarse sin comprometer la calidad de la obra ni la seguridad de los trabajadores.

Finalmente, se concluye que el proyecto mantiene condiciones técnicas y administrativas favorables para continuar con su ejecución. Se dispone del personal, los recursos, los materiales y la organización necesarios para desarrollar las actividades pendientes, esperando que las condiciones climáticas mejoren durante el siguiente periodo, lo cual permitirá incrementar el rendimiento de las cuadrillas, recuperar progresivamente el desfase presentado y avanzar hacia el cumplimiento de las metas físicas y contractuales establecidas para el proyecto.



Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

REGISTRO FOTOGRAFICO


CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARADEROS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ.







PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque

E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com

Tel. 3102195296

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NIT 901126077	7	PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CENTRO DE GUATEQUE
			Exonerado SENA e ICBF		
			Si		


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha
2026-05	2026-06	1000000626	9504041561	E	2026/06/19
			Banco		
			Dias Mora		
			Valor		
			0		
			56,174,900		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO				PENSION				SALUD			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)				\$19,697,682				\$19,259,955			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (12 Afiliados)				\$19,697,682				\$19,259,955			
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (12 Afiliados)				\$19,697,682				\$19,259,955			
1	CC 4263718	BUTRAGO JORGE	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
2	CC 1049798226	GUATAQUIRA ANGELA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
3	CC 1049798317	MARTINEZ JULIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
4	CC 1049794208	MORA WILSON	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
5	PT 5370684	NOVA JHONY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
6	CC 1049796509	RAMIREZ LUIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
7	CC 1007402176	ROA JAHR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
8	CC 1049796832	RODRIGUEZ YESID	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
9	CC 7314149	SALGADO HENRY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
10	CC 4047184	SANCHEZ HECTOR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF555	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF555
11	CC 1032473641	SANCHEZ MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005
12	CC 1049796388	ISOLAND MARCO	25-14	7	\$437,727	\$70,100		0	\$0	\$0	
Total Afiliados(12)				\$19,697,682				\$19,259,955			

RIESGOS				CCF				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)				\$19,697,682				\$19,697,682			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (12 Afiliados)				\$19,697,682				\$19,697,682			
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (12 Afiliados)				\$19,697,682				\$19,697,682			
1	CC 4263718	BUTRAGO JORGE	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
2	CC 1049798226	GUATAQUIRA ANGELA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
3	CC 1049798317	MARTINEZ JULIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
4	CC 1049794208	MORA WILSON	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
5	PT 5370684	NOVA JHONY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
6	CC 1049796509	RAMIREZ LUIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
7	CC 1007402176	ROA JAHR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041
8	CC 1049796832	RODRIGUEZ YESID	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
9	CC 7314149	SALGADO HENRY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037
10	CC 4047184	SANCHEZ HECTOR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF555	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF555
11	CC 1032473641	SANCHEZ MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005
12	CC 1049796388	ISOLAND MARCO	25-14	7	\$437,727	\$70,100		0	\$0	\$0	
Total Afiliados(12)				\$19,697,682				\$19,697,682			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$3,152,300	\$0	\$0	\$3,152,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,802,000	\$0	\$0	\$2,802,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,462,800	\$0	\$0	\$1,462,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	\$1,462,800	\$0	\$0	\$1,462,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$788,700	\$0	\$0	\$788,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$788,700	\$0	\$0	\$788,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$771,100	\$0	\$0	\$771,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
TOTAL				12	\$6,174,900	\$0	\$0	\$6,174,900	

PÓLIZAS



Dirección: Carrera 6A #4-02 Guateque
E-Mail: gesdaingenieria@gmail.com
Tel. 3102195296

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: yy3BZFEMJTC+118JHZE/A==

No. PÓLIZA	CPL-100001130	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	556002293	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN PUENTE LARGO	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	21/05/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	05/07/2031	DÍAS		
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		N/A		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		N/A		
TOMADOR	GESDA INGENIERIA SAS						No. DOC. IDENTIDAD	901126077-7
DIRECCIÓN	CR 6A 4 - 02						TELÉFONO	3166608623
ASEGURADO	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA						No. DOC. IDENTIDAD	891800896-8
DIRECCIÓN	CARRERA 5 A NO. 3 - 13						TELÉFONO	3142637013
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA						No. DOC. IDENTIDAD	891800896-8
DIRECCIÓN	CARRERA 5 A NO. 3 - 13						TELÉFONO	3142637013

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.AMG-MC-OP-057-2026 , CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARADEROS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ.

-NOTA- ESTABILIDAD DE LA OBRA: CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

HOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/05/2026	24:00 Horas Del 05/11/2026	4.865.870,93	8.959,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/05/2026	24:00 Horas Del 05/07/2029	4.865.870,93	45.633,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/07/2026	24:00 Horas Del 05/07/2031	4.865.870,93	73.028,00
TOTAL ASEGURADO			\$	14.597.612,79

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
NERY LUCIA MARTIN BONELL	AGENTES	100,00		127.620,00
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 127.620,00
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
			IVA	\$ 25.198,00
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/05/2026		TOTAL A PAGAR	\$ 157.818,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CPL-100001130	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	556002293	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN PUENTE LARGO		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	21/05/2026	24:00 Horas Del	05/07/2031	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Página web: www.segurosmondial.com.co
Correo electrónico: mondial@segurosmondial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



No. PÓLIZA	CPL-100000257	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	556002294	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN PUENTE LARGO		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
	21/05/2026		05/07/2026			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE \$350.181.000

, - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA GESDA INGENIERIA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMVLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMVLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMVLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMVLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENCIONES

Código de Seguridad: 1YUN5K5ges0a1lWfkyzxLw==

Nº. PÓLIZA	CPL-100000257	Nº. ANEXO	2	Nº. CERTIFICADO	556002381	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN PUENTE LARGO
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	01/06/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	16/07/2026	DÍAS	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		DÍAS			
N/A		N/A		N/A		N/A	
TOMADOR	GESDA INGENIERIA SAS					Nº. DOC. IDENTIDAD	901126077-7
DIRECCIÓN	CR 6A 4 - 02					TELÉFONO	3166608623
ASEGURADO	GESDA INGENIERIA SAS					Nº. DOC. IDENTIDAD	901126077-7
DIRECCIÓN	CR 6A 4 - 02					TELÉFONO	3166608623
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					Nº. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN						TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DE ESTE ANEXO, SEGUN ACTA DE INICIO, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2026, SE PROCEDE A AJUSTAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA EN REFERENCIA, QUEDANDO COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.AMG-MC-OP-057-2026 , CUYO OBJETO ES

: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARADEROS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ

NOTA- ASEGURADO: MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA, IDENTIFICADA CON NIT 891.800.896-8 Y GESDA INGENIERIA S.A.S NIT: 901.126.077-7

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	107.932,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
NERY LUCIA MARTIN BONELL	AGENTES	100,00		107.932,00
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 107.932,00
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
			IVA	\$ 21.457,00
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/06/2026		TOTAL A PAGAR	\$ 134.389,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D00I

No. PÓLIZA	CPL-100000257	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	556002381	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN PUENTE LARGO		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 01/06/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 16/07/2026	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA, IDENTIFICADA CON NIT 891.800.896-8

-NOTA2- LA PRESENTE POLIZA INCLUYE LOS SIGUIENTES SUBAMPAROS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE (LIMITACION) SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE \$350.181.000

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE \$350.181.000 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA GESDA INGENIERIA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 0d34+1qyKYS6Rhe/XQa2Ug==

No. PÓLIZA	CPL-100001130	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	556002379	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN PUENTE LARGO
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	01/06/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	16/07/2031	DÍAS	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		N/A		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		N/A	
TOMADOR	GESDA INGENIERIA SAS					No. DOC. IDENTIDAD	901126077-7
DIRECCIÓN	CR 6A 4 - 02					TELÉFONO	3166608623
ASEGURADO	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA					No. DOC. IDENTIDAD	891800896-8
DIRECCIÓN	CARRERA 5 A NO. 3 - 13					TELÉFONO	3142637013
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA					No. DOC. IDENTIDAD	891800896-8
DIRECCIÓN	CARRERA 5 A NO. 3 - 13					TELÉFONO	3142637013

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DE ESTE ANEXO, SEGUN ACTA DE INICIO, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2026, SE PROCEDE A AJUSTAR LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA CITADA EN REFERENCIA, QUEDANDO COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.AMG-MC-OP-057-2026, CUYO OBJETO ES

: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARADEROS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, BOYACÁ.

-NOTA- ESTABILIDAD DE LA OBRA: CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

HOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/06/2026	24:00 Horas Del 16/11/2026	4.865.870,93	8.959,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/06/2026	24:00 Horas Del 16/07/2029	4.865.870,93	45.633,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/07/2026	24:00 Horas Del 16/07/2031	4.865.870,93	73.028,00
TOTAL ASEGURADO			\$	14.597.612,79

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
NERY LUCIA MARTIN BONELL	AGENTES	100,00		127.620,00
			DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 127.620,00
					GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
					IVA	\$ 25.198,00
					TOTAL A PAGAR	\$ 157.818,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/06/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CPL-100001130	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	556002379	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN PUENTE LARGO		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/06/2026	24:00 Horas Del	16/07/2031	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmondial.com.co

Correo electrónico: mondial@segurosmondial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

