


	ACTA DE SUSPENSIÓN			Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a partir de: 2026			0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD 21	MM 7	AA 2026	CONTRATO N° 2117-2026
-------------	-------	----------	---------	------------	------------------------------

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 02 DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°01 DE CONTRATO

INTERVENTORÍA ☐	CONSULTORÍA ☐	OBRA ☒
--	--------------------------------------	--

CONTRATO No	2117 (Número de contrato)	DE	2026 (Año de suscripción)	
-------------	---	----	---	--

VIGENCIA	2026 (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)
----------	---

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE – SAN MIGUEL, CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER, ÁREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
---------------------	---

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
---------------------------	--

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2 MESES
---	---------

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	14 DE 05 DE 2026 (Día) (Mes) (Año)
----------------------------------	--

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 170.459.318,16 (Indique el valor del contrato suscrito en números)
----------------------------	---

SON: CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS LCON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
-------------	---

INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)
-------------	---

SUPERVISOR (E)	ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)
----------------	---


ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
CONTRATO ADICIONAL No	FECHA

ACTA N° 02 DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°01 DE CONTRATO

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	14/05/2026	60,00
Acta No 01 SUSPENSIÓN	12/06/2026	30,00

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

	ACTA DE SUSPENSIÓN	Versión	Código	Página		
	Vigencias a partir de: 2026	0.1	FGB - 002	2 DE 3		
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 21	MM 7	AA 2026	CONTRATO N° 2117-2026	


CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO		DOS (2) MESES (Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		22 DE 2026 (Día) (Mes) (Año)			
VALOR ACTUAL	\$	\$ 170.459.318,16			
En Leticia; a los 21 días del mes julio de 2026 (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)					
se reunieron		LUCERO PIZANO BARBOSA representante legal Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)			
del contratista,		N/A representante legal de la interventoría, y (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)			
ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Supervisor,		con el fin de AMPLIAR LA SUSPENSIÓN (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Suspender/Ampliar la suspensión)			
el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del		CONTRATISTA del 21 (Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)			
de JULIO de 2026 (Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)					

CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

El contratista INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S. presentó, mediante oficio fechado el 21 de julio de 2026 y radicado por correo electrónico, una solicitud de suspensión del Contrato No. 2117-2026. En dicho documento informa que persisten las condiciones climáticas adversas propias de la temporada de lluvias en el área de influencia del proyecto, las cuales han generado un incremento significativo en el estancamiento o empozamiento de agua en el sector de intervención. Cabe señalar que estas acumulaciones no corresponden ni forman parte de sistemas hídricos existentes.

No obstante, la situación descrita limita las condiciones de acceso, dificulta la ejecución de las actividades programadas y representa un riesgo para la seguridad del personal, los equipos y la calidad de las obras.

En consecuencia, y considerando la necesidad de garantizar condiciones técnicas y de seguridad adecuadas para la reanudación de los trabajos, se determina mantener la suspensión del contrato por un término de un (01) mes. La fecha estimada de reinicio se fija para el 20 de agosto de 2026, y la fecha prevista de terminación del contrato para el 20 de septiembre de 2026.

	ACTA DE SUSPENSIÓN			Versión	Código	Página	
	Vigencias a partir de: 2026			0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD 21	MM 7	AA 2026	CONTRATO N° 2117-2026
-------------	-------	----------	---------	------------	-----------------------

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN	12 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2026 (Año)
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN	21 (Día)	DE	7 (Mes)	DE	2026 (Año)
PLAZO TRANSCURRIDO	29 DÍAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)				
PLAZO FALTANTE	31 DÍAS (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)				
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN	20 (Día)	DE	08 (Mes)	DE	2026 (Año)

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 02 DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N°01 DE CONTRATO

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO


PERSONAL DIRECTIVO			
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	DANIEL ESTUPINAN	52202173632NNR


PERSONAL OPERATIVO	
CARGO	CANTIDAD
MAESTRO OBRA	1
AYUDANTES DE OBRA	3
TOPOGRAFO	1

MAQUINARIA			
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A			

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2117 de 2026
(Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)
 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 21 días del mes de JULIO de 2026
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)


Nombre: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS
LUCERO PIZANO BARBOSA
 Contratista


ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES
 GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
 Supervisor Designado

Original Oficina Jurídica:
 1era copia :interventor
 2da copia contratista
 3ra copia dependencia responsable del contrato

Leticia, 21 de julio de 2026

Ingeniero
ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Ciudad.


Asunto: Solicitud de prórroga de la suspensión del Contrato No. 2117-2026, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE - SAN MIGUEL, CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER, ÁREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar prórroga de la suspensión del contrato de obra n° 2117-2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE - SAN MIGUEL, CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER, ÁREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", por un término de un (01) mes debido a que persisten las condiciones climáticas adversas propias de la temporada de lluvias en el área de influencia del proyecto en el Área No Municipalizada de Puerto Santander, las cuales han ocasionado un incremento significativo del estancamiento o empozamiento de agua del sector de intervención, las cuales no pertenecen ni hacen parte de sistemas hídricos existentes. Sin embargo, esta situación limita las condiciones de acceso, dificulta la ejecución de las actividades programadas y representa un riesgo para la seguridad del personal, los equipos y la calidad de las obras.



En consecuencia, y considerando que las condiciones que se presentan, resultan necesarias prorrogar la suspensión del contrato por un término de un (01) mes hasta que existan condiciones técnicas y de seguridad que permitan reanudar las actividades constructivas.

Atentamente,



INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S
NIT. 901.506.541-4
R/L. LUCERO PIZANO BARBOSA

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

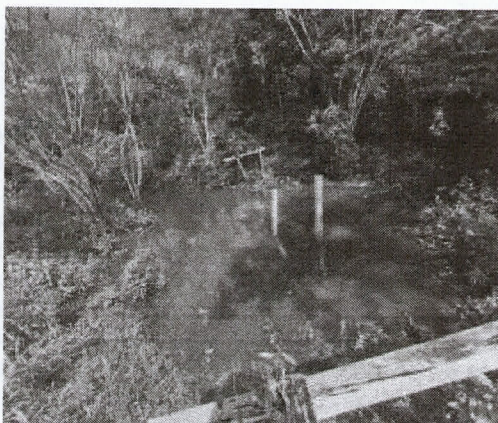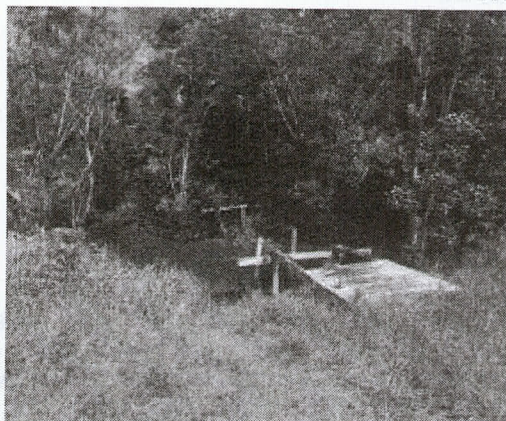

Cr 7 B 17 32 Apto 2 B Brr José María Fajardo
E-mail: iynumaesas@gmail.com
Tel. 3204567911
