

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991

OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 6

PERIODO DEL INFORME:
DEL 19/01/2026 AL 18/02/2026

CONTRATISTA
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025

INTERVENTORIA
CONSORCIO MAGNUS

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD-SDM

BOGOTÁ D.C,

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com




CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

CONTROL DE MODIFICACIONES


VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	FOLIOS
V0	27/02/2026	Versión Original	115 más anexos

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

CONTRATISTA

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
		
Ing. Sergio Andrés Aranda Nieves Ing. Juan Carlos León Sarmiento	Ing. Helver Alejandro Sahabria Ramírez	Ing. Helver Alejandro Sahabria Ramírez
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Obra

INTERVENTORIA

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
 	Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE <small>Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247</small>	Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE <small>Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247</small>
Ing. Jessica Fernanda Guerrero Muñoz Ing. William Harbey Manrique Rinco	Eliana Constanza Medina Pabuece	Eliana Constanza Medina Pabuece
Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Director de Interventoría

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	9
2.	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	10
3.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
3.1.	DETALLES DEL CONTRATO	13
3.1.1.	ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO 2025-2991	13
3.1.2.	PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	13
4.	LOCALIZACIÓN GENERAL	14
4.1.	LOCALICACION GENERAL DE ID'S SUMINISTRADOS POR LA SDM	15
4.2.	LOCALIZACIÓN ESPECIFICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES DE IMPLEMENTACION DE ID's.....	16
4.2.1.	PRIMER PAQUETE DE ID's SUMINISTRADO POR LA SDM	16
4.2.1.1.	SEGUNDA ENTREGA ID's PRIMER PAQUETE SUMINISTRADO POR LA SDM	22
5.	INFORME ADMINISTRATIVO	40
5.1.	REGISTRO MENSUAL DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA	40
5.2.	REGISTRO MENSUAL DEL EQUIPO USADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA.....	41
5.3.	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL PERIODO	42
5.3.1.	CORRESPONDENCIA ENVIADA.....	42
5.3.2.	CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....	44
5.4.	ENTREGA PARA INGRESO CONTABLE DE LOS ELEMENTOS AL ALMACÉN DE LA SDM	46
5.5.	INFORMES MENSUALES PRESENTADOS A LA FECHA.....	46
6.	INFORME TÉCNICO.....	47
6.1.	METODOLOGIA DE TRABAJO DEL CONTRATO	47
6.1.1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL	47
6.1.2.	Actividades de Georreferenciación	48

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.1.3.	Actividades de cierre de georreferenciación y cierre de contrato	48
6.2.	FICHAS TECNICAS DE SOPORTE	50
6.3.	PROGRAMACIÓN DE VISITAS TECNICAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	53
6.3.1.	PROGRAMACION DE VISITAS TECNICAS.....	53
6.4.	INFORMACION DE VISITAS TECNICAS POR CADA FTS	56
6.5.	FORMATOS DE VISITA DE INSPECCIÓN TECNICA	57
6.5.1.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	58
6.6.	REGISTRO FOTOGRAFICO.....	59
6.7.	ESQUEMAS TIPICOS DE ESVAP	68
6.7.1.	Malla eslabonada	69
6.7.2.	Malla en varilla	69
6.7.3.	Vallas	70
6.7.4.	Materia alta	70
6.7.5.	MATERIA TIPO PARALELEPÍPEDO	71
6.7.6.	BOLARDO TIPO M63	71
6.7.7.	BOLARDO CÚBICO.....	72
6.2.	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	72
7.	CONTROL DE OBRA.....	75
7.1.	PRESUPUESTO GENERAL Y CONDICIONES ACTUALIZADAS	75
7.2.	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ID	89
7.3.	REPORTE APROBACION MENSUAL DE ID's FINALIZADOS.	101
7.4.	DIFICULTADES ENCONTRADAS EN OBRA	104
7.5.	ACTAS PARCIALES DE PAGO	104
7.6.	COSTO UNITARIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	105
7.7.	ACTAS DE COMITÉ.....	106
7.8.	INFORMES SEMANALES.....	106

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

7.9.	COPIA DE LA BITACORA DE OBRA DEL PERIODO	107
7.10.	REGISTRO MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	107
7.11.	ESTUDIOS, ENSAYOS Y FICHAS TÉCNICAS.	107
7.11.1.	DESCRIPCION DE LA NORMATIVIDAD Y ENSAYOS APLICADOS.....	108
7.11.2.	ENSAYOS REALIZADOS IN-SITU	109
7.11.3.	DISEÑO DE CONCRETO	109
7.11.4.	CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS Y/O SISTEMAS IMPLEMENTADOS	109
8.	INFORME FINANCIERO PRESUPUESTAL CONTRATO 2025-2991	109
8.1.	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	109
8.2.	LISTADO DE COSTOS POR ID's	110
8.3.	AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 2025-2991.....	111
8.4.	AVANCE SEGÚN VIGENCIA 2025 CONTRATO 2025-299	114
8.5.	AVANCE ESPECIFICO TOTAL DE ID's VIGENCIA 2025	116
9.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO	119
10.	INFORME DE CUMPLIMIENTO SST-AMBIENTAL	119
10.1.	PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	120
10.2.	RESUMEN PAGO DE SALARIOS	120
10.3.	CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS	120
10.4.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL-PGA.....	121
11.	INFORME PLAN DE CALIDAD	122
12.	CONCLUSIONES	122
13.	OBSERVACIONES	124
14.	RECOMENDACIONES	124
15.	LISTA DE ANEXOS	124

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Etapas de la implementación del proyecto.....	10
Tabla 2. Factores de evaluación	10
Tabla 3. Indicadores de cumplimiento con respecto a los factores de evaluación del contrato	11
Tabla 4. Detalles del contrato	13
Tabla 5. Detalles de Pólizas del contrato	13
Tabla 6. Primer paquete de ID's suministrados por la SDM.....	16
Tabla 7. ID's segunda entrega del primer paquete de ID's suministrado por la SDM	22
Tabla 8. MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C SUR y ID_MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_TOM ADAMS.....	24
Tabla 9. Directorio personal contrato 2025-2991	40
Tabla 10. Vehículos utilizados por el contratista de obra	42
Tabla 11. Correspondencia enviada	42
Tabla 12. Correspondencia Recibida	44
Tabla 13. Resumen de Informes Técnicos Mensuales radicados.....	46
Tabla 14. Resumen de ID Aprobados componente Georreferenciación	48
Tabla 15. Fichas técnicas de soporte asociadas a los ID's	50
Tabla 16. Fechas de visita de inspección a los ID's suministrados	56
Tabla 17. ID EX_12_141_1881_12 (FTS 2025_OSV_PEP_COLOMBIA. 1, 2 Y 3)	59
Tabla 18. ID EX_14_096_1881_12 (FTS 2024_SGV_11)	60
Tabla 19. ID EX_05_001_1073_24 (FTS ANTONIO JOSE DE SUCRE).....	61
Tabla 20. ID EX_13_171_1881_12 (FTS TEUSAQUILLO).....	61
Tabla 21. ID EX_08_308_1867_12 (MV_08_001_1703_10_V6 _ESVAP V1_Tom Adams).....	62
Tabla 22. ID MV_AV_CALI_941_09_T1 (2024_SBP_00.1).....	62
Tabla 23. ID MV_AV_CALLE_80_1238_24 (2023_SGV_01.1 Y 01.2)	63
Tabla 24. ID_MV_AC26_643_24 (2025_SGV_5.1)	64
Tabla 25. ID_MV_08_259_1244_11 (MV_08_001_1703_10_V6 _ESVAP V1_40C sur).....	65
Tabla 26. ID_EX_11_417_1842_12 (2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1).....	65
Tabla 27. ID_EX_01_341_1842_12 (2025_SBP_SI_137.1)	66
Tabla 28. ID_EX_17_033_1881_12 (2025_UT_Calle_11.1).....	67
Tabla 29. ID_EX_17_032_1881_12 (2025_UT_Calle_12.1).....	67
Tabla 30. COI Vigentes.....	73
Tabla 31. Presupuesto general vigencia 2025 contrato No. 2025-2991	75
Tabla 32. % de Avances vs % Programados por ID suministrados con respecto a la vigencia 2025	99

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Tabla 33. Aprobación de ID por parte de INTER/SDM	101
Tabla 34. Costo unitario por actividades ejecutadas.....	105
Tabla 35. Registro del tiempo en Bogotá D.C.....	107
Tabla 36. Listado de costos por ID	110
Tabla 37. Avance general del contrato de obra	111
Tabla 38. Avance del contrato según vigencia 2025.....	114
Tabla 39. Avance específico de los ID's por ejecutar en la vigencia 2025.....	116
Tabla 40. RESUMEN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	119

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto-Bogotá D.C.....	14
Ilustración 2. Localización general de primer paquete de ID's.....	15
Ilustración 3. Localización general de segundo paquete de ID's	15
Ilustración 4. UPZ de la ciudad de BOGOTÁ DC.....	16
Ilustración 5. Ubicación geográfica ID 2024-SBP-00.1	17
Ilustración 6. Ubicación geográfica ID 2023-SGV-01.1 Y 01.2.....	18
Ilustración 7. Ubicación geográfica del ID 2023_SGV_6.1.....	18
Ilustración 8. Ubicación geográfica del ID 2025_OSV-PEP_COLOMBA.1	20
Ilustración 9. Ubicación geográfica del antes del ID 2025_SGV_5.1	21
Ilustración 10. Ubicación geográfica del antes del ID MV_14_089_1249_11 y EX_14_096_1881_12	22
Ilustración 11. Ubicación geográfica del antes del ID MV_14_089_1249_11	23
Ilustración 12. Ubicación geográfica del antes del ID MV_14_089_1249_12	23
Ilustración 13. Ubicación geográfica del antes del ID MV_08_259_1244_11	25
Ilustración 14. Ubicación geográfica del antes del ID EX_08_308_1867_12.....	25
Ilustración 15. Ubicación geográfica del antes del ID EX_08_308_1867_12.....	26
Ilustración 16. Ubicación geográfica del antes del ID EX_13_171_1881_12.....	26
Ilustración 17. Ubicación geográfica del antes del ID EX_05_001_1073_24.....	26
Ilustración 18. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1	29
Ilustración 19. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1	30
Ilustración 20. Ubicación geográfica ID 2024_SI_2.1	30
Ilustración 21. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_82.....	31
Ilustración 22. Ubicación geográfica ID 2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	31
Ilustración 23. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_137.1	32

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

<i>Ilustración 24.</i> Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_11.1	32
<i>Ilustración 25.</i> Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_12.1	33
<i>Ilustración 26.</i> Ubicación geográfica ID 2024_SBP_9.1	33
<i>Ilustración 27.</i> Ubicación geográfica ID 2024_OSV_1.1	34
<i>Ilustración 28.</i> Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_1.1	34
<i>Ilustración 29.</i> Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_2.1	35
<i>Ilustración 30.</i> Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_3.1	35
<i>Ilustración 31.</i> Ubicación geográfica ID 2024_SGV_14.1	36
<i>Ilustración 32.</i> Ubicación geográfica ID 2025_DIT_1.1	36
<i>Ilustración 33.</i> Ubicación geográfica ID 2025_DIT_2.1	37
<i>Ilustración 34.</i> Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_4.1	37
<i>Ilustración 35.</i> Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_5.1	38
<i>Ilustración 36.</i> Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_6.1	38
<i>Ilustración 37.</i> Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_7.1	39
<i>Ilustración 38.</i> Programación Primer paquete de ID's	53
<i>Ilustración 39.</i> Cronograma de visitas técnicas primer paquete ID's	54
<i>Ilustración 40.</i> Pantallazo del grupo ESVAP Obra	54
<i>Ilustración 41.</i> Programación visita técnica ID: 2024_SGV_11	55
<i>Ilustración 42.</i> Programación de visitas de inspección para segundo paquete de ID's suministrados	55
<i>Ilustración 43.</i> ID MV_AUTO_SUR_643_24 (2024_SGV_6.1, 6.2, 6.3 y 6.4)	68
<i>Ilustración 44.</i> Detalle malla eslabonada	69
<i>Ilustración 45.</i> Detalle de malla en varilla	69
<i>Ilustración 46.</i> Detalle de vallas	70
<i>Ilustración 47.</i> Detalle de materia alta	70
<i>Ilustración 48.</i> Detalle de materia paralelepípedo	71
<i>Ilustración 49.</i> Detalle de bolardo M63	71
<i>Ilustración 50.</i> Detalle de bolardo cúbico	72
<i>Ilustración 51.</i> Resumen General del contrato 2025-2991	113
<i>Ilustración 52.</i> Resumen avance del contrato según vigencia 2025	115
<i>Ilustración 53.</i> Resumen del avance específico de cada ID's suministrado	118
<i>Ilustración 54.</i> Cargue y Disposición final de RCD generados	121

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Movilidad - SDM en el marco de sus funciones y en pro de garantizar condiciones de seguridad vial y accesibilidad para todos los ciudadanos, en los últimos años ha desarrollado diferentes estrategias para recuperar el espacio público peatonal, así como mitigar conductas de riesgo de cruce transversal sobre las vías por lugares no regulados, y el redireccionamiento de los peatones a los cruces y lugares seguros y accesibles. La vulnerabilidad de la circulación peatonal frente a los otros modos de transporte evidencia que, los peatones son el actor vial con mayor riesgo al momento de movilizarse por las calles.

Por lo anterior, desde la SDM se han implementado diferentes estrategias como; Política Pública del Peatón, “En Bogotá primero el peatón 2023-2035”, la cual busca consolidar a Bogotá como una ciudad cuyas condiciones de infraestructura, accesibilidad y seguridad fomenten y mejoren la calidad de la movilidad peatonal y el disfrute en el espacio público.

El presente documento contiene información detallada correspondiente al contrato de obra No. 2025-2991 celebrado entre la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD-SDM** y **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025** y cuyo objeto del contrato es; “**SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**” con vigencia para los años 2025, 2026 y 2027. La SDM con el desarrollo de este proyecto, busca contribuir con la mejora de las condiciones de seguridad vial y accesibilidad para todos los actores viales de la ciudad de Bogotá D.C, principalmente para los peatones. Además, forma parte de una estrategia que busca priorizar de forma segura la circulación peatonal en sitios de mayor afluencia, suministrando, instalando y/o implementando Elementos de Seguridad Vial y Accesibilidad Peatonal-ESVAP, que garanticen pasos seguros peatonales y el uso racional de la infraestructura vial actual.

El proyecto fue realizado en la ciudad de Bogotá D.C, sobre las 20 localidades que la componen, específicamente sobre las áreas integrantes de los perfiles viales peatonales y vehiculares, constitutivos del espacio público asociado a la infraestructura de transporte de la ciudad. El contrato tiene un plazo de ejecución de treinta y un (31) meses.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Para la ejecución del presente contrato, se implementaron las siguientes etapas:

Tabla 1. Etapas de la implementación del proyecto

ETAPAS	DURACIÓN
ETAPA 1. Actividades preliminares a la implementación y actividades de implementación de los elementos de seguridad vial y accesibilidad peatonal.	Del mes 1 al mes 30 (contados a partir de la suscripción del acta de inicio).
ETAPA 2. Actividades de Georreferenciación (Mes a mes de acuerdo con la implementación realizada en el periodo).	Del mes 1 al mes 30 (contados a partir de la suscripción del acta de inicio).
ETAPA 3. Actividades de cierre de Georreferenciación (Correspondiente a la implementación realizada en el mes 30) y actividades de cierre de contrato.	En el mes 31 (contados a partir de la suscripción del acta de inicio).

Fuente: Tabla tomada del documento “2.1 anexo técnico definitivo-SDM.LP-10-2025”.

Finalmente, los factores de evaluación para la adjudicación de la licitación pública SDM-LP-10-2025 fueron las siguientes:

Tabla 2. Factores de evaluación

CONCEPTO	PUNTAJE MAXIMO
Oferta económica	48,5
Factor de calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresa de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
TOTAL	100

Fuente: Tabla tomada del documento “2.1 anexo técnico definitivo-SDM.LP-10-2025”.

Factor de calidad. El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presentó para su revisión y aprobación, documentos como: Plan de Aseguramiento de calidad, Plan Técnico de Inspección y Ensayos, entre otros, bajo los lineamientos descritos en el anexo técnico.

Apoyo a la industria nacional. El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** da cumplimiento al concepto de apoyo a la industrial nacional mediante la adquisición de insumos, herramientas y/o

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

equipos de origen nacional. Además, de la contratación de mano de obra calificada y no calificada de origen nacional. (Ver Anexo R, "Certificaciones Factores de Evaluación").

Vinculación de personas con discapacidad. El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** da cumplimiento mediante la vinculación de personas con discapacidad de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015. (Ver Anexo R, "Certificaciones Factores de Evaluación").

Para el presente periodo, se cuenta con la participación de ocho (8) mujeres, quienes representan el 18,60 % del total del personal contratado y asignado al presente Proyecto. Por lo cual se cumple con el Decreto 332 de 2020, de la Alcaldía Distrital, teniendo en cuenta que la actividad económica y rama a la cual se relaciona el objeto del presente contrato es Construcción, el cual indica que el porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contrato, a partir del 1 de junio de 2023 es del 13.8%.

Para el presente informe se relaciona el personal que se tiene asignado al proyecto y que cumple con los diferentes porcentajes contractuales. Sin embargo, no se realiza en ingreso y la solicitud formal a la interventoría para la aprobación de algunos de ellos, teniendo en cuenta que el contrato por ser su etapa inicial no lo amerita.

Una vez, el proyecto inicie al 100% sus actividades operativas, se asignará y radicará la información de cada uno de los trabajadores que serán asignados al presente proyecto y que cumplen para los diferentes porcentajes que a continuación se relaciona:

Tabla 3. Indicadores de cumplimiento con respecto a los factores de evaluación del contrato

Indicador	Mín	Consideraciones	Personal ofrecido	Cant. en el período	Personal total	Resultado
Mano de obra no calificada local	10%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 10 Num 1	Frank Carlos Gómez Martínez	1	43	CUMPLE
			Luis Miguel Patiño	1		
			Fernando Fidel Vergara Morales	1		
			Giovanni Duarte Peña	1		
Mano de obra no calificada local- mujeres	5%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 10 Num 1	Angie Catalina Hernández Castillo	1	43	CUMPLE
			Yuli Paulin Rodríguez	1		
			Nancy Liliana Parra Herrera	1		

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Indicador	Mín	Consideraciones	Personal ofrecido	Cant. en el período	Personal total	Resultado
			Yeimy Viviana Cifuentes Castañeda	1		
Participación de mujeres	13.8%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 11 Num 37	María Catalina Galeano Soto	1	43	CUMPLE
			Merlyn Katherine Caicedo Villamarín	1		
			Ana Paola Pinzón	1		
			Laura Valentina Sánchez Reyes	1		
			Angie Catalina Hernández Castillo	1		
			Nancy Liliana Parra Herrera	1		
			Yuli Paulin Rodríguez	1		
			Yeimi Viviana Cifuentes Castañeda	1		
Participación de jóvenes (18-28 años)	5%	Profesionales o tecnólogos CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 11 Num 38	Angie Catalina Hernández Castillo	1	43	CUMPLE
			Laura Valentina Sánchez Reyes	1		
Personal vulnerable	0%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 10 Num 48	Luis A Cardenas Contreras (Profesional de calidad)	1	43	CUMPLE

Fuente: Elaboración propia.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra **No. 2025-2991** con objeto “**SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**” pretende mejorar las condiciones de seguridad vial, protegiendo los espacios públicos dedicados exclusivamente al tránsito de peatones, siendo el peatón el actor vial con mayor vulnerabilidad, redireccionando a los usuarios a cruces seguros, mediante la implementando Elementos de Seguridad Vial y Accesibilidad Peatonal-ESVAP en la infraestructura de transporte de la ciudad de Bogotá D.C.

La SDM suministrará al contratista a través de la interventoría las solicitudes (Fichas técnicas de Soporte-FTS, Documentos Técnicos de Soporte-DTS, esquemas, planos o cualquier otro documento validado por la SDM).

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

A continuación, se describen las actividades y/o elementos de seguridad vial y accesibilidad peatonal por implementar, de acuerdo con lo relacionado en el anexo técnico del presente proyecto.

- Actividades preliminares (Demoliciones, excavaciones, concretos y suministro de aceros).
- Reemplazo, mantenimiento o suministro de mallas.
- Desmante, reemplazo o suministro de bolardos.
- Desmante, reemplazo, mantenimiento o suministro de barandas.
- Desmante o suministro de materas.

Es importante aclarar, que el proyecto puede implementar otras actividades diferentes a las mencionadas anteriormente, según las necesidades que surjan durante su desarrollo.

3.1. DETALLES DEL CONTRATO

3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO 2025-2991

Tabla 4. Detalles del contrato

Entidad contratante:	Secretaría Distrital de Movilidad
Contratista:	Consortio Seguridad Vial Bogotá 2025
Contrato:	2025-2991
Objeto:	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
Plazo total del Contrato:	TREINTA Y UN (31) MESES
Fecha de inicio:	19/08/2025
Fecha de terminación:	18/03/2028
Interventoría:	Consortio Magnus
Contrato:	2025-3000

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 5. Detalles de Pólizas del contrato

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
ASEGURADORA – ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
AMPAROS	ANEXO No.:	03		
	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	SGPL-203821158-1	19/08/2025	18/09/2028	\$ 3.045.364.822,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SGPL-203821158-1	19/08/2025	18/03/2031	\$ 2.030.243.215,00
Estabilidad y calidad de las obras	SGPL-203821158-1	18/03/2028	18/03/2033	\$ 3.045.364.822,50

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Fuente: Elaboración propia.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
ASEGURADORA – ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
AMPAROS	ANEXO No.:	02		
	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
		DESDE	HASTA	
Predios, Labores y Operaciones	LBCO-203825579-1	19/08/2025	18/03/2028	\$ 711.750.000,00
Daño Moral	LBCO-203825579-1	19/08/2025	18/03/2028	\$ 711.750.000,00
Lucro Cesante	LBCO-203825579-1	19/08/2025	18/03/2028	\$ 711.750.000,00
RC Contratistas y subcontratistas independientes	LBCO-203825579-1	19/08/2025	18/03/2028	\$ 711.750.000,00
RC Patronal	LBCO-203825579-1	19/08/2025	18/03/2028	\$ 711.750.000,00
RC Vehículos propios y no propios.	LBCO-203825579-1	19/08/2025	18/03/2028	\$ 711.750.000,00


Fuente: Elaboración propia.

En el **ANEXO A**, se relacionan las pólizas actualizadas del contrato 2025-2991.

4. LOCALIZACIÓN GENERAL

Las actividades de suministro y/o instalación y/o implementación de los ESVAP será realizado en la ciudad de Bogotá D.C, en zonas priorizadas por la secretaria Distrital de Movilidad de acuerdo con el espacio público asociado a la Infraestructura de Transporte actual.

Ilustración 1. Localización del proyecto-Bogotá D.C

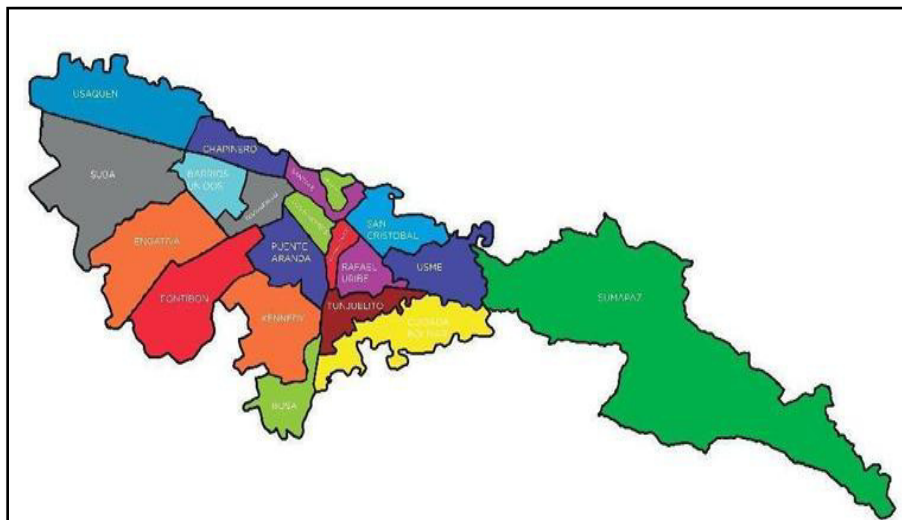

Fuente: Figura tomada del Anexo Técnico Definitivo del Documento SDM-LP-10-2025.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0


4.1. LOCALICACION GENERAL DE ID'S SUMINISTRADOS POR LA SDM

Ilustración 2. Localización general de primer paquete de ID's

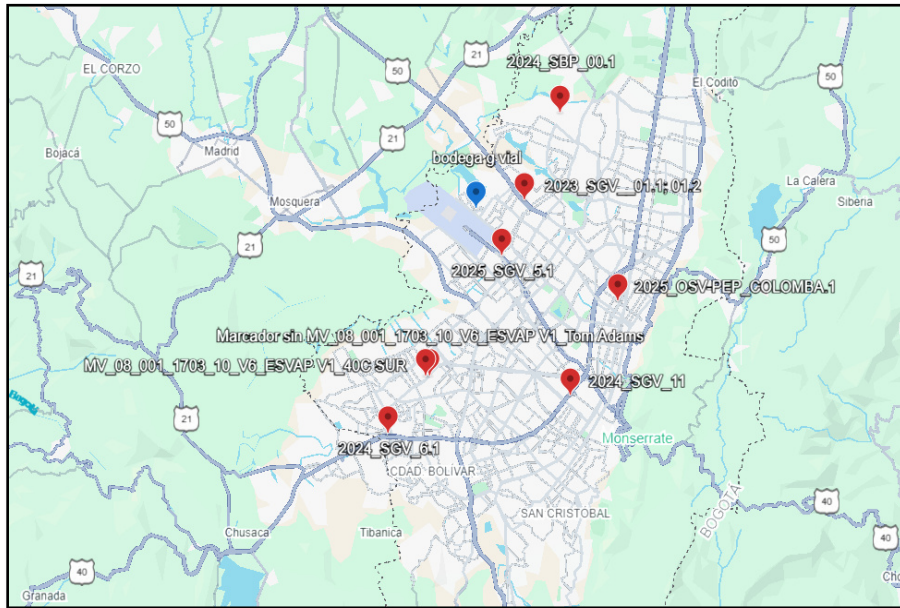

Fuente: Elaboración propia en Google Maps.

Ilustración 3. Localización general de segundo paquete de ID's

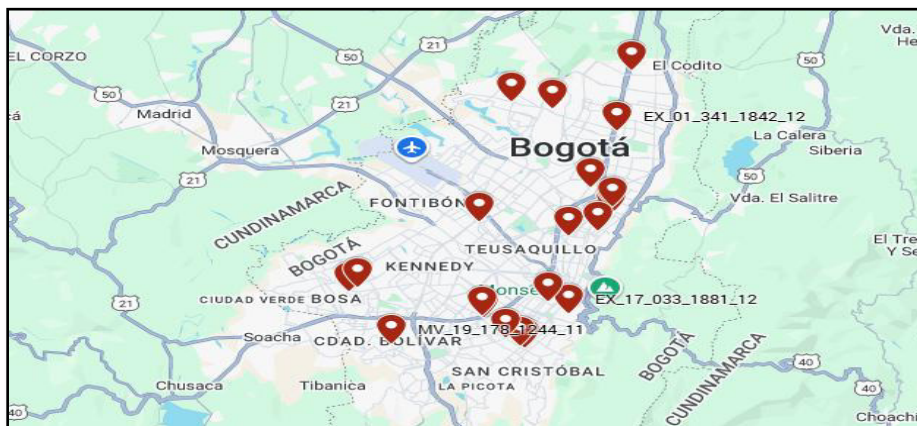


Fuente: Elaboración propia en Google Maps.

Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) constituyen una herramienta fundamental para la gestión territorial en Bogotá, ya que permiten organizar el suelo urbano a una escala intermedia entre la

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

localidad y el barrio. Cada UPZ agrupa sectores con características urbanas, sociales y económicas similares, lo que facilita la planeación, el seguimiento y la evaluación de proyectos de inversión pública y privada. En el presente informe mensual, la clasificación por UPZ permite ubicar con precisión cada ID asociado a la implementación del ESVAP. Esta distribución territorial facilita el análisis espacial de las intervenciones y su representación se presenta en la Ilustración 4.

Ilustración 4. UPZ de la ciudad de BOGOTA DC

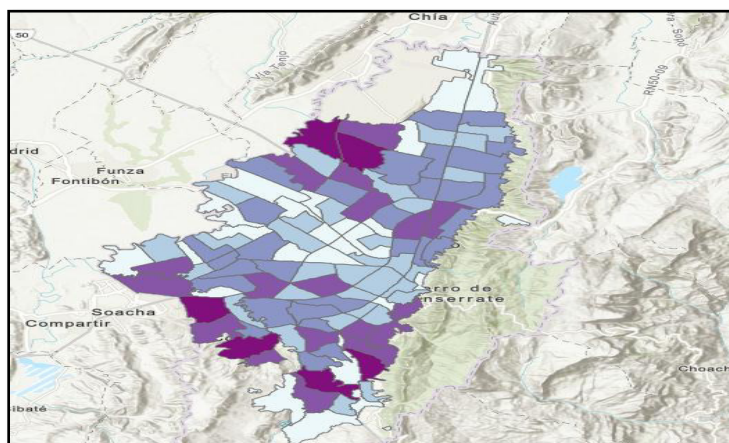

Fuente: Imagen tomada de ARCGIS MAP VIEWER.

4.2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES DE IMPLEMENTACION DE ID's

A continuación, se detallan las zonas a intervenir en la ciudad de Bogotá D.C de acuerdo con las fichas técnicas de soporte y memorandos recibidos en el periodo del presente informe:

4.2.1.PRIMER PAQUETE DE ID's SUMINISTRADO POR LA SDM

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó el primer paquete conformado por cinco (05) ID's el día veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025) distribuidos como viene a continuación:

Tabla 6. Primer paquete de ID's suministrados por la SDM

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado
2024_SBP_00.1	MV_AV_CALI_941_09_T1	Calle 151C	Av Ciudad de Cali	Av Ciudad de Cali	EW-WE	Separador
2023_SGV_01.1 y 01.2	MV_AV_CALLE_80_1238_24	Av. calle 80	Carrera 102	Carrera 97	E w, W-E	Separador

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido o vial	Costado
2024_SGV_6.1	MV_AUTO_SUR_643_24	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito	E-W	N
2024_SGV_6.2	MV_AUTO_SUR_643_24	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito	E-W	N
2024_SGV_6.3 y 6.4	MV_AUTO_SUR_643_24	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito	EW-WE	N, S
2025_OSV- PEP_COLOMBA.1	EX_12_141_1881_12	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A Bis	E-W	
2025_OSV- PEP_COLOMBA.2 y 3	EX_12_141_1881_12	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A Bis	E-W	
2025_SGV_5.1	MV_AC26_643_24	Av. calle 26	Diagonal 25C	Carrera 96A	E w, W-E	N-S

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_AV_CALI_941_09_T1:** Se encuentra ubicado en la localidad de Suba con dirección calle 151C con Avenida ciudad de Cali, en el separador. Sentido vial EW-WE en el barrio Pinos de Lombardía, barrio que pertenece a la UPZ No. 27 “Suba centro”

Ilustración 5. Ubicación geográfica ID 2024-SBP-00.1



Fuente: Elaboración propia.

- **MV_AV_CALLE_80_1238_24:** Se encuentra ubicado en la localidad de Engativá con dirección: Av. Calle 80 entre Cra. 97 y Cra. 102 en el barrio Bochica, barrio que pertenece a la UPZ 73 “Garces Navas”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Ilustración 6. Ubicación geográfica ID 2023-SGV-01.1 Y 01.2




- **MV_AUTO_SUR_643_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Bosa con dirección: Sobre la autopista sur con calle 63 Sur, en el barrio Bosa La Estación, barrio que pertenece a la UPZ 85 “Bosa Central”

Ilustración 7. Ubicación geográfica del ID 2023_SGV_6.1



CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

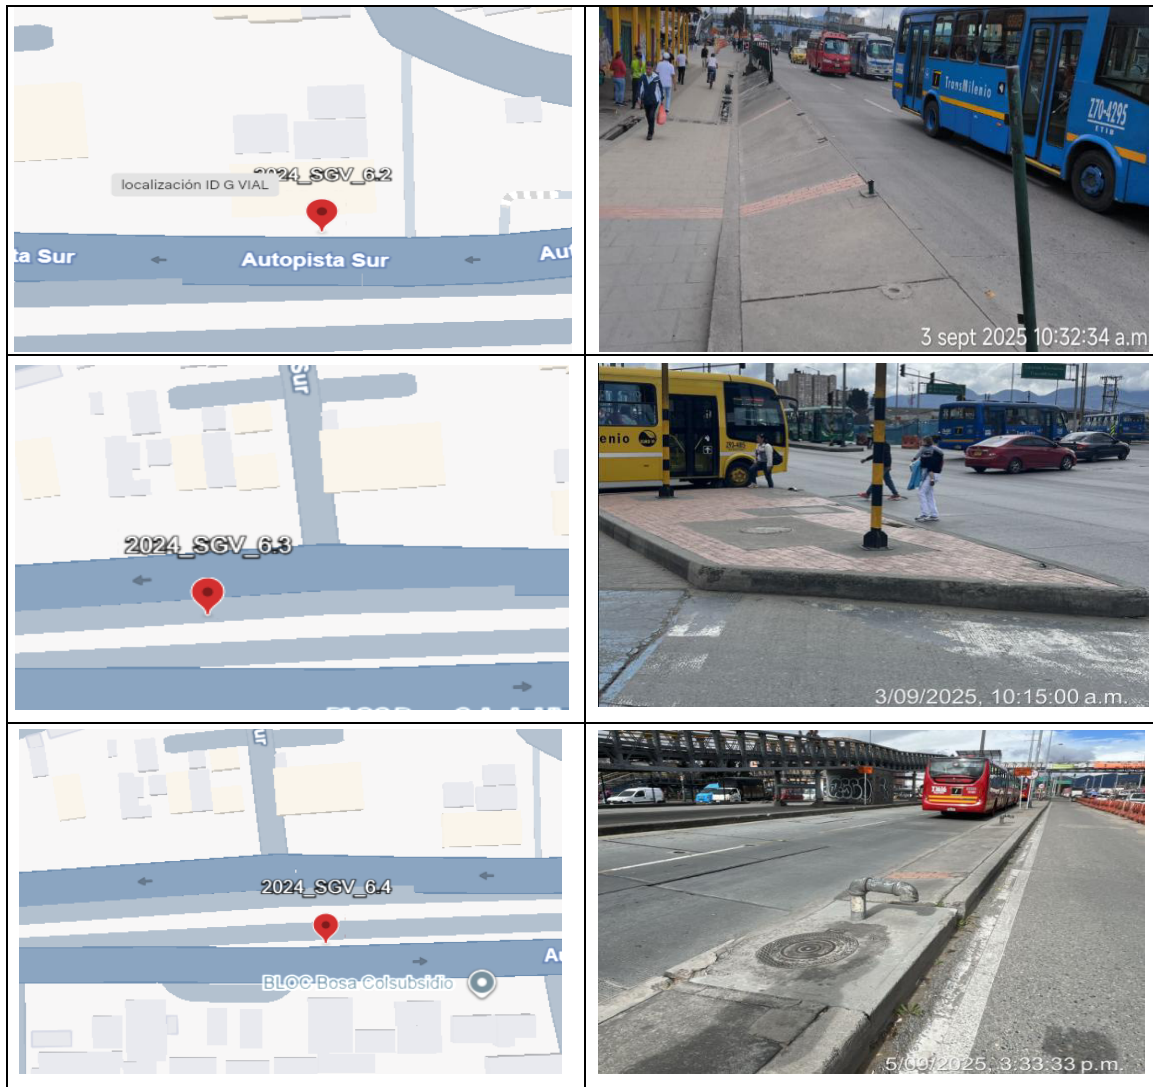

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_12_141_1881_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos con dirección: Calle 71A con Cra. 20 y Diag. 71A Bis (E-W), en el barrio SAN FELIPE, barrio que pertenece a la UPZ 98 “Los Alcázares”.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Ilustración 8. Ubicación geográfica del ID 2025_OSV-PEP_COLOMBA.1



Fuente: Elaboración propia.

- **MV_AC26_643_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón con dirección: Av. Calle 26 entre diagonal 25C y Cra 96A, sentido E-W, costado N-S, en el barrio Santa Cecilia, barrio que pertenece a la UPZ 115 “Capellanía”, UPZ 116 “Alamos” y UPZ 117 “Aeropuerto el dorado”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Ilustración 9. Ubicación geográfica del antes del ID 2025_SGV_5.1



Fuente: Elaboración propia.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

4.2.1.1. SEGUNDA ENTREGA ID's PRIMER PAQUETE SUMINISTRADO POR LA SDM

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó la segunda entrega del primer paquete conformado por Seis (06) ID's el día ocho (08) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) como viene a continuación:


Tabla 7. ID's segunda entrega del primer paquete de ID's suministrado por la SDM

Nombre FTS	ID
ID_2024_SGV_11	EX_14_096_1881_12
ID_2024_SGV_11	MV_14_089_1249_11
MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1_40C sur	EX_08_308_1867_12
MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1_40C sur	EX_08_308_1867_12
MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1_Tom Adams	MV_08_259_1244_11
TEUSAQUILLO	EX_13_171_1881_12
ANTONIO JOSE DE SUCRE	EX_05_001_1073_24

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_14_089_1249_11 y EX_14_096_1881_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires con dirección: carrera 27 entre Calle 19 y calle 22, en el barrio Paloquemao, barrio que pertenece a la UPZ 102 “La Sabana”, sobre el perímetro de la plaza de mercado de Paloquemao.

Ilustración 10. Ubicación geográfica del antes del ID MV_14_089_1249_11 y EX_14_096_1881_12

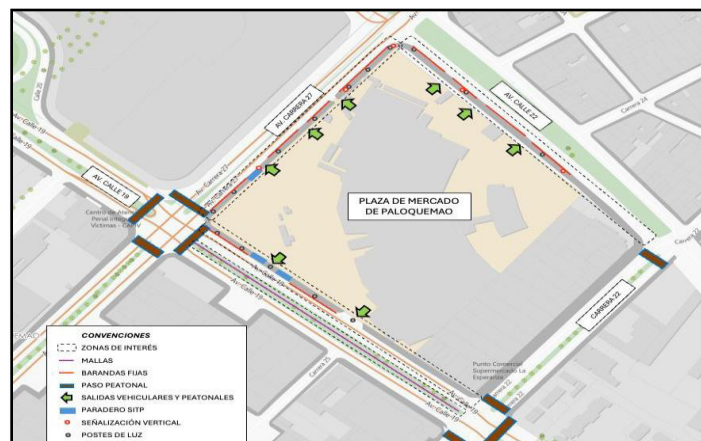


Fuente: Secretaría distrital de movilidad (SDM).

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **MV_14_089_1249_11:** Se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires con dirección: Calle 19 con carrera 22 a carrera 27, en el barrio Paloquemao, barrio que pertenece a la UPZ 102 “La Sabana”.

Ilustración 11. Ubicación geográfica del antes del ID MV_14_089_1249_11

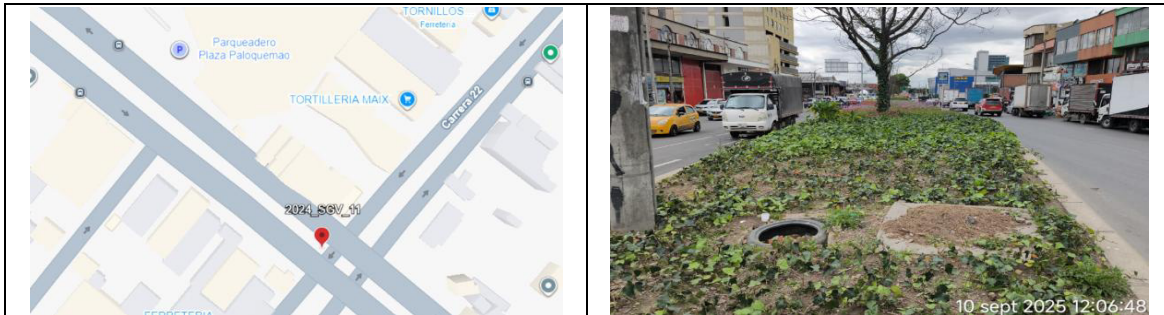


Fuente: Elaboración propia.

- **MV_14_089_1249_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires con dirección: carrera 27 entre Calle 19 y calle 22, en el barrio Paloquemao, barrio que pertenece a la UPZ 102 “La Sabana”

Ilustración 12. Ubicación geográfica del antes del ID MV_14_089_1249_12



CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

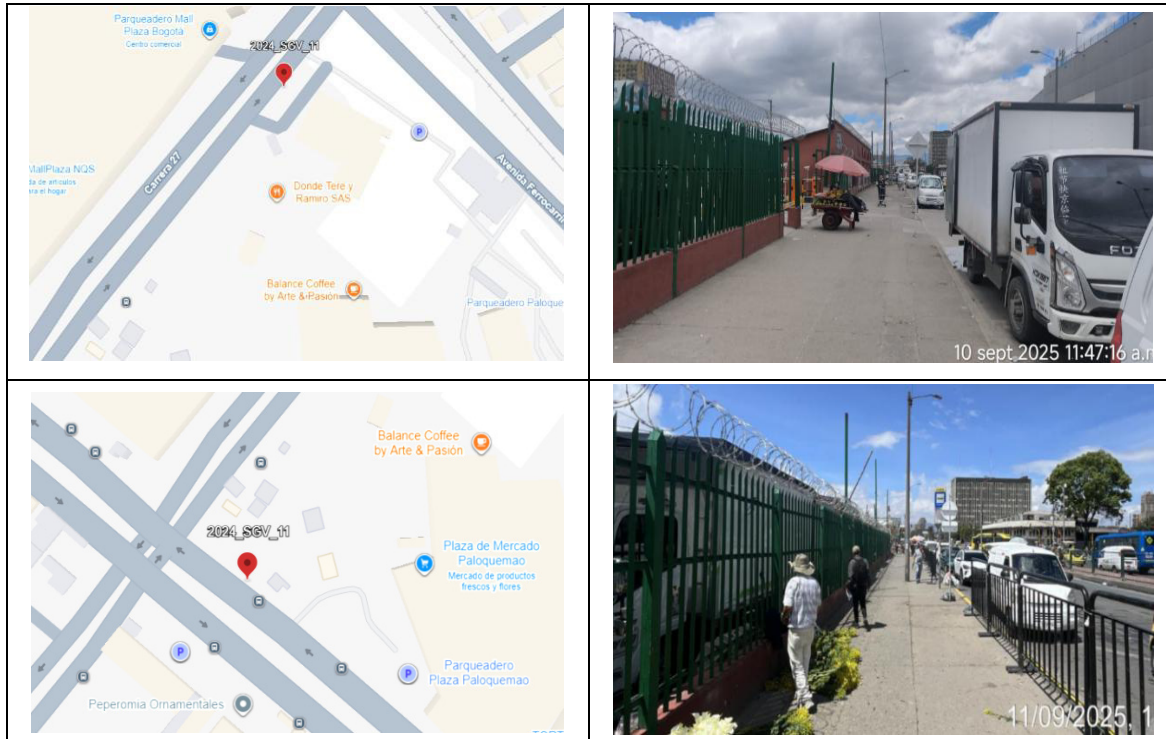

- **MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C SUR y ID_MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_TOM ADAMS:** La ubicación de este ID se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy.

Tabla 8. MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C SUR y ID_MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_TOM ADAMS


ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado	Tipo de elemento
MV_08_259_1244_11	AV AGOBERTO MEJIA	calle 40c sur	calle 40b sur	W-E	separador central	Valla PEATONAL
EX_08_308_1867_12	TOM ADAMS	ClI 40a Sur - Cra 79c	ClI 39a Sur - Cra 79f	EW-WE	N, S	Bolardos
EX_08_308_1867_12	TOM ADAMS	Cl 40C Cra 79	Cra 80		calzada	Materia alta

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_08_259_1244_11:** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: sobre la carrera 79F – Cra 79C entre la calle 40 sur a la calle 39 A sur/calle 40 A sur y Av. Carrera 80 en el separador central ubicado en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0


Ilustración 13. Ubicación geográfica del antes del ID MV_08_259_1244_11

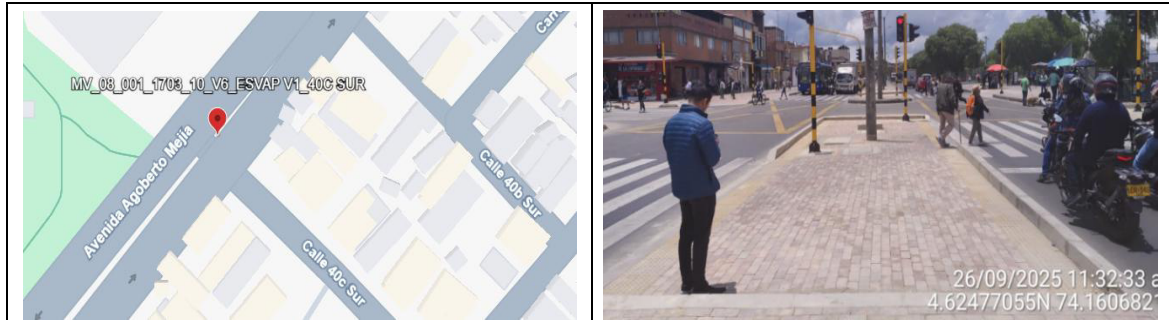

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_08_308_1867_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: sobre la carrera 79F – Cra 79C entre la calle 40 sur a la calle 39 A sur/calle 40 A sur, ubicado en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

Ilustración 14. Ubicación geográfica del antes del ID EX_08_308_1867_12

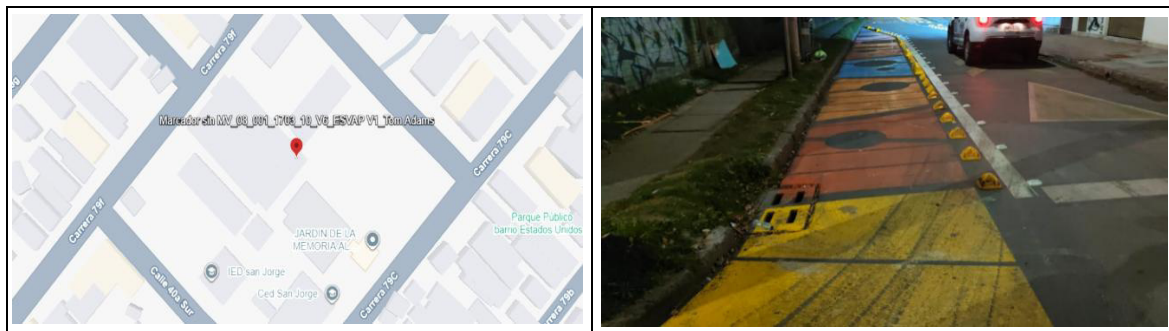


Fuente: Elaboración propia.

- **EX_08_308_1867_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: sobre la carrera 79F – Cra 79C entre la calle 40 sur a la calle 39 A sur/calle 40 A sur, ubicado en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Ilustración 15. Ubicación geográfica del antes del ID EX_08_308_1867_12

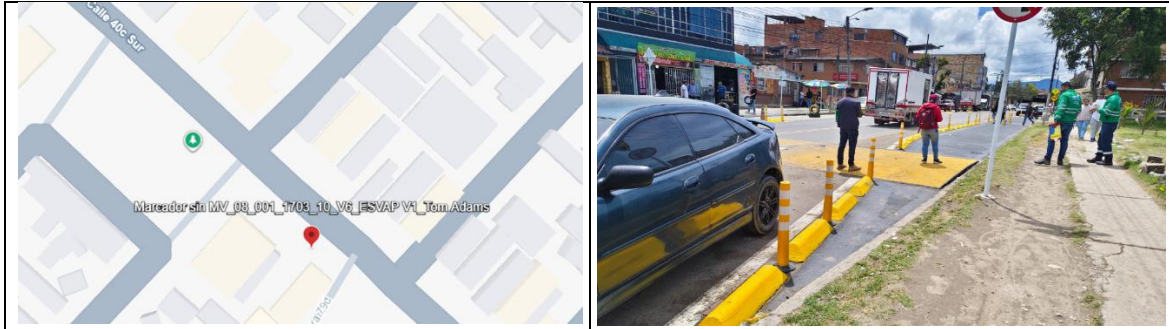

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_13_171_1881_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo con dirección: Sobre la transversal 17A bis entre la CL 36 y CL 37, pertenece a la UPZ 101 “Teusaquillo”.


Ilustración 16. Ubicación geográfica del antes del ID EX_13_171_1881_12



Fuente: Elaboración propia.

- **EX_05_001_1073_24:** Se encuentra ubicado en la localidad de Usme sobre la Carrera 7 entre la calle 108 sur y la calle 106.

Ilustración 17. Ubicación geográfica del antes del ID EX_05_001_1073_24

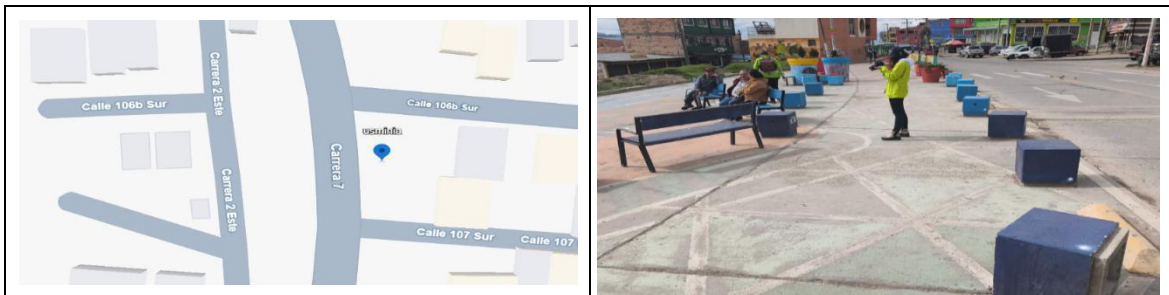

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

4.2.2. SEGUNDO PAQUETE DE ID'S SUMINISTRADOS POR LA SDM

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó el segundo paquete conformado por veinte (20) ID's el día nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) distribuidos como viene a continuación:

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado
2025_SBP_SI_63.1	MV_10_161_1560_10	Calle 63	Carrera 24	Carrera 26	EW-WE	E-W
2025_SBP_SI_63.1	EX_13_109_1098_11	Carrera 26	Calle 62	Calle 63	S-N	E-W
2024_SI_2.1	EX_11_413_1842_12	Calle 145B	Carrera 85A	Carrera 85B	E-W	N-S
2025_UT_Calle_82	EX_02_038_1556_10	Calle 82 Carrera 13	Carrera 11 Calle 85 Calle 86a	Carrera 12 Calle 86a Calle 87a	E-W S-N	N-S
2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	EX_11_417_1842_12	Calle 139	Carrera 104	Carrera 110	EW-WE	Separador
2025_SBP_SI_137.1	EX_01_341_1842_12	Calle 137	Carrera 23	Autopista Norte	E-W	N-S
2025_UT_Calle_11.1	EX_17_033_1881_12	Calle 11	Carrera 5	Carrera 7	E-W	N-S
2025_UT_Calle_12.1	EX_17_032_1881_12	Calle 12A	Carrera 7	Carrera 8	E w, W-E	N-S
2024_SBP_9.1	EX_02_003_585_24	Carrera 10	Calle 70	Calle 70A	S-N	E-W

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado
2024_OSV_1.1	MV_08_259_1244_11	Carrera 80	Calle 55	Calle 57A Sur	S-N	Separador
2025_SGV_MANT_1.1	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte	Calle 187	Calle 188A	S-N	Separador
2025_SGV_MANT_2.1	MV_09_424_947_10	Avenida Calle 24	Av Carrera 70	Avenida Boyaca	EW-WE	Separador
2025_SGV_MANT_3.1	MV_AC_13_872_24_T1	Avenida Calle 13	Carrera 17	Carrera 18	EW-WE	Separador
2025_SGV_MANT_3.2	MV_AC_13_872_24_T1	Avenida Calle 13	Carrera 17	Carrera 18	EW-WE	Separador
2024_SGV_14.1	MV_12_001_1238_24	Carrera 50	Calle 94C	Calle 94	S-N	Separador
2025_DIT_1.1	MV_08_259_1244_11	Carrera 80	Calle 55 Sur	Calle 43 Sur	S-N	Separador
2025_DIT_2.1	MV_19_178_1244_11	Avenida Villavicencio	Carrera 45B	Carrera 50	E-W	Separador
2025_SGV_MANT_4.1	MV_15_016_1561_10 MV_04_511_676_09	Avenida Primera de Mayo	Carrera 6	Carrera 110	E-W	Separador
2025_SGV_MANT_5.1	MV_15_016_1561_10	Avenida Primera de Mayo	Carrera 12D	Carrera 13	E-W	Separador

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado
2025_SGV_MANT_6.1	MV_15_016_1561_10	Avenida Primera de Mayo	Carrera 14	Carrera 18	E-W	Separador
2025_SGV_MANT_7.1	MV_06_001_643_24 MV_AUTO_SUR_643_24	Avenida Primera de Mayo	Carrera 30	Transversal 35	E-W	Separador

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_10_161_1560_10:** Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos con dirección Calle 63 entre la Carrera 24 y la Carrera 26, en el andén. Sentido vial EW-WE en el barrio Quinta Mutis, barrio que pertenece a la UPZ No. 98 “Los alcázares”.

Ilustración 18. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1



Fuente: Elaboración propia.

- **EX_13_109_1098_11:** Se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo con dirección: Carrera 26 entre Calle 62 y Calle 63 en el barrio Quinta Mutis, barrio que pertenece a la UPZ 100 “Galerías”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0


Ilustración 19. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1



Fuente: Elaboración propia.

- **EX_11_413_1842_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de Suba con dirección: Sobre la Calle 145B entre la AK 85A y la AK 85B, en el barrio San Francisco, barrio que pertenece a la UPZ 27 “Suba”.

Ilustración 20. Ubicación geográfica ID 2024_SI_2.1

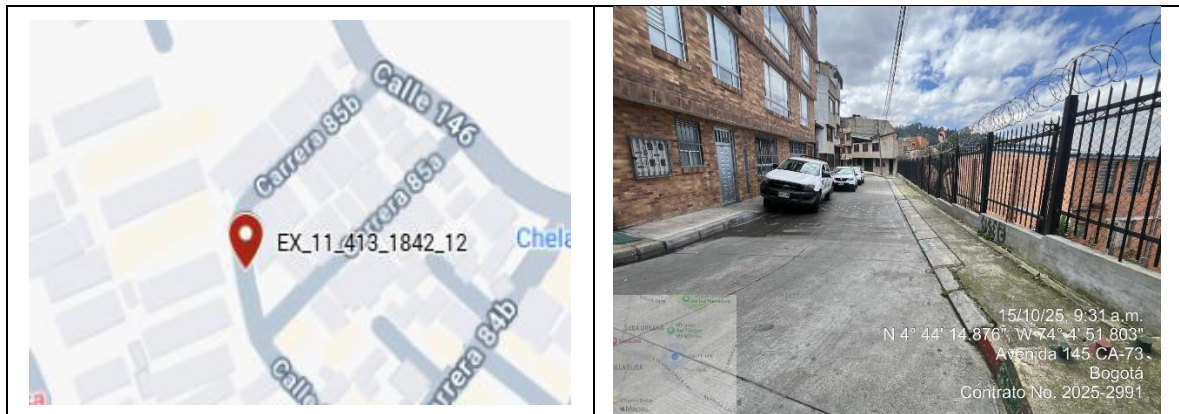


Fuente: Elaboración propia.

- **EX_02_033_1556_10 - EX_02_033_1556_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero con dirección: Sobre la Calle 82 entre la AK 11 y la AK 12, sobre la AK 13 entre la CL 85 y la CL 86ª, sobre la AK 13 entre la CL 86a y la CL 87a, en el barrio El retiro, barrio que pertenece a la UPZ 97 “Chico Lago”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0


Ilustración 21. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_82

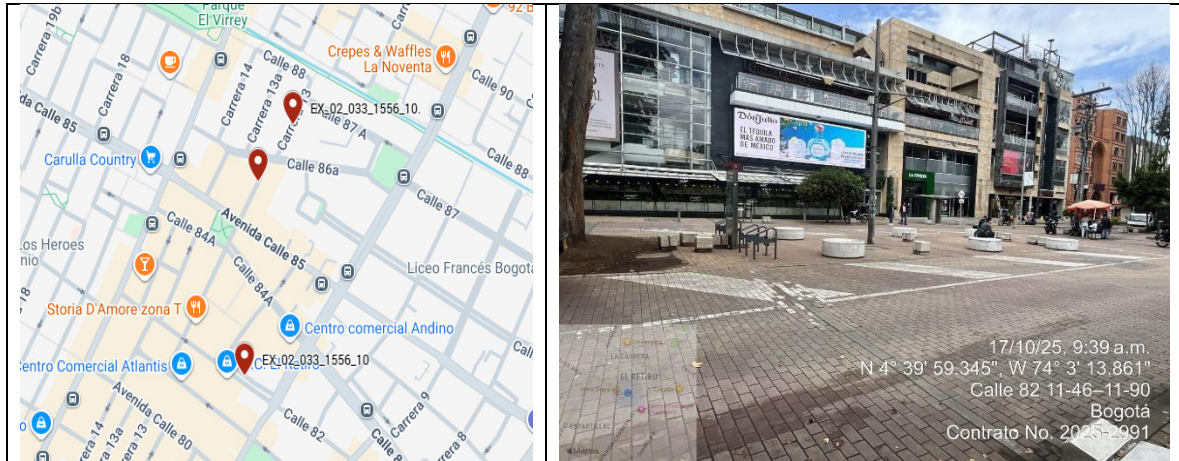

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_11_417_1842_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de Suba con dirección: Sobre la calle 139 entre la AK 104 y la AK 110, en el barrio Las flores, barrio que pertenece a la UPZ 28 “El rincón”.

Ilustración 22. Ubicación geográfica ID 2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1

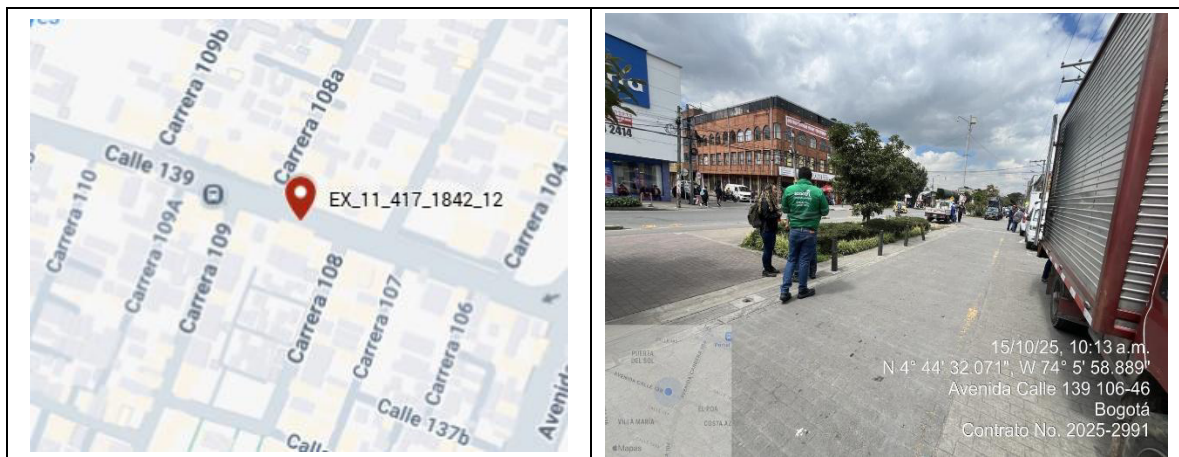

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_01_341_1842_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén con dirección: Sobre la CL 137 entre la AK 23 y la Autopista Norte, en el barrio Los cedros, barrio que pertenece a la UPZ 13 “Los cedros”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0


Ilustración 23. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_137.1



Fuente: Elaboración propia.

- **EX_17_033_1881_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de La candelaria con dirección: Sobre la Calle 11 entre la AK 5 y la AK 7, en el barrio la candelaria, barrio que pertenece a la UPZ 94 “La candelaria”.

Ilustración 24. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_11.1

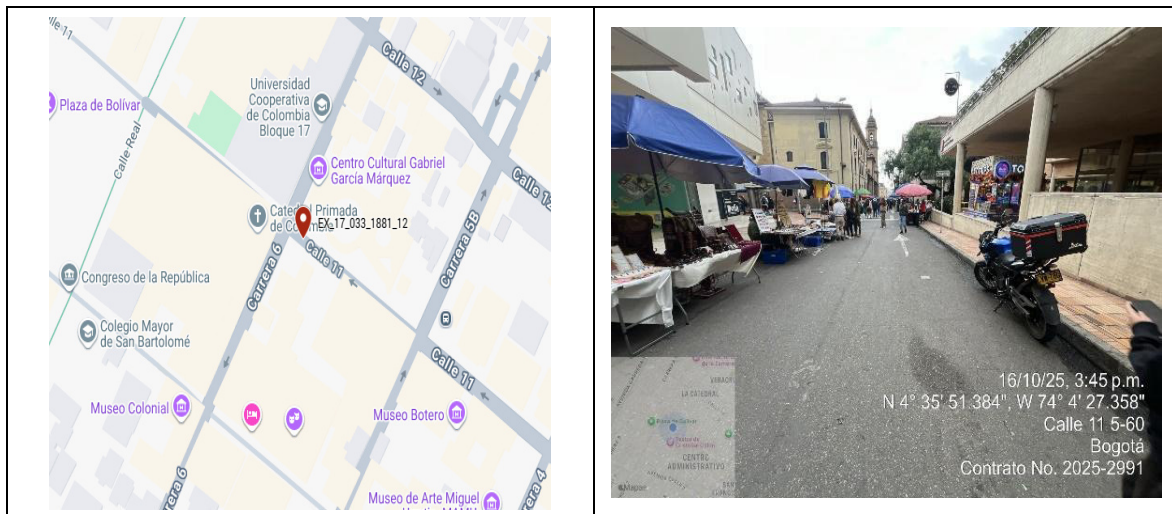

Fuente: Elaboración propia.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **EX_17_033_1881_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de La candelaria con dirección: Sobre la Calle 12 entre la AK 5 y la AK 7, en el barrio la candelaria, barrio que pertenece a la UPZ 94 “La candelaria”.

Ilustración 25. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_12.1

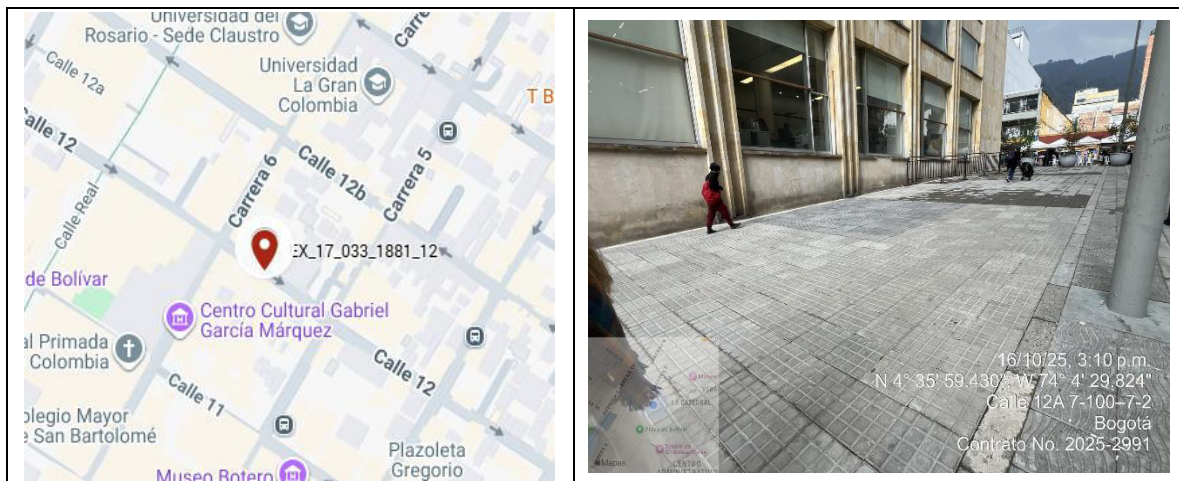

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_02_003_585_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero con dirección: Sobre la Carrera 10 entre la CL 70 y la CL 70A, en el barrio Quinta Camacho, barrio que pertenece a la UPZ 97 “Chico Lago”.

Ilustración 26. Ubicación geográfica ID 2024_SBP_9.1




Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **MV_08_259_1244_11.** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: Sobre la carrera 80 entre la CL 55 y la CL 57A sur, en el barrio britalia, barrio que pertenece a la UPZ 48 “Timiza”.


Ilustración 27. Ubicación geográfica ID 2024_OSV_1.1

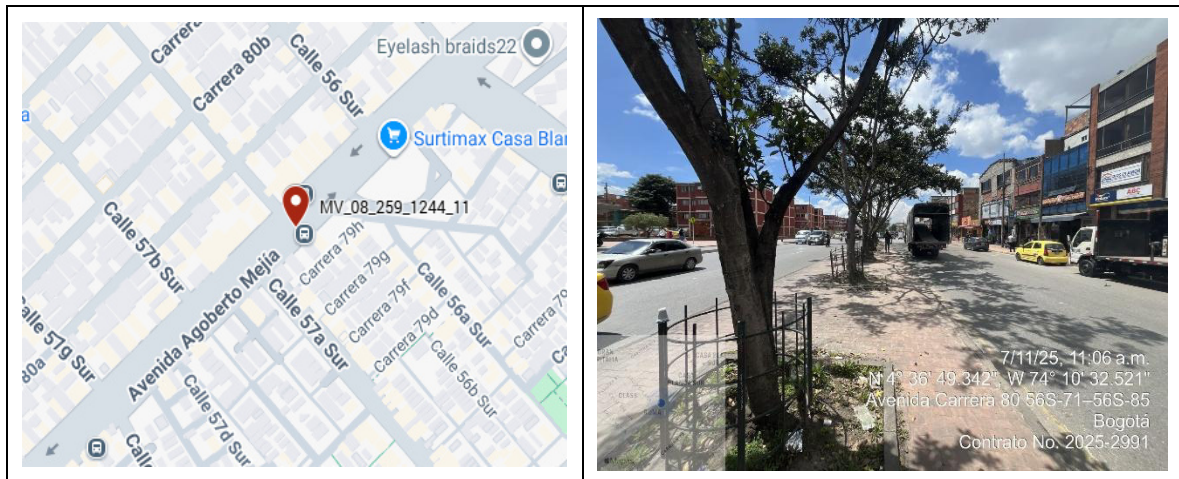

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_01_033_1560_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén con dirección: Sobre la Autopista Norte entre la CL 187 y CL 188 A, en el barrio Mirandela, barrio que pertenece a la UPZ 9 “Verbenal”.

Ilustración 28. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_1.1

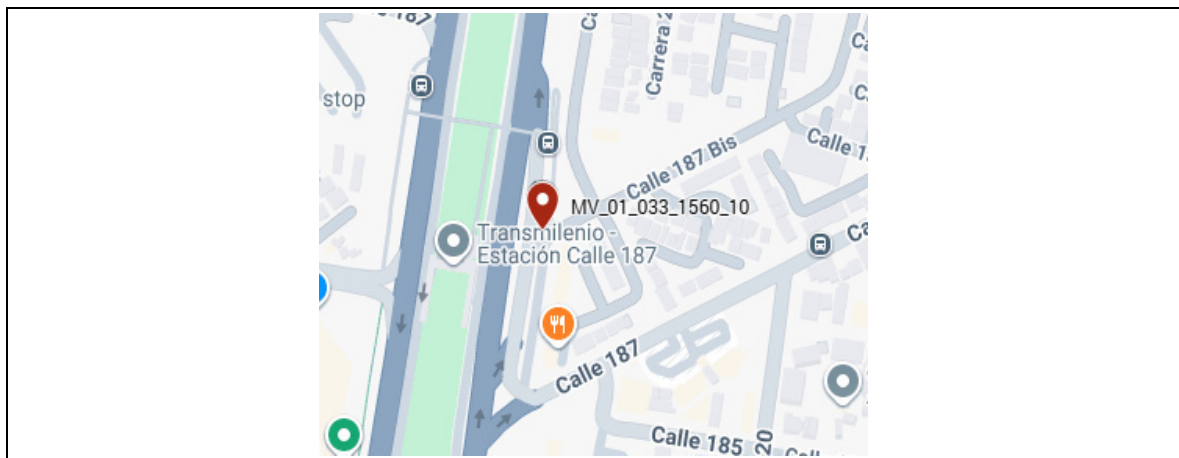


Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **MV_09_424_947_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón con dirección: Sobre Avenida calle 24 con Av. AK 70 con Av. Boyacá, en el barrio la candelaria, barrio que pertenece a la UPZ 110 “Ciudad Salitre occidental”.


Ilustración 29. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_2.1

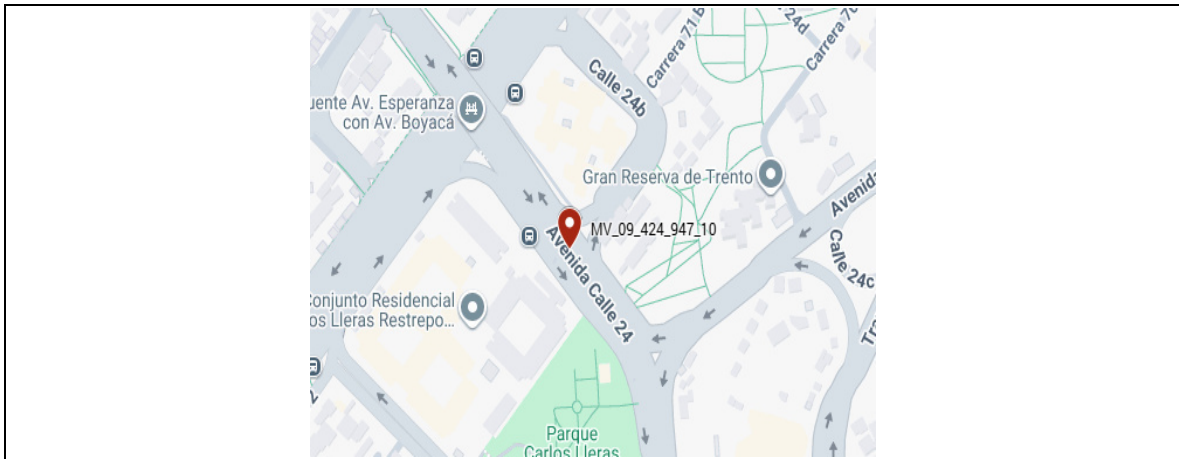

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_AC_13_872_24_T1.** Se encuentra ubicado en la localidad de Los mártires con dirección: Sobre la Av. CL 13 con AK 17 y AK 18, en el barrio Puente Aranda, barrio que pertenece a la UPZ 112 “La sabana”.

Ilustración 30. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_3.1

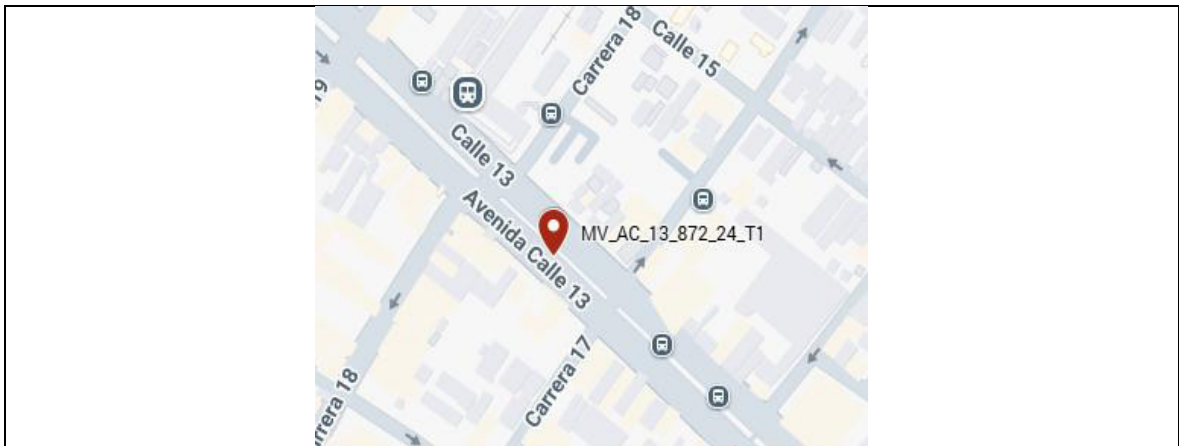


Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **MV_12_001_1238_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos con dirección: Sobre la carrera 50 entre la CL 94C y la 18, en el barrio rincón de los andes, barrio que pertenece a la UPZ 21 “Los andes”.


Ilustración 31. Ubicación geográfica ID 2024_SGV_14.1

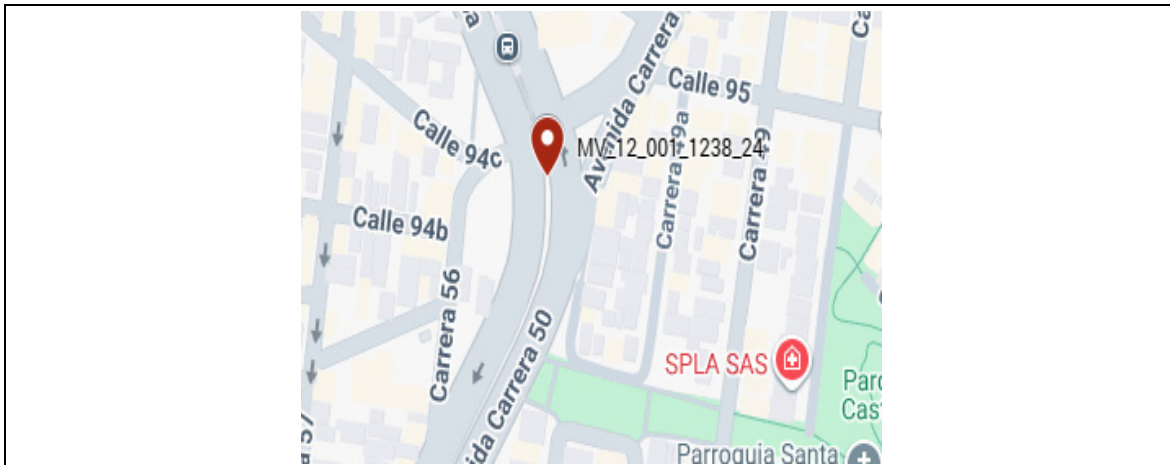

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_08_259_1244_11.** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: Sobre carrera 80 entre la CL 55 Sur y la CL 43 Sur, en el barrio ciudad Kennedy sur, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

Ilustración 32. Ubicación geográfica ID 2025_DIT_1.1

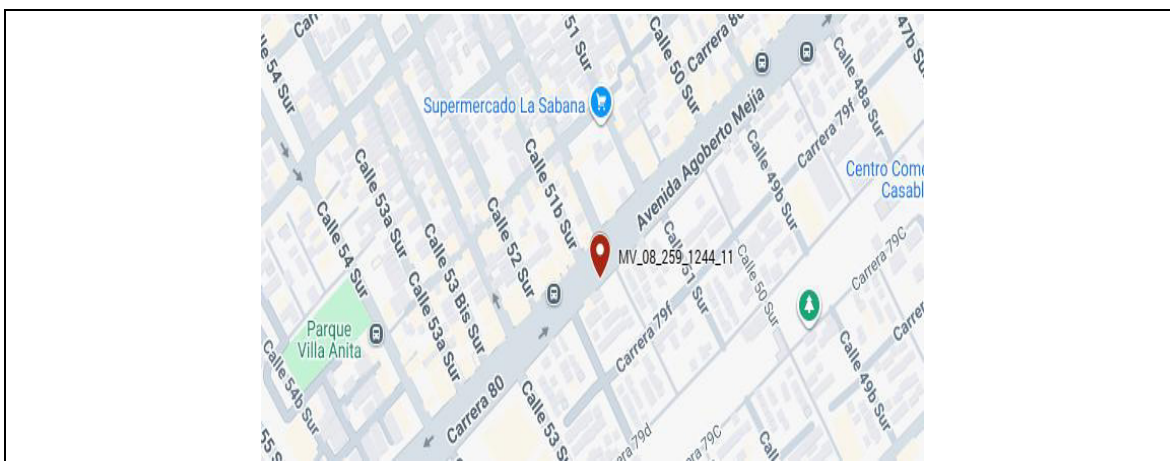


Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **MV_19_178_1244_11.** Se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar con dirección: Sobre la AV Villavicencio con AK 45B y AK 50, en el barrio Verona, barrio que pertenece a la UPZ 65 “Arborizadora”.


Ilustración 33. Ubicación geográfica ID 2025_DIT_2.1

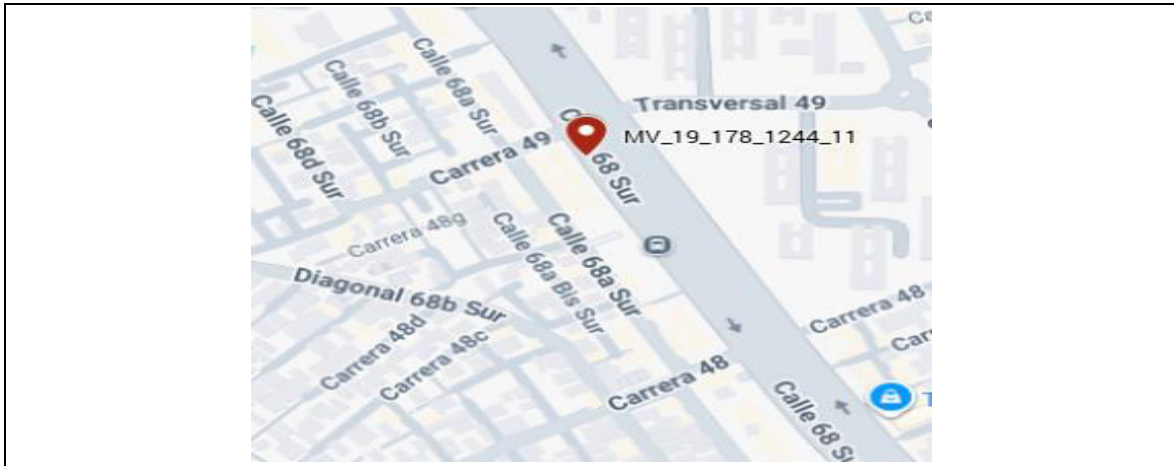

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_04_511_676_09 - MV_15_016_1561_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal y Antonio Nariño con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 6 y la AK 11, en el barrio Verona, barrio que pertenece a la UPZ 34 “20 de julio” y UPZ 35 “Ciudad Jardín”.

Ilustración 34. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_4.1

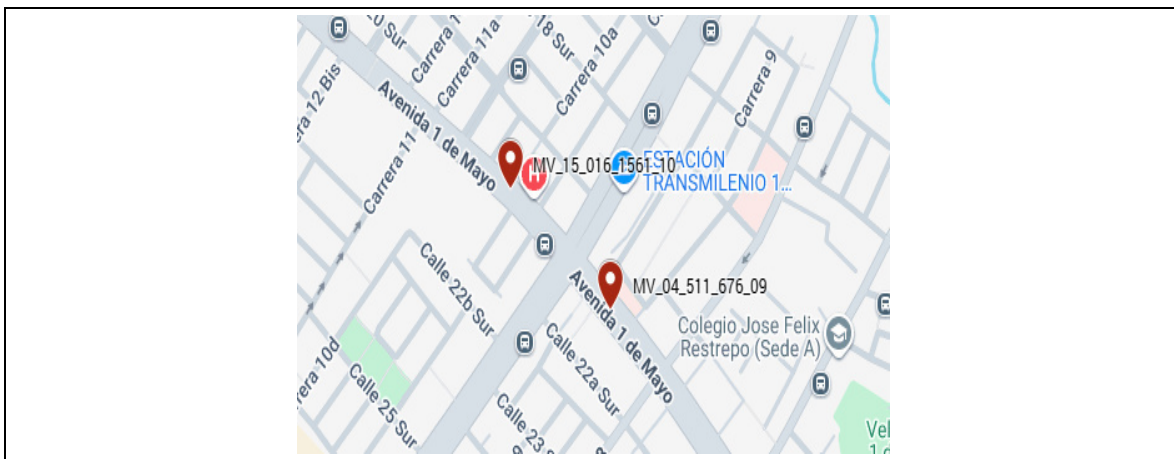


Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **MV_15_016_1561_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 12D y la AK 13, en el barrio San José Sur, barrio que pertenece a la UPZ 36 “San José”.

Ilustración 35. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_5.1

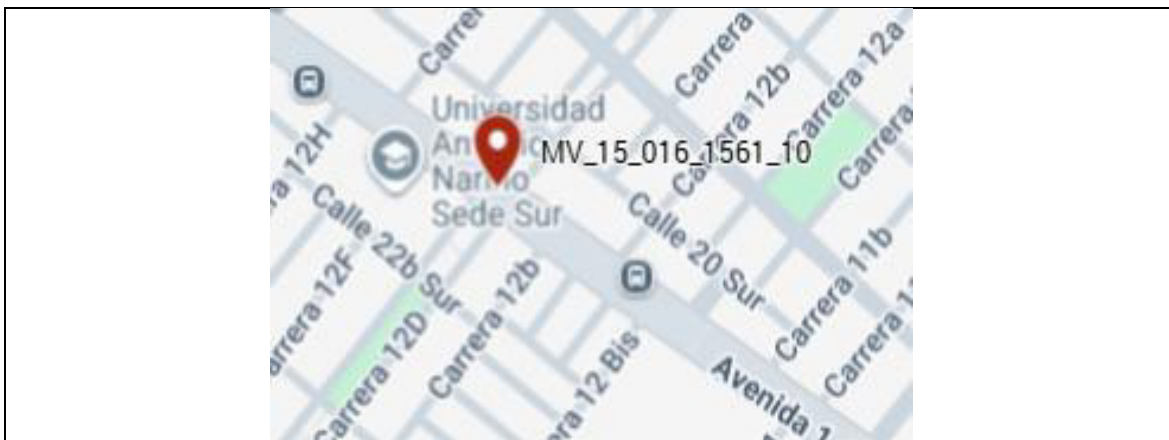

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_15_016_1561_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 14 y la AK 18, en el barrio Restrepo, barrio que pertenece a la UPZ 39 “Quiroga”.

Ilustración 36. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_6.1




Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- **MV_06_001_643_24 - MV_AUTO_SUR_643_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Antonio Nariño y Puente Aranda con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 30 y la Transversal 35, en el barrio La fragua y los Sauces, barrio que pertenece a la UPZ 38 “Restrepo” y UPZ 40 “Ciudad Montes”.

Ilustración 37. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_7.1

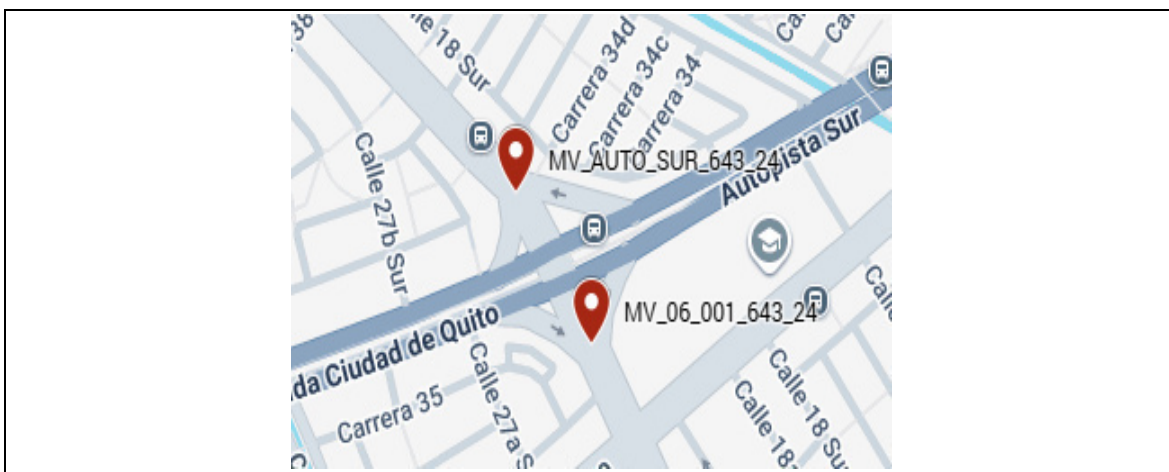

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. TERCER PAQUETE DE ID'S SUMINISTRADOS POR LA SDM

El día 02 de febrero y 13 de febrero de 2026, se recibe vía correo electrónico de la interventoría, tercer paquete de ID's para su implementación en la vigencia 2026, los cuales son los siguientes:

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado
Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun
Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun	Se desconoce aun
2024_SGV_11.3	MV_14_089_1249_11	Av Calle 19	Carrera 27	Carrera 22	E-W, W-E	Separador
2023_SGV_01.3	MV_AV_CALLE_80_1238_24	Av. Calle 80	Carrera 100	Carrera 97	E-W, W-E	Separador
2025_SBP-SI_T117_f2.1	MV_12_182_1747_10	Calle 68 Calle 68 Calle 68	Carrera 27 Carrera 27A	Carrera 27A Carrera 27B	E-W	Separador

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado
			Carrera 27B	Carrera 27C		
2025_SBP_OGS_SI_T117_F3.1	MV_12_182_1747_10	Calle 68	Carrera 28	Carrera 28A	E-W	Separador
2024_SBP_4.1	ZE_07_050_1561_10	Calle 65J Sur	Carrera 78J	Carrera 79B	NS-SN	Separador
2025_SBP_SI_Z1_CONSECUTIVO 01_CL 72 ENTRE KR 101 Y KR 103-COST. NORTE.1	MV_12_281_941_09	Av. Calle 72	Carrera 101	Carrera 103	E-W, W-E	Separador
2025_SBP-SI_Z1_CONSECUTIVO 02_CL 72 ENTRE KR 102A Y KR 103A-COST. SUR.1	MV_12_281_941_09	Av. Calle 72	Carrera 102A	Carrera 103A	E-W, W-E	Separador
2024_SGV_1.1	MV_AV_AMERICAS_716_24	Av. Americas	Carrera 62	Carrera 68	E-W, W-E	Separador
2024_SGV_2.1	MV_AV_AMERICAS_716_24	Av. Americas	Carrera 53F	Carrera 57	E-W, W-E	Separador
2024_SGV_8.1	MV_AV_AMERICAS_716_24	Av. Americas	Carrera 74	Carrera 75	E-W	Separador
2024_OSV_9.1	MV_18_031_1561_10	Calle 41B Sur	Calle 44 Sur	Calle 44 Sur	S-N, N-S	Separador

Fuente: Elaboración propia.

5. INFORME ADMINISTRATIVO

5.1. REGISTRO MENSUAL DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se relaciona información general del personal administrativo del **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**.

De acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones y la entrega de hojas de vida y aprobación por parte de la interventoría del personal tanto administrativo como de obra mediante el radicado CMAG-018-2025 del 08 de agosto de 2025, se adjunta el cuadro de personal de obra que ha laborado en el contrato desde el día en que se firmó el acta de inicio el 19 de agosto de 2025.

Tabla 9. Directorio personal contrato 2025-2991

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CONTACTO
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMÍREZ	93.413.325	DIRECTOR DE OBRA	3011818936
MARIA CATALINA GALEANO SOTO	1.049.640.784	ESPECIALISTA EN TRANSITO	3185359662

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CONTACTO
SERGIO ANDRES ARANDA NIEVES	1.030.666.198	RESIDENTE DE OBRA	3204137747
JUAN CARLOS LEON SARMIENTO	1.072.073.649	RESIDENTE DE OBRA	3145383967
ESTEBAN RUIZ LOPEZ	1.019.110.033	PROFESIONAL SISO-AMBIENTAL	3003428051
MERLYN KATHERINE CAICEDO	1.015.428.689	INGENIERA FORESTAL	310 222 0122
WILLIAM GAMEZ	1.003.382.048	GEORREFERENCIADOR	3125563902
FRANK CARLOS GOMEZ MARTINEZ	1.042.442.451	JEFE DE CUADRILLA	3022631061
LUIS MIGUEL PATIÑO MONROY	1.031.145.204	AYUDANTE DE OBRA	3229636642
OLVEIN CASTRO VALENCIA	1.071.331.237	AYUDANTE DE OBRA	3214024970
ROLAN YESID PEREZ MONRROY	1.003.736.363	AYUDANTE DE OBRA	3502034101
WILSON VALDERRAMA MURCIA	1.110.510.062	AYUDANTE DE OBRA	322 328 7203
LUIS FERNANDO CONTRERAS	1.063.560.440	AYUDANTE DE OBRA	320 918 8542
ANGIE CATALINA HERNANDEZ CASTILLO	1.000.225.948	SECRETARIA	3104526354
ANA PAOLA PINZÓN GONZALEZ	1.022.972.271	SECRETARIA	3138966555

Fuente: Elaboración propia.

Anexo B, Afiliaciones del personal administrativo y operativo. Se presentan los certificados del personal administrativo y operativo del periodo del 19 de enero de 2026 al 18 de febrero del 2026.

5.2. REGISTRO MENSUAL DEL EQUIPO USADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

En el Anexo C, Vehículos, Maquinaria y Equipos utilizados. Se incluyen los documentos de soporte de los vehículos utilizados, registrados mediante el radicado CS-SVBTA-2025-037-2025 del 15 de septiembre de 2025 y el radicado CS-SVBTA-2025-019-2025 del 15/09/2025, estos radicados fueron presentados por el CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025 a conocimiento y aprobación de la interventoría. Dichos vehículos fueron empleados para adelantar las visitas de campo y demás actividades administrativas y de obra desarrolladas durante el periodo comprendido entre enero del 2026 y febrero del 2026 como se observa en la tabla 10:

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Tabla 10. Vehículos utilizados por el contratista de obra

VEHICULO	MARCA	PLACA
CAMIONETA DUSTER	RENAULT	LZM-699
CAMIONETA DUSTER	RENAULT	WNV397
CAMIÓN	CHEVROLET	KYR221
CAMIÓN	HYUNDAI	TRJ149

Fuente: Elaboración propia.

Además, se relacionan las certificaciones de verificación y/o calibración de los equipos implementados durante el periodo en mención sobre el **Anexo C**.

5.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

5.3.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Se relacionan las comunicaciones recibidas y/o enviadas durante el periodo del presente informe.

Tabla 11. Correspondencia enviada

# RADICADO	FECHA	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
CS-SVBTA-2025-164-2026	19/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Envío de Informe Semanal No. 22 del contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-165-2026	22/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Entrega de Informe Técnico Mensual No. 5 del contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-166-2026	21/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Radicación Cuenta Parcial de Cobro No. 4 para el contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-167-2026	20/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta al comunicado CMAG-191-2026-“Alcance a oficio CMAG-165-2025 Respuesta a comunicado de contratista CS-SVBTA-2025-140-2025.”.
CS-SVBTA-2025-168-2026	20/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta al comunicado CMAG-188-2026-“Respuesta al comunicado CS-SVBTA-2025-113-2025 con asunto: Reiteración de solicitud – Aprobación materia tipo MP-80x80 oficios No CS-SVBTA-2025-059-2025, CS-SVBTA-2025-071-2025 y CS-SVBTA-2025-075-2025”.
CS-SVBTA-2025-169-2026	21/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Alcance al comunicado CS-SVBTA-2025-159-2026-“Respuesta a comunicación CMAG-168-2026 – Atención observaciones Componente Forestal”.
CS-SVBTA-2025-170-2026	22/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Registro Fotográfico con fines de georreferenciación .
CS-SVBTA-2025-171-2026	27/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Alcance al comunicado CS-SVBTA-2025-153-2026-“Radicación Cuenta Parcial de Cobro No. 3 para el contrato de la referencia.”
CS-SVBTA-2025-172-2026	23/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta oficio de interventoría CMAG-171-2025 - Verificación de ingreso personal.
CS-SVBTA-2025-173-2026	23/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta oficio de interventoría CMAG-154-2025 Informe mensual 3 SST VERSIÓN 2.
CS-SVBTA-2025-174-2026	23/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta oficio de interventoría CMAG-185-2025 - observaciones Recorrido.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

# RADICADO	FECHA	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
CS-SVBTA-2025-175-2026	27/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Envío de Informe Semanal No. 23 del contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-176-2026	27/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Solicitud de Planos e Internos con fines de georreferenciación.
CS-SVBTA-2025-177-2026	28/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta oficio de interventoría CMAG-171-2025 - Verificación de ingreso personal.
CS-SVBTA-2025-178-2026	28/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Tercera entrega Planos Record y Planillas de Obra.
CS-SVBTA-2025-179-2026	29/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Entrega de Informe Forestal Mensual No. 5 del contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-180-2026	30/01/2026	CONSORCIO MAGNUS	Alcance CS-SVBTA-2025-178-2026 Tercera entrega Planos Record y Planillas de Obra.
CS-SVBTA-2025-181-2026	02/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Envío de Informe Semanal No. 24 del contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-182-2026	02/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta al comunicado CMAG-187-2026-"Atención al comunicado CS-SVBTA-2025-153-2026, con asunto: Radicación Cuenta Parcial de Cobro No. 3 para el contrato de la referencia."
CS-SVBTA-2025-183-2026	02/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta al comunicado "Revisión obra CTO 2991 de 2025" con fines de georreferenciación.
CS-SVBTA-2025-184-2026	03/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	RADICACION INFORME MENSUAL SSTA 5 V1.
CS-SVBTA-2025-185-2026	03/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta oficio de interventoría CMAG-154-2025 Informe mensual 4 SST VERSIÓN 2.
CS-SVBTA-2025-186-2026	03/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Alcance "CS-SVBTA-2025-160-2025". EX_17_032_1881_12_C3.
CS-SVBTA-2025-187-2026	03/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Radicación documentos pendiente SSTA – contratista.
CS-SVBTA-2025-188-2026	04/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Envío de Hoja de vida y documentación pertinente, para cambio del profesional del componente SST-AMBIENTAL del contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-189-2026	04/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta al comunicado "Revisión obra CTO 2991 de 2025" con fines de georreferenciación.
CS-SVBTA-2025-190-2026	05/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Alcance al comunicado CS-SVBTA-2025-166-2026-"Radicación Cuenta Parcial de Cobro No. 4 para el contrato de la referencia."
CS-SVBTA-2025-191-2026	09/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Envío de Informe Semanal No. 25 del contrato de la referencia.
CS-SVBTA-2025-192-2026	09/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Solicitud Internos con fines de georreferenciación.
CS-SVBTA-2025-193-2026	10/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	RESPUESTA OFICIO DE INTERVENTORIA CMAG-214-2025 INFORME MENSUAL 4 SST VERSIÓN 1.
CS-SVBTA-2025-194-2026	10/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	RESPUESTA OFICIO DE INTERVENTORIA CMAG-209-2026 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAL Y VEHÍCULOS.
CS-SVBTA-2025-195-2026	11/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta oficio de interventoría CMAG-206-2025 Informe mensual 3 SST VERSIÓN 3.
CS-SVBTA-2025-196-2026	11/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Entrega paquete de georreferenciación con cortes de obra.
CS-SVBTA-2025-197-2026	11/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Alcance al comunicado CS-SVBTA-2025-162-2026-" Respuesta al comunicado CMAG-179-2026-"Atención al comunicado CS-SVBTA-2025-145-2025 con Versión N°2 de Cronograma de obra General y Específicos del contrato de la referencia".

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

# RADICADO	FECHA	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
CS-SVBTA-2025-198-2026	13/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Atención al oficio No CMAG-211-2026 “Observaciones a la hoja de vida del profesional SST-AMBIENTAL”
CS-SVBTA-2025-199-2026	13/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Respuesta oficio de interventoría CMAG-076-2025 subsanación plan de manejo ambiental y protocolo de manejo de residuos - consorcio Bogotá.
CS-SVBTA-2025-200-2026	16/02/2026	CONSORCIO MAGNUS	Ratificación de precio APU – Suministro e instalación de materas conforme a cotización.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 12. Correspondencia Recibida

FECHA	# RADICADO	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
16/01/2026	CMAG-180-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado CS-SVBTA-2025-141-2025: Respuesta al comunicado CMAG-163-2025 - “Solicitud para aumento de espesor de película seca aplicada a las barandas y mallas de proyecto ESVAP”.
16/01/2026	CMAG-181-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Solicitud de visita a taller de pintura de elementos metálicos.
16/01/2026	CMAG-182-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta a los oficios CS-SVBTA-2025-041-2025 y CS-SVBTA-2025-068-2025, CS-SVBTA-2025-081-2025, CS-SVBTA-2025-082-2025 “Ajuste de cronograma”.
16/01/2026	CMAG-183-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Revisión del Informe Mensual 4 SSTA. Respuesta a su comunicado CS-SVBTA-2025-133-2025.
19/01/2026	CMAG-185-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Hallazgos en recorridos de obra SSTA.
19/01/2026	CMAG-186-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado CS-SVBTA-2025-134-2025 con subsanaciones informe Técnico N°2.
27/01/2026	CMAG-187-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Atención al comunicado CS-SVBTA-2025-153-2026, con asunto: Radicación Cuenta Parcial de Cobro No. 3 para el contrato de la referencia.
20/01/2026	CMAG-188-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado CS-SVBTA-2025-113-2025 con asunto: Reiteración de solicitud – Aprobación materia tipo MP-80x80 oficios No CS-SVBTA-2025-059-2025, CS-SVBTA-2025-071-2025 y CS-SVBTA-2025-075-2025.
19/01/2026	CMAG-189-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Accidente de trabajo. Respuesta a su comunicado CS-SVBTA-2025-158-2025.
19/01/2026	CMAG-190-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Verificación de Ingreso Personal – Contrato de obra No. 2025-2991. Respuesta a su comunicado CS-SVBTA-2025-161-2025.
20/01/2026	CMAG-191-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Alcance a oficio CMAG-165-2025 Respuesta a comunicado de contratista CS-SVBTA-2025-140-2025.
21/01/2026	CMAG-192-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta a los comunicados del contratista de obra CS-SVBTA-2025-048-2025, CS-SVBTA-2025-080-2025, SVBTA-2025-082-2025, relacionados con subsanaciones de pólizas.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

FECHA	# RADICADO	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
22/01/2026	CMAG-193-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado del contratista de obra CS-SVBTA-2025-061-2025, con asunto: Reiteración de solicitud de información correspondiente a los ID suministrados, para actividades de georreferenciación y asignación de internos.
23/01/2026	CMAG-194-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado del contratista de obra CS-SVBTA-2025-076-2025, con asunto: Envío de actas de visitas de inspección-Segundo Paquete-15 al 17 de octubre.
23/01/2026	CMAG-196-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado del contratista de obra CS-SVBTA-2025-084-2025, error de envío de oficio CMAG-101-2025.
23/01/2026	CMAG-197-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado del contratista de obra CS-SVBTA-2025-097-2025, con asunto: En respuesta al comunicado CMAG-113-2025 - "Respuesta al oficio CS-SVBTA-2025-069-2025 – Reenvío de información y medio de entrega Planillas de seguridad social y certificaciones de pago de salarios".
23/01/2026	CMAG-198-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado CS-SVBTA-2025-096-2025, Reenvío de información y medio de entrega Planillas de seguridad social y certificaciones de pago de salarios.
26/01/2026	CMAG-200-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al comunicado del contratista de obra CS-SVBTA-2025-098-2025, con asunto: Envío de visitas de inspección de los ID's: EX_02_003_585_24 y MV_08_259_1244_11 del segundo paquete de ID's suministrados por la SDM para el contrato de la referencia.
26/01/2026	CMAG-202-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Atención a comunicado CS-SVBTA-2025-108-2025, con asunto: Respuesta al comunicado CMAG-134-2025- "Respuesta al oficio CS-SVBTA-2025-100-2025 – Apremio por incumplimiento en la entrega de actas parciales y del Informe Mensual Técnico No. 02" del contrato de la referencia.
22/01/2026	CMAG-204-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta a sus Oficios CS-SVBTA-2025-159-2025 (14/01/26) y CS-SVBTA-2025-169-2025 (2101/26). Aprobación Informes Mensuales Area Forestal No.2, 3 y 4, Plan de Trabajo y Cronograma Forestal.
23/01/2026	CMAG-205-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta al Oficio CS-SVBTA-2025-139-2025 con asunto: Respuesta al comunicado CMAG-161-2025 - "Traslado de comunicado SDM 202553000253123 – Cumplimiento Decreto 332 de 2020 y 634 de 2023 – Contratación de mujeres."
05/02/2026	CMAG-206-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Revisión del Informe Mensual 3 SST versión 3. Respuesta a su comunicado CS-SVBTA-2025-173-2026
23/01/2026	CMAG-207-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Hallazgos en recorrido de obra SSTA.
09/02/2026	CMAG-208-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Solicitud de divulgación de riesgos y controles SST.
05/02/2026	CMAG-209-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Verificación de documentos de personal y vehículos. Respuesta a su comunicado CS-SVBTA-2025-177-2026

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

FECHA	# RADICADO	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
05/02/2026	CMAG-210-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Revisión de informe SSTA No 5. Respuesta a su comunicado CS-SVBTA-2025-184-2026.
09/02/2026	CMAG-211-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Observaciones a la hoja de vida del profesional SST-AMBIENTAL.
03/02/2026	CMAG-212-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Respuesta a su Oficio CS-SVBTA-2025-179-2025. Aprobación Informe Mensual Forestal No.5.
05/02/2026	CMAG-213-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Dando respuesta a los comunicados CS-SVBTA-2025-168-2026 y CS-SVBTA-2025-151-2026 Respuesta a comunicaciones del contratista relacionadas con el ítem No. 33 – Materia alta (APU y ajuste económico).
05/02/2026	CMAG-214-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Revisión del Informe Mensual 4 SSTA versión 2. Respuesta a su comunicado CS-SVBTA-2025-185-2026.
10/02/2026	CMAG-219-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Informe Inspección PT Id MV_14_089_1249_11.
16/02/2026	CMAG-220-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Requerimiento formal por incumplimientos técnicos y contractuales derivados de visita SDM
13/02/2026	CMAG-221-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Llamado de atención por Incumplimiento al plan de calidad y entrega de resultados de ensayos pendientes.
13/02/2026	CMAG-222-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Remisión de primer paquete ID 2026
13/02/2026	CMAG-224-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Hallazgos en recorrido de obra SSTA.
13/02/2026	CMAG-226-2026	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	Observaciones ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

Fuente: Elaboración propia.

En el **ANEXO D, Correspondencia**, se pueden verificar cada uno de los oficios enviados y recibidos relacionados anteriormente

5.4. ENTREGA PARA INGRESO CONTABLE DE LOS ELEMENTOS AL ALMACÉN DE LA SDM

A la fecha se han realizado cuatro (04) entregas de elementos al almacén de la SMD mediante la radicación del formato (PA01-PR12- F06_FORMATO_ASIGNACION_DE_BIENES_RECIBIDOS), correspondiente a las cuatro (04) cuentas parciales de cobro radicadas hasta la fecha del presente informe. (**Ver Anexo T**, “Formatos de Almacen radicados”).

5.5. INFORMES MENSUALES PRESENTADOS A LA FECHA

A la fecha se han presentado los siguientes informes técnicos mensuales:

Tabla 13. Resumen de Informes Técnicos Mensuales radicados

N°	DESCRIPCIÓN	PERIODO	# COMUNICADO
----	-------------	---------	--------------

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

1	Entrega de Informe Mensual Técnico No. 1 del contrato de la referencia	19 de agosto al 18 de septiembre de 2025	CS-SVBTA-2025-064- 2025
2	Entrega de Informe Mensual Técnico No. 2 del contrato de la referencia	19 de septiembre al 18 de octubre de 2025	CS-SVBTA-2025-093- 2025/CS-SVBTA- 2025-123-2025
3	Entrega de Informe Mensual Técnico No. 3 del contrato de la referencia	19 de octubre al 18 de noviembre de 2025	CS-SVBTA-2025-111- 2025
4	Entrega de Informe Mensual Técnico No. 4 del contrato de la referencia	19 de noviembre al 18 de diciembre de 2025	CS-SVBTA-2025-129- 2025
5	Entrega de Informe Mensual Técnico No. 5 del contrato de la referencia	19 de diciembre al 18 de enero de 2025	CS-SVBTA-2025-165- 2026

Fuente: Elaboración propia.

6. INFORME TÉCNICO

6.1. METODOLOGIA DE TRABAJO DEL CONTRATO

La ejecución del proyecto cuenta con tres (3) etapas, las cuales son:

6.1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

La primera etapa se llevó a cabo mediante la revisión, verificación y consulta de las Fichas Técnicas de Soporte-FTS suministradas por parte de la Entidad. Las FTS evidencian los ESVAP a suministrar y/o instalar y/o implementar para cada uno de los puntos a intervenir, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDM. Recibida y revisada la información anterior, Gestión Vial Integral S.A.S procede con la realización de visitas de inspección a campo donde se ejecutaron labores de toma de datos, registro fotográfico y filmico de los puntos a intervenir, evidenciando su estado de inicial y analizando características y actividades predominantes propias del sector.

Así mismo, dentro de esta etapa se realizó la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito, Presupuesto de obra, Cronograma de actividades y actividades de divulgación y sensibilización de las actividades a ejecutar.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.1.2. Actividades de Georreferenciación

6.1.3. Actividades de cierre de georreferenciación y cierre de contrato

El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** ha realizado desde el inicio del presente contrato la implementación del componente de Georreferenciación, sin embargo, a la fecha se continua a la de varias respuestas por parte de la interventoría con respecto a los siguientes Comunicados enviados; **CS-SVBTA-2025-046-2025** remitido el día 19 de septiembre de 2025 con asunto “Solicitud de información correspondiente a los ID suministrados, para actividades de georreferenciación.”, **CS-SVBTA-2025-061-2025** remitido el día 06 de octubre de 2025 con asunto “Reiteración de solicitud de información correspondiente a los ID suministrados, para actividades de georreferenciación y asignación de internos” y el comunicado **CS-SVBTA-2025-079-2025** remitido el día 22 de octubre de 2025 con asunto “Entrega de planos récord y planillas de obra – Solicitudes de georreferenciación”.

Por lo anterior, el **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** no ha podido realizar hasta el presente informe el cobro de las actividades ejecutadas correspondiente al componente de georreferenciación. Adicionalmente, luego de varias reuniones virtuales con los profesionales de la interventoría, secretaria y **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025**, se remitió vía correo electrónico nuevamente planos récord y planillas de obra de ID finalizados a la fecha para su respectiva verificación y aprobación, a la fecha del presente informe se recibió el oficio **CMAG-173-2026** el día 05 de enero de 2025 con las observaciones al componente de georreferenciación por parte de la interventoría correspondiente a 3 ID de un total de 7 ID remitidos.

El día 14 de enero de 2026 se remitió el comunicado **CS-SVBTA-2025-160-2026** mediante el cual se presentan las subsanación a las observaciones recibidas de los 3 ID’s, y de esta manera, se enviaron 3 ID’s más para su revisión, remitiendo para la revisión de la interventoría un total de 10 ID’s.

Tabla 14. Resumen de ID Aprobados componente Georreferenciación

ID FTS	ID DISEÑO	ESTADO	CUENTA PARCIAL DONDE SE GENERO LA IMPLEMENTACIÓN	CUENTA PARCIAL DONDE SE COBRO
2025_OSV- PEP_COLOMBA.1, 2 Y 3	EX_12_141_1881_12	APROBADO SDM - 05/02/2026	No. 1	N.A
2024_SGV_11	EX_14_096_1881_12	APROBADO SDM - 03/02/2026	No. 1	N.A
MV_08_001_1703_10 _V6_ ESVAP V1 _Tom Adams	EX_08_308_1867_12	APROBADO SDM - 30/01/2026	No. 1	N.A

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

ID FTS	ID DISEÑO	ESTADO	CUENTA PARCIAL DONDE SE GENERO LA IMPLEMENTACIÓN	CUENTA PARCIAL DONDE SE COBRO
TEUSAQUILLO	EX_13_171_1881_12	APROBADO SDM - 05/02/2026	No. 1	N.A
ANTONIO JOSE DE SUCRE	EX_05_001_1073_24	APROBADO SDM - 12/02/2026	No. 1	N.A
2024_SBP_00.1	MV_AV_CALI_941_0 9_T1	APROBADO SDM - 29/01/2026	No. 2	N.A
2025_SGV_5.1	MV_AC26_643_24	APROBADO SDM - 20/02/2026	No. 2	N.A
2024_SGV_11	EX_14_096_1881_12 / MV_14_089_1249_11	APROBADO SDM - 03/02/2026	No. 2	N.A
MV_08_001_1703_10 _V6 _ ESVAP V1 _40C sur	MV_08_259_1244_11	APROBADO SDM - 30/01/2026	No. 2	N.A
2024_SGV_11	EX_14_096_1881_12 / MV_14_089_1249_11	APROBADO SDM - 03/02/2026	No. 3	N.A
2025_SBP- SI_Z4_CONSECUTIV O 04.1	MV_11_221_988_09	APROBADO SDM - 19/02/2026	No. 3	N.A
2025_SBP_SI_137.1	EX_01_341_1842_12	PENDIENTE APROBACION SDM - APROBADO POR INTERVENTORIA	No. 3	N.A
2025_UT_Calle_11.1	EX_17_033_1881_12	APROBADO SDM - 05/02/2026	No. 3	N.A
2025_UT_Calle_12.1	EX_17_032_1881_12	APROBADO SDM - 05/02/2026	No. 3	N.A
2025_SGV_5.1	MV_AC26_643_24	APROBADO SDM - 20/02/2026	No. 4	N.A
2025_SBP- SI_Z4_CONSECUTIV O 04.1	MV_11_221_988_09	EN REVISION INTERVENTORIA - ENVIADO 11/02/2026	No. 4	N.A
2025_SBP_SI_137.1	EX_01_341_1842_12	EN REVISION INTERVENTORIA - ENVIADO 11/02/2026	No. 4	N.A
2023_SGV_01.1 Y 01.2	MV_AV_CALLE_80_1 238_24	PENDIENTE APROBACION SDM E INTERVENTORIA - ENVIADO 28/01/2026	No. 5	N.A
2025_UT_Calle_12.1	EX_17_032_1881_12	PENDIENTE APROBACION SDM	No. 5	N.A

Fuente: Elaboración propia.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.2. FICHAS TECNICAS DE SOPORTE

Tabla 15. Fichas técnicas de soporte asociadas a los ID's

Nombre FTS	FICHA TÉCNICA		DESCRIPCIÓN
	SI	OTRO	
PRIMER PAQUETE			
2024_SBP_00.1		X	De acuerdo con el memorando 202431000162073
2023_SGV_01.1		X	De acuerdo con el MEMORANDO 202332100233073 y MV_10_183_1747_10_V25 ID 10_14
2023_SGV_01.2		X	MEMORANDO 202432100153313
2024_SGV_6.1	X		Ficha técnica de soporte del 10/02/2025
2024_SGV_6.2	X		
2024_SGV_6.3	X		
2024_SGV_6.4	X		
2025_OSV-PEP_COLOMBA.1		X	De acuerdo con el plano EX_12_141_1881_12
2025_OSV-PEP_COLOMBA.2		X	De acuerdo con el plano EX_12_141_1881_12
2025_OSV-PEP_COLOMBA.3		X	De acuerdo con el plano EX_12_141_1881_12
2025_SGV_5.1	X		Ficha técnica de soporte del 30/12/2024
2024_SGV_11	X		Ficha técnica de soporte del 08/11/2024
MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _40C sur		X	De acuerdo con el plano MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _40C sur
MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _Tom Adams		X	De acuerdo con el plano MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _Tom Adams
2024_SBP_00.1		X	De acuerdo con el memorando 202431000162073
2023_SGV_01.1		X	De acuerdo con el MEMORANDO 202332100233073 y MV_10_183_1747_10_V25 ID 10_14
2023_SGV_01.2		X	MEMORANDO 202432100153313
2024_SGV_6.1	X		Ficha técnica de soporte del 10/02/2025
2024_SGV_6.2	X		
2024_SGV_6.3	X		
2024_SGV_6.4	X		
2025_OSV-PEP_COLOMBA.1		X	De acuerdo con el plano EX_12_141_1881_12

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	FICHA TÉCNICA		DESCRIPCIÓN
	SI	OTRO	
2025_OSV-PEP_COLOMBA.2		X	De acuerdo con el plano EX_12_141_1881_12
2025_OSV-PEP_COLOMBA.3		X	De acuerdo con el plano EX_12_141_1881_12
2025_SGV_5.1	X		Ficha técnica de soporte del 30/12/2024
2024_SGV_11	X		Ficha técnica de soporte del 08/11/2024
MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _40C sur		X	De acuerdo con el plano MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _40C sur
MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _Tom Adams		X	De acuerdo con el plano MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _Tom Adams
SEGUNDO PAQUETE			
2025_SBP_SI_63.1	X		Ficha técnica del soporte de 11/07/2025
2025_SBP_SI_63.1			
2024_SI_2.1	X		Ficha técnica del soporte de 19/12/2024
2025_UT_Calle_82		X	
2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	X		Ficha técnica del soporte de 8/07/2025
2025_SBP_SI_137.1		X	
2025_UT_Calle_11.1		X	
2025_UT_Calle_12.1		X	
2024_SBP_9.1	X		Ficha técnica del soporte de 2024/12/2024
2024_OSV_1.1	X		Ficha técnica del soporte de 30/12/2024
2025_SGV_MANT_1.1		X	
2025_SGV_MANT_2.1		X	
2025_SGV_MANT_3.1		X	

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	FICHA TÉCNICA		DESCRIPCIÓN
	SI	OTRO	
2025_SGV_MANT_3.2		X	
2024_SGV_14.1	X		Ficha técnica del soporte de 1/12/2024
2025_DIT_1.1		X	
2025_DIT_2.1		X	
2025_SGV_MANT_4.1		X	
2025_SGV_MANT_5.1		X	
2025_SGV_MANT_6.1		X	
2025_SGV_MANT_7.1		X	
TERCER PAQUETE			
2024_SGV_11.3		X	
2023_SGV_01.3		X	
2025_SBP-SI_T117_f2.1	X		Ficha técnica del soporte
2025_SBP_OGS_SI_T117_F3.1	X		Ficha técnica del soporte
2024_SBP_4.1	X		Ficha técnica del soporte
2025_SBP_SI_Z1_CONSECUTIVO 01_CL 72 ENTRE KR 101 Y KR 103-COST. NORTE.1	X		Ficha técnica del soporte
2025_SBP-SI_Z1_CONSECUTIVO 02_CL 72 ENTRE KR 102A Y KR 103A-COST. SUR.1	X		Ficha técnica del soporte
2024_SGV_1.1	X		Ficha técnica del soporte
2024_SGV_2.1	X		Ficha técnica del soporte

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	FICHA TÉCNICA		DESCRIPCIÓN
	SI	OTRO	
2024_SGV_8.1	X		Ficha técnica del soporte
2024_OSV_9.1	X		Ficha técnica del soporte

Fuente: Elaboración propia.


En el ANEXO E, **Fichas técnicas de soporte**, se encuentran las fichas técnicas del primer paquete y los memorandos del segundo paquete correspondiente a cada ID.

6.3. PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6.3.1. PROGRAMACION DE VISITAS TECNICAS

El día 28 de agosto de 2025 se relaciona a la SDM y a la interventoría el cronograma de visitas técnicas de los ID's suministrados en el primer paquete de entrega a través de WhatsApp en el grupo llamado “ESVAP Obra” como se observa en la ilustración 38:

Ilustración 38. Programación Primer paquete de ID's.

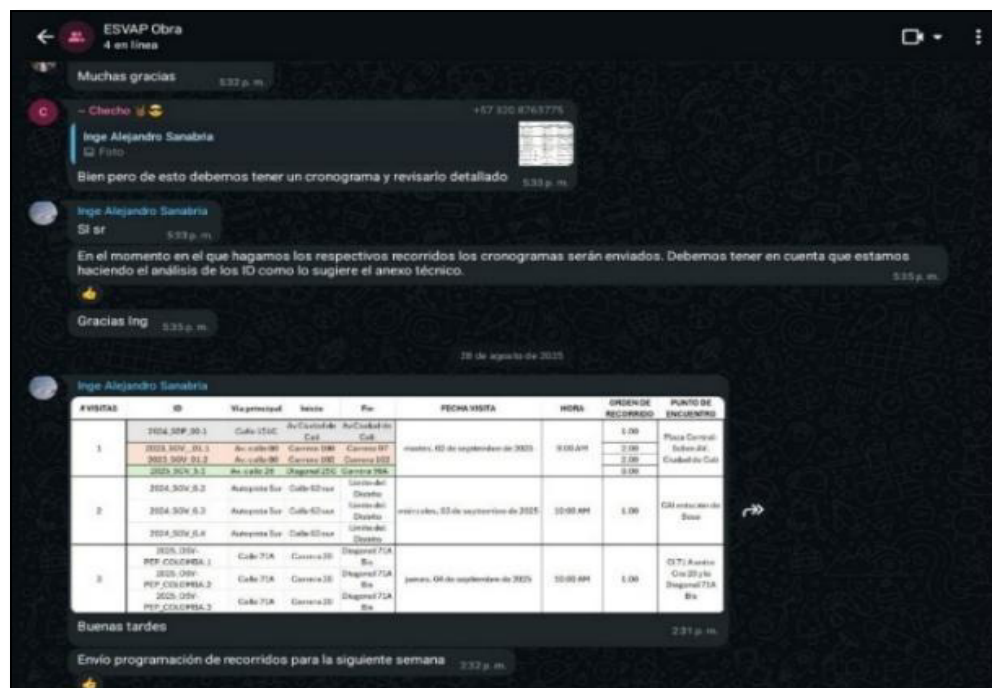

#VISITAS	ID	Via principal	Inicio	Fin	FECHA VISITA	HORA	DURACION DE RECORRIDO	PUNTO DE ENCUENTRO
1	2024.SGV.80.1	Calle 174C	Av. Centinela	Av. Centinela	miércoles, 02 de septiembre de 2025	8:00 AM	1.00	Plaza Central
	2024.SGV.80.2	Av. Centinela	Carrera 188	Carrera 188			2.00	Suba del
	2024.SGV.80.3	Av. Centinela	Carrera 190	Carrera 190			2.00	Crédito de Cali
	2024.SGV.80.4	Av. Centinela	Diagonal 174	Diagonal 174			2.00	
2	2024.SGV.8.2	Autopista Sur	Calle 62 sur	Calle 62 sur	miércoles, 03 de septiembre de 2025	10:00 AM	1.00	Estación de
	2024.SGV.8.3	Autopista Sur	Calle 62 sur	Calle 62 sur			1.00	Suba
	2024.SGV.8.4	Autopista Sur	Calle 62 sur	Calle 62 sur			1.00	
	2024.SGV.8.5	Autopista Sur	Calle 62 sur	Calle 62 sur			1.00	
3	2024.SGV.8.6	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A	miércoles, 04 de septiembre de 2025	10:00 AM	1.00	OTI / Avenida
	2024.SGV.8.7	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A			1.00	Cra 20 y la
	2024.SGV.8.8	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A			1.00	Diagonal 71A
	2024.SGV.8.9	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A			1.00	Suba

Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

✓ CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS

Ilustración 39. Cronograma de visitas técnicas primer paquete ID's

# VISITAS	ID	Via principal	Inicio	Fin	FECHA VISITA	HORA	ORDEN DE RECORRIDO	PUNTO DE ENCUENTRO	03/09/2025	04/09/2025	05/09/2025
1	2024_SBP_00.1	Calle 151C	Av Ciudad de Cali	Av Ciudad de Cali	miércoles, 03 de septiembre de 2025	10:00 AM	1.00	Plaza Central-Sobre AV.			
	2023_SGV_01.1	Av. calle 80	Carrera 100	Carrera 97			2.00	Plaza Central-Sobre AV.			
	2023_SGV_01.2	Av. calle 80	Carrera 102	Carrera 102			2.00	Plaza Central-Sobre AV.			
	2025_SGV_5.1	Av. calle 26	Diagonal 25C	Carrera 96A			3.00	Plaza Central-Sobre AV.			
2	2024_SGV_6.2	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito	jueves, 04 de septiembre de 2025	10:00 AM	1.00	CAI estación de Bosa			
	2024_SGV_6.3	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito				CAI estación de Bosa			
	2024_SGV_6.4	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito				CAI estación de Bosa			
3	2025_OSV-PEP_COLOMBA.1	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A Bis	viernes, 05 de septiembre de 2025	10:00 AM	1.00	Clt 71 A entre Cro 20 y la Diagonal 71A Bis			
	2025_OSV-PEP_COLOMBA.2	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A Bis				Clt 71 A entre Cro 20 y la Diagonal 71A Bis			
	2025_OSV-PEP_COLOMBA.3	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A Bis				Clt 71 A entre Cro 20 y la Diagonal 71A Bis			

Fuente: Elaboración propia.

De igual manera el día 09 de septiembre de 2025 se relaciona a la SDM y la interventoría el cronograma de visitas técnicas a los ID suministrados en el segundo paquete de entrega por la SDM a través de WhatsApp en el grupo llamado “ESVAP Obra” como se observa en la siguiente imagen:

Ilustración 40. Pantallazo del grupo ESVAP Obra



Fuente: Elaboración propia.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

✓ **CRONOGRAMA DE VISITA TECNICA AL ID: 2024_SGV_11**

Ilustración 41. Programación visita técnica ID: 2024_SGV_11

# VISITAS	ID	Vía principal	Inicio	Fin	FECHA VISITA	HORA	ORDEN DE RECORRIDO	PUNTO DE ENCUENTRO	10/09/2025
1		Calle 106	Carrera 15	Carrera 17	miércoles, 10 de septiembre de 2025	9:00 AM	1.00	Sobre la calle 106 y la Carrera 17	
2		Transversal 17A Bis	Calle 37	Calle 36	miércoles, 10 de septiembre de 2025	10:00 AM	2.00	Sobre la Transv. 17A Bis y la calle 36	
3	2024_SGV_11	Carrera 27	Calle 19	Calle 22	miércoles, 10 de septiembre de 2025	11:00 AM	3.00	Entre la Cra 27 y la CL 22	
4		Carrera 7	Calle 108 sur	Calle 106	miércoles, 10 de septiembre de 2025	12:00 AM	4.00	Entre la carrera 7 y calle 105 sur	

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el día 09 de octubre de 2025 se recibe por parte de la SDM segundo paquete de ID's, los cuales una vez verificada la información y enviadas las respectivas observaciones realizadas a la interventoría el día 15 de octubre de 2025 bajo el comunicado **CS-SVBTA-2025-072-2025**, se remite la programación general para la ejecución de las visitas de inspección correspondiente al segundo paquete de ID's recibidos.

Ilustración 42. Programación de visitas de inspección para segundo paquete de ID's suministrados

# VISITAS	FTS	ID	Vía principal	Inicio	Fin	FECHA VISITA	HORA	ORDEN DE RECORRIDO	PUNTO DE ENCUENTRO
1	2025_SBP_SI_63.1	MV_10_161_1560_10 / EX_13_109_1098_11	Calle 63	Carrera 24	Carrera 26	miércoles, 15 de octubre de 2025	9:00 AM	1	Calle 63 con Carrera 24
	2024_SI_2.1	EX_11_413_1842_12	Calle 145B	Carrera 85A	Carrera 85B			2	
	2025_UT_Calle_82	A la espera de información						3	
	2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO_04.1	EX_11_417_1842_12	Calle 139	Carrera 104	Carrera 110			4	
	2025_SBP_SI_137.1	EX_01_341_1842_12	Calle 137	Carrera 23	Autopista norte			5	
2	2025_UT_Calle_11.1	EX_17_033_1881_12	Calle 11	Carrera 5	Carrera 7	jueves, 16 de octubre de 2025	9:00 AM	1	Calle 11 con Carrera 5
	2025_UT_Calle_12.1	EX_17_032_1881_12	Calle 12A	Carrera 7	Carrera 8			2	
	2024_SBP_9.1	EX_02_003_585_24	Carrera 10	Calle 70	Calle 70A			3	
	2024_OSV_1.1	MV_08_259_1244_11	Carrera 80	Calle 55	Calle 57A sur			4	
	2025_SGV_MANT_1.1	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte	Calle 187	Calle 188 A			5	
	2025_SGV_MANT_2.1	MV_09_424_947_10	Av. Calle 24	Av. Carrera 70	Av. Boyacá			6	
	2025_SGV_MANT_3.1	MV_AC_13_872_24_T1	Av. Calle 13	Carrera 17	Carrera 18			7	
3	2024_SGV_14.1	MV_12_001_1238_24	Carrera 50	Calle 94C	Calle 18	viernes, 17 de octubre de 2025	9:00 AM	1	Calle 94C
	2025_DIT_1.1	MV_08_259_1244_11	Carrera 80	Calle 55 Sur	Calle 43 Sur			2	
	2025_DIT_2.1	MV_19_178_1244_11	Av Villavicencio	Carrera 45B	Carrera 50			3	
	2025_SGV_MANT_4.1	MV_01_033_1560_10	Av. Primera de Mayo	Carrera 6	Carrera 11			4	
	2025_SGV_MANT_5.1	MV_09_424_947_10	Av. Primera de Mayo	Carrera 12D	Carrera 13			5	
	2025_SGV_MANT_6.1	MV_AC_13_872_24_T1	Av. Primera de Mayo	Carrera 14	Carrera 18			6	
	2025_SGV_MANT_7.1	MV_AC_13_872_24_T1	Av. Primera de Mayo	Carrera 30	Transversal 35			7	

Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.4. INFORMACION DE VISITAS TECNICAS POR CADA FTS

Durante el periodo se llevaron a cabo visitas técnicas a los puntos señalados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En una primera fase, dichas visitas se enfocaron en el reconocimiento y análisis de los sitios priorizados por la entidad, teniendo en cuenta los principales aspectos técnicos a evaluar. Cada visita se efectuó de manera conjunta con la interventoría y la SDM, diligenciando el acta de visita correspondiente a cada punto revisado. Dicha acta incluyó la localización general de cada ID, el área de influencia, tipo de implementación, horario de implementación y un bosquejo o esquema general de aplicación de ESVAP. Cabe resaltar que cada acta cuenta con registro fotográfico y cumple con todos los requisitos establecidos en el anexo técnico definitivo.

A continuación, se relacionan las visitas técnicas realizadas a los puntos entregados por la SDM:

Tabla 16. Fechas de visita de inspección a los ID's suministrados

Nombre FTS	LOCALIZACIÓN	FECHA DE VISITA
PRIMER PAQUETE		
2024_SBP_00.1	Calle 151C	2/09/2025
2023_SGV_01.1	Av. calle 80	2/09/2025
2023_SGV_01.2	Av. calle 80	2/09/2025
2025_SGV_5.1	Av. calle 26	2/09/2025
2024_SGV_6.1	Autopista Sur	3/09/2025
2024_SGV_6.2	Autopista Sur	3/09/2025
2024_SGV_6.3	Autopista Sur	3/09/2025
2024_SGV_6.4	Autopista Sur	3/09/2025
2025_OSV-PEP_COLOMBA.1	Calle 71A	4/09/2025
2025_OSV-PEP_COLOMBA.2	Calle 71A	4/09/2025
2025_OSV-PEP_COLOMBA.3	Calle 71A	4/09/2025
2024_SGV_11	PALOQUEMAO	10/09/2025
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C SUR	AV AGOBERTO MEJIA	10/09/2025
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_Tom Adams	TOM ADAMS	10/09/2025
TEUSAQUILLO	Sobre la transversal 17A bis entre la CL 36 y CL 37	12/09/2025
ANTONIO JOSE DE SUCRE	Sobre la Cra 7 entre la CL 108 sur y la CL 106	12/09/2025
ANTONIO JOSE DE SUCRE	Sobre la Cra 7 entre la CL 108 sur y la CL 106	12/09/2025
SEGUNDO PAQUETE		
2025_SBP_SI_63.1	Sobre la CL 63 ENTRE la AK 24 y la AK 26	17/10/2025

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS	LOCALIZACIÓN	FECHA DE VISITA
	Sobre la AK 26 ENTRE la CL 62 y la CL 63	
2024_SI_2.1	Sobre la CL 145B entre la AK 85A y la AK 85B	15/10/2025
2025_UT_Calle_82	Sobre la Calle 82 entre la AK 11 y la AK 12 Sobre la AK 13 entre la CL 85 y la CL 86a Sobre la AK 13 entre la CL 86a y la CL 87a	17/10/2025
2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	Sobre la CL 139 entre la AK 104 y la AK 110	15/10/2025
2025_SBP_SI_137.1	Sobre la CL 137 entre la AK 23 y la Autopista Norte	15/10/2025
2025_UT_Calle_11.1	Sobre la Calle 11 entre la AK 5 y la AK 7	16/10/2025
2025_UT_Calle_12.1	Sobre la CL 12A entre la AK 7 y la AK 8	16/10/2025
2024_SBP_9.1	Sobre la AK 10 entre la CL 70 y la CL 70A	5/11/2025
2024_OSV_1.1	Sobre AK 80 entre la CL 55 y l CL 57A sur	5/11/2025
2025_SGV_MANT_1.1	Sobre la Autopista Norte entre la CL 187 y l CL 188 A	1/12/2025
2025_SGV_MANT_2.1	Sobre AV CL 24 con Av AK 70 con Av Boyaca	1/12/2025
2025_SGV_MANT_3.1	Sobre la Av CL 13 con AK 17 y AK 18	1/12/2025
2025_SGV_MANT_3.2	Sobre la Av CL 13 con AK 17 y AK 18	9/12/2025
2024_SGV_14.1	Sobre la AK 50 entre la CL 94C y la 18	9/12/2025
2025_DIT_1.1	Sobre AK 80 entre la CL 55 Sur y la CL 43 Sur	9/12/2025
2025_DIT_2.1	AV Villavicencio con AK 45B y AK 50	10/12/2025
2025_SGV_MANT_4.1	Av Primera de Mayo entre la AK 6 y la AK 11	10/12/2025
2025_SGV_MANT_5.1	Av Primera de Mayo entre la AK 12D y la AK 13	11/12/2025
2025_SGV_MANT_6.1	Av Primera de Mayo entre la AK 14 y la AK 18	11/12/2025
2025_SGV_MANT_7.1	Av Primera de Mayo entre la AK 30 y la Transversal 35	11/12/2025

Fuente: Elaboración propia.

Para los nombres FTS indicados se adelantaron las visitas de inspección, mediciones y modulación de mallas, vallas y bolardos, teniendo en consideración las indicaciones descritas en el anexo técnico y sus respectivas FTS asignadas.

6.5. FORMATOS DE VISITA DE INSPECCIÓN TECNICA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta la trazabilidad del formato de visita de inspección correspondiente a los ID's visitados.

El viernes 29 de agosto de 2025, se remitió a la interventoría, mediante correo electrónico, el formato diseñado por esta dependencia para su respectiva verificación y aprobación, a través del oficio CS-

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

SVBTA-2025-025-2025 con asunto “Solicitud de aprobación de Formatos de Inspección de visitas”. Posteriormente, la interventoría emitió respuesta favorable mediante el oficio CMAG-043-2025, Aprobando así el formato de visitas de inspección.

En el Anexo F, formatos visita de inspección, Se encuentran los formatos de inspección técnica diligenciados durante cada visita y así mismo firmados por la SDM y la interventoría quienes realizaron el respectivo acompañamiento a cada una de estas. Se anexan las visitas de inspección que correspondan al periodo del 19 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2025.

Se tiene como compromiso la presentación de la programación de las visitas de inspección del nuevo paquete de ID’s suministrado por la entidad el día 02 y 13 de febrero de 2026.

6.5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades correspondiente al primer paquete de ID’s suministrados por la SDM, se remitió a la Interventoría por medio de correo electrónico el día 28 de agosto de 2025 (Oficio: CS-SVBTA-2025-021-2025). La Interventoría dio repuesta el día 01 de septiembre de 2025 requiriendo ajustes a la misma (Oficio: CMAG-038-2025). El 05 de septiembre se envió nuevamente el cronograma de actividades ajustado a las solicitudes de interventoría, por medio de correo electrónico (Oficio: CS-SVBTA-2025-030-2025). La interventoría da respuesta el 9 de septiembre de 2025 mediante solicitando nuevamente ajustes al cronograma de actividades según (formato: CMAG-054-2025). El 11 de septiembre de 2025 la interventoría solicita la entrega de los cronogramas de actividades incluyendo la segunda entrega del primer paquete de ID’s (Oficio: CMAG-060-2025). El 15 de septiembre de 2025 se precisa que la interventoría de aclaración del cronograma solicitado con respecto a lo estipulado en el anexo técnico definitivo (Oficio: CS-SVBTA-2025-041-2025). Ese mismo día el 15 de septiembre de 2025 se hace entrega del cronograma de actividades solicitado a través de correo electrónico (Oficio: CS-SVBTA-2025-042-2025) en espera de solicitudes y/o apuntes por parte de interventoría.

Mediante los oficio CS-SVBTA-2025-045-2025, CS-SVBTA-2025-051-2025 el **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025** remite a la interventoría los cronogramas y presupuestos ajustados en su momento, sin embargo, ante el suministro de un segundo paquete de ID por parte de la SDM, se remiten ajustados y en su última versión cronogramas y presupuestos de obra bajo el comunicado CS-SVBTA-2025-085-2025 y CS-SVBTA-2025-086-2025, documentos entregados de acuerdo con los requerimientos y directrices establecidas por la interventoría.

Adicionalmente, mediante el oficio **CMAG-125-2025** recibido el día 11 de noviembre de 2025, la interventoría da el concepto de aprobación a la Versión 4 de los cronogramas de obra y a la Versión

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

5 de los presupuestos de obra. Sin embargo, el día 14 de noviembre de 2025, se envía Versión No. 6 de los presupuestos de obra y Versión No.5 de los cronogramas de obra bajo el comunicado **CS-SVBTA-2025-099-2025**.

Por otro lado, el día 29 de diciembre de 2025 se remitió a la interventoría de acuerdo con el compromiso adquirido en comité de obra, él envió de la Versión No. 2 del cronograma de obra general y específicos de la vigencia 2025 y 2026, a través del comunicado **CS-SVBTA-2025-145-2025**. La interventoría remitió observaciones bajo el oficio **CMAG-179-2026** el día 15 de enero de 2026 y se realizaron las respectivas subsanaciones bajo el comunicado **CS-SVBTA-2025-162-2026** enviado el día 16 de enero de 2025.

Finalmente, el día 11 de febrero de 2026 se remitió a la interventoría un alcance al comunicado **CS-SVBTA-2025-162-2026**, correspondiente a la Versión No. 2 del cronograma de obra General y Específicos por cada ID de la vigencia 2025 y 2026 mediante el comunicado **CS-SVBTA-2025-197-2026**. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido bajo el comité de obra No. 26 realizado el día 10 de febrero de 2026 en instalaciones de la SDM sede Paloquemao.

En el Anexo G, Cronogramas de actividades. Allí se encuentra el cronograma general y cronograma específico de cada ID actualizado a la fecha.

6.6. REGISTRO FOTOGRAFICO


En el Anexo H, Registro fotográfico. Se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo evaluado en el presente documento, organizadas por el numero de la semana con su respectivo periodo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del antes, durante y después de cada una de las intervenciones realizadas hasta el 18 de febrero de 2026 (incluyendo actividades ejecutadas en el informe No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4) y de acuerdo con lo relacionado en el numeral 7.2.

Tabla 17. ID EX_12_141_1881_12 (FTS 2025_OSV_PEP_COLOMBIA. 1, 2 Y 3)


Nombre FTS:	2025_OSV_PEP_COLOMBIA. 1, 2 Y 3	
ID:	EX_12_141_1881_12	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDOS CUBICOS M-41 Y MATERA ALTA	
ACTIVIDAD REALIZADA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS CUBICOS M-41.	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

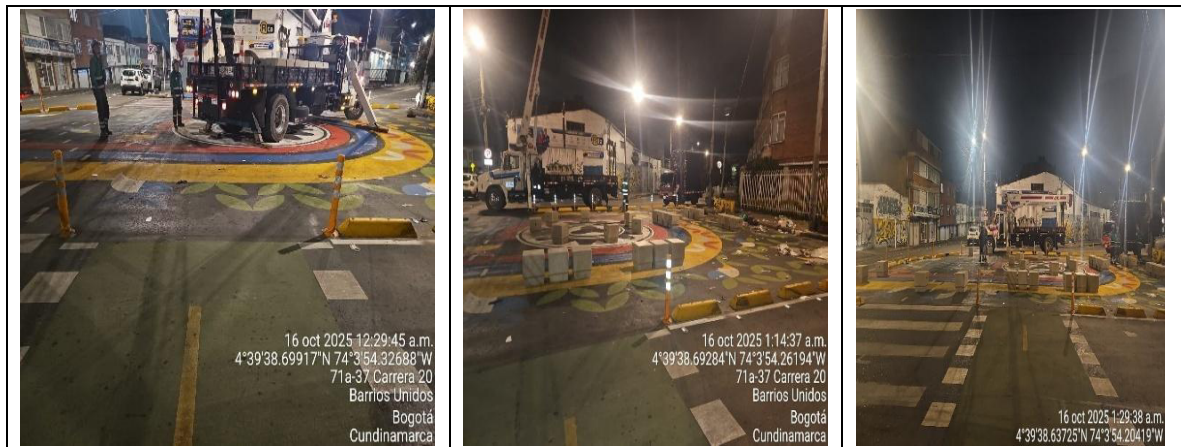

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. ID EX_14_096_1881_12 (FTS 2024_SGV_11)

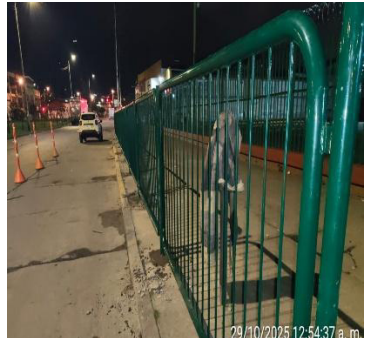Nombre FTS:		FTS 2024_SGV_11	
ID:		EX_14_096_1881_12	
ESVAP IMPLEMENTAR:		POR	MALLA ESLABONADA Y VALLA PEATONAL
ACTIVIDAD REALIZADA:		DEMOLICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y MALLA ESLABONADA.	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
ANTES		DURANTE	
 <p>10 sept: 2025 11:30:42 a.m. 25-26 Avenida 22 Bogotá</p>		 <p>28/10/2025 11:13:56 p. m. 4.61695601N 74.08329167W 22-17 Carrera 24 Los Mártires Bogotá</p>	
		DESPUES	
		 <p>29/10/2025 12:54:37 a. m. 4.61690765N 74.0832639W # 22-43 Avenida Calle 22 Los Mártires Bogotá Cundinamarca</p>	

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19. ID EX_05_001_1073_24 (FTS ANTONIO JOSE DE SUCRE)

Nombre FTS:	ANTONIO JOSE DE SUCRE	
ID:	EX_05_001_1073_24	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDOS CUBICOS M-41	
ACTIVIDAD REALIZADA:	RETIRO DE BOLARDOS AL ID EX_08_308_1867_12 Y REUBICIÓN DE BOLARDOS CUBICOS SOBRE LA ZONA.	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div><p>10 sept 2025 2:59:38 p.m. # 107-16 Carrera 7 Bogotá, D.C.</p></div>	<div><p>16/09/2025 1:34:39 a.m. 18 Sur Calle 106b Sur Usme Bogotá</p></div>	<div><p>26/09/2025 10:18:47 a.m. N 4° 29' 34" W 74° 5' 57" Carrera 7 Bogotá Contrato No. 2025-2991</p></div>

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20. ID EX_13_171_1881_12 (FTS TEUSAQUILLO)

Nombre FTS:	TEUSAQUILLO
ID:	EX_13_171_1881_12

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

ESVAP POR IMPLEMENTAR:		N.A , RETIRO DE BOLARDOS CUBICOS M-41	
ACTIVIDAD REALIZADA:		RETIRO DE BOLARDOS AL ID EX_08_308_1867_12.	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
ANTES		DURANTE	
			
		DESPUES	
			

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21. ID EX_08_308_1867_12 (MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _Tom Adams)

Nombre FTS:	MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _Tom Adams	
ID:	EX_08_308_1867_12	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDOS CUBICOS M-41	
ACTIVIDAD REALIZADA:	INSTALACIÓN DE BOLARDOS CUBICOS M-41	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22. ID MV_AV_CALI_941_09_T1 (2024_SBP_00.1)

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Nombre FTS:	2024_SBP_00.1
ID:	MV_AV_CALI_941_09_T1
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDO METÁLICO HF tipo M-63
ACTIVIDAD REALIZADA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOLARDO METÁLICO HF TIPO M-63

REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23. ID MV_AV_CALLE_80_1238_24 (2023_SGV__01.1 Y 01.2)

Nombre FTS:	2023_SGV__01.1 Y 01.2
ID:	MV_AV_CALLE_80_1238_24
ESVAP IMPLEMENTAR:	POR MALLA ESLABONADA
ACTIVIDAD REALIZADA:	DEMOLICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA.
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ANTES	DESPUES

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. ID_MV_AC26_643_24 (2025_SGV_5.1)

Nombre FTS:		2025_SGV_5.1
ID:		MV_AC26_643_24
ESVAP IMPLEMENTAR:	POR	MALLA ESLABONADA
ACTIVIDAD REALIZADA:		DEMOLICIÓN EN CONCRETO Y EN MATERIAL ASFALTICO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA.
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 <p>VIVO V40 / ZEISS 21.10.2025, 11:21</p>	 <p>8/11/2025 2:33:05 a. m. 4.68601811N 74.12585335W #97-2 a 97-98 Avenida Calle 26 Fontibón Bogotá</p>	 <p>6/12/2025 1:34:30 a. m. 4.68618383N 74.12612877W # 96A-48 Avenida 26 Fontibón Bogotá, D.C.</p>

Fuente: Elaboración propia.


OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Tabla 25. ID_MV_08_259_1244_11 (MV_08_001_1703_10_V6 _ESVAP V1 _40C sur)

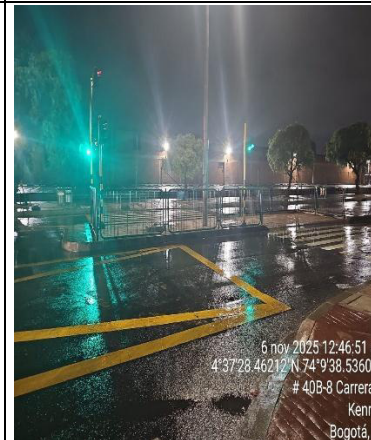
Nombre FTS:		MV_08_001_1703_10_V6 _ESVAP V1 _40C sur)
ID:		MV_08_259_1244_11
ESVAP	POR	VALLA PEATONAL
IMPLEMENTAR:		
ACTIVIDAD REALIZADA:		DEMOLICIÓN DE LOSETA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, RETIRO DE BOLARDOS CON POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL.
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26. ID_EX_11_417_1842_12 (2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1)

Nombre FTS:	2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	
ID:	EX_11_417_1842_12	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDO M-60	
ACTIVIDAD REALIZADA:	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, CON POSTERIOR INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60.	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

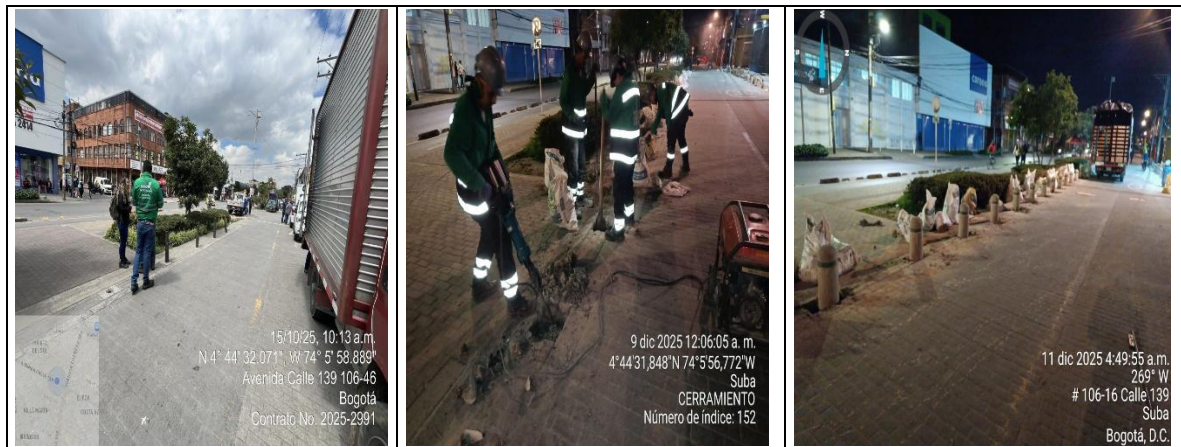

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27. ID_EX_01_341_1842_12 (2025_SBP_SI_137.1)

Nombre FTS:	2025_SBP_SI_137.1	
ID:	EX_01_341_1842_12	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDO M-63	
ACTIVIDAD REALIZADA:	DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, RETIRO DE BOLARDOS Y POSTERIOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-63.	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES

Fuente: Elaboración propia.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Tabla 28. ID_EX_17_033_1881_12 (2025_UT_Calle_11.1)


Nombre FTS:	2025_UT_Calle_11.1	
ID:	EX_17_033_1881_12	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDO M-41	
ACTIVIDAD REALIZADA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO CUBICO TIPO M-41	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div></div>	<div></div>	<div></div>

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29. ID_EX_17_032_1881_12 (2025_UT_Calle_12.1)



Nombre FTS:	2025_UT_Calle_12.1	
ID:	ID_EX_17_032_1881_12	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	BOLARDO M-41	
ACTIVIDAD REALIZADA:	DEMOLICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, RETIRO DE RESTOS DE BOLARDOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO CUBICO TIPO M-41, AC-405-01 Y BOLARDO M-60.	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

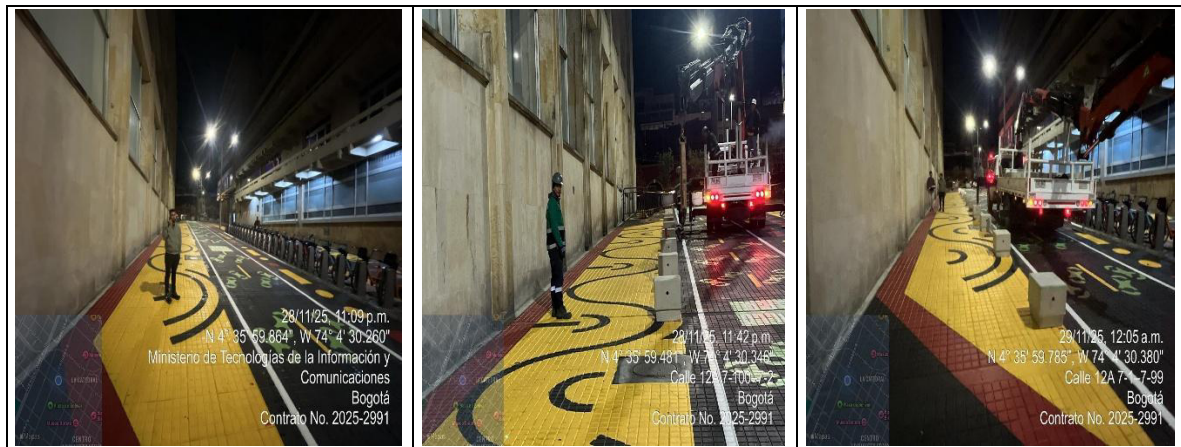

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 43. ID MV_AUTO_SUR_643_24 (2024_SGV_6.1, 6.2, 6.3 y 6.4)

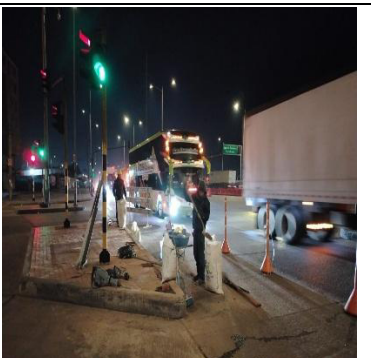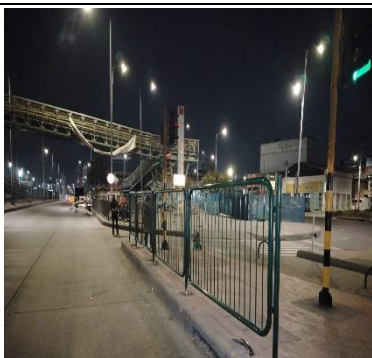Nombre FTS:	2024_SGV_6.1, 6.2, 6.3 y 6.4	
ID:	ID_MV_AUTO_SUR_643_24	
ESVAP POR IMPLEMENTAR:	MALLA EN VARILLA Y VALLA PEATONAL	
ACTIVIDAD REALIZADA:	DEMOLICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO VALLA PEATONAL	
REGISTRO FOTOGRAFICO		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div><p>3/09/2025, 10:15:00 a.m. N 4° 35' 50", W 74° 10' 47" Avenida Calle 57R Sur Bogotá Contrato No. 2025-2991</p></div>	<div><p>05 feb 2026 01:01:24 a.m. 4°35'49,7269"N 74°10'46,47994"W 110111 Bogotá</p></div>	<div><p>10 feb 2026 01:09:23 a.m. 4°35'49,67675"N 74°10'46,11155"W 110111 Bogotá</p></div>

Fuente: Elaboración propia.

6.7. ESQUEMAS TÍPICOS DE ESVAP

La SDM ha suministrado los esquemas típicos y los planos de los siguientes ESVAP:

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.7.1. Malla eslabonada


Ilustración 44. Detalle malla eslabonada

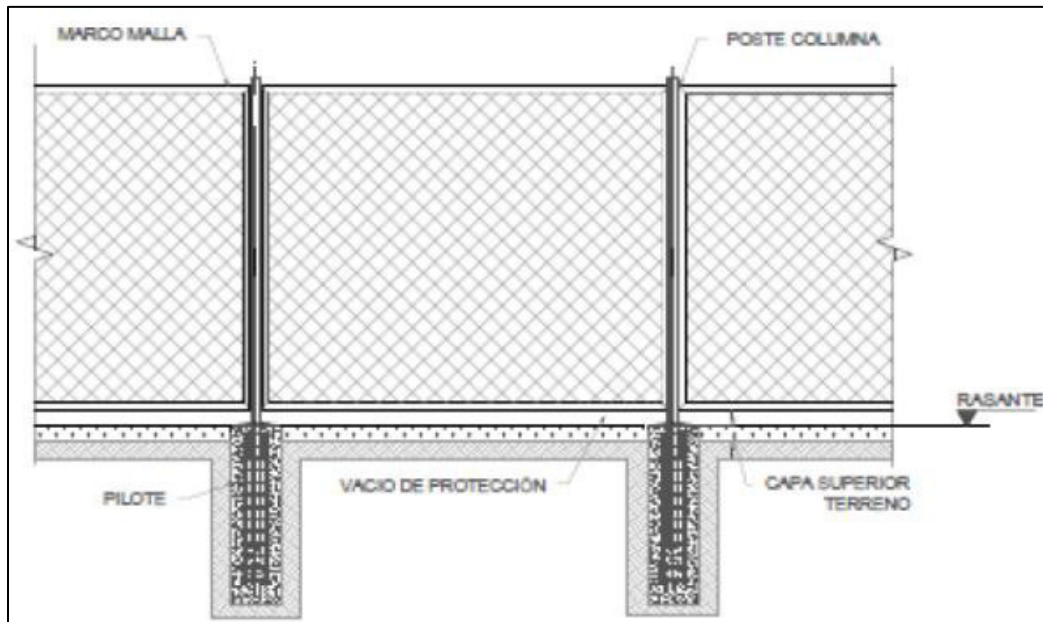

Fuente: Anexo técnico.

6.7.2. Malla en varilla

Ilustración 45. Detalle de malla en varilla

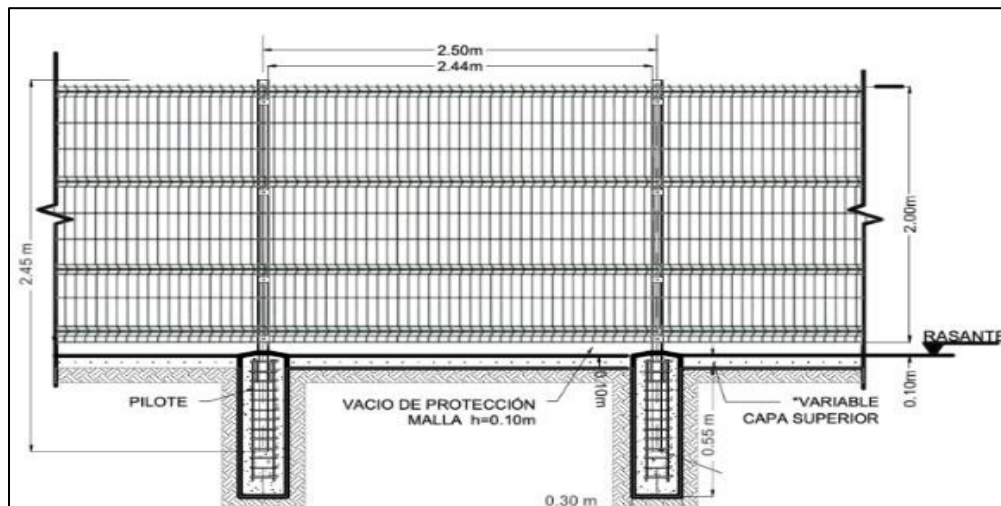

Fuente: Anexo técnico.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.7.3. Vallas


Ilustración 46. Detalle de vallas



Fuente: Anexo técnico.

6.7.4. Matera alta

Ilustración 47. Detalle de matera alta

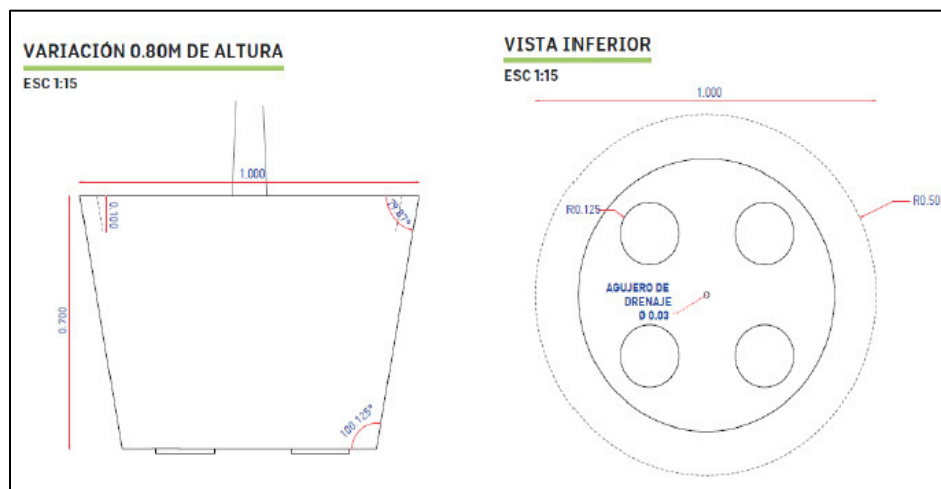

Fuente: Cartilla de Mobiliario Urbano -MEP 2023.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.7.5.MATERA TIPO PARALELEPÍPEDO


Ilustración 48. Detalle de materia paralelepípedo



Fuente: DTS. SBP-DTS-001-2024.

6.7.6.BOLARDO TIPO M63

Ilustración 49. Detalle de bolardo M63

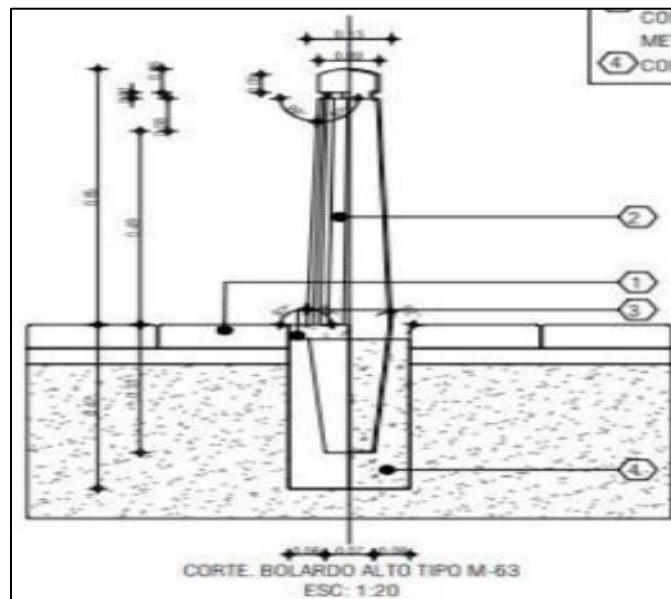

Fuente: Anexo técnico.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

6.7.7.BOLARDO CÚBICO

Ilustración 50. Detalle de bolardo cúbico



Fuente: Anexo técnico.

6.2. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el Plan General de Manejo de Tráfico (PMT), el cual incorpora esquemas típicos para su implementación de acuerdo con las condiciones específicas de cada frente de trabajo y las necesidades derivadas de la instalación de sistemas de contención vehicular. La formulación del PMT se realizó conforme a los lineamientos y exigencias establecidas en el anexo técnico del pliego de condiciones, asegurando su correspondencia con la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial.

Los esquemas y disposiciones técnicas que conforman este plan fueron estructurados en función de las actividades programadas para la ejecución del contrato, con el propósito de garantizar la operatividad, seguridad y continuidad de la movilidad en las zonas de intervención.

- Instalación de malla eslabonada
- Instalación de malla de malla en varilla
- Instalación de vallas peatonales
- Instalación de materas y bolardos

El Plan de Manejo de Transito General y esquemas típicos fueron radicados mediante el oficio CS-SVBTA-2025-022-2025 a la interventoría y aprobados mediante oficio CMAG-042-2025 del

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

01/09/2025. De igual manera, a la fecha se han radicado diferentes PMT específicos y/o emergencia, lo anterior, para el inicio de labores en campo.

Tabla 30. COI Vigentes

ID	UBICACIÓN	FECHA RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN SDM	TIPO DE PMT	COI	ESTADO
EX_08_308_1867_12	Sobre la Cra 79F y 79C entre la CI 39A S y la CI 40A S	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	EMERGENCIA/TÍPICO	COI No. 38 SEPTIEMBRE 18 DE 2025	VENCIDO
EX_08_308_1867_12	Sobre la CI 40C sur entre la Cra 79 y la Cra 80	21/01/2026	22/01/2026	29/01/2026	MASIVO/TÍPICO	COI 5 DEL 29 DE ENERO - 2026	VIGENTE
MV_08_259_1244_11	Sobre la CI 40C sur y la Cra 80	27/10/2025	29/10/2025	06/11/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 45 - NOVIEMBRE 6 DE 2025	VENCIDO
EX_05_001_1073_24	Sobre la Cra 7 entre la CL 108 sur y la CL 106	10/09/2025	10/09/2025	18/09/2025	EMERGENCIA/TÍPICO	COI No. 38 SEPTIEMBRE 18 DE 2025	VENCIDO
MV_AV_CALI_941_09_T1	Entre CI 151C y la Av. Ciudad de Cali	16/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 43 - OCTUBRE 23 DE 2025	VENCIDO
MV_AV_CALLE_80_1238_24	Sobre la Av. CI 80 entre la Cra 97 a la Cra102	27/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	NORMAL/ESPECÍFICO	COI No. 6 - FEBRERO 05 DE 2026	VIGENTE
MV_AUTO_SUR_643_24	Sobre la Autopista sur hasta la CI 63 sur	29/01/2026	29/01/2026	26/01/2026	ESPECÍFICO/TÍPICO	COI No. 6 (ADICIONAL)- FEBRERO 9 DE 2026	EN ESPERA DE RESPUESTA
EX_12_141_1881_12	Sobre la CI 71A entre la Cra 20 y la Dg 71A Bis	21/01/2026	21/01/2026	EN REVISIÓN DE LA SDM	NORMAL/ESPECÍFICO	EN REVISIÓN DE LA SDM	EN ESPERA DE RESPUESTA
MV_AC26_643_24	Av cl 26 entre la Dg 25c y Cra 96A	15/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 4 - ENERO 22 DE 2026	VIGENTE
EX_14_096_1881_12 MV_14_089_1249_11	KR 27 X CL 19 - CL 22 (ANDENES) KR 27 X CL 19 - CL 22 (SEPARADOR) AC 19 CON KR 27	20/01/2026	21/01/2026	29/01/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 5 - ENERO 29 DE 2026	VIGENTE
MV_10_161_1560_10 EX_13_109_1098_11	Sobre la CL 63 ENTRE la AK 24 y la AK 26 AK 26 X CL 62 - CL63	15/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 4 - ENERO 22 DE 2026	VIGENTE
EX_11_413_1842_12	Sobre la CL 145B entre la AK 85A y la AK 85B	29/01/2025	29/01/2025	5/02/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 6 - FEBRERO 05 DE 2026	VIGENTE
EX_02_038_1556_10 EX_02_033_1556_10	Sobre la Calle 82 entre la AK 11 y la AK 12 Sobre la AK 13 entre la CL 85 y la CL 86a Sobre la AK 13 entre la CL 86a y la CL 87a	16/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 43 - OCTUBRE 23 DE 2025	VIGENTE
EX_11_417_1842_12	Sobre la CL 139 entre la AK 104 y la AK 110	15/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 4 - ENERO 22 DE 2026	VIGENTE

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

ID	UBICACIÓN	FECHA RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN SDM	TIPO DE PMT	COI	ESTADO
EX_01_341_1842_12	Sobre la CL 137 entre la AK 23 y la Autopista Norte	25/11/2025	25/11/2025	04/12/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 49 - DICIEMBRE 4 DE 2025	VIGENTE
EX_17_033_1881_12	Sobre la Calle 11 entre la AK 5 y la AK 7	16/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 43 - OCTUBRE 23 DE 2025	VIGENTE
EX_17_032_1881_12	Sobre la CL 12A entre la AK 7 y la AK 8	29/01/2026	29/01/2026	06/11/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 45 - NOVIEMBRE 6 DE 2025	VIGENTE
EX_02_003_585_24	Sobre la AK 10 entre la CL 70 y la CL 70A	15/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 4 - ENERO 22 DE 2026	VIGENTE
MV_08_259_1244_11	Sobre AK 80 entre la CL 55 y I CL 57A sur	11/02/2026	11/02/2026	19/02/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 8 - FEBRERO 19 DE 2026	VIGENTE
MV_01_033_1560_10	Sobre la Autopista Norte entre la CL 187 y I CL 188 A	15/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 4 - ENERO 22 DE 2026	VIGENTE
MV_09_424_947_10	Sobre AV CL 24 con Av AK 70 con Av Boyaca	16/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 43 - OCTUBRE 23 DE 2025	VIGENTE
MV_AC_13_872_24_T1	Sobre la Av CL 13 con AK 17 y AK 18	29/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	NORMAL/ESPECÍFICO	COI No. 47 - NOVIEMBRE 20 DE 2025	VIGENTE
MV_12_001_1238_24	Sobre la AK 50 entre la CL 94C y la 18	27/10/2025	29/10/2025	06/11/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 45 - NOVIEMBRE 6 DE 2025	VIGENTE
MV_08_259_1244_11	Sobre AK 80 entre la CL 55 Sur y la CL 43 Sur	29/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	NORMAL/ESPECÍFICO	COI No. 47 - NOVIEMBRE 20 DE 2025	VIGENTE
MV_19_178_1244_11	AV Villavicencio con AK 45B y AK 50	11/02/2026	11/02/2026	19/02/2026	MASIVO/TÍPICO	COI No. 8 - FEBRERO 19 DE 2026	VIGENTE
MV_15_016_1561_10 MV_04_511_676_09	Av Primera de Mayo entre la AK 6 y la AK 11	10/12/2025	11/12/2025	18/12/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 51 - DICIEMBRE 18 DE 2025	VIGENTE
MV_15_016_1561_10	Av Primera de Mayo entre la AK 12D y la AK 13 Av Primera de Mayo entre la AK 14 y la AK 18	10/12/2025	11/12/2025	18/12/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 51 - DICIEMBRE 18 DE 2025	VIGENTE
MV_06_001_643_24 MV_AUTO_SUR_643_24	Av Primera de Mayo entre la AK 30 y la Transversal 35	10/12/2025	11/12/2025	18/12/2025	MASIVO/TÍPICO	COI No. 51 - DICIEMBRE 18 DE 2025	VIGENTE

Fuente: Elaboración propia.

En el anexo I, PMT. Se anexa PMT general aprobado y los diferentes PMT específicos y/o emergencia radicados durante el periodo del presente informe.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELÉFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

7. CONTROL DE OBRA

7.1. PRESUPUESTO GENERAL Y CONDICIONES ACTUALIZADAS

Tabla 31. Presupuesto general vigencia 2025 contrato No. 2025-2991

PRESUPUESTO																
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
DEMOLICIONES- EXCAVACIONES - BORDILLOS - CONCRETOS - ACEROS																
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	41,83	\$ 122.786,00	\$ 5.136.138,38		28,00	13,83	\$ 1.698.646,08	2,37	\$ 290.499,40	8,94	\$ 1,097,792.79	64.63%	4,89	\$ 600.853,29
	Demolición de concreto estructural (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	47,48	\$ 267.724,00	\$ 12.711.535,52		47,48	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
	Demolición pavimento flexible espesor variable, (incluye equipo, cargue, transporte y disposición final de escombros).	M3	42,96	\$ 92.690,00	\$ 3.981.962,40		42,85	0,11	\$ 10.010,52		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD AD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD AD	VALOR TOTAL	CANTIDAD AD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	253,24	\$ 53.894,00	\$ 13.648.116,56		174,80	74,44	\$ 4.227.650,16	5,18	\$ 278.960,73	52,45	\$ 2.826.961,27	66,87%	25,99	\$ 1.400.688,89
	Suministro e instalación de Bordillo prefabricado tipo A-10 incluye 3 cm de mortero.	M	16,96	\$ 93.695,00	\$ 1.589.067,20		16,96	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
	Suministro e instalación de Bordillo prefabricado tipo A-80 incluye mortero de nivelación 1:4, y de pegue 1:3; Norma de referencia NTC 4109	ML	16,96	\$ 83.278,00	\$ 1.412.394,88		16,96	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 1500 PSI (incluye acelerante)	M3	41,83	\$ 932.290,00	\$ 38.997.690,70		41,83	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)	M3	66,7	\$ 1.017.530,00	\$ 67.869.251,00		45,33	21,37	\$ 21.746.040,64	0,73	\$ 738.116,26	9,15	\$ 9.311.620,54	42,82%	12,22	\$ 12.434.420,11
	Suministro e instalación de acero A-36, incluye corte y/o curvado y pintado, elementos	KG	57,66	\$ 15.857,00	\$ 914.314,62		57,66	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDA D	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTID AD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTID AD	VALOR TOTAL	CANTID AD	VALOR TOTAL	% EJECUCI ÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MA YOR ES (+)	ME NOR ES (-)									
	de sujeción y soldadura															
	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 36000 PSI, Incluye corte amarre y figurado	KG	875,04	\$ 10.499,00	\$ 9.187.044,96	875,04	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -	
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado	KG	786,86	\$ 9.860,00	\$ 7.758.439,60	1411,56	2198,42	\$ 21.676.421,20	74,62	\$ 735.753,20	941,36	\$ 9.281.809,60	42,82%	1257,06	\$ 12.394.611,60	
MALLAS																
12	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de Mallas con cimentación - Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano, (color de acuerdo con la normatividad vigente), Secciones según diseño con	M2	208,02	\$ 346.183,00	\$ 72.012.987,66	170,395	37,63	\$ 13.025.135,38	37,63	\$ 13.025.135,38	37,63	\$ 13.025.135,38	100,00%	0,00	\$ 0,00	

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
	marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 mm.															
13	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de Mallas en varilla de acero galvanizado electrosoldado calibre 6 panel rígido de 2 m x 2,5 m abertura de 50mm x 200 mm terminado en pintura electrostática - con cimentación (incluye postes de fijación empotrados en concreto, abrazadera perno, tuerca de seguridad) Normas de referencia ISO 1401 e ISO 9001	M2	217,06	\$ 357.216,00	\$ 77.537.304,96	217,06	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -		

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDA D	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTID AD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTID AD	VALOR TOTAL	CANTID AD	VALOR TOTAL	% EJECUCI ÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYOR ES (+)	MENOR ES (-)									
14	Suministro e Instalación de Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano (incluye cimentación), (color de acuerdo con la normatividad vigente), Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 m	M2	680,59	\$ 367.936,00	\$ 250.413.562,24	3547,44		4228,03	\$ 1.555.644.906,43	295,63	\$ 108.771.080,00	2718,95	\$ 1.000.401.242,91	64,31%	1509,08	\$ 555.243.663,52
15	Suministro e instalación de Malla eslabonada de hueco 2" alambre galvanizado Cal 10 (incluye mano de obra, transporte y soldadura para fijación)	M2	997,14	\$ 141.281,00	\$ 140.876.936,34	997,14		0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
16	Suministro e instalación de Malla en varilla de acero galvanizado electrosoldado calibre 6 panel rígido de 2m x 2,5m abertura de 50mm x 200 mm terminado en pintura	M2	1079,67	\$ 312.544,00	\$ 337.444.380,48	86,705		1166,38	\$ 364.543.508,00		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	1166,38	\$ 364.543.508,00

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
	electrostática - (incluye postes de fijación empotrados en concreto, abrazadera perno, tuerca de seguridad) Normas de referencia ISO 1401 e ISO 9001															
BOLARDOS																
17	Retiro de bolardo (o restos). Incluye reparación del sitio con concreto de 1500 PSI hecho en obra (40x40x10cm) y subbase granular B-200 E=0,35. Incluye demolición, excavación y retiro de escombros.	UN	38,44	\$ 49.165,00	\$ 1.889.902,60	14,56		53,00	\$ 2.605.745,00	19,00	\$ 934.135,00	32,00	\$ 1.573.280	60,38%	21,00	\$ 1.032.465
18	Retiro de bolardo (o restos). Incluye demolición y retiro de escombros. (sin reparación del sitio)	UN	41,83	\$ 34.163,00	\$ 1.429.038,29	32,17		74,00	\$ 12.528.062,00	29,00	\$ 990.727,00	74,00	\$ 2.528.062,00	100,00%	0,00	\$ 0,00
19	Retiro de bolardo cubico (incluye transporte del elemento)	UN	41,83	\$ 37.941,00	\$ 1.587.072,03	8,17		50,00	\$ 1.897.050,00		\$ -	50,00	\$ 1.897.050	100,00%	0,00	\$ -

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
20	Reemplazo de bolaro tipo M60 en concreto reforzado, y anillo en platina de e= 1/4", incluye mano de obra para instalación y transporte de escombros	UN	41,83	\$ 291.427,00	\$ 12.190.391,41	41,83	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -		
21	Reemplazo de bolaro metálico HF tipo M63, incluye mano de obra para instalación y transporte de escombros.	UN	39,57	\$ 347.358,00	\$ 13.744.956,06	39,57	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -		
22	Suministro e instalación de Bolaro en concreto reforzado, y anillo en platina de e= 1/4", tipo M60 incluye mano de obra para instalación	UN	41,83	\$ 254.875,00	\$ 10.661.421,25	244,17	286,00	\$ 72.894.250,00	\$ 47.406.750,00	186,00	\$ 286,00	72.894.250,00	100,00%	0,00	\$ 0,00	
23	Suministro e instalación Bolaro metálico HF tipo M-63, incluye mano de obra para instalación <u>Norma de referencia ASTM 4339</u>	UN	416,04	\$ 251.828,00	\$ 104.770.521,12	391,0	25,00	\$ 6.295.700,00	\$ 1.007.312,00	4,00	\$ 25,00	6.295.700,00	100,00%	0,00	\$ -	

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
24	Suministro e instalación de Bolardo Cúbico 0,45 x 0,45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico)	UN	166,19	\$ 713.951,00	\$ 118.651.516,69		136,2	30,00	\$ 21.418.530,00		\$ -	30,00	\$ 21.418.530,00	100,00%	0,00	\$ -
25	Suministro e instalación de Bolardo Cúbico 0,45 x 0,45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41	UN	166,19	\$ 684.597,00	\$ 113.773.175,43		92,19	74,00	\$ 50.660.178,00		\$ -	74,00	\$ 50.660.178,00	88,10%	10,00	\$ 6.845.970,00
26	Instalación de Bolardo Cúbico 0,45 x 0,45 Concreto aligerado Resistencia 24MPa incluye acero de refuerzo, según diseño TIPO M-41 (con epoxico y transporte)	UN	166,19	\$ 92.725,00	\$ 15.409.967,75		116,2	50,00	\$ 4.636.250,00		\$ -	50,00	\$ 4.636.250	100,00%	0,00	\$ -

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
27	Suministro e instalación de Bolardo AC-405-01 (M-15-A) en hierro nodular ASTM A536 65-45-12, H min 0.805 m, e=6 mm, pintura de polipropileno tratado o zincado con resultado de color, con 0,35 m de largo extra para instalación por método embebido en dado de concreto de 1500 PSI	UN	498,57	\$ 367.618,00	\$ 183.283.306,26		497,57	1,00	\$ 367.618,00		\$ -	1,00	\$ 367.618,00	0,70%	141,00	\$ 51.834.138,00
BARANDAS O VALLAS PEATONALES																
28	Desmonte de barandas con corte a ras de andén o separador. Incluye transporte de elementos metálicos al sitio de disposición de la SDM.	KG	531,35	\$ 1.867,00	\$ 992.030,45		531,35	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
29	Reparación y mantenimiento de barandas en sitio. Incluye restauración de elementos, soldadura y pintura (No incluye	M2	202,37	\$ 58.203,00	\$ 11.778.541,11		202,37	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
	reemplazo de elementos, ni cimentación)															
30	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de vallas con cimentación - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), con altura de según diseño (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)	M2	208,02	\$ 454.105,00	\$ 94.462.922,10	208,02	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -		
31	Reparación y mantenimiento de barandas en sitio. Incluye reemplazo de tubo metálico agua negra doblado tipo pesado de 2", soldadura y pintura. (no incluye la cimentación)	M	248,72	\$ 78.879,00	\$ 19.618.784,88	248,72	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -		

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)	M2	499,7	\$ 427.989,00	\$ 213.866.103,30	82,973		582,67	\$ 249.377.634,60	50,46	\$ 21.596.324,94	580,35	\$ 248.384.700,12	99,60%	2,32	\$ 992.934,48
MATERAS																
33	Suministro e instalación de Matera Alta para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (CA-306-01 o similar), H min 0,80 m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lamina retrorreflectiva tipo XI, amarillo verde-fluorescente, lámina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	165,06	\$ 1.303.492,00	\$ 215.154.389,52	123,10		42,0	\$ 49.532.696,00		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	38,00	\$ 49.532.696,00

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
34	Instalación de Matera Alta para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (CA-306-01 o similar), H min 0,80 m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lamina retrorreflectiva tipo XI, amarillo verde-fluorescente, lámina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	151,49	\$ 405.158,00	\$ 61.377.385,42		151,49	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -	
35	Suministro e instalación de Matera paralelepipedo para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (HDPE), L=1m, A=0,35, H=0.40m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lámina retrorreflectiva tipo XI, lámina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	165,06	\$ 739.051,00	\$ 121.987.758,06		165,06	0,00	\$ 5.173.357,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00%	7,00	\$ 5.173.357,00	

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM DESCRIPCIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
36	Instalación de Matera paralelepipedo para vegetales en polietileno inyectado de alta densidad (HDPE), L=1m, A=0,35, H=0.40m, incluye material vivo (según recomendación Jardín Botánico), tierra negra fertilizada, lámina retrorreflectiva tipo XI, lámina de acero y pernos de anclaje, epóxico.	UN	249,85	\$ 319.052,00	\$ 79.715.142,20		249,85	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
37	Retiro de Matera Alta incluye retiro de elemento y escombros.	UN	58,79	\$ 31.450,00	\$ 1.848.945,50		58,79	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
38	Retiro de Matera paralelepipedo incluye retiro de elemento y escombros.	UN	46,35	\$ 20.503,00	\$ 950.314,05		46,35	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00%	0,00	\$ -
TRANSPORTE																
39	Transporte de materiales no granulares, Incluye Mano de obra para trasiego	TON	135,58	\$ 69.074,00	\$ 9.365.287,02		135,58	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PRESUPUESTO																
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS INFORME MENSUAL No. 6		CANTIDADES ACUMULADAS			CANTIDADES PENDIENTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						MAYORES (+)	MENORES (-)									
	VALOR TOTAL VIGENCIA 2025				\$ 2.450.000.000,00				\$ 2.450.000.000,00		\$ 194.767.482,00		\$ 1.446.610.191,00	59,05 %		\$ 1.003.389.809,00

Fuente: Elaboración propia.

En el anexo J, presupuesto general y balance. 2025. Se adjunta presupuesto inicial asignado al contrato de obra No. 2025-2991 y el ajuste con respecto a los ID's suministrados a la fecha vs lo ejecutado.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

7.2. REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ID

Para el periodo del presente informe se ejecutaron las siguientes actividades en campo:

2023_SGV__01.1 Y 01.2 (ID MV_AV_CALLE_80_1238_24)

- Sobre el ID MV_AV_CALLE_80_1238_24 durante la semana 17 (entre el 08 de diciembre al 14 de diciembre de 2025) y semana 26 (entre el 09 de febrero al 15 de febrero de 2026) se ejecutaron en horario nocturno las siguientes actividades: Reemplazo de malla eslabonada, suministro e instalación de malla eslabonada, Afinado y resane de cimentaciones, retiro de escoria y ajuste de soldadura, aplicación de pintura sobre módulos instalados. Lo anterior, bajo la verificación y aprobación de la interventoría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
12	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de Mallas con cimentación - Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano, (color de acuerdo con la normatividad vigente), Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 mm.	M2	37,63	37,63	100,00 %

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0



Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
14	Suministro e Instalación de Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano(incluye cimentación), (color de acuerdo con la normatividad vigente), Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 m	M2	295,63	295,63	100,00 %

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 G VIAL SEGURIDAD VIAL
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0



Fuente: Elaboración propia.

2024_SGV_6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 (ID MV_AUTO_SUR_643_24)

- Sobre el ID MV_AC26_643_24 durante la semana 25 (entre el 02 de febrero al 08 de febrero de 2026) y semana 26 (entre el 09 de febrero al 15 de febrero de 2026), se ejecutaron en horario nocturno las siguientes actividades: Demolición de placa de concreto en andén, Excavación manual en material común, corte, armado y figurado de acero de refuerzo para construcción de micropilotes, vaciado de concreto de 3000 PSI para construcción de micropilotes sobre andén y actividades de suministro e instalación de valla peatonal. Lo anterior, bajo la verificación y aprobación de la interventoría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	2,09	0,18	8,41 %

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0



Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	10,44	0,53	5,04 %



Fuente: Elaboración propia.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
8	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante)	M3	12,95	0,73	5,60 %

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83


EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

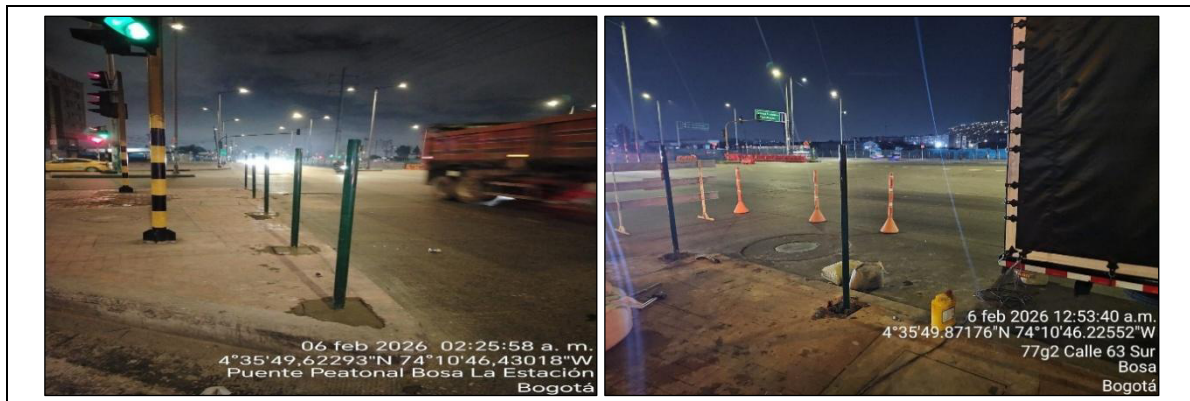

Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado	KG	1331,68	74,62	5,60 %

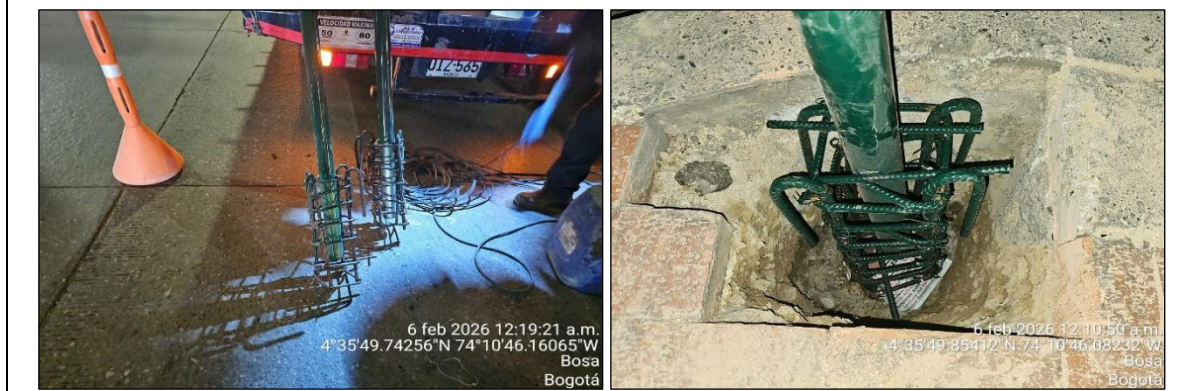

Fuente: Elaboración propia.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de ½", (color de acuerdo	M2	52,78	50,46	95,60 %

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

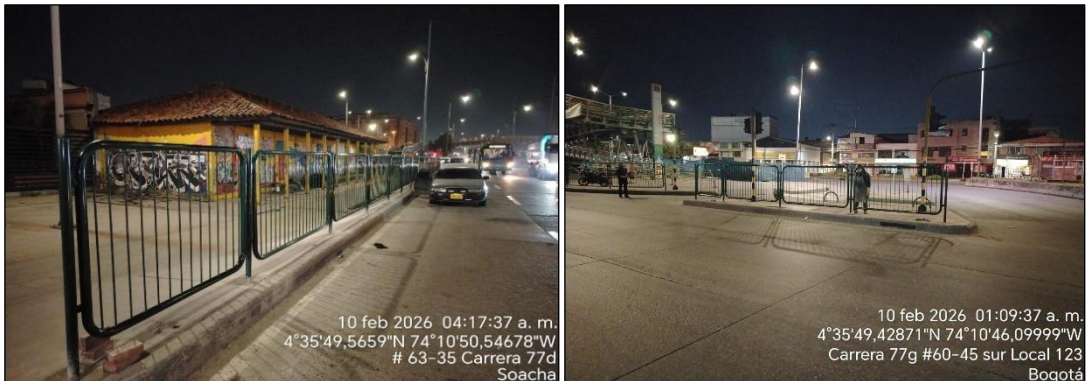con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653).				
 <p>10 feb 2026 04:17:37 a. m. 4°35'49,5659"N 74°10'50,54678"W # 63-35 Carrera 77d Soacha</p> <p>10 feb 2026 01:09:37 a. m. 4°35'49,42871"N 74°10'46,09999"W Carrera 77g #60-45 sur Local 123 Bogotá</p>				

Fuente: Elaboración propia.

2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1 (ID_EX_11_417_1842_12)

- Sobre el ID EX_11_417_1842_12 durante la semana 23 (entre el 19 de enero al 25 de enero de 2026), semana 24 (entre el 26 de enero al 01 de febrero de 2026), semana 25 (entre el 02 de febrero al 08 de febrero de 2026) y la semana 26 (entre el 09 de febrero al 15 de febrero de 2026), se ejecutaron en horario nocturno las siguientes actividades: Demolición de concreto y loseta prefabricada ubicada en andén, excavación manual en material común sobre andén, Retiro de bolardos (o restos) incluyendo su reparación, vaciado de concreto de 3000 PSI para las actividades de suministro e instalación de bolardos tipo M-60, ubicado sobre la calle 139 entre la Ak 104 a la 110. Lo anterior, bajo la verificación y aprobación de la interventoría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
1	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	4,22	4,22	100,0 %

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0



Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
4	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	14,28	14,28	100,00 %



Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
17	Retiro de bolardo (o restos). Incluye reparación del sitio con concreto de 1500 PSI hecho en obra	UN	29,00	29,00	100,00 %

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

(40x40x10cm) y subbase granular B- 200 E=0,35. Incluye demolición, excavación y retiro de escombros.				
				

Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
18	Retiro de bolardo (o restos). Incluye demolición y retiro de escombros. (sin reparación del sitio)	UN	69,0	69,0	100,0 %
					

Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
------	-------------	----	-------------------------	-----------------------	----------------

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

22	Suministro e instalación de Bolardo en concreto reforzado, y anillo en platina de e= 1/4", tipo M60 incluye mano de obra para instalación	UN	285,0	285,0	100,0 %
----	---	----	-------	-------	---------



Fuente: Elaboración propia.

2025_UT_Calle_12.1 (ID_EX_17_032_1881_12)

- Sobre el ID EX_01_341_1842_12 durante la semana 24 (entre el 26 de enero al 01 de febrero de 2026), se ejecutaron en horario nocturno las siguientes actividades: Retiro de bolardos (o restos), vaciado de concreto de 3000 PSI para las actividades de suministro e instalación de bolardo tipo M-60, ubicado sobre la calle 12ª entre la Ak 8 y la Ak 7. Lo anterior, bajo la verificación y aprobación de la interventoría. Es importante mencionar, que estas actividades se ejecutaron debido a los actos de vandalismo ocurridos en la zona sobre elementos previamente implementados. (Bolardo AC-405-01 implementado).

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
18	Retiro de bolardo (o restos). Incluye demolición y retiro de escombros. (sin reparación del sitio)	UN	1,00	1,00	100,00 %

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0



Fuente: Elaboración propia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
22	Suministro e instalación de Bolardo en concreto reforzado, y anillo en platina de e=1/4", tipo M60 incluye mano de obra para instalación	UN	1,0	1,0	100,00 %



Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Tabla 32. % de Avances vs % Programados por ID suministrados con respecto a la vigencia 2025

ID FTS	PROGRAMADO		EJECUTADO		FINANCIERO	
	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
PRIMER PAQUETE						
2024_SBP_00.1	\$ 1.012.035,95	100,00%	\$ 1.012.035,95	100,00%	\$ 1.012.035,95	100,00%
2023_SGV_01.1 Y 01.2	\$ 122.033.067,32	100,0%	\$ 122.033.067,32	100,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4	\$ 252.235.362,23	0,00%	\$ 23.120.118,50	5,58%	\$ -	0,00%
2025_OSV_PEP_ COLOMBIA. 1, 2 Y 3	\$ 46.184.878,00	100,00%	\$ 21.418.530,0	46,38%	\$ 21.418.530,0	46,38%
2025_SGV_5.1	\$ 1.026.544.777,2 1	100,00%	\$ 681.604.124,82	66,40%	\$ -	0,00%
ID_2024_SGV_11	\$ 440.019.946,08	100,00%	\$ 440.019.946,08	100,00%	\$ 181.485.200,5 2	41,28%
MV_08_001_1703 _10_V6_ESVAP V1_Tom Adams_BOLARD OS	\$ 6.533.300,00	100,00%	\$ 6.533.300,0	100,00%	\$ 6.533.300,0	100,00%
MV_08_001_1703 _10_V6_ESVAP V1_40C sur_MATERAS ALTAS	\$ 29.980.316,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
MV_08_001_1703 _10_V6_ESVAP V1_40C sur_VALLA	\$ 16.248.708,03	100,00%	\$ 16.248.708,03	100,00%	\$ 16.248.708,03	100,00%
SEGUNDO PAQUETE						
2025_SBP_SI_63. 1	\$ 0,00	45,63%	\$ -	0,0%	\$ -	0,00%
2024_SI_2.1	\$ 0,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_UT_Calle_8 2	\$ 0,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP- SI_Z4_CONSECU TIVO 04.1	\$ 81.696.014,36	100,00%	\$ 78.815.739,70	96,47%	\$ -	0,00%
2025_SBP_SI_13 7.1	\$ 5.591.837,36	100,00%	\$ 5.591.837,36	100,00%	\$ 5.591.837,36	100,00%
2025_UT_Calle_1 1.1	\$ 39.706.626,00	100,00%	\$ 39.706.626,0	100,00%	\$ 39.706.626,0	100,00%
2025_UT_Calle_1 2.1	\$ 11.611.343,43	100,00%	\$ 11.611.343,43	100,00%	\$ -	0,00%
2024_SBP_9.1	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_OSV_1.1	\$ 121.721.848,16	75,05%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PROGRAMADO			EJECUTADO		FINANCIERO	
ID FTS	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
2025_SGV_MANT_1. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_2. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_3. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_3. 2	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_14.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_DIT_1.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_DIT_2.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_4. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_5. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_6. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_7. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TERCER PAQUETE						
SIN UBICACIÓN	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SIN UBICACIÓN	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_11.3	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2023_SGV_01.3	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP- SI_T117_f2.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP_OGS_SI_ T117_F3.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SBP_4.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP_SI_Z1_C ONSECUTIVO 01_CL 72 ENTRE KR 101 Y KR 103-COST. NORTE.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP- SI_Z1_CONSECUTIV O 02_CL 72 ENTRE KR 102A Y KR 103A- COST. SUR.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_1.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_2.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PROGRAMADO			EJECUTADO		FINANCIERO	
ID FTS	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
2024_SGV_8.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_OSV_9.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

Fuente: Elaboración propia.

7.3. REPORTE APROBACION MENSUAL DE ID's FINALIZADOS.

Se presenta el estado actual de aprobación, por parte de la interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), de los ítems ejecutados y recibidos a satisfacción hasta la fecha:

Tabla 33. Aprobación de ID por parte de INTER/SDM

ID FTS	LOCALIZACIÓN	%INTER/SDM
2024_SBP_00.1	Calle 151C	100,00%
2023_SGV_01.1 Y 01.2	Av. calle 80	100,00%
2024_SGV_6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4	Autopista Sur	5,58%
2025_OSV_PEP_COLOMBIA. 1, 2 Y 3	Calle 71A	46,38%
2025_SGV_5.1	Calle 71A	66,40%
ID_2024_SGV_11	Cra 27 entre la Cl 19 y la Cl 22 y alrededor de la Plazoleta de comidas	100,00%
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_Tom Adams_BOLARDOS	Sobre la Cl 40C sur entre la Cra 79 y la Cra 80	100,00%
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C sur MATERAS ALTAS	Sobre la Cra 79F y 79C entre la Cl 39A S y la Cl 40A S	0,00%
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C sur VALLA	Sobre la Cl 40C sur y la Cra 80	100,00%
SEGUNDO PAQUETE		
2025_SBP_SI_63.1	Sobre la CL 63 ENTRE la AK 24 y la AK 26 Sobre la AK 26 ENTRE la CL 62 y la CL 63	0,00 %
2024_SI_2.1	Sobre la CL 145B entre la AK 85A y la AK 85B	0,00 %
2025_UT_Calle_82	Sobre la Calle 82 entre la AK 11 y la AK 12 Sobre la AK 13 entre la CL 85 y la CL 86a	0,00 %

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

ID FTS	LOCALIZACIÓN	%INTER/SDM
	Sobre la AK 13 entre la CL 86a y la CL 87a	
2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	Sobre la CL 139 entre la AK 104 y la AK 110	100,00%
2025_SBP_SI_137.1	Sobre la CL 137 entre la AK 23 y la Autopista Norte	100,00 %
2025_UT_Calle_11.1	Sobre la Calle 11 entre la AK 5 y la AK 7	100,00 %
2025_UT_Calle_12.1	Sobre la CL 12A entre la AK 7 y la AK 8	100,00 %
2024_SBP_9.1	Sobre la AK 10 entre la CL 70 y la CL 70A	0,00 %
2024_OSV_1.1	Sobre AK 80 entre la CL 55 y l CL 57A sur	0,00 %
2025_SGV_MANT_1.1	Sobre la Autopista Norte entre la CL 187 y l CL 188 A	0,00 %
2025_SGV_MANT_2.1	Sobre AV CL 24 con Av AK 70 con Av Boyaca	0,00 %
2025_SGV_MANT_3.1	Sobre la Av CL 13 con AK 17 y AK 18	0,00 %
2025_SGV_MANT_3.2	Sobre la Av CL 13 con AK 17 y AK 18	0,00 %
2024_SGV_14.1	Sobre la AK 50 entre la CL 94C y la 18	0,00 %
2025_DIT_1.1	Sobre AK 80 entre la CL 55 Sur y la CL 43 Sur	0,00 %
2025_DIT_2.1	AV Villavicencio con AK 45B y AK 50	0,00 %
2025_SGV_MANT_4.1	Av Primera de Mayo entre la AK 6 y la AK 11	0,00 %
2025_SGV_MANT_5.1	Av Primera de Mayo entre la AK 12D y la AK 13	0,00 %
2025_SGV_MANT_6.1	Av Primera de Mayo entre la AK 14 y la AK 18	0,00 %
2025_SGV_MANT_7.1	Av Primera de Mayo entre la AK 30 y la Transversal 35	0,00 %
TERCER PAQUETE		
SIN UBICACIÓN		0,00 %

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

ID FTS	LOCALIZACIÓN	%INTER/SDM
SIN UBICACIÓN		0,00 %
2024_SGV_11.3	AC 19 entre KR 22 Y KR 27	0,00 %
2023_SGV_01.3	AC 80 entre la KR 100 y KR 97	0,00 %
2025_SBP-SI_T117_f2.1	CL 68 entre KR 27 Y KR 27A CL 68 entre KR 27A Y KR 27B CL 68 entre KR 27B Y KR 27C	0,00 %
2025_SBP_OGS_SI_T117_F3.1	CL 68 entre KR 28 y KR 28A CL 68 entre KR 27B BIS Y KR 28	0,00 %
2024_SBP_4.1	CL 65J Sur entre KR 78J y KR 79B	0,00 %
2025_SBP_SI_Z1_CONSECUTIVO 01_CL 72 ENTRE KR 101 Y KR 103-COST. NORTE.1	AC 72 entre KR 101 Y KR 103	0,00 %
2025_SBP-SI_Z1_CONSECUTIVO 02_CL 72 ENTRE KR 102A Y KR 103A-COST. SUR.1	AC 72 entre KR 102A Y KR 103A	0,00 %
2024_SGV_1.1	Av Americas entre KR 62 Y KR 68	0,00 %
2024_SGV_2.1	Av Americas entre KR 53F Y KR 57	0,00 %
2024_SGV_8.1	Av Americas entre KR 74 Y KR 75	0,00 %
2024_OSV_9.1	Av Caracas entre CL 41B Sur Y CL 44 Sur	0,00 %

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior, se concluye que en este periodo se ha completado en su totalidad el ID de la FTS MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _Tom Adams_BOLARDOS (ID EX_08_308_1867_12), MV_08_001_1703_10_V6 _ ESVAP V1 _40C sur (ID MV_08_259_1244_11), 2024_SBP_00.1 (MV_AV_CALI_941_09_T1), 2023_SGV_01.1 Y 01.2, 2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1(EX_11_417_1842_12), ID_2024_SGV_11, 2025_SBP_SI_137.1 (ID EX_01_341_1842_12), 2025_UT_Calle_11.1 (EX_17_033_1881_12) y 2025_UT_Calle_12.1 (EX_17_032_1881_12). Sin embargo, a la fecha no se cuenta con acta parcial de recibo de los ID finalizados, solo se encuentra registrado y firmado en el libro de obra.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

El ID correspondiente a la FTS **2024_SI_2.1 (EX_11_413_1842_12)** por consideraciones de la SDM no será ejecutado.

7.4. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN OBRA

Durante la ejecución de actividades en jornada nocturna sobre el frente de obra **2025_SGV_5.1 (ID_MV_AC26_643_24)** se reporte en la noche del 11-12 de noviembre, una situación de hurto a mano armada, donde se registra el hurto de los siguientes elementos: Demoledor marca MAKITA HM1812 de color negro con azul y de la Planta eléctrica marca KTC de color rojo modelo 437-ODG8-1, hecho que fue presentado a las autoridades competentes y hecho denunciado ante las autoridades competentes bajo el número de radicado 110016108112202501410.

Sobre el ID de FTS **2025_UT_Calle_12.1 (ID_EX_17_032_1881_12)** se presentaron actos de vandalismo sobre bolardo tipo AC-405-01 implementado, lo anterior, implica mayor acompañamiento de las autoridades en garantizar la durabilidad y el cuidado de las obras ejecutadas. Adicionalmente, en la jornada nocturna entre el 11/12 de febrero de 2026, se presentaron hechos de intento de hurto a los trabajadores del **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**, situación que generó no solo inseguridad en el personal, sino que, además, represento un atraso a las labores constructivas ejecutadas en el momento.

Sobre el ID de FTS **2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1(EX_11_417_1842_12)** se presento hecho de vandalismo sobre una unidad de bolardo tipo M-60. Ante las recurrentes visitas a campo se observa sobre el ID ejecutado la permanencia de carros estaciones y además, la comunidad manifiesta su descontento con algunas instalaciones, por lo que dieron a entender al profesional ubicado en la visita, que estos serán retirado por los mismos ciudadanos.

7.5. ACTAS PARCIALES DE PAGO

A la fecha del presente informe se han revisado y aprobado las siguientes actas parciales de pago.

Numero de Acta	Periodo facturado	Valor Acta	Valor Cobrado
1	Del 19 de agosto al 18 de octubre de 2025	\$ 28.097.344,00	\$ 22.477.875,00 (80% de obra)
2	Del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025	\$ 199.560.141,00	\$ 159.648.113,00 (80% de obra)
3	Del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2025	\$ 341.783.162,00	\$ 290.515.688,00 (85% de obra)
4	Del 19 de diciembre al 18 de enero de 2025	\$ 682.402.063,00	\$ 580.041.754,00 (85% de obra)

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

7.6. COSTO UNITARIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

Tabla 34. Costo unitario por actividades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO
01	Demolición de concreto (incluye equipo, cargue transporte y disposición final de escombros).	M3	2,37	\$ 122.786	\$ 290.499,40
04	Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final)	M3	5,18	\$ 53.894,00	\$ 278.960,73
08	Suministro e instalación de concreto hidráulico de Fc = 3000 PSI (incluye acelerante).	M3	0,73	\$ 1.017.530,00	\$ 738.116,26
11	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado.	KG	74,62	\$ 9.860,00	\$ 735.753,20
12	Reemplazo (Desmonte, suministro e instalación. No incluye excavación) de Mallas con cimentación - Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano, (color de acuerdo con la normatividad vigente), Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 mm.	M2	37,63	\$ 346.183,00	\$ 13.025.1335,38
14	Suministro e Instalación de Malla eslabonada de hueco de Ø=2" CL 10 alambre galvanizado con pintura poliuretano(incluye cimentación), (color de acuerdo con la normatividad vigente), Secciones según diseño con marco en Angulo de 1½ x 3/16" y tubería tipo cerramiento galvanizada de Ø=2" emin= 3 m	M2	295,63	\$ 367.936,00	\$ 108.771.080,00
17	Retiro de bolardo (o restos). Incluye reparación del sitio con concreto de 1500 PSI hecho en obra (40x40x10cm) y subbase granular B-200 E=0,35. Incluye demolición, excavación y retiro de escombros.	UN	19,00	\$ 49.165,00	\$ 934.135,00
18	Retiro de bolardo (o restos). Incluye demolición y retiro de	UN	29,00	\$ 34.163,00	\$ 990.727,00

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO
	escombros. (sin reparación del sitio)				
22	Suministro e instalación de Bolardo en concreto reforzado, y anillo en platina de e= 1/4", tipo M60 incluye mano de obra para instalación.	UN	186,00	\$ 254.875,00	\$ 47.406.750,00
32	Suministro e Instalación de valla peatonal típica - Tubo redondo Ø =2" emin= 3mm y varilla lisa de 1/2", (color de acuerdo con la normatividad vigente), (normas de referencia NTC 1560, NTC 1054, NTC 2076, NTC 3320, ASTM A653)	M2	50,46	\$ 427.989,00	\$ 21.596.324,94

Fuente: elaboración propia.

7.7. ACTAS DE COMITÉ

Durante el periodo del presente informe se suscribieron cinco (5) actas de comité, las cuales se detallan a continuación:

- ✓ Acta de comité No. 22 del 22/01/2026.
- ✓ Acta de comité No. 23 del 29/01/2026.
- ✓ Acta de comité No. 24 del 05/02/2026.
- ✓ Acta de comité No. 25 del 10/02/2026.

En el anexo K, Actas de comité. Se anexan las actas de comité previamente mencionadas, diligenciadas en el formato institucional establecido, identificado con el código **OA01-M01-F03**.

7.8. INFORMES SEMANALES

Durante el periodo en referencia se elaboraron cuatro (04) informes semanales, los cuales se presentaron con su respectivo comunicado a la interventoría y se detallan a continuación:

- ✓ Informe semanal No. 23, semana del 19/01/2026 al 25/01/2026.
- ✓ Informe semanal No. 24, semana del 26/01/2026 al 01/02/2026.
- ✓ Informe semanal No. 25, semana del 02/02/2026 al 08/02/2026.
- ✓ Informe semanal No. 26, semana del 09/02/2026 al 15/02/2026.

En el anexo L, Informes semanales. Se anexan los formatos previamente mencionados.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

7.9. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA DEL PERIODO

En el anexo M, **Bitácora de obra**. Se anexa la bitácora de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de enero de 2026 hasta el 18 de febrero de 2026.

7.10. REGISTRO MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Tabla 35. Registro del tiempo en Bogotá D.C

JORNADA NOCTURNA		
FECHA	CLIMA	HORAS DE LLUVIA
lunes, 19 de enero de 2026	SOLEADO	0
martes, 20 de enero de 2026	SOLEADO	0
miércoles, 21 de enero de 2026	SOLEADO	0
jueves, 22 de enero de 2026	SOLEADO	0
viernes, 23 de enero de 2026	SOLEADO	0
sábado, 24 de enero de 2026	SOLEADO	0
domingo, 25 de enero de 2026	SOLEADO	0
lunes, 26 de enero de 2026	SOLEADO	0
martes, 27 de enero de 2026	LLUVIOSO	6
miércoles, 28 de enero de 2026	SOLEADO	0
jueves, 29 de enero de 2026	SOLEADO	0
viernes, 30 de enero de 2026	SOLEADO	0
sábado, 31 de enero de 2026	SOLEADO	0
domingo, 01 de febrero de 2026	SOLEADO	0
lunes, 02 de febrero de 2026	SOLEADO	0
martes, 03 de febrero de 2026	SOLEADO	0
miércoles, 04 de febrero de 2026	SOLEADO	0
jueves, 05 de febrero de 2026	SOLEADO	0
viernes, 06 de febrero de 2026	LLUVIOSO	6
sábado, 07 de febrero de 2026	SOLEADO	0
domingo, 08 de febrero de 2026	SOLEADO	0
lunes, 09 de febrero de 2026	SOLEADO	0
martes, 10 de febrero de 2026	SOLEADO	0
miércoles, 11 de febrero de 2026	SOLEADO	0
jueves, 12 de febrero de 2026	SOLEADO	0
viernes, 13 de febrero de 2026	SOLEADO	0
sábado, 14 de febrero de 2026	SOLEADO	0
domingo, 15 de febrero de 2026	SOLEADO	0
lunes, 16 de febrero de 2026	SOLEADO	0
martes, 17 de febrero de 2026	SOLEADO	0
miércoles, 18 de febrero de 2026	SOLEADO	0

Fuente: elaboración propia.

7.11. ESTUDIOS, ENSAYOS Y FICHAS TÉCNICAS.

Los estudios y ensayos se hacen durante la fase de construcción con base en normas técnicas establecidas acorde al país en el que se ejecute el proyecto. En el caso de Colombia, se rigen bajo las Normas Técnicas Colombianas (NTC). Para la toma de muestras de concreto, la norma es la NTC

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

454 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Concretos. Concreto Fresco. Toma de Muestras, y para los agregados es la NTC 129 NSR-10 Capítulo 5 Calidad del concreto mezclado y colocación Título C concreto estructural.

Durante el periodo en mención, se ejecutaron ensayos o pruebas de calidad en concretos y en pintura para la instalación de malla eslabonada.

Anexo N, Ensayos y Fichas Técnicas, se anexan los ensayos y fichas técnicas que aplicaron para el periodo del presente informe.

7.11.1. DESCRIPCION DE LA NORMATIVIDAD Y ENSAYOS APLICADOS

De acuerdo con el Documento Técnico de Soporte (DTS) del Contrato de obra No. 2025-1995 se expresa que: *“Las barandas son elementos verticales que tienen la función de apoyar al desplazamiento, brindar seguridad de la circulación y proteger a todas las personas que lo requieran.”*.

Además, el DTS añade: *“El uso de esta baranda no debe interrumpir la circulación peatonal, por lo tanto, debe garantizar el acceso universal, siempre y cuando no se ponga en riesgo al peatón”*.

Por otro lado, el DTS establece lo siguiente para el caso de la implementación de los bolardos: “La implementación de bolardos se limita a la instalación en infraestructura peatonal conformada en obra física, como andenes y plazoletas. Siendo el bolaro cúbico el único factible para implementar en espacios recuperados de calzada para uso peatonal. La disposición de bolardos debe ser lineal, puede diseñarse en forma conjunta con materas, alumbrado, bancas y otro mobiliario urbano, manteniendo una Inter distancia efectiva de 1.20 metros, y no deben interferir con el acceso y uso a elementos del mobiliario urbano con orientación a la prestación de servicios, como, hidrantes, canecas, cajas y tapas de redes de servicios públicos, etc.”.

Para la implementación de la malla eslabonada de acuerdo con el anexo técnico y lo establecido en nuestro Plan Técnico de Inspección y Ensayos aprobado por la interventoría, se realizaron las siguientes pruebas y ensayos;

- Prueba slump o asentamiento (NTC 396).
- Evaluación de adherencia del recubrimiento y pintura aplicado haciendo uso de micrómetro digital (ISO 19840 y la ASTM D7091).
- Prueba de Tintas permanentes (ASTM E165).
- Control de color.
- Inspección Visual a la totalidad de Malla y/o barandas peatonales implementadas.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

7.11.2. ENSAYOS REALIZADOS IN-SITU

A la fecha del presente informe se realizó la toma in situ de los siguientes ensayos:

Bolardo M-63

- Prueba slump o asentamiento (NTC 396).

Malla eslabonada.

- Prueba slump o asentamiento (NTC 396).
- Toma de muestras de concreto en probetas para ensayo de resistencia del concreto a la compresión.
- Evaluar espesores de imprimante y pintura en seco con uso de micrómetro digital.
- Control de color de acabados.
- Inspección visual a la total de la soldadura.

7.11.3. DISEÑO DE CONCRETO

A la fecha del presente informe, para la implementación de elementos como bolardos metálicos tipo M-63 y Mallas eslabonadas, se implementó un diseño de mezclas para la construcción de los micropilotes y las cimentaciones, dando cumplimiento a la resistencia mínima del concreto establecida en el anexo técnico de 3000 PSI.

Anexo N, Ensayos y Fichas Técnicas, se relaciona el diseño de mezcla implementado en las actividades de campo.

7.11.4. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS Y/O SISTEMAS IMPLEMENTADOS

Durante el periodo del presente informe se relaciona los certificados de calidad de los siguientes elementos: Bolardos metálicos Tipo M-63, tubería circular de 2” con pared mínima de 3 mm, varillas de acero de ½”, platinas de acero A-36, imprimante, pintura o esmalte sintético de secamiento al aire.

Revisar **Anexo Ñ, Certificados de calidad**.

8. INFORME FINANCIERO PRESUPUESTAL CONTRATO 2025-2991

8.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**, identificado con NIT No. 901.905.196-2, cuenta con un plazo estimado de treinta y un (31) meses para la ejecución del contrato, contados a partir del

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

acta de inicio suscrita el 19 de agosto de 2025. El contrato suscrito con la **Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)** corresponde al CTO No. 2025-2991, por un valor de **DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.151.216.075)**, IVA incluido, y cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), conformado de la siguiente manera:

- ✓ Vigencia 2025: **CDP No.: 961** del 21 de febrero de 2025 por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.450.000.000) INLCUIDO AIU E IVA
- ✓ Vigencia 2026: **CDP No.: 28** del 21 de febrero del 2025 por un valor de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$3.793.702.500) INLCUIDO AIU E IVA.
- ✓ Vigencia 2027: **CDP No.: 28** del 21 de febrero del 2025 por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.907.513.575) INLCUIDO AIU E IVA.

También cuenta con **CRP No. 2635** del 19 de junio de 2025 por un valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE (\$2.450.000.000)**.

8.2. LISTADO DE COSTOS POR ID's

Tabla 36. Listado de costos por ID

ID	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR TOTAL
PRIMER PAQUETE			\$ 2.102.811.728
MV_AV_CALI_941_09_T1	21/08/2025	7/11/2025	\$ 1.012.035,95
MV_AV_CALLE_80_1238_24	21/08/2025	6/12/2025	\$ 122.033.067,00
MV_AUTO_SUR_643_24	21/08/2025	11/03/2026	\$ 414.254.699,12
EX_12_141_1881_12	21/08/2025	14/02/2026	\$ 46.184.878,00
MV_AC26_643_24	21/08/2025	31/01/2026	\$ 1.026.401.792,92
MV_14_089_1249_11 / EX_14_096_1881_12	8/09/2025	12/12/2025	\$ 440.019.946,08
(EX_08_308_1867_12/ MV_08_259_1244_11/ EX_13_171_1881_12 / EX_05_001_1073_24	8/09/2025	24/02/2026	\$ 52.762.324,03
SEGUNDO PAQUETE			\$ 713.934.090
MV_10_161_1560_10/ EX_13_109_1098_11	9/10/2025	06/02/2026	\$ 21.062.105,79
EX_11_413_1842_12	9/10/2025	05/02/2026	\$ 0
EX_02_038_1556_10 EX_02_033_1556_10	9/10/2025	09/02/2026	\$ 38.041.275,14

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

ID	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR TOTAL
EX_11_417_1842_12	9/10/2025	28/01/2026	\$ 81.696.014,36
EX_01_341_1842_12	9/10/2025	8/12/2025	\$ 5.591.837,36
EX_17_033_1881_12	9/10/2025	16/12/2025	\$ 39.706.626,00
EX_17_032_1881_12	9/10/2025	17/12/2025	\$ 11.611.343,43
EX_02_003_585_24	9/10/2025	09/02/2026	\$ 12.558.326,48
MV_08_259_1244_11	9/10/2025	19/02/2026	\$ 162.184.855,23
MV_01_033_1560_10	09/10/2025	03/04/2026	\$ 17.189.962,98
MV_09_424_947_10	09/10/2025	02/04/2026	\$ 10.746.460,09
2025_SGV_MANT_3.1 (MV_AC_13_872_24_T1)	09/10/2025	25/03/2026	\$ 1.735.615,16
2025_SGV_MANT_3.2 (MV_AC_13_872_24_T1)	09/10/2025	18/04/2026	\$ 70.802.039,81
MV_12_001_1238_24	09/10/2025	24/04/2026	\$ 121.764.702,18
MV_08_259_1244_11	09/10/2025	17/04/2026	\$ 74.583.203,32
MV_19_178_1244_11	09/10/2025	11/04/2026	\$ 22.836.575,87
MV_15_016_1561_10 MV_04_511_676_09	09/10/2025	10/04/2026	\$ 6.808.156,49
2025_SGV_MANT_5.1 (MV_15_016_1561_10)	09/10/2025	10/04/2026	\$ 3.584.582,89
2025_SGV_MANT_6.1 (MV_15_016_1561_10)	09/10/2025	10/04/2026	\$ 3.584.582,89
MV_06_001_643_24 MV_AUTO_SUR_643_24	09/10/2025	10/04/2026	\$ 7.165.521,49
TOTAL:			\$ 2.816.745.817,73

Fuente: elaboración propia.

8.3. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 2025-2991

De acuerdo con el seguimiento realizado al contrato CTO 2025-2991, durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026, se presenta el avance general del contrato hasta la fecha.

Tabla 37. Avance general del contrato de obra

SEMANA #	PROGRAMADO		EJECUTADO		FINANCIERO	
	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
SEMANA 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SEMANA 2	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SEMANA 3	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SEMANA 4	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PROGRAMADO			EJECUTADO		FINANCIERO	
SEMANA #	VALOR ACUMULAD O	% ACUMULAD O	VALOR ACUMULADO	% ACUMULAD O	VALOR ACUMULADO	% ACUMULAD O
SEMANA 5	\$ 29.438.526,62	0,29%	\$ 6.533.300,00	0,06%	\$ -	0,00%
SEMANA 6	\$ 98.128.422,06	0,97%	\$ 6.533.300,00	0,06%	\$ -	0,00%
SEMANA 7	\$ 166.818.317,5 0	1,64%	\$ 6.533.300,00	0,06%	\$ -	0,00%
SEMANA 8	\$ 235.508.212,9 4	2,32%	\$ 6.533.300,00	0,06%	\$ -	0,00%
SEMANA 9	\$ 305.780.824,8 7	3,01%	\$ 28.163.648,24	0,28%	\$ -	0,00%
SEMANA 10	\$ 385.549.735,7 0	3,80%	\$ 41.509.721,03	0,41%	\$ -	0,00%
SEMANA 11	\$ 465.318.646,5 3	4,58%	\$ 121.902.421,03	1,20%	\$ -	0,00%
SEMANA 12	\$ 545.087.557,3 7	5,37%	\$ 180.285.559,07	1,78%	\$ -	0,00%
SEMANA 13	\$ 624.856.468,2 0	6,16%	\$ 227.657.484,43	2,24%	\$ -	0,00%
SEMANA 14	\$ 714.138.050,8 8	7,04%	\$ 227.686.587,19	2,24%	\$ -	0,00%
SEMANA 15	\$ 807.224.702,2 8	7,95%	\$ 311.661.759,19	3,07%	\$ -	0,00%
SEMANA 16	\$ 900.311.353,6 9	8,87%	\$ 649.964.710,90	6,40%	\$ -	0,00%
SEMANA 17	\$ 993.398.005,1 0	9,79%	\$ 937.543.396,59	9,24%	\$ -	0,00%
SEMANA 18	\$ 1.089.814.910 ,30	10,74 %	\$ 1.237.648.823,18	12,19%	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 19	\$ 1.190.672.153 ,88	11,73%	\$ 1.316.912.066,78	12,97%	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 20	\$ 1.291.529.397 ,46	12,72%	\$ 1.358.452.112,30	13,38%	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 21	\$ 1.392.386.641 ,05	13,72%	\$ 1.372.426.005,44	13,52%	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 22	\$ 1.493.243.884 ,63	14,71%	\$ 1.373.698.925,00	13,53%	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 23	\$ 1.597.768.664 ,35	15,74 %	\$ 1.388.523.541,67	13,68 %	\$ 182.125.988,00	1,79%

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83


EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

	PROGRAMADO		EJECUTADO		FINANCIERO	
SEMANA #	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
SEMANA 24	\$ 1.702.293.444,06	16,77 %	\$ 1.400.900.031,24	13,80 %	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 25	\$ 1.806.818.223,78	17,80 %	\$ 1.403.224.657,84	13,82 %	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 26	\$ 1.911.343.003,49	18,83 %	\$ 1.441.239.952,20	14,20 %	\$ 182.125.988,00	1,79%
SEMANA 27	\$ 2.026.617.780	19,96 %	\$ 1.447.289.687,20	14,26 %	\$ 1.052.683.430,00	10,37 %

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 51. Resumen General del contrato 2025-2991

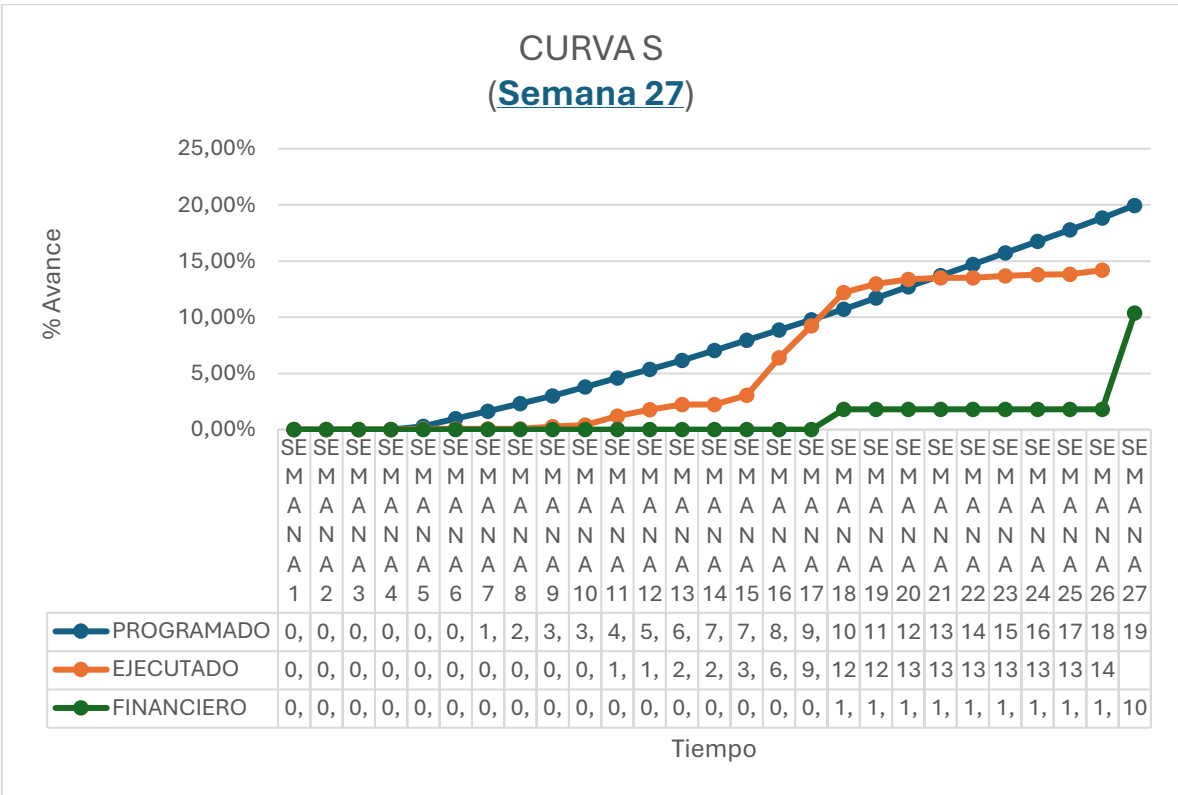

Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

8.4. AVANCE SEGÚN VIGENCIA 2025 CONTRATO 2025-299

De acuerdo con el seguimiento realizado al contrato CTO 2025-2991, durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026, se presenta el avance del contrato según la vigencia del 2025 hasta la fecha.

Tabla 38. Avance del contrato según vigencia 2025

PROGRAMADO			EJECUTADO		FINANCIERO	
SEMANA #	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
SEMANA 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SEMANA 2	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SEMANA 3	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SEMANA 4	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SEMANA 5	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ -	0,00%
SEMANA 6	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ -	0,00%
SEMANA 7	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ -	0,00%
SEMANA 8	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ 6.533.300,00	0,27%	\$ -	0,00%
SEMANA 9	\$ 29.392.409,12	1,20%	\$ 28.163.648,24	1,15%	\$ -	0,00%
SEMANA 10	\$ 61.175.907,91	2,50%	\$ 41.509.721,03	1,69%	\$ -	0,00%
SEMANA 11	\$ 98.517.154,79	4,02%	\$ 121.902.421,03	4,98%	\$ -	0,00%
SEMANA 12	\$ 167.271.186,64	6,83%	\$ 180.285.559,07	7,36%	\$ -	0,00%
SEMANA 13	\$ 277.940.214,73	11,34%	\$ 227.657.484,43	9,29%	\$ -	0,00%
SEMANA 14	\$ 405.910.872,09	16,57%	\$ 227.686.587,19	9,29%	\$ -	0,00%
SEMANA 15	\$ 524.537.675,90	21,41%	\$ 311.661.759,19	12,72%	\$ -	0,00%
SEMANA 16	\$ 648.750.016,95	26,48%	\$ 649.964.710,90	26,53%	\$ -	0,00%
SEMANA 17	\$ 689.293.620,12	28,13%	\$ 937.543.396,59	38,27%	\$ -	0,00%
SEMANA 18	\$ 734.282.542,93	29,97%	\$ 1.237.648.823,18	50,52%	\$ 182.125.988,00	7,43%
SEMANA 19	\$ 973.573.350,82	39,74%	\$ 1.316.912.066,78	53,75%	\$ 182.125.988,00	7,43%
SEMANA 20	\$ 1.212.864.158,71	49,50%	\$ 1.358.452.112,30	55,45%	\$ 182.125.988,00	7,43%
SEMANA 21	\$ 1.452.154.966,59	59,27%	\$ 1.372.426.005,44	56,06%	\$ 182.125.988,00	7,43%
SEMANA 22	\$ 1.693.936.892,18	69,14%	\$ 1.373.698.925,00	56,07%	\$ 182.125.988,00	7,43%

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

8.5. AVANCE ESPECIFICO TOTAL DE ID's VIGENCIA 2025

Para el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026, se tiene el siguiente avance para cada uno de los ID's suministrados a la fecha, por ejecutar para la vigencia 2025.

Tabla 39. Avance especifico de los ID's por ejecutar en la vigencia 2025

ID FTS	PROGRAMADO		EJECUTADO		FINANCIERO	
	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
PRIMER PAQUETE						
2024_SBP_00.1	\$ 1.012.035,95	100,00%	\$ 1.012.035,95	100,00%	\$ 1.012.035,95	100,00%
2023_SGV_01.1 Y 01.2	\$ 122.033.067,32	100,0%	\$ 122.033.067,32	100,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4	\$ 252.235.362,23	0,00%	\$ 23.120.118,50	5,58%	\$ -	0,00%
2025_OSV_PEP_ COLOMBIA. 1, 2 Y 3	\$ 46.184.878,00	100,00%	\$ 21.418.530,0	46,38%	\$ 21.418.530,0	46,38%
2025_SGV_5.1	\$ 1.026.544.777,2 1	100,00%	\$ 681.604.124,82	66,40%	\$ -	0,00%
ID_2024_SGV_11	\$ 440.019.946,08	100,00%	\$ 440.019.946,08	100,00%	\$ 181.485.200,5 2	41,28%
MV_08_001_1703 _10_V6_ESVAP V1_Tom Adams_BOLARD OS	\$ 6.533.300,00	100,00%	\$ 6.533.300,0	100,00%	\$ 6.533.300,0	100,00%
MV_08_001_1703 _10_V6_ESVAP V1_40C sur_MATERAS ALTAS	\$ 29.980.316,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
MV_08_001_1703 _10_V6_ESVAP V1_40C sur_VALLA	\$ 16.248.708,03	100,00%	\$ 16.248.708,03	100,00%	\$ 16.248.708,03	100,00%
SEGUNDO PAQUETE						
2025_SBP_SI_63. 1	\$ 0,00	45,63%	\$ -	0,0%	\$ -	0,00%
2024_SI_2.1	\$ 0,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_UT_Calle_8 2	\$ 0,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP- SI_Z4_CONSECU TIVO 04.1	\$ 81.696.014,36	100,00%	\$ 78.815.739,70	96,47%	\$ -	0,00%
2025_SBP_SI_13 7.1	\$ 5.591.837,36	100,00%	\$ 5.591.837,36	100,00%	\$ 5.591.837,36	100,00%
2025_UT_Calle_1 1.1	\$ 39.706.626,00	100,00%	\$ 39.706.626,0	100,00%	\$ 39.706.626,0	100,00%

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

PROGRAMADO			EJECUTADO		FINANCIERO	
ID FTS	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
2025_UT_Calle_1 2.1	\$ 11.611.343,43	100,00%	\$ 11.611.343,43	100,00%	\$ -	0,00%
2024_SBP_9.1	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_OSV_1.1	\$ 121.721.848,16	75,05%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_1. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_2. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_3. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_3. 2	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_14.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_DIT_1.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_DIT_2.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_4. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_5. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_6. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SGV_MANT_7. 1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TERCER PAQUETE						
SIN UBICACIÓN	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SIN UBICACIÓN	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SGV_11.3	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2023_SGV_01.3	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP-SI_T117_f2.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP_OGS_SI_T117_F3.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2024_SBP_4.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP_SI_Z1_C ONSECUTIVO 01_CL 72 ENTRE KR 101 Y KR 103-COST. NORTE.1	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2025_SBP-SI_Z1_CONSECUTIV O 02 CL 72 ENTRE	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026 las actividades realizadas están alineadas con lo establecido bajo el Plan de Inspección y Ensayos aprobado bajo el comunicado CMAG-118-2025 recibido por la interventoría, específicamente bajo la norma NTC 4109:2019.

10. INFORME DE CUMPLIMIENTO SST-AMBIENTAL

Se dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior, presenta mayor amplitud en su respectivo informe mensual del área SST-Ambiental No. 5 (Ver Anexo Q, Certificación de cumplimiento al SG-SST).

Tabla 40. RESUMEN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	INDICE BASE DE COTIZACION	VALOR COTIZADO EN EPS, AFP Y ARL	# PLANILLA
HELVERTH ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	DIRECTOR OBRA	70	\$4.120.000	\$4.120.000	\$ 1.275.600	83726924
ESTEBAN DAVID RUIZ LOPEZ	PRESIONAL SSTA	30	\$ 2.865.000	\$ 2.865.000	\$ 887.100	82337575
SERGIO ANDRES ARANDA NIEVES	RESIDENTE TECNICO	100	\$3.000.000	\$3.390.000	\$ 1.057.300	83726924
JUAN CARLOS LEON SARMIENTO	RESIDENTE TECNICO	100	\$3.000.000	\$4.420.935	\$ 1.303.400	83726924
WILLIAM GAMEZ	GEORREFERENCIADOR	100	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 472.200	83726924
MERLY KATHERINE CAICEDO	INGENIERA FORESTAL	30	\$ 1.000.000	\$ 1.423.500	\$ 121.900	83726783
MARIA CATALINA GALEANO	ESPECIALISTA DE TRÁNSITO	70	\$ 3.655.000	\$ 3.655.000	\$ 508.300	6003467031
LUIS MIGUEL PATIÑO MONROY	AYUDANTE OBRA	100	\$ 1.855.079	\$ 1.855.079	\$ 686.300	83726924
GILMER JOSUE CASTRO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	100	\$ 1.673.258	\$ 1.673.258	\$ 518.300	83726924
ROLAN YESID PEREZ MONROY	AYUDANTE DE OBRA	100	\$ 1.855.079	\$ 1.855.079	\$ 574.700	83726924
OLVEIN CASTRO VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	100	\$ 1.855.079	\$ 1.855.079	\$ 574.700	83726924
LUIS FERNANDO CONTRERAS TORRES	AYUDANTE DE OBRA	100	\$ 1.818.844	\$ 1.818.844	\$ 545.300	83726924

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	INDICE BASE DE COTIZACION	VALOR COTIZADO EN EPS, AFP Y ARL	# PLANILLA
WILSON VALDERRAMA MURCIA	OFICIAL DE OBRA	100	\$ 1.818.844	964.836	\$ 298.800	83726924
YULI PAULIN RODRIGUEZ	APLICADOR JEFE DE CUADRILLA	100	\$ 2.049.528	\$ 2.049.528	\$ 634.700	81910689
LAURA VALENTINA SANCHEZ REYES	INGENIERO AUXILIAR	100	\$ 2.540.000	\$ 2.540.000	\$ 786.400	82337575
JHONATAN MAURICIO DIAZ	AUXILIAR SST	100	\$ 484.700	\$ 484.700	\$ 127.400	82337575
ANGIE CATALINA FERNANDEZ CASTILLO	SECRETARIA	100	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 367.900	82338412
ANA PAOLA PINZÓN GONZALEZ	SECRETARIA	100	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 416.900	82338412

Fuente: Elaboración propia.

10.1. PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

Al tratarse del Cuarto mes de ejecución y bajo los lineamientos establecidos en la LEY 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y el art. 23 de la ley 1150 del 2007, se anexan las planillas de aportes al sistema general de seguridad social del personal involucrado (Ver Anexo B, Planillas de seguridad).

10.2. RESUMEN PAGO DE SALARIOS

En el anexo O, **Certificación de pagos de salarios**, se relaciona certificación del pago de salarios expedido por el revisor fiscal.

10.3. CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS

El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de acuerdo con lo establecido en su Plan de Gestión Ambiental-PGA, ha realizado la correcta recolección, manejo, cargue y disposición final de los RCD correspondiente a las actividades de demolición y excavaciones. El cargue y retiro de los RCD fue realizado en volqueta sencilla autorizada mediante el cumplimiento del PMT aprobado. A continuación, se presenta el consolidado del cargue y disposición final de los RCD ejecutados a la fecha (Ver Anexo S, Certificaciones de Disposición Final de RCD).


FECHA DE RETIRO	MATERIAL RETIRADO	ID DE FTS	TIPO DE VEHICULO	CAPACIDAD	DISPOSICIÓN FINAL
--------------------	----------------------	-----------	---------------------	-----------	-------------------

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

19/12/2025	RCD	ID_2025_SGV_5.1	VOLQUETA	7,50 M3 (2 viajes se ejecutaron)	De acuerdo con lo establecido en el PGA, los RCD generados pueden ser transportados a la bodega principal, donde posteriormente serán acopiados y una vez se cuente con la cantidad mínima acumulada de residuos, se realizará su respectiva disposición final a través de la empresa WeltNeu. Para este caso, se realizaron las actividades de cargue en volqueta y retiro sobre el frente de obra.
------------	-----	-----------------	----------	----------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 54. Cargue y Disposición final de RCD generados

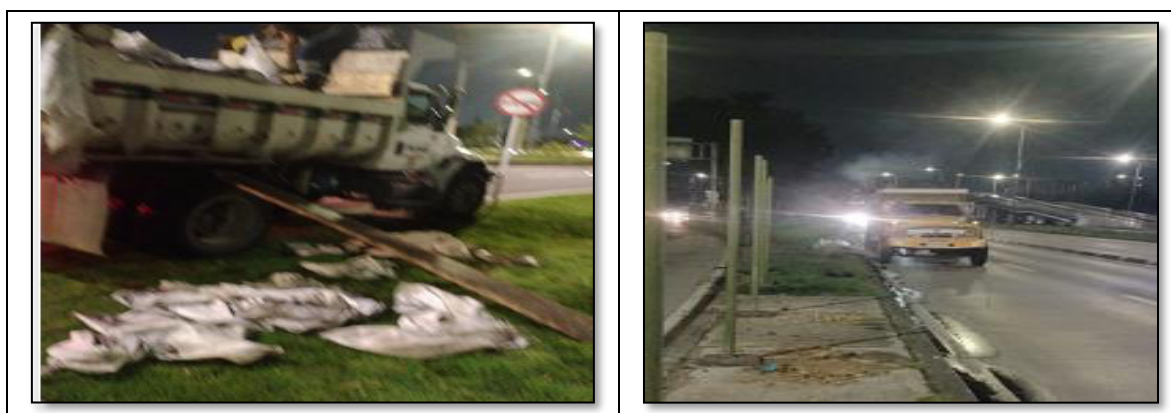

Fuente: Elaboración propia.

10.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL-PGA

El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** de acuerdo con lo establecido en su PGA se ha propuesto reducir los impactos ambientales a causa de la generación de residuos de la construcción y demolición-RCD, implementando correctas prácticas de recolección, manejo, cargue y disposición final. El centro de acopio del proyecto fue la bodega principal, zona que estuvo debidamente señalizada y delimitada. Además, durante la ejecución de las actividades del contrato, se han realizado diferentes labores de aseo, orden y limpieza, garantizando un área de trabajo libre de obstáculos y/o peligros en materias de seguridad tanto para los involucrados en el proyecto como a los transeúntes de la zona.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

Por otro lado, a través del informe Mensual SST-Ambiental y dentro del presente documento sobre el Anexo C, Vehículos, Maquinaria y Equipos utilizados, se han presentado los respectivos mantenimientos de los vehículos vinculados al contrato.

11. INFORME PLAN DE CALIDAD

El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025** ha dado cumplimiento integral a los numerales contemplados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, en concordancia con los lineamientos contractuales y normativos aplicables. Dicho plan, en su última versión oficializada mediante el oficio **CS-SVBTA-2025-052-2025** y **CS-SVBTA-2025-077-2025**, establece los criterios, procedimientos y controles necesarios para garantizar la adecuada ejecución de las actividades de obra, así como la trazabilidad de los procesos de verificación y seguimiento. En este sentido, las acciones desarrolladas por el Consorcio han estado de calidad, asegurando así la validez de los resultados reportados y la satisfacción de los objetivos previstos en el contrato.

En el anexo P, plan de calidad. Aprobado bajo el comunicado **CMAG-095-2025** y **CMAG-118-2025**.

Durante el periodo en mención no se presentaron accidentes por parte del personal del **CONSORCIO DE SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025**.

- ✓ Se garantizó el uso de EPP's y medidas de seguridad aplicables a las actividades de desmonte y/o retiro e instalación de bolardos cúbicos.
- ✓ Se presentó la documentación relacionada al personal, equipos y vehículos implementados para la ejecución de las actividades relacionadas en el presente documento.
- ✓ Como los trabajos realizados se ejecutaron en jornada nocturna, se suministró los elementos de señalización, garantizando el cumplimiento de los PMT aprobados para cada punto intervenido.

12. CONCLUSIONES

El contratista de obra cuyo objeto es “**SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**”, desarrolló las actividades conforme las obligaciones contractuales y los aspectos contenidos en el ANEXO TÉCNICO, y reportó de manera oportuna en las diversas reuniones realizadas con la supervisión del contrato por parte de SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y la Interventoría CONSORCIO MAGNUS, los logros y dificultades respecto al inicio de actividades.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

De igual forma, respecto a la consecución de personal para conformar el equipo de trabajo, se vinculó el 100% del equipo de trabajo exigido, conforme las obligaciones contractuales, y la aprobación de las hojas de vida del personal realizadas por la Interventoría, cumpliendo con los requisitos mínimos, nivel de formación y experiencia exigidas en el Anexo Técnico y del pliego de condiciones del contrato.

A la fecha se ha realizado el 48% de las visitas de inspección de los ID's del segundo paquete y el 100 % de los ID's proyectados por ejecutar para dentro de la vigencia 2025.

Se encuentran finalizados en un 100 % los siguientes ID's de FTS: **2024_SBP_00.1, 2023_SGV__01.1 Y 01.2, ID_2024_SGV_11, MV_08_001_1703_10_V6 _ESVAP V1 _Tom Adams, MV_08_001_1703_10_V6 _ESVAP V1 _40C sur, 2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1, 2025_SBP_SI_137.1, 2025_UT_Calle_11.1 y 2025_UT_Calle_12.1.** Es importante aclarar, que todo trabajo realizado en campo es consultado, verificado y avalado por la interventoría.

Durante la ejecución de actividades en jornada nocturna sobre el frente de obra 2025_SGV_5.1 (ID_MV_AC26_643_24) se reporte en la noche del 11-12 de noviembre, una situación de hurto a mano armada, donde se registra el hurto de los siguientes elementos: Demoledor marca MAKITA HM1812 de color negro con azul y de la Planta eléctrica marca KTC de color rojo modelo 437-ODG8-1, hecho que fue presentado a las autoridades competentes y hecho denunciado ante las autoridades competentes bajo el número de radicado 110016108112202501410.

El componente de georreferenciación a la fecha cuenta con la aprobación de los planos de diseño y sus respectivas planillas de los ID's relacionados en las actas parciales de cobro No. 1, 2, 3 y 4. A la fecha el CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025 se encuentra a la espera de la revisión y/o aprobación de los diseños remitidos correspondientes a los ID's relacionados en el acta parcial No. 5.

Sobre el ID de FTS 2025_SBP_SI_137.1 (ID_EX_01_341_1842_12) se presentaron actos de vandalismo sobre algunos ESVAP implementados, lo anterior, implica mayor acompañamiento de las autoridades en garantizar la durabilidad y el cuidado de las obras ejecutadas.

Sobre recorrido de campo realizado el día 14/15 de enero de 2026 se evidenciaron situaciones de vandalismos sobre elementos implementados como mallas eslabonadas sobre los ID de FTS ID_2024_SGV_11 y 2023_SGV__01.1 Y 01.2.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 G VIAL CONSORCIO SEGURIDAD VIAL
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

13. OBSERVACIONES

A la fecha se continua a la espera por parte de la interventoría en el concepto de aprobación y/o rechazo de la versión No. 2 de los cronogramas de obra General y Específicos y de los presupuestos ajustados de acuerdo al ajuste de cada vigencia 2025 y 2026, lo anterior, a solicitud de la entidad.

14. RECOMENDACIONES

Toda actividad ejecutada por el contratista es verificada y avalada por el profesional de la interventoría, por tal razón, el movimiento o desplazamiento de los elementos como bolarados previamente implementados por el CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025 a cargo de la comunidad , , no es obligación del CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025 su reubicación, ya que, los trabajos fueron realizados y verificados por delegado de la SDM y profesional de la interventoría en su momento y cuya evidencia se encuentra descrito en bitácora de obra.

15. LISTA DE ANEXOS

- ◆ Anexo A, Pólizas.
- ◆ Anexo B, Planillas de seguridad.
- ◆ Anexo C, vehículos utilizados.
- ◆ Anexo D, Correspondencia.
- ◆ Anexo E, Fichas técnicas de soporte.
- ◆ Anexo F, Formatos de visita de inspección.
- ◆ Anexo G, Cronogramas de actividades.
- ◆ Anexo H, Registro fotográfico.
- ◆ Anexo I, PMT.
- ◆ Anexo J, Presupuesto general y Específicos.
- ◆ Anexo K, Actas de comité.
- ◆ Anexo L, Informes Semanales.
- ◆ Anexo M, Bitácora de obra.
- ◆ Anexo N, Ensayos y Fichas Técnicas.
- ◆ Anexo Ñ, Certificados de calidad.
- ◆ Anexo O, Certificación de pagos de salarios.
- ◆ Anexo P, Plan de calidad.
- ◆ Anexo Q, Certificación de cumplimiento al SG-SST.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME TÉCNICO MENSUAL N°6	V.0

- ◆ Anexo R, Certificaciones Factores de Evaluación.
- ◆ Anexo S, Certificaciones de Disposición final de RCD.
- ◆ Anexo T, Formatos de Almacen radicados.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991

OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

INFORME FORESTAL MENSUAL No. 6

PERIODO DEL INFORME:
DEL 19/01/2026 AL 18/02/2026

CONTRATISTA
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025

INTERVENTORIA
CONSORCIO MAGNUS

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD-SDM

BOGOTÁ D.C,

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com



CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

CONTROL DE MODIFICACIONES


VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	FOLIOS
V01	23/02/2026	Versión Inicial	56

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

CONTRATISTA

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
		
Ing. Katherine Caicedo	Ing. Helver Alejandro Sanabria Ramírez	Ing. Helver Alejandro Sanabria Ramírez
Ingeniera Forestal	Director de Obra	Director de Obra

INTERVENTORIA

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
	Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE <small>Persona con Discapacidad -PCD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247</small>	Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE <small>Persona con Discapacidad -PCD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247</small>
Ing. Saul Ayala	Eliana Constanza Medina Pabunce	Eliana Constanza Medina Pabunce
Ingeniero Forestal	Director de Interventoría	Director de Interventoría

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
OBJETIVO GENERAL	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	8
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	9
4.1 DETALLES DEL CONTRATO.....	10
4.1.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO 2025-2991	10
4.1.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	10
5. LOCALIZACIÓN GENERAL	11
5.1 LOCALICACION GENERAL DE ID'S SUMINISTRADOS POR LA SDM.....	12
5.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES DE IMPLEMENTACION DE ID's	13
5.2.1 PRIMER PAQUETE ID's SUMINISTRADO POR LA SDM	13
5.2.2 SEGUNDA ENTREGA ID's PRIMER PAQUETE SUMINISTRADO POR LA SDM	19
5.2.3. SEGUNDO PAQUETE DE ID's SUMINISTRADO POR LA SDM	24
6. COMUNICACIONES ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	36
7. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN	38
7.1. Localización	38
7.2 Contexto Ambiental Urbano	38
7.2 Condiciones climáticas y atmosféricas.....	40
7.2.1 Precipitaciones.....	40
7.2.2 Temperatura.....	43
7.2.3 Humedad relativa	44
7.2.4 Coberturas vegetales	45
8. AVANCE EN LA GESTIÓN FORESTAL.....	47

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

8.1 Registro fotográfico	49
8.2 Avance en el plan de manejo y protocolo de residuos – Componente forestal	52
8.3 Cronograma	52
8.4 Selección de material vegetal para ESVAP materas	53
8.4.1 Propuesta de material vegetal por tipología	54
9. CONCLUSIONES	56

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto-Bogotá D.C	11
Ilustración 2. Localización general de primer paquete de ID´s	12
Ilustración 3. Localización general de segundo paquete de ID´s	12
Ilustración 4. UPZ DE BOGOTÁ DC	13
Ilustración 5. Ubicación geográfica ID 2024-SBP-00.1	14
Ilustración 6. Ubicación geográfica ID 2023-SGV-01.1 Y 01.2	15
Ilustración 7. Ubicación geográfica del ID 2023_SGV_6.1	15
Ilustración 8. Ubicación geográfica del ID 2025_OSV-PEP_COLOMBA.1	17
Ilustración 9. Ubicación geográfica del antes del ID 2025_SGV_5.1	18
Ilustración 10. Información ID 2024_SGV_11 SEGUNDO paquete	19
Ilustración 11. Registro fotográfico del segundo paquete de ID´s suministrados por la SDM	20
Ilustración 12. Registro fotográfico del segundo paquete de ID´s suministrados por la SDM	22
Ilustración 13. Registro fotográfico del segundo paquete de ID´s suministrados por la SDM	22
Ilustración 14. Ubicación geográfica del antes del ID EX_08_308_1867_12_Materas	22
Ilustración 15. Ubicación geográfica del antes del ID EX_13_171_1881_12	23
Ilustración 16. Ubicación geográfica del antes del ID EX_05_001_1073_24	23
Ilustración 17. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1	26
Ilustración 18. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1	27
Ilustración 19. Ubicación geográfica ID 2024_SI_2.1	27
Ilustración 20. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_82	28
Ilustración 21. Ubicación geográfica ID 2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	28
Ilustración 22. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_137.1	29
Ilustración 23. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_11.1	29
Ilustración 24. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_12.1	30

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Ilustración 25. Ubicación geográfica ID 2024_SBP_9.1	30
Ilustración 26. Ubicación geográfica ID 2024_OSV_1.1	31
Ilustración 27. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_1.1	31
Ilustración 28. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_2.1	32
Ilustración 29. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_3.1	32
Ilustración 30. Ubicación geográfica ID 2024_SGV_14.1	33
Ilustración 31. Ubicación geográfica ID 2025_DIT_1.1	33
Ilustración 32. Ubicación geográfica ID 2025_DIT_2.1	34
Ilustración 33. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_4.1	34
Ilustración 34. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_5.1	35
Ilustración 35. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_6.1	35
Ilustración 36. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_7.1	36
Ilustración 37 Localización de los ID intervenidos en el periodo de reporte	40
Ilustración 38 Distribución espacial de la precipitación media anual en Bogotá D.C.	42
Ilustración 39 Temperatura media promedio en la Localidades de los Id intervenidos en el mes de reporte	44
Ilustración 40 Mapa humedad relativa de Bogotá	45

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Etapas de la implementación del proyecto.....	8
Tabla 2. Factores de evaluación	8
Tabla 3. Detalles del contrato	10
Tabla 4. Detalles de Pólizas del contrato	10
Tabla 5. Primer Paquete de ID's suministrados por la SDM	13
Tabla 6. ID's segundo paquete suministrado por la SDM	19
Tabla 7. Segundo Paquete de ID's suministrados por la SDM	24
Tabla 8 Correspondencia enviada	37
Tabla 9 Soporte técnico – Intervención en zonas verdes y gestión forestal del periodo	48

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta la gestión desarrollada por el componente forestal durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2026 y el 18 de febrero de 2026, en el marco de la ejecución de los Elementos de Seguridad Vial y Accesibilidad Peatonal (ESVAP) implementados por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM en diferentes sectores del área urbana de Bogotá D. C.

La gestión forestal del periodo se orientó a la verificación, seguimiento y control ambiental preventivo de las actividades ejecutadas en los frentes de obra, con el propósito de garantizar la protección del recurso vegetal existente y la correcta articulación del componente forestal con las labores de obra civil. Estas acciones se desarrollaron conforme a las condiciones reales del área de intervención y al alcance definido en el Anexo Técnico Definitivo del contrato.

Las actividades ejecutadas durante el periodo se concentraron principalmente sobre superficies duras del espacio público, tales como calzadas, andenes, separadores intervenidos y placas de concreto. En aquellos puntos donde se identificó la presencia puntual de zonas verdes, jardinería urbana o arbolado adyacente, las intervenciones se realizaron de manera localizada y técnicamente controlada, sin evidenciar afectaciones a las coberturas vegetales ni a individuos arbóreos.

En este contexto, el componente forestal no contempló la ejecución de intervenciones directas sobre el recurso vegetal, manteniendo su actuación dentro del marco de control ambiental, verificación en campo y acompañamiento técnico, asegurando el cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables y la no generación de impactos sobre el componente forestal durante el periodo evaluado.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades realizadas en el componente de forestal en la etapa de construcción, en el período comprendido entre el 19 de enero de 2026 al 18 de febrero de 2026, contrato de obra No. 2025-2991 celebrado entre la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD-SDM** y **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025** y cuyo objeto del contrato es; ***“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”***

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Consolidar las acciones de verificación, seguimiento y control desarrolladas por el componente forestal durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2026 al 18 de febrero de 2026, en el marco de la ejecución del contrato.
- Verificar y documentar que las actividades ejecutadas en los diferentes frentes se desarrollaron sin afectación al recurso vegetal, particularmente en los puntos con presencia de zonas verdes, jardinería urbana y arbolado.
- Evidenciar la correcta aplicación de medidas de manejo y control ambiental en las áreas intervenidas, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos en el Anexo Técnico.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Para la ejecución del presente contrato, se implementaron las siguientes etapas:

Tabla 1. Etapas de la implementación del proyecto.

ETAPAS	DURACIÓN
ETAPA 1. Actividades preliminares a la implementación y actividades de implementación de los elementos de seguridad vial y accesibilidad peatonal.	Del mes 1 al mes 30 (contados a partir de la suscripción del acta de inicio).
ETAPA 2. Actividades de Georreferenciación (Mes a mes de acuerdo con la implementación realizada en el periodo).	Del mes 1 al mes 30 (contados a partir de la suscripción del acta de inicio).
ETAPA 3. Actividades de cierre de Georreferenciación (Correspondiente a la implementación realizada en el mes 30) y actividades de cierre de contrato.	En el mes 31 (contados a partir de la suscripción del acta de inicio).

Fuente: Tabla tomada del documento “2.1 anexo técnico definitivo-SDM.LP-10-2025”.

Finalmente, los factores de evaluación para la adjudicación de la licitación pública SDM-LP-10-2025 fueron las siguientes:

Tabla 2. Factores de evaluación

CONCEPTO	PUNTAJE MAXIMO
Oferta económica	48,5
Factor de calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresa de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
TOTAL	100

Fuente: Tabla tomada del documento “2.1 anexo técnico definitivo-SDM.LP-10-2025”.

Factor de calidad. El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presentó para su revisión y aprobación, documentos como: Plan de

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Aseguramiento de calidad, Plan Técnico de Inspección y Ensayos, entre otros, bajo los lineamientos descritos en el anexo técnico.

Apoyo a la industria nacional. El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** da cumplimiento al concepto de apoyo a la industria nacional mediante la adquisición de insumos, herramientas y/o equipos de origen nacional. Además, de la contratación de mano de obra calificada y no calificada de origen nacional.

Vinculación de personas con discapacidad. El **CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTA 2025** da cumplimiento mediante la vinculación de personas con discapacidad de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra **No. 2025-2991** con objeto **“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”** pretende mejorar las condiciones de seguridad vial, protegiendo los espacios públicos dedicados exclusivamente al tránsito de peatones, siendo el peatón el actor vial con mayor vulnerabilidad, redireccionando a los usuarios a cruces seguros, mediante la implementando Elementos de Seguridad Vial y Accesibilidad Peatonal-ESVAP en la infraestructura de transporte de la ciudad de Bogotá D.C.

La SDM suministrará al contratista a través de la interventoría las solicitudes (Fichas técnicas de Soporte-FTS, Documentos Técnicos de Soporte-DTS, esquemas, planos o cualquier otro documento validado por la SDM).

A continuación, se describen las actividades y/o elementos de seguridad vial y accesibilidad peatonal por implementar, de acuerdo con lo relacionado en el anexo técnico del presente proyecto.

- Actividades preliminares (Demoliciones, excavaciones, concretos y suministro de aceros).
- Reemplazo, mantenimiento o suministro de mallas.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

- Desmonte, reemplazo o suministro de bolardos.
- Desmonte, reemplazo, mantenimiento o suministro de barandas.
- Desmonte o suministro de materas.

Es importante aclarar, que el proyecto puede implementar otras actividades diferentes a las mencionadas anteriormente, según las necesidades que surjan durante su desarrollo.

4.1 DETALLES DEL CONTRATO

4.1.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO 2025-2991

Tabla 3. Detalles del contrato

Entidad contratante:	Secretaria Distrital de Movilidad
Contratista:	Consortio Seguridad Vial Bogotá 2025
Contrato:	2025-2991
Objeto:	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
Plazo total del Contrato:	TREINTA Y UN (31) MESES
Fecha de inicio:	19/08/2025
Fecha de terminación:	18/03/2028
Interventoría:	Consortio Magnus
Contrato:	2025-3000

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 4. Detalles de Pólizas del contrato

POLIZAS			
ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO			
CONCEPTO	ANEXO No.:	01	
	No. POLIZA	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	SGPL-203921158-1	19/08/2025	18/09/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	SGPL-203921158-1	19/08/2025	18/03/2031

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


Estabilidad y calidad de las obras	SGPL-203921158- 1	18/03/2028	18/03/2033
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	LBCO-203825579- 1	18/06/2025	18/03/2028

Fuente: Elaboración propia.

5. LOCALIZACIÓN GENERAL

Las actividades de suministro y/o instalación y/o implementación de los ESVAP será realizado en la ciudad de Bogotá D.C, en zonas priorizadas por la secretaria Distrital de Movilidad de acuerdo con el espacio público asociado a la Infraestructura de Transporte actual.

Ilustración 1. Localización del proyecto-Bogotá D.C

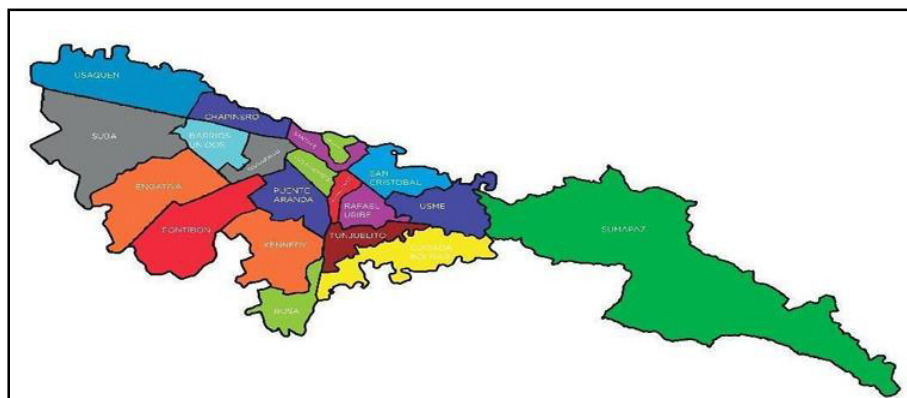

Fuente: Figura tomada del Anexo Técnico Definitivo del Documento SDM-LP-10-2025

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


5.1 LOCALICACION GENERAL DE ID'S SUMINISTRADOS POR LA SDM

Ilustración 2. Localización general de primer paquete de ID's

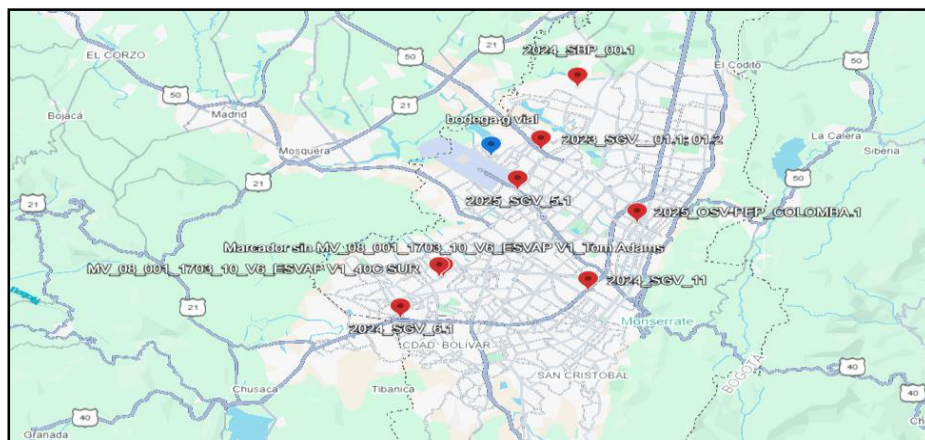

Fuente: Google Earth.

Ilustración 3. Localización general de segundo paquete de ID's

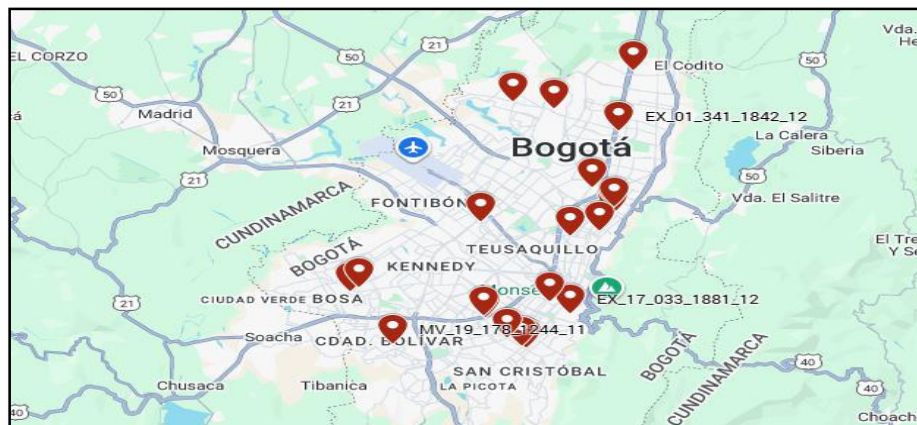

Fuente: Elaboración propia en Google Maps.

Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) constituyen una herramienta fundamental para la gestión territorial en Bogotá, ya que permiten organizar el suelo urbano a una escala intermedia entre la localidad y el barrio. Cada UPZ agrupa sectores con características urbanas, sociales y económicas similares, lo que facilita la planeación, el seguimiento y la evaluación de proyectos de inversión pública y privada. En el presente informe mensual, la clasificación por UPZ permite ubicar con precisión cada ID asociado a la

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

implementación del ESVAP. Esta distribución territorial facilita el análisis espacial de las intervenciones y su representación se presenta en la Ilustración 3.

Ilustración 4. UPZ DE BOGOTÁ DC

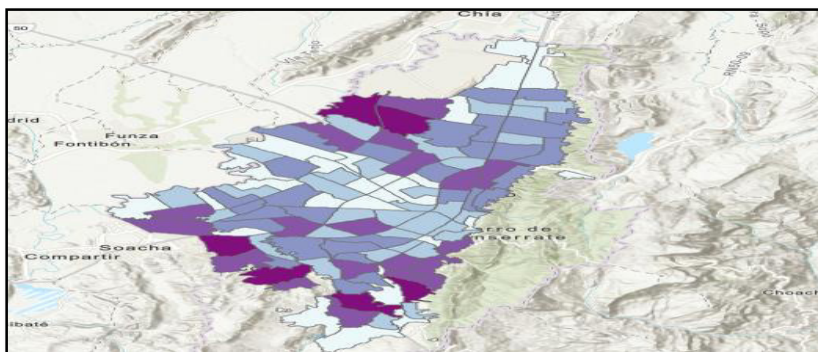

Fuente: ARCGIS MAP VIEWER.

5.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES DE IMPLEMENTACION DE ID's

A continuación, se detallan las zonas a intervenir en la ciudad de Bogotá D.C de acuerdo con las fichas técnicas de soporte y memorandos recibidos en el periodo del presente informe:

5.2.1 PRIMER PAQUETE ID's SUMINISTRADO POR LA SDM

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó el primer paquete conformado por cinco (05) ID's el día veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025) distribuidos como viene a continuación:

Tabla 5. Primer Paquete de ID's suministrados por la SDM

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentid o vial	Costado
2024_SBP_00.1	MV_AV_CALI_941_09_T1	Calle 151C	Av Ciudad de Cali	Av Ciudad de Cali	EW-WE	Separador
2023_SGV_01.1 y 01.2	MV_AV_CALLE_80_1238_24	Av. calle 80	Carrera 102	Carrera 97	E w, W-E	Separador
2024_SGV_6.1	MV_AUTO_SUR_643_24	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito	E-W	N
2024_SGV_6.2	MV_AUTO_SUR_643_24	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito	E-W	N

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

2024_SGV_6.3 y 6.4	MV_AUTO_SUR_643_24	Autopista Sur	Calle 63 sur	Límite del Distrito	EW-WE	N, S
2025_OSV- PEP_COLOMBA.1	EX_12_141_1881_12	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A Bis	E-W	
2025_OSV- PEP_COLOMBA.2 y 3	EX_12_141_1881_12	Calle 71A	Carrera 20	Diagonal 71A Bis	E-W	
2025_SGV_5.1	MV_AC26_643_24	Av. calle 26	Diagonal 25C	Carrera 96A	E w, W- E	N-S

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_AV_CALI_941_09_T1:** Se encuentra ubicado en la localidad de Suba con dirección calle 151C con Avenida ciudad de Cali, en el separador. Sentido vial EW-WE en el barrio Pinos de Lombardía, barrio que pertenece a la UPZ No. 27 “Suba centro”.

Ilustración 5. Ubicación geográfica ID 2024-SBP-00.1



Fuente: Elaboración propia.

- **MV_AV_CALLE_80_1238_24:** Se encuentra ubicado en la localidad de Engativá con dirección: Av. Calle 80 entre Cra. 97 y Cra. 102 en el barrio Bochica, barrio que pertenece a la UPZ 73 “Garces Navas”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Ilustración 6. Ubicación geográfica ID 2023-SGV-01.1 Y 01.2



- **MV_AUTO_SUR_643_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Bosa con dirección: Sobre la autopista sur con calle 63 Sur, en el barrio Bosa La Estación, barrio que pertenece a la UPZ 85 “Bosa Central”.

Ilustración 7. Ubicación geográfica del ID 2023_SGV__6.1



CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01



Fuente: Elaboración propia.

- **EX_12_141_1881_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos con dirección: Calle 71A con Cra. 20 y Diag. 71A Bis (E-W), en el barrio SAN FELIPE, barrio que pertenece a la UPZ 98 “Los Alcázares”.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Ilustración 8. Ubicación geográfica del ID 2025_OSV-PEP_COLOMBA.1



Fuente: Elaboración propia.

- **MV_AC26_643_24:** Se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón con dirección: Av. Calle 26 entre diagonal 25C y Cra 96A, sentido E-W, costado N-S, en el barrio Santa Cecilia, barrio que pertenece a la UPZ 115 “Capellania”, UPZ 116 “Álamos” y UPZ 117 “Aeropuerto el dorado”.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Ilustración 9. Ubicación geográfica del antes del ID 2025_SGV_5.1



Fuente: Elaboración propia.

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

5.2.2 SEGUNDA ENTREGA ID's PRIMER PAQUETE SUMINISTRADO POR LA SDM

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó el segundo paquete conformado por Dos (02) ID's el día ocho (08) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) como viene a continuación:


Tabla 6. ID's segundo paquete suministrado por la SDM

Nombre FTS	ID
ID_2024_SGV_11	EX_14_096_1881_12
ID_2024_SGV_11	MV_14_089_1249_11
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C sur	EX_08_308_1867_12
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C sur	EX_08_308_1867_12
MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_Tom Adams	MV_08_259_1244_11
TEUSAQUILLO	EX_13_171_1881_12
ANTONIO JOSE DE SUCRE	EX_05_001_1073_24

Fuente: Elaboración propia.

➤ ID_MV_14_089_1249_11 y EX_14_096_1881_12

Ilustración 10. Información ID 2024_SGV_11 SEGUNDO paquete

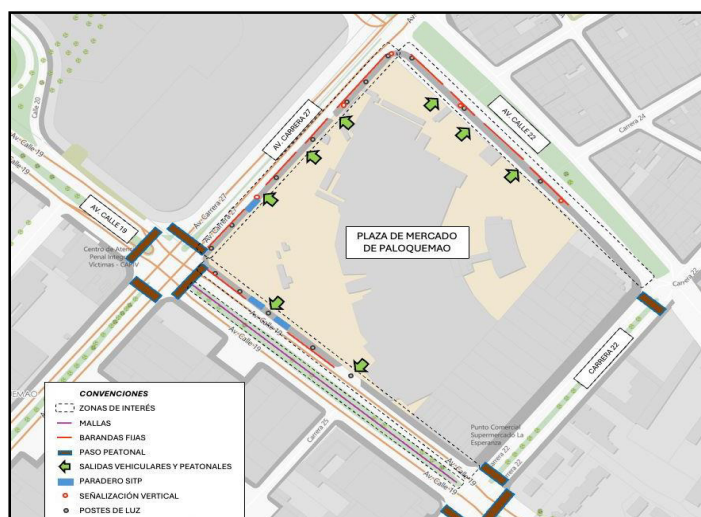

Fuente: Secretaría distrital de movilidad (SDM).

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com


CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

- **MV_14_089_1249_11/EX_14_096_1881_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires con dirección: Calle 19 entre carrera 27 sentido S-N y carrera 22 – carrera 27 entre Av. Calle 19 y calle 22 – calle 22 entre carrera 27 y carrera 22, en el barrio Paloquemao, barrio que pertenece a la UPZ 102 “La Sabana”.

Ilustración 11. Registro fotográfico del segundo paquete de ID's suministrados por la SDM

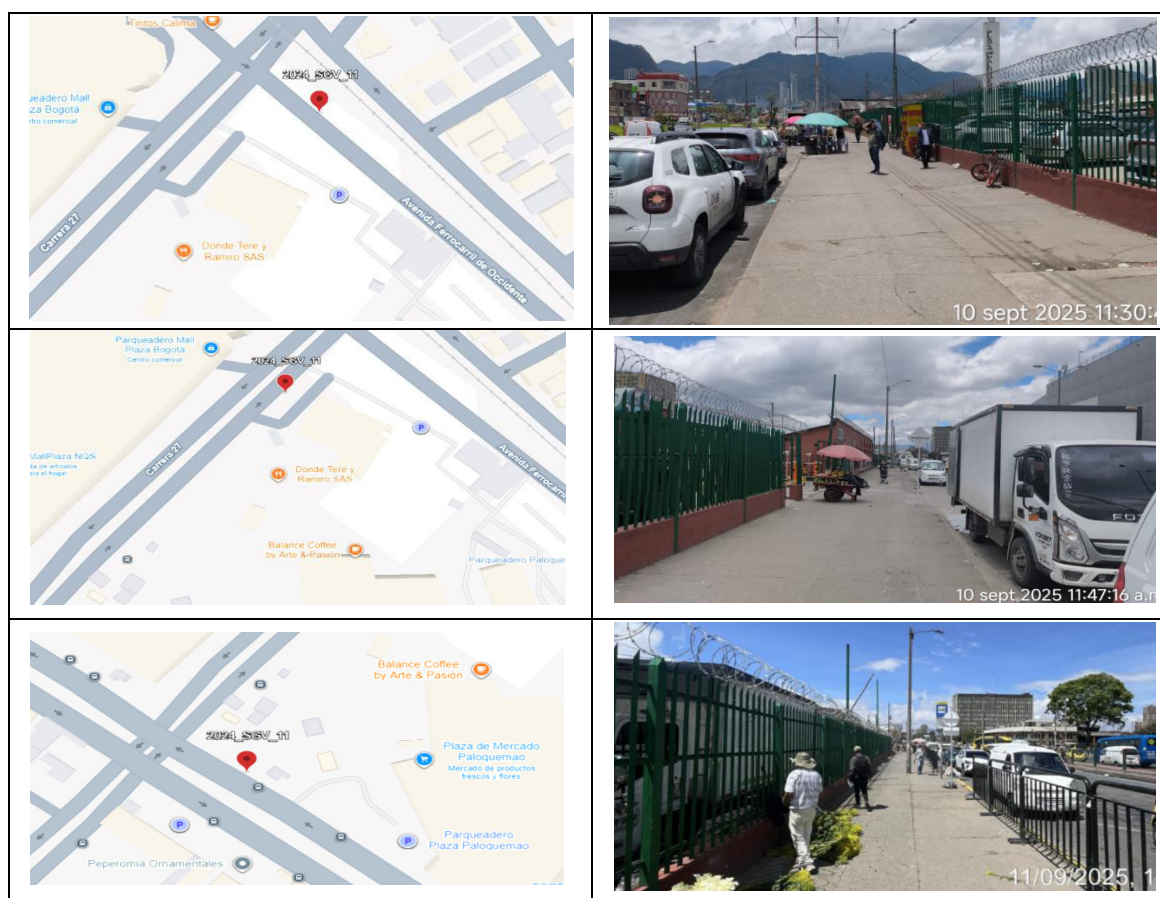

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

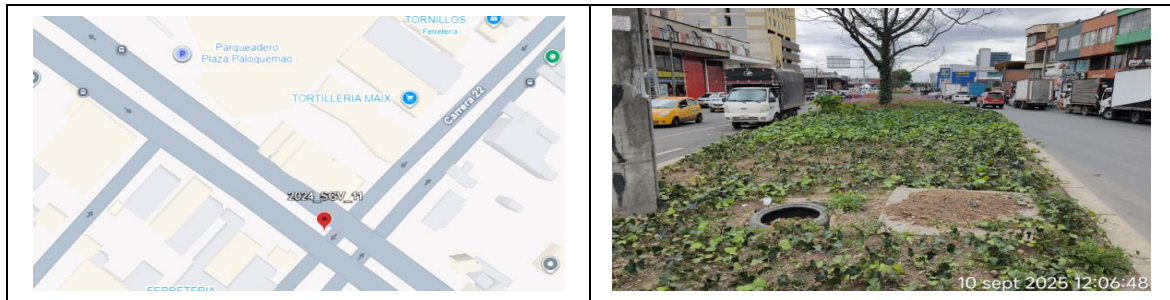

Fuente: Elaboración propia.

- **ID_ MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_40C SUR y ID_MV_08_001_1703_10_V6_ESVAP V1_TOM ADAMS**

Tabla 6. IDS suministrados por la SDM, SEGUNDO paquete


ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado	Tipo de elemento
MV_08_259_1244_11	AV AGOBERTO MEJIA	calle 40c sur	calle 40b sur	W-E	separad or central	Valla PEATONAL
EX_08_308_1867_12	TOM ADAMS	Cll 40a Sur - Cra 79c	Cll 39a Sur- Cra 79f	EW-WE	N, S	Bolardos
EX_08_308_1867_12	TOM ADAMS	Cl 40C Cra 79	Cra 80		calzada	Matera alta

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_08_259_1244_11:** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: sobre la carrera 79F – Cra 79C entre la calle 40 sur a la calle 39 A sur/calle 40 A sur y Av. Carrera 80 en el separador centra ubicado en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


Ilustración 12. Registro fotográfico del segundo paquete de ID's suministrados por la SDM

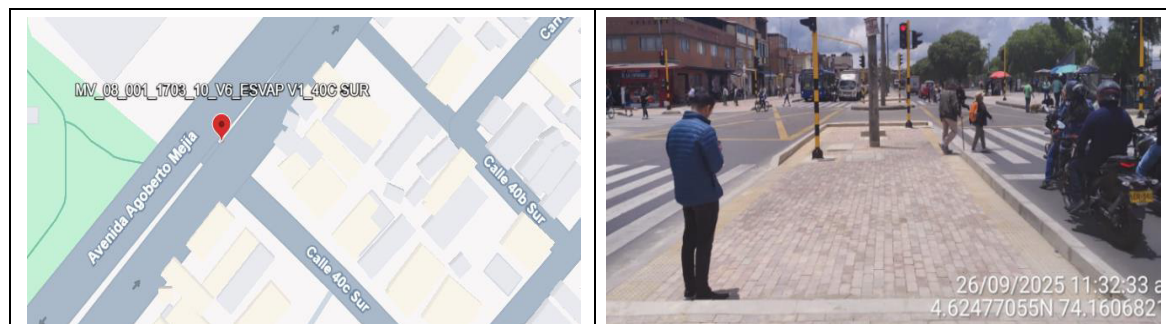

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_08_308_1867_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: sobre la carrera 79F – Cra 79C entre la calle 40 sur a la calle 39 A sur/calle 40 A sur y Av. Carrera 80 en el separador centra ubicado en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

Ilustración 13. Registro fotográfico del segundo paquete de ID's suministrados por la SDM

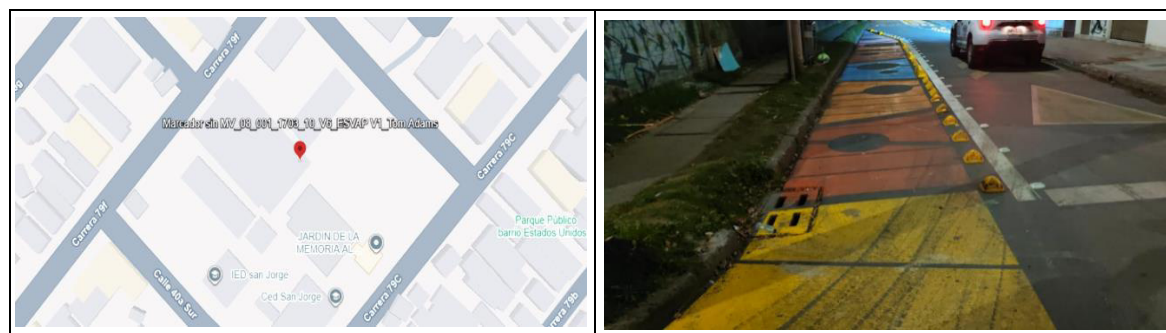

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_08_308_1867_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: sobre la carrera 79F – Cra 79C entre la calle 40 sur a la calle 39 A sur/calle 40 A sur, ubicado en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.


Ilustración 14. Ubicación geográfica del antes del ID EX_08_308_1867_12_Materas

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

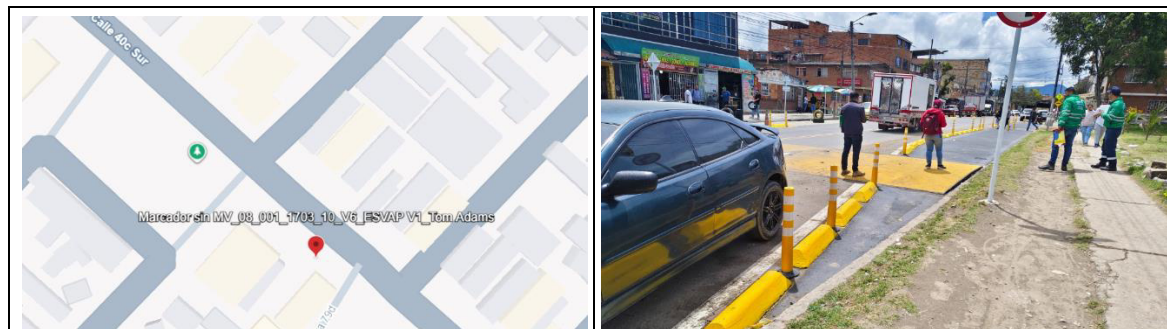

Fuente: Elaboración propia.

- **EX_13_171_1881_12:** Se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo con dirección: Sobre la transversal 17A bis entre la CL 36 y CL 37, pertenece a la UPZ 101 “Teusaquillo.”

Ilustración 15. Ubicación geográfica del antes del ID EX_13_171_1881_12



Fuente: Elaboración propia.

- **EX_05_001_1073_24:** Se encuentra ubicado en la localidad de Usme sobre la Carrera 7 entre la calle 108 sur y la calle 106.

Ilustración 16. Ubicación geográfica del antes del ID EX_05_001_1073_24

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01



Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.SEGUNDO PAQUETE DE ID's SUMINISTRADO POR LA SDM

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó el segundo paquete conformado por veinte (20) ID's el día nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) distribuidos como viene a continuación

Tabla 7. Segundo Paquete de ID's suministrados por la SDM

Nombre FTS	ID	Vía ppal	Inicio	Fin	Sentido vial	Costado
2025_SBP_SI_63.1	MV_10_161_1560_10	Calle 63	Carrera 24	Carrera 26	EW-WE	E-W
2025_SBP_SI_63.1	EX_13_109_1098_11	Carrera 26	Calle 62	Calle 63	S-N	E-W
2024_SI_2.1	EX_11_413_1842_12	Calle 145B	Carrera 85A	Carrera 85B	E-W	N-S
2025_UT_Calle_82	EX_02_038_1556_10	Calle 82 Carrera 13	Carrera 11 Calle 85 Calle 86a	Carrera 12 Calle 86a Calle 87a	E-W S-N	N-S
2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1	EX_11_417_1842_12	Calle 139	Carrera 104	Carrera 110	EW-WE	Separador

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

2025_SBP_SI_137.1	EX_01_341_1842_12	Calle 137	Carrera 23	Autopista Norte	E-W	N-S
2025_UT_Calle_11.1	EX_17_033_1881_12	Calle 11	Carrera 5	Carrera 7	E-W	N-S
2025_UT_Calle_12.1	EX_17_032_1881_12	Calle 12A	Carrera 7	Carrera 8	E w, W-E	N-S
2024_SBP_9.1	EX_02_003_585_24	Carrera 10	Calle 70	Calle 70A	S-N	E-W
2024_OSV_1.1	MV_08_259_1244_11	Carrera 80	Calle 55	Calle 57A Sur	S-N	Separador
2025_SGV_MANT_1.1	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte	Calle 187	Calle 188A	S-N	Separador
2025_SGV_MANT_2.1	MV_09_424_947_10	Avenida Calle 24	Av Carrera 70	Avenida Boyaca	EW-WE	Separador
2025_SGV_MANT_3.1	MV_AC_13_872_24_T1	Avenida Calle 13	Carrera 17	Carrera 18	EW-WE	Separador
2025_SGV_MANT_3.2	MV_AC_13_872_24_T1	Avenida Calle 13	Carrera 17	Carrera 18	EW-WE	Separador
2024_SGV_14.1	MV_12_001_1238_24	Carrera 50	Calle 94C	Calle 94	S-N	Separador
2025_DIT_1.1	MV_08_259_1244_11	Carrera 80	Calle 55 Sur	Calle 43 Sur	S-N	Separador

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

2025_DIT_2.1	MV_19_178_1244_11	Avenida Villavicencio	Carrera 45B	Carrera 50	E-W	Separador
2025_SGV_MANT_4.1	MV_15_016_1561_10 MV_04_511_676_09	Avenida Primera de Mayo	Carrera 6	Carrera 110	E-W	Separador
2025_SGV_MANT_5.1	MV_15_016_1561_10	Avenida Primera de Mayo	Carrera 12D	Carrera 13	E-W	Separador
2025_SGV_MANT_6.1	MV_15_016_1561_10	Avenida Primera de Mayo	Carrera 14	Carrera 18	E-W	Separador
2025_SGV_MANT_7.1	MV_06_001_643_24 MV_AUTO_SUR_643_24	Avenida Primera de Mayo	Carrera 30	Transversal 35	E-W	Separador

Fuente: Elaboración propia.

- **MV_10_161_1560_10:** Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos con dirección Calle 63 entre la Carrera 24 y la Carrera 26, en el andén. Sentido vial EW-WE en el barrio Quinta Mutis, barrio que pertenece a la UPZ No. 98 “Los alcázares”.

Ilustración 17. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1



OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

- **_13_109_1098_11:** Se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo con dirección: Carrera 26 entre Calle 62 y Calle 63 en el barrio Quinta Mutis, barrio que pertenece a la UPZ 100 “Galerías”.

Ilustración 18. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_63.1



- **EX_11_413_1842_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de Suba con dirección: Sobre la Calle 145B entre la AK 85A y la AK 85B, en el barrio San Francisco, barrio que pertenece a la UPZ 27 “Suba”.

Ilustración 19. Ubicación geográfica ID 2024_SI_2.1




- **EX_02_033_1556_10 - EX_02_033_1556_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero con dirección: Sobre la Calle 82 entre la AK 11 y la AK 12, sobre la AK 13 entre la CL 85

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

y la CL 86ª, sobre la AK 13 entre la CL 86a y la CL 87a, en el barrio El retiro, barrio que pertenece a la UPZ 97 “Chico Lago”.

Ilustración 20. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_82

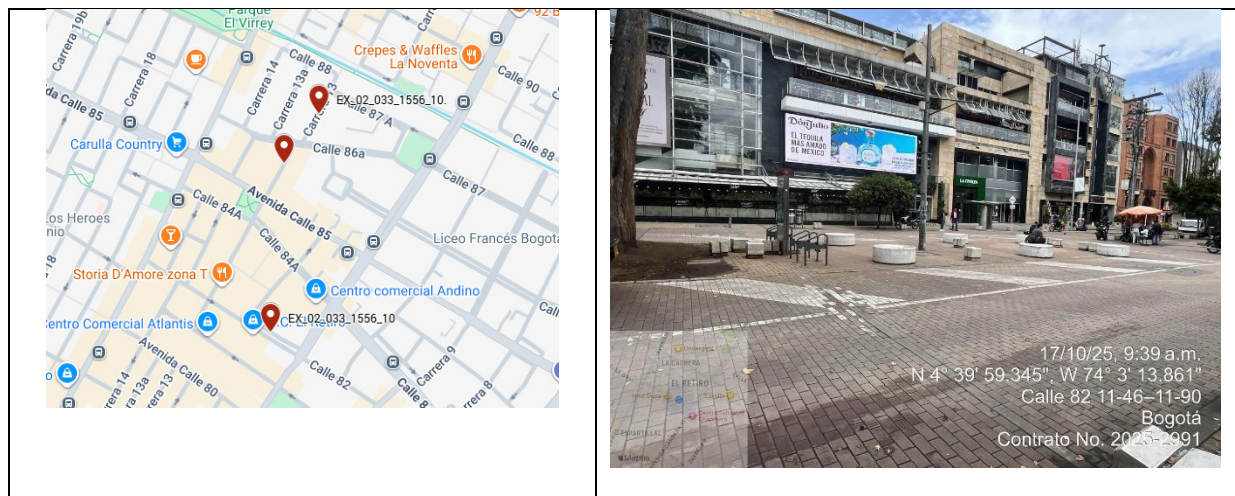

- **EX_11_417_1842_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de Suba con dirección: Sobre la calle 139 entre la AK 104 y la AK 110, en el barrio Las flores, barrio que pertenece a la UPZ 28 “El rincón”.

Ilustración 21. Ubicación geográfica ID 2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1



OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


- **EX_01_341_1842_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén con dirección: Sobre la CL 137 entre la AK 23 y la Autopista Norte, en el barrio Los cedros, barrio que pertenece a la UPZ 13 “Los cedros”.

Ilustración 22. Ubicación geográfica ID 2025_SBP_SI_137.1

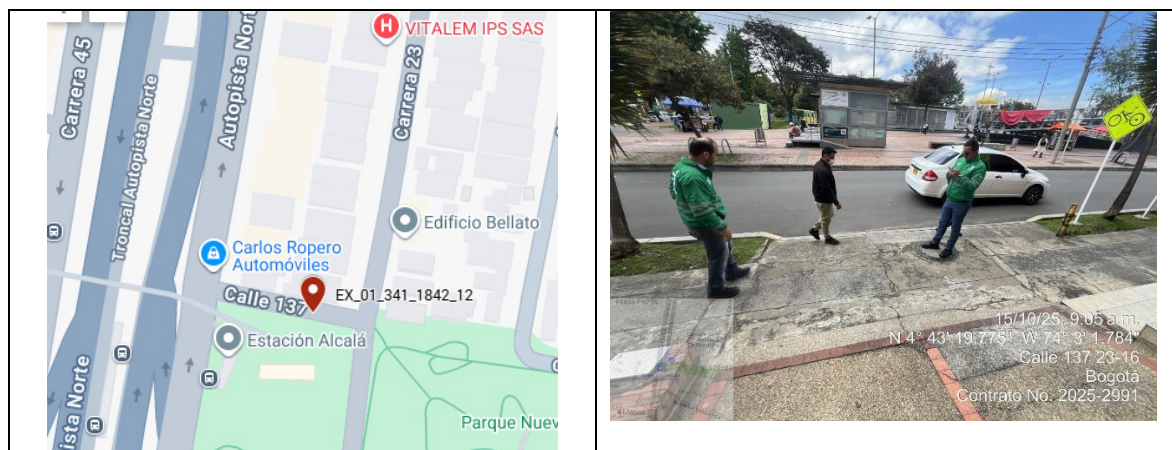

- **EX_17_033_1881_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de La candelaria con dirección: Sobre la Calle 11 entre la AK 5 y la AK 7, en el barrio la candelaria, barrio que pertenece a la UPZ 94 “La candelaria”.

Ilustración 23. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_11.1

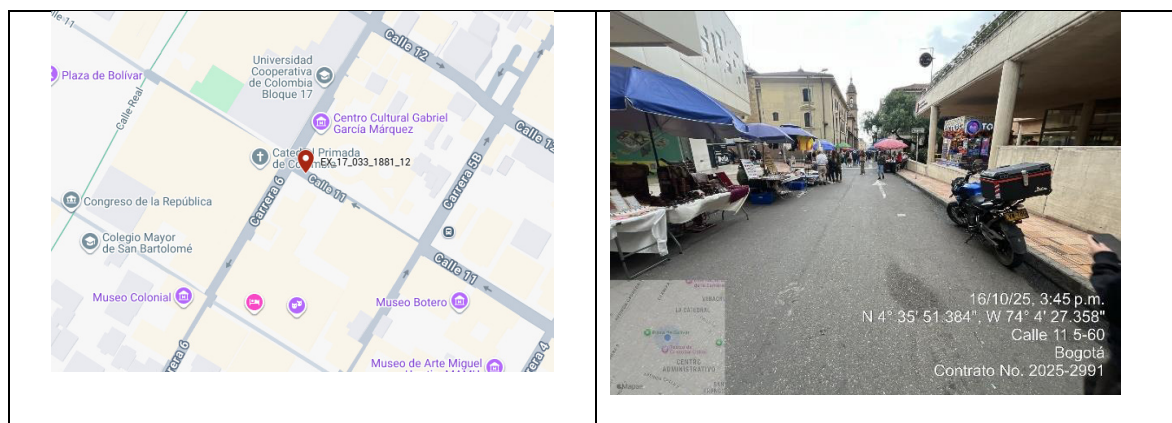

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


- **EX_17_033_1881_12.** Se encuentra ubicado en la localidad de La candelaria con dirección: Sobre la Calle 12 entre la AK 5 y la AK 7, en el barrio la candelaria, barrio que pertenece a la UPZ 94 “La candelaria”.

Ilustración 24. Ubicación geográfica ID 2025_UT_Calle_12.1

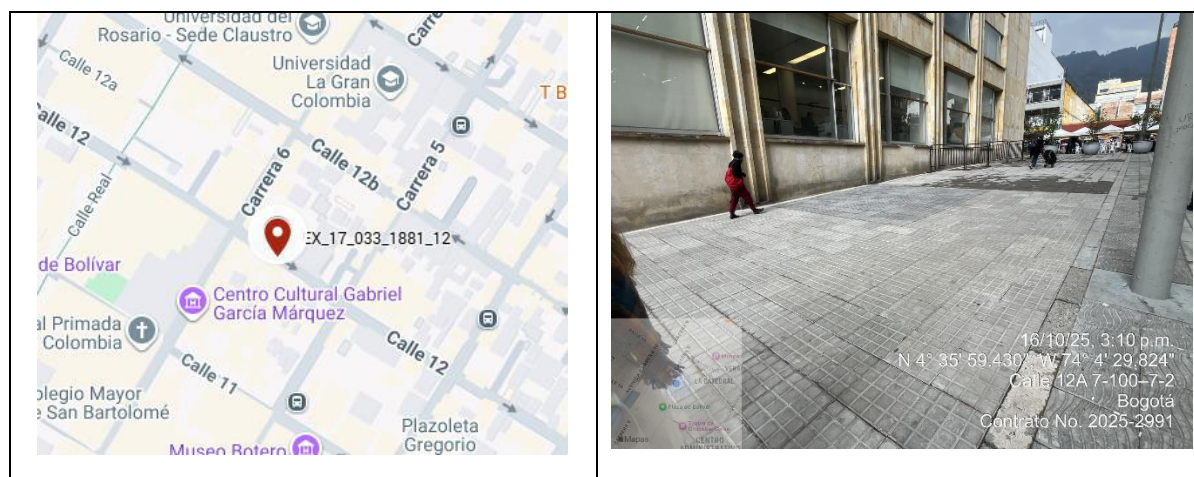

- **EX_02_003_585_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero con dirección: Sobre la Carrera 10 entre la CL 70 y la CL 70A, en el barrio Quinta Camacho, barrio que pertenece a la UPZ 97 “Chico Lago”.

Ilustración 25. Ubicación geográfica ID 2024_SBP_9.1

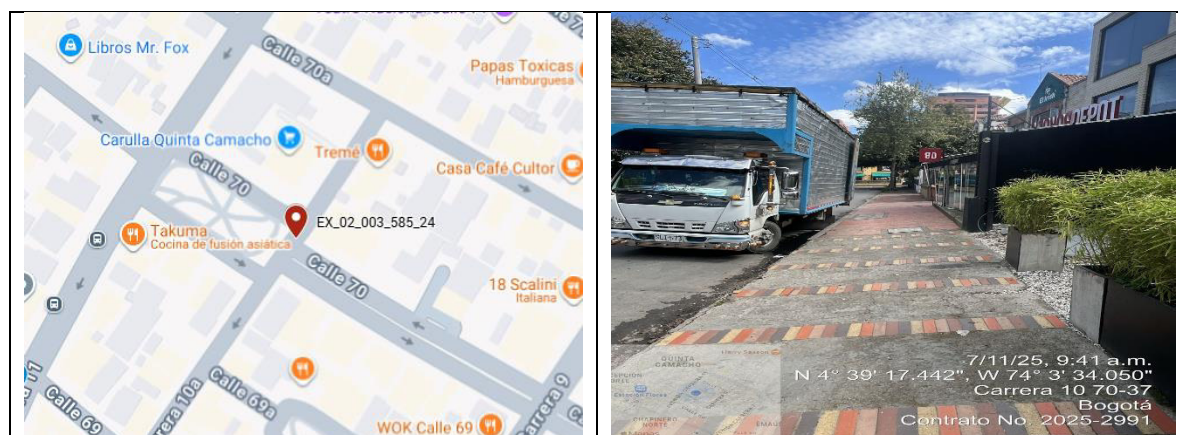

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


- **MV_08_259_1244_11.** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: Sobre la carrera 80 entre la CL 55 y l CL 57A sur, en el barrio britalia, barrio que pertenece a la UPZ 48 “Timiza”.

Ilustración 26. Ubicación geográfica ID 2024_OSV_1.1

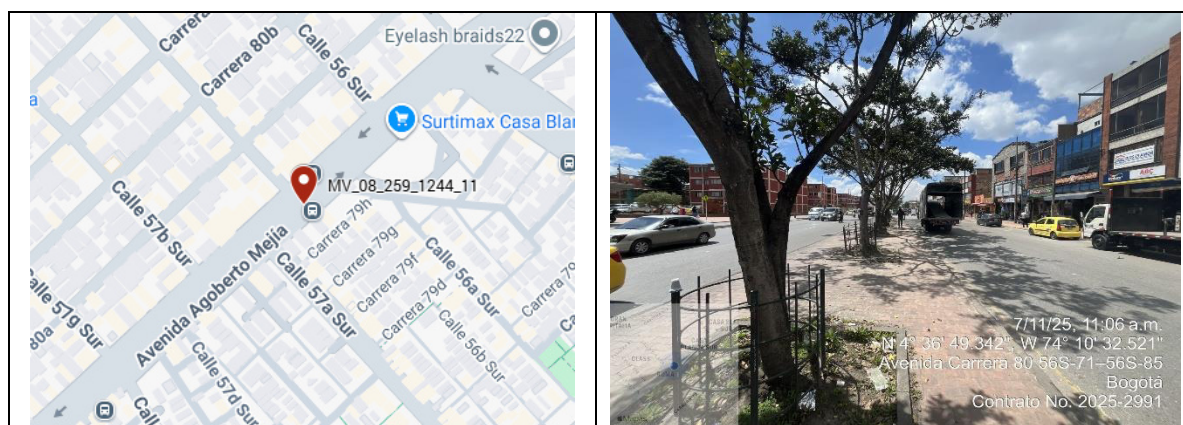

- **MV_01_033_1560_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén con dirección: Sobre la Autopista Norte entre la CL 187 y CL 188 A, en el barrio Mirandela, barrio que pertenece a la UPZ 9 “Verbenal”.

Ilustración 27. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_1.1

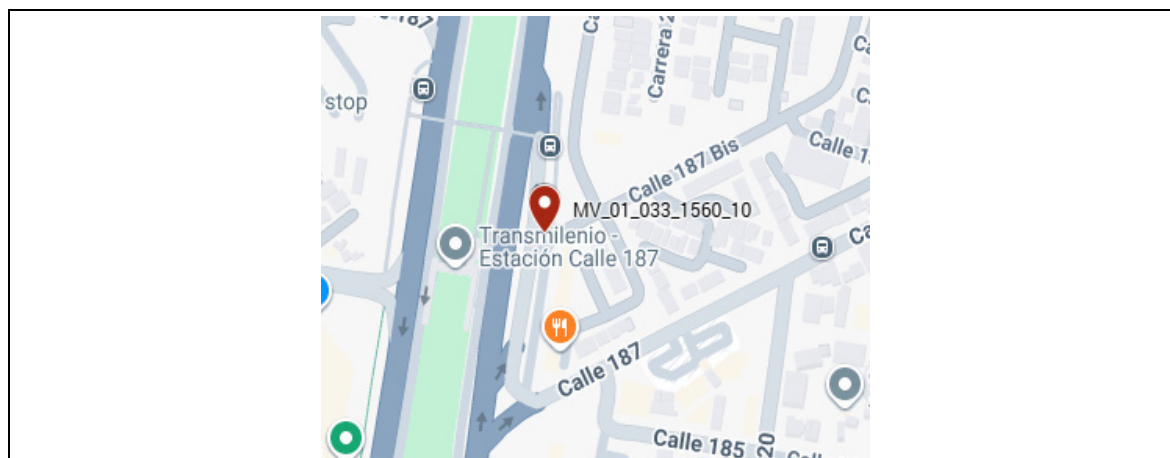

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


- **MV_09_424_947_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón con dirección: Sobre Avenida calle 24 con Av. AK 70 con Av. Boyacá, en el barrio la candelaria, barrio que pertenece a la UPZ 110 “Ciudad Salitre occidental”.

Ilustración 28. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_2.1

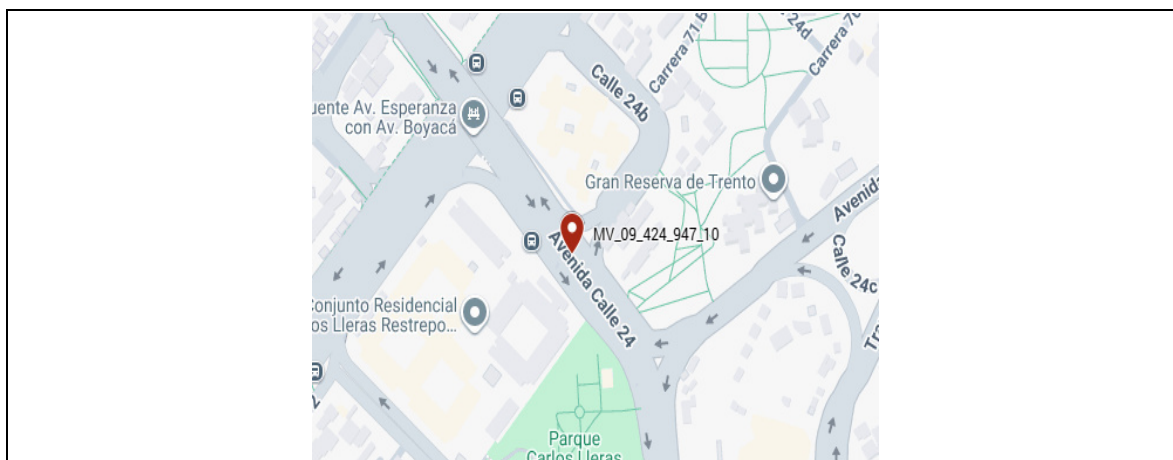

- **MV_AC_13_872_24_T1.** Se encuentra ubicado en la localidad de Los mártires con dirección: Sobre la Av. CL 13 con AK 17 y AK 18, en el barrio Puente Aranda, barrio que pertenece a la UPZ 112 “La sabana”.


Ilustración 29. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_3.1

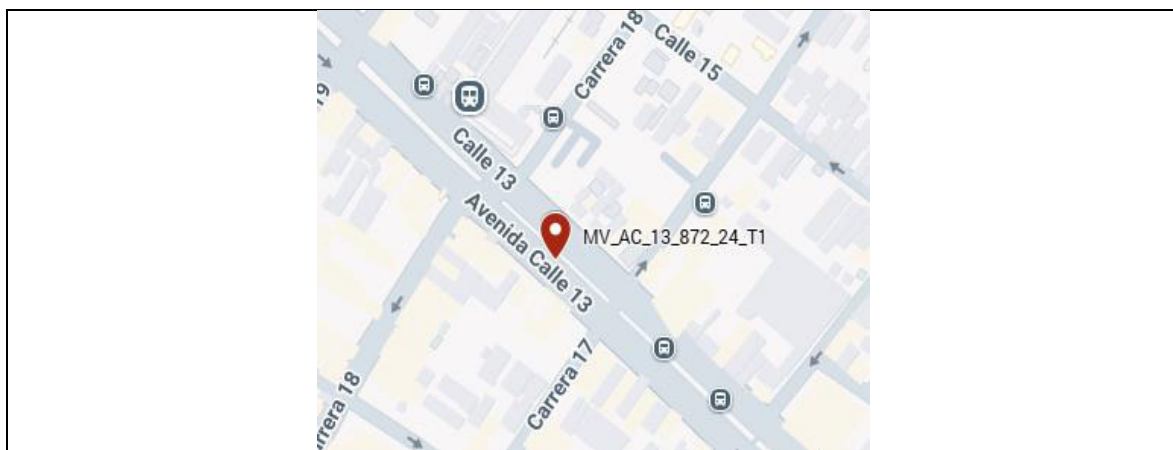

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


- **MV_12_001_1238_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos con dirección: Sobre la carrera 50 entre la CL 94C y la 18, en el barrio rincón de los andes, barrio que pertenece a la UPZ 21 “Los andes”.

Ilustración 30. Ubicación geográfica ID 2024_SGV_14.1

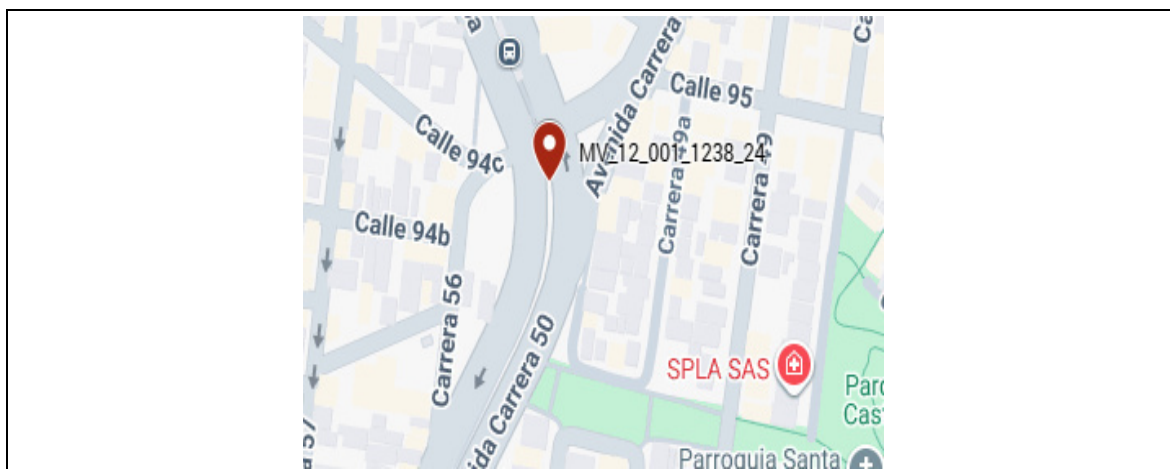

- **MV_08_259_1244_11.** Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: Sobre carrera 80 entre la CL 55 Sur y la CL 43 Sur, en el barrio ciudad Kennedy sur, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

Ilustración 31. Ubicación geográfica ID 2025_DIT_1.1

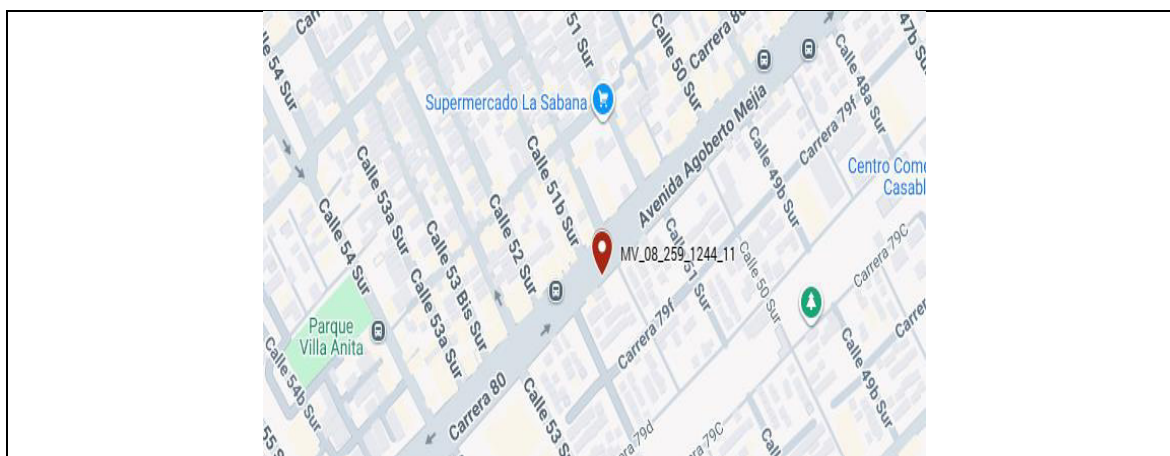

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá


TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01


- **MV_19_178_1244_11.** Se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar con dirección: Sobre la AV Villavicencio con AK 45B y AK 50, en el barrio Verona, barrio que pertenece a la UPZ 65 “Arborizadora”.

Ilustración 32. Ubicación geográfica ID 2025_DIT_2.1

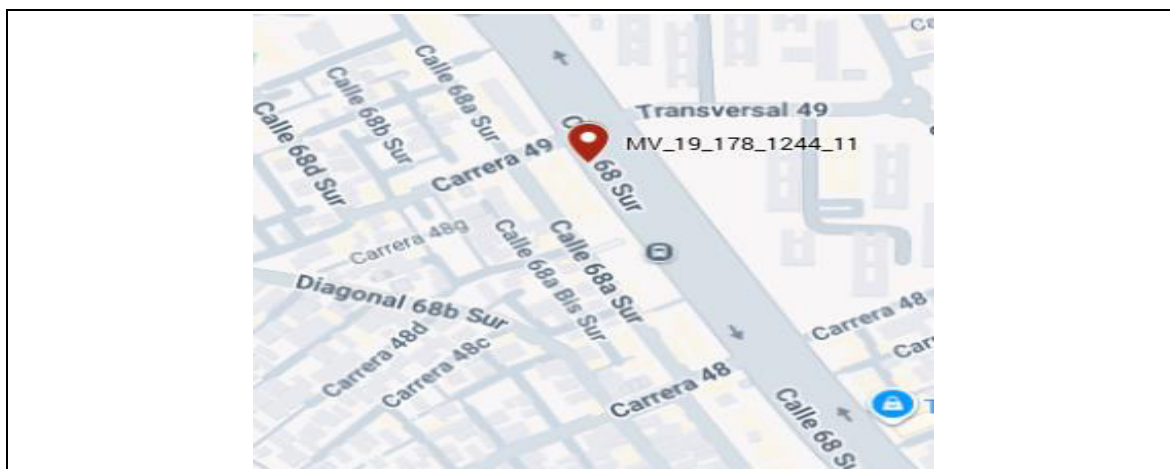

- **MV_04_511_676_09 - MV_15_016_1561_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal y Antonio Nariño con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 6 y la AK 11, en el barrio Verona, barrio que pertenece a la UPZ 34 “20 de julio” y UPZ 35 “Ciudad Jardín”.


Ilustración 33. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_4.1

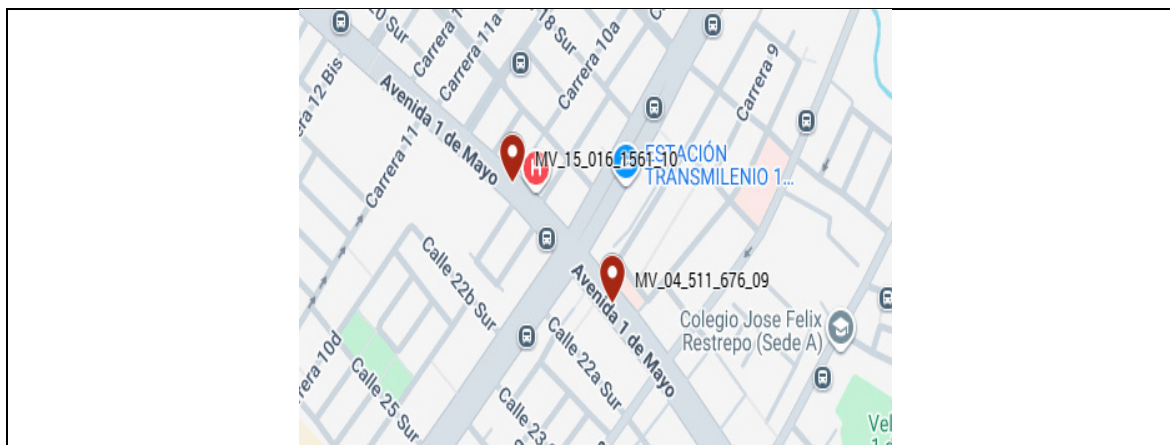

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

- **MV_15_016_1561_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 12D y la AK 13, en el barrio San José Sur, barrio que pertenece a la UPZ 36 “San José”.

Ilustración 34. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_5.1

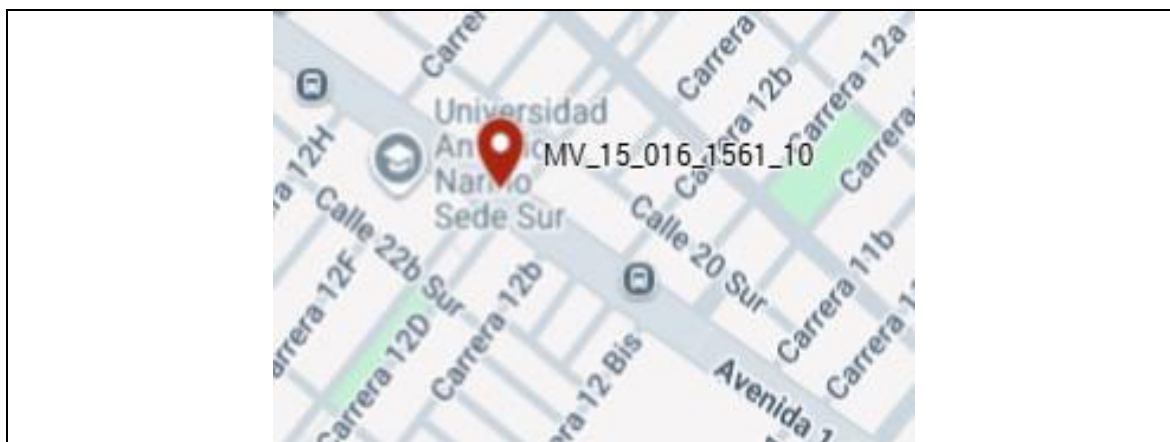

- **MV_15_016_1561_10.** Se encuentra ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 14 y la AK 18, en el barrio Restrepo, barrio que pertenece a la UPZ 39 “Quiroga”.


Ilustración 35. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_6.1



CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

- **MV_06_001_643_24 - MV_AUTO_SUR_643_24.** Se encuentra ubicado en la localidad de Antonio Nariño y Puente Aranda con dirección: Avenida Primera de Mayo entre la AK 30 y la Transversal 35, en el barrio La fragua y los Sauces, barrio que pertenece a la UPZ 38 “Restrepo” y UPZ 40 “Ciudad Montes”.

Ilustración 36. Ubicación geográfica ID 2025_SGV_MANT_7.1

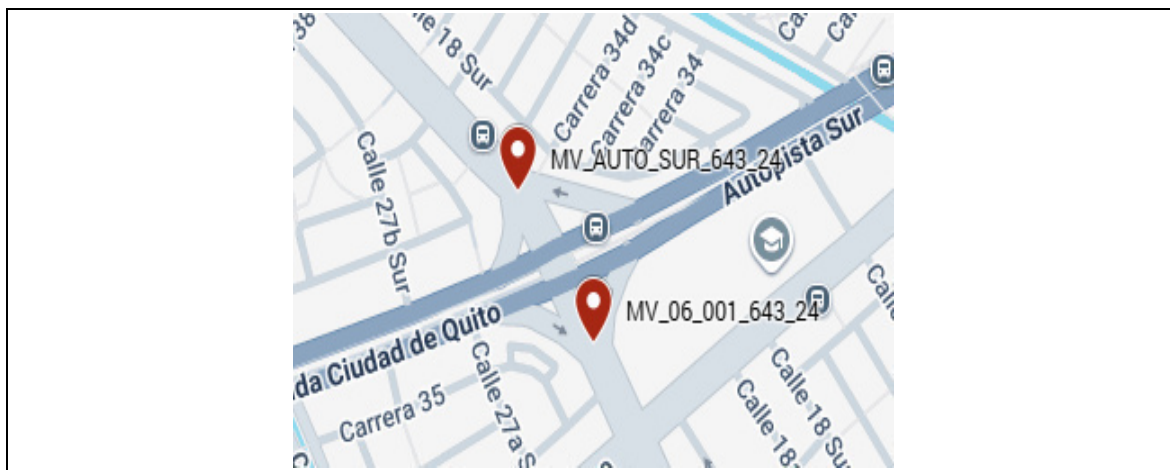

Fuente: Ilustración tomada de Google Maps.

6. COMUNICACIONES ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta una tabla con el registro de los comunicados realizados durante el período correspondiente, en la cual se detallan las fechas de emisión y los destinatarios, con el fin de evidenciar la gestión y coordinación de las actividades del componente forestal dentro del contrato CTO-2025-2991. Ver anexo 1

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Tabla 8 Correspondencia enviada

NUMERO DE CONSECUTIVO	Fecha	Asunto	Destinatario
CS-SVBTA-2025- 169-2026	21/01/2026	Alcance al comunicado CS-SVBTA-2025-159-2026- “Respuesta a comunicación CMAG-168-2026 – Atención observaciones Componente Forestal”.	Interventoría - Consorcio Magnus
CS-SVBTA-2025- 179-2026	29/01/2026	Entrega de Informe Forestal Mensual No. 5 del contrato de la referencia.	Interventoría - Consorcio Magnus
CS-SVBTA-2025- 199-2026	13/02/2026	Respuesta oficio de interventoría CMAG-076-2025 subsanación plan de manejo ambiental y protocolo de manejo de residuos – Consorcio Bogotá DC para su verificación y aprobación.	Interventoría - Consorcio Magnus

Fuente: Elaboración propia

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

7. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

7.1. Localización

Durante el periodo de reporte, las actividades del proyecto se ejecutaron en sectores urbanos consolidados de Bogotá D. C., mediante varios frentes de obra asociados a la instalación, retiro y mantenimiento de elementos de seguridad vial y control peatonal (principalmente bolardos, y actividades complementarias sobre cerramientos/mallas y vallas peatonales), priorizados para la gestión de movilidad y seguridad de peatones.

En términos de localización, el frente con mayor recurrencia se desarrolló en la localidad de Suba, sobre el corredor de la Calle 139 en tramos comprendidos entre AK 104 – AK 110 y sectores cercanos (AK 107 – AK 109 / AK 108A – AK 107), donde se adelantaron labores de demolición y excavación de puntos, retiro de bolardos existentes (M-63), fundida de concreto y suministro e instalación de bolardos tipo M-60, además de actividades de resane, acabados y recolección de escombros. En este corredor se reportó como novedad la interferencia con infraestructura subterránea (tubería de aguas negras) en dos excavaciones, lo que impidió implementar la intervención prevista en esos puntos.

De manera complementaria, se realizaron intervenciones en el centro de la ciudad (zona de Paloquemao) sobre la Avenida Calle 19 entre Cra 22 y Cra 19 (separador central), en un entorno de alta carga de movilidad y operación urbana, con actividades asociadas al acabado de concreto, limpieza de residuos de soldadura, pintura y embellecimiento de elementos instalados. Asimismo, se registraron frentes sobre la Calle 12A entre Cra 7 y Cra 8 (sector central), con intervención puntual relacionada con retiro/instalación y/o acabado de bolardos.

En el occidente se reportó frente sobre la Avenida Calle 80 entre AK/Cra 101 y AK/Cra 106 (corredor arterial), con actividades de limpieza de viruta, ajustes de soldadura y aplicación de pintura en módulos y postes. En el suroccidente, se ejecutaron actividades en el corredor de la Autopista Sur (sector Calle 63 sur – Calle 65A sur) orientadas a demolición/excavación, cimentaciones, instalación de postes, montaje de módulos y pintura de elementos de control peatonal, y adicionalmente se registró un frente sobre la Avenida Calle 40C sur con AK 80.

7.2 Contexto Ambiental Urbano

Los frentes intervenidos se ubican en áreas con alto grado de transformación antrópica, donde predominan superficies duras (calzadas, separadores, andenes y espacio público construido). La cobertura vegetal presente es puntual y fragmentada, limitada principalmente a arbolado urbano aislado y jardinería en

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

separadores o franjas verdes remanentes, con funciones locales de paisaje, regulación microclimática y mitigación (polvo/escorrentía) a pequeña escala.

Durante el periodo se presentaron jornadas secas, húmedas y lluviosas, con varios reportes de precipitación nocturna que afectaron el rendimiento y, en algunos casos, impidieron la ejecución de actividades programadas (especialmente labores de acabado, limpieza o pintura). En este contexto urbano, las actividades realizadas (demolición/excavación puntual, fundidas de concreto, resanes y recolección de escombros) requieren el manejo cuidadoso de residuos y control operativo para evitar afectaciones al espacio público, garantizando además la implementación del PMT por tratarse de corredores con alta dinámica vehicular y peatonal.

A continuación, se presenta la localización general de cada uno de los puntos intervenidos durante el periodo de reporte:

EX_11_417_1842_12: localizado en la Localidad de Suba, sobre la Calle 139 entre la Avenida Carrera 104 y la Avenida Carrera 110, en el barrio Las Flores, perteneciente a la UPZ El Rincón (UPZ 28), en un sector urbano residencial consolidado con presencia de andenes y espacio público intervenido

MV_14_089_1249_11 / EX_14_096_1881_12: localizado en la Localidad de Los Mártires, sobre la Avenida Calle 19 entre las carreras 22 y 19, así como en tramos asociados a la Carrera 27 en el sector de Paloquemao, barrio perteneciente a la UPZ La Sabana (UPZ 102), en un entorno urbano consolidado con predominio de infraestructura vial y separadores centrales.

EX_17_032_1881_12: localizado en la Localidad de La Candelaria, sobre la Calle 12A entre las carreras 7 y 8, en el centro histórico de la ciudad, en un entorno urbano consolidado de alta sensibilidad patrimonial, con predominio de superficies duras y espacio público estructurado.


MV_AUTO_SUR_643_24: localizado sobre el eje de la Autopista Sur, con intervención en tramos comprendidos hasta la Calle 63 Sur, en sectores correspondientes principalmente a las localidades de Kennedy y Bosa, en un corredor vial de carácter metropolitano, con predominio de infraestructura vial de gran escala y separadores centrales intervenidos.

MV_AV_CALLE_80_12_38_24: localizado en la Localidad de Engativá, sobre la Avenida Calle 80 entre las carreras 101 y 96, en el barrio Bochica, perteneciente a la UPZ Garcés Navas (UPZ 73), en un corredor vial de alta jerarquía y alta carga de movilidad vehicular.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

MV_08_259_1244_11: Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy con dirección: sobre la carrera 79F – Cra 79C entre la calle 40 sur a la calle 39 A sur/calle 40 A sur y Av. Carrera 80 en el separador central ubicado en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, barrio que pertenece a la UPZ 47 “Kennedy Central”.

Ilustración 37 Localización de los ID intervenidos en el periodo de reporte

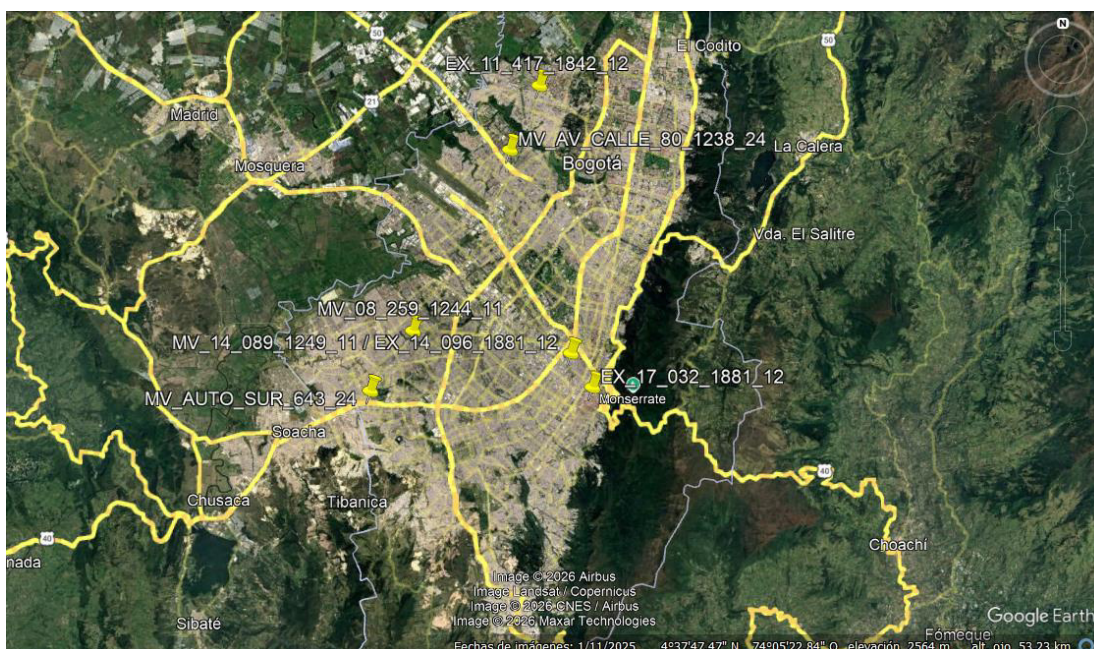

Fuente: Google Earth

7.2 Condiciones climáticas y atmosféricas

7.2.1 Precipitaciones

De acuerdo con la distribución espacial de la precipitación media anual mostrada en la Ilustración 38, las localidades donde se ejecutaron los ID intervenidos durante el periodo de reporte presentan comportamientos diferenciados de precipitación, asociados a su localización dentro del área urbana de Bogotá y a las condiciones atmosféricas predominantes en cada sector.

Localidad de Suba: se ubica dentro de una franja de precipitación media anual aproximada entre 800 y 900 mm/año. Este rango corresponde a condiciones de precipitación intermedia, típicas del noroccidente de la

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

ciudad, donde los acumulados de lluvia son moderados y relativamente homogéneos a lo largo del año. Las condiciones identificadas son representativas de los ID intervenidos en esta localidad durante el periodo de reporte.

Localidad de Engativá: indica valores de precipitación media anual cercanos a los 800 mm/año, ubicando a esta localidad dentro de una franja de precipitación intermedia–baja. Este comportamiento es característico de sectores occidentales urbanos con alta consolidación y coincide con las condiciones ambientales bajo las cuales se ejecutaron los ID intervenidos en el mes de reporte.


Localidad de Los Mártires: De acuerdo con la información presentada en la Ilustración 38, la Localidad de Los Mártires se ubica dentro de una franja de precipitación intermedia, con valores aproximados que oscilan entre 800 y 900 mm/año. Este rango es representativo de las condiciones climáticas del sector central de la ciudad y corresponde a las precipitaciones bajo las cuales se desarrollaron los ID intervenidos durante el mes de reporte.

Localidad de la candelaria: se ubica en un rango intermedio de precipitación, con valores aproximados entre 750 y 900 mm/año. Esta condición es típica del centro de Bogotá y responde a la influencia moderada de los Cerros Orientales. Las precipitaciones registradas no presentan extremos hídricos y son compatibles con un entorno urbano consolidado, caracterizado por el predominio de superficies duras y baja capacidad de infiltración, sin generar restricciones ambientales para las actividades desarrolladas en espacio público.

Localidad de Kennedy: Kennedy se ubica principalmente en el rango de precipitación media anual entre 725 y 879 mm, lo que corresponde a una oferta hídrica moderada. Esta condición es típica de la planicie occidental de Bogotá y se asocia a un régimen de lluvias bimodal. La precipitación es suficiente para el sostenimiento de coberturas herbáceas y jardinería urbana, aunque la alta impermeabilización del suelo limita la infiltración y favorece la escorrentía superficial.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Ilustración 38 Distribución espacial de la precipitación media anual en Bogotá D.C.

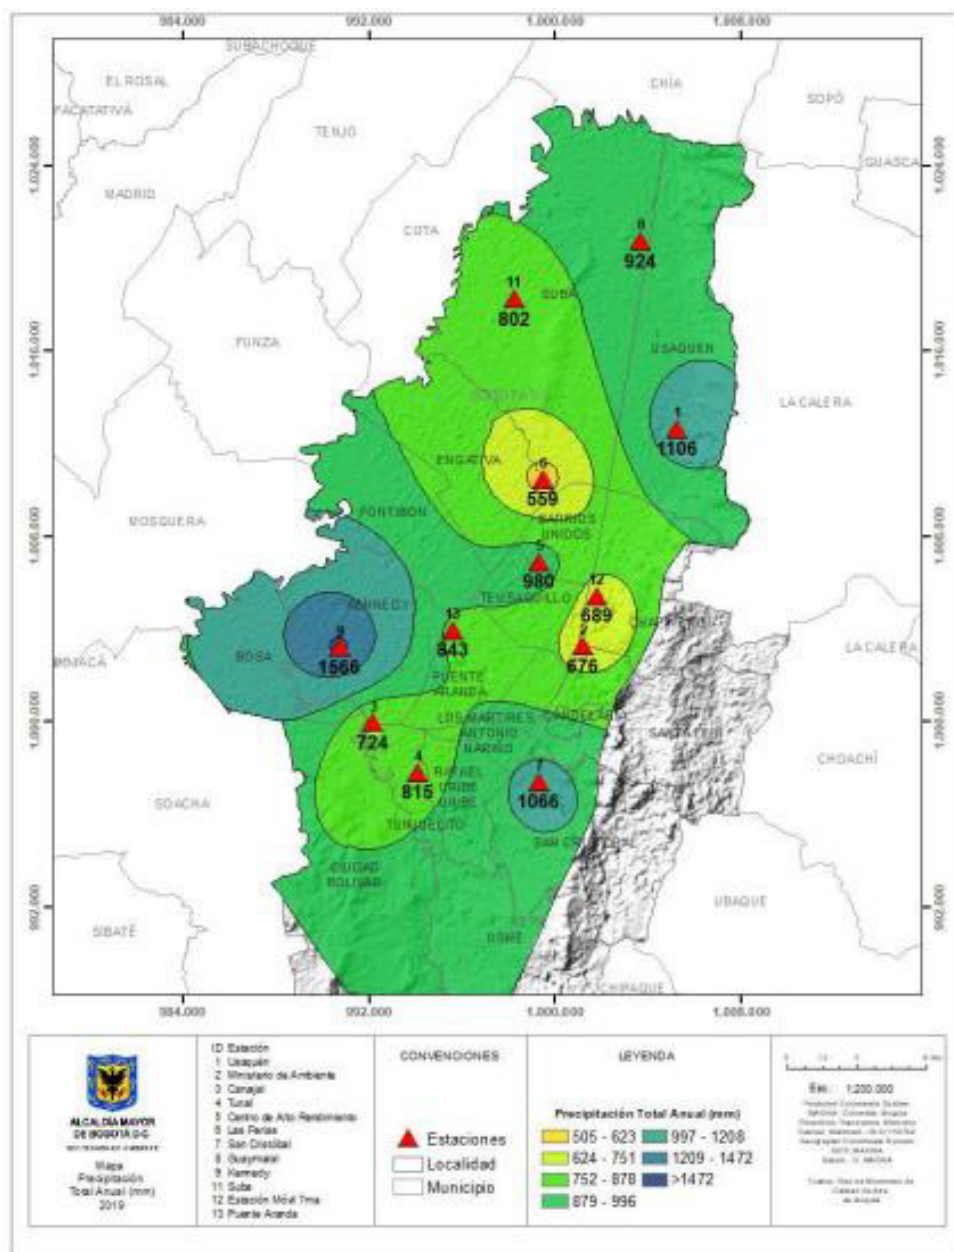

Fuente: Informe Anual de Calidad del Aire 2018

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

7.2.2 Temperatura

De acuerdo con la distribución espacial de la temperatura promedio (°C) mostrada en el visor geográfico ambiental, las localidades donde se ejecutaron los ID intervenidos durante el periodo de reporte presentan variaciones térmicas asociadas a su localización dentro del área urbana, la altitud y el grado de consolidación urbana.

Localidad de Suba: se ubica predominantemente dentro de los rangos de 14,0 a 14,5 °C, con sectores que alcanzan valores cercanos a 14,5 °C. Estas temperaturas corresponden a condiciones térmicas moderadas, propias del noroccidente de la ciudad, influenciadas por su altitud y por la mezcla de áreas urbanizadas y zonas con mayor presencia de cobertura verde.

Localidad de Engativá: la temperatura promedio se sitúa principalmente en el rango de 14,0 a 14,5 °C, con tendencia a valores cercanos a 14,5 °C en sectores altamente urbanizados y asociados a corredores viales de alta demanda. Este comportamiento térmico es representativo del occidente de Bogotá y del efecto de superficies duras sobre el microclima urbano.


Localidad de Los Mártires: se encuentra mayoritariamente dentro del rango de 13,5 a 14 °C, con áreas puntuales que alcanzan valores cercanos a 14,5 °C. Estas condiciones térmicas son representativas del centro de la ciudad, donde la alta densidad urbana y la escasa cobertura vegetal influyen en el incremento de la temperatura promedio.

Localidad de la candelaria: se ubica en un rango térmico aproximado entre 14 °C y 15 °C. Esta condición es característica del centro de la ciudad y está influenciada por su localización intermedia entre las zonas de mayor altitud de los Cerros Orientales y los sectores occidentales más cálidos.

Localidad de Kennedy: Presenta temperaturas promedio anuales que se ubican principalmente entre 13,5 y 14,5 °C, con sectores puntuales que alcanzan valores cercanos a 15 °C. Este comportamiento térmico está asociado a su localización en la planicie occidental de Bogotá y al alto grado de urbanización, factores que favorecen condiciones ligeramente más cálidas por efecto de la isla de calor urbana.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Ilustración 39 Temperatura media promedio en la Localidades de los Id intervenidos en el mes de reporte

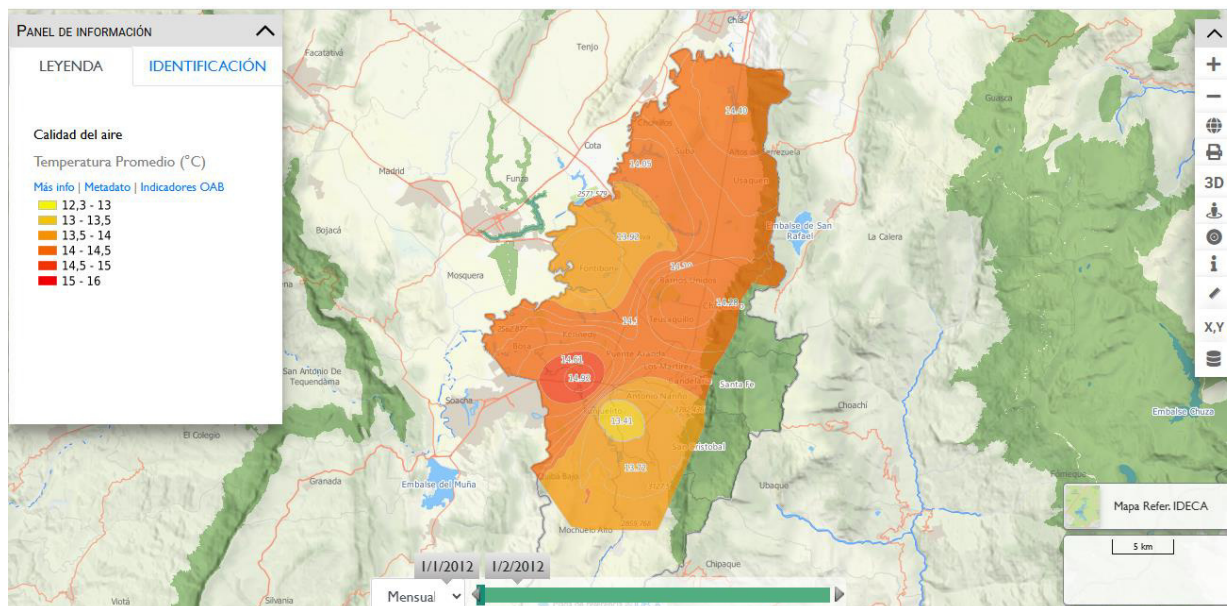

Fuente: Visor Geográfico ambiental, 2026


7.2.3 Humedad relativa

De acuerdo con la Zonificación de Humedad Relativa establecida en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá D. C., los puntos intervenidos durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026 se localizan principalmente dentro de la zona de humedad semiseca, condición caracterizada por una oferta hídrica moderada, balance hídrico limitado y la presencia de hasta tres meses secos al año. Esta clasificación aplica para las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Los Mártires, donde se ejecutaron la mayoría de los frentes de obra bajo dichas condiciones ambientales, con valores promedio de humedad relativa entre 65 % y 75 % y variaciones asociadas a eventos de precipitación registrados durante el periodo.

Por su parte, la localidad de La Candelaria se clasifica dentro de la zona húmeda de la ciudad, asociada a una mayor disponibilidad de humedad ambiental por influencia orográfica. No obstante, esta condición no implicó cambios relevantes en el desarrollo de las actividades reportadas, debido a que las intervenciones se realizaron en entornos urbanos consolidados, sobre superficies previamente intervenidas y sin afectación directa al recurso vegetal.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Ilustración 40 Mapa humedad relativa de Bogotá

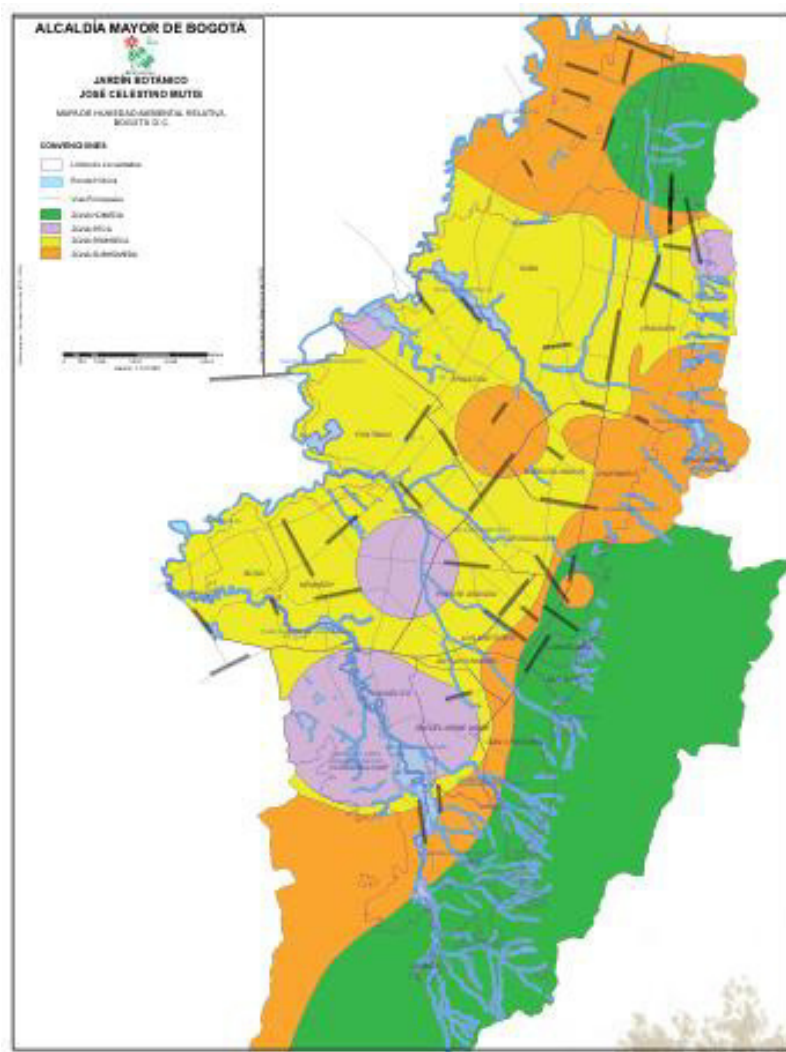

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBB. *Manual de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C.* Bogotá D.C.

7.2.4 Coberturas vegetales

En las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Los Mártires, las intervenciones se desarrollaron principalmente en corredores viales arteriales, separadores centrales y andenes consolidados. En estos sectores predomina una cobertura vegetal discontinua y fragmentada, compuesta en su mayoría por arbolado urbano aislado, jardinería ornamental puntual y franjas verdes de dimensiones reducidas. La

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B – 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

vegetación existente se encuentra establecida en alcorques o en zonas duras con suelo confinado, lo que limita su conectividad ecológica y su capacidad de regeneración natural. Las actividades ejecutadas durante el periodo se realizaron sobre superficies previamente intervenidas, como concreto, andenes y cimentaciones existentes, sin requerir remoción de cobertura vegetal ni generar afectación directa al arbolado urbano.

En la localidad de La Candelaria, la cobertura vegetal es aún más restringida debido al alto nivel de consolidación urbana y al valor patrimonial del sector. La vegetación presente se limita a arbolado urbano aislado en espacio público, algunos puntos de jardinería ornamental y pequeñas áreas verdes residuales, sin presencia de coberturas naturales continuas. Las intervenciones se ejecutaron exclusivamente sobre áreas duras y estructuras previamente existentes, sin intervenir suelo natural ni individuos arbóreos o arbustivos, por lo que la cobertura vegetal del entorno inmediato se mantuvo intacta.

En términos generales, las zonas intervenidas presentan un alto grado de transformación antrópica, con predominio de superficies impermeables y baja proporción de cobertura vegetal efectiva. La estructura vegetal cumple principalmente funciones paisajísticas, de regulación microclimática local y de mitigación ambiental a pequeña escala, sin conformar ecosistemas urbanos continuos.

7.2.4.1 Tipologías de coberturas vegetales identificables

Con base en la clasificación establecida en el Manual, las coberturas vegetales presentes o potenciales en el área de intervención se enmarcan principalmente en las siguientes categorías:

Arbolado urbano: corresponde a individuos arbóreos aislados o alineados, localizados en espacio público o privado, asociados a andenes, separadores viales y áreas duras. Esta cobertura cumple funciones de regulación térmica, captura de contaminantes atmosféricos y mejoramiento del paisaje urbano; no obstante, su desarrollo se encuentra condicionado por la limitada disponibilidad de suelo, la compactación y la presión urbana.

Vegetación arbustiva: presente de manera puntual y discontinua, generalmente asociada a franjas reducidas de suelo, jardinerías o espacios residuales. Su función principal es paisajística y de delimitación espacial, con baja representatividad ecológica.

Coberturas herbáceas y césped: corresponden a coberturas de bajo porte y escasa profundidad radicular, ampliamente representadas en separadores viales y zonas verdes urbanas. En los sectores intervenidos,

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

estas coberturas presentan limitaciones funcionales asociadas a compactación del suelo, déficit hídrico y mantenimiento intensivo.

Áreas sin cobertura vegetal (superficies artificiales): corresponden a andenes, calzadas, separadores duros y placas de concreto, constituyendo la cobertura predominante en los puntos de intervención. Estas superficies no aportan funciones ecológicas y generan condiciones de mayor estrés ambiental para la vegetación circundante.

8. AVANCE EN LA GESTIÓN FORESTAL

Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026, el componente forestal llevó a cabo actividades de seguimiento técnico, control preventivo y verificación ambiental en los frentes de obra localizados en Suba, Engativá, Kennedy, Los Mártires y La Candelaria, conforme al alcance contractual y a los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del proyecto.

Las intervenciones se concentraron en corredores viales y en espacio público previamente consolidado, caracterizado por superficies duras y escasa presencia de suelo natural. En los puntos donde se identificó arbolado urbano aislado o jardinería ornamental en separadores y franjas verdes, se adoptaron medidas preventivas para evitar posibles afectaciones derivadas del tránsito de personal, el manejo de materiales o el acopio temporal.

Durante el periodo evaluado no se realizaron intervenciones directas sobre individuos arbóreos. Las actividades constructivas como demolición, excavación, fundida de concreto e instalación de elementos de control peatonal se ejecutaron en áreas previamente intervenidas, sin afectar coberturas vegetales existentes.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Tabla 9 Soporte técnico – Intervención en zonas verdes y gestión forestal del periodo

ID de intervención	Localidad	Periodo de intervención	Tipo de superficie	Presencia de arbolado	Gestión forestal
2025_SBP-SI_Z4_CONSECUTIVO 04.1 / EX_11_417_1842_12	Suba	Ene-Feb 2026	Andenes y borde de calzada	Arbolado urbano aislado en entorno	Seguimiento preventivo y verificación de no afectación
2024_SGV_11 / MV_14_089_1249_11	Los Mártires	Ene-Feb 2026	Separador central	Arbolado aislado y jardinería puntual	Verificación de no afectación y manejo de residuos
2025_UT_CALLE_12.1 / EX_17_032_1881_12	La Candelaria	Ene-Feb 2026	Andenes urbanos consolidados	Sin presencia de arbolado	Supervisión preventiva sin intervención vegetal
2023_SGV_01.1 y 01.2 / MV_AV_CALLE_80_1238_24	Engativá	Feb 26	Corredor vial y espacio público	Arbolado en alineación vial	Seguimiento técnico y control de tránsito de obra
2024_SGV_6.1-6.4 / MV_AUTO_SUR_643_24	Kennedy	Feb 26	Infraestructura vial y separadores	Arbolado en entorno vial	Verificación de no afectación y manejo de residuos

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

ID de intervención	Localidad	Periodo de intervención	Tipo de superficie	Presencia de arbolado	Gestión forestal
MV_08- 001_1703_10_V6_ESVAP_V1_TOM ADAMS / MV_08_259_1244_11	Kennedy	feb-26	Andenes urbanos	Vegetación ornamental dispersa	Supervisión preventiva

Fuente: Elaboración propia

8.1 Registro fotográfico

El registro fotográfico presentado corresponde a evidencias representativas de las fases antes, durante y después para cada ID intervenido durante el periodo de reporte. Dado que las actividades se desarrollaron en múltiples jornadas, se seleccionaron fechas clave que permiten verificar el control ambiental y la no afectación al componente forestal, sin que ello implique la inclusión de registros diarios.

ID de intervención: EX_11_417_1842_12

Antes	Durante	Después
 19 ene 2026 2:22:58 a. m. # 104-65 Calle 139 Suba Bogotá, D.C.	 23/01/2026 4:22:22 a. m. 4.74236389N 74.10002106W 107-14 Calle 139 Suba Bogotá	 13/02/2026 12:46:40 a. m. 4.74199375N 74.09907185W 108-20 Calle 139 Suba Bogotá


OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83


EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

ID de intervención: MV_14_089_1249_11

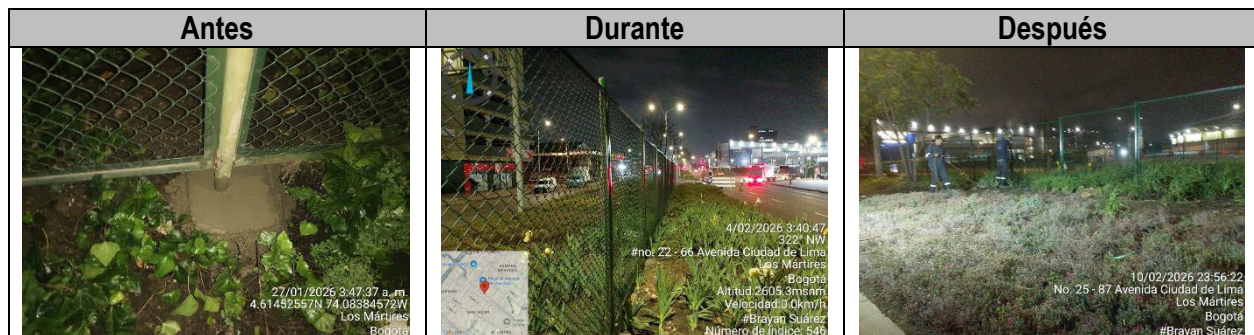

ID de intervención: EX_17_032_1881_12

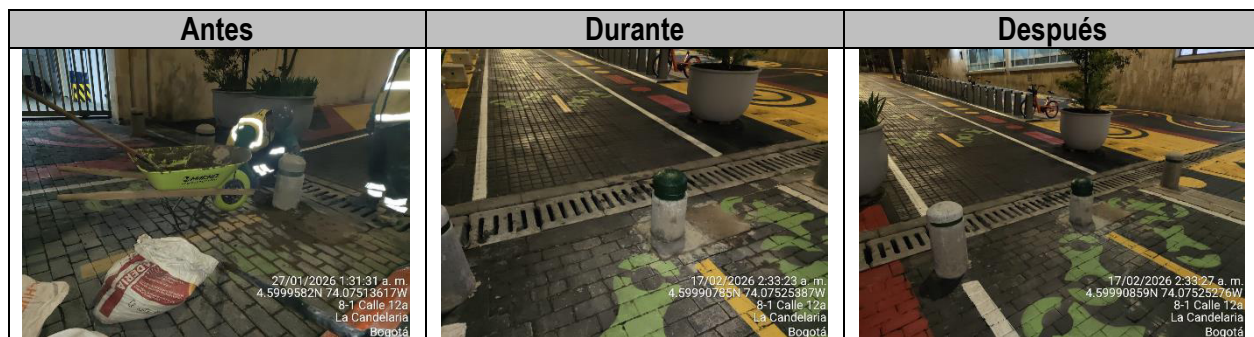

ID de intervención: MV_AV_CALLE_80_1238_24



OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

ID de intervención: MV_AUTO_SUR_643_24

Antes	Durante	Después
 4/02/2025 3:49:05 a. m. # 43-35 Carrera 77d Soacha Bogotá, D.C.	 04 feb 2026 11:38:50 p. m. 4°35'49.6091"N 74°10'45.40915"W Carrera 77g #60-45 sur Local 123 Bogotá	 10 feb 2026 01:09:23 a. m. 4°35'49.67675"N 74°10'46.11155"W 110111 Bogotá

ID de intervención: MV_08_259_1244_11

Antes	Durante	Después
 13 feb 2026 2:20:11 a. m.	 18 feb 2026 2:20:04 a. m. # 63-35 Carrera 77d Soacha, 110741 Colombia	 13 feb 2026 2:15:21 a. m. # 63-35 Carrera 77d Soacha, 110741 Colombia

OFICINAS
Carrera 70 F # 125 B - 43 Niza
PLANTA
Transversal 112B Bis No. 64-69 Engativá

TELEFONOS:
(601) 7552782/83

EMAIL:
consorcioseguridadvial2025@g-vial.com

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

8.2 Avance en el plan de manejo y protocolo de residuos – Componente forestal

Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026, en los ID de intervención localizados en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Los Mártires y La Candelaria, el componente forestal adelantó actividades de verificación, seguimiento y control ambiental preventivo, conforme al alcance definido en el Anexo Técnico del proyecto.

En los frentes donde se identificó presencia puntual de separadores con cobertura herbácea o arbolado urbano adyacente, las actividades se ejecutaron de manera controlada y localizada, sin generar afectación sobre las coberturas vegetales ni sobre individuos arbóreos existentes. No se realizaron intervenciones directas sobre el recurso vegetal, por lo que no se generaron residuos asociados al componente forestal.

Los residuos producidos durante el periodo correspondieron exclusivamente a Residuos de Construcción y Demolición (RCD) derivados de actividades civiles como demolición, excavación, fundición e instalación de elementos de infraestructura. Su manejo y disposición se reportan en el capítulo correspondiente al componente ambiental/obra civil, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos en el proyecto (ver Anexo 2).

8.3 Cronograma

En cumplimiento de la programación contractual, a la fecha se han presentado cinco (5) informes técnicos de seguimiento forestal, radicados de manera periódica conforme a la estructura mensual establecida. Todos los informes han sido revisados y aprobados por la interventoría, sin observaciones de fondo relacionadas con su contenido técnico, trazabilidad de la información o coherencia metodológica.

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental (PMA), este ya fue radicado y se encuentra en revisión técnica. Sin embargo, la interventoría emitió algunas observaciones enfocadas principalmente en ajustes metodológicos y de alcance. En atención a ello, el equipo técnico está realizando las modificaciones correspondientes conforme a los lineamientos recibidos, con el propósito de consolidar una versión ajustada que permita avanzar hacia su aprobación definitiva.

Respecto al componente forestal asociado a la implementación de materas y material vegetal, a la fecha no se han ejecutado este tipo de intervenciones en los ID del proyecto. Actualmente se está adelantando la definición técnica de las materas, incluyendo sus especificaciones constructivas, el tipo de sustrato y la selección del material vegetal más adecuado. Para ello, se están considerando criterios de adaptación

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

climática, condiciones del espacio público y lineamientos de silvicultura urbana aplicables. Estas actividades se encuentran en fase de estructuración técnica previa a su programación en obra.

8.4 Selección de material vegetal para ESVAP materas

La selección de material vegetal para las ESVAP tipo matera se formula conforme a los lineamientos distritales para la planificación y manejo de coberturas vegetales urbanas, en especial el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D. C. (adoptado por compilación mediante Resolución SDA 2635 de 2023) y las directrices de gestión y jardinería urbana del Distrito (Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería 2019–2030). Como referencia complementaria para selección por uso ornamental y desempeño urbano se consideran guías técnicas de jardinería urbana del Distrito.

Bajo estos instrumentos, la propuesta prioriza especies y combinaciones con: bajo–medio porte, raíces no agresivas (compatibles con confinamiento), tolerancia a contaminación, viento y radiación, baja demanda hídrica (adaptación a condición urbana con riego de establecimiento), cobertura rápida (control de sustrato expuesto), perennidad y mantenimiento sencillo (poda sanitaria/formativa, reposición puntual). En todos los casos, la selección final queda sujeta a disponibilidad en viveros, sanidad, homogeneidad del lote y aprobación/revisión.

De los dos paquetes entregados para el contrato, únicamente se identifican tres (3) puntos con implementación de ESVAP tipo matera:

ID	Localidad	Tipo de matera	Cantidad
2025_OSV-PEP_COLOMBA.2	Barrios Unidos	Matera Paralelepípedo	7 unidades
2025_OSV-PEP_COLOMBA.3	Barrios Unidos	Matera Alta CA-306-01	20 unidades
MV_08_001_1703_10_V6 – ESVAP V1 – 40C Sur	Kennedy	Matera Alta CA-306-01	23 unidades

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

8.4.1 Propuesta de material vegetal por tipología

A. Matera Alta CA-306-01

(Barrios Unidos y Kennedy)

Dado el volumen medio de este contenedor, se requiere una especie estructural de porte compacto, comportamiento radicular controlado y buena respuesta a poda ligera.

Estrato	Especie seleccionada	Cantidad	Función
Estructural	Dodonaea viscosa (porte juvenil controlado)	1	Volumen vertical, delimitación visual
Cobertura	Liriope muscari	4	Control de sustrato y estabilidad

Justificación técnica de las especies propuestas

Dodonaea viscosa

- Porte medio controlable (1.5–2 m en confinamiento).
- Sistema radicular no agresivo.
- Alta tolerancia a estrés urbano.
- Buena respuesta a poda formativa.
- Bajo requerimiento hídrico.
- Comportamiento estable en espacio público.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

Liriope muscari

- Especie ampliamente utilizada en jardinería urbana distrital.
- Excelente comportamiento en confinamiento.
- Cobertura densa que reduce evaporación.
- Bajo mantenimiento.
- No invasora.

B. Madera Paralelepípedo

(Barrios Unidos)

Debido a su menor volumen, no se recomienda inclusión de arbusto estructural.

Estrato	Especie seleccionada	Cantidad
Cobertura única	Liriope muscari	6–8

Justificación técnica

- Evita sobrecarga radicular.
- Reduce necesidad de poda estructural.
- Mantiene homogeneidad paisajística.
- Facilita reposición de marras.

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	““SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	
Contrato de Obra No. 2025-2991	INFORME FORESTAL MENSUAL	V.01

9. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2026, las actividades ejecutadas en los diferentes ID intervenidos se desarrollaron en entornos urbanos consolidados, sin afectación directa al recurso vegetal existente, manteniendo condiciones de mínima intervención sobre coberturas vegetales y arbolado urbano.
- ✓ El seguimiento forestal adelantado permitió verificar que las actividades civiles asociadas al proyecto no generaron impactos sobre zonas verdes adyacentes, garantizando el cumplimiento de los lineamientos distritales en materia de manejo del componente forestal.
- ✓ La selección del material vegetal propuesta para las ESVAP tipo matera se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C. y demás lineamientos técnicos distritales, priorizando especies no invasoras, de porte controlado, sistema radicular compatible con confinamiento y adecuada adaptación a condiciones de estrés urbano.
- ✓ La configuración vegetal definida para las materas en las localidades de Barrios Unidos y Kennedy garantiza viabilidad técnica en contenedor, bajo requerimiento de mantenimiento, estabilidad estructural y coherencia paisajística, asegurando sostenibilidad funcional y ambiental en el espacio público intervenido.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

<p align="center">INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL No 06 del 19 de enero al 18 de febrero de 2026</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA N° 2025-2991, cuyo objeto es el “<u>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</u>”</p>	
CONTRATISTAS	<p align="center">CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>  <p align="center">CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>
CLIENTE:	<p align="center">SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p>  <p align="center">BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
ELABORÓ CONTRATISTA	<p>ESTEBAN DAVID RUIZ LOPEZ Profesional SST</p>
	<p>Fecha: 25 de junio de 2026</p>
	<p>Firma: <i>Esteban David Ruiz López</i></p>
REVISÓ CONTRATISTA	<p>Helbert Alejandro Sanabria Ramírez Director de obra</p>
	<p>Fecha: 25 de junio de 2026</p>
	<p>Firma: </p>
APROBÓ INTERVENTORÍA	<p>Amparo Suárez Levette Profesional SST</p>
	<p>Fecha: 25 de junio de 2026</p>
	<p>Firma: <i>ASL</i></p>
APROBÓ INTERVENTORÍA	<p>Eliana Constanza Medina Pabuce Director de interventoría</p>
	<p>Fecha: 25 de junio de 2026</p>
	<p>Firma: Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUCE <small>Persona con Discapacidad - PCD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247</small></p>
VERSIÓN No.	2 respuesta oficio Interventoría (CMAG-355-2026)

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

Contenido

1.	GENERALIDADES DE LA GESTIÓN EN SGSST Y AMBIENTAL	4
1.1.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
1.2.	LOCALIZACIÓN	4
1.3.	ALCANCE	5
1.4.	OBJETIVO	5
1.5.	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	5
1.6.	MANEJO SST EN OBRA DE ACUERDO CON EL SG-SST	5
1.7.	RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES	6
2.	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	7
2.1.	PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	7
2.1.2.	Inducciones	10
2.1.3.	REGISTRO FOTOGRAFICO	11
2.1.4.	Capacitaciones y charlas	12
2.1.5.	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	13
2.1.6.	Ausentismo	14
2.1.7.	Condiciones de salud.....	14
2.2.	MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	15
2.2.1.	Vehículos	15
2.2.2.	Maquinaria	15
2.3.	SGSST.....	16
2.3.1.	Actividades realizadas	16
2.3.2.	Inspecciones	17
2.3.3.	EPP'S y Dotación.....	17
2.3.4.	Actividades críticas	18
2.3.5.	SGA	18
2.3.6.	PESV	19
2.3.7.	COPASST	22
2.3.8.	Comité de Convivencia Laboral	23
2.3.9.	Indicadores SGSST	24
2.3.10.	Accidentalidad	26
2.3.11.	Señalización y Demarcación en la Zona	27
2.3.12.	Preparación ante las emergencias	27

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

2.4.	INCLUSIÓN SOCIAL	32
2.0.1.2.	PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO	32
3.	GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA	33
3.1.	Manejo de residuos	33
3.1.1.	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.....	33
3.1.2.	Residuos Generados	33
3.1.3.	Disposición de residuos	34
3.1.4.	Balance	34
3.2.	Equipos.....	35
3.3.	Ruido	35
4.	CONCLUSIONES	36
5.	ANEXOS	36

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

INFORME DEL COMPONENTE SGSST Y AMBIENTAL

1. GENERALIDADES DE LA GESTIÓN EN SGSST Y AMBIENTAL

Período: 19 de Enero 2026 al 18 de Febrero 2026, versión 02

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el desarrollo de este proyecto, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, contribuye a garantizar condiciones de seguridad vial y accesibilidad para todos los ciudadanos. Este proyecto hace parte de las estrategias desarrolladas en los últimos años para recuperar el espacio público peatonal, así como mitigar conductas de riesgo de cruce transversal sobre las vías por lugares no regulados, y el redireccionamiento de los peatones a los cruces y lugares seguros y accesibles. Así, mediante la implementación de elementos de seguridad vial y accesibilidad peatonal - ESVAP se busca priorizar la circulación peatonal en sitios de mayor afluencia de peatones por la presencia de equipamientos atractores y generadores de viajes a pie y concurrencia de diversos actores viales que entran en conflicto, salvaguardando la vida del peatón o actor más vulnerable mediante la persuasión del viandante a utilizar los pasos seguros y el uso racional de la infraestructura dispuesta, evitando percances y conflictos con el tránsito vehicular.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha desarrollado un Documento Técnico de Soporte-DTS1 en el que se describen a detalle las definiciones, tipología, uso, lineamientos, criterios de selección, procesos y seguimiento a la instalación de elementos que mejoran la seguridad vial y accesibilidad peatonal. Este documento será base para la ejecución de las actividades objeto de este proceso y se complementará con las fichas técnicas de soporte - FTS y DTS de proyectos de urbanismo táctico, que serán entregadas por las diferentes Dependencias de la SDM mediante las cuales se oficializa y viabiliza la solicitud en cumplimiento del DTS.

1.2. LOCALIZACIÓN

Las actividades objeto de este proceso serán realizadas en el Distrito Capital, sobre las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte.

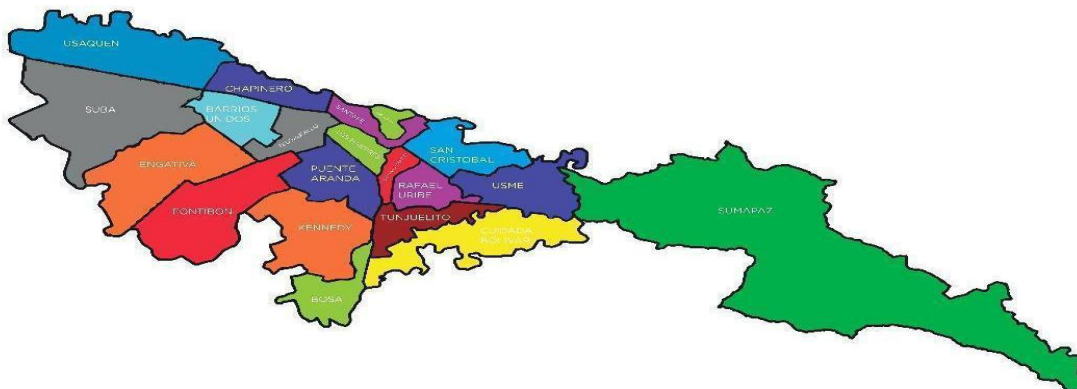


Ilustración 1. Localización del proyecto

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

1.3. ALCANCE

Suministrar e Implementar elementos de seguridad vial y accesibilidad peatonal en la ciudad de Bogotá D.C., en zonas priorizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, mejorando las condiciones de seguridad vial, protegiendo espacios públicos dedicados exclusivamente al tránsito de peatones y redireccionando a los usuarios a cruces seguros.

Durante la ejecución del contrato la SDM podrá modificar la priorización de los puntos de intervención asignados, con el fin de dar continuidad a acciones que permitan promover la seguridad vial en la ciudad, sin que esto implique mayores costos para la entidad o reclamación alguna.

1.4. OBJETIVO

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025 SAS, la cual tiene a cargo la ejecución del CONTRATO **SDM-LP-10-2025V**, cuyo objeto es el **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CANALIZACIÓN Y OTROS ELEMENTOS DE CONTROL AL TRANSITO PEATONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC”**; implementará las actividades establecidas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la normatividad Colombiana; con el fin de preservar y mantener las mejores condiciones de salud y bienestar de los trabajadores, en equilibrio con su entorno laboral; protegiéndolos de la exposición a las condiciones peligrosas generadas por el ambiente y las cuadrillas propia del trabajo, con la ayuda de recursos financieros, administrativos y humanos según el porcentaje de dedicación que la entidad (SDM) estableció para contrato.

1.5.ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

Durante el desarrollo del contrato se ejecutaron entre otras, las siguientes actividades, las cuales permiten el avance y cumplimiento de los requerimientos contractuales del mismo:

- Programación por ID según aprobación de diseños.
- Generar fichas técnicas en Base a la Visita.
- Elaboración e instalación de Plan de Manejo al Transito
- Respuesta oficios de Interventoría.
- Inducción en SST
- Entrega de Dotación
- Capacitación y Charlas preoperacionales
- Divulgación y Notificación de Riesgos.
- Afiliación al Sistema de Seguridad Social
- Entrega de dotación
- Supervisión SST y técnica en Campo

1.6. MANEJO SST EN OBRA DE ACUERDO CON EL SG-SST

Para el presente periodo, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas y de obra. Por lo que se aprovecha el tiempo y espacios para ejecutar actividades relacionadas en el plan de trabajo anual y cronograma de capacitaciones con el personal operativo y administrativo.

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

1.7. RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES


Teniendo en cuenta el objeto del contrato y las actividades naturales del mismo, se realizó el análisis y actualización de la matriz de identificación, evaluación y control de los riesgos con el fin de detectar los escenarios y actividades que tengan el potencial de causar un accidente de trabajo y/o enfermedades laborales. Dicha Matriz está en constante verificación en caso de que se tenga que actualizar si detecta algún otro riesgo, condiciones o controles evidenciados para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO
Retiro y acomodación de bolardos	Izaje de elementos en concreto	Golpes/ fracturas por caída del objeto
	Manejo de cargas	Dolores, afectaciones musculares
	Trabajo nocturno	Pérdida capacidad visual por condiciones de iluminación
	Trabajo en espacio público	Riesgos de seguridad
	Trabajo sobre vía vehicular	Riesgos de seguridad vial, atropellamiento de los trabajadores con consecuencias de golpes, fracturas o muerte.
	Demoliciones manuales, fundición de concretos	Riesgo Químico: Inhalación de polvos y partículas, contacto con químicos Riesgo Físico: Caída de Objetos, caída a diferente y mismo nivel. Vibraciones y ruido, por el uso de los equipos. Riesgo Eléctrico: Contacto con redes eléctricas ocultas.
Soldadura / Instalación de pasacalles / Pintura	Chispas y calor	Quemaduras
	Radiación UV/IR	Lesión ocular
	Energía eléctrica	Electrocución
	Humos metálicos	Afecciones respiratorias
	Bordes cortantes	Cortes
	Vapores y solventes Contacto químico	Intoxicación
Transporte de personal	Peligros viales	Accidentes de tránsito con consecuencias de golpe, fracturas, muerte
Demolición Manual y Fundición de concretos	Mecánico	Golpes, cortaduras, amputaciones, atrapamientos, Golpes, atrapamientos, cortes
	Locativo	Traumatismos, fracturas, lesiones graves, Caídas al mismo nivel o a diferente nivel
	Físico	Lesiones oculares, contusiones, Hipoacusia, fatiga auditiva, Golpe de calor, deshidratación
	Ergonómico	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas
	Eléctrico	Electrocución, quemaduras
	Biológico	Infecciones, alergias
	Público	Lesiones a terceros
	Químico	Quemaduras químicas, dermatitis

Tabla 1. Peligros y riesgos de las actividades en obra

Ver Anexo 1. Matriz de Identificación, evaluación y control de Riesgos.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

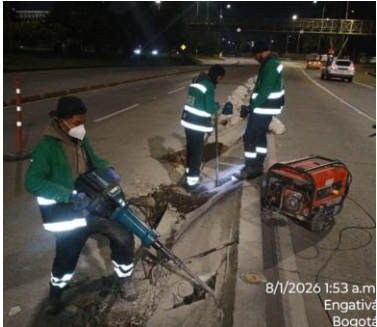 <p>14/01/2026 2:23:16 a. m. 4.6839794N 74.12312048W Engativá Bogotá</p>	 <p>8/1/2026 10:01 p.m. 12:34 a. m. Engativá Bogotá</p>
<p>Uso de Equipos y Maquinas</p>	<p>Instalación de PMT</p>
 <p>13/1/2026 11:48 p.m. Engativá Bogotá</p>	 <p>14/01/2026 2:28:07 a. m. 4.68399151N 74.123113867W Engativá Bogotá</p>
<p>Instalación de PMT</p>	<p>Trabajos con maquina</p>
 <p>8/1/2026 1:53 a.m. Engativá Bogotá</p>	
<p>Manejo de equipos</p>	

2. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A continuación, se relaciona el personal total activo que desarrolló actividades del contrato en este periodo, relacionando el número de planilla de seguridad social correspondiente a cada trabajador y fecha de pago de la misma. Cumpliendo de esta manera, legal y contractualmente con las afiliaciones al personal tanto directo como contratista.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

PERSONAL DIRECTO CONTRACTUAL - ACTIVO EN EL PERIODO						
DIRECTOS						
No	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO AL PROYECTO	EMPLEADOR	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA S. S
1.	Helver Alejandro Sanabria	Director De Obra	15/09/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726924
2.	Esteban David Ruiz López	Profesional SSTA	15/09/2025	G-Vial	23/02/2026	83105315
3.	Sergio Andrés Aranda	Residente De Obra	15/09/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726924
4.	Juan Carlos León	Residente De Obra	15/09/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726924
5.	Merlyn Katherine Caicedo	Ingeniero Forestal	15/09/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726783
6.	William Isaa Gámez Jiménez	Georeferenciador	25/09/2025	G-Vial	19/02/2026	83726924
7.	Luis Fernando Contreras Torres	Ayudante De Obra	11/11/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726924
8.	Rolan Yesid Pérez Monrroy	Ayudante De Obra	11/11/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726924
9.	Olvein Castro Valencia	Ayudante De Obra	27/10/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726924
10.	Luis Miguel Patiño Monroy	Ayudante De Obra	11/11/2025	Consorcio Seguridad Vial	19/02/2026	83726924
11.	Yeimy Viviana Cifuentes Castañeda	Ayudante de Obra	15/12/2025	G-Vial	23/02/2026	83192887
12.	Nancy Liliana Parra Herrera	Ayudante de Obra	15/12/2025	G-Vial	23/02/2026	83192887
13.	Yuli Paulin Rodríguez	Ayudante de Obra	15/12/2025	G-Vial	23/02/2026	83192887
14.	Angie Catalina Hernández Castillo	Secretaria	15/12/2025	G-Vial	23/02/2026	83105609
15.	Laura Valentina Sánchez Reyes	Auxiliar de Ingeniería	15/12/2025	G-Vial	23/02/2026	83105315
16.	Juan Felipe Fernández Cabrera	Ayudante de Obra	15/12/2025	G-Vial	11/02/2026	83104723

Tabla 2. Personal activo en el periodo

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

PERSONAL CONTRATISTA - ACTIVO EN EL PERIODO						
B&P SAS						
NIT: 901697034						
No	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO AL PROYECTO	EMPLEADOR	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA S. S
17.	Jhonnatan Sánchez George	Soldador Instalador	17/10/2025	P&B SAS	19/01/2026	27842016
18.	Nixon Jhovanny Zarate Romero	Residente	17/10/2025	P&B SAS	19/01/2026	27842016

Tabla 3 Relación personal Contratista B&P

PERSONAL CONTRATISTA - ACTIVO EN EL PERIODO						
INDUMALLAS Y ESTRUCTURA SAS						
NIT: 901214448						
No	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO AL PROYECTO	EMPLEADOR	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA S. S
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A

Tabla 4 Relación Personal Contratista Indumallas

2.1.1.1. Ingresos

Para el periodo, no se presentaron ingresos temporales, de personal directo de la compañía ni subcontratistas.

PERSONAL DIRECTO - INGRESOS EN EL PERIODO				
DIRECTOS				
N°	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA COMPAÑÍA	FECHA DE INGRESO AL PROYECTO
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 5. Personal ingresos en el periodo

2.1.1.2. Retiros

Para el presente periodo, el contratista Indumallas no cuenta con personal activo.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

PERSONAL RETIRADO EN EL PERIODO					
DIRECTOS					
No	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO AL PROYECTO	EMPLEADOR	FECHA DE RETIRO
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

Tabla 6. Personal retiros en el periodo

De acuerdo con las actualizaciones y el seguimiento realizado a la planta de personal, para el presente informe se registra un total de dieciocho **(18) trabajadores activos**. Esta misma cantidad fue tomada como base para el cálculo de los indicadores del SG-SST y de Inclusión Social. Lo anterior obedece principalmente a los retiros de personal ocurridos durante el periodo evaluado, los cuales impactaron la composición de la planta de trabajadores. Como soporte de lo anterior, en el Anexo 02 se adjunta la base de datos de personal actualizada al Informe No. 06.

Ver anexo 2. Base de datos de trabajadores, donde se relacionan los números de las planillas.

Ver anexo 3. Planillas de seguridad.

2.1.2. Inducciones

Las inducciones al personal hacen parte importante del proceso de ejecución de actividades ya que con esto se le informa al personal en general sobre los aspectos más importantes a la hora de ingresar a obra, en las inducciones realizadas se mencionan temas como; información general del consorcio, horarios, seguridad social, socialización de políticas, elementos de protección personal, orden y aseo en áreas de trabajo, autocuidado, riesgos a los que se encuentran expuestos, funciones, plan de emergencias, socialización de SST, responsabilidades, derechos y deberes de los trabajadores, entre otros temas tratados., los cuales varían dependiendo el cargo, para este mes se realizaron.

Dentro de la Inducción SSTA se divulgaron entre otros temas los siguientes:

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

- Reglamento interno de trabajo
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Políticas y Objetivos de SST, política ambiental, política PESV, política Tabaco, alcohol y drogas.
- Comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo
- Comité de convivencia laboral
- Llamados de atención
- Normas de seguridad en el sitio de trabajo
- Prevención y autocuidado en el trabajo
- Punto de encuentro
- Notificación de riesgos
- Elementos de protección personal
- Equipos de protección personal
- Orden y aseo/ Reciclaje
- Procedimiento de notificación de accidentes de trabajo
- Seguridad social (ARL, EPS, AFP, CCF)
- Identificación de riesgos y peligros
- Que hacer en caso de accidente
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Actividades rutinarias y no rutinarias
- PMT
- Plan de Emergencias y Brigadas.
- Disposición de residuos
- PESV

Para el presente periodo, no se realizaron inducciones en Seguridad y Salud en el trabajo

INDUCCIONES SST DEL PERIODO				
DIRECTOS				
Nº	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INDUCCION	TIPO DE INDUCCION
1.	N/A	N/A	N/A	N/A


Tabla 7 Relación Inducciones del Periodo

Ver Anexo 04. Registro de Inducciones SST.

2.1.3. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico que soporta la ejecución de algunas actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas durante el periodo del informe.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

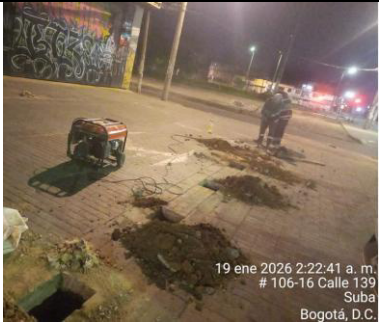 <p>19 ene 2026 3:55:15 a. m. # 106-4 Calle 139 Suba Bogotá, D.C.</p>	 <p>13/1/2026 11:48 p.m. Engativá Bogotá</p>
<p><i>Registro fotográfico supervisión SST – manejo de equipos</i></p>	<p><i>Registro fotográfico supervisión SST – Implementación de PMT</i></p>
 <p>19 ene 2026 2:22:41 a. m. # 106-16 Calle 139 Suba Bogotá, D.C.</p>	 <p>20/01/2026 4:24:53 a. m. 4.74195668N 74.09904603W 105-02 Calle 139 Suba Bogotá</p>
<p><i>Registro fotográfico Gestión Ambiental – Orden y aseo de la zona</i></p>	<p><i>Registro fotográfico Gestión Ambiental – Orden y aseo de la zona</i></p>
 <p>19 ene 2026 1:38:35 a. m. # 106-25 Calle 139 Suba Bogotá, D.C.</p>	 <p>19 ene 2026 12:02:18 a. m. # 106-16 Calle 139 Suba Bogotá, D.C.</p>
<p><i>Registro fotográfico supervisión SST – uso de maquinas</i></p>	<p><i>Registro fotográfico supervisión SST – herramientas manuales</i></p>

2.1.4. Capacitaciones y charlas

Las capacitaciones – charlas SST se realizan en espacios libres de los tramos de trabajo y/o centros de trabajo, donde se le transmite los conocimientos al personal y con esto se garantiza con los respectivos temas, el compromiso y la responsabilidad en la ejecución de actividades diarias para el periodo.

Para este presente periodo, se apoyan las diferentes campañas del SG SST con el fin de dar cumplimiento del Plan de trabajo Anual y el Cronograma de capacitaciones. (Mes Diciembre) Las siguientes actividades son

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

el resultado de las programaciones establecidas y la ejecución del 100% de las actividades programadas. Por otra parte, se continuará en los siguientes periodos, mejorando la cobertura de dichas actividades:

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Nº	FECHA	TEMA	CAPACITADOR	PATICIPAN TES	TIPO
1.	02/01/2026	Prevención de lesiones osteomusculares	Profesional SST	9	PROGRAMADA
2.	04/01/2026	Uso de EPP	Profesional SST	9	PROGRAMADA
3.	07/01/2026	Trabajo en equipo	Profesional SST	9	PROGRAMADA
4.	08/01/2026	Orden y aseo	Profesional SST	9	PROGRAMADA
5.	09/01/2026	Procedimiento seguro de trabajo	Profesional SST	9	PROGRAMADA
6.	12/01/2026	Cultura preventiva en riesgos físicos	Profesional SST	9	PROGRAMADA
7.	13/01/2026	Implementación PMT	Profesional SST	9	PROGRAMADA
8.	14/01/2026	Accidentes en la vía	Profesional SST	9	PROGRAMADA

Tabla 8 Relación de capacitaciones y charlas al personal.

Ver anexo 5. Capacitaciones y Charlas

2.1.5. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Por medio de Capacitaciones, charlas y demás actividades en campo, se divulgan semanalmente los riesgos a los cuales está expuesto el personal al momento de ejecutar las actividades propias del cargo. De igual manera se divulga los controles necesarios y responsables para prevenir cualquier tipo de incidente y accidente de trabajo. Los documentos diligenciados semanalmente corresponden al Análisis de Trabajo Seguro y Permiso de Trabajo Seguro, los cuales están firmados por el Residente SST, Residente de Obra y trabajadores involucrados en las actividades. De igual manera en la inducción SST, se aprovecha para notificar a los trabajadores que ingresan a la compañía y al proyecto, sobre los diferentes riesgos a los cuales están expuestos según el cargo. Recalcando principalmente el Riesgo Biomecánico, público y Accidentes de tránsito.

Para el presente informe, no se llevaron a cabo notificaciones de riesgo .

NOTIFICACION DE RIESGOS SST DEL PERIODO			
DIRECTOS			
Nº	NOMBRE	CARGO	TIPO DE INDUCCION
1.	N/A	N/A	N/A

Tabla 9 Relación de capacitaciones y charlas al personal.

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

Ver anexo 6. Notificación de riesgos.

2.1.6. Ausentismo

Para el presente periodo, no se presentan incapacidades.

Trabajador	Cargo	Cant. Días ausentes	Causa
NA	NA	NA	NA

Tabla 10 Ausentismo del personal.

2.1.7. Condiciones de salud

Los exámenes Ocupacionales se realizan con el fin de cumplir el decreto 2346 de 2007 estos se ofrecen a todos los trabajadores de la empresa Consorcio Seguridad Vial Bogotá 2025 que ingresan, laboran o egresan de la compañía. La información que se obtiene queda consignada en la historia clínica ocupacional del paciente.

Todo el personal que ingreso al contrato cuenta con exámenes médicos ocupacionales de ingreso dando cumplimiento a los procedimientos internos de SST y RRHH, entre los que se encuentra el examen médico general y paraclínicos (visiometría, audiometría y osteomuscular). De igual manera se realiza la divulgación al trabajador, sobre las recomendaciones médicas, con base en los resultados del EMO.

De igual manera se relaciona la IPS contratada para la ejecución de los Exámenes Periódicos Ocupacionales y los respectivos soportes que avalan su correcto funcionamiento.

IPS APROBADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EMO			
Nº	NOMBRE	RESOLUCIÓN	SERVICIOS OFRECIDOS
1	EFI CIENCIA OCUPACIONAL LTDA.	10964 de 2013	-Certificación Para Trabajo En Alturas Y Espacios Confinados -Examen Ocupacional De Ingreso -Examen Ocupacional De Egreso. -Examen Ocupacional Periódico. -Examen Post-Incapacidad O De Reubicación Laboral. -Certificación Para Manipulación De Alimentos. -Exámenes De Laboratorio Clínico. -Pruebas Para Detección De Sars-Cov-2 (Covid 19).

Tabla 11 IPS Aprobada

Para el periodo, no se llevaron a cabo exámenes médicos ocupacionales.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

RELACIÓN EMO DEL PERIODO						
ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	RECOMENDACIONES MEDICAS	RESTRICCIONES MÉDICAS	TIPO DE EXAMEN	FECHA	CONCEPTO
1						
2						

Tabla 12 Relación EMO del Periodo

Ver Anexo 07. Exámenes Médicos Ocupacionales.

Ver Anexo 08. Recomendación Médicas Laborales.

2.2. MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHICULOS

2.2.1. Vehículos

Para el presente periodo, se relacionan los vehículos que fueron aprobados y están vinculados al desarrollo del contrato, dichos vehículos se utilizaron en el contrato a partir del 16 de septiembre, día en que iniciaron actividades en campo:

Para el presente periodo solo se contó con la participación de los siguientes vehículos:

VEHÍCULOS						
ITEM	VEHÍCULOS	PLACA	EMPRESA	SOAT	TECNOMECANICA	ESTADO
1.	CAMION	KYR 221	G-VIAL	5/09/2026	17/03/2026	ACTIVO
2.	CAMION (OCASIONAL)	JOW459	INDUMALLAS	17/10/26	10/10/26	ACTIVO
3.	CAMIONETA	LZM699	CONSORCIO	11/06/2026	18/06/2026	ACTIVO

Tabla 13 Relación de Vehículos del periodo

Ver Anexo 09 Maquinaria - Equipos y Vehículos. En el que se encuentran todos los documentos de los vehículos con los cuales se autorizó su uso en el proyecto.

Diariamente el contratista realiza los pre operacionales con el fin de verificar el estado antes de su uso.

2.2.2. Maquinaria

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

A continuación, se relacionan los equipos mínimos requeridos, que fueron adquiridos y aprobados para el desarrollo del contrato.

EQUIPOS						
ITEM	TIPO	SERIAL Y/O MARCA	EMPRESA	FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO	FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO	ESTADO
1	DEMOLEDOR	MAKITA	GVIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de marzo de 2026	ACTIVO
2	PLANTA ELÉCTRICA	HUSQVARNA	GVIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de marzo de 2026	ACTIVO
3	PLANTA ELÉCTRICA	BAUKER	GVIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de marzo de 2026	ACTIVO
4	EQUIPO SOLDADURA	ELITE	GVIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de marzo de 2026	ACTIVO

Tabla 14 Relación de Máquinas y Equipos

Ver anexo 09. Maquinaria - Equipos y Vehículos

2.3. SGSST

2.3.1. Actividades realizadas

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), al igual que cualquier otro sistema de gestión basado en el ciclo de mejora continua o ciclo PHVA, será eficaz en la medida en que las desviaciones que se presenten con respecto a las metas y requisitos establecidas puedan ser identificadas y corregidas de manera oportuna. Sin la aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación no es posible determinar si se cumplen o no los objetivos definidos, ni efectuar comparaciones de los resultados obtenidos en los diferentes ciclos de gestión. El Decreto 1072 de 2015, en su parte 2, libro 2, título 4, capítulo 6, establece unos mecanismos de seguimiento, como la auditoría, la rendición de cuentas, la revisión gerencial y la medición de indicadores de estructura, proceso y resultado, y adicionalmente la Resolución 312 de 2019 adopta un instrumento para la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST y define una serie de indicadores de impacto, las organizaciones son libres de incorporar herramientas de medición complementarias, toda vez que estas pueden aportar valor al sistema de gestión.

Se avanza en el cumplimiento de las actividades relacionadas en el plan de trabajo anual del SG-SST, de igual manera en el cumplimiento de las capacitaciones relacionadas en el cronograma de capacitaciones anual.

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

Ver anexo 10. SG-SST.

2.3.2. Inspecciones

Las inspecciones son realizadas para identificar el buen estado o las posibles fallas que se puedan presentar en el elemento evaluar, y con esto dar los correctivos pertinentes, y garantizar que la herramienta/equipo están en buenas condiciones antes de su uso, las inspecciones se realizan de acuerdo con el cronograma establecido por el SG-SST.

Para el presente informe se adjuntan los soportes de inspección de los MEV y elementos de emergencia disponibles en el proyecto.

INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO		
INSPECCIÓN	CANTIDAD DE INSPECCIONES EJECUTADAS	FRECUENCIA
Inspección Camilla y Botiquín de Emergencia	3	Mensual
Inspección taladro Eléctrico	2	Antes de su uso
Planta Eléctrica	2	Antes de su uso
Vehículos	3	Antes de su uso
Equipo de Soldadura	1	Antes de su uso
Nota: La frecuencia de inspecciones de Vehículos, máquinas y herramientas está sujeta a la relación de días en que sean manipulados, esto debido a que no siempre se utilizan en el periodo por diferentes motivos (Cancelación por lluvia, mantenimientos, traslados etc.)		

Tabla 15 Relación de Inspecciones

Ver Anexo 11. Inspecciones de Seguridad.

2.3.3. EPP'S y Dotación

Todo el personal que ingresa a la compañía, se le debe suministrar la dotación acorde a las actividades que vaya a realizar, también se debe realizar el respectivo cambio de los elementos cuando presenten deterioro o daño y así garantizar que el personal cuenta con su dotación ya que esta es la primera barrera que mitiga las consecuencias de un posible suceso repentino.

RELACIÓN DOTACIÓN ASIGNADA EN EL PERIODO			
Nº	NOMBRE	FECHA	DOTACIÓN Y EPP ENTREGADO
1.			
2.			
3.			

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

Tabla 16 Relación Entrega de EPP y Dotación del periodo

Ver anexo 12. Entrega de dotación

2.3.4. Actividades críticas

Para el presente periodo, se ejecutaron actividades de soldadura, para las cuales se diligenciaron los respectivos PTS.

2.3.5. SGA

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es el de suministro e instalación de sistemas de canalización y otros elementos de control al tránsito, a continuación, se relacionan las Sustancias Químicas que se van a utilizar en el transcurso del desarrollo del contrato.

Para el presente periodo, se actualiza la base de datos y se incluye dentro del SGA, las fichas técnicas, con el fin de divulgar con el personal y se realiza capacitación en Etiquetado y pictogramas según el SGA. De igual manera se incluye plantilla para el etiquetado y rotulado de recipientes, la cual se implementará en el siguiente periodo, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento.

		FORMATO DE ETIQUETA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS		CÓDIGO: FOR-SST-086 VERSIÓN: 1 FECHA: 1/01/2023 PAGINA: 1 DE 1
---	--	---	--	---

1.) NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA							
4.) PICTOGRAMAS SGA		2.) PALABRA DE ADVERTENCIA		INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA			
				CONCENTRACIÓN: %			
							
				3.) INDICACIONES DE PELIGRO (H)			
				SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO			
				5.) INDICACIONES DE PRUDENCIA (P)			
		EPP		6.) INFORMACION DEL FABRICANTE			
				DIRECCIÓN:			
				TELÉFONO:			
				RESPONSABLE:			
				FECHA TRASVASE: DÍA: MES: AÑO:			
NÚMERO UN		    					
NÚMERO CAS							

Ilustración 2. Etiqueta de sustancias químicas

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

RELACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
PRODUCTO	HOJA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN HOJAS DE SEGURIDAD	ACTIVIDADES / USO	CHARLA PREOPERACIONAL SOBRE SU USO
Cemento	SI	- vehículo y Bodega Principal.	- instalación de Sistemas de canalización.	Prevención Riesgo Químico
Gasolina	SI	- vehículo y Bodega Principal.	- combustible para el encendido de máquinas y Planta de Electricidad.	Prevención Riesgo Químico
Alcohol Antiséptico	SI	- vehículo y Bodega Principal.	- desinfección de manos y Equipos.	Prevención Riesgo Químico
Aceite Lubricante	SI	- vehículo y Bodega Principal.	- lubricación de Máquinas y Equipos	Prevención Riesgo Químico
Epóxico	SI	- vehículo y Bodega Principal.	- instalación de Sistemas de canalización.	Prevención Riesgo Químico
Catalizador	SI	- vehículo y Bodega Principal.	- instalación de Sistemas de canalización.	Prevención Riesgo Químico
Desengrasante	SI	- vehículo y Bodega Principal.	- atención de emergencias	Prevención Riesgo Químico

Tabla 17 Relación productos químicos

Ver anexo 14. Manejo de Sustancias Químicas

Las fichas de seguridad de estos productos se encuentran en los vehículos que las transportan.

2.3.6. PESV

En la actualidad el Consorcio Seguridad Vial Bogotá 2025, se encuentra adelantando un Plan estratégico de Seguridad vial acorde al número de vehículos y conductores. Para el presente informe se adjunta el seguimiento a multas y comparendos y de igual manera la creación del documento Competencias para Cargos y Roles. Los cuales se adjuntan en el anexo 10.

2.3.6.1. Conductores

Los conductores que ejecutaron actividades en este período son:

En cuanto al trabajador Harold Enrique Mercado, teniendo en cuenta que para el presente periodo se presentó el retiro de la empresa, no se puede continuar con el control y seguimiento a las multas.

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

En cuanto a la señora María Elena Castro, nos permitimos informar que su presencia en el proyecto fue ocasional y/o casi nula, por lo que no se relaciona en el personal contractual, de igual manera con el conductor de la Grúa. No obstante, se adjunta la respectiva seguridad social.

Con respecto al Señor Belaunder su presencia en el proyecto fue ocasional por lo que no se relaciona en el personal contractual.

Nombre	Identificación	Comparendos en los últimos 12 meses	Curso manejo defensivo	Curso transporte sustancias peligrosas	Vigencia licencia conducción	Observaciones
BELAUNDER ORTEGÓN PATIÑO	93.120.818	NO	NO	NO	09/01/2026	No presenta reportes por comparendos y multas
MARIA ELENA CASTRO ESGUERRA	52.170.260	NO	NO	NO	27/11/2026	No presenta reportes por comparendos y multas

Tabla 18 Conductores del Contratista

2.3.6.2. Indicadores plan de trabajo

De acuerdo con el paso 20 de un PESV básico se deben reportar los siguientes indicadores:

Nombre del Indicador	Fórmula / Unidad	Meta Anual	Evidencia / Soporte	Resultado	Observaciones	Análisis de resultados
Nº de capacitaciones realizadas	Conteo	≥ 2	Listas de asistencia	1/1=100%	Actividades incluidas en el programa de capacitación para el presente periodo	Se ejecutan la actividad programada en el periodo
% de trabajadores capacitados	$(\text{Capacitados} / \text{Total}) \times 100$	$\geq 80\%$	Informe de RRHH	9/18= 0.5%	Actividad de capacitaciones ejecutadas con el personal activo en el periodo.	Se cuentan con 18 trabajadores aprobados, sin embargo solamente estuvieron 12 trabajadores fijos activos en el periodo.
Nº de campañas de sensibilización	Conteo	≥ 1	Material gráfico / fotos	0	Campaña interna o externa	NA
Nº de incidentes viales registrados	Conteo	0	Reportes de siniestros	0	Incluye incidentes leves	NA
Tasa de siniestralidad por km	$(\text{Incidentes} / \text{Km recorridos}) \times 100,000$	≤ 5	Registro de recorridos	NA	Solo si aplica	NA
Nº de infracciones de	Conteo	≤ 2	Comparendos/ notificaciones	0	No se presentaron infracciones	Los conductores del periodo no presentan

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

Nombre del Indicador	Fórmula / Unidad	Meta Anual	Evidencia / Soporte	Resultado	Observaciones	Análisis de resultados
tránsito						comparendos.
% de acciones del PESV ejecutadas	(Acciones ejecutadas / Total) × 100	≥ 90%	Cronograma / plan anual	02/02= 100%	Seguimiento a comparendos y creación del documento Identificación de riesgos viales	NA
% de vehículos con revisión vigente	(Vehículos con RTM / Total) × 100	100%	Certificados RTM	3/3= 100%	Todos los certificados se encuentran vigentes	Todos los certificados se encuentran vigentes
% de vehículos con SOAT vigente	(Vehículos con SOAT / Total) × 100	100%	Pólizas SOAT	3/3= 100%	Las pólizas tipo SOAT se encuentran vigentes	Las pólizas se encuentran vigentes
Nº de acciones correctivas implementadas	Conteo	≥ 1	Actas de auditoría	NA	NA	NA
% de cumplimiento de metas del PESV	(Metas cumplidas / Total) × 100	≥ 90%	Informe de seguimiento	2/2 = 100%	Se ejecutan las actividades programadas en el periodo, sin embargo el PESV se encuentra en su etapa inicial.	Se ejecutan las dos actividades programadas en el periodo

Tabla 19 Indicadores PESV del Contratista

2.3.6.3. Mantenimiento

La organización establece los pasos que se tendrán en cuenta para realizar el mantenimiento, las obligaciones que se generan, el esquema de los planes de mantenimiento, los tipos de mantenimiento que se realizarán y los encargados de realizarlos, el sistema de información para realizar el mantenimiento, el contenido de las capacitaciones que se brinden a los trabajadores sobre el mantenimiento que deben realizar sobre los equipos, máquinas y herramientas que utilicen, entre otros aspectos.

Así mismo, el programa de mantenimiento de equipos, máquinas y herramientas se constituye como una medida de prevención y protección en donde se especifican los procedimientos adecuados y seguros que se tendrán en cuenta para realizar el mantenimiento sin afectar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores ni el funcionamiento de la empresa.

Para el presente informe no se realizaron mantenimientos preventivos ni correctivos, para el siguiente informe se adjuntarán los que apliquen según el cronograma de mantenimiento y/o novedades presentadas.

RELACION MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO					
ITE	VEHÍCULOS	RELACION DE MANTENIMIENTO	ULTIMO MANTENIMIENTO	FECHA DE RE -	ESTADO

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

M		SEGÚN CRONOGRAMA	O	PROGRAMA CION	
1.	CAMION KYR 221	N/A	30/10/2025	30/01/2026	Operativo
2.	CAMIÓN JOW 459	N/A	25/10/2025	25/01/2026	Operativo
3.	CAMIONET ALZM699	N/A	10/11/2025	10/01/2026	Operativo

Tabla 20 Relación Mantenimientos Ejecutados en el Periodo.

2.3.7. COPASST

2.3.7.1. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO COPASST Y COCOLA

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral los cuales, apoyan la ejecución de actividades que emanan del SG-SST, incluidos los cronogramas que promueven la promoción y prevención no solo de incidentes sino también de accidentes y enfermedades laborales y prevención del riesgo psicosocial, contribuyendo así un ambiente de trabajo seguro.

Para el presente periodo se adjunta acta de la última reunión de cada Comité., dando así cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral los cuales, apoyan la ejecución de actividades que emanan del SG-SST, incluidos los cronogramas que promueven la promoción y prevención no solo de incidentes sino también de accidentes y enfermedades laborales y prevención del riesgo psicosocial, contribuyendo así un ambiente de trabajo seguro.

Para el presente periodo se adjunta acta de la última reunión de cada Comité, dando así cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986.

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

**ACTA N° 12
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS.**



Fecha: 22/01/2026

Ciudad

Bogotá D.C

Lugar. Sede presencial Niza & Modalidad Virtual

Dirección: Cra. 70f No 125b – 43

El día 22 de enero de 2026 siendo las 08:00 a.m. en el marco del cumplimiento de la normatividad legal vigente se adelanta y da inició a la reunión **No 13** del presente año de forma presencial con los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con el cuórum correspondiente; cuyo objetivo es el siguiente:

OBJETIVO:

Realizar la Reunión Mensual del Comité COPASST – Verificando y ejecutando los temas según el orden del día, cumpliendo de esta manera con la normatividad legal vigente.

Ilustración 1 Acta COPASST

2.3.8. Comité de Convivencia Laboral

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

ACTA N° 1 COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS.	
--	---

Fecha: 26/01/2026

Ciudad

Bogotá D.C

Lugar. Sede presencial Niza & Modalidad Virtual



Dirección: Cra. 70f No 125b – 43

El día 26 de Enero de 2026 siendo las 08:00 a.m. en el marco del cumplimiento de la normatividad legal vigente se adelanta y da inicio a la reunión No 2 del presente año de forma presencial con los integrantes del Comité Convivencia Laboral, cumpliendo con el quorum correspondiente; cuyo objetivo es el siguiente:

OBJETIVO:

Realizar la Reunión Mensual del Comité Convivencia Laboral – Verificando y ejecutando los temas según el orden del día, cumpliendo de esta manera con la normatividad legal vigente.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CEDULA	ROL	FIRMA
Valentina Sánchez	1.005.716.497	Principal	
Franci Liliana González Pérez	1.022.371.246	Principal	

Ver Anexo 15. Comités SGSST

2.3.9. Indicadores SGSST

Para el periodo evaluado se presentan novedades en los indicadores, teniendo en cuenta que estos se reportan con corte al último día calendario del mes. En ese sentido, el presente informe (19 de enero al 18 de febrero 2026)

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

N°	INDICADOR	RESULTADO	FORMULA	PERIODICIDAD
1	Frecuencia De La Accidentalidad	Para el periodo, no se presentaron accidentes de trabajo por la cual no se genera novedad en el indicador Se mantiene en 0	$(\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes (0) / Número de trabajadores en el mes (18)} * 100$	Mensual (enero 2026)
2	Severidad De La Accidentalidad	Para el periodo, no se presentaron accidentes de trabajo por la cual no se genera novedad en el indicador Se mantiene en 0	$(\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes (0) / número de días cargados en el mes (0) / Número de trabajadores en el mes (18)} * 100$	Mensual (enero 2026)
3	Proporción De La Mortalidad	Para el periodo, no se presentaron accidentes de trabajo mortales, razón por la cual no se genera novedad en el indicador Se mantiene en 0	$\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año} * 100$	Mensual (enero 2026)
4	Prevalencia De La Enfermedad Laboral	Para el periodo, no se presentaron ni reportaron enfermedades laborales razón por la cual no se genera novedad en el indicador Se mantiene en 0	$(\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}) * 100.000$	Mensual (enero 2026)
5	Incidencia De La Enfermedad Laboral	Para el periodo, no se presentaron ni reportaron enfermedades laborales razón por la cual no se genera novedad en el indicador Se mantiene en 0	$:(\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}) * 100.000$	Mensual (enero 2026)
6	Tasa De Accidentes Por Mes	Se presentó (0) AT accidentes de trabajo en el periodo	0	Mensual (enero 2026)
7	Ausentismo Medico	Para el periodo, no se presentaron casos de ausentismo ni por enfermedad general ni AT, razón por la cual no se modifica en indicador el cual	$(\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes (0) / Número de días de trabajo programados en$	Mensual (enero 2026)

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

		es 0	el mes 30 * 100	
8	Promedio De Trabajadores	Para el presente periodo, se contó con la participación de 18 trabajadores directos del consorcio y subcontratistas y activos en el desarrollo del contrato.	Suma del total de trabajadores reportados en el mes	Mensual (enero 2026)
9	Horas Hombre Trabajadas	Las HHT para este periodo son 4320	:(Número de días trabajados en el mes * horas trabajadas en el día * promedio de trabajadores en el mes) (30*8*18)	Mensual (enero 2026)

Tabla 21 Resumen Indicadores del Periodo

2.3.10. Accidentalidad

Para el presente período no se presentaron accidentes de trabajo.

Indicadores Accidentabilidad	% de accidentabilidad por mes							
	2025- 02							
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
No. total, de trabajadores accidentados en el mes	0	0	1	0				
No. total, de trabajadores en el mes	31	16	35	26				
HHT	2232	3968	8400	6240				
Indicadores Accidentabilidad	% de accidentabilidad por mes							
	2026 – 01							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
No. total, de trabajadores accidentados en el mes	-0	-	-	-	-	-	-	0
No. total, de trabajadores en el mes	-18	-	-	-	-	-	-	0
HHT	4320	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 22 Relación Porcentaje de accidentabilidad por mes

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

2.3.11. Señalización y Demarcación en la Zona

Se verifica en obra la implementación de los esquemas de PMT de acuerdo con la longitud y localización de las obras, desde el punto de vista de que ofrezca seguridad para el personal que está trabajando dentro del cerramiento y alrededor.



Ilustración 2 Registro Fotográfico PMT

2.3.12. Preparación ante las emergencias

El plan de emergencias de Consorcio Seguridad Vial Bogotá 2025; es un conjunto de acciones y procedimientos para la atención de un siniestro que afecte directa o indirectamente a la Entidad, con el objeto de reducir los daños a los factores humanos, los recursos y los sistemas y procesos. Con base en lo anterior, la organización brinda la formación de sus brigadista, adquisición de recursos de Emergencia y disposición de tiempo para la ejecución de actividades en cumplimiento del plan de Emergencias.

A continuación, se relacionan los recursos con los que cuenta la brigada de Emergencia:

Botiquín: Elemento destinado a contener los utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios, el botiquín se encuentra en el vehículo donde el personal se traslada para la ejecución de las actividades en campo. Dicho elemento se encuentra ubicado en el vehículo de la empresa, el cual está 100% en campo.

Camilla rígida: Dispositivo utilizado en situaciones de emergencia para la inmovilización y traslado de pacientes en casos de evacuación, rescate y primeros auxilios, tanto para transportar de un lugar a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una situación de emergencia. Dicho elemento se encuentra ubicado en el centro de trabajo de la compañía

Extintor: Cumple una función de vital importancia en el plan de protección contra incendios de la obra puesto que, si llegase a ocurrir un incendio, son los primeros elementos que se usan para intentar controlarlo. Dicho elemento se encuentra ubicado en el vehículo de la empresa, el cual está 100% en campo.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

Kit de Derrames: Contiene los elementos necesarios (pala, cordones, paños absorbentes, bolsas rojas, guantes de nitrilo solvex, protección respiratoria media máscara, traje tyvek, monogafas y cinta de demarcación) para contener un derrame mínimo o menor de algún material peligroso. Dicho elemento se encuentra ubicado en el vehículo de la empresa, el cual está 100% en campo.

ELEMENTOS DE EMERGENCIA	
<p>Camilla de Primeros Auxilios</p>	
<p>Kit de derrames</p>	
<p>Botiquín de Primeros auxilios</p>	

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

<p>Extintor.</p>	
------------------	--

Tabla 23 Elementos de Emergencia

2.3.12.1. Situaciones de emergencia presentadas

En este período no se presentaron situaciones de emergencia.

2.3.12.2. Simulacros realizados

Para el periodo no se realizaron simulacros de emergencia.

Ver anexo 16. Plan de Emergencias

2.3.12.3. Inspecciones

Inspección	Fecha	Hallazgos
Botiquín	08/01/2026	Sin novedad
Camilla	08/01/2026	Sin novedad
Extintor	N/A	Sin novedad

Tabla 24 Inspecciones a elementos de emergencia del contratista

2.3.12.4. Brigada de emergencias

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

ESTRUCTURA DE LA BRIGADA

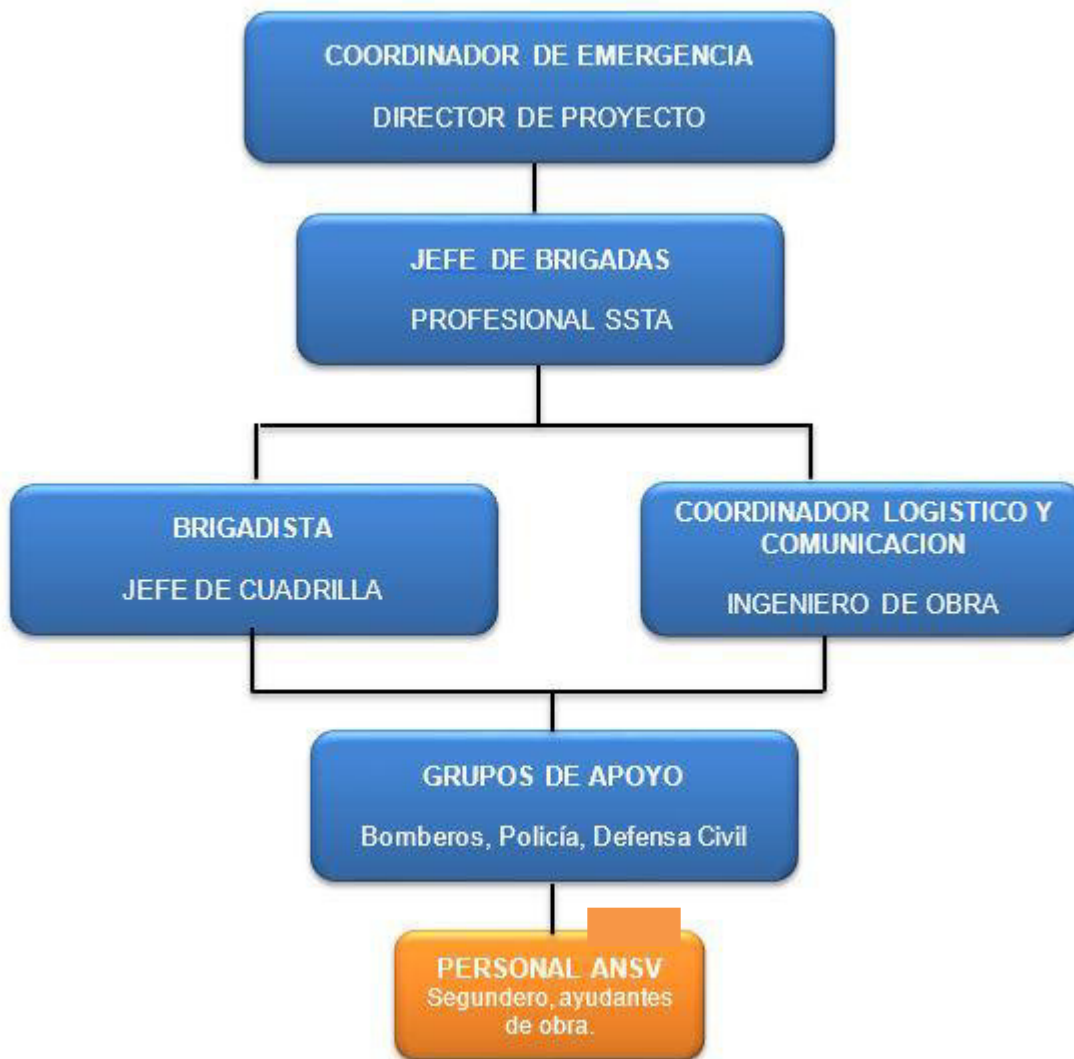


Ilustración 3 Estructura Brigada de Emergencias

2.0.1.1. **BRIGADISTAS:**

Con el fin de atender los diferentes eventos no deseados en cualquiera de los puntos de intervención, la compañía está en el proceso de entrenamiento y capacitación de los brigadistas y futuros brigadista, los cuales estarán distribuidos en todos los frentes de trabajo.

De igual manera, se realiza seguimiento a la lista de contactos de emergencia del personal, alimentando las hojas de vida de los diferentes colaboradores y brigadistas del contrato.

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

Se adjunta listado de emergencia del personal y brigadistas asignado al proyecto, con el fin de contar con los números de emergencia, seguridad social, recomendaciones médicas etc. Con el fin de poder actuar de la mejor manera en caso de que se presente algún evento no deseado y Capacitación Brigadas de Emergencia.

Se adjunta listado de emergencia del personal y brigadistas asignado al proyecto, con el fin de contar con lista números de emergencia, seguridad social, recomendaciones médicas etc. Con el fin de poder actuar de la mejor manera en caso de que se presente algún evento no deseado y Capacitación Brigadas de Emergencia. De igual manera, en el presente informe se adjuntan los soportes de formación, hojas de vida y acta de conformación de Brigada de Emergencia acorde al periodo del informe.

BRIGADISTAS ACTIVOS.		
Nº	NOMBRE	TIPO DE BRIGADISTA
1.	Esteban David Ruiz López	INTEGRAL
2.	Laura Valentina Sanchez	INTEGRAL
3.	Yeimy Viviana Cifuentes	INTEGRAL
4.	Yuli Paulin Rodríguez	INTEGRAL
5.	Castro Valencia Olvein	INTEGRAL

Tabla 25 Brigadistas Activos

Ver anexo 16. Plan de Emergencias

2.3.12.5. Capacitaciones y charlas sobre emergencias

En el presente periodo, según nuestro cronograma de capacitaciones no se tienen programados temas relacionados a emergencias.

Tema programado	Fecha ejecución	Cant. Asistentes	% de cobertura= Cant asistentes/ Personal del periodo
-	-	-	-
Tema no programado	Fecha ejecución	Cant. Asistentes	% de cobertura= Cant asistentes/ Personal del periodo
-	-	-	-

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

Tabla 26 Relación de capacitaciones y charlas al personal del Contratista sobre Emergencias

2.4. INCLUSIÓN SOCIAL

2.0.1.2. PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el presente informe se relaciona el personal que se tiene asignado al proyecto y que cumple con los diferentes porcentajes contractuales. Sin embargo, no se realiza en ingreso y la solicitud formal a la interventoría para la aprobación de algunos de ellos, teniendo en cuenta que el contrato por ser su etapa inicial no lo amerita. Ejercicio realizado con base en el total del personal del periodo (27).

Indicador	Mín	Consideraciones	Personal ofrecido	Cant. en el periodo	Personal total	Resultado
Mano de obra no calificada local	10%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 10 Num 1	Olvein Castro Valencia	1	4	Cumplimiento con el 15.38%
			Luis Miguel Patiño	1		
			Luis Fernando Contreras Torres	1		
			Miguel Eduardo Pulido Martínez	1		
Mano de obra no calificada local- mujeres	5%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 10 Num 1	Cifuentes Castañeda Yeimy Viviana	1	3	Cumplimiento con el 11.54 %
			Yuli Paulin Rodríguez	1		
			Nancy Liliana Parra Herrera	1		
Participación de mujeres	13.8%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 11 Num 37	Laura Valentina Sánchez Reyes	1	5	Cumplimiento con el 19. 23 %
			Merlyn Katherine Caicedo Villamarín	1		
			Nancy Liliana Parra Herrera	1		
			Yuli Paulin Rodríguez	1		
			Hernández Castillo Angie	1		
Participación de jóvenes (18-28 años)	5%	Profesionales o tecnólogos CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 11 Num 38	Hernández Castillo Angie	1	2	Cumplimiento con el 7.69 %
			Laura Valentina Sánchez Reyes	1		
Personal vulnerable	5%	CONTRATO DE OBRA No. 2025-2991. Cláusula 10	Juan Felipe Cabrera	1	2	Cumplimiento con el 7.69 %
			Luis Miguel Patiño Monroy	1		

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

		Num 48	William Ducuara Guerra	0		
--	--	--------	------------------------	---	--	--

Tabla 27 Indicadores de inclusión social del contratista

3. GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

3.1. Manejo de residuos

3.1.1. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Para el presente periodo no se realiza disposición final de residuos (RCD) ni residuos peligrosos, lo anterior debido que los residuos se encuentran en el punto de acopio.

RELACIÓN CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN PERIODOS ANTERIORES				
Nº	MATERIAL	CANTIDAD	FECHA DE RECOLECCION	INFORME SST
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 28 Relación de Certificados RCD

RELACIÓN CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN PRESENTE PERIODO				
Nº	MATERIAL	CANTIDAD	FECHA DE RECOLECCION	INFORME SST
1	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 29 Relación de Certificados de Disposición Presente Informe

3.1.2. Residuos Generados

Para la actividad realizada no se generaron residuos.

Tipo de Residuo	Clasificación	Fuente de Generación	Cantidad Generada	Cant. Acum.	Unidad	Peso proyectado (T)	Peso proye acum (T)
Tierras limpias de excavación	010102	4) Excavación manual en material común, profundidad hasta - 2 (incluye cargue, transporte y disposición final).	0	47.28	M3	0	61.46

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

Concretos	010301	17) Retiro de bolardo (o restos). Incluye reparación del sitio con concreto de 1500 PSI hecho en obra (40x40x10cm) y subbase granular B-200 E=0,35. Incluye demolición, excavación y retiro de escombros.	0	13	UN		1.26
		18) Retiro de bolardo (o restos). Incluye demolición y retiro de escombros. (sin reparación del sitio)	0	45	UN	0	4.36
		19) Retiro de bolardo cubico (incluye transporte del elemento).	0	0.49	UN	0	0.49
		1) Demolición de concreto (incluye equipo, cargue, transporte y disposición final de escombros).	0	6.57	M3	0	15.11
Residuos de material asfáltico	010304	3) Demolición pavimento flexible espesor variable, (incluye equipo, cargue, transporte y disposición final de escombros).	0	0	M3	0	0
Acero y Hierro	010501	11) Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 60000 PSI, Incluye corte amarre y figurado	0	866.74	M2		0.01

Tabla 30 Residuos generados en la obra

3.1.3. Disposición de residuos

Para el presente periodo no se realiza disposición final de residuos, se tiene programado para el siguiente mes. Actualmente se encuentran en el centro de acopio de la empresa.

Tipo de Residuo	Clasificación	Transportador	Licencias/ Permisos/ autorizaciones	Gestor/ Dispositivo final	Licencias/ Permisos/ autorizaciones	Cantidad Generada	Cant Acum.	Unidad	Cant dispuesta	Cant dispuesta acum
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 31 Disposición de Residuos de Obra

3.1.4. Balance

Tipo de Residuo	Clasificación	Cantidad pendiente	Unidad
Tierras limpias de excavación	010102	61.45	T
Concretos	010301	21.22	T

 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991	INFORME MENSUAL SSTA No. 06	V.2

Residuos de material asfáltico	010304	0.26	T
Papel y carton	010404	59	BOLSAS
Acero y hierro	010501	0.008	T

De acuerdo con la información anterior no se presenta una generación de residuos para la actividad

Tabla 32 Disposición de Residuos de Obra

3.2. Equipos

Para el presente periodo, se relacionan los vehículos que fueron aprobados y están vinculados al desarrollo del contrato, dichos vehículos se utilizaron en el contrato a partir del 19 de septiembre, día en que iniciaron actividades en campo:

A continuación, se relacionan los equipos mínimos requeridos, que fueron adquiridos y aprobados para el desarrollo del contrato.

EQUIPOS						
ITEM	TIPO	SERIAL Y/O MARCA	EMPRESA	FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO	FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO	ESTADO
1	ROTOMARTILLO	MAKITA	G-VIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de febrero de 2026	ACTIVO
2	PLANTA ELÉCTRICA	HUSQVARNA	G-VIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de febrero de 2026	ACTIVO
3	PLANTA ELÉCTRICA	BAUKER	G-VIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de febrero de 2026	ACTIVO
4	EQUIPO DE SOLDADURA	ELITE MIG	G-VIAL	No aplica – Equipo nuevo	02 de febrero de 2026	ACTIVO

Tabla 33 Relación de Máquinas y Equipos

Ver anexo 09. Maquinaria - Equipos y Vehículos

3.3. Ruido

En las actividades realizadas en el período no se generó ruido por encima de los niveles permisibles ni se recibieron quejas de la comunidad al respecto, a pesar de realizar los trabajos en la noche.

 <p>CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BOGOTÁ 2025</p>	<p>SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD PEATONAL (ESVAP) EN EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>
<p>CONTRATO DE OBRA NO. 2025-2991</p>	<p>INFORME MENSUAL SSTA No. 06</p>	<p>V.2</p>

4. CONCLUSIONES

- Para el presente informe perteneciente al periodo del 19 de enero al 18 de febrero 2026, las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se enfocaron principalmente con el desarrollo de Inducciones SST, notificación de riesgos, recomendaciones médica laborales, capacitaciones SST y creación y actualización de procedimientos, formatos, cronogramas y demás, asociados al SGSST
- Teniendo en cuenta la dedicación contractual del Profesional SST para el contrato, se realizaron actividades del componente SST acordes al 30% de dedicación.
- Se realizaron las inspecciones de seguridad pertenecientes a la verificación del estado de los equipos y herramientas antes de su uso y de igual manera al orden y aseo de los puestos de trabajo.
- Para el presente informe, no se presentaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales, reflejando la efectividad en las normas SST y el autocuidado del personal.

5. ANEXOS

ANEXO 01. MATRIZ DE PELIGRO
 ANEXO 02. BASE DE DATOS DE PERSONAL
 ANEXO 03. PLANILLAS DE SEGURIDAD
 ANEXO 04. REGISTRÓ DE INDUCCIONES SST
 ANEXO 05. CAPACITACIONES SST
 ANEXO 06. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ATS
 ANEXO 07 EMO
 ANEXO 08. RECOMENDACIONES MÉDICAS LABORALES
 ANEXO 09. MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS
 ANEXO 10. SG-SST
 ANEXO 11. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
 ANEXO 12. ENTREGA DE DOTACION
 ANEXO 13. PROCEDIMIENTO DE IZAJE DE CARGAS
 ANEXO 14. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
 ANEXO 15. COMITES SGSST
 ANEXO 16. PLAN DE EMERGENCIAS
